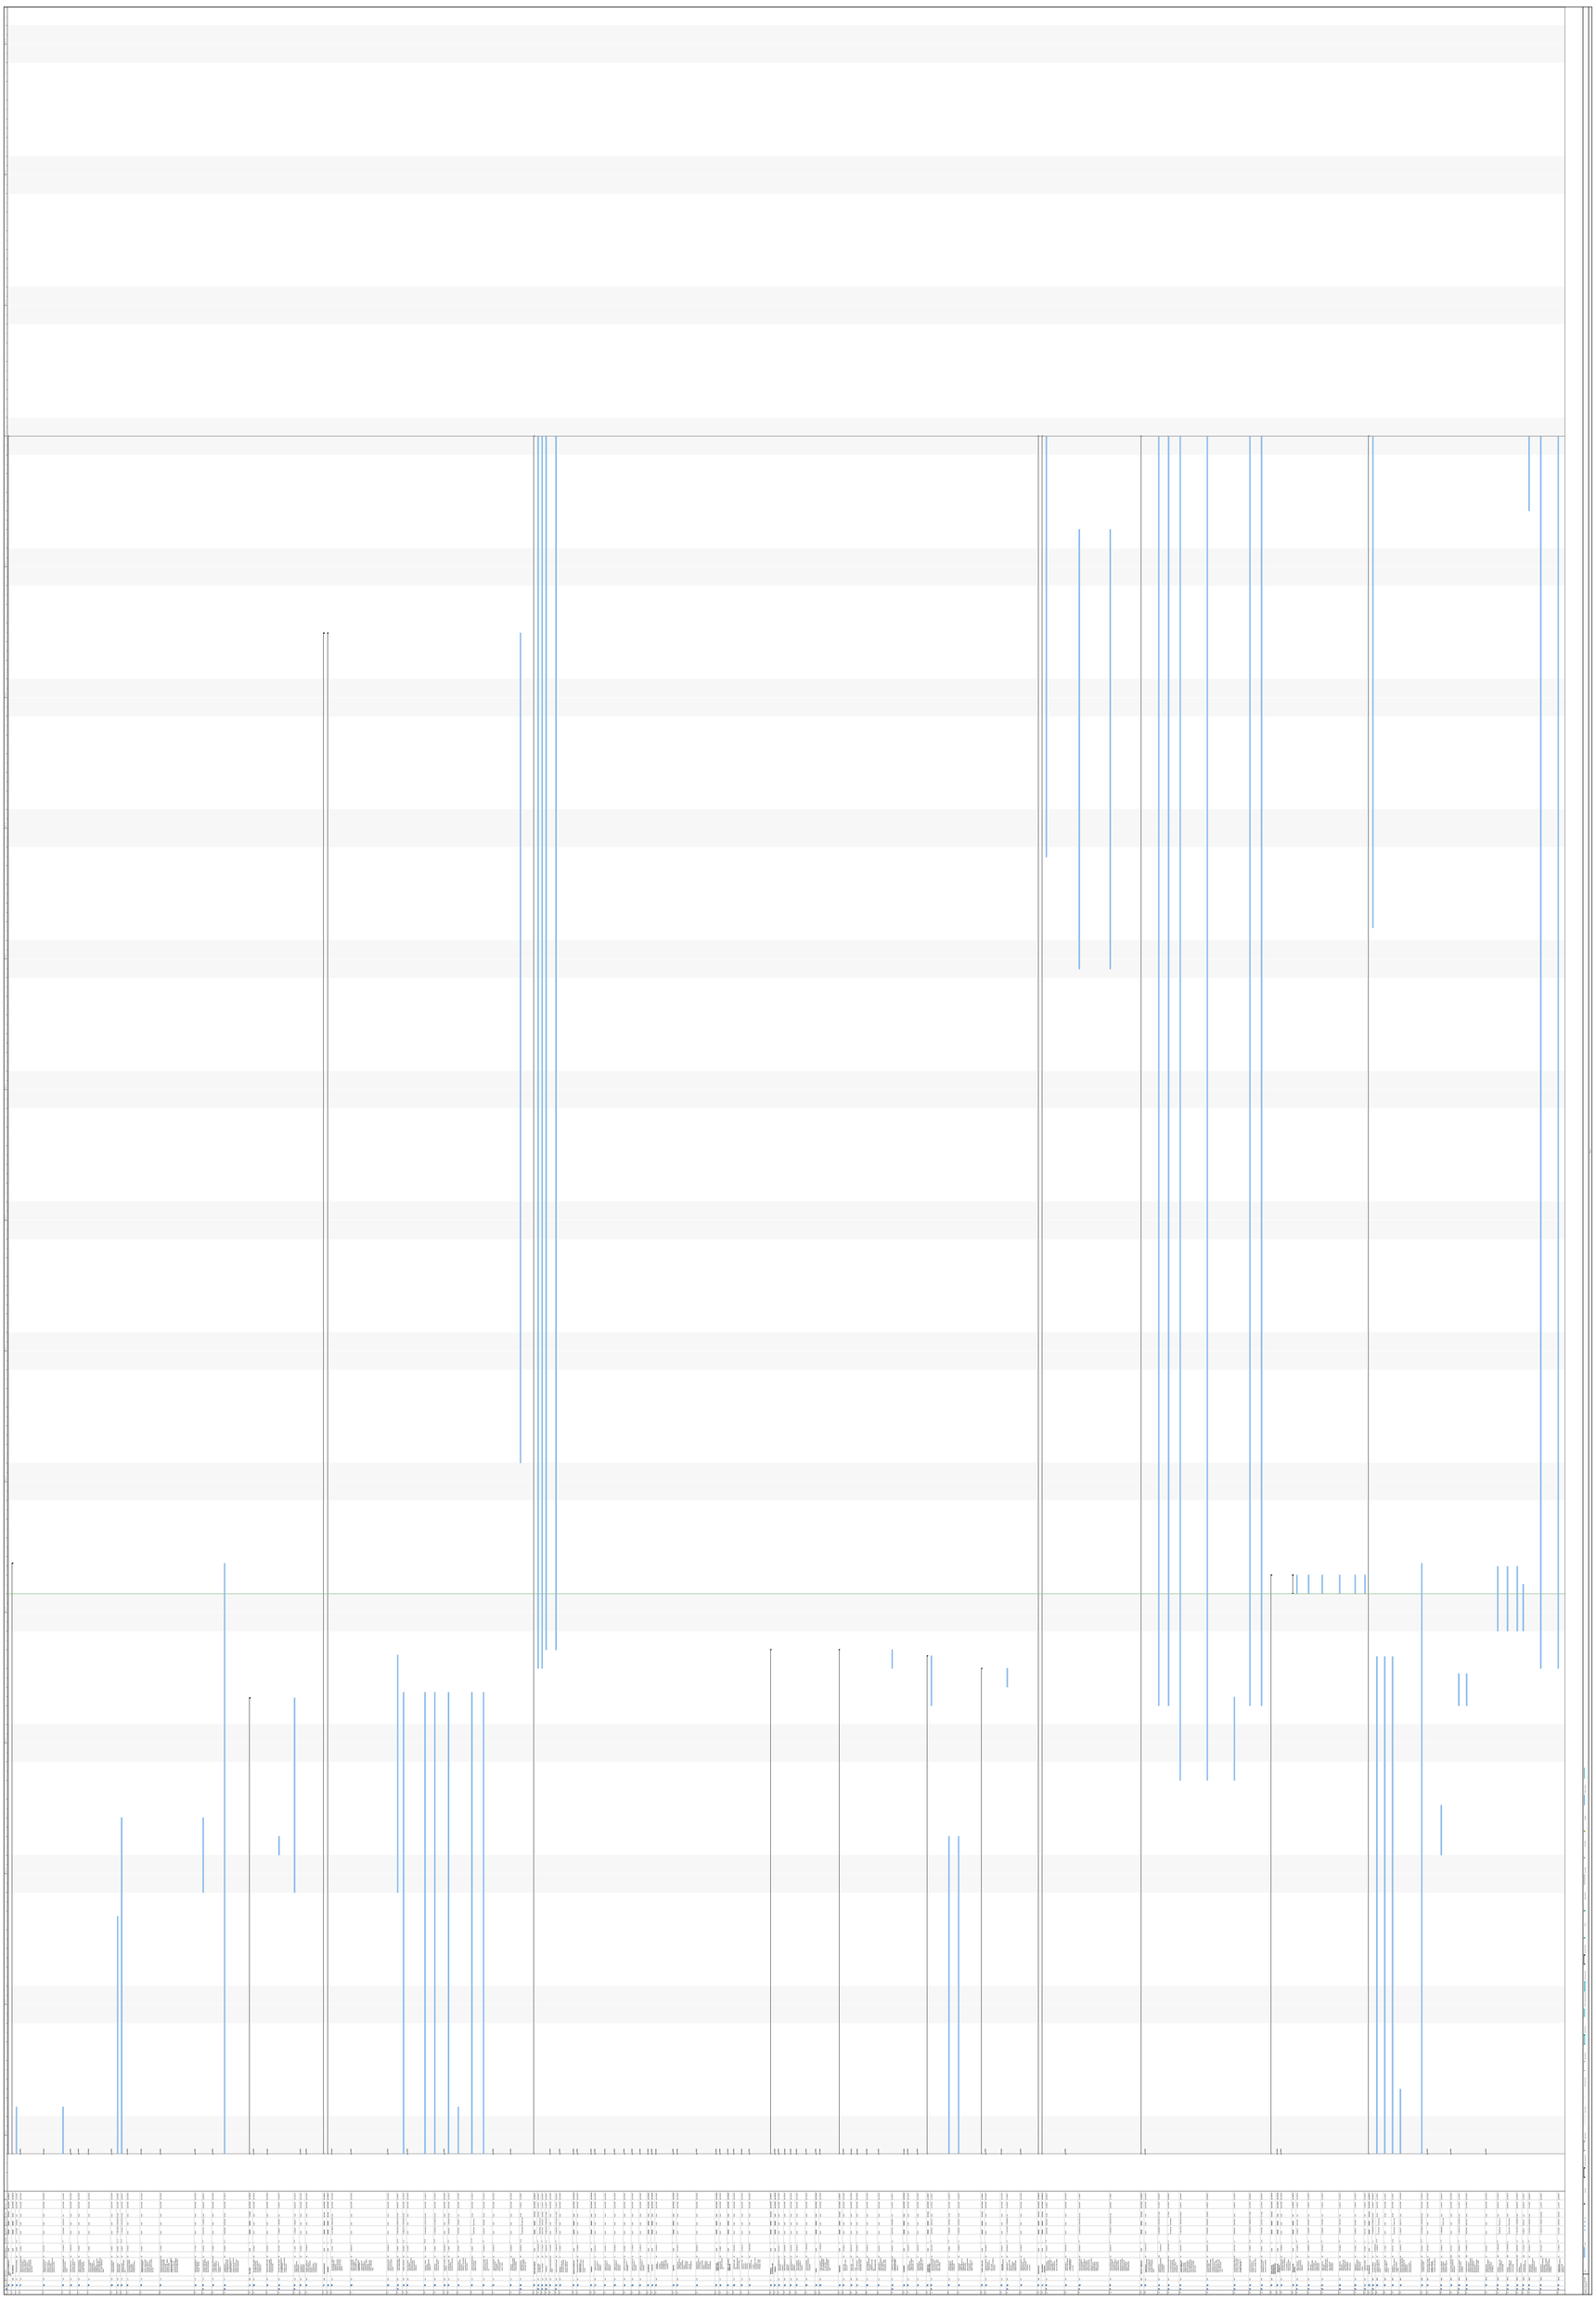


Id	Modo de tarea	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR SIN AIU	VALOR CON AIU	Duración	Comienzo	Fin
146		NP 20	SUMINISTRO E INSTALACION BARRAJE PREFORMADO SUMERGIBLE DE 6 SALIDAS 3M PARA BAJA TENSION EN PUNTO DE CONEXIÓN DEFINIDO POR CODENSA INCLUYE SOPORTE DE FIJACION.	JUEGO X 3	$ 1.494.140,00	0,42	$ 627.538,80	$ 851.630,23	58,88 días	jue 14/01/21	sáb 20/03/21
147		NP 21	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLE LIMITADOR DE 70 A PARA CABLE No 4	JUEGO X 3	$ 748.356,00	0,42	$ 314.309,52	$ 426.548,11	58,88 días	jue 14/01/21	sáb 20/03/21
148		NP 22	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA CABLE 3 No 4 AL + 1 No 8T Cu AWG,600V INCLUYE CONDUCTORES, CONEXIONADO, MARCACION Y ACCESORIOS.	ML	$ 68.500,00	62,7	$ 4.294.950,00	$ 5.828.658,36	60 días	mié 13/01/21	sáb 20/03/21
149		NP 23	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME 3 M CON DERIVACION EN RESINA,DEBE SER SUMERGIBLE 100% PARA CABLE No 4 a No 12 AWG.	UN	$ 259.514,00	3,76	$ 975.772,64	$ 1.324.216,90	57,75 días	vie 15/01/21	sáb 20/03/21
150		NP 24	SUMISTRO E INSTALACION DE CABLE 2 No 12+1No12 T ALIMENTACION LUMINARIA	UN	$ 176.044,00	3,76	$ 661.925,44	$ 898.296,20	58,88 días	jue 14/01/21	sáb 20/03/21
151		NP 25	CERTIFICADO RETIE Y RETILAP	UN	$ 12.977.055,00	0,42	$ 5.450.363,10	$ 7.396.684,56	56 días	lun 18/01/21	sáb 20/03/21
152		NP 26	SOLICITUD CODENSA CONEXIÓN DEFINITIVA	DIA	$ 450.000,00	3,34	$ 1.503.000,00	$ 2.039.714,90	56 días	lun 18/01/21	sáb 20/03/21
153		NP 27	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA YOA MIDI FOTOMETRIA 5120 (24 LEDS)530 mA (55W)(7,000 Lm)(100277V)	UN	$ 4.614.568,00	4,07	$ 18.781.291,76	$ 25488.011,11	58,88 días	jue 14/01/21	sáb 20/03/21
154		NP 28	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	ML	$ 10.710,00	41,8	$ 447.678,00	$ 607.541,91	1 día	sáb 19/12/20	lun 21/12/20
155		NP 29	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 16" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA.	ML	$ 16.065,00	62,7	$ 1.007.275,50	$ 1.366.969,29	1 día	sáb 19/12/20	lun 21/12/20
156		NP 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL ACO MONOBLOCK RD 200 10,0	ML	$ 895.838,00	41,38	$ 37.069.776,44	$ 50307.235,83	3 días	lun 04/01/21	mié 06/01/21
157			**COMPONENTES**		**$ 0,00**	**0**	**#ERROR**	**#ERROR**	**24 días**	**lun 22/02/21**	**sáb 20/03/21**
158			AMBIENTAL Y SST	GBL	$ 10.359.242,49	1	$ 10.359.242,48	$ 14058.483,88	24 días	lun 22/02/21	sáb 20/03/21
159			SOCIAL	GBL	$ 17.793.996,49	1	$ 17.793.996,49	$ 24148.156,90	24 días	lun 22/02/21	sáb 20/03/21
160			PMT	GBL	$ 8.142.543,11	1	$ 8.142.543,11	$ 11050.210,63	24 días	lun 22/02/21	sáb 20/03/21
161			**ENSAYOS DE LABORATORIO**		**$ 0,00**	**0**	**#ERROR**	**#ERROR**	**24 días**	**sáb 19/12/20**	**mar 19/01/21**
162			ENSAYOS DE LABORATORIO	GBL	$ 3.373.670,52	1	$ 3.373.670,52	$ 4.578.393,90	24 días	sáb 19/12/20	mar 19/01/21
163			**PROGRAMA DE ARQUEOLOGIA PREVENTIVA**		**$ 0,00**	**0**	**#ERROR**	**#ERROR**	**24 días**	**lun 22/02/21**	**sáb 20/03/21**
164			PROGRAMA DE ARQUEOLOGIA PREVENTIVA	GBL	$ 11.646.046,40	1	$ 11.646.046,40	$ 15804.800,00	24 días	lun 22/02/21	sáb 20/03/21
