NP 8,03	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA .	PTO	$ 100.000,00	8	$	800.000,00
NP 8,04	REPARACION DE PUNTOS DE ANCLAJE DE COLUMNAS METALICAS INCLUYE RELLENO CON CONCRETO PARA PROTECCION	PTO	$ 100.000,00	0	$	-
NP 8,05	PINTURA MALLA ESLABONADA PARA CERRAMIENTO	M2	$ 18.314,49	76,8	$	1.406.553,00
Subtotal					**$**	**61.527.097,00**
9	POLIDEPORTIVO JUANA SOFIA					
9,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	$ 3.541,38	16,00	$	56.662,00
9,02	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	$ 31.475,72	8,00	$	251.806,00
9,03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	$ 701.543,17	5,18	$	3.633.994,00
9,04	VIGA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	$ 1.043.239,51	2,00	$	2.086.479,00
9,05	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	$ 1.403.792,39	0,64	$	898.427,00
9,06	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	$ 1.882.201,91	0,80	$	1.505.762,00
9,07	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:4)	M2	$ 140.058,21	30,60	$	4.285.781,00
9,08	ACERO VIGAS: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	$ 8.199,41	339,59	$	2.784.438,00
9,09	ACERO COLUMNA: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	$ 8.199,41	140,68	$	1.153.493,00
9,10	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	$ 18.228,40	0,00	$	-
9,11	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	$ 1.314.935,07	0,00	$	-
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	$ 122.759,51	0,00	$	-
9,13	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO.	U	$ 15.617.415,88	2,00	$	31.234.832,00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

	INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP 9,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.629,22	0,00	$ -
NP 9,02	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML	$ 3.977,52	0,00	$ -
Subtotal					**$ 47.891.674,00**
10	POLIDEPORTIVO EL C.I.C				
10,01	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	U	$ 82.833,34	1,00	$ 82.833,00
10,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	$ 713.382,09	2,00	$ 1.426.764,00
10,03	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10x0.20x0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	$ 56.592,58	4,82	$ 272.776,00
10,04	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	$ 37.661,46	2,41	$ 90.764,00
10,05	PINTURA VINITO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	$ 12.008,92	196,32	$ 2.357.591,00
10,06	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	$ 14.429,63	449,04	$ 6.479.480,00
10,07	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	$ 18.228,40	331,22	$ 6.037.612,00
10,08	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	$ 1.314.935,07	1,00	$ 1.314.935,00
10,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCIÓN CANCHAS	M2	$ 122.759,51	0,00	$ -
10,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.629,22	560,32	$ 3.714.483,00
10,11	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	U	$ 537.435,17	0,00	$ -
10,12	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	$ 109.702,93	0,00	$ -
10,13	ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA	M2	$ 15.702,54	68,50	$ 1.075.561,00
10,14	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 15.617.415,88	0,00	$ -
10,15	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 1000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1",	U	$ 1.171.628,59	0,00	$ -

	FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP 10,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M	$ 3.977,52	349,47	$ 1.390.025,00
NP 10,02	PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M	$ 8.547,80	0,00	$ -
Subtotal					**$ 24.242.824,00**
11	POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE				
11,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.629,22	549,96	$ 3.645.804,00
11,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	$ 14.429,63	41,04	$ 592.192,00
11,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	$ 18.228,40	414,13	$ 7.548.929,00
11,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	$ 35.613,11	94,79	$ 3.375.767,00
11,05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	$ 1.314.935,07	1,00	$ 1.314.935,00
11,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 687.687,73	0,00	$ -
11,07	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 15.617.415,88	2,00	$ 31.234.832,00
11,08	MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS	M	$ 879.898,99	0,00	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP 11,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M	$ 3.977,52	416,42	$ 1.656.321,00
NP 11,02	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA .	PTO	$ 100.000,00	8,00	$ 800.000,00
NP 11,03	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	M	$ 33.823,00	108,00	$ 3.652.884,00
Subtotal					**$ 53.821.664,00**
				COSTO DIRECTO	**$440.868.362,00**
				ADMINISTRACION 28%	**$123.443.141,36**
				IMPREVISTOS 1%	**$4.408.683,62**
				UTILIDAD 5%	**$22.043.418,10**
				AIU %	**$149.895.243,08**
				COSTO TOTAL	**$590.763.605,00**

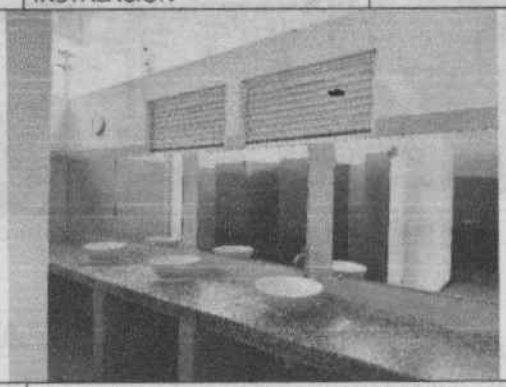
Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

GRÁFICA DE AVANCE FÍSICO

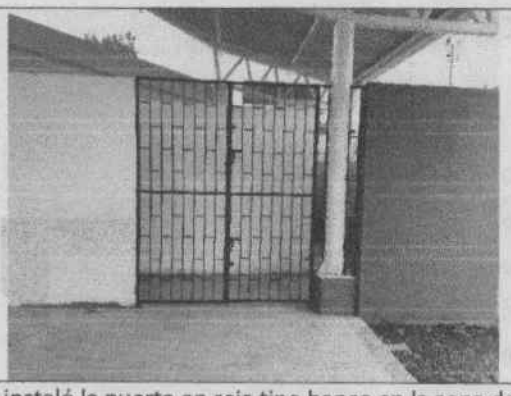


Durante la ejecución del tercer mes se evidencia un avance ejecutado del 71,75% contra un avance programado del 70%, generando un avance optimo en la programación de obra. Lo anterior, es debido a que se lograron mayores rendimientos en los frentes de obra durante la ejecución de actividades; adicionalmente se ejecutaron actividades cuyo valor representan un gran porcentaje del presupuesto total como se describe a continuación:

REGISTRO DE AVANCE

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 1,1,2	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	3,2 M2	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se instalaron los espejos dentro del baño		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 1,1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN REJA VARILLA CUADRADA 10 MM CON CERRADURA A= 0.90 - 1.50 M. INCLUYE PINTURA	2 U	100,00%



OBSERVACIONES	Se instaló la puerta en reja tipo banco en la zona de acceso a los baños públicos

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
2,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	17,76 M2	100,00%



OBSERVACIONES	**Se realizó la localización y replanteo del área donde se sitúa el cárcamo**

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
2,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	2,66 M3	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

	
OBSERVACIONES	Se realizó la excavación manual previamente a la construcción del cárcamo

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
2,03	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 Mpa (1800 PSI)	0,89 M3	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se vació el solado de limpieza sobre el área donde se sitúa el cárcamo		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
2,04	CARCAMO EN CONCRETO 3000PSI E=0,15M. SECCIOÓN 0,40X0,45M INCLUYE EXCAVACION A MANO	2,66 M3	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgri@gmail.com



OBSERVACIONES	Se fundió el carcamo en concreto reforzado de 3000 psi

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
2,05	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	18,57 M2	100,00%



OBSERVACIONES	Se pañetaron los pedestales que se encontraban en mal estado con el acero expuesto

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
2,06	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	345,78 M2	100,00%



Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

OBSERVACIONES	Se realizó el lavado de las graderías antes de aplicar la pintura

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
2,07	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	36,16 M2	100,00%



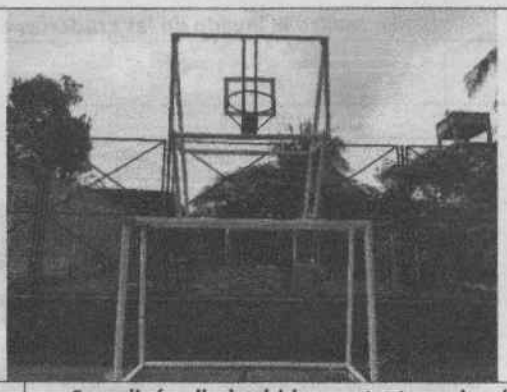
OBSERVACIONES	Se aplicó la pintura sobre los pedestales

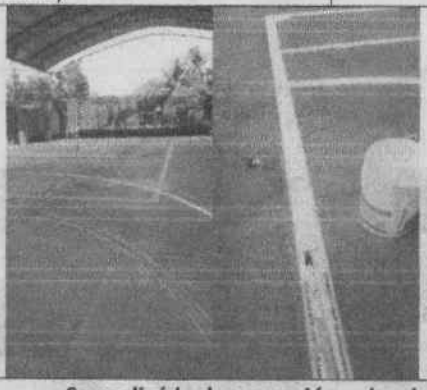
ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
2,08	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	301,15 M2	100,00%



OBSERVACIONES	Se aplicó pintura en esmalte sobre las graderías

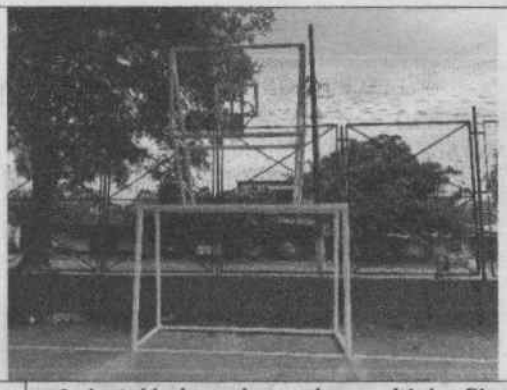
ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
2,09	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	84,6 M2	100,00%

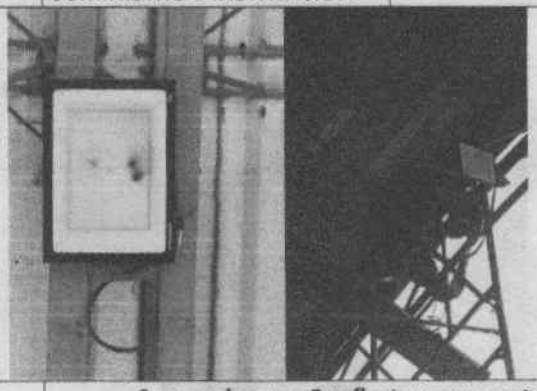
	
OBSERVACIONES	Se aplicó sellador hidro protector sobre los muros de cerramiento

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
2,10	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	1 U	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se realizó la demarcación sobre la placa de cancha multiple		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
2,11	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 U	100,00%

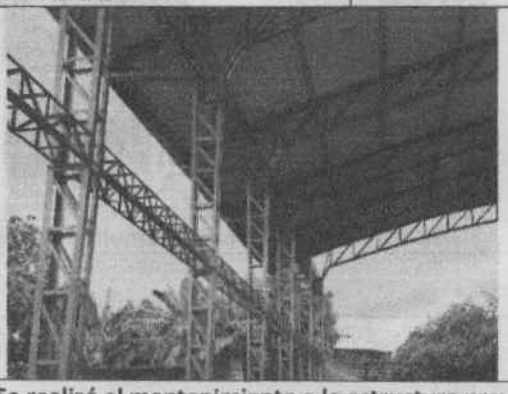
Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgri@gmail.com

	
OBSERVACIONES	Se instaló el par de canchas multiples fijas en el escenario deportivo

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
2,12	REFLECTOR LED 300W IP 65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	3 U	37,50%
			
OBSERVACIONES	Se remplazaron 3 reflectores que estaban en mal estado		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
2,13	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL	252,72 M2	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se aplicó pintura en esmalte sobre la malla de cerramiento		

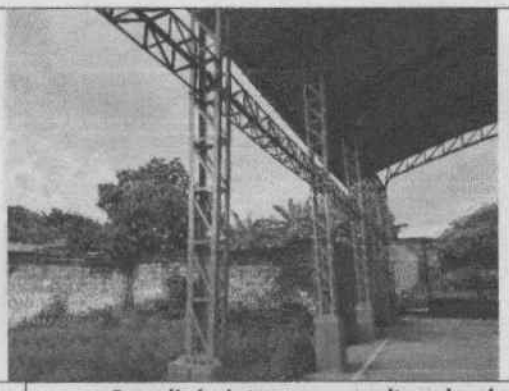
Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
2,14	MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS	8 M	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se realizó el mantenimiento a la estructura previo a la aplicación de pintura		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 2,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	336,4 ML	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se realizó el lavado de la demarcación existente previamente a la aplicación de pintura		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 2,02	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	96 ML	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com



OBSERVACIONES	Se aplicó pintura en esmalte sobre las columnas metálicas

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 2,03	REFORZAMIENTO DE TEJA METALICA EXISTENTE EN POLIDEPORTIVO ALTURA 10M Y MAX 10M2 DE INTERVENCION	1 GL	100,00%



OBSERVACIONES	Se reforzó la cubierta con cinta asfáltica en las zonas afectadas

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 2,04	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO A= 0,40 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	1,8 ML	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com



OBSERVACIONES	Se realizó la demolición de concreto sobre la placa que interrumpía la continuación del cárcamo

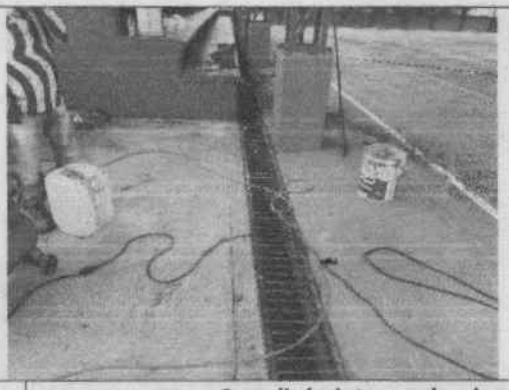
ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
3,01	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE BALONCESTO EN LAMINA DE ACRILICO 1.20 X 1.80m E0 10mm INC DEMARCACION	2 U	100,00%



OBSERVACIONES	Se instalaron los dos tableros en acrílico para las canchas múltiples

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
4,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	94,81 M2	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com



OBSERVACIONES	Se aplicó pintura sobre los pedestales

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
4,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	4 U	50,00%



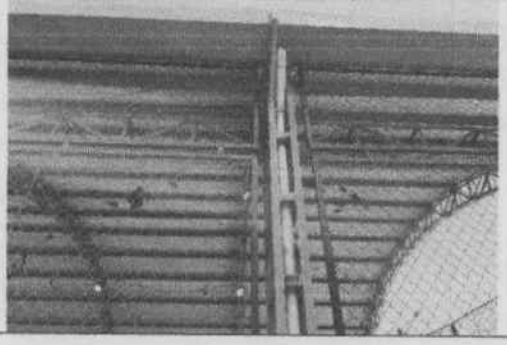
OBSERVACIONES	Se remplazaron los reflectores que estaban en mal estado

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
4,07	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	2 M	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

	
OBSERVACIONES	Se realizó el mantenimiento a la estructura previo a la aplicación de pintura

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 4,02	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	72 ML	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se aplicó pintura en esmalte sobre las columnas metálicas		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
5,07	MANTENIMIENTO DE ETRUCTURAS METALICAS	2 M	100,00%
			

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

OBSERVACIONES	Se realizó mantenimiento a la estructura metálica en mal estado

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
6,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 U	12,50%



OBSERVACIONES	Se remplazó el reflector que se encontraba en mal estado

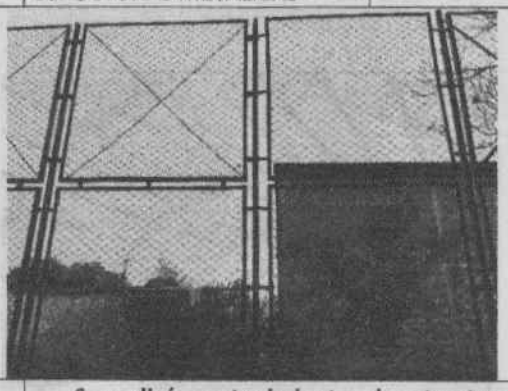
ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
6,07	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 U	100,00%



Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

OBSERVACIONES	Se instaló el par de canchas múltiples en el escenario deportivo

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
6,09	MANTENIMIENTO DE ESRUCTURAS METALICAS	2 M	100,00%



OBSERVACIONES	Se realizó mantenimiento a la estructura metálica en mal estado


ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
9,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	16 M2	100,00%



OBSERVACIONES	Se realizó la localización y replanteo en el área donde se sitúa el muro contra impacto

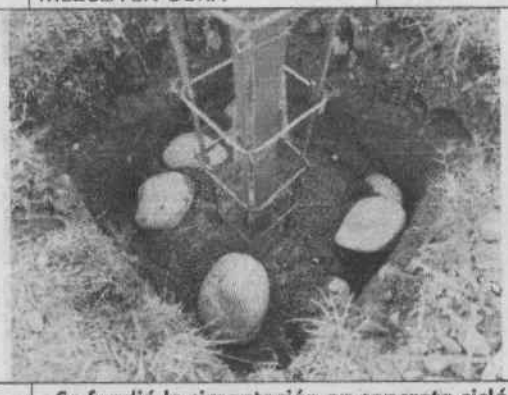
ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
9,02	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	8 M3	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com



OBSERVACIONES	Se hizo la excavación para la cimentación del muro contra impacto

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
9,03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	5,18 M3	80,94%



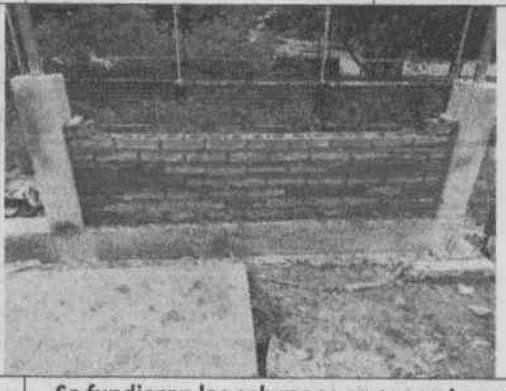
OBSERVACIONES	Se fundió la cimentación en concreto ciclópeo según especificaciones

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
9,04	VIGA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	2 M3	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgri@gmail.com

	
OBSERVACIONES	Se fundió viga en concreto para el muro contra impacto

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
9,05	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	0,64 M3	47,06%

	
OBSERVACIONES	Se fundieron las columnas en concreto para el muro contra impacto

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
9,06	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	0,8 M3	80,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

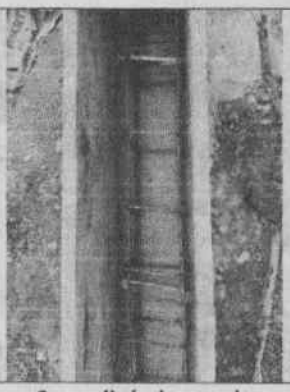
	
OBSERVACIONES	Se fundió la alfajía en concreto sobre el muro contra impacto

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
9,07	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:4)	30,6 M2	100,00%

	
OBSERVACIONES	Se construyó el muro en ladrillo prensado para la malla contra impacto

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
9,08	ACERO VIGAS: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	339,59 KG	90,72%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com



OBSERVACIONES	Se realizó el armado y amarre de acero para las vigas

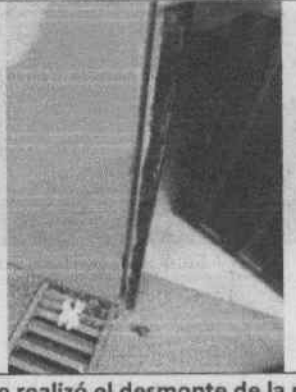
ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
9,09	ACERO COLUMNA: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	140,68 KG	57,17%



OBSERVACIONES	Se realizó el armado y amarre de acero para las columnas

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
9,13	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE	2 U	100,00%

	MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN		
			
OBSERVACIONES	**Se instaló el par de canchas múltiples en el escenario deportivo**		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
10,01	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	1 U	100,00%
			
OBSERVACIONES	**Se realizó el desmonte de la puerta que estaba en mal estado**		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
10,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	2 M2	100,00%

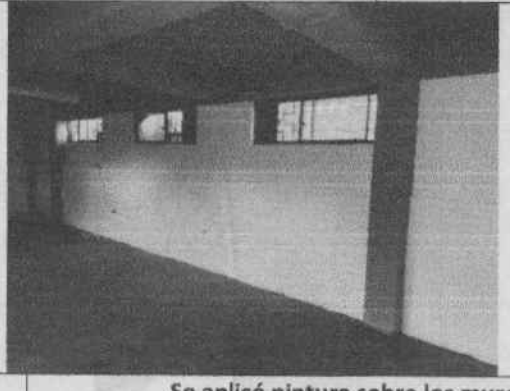
Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL



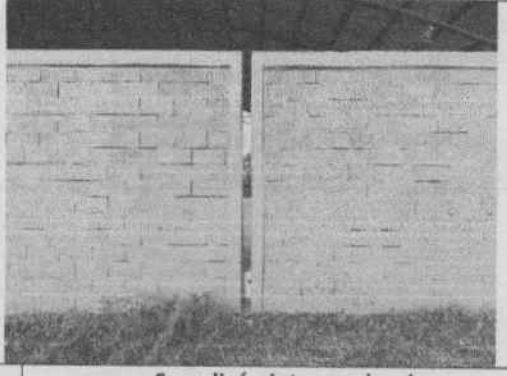
OBSERVACIONES	Se instaló la nueva puerta para el baño

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
10,05	PINTURA VINITO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	196,32 M2	80,00%



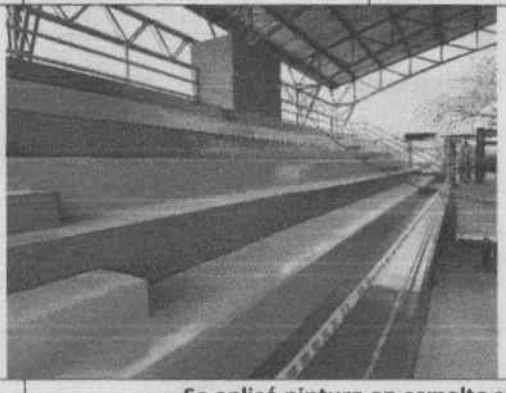
OBSERVACIONES	Se aplicó pintura sobre los muros del camerino

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
10,06	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	449,04 M2	100,00%



OBSERVACIONES	Se aplicó pintura sobre los muros de cerramiento

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
10,07	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	331,22 M2	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se aplicó pintura en esmalte sobre graderías		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
10,13	ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA	68,496 M2	80,00%
			
OBSERVACIONES	Se aplicó pintura en esmalte sobre las barandas		

RELACIÓN DE PERSONAL

A continuación, se menciona el personal técnico y operativo empleado durante el primer mes de ejecución para el desarrollo de las actividades, los cuales cuentan con afiliaciones y pagos de seguridad vigentes a la fecha; y elementos de protección personal para realizar labores en obra.

SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2026							
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	DÍAS COTIZADOS	PENSIÓN	SALUD	ARL	PLANILLA
ROSEMBERTH LÓPEZ HERNANDEZ	86039315	DIRECTOR DE OBRA	30	COLPENSIONES	SANITAS	SURA	9504385557
LUIS FERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA	1006718337	RESIDENTE DE OBRA	30	PROTECCIÓN	SANITAS	SURA	9504430138
ROSEMARY HURTADO MEJÍA	1121834191	PROFESIONAL SST	30	POVENIR	SANITAS	SURA	9514566428
RUBIEL DE JESUS OSORIO ARBOLEDA	6465399	MAESTRO DE OBRA	30	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA	9503954462
FABIO JAIME GARZÓN	86063434	MAESTRO DE OBRA	30	PORVENIR	CAJACOPI	SURA	9503982945

CONCLUSIONES

Durante la ejecución del tercer mes se evidencia un avance ejecutado del 71,75% contra un avance programado del 70%. Se lograron incrementar los rendimientos una vez aprobada el acta modificatoria No. 1; también se ejecutaron actividades las cuales abarcan un gran porcentaje del presupuesto total del contrato. Se ejecutaron actividades con normalidad cumpliendo con los plazos establecidos en la programación de obra. Sin embargo, algunas actividades quedan pendientes a la fecha, debido que durante el presente mes se encuentra en trámite el acta modificatoria No. 2 de mayores y menores cantidades, de acuerdo a los requerimientos de la comunidad y condiciones reales en campo.

ING. ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS GRL

	ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRATISTAS	Código: F - 248 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

Fecha: 2/04/2026

OBJETO CONTRATO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GRL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A
INTERVENTORÍA:	N/A

NOMBRE	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL.		NORMA A CUMPLIR	FECHA DE RECIBIDO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		ELEMENTOS DE PROTECIÓN PERSONAL / DOTACIÓN	CANTIDAD			
LUIS FERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA	RESIDENTE DE OBRA	GAFAS LENTE OSCURO	1	NTC 1771	2/04/2026	
ROSEMARY HURTADO MEJIA	RESIDENTE HSEQ	GAFAS LENTE OSCURO	1	NTC 1771	2/04/2026	
RUBIEL DE JESUS OSORIO ARBOLEDA	MAESTRO DE OBRA	GAFAS LENTE OSCURO PROTECTOR AUDITIVO	1 1	NTC 1771 NTC 2272 y NTC 2273	20/01/2026	rubiel osorio
FABIO JAIME GARZON	MAESTRO DE OBRA	GAFAS LENTE OSCURO PROTECTOR AUDITIVO	1 1	NTC 1771 NTC 2272 y NTC 2273	20/01/2026	fabio garzon
PRIETO SALAMANCA MIGUEL ANGEL	ORNAMENTADOR	CASCO BOTAS DE SEGURIDAD GAFAS LENTE OSCURO PROTECTOR AUDITIVO	1 1 1 1	NTC 1523 NTC 2035 NTC 1771 NTC 2272 y NTC 2273	20/01/2026	miguel prieto

Con la firma de este registro certifico que:
1. Recibí los elementos de proteccion persona
2. Los revise y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso.
4. Me comprometo a usarlo.
5. Me comprometo a mantenerlo en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,
el día **2/04/2026**

Firma
LUIS FERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037-0626193 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONSORCIO OBRAS GRL

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO PUERTO LOPEZ

CONTRATO DE OBRA N° 103-13-09-005 DE 2025

"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META"

PERIODO: Del 23 marzo al 22 de abril del 2026.

ELABORO	REVISO	APROBO
ROSEMARY HURTADO M.		
ROSEMARY HURTADO MEJIA **PROFESIONAL SST**	ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ **DIRECTOR DE OBRA**	LUIS FERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA **RESIDENTE DE OBRA**

CONSORCIO OBRAS GRL	INFORME DE GESTION MENSUAL		
SG-SST	VERSION 01	FECHA	31/10/2024

EMPRESA CONSTRATISTA

CONSORCIO OBRAS GRL
NIT: 902.021.128-6

CONTRATO DE OBRA N° 103-13-09-005 DE 2025

ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 4
2. OBJETIVOS 4
3. ALCANCE 4
4. INFORMACION BASICA CONTRATO DE OBRA 4
   4.1 TURNOS DE TRABAJO 5
5. INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROYECTO PUERTO LOPEZ 6
   5.1 LISTADO DEL PERSONAL QUE ESTÁ EJECUTANDO EL CONTRATO 6
   5.2 AFILIACION Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 6
   5.3 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE Y RIESGOS 6
   5.4 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 7
   5.5 ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO LABORAL 7
   5.6 CERTIFICADO DE SINIESTRALIDAD EMITIDO POR LA ARL 7
   5.7 ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO 7
   5.8 PROGRAMA DE CAPACITACION Y CHARLAS 7
6. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 8
   6.1 INSPECCIONES SST 8
   6.2 REGISTRO FOTOGRAFICO 8
7. ANEXOS 8

1. INTRODUCCION

La seguridad es la confianza de realizar un trabajo determinado sin llegar al descuido. Por tanto, CONSORCIO OBRAS GRL, velara por la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST, garantizando un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los trabajadores y al mismo tiempo estimular la prevención de accidentes fuera del área de trabajo. Si las causas de los accidentes industriales pueden ser controladas, la repetición de éstos será reducida.

La seguridad es parte fundamental de todos los proyectos. Es política de CONSORCIO OBRAS GRL, proveer un óptimo nivel de seguridad para todos los empleados. Lo anterior debe incluir, pero no limitarse a crear una actitud positiva hacia la seguridad, establecer procedimientos de actuación y operación seguras, proveer equipos e instalaciones adecuadas y suministrar la información necesaria para la prevención y control de siniestros de cualquier naturaleza.

Por todo lo anterior se justifica la elaboración e implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que garantice el mejoramiento continuo de las Condiciones de Salud, Trabajo y el bienestar de los trabajadores. Para que se desempeñen de una manera adecuada y eficiente permitiendo su crecimiento personal, a la vez el mejoramiento de la productividad del proyecto.

2. OBJETIVOS

- Sensibilizar a la población trabajadora
- Hacer seguimiento periódico a las áreas de trabajo verificando la ejecución de las diferentes medidas de control, realizadas por CONSORCIO OBRAS GRL.
- Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones generales de salud y calidad de vida de los trabajadores, que integren el proyecto.

3. ALCANCE

El presente informe es para la verificación de las actividades aplicadas por todo el personal que labora en la obra "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META" referente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. INFORMACION BASICA CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°	103-13-09-005 DE 2025
OBJETO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GRL
LOCALIZACION	PUERTO LOPEZ
PLAZO	3 MESES 18 DÍAS
FECHA DE ACTA DE INICIO	23 DE ENERO DE 2025

4.1 TURNOS DE TRABAJO

El personal administrativo es el que se encuentra como base dentro de las instalaciones de CONSORCIO OBRAS GRL, por lo que aparece dentro de la planilla de seguridad Social. El personal contratado para el proyecto puede variar de acuerdo con las necesidades específicas del mismo.

A continuación, se detallan de manera general los turnos y horarios de la fuerza de trabajo de CONSORCIO OBRAS GRL, distribuidos de la siguiente manera.

HORARIOS DE TRABAJO

AREAS DE TRABAJO	HORARIOS	DESCANSO
Oficina administrativa	Lunes a viernes 08:00 am – 12:00 pm, 2:00 pm a 6:00 pm	15 minutos en cada jornada.
	sábados de 08:00 am a 1:00 pm	2 horas de almuerzo
Lugar de ejecución del proyecto	Lunes a viernes 7:00 am – 5:00 pm	15 minutos en cada jornada.
	sábados de 08:00 am a 12:00 pm	2 horas de almuerzo

5. INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROYECTO PUERTO LOPEZ

El objetivo particular de este corresponde al informe mensual del periodo transcurrido del Del 23 marzo al 22 de abril del 2026, de las actividades ejecutadas durante el avance de obra con el personal actualmente vinculado al proyecto.

5.1 LISTADO DEL PERSONAL QUE ESTÁ EJECUTANDO EL CONTRATO

Durante el periodo que comprende este informe no se realiza la contratación de personal para los avances de obra.

Anexo 1: Listado de personal asignado al proyecto.

5.2 AFILIACION Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Garantizando el bienestar de nuestros colaboradores y en cumplimiento de las obligaciones legales requeridas, se realizan las afiliaciones y aportes al Sistema General de Riesgos Laborales (EPS, ARL, AFP, CCF) de cada uno de los colaboradores que laboran en el proyecto.

Se realiza la validación de los pagos de seguridad social del personal actualmente vinculado con el proyecto.

Anexo 2: planilla de Seguridad Social

5.3 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE Y RIESGOS

A través de esta herramienta de gestión, basada en la GTC45 le permite a CONSORCIO OBRAS GRL, determinar de manera objetiva cuales son los riesgos relevantes para la seguridad y salud y de todoslos colaboradores que prestan el servicio para este contrato y los controles a establecer.

La gestión de peligros se realiza por medio de la implementación de medidas prevención y control determinadas de acuerdo con la siguiente jerarquización:

- ✓ Eliminación del peligro.
- ✓ Sustitución
- ✓ Controles de Ingeniería

- ✓ Controles administrativos
- ✓ Equipos y Elemento de protección personal

Anexo 3: Matriz IPEVR

5.4 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Se suministran los equipos y elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, se desarrollan las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores, para que estos conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos y para que el mantenimiento o reemplazo de estos se haga de forma tal, que se asegure su buen funcionamiento y recambio según vida útil para la protección de los trabajadores.

5.5 ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO LABORAL

Durante el periodo que comprende este informe, se presentan, CERO (0) accidentes laborales y cero (0) incidentes.

IFAT = (N° TOTAL DE A.T EN EL AÑO / N° HHT AÑO) *K

Anexo 4: Estadística ausentismo y accidentalidad.

5.6 CERTIFICADO DE SINIESTRALIDAD EMITIDO POR LA ARL

Durante el periodo que comprende este informe, se presenta CERO (0) accidentes laborales y cero (0) incidentes laborales.

5.7 ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO

Durante este periodo no se realizan actividades de alto riesgo.

5.8 PROGRAMA DE CAPACITACION Y CHARLAS

CHARLAS DE SEGURIDAD

Se realizan charlas de seguridad antes del inicio de las actividades, con el fin de prevenir accidentes y enfermedades profesionales, además de recalcar la identificación de posibles riesgos en el lugar de trabajo y la aplicación de medidas adecuadas de prevención y control.

Anexo 5: Registro asistencia charlas

6. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.1 INSPECCIONES SST

Durante el periodo que comprende el presente informe, se realiza inspección de la herramienta menor y equipos que utilizan en los avances de obra

INSPECCION DE HERRAMIENTA MENOR

Se realiza inspección a las herramientas no se evidenciaron daños, cables con peladuras que presenten una condición de riesgo para la integridad física de los colaboradores.

Anexo 6: Registro inspección de herramientas

6.2 REGISTRO FOTOGRAFICO

Mediante registro fotográfico, se puede evidenciar la realización de las actividades descritas en el presente informe.

Anexo 7: Registro fotográfico

7. ANEXOS

Anexo 1: Listado de personal asignado al proyecto.

Anexo 2: Planillas de Seguridad Social

Anexo 3: Matriz IPEVR

Anexo 4: Estadística ausentismo y accidentalidad.

Anexo 5: Registro asistencia charlas

Anexo 6: Registro inspección de herramientas

Anexo 7: Registro fotográfico

CONSORCIO OBRAS GRL

PERSONAL PROYECTO PUERTO LOPEZ - META
CONSORCIO OBRAS GRL
ABRIL

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF
PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO							
1	ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ	86,039,315	DIRECTOR DE OBRA	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	N/A
2	LUIS FERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA	1,006,718,337	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	COFREM
3	ROSEMARY HURTADO MEJIA	1,121,834,191	RESIDENTE HSEQ	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	N/A
PERSONAL OPERATIVO							
1	RUBIEL DE JESUS OSORIO ARBOLEDA	6,465,399	MAESTRO DE OBRA	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	N/A
2	PRIETO SALAMANCA MIGUEL ANGEL	86,086,169	ORNAMENTADOR	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COFREM
3	FABIO JAIME GARZON	86,063,434	MAESTRO DE OBRA	CAJACOPI	PORVENIR	SURA	N/A

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86039315		LOPEZ HERNANDEZ ROSEMBERTH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 3 # 34B 11 URB LAS ACACIAS	VILLAVICENCIO-META	6788372	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	285555802	9504385557	I	2026/05/07	2026/05/06	BANCOLOMBIA	0	$621,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$0	$0	$121,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$121,900	$0	$0	$121,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$621,000	$0	$0	$621,000
