
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM 424 de 2023

INFORME DE INTERVENTORIA No.5

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato:

Objeto Contrato: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN EL CENTRO POBLADO POTOSI DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA

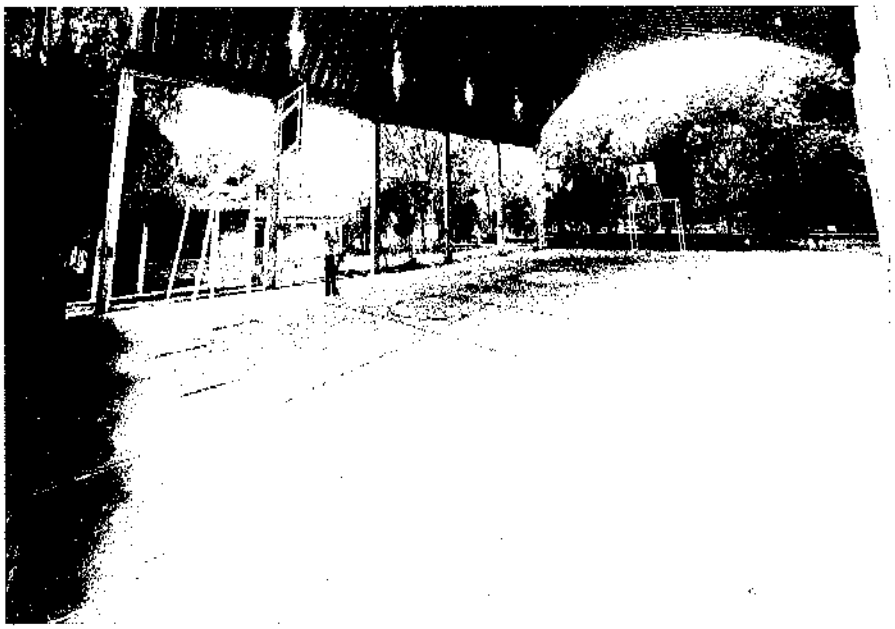

MUNICIPIO: NEIVA

DEPARTAMENTO: HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM 424 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

APOYO A LA SUPERVISIÓN	ARQ. FELIPE ANDRÉS SALAS SANABRIA	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CIHCM424 DE 2023		
OBJETO	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL ' DEPORTIVO LOCALIZADO EN EL CENTRO POBLADO POTOSÍ DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.	**PERIODO DEL INFORME**	ENTRE 01 DE DICIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024
CONTRATISTA	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.	**NIT:**	891.101.100-5
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. JAVIER BARRERO MOSSOS	**C.C:**	7.685.694

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	07 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE INICIO (D/M/A):	23 DE NOVIEMBRE DEL 2023
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
FECHA DE SUSPENSION	28 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE REINICIO No.01	5 DE JUNIO DEL 2024
OTROSI No. 1 06/06/2024	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 -PLAZO DEL CONTRATO – VIGENCIA FISCAL
OTRO SI No 2: 25/07/2024	CUARENTA Y CINCO (48) DIAS CALENDARIO
OTRO SI No 3 12/09/2024	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
ACTADE SUSPENSION N.2	25 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE REINICIO N. 02	8 DE NOVIEMBRE DEL 2024
OTROSI No.4 08/11/2024	PRÓRROGA DE UN (01) MES

PLAZO TOTAL:	SEIS (6) MESES Y TRES DIAS
VALOR INICIAL:	**$ 88.354.948.00**
VALOR ADICIONAL (OTROSI No.5):	$ 9.414.222.47
VALOR TOTAL:	**$ 97.769.170,47**


2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

APOYO A LA SUPERVISIÓN	FELIPE ANDRES SALAS		
INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CLPIH417 DE 2023		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO DEL INFORME	Entre el 08 de noviembre al 30 de noviembre de 2024.

CONTRATISTA	DANES INGENIEROS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	01/11/2023
FECHA DE INICIO (D/M/A):	23/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	28/12/2023
FECHA DE REINICIO N°1:	05/06/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:	25/07/2024
FECHA DE REINICIO N°2:OTROSI No. 2	08/11/2024
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	UN (01) MES
PLAZO TOTAL:	CUATRO (04) MESES
VALOR INICIAL:	$ 453.762.700
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	$40.743.728
VALOR TOTAL:	$ 494.506.428

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO CANAIMA DE LA COMUNA No. 6 DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

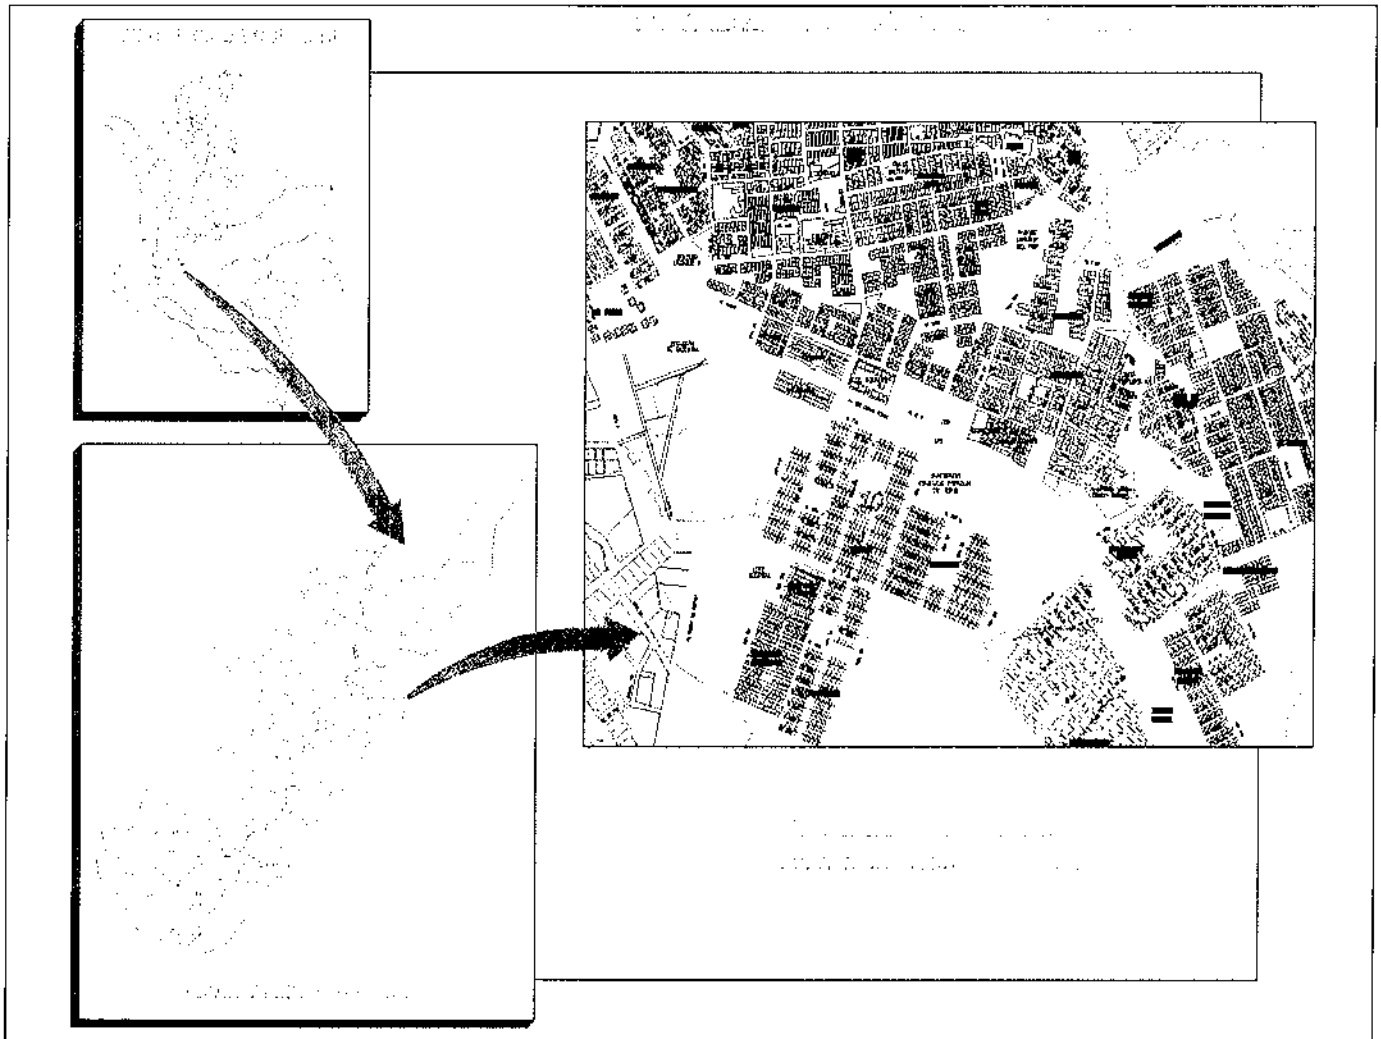

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La construcción corresponde a una cubierta autoportante, que es un sistema de cubierta que no requiere estructura intermedia de soporte, evitando así la construcción de Cerchas y Correas necesarias en otros tipos de sistemas.

La estructura del proyecto será un sistema a porticado de concreto, estará soportada con columnas en concreto reforzado para la estabilización del terreno, elementos zapatas tipo mat fundation, pedestales, vigas de cimentación y viga canal.

Todas las obras deberán atender lo establecido en la NORMA SISMORESISTENTE de 2010 - NSR-10. La cubierta será en teja auto portante metálica cal. 22, con todos sus componentes. Además, el proyecto contará con redes eléctricas para su iluminación cumpliendo la normativa, también tendrá las salidas de aguas lluvias

(bajantes aguas lluvias, cunetas) que garanticen el continuo y normal funcionamiento de la totalidad del escenario sin que se vea afectado por el horario o condiciones climáticas del sector para la práctica deportiva del municipio de Villavieja del departamento del Huila.5

Es preciso aclarar que en la construcción para la cubierta también se contemplan actividades para el mejoramiento del polideportivo, actividades tales como la reconstrucción de la placa de concreto del polideportivo, que corresponde a placa en concreto de resistencia 3000 PSI con 0,10 mts. de espesor; la instalación de la cancha multifuncional, que corresponde a la instalación de marco, tablero y demarcación en pintura; entre otras actividades.

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

- ACTIVIDADES PRELIMINARES
- CIMENTACIÓN
- ESTRUCTURA EN CONCRETO
- CUBIERTA
- ACABADOS – PLACA DE CONCRETO
- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- TRANSPORTE

5. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

De acuerdo con el seguimiento de obra esta interventoría relaciona las actividades ejecutadas en la: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL Huila.

ACABADOS – PLACAS EN CONCRETO

-Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.
-Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura.
-Rejillas prefabricadas para cunetas.

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	23/11/2023			
Suspensión No. 1	28/12/2023	35		
Reiniciación No. 1	05/06/2024		160	
Suspensión No. 2	25/07/2024	50		
Reiniciación No. 1	08/11/2024		106	

TERMINACIÓN Cto.	12/12/2024			12/12/2024
TOTAL DIAS		120	266	

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)


Tipo de Acta	No.	Fecha
Inicio		23/11/2023
Justificación de Suspensión	1	28/12/2023
Suspensión	1	28/12/2023
Justificación para el Reinicio	2	05/06/2024
Reinicio	1	05/06/2024
Justificación para modificación cláusula 4 -plazo del contrato – vigencia fiscal	1	06/06/2024
Justificación de Suspensión	3	25/07/2024
Suspensión	2	25/07/2024
Justificación de Reinicio	4	08/11/2024
Reinicio	2	08/11/2024
Justificación adicional en tiempo	5	08/11/2024
Justificación adicional en valor	6	18/11/2024
Acta de Recibo parcial de obra	1	21/11/2024
Acta de terminación	1	12/12/2024
Acta de recibo final	1	12/12/2024

8. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO
(Cumplimiento Obligaciones del contrato).

a). **Obligaciones de Carácter General.**	• Verifica obligaciones contractuales del contratista de obra. • Se verifica y se cuantifica los ítem contractuales e ítem no previstos que están resultando debido al trabajo de replanteo y verificación de las cantidades contractuales en obra; de acuerdo con los nuevos planos y rediseño estructural del contrato. **ACABADOS – PLACAS EN CONCRETO**

	-Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto. -Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura. -Rejillas prefabricadas para cunetas.
b). **Actividades Administrativas.**	Interventoría Sociedad Técnica Ltda. - Se revisa pagos de seguridad social del personal en obra. - Se firma reinicio No 2 el día 8 de noviembre del 2024 y se mediante otrosi No 2 se adiciona en dinero lo avalado en balance de mayores y menores cantidades - Se da 1 mes de prorroga al contrato
c). **Actividades Operativas.**	De acuerdo con el seguimiento de obra esta interventoría relaciona las actividades ejecutadas en la: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA - <u>ACABADOS – PLACAS EN CONCRETO</u> -Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto. -Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura. -Rejillas prefabricadas para cunetas.
d). **Actividades Logisticos.**	- Se revisa que los trabajos sean realizados con todas las normas que exigen la seguridad y salud en el trabajo. - Se revisa y firma bitácora de obra - Se hizo medición de cantidades de los ítems realizados e ítem no previsto o ítem nuevos
e). **Obligaciones de Carácter Ambiental.**	La interventoria sociedad técnica Ltda. Solicito Limpieza y recolección de escombros
f). **Actividades Financieras.**	Según otro si No. 2 se autoriza al contrato de obra y a la interventoria prorroga de un mes y un adicional al contrato de acuerdo al balance de obra de mayores y menores cantidades e item nuevos y no previstos.
g). **Actividades Jurídicos**	- Se firma acta de terminación el 12 de diciembre del 2024.
9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO	

Durante el mes de diciembre se presentaron lluvias sin embargo estas no afectaron el desarrollo de las actividades programadas para el periodo de ejecución del presente informe, esto debido a que ya se tenía instalada la cubierta.

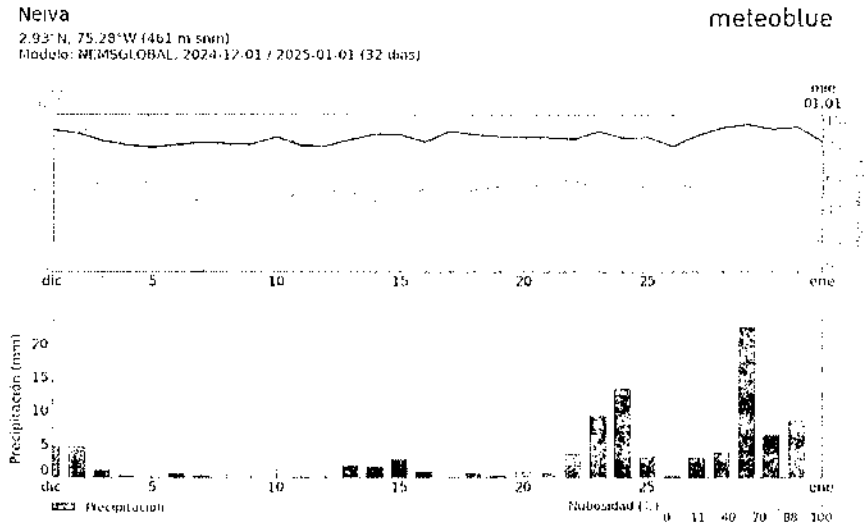

DICIEMBRE 2024

10. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	***3000 PSI***	1:2:3
Diseños de mezcla para base.	*N.A.*	N.A.
Compresión simple al concreto.	3.000 PSI	
Ensayo de compactación de campo	*N.A.*	

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio realizados por la INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			
VIGAS DE CIMENTACION EJE 2	06/06/2024	13/6/2024	X				17.7MPA 2560 PSI	
		20/6/2024						
		04/07/2024			X	3000 PSI	24.3 MPA 3492 PSI	CUMPLE
VIGA DE CIMENTACIÓN EJE 1	08/06/2024	15/6/2024	X				12.4 MPA 1772 PSI	
		22/6/2024						
		06/07/2024			X	3000 PSI	21.4 MPA 3078 PSI	CUMPLE
COLUMNAS EJE 1	21/06/2024	28/06/2024	X				12.6 MPA 1832PSI	
		05/07/2024						
		19/07/2024		X		3000 PSI	25 MPA 3630 PSI	CUMPLE
COLUMNAS EJE 2	25/06/2024	02/07/2024	X				13.9 MPA 2021 PSI	
		09/07/2024						

		23/07/2024			X	3000 PSI	22.1 MPA 3185 PSI	CUMPLE
VIGA CANAL EJE 1 Y 2	05/072024	12/07/2024	X			3000 PSI	24.1 MPA 3455 PSI	CUMPLE

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio realizados por el CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			
ZAPATAS EJE 2 VIGA DE CIMENTACIÓN EJE 2	06/06/2024	13/6/2024	X				17.6 MPA 2552.6 PSI	
		20/6/2024		X			18.4 MPA 2668.7 PSI	
		04/07/2024			X	3000 PSI	24.0 MPA 3480.91 PSI	CUMPLE
ZAPATAS EJE 2 VIGA DE CIMENTACIÓN EJE 2	07/06/2024	14/6/2024	X				15.4 MPA 2233.6 PSI	
		21/6/2024		X			16.6 MPA	

							2407.6 PSI	
		05/07/2024			X	3000 PSI	23.1 MPA 3350.37 PSI	CUMPLE
ZAPATAS EJE 1 VIGA DE CIMENTACIÓN EJE 1	08/06/2024	15/6/2024	X				12.2 MPA 1769.5 PSI	
		22/6/2024		X			14.0 MPA 2030.5 PSI	
		06/07/2024			X	3000 PSI	21.1 MPA 3060.30 PSI	CUMPLE
COLUMNAS EJE 1	21/06/2024	28/06/2024	X				12.5 MPA 1813 PSI	
		05/07/2024		X			14.6 MPA 2117.55 PSI	
		19/07/2024		X		3000 PSI	25 MPA 3625.94 PSI	CUMPLE
COLUMNAS EJE 2	25/06/2024	02/07/2024	X				13.8 MPA 2001.52 PSI	
		09/07/2024		X			18.6 MPA 2697.70 PSI	
		23/07/2024			X	3000 PSI	21.9 MPA 3176.32 PSI	CUMPLE
VIGA CANAL EJE 1 Y 2	05/072024 06/07/2024 12/07/2024	12/07/2024	X			3000 PSI	23.9 MPA 3466.40 PSI	CUMPLE
		13/07/2024	X			3000 PSI	21.8 MPA 3161.82 PSI	CUMPLE

			19/07/2024	X			3000 PSI	22.3 MPA 3234.34 PSI	CUMPLE

11. CONTROL DE ANTICIPO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Contrato	01/11/2023	$453.762.700		
Valor Anticipo (25%)	09/07/2024	$113.440.675		$113.440.675
Valor Adicional 1	18/11/2024	$40.743.728		
Acta Parcial No. 1	21/11/2024	$445.055.787	$113.440.675	$ 331.615.112
Acta de recibo final	12/12/2024	$49.450.641	$0.00	$49.450.641
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 453.762.700	$40.743.728	$ 494.506.428	$ 494.506.428	$0.00

12. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
12/12/2024	INDERHUILA	Firma de terminación del contrato de obra No. CLPIH417 DE 2023

13. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No.0))	07/11/2023	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso (No.0))	07/11/2023	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No.1))	10/01/2024	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso (No.1))	10/01/2024	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No.2))	12/01/2024	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso (No.2))	12/01/2024	S. N	FISICO Y DIGITAL

Pólizas de cumplimiento (Endoso (No.3))	12/01/2024	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso (No.3))	12/01/2024	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No.4))	24/06/2024	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso (No.4))	24/06/2024	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No.5))	4/10/2024	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso (No.5))	4/10/2024	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso (No.6))	4/10/2024	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No.7))	15/12/2024	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso (No.7))	16/12/2024	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No.7))	16/12/2024	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso (No.8))	16/12/2024	S. N	FISICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No.9))	28/02/2025	S. N	FISICO Y DIGITAL
Actas de socialización e inicio de obra	28/12/2023	----------	DIGITAL
Actas de conformación de veeduría ciudadana	28/12/2023	----------	DIGITAL
Acta de vecindad	28/12/2023	----------	DIGITAL
Registro fotográfico de valla			
Registro fotográfico (Dotación, PAPSO, PGIO) (Periodo del (((23/11/2023) al (12/12/2024).	**28/12/2023 30/06/2024 25/07/2024 30/11/2024 12/12/2024**	**N/A**	**Físico y Digital**
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP (23/11/2023) al (12/12/2024).	**28/12/2023 30/06/2024 25/07/2024 30/11/2024 12/12/2024**	**N/A**	**Físico y Digital**
Copias de Bitácora de Obra (periodo del ((23/11/2023) al (12/12/2024).	**28/12/2023 30/06/2024 25/07/2024 30/11/2024 12/12/2024**	**N/A**	**Físico y Digital**
Informe HSEQ (periodo ((23/11/2023) al (12/12/2024).	**28/12/2023 30/06/2024 25/07/2024**	**N/A**	**Físico y Digital**

	30/11/2024 12/12/2024		
Rregistros de ensayos de laboratorio (periodo del ((23/11/2023) al (12/12/2024).	28/12/2023 30/06/2024 30/06/2024 25/07/2024 30/11/2024 12/12/2024	N/A	Físico y Digital

14. RELACION DE PERSONAL (Profesional Interventoría)

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
JAVIER BARRERO MOSSOS	7.685.694	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	TERMINO FIJO
JAVIER ANTONIO NOREÑA	7.721.877	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	TERMINO FIJO
JAVIER BARRERO MOSSOS	7.685.694	REPRESENTANTE LEGAL	TERMINO FIJO

15. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
Anticipo	2024000966	23 agosto de 2024

16. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO
JAVIER BARRERO MOSSOS	$960.000	$240.000	$417.600	$240.000	$	28404079	12/12/2023
	$960.000	$240.000	$417.600	$360.000	$	28766644	19/01/2024
	$ 960.000	$ 240.000	$ 417.600	$240.000	$	30559993	31/07/2024
	$ 960.000	$ 240.000	$ 417.600	$240.000	$	30629336	10/08/2024
	$ 960.000	$ 240.000	$ 417.600	$240.000	$	30819847	10/09/2024
	$ 1.290.000	$480.000	$ 835.200	$480.000	$	31130437	10/10/2024
	$ 1.920.000	$ 480.000	$ 835.200	$ 480.000	$	31413023	05/11/2024
	$ 2.352.000	$ 1.837.500	$ 1.023.200	$ 588.000	$	32195097	25/01/2025
PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO
JAVIER ANTONIO NOREÑA	$ 352.000	$ 88.000	$ 11.500	$ 88.000	$	28404527	12/12/2023
	$ 352.000	$ 88.000	$ 11.500	$ 88.000	$	28818588	19/01/2024

	$ 361.600	$ 90.400	$ 11.800	$ 90.400	$	30202546	31/06/2024
	$ 361.600	$ 90.400	$ 11.800	$ 90.400	$	30559926	31/07/2024
	$ 361.600	**$ 90.400**	**$ 11.800**	**$ 90.400**	$	**31405990**	**11/11/2024**
PERSONAL	**PENSIÓN**	**SALUD**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
JAVIER BARRERO MOSSOS	$960.000	$240.000	$417.600	$240.000	$	28404079	12/12/2023
	$960.000	$240.000	$417.600	$360.000	$	28766644	19/01/2024
	$ 960.000	$ 240.000	$ 417.600	$240.000	$	30559993	31/07/2024
	$ 960.000	$ 240.000	$ 417.600	$240.000	$	30629336	10//08/2024
	$ 960.000	$ 240.000	$ 417.600	$240.000	$	30819847	10/09/2024
	$ 1.290.000	$480.000	$ 835.200	$480.000	$	31130437	10/10/2024
	$ 1.920.000	$ 480.000	$ 835.200	$ 480.000	$	**31413023**	**05/11/2024**
	$ 2.352.000	$ 1.837.500	$ 1.023.200	$ 588.000	$	32195097	25/01/2025

17. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

Póliza legalización del CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-1011051840	0	16/11/2023	Cumplimiento del contrato	15/11/2023	15/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15/11/2023	15/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	15/02/2024	15/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101018885	0	16/11/2023	15/11//2023	15/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-1011051840	1	01/01//2024	Cumplimiento del contrato	15/11/2023	15/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15/11/2023	15/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	15/02/2024	15/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

			FECHA	VIGENCIA

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101018885	1	01/01/2024	15/11//2023	15/02/2024

Póliza actualizada

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-1011051840	2	01/01//2024	Cumplimiento del contrato	23/11/2023	23/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	23/11/2023	23/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	23/02/2024	23/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101018885	2	01/01/2024	23/11/2023	23/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-1011051840	3	01/01/2024	Cumplimiento del contrato	23/11/2023	23/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	23/11/2023	23/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	23/02/2024	23/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101018885	3	01/01/2024	23/11/2023	23/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE REINICIO No. 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-1011051840	4	24/06/2024	Cumplimiento del contrato	23/11/2023	30/01/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	23/11/2023	02/08/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	23/02/2024	23/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101018885	4	24/06/2024	23/11/2023	01/08/2024

Póliza actualizada modificatorio 5

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-1011051840	5	01/10//2024	Cumplimiento del contrato	23/11/2023	03/05/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	23/11/2023	03/11/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	23/02/2024	23/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101018842	5	01/101/2024	23//11/2023	01/08/2024

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101018842	6	01/10/2024	23//11/2023	02/11/2024

Póliza actualizada suspensión y reinicio No2

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-1011051840	6	12/12/2024	Cumplimiento del contrato	23/11/2023	17/05/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	23/11/2023	17/11/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	23/02/2024	23/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101018842	7	13/12/2024	23//11/2023	01/08/2024

Póliza actualizada modificatorio

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-1011051840	7	13/12/2024	Cumplimiento del contrato	23/11/2023	17/05/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	23/11/2023	17/11/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	23/02/2024	23/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL otrosi NO.4

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101018842	8	13/12/2024	23//11/2023	16/12/2024

Póliza actualizada según fecha de terminación del contrato de obra


POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-1011051840	9	28/02/2025	Cumplimiento del contrato	23/11/2023	17/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	23/11/2023	17/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	23/02/2024	16/12/2029

18. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

ACABADOS – PLACA EN CONCRETO

- Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.

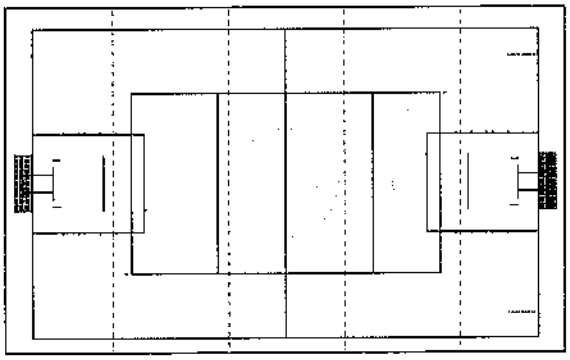



19. REGISTRO FOTOGRÁFICO







-Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura

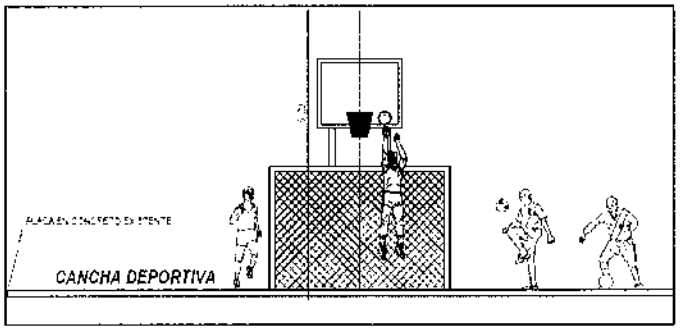

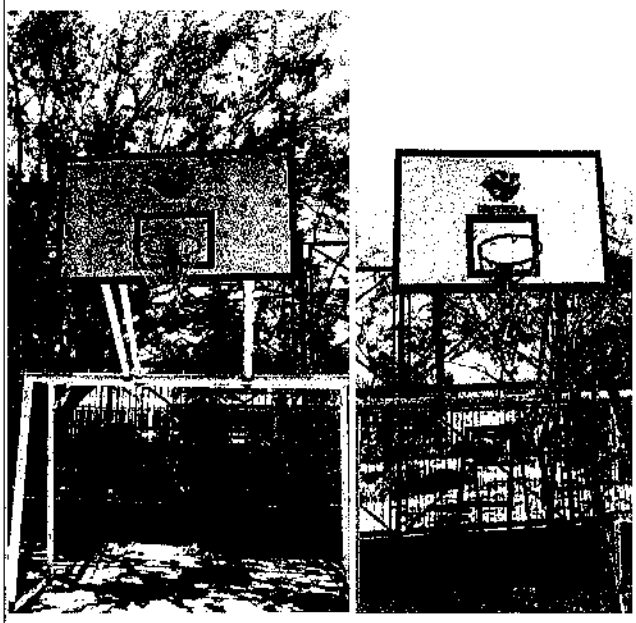

-Rejillas prefabricadas para cunetas.

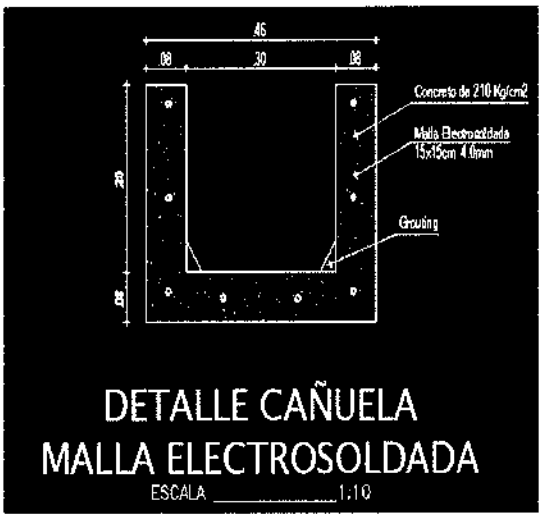

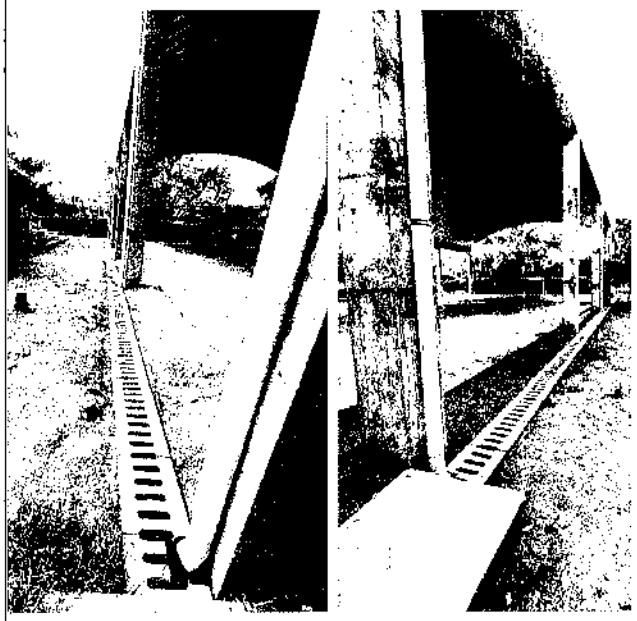

SEGUIMIENTO AVANCE EJECUCIÓN INFORME MENSUAL NO. 05

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	EJECUCIÓN DE OBRA PRESENTE INFORME CANT.	EJECUCIÓN DE OBRA PRESENTE INFORME VR/TOTAL	EJECUCIÓN DE OBRA PRESENTE INFORME % EJECUCIÓN	EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA CANT.	EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA VR/TOTAL	EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA % EJECUCIÓN
1											
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1.1.1	Localización y replanteo.	M2	754.46	$ 3,538.00	$ 2,669,279.00		$ 0.00	0.0%	754.46	$ 2,669,279.00	100.0%
1.1.2	Corte de placa de concreto e= 0.10 mts.	ML	62.60	$ 10,705.00	$ 670,133.00		$ 0.00	0.0%	62.60	$ 670,133.00	100.0%
1.1.3	Demolición de placa de concreto e= 0.10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	48.64	$ 26,131.00	$ 1,271,012.00		$ 0.00	0.0%	48.64	$ 1,271,012.00	100.0%
1.1.4	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	ML	0.00	$ 20,742.00	$ 0.00		$ 0.00	0.0%	0.00	$ 0.00	
1.1.5	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2.00	$ 116,063.00	$ 232,126.00		$ 0.00	0.0%	2.00	$ 232,126.00	100.0%
1.1.6	Excavación manual sin clasificar. Incluye. todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	270.03	$ 45,743.00	$ 12,351,982.00		$ 0.00	0.0%	270.03	$ 12,351,982.00	100.0%
1.1.7	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	221.02	$ 83,375.00	$ 18,427,543.00		$ 0.00	0.0%	221.02	$ 18,427,543.00	100.0%
Subtotal					**$ 35,622,075.00**		**$ 0.00**			**$ 35,622,075.00**	
2											
2.1	CIMENTACIÓN										
2.1.1	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	77.75	$ 33,820.00	$ 2,629,505.00		$ 0.00	0.0%	77.75	$ 2,629,505.00	100.0%

2.1.2	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	32.58	$ 615,560.00	$ 20,054,945.00		$ 0.00	0.0%	32.58	$ 20,054,945.00	100.0%
2.1.3	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	2210.92	$ 7,076.00	$ 15,644,470.00		$ 0.00	0.0%	2,210.92	$ 15,644,470.00	100.0%
2.1.4	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	7.50	$ 737,842.00	$ 5,533,815.00		$ 0.00	0.0%	7.50	$ 5,533,815.00	100.0%
2.1.5	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	1214.01	$ 7,076.00	$ 8,590,335.00		$ 0.00	0.0%	1,214.01	$ 8,590,335.00	100.0%
Subtotal					**$ 52,453,070.00**		**$ 0.00**			**$ 52,453,070.00**	
3											
3.1	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**										
3.1.1	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI	M3	15.00	$ 915,618.00	$ 13,734,270.00		$ 0.00	0.0%	15.00	$ 13,734,270.00	100.0%
3.1.2	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	4617.62	$ 7,076.00	$ 32,674,279.00		$ 0.00	0.0%	4,617.62	$ 32,674,279.00	100.0%
3.1.3	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	18.00	$ 999,189.00	$ 17,985,402.00		$ 0.00	0.0%	18.00	$ 17,985,402.00	100.0%
3.1.4	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	2032.00	$ 7,076.00	$ 14,378,432.00		$ 0.00	0.0%	2,032.00	$ 14,378,432.00	100.0%
3.1.5	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	57.76	$ 40,119.00	$ 2,317,273.00		$ 0.00	0.0%	57.76	$ 2,317,273.00	100.0%
Subtotal					**$ 81,089,656.00**		**$ 0.00**			**$ 81,089,656.00**	
4											
4.1	**CUBIERTA**										
4.1.1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	704.37	$ 210,361.00	$ 148,171,978.00		$ 0.00	0.0%	704.37	$ 148,171,978.00	100.0%
Subtotal					**$ 148,171,978.00**		**$ 0.00**			**$ 148,171,978.00**	
5											

5.1	**ACABADOS - PLACA EN CONCRETO**										
5.1.1	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	317.78	$ 14,714.00	$ 4,675,815.00	317.78	$ 4,675,815.00	100.0%	317.78	$ 4,675,815.00	100.0%
5.1.2	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto. Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1.05 M . Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	2.00	$ 3,689,773.00	$ 7,379,546.00	2.00	$ 7,379,546.00	100.0%	2.00	$ 7,379,546.00	100.0%
5.1.3	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0.10 cm.	M2	50.08	$ 84,255.00	$ 4,219,490.00		$ 0.00	0.0%	50.08	$ 4,219,490.00	100.0%
5.1.4	Cuenta en concreto de 3000 PSI, según diseño.	ML	60.80	$ 83,378.00	$ 5,069,382.00		$ 0.00	0.0%	60.80	$ 5,069,382.00	100.0%
NP-5.1.5	Rejillas prefabricadas para cunetas.	ML	60.80	$ 159,779.00	$ 9,714,563.00	60.80	$ 9,714,563.00	100.0%	60.80	$ 9,714,563.00	100.0%
Subtotal					**$ 31,058,796.00**		**$ 21,769,924.00**			**$ 31,058,796.00**	
6											
6.1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
6.1.1	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	52.00	$ 79,692.00	$ 4,143,984.00		$ 0.00	0.0%	52.00	$ 4,143,984.00	100.0%
6.1.2	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	21.10	$ 106,485.00	$ 2,246,834.00		$ 0.00	0.0%	21.10	$ 2,246,834.00	100.0%
6.1.3	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	17.30	$ 217,813.00	$ 3,768,165.00		$ 0.00	0.0%	17.30	$ 3,768,165.00	100.0%
6.1.4	Caja de inspeccion en concreto de F'c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms ; con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2.00	$ 348,008.00	$ 696,016.00		$ 0.00	0.0%	2.00	$ 696,016.00	100.0%
Subtotal					**$ 10,854,999.00**		**$ 0.00**			**$ 10,854,999.00**	
7											

7.1	INSTALACIONES ELECTRICAS										
7.1.1	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	UND	4.00	$ 291,692.00	$ 1,166,768.00		$ 0.00	0.0%	4.00	$ 1,166,768.00	100.0%
7.1.2	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3.00	$ 635,287.00	$ 1,905,861.00		$ 0.00	0.0%	3.00	$ 1,905,861.00	100.0%
7.1.3	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	5.18	$ 45,743.00	$ 236,949.00		$ 0.00	0.0%	5.18	$ 236,949.00	100.0%
7.1.4	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha, a=0,40 mts.	ML	32.40	$ 49,062.00	$ 1,589,609.00		$ 0.00	0.0%	32.40	$ 1,589,609.00	100.0%
7.1.5	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2.00	$ 302,780.00	$ 605,560.00		$ 0.00	0.0%	2.00	$ 605,560.00	100.0%
7.1.6	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2.00	$ 280,679.00	$ 561,358.00		$ 0.00	0.0%	2.00	$ 561,358.00	100.0%
7.1.7	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1.00	$ 1,011,073.00	$ 1,011,073.00		$ 0.00	0.0%	1.00	$ 1,011,073.00	100.0%
7.1.8	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1.00	$ 4,674,610.00	$ 4,674,610.00		$ 0.00	0.0%	1.00	$ 4,674,610.00	100.0%
7.1.9	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	18.00	$ 88,034.00	$ 1,584,612.00		$ 0.00	0.0%	18.00	$ 1,584,612.00	100.0%
7.1.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12.00	$ 366,881.00	$ 4,402,572.00		$ 0.00	0.0%	12.00	$ 4,402,572.00	100.0%
7.1.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60.00	$ 57,824.00	$ 3,469,440.00		$ 0.00	0.0%	60.00	$ 3,469,440.00	100.0%
7.1.12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12.00	$ 1,013,024.00	$ 12,156,288.00		$ 0.00	0.0%	12.00	$ 12,156,288.00	100.0%
7.1.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	$ 969,497.00	$ 969,497.00		$ 0.00	0.0%	1.00	$ 969,497.00	100.0%

7.1.14	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	$ 1,029,509.00	$ 1,029,509.00		$ 0.00	0.0%	1.00	$ 1,029,509.00	100.0%
Subtotal					**$ 35,363,706.00**		**$ 0.00**			**$ 35,363,706.00**	
8											
8.1	**TRANSPORTE**										
8.1.1	Transporte de materiales petreos	M3-Km	861.62	$ 1,150.00	$ 990,863.00		$ 0.00	0.0%	861.62	$ 990,863.00	100.0%
Subtotal					**$ 990,863.00**		**$ 0.00**			**$ 990,863.00**	
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 395,605,143.00**		**$ 21,769,924.00**			**$ 395,605,143.00**	
	Administración	20%			$ 79,121,029.00		$ 4,353,985.00			$ 79,121,029.00	
	Imprevistos	1%			$ 3,956,051.00		$ 217,699.00			$ 3,956,051.00	
	Utilidad	4%			$ 15,824,206.00		$ 870,797.00			$ 15,824,206.00	
	VALOR TOTAL				**$ 494,506,428.00**		**$ 27,212,405.00**			**$ 494,506,428.00**	
	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	25%			**$ 113,440,675.00**		**$ 6,803,101.25**				
	% AVANCE DE OBRA							**5.50%**			**100.00%**

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. **NÉSTOR RODRIGO FIERRO L.**
DIRECTOR DE OBRA

ING. **JAVIER BARRERO MOSSOS**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO OBRA

- VALOR TOTAL DEL CONTRATO..... $ 453.762.700
- VALOR DEL ANTICIPO..... $ 113.440.675
- PORCENTAJE DE ANTICIPO..... 25%

AVANCE FISICO REAL

- Avance Físico Mensual..... 5.50%
- Avance Físico Acumulado..... 100%%

AVANCE EN TIEMPO

- Tiempo Total de Obra..... 120 días
- Tiempo Total Transcurrido .....120 días
- Tiempo Total que les queda..... 00 días

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

FECHA DE REINICIO N°2:OTROSI No. 2	08/11/2024
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	UN (01) MES
PLAZO TOTAL:	CUATRO (04) MESES
VALOR INICIAL:	$ 453.762.700
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	$40.743.728
VALOR TOTAL:	$ 494.506.428

20. ANEXOS

- ACTAS DE COMITÉS.
- RESULTADO DE ENSAYOS Y PRUEBA DE LABORATORIO.
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).

ING.JAVIER BARRERO MOSSOS	(12/12/2024)	ARQ. ANDRES FELIPE SALAS
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo. Bo APOYO SUPERVISION**

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación: NI - 891101100
Sucursal 4898
Periodo Pensión 2023-11
Periodo Salud 2023-12
Fecha Pago Planilla 2023-12-12

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	7701877
Nombre	JAVIER ANTURIO NOREÑA ROJAS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de Compensación	Caja de Compensación Familiar de Fute COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	95716637
Referencia de Pago PILA	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-11
Periodo Salud	2023-12
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

NG	Fecha NG	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN	Fecha EV...	IGE	Fecha IGE	Fecha LMA	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA	VAC	Fecha VACRE	Fecha vacRe	AVP	VCT	Fecha VCT Inicial	Fecha VCT Fi...	IRL	Fecha IN... Inicio	Fecha IN... Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.200.000	0.0400000	$ 88.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	BC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.200.000	0.1600000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot.	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.200.000	0.0052200	$ 11.500	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP	MIN DE EDUCACIÓN		
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.200.000	0.0400000	$ 88.000	0	0,0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación: NI - 891101100
Sucursal: 4896
Periodo Pensión: 2023-12
Periodo Salud: 2024-01
Fecha Pago Planilla: 2024-01-19

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	7721377
Nombre	JAVIER ANTONIO NOPEÑA ROJAS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de Compensación	Caja de Compensación Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	28814548
Referencia de Pago/PIN	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-12
Periodo Salud	2024-01
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No Aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vacancia I	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.200.000	0.0400000	$ 88.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.200.000	0.1600000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.200.000	0.0052273	$ 11.500	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot Obligatori	Tarifa	Cot	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.200.000	0.0400000	$ 88.000	0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificacion: NI - 891101100
Sucursal: 4856
Periodo Pensión: 2024-06
Periodo Salud: 2024-07
Fecha Pago Planilla: 2024-07-31

Tipo Identificacion	CC
Numero Identificacion	7721577
Nombre	JAVIER ANTONIO NORIEGA ROJAS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de Compensacion	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Numero Planilla	5068935
Referencia de Pago Pila	
Tipo Planilla	E
Periodo Pension	2024-06
Periodo Salud	2024-07
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No Aplica

NG	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha S.N. inicio	Fecha S.N. Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Numero Autorización	Valor
30	2.299.394	0.0400000	$ 90.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.299.394	0.1600000	$ 361.600	$ 0	$ 0	$ 361.600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.299.394	0.0052200	$ 11.998	1

APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar				Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligat on.	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori.
30	2.299.394	0.0400000	90.400	0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación	NI - 891101100
Sucursal	4896
Periodo Pensión	2024-07
Período Salud	2024-08
Fecha Pago Planilla	2024-08-13

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	7721677
Nombre	JAVIER ANTONIO NIJHEÑA ROJAS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensacion	Caja de Compensación Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Numero Planilla	30626823
Referencia de Pago(PILA)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2024-07
Periodo Salud	2024-08
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Numero Autorización	Valor	Numero Autorización	Valor
30	2.259.394	0.0400000	$ 90.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.259.394	0.1600000	$ 361.600	$ 0	$ 0	$ 361.600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.259.394	0.0052200	$ 11.800	2

APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatoria
30	2.259.394	0.0400000	$ 90.400	0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación	NI - 891101100
Sucursal	4896
Periodo Pensión	2024-08
Periodo Salud	2024-09
Fecha Pago Planilla	2024-09-05

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	7721877
Nombre	JAVIER ANTONIO VIVEROS ROJAS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de Compensación	Caja de Compensación Familiar de Fenalco COMFENALCAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	0699440
Sucursal de Pago(PILA)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2024-08
Periodo Salud	2024-09
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

IBC	Fecha IBC	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Ini SLN	Fecha Fin SLN	IGE	Fecha Ini IGE	Fecha Fin IGE	LMA	Fecha Ini LMA	Fecha Fin LMA	VAC	Fecha Ini VAC	Fecha Fin VAC	AVP	VCT	Fecha Ini VCT	Fecha Fin VCT	IRL	Fecha Ini IRL	Fecha Fin IRL
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.259.394	0.04000000	$ 90.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria			Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante	Total			
30	2.259.394	0.16000000	$ 361.600	$ 0	$ 0	$ 361.600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.259.394	0.00626200	$ 11.550	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF			ESAP			MIN DE EDUCACION	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatoria	IBC	Tarifa	Cot Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot	Tarifa	Cot	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.259.394	0.04000000	$ 90.400	0	0.00000000	$ 0	0.00000000	$ 0	0.00000000	$ 0	0.00000000	$ 0		$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación	NI - 891101100
Sucursal	4806
Periodo Pensión	2024-09
Periodo Salud	2024-10
Fecha Pago Planilla	2024-11-08

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	7701977
Nombre	JAVIER ANTONIO NORIEGA ROJAS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensación Familiar de Fomento COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	31462413
Referencia de Pago Pila	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2024-09
Periodo Salud	2024-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VACT Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																											0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.259.394	0.040000	$ 90.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.259.394	0.160000	$ 361.600	$ 0	$ 0	$ 361.600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de cerro de trabajo
30	2.259.394	0.005220	$ 11.800	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatoria	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.259.394	0.040000	$ 90.400	0	0.000000	$ 0	0.000000	$ 0	0.020000	$ 0	0.000000	$ 0

ASCPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación NI - 891101100
Sucursal 4896
Periodo Pensión 2024-10
Periodo Salud 2024-11
Fecha Pago Planilla 2024-11-08

Tipo identificación	CC
Número identificación	7721677
Nombre	JAVIER ANTONIO TORRES ROJAS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensación Familiar de Fenalco COMFENALCO
ARL	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	31402945
Retención de Pago PILA	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2024-10
Periodo Salud	2024-11
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

IBC	Fecha IBC	F.ET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	RL	Fecha RL Inicio	Fecha RL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.253.394	0.0400000	$ 90.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	ISC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.253.394	0.1600000	$ 360.600	$ 0	$ 0	$ 360.600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.253.394	0.0052200	$ 11.820	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot Obligatori
30	2.253.394	0.0400000	$ 90.400	0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación Ni - 891101100
Sucursal 4896
Periodo Pensión 2024-11
Periodo Salud 2024-12
Fecha Pago Planilla 2024-12-19

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	7721577
Nombre	JAVIER ANTONIO HOREÑA ROJAS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensación Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	31811967
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2024-11
Periodo Salud	2024-12
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vacacion	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.300.000	0.0420000	$ 92.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.300.000	0.1600000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.300.000	0.0696000	$ 160.080	20

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.300.000	0.0400000	$ 92.000	0	0.0200000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SCTA LTDA
Identificación: NI - 891101100
Sucursal: 4896
Periodo Pensión: 2024-12
Periodo Salud: 2025-01
Fecha Pago Planilla: 2025-01-13

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	7731577
Nombre	JAVIER ANTONIO MORENA ROJAS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de Compensación	Caja de Compensación Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	532710129
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2024-12
Periodo Salud	2025-01
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

IGE	Fecha Inicio IGE	Fecha Fin IGE	LMA	Fecha Inicio LMA	Fecha Fin LMA	VAC	Fecha Inicio VAC	Fecha Fin VAC	AVP	VCT	Fecha Inicio VCT	Fecha Fin VCT	IRL	Fecha Inicio IRL	Fecha Fin IRL
													0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	$ 3.800.000	0.1400000	$ 532.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	$ 3.800.000	0.1600000	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	$ 3.800.000	0.0052200	$ 19.836	22

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot. Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	$ 3.800.000	0.0400000	$ 152.000	$ 0	0.0200000	$ 0	0.0300000	$ 0	0.0050000	$ 0	0.0050000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación: NI - 891101100
Sucursal: INTERX
Periodo Pension: 2023-11
Periodo Salud: 2023-12
Fecha Pago Planilla: 2023-12-12

Tipo Identificacion	CC
Numero Identificacion	7685694
Nombre	JAVIER BARRERO MOSSOS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
Caja de Compensacion	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Numero Planilla	26101079
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pension	2023-11
Periodo Salud	2023-12
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Ini SLN	Fecha Fin SLN	IGE	Fecha Ini IGE	Fecha Fin IGE	LMA	Fecha Ini LMA	Fecha Fin LMA	VAC	Fecha Ini VAC	Fecha Fin VAC	AVP	VCT	Fecha Ini VCT	Fecha Fin VCT	IRL	Fecha Ini IRL	Fecha Fin IRL
											X																	0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	$ 600.000	0.0400000	$ 240.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	$ 600.000	0.1600000	$ 960.000	$ 0	$ 0	$ 960.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot Obligatoria	Código de clase de trabajo
30	$ 600.000	0.0696000%	$ 417.600	891101100

APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		VIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot Obligatori	IBC	Tarifa	Cot Obligatorio	Tarifa	Cot Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot Obligatori
30	$ 600.000	0.0400000	$ 240.000	0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0

ASOPAGOS S.A.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación NI - 891101100
Sucursal INTERX
Período Pensión 2023-12
Período Salud 2024-01
Fecha Pago Planilla 2024-01-19

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	7[illegible]84
Nombre	LAVIER BARRERO MOSSOR
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensación Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	287268[illegible]
Referencia de Pago(P.N.)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-12
Periodo Salud	2024-01
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	19/12/23								X																	0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G.		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	6.000.000	0,0400000	$ 240.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	6.000.000	0.1600000	$ 960.000	$ 0	$ 0	$ 960.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	6.000.000	0.0696000	$ 417.600	891101100

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	9.000.000	0.0400000	$ 360.000	0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación: NIT - 891101100
Sucursal: INTERX
Periodo Pensión: 2024-06
Periodo Salud: 2024-07
Fecha Pago Planilla: 2024-07-31

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	79558[illegible]
Nombre	JAVIER BERRERO MOSSOS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	[illegible] COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensación Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	95559895
Referencia de Pago PIN:	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2024-06
Periodo Salud	2024-07
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
											X																	X			

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	$ 6.500.000	0.0100000	$ 240.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	$ 6.500.000	0.1600000	$ 960.000	$ 0	$ 0	$ 960.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	$ 6.500.000	0.0696000	$ 417.600	891101100

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			SENA			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatoria	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	$ 6.500.000	0.0400000	$ 260.000	0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación NI - 891101100
Sucursal INTERX
Periodo Pensión 2024-07
Periodo Salud 2024-08
Fecha Pago Planilla 2024-10-10

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	7685094
Nombre	JAVIER BARRERO MOSSOS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POS TIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	80629038
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2024-07
Periodo Salud	2024-08
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

IGE	Fecha IGE	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vacaciones	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
											X																	0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	$ 6.000.000	0.0400000	$ 240.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	$ 5.500.000	0.1600000	$ 880.000	$ 0	$ 0	$ 880.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	6.000.000	0.0696000	$ 417.600	891101100

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF			SSAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori	
30	$ 6.000.000	0.0400000	$ 240.000	0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación: NI - 891101100
Sucursal: INTERX
Periodo Pension: 2024-09
Periodo Salud: 2024-09
Fecha Pago Planilla: 2024-10-10

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	7[illegible]84
Nombre	JAVIER BARRERO MASSOS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	[illegible] COLFONDOS
Caja de compensación	Caja de Compensación Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	90815817
Referencia de Pago(PRE)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2024-09
Periodo Salud	2024-09
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VACTRE Inicio	Fecha VACTRE Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
											X																				

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	8.000.000	0.0400000	$ 240.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad y	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	8.000.000	0.1600000	$ 960.000	$ 0	$ 0	$ 960.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	8.000.000	0.0696000	$ 117.600	891101100

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			SENA			ICBF		ESAP			ITN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot Obligatorio	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.		Tarifa	Cot. Obligatori
30	8.000.000	0.0400000	$ 240.000	0	0.0200000	$ 0	0.0300000	$ 0	0.0050000	$ 0		0.0050000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación: NI - 891101100
Sucursal: INTERX
Período Pensión: 2024-09
Período Salud: 2024-10
Fecha Pago Planilla: 2024-10-10

Tipo de Identificación	CC
Número Identificación	7535694
Nombre	JAVIER BARRERO VOGEDE
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensación Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	51130437
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Período Pensión	2024-09
Período Salud	2024-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

XD	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VACACIONES	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicial	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
											X																	0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G.		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	12.000.000	0,0400000	$ 480.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	12.000.000	0.1600000	$ 1.920.000	$ 0	$ 0	$ 1.920.000	$ 60.000	$ 60.000	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	12.000.000	0.0696000	$ 835.200	891101100

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	12.000.000	0.0400000	$ 480.000	0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación Nit - 891101100
Sucursal INTERX
Periodo Pensión 2024-10
Periodo Salud 2024-11
Fecha Pago Planilla 2024-12-19

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	7855654
Nombre	JAIRER BARRERO MOSSOS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora General de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensación Familiar de Nariño COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	31797365
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2024-10
Periodo Salud	2024-11
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

N.D.	Fecha IBC	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
											X																	0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.000.000	0.0400000	$ 480.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	12.000.000	0.1600000	$ 1.920.000	$ 0	$ 0	$ 1.920.000	$ 60.000	$ 60.000	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	15.000.000	0.0348000	$ 339.200	891101100

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACION	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatoria	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatoria
30	12.000.000	0.0400000	$ 480.000	0	0.0300000	$ 0	0.0150000	$ 0	0.0050000	$ 0	0.0050000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación NI - 891101100
Sucursal INTERX
Período Pensión 2024-11
Período Salud 2024-12
Fecha Pago Planilla 2024-12-27

Tipo Identificacion	CC
Numero Identificacion	73085894
Nombre	JAVIER BARRERO MOSSOS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensacion	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPAN A DE SEGUROS
Número Planilla	31787543
Referencia de Pago(Pila)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2024-11
Periodo Salud	2024-12
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

INS	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Ini	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Ini	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA Ini	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Ini	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Ini	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Ini	Fecha IRL Fin
											X																	0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	14.700.000	0.1250000	$ 1.837.500	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	14.700.000	0.1600000	$ 2.352.000	$ 0	$ 0	$ 2.352.000	$ 73.500	$ 73.500	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	14.700.000	0.0696000	$ 1.023.200	891101100

APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	14.700.000	0.0400000	$ 588.000	14.700.000	0.0300000	$ 294.000	0.0300000	$ 441.000	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
Identificación: NI - 891101100
Sucursal: INTERX
Periodo Pensión: 2024-12
Periodo Salud: 2025-01
Fecha Pago Planilla: 2025-01-10

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	79[illegible]
Nombre	JAIMER BARRERO MOSSOS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	[illegible]
Caja de compensación	Caja de Compensación Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIE DE SEGUROS
Número Planilla	5216[illegible]7
Referencia de Pago PILA	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2024-12
Periodo Salud	2025-01
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Fin	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
											X																	0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	14.700.000	0.125[illegible]	$ 1.837.500	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	14.700.000	0.160[illegible]	$ 2.352.000	$ 0	$ 0	$ 2.352.000	$ 73.500	$ 73.500	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	14.700.000	0.0696000	$ 1.023.200	891101102

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot Obligatoria	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot Obligatori
30	14.700.000	0.0400000	$ 588.000	14.700.000	0.0200000	$ 294.000	0.0300000	$ 441.000	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA Nº CLPIH4-17 DE 2023

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA: DANES INGENIEROS S.A.S.
NIT: 900.219.918-2

CONTRATANTE: EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA – INDER HUILA

NEIVA - HUILA

NOVIEMBRE 23 DE 2023

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 maestro de obra y 1 Cuadrilla de obras civiles (2 personas)
EQUIPOS: Herramienta menor
TIEMPO: Seco y Soleado.
ACTIVIDADES: Socialización del proyecto de obra a la comunidad, localización del proyecto de obra.

Contratista Obra — Mónicastro Interventora

NOVIEMBRE 24 DE 2023

ERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior.
QUIPOS: Herramienta menor.
IEMPO: Seco y Soleado.
CTIVIDADES: Localización y replanteo del área en el que se va a ejecutar la obra.

Contratista Obra — Mónicastro Interventora

NOVIEMBRE 25 DE 2023

ERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior.
QUIPOS: Herramienta menor.
IEMPO: Seco y soleado.
CTIVIDADES: Continúa la localización y replanteo del área del proyecto de obra.

Contratista Obra — Mónicastro Interventora

NOVIEMBRE 27 DE 2023

ERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior.

Cimentación, Cerramiento del perímetro de la obra con lona de color verde, instalación de valla con información de la obra, transporte de equipos al sitio de la obra.

Maestro Interventoría

Contratista Obra

NOVIEMBRE 28 DE 2023

PERSONAL: 1 residente de obra, 1 maestro de obra y 1 cuadrilla de obras civiles (4 personas).

EQUIPOS: Herramienta menor, pulidora pequeña y grande, taladro, picas y palas.

TIEMPO: Seco y soleado.

ACTIVIDADES: Se inicia el corte de la placa de concreto de las zapatas A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5 y B6; también se inicia la excavación de las zapatas A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5 y B6.

Maestro Interventoría

Contratista Obra

NOVIEMBRE 29 DE 2023

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior.

EQUIPOS: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior.

TIEMPO: Seco y soleado.

ACTIVIDADES: Continúa el corte de la placa de concreto y la excavación en el sitio que deben ir las zapatas A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5 y B6.

Maestro Interventoría

Contratista Obra

NOVIEMBRE 30 DE 2023

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del

EQUIPO: Se cuenta con el mismo equipo del día anterior.
TIEMPO: Seco y soleado.
ACTIVIDADES: Continúa el corte de la placa de concreto y la excavación en el sitio en el que van las zapatas A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Se inicia la excavación en el sitio en el que van las vigas de cimentación A1-A2, A2-A3, A3-A4, A4-A5, A5-A6.

Contratista obra

Monicastro
Interventoria

DICIEMBRE 1 DE 2023

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior.
EQUIPOS: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior.
TIEMPO: Seco y soleado.
ACTIVIDADES: Continúa el corte de la placa de concreto, continúa la excavación de las zapatas y vigas de cimentación, A se inicia el armado del acero de refuerzo de las zapatas y vigas de cimentación.

Contratista obra

Monicastro
Interventoria

DICIEMBRE 2 DE 2023

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior.
EQUIPO: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior.
TIEMPO: Seco y soleado.
ACTIVIDADES: Se termina el corte de la placa de concreto, continúa la excavación manual de las zapatas y vigas de cimentación, continúa el armado del acero de refuerzo de la cimentación.

Monicastro

DICIEMBRE 4 DE 2023

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 maestro de obra y 1 cuadrilla de labras civiles (4 personas)

EQUIPOS: Herramienta menor, Pulidoras, 1 taladro, picas y palas.

ACTIVIDADES: Continúa la excavación manual de las zapatas y vigas de cimentación, continúa el armado del acero de refuerzos de las zapatas y vigas de cimentación

TIEMPO: Soleado y Soleado.

Contratista obra

Mpicastro

Interventoria

DICIEMBRE 5 DE 2023

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior.

EQUIPOS: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior

TIEMPO: Soleado y soleado.

ACTIVIDADES: Continúa la excavación manual de las zapatas y vigas de cimentación, continúa el armado del acero de refuerzo de las zapatas y vigas de cimentación

Contratista obra

Mpicastro

Interventoria

DICIEMBRE 6 DE 2023

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior.

EQUIPOS: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior.

ACTIVIDADES: Continúa la excavación manual y el armado del acero de refuerzo de la cimentación

Contratista obra

Mpicastro

DICIEMBRE 7 DE 2023

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior.
EQUIPOS: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior.
ACTIVIDADES: Continúa la excavación manual y armado del acero de refuerzo de las zapatas y vigas de cimentación.
TIEMPO: Seco y Soleado.

Contratista obra

Mónicastro
Interventoria

DICIEMBRE 8 DE 2023

En este día no hubo actividades por ser día festivo.

Contratista obra

Mónicastro
Interventoria

DICIEMBRE 9 DE 2023

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 maestro de obra y 1 cuadrilla de obras civiles (4 personas)
EQUIPOS: Herramienta menor, 1 taladro, picas y palas.
TIEMPO: Seco y Soleado, con lluvia en la noche anterior.
ACTIVIDADES: Continúa la excavación manual y armado del acero de refuerzo de las zapatas y vigas de cimentación, retiro del agua lluvia de las zanjas-ejes A y B, con bomba de agua.

Contratista obra

Mónicastro
Interventoria

DICIEMBRE 11 DE 2023

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior.
EQUIPO: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior.
TIEMPO: Lluvioso y nublado.
ACTIVIDADES: Continúa la excavación manual y armado del

acero de refuerzo de las zapatas y vigas de cimentación

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: Solicitud de documentación para dar cumplimiento en el pliego de condiciones y contrato por parte de la interventoría.

Contratista Obra

Mónicastro
Interventoría

DICIEMBRE 12 DE 2023

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 maestro de obra, 1 cuadrilla de obras civiles (4 personas).

EQUIPO: Herramienta menor, polidoras, picas y palas.

TIEMPO: Seco y soleado

ACTIVIDADES: Continúa la excavación manual y el armado del acero de refuerzo de las zapatas y vigas de cimentación.

Contratista Obra

Mónicastro
Interventoría

DICIEMBRE 13 DE 2023

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior

EQUIPO: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior

TIEMPO: Lluvioso y nublado.

ACTIVIDADES: Continúa la excavación manual y el armado del acero de refuerzo de las zapatas y vigas de cimentación, Se inicia el Fundido de la Solada de limpieza en las zapatas de cimentación, Se realiza el desmonte de 4 postes de iluminación del polideportivo

Contratista Obra

Mónicastro
Interventoría

DICIEMBRE 14 DE 2023

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo

día anterior.
EQUIPO: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior.
TIEMPO: Lluvioso y nublado.
ACTIVIDADES: Continúa la excavación manual y armado del acero de refuerzo de las zapatas y vigas de cimentación, continúa el fundido del solado de limpieza en las vigas y zapatas de cimentación, retiro de agua lluvia de las zanjas de los ejes A y B con una bomba de agua.

Contratista obra
Maestro
Interventoría

DICIEMBRE 15 DE 2023

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 cuadrilla de obras civiles (4 personas), 1 maestro de obra.
EQUIPO: Herramienta menor, pulidoras, picas y palas.
TIEMPO: Seco y soleado.
ACTIVIDADES: Continúa la excavación manual y armado del acero de refuerzo de las vigas y zapatas de cimentación.

Contratista obra
Maestro
Interventoría

DICIEMBRE 16 DE 2023

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo (eq) personal del día anterior.
EQUIPO: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior.
TIEMPO: Lluvioso y nublado.
ACTIVIDADES: Continúa la excavación manual y armado del acero de refuerzo de las zapatas y vigas de cimentación, Fundido del solado de limpieza de las zapatas de cimentación, retiro de agua lluvia de las zanjas con bomba de agua.

Maestro

DICIEMBRE 18 DE 2023

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 maestro de obra, 1 cuadrilla de obras civiles (4 personas).

EQUIPOS: Herramienta menor, picas, palas y una mezcladora de concreto.

ACTIVIDADES: Continúa la excavación manual y armado del acero de refuerzo de las zapatas y vigas de cimentación, Fundido del solado de limpieza de las zapatas de cimentación.

TIEMPO: Lluvioso y nublado.

Contratista obra

Interventoría

DICIEMBRE 19 DE 2023

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior.

EQUIPOS: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior.

TIEMPO: Seco y Soleada

ACTIVIDADES: Continúa la excavación manual y armado del acero de refuerzo de las zapatas y vigas de cimentación, Se inicia el armado del acero de refuerzo de las columnas A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, Se inicia el Fundido del solado de limpieza en las vigas de cimentación

Contratista obra

Interventoría

DICIEMBRE 20 DE 2023

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior.

EQUIPOS: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior

TIEMPO: Lluvioso y nublado

ACTIVIDADES: Continúa la excavación manual y armado del acero de refuerzo de las zapatas y vigas de cimentación, Continúa el Fundido del Solado de limpieza de las vigas de cimentación, continúa el armado del acero de refuerzo de las columnas, retiro de agua lluvia de las zanjas con una bomba de agua.

Contratista Obra — Mpicastro Interventoría

DICIEMBRE 21 DE 2023

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 maestro de obra, 1 cuadrilla de obras civiles (4 personas).
EQUIPOS: Herramienta menor, picas, palles y Vibradora de concreto.
TIEMPO: Lluvioso y nublado.
ACTIVIDADES: Se terminan las excavaciones manuales de las zapatas y vigas de cimentación, Continúa el armado del acero de refuerzo de las zapatas, vigas de cimentación y las columnas, se funden las vigas de cimentación con el Solado de limpieza.

Contratista Obra — Mpicastro Interventoría

DICIEMBRE 22 DE 2023

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior.
EQUIPOS: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior.
TIEMPO: Seco y Soleado.
ACTIVIDADES: Continúa el armado del acero de refuerzo de las zapatas, vigas de cimentación, columnas, Continúa el Fundido del Solado de limpieza de las vigas de cimentación.

Contratista Obra — Mpicastro Interventoría

DICIEMBRE 23 DE 2023

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 maestro de obra, 1 cuadrilla de obras civiles (4 personas)

EQUIPOS: Herramienta menor, picas, palas y 1 mezcladora de concreto.

TIEMPO: Lluvioso y nublado.

ACTIVIDADES: Continúa el armado del acero del refuerzo de las zapatas y vigas de cimentación, y columnas, continúa el fundido del solado de limpieza en las vigas de cimentación, retiro de agua lluvia de las zanjas con bamba de agua.

Mónicastro

Contratista obra — Interventoría

DICIEMBRE 25 DE (DICIEMBRE) 2023

No hubo actividades por ser día Festivo.

Mónicastro

Contratista obra — Interventoría

DICIEMBRE 26 DE 2023

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 maestro de obra, 1 cuadrilla de obras civiles (4 personas)

EQUIPOS: Herramienta menor, picas, 1 mezcladora de concreto.

TIEMPO: Lluvioso y nublado.

ACTIVIDADES: Se termina el armado del acero de refuerzo de las zapatas y vigas de cimentación, continúa el armado del acero de refuerzo de las columnas, Se realizan 2 viajes de limpieza de material de excavación

Contratista obra — Interventoría — Mónicastro

DICIEMBRE 27 DE 2023

PERSONAL: Se labora en obra con el mismo personal del día anterior.

EQUIPOS: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior.
TIEMPO: Lluvioso y nublado.
ACTIVIDADES: Continúa el armado del acero de refuerzo de las columnas, Se realiza 1 viaje de limpieza del material de excavación.

Contratista obra

Mónicastro
Interventoria

DICIEMBRE 28 DE 2023

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 maestro de obra, 1 cuadrilla de obras civiles (4 personas).
EQUIPOS: Herramienta menor.
TIEMPO: Nublado
ACTIVIDADES: Continúa el armado del acero de refuerzo de las columnas A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5 y B6.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: Se realiza la suspensión de la obra mediante el acta de suspensión No. 1 al contrato de obra CLPIH 417 de 2023, con motivo de las fuertes lluvias presentadas.

Contratista Obra

Mónicastro
Contratista Interventoria

JUNIO 5 DE 2024

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 maestro de obra, 1 cuadrilla de obras civiles (6 personas).
EQUIPOS: Bomba de agua, palas, picas y herramienta menor.
TIEMPO: Seco y soleado.
ACTIVIDADES: Retiro de agua lluvia de las zanjas de las columnas A y B con bomba de agua.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: Se realiza la reinicio de obra mediante el acta de reinicio No. [illegible] de 2024

Mónicastro
Interventora

Contratista obra

JUNIO 6 DE 2024

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 maestro de obras, 1 cuadrilla de obras civiles (6 personas).
EQUIPOS: Herramienta menor, bomba de agua, picas y palas.
TIEMPO: Seco y soleado.
ACTIVIDADES: Continúa el retiro de agua lluvia de las zanjas de los ejes A y B con bomba de agua.

Mónicastro
Interventora

Contratista obra

JUNIO 7 DE 2024

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior.
EQUIPOS: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior.
TIEMPO: Seco y soleado.
ACTIVIDADES: Continúa el retiro de agua lluvia de las zanjas de los ejes A y B con bomba de agua, se inician las actividades de limpieza del material de sedimentación de las zanjas A y B.

Mónicastro
Interventora

Contratista Obra

JUNIO 8 DE 2024

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior.
EQUIPOS: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior.
TIEMPO: Seco y soleado.
ACTIVIDADES: Continúa el retiro del agua lluvia y el material de sedimentación de las zanjas ejes A y B.

Contratista obra

Mónicastro

JUNIO 10 DE 2024

PERSONAL= 1 Residente de obra, 1 maestro de obra, 1 cuadrilla de obras civiles (6 personas)
EQUIPOS= Herramienta menor, picas y palas.
TIEMPO= Lluvioso.
ACTIVIDADES= Continúa el retiro de agua lluvia, y el material de sedimentación de las zanjas de los ejes A y B, se inicia el grateo del acero de refuerzo de las zapatas, vigas de cimentación y las columnas.

Contratista Obra Maestro Interventoría

JUNIO 11 DE 2024

PERSONAL= Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior
EQUIPOS= Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior.
TIEMPO= Lluvioso.
ACTIVIDADES= Continúa el retiro de agua lluvia y el material de sedimentación de las zanjas de los ejes A y B, continúa el grateo del acero de refuerzo de las zapatas, vigas de cimentación y columnas.

Contratista Obra Maestro Interventoría

JUNIO 12 DE 2024

PERSONAL= Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior
EQUIPOS= Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior.
TIEMPO= Lluvioso
ACTIVIDADES= Continúa el retiro de agua lluvia, y el material de sedimentación de las zanjas de los ejes A y B, continúa el grateo del acero de refuerzo de la cimentación y las columnas.

Contratista Obra Maestro Interventoría

JUNIO 13 DE 2024

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 maestro de obra, 1 cuad
de obras civiles (6 personas)
EQUIPOS: Herramienta menor, bomba de agua, picas y p
TIEMPO: Seco y Soleado.
ACTIVIDADES: Continúa el retiro de agua lluvia, y mate
de sedimentación, continúa el grateo del acero
refuerzo de la cimentación y las columnas.

Contratista obra
JUNIO 14 DE 2024

Mónicastro
Interventoría

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día ante
EQUIPOS: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día ante
TIEMPO: Lluvioso.
ACTIVIDADES: Continúa el retiro de agua lluvia y el mater
de sedimentación de las zanjas de los ejes A y B
continúa el grateo del acero de refuerzo de la
cimentación y las columnas.

Contratista obra
JUNIO 15 DEL 2024

Mónicastro
Interventoría

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior.
EQUIPOS: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día ante
TIEMPO: Seco y soleado.
ACTIVIDADES: Continúa el retiro de material de sedimentación de
las zanjas de los ejes A y B, continúa el grate
del acero de refuerzo de la cimentación y las
columnas.

Contratista obra

Mónicastro

JUNIO 17 DE 2024

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 maestro de obra, 1 cuadrilla de obras civiles (6 personas)
EQUIPOS: Herramienta menor, picas, palas y formaleta.
TIEMPO: Seco y soleado.
ACTIVIDADES: Se termina la limpieza y retiro del material de sedimentación de las zanjas de los ejes A y B, continúa el grateo del acero de refuerzo de la cimentación y las columnas, se inicia la instalación de formaletas para la fundición de las zapatas y vigas de cimentación.

Contratista obra — Interventoría Mónicastro

JUNIO 18 DE 2024

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior
EQUIPOS: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior
ACTIVIDADES: Continúa el grateo del acero de refuerzo, continúa la instalación de formaletas para la fundición de zapatas y vigas de cimentación.
TIEMPO: Seco y soleado

Contratista obra — Interventoría Mónicastro

JUNIO 19 DE 2024

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo equipo personal del día anterior.
EQUIPOS: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior.
TIEMPO: Seco y soleado.
ACTIVIDADES: Continúa el grateo del acero de refuerzo, continúa la instalación de formaletas para la fundición de zapatas y vigas de cimentación.

Contratista obra — Interventoría Mónicastro

JUNIO 20 DE 2024

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 maestro de obra, 1 cuadrilla de obras civiles (6 personas).

EQUIPOS: Herramienta menor y formaletas.

TIEMPO: Seco y soleado.

ACTIVIDADES: Finaliza el grateo del acero de refuerzo de la cimentación y columnas, Finaliza la instalación de Formaleta de la cimentación del eje B,

Mmaestro

Contratista obra

Interventoría

JUNIO 21 DE 2024

PERSONAL: Continúa el mismo personal del día anterior.

EQUIPOS: Continúa en obra el mismo equipo del día anterior.

ACTIVIDADES: Se realiza la Fundición de las zapatas y vigas de cimentación del eje B (20.04 m³), Continúa la instalación de Formaleta para la Fundición de la cimentación del eje A.

TIEMPO: Seco y soleado.

Mmaestro

Contratista obra

Interventoría

JUNIO 22 DE 2024

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior.

EQUIPOS: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior

ACTIVIDADES: Continúa la instalación de Formaleta para la Fundición de la cimentación del eje A.

TIEMPO: Seco y soleado.

Mmaestro

Contratista obra

Interventoría

JUNIO 24 DE 2024

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 maestro de obra, 1 cuadrilla de obras civiles (6 personas).
EQUIPOS: Herramienta menor y Formaletas.
TIEMPO: Seco y Soleado.
ACTIVIDADES: Finaliza la instalación de Formaleta para la Fundición de la cimentación del eje A, Se inicia el armado del acero de refuerzo transversal de las columnas.

Contratista Obra — Interventoría Mónicastro

JUNIO 25 DE 2024

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior.
EQUIPOS: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior, Carros con mezcladora de concreto y autobomba
TIEMPO: Seco y Soleado.
ACTIVIDADES: Se realiza la Fundición de las zapatas y vigas de cimentación del eje A (20.04 m³), Finaliza el armado del acero de refuerzo transversal de las Columnas hasta una altura de 2.40m, medidos desde el tope de las zapatas, armado y desformaletas de 6 Columnas del eje B.

Contratista Obra — Interventoría Mónicastro

JUNIO 26 DE 2024

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior.
EQUIPOS: (Finaliza) Herramienta menor, Formaletas y 1 carro con mezcladora de concreto, 1 canguro, andamios
TIEMPO: Seco y Soleado
ACTIVIDADES: Se realiza la Fundición de 6 columnas del eje B, con una altura de 2.40 m, medidos desde el tope de las zapatas (2.59 m³), Se [illegible] el relleno comenzado en el eje B. Se [illegible] de

de Formaletas de las Columnas del eje A, hasta una altura de 2.40m, medidos desde el tope de las Zapatas de cimentación.

Contratista obra

Interventoría Márcastro

27 DE JUNIO DE 2024

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 maestro de obra, 1 cuadrilla de obras civiles (4 personas)

EQUIPOS: Herramienta menor, Formaletas, 1 carro con mezcla de concreto, andamios, 1 canguro, 1 vibrador.

TIEMPO: Seco y Soleado.

ACTIVIDADES: Se realiza la fundición de 6 columnas del eje A hasta una altura de 2.40m medida desde el tope de las Zapatas de cimentación ($2.59m^3$). Continúa el proceso de relleno compactado en el eje B, Se inicia la continuación del armado del acero de refuerzo longitudinal y transversal del eje B.

Contratista Obra

JUNIO 28 DE 2024

Interventoría Márcastro

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior

EQUIPOS: Herramienta menor, andamios y 1 canguro, Volqueta

TIEMPO: Seco y Soleado.

ACTIVIDADES: Continúa el relleno con recebo compactado en los ejes A y B, continúa el armado del acero de refuerzo longitudinal y transversal de las columnas del eje A y B, Se realiza el retiro de material de excavación con volqueta.

Contratista Obra

Márcastro Interventoría

JUNIO 29 DE 2024

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 maestro de obra, 1 cuadrilla de obras civiles (4 personas)
EQUIPOS: Herramienta menor, andamios, 1 cangrejo, volquetas.
TIEMPO: Seco y Soleado
ACTIVIDADES: Continúa el relleno con recebo compactado en los ejes A y B, Continúa el armado del acero de refuerzo de las columnas de los ejes A y B, continúa el retiro de material de excavación con volqueta.

Contratista obra — Mónica Castro Interventoría

JULIO 1 DE 2024

Este día no hubo actividades por ser día Festivo.

Contratista obra — Mónica Castro Interventoría

JULIO 2 DE 2024

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 maestro de obra, 1 cuadrilla de obras civiles (4 personas)
EQUIPOS: Herramienta menor, andamios, 1 cangrejo, volquetas.
TIEMPO: Seco y soleado.
ACTIVIDADES: Continúa el relleno con recebo compactado en los ejes A y B, continúa el armado del acero de refuerzo de las columnas de los ejes A y B, continúa el retiro de material de excavación con volqueta

Contratista obra — Mónica Castro Interventoría

JULIO 3 DE 2024

PERSONAL: Continúa el mismo personal del día anterior.

TIEMPO: Seco y Soleado.
ACTIVIDADES: Continúa el relleno con recebo compactado en los ejes A y B, continúa el armado del acero de refuerzo de las columnas del los ejes A y B, continúa el retiro de material de excavación con volqueta.

Contratista obra
JULIO 4 DE 2024

Mónicastro
Interventoría

PERSONAL: 1 residente de obra, 1 maestro de obra, 1 cuadrilla de obras civiles (4 personas).
EQUIPOS: Herramienta menor, andamios, 1 canguro, volqueta.
TIEMPO: Seco y soleado.
ACTIVIDADES: Continúa el relleno con recebo compactado en los ejes A y B, continúa el armado del acero de refuerzo de las columnas, continúa el material de excavación con volqueta (limpieza).

Contratista obra
JULIO 5 DE 2024

Mónicastro
Interventoría

PERSONAL: Continúa el mismo personal del día anterior.
EQUIPOS: Continúa el mismo equipo del día anterior.
TIEMPO: Seco y Soleado.
ACTIVIDADES: Continúa el relleno con recebo compactado en los ejes A y B, continúa el armado del acero de refuerzo de las columnas, continúa el retiro de material de excavación con volqueta.

Contratista obra
JULIO 16 DE 2024

Mónicastro
Interventoría

EQUIPOS: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior.

TIEMPO: Seco y soleado.

ACTIVIDADES: Continúa el relleno con recebo, compactado en los ejes A y B, continúa el armado del acero de refuerzo de las columnas de los ejes A y B, Continúa el retiro de material de excavación con volqueta

Contratista obra

Mi castro
Interventoría

JULIO 8 DE 2024

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior.

EQUIPOS: Herramienta menor, andamios, 1 canguro, Formaletas, volquetas.

TIEMPO: Seco y soleado.

ACTIVIDADES: Se inicia la instalación de Formaletas para la Fundición de las columnas hasta el nivel de las vigas aéreas, Continúa el relleno con recebo compactado en los ejes A y B, Continúa el armado del acero de refuerzo de las columnas, Finaliza el retiro de material de excavación con volqueta.

Contratista obra

Interventoría
Mi castro

JULIO 9 DE 2024

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior.

EQUIPOS: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior.

TIEMPO: Seco y soleado.

ACTIVIDADES: Continúa la instalación de formaletas para la fundición de columnas, continúa rellenando con

recebo compactado en los ejes A y B, continúa el armado del acero de refuerzo de las columnas.

Mónicastro
Interventora

Contratista obra
JULIO 10 DE 2024

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 maestro de obra, 1 cuadrilla de Obras civiles (4 personas).
EQUIPOS: Herramienta menor, andamios, 1 canguro, Formaletas, Viguetas.
TIEMPO: Seco y soleado.
ACTIVIDADES: Continúa la instalación de Formaletas para la Fundición de Columnas, Continúa el relleno con recebo compactado en los ejes A y B, continúa el armado del acero de refuerzo de las columnas.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: Se radica la solicitud de la revisión del balance de obra con el Acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra a la interventoría.

Mónicastro
Interventora

Contratista obra
JULIO 11 DE 2024

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior.
EQUIPO: Se encuentra en obra con el mismo equipo del día anterior.
TIEMPO: Seco y soleado.
ACTIVIDADES: Continúa la instalación de Formaletas de las Columnas, continúa el relleno con recebo compactado en los ejes A y B, continúa el armado del acero de refuerzo de las columnas.

Contratista obra

Mónicastro
Interventora

JULIO 12 DE 2024

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior.
EQUIPOS: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior.
TIEMPO: Seco y soleado.
ACTIVIDADES: Finaliza la instalación de formaletas de las columnas, Finaliza la instalación y armado del acero de refuerzo de las columnas, Finaliza el relleno con recebo compactado en los ejes A y B.

Contratista obra

Mónica Castro
Interventoría

JULIO 13 DE 2024

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior.
EQUIPOS: Herramienta menor, andamios, formaletas, carros mezcladores de concreto y autobomba.
TIEMPO: Seco y soleado.
ACTIVIDADES: Se realiza la fundición de 12 columnas de los ejes A y B. (10 m^3) con una altura aproximada de 4.4m, medida desde el tope de la fundición anterior.

Contratista obra

Mónica Castro
Interventoría

JULIO 15 DE 2024

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior.
EQUIPOS: Herramienta menor, cerchas, camillas, bomba.
TIEMPO: Seco y soleado.
ACTIVIDADES: Se inicia el armado de las cerchas para fund. las vigas canal y viga de amarre de los ejes A y B (h = 5.8m).

Contratista obra

Mónica Castro
Interventoría

JULIO 16 DE 2024

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 maestro de obra, 1 cuadrilla de obras civiles (4 personas)
EQUIPOS: Herramienta menor, Cerchas, camillas, parales.
TIEMPO: Seco y Soleado
ACTIVIDADES: Continúa el armado de la estructura para la fundición de la viga canal y vigas aéreas de los ejes A y B (Altura = 5.8m).

Contratista obra
Minicastro Interventoría

JULIO 17 DE 2024

PERSONAL: Se cuenta en obra con el mismo personal del día anterior.
EQUIPOS: Se cuenta en obra con el mismo equipo del día anterior
TIEMPO: Seco y Soleado
ACTIVIDADES: Continúa el armado de la estructura para la fundición de la viga canal y vigas aéreas de los ejes A y B (Altura = 5.8m), Se inicia el armado del acero de refuerzo de la viga aérea del eje B.

Contratista obra
Minicastro Interventoría

Julio 18 DE 2024.
Personal: Maestro obra, oficial, cuadrilla obreros.
Clima: Soleado.
Actividad: Se realiza la armada del encofrado para las dos viga canales de la cubierta, se verifica con la interventoría el correcto armado del acero de refuerzo y la formaleta instalada, se autoriza la fundición.

Contratista Obra
Minicastro Interventoría

Viernes, 19 de Julio 2024.

Clima: Soleado
Personal: Maestro, oficial, cuadrilla obreros.

Actividades: Se realiza la fundición de las viga canales de los dos ejes de la cubierta, utilizando concreto premezclado acelerado a 3 días, con la finalidad de poder realizar a tiempo la instalación de los anclajes de cubierta.

Contratista Obra

Mónicastro
Interventoria.

Sabado, 20 de Julio 2024

Clima. Soleado.
Personal: Maestro, oficial, cuadrilla obreros.

Actividades: Se realiza el retiro de la formaleta de los costados de la viga canal fundida el día anterior, dejando solamente la formaleta inferior y la estructura de soporte apuntalando la viga canal.

Contratista Obra

Mónicastro
Interventoria.

Domingo 21 de Julio 2024

No se trabajó. Dia no laboral.

Contratista Obra

Mpincastro
Interventoria.

Lunes, 22 de Julio 2024

Clima: Soleado
Personal: Maestro, oficial, cuadrilla obreros.

Actividades: Se realiza la instalación de formaleta y malla, electrosoldada para los cunetas de los laterales de las canchas previa excavación manual de las mismas, la interventoria verifica la sección de arena, pendiente y encofrado, autorizando la fundición.
Se instala la varilla de tubería para bajantes de cubierta.
Se realiza instalación de marco metálico para viga canal en caliente.

Contratista Obra

Mpincastro
Interventoria

Martes, 23 de Julio 2024.

Clima: Soleado
Personal: Maestro, oficial, cuadrilla obreros.

Actividades: Se realiza el suministro de la lamina de teja autoportante, el subcontratista de dicha actividad realiza el anclaje de pernos de soporte de la cubierta, adicionalmente realiza el doblado de la lamina, quedando lista para su instalación.

Se realiza la fundición de las dos anclas en concreto para los laterales de la cancha, junto con la fundición de las cajillas recolectoras de aguas lluvias.

Contratista Obra — Interventoría. — Maestro

Miercoles, 24 de Julio 2024.

Clima: Soleado
Personal: Maestro obra, oficial, cuadrilla obreros.

Actividades: Se realiza la instalación de la cubierta autoportante garantizando el correcto anclaje de la misma, se verifica la correcta instalación y se hace pruebas de goteras, dando se evidencia que no presenta filtraciones de agua.

Contratista/Obra — Interventoría — Maestro

Jueves, 25 de Julio 2024.

Se suscribe el acta de suspensión No. 02.

Contratista obra

Mónica Castro
Interventoría

Viernes, 08 de Noviembre 2024.

Clima: Soleado
Personal: Maestro, cuadrilla eléctrica.

Actividades: Se suscribe acta de reinicio No. 02
el día 08/11/24.
El contratista inicia labores de suministro de
materiales para el apartado eléctrico y de luminaria
del proyecto.
Se realiza limpieza general de la obra y retiro
de material sobrante y tierra en canaletas y cajillas

Contratista obra

Mónica Castro
Interventoría

Sábado, 09 de Noviembre 2024.
Clima: Soleado
Personal: Cuadrilla eléctrica
Actividades: Se inician labores de excavación manual
para redes e instalaciones eléctricas.

Contratista obra

Mónica Castro
Interventoría

Domingo, 10 de Noviembre 2024.

No se trabajó. Día no laboral.

Contratista Obra

Mónicastro
Interventoría

Lunes, 11 de Noviembre 2024.

Clima: Soleado
Personal: Cuadrilla eléctricos.

Actividades: Se realiza la canalización de ductos para baja tensión, incluyendo el relleno y compactación de la brecha.
Se continua realizando suministro de materiales eléctricos y de telecomunicación.

Contratista Obra

Mónicastro
Interventoría

Martes, 12 de Noviembre 2024.
Clima: Soleado
Personal: Cuadrilla eléctrica.
Actividades: Se realiza la excavación manual para cajillas de inspección eléctricas y se realiza encofrado de cajillas eléctricas.

Contratista Obra

Mónicastro
Interventoría

Miercoles, 13 de Noviembre 2024.

Clima: Nuboso
Personal: Cuadrilla electricos.
Actividades: Durante el dia se presentes fuertes lluvias, lo cual impide la fundición de cajillas en concreto electricas.
Se inicia la instalación de tuberia electrica para instalaciones electricas de iluminación - Obra fecha.

Contratista obra — Mónica Castro Interventoria

Jueves, 14 de Noviembre 2024.
Clima: Nublado.
Personal: Cuadrilla electricos.
Actividades: Se realiza la construcción de las cajillas de inspección en concreto para la red de alumbrado, se continua instalando tuberia.

Contratista obra — Mónica Castro Interventoria

Viernes, 15 de Noviembre 2024.
Clima: Soleado
Personal: Cuadrilla electricos.
Actividades: Se realiza las actividades de transición de red aérea - subterranea en tuberia pvc, tambien se realiza instalación de tablero de control de la red electrica.

Contratista obra — Mónica Castro Interventoria

Sabado 16 de Noviembre 2024.
Clima: Soleado
Personal: Maestro, cuadrilla electrica.
Actividades: Se realiza parte del suministro e instalación de cableado para redes electricas y de iluminación.

Contratista obra

Mónicastro
Intervertena

Domingo, 17 de Noviembre 2024.

No se trabaja, día no laboral.

Contratista obra

Mónicastro.
Contratista Intervertena

Lunes, 18 de Noviembre 2024.
Clima: Soleado
Personal: Cuadrilla electricos.
Actividades: Se realiza el suministro e instalación de los reflectores de 150W junto con su brazo y cuadrilla de soporte y anclaje y se termina de instalar el cableado de redes electricas y de iluminación.

Contratista obra

Mónicastro
Intervertena

Martes, 19 de Noviembre 2024.
Clima: Soleado
Personal: Cuadrilla electricos y maestro.
Actividades: Se realizo prueba de iluminación y redes electricas ya con el proyecto energizado

Maestro
Contratista Obra
Interventoria

Miercoles, 20 de Noviembre 2024.
Clima: Soleado.
Personal: Cuadrilla electricos y maestro.
Actividades: Se instalen tomacorrientes y demás accesorios electricos, finalizando las actividades electricas y de iluminación del proyecto.

Maestro
Contratista Obra
Interventoria

Jueves, 21 de Noviembre 2024.
Clima: Soleado
Personal: Maestro y ayudante.
Actividades: Se realizan actividades de curado y corte de placa de concreto de la cancha multifuncional, adicionalmente se realiza limpieza y retiro de sedimentos en los cunetas y cajilla de inspección.

Maestro
Contratista Obra
Interventoria

Viernes, 22 de Noviembre 2024
Clima: Soleado
Personal: Maestro, oficial, 2 ayudantes.
Actividades: Se da inicio a actividad de demolición de placa de concreto 10cm existente, empleando martillo demoledor y demás herramientas necesarias.

Contratista Obra — Maestro / Interventoría

Sábado, 23 de Noviembre 2024
Clima: Soleado
Personal: Maestro, oficial, 2 ayudantes.
Actividades: Se termina de realizar la demolición de placa existente en concreto de un costado de la cancha multifuncional.

Contratista Obra — Maestro / Interventoría

Domingo, 24 de Noviembre 2024
No se trabaja, día no laboral.

Contratista Obra — Maestro / Interventoría

Lunes, 25 de Noviembre 2024.
Clima: Soleado
Personal: Maestro oficial, 2 ayudantes.
Actividades: Se terminan actividades de demolición de placa existente en concreto, se realiza cargue y acopio de material, para su posterior retiro y disposición.

Contratista obra

Maestro
Interventoría.

Martes, 26 de Noviembre 2024.
Clima: Soleado
Personal: Maestro, oficial, 2 ayudantes.
Actividades: Se da inicio a el encofrado y nivelación de terreno para fundición de placa de piso en concreto. Se da inicio a la fundición de placa, en un costado de la cancha multifuncional.

Contratista obra

Maestro
Interventoría

Miercoles, 27 de Noviembre 2024
Clima: Soleado
Personal: Maestro, oficial, 2 ayudantes.
Actividades: Se termina de realizar la fundición de placa de concreto en un costado de la cancha multifuncional, se da inicio a la fundición de placa del otro costado.

Maestro

Contratista obra

Intervetena.

Jueves, 28 de Noviembre 2024
Clima: Soleado
Personal: Maestro, de obra, oficial, 2 ayudantes.
Actividades: Se termina de realizar la fundición de placa de concreto en ambos costados de la Cancha multifuncional, dando por culminada la actividad.

Maestro

Contratista obra

Intervetena

Viernes, 29 de Noviembre 2024
Clima: Soleado
Personal: Maestro, oficial, 2 ayudantes
Actividades: Se realizó el desmonte de las Canchas multifuncionales existentes, se hizo entrega de las mismas a la junta de acción comunal.

Maestro

Contratista obra

Intervetena

Sabado, 30 de Noviembre 2024.
Personal: Cuadrilla eléctrica.
Actividades: Se tenia de realizar la instalación de las lámparas de iluminación de la cubierta de la cancha multifuncional. Se realiza prueba de iluminación.

Maricastro
Contratista obra Interventora

Domingo, 01 de Diciembre 2024.
No se trabaja, día no laboral.

Maricastro
Contratista obra Interventora.

Lunes, 02 de diciembre 2024.
Clima: Soleado
Personal: Cuadrilla ornamentación
Actividades: Se da inicio a la fabricación de las cargas multifuncionales en estructura metálica tubular, según diseño, se realiza suministro de tubos y vigas.

Maricastro
Contratista obra Interventora

Martes, 03 de diciembre 2024
Clima: Soleado
Personal: Cuadrilla ornamentación
Actividades: Se continua realizando la fabricación de las 2 canchas multifuncionales en estructura metálica, se realiza el montaje y se deja listo para pintar.

Maestro
Contratista obra — Interventoría

Miercoles, 04 de diciembre 2024
Clima: Soleado
Personal: Cuadrilla ornamentación
Actividades: Se realiza la instalación y fijación de las 2 canchas multifuncionales, quedando enterradas dentro de la placa de concreto con pedestales en concreto, se realiza la correspondiente pintada de color blanco y se instalan los tableros, aros y mallas de baloncesto.

Maestro
Contratista obra — Interventoría

Jueves 05 de Diciembre 2024
Personal: Maestro de obra, 2 ayudantes
Actividades: Se realizan actividades de lavado y limpieza de placa de concreto de la cancha multifuncional.

Maestro
Contratista obra — Interventoría

Viernes, 06 de Diciembre 2024.
Clima: Soleado.
Personal: Maestro, 2 oficiales.
Actividades: Se da inicio a la demarcación de juego en la placa de piso de la cancha multifuncional, se realiza limpieza y se inicia con la demarcación de microfútbol.

Maestro
Contratista obra
Interventoría.

Sábado, 07 Diciembre 2024.
Clima: Soleado.
Personal: Maestro, 2 ayudantes.
Actividades: Se continua realizando la demarcación de juego de la cancha multifuncional, se realiza demarcación de baloncesto.

Maestro
Contratista obra
Interventoría

Domingo, 08 Diciembre 2024.
No se trabaja, día no laboral.

Maestro
Contratista obra
Interventoría.

Lunes, 09 de Diciembre 2024.
Clima: Soleado
Personal: Maestro, 2 ayudantes.
Actividades: Se tuvo a bien realizar la demarcación de juegos, de la placa de piso de la cancha multifuncional, quedando demarcado, juego de microfutbol, baloncesto y voleybol. Se realiza el vaciado de tapas prefabricadas en concreto para cunetas.

Maestro

Contratista dora

Interventoria

Martes, 10 de Diciembre 2024.
Clima: Soleado
Personal: Maestro, 2 ayudantes.
Actividades: Se realiza la instalación de tapas, tipo rejilla en concreto prefabricadas para las cunetas y de aguas lluvias en los costados de la cancha multifuncional, previo a la limpieza de las cunetas y retiro de sedimentos.

Maestro

Contratista dora

Interventoria

Miercoles, 11 de Diciembre 2024.
Clima: Soleado
Personal: Mincargador, 2 volqueteros.
Actividades: Se realizaron actividades de limpieza y retiro de escombros de demoliciones y demas material apilado y sobrante, empleando mincargador y 2 volquetas sencillas.

Contratista de la Interventoria.

Jueves, 12 de Diciembre 2024.
Clima: Soleado
Personal: Obrero, 2 ayudantes.
Actividades: Se realizo aseo general a la obra que hace entrega de la misma a la interventoria y a la comunidad, se inspeccionó el cargue puntualmente de las instalaciones electrica y de iluminación como también el estado de la obra, entregada, siendo recibida a satisfacion.

Contratista de la Interventoria.
