SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

INFORME DE EJECUCION ACTIVIDADES N° 02 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y TRANSPORTE N° SA-SI-MA-003-2026

OBJETO:

"SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE MAQUIANRIA, CONFROME A FICHA TECNICA, ORIENTADO AL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACÁ".

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
R.L. CARLOS HOLMER ALVIS MENDOZA
C.C. 94.513.754 de Cali.

JUNIO DE 2026

CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

CONTENIDO

1. **INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO** 3
2. **OBJETO DEL DOCUMETO** 3
3. **DESCRIPCION DE LA NECESIDAD** 4
4. **OBJETO DEL PROYECTO** 5
5. **LUGAR DE EJECUCION** 6
6. **ESPECIFICACIONES TECNICAS** 6
7. **PRESUPUESTO DEL CONTRATO** 7
   7.1. PRESUPUESTO DEL CONTRATO 7
8. **RELACION DE GARANTIAS** 7
9. **BALANCE FINACIERO DEL CONTRATO** 7
10. **EQUIPO Y PERSONAL PARA EL PROYECTO** 8
11. **ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS** 8
12. **RELACION DE DOCUMENTOS SUSCRITOS** 8
13. **EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES** 8
14. **REGISTRO Y CONTRIOL DE TRABAJO REALZIADO.** 10
15. **CONTRATIEMPOS Y/O ATRASOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES** 12
16. **CONCLUSIONES** 13
17. **CANTIDADES EJECUTADAS PRESETE CORTE** 14

CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y TRANSPORTE N° SA-SI-MA-003-2026	
PROCESO	**SA-SI-MA-003-2026**
TIPO DE CONTRATO	ARRENDAMIENTO Y TRANSPORTE
OBJETO	"SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE MAQUIANRIA, CONFROME A FICHA TECNICA, ORIENTADO AL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACÁ".
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO, BOYACÁ NIT: 800.063.791-1
CONTRATISTA	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 901.510.145-6
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS HOMER ALVIS MENDOZA C.C. 94.513.754 de Cali.
SUPERVISOR	AQR. CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA supervisor.
N° DE RP	2026020031 de 18 de marzo de 2026
VALOR INICIAL	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($ 146.000.000,00)
FECHA DE INICIO	Dieciocho (18) de marzo de 2026
PLAZO	OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA	Diecisiete (17) de noviembre de 2026

2. OBJETO DEL DOCUMETO

El propósito del presente documento es relacionar las actividades técnicas y administrativas llevadas a cabo para dar cumplimiento al desarrollo del contrato de **ARRENDAMIENTO Y TRANSPORTE N° SA-SI-MA-003-2026**, suscrito entre el municipio de Arcabuco – Boyacá y la empresa **DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.** y el cual se encuentra en ejecución.

3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Las vías rurales constituyen un eje fundamental para el desarrollo económico, social y productivo de las comunidades del municipio, en la medida en que permiten la conexión entre el casco urbano, las veredas y los municipios vecinos, facilitando la movilidad de personas, bienes y servicios, así como la comercialización de los productos agrícolas. Actualmente, el municipio de Arcabuco cuenta con un inventario vial aproximado de 166,27 kilómetros, correspondientes en su mayoría a vías terciarias.

No obstante, a partir de un diagnóstico visual realizado en diferentes sectores del municipio, se ha evidenciado el deterioro significativo de varias vías urbanas y rurales, situación que dificulta el tránsito vehicular y peatonal de la población. Este deterioro obedece, principalmente, a la ausencia o deficiente estado de cunetas, el taponamiento de alcantarillas, la falta de obras de drenaje adecuadas y los efectos de las constantes y fuertes precipitaciones, que han generado procesos de erosión, socavación y pérdida de la capacidad estructural de la vía.

La alta frecuencia de uso de las vías terciarias, sumada a las condiciones climáticas adversas y a la falta de pavimentación en amplios tramos, ha ocasionado que algunas vías se encuentren en estado regular o intransitable, afectando de manera directa la movilidad de la población, el acceso a servicios básicos, el desarrollo agropecuario, el turismo y, en general, el crecimiento económico del municipio. En este contexto, resulta prioritario que la Administración Municipal adelante labores de mantenimiento, adecuación y conservación vial, bajo criterios técnicos que garanticen la durabilidad, funcionalidad y seguridad de la infraestructura.

Para la ejecución adecuada de estas actividades se requiere el uso de maquinaria especializada que permita realizar trabajos de perfilado, conformación de la rasante, cuneteo y nivelación de la superficie de rodadura, así como el transporte y disposición de material granular y la atención de puntos críticos identificados en la red vial. En particular, la motoniveladora se constituye en un equipo indispensable para la nivelación y conformación de las vías, la limpieza y conformación de cunetas y taludes, y la adecuada distribución del material; mientras que la volqueta resulta esencial para el transporte de los materiales requeridos en las intervenciones viales.

La Administración Municipal de Arcabuco cuenta con una retroexcavadora tipo pajarita de su propiedad, la cual cumple una función complementaria y articulada con la motoniveladora que se pretende alquilar, en la medida en que permite remover y cargar el material excedente producto de las actividades de perfilado y cuneteo, así como realizar el cargue del material de recebo, teniendo en cuenta que actualmente el municipio dispone de una reserva de material de recebo para ser utilizada en las labores de mantenimiento vial.

En virtud de lo anterior, se concluye que existe una necesidad real, actual y prioritaria de contratar el servicio de alquiler, a todo costo, de motoniveladora y volqueta, de manera

complementaria a la maquinaria propia del municipio, orientado al mantenimiento, adecuación y conservación de la malla vial del municipio de Arcabuco, Boyacá, como una medida necesaria para mejorar la movilidad, fortalecer la economía rural, garantizar el acceso a los servicios y contribuir al desarrollo social, económico y territorial del municipio, en concordancia con los planes, programas y proyectos de inversión de la Administración Municipal. Se requiere que la contratación del servicio de alquiler de maquinaria se realice bajo la modalidad de monto agotable, teniendo en cuenta que las intervenciones a ejecutar en los diferentes tramos viales del municipio no son homogéneas y dependen de las condiciones particulares, el grado de deterioro y las necesidades técnicas identificadas en cada sector. En este sentido, la ejecución de los ítems contratados estará sujeta a la demanda real de maquinaria en cada frente de trabajo, permitiendo su utilización de manera flexible y proporcional, conforme se vayan presentando las necesidades de mantenimiento, adecuación y conservación de las vías urbanas y rurales, hasta el agotamiento total de los recursos contratados.

4. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del proyecto es: ***"SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE MAQUIANRIA, CONFROME A FICHA TECNICA, ORIENTADO AL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACÁ".***

OBJETIVO GENERAL

Prestar el servicio de alquiler de maquinaria a todo costo, bajo las especificaciones solicitadas por el ordenador del gasto, con el fin de realizar las labores de mantenimiento, adecuación y conservación de la malla vial rural del municipio de Arcabuco, Boyacá.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Garantizar la disponibilidad oportuna de los equipos ofertados en el municipio de Arcabuco, Boyacá, asegurando su entrega en el lugar y momento acordados con la entidad.
- Desarrollar de manera adecuada las actividades operativas de la maquinaria y equipos, cumpliendo con los lineamientos técnicos y las solicitudes establecidas por la entidad contratante.
- Recopilar, sistematizar y presentar la información generada durante la ejecución de las actividades, asegurando su pertinencia para el cumplimiento de los objetivos.

5. LUGAR DE EJECUCION

La realización de los trabajos se lleva a cabo en el área del municipio de arcabuco – Boyacá.

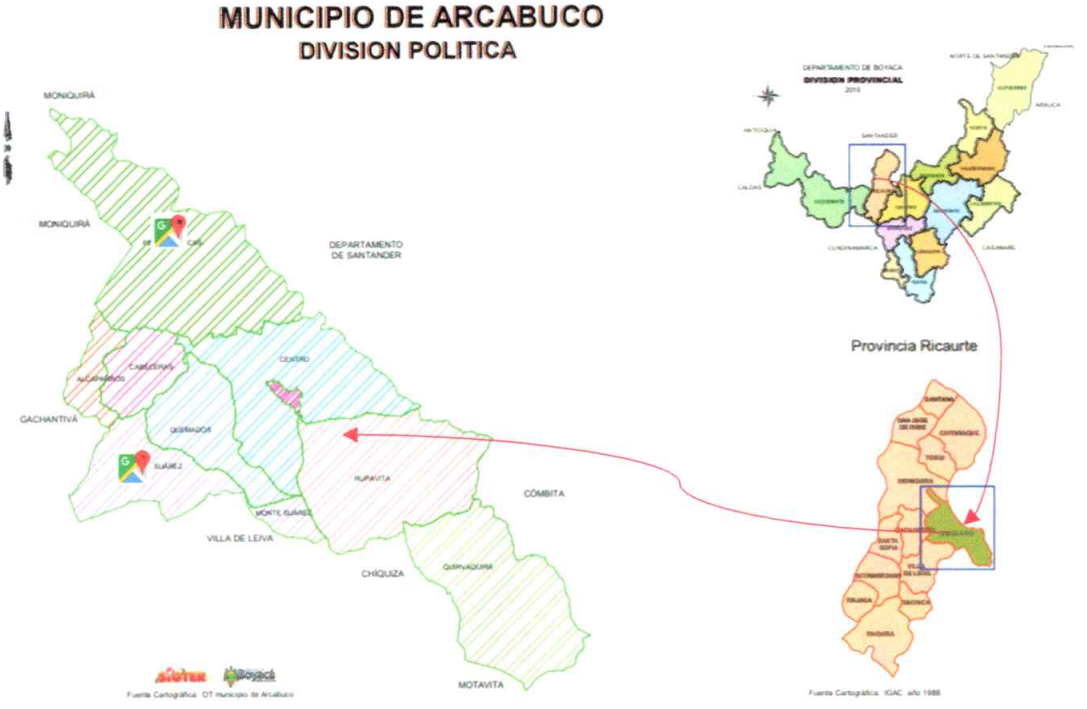


Imagen 1: municipio de Arcabuco

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las condiciones técnicas a cumplir son las siguientes:

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Alquiler de maquinaria amarilla tipo motoniveladora	HORA	1
2	Alquiler de maquinaria tipo volqueta de capacidad 7 toneladas	M3/km	1

De acuerdo al proceso de selección, se debe disponer de la maquinaria y equipos antes relacionados, para dar cumplimiento a las cantidades solicitadas.

7. PRESUPUESTO DEL CONTRATO

7.1. PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El valor del presupuesto del presente contrato es: ***CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 146.000.000,00)*** representado en los siguientes items y cantidades:

ITEM	CONCEPTO	UNI	CANT	VR. UNITARIO	IVA (19%)	VR. TOTAL (INCLUYE IVA)
1	ALQUILER DE MOTONIVELADORA CON CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR A 135 HP	HORA	MONTO AGOTABLE	$ 243.800,00	$ 46.322,00	$ 290.122,00
2	ALQUILER DE MAQUINARIA TIPO VOLQUETA DE CAPACIDAD 7 TONELADAS	M3/KM	MONTO AGOTABLE	$ 2.800,00	$ 0.00	$ 2.800,00
TOTAL						**$ 146.000.000,00**

8. RELACION DE GARANTIAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL					
ANEXO	**N° DE POLIZA**	**CONCEPTO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO/ ACTUAL**
2	39-46-101018875	Cumplimiento del contrato	**18/03/2026**	**23/05/2027**	**$ 14.600.000,00**
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	**18/03/2026**	**23/11/2026**	**$ 29.200.000,00**
2	39-54-101003081	Predios labores y operaciones	**18/03/2026**	**23/11/2026**	**$ 350.181.000,00**

9. BALANCE FINACIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL		
RELACION ACTAS PARCIALES	**DEBITO**	**CRÉDITO**
VALOR CONTRATO	$ 146.000.000,00	
VR. ACTA DE PAGO PARCIAL 01		$ 50.336.167,00
VR. PRESENTE ACTA		$ 81.622.252,60
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		$ 14.401.580,40
SUMAS IGUALES	**$ 146.000.000,00**	**$ 146.000.000,00**

10. EQUIPO Y PERSONAL PARA EL PROYECTO

PERSONAL:

- Un (01) Operador de Motoniveladora
- Un (01) conductor

EQUIPO:

- Una (01) Motoniveladora
- Una (01) volqueta sencilla de 7 M3

11. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Para la ejecución del contrato se efectuaron las siguientes actividades de carácter administrativo:

- Elaboración de propuesta económica
- Afiliación del personal al sistema de seguridad social
- Recopilación de información y elaboración de informes

12. RELACION DE DOCUMENTOS SUSCRITOS

FECHA	ACTA/DOCUMENTO	OBSERVACIONES
Doce (12) de marzo de 2026	SUSCRIPCION CONTRATO	Se firma por quienes intervienen
Dieciocho (18) de marzo de 2026	ACTA DE INICIO	Se firma por quienes intervienen

13. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	DESCRIPCION EJECUCION DE LA ACTIVIDAD
ALQUILER DE MOTONIVELDAROA CON CAPACIDAD	• Se realizo la disposición, movilización y traslado del equipo ofertado hasta el sitio de trabajo indicado por la entidad

14. REGISTRO Y CONTRIOL DE TRABAJO REALZIADO.

REGISTRO DE TRABAJO MOTONIVELADORA

REGISTRO DE HORAS MAQUINARIA					
N°DE RECIBO	FECHA	DESCRIPCION/ UBICACIÓN	HRTO/INICIAL	HRTO/FINAL	N° DE HORAS
1406	27/04/2026	VEREDA PEÑAS BLANCAS	4129,5	4136,4	6,9
1407	28/04/2026	VEREDA PEÑAS BLANCAS	4136,4	4140,7	4,3
1408	29/04/2026	VEREDA PEÑAS BLANCAS	4140,9	4147,2	6,3
1409	30/04/2026	VEREDA PEÑAS BLANCAS	4147,2	4152,4	5,2
1410	2/05/2026	VEREDA PEÑAS BLANCAS	4152,4	4158	5,6
1411	4/05/2026	VEREDA PEÑAS BLANCAS	4158	4163,5	5,5
1412	5/05/2026	VEREDA PEÑAS BLANCAS	4163,5	4169,6	6,1
1413	6/05/2026	VEREDA PEÑAS BLANCAS	4170	4173,9	3,9
1414	7/05/2026	VEREDA PEÑAS BLANCAS	4173,9	4178,6	4,7
1415	8/05/2026	VEREDA PEÑAS BLANCAS	4178,6	4184	5,4
1416	9/05/2026	VEREDA PEÑAS BLANCAS	4184	4189,9	5,9
1417	11/05/2026	VEREDA PEÑAS BLANCAS	4190,2	4196,2	6
1418	12/05/2026	VEREDA RUPAVITA	4196,3	4202,9	6,6
1419	13/05/2026	VEREDA RUPAVITA	4202,9	4207,7	4,8
1420	14/05/2026	VEREDA RUPAVITA	4207,9	4213,3	5,4
1421	15/05/2026	VEREDA RUPAVITA	4213,5	4219,4	5,9
1422	16/05/2026	VEREDA RUPAVITA	4219,6	4225,1	5,5
1423	19/05/2026	VEREDA RUPAVITA	4225,2	4231,8	6,6
1424	20/05/2026	VEREDA RUPAVITA	4231,9	4238,1	6,2
1425	21/05/2026	VEREDA RUPAVITA	4238,7	4244,9	6,2
1426	22/05/2026	VEREDA RUPAVITA	1763,9	1766,6	6,2
1427	23/05/2026	VEREDA RUPAVITA	1766,6	1774,9	8,3
1428	25/05/2026	VEREDA RUPAVITA	1774,9	1778,4	7,4
1429	26/05/2026	VEREDA RUPAVITA	1778,4	1781,8	7,2
1430	27/05/2026	VEREDA RUPAVITA	1781,8	1787,4	7,2
1431	28/05/2026	VEREDA RUPAVITA	1787,4	1792,7	7,1
1432	29/05/2026	CASA BLANCA	1792,7	1799,9	6,8
1433	30/05/2026	CASA BLANCA	1799,9	1805	5,1
TOTAL, EJECUATDO					**168,3**

Tabla 1: Registro de trabajo motoniveladora.
Fuente: Elaboración propia

REGISTRO TRABAJO DIARIO VOLQUETA

FECHA	ORIGEN	DESTINO	KM RECORRIDO	CANT M3	M3-KM
27/04/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161
27/04/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161
27/04/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161
28/04/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161
28/04/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	18	7	126
28/04/2026	CANTERA COMBITA	MONTE SUAREZ	23	7	161
29/04/2026	CANTERA COMBITA	MONTE SUAREZ	21	7	147
29/04/2026	CANTERA COMBITA	MONTE SUAREZ	22	7	154

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

29/04/2026	CANTERA COMBITA	MONTE SUAREZ	23	7	161
30/04/2026	CANTERA COMBITA	MONTE SUAREZ	22	7	154
30/04/2026	CANTERA COMBITA	MONTE SUAREZ	30,5	7	213,5
30/04/2026	CANTERA COMBITA	MONTE SUAREZ	22	7	154
04/05/2026	CANTERA COMBITA	MONTE SUAREZ	23	7	161
04/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	24	7	168
04/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	18	7	126
05/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	18	7	126
05/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161
05/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	21	7	147
06/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	22	7	154
06/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	22	7	154
06/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	21	7	147
07/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	22	7	154
07/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161
07/05/2026	RECEBERA COMBITA	MONTESUAREZ	30	7	210
07/05/2026	RECEBERA COMBITA	MONTESUAREZ	30	7	210
08/05/2026	RECEBERA COMBITA	MONTESUAREZ	30,5	7	213,5
08/05/2026	RECEBERA COMBITA	MONTESUAREZ	30,5	7	213,5
08/05/2026	RECEBERA COMBITA	MONTESUAREZ	30,5	7	213,5
09/05/2026	RECEBERA COMBITA	MONTESUAREZ	30,5	7	213,5
09/05/2026	RECEBERA COMBITA	MONTESUAREZ	57	7	399
11/05/2026	RECEBERA COMBITA	MONTESUAREZ	57	7	399
12/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	17	7	119
12/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	17	7	119
12/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	17	7	119
15/05/2026	ACOPIO	RUPAVITA	12	7	84
15/05/2026	ACOPIO	RUPAVITA	12	7	84
15/05/2026	ACOPIO	RUPAVITA	12	7	84
15/05/2026	ACOPIO	RUPAVITA	12	7	84
15/05/2026	ACOPIO	RUPAVITA	12	7	84
15/05/2026	ACOPIO	RUPAVITA	12	7	84
16/05/2026	ACOPIO	RUPAVITA	12	7	84
16/05/2026	ACOPIO	RUPAVITA	12	7	84
16/05/2026	ACOPIO	RUPAVITA	12	7	84
16/05/2026	ACOPIO	RUPAVITA	12	7	84
16/05/2026	ACOPIO	RUPAVITA	12	7	84
16/05/2026	ACOPIO	RUPAVITA	12	7	84
19/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA	14	7	98
19/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA	14	7	98
19/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA	14	7	98
20/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA	14	7	98
20/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA	14	7	98
20/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA	14	7	98
20/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA	14	7	98
20/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161
21/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	21	7	147
21/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA	14	7	98
21/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA	14	7	98
21/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
21/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
22/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161
22/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5

CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

22/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
22/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
22/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
22/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
23/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
23/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
23/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
23/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161
23/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161
25/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
25/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
25/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
25/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
25/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
26/05/2026	ACOPIO	VEREDA QUEMADOS	5,8	7	40,6
26/05/2026	ACOPIO	VEREDA QUEMADOS	5,8	7	40,6
26/05/2026	ACOPIO	VEREDA QUEMADOS	5,8	7	40,6
26/05/2026	ACOPIO	VEREDA QUEMADOS	5,8	7	40,6
26/05/2026	CANTERA COMBITA	VEREDA RUPAVITA	16	7	112
27/05/2026	CANTERA COMBITA	VEREDA RUPAVITA	16	7	112
27/05/2026	RECEBERA COMBITA	VEREDA QUIVAQUIRA	12	7	84
27/05/2026	RECEBERA COMBITA	VEREDA QUIVAQUIRA	12	7	84
28/05/2026	RECEBERA COMBITA	MONTESUAREZ	30,5	7	213,5
28/05/2026	RECEBERA COMBITA	VEREDA RUPAVITA	14,5	7	101,5
28/05/2026	RECEBERA COMBITA	VEREDA QUIVAQUIRA	12	7	84
28/05/2026	RECEBERA COMBITA	VEREDA QUIVAQUIRA	12	7	84
29/05/2026	RECEBERA COMBITA	VEREDA RUPAVITA	14,5	7	101,5
29/05/2026	RECEBERA COMBITA	VEREDA QUIVAQUIRA 1	12	7	84
30/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	25,5	7	178,5
	TOTAL M3-KM				**11712,4**

Tabla 2: Registro de trabajo volqueta.
Fuente: Elaboración propia

15. CONTRATIEMPOS Y/O ATRASOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

Durante la fase inicial del periodo reportado, se contó con excelentes condiciones climáticas que favorecieron el despliegue operativo en jornadas completas, permitiendo un avance óptimo en la intervención de la malla vial. No obstante, en días posteriores se han registrado precipitaciones recurrentes que han complejizado las labores en terreno; pese a estas condiciones hidrometeorológicas adversas, la programación no ha sufrido interrupciones gracias a una estrategia de intervención resiliente que ha permitido dar continuidad a las actividades sin suspender las labores.

Este avance sostenido ha sido posible mediante la disposición continua de material granular de cantera y la operación coordinada de un vibrocompactador y un retrocargador suministrado por la entidad. La articulación de estos equipos con nuestra maquinaria alquilada ha permitido la

estabilización inmediata de sectores críticos, garantizando la recuperación de bombeos y el adecuado manejo de escorrentías superficiales, incluso bajo la influencia de las lluvias.

En cuanto al rendimiento de los equipos, el reporte de disponibilidad mecánica indica una ejecución fluida y libre de siniestros. Se hace constar que las paradas técnicas realizadas para el mantenimiento preventivo (reemplazo de fluidos y reabastecimiento) son maniobras programadas que aseguran la potencia hidráulica y continuidad operativa de los frentes de trabajo. De este modo, la maquinaria ha respondido con eficacia a las exigencias cambiantes del terreno, cumpliendo cabalmente con el objeto contractual de mejorar la conectividad y el desarrollo del municipio de Arcabuco.

16. CONCLUSIONES

- Se presenta un avance acumulado del 90.39 % en la ejecución del contrato, en relación con el valor total contratado, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones pactadas.
- Con la ejecución en el periodo de tiempo desde el e27 de abril de 2026 hasta el 30 de mayo de 2026, se logró ha logrado la ejecución de 168.2 horas de operación de maquinaria pesada tipo motoniveladora y el transporte de 11712.4 m3-km de material de afirmado, conforme a las instrucciones, requerimientos y programaciones definidas por la supervisión del contrato
- Con la ejecución de las horas contratadas y el traslado de material se ha venido mitigando de manera significativa el deterioro de las vías terciarias intervenidas, mejorando las condiciones de transitabilidad y contribuyendo al bienestar y calidad de vida de la comunidad.
- Durante el desarrollo continuo de las actividades contractuales no se registraron inconsistencias técnicas, operativas ni administrativas, garantizándose una adecuada ejecución del contrato.

Presenta;

CARLOS HOLMER ALVIS MENDOZA
R.L. DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
CONTRATISTA

IGUAL O SUPERIOR A 135 HP	contratante, garantizando su disponibilidad oportuna para el inicio de las actividades programadas. • Con base en las directrices impartidas por la supervisión del contrato, la entidad contratante establecido el cronograma de ejecución de actividades, conforme al perfil operativo de la maquina tipo motoniveladora, orientado principalmente a labores de conformación y nivelación de la rasante, cuneteo de vías y extendido y nivelación de material de afirmado. • En atención a dicho cronograma y a las instrucciones técnicas impartidas, se ejecutaron de manera continua las actividades programadas, con el fin de dar cumplimiento efectivo al objeto contractual y a las metas establecidas. • Para el control y registro de las horas efectivamente trabajadas, el equipo dispone de un sistema de horómetro, el cual se verifica al inicio y al cierre de cada jornada. El registro de horas se consigna en un formato debidamente avalado por la supervisión del contrato, en el que adicionalmente se documenta la ubicación de la intervención y la actividad ejecutada.
ALQUILER DE MAQUINARIA TIPO VOLQUETA DE CAPACIDAD 7 TONELADAS	• Se realizo la disposición, movilización y traslado del equipo ofertado hasta el sitio de trabajo indicado por la entidad contratante, garantizando su disponibilidad oportuna para el inicio de las actividades programadas para el transporte de material de afirmado. • Con base en las directrices impartidas por la supervisión del contrato, la entidad contratante establecido el cronograma de ejecución de actividades, conforme a la capacidad de operación de la volqueta. • En atención a dicho cronograma y a las instrucciones técnicas impartidas, se ejecutaron de manera continua las actividades programadas, en el transporte de material de afirmado a los diferentes puntos del área rural del municipio. • Para el control y registro de los transportes realizados, previo acuerdo se planteó y aprobó el registro del traslado en una planilla de control, en la cual se toma nota del origen, destino, cantidad de km de recorrido y cantidad de material transportado, este registro permite tener una

14. REGISTRO Y CONTRIOL DE TRABAJO REALZIADO.

REGISTRO DE TRABAJO MOTONIVELADORA

REGISTRO DE HORAS MAQUINARIA					
N°DE RECIBO	FECHA	DESCRIPCION/ UBICACIÓN	HRTO/INICIAL	HRTO/FINAL	N° DE HORAS
1406	27/04/2026	VEREDA PEÑAS BLANCAS	4129,5	4136,4	6,9
1407	28/04/2026	VEREDA PEÑAS BLANCAS	4136,4	4140,7	4,3
1408	29/04/2026	VEREDA PEÑAS BLANCAS	4140,9	4147,2	6,3
1409	30/04/2026	VEREDA PEÑAS BLANCAS	4147,2	4152,4	5,2
1410	2/05/2026	VEREDA PEÑAS BLANCAS	4152,4	4158	5,6
1411	4/05/2026	VEREDA PEÑAS BLANCAS	4158	4163,5	5,5
1412	5/05/2026	VEREDA PEÑAS BLANCAS	4163,5	4169,6	6,1
1413	6/05/2026	VEREDA PEÑAS BLANCAS	4170	4173,9	3,9
1414	7/05/2026	VEREDA PEÑAS BLANCAS	4173,9	4178,6	4,7
1415	8/05/2026	VEREDA PEÑAS BLANCAS	4178,6	4184	5,4
1416	9/05/2026	VEREDA PEÑAS BLANCAS	4184	4189,9	5,9
1417	11/05/2026	VEREDA PEÑAS BLANCAS	4190,2	4196,2	6
1418	12/05/2026	VEREDA RUPAVITA	4196,3	4202,9	6,6
1419	13/05/2026	VEREDA RUPAVITA	4202,9	4207,7	4,8
1420	14/05/2026	VEREDA RUPAVITA	4207,9	4213,3	5,4
1421	15/05/2026	VEREDA RUPAVITA	4213,5	4219,4	5,9
1422	16/05/2026	VEREDA RUPAVITA	4219,6	4225,1	5,5
1423	19/05/2026	VEREDA RUPAVITA	4225,2	4231,8	6,6
1424	20/05/2026	VEREDA RUPAVITA	4231,9	4238,1	6,2
1425	21/05/2026	VEREDA RUPAVITA	4238,7	4244,9	6,2
1426	22/05/2026	VEREDA RUPAVITA	1763,9	1766,6	6,2
1427	23/05/2026	VEREDA RUPAVITA	1766,6	1774,9	8,3
1428	25/05/2026	VEREDA RUPAVITA	1774,9	1778,4	7,4
1429	26/05/2026	VEREDA RUPAVITA	1778,4	1781,8	7,2
1430	27/05/2026	VEREDA RUPAVITA	1781,8	1787,4	7,2
1431	28/05/2026	VEREDA RUPAVITA	1787,4	1792,7	7,1
1432	29/05/2026	CASA BLANCA	1792,7	1799,9	6,8
1433	30/05/2026	CASA BLANCA	1799,9	1805	5,1
TOTAL, EJECUATDO					**168,3**

Tabla 1: Registro de trabajo motoniveladora.
Fuente: Elaboración propia

REGISTRO TRABAJO DIARIO VOLQUETA

FECHA	ORIGEN	DESTINO	KM RECORRIDO	CANT M3	M3-KM
27/04/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161
27/04/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161
27/04/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161
28/04/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161
28/04/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	18	7	126
28/04/2026	CANTERA COMBITA	MONTE SUAREZ	23	7	161
29/04/2026	CANTERA COMBITA	MONTE SUAREZ	21	7	147
29/04/2026	CANTERA COMBITA	MONTE SUAREZ	22	7	154

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

29/04/2026	CANTERA COMBITA	MONTE SUAREZ	23	7	161
30/04/2026	CANTERA COMBITA	MONTE SUAREZ	22	7	154
30/04/2026	CANTERA COMBITA	MONTE SUAREZ	30,5	7	213,5
30/04/2026	CANTERA COMBITA	MONTE SUAREZ	22	7	154
04/05/2026	CANTERA COMBITA	MONTE SUAREZ	23	7	161
04/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	24	7	168
04/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	18	7	126
05/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	18	7	126
05/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161
05/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	21	7	147
06/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	22	7	154
06/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	22	7	154
06/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	21	7	147
07/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	22	7	154
07/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161
07/05/2026	RECEBERA COMBITA	MONTESUAREZ	30	7	210
07/05/2026	RECEBERA COMBITA	MONTESUAREZ	30	7	210
08/05/2026	RECEBERA COMBITA	MONTESUAREZ	30,5	7	213,5
08/05/2026	RECEBERA COMBITA	MONTESUAREZ	30,5	7	213,5
08/05/2026	RECEBERA COMBITA	MONTESUAREZ	30,5	7	213,5
09/05/2026	RECEBERA COMBITA	MONTESUAREZ	30,5	7	213,5
09/05/2026	RECEBERA COMBITA	MONTESUAREZ	57	7	399
11/05/2026	RECEBERA COMBITA	MONTESUAREZ	57	7	399
12/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	17	7	119
12/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	17	7	119
12/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	17	7	119
15/05/2026	ACOPIO	RUPAVITA	12	7	84
15/05/2026	ACOPIO	RUPAVITA	12	7	84
15/05/2026	ACOPIO	RUPAVITA	12	7	84
15/05/2026	ACOPIO	RUPAVITA	12	7	84
15/05/2026	ACOPIO	RUPAVITA	12	7	84
15/05/2026	ACOPIO	RUPAVITA	12	7	84
16/05/2026	ACOPIO	RUPAVITA	12	7	84
16/05/2026	ACOPIO	RUPAVITA	12	7	84
16/05/2026	ACOPIO	RUPAVITA	12	7	84
16/05/2026	ACOPIO	RUPAVITA	12	7	84
16/05/2026	ACOPIO	RUPAVITA	12	7	84
16/05/2026	ACOPIO	RUPAVITA	12	7	84
19/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA	14	7	98
19/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA	14	7	98
19/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA	14	7	98
20/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA	14	7	98
20/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA	14	7	98
20/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA	14	7	98
20/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA	14	7	98
20/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161
21/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	21	7	147
21/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA	14	7	98
21/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA	14	7	98
21/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
21/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
22/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161
22/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5

CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

22/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
22/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
22/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
22/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
23/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
23/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
23/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
23/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161
23/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161
25/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
25/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
25/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
25/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
25/05/2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA-SECTOR LA CANTERA	15,5	7	108,5
26/05/2026	ACOPIO	VEREDA QUEMADOS	5,8	7	40,6
26/05/2026	ACOPIO	VEREDA QUEMADOS	5,8	7	40,6
26/05/2026	ACOPIO	VEREDA QUEMADOS	5,8	7	40,6
26/05/2026	ACOPIO	VEREDA QUEMADOS	5,8	7	40,6
26/05/2026	CANTERA COMBITA	VEREDA RUPAVITA	16	7	112
27/05/2026	CANTERA COMBITA	VEREDA RUPAVITA	16	7	112
27/05/2026	RECEBERA COMBITA	VEREDA QUIVAQUIRA	12	7	84
27/05/2026	RECEBERA COMBITA	VEREDA QUIVAQUIRA	12	7	84
28/05/2026	RECEBERA COMBITA	MONTESUAREZ	30,5	7	213,5
28/05/2026	RECEBERA COMBITA	VEREDA RUPAVITA	14,5	7	101,5
28/05/2026	RECEBERA COMBITA	VEREDA QUIVAQUIRA	12	7	84
28/05/2026	RECEBERA COMBITA	VEREDA QUIVAQUIRA	12	7	84
29/05/2026	RECEBERA COMBITA	VEREDA RUPAVITA	14,5	7	101,5
29/05/2026	RECEBERA COMBITA	VEREDA QUIVAQUIRA 1	12	7	84
30/05/2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	25,5	7	178,5
	TOTAL M3-KM				**11712,4**

Tabla 2: Registro de trabajo volqueta.
Fuente: Elaboración propia

15. CONTRATIEMPOS Y/O ATRASOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

Durante la fase inicial del periodo reportado, se contó con excelentes condiciones climáticas que favorecieron el despliegue operativo en jornadas completas, permitiendo un avance óptimo en la intervención de la malla vial. No obstante, en días posteriores se han registrado precipitaciones recurrentes que han complejizado las labores en terreno; pese a estas condiciones hidrometeorológicas adversas, la programación no ha sufrido interrupciones gracias a una estrategia de intervención resiliente que ha permitido dar continuidad a las actividades sin suspender las labores.

Este avance sostenido ha sido posible mediante la disposición continua de material granular de cantera y la operación coordinada de un vibrocompactador y un retrocargador suministrado por la entidad. La articulación de estos equipos con nuestra maquinaria alquilada ha permitido la

estabilización inmediata de sectores críticos, garantizando la recuperación de bombeos y el adecuado manejo de escorrentías superficiales, incluso bajo la influencia de las lluvias.

En cuanto al rendimiento de los equipos, el reporte de disponibilidad mecánica indica una ejecución fluida y libre de siniestros. Se hace constar que las paradas técnicas realizadas para el mantenimiento preventivo (reemplazo de fluidos y reabastecimiento) son maniobras programadas que aseguran la potencia hidráulica y continuidad operativa de los frentes de trabajo. De este modo, la maquinaria ha respondido con eficacia a las exigencias cambiantes del terreno, cumpliendo cabalmente con el objeto contractual de mejorar la conectividad y el desarrollo del municipio de Arcabuco.

16. CONCLUSIONES

- Se presenta un avance acumulado del 90.39 % en la ejecución del contrato, en relación con el valor total contratado, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones pactadas.
- Con la ejecución en el periodo de tiempo desde el e27 de abril de 2026 hasta el 30 de mayo de 2026, se logró ha logrado la ejecución de 168.2 horas de operación de maquinaria pesada tipo motoniveladora y el transporte de 11712.4 m3-km de material de afirmado, conforme a las instrucciones, requerimientos y programaciones definidas por la supervisión del contrato
- Con la ejecución de las horas contratadas y el traslado de material se ha venido mitigando de manera significativa el deterioro de las vías terciarias intervenidas, mejorando las condiciones de transitabilidad y contribuyendo al bienestar y calidad de vida de la comunidad.
- Durante el desarrollo continuo de las actividades contractuales no se registraron inconsistencias técnicas, operativas ni administrativas, garantizándose una adecuada ejecución del contrato.

Presenta;

CARLOS HOLMER ALVIS MENDOZA
R.L. DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
CONTRATISTA

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

17. CANTIDADES EJECUTADAS PRESETE CORTE

SABANA DE EJECUCION DE CANTIDADES CONTRATO DE ARRENADAMIENTO Y TRANSPORTE SA-SI-MA-003-2026												
OBJETO DEL CONTRATO	"SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE MAQUIANRIA, CONFROME A FICHA TECNICA, ORIENTADO AL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACÁ".											
CONTRANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO						CONTRATISTA			DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS		
FECHA DE INCIO	18/03/2026		FECHA DE TEMINACION		17/11/2026		EJECUTADO ACTA PARCIAL 01			EJECUTADO PRESENTE ACTA		
CONDICIONES CONTRACTUALES							PORCENTAJE EJECUTADO		34,48%	PORCENTAJE EJECUTADO		55,91%
ITEM	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**19% IVA**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**19% IVA**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**19% IVA**	**VR. TOTAL**
1	Alquiler de maquinaria amarilla tipo motoniveladora	HORA	MONTO AGOTABLE	$243.800,00	$46.322,00	290.122,00	173,5	$8.036.867,00	$50.336.167,00	168,3	$7.795.992,60	$48.827.532,60
2	Alquiler de maquinaria tipo volqueta de capacidad 7 toneladas	M3/km	MONTO AGOTABLE	$2.800,00	$0,00	$2.800,00				11712,4		$32.794.720,00
TOTAL, FINAL					**$146.000.000,00**				**$50.336.167,00**			**$81.622.252,60**

Hasta la fecha se presenta un avance acumulado del 90.39 % y para el presente corte se tiene un avance del 55.91% de acuerdo la información antes indicada y sustentada con los recibos de control de trabajo diario presentados.

El valor de la presente acta es de: ***OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($ 81.622.252,60)***

CARLOS HOLMER ALVIS MENDOZA
RL. DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS
Contratista

CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
Supervisor

CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560


DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

1. REGISTRO FOTOGRAFICO MOTONIVELADORA








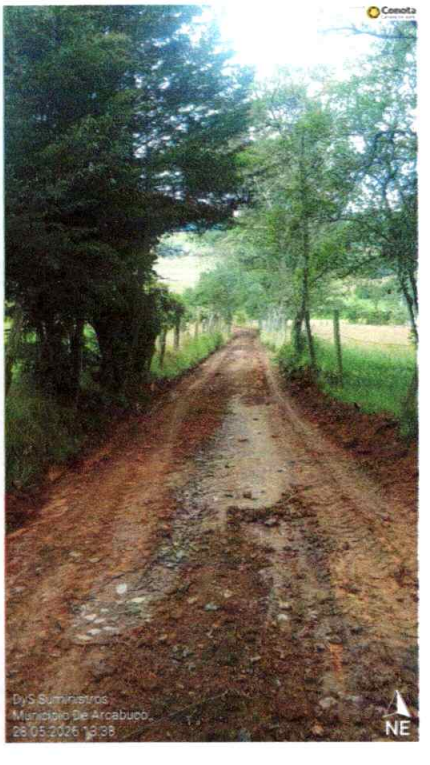

CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES



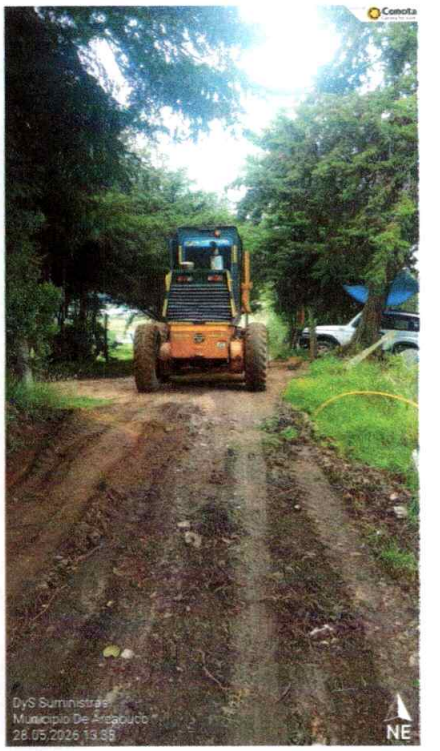







CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES



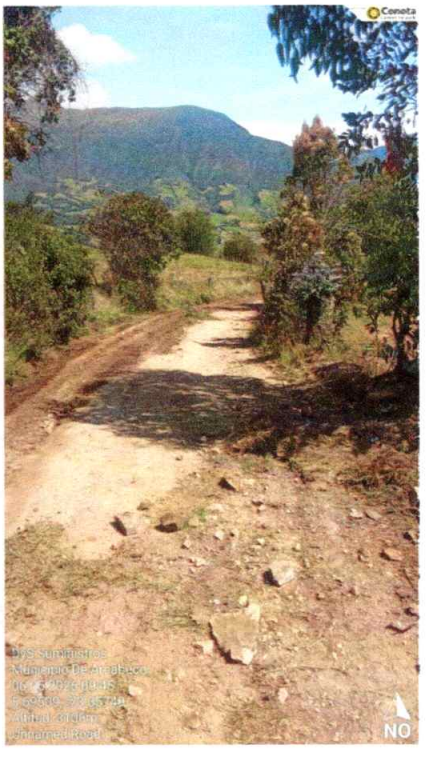



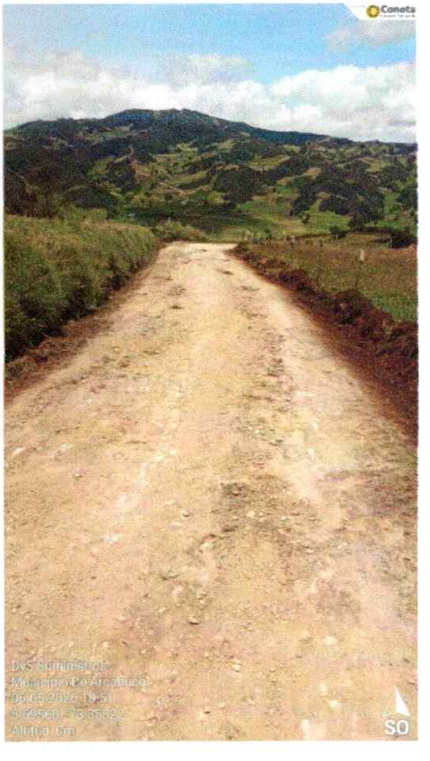

CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES










CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES





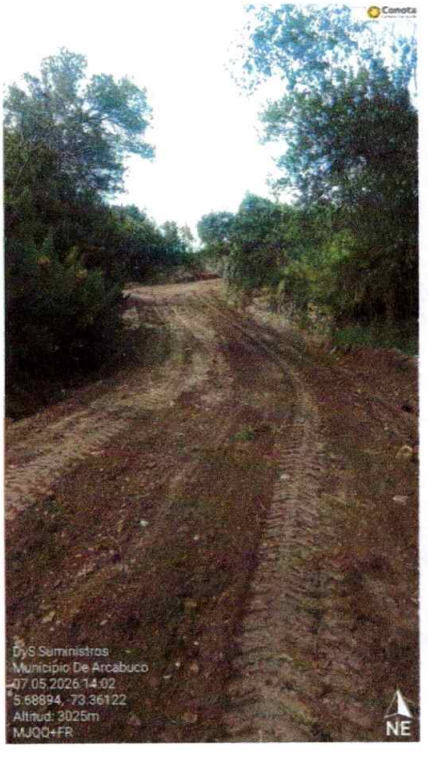




CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES





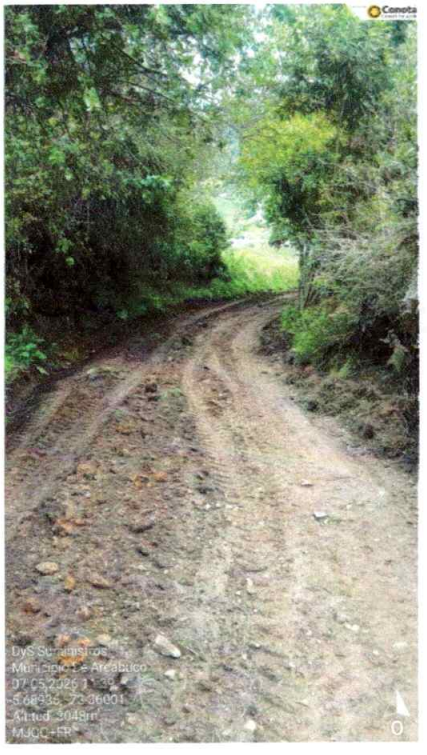



CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES










CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES








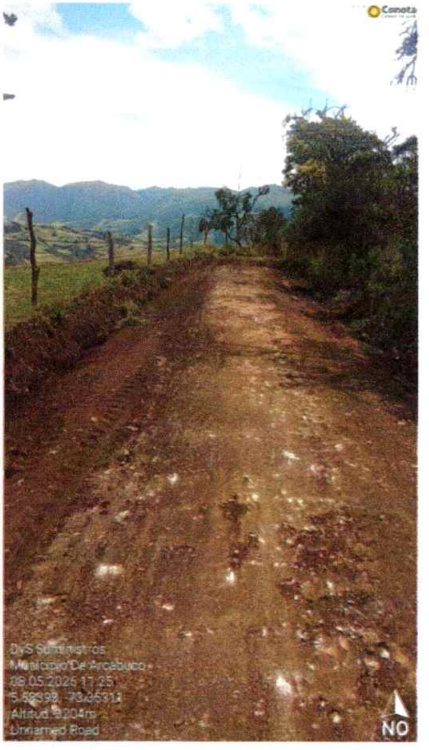



CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

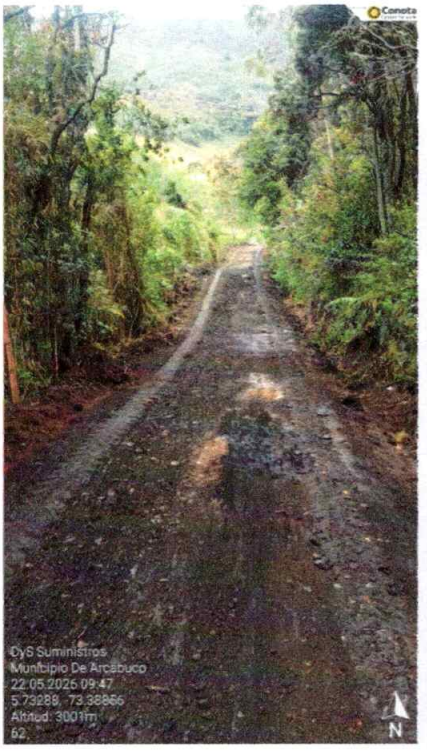



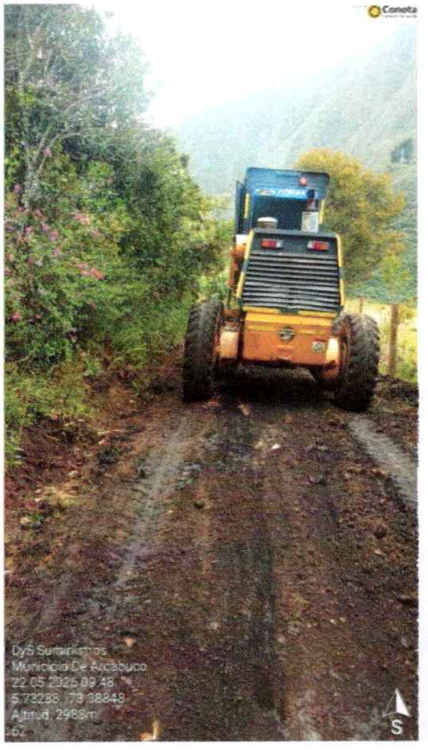


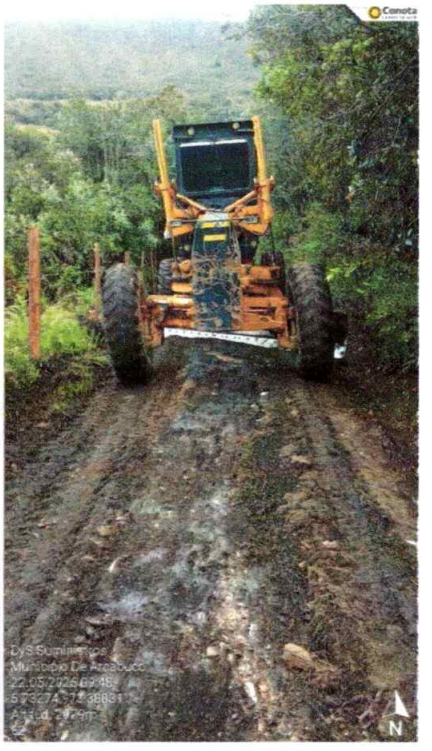


CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES



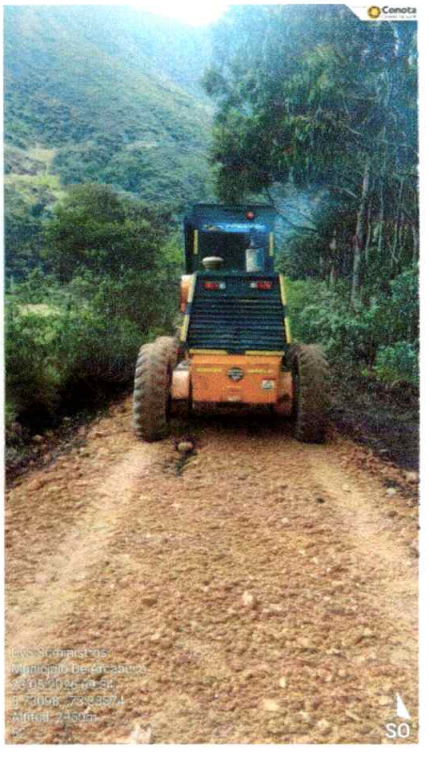





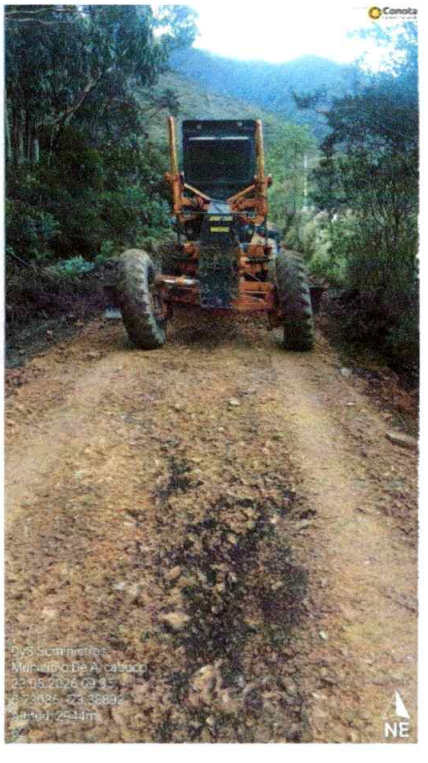

CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

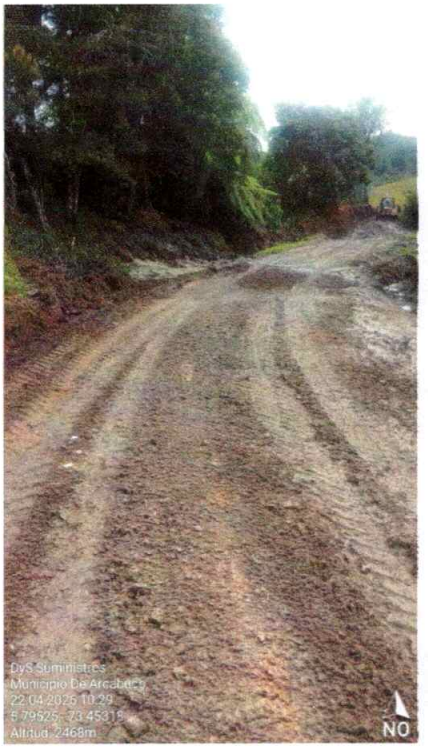

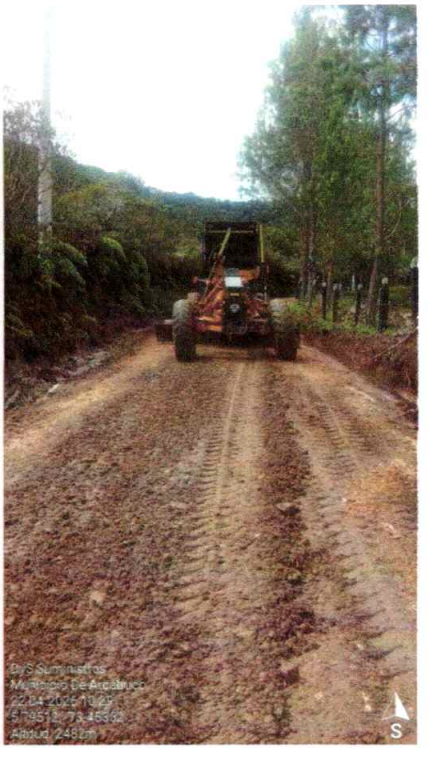






CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES



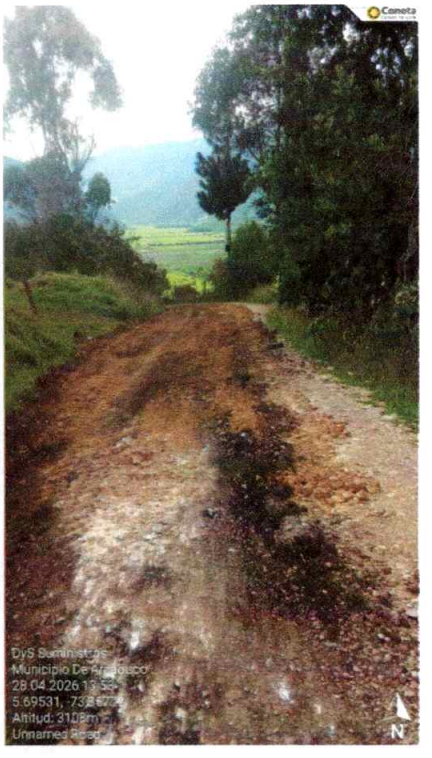






CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES








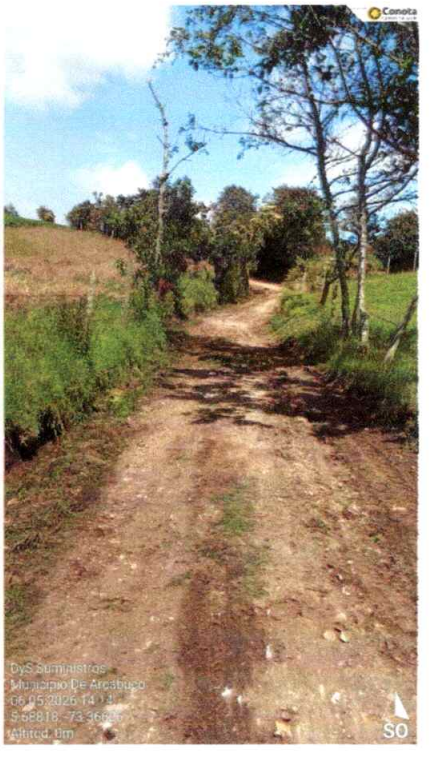



CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

2. REGISTRO FOTOGRAFICO TRANSPORTE DE MATERIAL

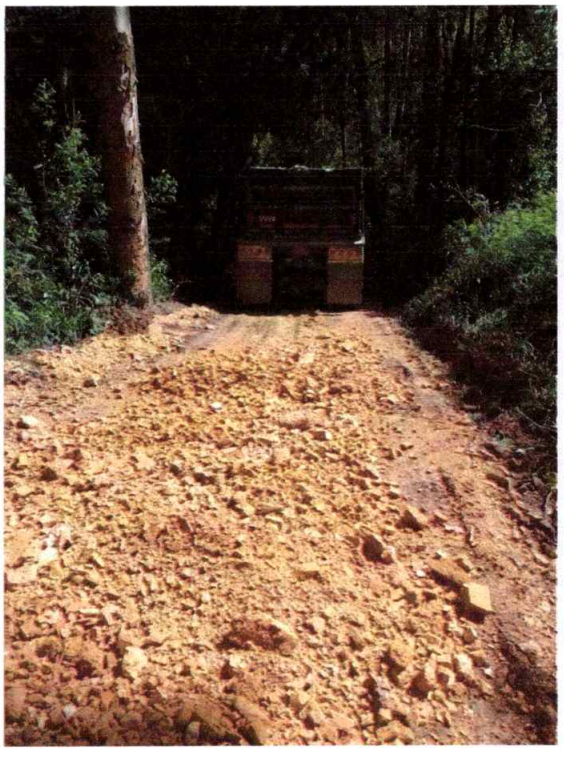

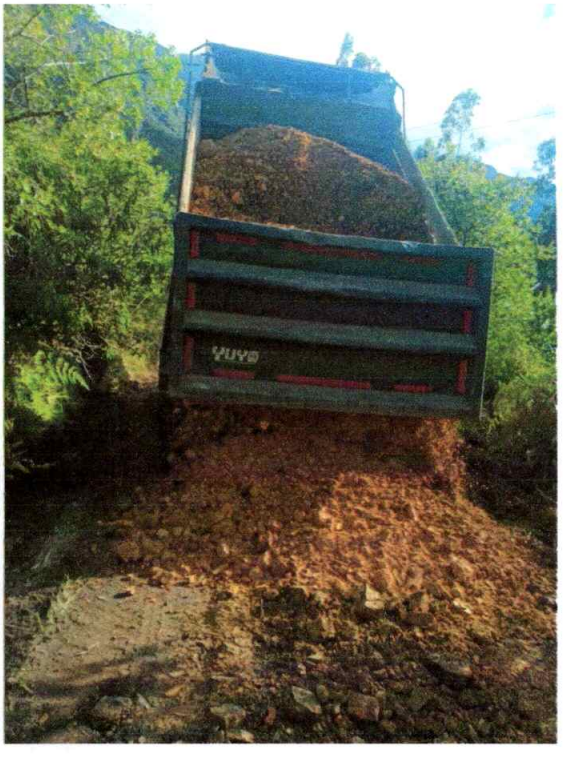


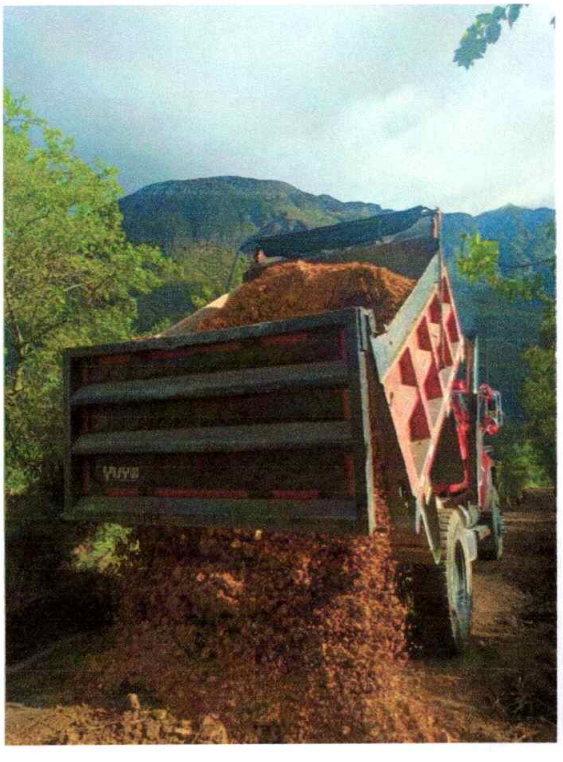





CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

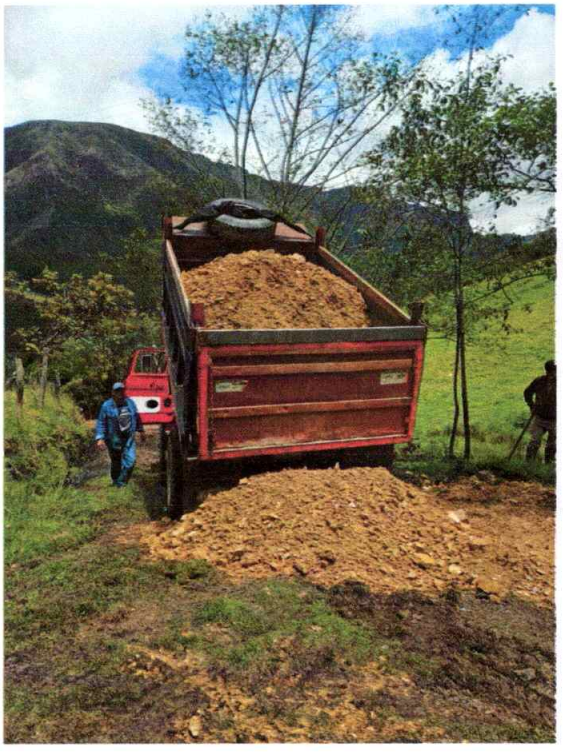

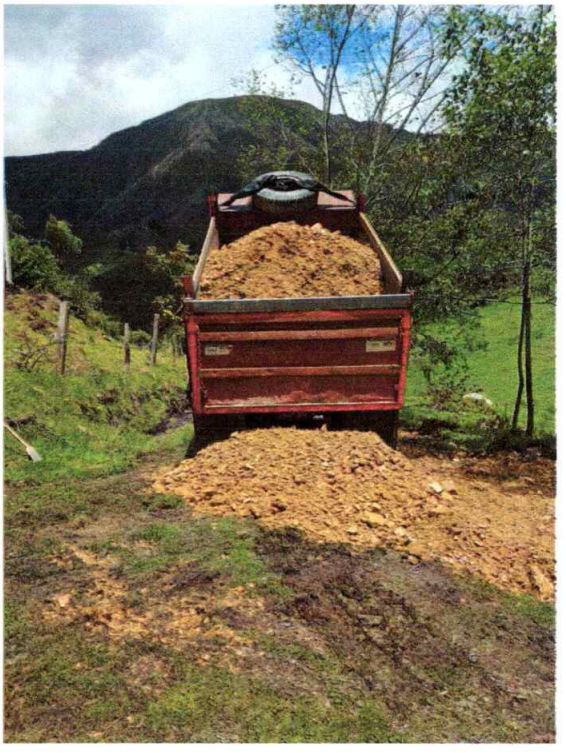


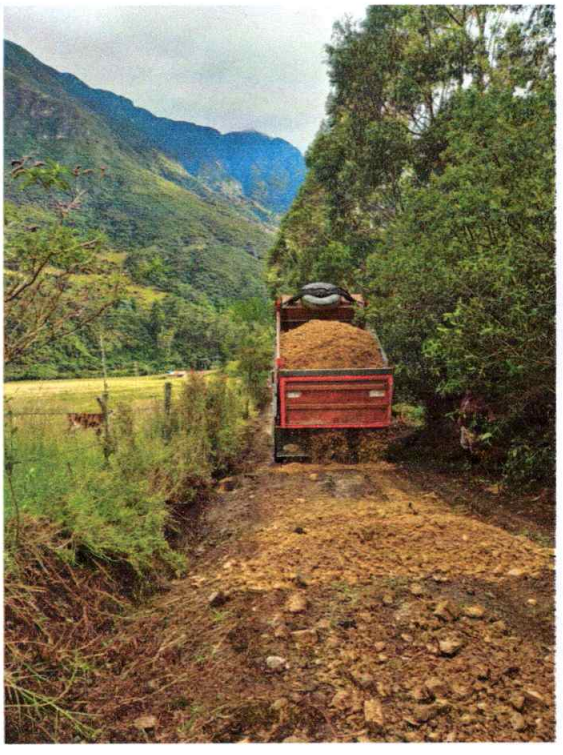





CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

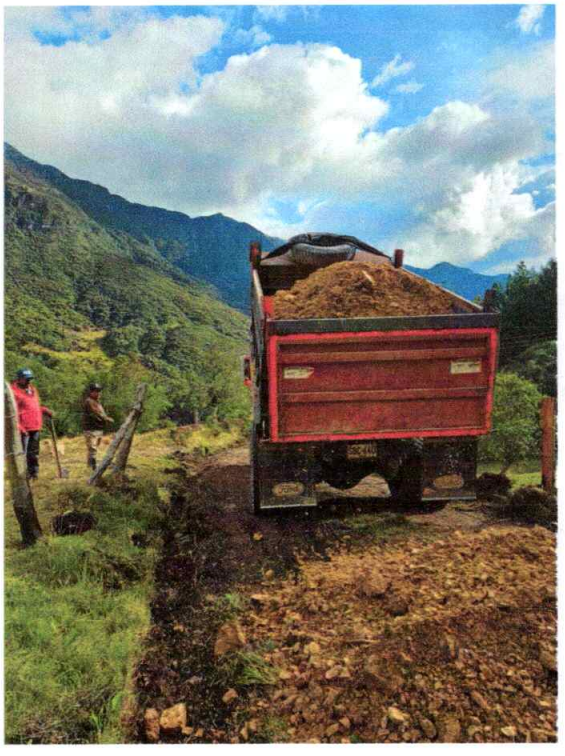

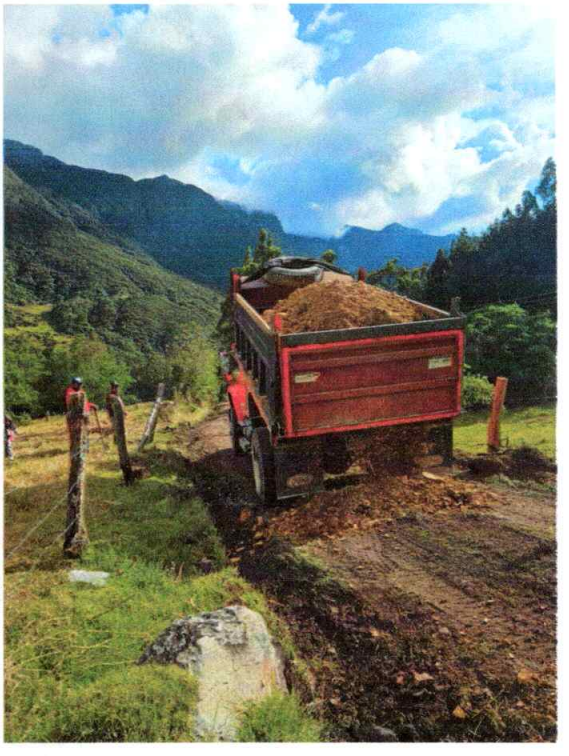


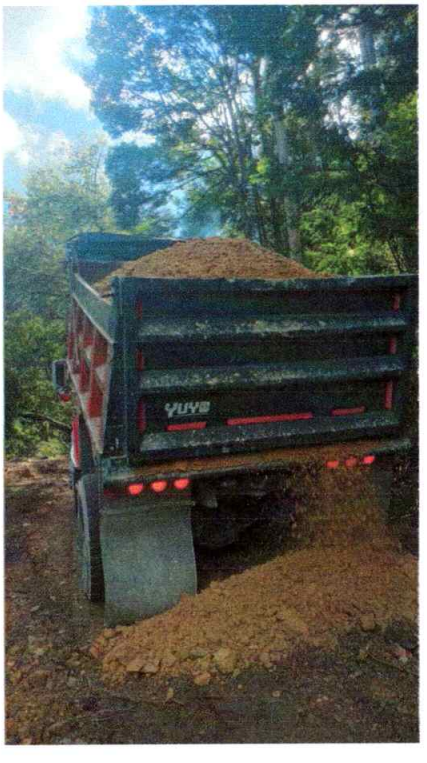




CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

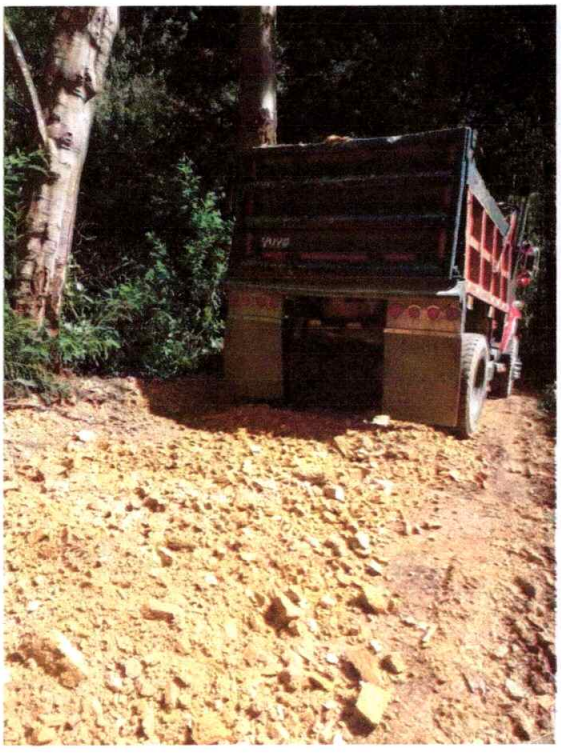



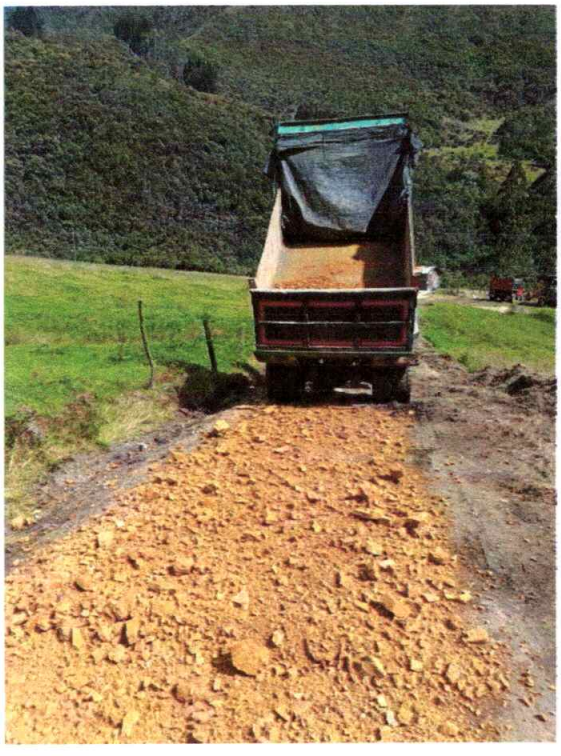




CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES








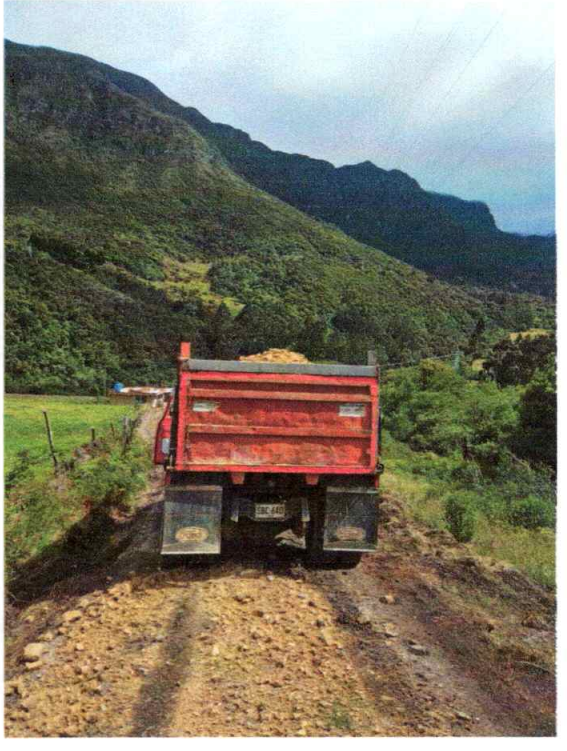



CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

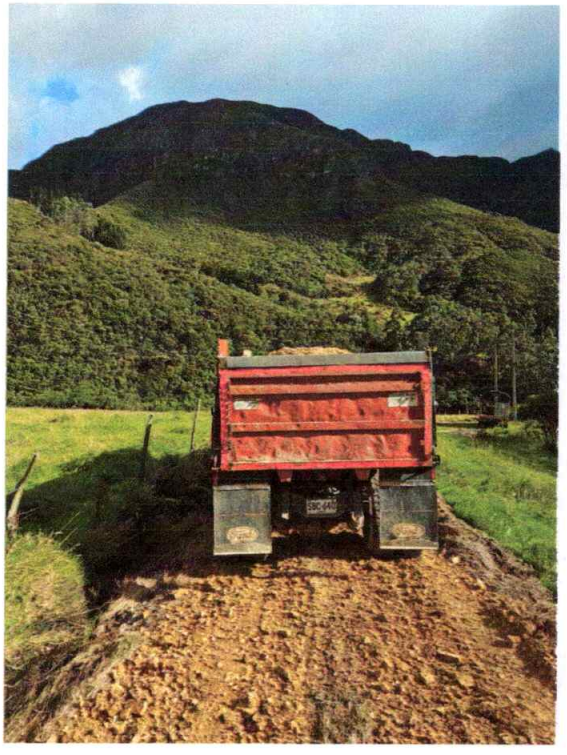




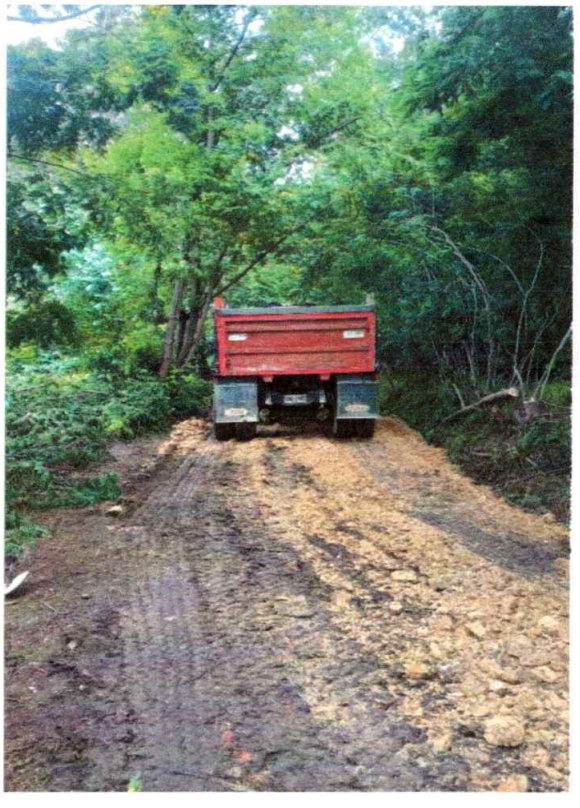

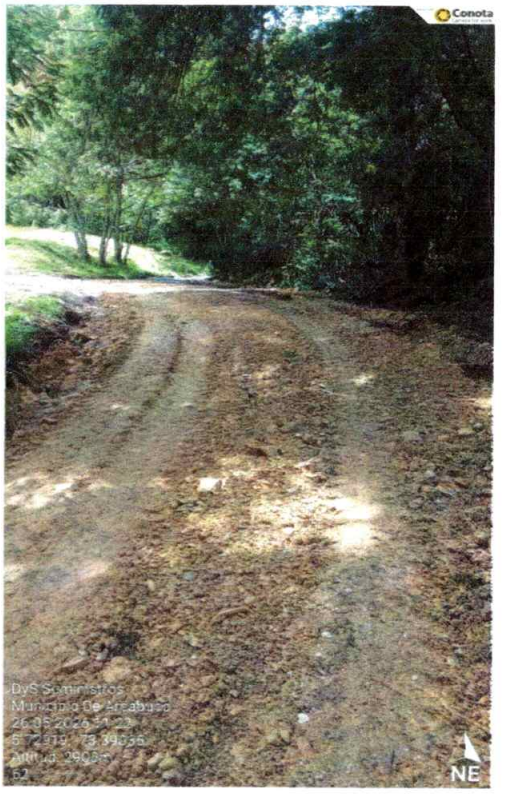

CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

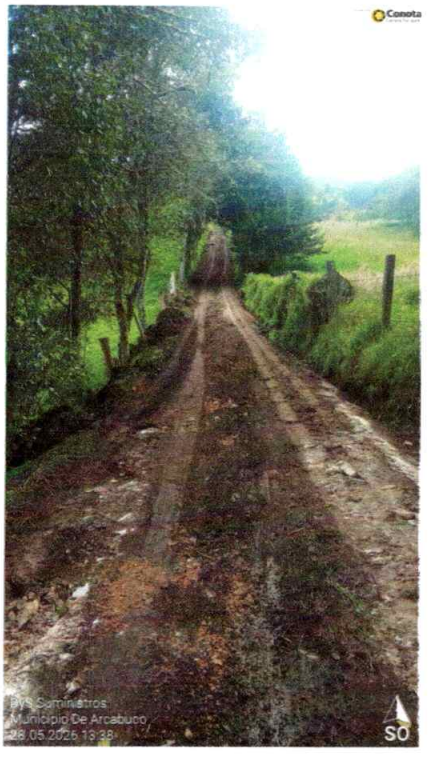








CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES



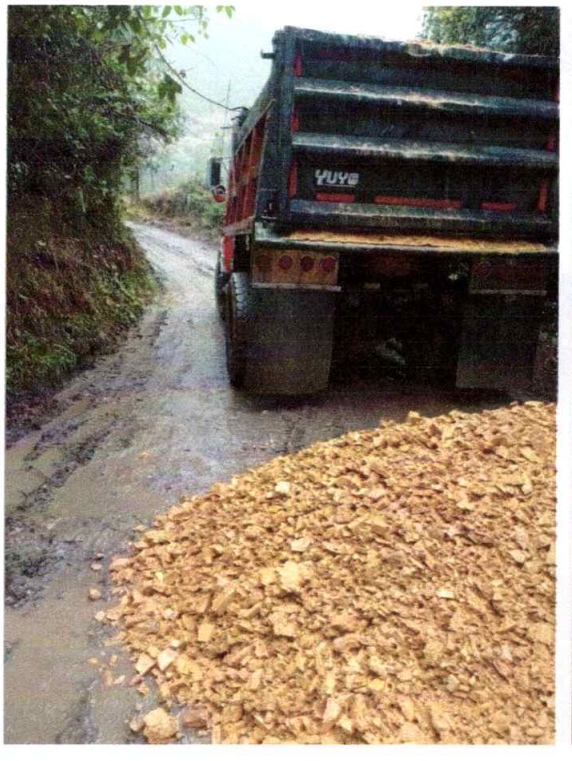



CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES








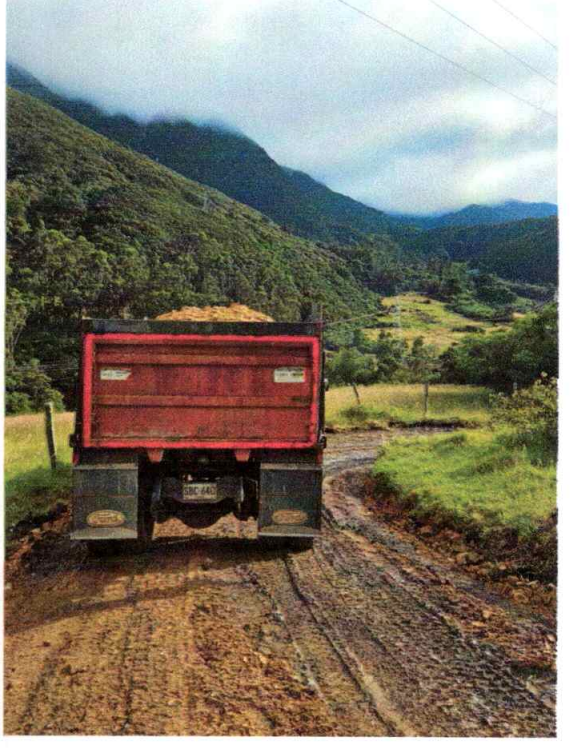

CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES



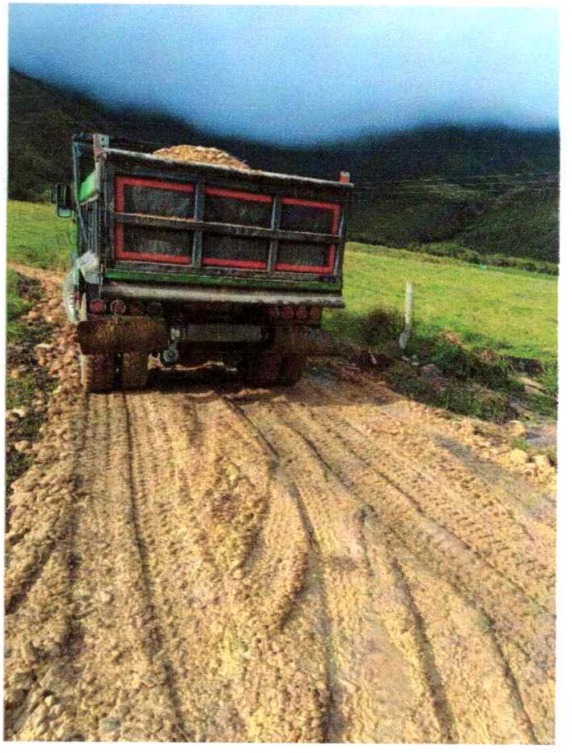






CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

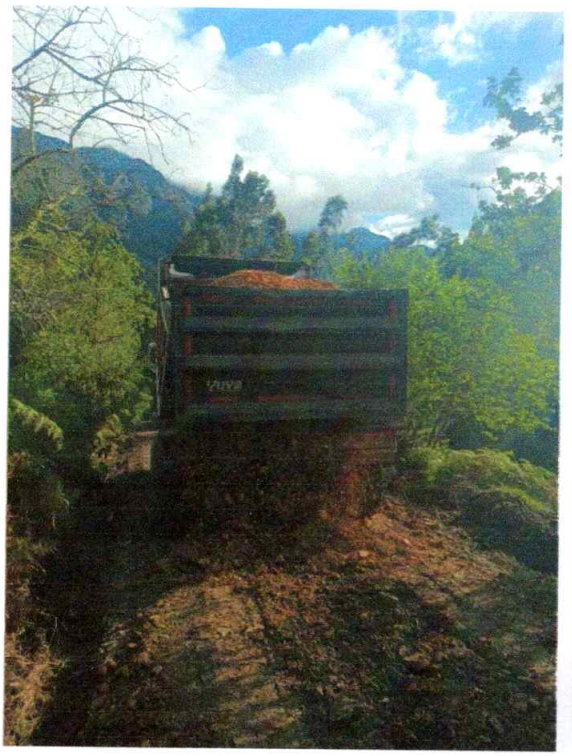



CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1406

DÍA	MES	AÑO
27	04	26

CLIENTE: Municipio de Arcabuco
OBRA: Mantenimiento de vias
EQUIPO: Motoniveladora ACPM:
H/TRO INICIAL: 4129,5 H/TRO FINAL: 4136,4 HORAS TRABAJADAS: 6.9
DIRECCIÓN: Vereda Peñas Blancas
OBSERVACIONES:

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR
FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: SALOMON HERNANDEZ
CARGO: COMUNIDAD
FIRMA:

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1407

DÍA	MES	AÑO
28	04	26

CLIENTE: Municipio de Arcabuco
OBRA: Mantenimiento de vias
EQUIPO: Motoniveladora ACPM:
H/TRO INICIAL: 4136.4 H/TRO FINAL: 4140.7 HORAS TRABAJADAS: 4.3
DIRECCIÓN: Vereda Peñas Blancas
OBSERVACIONES:

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR
FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: SALOMON HERNANDEZ
CARGO: COMUNIDAD
FIRMA:

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1408

DÍA	MES	AÑO
29	04	26

CLIENTE: Alcaldia de Arcabuco
OBRA: mantenimiento de vias
EQUIPO: Motoniveladora ACPM:
H/TRO INICIAL: 4140.9 H/TRO FINAL: 4147.2 HORAS TRABAJADAS: 6.3
DIRECCIÓN: Vereda Peñas Blancas
OBSERVACIONES:

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR
FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: SALOMON HERNANDEZ
CARGO: COMUNIDAD
FIRMA:

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1409

DÍA	MES	AÑO
30	04	26

CLIENTE: Municipio de Arcabuco
OBRA: Mantenimiento vias
EQUIPO: Motoniveladora ACPM:
H/TRO INICIAL: 4147.2 H/TRO FINAL: 4152.4 HORAS TRABAJADAS: 5.2
DIRECCIÓN: Vereda Peñas Blancas
OBSERVACIONES:

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR
FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: SALOMON HERNANDEZ
CARGO: COMUNIDAD
FIRMA:

Scanned with CamScanner

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1410

CLIENTE Municipio de Arcabuco

OBRA Mantenimiento de vias

EQUIPO Motoniveladora ACPM

DÍA	MES	AÑO
02	05	26

H/TRO INICIAL 4152.4 H/TRO FINAL 4158 HORAS TRABAJADAS 5.6

DIRECCIÓN Vereda Peñas Blancas

OBSERVACIONES:

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR

FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: SALOMON HERNANDEZ

CARGO: COMUNIDAD

FIRMA:

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1411

CLIENTE Municipio de Arcabuco

OBRA Mantenimiento de vias

EQUIPO Motoniveladora ACPM

DÍA	MES	AÑO
04	05	26

H/TRO INICIAL 4158 H/TRO FINAL 4163.5 HORAS TRABAJADAS 5.5

DIRECCIÓN Vereda Peñas Blancas

OBSERVACIONES:

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR

FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: SALOMON HERNANDEZ

CARGO: COMUNIDAD

FIRMA:

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1412

CLIENTE Municipio de Arcabuco

OBRA Mantenimiento de vias

EQUIPO Motoniveladora ACPM

DÍA	MES	AÑO
05	05	26

H/TRO INICIAL 4163.5 H/TRO FINAL 4169.6 HORAS TRABAJADAS 6.1

DIRECCIÓN Vereda Peñas Blancas

OBSERVACIONES:

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR

FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: SALOMON HERNANDEZ

CARGO: COMUNIDAD

FIRMA:

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1413

CLIENTE Municipio de Arcabuco

OBRA Mantenimiento de vias

EQUIPO Motoniveladora ACPM

DÍA	MES	AÑO
06	05	26

H/TRO INICIAL 4170 H/TRO FINAL 4173.9 HORAS TRABAJADAS 3.9

DIRECCIÓN Vereda Peñas Blancas

OBSERVACIONES:

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR

FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: SALOMON HERNANDEZ

CARGO: COMUNIDAD

FIRMA:

Scanned with CamScanner

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1414

CLIENTE Municipio de Arcabuco

OBRA Mantenimiento de vias

EQUIPO Motoniveladora ACPM

H/TRO INICIAL 4173.9 H/TRO FINAL 4178.6 HORAS TRABAJADAS 4.7

DIRECCIÓN Vereda Peñat Blancas

OBSERVACIONES:

DÍA	MES	AÑO
07	05	26

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR

FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: SALOMON HERNANDEZ

CARGO: COMUNIDAD

FIRMA:

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1415

CLIENTE Municipio de Arcabuco

OBRA Mantenimiento de vias

EQUIPO Motoniveladora ACPM

H/TRO INICIAL 4178.6 H/TRO FINAL 4184 HORAS TRABAJADAS 5.4

DIRECCIÓN

OBSERVACIONES:

DÍA	MES	AÑO
08	05	26

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR

FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: Anatolio Hernandez

CARGO: Comunidad

FIRMA: Anatolio

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1416

CLIENTE Municipio de Arcabuco

OBRA Mantenimiento de vias

EQUIPO Motoniveladora ACPM

H/TRO INICIAL 4184 H/TRO FINAL 4189 HORAS TRABAJADAS 5.9

DIRECCIÓN Vereda Peñat Blancas

OBSERVACIONES:

DÍA	MES	AÑO
09	05	26

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR

FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: Anatolio Hernandez

CARGO: Comunidad

FIRMA: Anatolio

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1417

CLIENTE Municipio de Arcabuco

OBRA Mantenimiento de vias

EQUIPO Motoniveladora ACPM

H/TRO INICIAL 4190.2 H/TRO FINAL 4196.2 HORAS TRABAJADAS 6

DIRECCIÓN Vereda Peñat Blancas

OBSERVACIONES:

DÍA	MES	AÑO
11	05	26

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR

FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: Anatolio Hernandez

CARGO: Comunidad

FIRMA: Anatolio

Scanned with CamScanner

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1418

DÍA	MES	AÑO
12	05	26

CLIENTE: Municipio de Arcabuco
OBRA: Mantenimiento de vías
EQUIPO: Motoniveladora ACPM:
H/TRO INICIAL: 4196.3 H/TRO FINAL: 4202.9 HORAS TRABAJADAS: 6.6
DIRECCIÓN: Vereda Rapaquita
OBSERVACIONES:

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR
FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: Yeison Aguilar
CARGO: Comunidad
FIRMA:

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1419

DÍA	MES	AÑO
13	05	26

CLIENTE: Municipio de Arcabuco
OBRA: Mantenimiento de vías
EQUIPO: Motoniveladora ACPM:
H/TRO INICIAL: 4202.9 H/TRO FINAL: 4207.7 HORAS TRABAJADAS: 4.8
DIRECCIÓN: Vereda Rapaquita
OBSERVACIONES:

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR
FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: Yeison Aguilar
CARGO: Comunidad
FIRMA:

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1420

DÍA	MES	AÑO
14	05	26

CLIENTE: Municipio de Arcabuco
OBRA: Mantenimiento de vías
EQUIPO: Motoniveladora ACPM:
H/TRO INICIAL: 4207.9 H/TRO FINAL: 4213.3 HORAS TRABAJADAS: 5.4
DIRECCIÓN: Vereda Rapaquita
OBSERVACIONES:

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR
FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: Yeison Aguilar
CARGO: Comunidad
FIRMA:

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1421

DÍA	MES	AÑO
15	05	26

CLIENTE: Municipio de Arcabuco
OBRA: Mantenimiento de vías
EQUIPO: Motoniveladora ACPM:
H/TRO INICIAL: 4213.5 H/TRO FINAL: 4219.4 HORAS TRABAJADAS: 5.9
DIRECCIÓN: Vereda Rapaquita
OBSERVACIONES:

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR
FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: Yeison Aguilar
CARGO: Comunidad
FIRMA:

Scanned with CamScanner

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1422

DÍA	MES	AÑO
16	05	26

CLIENTE Municipio de Arcabuco
OBRA Mantenimiento de vías
EQUIPO Motoniveladora ACPM
H/TRO INICIAL 4219.6 H/TRO FINAL 4225.1 HORAS TRABAJADAS 5.5
DIRECCIÓN Vereda Rabanta
OBSERVACIONES:

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR
FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: Yeison Aguilar
CARGO: comunidad
FIRMA:

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1423

DÍA	MES	AÑO
19	05	26

CLIENTE Municipio de Arcabuco
OBRA Mantenimiento de vías
EQUIPO Motoniveladora ACPM
H/TRO INICIAL 4225.2 H/TRO FINAL 4231.8 HORAS TRABAJADAS 6.6
DIRECCIÓN Vereda Rabanta
OBSERVACIONES:

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR
FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: Yeison Aguilar
CARGO: comunidad
FIRMA:

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1424

DÍA	MES	AÑO
20	05	26

CLIENTE Municipio de Arcabuco
OBRA Mantenimiento de vías
EQUIPO Motoniveladora ACPM
H/TRO INICIAL 4231.9 H/TRO FINAL 4238.1 HORAS TRABAJADAS 6.2
DIRECCIÓN Vereda Rabanta
OBSERVACIONES:

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR
FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: Yeison Aguilar
CARGO: comunidad
FIRMA:

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1425

DÍA	MES	AÑO
21	05	26

CLIENTE Municipio de Arcabuco
OBRA Mantenimiento de vías
EQUIPO Motoniveladora ACPM
H/TRO INICIAL 4238.7 H/TRO FINAL 4244.9 HORAS TRABAJADAS 6.2
DIRECCIÓN Vereda Rabanta
OBSERVACIONES:

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR
FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: Yeison Aguilar
CARGO: comunidad
FIRMA:

Scanned with CamScanner

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1426

CLIENTE Municipio de Arcabuco

DÍA	MES	AÑO
22	05	26

OBRA Mantenimiento de vías

EQUIPO Motoniveladora ACPM

H/TRO INICIAL 1763.9 H/TRO FINAL 1766.6 HORAS TRABAJADAS 6.2

DIRECCIÓN Vereda Rufaurta

OBSERVACIONES:

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR

FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: Yeison Aguilar

CARGO: Comunidad

FIRMA:

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1427

CLIENTE Municipio de Arcabuco

DÍA	MES	AÑO
23	05	26

OBRA Mantenimiento de vías

EQUIPO Motoniveladora ACPM

H/TRO INICIAL 1766.6 H/TRO FINAL 1774.9 HORAS TRABAJADAS 8.3

DIRECCIÓN Vereda Rufaurta

OBSERVACIONES:

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR

FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: Yeison Aguilar

CARGO: Comunidad

FIRMA:

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1428

CLIENTE Municipio de Arcabuco

DÍA	MES	AÑO
25	05	26

OBRA Mantenimiento de vías

EQUIPO Motoniveladora ACPM

H/TRO INICIAL 1774.9 H/TRO FINAL 1778.4 HORAS TRABAJADAS 7.4

DIRECCIÓN Vereda Rufaurta

OBSERVACIONES:

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR

FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: Yeison Aguilar

CARGO: Comunidad

FIRMA:

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1429

CLIENTE Municipio de Arcabuco

DÍA	MES	AÑO
26	05	26

OBRA Mantenimiento de vías

EQUIPO Motoniveladora ACPM

H/TRO INICIAL 1778.4 H/TRO FINAL 1781.9 HORAS TRABAJADAS 7.2

DIRECCIÓN Vereda Rufaurta

OBSERVACIONES:

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR

FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: Yeison Aguilar

CARGO: Comunidad

FIRMA:

Scanned with CamScanner

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1430

DÍA	MES	AÑO
27	05	26

CLIENTE Municipio de Aracataca
OBRA Mantenimiento de vías
EQUIPO Motoniveladora ACPM
H/TRO INICIAL 7781.8 H/TRO FINAL 7787.4 HORAS TRABAJADAS 7.2
DIRECCIÓN Vereda Rafaelito
OBSERVACIONES:

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR
FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: Yeison Aguilar
CARGO: Comunidad
FIRMA:

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1431

DÍA	MES	AÑO
28	05	26

CLIENTE Municipio de Aracataca
OBRA Mantenimiento de vías
EQUIPO Motoniveladora ACPM
H/TRO INICIAL 7787.4 H/TRO FINAL 7792.7 HORAS TRABAJADAS 7.1
DIRECCIÓN Vereda Rafaelito
OBSERVACIONES:

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR
FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: Yeison Aguilar
CARGO: Comunidad
FIRMA:

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1432

DÍA	MES	AÑO
29	05	26

CLIENTE Municipio de Aracataca
OBRA Mantenimiento de vías
EQUIPO Motoniveladora ACPM
H/TRO INICIAL 7792.7 H/TRO FINAL 7799.9 HORAS TRABAJADAS 6.8
DIRECCIÓN Casa Blanca
OBSERVACIONES:

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR
FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: Yeison Aguilar
CARGO: Comunidad
FIRMA:

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

Nº 1433

DÍA	MES	AÑO
30	05	26

CLIENTE Municipio de Aracataca
OBRA Mantenimiento de vías.
EQUIPO Motoniveladora ACPM
H/TRO INICIAL 7799.9 H/TRO FINAL 1805 HORAS TRABAJADAS 5.1.
DIRECCIÓN Casa Blanca
OBSERVACIONES:

ENCARGADO EQUIPO

NOMBRE: VICTOR TOVAR
FIRMA: VICTOR TOVAR

ENCARGADO EN OBRA

NOMBRE: Yeison Aguilar
CARGO: Comunidad
FIRMA:

Scanned with CamScanner

REGISTRO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO

CONTRATO
N° SA-SI-MA-003-2026

"SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE MAQUINARIA, CONFORME A FICHA TECNICA, ORIENTADO AL MANTENIMINETO, ADECUACION Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICPIO DE ARCABUCO BOYACÁ"

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

FECHA	ORIGEN	DESTINO	CANTIDAD KM	CANTIDAD M3	M3/KM	FIRMA QUIEN RECIBE MATERIAL
27-04-26	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS.	23	7	161	
27-04-2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161	
27-04-2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161	
28-04-2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161	
28-04-2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	18.	7	126	
28-04-2026	CANTERA COMBITA	MONTE SUAREZ	23.	7	161	
29-04-2026	CANTERA COMBITA	MONTE SUAREZ	21	7	147	
29-04-2026	CANTERA COMBITA	MONTE SUAREZ	22	7	154	
29-04-2026	CANTERA COMBITA	MONTE SUAREZ	23	7	161	
30-04-2026	CANTERA COMBITA	MONTE SUAREZ	22.	7	154	
30-04-2026	CANTERA COMBITA	MONTE SUAREZ	30.5	7	213.5	
30-04-2026	CANTERA COMBITA	MONTE SUAREZ	22	7	154.	
04-05-2026	CANTERA COMBITA	MONTE SUAREZ	23	7	161	
TOTAL, MATERIAL TRANSPORTADO					2075.5	

Superviso:

Reviso y aprobo:

REGISTRO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO

CONTRATO
N° SA-SI-MA-003-2026

"SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE MAQUINARIA, CONFORME A FICHA TECNICA, ORIENTADO AL MANTENIMINETO, ADECUACION Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICPIO DE ARCABUCO BOYACÁ"

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

FECHA	ORIGEN	DESTINO	CANTIDAD KM	CANTIDAD M3	M3/KM	FIRMA QUIEN RECIBE MATERIAL
04-05-2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS.	24.	7	168.	
04-05-2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	18	7	126	
05-05-2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	18	7	126	
05-05-2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161	
05-05-2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	21	7	147	
06-05-2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	22.	7	154	
06-05-2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	22.	7	154.	
06-05-2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS.	21	7	147	
07-05-2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	22	7	154.	
07-05-2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS.	23	7	161	
07-05-2026	RECEBERA COMBITA	MONTE SUAREZ	30	7	210	Libardo Vargas.
07-05-2026	RECEBERA COMBITA	MONTE SUAREZ	30	7	210.	Libardo Vargas
08-05-2026	RECEBERA COMBITA	MONTE SUAREZ	30.5	7	213.5	Libardo Vargas.
TOTAL, MATERIAL TRANSPORTADO					2131.5	

Superviso:

Reviso y aprobo:

REGISTRO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO

CONTRATO
N° SA-SI-MA-003-2026

"SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE MAQUINARIA, CONFORME A FICHA TECNICA, ORIENTADO AL MANTENIMINETO, ADECUACION Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICPIO DE ARCABUCO BOYACÁ"

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

FECHA	ORIGEN	DESTINO	CANTIDAD KM	CANTIDAD M3	M3/KM	FIRMA QUIEN RECIBE MATERIAL
08-05-2026	RECEBERA COMBITA	MONTE SUAREZ	30.5	7	213.5	
08-05-2026	RECEBERA COMBITA	MONTE SUAREZ.	30.5	7	213.5	
09-05-2026	RECEBERA COMBITA	MONTE SUAREZ	30.5	7	213.5	
09-05-2026	RECEBERA COMBITA	MONTE SUAREZ.	57	7	399	
11-05-2026	RECEBERA COMBITA	MONTE SUAREZ.	57	7	399	
12-05-2026	CANTERA COMBITA	RUPAHITA - LA CANTERA.	17	7	119	
12-05-2026	CANTERA - COMBITA	RUPAHITA - LA CANTERA	17	7	119.	
12-05-2026	CANTERA - COMBITA	RUPAHITA - LA CANTERA	17	7	119	
15-05-2026	ACOPIO - ARCABUCO	RUPAHITA	12	7	84	
15-05-2026	ACOPIO - ARCABUCO	RUPAHITA	12	7	84	
15-05-2026	ACOPIO - ARCABUCO	RUPAHITA	12	7	84	
15-05-2026	ACOPIO - ARCABUCO	RUPAHITA	12	7	84	
15-05-2026	ACOPIO - ARCABUCO	RUPAHITA	12	7	84	
1	TOTAL, MATERIAL TRANSPORTADO				2215.5	

Superviso:

Reviso y aprobo:

REGISTRO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO

CONTRATO
N° SA-SI-MA-003-2026

"SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE MAQUINARIA, CONFORME A FICHA TECNICA, ORIENTADO AL MANTENIMIMINETO, ADECUACION Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICPIO DE ARCABUCO BOYACÁ"

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

FECHA	ORIGEN	DESTINO	CANTIDAD KM	CANTIDAD M3	M3/KM	FIRMA QUIEN RECIBE MATERIAL
15-05-2026	ACOPIO - ARCABUCO	RUPAVITA	12	7	84	
16-05-2026	ACOPIO - ARCABUCO	RUPAVITA	12	7	84	
16-05-2026	ACOPIO - ARCABUCO	RUPAVITA	12	7	84	
16-05-2026	ACOPIO - ARCABUCO	RUPAVITA	12	7	84	
16-05-2026	ACOPIO - ARCABUCO	RUPAVITA	12	7	84	
16-05-2026	ACOPIO - ARCABUCO	RUPAVITA	12	7	84	
16-05-2026	ACOPIO - ARCABUCO	RUPAVITA	12	7	84	
19-05-2026	CANTERA - COMBITA	RUPAVITA	14	7	98	
19-05-2026	CANTERA - COMBITA	RUPAVITA	14	7	98	
19-05-2026	CANTERA - COMBITA	RUPAVITA	14	7	98	
20-05-2026	CANTERA - COMBITA	RUPAVITA	14	7	98	
20-05-2026	CANTERA - COMBITA	RUPAVITA	14	7	98	
20-05-2026	CANTERA - COMBITA	RUPAVITA	14	7	98	
TOTAL, MATERIAL TRANSPORTADO					1176	

Superviso:

Reviso y aprobo:

REGISTRO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO

CONTRATO
N° SA-SI-MA-003-2026

"SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE MAQUINARIA, CONFORME A FICHA TECNICA, ORIENTADO AL MANTENIMINETO, ADECUACION Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICPIO DE ARCABUCO BOYACÁ"

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

FECHA	ORIGEN	DESTINO	CANTIDAD KM	CANTIDAD M3	M3/KM	FIRMA QUIEN RECIBE MATERIAL
20-05-2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA	14	7	98.	
20-05-2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161	
21-05-2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	21	7	147.	
21-05-2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA	14	7	98	
21-05-2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA	14.	7	98.	
21-05-2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA — LA CANTERA	15.5	7	108.5	
21-05-2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA — LA CANTERA	15.5	7	108.5	
22-05-2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161	
22-05-2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA — LA CANTERA	15.5	7	108.5	
22-05-2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA — LA CANTERA	15.5	7	108.5	
22-05-2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA - LA CANTERA.	15.5	7	108.5	
22-05-2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA - LA CANTERA	15.5	7	108.5	
22-05-2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA - LA CANTERA	15.5	7	108.5	
TOTAL, MATERIAL TRANSPORTADO					1522.5	

Superviso:

Reviso y aprobo:

REGISTRO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO

CONTRATO
N° SA-SI-MA-003-2026

"SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE MAQUINARIA, CONFORME A FICHA TECNICA, ORIENTADO AL MANTENIMINETO, ADECUACION Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICPIO DE ARCABUCO BOYACÁ"

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

FECHA	ORIGEN	DESTINO	CANTIDAD KM	CANTIDAD M3	M3/KM	FIRMA QUIEN RECIBE MATERIAL
23-05-2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA - LA CANTERA	15.5	7	108.5	
23-05-2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA - LA CANTERA	15.5	7	108.5	
23-05-2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA - LA CANTERA	15.5	7	108.5	
23-05-2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161	
23-05-2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	23	7	161	
25-05-2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA - LA CANTERA	15.5	7	108.5	
25-05-2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA - LA CANTERA	15.5	7	108.5	
25-05-2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA - LA CANTERA	15.5	7	108.5	
25-05-2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA - LA CANTERA	15.5	7	108.5	
25-05-2026	CANTERA COMBITA	RUPAVITA - LA CANTERA	15.5	7	108.5	
26-05-2026	ACOPIO - ARCABUCO	VDA QUEMADOS	5.8	7	40.6	
26-05-2026	ACOPIO - ARCABUCO	VDA QUEMADOS	5.8	7	40.6	
26-05-2026	ACOPIO - ARCABUCO	VDA QUEMADOS	5.8	7	40.6	
TOTAL, MATERIAL TRANSPORTADO					1311.8	

Superviso:

Reviso y aprobo:

REGISTRO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO

CONTRATO
N° SA-SI-MA-003-2026

"SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE MAQUINARIA, CONFORME A FICHA TECNICA, ORIENTADO AL MANTENIMINETO, ADECUACION Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICPIO DE ARCABUCO BOYACÁ"

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

FECHA	ORIGEN	DESTINO	CANTIDAD KM	CANTIDAD M3	M3/KM	FIRMA QUIEN RECIBE MATERIAL
26-05-2026	ACOPIO - ARCABUCO	VDA QUEMADOS	5.8	7	40.6	
26-05-2026	CANTERA COMBITA	VDA RUPAVITA	16	7	112	
27-05-2026	CANTERA COMBITA	VDA RUPAVITA	16	7	112	
27-05-2026	RECESERA COMBITA	VDA QUIVAQUIRA	12	7	84	
27-05-2026	RECESERA COMBITA	VDA QUIVAQUIRA	12	7	84	
28-05-2026	RECESERA COMBITA	MONTESUAREZ	30.5	7	213.5	
28-05-2026	RECESERA COMBITA	VDA RUPAVITA	14.5	7	101.5	
28-05-2026	RECESERA COMBITA	VDA QUIVAQUIRA	12	7	84	
28-05-2026	RECESERA COMBITA	VDA QUIVAQUIRA	12	7	84	
29-05-2026	RECESERA COMBITA	VDA RUPAVITA	14.5	7	101.5	
29-05-2026	RECESERA COMBITA	VDA QUIVAQUIRA	12	7	84	
30-05-2026	CANTERA COMBITA	PEÑAS BLANCAS	25.5	7	178.5	
TOTAL, MATERIAL TRANSPORTADO					1279.6	

Superviso:

Reviso y aprobo:
