INFORME DE AVANCE DE OBRA No. 3

27 de enero – 18 de febrero de 2026

CONVENIO No. SEMS-ES-CA-057-2025

PROYECTO

“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ampliar la cobertura del servicio de gas combustible por redes, a través de la construcción del sistema de distribución y la financiación del cargo por conexión y la red interna, para usuarios del municipio de Silvania del departamento de Cundinamarca.”

ACTA DE INICIO 19 DE NOVIEMBRE DE 2025

INFORME DE AVANCE DE OBRA No. 3

27 de enero – 18 de febrero de 2026

CONVENIO No. SEMS-ES-CA-057-2025

PROYECTO

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ampliar la cobertura del servicio de gas combustible por redes, a través de la construcción del sistema de distribución y la financiación del cargo por conexión y la red interna, para usuarios del municipio de Silvania del departamento de Cundinamarca."

ACTA DE INICIO 19 DE NOVIEMBRE DE 2025

INFORME DE AVANCE DE OBRA No. 3

27 de enero – 18 de febrero de 2026

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 5
OBJETO DEL CONVENIO 5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
4. ALCANCE DEL PROYECTO. 7
5. INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL EN OBRA 12
5. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATO 15
5.1 CONTRATISTA 15
5.2 SUPERVISIÓN 15
5.3 INTERVENTOR 15
6. DATOS DEL CONVENIO 16
7. ACTAS DEL CONTRATO 17
8. CONTROL DE POLIZAS 17
9. CONCLUSIONES 18

1. INTRODUCCIÓN

Durante el desarrollo de las actividades que dan cumplimiento a lo establecido en el convenio No. SEMS-ES-CA-057-2025, celebrado entre el Departamento de Cundinamarca – Secretaría De Energía Y Minería Sostenible y Distriservicios S.A.S. E.S.P para transferencia de recursos destinados a subsidios para usuarios del servicio de gas combustible por redes. Iniciando la realización de la obra el 19 de noviembre de 2025. En el presente informe de avance de obra con fecha del 27 de enero al 18 de febrero de 2026, se presentan las actividades programadas y a su vez el desarrollo y control que se asumió para llevar a cabo las mismas de acuerdo con los parámetros establecidos en el proyecto con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ampliar la cobertura del servicio de gas combustible por redes, a través de la construcción del sistema de distribución y la financiación del cargo por conexión y la red interna, para usuarios del municipio de Silvania del departamento de Cundinamarca.”

El convenio No. SEMS-ES-CA-057-2025, se suscribió entre el Departamento de Cundinamarca – Secretaría De Energías Y Minería Sostenible y el representante legal de DISTRISERVICIOS SAS ESP. Hernán Darío Huertas Murcia con Número de Cedula: 1.070.584.730 de Girardot Cundinamarca, para la gasificación de las veredas: Noruega Alta, San Luis Alto, Jalisco, Victoria Alta, Agua Bonita y Santa Rita Alta que beneficiarán a 1.033 familias de usuarios residenciales del municipio de Silvania, Cundinamarca.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONVENIO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ampliar la cobertura del servicio de gas combustible por redes, a través de la construcción del sistema de distribución y la financiación del cargo por conexión y la red interna, para usuarios del municipio de Silvania del departamento de Cundinamarca.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Realizar las actividades de acuerdo con los parámetros establecidos en el convenio No. SEMS-ES-CA-057-2025, celebrado entre el Departamento de Cundinamarca – Secretaría De Energías Y Minería Sostenible y Distriservicios S.A.S. E.S.P para transferencia de recursos destinados a subsidios para usuarios del servicio de gas combustible por redes.

2. Generar beneficio concreto para la comunidad de las veredas Noruega Alta, San Luis Alto, Jalisco, Victoria Alta, Agua Bonita y Santa Rita Alta del Municipio de Silvania, mejorando la calidad de vida de la población.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La baja cobertura del servicio de gas combustible por redes en la zona rural del municipio de Silvania, Cundinamarca ha ocasionado que las veredas Noruega Alta, San Luis Alto, Jalisco, Victoria Alta, Agua Bonita y Santa Rita Alta no cuenten con servicio de gas combustible por redes, las fuentes alternativas para el reemplazo de este servicio fundamental son; Biomasa (leña), estufas eléctricas, a gasolina o ACPM y GLP en cilindro el cual es comercializado a un precio bastante alto y en periodos de tiempo extensos.

Es por esto por lo que el proyecto tiene como objetivo: aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ampliar la cobertura del servicio de gas combustible por redes, a través de la construcción del sistema de distribución y la financiación del cargo por conexión y la red interna, para usuarios del municipio de Silvania del departamento de Cundinamarca.

4. ALCANCE DEL PROYECTO.

El convenio No. SEMS-ES-CA-057-2025 **"CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES Y REDES INTERNAS PARA SUMINISTRO DE GLP EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA".** Se ha ejecutado de acuerdo con las especificaciones establecidas.

En el presente avance de obra, se construyeron 0.82 km de tubería de polietileno de ¾'' en zona verde, 0.20 km de tubería de polietileno de ¾'' en calzada concreto y 0.48 km de tubería de polietileno de 1'' en zona verde perteneciente a la red de distribución, siendo un total de 2.03km red construida hasta la fecha representando aproximadamente un 2.7% de avance del sistema de distribución del proyecto, un total de 97 usuarios fueron afiliados alcanzando a la fecha un total acumulado de 199 beneficiarios que ahora contarán con acceso al servicio y se construyó el cerramiento de la estación con capacidad de 4000 galones en la vereda Aguabonita.

EJECUCIÓN TERCER INFORME					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad por SEMS	Cantidad por Distriservicios ESP	Cantidad ejecutada
1	CONEXIONES A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1				
1.1	Acometida / Derecho de Conexión	Und	0,00	0,00	0,00
2	RED INTERNA A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1				
2.1	Red interna a usuarios residenciales estrato 1 (hasta 35 metros)	Und	0,00		0,00
3	REDES DE DISTRIBUCIÓN				
3.1	Tubería de Polietileno de 3/4" en Andén Concreto	Km	0,00	0,00	0,00
3.2	Tubería de Polietileno de 3/4" en Zona Verde	Km	0,00	0,82	1,35
3.3	Tubería de Polietileno de 3/4" en Calzada Concreto	Km	0,00	0,20	0,20
3.4	Tubería de Polietileno de 1" en Andén Concreto	Km	0,00	0,00	0,00
3.5	Tubería de Polietileno de 1" en Zona Verde	Km	0,00	0,48	0,48
3.6	Tubería de Polietileno de 1" en Calzada Concreto	Km	0,00	0,00	0,00
4	PASOS ESPECIALES				
4.1	Paso especial 30 – 35 metros	Und	0,00	0,00	0,00
4.2	Paso especial 15 – 20 metros	Und	0,00	0,00	0,00
4.3	Paso especial 10 – 15 metros	Und	0,00	0,00	0,00
4.4	Paso especial 5 – 10 metros	Und	0,00	0,00	0,00
4.5	Paso especial 0 – 5 metros	Und	0,00	0,00	0,00

5	ESTACION DE ALMACENAMIENTO				
5.1	Estación de almacenamiento de 4000 GL	Und	0,00	0,00	0,00

Las redes del sistema de distribución se encuentran georreferenciadas en la siguiente ubicación y se anexa el plano donde se visualizan las redes y los usuarios afiliados.

Consolidado Red Construida		
Diámetro	Descripción	Aporte Distriservicios Longitud (m)
1"	Zona Verde	480.0
3/4"	Zona Verde	820.0
3/4"	Calzada Concreto	200.0
Total		**1500.0**

Tramo	Diámetro	Descripción	Longitud (m)	Vereda	Coordenadas UTM (18N)				Aporte
					Inicio tramo		Final tramo		
					Norte	Este	Norte	Este	
T01-T02	3/4"	Zona Verde	717.0	Aguabonita	491054.52	574876.41	490362.96	574886.59	Distriservicios
T02-T03	3/4"	Calzada Concreto	200.0	Aguabonita	490362.96	574886.59	490171.73	574894.53	Distriservicios
T03-T04	3/4"	Zona Verde	103.0	Aguabonita	490171.73	574894.53	490169.65	574967.59	Distriservicios
T05-T06	1"	Zona Verde	480.0	Aguabonita	489960.69	574818.50	489960.60	574944.81	Distriservicios

A fecha de este informe, se ha realizado un total de 199 afiliaciones a usuarios de los cuales 51 se han realizado un avance constructivo de instalaciones internas, como se evidencia a continuación:

AFILIACIONES SILVANIA - CUNDINAMARCA			
VEREDA	VENTAS SIN CONSTRUIR	CONSTRUCCION SOLO INTERNA	TOTAL VENTAS
AGUA BONITA	40	51	91
SANTA RITA ALTA	35		35
VICTORIA ALTA	73		73
TOTAL	**148**	**51**	**199**

Se adjunta el listado de los 97 usuarios afiliados durante este periodo de informe de obra:

CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP

DISTRISERVICIOS ESP
INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION

NIT. 901.105.922 - 6

ÍTEM	CEDULA	NOMBRE	BARRIO / VEREDA
1	52,758,251	ANA ISABEL ROPERO PINEDA	VICTORIA ALTA
2	1,022,331,977	JOSE CAMPO ELIAS PINZON GUTIERREZ	VICTORIA ALTA
3	1,032,419,063	MERY MEDINA VARGAS	SANTA RITA ALTA
4	20,927,291	CARMEN ALICIA VANEGAS JIMENEZ	SANTA RITA ALTA
5	80,001,135	CARLOS ALFREDO MONTES PEREZ	AGUA BONITA
6	39,665,234	LAURA PATRICIA CEPEDA PAEZ	SANTA RITA ALTA
7	5,653,428	JULIO CESAR DIAZ CANO	AGUA BONITA
8	20,939,010	ROSA MARIA ACOSTA PENAGOS	AGUA BONITA
9	3,171,717	GERARDO VARGAS SALAMANCA	AGUA BONITA
10	20,926,634	EDITH MUÑOZ GONZALEZ	AGUA BONITA
11	39,629,223	LEONOR GONZALEZ MENDEZ	AGUA BONITA
12	11,257,448	WILLIAM PARRA RICO	AGUA BONITA
13	51,777,993	MARIA AIXA MURCIA BEDOYA	SANTA RITA ALTA
14	20,927,304	SANDRA CILENIA CHACON CAVIATIVA	AGUA BONITA
15	39,619,551	LILIA CHACON CAVIATIVA	AGUA BONITA
16	11,382,851	ORIOL ALBERTO CHACON CAVIATIVA	AGUA BONITA
17	20,925,914	ESPERANZA CHACON CAVIATIVA	AGUA BONITA
18	39,627,373	LUZ MIREYA GARZON VANEGAS	AGUA BONITA
19	4,119,542	HENRY UNIBIO GUERRERO	AGUA BONITA
20	20,952,953	ROSA NIEVES PULIDO CRUZ	AGUA BONITA
21	20,914,490	ANA CECILIA MEDINA DE BUITRAGO	AGUA BONITA
22	1,069716,803	YEIMI TATIANA DIAZ GARZON	AGUA BONITA
23	3138372956	HILDA TERESA RINCON ARIAS	AGUA BONITA
24	20,926,044	NESLY CHACON CAVIATIVA	AGUA BONITA
25	79423928	HENRY ROMERO ORIGUA	AGUA BONITA
26	1,007,399,272	MIGUEL ANGEL ALVAREZ GONZALEZ	AGUA BONITA
27	1,069,733,040	JAIME ANDRES CASTILLO MEDINA	AGUA BONITA
28	39,621,651	MARIA NUBIA PINEDA ACOSTA	AGUA BONITA
29	1,069,755,785	ERIKA NATALIA MENDOZA MENDEZ	AGUA BONITA
30	12,194,528	JAIRO VARGAS LLANOS	AGUA BONITA
31	51,968,940	GLADYS YANETH ORTEGON	AGUA BONITA
32	39,622,469	SMERALDA LEONOR CHACON CABIATIVA	AGUA BONITA
33	11,384,888	EDGAR ROMERO RODRIGUEZ	AGUA BONITA
34	39,614,334	BLANCA CECILIA ROMERO DE GONZALEZ	AGUA BONITA
35	19,103,387	JOSE LISANDRO HERRERA PEREZ	AGUA BONITA
36	1,069,740,110	SANTIAGO CIFUENTES RUBIANO	AGUA BONITA
37	39,616,097	CARMEN CIFUENTES RUBIANO	AGUA BONITA
38	20,926,458	LUZ YOLANDA PEÑA JIMENEZ	AGUA BONITA
39	39,617,992	FLOR ALICIA BOBADILLA GARCIA	AGUA BONITA

40	385.962	FELIPE FIDOLO PRIETO	AGUA BONITA
41	52,106,053	LUZ MARINA HUERTAS RIVEROS	AGUA BONITA
42	1,069,717368	JENNY MIREYA ANGARITA VASQUEZ	AGUA BONITA
43	51,902,259	MARIA OFELIA VASQUEZ HUESO	AGUA BONITA
44	80,310,801	LUIS OSCAR MARTINEZ SICHACA	AGUA BONITA
45	11,387,978	ALVARO ROMERO RODRIGUEZ	AGUA BONITA
46	1,069,765,198	YEISON ARLEY NOVOA PALACIO	AGUA BONITA
47	35,251,475	SANDRA PATRICIA GARZON ROLDAN	AGUA BONITA
48	39,342,704	HENRY AVENDAÑO CASTRILLON	AGUA BONITA
49	11,387,600	JOSE JUAN AGUSTIN NOVOA PINTO	AGUA BONITA
50	23,794,854	YINA CONSUELOVELANDIA CHAPARRO	AGUA BONITA
51	1,069,715,819	BRAYAN JAIR GARZON DIAZ	AGUA BONITA
52	39,620,147	FLORALBA ANGARITA ABRIL	AGUA BONITA
53	1,069,739,904	VERONICA ROCIO CHACON ANGARITA	AGUA BONITA
54	1,068,973,343	LUZ DARY ANGARITA	AGUA BONITA
55	28,788,082	MARIA OFELIAANGARITA ABRIL	AGUA BONITA
56	39,611,200	BEATRIZ ANGARITA ABRIL	AGUA BONITA
57	36,611,216	LUZ MARINA ANGARITA ABRIL	AGUA BONITA
58	93,461,091	JOSE RODRIGO ANGSARITA ABRIL	AGUA BONITA
59	1,069,720,743	SANDRA VIVIANA ROMERO AHUMADA	AGUA BONITA
60	23,560,734	NUBIA LUCIA BARON CARREÑO	AGUA BONITA
61	20,560,992	MARIA CRISTINA CAGUEÑAS GARCIA	AGUA BONITA
62	96,351,753	ABAD EMIRSUAREZ TRUJILLO	AGUA BONITA
63	6,023,429	JUAN CARLOS AGUIRRE GALEANO	AGUA BONITA
64	35,424,278	MARTHA JANETHTORRES HIGUERA	AGUA BONITA
65	80,657,597	ALVARO RENE BAYONA MORA	AGUA BONITA
66	20,925,740	GLADYS CUBILLOS	AGUA BONITA
67	19,325,191	ALCIBIADES SALAMANCA LEON	AGUA BONITA
68	20,624,693	MARIA IGNACIA PAEZ DUARTE	AGUA BONITA
69	39,616,899	CARMEN AMANDA TORRES	AGUA BONITA
70	35,496,545	MARGARITA MARIA PULIDO DE SANTIAGO	AGUA BONITA
71	35,252,813	SANDRA MILENA TOVAR CASTELLANOS	AGUA BONITA
72	10,554,069	CARLOS OLVER BONILLA ROMERO	AGUA BONITA
73	11,382,157	HECTOR ENRIQUUE LEON HERNANDEZ	AGUA BONITA
74	20,568,411	MARIA HELENA TOVAR HERNANDEZ	AGUA BONITA
75	82,391,703	JOSE WISON TOIVAR CASTELLANOS	AGUA BONITA
76	11,383,110	JOSE DANIEL PINZON	AGUA BONITA
77	39,628,951	YOLI RUBIELA TOVAR CASTELLANOS	AGUA BONITA
78	51,837,796	MARIA CRISTINA PELAEZ REYES	AGUA BONITA
79	11,382,535	JAIRO VILLALBA VILLALOBOS	AGUA BONITA
80	19,435,854	HERNANDO BARRERA RODRIGUEZ	AGUA BONITA

81	80,261,708	GERMAN AUGUSTO GARCIA PIÑEROS	AGUA BONITA
82	11,255,280	VIRGILIO ADRIAN CASTILLO RODRIGUEZ	AGUA BONITA
83	482.535	ADRIAN GERARDO CHANDIA	AGUA BONITA
84	35,252,589	ELIANA PATRICIA ROBAYO MARTINEZ	AGUA BONITA
85	39,743,416	MARTHA CECILIA GOMEZ MURCIA	AGUA BONITA
86	79,114,546	ALIRIO ALFONSO VILLAMARIN OSORIO	AGUA BONITA
87	79,449,727	DIESTEFANO PACHON MENDEZ	AGUA BONITA
88	1,069,721,626	YURI PAOLA GARZON ANGARITA	AGUA BONITA
89	79,408,556	PARMENIO CUERVO RAMOS	AGUA BONITA
90	1,069,735,713	JUAN GABRIEL ESPITTIA RAMIREZ	AGUA BONITA
91	385.895	MANUEL ALCIDES ESPITIA	AGUA BONITA
92	51,891,867	OMAIRA RAMIREZ	AGUA BONITA
93	80,499,438	PABLO ERNESTO PARRA RICO	AGUA BONITA
94	1,70,494,943	DAYANA GABRIELA LOPEZRODRIGUEZ	AGUA BONITA
95	11,258,725	WILBERTO QUINTERO CHACON	AGUA BONITA
96	1,005,711,368	DIVANA KAROLINA DIAZ DIAZ	AGUA BONITA
97	80,199,400	NELSON CRISTIAN RODRIGUEZ ALVARES	AGUA BONITA

5. INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL EN OBRA

N°	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	CARGO
1	MONROY	LOZANO	LUIS	ENRIQUE	INGENIERO RESIDENTE
2	RIVERA		EUCLIDES		PEGADOR
3	LOZANO		MARIO		OPERADOR DE MÁQUINA
4	PINZON		DAVID		OPERADOR DE MÁQUINA
5	ALVAREZ		FERNANDO		AUXILIAR DE CAMPO
6	ADAMES		JUAN	CARLOS	AUXILIAR DE OBRA
7	ADAMES	ANAGARITA	MICHAEL		AUXILIAR DE OBRA
8	ALVAREZ		DARÍO	FERNANDO	AUXILIAR DE OBRA
9	PINEDA		RONAL		AUXILIAR DE OBRA
10	GONZALEZ		JOSÉ	GREGORIO	AUXILIAR DE OBRA
11	CLAVIJO		YOHAN	SEBASTIÁN	AUXILIAR DE OBRA
12	MIRQUEZ	VILLANUEVA	LEIDER		AUXILIAR DE OBRA
13	PRECIADO		GERMÁN		AUXILIAR DE OBRA

Cronograma general de actividades inicial:

CRONOGRAMA DE OBRA - 13 MESES																			
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES Y REDES INTERNAS PARA SUMINISTRO DE GLP EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA"						MES													
Item	Actividad	Cantidad	Unidad	Días	Aportante	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PRECONTRACTUALES	1	ud	30		1													
RED DE DISTRIBUCIÓN - UNIDADES CONSTRUCTIVAS HOMOLOGADAS POR LA CREG																			
1	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto	0.32	Km	390	Distriservicios SAS ESP	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
2	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	54.35	Km	390	Distriservicios SAS ESP	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	
3	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto	6.66	Km	390	Distriservicios SAS ESP	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	
4	Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde	7.76	Km	390	Distriservicios SAS ESP	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	
5	Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto	0.02	Km	390	Distriservicios SAS ESP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Tubería de Polietileno de 1 pulg. En Calzada Concreto	6.41	Km	390	Distriservicios SAS ESP	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	
RED DE DISTRIBUCIÓN - UNIDADES CONSTRUCTIVAS NO HOMOLOGADAS POR LA CREG																			
Item	Actividad	Cantidad	Unidad	Dias	Aportante														
7	Estacion almacenamiento de GLP de 4000 galones (todo incluido)	2	Und	60	Distriservicios SAS ESP		1	1											
8	Paso especial 30 - 35 metros	1	Und	30	Distriservicios SAS ESP		1												
9	Paso especial 15 - 20 metros	2	Und	60	Distriservicios SAS ESP			1	1										
10	Paso especial 10 - 15 metros	11	Und	330	Distriservicios SAS ESP		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
11	Paso especial 5 - 10 metros	21	Und	330	Distriservicios SAS ESP		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1		
12	Paso especial 0 - 5 metros	82	Und	330	Distriservicios SAS ESP		7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8		
CONEXIONES E INTERNAS																			
Item	Actividad	Cantidad	Unidad	Dias	Aportante														
13	Otorgamiento del servicio a usuarios (todo incluido)	1033	Ud	360	Gobernacion de Cundinamarca (Secretaria de Energia y Mineria Sostenible)		80	80	80	80	83	90	90	90	90	90	90	90	
14	Liquidacion	1	GLB	30														1	

Avance de obra sobre el cronograma general de actividades:

CRONOGRAMA DE OBRA - 13 MESES													
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES Y REDES INTERNAS PARA SUMINISTRO DE GLP EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA"					Mes 3							
Item	Actividad	Cantidad	Unidad	Dias	Avance mes 3 según cronograma		Avance mes 3 ejecutado		Avance según cronograma a la fecha (mes 1, 2 y 3)		Avance total Proyecto (mes 1, 2 y 3)	
					Und	%	Und	%	Und	%	Und	%
	PRECONTRACTUALES	1	ud	30	0	**100.0%**	0	**100.0%**	1	**100%**	1	**100%**
RED DE DISTRIBUCIÓN - UNIDADES CONSTRUCTIVAS HOMOLOGADAS POR LA CREG												
1	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto	0.32	Km	390	0.02	**100.0%**	0	**0.00%**	0.07	**23.08%**	0	**0.00%**
2	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	54.35	Km	390	4.18	**100.0%**	0.82	**19.61%**	12.54	**23.08%**	1.35	**2.48%**
3	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto	6.66	Km	390	0.51	**100.0%**	0.2	**39.04%**	1.54	**23.08%**	0.2	**3.00%**
4	Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde	7.76	Km	390	0.60	**100.0%**	0.48	**80.41%**	1.79	**23.08%**	0.48	**6.19%**
5	Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto	0.02	Km	390	0.0015	**100.0%**	0	**0.00%**	0.005	**23.08%**	0	**0.00%**
6	Tubería de Polietileno de 1 pulg. En Calzada Concreto	6.41	Km	390	0.49	**100.0%**	0	**0.00%**	1.48	**23.08%**	0	**0.00%**
RED DE DISTRIBUCIÓN - UNIDADES CONSTRUCTIVAS NO HOMOLOGADAS POR LA CREG												
7	Estacion almacenamiento de GLP de 4000 galones (todo incluido)	2	Und	60	1.00	**100.0%**	0	**0.00%**	2.00	**100.00%**	0.0	**0.00%**
8	Paso especial 30 - 35 metros	1	Und	30	0.00	**100.0%**	0	**0.00%**	1.00	**100.00%**	0.0	**0.00%**
9	Paso especial 15 - 20 metros	2	Und	60	1.00	**100.0%**	0	**0.00%**	1.00	**50.00%**	0.0	**0.00%**
10	Paso especial 10 - 15 metros	11	Und	330	1.00	**100.0%**	0	**0.00%**	2.00	**18.18%**	0.0	**0.00%**
11	Paso especial 5 - 10 metros	21	Und	330	2.00	**100.0%**	0	**0.00%**	4.00	**19.05%**	0.0	**0.00%**
12	Paso especial 0 - 5 metros	82	Und	330	7.00	**100.0%**	0	**0.00%**	14.00	**17.07%**	0.0	**0.00%**
CONEXIONES E INTERNAS												
13	Afiliaciones del servicio a usuarios	1033	Ud	360	80.00	**100.0%**	97	**121.25%**	160.00	**15.49%**	199.0	**19.26%**
14	Usuarios con servicios (todo incluido)	1033	Ud	360	80.00	**100.0%**	0	**0.00%**	160.00	**15.49%**	0.0	**0.00%**
15	Liquidacion	1	GLB	30	0.00	**100.0%**	0	**0.00%**	0.00	**0.00%**	0.0	**0.00%**
									Promedio Total proyectado	**35.86%**	**Promedio Total ejecutado**	**8.18%**

5. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATO

5.1 CONTRATISTA

Las actividades para desarrollar están a cargo de DISTRISERVICIOS SAS ESP por el representante legal, Hernán Darío Huertas Murcia con número de cédula: 1.070.584.730 de Girardot, Cundinamarca.

5.2 SUPERVISIÓN

Quien realiza la supervisión es don Fredy Humberto García Rodríguez con número de cédula: 79.863.146, profesional del área de la Secretaría de Energías y Minería Sostenible.

5.3 INTERVENTOR

No aplica.

6. DATOS DEL CONVENIO

CONVENIO No.:	**CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. SEMS-ES-CA-057-2025 CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE Y CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAS**
CONTRATISTA O PARTE DEL CONVENIO:	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP (DISTRISERVICIOS SAS ESP)
NIT	901105922-6
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNAN DARIO HUERTAS MURCIA
CÉDULA:	1.070.584.730 GIRARDOT – CUNDINAMARCA
OBJETO DEL CONTRATO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ampliar la cobertura del servicio de gas combustible por redes, a través de la construcción del sistema de distribución y la financiación del cargo por conexión y la red interna, para usuarios del municipio de Silvania del departamento de Cundinamarca.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	**$ 7.636.542.418** Siete mil seiscientos treinta y seis millones quinientos cuarenta y dos mil cuatrocientos dieciocho pesos m/cte.
VALOR APORTE SEMS:	**$ 1.633.445.712** Mil seiscientos treinta y tres millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos doce pesos m/cte.
VALOR APORTE DISTRISERVICIOS	**$ 6.003.096.706** Seis mil tres millones noventa y seis mil setecientos seis pesos m/cte.
PLAZO:	Trece (13) meses
FECHA DE INICIO:	19 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de diciembre de 2026

7. ACTAS DEL CONTRATO

Las actas legales suscritas para la obra:

ACTA INICIO OBRA:	19 de noviembre de 2025

8. CONTROL DE POLIZAS

Se relaciona en la tabla Control de pólizas:

<table>
<tr><td rowspan="5">GARANTIAS</td><td>ASEGURADORA:</td><td colspan="3">No POLIZA</td></tr>
<tr><td>Seguros Generales Suramericana S. A</td><td colspan="3">4391146 y 013001042939</td></tr>
<tr><td>PRODUCTO</td><td rowspan="2">SUMA ASEGURADA</td><td colspan="2">VIGENCIA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1. SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES</td><td>DESDE</td><td>HASTA</td></tr>
<tr><td>$ 871.860.834</td><td>19/11/2025</td><td>13/01/2030</td></tr>
<tr><td>2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO</td><td>$ 711.750.000</td><td>19/11/2025</td><td>13/01/2027</td></tr>
</table>

Expedidas por la compañía **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.**

NIT: 890.903.407-9

9. CONCLUSIONES

1. Las obras y construcciones se desarrollaron siguiendo los parámetros de ley, las Normas Técnicas Colombianas NTC 3728, NTC 3853 y NTC 3853, además de los manuales de instalación del fabricante de la tubería (Extrucol).

2. A la fecha de este informe, la obra presenta un avance general del 8.18% con respecto al 35.86% proyectado en el cronograma del proyecto.

3. Durante el presente corte se priorizó el avance en el proceso de afiliación de usuarios, logrando consolidar y formalizar un número significativo de registros, lo que permite fortalecer la base operativa y garantizar la sostenibilidad del proyecto en su etapa de puesta en servicio.

4. En cuanto a los usuarios a beneficiar, hasta la fecha se lleva un total de 199 afiliaciones, de las cuales, 51 usuarios cuentan con avance constructivo.

5. Se construyó el cerramiento de la estación de almacenamiento de 4.000 galones en la vereda Aguabonita para empezar a brindarle el servicio de gas a la comunidad. En cuanto a la red de distribución, se construyó en el corte 1.50 km para un total de 2.03 km de red construida hasta la fecha, ajustando la programación de actividades en campo en función de las condiciones climáticas presentadas en la zona. Las jornadas con lluvias intermitentes implicaron una reorganización operativa orientada a mantener la productividad y continuidad del proyecto.



HERNAN DARIO HUERTAS MURCIA
Representante legal
DISTRISERVICIOS SAS ESP.

ANEXOS

1. REGISTRO FOTOGRAFICO RED DE DISTRIBUCIÓN





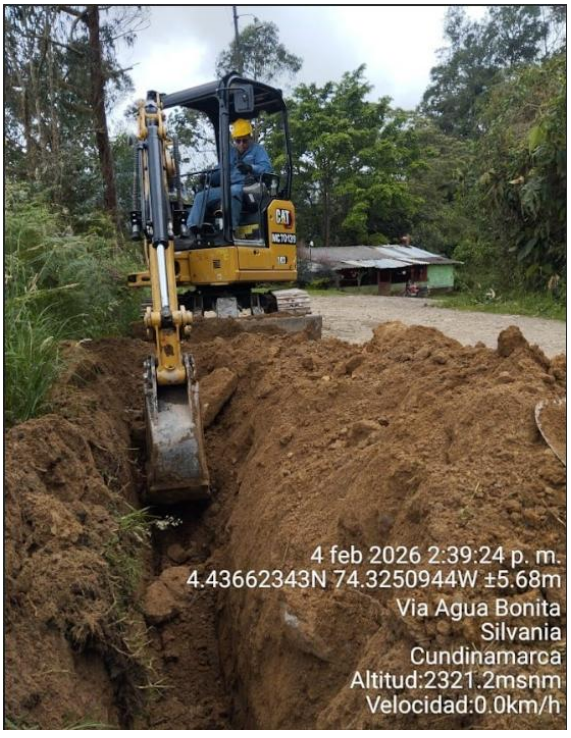





30
31 ene 2026 8
4.43344758N 74.3244110
Km 37 Vía Sibaté


3 feb 2026 9:33:29 a. m.
4.4340229N 74.32415867W ±3.79m
Altitud:2359.5msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 344


Network: 4/02/2026
Local: 4/02/2026


4 feb 2026 2:39:24 p. m.
4.43662343N 74.3250944W ±5.68m
Via Agua Bonita
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2321.2msnm
Velocidad:0.0km/h

CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP

DISTRISERVICIOS ESP
INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION

NIT. 901.105.922 - 6







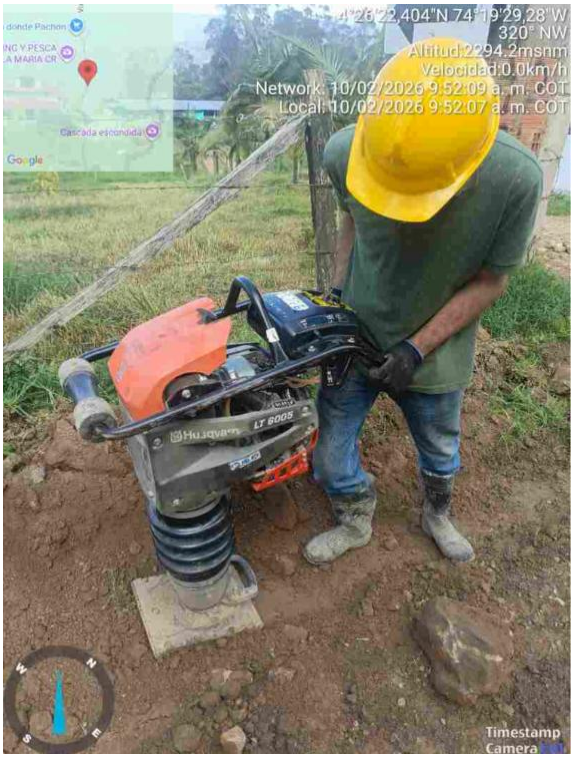


DISTRISERVICIOS SAS ESP

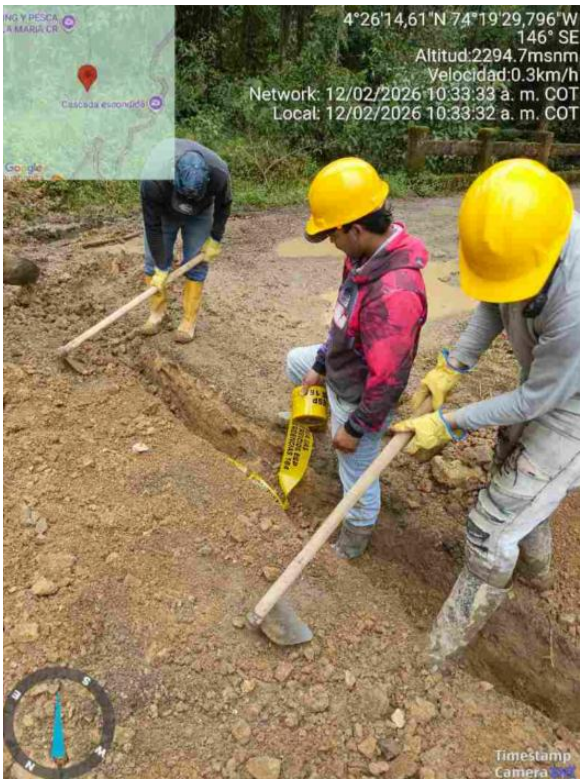
WhatsApp 317 3915546 - línea de atención 302 2610970
Calle 21 5bis 21 oficina 301 Edificio Las Ceibas
Neiva, Huila.
servicioalcliente@distriserviciosesp.com
www.distriserviciosesp.com

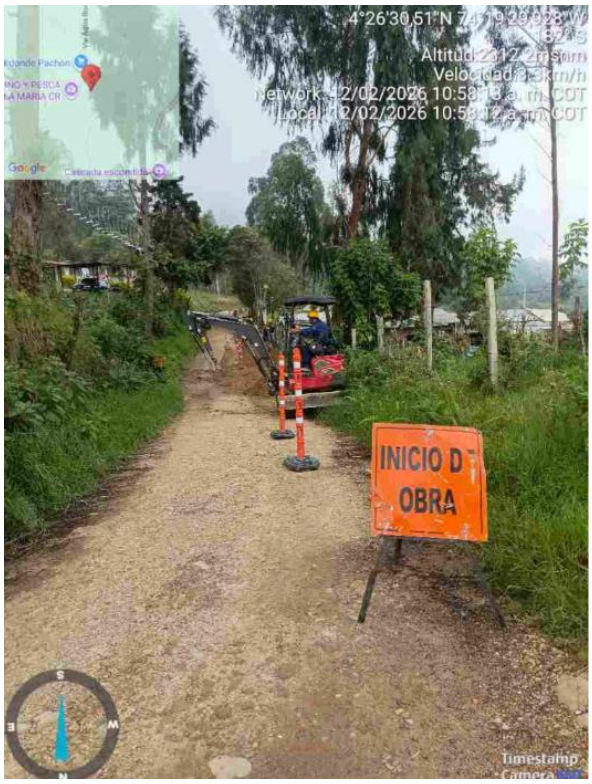

4°26'25,393"N 74°19'28,488"W
170° S
Network: 9/02/2026 4:25:31 p. m. COT
Local: 9/02/2026 4:25:29 p. m. COT
Timestamp Camera


4°26'28,572"N 74°19'29,82"W
355° N
Altitud:2299.7msnm
Velocidad:0.8km/h
Network: 10/02/2026 4:27:08 p. m. COT
Local: 10/02/2026 4:27:07 p. m. COT
Timestamp Camera

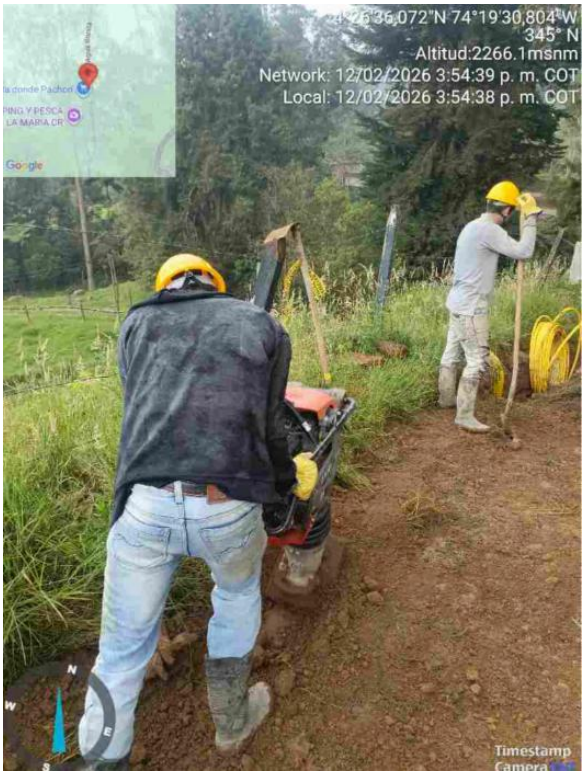

4°26'22,404"N 74°19'29,28"W
320° NW
Altitud:2294.2msnm
Velocidad:0.0km/h
Network: 10/02/2026 9:52:09 a. m. COT
Local: 10/02/2026 9:52:07 a. m. COT
Timestamp Camera


4°26'29,088"N 74°19'30,212"W
266° W
Altitud:2242.3msnm
Network: 11/02/2026 2:06:17 p. m. COT
Local: 11/02/2026 2:06:16 p. m. COT
Timestamp Camera


4°26'14,61"N 74°19'29,796"W
146° SE
Altitud:2294.7msnm
Velocidad:0.3km/h
Network: 12/02/2026 10:33:33 a. m. COT
Local: 12/02/2026 10:33:32 a. m. COT
Timestamp Camera


INICIO D
OBRA
Timestamp Camera


Timestamp Camera


Altitud:2266.1msnm
Network: 12/02/2026 3:54:39 p. m. COT
Local: 12/02/2026 3:54:38 p. m. COT
Timestamp Camera


4°26'9.125"N 74°19'30.162"W
151° SE
Altitud:2323.2msnm
Velocidad:1.8km/h
Network: 13/02/2026 3:39:27 p. m. COT
Local: 13/02/2026 3:39:26 p. m. COT
Timestamp Camera


4°26'34.452"N 74°19'28.152"W
40° NE
Altitud:2249.2msnm
Velocidad:3.5km/h
Network: 13/02/2026 1:32:59 p. m. COT
Local: 13/02/2026 1:32:57 p. m. COT
Timestamp Camera


17 feb 2026 4:34:58 p. m.
4.43216078N 74.32821076W ±3.79m
Fusagasuga - Sibate
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2309.9msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 457


18 feb 2026 4:35:10 p. m.
4.43239372N 74.3286045W ±3.79m
Altitud:2312.2msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 479

2. REGISTRO FOTOGRAFICO ESTACIÓN DE ALMACENAMIENTO AGUABONITA











