INFORME DE AVANCE DE OBRA No. 4

19 de febrero – 18 de marzo de 2026

CONVENIO No. SEMS-ES-CA-057-2025

PROYECTO

“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ampliar la cobertura del servicio de gas combustible por redes, a través de la construcción del sistema de distribución y la financiación del cargo por conexión y la red interna, para usuarios del municipio de Silvania del departamento de Cundinamarca.”

ACTA DE INICIO 19 DE NOVIEMBRE DE 2025

INFORME DE AVANCE DE OBRA No. 4

19 de febrero – 18 de marzo de 2026

CONVENIO No. SEMS-ES-CA-057-2025

PROYECTO

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ampliar la cobertura del servicio de gas combustible por redes, a través de la construcción del sistema de distribución y la financiación del cargo por conexión y la red interna, para usuarios del municipio de Silvania del departamento de Cundinamarca."

ACTA DE INICIO 19 DE NOVIEMBRE DE 2025

INFORME DE AVANCE DE OBRA No. 4

19 de febrero – 18 de marzo de 2026

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 5
OBJETO DEL CONVENIO 5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
4. ALCANCE DEL PROYECTO. 7
5. INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL EN OBRA 10
5. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATO 13
5.1 CONTRATISTA 13
5.2 SUPERVISIÓN 13
5.3 INTERVENTOR 13
6. DATOS DEL CONVENIO 14
7. ACTAS DEL CONTRATO 15
8. CONTROL DE POLIZAS 15
9. CONCLUSIONES 16

1. INTRODUCCIÓN

Durante el desarrollo de las actividades que dan cumplimiento a lo establecido en el convenio No. SEMS-ES-CA-057-2025, celebrado entre el Departamento de Cundinamarca – Secretaría De Energía Y Minería Sostenible y Distriservicios S.A.S. E.S.P para transferencia de recursos destinados a subsidios para usuarios del servicio de gas combustible por redes. Iniciando la realización de la obra el 19 de noviembre de 2025. En el presente informe de avance de obra con fecha del 19 de febrero al 18 de marzo de 2026, se presentan las actividades programadas y a su vez el desarrollo y control que se asumió para llevar a cabo las mismas de acuerdo con los parámetros establecidos en el proyecto con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ampliar la cobertura del servicio de gas combustible por redes, a través de la construcción del sistema de distribución y la financiación del cargo por conexión y la red interna, para usuarios del municipio de Silvania del departamento de Cundinamarca.”

El convenio No. SEMS-ES-CA-057-2025, se suscribió entre el Departamento de Cundinamarca – Secretaría De Energías Y Minería Sostenible y el representante legal de DISTRISERVICIOS SAS ESP. Hernán Darío Huertas Murcia con Número de Cedula: 1.070.584.730 de Girardot Cundinamarca, para la gasificación de las veredas: Noruega Alta, San Luis Alto, Jalisco, Victoria Alta, Agua Bonita y Santa Rita Alta que beneficiarán a 1.033 familias de usuarios residenciales del municipio de Silvania, Cundinamarca.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONVENIO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de ampliar la cobertura del servicio de gas combustible por redes en el municipio de silvana, departamento de Cundinamarca. Para ello se desarrollará la construcción del sistema de distribución y la financiación del cargo por conexión y la red interna, beneficiando directamente a los usuarios del territorio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Ejecutar las actividades previstas conforme a los parámetros establecidos en el convenio No. SEMS-ES-CA-057-2025, suscrito entre el Departamento de Cundinamarca – Secretaría De Energías Y Minería Sostenible y Distriservicios S.A.S. E.S.P para transferencia de recursos destinados a subsidios para usuarios del servicio de gas combustible por redes.

2. Generar beneficio tangible para la comunidad de las veredas Noruega Alta, San Luis Alto, Jalisco, Victoria Alta, Agua Bonita y Santa Rita Alta del Municipio de Silvania, mejorando la calidad de vida de la población.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La baja cobertura del servicio de gas combustible por redes en la zona rural del municipio de Silvania, Cundinamarca ha ocasionado que las veredas Noruega Alta, San Luis Alto, Jalisco, Victoria Alta, Agua Bonita y Santa Rita Alta no cuenten con servicio de gas combustible por redes, las fuentes alternativas para el reemplazo de este servicio fundamental son; Biomasa (leña), estufas eléctricas, a gasolina o ACPM y GLP en cilindro el cual es comercializado a un precio bastante alto y en periodos de tiempo extensos.

Es por esto por lo que el proyecto tiene como objetivo: aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ampliar la cobertura del servicio de gas combustible por redes, a través de la construcción del sistema de distribución y la financiación del cargo por conexión y la red interna, para usuarios del municipio de Silvania del departamento de Cundinamarca.

4. ALCANCE DEL PROYECTO.

El convenio No. SEMS-ES-CA-057-2025 **"*CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES Y REDES INTERNAS PARA SUMINISTRO DE GLP EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA*".** Se ha ejecutado de acuerdo con las especificaciones establecidas.

En el presente avance de obra, se ha construido:

1,52 km de tubería de polietileno de ¾'' en zona verde

0,21 km de tubería de polietileno de ¾'' en calzada concreto

0.04 km de tubería de polietileno de 1'' en zona verde

2.06 km de tubería de polietileno de 1" en calzada concreto

Total construido en el corte: 3.83 km

Estas intervenciones corresponden a la red de distribución, alcanzando un total de 5,86 km red construida hasta la fecha, lo que representa aproximadamente un 7.76% de avance en la ejecución del sistema de distribución del proyecto.

EJECUCIÓN CUARTO INFORME						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad por SEMS	Cantidad por Distriservicios ESP	Cantidad parcial ejecutada	Cantidad total ejecutada
1	CONEXIONES A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1					
1.1	Acometida / Derecho de Conexión	Und	0	0	0	0
2	RED INTERNA A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1					
2.1	Red interna a usuarios residenciales estrato 1 (hasta 35 metros)	Und	0		0	0
3	REDES DE DISTRIBUCIÓN					
3.1	Tubería de Polietileno de 3/4" en Andén Concreto	Km	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Tubería de Polietileno de 3/4" en Zona Verde	Km	0,00	1,52	1,52	2,87
3.3	Tubería de Polietileno de 3/4" en Calzada Concreto	Km	0,00	0,21	0,21	0,41
3.4	Tubería de Polietileno de 1" en Zona Verde	Km	0,00	0,04	0,04	0,52
3.5	Tubería de Polietileno de 1" en Andén Concreto	Km	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Tubería de Polietileno de 1" en Calzada Concreto	Km	0,00	2,06	2,06	2,06
4	PASOS ESPECIALES					
4.1	Paso especial 30 – 35 metros	Und	0	0	0	0
4.2	Paso especial 15 – 20 metros	Und	0	0	0	0

4.3	Paso especial 10 – 15 metros	Und	0	0	0	0
4.4	Paso especial 5 – 10 metros	Und	0	0	0	0
4.5	Paso especial 0 – 5 metros	Und	0	0	0	0
5	ESTACION DE ALMACENAMIENTO					
5.1	Estación de almacenamiento de 4000 GL	Und	0	1	1	1

Las redes del sistema de distribución se encuentran debidamente georreferenciadas en la ubicación indicada, y se anexa el plano correspondiente en el cual se visualizan tanto las redes construidas.

Consolidado Red Construida		
Diámetro	Descripción	Aporte Distriservicios Longitud (m)
1"	Zona Verde	40
1"	Calzada Concreto	2060
3/4"	Zona Verde	1520
3/4"	Calzada Concreto	210
Total		**3830**

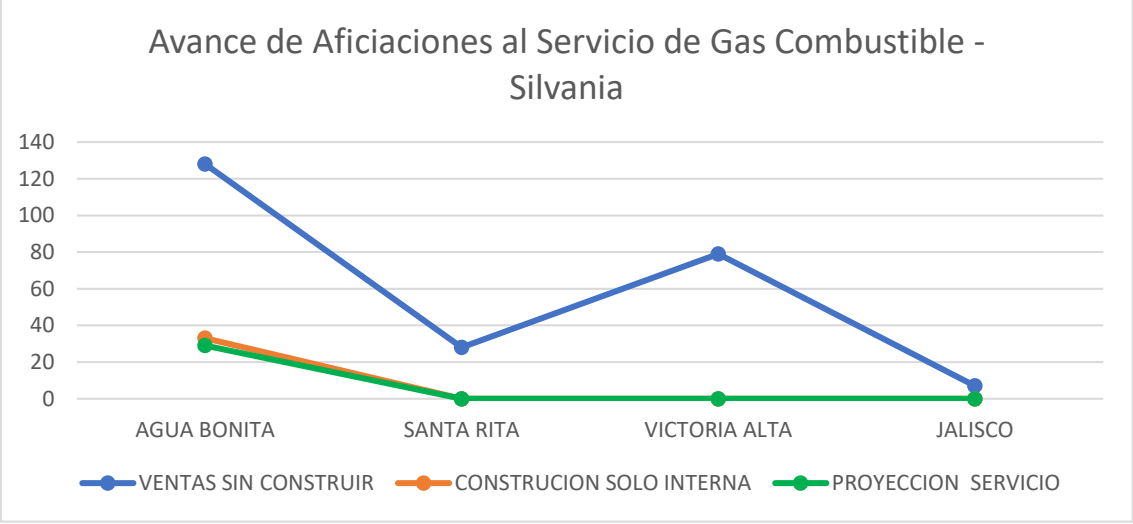
Tramo	Diámetro	Descripción	Longitud (m)	Vereda	Coordenadas UTM (18N)				Aporte
					Inicio tramo		Final tramo		
					Norte	Este	Norte	Este	
T01-T02	3/4"	Zona Verde	428	Aguabonita	491054,52	574876,41	491357,50	574759,91	Distriservicios
T02-T03	3/4"	Calzada Concreto	180	Aguabonita	491357,50	574759,91	491513,79	574817,40	Distriservicios
T03-T04	3/4"	Zona Verde	528	Aguabonita	491513,79	574817,40	492017,17	574937,43	Distriservicios
T05-T06	1"	Zona Verde	40	Aguabonita	489960,69	574818,50	489932,15	574793,40	Distriservicios
T06-T07	1"	Calzada Concreto	2060	Aguabonita	489932,15	574793,40	490672,66	573890,17	Distriservicios
T08-T09	3/4"	Calzada Concreto	30	Aguabonita	489801,68	574604,52	489805,32	574575,21	Distriservicios
T10-T11	3/4"	Zona Verde	94	Aguabonita	489952,37	574487,11	490014,23	574427,79	Distriservicios
T12-T13	3/4"	Zona Verde	44	Aguabonita	490628,95	573896,60	490523,33	573523,10	Distriservicios
T14-T15	3/4"	Zona Verde	426	Aguabonita	490554,13	573582,74	490580,44	573547,47	Distriservicios

AVANCE EN AFILIACIONES DE USUARIOS

A la fecha del presente informe se han realizado un total de 304 afiliaciones de usuarios al servicio. De este grupo, 33 usuarios cuentan con un avance constructivo en sus instalaciones internas.

Así mismo, se proyecta para el siguiente mes la gasificación de 29 usuarios, conforme al cronograma establecido, lo cual evidencia el progreso sostenido en la cobertura del servicio.

AFILIACIONES SILVANIA - CUNDINAMARCA				
VEREDA	VENTAS SIN CONSTRUIR	CONSTRUCCION SOLO INTERNA	PROYECCION SERVICIO	TOTAL VENTAS
AGUA BONITA	128	33	29	190
SANTA RITA ALTA	28			28
VICTORIA ALTA	79			79
JALISCO	7			7
TOTAL	**242**	**33**	**29**	**304**



5. INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL EN OBRA

Para la ejecución del convenio No. SEMS-ES-CA-057-2025 "**Construcción De Conexiones Y Redes Internas Para Suministro De GLP En La Zona Rural Del Municipio De Silvania, Cundinamarca**". Se ha dispuesto personal técnico y operativo especializado, con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades constructivas y administrativas previstas.

El recurso humano asignado comprende:

N°	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	CARGO
1	MONROY	LOZANO	LUIS	ENRIQUE	INGENIERO RESIDENTE
2	RIVERA		EUCLIDES		PEGADOR
3	LOZANO		MARIO		OPERADOR DE MÁQUINA
4	PINZON		DAVID		OPERADOR DE MÁQUINA
5	SÁNCHEZ		WILKER		OPERADOR DE MÁQUINA
6	ALVAREZ		FERNANDO		AUXILIAR DE CAMPO
7	ADAMES		JUAN	CARLOS	AUXILIAR DE OBRA
8	ADAMES	ANAGARITA	MICHAEL		AUXILIAR DE OBRA
9	ALVAREZ		DARÍO	FERNANDO	AUXILIAR DE OBRA
10	PINEDA		RONAL		AUXILIAR DE OBRA
11	GONZALEZ		JOSÉ	GREGORIO	AUXILIAR DE OBRA
12	CLAVIJO		YOHAN	SEBASTIÁN	AUXILIAR DE OBRA
13	MIRQUEZ	VILLANUEVA	LEIDER		AUXILIAR DE OBRA
14	PRECIADO		GERMÁN		AUXILIAR DE OBRA
15	ALAYON		MARLON	JAVIER	AUXILIAR DE OBRA
16	ROJAS		WILTON	ALEJANDRO	AUXILIAR DE OBRA
17	VILLARAGA		JOSÉ DEL	MARMEN	AUXILIAR DE OBRA
18	LEÓN	PINZÓN	LUIS	ALONSO	AUXILIAR DE OBRA

Cronograma general de actividades inicial:

CRONOGRAMA DE OBRA - 13 MESES																			
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES Y REDES INTERNAS PARA SUMINISTRO DE GLP EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA"						MES													
Item	Actividad	Cantidad	Unidad	Días	Aportante	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	PRECONTRACTUALES	1	ud	30		1													
RED DE DISTRIBUCIÓN - UNIDADES CONSTRUCTIVAS HOMOLOGADAS POR LA CREG																			
1	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto	0.32	Km	390	Distriservicios SAS ESP	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
2	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	54.35	Km	390	Distriservicios SAS ESP	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	
3	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto	6.66	Km	390	Distriservicios SAS ESP	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	
4	Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde	7.76	Km	390	Distriservicios SAS ESP	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	
5	Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto	0.02	Km	390	Distriservicios SAS ESP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Tubería de Polietileno de 1 pulg. En Calzada Concreto	6.41	Km	390	Distriservicios SAS ESP	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	
RED DE DISTRIBUCIÓN - UNIDADES CONSTRUCTIVAS NO HOMOLOGADAS POR LA CREG																			
Item	Actividad	Cantidad	Unidad	Dias	Aportante														
7	Estacion almacenamiento de GLP de 4000 galones (todo incluido)	2	Und	60	Distriservicios SAS ESP		1	1											
8	Paso especial 30 - 35 metros	1	Und	30	Distriservicios SAS ESP		1												
9	Paso especial 15 - 20 metros	2	Und	60	Distriservicios SAS ESP			1	1										
10	Paso especial 10 - 15 metros	11	Und	330	Distriservicios SAS ESP		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
11	Paso especial 5 - 10 metros	21	Und	330	Distriservicios SAS ESP		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1		
12	Paso especial 0 - 5 metros	82	Und	330	Distriservicios SAS ESP		7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8		
CONEXIONES E INTERNAS																			
Item	Actividad	Cantidad	Unidad	Dias	Aportante														
13	Otorgamiento del servicio a usuarios (todo incluido)	1033	Ud	360	Gobernacion de Cundinamarca (Secretaria de Energia y Mineria Sostenible)		80	80	80	80	83	90	90	90	90	90	90	90	
14	Liquidacion	1	GLB	30														1	

Avance de obra sobre el cronograma general de actividades:

CRONOGRAMA DE OBRA - 13 MESES												
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES Y REDES INTERNAS PARA SUMINISTRO DE GLP EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA"					Mes 4 (19 FEB- 18 MAR-2026)							
Item	Actividad	Cantidad	Unidad	Dias	Avance mes 4 según cronograma		Avance mes 4 ejecutado		Avance según cronograma a la fecha (mes 1, 2, 3 y 4)		Avance total Proyecto (mes 1, 2, 3 y 4)	
					Und	%	Und	%	Und	%	Und	%
	PRECONTRACTUALES	1	ud	30	0	**100.0%**	0	**100.0%**	1	**100%**	1	**100%**
RED DE DISTRIBUCIÓN - UNIDADES CONSTRUCTIVAS HOMOLOGADAS POR LA CREG												
1	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto	0.32	Km	390	0.02	**100.0%**	0	**0.00%**	0.10	**30.77%**	0	**0.00%**
2	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	54.35	Km	390	4.18	**100.0%**	1.52	**36.36%**	16.72	**30.77%**	2.87	**5.28%**
3	Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto	6.66	Km	390	0.51	**100.0%**	0.21	**40.99%**	2.05	**30.77%**	0.41	**6.16%**
4	Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde	7.76	Km	390	0.60	**100.0%**	0.04	**6.70%**	2.39	**30.77%**	0.52	**6.70%**
5	Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto	0.02	Km	390	0.00	**100.0%**	0	**0.00%**	0.006	**30.77%**	0	**0.00%**
6	Tubería de Polietileno de 1 pulg. En Calzada Concreto	6.41	Km	390	0.49	**100.0%**	2.06	**417.78%**	1.97	**30.77%**	2.06	**32.14%**
RED DE DISTRIBUCIÓN - UNIDADES CONSTRUCTIVAS NO HOMOLOGADAS POR LA CREG												
7	Estacion almacenamiento de GLP de 4000 galones (todo incluido)	2	Und	60	0.00	**100.0%**	1	**0.00%**	2.00	**100.00%**	1.0	**50.00%**
8	Paso especial 30 - 35 metros	1	Und	30	0.00	**100.0%**	0	**0.00%**	1.00	**100.00%**	0.0	**0.00%**
9	Paso especial 15 - 20 metros	2	Und	60	1.00	**100.0%**	0	**0.00%**	2.00	**100.00%**	0.0	**0.00%**
10	Paso especial 10 - 15 metros	11	Und	330	1.00	**100.0%**	0	**0.00%**	3.00	**27.27%**	0.0	**0.00%**
11	Paso especial 5 - 10 metros	21	Und	330	2.00	**100.0%**	0	**0.00%**	6.00	**28.57%**	0.0	**0.00%**
12	Paso especial 0 - 5 metros	82	Und	330	7.00	**100.0%**	0	**0.00%**	21.00	**25.61%**	0.0	**0.00%**
CONEXIONES E INTERNAS												
13	Afiliaciones del servicio a usuarios	1033	Ud	360	80.00	**100.0%**	105	**131.25%**	240.00	**23.23%**	304.0	**29.43%**
14	Usuarios con servicios (todo incluido)	1033	Ud	360	80.00	**100.0%**	0	**0.00%**	240.00	**23.23%**	0.0	**0.00%**
15	Liquidacion	1	GLB	30	0.00	**100.0%**	0	**0.00%**	0.00	**0.00%**	0.0	**0.00%**
									Promedio Total proyectado	**44.53%**	**Promedio Total ejecutado**	**14.36%**

5. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATO

5.1 CONTRATISTA

Las actividades para desarrollar están a cargo de DISTRISERVICIOS SAS ESP por el representante legal, Hernán Darío Huertas Murcia con número de cédula: 1.070.584.730 de Girardot, Cundinamarca.

5.2 SUPERVISIÓN

Quien realiza la supervisión es don Fredy Humberto García Rodríguez con número de cédula: 79.863.146, profesional del área de la Secretaría de Energías y Minería Sostenible.

5.3 INTERVENTOR

No aplica.

6. DATOS DEL CONVENIO

CONVENIO No.:	**CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. SEMS-ES-CA-057-2025 CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE Y CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAS**
CONTRATISTA O PARTE DEL CONVENIO:	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP (DISTRISERVICIOS SAS ESP)
NIT	901105922-6
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNAN DARIO HUERTAS MURCIA
CÉDULA:	1.070.584.730 GIRARDOT – CUNDINAMARCA
OBJETO DEL CONTRATO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ampliar la cobertura del servicio de gas combustible por redes, a través de la construcción del sistema de distribución y la financiación del cargo por conexión y la red interna, para usuarios del municipio de Silvania del departamento de Cundinamarca.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	**$ 7.636.542.418** Siete mil seiscientos treinta y seis millones quinientos cuarenta y dos mil cuatrocientos dieciocho pesos m/cte.
VALOR APORTE SEMS:	**$ 1.633.445.712** Mil seiscientos treinta y tres millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos doce pesos m/cte.
VALOR APORTE DISTRISERVICIOS	**$ 6.003.096.706** Seis mil tres millones noventa y seis mil setecientos seis pesos m/cte.
PLAZO:	Trece (13) meses
FECHA DE INICIO:	19 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de diciembre de 2026

7. ACTAS DEL CONTRATO

Las actas legales suscritas para la obra:

ACTA INICIO OBRA:	19 de noviembre de 2025

8. CONTROL DE POLIZAS

Se relaciona en la tabla Control de pólizas:

<table>
<tr><td rowspan="5">GARANTIAS</td><td>ASEGURADORA:</td><td colspan="3">No POLIZA</td></tr>
<tr><td>Seguros Generales Suramericana S. A</td><td colspan="3">4391146 y 013001042939</td></tr>
<tr><td>PRODUCTO</td><td rowspan="2">SUMA ASEGURADA</td><td colspan="2">VIGENCIA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1. SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES</td><td>DESDE</td><td>HASTA</td></tr>
<tr><td>$ 871.860.834</td><td>19/11/2025</td><td>13/01/2030</td></tr>
<tr><td>2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO</td><td>$ 711.750.000</td><td>19/11/2025</td><td>13/01/2027</td></tr>
</table>

Expedidas por la compañía **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.**

NIT: 890.903.407-9

9. CONCLUSIONES

1. Las obras y construcciones se desarrollaron siguiendo los parámetros de ley, las Normas Técnicas Colombianas NTC 3728, NTC 3853 y NTC 3853, además de los manuales de instalación del fabricante de la tubería (Extrucol).

2. A la fecha de este informe, la obra presenta un avance general del 14.36% con respecto al 44.53% proyectado en el cronograma del proyecto.

3. En cuanto a los usuarios a beneficiar, hasta la fecha se lleva un total de 304 afiliaciones a usuarios de los cuales 33 se han realizado un avance constructivo de instalaciones internas, con una proyección total de 29 usuarios gasificados para el siguiente corte.

4. Se terminó de construir la estación de almacenamiento de 4.000 galones en la vereda Aguabonita posibilitando la gasificación de algunos sectores con la red de distribución ya instalada permitiendo el acceso del servicio a los usuarios.

5. Referente a la red de distribución, se construyó en el corte 3.83 km para un total de 5.86 km de red construida hasta la fecha, representando un 7.76% de avance; se espera que, para el siguiente reporte de avance de obra, se gasifique gran parte de la red construida y así poder aumentar el porcentaje de avance de usuarios gasificados.



HERNAN DARIO HUERTAS MURCIA
Representante legal
DISTRISERVICIOS SAS E

ANEXOS

1. REGISTRO FOTOGRAFICO RED DE DISTRIBUCIÓN










21 feb 2026 10:38:38 a. m.
4.43205278N 74.32769536W ±3.79m
Via Agua Bonita
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2324.2msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 512


25 feb 2026 9:16:53 a. m.
4.43270377N 74.32895778W ±9.94m
Fusagasuga - Sibate
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2292.3msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 555


4°26'2,808"N 74°19'53,34"W
136° SE
Altitud:2270.0msnm
Velocidad:0.4km/h
Network: 24/02/2026 9:51:45 a. m. COT
Local: 24/02/2026 9:51:44 a. m. COT
Las Fronteras

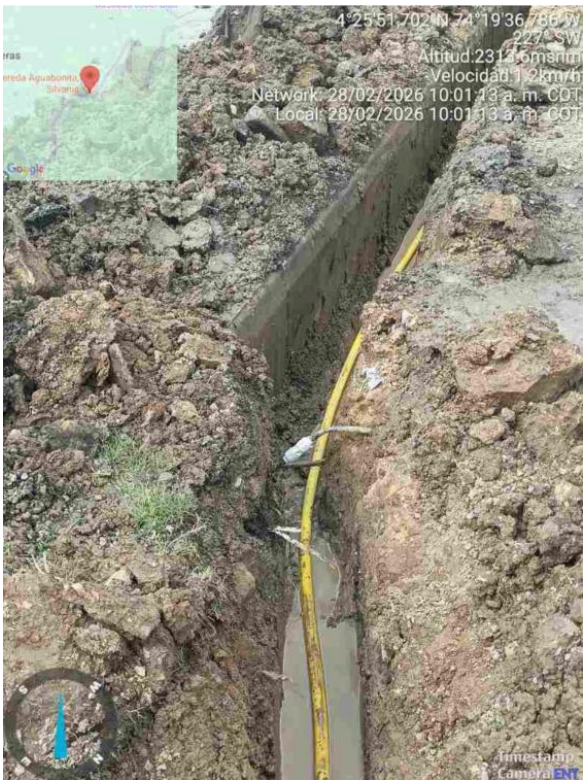

4°26'1,194"N 74°19'49,74"W
261° W
Altitud:2264.1msnm
Velocidad:3.5km/h
Network: 23/02/2026 1:26:21 p. m. COT
Local: 23/02/2026 1:26:20 p. m. COT
Las Fronteras

CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP

DISTRISERVICIOS ESP
INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION

NIT. 901.105.922 - 6









DISTRISERVICIOS SAS ESP

WhatsApp 317 3915546 - línea de atención 302 2610970
Calle 21 5bis 21 oficina 301 Edificio Las Ceibas
Neiva, Huila.
servicioalcliente@distriserviciosesp.com
www.distriserviciosesp.com

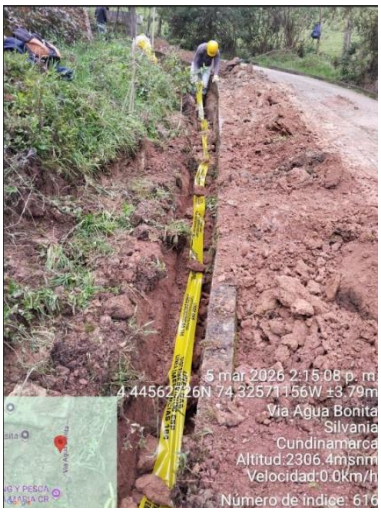

4°25'51,684"N 74°19'38,1"W
256° W
Altitud:2334.5msnm
Velocidad:0.4km/h
Network: 3/03/2026 9:43:02 a. m. COT
Local: 3/03/2026 9:43:00 a. m. COT
Timestamp Camera


4°25'51,6"N 74°19'37,062"W
287° W
Altitud:2332.3msnm
Velocidad:0.3km/h
Network: 3/03/2026 9:20:35 a. m. COT
Local: 3/03/2026 9:20:34 a. m. COT
Timestamp Camera


4°25'51,6"N 74°19'36,96"W
320° NW
Altitud:2323.1msnm
Velocidad:1.2km/h
Network: 3/03/2026 9:20:25 a. m. COT
Local: 3/03/2026 9:20:25 a. m. COT
Timestamp Camera


4°25'52,488"N 74°19'35,088"W
49° NE
Altitud:2335.6msnm
Velocidad:1.3km/h
Network: 3/03/2026 8:33:48 a. m. COT
Local: 3/03/2026 8:33:46 a. m. COT


4 mar 2026 3:24:56 p. m.
4.4364302N 74.33251692W ±3.79m
Fusagasuga - Sibate
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2254.6msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 603
Las Fronteras


5 mar 2026 2:15:08 p. m.
4.44562726N 74.32571156W ±3.79m
Via Agua Bonita
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2306.4msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 616


5 mar 2026 2:23:05 p. m.
4.44591294N 74.3256831W ±3.79m
Via Agua Bonita
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2300.5msnm
Velocidad:0.5km/h
Número de índice: 618


5 mar 2026 3:24:38 p.m.
4°26'10.926"N 74°19'58.566"W
Fusagasuga - Sibate
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2241.2msnm
Velocidad:0.0km/h
Silvania - cundinamarca
ING - Luis Monroy


6 mar 2026 2:58:11 p. m.
4.43671362N 74.33303359W ±7.35m
Fusagasuga - Sibate
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2253.7msnm
Velocidad:1.1km/h
Número de índice: 641
Las Fronteras

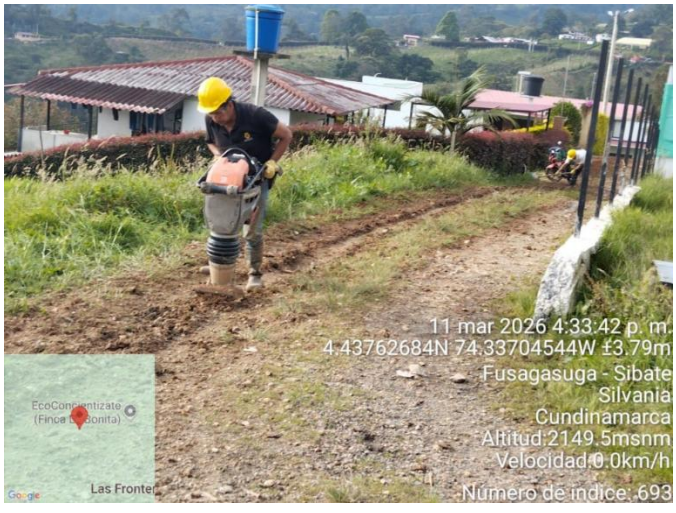

6 mar 2026 1:42:07 p.m.
4°26'12.798"N 74°19'58.932"W
Fusagasuga - Sibate
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2233.8msnm
Velocidad:0.0km/h
Silvania - cundinamarca
ING - Luis Monroy


7 mar 2026 9:51:32 a. m.
4.43724081N 74.33284307W ±3.79m
Fusagasuga - Sibate
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2245.6msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 657
Las Fronteras


4.437
Las Fronteras


7 mar 2026 9:51:26 a. m.
4.43723212N 74.33283325W ±4.07m
Fusagasuga - Sibate
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2244.9msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 656
Las Fronteras

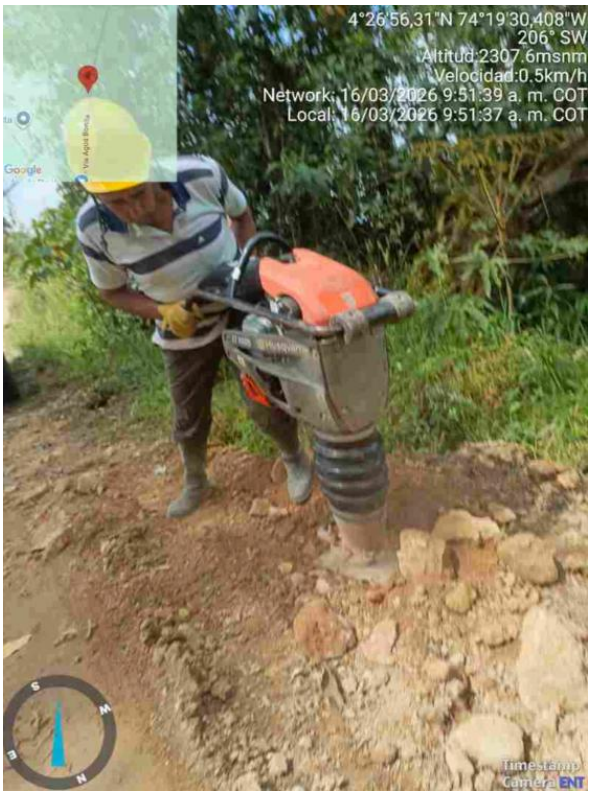

9 mar 2026 11:28:48 a.m.
4°26'14.46"N 74°19'56.628"W
Km 37 Vía Sibate Fusagasuga
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2236.0msnm
Velocidad:1.7km/h
Silvania - cundinamarca
ING - Luis Monroy


11 mar 2026 4:33:42 p. m.
4.43762684N 74.33704544W ±3.79m
Fusagasuga - Sibate
Silvania
Cundinamarca
Altitud:2149.5msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 693




Las Fronteras
Network: 12/03/2026 10:20:22 a. m. COT
Local: 12/03/2026 10:20:21 a. m. COT
Timestamp Camera


Network: 13/03/2026 3:49:04 p. m. COT
Local: 13/03/2026 3:49:03 p. m. COT
Timestamp Camera


4°26'56,31"N 74°19'30,408"W
206° SW
Altitud:2307.6msnm
Velocidad:0.5km/h
Network: 16/03/2026 9:51:39 a. m. COT
Local: 16/03/2026 9:51:37 a. m. COT
Timestamp Camera


Las Fronteras

2. REGISTRO FOTOGRAFICO ESTACIÓN DE ALMACENAMIENTO AGUABONITA



