INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA

TIERRASUA ¡Conectamos región!

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	10			FECHA:	6	de	JUNIO	de	2026		
PERIODO: DEL	1	de	MAYO	de	2026	AL	31	de	MAYO	de	2026

CONTRATO No:	IPVO-017-2025	DE	2025	REGISTRO BP Y P No	REGALIAS

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL, CONTABLE, Y JURIDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACION:

El proyecto se localiza específicamente en la vía secundaria (61BY10) Úmbita - Puente Sisa, en la abscisa de inicio K7+660 y final K9+160.

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	REPRESENTANTE LEGAL:
JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	**JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ**
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONSULTORÍA:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
CONSORCIO SISA 25 R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ	**JULIÁN EDGARDO GUERRERO RINCON**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
	N/A	0	N/A
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

VALOR INICIAL:	$ 368.302.174,03	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 368.302.174,03

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	18	de	JUNIO	de	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	2	de	JULIO	de	2026

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO INTERV.	**89,47%**	% DE AVANCE CTO DE OBRA	**65,91%**	% PROGRAMADO CTO DE OBRA	**78,84%**



PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

No PÓLIZA	39-44-101174421		ANEXO No.	2	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19	8	2025	21	12	2026	$ 36.830.217,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19	8	2025	20	6	2029	$ 36.830.217,40
CALIDAD DEL SERVICIO	19	8	2025	20	6	2031	$ 73.660.434,81

No PÓLIZA	39-44-101174421		ANEXO	2	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA

TIERRASUA ¡Conectamos región!

NO POLIZA	55-44-101174421		No.	2	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	19	8	2025	20	6	2026	$ 284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	19	8	2025	20	6	2026	$ 284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	19	8	2025	20	6	2026	$ 284.700.000,00

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO DE INTERVENTORÍA	19	8	2025
ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO	19	8	2025
ACTA DE SUSPENSIÓN 1 DE INTERVENTORIA	31	12	2025
ACTA DE REINICIO 1 DE INTERVENTORÍA	13	1	2026

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	
INTERVENTORÍA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA)	K9+150 - K9+160
INTERVENTORIA TÉCNICA EXCAVACIÓN DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	K7+660 - K9+160
INTERVENTORIA TÉCNICA SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL	K7+660 - K9+160
INTERVENTORIA TÉCNICA CONFORMACIÓN DE BOTADERO O ESCOMBRERA	Disposición de material de excavación
OBRAS DE DRENAJE	
INTERVENTORIA TÉCNICA EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	Alcantarillas
INTERVENTORIA TÉCNICA EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO	Alcantarillas
INTERVENTORIA TÉCNICA RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBRO COMPACTADOR	Alcantarillas
INTERVENTORIA TÉCNICA INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	Alcantarillas
INTERVENTORIA TÉCNICA INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	Alcantarillas
INTERVENTORIA TÉCNICA INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	Alcantarillas
INTERVENTORIA TÉCNICA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D-36", INCLUYE EMBOQUILLADA	Alcantarillas
INTERVENTORIA TÉCNICA FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Alcantarillas, cunetas y bordillos
INTERVENTORIA TÉCNICA CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	Cunetas y bordillos
INTERVENTORIA TÉCNICA MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D=6 MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	Cunetas y bordillos
INTERVENTORIA TECNICA CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	Filtros
INTERVENTORÍA SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	Filtros
INTERVENTORÍA TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)	Rellenos y mejoramientos de suelo de rasante.
PAVIMENTO FLEXIBLE	

INTERVENTORIA TÉCNICA CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACIÓN)	Cunetas y bordillos
INTERVENTORIA TÉCNICA INSTALACIÓN DE PEDRAPLÉN COMPACTO.	Mejoramiento de suelo de rasante.
INTERVENTORIA TÉCNICA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS.	Estructura de pavimento
INTERVENTORIA TÉCNICA SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM).	Estructura de pavimento
INTERVENTORIA TÉCNICA SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM).	Estructura de pavimento
INTERVENTORIA TÉCNICA IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1H	Estructura de pavimento
INTERVENTORÍA TÉCNICA CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS	Estructura de pavimento
INTERVENTORIA TÉCNICA TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULARES DESPUÉS DE 5 KM.	Estructura de pavimento
INTERVENTORIA TÉCNICA TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUÉS DE 5 KM.	Estructura de pavimento

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
Cinta métrica.	Verificación dimensiones	30%	Interventoría
Computador.	Elaboración de informes.	100%	Interventoría
Elementos de oficina.	Elaboración de informes.	50%	Interventoría
Estación total topografía y rtk	Verificación topografía	40%	Interventoría

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA			VALOR
Anticipo				**N/A**
Acta Parcial No. 1	24	12	2025	$ 122.866.672,22
Acta Parcial No. 2	24	3	2026	$ 96.986.239,15
Acta Parcial No. 3	1	6	2026	$ 107.889.655,05
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 327.742.566,42**

SOLICITUDES PRESENTADAS

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
2/05/2026	TIERRASUA S.A.S.	ACTA DE COMITE DE OBRA #16	REVISADO Y APROBADO POR LA SUPERVISION.
4/05/2026	TIERRASUA S.A.S.	INFORME SEMANAL 36 DE INTERVENTORIA	REVISADO Y APROBADO POR LA SUPERVISION.
5/05/2026	TIERRASUA S.A.S.	INFORME MENSUAL 9 DE INTERVENTORIA	REVISADO Y APROBADO POR LA SUPERVISION.
6/05/2026	TIERRASUA S.A.S.	Fwd: INFORME 09, 01/04/2026 - 30/04/2026	REVISADO Y APROBADO POR LA SUPERVISION.
6/05/2026	TIERRASUA S.A.S.	REMISION DOCUMENTACIÓN MODIFICATORIO DE OBRA #1	EN REVISIÓN Y EVALUACIÓN
12/05/2026	TIERRASUA S.A.S.	INFORME SEMANAL 37 DE INTERVENTORIA	REVISADO Y APROBADO POR LA SUPERVISION.
13/05/2026	TIERRASUA S.A.S.	Fwd: ACTA PARCIAL 2 AUSTADA	REVISADO Y APROBADO POR LA SUPERVISION.
14/05/2026	TIERRASUA S.A.S.	Fwd: Remisión oficio solicitud de prórroga contrato IPO 001-2025	REVISADO Y APROBADO POR LA SUPERVISION.
15/05/2026	TIERRASUA S.A.S.	REMISION DOCUMENTACIÓN AJUSTADA MODIFICATORIO DE OBRA #1	EN REVISIÓN Y EVALUACIÓN

19/05/2026	TIERRASUA S.A.S.	INFORME SEMANAL 38 DE INTERVENTORIA	REVISADO Y APROBADO POR LA SUPERVISION.
19/05/2026	TIERRASUA S.A.S.	SOLICITUD DE ENTREGA DE RESULTADOS DE ENSAYOS	REVISADO Y APROBADO POR LA SUPERVISION.
19/05/2026	TIERRASUA S.A.S.	CITACION A COMITÉ TECNICO DE OBRA #18	REVISADO Y TRAMITADO POR LA SUPERVISION.
20/05/2026	TIERRASUA S.A.S.	ACTA DE COMITE DE OBRA #17	REVISADO Y APROBADO POR LA SUPERVISION.
25/05/2026	TIERRASUA S.A.S.	INFORME SEMANAL 39 DE INTERVENTORIA	REVISADO Y APROBADO POR LA SUPERVISION.
27/05/2026	TIERRASUA S.A.S.	ACTA PARCIAL 03 CONTRATO N° IPVO – 017 - 2025	REVISADO Y APROBADO POR LA SUPERVISION.

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	7.172.271	X	X	X	1	5	2026	31	5	2026
ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ	1.054.254.612	X	X	X	1	5	2026	31	5	2026
MARÍA CLARA CÁCERES ESTUPIÑÁN	39.724.228	X	X	X	1	5	2026	31	5	2026
CLAUDIA ROCÍO SUAREZ CASTILLO	52.351.443	X	X	X	1	5	2026	31	5	2026
JORGE ANDRÉS ROA ROMERO	1.049.622.654	X	X	X	1	5	2026	31	5	2026
HERNANDO ANDRÉS ÁLVAREZ ARÉVALO	7.181.652	X	X	X	1	5	2026	31	5	2026

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA*

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	7.172.271
RESIDENTE DE INETERVENTORIA	ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ	1.054.254.612
PROFESIONAL DE ASEGURAMIENTO O GESTIÓN DE CALIDAD	MARÍA CLARA CÁCERES ESTUPIÑÁN	39.724.228
ESPECIALISTA HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO	CLAUDIA ROCÍO SUAREZ CASTILLO	52.351.443
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JORGE ANDRÉS ROA ROMERO	1.049.622.654
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	HERNANDO ANDRÉS ÁLVAREZ ARÉVALO	7.181.652

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Solicitud y verificación de manejo de escombros y licencias de explotación de materiales	PROYECTO EN GENERAL
Solicitud implementación PMA	PROYECTO EN GENERAL
Se solicitó la instalación de señalización adecuada acorde con las actividades ejecutas en campo.	PROYECTO EN GENERAL
Se solicitó afiliación de todo el personal que ingreso, tanto al sistema de salud, pensión y riesgos laborales. Y entrega de los respectivos exámenes de ingreso.	PROYECTO EN GENERAL
Se solicitó la implementación del SG-SST, con los seguimientos al PMA y entrega de las evidencias realizadas.	PROYECTO EN GENERAL
Solicitud de entrega de EPP's y verificación del uso de estos, control de seguridad social integral y manejo de materiales	PROYECTO EN GENERAL
La interventoría ha requerido al contratista con el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad industrial, por medio de oficios, comités técnicos y bitácora de obra, al igual, se han revisado los informes del PMA y se han solicitado ajuste y aclaraciones al mismo.	PROYECTO EN GENERAL

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	12	11	2025	En estudio
Concreto para muros cajas encole y aletas descole alcantarillas.	19	11	2025	En estudio
Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	20	11	2025	En estudio
Concreto para muros cajas encole y aletas descole alcantarillas.	26	11	2025	En estudio
Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	28	11	2025	En estudio
Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	2	12	2025	En estudio
Concreto para muros cajas encole y aletas descole alcantarillas.	3	12	2025	En estudio
Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	5	12	2025	En estudio
Concreto para muros cajas encole y aletas descole alcantarillas.	10	12	2025	En estudio
Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	13	12	2025	En estudio
Concreto para muros cajas encole y aletas descole alcantarillas.	16	12	2025	En estudio
Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	18	12	2025	En estudio
Concreto para muros cajas encole y aletas descole alcantarillas.	20	12	2025	En estudio
Concreto para tuberías de alcantarillas.	28	1	2026	En estudio
Concreto para cunetas y bordillos.	22	5	2026	En estudio
Concreto para cunetas y bordillos.	29	5	2026	En estudio

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de Comité de Obra No 1	26	8	2025	VERIFICACION AVANCE Y ESTADO DE OBRA
Acta de Comité de Obra No 2	5	9	2025	VERIFICACION AVANCE Y ESTADO DE OBRA
Acta de Comité de Obra No 3	19	9	2025	VERIFICACION AVANCE Y ESTADO DE OBRA
Acta de Comité de Obra No 4	3	10	2025	SEGUIMIENTO DE OBRA
Acta de Comité de Obra Extraordinario	14	10	2025	SEGUIMIENTO DE OBRA
Acta de Comité de Obra No 5	16	10	2025	SEGUIMIENTO DE OBRA
Acta de Comité de Obra Extraordinario	22	10	2025	VISITA CONSULTORES
Acta de Comité de Obra No 6	30	10	2025	SEGUIMIENTO DE OBRA
Acta de Comité de Obra No 7	13	10	2025	SEGUIMIENTO DE OBRA
Acta de Comité de Obra No 8	27	10	2025	SEGUIMIENTO DE OBRA
Acta de Comité de Obra No 9	11	12	2025	SEGUIMIENTO DE OBRA
Acta de Comité de Obra No 10	20	1	2026	SEGUIMIENTO DE OBRA
Acta de Comité de Obra No 11	6	2	2026	SEGUIMIENTO DE OBRA
Acta de Comité de Obra No 12	19	2	2026	SEGUIMIENTO DE OBRA
Acta de Comité de Obra No 13	5	3	2026	SEGUIMIENTO DE OBRA
Acta de Comité de Obra No 14	19	3	2026	SEGUIMIENTO DE OBRA
Acta de Comité de Obra No 15	9	4	2026	SEGUIMIENTO DE OBRA
Acta de Comité de Obra No 16	24	4	2026	SEGUIMIENTO DE OBRA
Acta de Comité de Obra No 17	7	5	2026	SEGUIMIENTO DE OBRA

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	19	8	2025	31	8	2025	Informe remitido por el contratista, revisado y tramitado para cargue en secop II.
Informe de Supervisión No. 2	1	9	2025	30	9	2025	Informe remitido por el contratista, revisado y tramitado para cargue en secop II.

Informe de Supervisión No. 3	1	10	2025	31	10	2025	Informe remitido por el contratista, revisado y tramitado para cargue en secop II.
Informe de Supervisión No. 4	1	11	2025	30	11	2025	Informe remitido por el contratista, revisado y tramitado para cargue en secop II.
Informe de Supervisión No. 5	1	12	2025	30	12	2025	Informe remitido por el contratista, revisado y tramitado para cargue en secop II.
Informe de Supervisión No. 6	13	1	2026	31	1	2026	Informe remitido por el contratista, revisado y tramitado para cargue en secop II.
Informe de Supervisión No. 7	1	2	2026	28	2	2026	Informe remitido por el contratista, revisado y tramitado para cargue en secop II.
Informe de Supervisión No. 8	1	3	2026	31	2	2026	Informe remitido por el contratista, revisado y tramitado para cargue en secop II.
Informe de Supervisión No. 9	1	4	2026	30	4	2026	Informe remitido por el contratista, revisado y tramitado para cargue en secop II.
Informe de Supervisión No. 10	1	5	2026	31	5	2026	Presente informe

OBSERVACIONES

Se recibe informe mensual N° 10 por parte del contratista de interventoria Jaime Humberto Pinzón Álvarez , en el cual describe las actividades ejecutadas para el seguimiento y control a la ejecución del contrato de obra IPO-001-2025. Se relaciona seguimiento técnico de las actividades ejecutadas por parte del contratista de obra, además del seguimiento ambiental, social, de seguridad PMT, verificación de equipos y maquinaria, bitácora de obra, cumplimiento de personal, control de examenes y EPPs, certificación de cumplimiento con el pago se aportes al sistema de seguridad social para el mes de mayo, certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos, certificación de ejecución de actividaes mes 10, soportes de seguimiento a la inversion del acnticipo, registro fotografico, correspondencia enviada y recibida, Informes de avance semanal del periodo. En el presente periodo se llevo a cabo seguimiento a la ejecución de actividades en obra por parte del DNP. Con corte al 31 de mayo de 2026 se reporta un avance de ejecución acumulado del 65,91%.

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORÍA

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No
INFORME DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	SI	143-148
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación) contrato de Interventoría	YA SE RADICO	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	YA SE RADICO	
El personal de Interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	11-13
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	NO	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	NO	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	150-161
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	115-126
Generales		
Certificación de ejecución de actividades	SI	52-55

INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA	TIERRASUA ¡Conectamos región!

Registro fotográfico	SI	29-33
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	87-114

OBSERVACIONES:

FIRMA:

Supervisor

NOMBRE:	JULIAN EDGARDO DUERRERO RINCON

VoBo. JUAN SEBASTIAN GONZALEZ AMAYA

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESPECIALISTA TEC. EN INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° IPVO 017-2025

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL, CONTABLE, Y JURIDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

PRESENTADO A:

TIERRASUA S.A.S
NIT. 901.285.377-2

ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR

INFORME N° 10 -V1
Del 1 al 31 de mayo de 2026

ORIGINAL
JUNIO DE 2026

PRESENTACIÓN DEL INFORME

El Ingeniero JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ, subscribió el CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° IPVO 017-2025cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL, CONTABLE, Y JURIDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", con TIERRASUA S.A.S, para el seguimiento y control de un contrato de obra.

El Contrato de obra es el N° IPO 001-2025, desarrollado por el contratista de obra CONSORCIO SISA 25, representado legalmente por el Ing. JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ cuyo objeto es la "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", y para la cual la entidad contratante es TIERRASUA S.A.S.

Los contratos se firmaron en julio de 2025 y las actas de inicio de los contratos de Obra y de interventoría se suscribieron el 19 de agosto de 2025, teniendo un plazo total de diez (10) meses; se suscriben actas de suspensión 1 de los contratos de obra e interventoría el día 31 de diciembre de 2025 y actas de reinicio 1 el día 13 de enero de 2026; en labores de interventoría se tiene por objetivo la inspección y aprobación de las actividades ejecutadas por el contratista, según los planos, diseños y especificaciones entregados por la entidad contratante.

OBJETIVOS

- ✓ Informar de forma clara y precisa a la entidad contratante de lo ocurrido en el proceso de Interventoría mencionado durante el periodo de ejecución pactado para un total de DIEZ (10) meses, dentro del tiempo estimado en el contrato de obra.

- ✓ Verificar que se ejecuten las obligaciones por parte del contratista, de acuerdo objeto contractual del contrato.

- ✓ Verificar que el contratista cumpla con especificaciones técnicas según lo descrito con los procedimientos técnicos de la normatividad vigente.

- ✓ Verificar el estado real ejecutado a la fecha, desde el 19 de agosto de 2025 al 31 de diciembre de 2025 fecha de suspensión 1 de los contratos de obra e interventoría y desde el 13 de enero de 2026 fecha de reinicio 1, a la fecha de corte del presente informe.

1. INFORMACIÓN GENERAL.

INFORME N.º: DIEZ (10).

PERIODO DEL INFORME: Del 1 al 31 de mayo de 2026.

1.1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Numero:	N° IPVO 017-2025
Contratista:	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
NIT:	7172271 - 2
Rep. Legal:	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
Valor Inicial:	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE ($368,302,174.03)
Valor adicional:	N/A
Valor actualizado:	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE ($368,302,174.03)
Fecha de Inicio:	19 DE AGOSTO DE 2025
Fecha suspensión 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de reinicio 1:	13 DE ENERO DE 2026
Fecha prevista finalización inicial:	18 DE JUNIO DE 2026.
Fecha prevista finalización vigente:	2 DE JULIO DE 2026
Valor anticipo inicial:	N/A
Valor anticipo adicional:	N/A
Valor anticipo total:	N/A

EQUIPO HUMANO:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	ING. ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ

PROFESIONAL DE ASEGURAMIENTO O GESTIÓN DE CALIDAD	MARIA CLARA CACERES ESTUPIÑAN
ESPECIALISTA HIDRÁULICO E HIDROLÓGIC	ING. CLAUDIA ROCIO SUAREZ CASTILLO
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	ING. JORGE ANDRES ROA ROMERO
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	ING. HERNANDO ANDRES ALVAREZ AREVALO

1.2. CONTRATO DE OBRA

Numero:	N° IPO 001-2025
Contratista:	CONSORCIO SISA 25
NIT:	901.969.390-5
Rep. Legal:	JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ
C.C:	6.775.637 de Tunja
Valor Inicial:	CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 5.260.771.954,77)
Valor adicional:	N/A
Valor actualizado:	CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 5.260.771.954,77)
Fecha de Inicio:	19 DE AGOSTO DE 2025
Fecha suspensión 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de reinicio 1:	13 DE ENERO DE 2026
Fecha prevista finalización inicial:	18 DE JUNIO DE 2026.
Fecha prevista finalización vigente:	2 DE JULIO DE 2026
Valor anticipo inicial:	DOS MIL CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($2,104,308,781.91)
Valor anticipo adicional:	N/A

Valor anticipo total:	DOS MIL CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($2,104,308,781.91)

EQUIPO HUMANO:

DIRECTOR DE OBRA:	ING. YOFRE LEONIDAS LOPEZ MERCHAN
RESIDENTE DE OBRA:	ING. NESTOR ANDRES MEDINA ROA
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	ING. JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ
ESPECIALISTA EN INGENIERIA AMBIENTAL	ING. ELIZABETH MAHECHA VALERO
ESPECIALISTA EN HSEQ	ING. HUGO MAURICIO SUAREZ RINCON

1.3. ENTIDAD CONTRATANTE

TIERRASUA S.A.S
NIT. 901.285.377-2

SUPERVISOR:	Ing. JULIAN EDGARDO GUERRERO
Supervisor–	Entidad contratante

1.4. CAPITULO ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO.

A la fecha los contratos de obra, de acuerdo al contrato suscrito, y del contrato de Interventoría se encuentran vigentes, de acuerdo al acta de reinicio #1, pólizas establecidas y plazo de los mismos.

1.4.1. PÓLIZAS DEL CONTRATISTA DE OBRA

- **CONTRATO DE OBRA IPO 001-2025**

- N° DE PÓLIZA 94219 Anexo 2
- COMPAÑÍA ASEGURADORA: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS.

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA									
No PÓLIZA	94219	ANEXO No.	2	ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							14	1	2026

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19	8	2025	1	1	2027	$ 526,077,196.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	19	8	2025	2	11	2026	$ 2,104,308,782.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19	8	2025	2	7	2029	$ 526,077,196.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	19	8	2025	2	7	2031	$ 1,052,154,391.00

- N° DE PÓLIZA 27100 Anexo 3
- COMPAÑÍA ASEGURADORA: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS

No PÓLIZA	27100	ANEXO No.	3	ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							14	1	2026

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	30	5	2025	2	7	2026	$ 569,400,000.00

- **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. IPVO 017-2025**

- N° DE PÓLIZA 39-44-101174421 – ANEXO 5
- COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA									
No PÓLIZA	**39-44-101174421**	ANEXO No.	5	ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**	FECHA EXP	de	mm	a
							23	02	2026

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	de	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19	08	2025	04	01	2027	$36,830,217.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19	08	2025	04	07	2029	$36,830,217.40
CALIDAD DEL SERVICIO	19	08	2025	04	07	2031	$73,660,434.81

- N° DE PÓLIZA 39-40-101045618 – ANEXO 4
- COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA									
No PÓLIZA	**39-40-101045618**	ANEXO No.	4	ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**	FECHA EXP	de	mm	a
							23	02	2026

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	de	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	19	08	2025	04	07	2026	$350,181,000.00

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	19	08	2025	04	07	2026	$350,181,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	19	08	2025	04	07	2026	$350,181,000.00

1.5. LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en el municipio Úmbita, provincia de Márquez, departamento de Boyacá, y comprende la construcción de 1500 metros lineales de pavimento flexible con respectivas cunetas laterales, además de construcción de alcantarillas a lo largo del tramo a intervenir, y se pretende la construcción de 1160 metros lineales de filtro.
Dicha intervención se realizará desde la abscisa K7+660 al K9+160 con coordenadas de inicio: E4950295,650 N2134652,658 y Fin E4949889,199, N2314999.383.



Ilustración 1. Imagen de Google e informe



Ilustración 2. Ubicación general del proyecto

2.6 ANTECEDENTES

Que, el Departamento de Boyacá mediante Decreto 1182 del 20 de diciembre de 2024, priorizó y aprobó el proyecto denominado: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Con BPIN 2024004150432, por un valor total de CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE ($5.629.761.803,07), los cuales soportan su financiamiento de la siguiente manera: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE

($779.382.431,31) con cargo a los recursos del 60% de la Asignación para la Inversión Regional Departamento de Boyacá para el Bienio 2023 - 2024, la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL QUIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 4.220.617.568,69) del 60% de la Asignación para la Inversión Regional Departamento de Boyacá para el Bienio 2025 - 2026, y SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 629.761.803,07), con cargo a la Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría Municipio de Úmbita para el Bienio 2023-2024.

Que así mismo, el Departamento de Boyacá mediante Decreto No. 0270 del 19 de marzo de 2025, realizó ajuste del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Con BPIN 2024004150432, designándose como entidad ejecutora del Proyecto de inversión y su interventoría a la Sociedad de Economía Mixta TIERRASUA S.A.S.

Que la sociedad TIERRASUA S.A.S., adelantó los respectivos estudios previos, estudios del sector y demás anexos, y adelantó la respectiva INVITACIÓN PUBLICA DE OFERTAS RE- IPO-001 -2025, Que, dentro De acuerdo con los resultados de la verificación de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras, así como a la ponderación de criterios de selección objetiva, se dio publicidad del informe final de evaluación, teniéndose en cuenta las observaciones y/o subsanaciones al informe preliminar por parte de los oferentes, en el que el comité evaluador sugirió de acuerdo con los resultados del proceso de selección, adjudicar la INVITACION PUBLICADE OFERTAS RE-IPO-001-2025 al oferente CONSORCIO SISA 25, representado legalmente por JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ, identificado con C.C. No. 6.775.637 de Tunja, por cumplir con los requisitos habilitantes y obtener un puntaje de (99.9494 PUNTOS) como criterios de selección ponderables, tratándose de una propuesta favorable para la entidad.

Que la sociedad TIERRASUA S.A.S., adelantó los respectivos estudios previos, estudios de mercado e invitación con el fin de realizar la convocatoria de invitación privada de varias ofertas IPVO – 021 - 2025, Que, atendiendo a la recomendación efectuada por el comité evaluador como consecuencia del proceso contractual INVITACIÓN PRIVADA DE VARIAS OFERTAS IPVO – 021 - 2025, la sociedad TIERRASUA S.A.S, encuentra conveniente ADJUDICAR el precitado proceso a JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ, identificado con C.C 7.172.271 de Tunja, de acuerdo a su propuesta económica presentada.

2. INFORME TÉCNICO

De acuerdo al contrato de obra, el cual fue firmado desde el pasado treinta (30) días del mes de julio de 2025, de las actas de inicio firmadas el 19 de agosto de 2025, y de las diferentes mesas y comités desarrollados con el supervisor de la entidad contratante, así como con los funcionarios del municipio de Umbita, y de las visitas al sitio de las obras realizadas, y de la socialización con la comunidad, se conoció el sitio y aspectos relevantes del proyecto.

Posterior al recibo de la información técnica, de estudios y diseños que dieron origen al proyecto, se realiza un análisis de información de documentos precontractuales, análisis de soportes de entrega del contratista de obra, respuestas y recomendaciones a la entidad contratante, contratista de obra inicia con la ejecución de las actividades de obra.

En la ejecución de obra se empieza por la localización y replanteo topográfico del proyecto en todo el trayecto de intervención del proyecto, continuando con las excavaciones mecánicas para ampliación de la vía y disposición final del material proveniente de estas excavaciones al botadero conformado; posteriormente se empieza la ejecución de las excavaciones mecánicas y manuales para las obras de arte del proyecto, empezando por las alcantarillas, de igual manera se realiza la instalación de solados y atraques para la posterior instalación de tubería en concreto reforzado de 36", se deja en claridad que debido a las condiciones del terreno se tienen algunos imprevistos en los cuales ha requerido hacer sobre excavaciones, así como mejoramientos al terreno natural, para lo cual se ha recomendado al contratista de obra, empezar a justificar e incluir estas actividades dentro del rubro de imprevistos que contempla el proyecto.

Sin embargo, el contratista continúa con la ejecución de las actividades de obra propias de la construcción de las alcantarillas, continuando con la instalación de tuberías, solados y atraques de estas, así como los solados de limpieza para los concretos de las estructuras de descole y encole, para lo cual se ha instalado el acero de refuerzo y posterior fundida de concreto para estos mismos elementos.

De igual manera se ha empezado con actividades de excavaciones mecánicas para filtros de drenaje y cajeos para mejoramientos de suelo, para la construcción de filtros se empiezan desde la abcisa K7+660 hasta el K9+160, realizando instalación de geotextil, tubería de drenaje de 4" y así mismo el relleno con piedra para filtro según granulometría especificada en diseños, alternamente se realizan cajeos y mejoramientos de suelo con pedraplén y material granular en este mismo trayecto referenciado.

Del mismo modo el contratista empieza la construcción de la estructura del pavimento, empezando con la localización y replanteo topográfico, verificación de niveles y anchos de vía, así como la instalación de geotextil para separar la subrasante con la estructura de pavimento; enseguida se inicia a extender, instalar y compactar la sub base granular empezando desde la abcisa K9+160 a la K7+660 aproximadamente.

Posteriormente se tiene toma de densidades de compactación para liberar esta capa granular, los cuales los resultados son entregados por el contratista de obra y verificados con la toma de muestras por parte de interventoría, validando y corroborando la información y procediendo a autorizar la instalación, extendida y compactación de base granular empezando desde la abcisa K9+160 a la K7+660 aproximadamente.

De igual manera se menciona que se empieza con el paisjismo y contención de taludes activos en zonas de alcantarillas mediante la alternativa y propuesta realizada por el contratista de obra, en especial en los encoles de las alcantarillas 5, 7, 8, 10 y 11.

Del mismo modo la contratista continua la construcción de la estructura del pavimento, empezando con la localización y replanteo topográfico, verificación de niveles y anchos de vía; enseguida se inicia a extender, instalar y compactar la base granular empezando desde la abcisa K9+160 a la K7+660 aproximadamente.

Posteriormente se tiene toma de densidades de compactación para liberar esta capa granular, los cuales los resultados son entregados por el contratista de obra y verificados con la toma de muestras por parte de interventoría, validando y corroborando la información y procediendo a autorizar la instalación, extendida y compactación de carpeta asfaltica empezando desde la abcisa K9+160 a la K8+235 aproximadamente.

De la misma manera se tiene inicio de cuneteo y perfilado de la vía, instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillo, así como el encofrado de estos elementos y su posterior fundida en concreto de 3000 psi, para lo cual se han tomado muestras y se ha solicitado a contratista entrega de los resultados para verificación de la calidad de los mismos.

Así mismo se han desarrollado comités de obra, en donde se requirió la presencia del consultor y diseñador del proyecto, con el fin de realizar aclaraciones a algunas observaciones encontradas durante la ejecución del proyecto, debido a las condiciones que se presentan en el terreno.

2.1. SOLICITUDES Y RECOMENDACIONES DE INTERVENTORÍA

De acuerdo al contrato de obra, y de los pliegos de condiciones, estudios previos y normas contractuales se solicitó:

.

1. Copia física y magnética de la propuesta técnica y económica presentada por el contratista de obra.
2. Copia de las pólizas y garantías, a favor de la entidad contratante, tanto de las iniciales del contrato, como de las actualizadas con el acta de inicio de obra.
3. Presentar a la interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato a la para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el contrato de obra:
    a. Hojas de vida del personal profesional.
    b. Relación del equipo mínimo obligatorio.
    c. Entrega de copia editable del presupuesto general de la obra.
    d. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica.
    e. Programa de obra y flujo de inversión.
    f. Plan de manejo de tránsito- PMT.
    g. Plan de adaptación de la guía ambiental.
    h. Caracterización del tramo vial.
    i. Plan de inversión del anticipo.
    j. Copia del contrato de fiducia mercantil para el manejo del anticipo.
    k. Copia de las afiliaciones a los sistemas de seguridad social integral, del personal administrativo y operativo, a nombre del Consorcio.
    l. Los demás que puedan exigirse, derivados del pliego de condiciones y del contrato.
4. Presentar antes de quince (15) días calendario, el concepto técnico de los estudios y diseños recibidos de la entidad, contados a partir del acta de inicio; superado este plazo, al NO presentar ninguna solicitud por parte del contratista, se entenderá, que acepta su contenido.
5. Presentar del programa de obra y flujo de inversión, y cumplir con el mismo. Este documento debe ser entregado en medio físico firmado y en medio magnético editable, para su verificación.
6. Entregar el organigrama de trabajo de acuerdo a la propuesta presentada.
7. Diligenciar y entregar para revisión las actas de vecindad del proyecto, tanto de los predios y edificaciones como de las vías y redes municipales aledañas al proyecto. En

este documento se debe realizar de manera clara las revisiones de arboles o especies nativas que deban ser retiradas del trazado entregado para su construcción.

8. Instalar la valla informativa sobre el proyecto en la cual se indique la información del proyecto. Para ello debe solicitar a la entidad modelo, datos y lugar de instalación.
9. Deberá entregar una certificación suscrita por el contratista de obra, en la que se manifieste de manera expresa la revisión y aprobación de los estudios y diseños y se indique que las cantidades de obra determinadas en el presupuesto son suficientes para la ejecución y construcción del proyecto.
10. Se realiza especial solicitud de dar cumplimiento a la cláusula séptima. *OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA,* dado que en la misma se enmarcan las principales obligaciones para el correcto desarrollo del contrato de obra, de la referencia.
11. Todas las obligaciones generales y específicas definidas en el contrato de la referencia.

Adicional a ello la interventoría se permite recordar:

- El plazo previsto para la realización de las obras, de acuerdo al contrato de obra, es de diez (10) meses.
- La interventoría no aprueba la ejecución de actividades no previstas o desarrollo de mayores cantidades de obra, sin la autorización expresa y escrita de la entidad contratante, en caso de realizarse por el contratista de obra este tipo de obras, será por su cuenta y riesgo y no se tomará como base para posibles futuras reclamaciones.

CAPITULO ADMINISTRATIVO:

2.2. RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ

En los anexos se adjuntan las actas de comité técnico, realizadas a la fecha del presente informe.

2.3. COPIA DE LA BITACORA

En los anexos se adjuntan copia de la bitácora para el periodo del presente informe. En el libro diario de obra se anotarán las actividades ejecutadas, el personal que está en campo, el equipo, pruebas, y demás condiciones de acuerdo a las tareas desarrolladas.

2.4. PERSONAL.

Por parte del contratista de obra ha entregado la seguridad social que corresponde al mes de abril de 2026, del personal operativo, así como administrativo ofertado en la propuesta, del mismo modo.

- **Personal Interventoría.**

Desde el inicio de los trabajos el personal en obra con la dedicación exigida en los documentos contractuales ha sido el siguiente:

Por parte de la firma Interventora.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	ING. ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ
PROFESIONAL DE ASEGURAMIENTO O GESTIÓN DE CALIDAD:	MARIA CLARA CACERES ESTUPIÑAN
ESPECIALISTA HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO:	ING. CLAUDIA ROCIO SUAREZ CASTILLO
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA:	ING. JORGE ANDRES ROA ROMERO
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS:	ING. HERNANDO ANDRES ALVAREZ AREVALO

- **Personal de Obra.**

DIRECTOR DE OBRA:	ING. YOFRE LEONIDAS LOPEZ MERCHAN
RESIDENTE DE OBRA:	ING. NESTOR ANDRES MEDINA ROA
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	ING. JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ
ESPECIALISTA EN INGENIERIA AMBIENTAL	ING. ELIZABETH MAHECHA VALERO
ESPECIALISTA EN HSEQ	ING. HUGO MAURICIO SUAREZ RINCON

3. PLAN DE TRABAJO / CRONOGRAMA DE OBRA.

Se anexó por el contratista de obra, en proyección mensual y semanal, los cuales incluyen duración, actividades con precedencias y sucesoras. Se encuentra suscrita por el representante legal de CONSORCIO SISA 25. Para el cual la interventoría hace la respectiva verificación del plan de trabajo establecido por el contratista.

ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL INICIO DE OBRA HASTA EL CORTE DEL PRESENTE INFORME

Durante el mes de mayo se dio inicio y/o continuación a la ejecución de las actividades contempladas en el contrato de obra No. IPO 001-2025, las cuales se hacen referencia a continuación:

- ✓ Socialización y recorrido del proyecto a la comunidad, contando con presencia de alcaldía municipal, concejo municipal, entidad contratante TIERRASUA S.A.S, equipos de contratista de obra e interventoría y la comunidad en general.
- ✓ Localización y replanteo topográfico de obra.
- ✓ Excavaciones mecánicas y cortes requeridos para la ampliación de la vía del proyecto.
- ✓ Retiro de material proveniente de excavaciones hacia botadero.
- ✓ Excavaciones mecánicas para construcción de obras de arte como alcantarillas.
- ✓ Instalación de solados y atraques para la tubería en concreto reforzado de las alcantarillas.
- ✓ Instalación de tuberías en concreto reforzado de 36", emboquillado de las mismas, para las alcantarillas 1 a 11 del proyecto.
- ✓ Instalación de solados de limpieza para concretos de las estructuras de las alcantarillas.
- ✓ Amarre e instalación de acero de refuerzo para placas de piso de cajas de encole y descole de alcantarillas, así como de los muros de las pocetas y aletas de las mismas.
- ✓ Fundida de concretos de 3000 PSI para las placas de piso de cajas de encole y descole de alcantarillas, así como de muros de aletas y pocetas de alcantarillas.
- ✓ Excavaciones mecánicas para construcción de filtros de drenaje y cajeos para mejoramientos de suelos.
- ✓ Construcción de filtros de drenaje, instalación de geotextil, tubería de 4"y piedra filtro.
- ✓ Mejoramientos de suelos mediante cajeos, con instalación y compactación de pedraplén compacto y material granular.
- ✓ Conformación de subrasante mediante nivelación e instalación de afirmado granular, debidamente compactado.
- ✓ Extendida e instalación de geotextil para separación de sub rasante con estructura de pavimento.
- ✓ Extendida, instalación y compactación de sub base granular.
- ✓ Toma de densidades de compactación a la capa de subbase granular por parte de contratista de obra y control de interventoría.
- ✓ Extendida, instalación y compactación de base granular.
- ✓ Toma de densidades de compactación a la capa de base granular por parte de contratista de obra y control de interventoría.

- ✓ Extendida, instalación y compactación de carpeta asfáltica.
- ✓ Toma de ensayos y control de calidad de la carpeta asfáltica por parte de contratista de obra y control de interventoría.
- ✓ Cuneteo y perfilado de la vía, instalación y amarre de acero de refuerzo para cunetas y bordillos de la vía.
- ✓ Enconfrado y posterior fundida de concreto de 3000 psi para cunetas y bordillo de la vía.
- ✓ Paisajismo y contención de taludes activos en zonas de encole de alcantarillas.
- ✓ Seguimiento y control del PMT.
- ✓ Seguimiento y control del PAGA.
- ✓ Seguimiento, control e implementación del SGSST.

4. CAPITULO FINANCIERO

4.1. VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Para todos los efectos legales y fiscales de cada uno de los contratos (Interventoría) los valores son:


Valor Inicial:	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE ($368,302,174.03)
Valor adicional:	N/A
Valor actualizado:	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE ($368,302,174.03)
Valor anticipo inicial:	N/A
Valor anticipo adicional:	N/A
Valor anticipo total:	N/A

4.2. VALOR DEL CONTRATO DE OBRA.

Valor Inicial:	CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 5.260.771.954,77)
Valor adicional:	N/A

Valor actualizado:	CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 5.260.771.954,77)
Valor anticipo inicial:	DOS MIL CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($2,104,308,781.91)
Valor anticipo adicional:	N/A
Valor anticipo total:	DOS MIL CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($2,104,308,781.91)

PORCENTAJE AVANCE DE OBRA

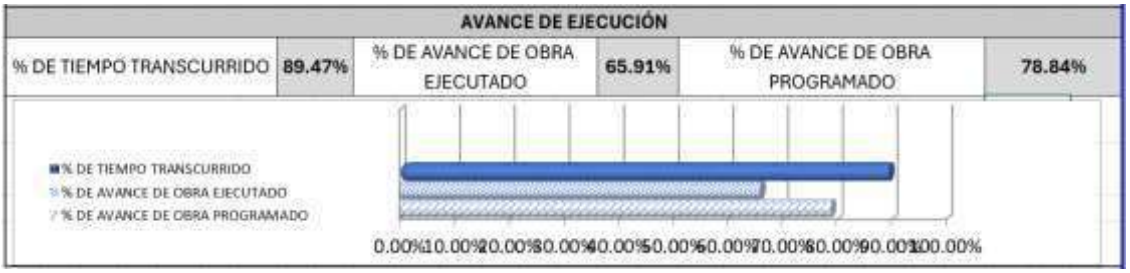

En el presente informe es pertinente aclarar que, de acuerdo a la verificación realizada a las cantidades contractuales, se tiene un porcentaje ejecutado del 65.91% , con un retraso en la ejecución de actividades de obra y según el cronograma de obra enviado por el contratista de obra, por lo cual se solicita tomar acciones pertinentes para evitar aumento de retrasos en la ejecución del proyecto.

4.3. ESTADO DEL ANTICIPO DE OBRA

Se solicitó la entrega de la documentación requerida para la conformación de la fiducia y el contrato para la inversión del anticipo, así como el plan de inversión mensualizado, el cual ya ha sido radicado ante la entidad contratante para su respectivo trámite.

De acuerdo a lo manifestado por el contratista y a la información enviada, se solicitó ajuste al plan de inversión del anticipo, por lo cual se revisa y acepta por la interventoría, el cual ya ha sido radicado ante la entidad contratante para su respectivo trámite.

De igual manera interventoría ha solicitado los soportes de acuerdo al nuevo documento, para el seguimiento, control y verificación del mismo, todo dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, es pertinente destacar que dentro de la información que allega el contratista a la fecha se han tenido siete (07) ordenes de giro de seguimiento al anticipo, en las cuales se entrega la documentación soporte para esos mismos pagos.

Se manifiesta que el contratista realiza entrega de soporte de pago de rendimientos financieros del anticipo, el cual tiene fecha del 12 de marzo de 2026, por un valor de $1.190.832,58, el cual se encuentra adjunto dentro del informe de interventoría en correspondencia recibida.

Se comenta que el contratista el día 22 de mayo de 2026, bajo correo electrónico hace envío de la documentación correspondiente a la liquidación del contrato fiduciario, el cual se adjunta en el informe mensual correspondiente.


5. OTROS Y RECOMENDACIONES

- Se solicitó la entrega de documentación para la verificación y seguimiento a las obligaciones contractuales del contratista de obra.
- Se solicitó la implementación y cumplimiento del PAGA y PMT por parte del contratista de obra.
- Se realiza constante comunicación con la entidad contratante, y el contratista de obra, manteniendo en todo tiempo informado del proceso a las partes.
- Se solicita al contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas, diseños y APU's aprobados por la entidad contratante.
- Se solicita la entrega de los documentos soportes de acuerdo al plan de inversión del anticipo.
- Se solicita el cumplimiento del SGSST.
- Se recuerda que no se autorizan mayores cantidades de obra, sin previa aprobación de la entidad contratante.
- Se solicita el cumplimiento del personal mínimo ofertado, de acuerdo a las dedicaciones contractuales.
- Se solicita al contratista entregar afiliaciones, planillas de seguridad social del personal operativo y administrativo de obra.
- Se solicita el cumplimiento en la entrega de la documentación pactada en los comités, oficios y demás requerimientos, dentro de los plazos establecidos, así como el cumplimiento de los compromisos pactados.
- Se solicita la entrega de dotación al personal, entrega de exámenes de ingreso laboral, y demás documentación soporte del seguimiento, control e implementación del SGSST.
- Se ha recomendado mantener la señalización nocturna y diurna en los puntos de intervención del proyecto, con el fin de mantener informado al usuario de los trabajos en la vía y dar cumplimiento a lo establecido en el PMT.
- Se ha solicitado la entrega de soportes de acuerdo a las ordenes de giro y plan de inversión del anticipo, para realizar seguimiento y verificación del mismo.
- Se solicita la entrega de resultados de laboratorio de concretos fundidos en obra, con los respectivos soportes de entrega de documentación del profesional laboratorista y certificado de calibración del equipo usado en campo.
- Se ha recomenado cumplir con las fechas establecidas en la entrega de informes y documentación para evitar reprocesos en la ejecución de obra.
- Se ha solicitado la entrega de certificados de calidad de los materiales usados en obra, así como la entrega de caracterización de materiales granulares a usar en el proyecto, previo a su instalación.

- Se ha solicitado realizar pruebas y ensayos requeridos según las especificaciones técnicas entregadas, así como los lineamientos establecidos en las normas vigentes como la INVIAS.
- Se ha solicitado monitoreo y seguimiento a los taludes que presentan actividad, con el fin de realizar verificación y control de estos y si s requieren obras de estabilización y contención, para informar a la entidad contratante.
- Interventoría solicita cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como la entrega de la documentación requerida para el seguimiento al plan de inversión del anticipo, informes en las fechas pactadas con soportes y demás documentación para seguimiento y control de obra.
- Se ha recomendado y solicitado la finalización del emboquillado de las alcantarillas, así como la respectiva reparación técnica de los elementos de concreto identificados y señalados en obra.
- Se ha recomendado y solicitado el inicio de ensayos de pavimentos y asfaltos, dado que estos deben tener tiempo para el muestreo y proceso a realizar, por lo cual puede generar retrasos a la hora de instalar este material en obra, y se recuerda que no se autorizan vaciados sin previa entrega de ensayos y soportes para verificación de calidad en obra.
- Se ha recomendado entregar un plan de inspección y ensayos con el fin de verificar los distintos laboratorios a ejecutar en las actividades programadas y a ejecutar en obra.
- Se solicita tomar acciones pertinentes para evitar aumento de retrasos en la ejecución del proyecto y dar cumplimiento a la programación de obra aprobada.
- Se ha solicitado iniciar y continuar con las actividades programadas y con retrasos, con el fin de dar cumplimiento con el plazo previsto.



Elaboró: **ING. ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ**
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



Aprobó y Revisó: **ING. JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ**
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	REGISTRO FOTOGRÁFICO	INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA #10

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S.		
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"		
PERIODO	viernes, 1 de mayo de 2026	**HASTA EL**	domingo, 31 de mayo de 2026
INTERVENTOR	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ		

ACTIVIDADES REALIZADAS

Excavación manual y replanteo para cunetas.



Extendida e instalación de base granular para estructura de pavimento.



Realización de comité de obra #17.



Paisajismo y contención de taludes activos en zonas de alcantarillas.



Extendida e instalación de base granular para estructura de pavimento.



Instalación y compactación de granular para estructura de pavimento.



JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	REGISTRO FOTOGRÁFICO	INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA #10

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S.		
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"		
PERIODO	viernes, 1 de mayo de 2026	**HASTA EL**	domingo, 31 de mayo de 2026
INTERVENTOR	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ		

ACTIVIDADES REALIZADAS

Extendida e instalación de base granular para estructura de pavimento.



Extendida e instalación de base granular para estructura de pavimento.



Amarre e instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillos de vía.



Fundida de concreto para cunetas y bordillo de vía.



Toma de densidades de compactación de base granular.



Realización de pausa activa y actividades SST por interventoría.



JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	REGISTRO FOTOGRÁFICO	INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA #10

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S.		
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"		
PERIODO	viernes, 1 de mayo de 2026	**HASTA EL**	domingo, 31 de mayo de 2026
INTERVENTOR	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ		

ACTIVIDADES REALIZADAS

Levantamiento topográfico de interventoría para verificación de niveles.



Imprimación para carpeta asfáltica.



Imprimación para carpeta asfáltica.



Extendida y compactación de carpeta asfáltica.



Extendida y compactación de carpeta asfáltica.



Extendida y compactación de carpeta asfáltica.



JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	REGISTRO FOTOGRÁFICO	INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA #10

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S.		
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"		
PERIODO	viernes, 1 de mayo de 2026	**HASTA EL**	domingo, 31 de mayo de 2026
INTERVENTOR	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ		

ACTIVIDADES REALIZADAS

Extendida y compactación de carpeta asfáltica.



Extendida y compactación de carpeta asfáltica.



JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FORMATO CONTROL DE TIEMPO

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	ESTADO DEL TIEMPO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA #10

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/05/2026 Y EL 31/05/2026 PLAZO: DIEZ (10) MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 CONTRATO No. IPO 001-2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

INTERVENTOR: JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ CONTRATO No. IPVO 017-2025

ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO DEL TIEMPO	MES MAYO																															OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MAÑANA	N			N	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N			S	N	N	N	N		N	N	LL	N	N	N		
TARDE	N			LL	LL	LL	N	N	N		N	N	N	N	N	N			N	LL	LL	N	N		N	S	N	N	N	N		Los días dominicales y festivos no se laboran.

CONVENCIONES

Lloviznas	LL		Soleado - Lloviznas	SZ	
Seco - Nublado	SN		Nublado - lloviznas	NL	
Nublado	N		Despejado	D	
Seco	S				

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA: El estado del tiempo es regular, afecta en el desarrollo de las actividades programadas en las jornadas donde se presenta lluvias.

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FORMATO DATOS DE PROYECTO

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	DATOS GENERALES DEL PROYECTO EN INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL

NOTA: FORMATO DE VERIFICACIÓN MENSUAL O CUANDO EL INTERVENTOR EN JEFE INDIQUE

CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S.
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
CONTRATISTA	CONSORCIO SISA 25
NIT.:	901.969.390-5
REP. LEGAL	JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ
C.C.	6.775.637 de Tunja
INTERVENTOR	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
C.C.	7.172.271 de Tunja
SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE	ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
DEPENDENCIA	TIERRASUA S.A.S.
PLAZO CONTRACTUAL:	DIEZ (10) MESES
FECHA FIRMA CONTRATO:	miércoles, 30 de julio de 2025
FECHA DE INICIO:	martes, 19 de agosto de 2025
FECHA PROYECTADA FINAL INICIAL:	jueves, 18 de junio de 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	miércoles, 31 de diciembre de 2025
FECHA DE REINICIO 1:	martes, 13 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	jueves, 2 de julio de 2026
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	N/A

No.	DOCUMENTOS Y/O REVISIÓN	ESTADO (seleccionar con X)			OBSERVACIONES / ESTADO
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	Contrato de: Obra / Consultoría / Diseño	X			
2	Pólizas de contrato (revisar según contrato)	X			Se tiene actualización de acuerdo a suscripción de acta de reinicio 1.
3	Aprobación de pólizas del contrato	X			Se tiene actualización de acuerdo a suscripción de acta de reinicio 1.
4	Acta de Inicio	X			
5	Verificación de obligaciones contractuales (listado)	X			
6	Copia de la propuesta del contratista	X			No se ha entregado la totalidad por parte del contratista.
7	Programación de Obra	X			Se solicita el cumplimiento de la programación de obra presentada por el contratista de acuerdo al plazo vigente.
8	Copia de Hojas de Vida profesionales propuestos	X			Se solicita el cumplimiento del profesional de acuerdo a dedicación según oferta.
9	Copia de equipos propuestos	X			Se solicita cumplimiento del equipo propuesto de acuerdo a oferta presentada.
10	Acta de suspensión (es)	X			Se suscribe acta de suspensión 1 el día 31 de diciembre de 2025.
11	Acta de Reinicio (s)			X	Se suscribe acta de reinicio 1 el día 13 de enero de 2026.
12	Ajuste de programación			X	Se tiene actualización de acuerdo a suscripción de acta de reinicio 1 y ajustada de acuerdo a solicitud de contratista.

observaciones adicionales: Dentro de las actividades, se solicita el cumplimiento de las recomendaciones y observaciones impartidas por interventoría.

SUPERVISOR: ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA: ING. ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN

FORMATO CONTROL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	CONTROL DE MAQUINARIA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA #10

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/05/2026 Y EL 31/05/2026 PLAZO: DIEZ (10) MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 CONTRATO No. IPO 001-2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

INTERVENTOR: JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ CONTRATO No. IPVO 017-2025

MAQUINARIA DEL CONTRATISTA

FECHA	MES	MAYO																														OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MAQUINARIA																																
ANDAMIOS (multidireccional, multifuncional con certificado de conformidad de las normas NTC1641, NTC16442, NTC1735)	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		N/A N/A
RETROEXCAVADORA DE ORUGA	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		N/A
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		N/A
VOLQUETA	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		En buen estado.
MOTONIVELADORA	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		En buen estado.
MEZCLADORA	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		En buen estado.
ALLANADORA DE CONCRETO	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		N/A
PLANCHA VIBRADORA TIPO RANA O CANGURO	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		N/A
CARRO TANQUE	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		En buen estado.
ESTACIÓN TOTAL	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		En buen estado.
VIBRO COMPACTADOR	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		En buen estado.
FINISHER	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	1	1	1	1	1		En buen estado.
COMPACTADOR SOBRE LLANTAS	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	1	1	1	1	1		En buen estado.
MAQUINARIA CONTRATISTA	**6**	**0**	**0**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**0**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**6**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**0**	**TOTAL PERIODO** **154**

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:	1.La interventoría recuerda que el equipo que se apruebe deberá permanecer en obra durante todo el periodo de ejecución del proyecto, de acuerdo a las condiciones adquiridas por el contratista. 2. La interventoría solicita la entrega de certificados de calibración de los equipos usados en obra.

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FORMATO CONTROL DE PERSONAL

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	CONTROL DE PERSONAL	INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA #10
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL viernes, 1 de mayo de 2026 Y EL domingo, 31 de mayo de 2026 PLAZO: DIEZ (10) MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 CONTRATO No. IPO 001-2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

INTERVENTOR: JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ CONTRATO No. IPVO 017-2025

PERSONAL DEL CONTRATISTA

| | | | | | | | | MES | ABRIL | | | | | | | |

FORMATO CONTROL DE PERSONAL BITÁCORA

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	CONTROL DE PERSONAL BITÁCORA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA #10

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/05/2026 Y EL 31/05/2026 PLAZO: DIEZ (10) MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 CONTRATO No. IPO 001-2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

INTERVENTOR: JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ CONTRATO No. IPVO 017-2025

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES	MAYO																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO																																
DIRECTOR DE OBRA	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		Se solicita cumplimiento de tiempo según dedicación ofertada.
RESIDENTE DE OBRA	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		Se solicita cumplimiento de tiempo según dedicación ofertada.
SISO	0			0	0	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0		Se solicita cumplimiento de tiempo según dedicación ofertada.
ESPECIALISTA AMBIENTAL	0			0	0	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0		Se solicita cumplimiento de tiempo según dedicación ofertada.
ESPECIALISTA PAVIMENTOS	0			0	0	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0		Se solicita cumplimiento de tiempo según dedicación ofertada.
TOPÓGRAFO	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
CADENERO	2			2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		
MAESTRO	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
AYUDANTE	7			7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7			7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7		
OPERADOR DE MAQUINARIA	3			3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3			3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		
CONTROLADORES DE TRANSITO	2			2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		
CUADRILLA DE ASFALTO	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		1	1	1	1	1	1		
PERSONAL CONTRATISTA	**17**	**0**	**0**	**17**	**17**	**20**	**17**	**17**	**17**	**0**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**0**	**0**	**17**	**17**	**20**	**17**	**17**	**0**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**0**	**TOTAL PERIODO** **420**

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:	1. La interventoria ha requerido la presencia de los profesionales propuestos por el contratista de obra así mismo se solicita la presencia de personal en obra. 2. Se recuerda que todo el personal, operativo y administrativo deberá portar y usar los EPP's (elementos de protección personal), de acuerdo a las actividades que ejecuten, y del cual el contratista de obra, debe entregar y documentar dicha entrega a cada trabajador.

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FORMATO CONTROL DE CORRESPONDENCIA

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	CONTROL DE CORRESPONDENCIA	INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA #10

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

INFORMACIÓN GENERAL

NOTA: FORMATO DE VERIFICACIÓN MENSUAL O CUANDO EL SUPERVISOR SOLICITE

CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S.		
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"		
PERIODO	viernes, 1 de mayo de 2026	**HASTA EL**	domingo, 31 de mayo de 2026
INTERVENTOR	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ		

No.	FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ESTADO			ASUNTO
			ENVÍO	RECIBIÓ	RESPUESTA	
1	lunes, 4 de mayo de 2026	CORREO		X		RESULTADOS DE LABORATORIO - MATERIAL SUBBASE GRANULAR
2	lunes, 4 de mayo de 2026	CORREO	X			INFORME SEMANAL 36 DE INTERVENTORÍA
3	martes, 5 de mayo de 2026	CORREO	X			CITACIÓN A COMITÉ TÉCNICO DE OBRA #17
4	martes, 5 de mayo de 2026	CORREO	X			INFORME MENSUAL 9 DE INTERVENTORÍA
5	miércoles, 6 de mayo de 2026	CORREO	X			REMISIÓN DOCUMENTACIÓN MODIFICATORIO DE OBRA #1
6	miércoles, 6 de mayo de 2026	CORREO		X		INFORME 09, 01/04/2026 - 30/04/2026
7	miércoles, 6 de mayo de 2026	CORREO	X		X	INFORME 09, 01/04/2026 - 30/04/2026
8	martes, 12 de mayo de 2026	CORREO	X			INFORME SEMANAL 37 DE INTERVENTORÍA
9	martes, 12 de mayo de 2026	CORREO		X		RESULTADOS DE LABORATORIO - MATERIAL BASE GRANULAR
10	martes, 12 de mayo de 2026	CORREO		X		REMISIÓN OFICIO SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO IPO 001-2025
11	martes, 12 de mayo de 2026	CORREO		X		RESULTADOS DE LABORATORIO - MATERIAL BASE GRANULAR
12	miércoles, 13 de mayo de 2026	CORREO		X		ACTA PARCIAL 2 AJUSTADA
13	miércoles, 13 de mayo de 2026	CORREO	X		X	ACTA PARCIAL 2 AJUSTADA
14	jueves, 14 de mayo de 2026	CORREO	X		X	REMISIÓN OFICIO SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO IPO 001-2025
15	viernes, 15 de mayo de 2026	CORREO	X			REMISIÓN DOCUMENTACIÓN AJUSTADA MODIFICATORIO DE OBRA #1
16	martes, 19 de mayo de 2026	CORREO	X			INFORME SEMANAL 38 DE INTERVENTORÍA
17	martes, 19 de mayo de 2026	CORREO	X			CITACIÓN A COMITÉ TÉCNICO DE OBRA #18
18	martes, 19 de mayo de 2026	CORREO	X			SOLICITUD DE ENTREGA DE RESULTADOS DE ENSAYOS.
19	miércoles, 20 de mayo de 2026	CORREO	X			ACTA DE COMITÉ DE OBRA #17
20	viernes, 22 de mayo de 2026	CORREO		X		DISEÑO MARSHALL MDC-19 ASFALTO
21	viernes, 22 de mayo de 2026	CORREO		X		ENVIÓ DE LIQUIDACIÓN DE FIDUCIA DEL CONTRATO.
22	viernes, 22 de mayo de 2026	CORREO		X		ALERTA POR AFECTACIÓN A INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE DRENAJE POR TRABAJOS PARTICULARES
23	domingo, 24 de mayo de 2026	CORREO		X		REMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PERSONAL (ASFALTO)

24	lunes, 25 de mayo de 2026	CORREO	X			INFORME SEMANAL 39 DE INTERVENTORÍA
25	lunes, 25 de mayo de 2026	CORREO		X		REPORTE DE HORARIOS DE CIERRE PROGRAMADO POR INSTALACIÓN DE ASFALTO.
26	lunes, 25 de mayo de 2026	CORREO		X		ENTREGA DE INFORMES: IMPREVISTOS Y MEJORAMIENTO DE BASE GRANULAR.
27	miércoles, 27 de mayo de 2026	CORREO		X		REMISIÓN DE CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN.

observaciones adicionales:

SUPERVISOR: ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO	 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA: ING. ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ	 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN

FORMATO CONTROL DE COMITÉS

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	CONTROL DE COMITÉS	INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA #10

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S.		
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"		
PERIODO	viernes, 1 de mayo de 2026	**HASTA EL**	domingo, 31 de mayo de 2026
INTERVENTOR	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ		

No.	FECHA	REFERENCIA	OBJETO DEL COMITÉ	TEMAS TRATADOS		COMPROMISOS	
1	7/05/2026	Técnico, administrativo, financiero y contable.	Seguimiento y control de obra.	1	Recorrido de la obra y recomendaciones de las partes.	1	Entrega de resultados de laboratorio de base granular.
				2	Verificación de cumplimiento de compromisos pactados en comités, de las solicitudes de interventoría y la entidad en comunicaciones previas.	2	Soportes modificatorio 1 de obra.
				3	Verificación de la ejecución del proyecto, en función del plazo vigente y de la programación de obra, se solicita tener en físico la programación de obra de acuerdo al reinicio #1 del contrato.		
				4	Verificación de estado de obra y procesos constructivos y ensayos realizados.		
				5	Seguimiento y control al SGSST, se solicita al contratista de obra realizar informe.		
				6	Solicitudes de contratista de obra.		
				7	Solicitudes de la entidad.		
				8	Recomendaciones y sugerencias de interventoría.		
				9	Otros y varios.		
				10	Compromisos.		

Observaciones adicionales: Se solicita cumplimiento de los compromisos pactados.

SUPERVISOR: ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA: ING. ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN

FORMATO CONTROL DE MUESTRAS DE CONCRETO

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	CONTROL DE MEZCLADO Y MUESTRAS PARA CONCRETOS

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S.
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
FECHA INICIAL	1/05/2026 **HASTA EL** 31/05/2026
INTERVENTOR	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

No.	ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN	PROCEDENCIA	MIXER	RESISTENCIA ESPERADA	N° CILINDRO	FECHA	RESISTENCIA OBTENIDA	EDAD CILINDRO
1	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1220	8/10/2025	5107	35
2	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1221	8/10/2025	4256	35
3	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1222	14/10/2025	5970	29
4	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1223	14/10/2025	6033	29
5	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1224	23/10/2025	5212	20
6	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1225	23/10/2025	5541	20
7	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1226	24/10/2025	5232	19
8	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1227	24/10/2025	5265	19
9	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1228	28/10/2025	5150	15
10	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1229	28/10/2025	5040	15
11	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1230	29/10/2025	5741	14
12	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1231	29/10/2025	5191	14
13	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1232	30/10/2025	4228	13
14	Tunería de alcantarillas 36".	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1233	30/10/2025	5552	13
15	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1374	6/11/2025	3629	28
16	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1375	6/11/2025	3247	28
17	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1376	12/11/2025	3284	28
18	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1377	12/11/2025	3268	28
19	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1378	19/11/2025	3789	28
20	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1379	19/11/2025	3940	28
21	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1380	20/11/2025	3678	28
22	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1381	20/11/2025	3298	28
23	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1382	26/11/2025	3774	28
24	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1383	26/11/2025	3268	28
25	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1384	28/11/2025	3474	28
26	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1385	28/11/2025	3299	28

JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	CONTROL DE MEZCLADO Y MUESTRAS PARA CONCRETOS

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S.
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
FECHA INICIAL	1/05/2026 **HASTA EL** 31/05/2026
INTERVENTOR	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

No.	ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN	PROCEDENCIA	MIXER	RESISTENCIA ESPERADA	N° CILINDRO	FECHA	RESISTENCIA OBTENIDA	EDAD CILINDRO
27	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1386	2/12/2025	3647	28
28	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1387	2/12/2025	3457	28
29	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1388	3/12/2025	3896	28
30	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1389	3/12/2025	3775	28
31	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1390	5/12/2025	3956	28
32	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1391	5/12/2025	4087	28
33	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1392	10/12/2025	3420	28
34	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1393	10/12/2025	3755	28
35	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1394	13/12/2025	3368	28
36	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1395	13/12/2025	3557	28
37	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1396	16/12/2025	3452	28
38	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1397	16/12/2025	3845	28
39	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1398	18/12/2025	3268	28
40	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1399	18/12/2025	3199	28
41	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1400	20/12/2025	3368	28
42	Concreto para placas de piso cajas encole y descole alcantarillas.	Concreto fundido en obra.	N/A	3000 PSI	1401	20/12/2025	3523	28

SUPERVISOR:
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:
ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN

CERTIFICACIÓN DE AVANCE MENSUAL

CERTIFICACION DE EJECUCIÓN POR PERIODO

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	Fecha:	1/06/2026

La INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - BPIN 2024004150432 ejecutado mediante contrato de obra No. IPO 001 - 2025, CERTIFICA la siguiente ejecución física y financiera, correspondiente al periodo 01/05/2026 al 31/05/2026:

						CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
1	**CAP. 1: PRELIMINARES**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**DIST %**	**VALOR TOTAL**	**M10 - 01/05/2026 al 31/05/2026**	
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA)	$ 328,465.00	1.50	0.00%	$ 640,506.75	0.00	$ -
1.2	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5KM	$ 12,244.00	10089.29	0.00%	$ 160,593,246.79	0.00	$ -
1.3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)	$ 84,648.00	159.86	0.00%	$ 17,591,378.06	0.00	$ -
1.4	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO libre 5 Km.)	$ 264,630.00	54.96	0.00%	$ 18,907,284.24	0.00	$ -
1.5	CONFORMACIÓN DE BOTADERO O ESCOMBRERA	$ 3,600.00	11376.42	0.00%	$ 53,241,645.60	0.00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 250,974,061.44**		**$ -**
2	**CAP. 2: OBRAS DE DRENAJE**						
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	$ 51,935.00	566.30	0.00%	$ 38,234,027.65	0.00	$ -
2.2	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO	$ 16,419.00	665.87	0.00%	$ 14,212,795.39	0.00	$ -
2.3	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	$ 90,641.00	211.97	0.00%	$ 24,977,124.60	0.00	$ -
2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	$ 516,340.00	42.04	12.00%	$ 31,605,295.32	0.00	$ -
2.5	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	$ 961,644.00	52.05	12.00%	$ 72,877,998.21	0.00	$ -
2.6	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	$ 1,004,305.00	68.97	12.00%	$ 100,852,629.48	0.00	$ -
2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	$ 700,220.00	88.00	12.00%	$ 89,717,788.16	0.00	$ -
2.8	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	$ 7,002.00	16047.81	12.00%	$ 163,606,010.74	344.40	$ 3,511,127.69
2.9	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	$ 696,586.00	519.76	12.00%	$ 527,155,777.30	24.00	$ 24,341,501.18
2.10	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	$ 7,389.00	7548.11	12.00%	$ 81,205,465.85	367.77	$ 3,956,610.88
2.11	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	$ 230,536.00	556.80	12.00%	$ 186,895,719.63	0.00	$ -
2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	$ 29,162.00	1160.00	12.00%	$ 49,253,451.52	0.00	$ -
2.13	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	$ 2,311.00	8775.56	0.00%	$ 26,364,414.91	0.00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 1,406,958,498.75**		**$ 31,809,239.75**
3	**CAP. 3: PAVIMENTO FLEXIBLE**						
3.1	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)	$ 1,249,671.00	1.50	0.00%	$ 2,436,858.45	1.20	$ 1,949,486.76
3.2	PEDRAPLEN COMPACTO	$ 119,390.00	3908.25	12.00%	$ 679,378,288.68	0.00	$ -
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	$ 8,393.00	10150.00	12.00%	$ 124,035,111.20	0.00	$ -
3.4	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	$ 102,474.00	2695.79	0.00%	$ 359,122,899.80	0.00	$ -
3.5	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	$ 120,635.00	1593.00	0.00%	$ 249,823,021.50	486.00	$ 76,217,193.00
3.6	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1H	$ 4,374.00	9000.00	12.00%	$ 57,316,896.00	5550.00	$ 35,345,419.20
3.7	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) NORMA INVIAS	$ 943,454.00	810.00	0.00%	$ 993,457,062.00	499.50	$ 612,631,854.90
3.8	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULARES DESPUES DE 5KM	$ 2,311.00	184174.11	0.00%	$ 553,314,278.67	20120.40	$ 60,447,717.72
3.9	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5KM	$ 2,978.00	64071.00	0.00%	$ 248,044,469.40	39510.45	$ 152,960,756.13
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 3,266,928,885.70**		**$ 939,552,427.71**
4	**CAP. 4: SEÑALIZACIÓN VIAL**						
4.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CM SEGÚN NORMAS INVIAS	$ 3,185.00	4500.00	12.00%	$ 20,868,120.00	0.00	$ -
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFELECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	$ 10,867.00	575.00	12.00%	$ 9,097,852.40	0.00	$ -
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTALES DE TAMAÑO 40 X 50 CMS SEGÚN NORMA INVIAS	$ 92,709.00	180.00	12.00%	$ 24,297,174.72	0.00	$ -
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM	$ 394,494.00	18.00	12.00%	$ 10,338,898.75	0.00	$ -
4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VIALES TRAMO RECTO, CAL. 12. 2 POSTES DE 1.50 mts. Y TERMINALES INCLUYENDO TORNILLERIA, CAPTA- FAROS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN CINTA REFLECTIVA GRAD. INGENIERIA SEGUN NORMA INVIAS	$ 250,000.00	475.00	12.00%	$ 172,900,000.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 237,502,045.87**		**$ -**
	TOTAL COSTOS INCLUYE (AIU)				$ 5,162,363,491.77		$ 971,361,667.46

CERTIFICACION DE EJECUCIÓN POR PERIODO

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	Fecha:	1/06/2026

La INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - BPIN 2024004150432 ejecutado mediante contrato de obra No. IPO 001 - 2025, CERTIFICA la siguiente ejecución física y financiera, correspondiente al periodo 01/05/2026 al 31/05/2026:

	OTROS							
	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS)				$ 45,843,796.00	9.21%	$	4,222,454.88
	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL				$ 40,288,767.00	9.21%	$	3,710,807.48
	CARCATERIZACIÓN DEL TRAMO VIAL				$ 12,275,900.00	-12.25%	-$	1,504,399.51
	TOTAL OBRA				**$ 5,260,771,954.77**		**$**	**977,790,530.31**
	INTERVENTORIA							
	INTERVENTORIA				$ 368,302,174.03	10.00%	**$**	**36,830,217.40**
	TOTAL EJECUTADO PERIODO M10 - 01/05/2026 al 31/05/2026				**$ 5,629,074,128.80**		**$**	**1,014,620,747.71**

ING. JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ
INTERVENTOR
Contrato No IPVO 017-2025

Vo.Bo ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO RINCON
SUPERVISOR
TIERRASUA S.A.S

CERTIFICACION DE EJECUCIÓN POR PERIODO

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	Fecha:	1/06/2026

La INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - BPIN 2024004150432 ejecutado mediante contrato de obra No. IPO 001 - 2025, CERTIFICA la siguiente ejecución física y financiera, correspondiente al periodo 01/05/2026 al 31/05/2026:

						PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR EJECUTADO
1	CAP. 1: PRELIMINARES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	DIST %	VALOR TOTAL	M10 - 01/05/2026 al 31/05/2026	
	SUBTOTAL CAPITULO MES				$ 250,974,061.44	0.00%	$ -
2	CAP. 2: OBRAS DE DRENAJE						
	SUBTOTAL CAPITULO MES				$ 1,406,958,498.76	2.26%	$ 31,809,239.75
3	CAP. 3: PAVIMENTO FLEXIBLE						
	SUBTOTAL CAPITULO MES				$ 3,266,928,885.70	28.76%	$ 939,552,427.71
4	CAP. 4: SEÑALIZACIÓN VIAL						
	SUBTOTAL CAPITULO MES				$ 237,502,045.87	0.00%	$ -
	TOTAL COSTOS INCLUYE (AIU)				$ 5,162,363,491.77		$ 971,361,667.46
	OTROS						
	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS)				$ 45,843,796.00	9.21%	$ 4,222,454.88
	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL				$ 40,288,767.00	9.21%	$ 3,710,807.48
	CARCATERIZACIÓN DEL TRAMO VIAL				$ 12,275,900.00	-12.25%	-$ 1,504,399.51
	TOTAL OBRA				$ 5,260,771,954.77	18.59%	$ 977,790,530.31
	INTERVENTORIA						
	INTERVENTORIA				$ 368,302,174.03	10.00%	$ 36,830,217.40
	TOTAL EJECUTADO PERIODO M10 - 01/05/2026 al 31/05/2026				$ 5,629,074,128.80	18.02%	$ 1,014,620,747.71

0

ING. JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ
INTERVENTOR
Contrato No IPVO 017-2025

Vo.Bo ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO RINCON
SUPERVISOR
TIERRASUA S.A.S

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

DCC JP ING CIVIL	"INTERVENTORIA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ INGENIERO CIVIL - CONSULTOR ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	7/05/2026	**COMITÉ N° :**	17
HORA DE INICIO:	9:30 am	**TERMINACIÓN:**	10:30 am
LUGAR DE REUNIÓN:	OBRA	**OBJETO:**	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA
CONTRATO OBRA #	IPO- 001-2025		
OBJETO CONTRATO OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S. NIT. 901.285.377-2		
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO SISA 25 NIT. 901.969.390-5 REP. L: JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ		
INTERVENTORÍA:	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ C.C: 7. 172.271		
SUPERVISIÓN:	ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO R. Director Tecnico / SUPERVISOR DESIGNADO		

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (POSIBLES OBSERVACIONES)

No se tienen observaciones, se aprueba por las partes.

2. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISOS	FECHA	CUMPLE (S/N/P)	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Informe mensual de abril con soportes.	30/04/2026	S	Contratista de obra.	
Tomar laboratorios y entregar resultados de acuerdo a norma INVIAS.	30/04/2026	P.	Contratista de obra.	

3. AGENDA DEL DÍA

1. Recorrido de la obra y recomendaciones de las partes.	8. Recomendaciones y sugerencias de interventoría.
2. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados en comités, de las solicitudes de interventoría y la entidad en comunicaciones previas.	9. Otros y varios.
3. Verificación de la ejecución del proyecto, en función del plazo vigente y de la programación de obra, se solicita tener en físico la programación de obra de acuerdo al reinicio #1 del contrato.	10. Compromisos.
4. Verificación de estado de obra y procesos constructivos y ensayos realizados.	
5. Seguimiento y control al SGSST, se solicita al contratista de obra realizar informe.	
6. Solicitudes de contratista de obra.	
7. Solicitudes de la entidad.	

Scanned with CamScanner

DCC JP ING CIVIL	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ INGENIERO CIVIL - CONSULTOR
		ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	7/05/2026	COMITÉ N°:	17

4. DESARROLLO DE LA AGENDA

1) Interventoría Saluda y da la bienvenida al desarrollo del comité de obra # 17 del proyecto mejoramiento dela vía secundaria Puente SISA - Umbita, contando con presencia de la entidad contratante, acompañamiento de la alcaldía municipal, equipos de contratista de obra y de interventoría.

Se inicia contratista de obra desarrollando el recorrido de obra, en donde manifiesta que ya se tiene instalación, extendida y compactación de base granular en el proyecto. Se tiene paisajismo y control de activación de los taludes e inicio de excavación y perfilado para la construcción de las cunetas.

Interventoría recomienda revisar los puntos señalados en el recorrido, como el tramo de ingreso a la vivienda próxima a la alcantarilla 5, lo cual tiene adoshonamiento, de igual manera abajo al lado de la alcantarilla 6, que presenta las mismas patologías, lo cual se debe garantizar la adecuada compactación y sello del material.

Interventoría recomienda mejorar rendimientos de obra para evitar retrasos en la ejecución del proyecto, así como acometer las actividades retrasadas y/o pendientes de inicio según la programación de obra.

2) Interventoría recuerda, reitera y manifiesta la importancia de cumplir con la entrega Según compromisos pactados en comités de obra, para garantizar el seguimiento y control de obra.

3) Se manifiesta y comenta que a la fecha del presente comité, se tiene un tiempo

Scanned with CamScanner

DCC JP ING CIVIL	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ INGENIERO CIVIL - CONSULTOR
		ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	7/05/2026	COMITÉ N° :	17

4. DESARROLLO DE LA AGENDA

Transcurrido del 8158%, un avance ejecutado del 48% y un avance programado del 52%. por lo cual se recomienda a contratista tomar acciones pertinentes para evitar retrasos en la ejecución del proyecto y de igual manera acometer las actividades. retrasadas en la ejecución y según la programación de obra.

4) Interventoria solicita la entrega de los resultados de ensayos y pruebas de la base granular, así como de la mezcla asfáltica, dado que sin estos últimos no se autorizan vaciados de material sin tener los respectivos soportes, para verificación, seguimiento y control de obra.

5) Siso de obra comenta que respecto al plan de trabajo anual, entregado para el año 2026, se tiene un avance del 40%, no se reportan actividades de accidentes laborales para abril, se continua con la entrega de dotaciones y EPP's al personal en obra.

Siso de interventoría solicita nuevamente la valla instalada en donde se evidencie los requisitos mínimos de seguridad para ingresar a obra, se evidencia y se confirma que se realizan las pausas activas y charlas en obra.

6) Contratista de obra solicita da trámite del modificatorio y del acta parcial 2 de Obra

7) N/A

8) Teniendo en cuenta la solicitud del contratista del acta parcial, sea entregada

Scanned with CamScanner

DCC JP ING CIVIL	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ INGENIERO CIVIL - CONSULTOR ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	7/05/2026	COMITÉ N° :	17

4. DESARROLLO DE LA AGENDA

Con todos los Soportes

→ Mantener la señalización de acuerdo al PMT y requerimiento de los tramos y puntos intervenidos

→ Continuar con la implementación del SGSST en obra

→ Realizar monitoreo de los taludes activos, así como donde se efectuó la mitigación y contención.

→ Entregar los EPP's en obra.

→ Acometer las observaciones ya realizadas en el comité y su desarrollo

→ Mejorar Rendimientos de obra para evitar aumento de retrasos en la ejecución del proyecto.

4) N/A

Scanned with CamScanner

DCC JP ING CIVIL	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ INGENIERO CIVIL - CONSULTOR ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	7/05/2026	COMITÉ N° :	17

COMPROMISOS PACTADOS

Compromiso	Fecha máx.. Cumplimiento	Responsable
Entrega de resultados de laboratorio base granular	11/05/2026	Contratista de obra
Soportes modificatorio 1 de Obra	11/05/2026	Contratista de Obra.

FECHA Y HORA PRÓXIMA REUNIÓN:	21/05/2026 9:30 am	LUGAR	OBRA.

ANEXOS

DESCRIPCION	TIPO ANEXO	QUIEN ENTREGA
N/A.		

PARTICIPANTES (En constancia Firman)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD/EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
Maria Clara Caceres	SST Interventoria	Jaime Pinzon Int	3134833544	
NEUSBDO VALENCIA C.	INSPECTOR OBRA	CONTRATISTA	313 8602277	
Hugo Mauricio Suarez R.	SST Consorcio Sisa	consorcio sisa.	3115504436.	
Nestor Andres Medina Roa	Residente de Obra	Consorcio SISA 25	3125620135	
Adriana Marcela Pedraza.	Prof. Auxiliar.	Consorcio SISA25	3105883591	Adriana P.
Diego Alexander Castañeda	Topografo	Consorcio Sisa25	3112568826	
Elizabeth Palacios	Apoyo Ambiental OBRA	Consorcio SISA 25	3202759047	
Salvador Valero S.	Maestro	Consorcio SISA 25	3207400546	
Hector Molina.	carrotanque	consorcio sisa	3118458115	
Juan Sebastian Gonzalez,	Apoyo supervisión	Tierrasur.	3143990829	
Jaime Gómez R.	R/L. Consorcio SISA 25	Consorcio SISA 25	3041858032	
John E. Carreño Y	Gerente Tierrasur	Gerente	3163336126	

Scanned with CamScanner

DCC JP ING CIVIL	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ INGENIERO CIVIL - CONSULTOR ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	07/05/2026	COMITÉ N°:	17

PARTICIPANTES (En constancia Firman)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD/EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
Yon Fredy Gonzalez H	Alcalde	Alcalde Úmbita	3112789290	
Jaime Humberto Pinzón	Director Interventoria	JP Interventoria	3143600483	
DAVID MEDAVELSO ALVAREZ	RESIDENTE INTERVENTORIA	JAIME PINZON INTERVENTOR	3227007441	

Scanned with CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Viernes, 1 de mayo de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Pasajismo y contención de taludes activos en zonas de alcantarillas 10 y 11.
Levantamiento topografico de chequeo de niveles y anchos de vía capa de base granular
Extendida, instalación y compactación de base granular abcisa K8+950 - K8+650.

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo supervisión	1
d	Topografo de obra	1
e.	Maestro de Obra	1
f.	Cuadrenos de Obra	2
g.	Operador de maquinaria	3
h.	Controladas de tránsito	2
i.	Ayudante de obra	7
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con Prisma	e) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	f Camión carro tanque	
c.	Motoniveladora	g) Mezcladora	
d	Vibrocompactador		

SEÑALIZACIÓN:

Barricada de listones
Paletas Pare y Siga.
Delineadores tubulares.

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Nublado
b.	Tarde	Nublado

OBSERVACIONES:

Interventoría Solicita toma de ensayos de acuerdo a normatividad vigente, así como el anexo tecnico y especificaciones de diseño.
Interventoría Solicita control y monitoreo de taludes activos y entrega de informe de imprevistos.

FIRMAS:

Interventoría

Nidia Mahecha R.
Residente de Obra

199

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Lunes, 4 de mayo de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Paisajismo y contención de taludes activos en zonas de alcantarillas 10 y 11.
Levantamiento topografico de chequeo de niveles y anchos de vía para capa de base granular.
Extendida, instalación y compactación de base granular abcisa K81650-K81850.

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de obra	1
e.	Maestro de obra	1
f.	Operario de maquinaria	3
g.	Cadenero de obra	2
h.	Controlador de tránsito	2
i.	Ayudante de obra	7
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con prisma	e) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	f) Camión Cisco tanque	
c.	Motoniveladora	g) Mezcladora.	
d	Rodillo compactador		

SEÑALIZACIÓN:

Barricada de listones
Paletas Pare y Siga
Delineadores tubulares.

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Nublado
b.	Tarde	Lluvioso

OBSERVACIONES:

Interventoría solicita la entrega de EPP's y dotación adecuada para jornadas de lluvia, garantizando la seguridad del personal en obra.
Se solicita seguimiento y control del SGSST, teniendo en cuenta normatividad vigente y especificación de diseño y obligaciones contractuales.

FIRMAS:

Interventoría

Nestor A Medina R.
Residente de Obra

200

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Martes, 5 de mayo de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Coneteo, perfilado y excavación para cunetas y borditos laterales.
Levantamiento topografico de chequeo de niveles y anchos de vía para extendedora de pavimento.
Extendida, instalación y compactación de base granular abscisa K8+550 - K8+450

	PERSONAL:	Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de obra	1
e.	Maestro de obra	1
f.	Operarios de maquinaria	3
g.	Cadenero de obra	2
h.	Controladores de tránsito	2
i.	Ayudante de obra	7.
j.		

	EQUIPO:		
a.	Estación total con prisma	e) Volqueta sencilla	
b.	Herramienta menor	f) Camión cuba tanque	
c.	Motoniveladora	g) Mezcladora.	
d	vibro compactador		

SEÑALIZACIÓN:

Barricada de listones
Paletas Pare y Siga
Delineadores tubulares.

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Nublado
b.	Tarde	Lluvioso

OBSERVACIONES:

Interventoría recuerda que no se autorizan mayores cantidades de obra sin previa aprobación de entidad contratante
Se solicita seguimiento, implementación y control del PMIT y PAGA según obligaciones contractuales.

FIRMAS:

Interventoría

Nelly Medina R.
Residente de Obra

201

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Miercoles, 6 de mayo de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Cuneteo y Perfilado y excavacion para cunetas y bordillos laterales de vía.
levantamiento topográfico de chageo y control de niveles y anchos de vía para base granular.
Extendida, instalación y compactación de base granular abcisa K8+450 – K8+350

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo supervisión	1
d	Topografo de obra	1
e.	Maestro de obra	1
f.	Operador de maquinaria	3
g.	Cuñatero de obra	2
h.	Controladores de tránsito	2
i.	Ayudante de Obra	7.
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con prismas	e) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	f) Camión Carrotanque.	
c.	Motoniveladora	g) Mezcladora.	
d	Vibrocompactador		

SEÑALIZACIÓN:	
Barricada de listones	
Paletas Pare y Siga	
Delineadores tubulares	

ESTADO DEL TIEMPO:		
a.	Mañana	Nublado
b.	Tarde	Lluvioso

OBSERVACIONES:

Se solicita cumplimiento del personal mínimo ofertado, según condiciones contractuales.
Se solicita cumplimiento de especificaciones técnicas y de diseños entregados por entidad.

FIRMAS:

Nestor Medina R.
Residente de Obra

Interventoría

202

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Jueves, 7 de mayo de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Realización de comité de obra # 17 en compañía de entidad contratante, equipo de obra e interventoría
Cuneteo, perfilado y excavación para bordillos y cunetas laterales de vía.
Chequeo topográfico de niveles y cunchos de vía de estructura de pavimento
Extendida, Intulación y Compactación de base granular abcisa K8+350 - K8+250

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría - Director de interventoría - Siso de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de obra	1
e.	Maestro de obra	1
f.	Operador de maquinaria.	3
g.	Cadenero de obra.	2
h.	Controladora de tránsito	2
i.	Ayudante de obra	7
j.	Profesional Pavimentos - Profesional ambiental - Profesional Siso de obra	1 - 1 - 1

EQUIPO:			
a.	Estación Total con prisma	e) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	f) Camión Carro tanque.	
c.	Motosoldadora	g) Mezcladora.	
d	Vibrocompactador		

SEÑALIZACIÓN:

Barricada de listones
Paletas Pare y Siga
Delineadores tubulares

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Nublado
b.	Tarde	Nublado

OBSERVACIONES:

Se solicita entrega de ensayos y laboratorios de los materiales granulares según normatividad vigente, así como el anexo técnico y especificaciones de diseños

FIRMAS:

Nesta Alfaro R.
Residente de Obra

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Viernes, 8 de mayo de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Cuneteo, perfilado y excavación para bordillos y cunetas laterales de vía.
Levantamiento topografico de chequeo y control de niveles y anchos de vía Para estructura de pavimento.
Extendida, instalación y compactación de base granular abcisa K8+250 – K8+200

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoria	1
c.	Profesional de apoyo supervisión	1
d	Topografo de Obra	1
e.	Maestro de obra	1
f.	Operador de maquinaria	3
g.	Cadenero de Obra	2
h.	Controlador de tránsito	2
i.	Ayudante de obra	7.
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con Prisma	e) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	f) Camión Cuno tanque	
c.	Motoniveladora	g) Mezcladora.	
d	Vibro Compactador.		

SEÑALIZACIÓN:

Barricada de listones
Paletas Pare y Siga
Delineadores tubulares.

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Nublado
b.	Tarde	Nublado

OBSERVACIONES:

Se solicita mejorar la señalización en el tramo intervenido, así como el cumplimiento del PMT según condiciones contractuales.
Se solicita continuar con la implementación del SGSST, de acuerdo a normatividad vigente y condiciones contractuales.

FIRMAS:

Interventoría

Nata Medina R.
Residente de Obra

204

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Sábado, 9 de mayo de 2026.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Cuneteo, perfilado y excavación de bordillos y cunetas laterales de vía.
Amarre e instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillos laterales de vía.
Sereo y compactación de base granular para dar anchos y niveles de vía.

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de Obra	1
b.	Residente de Interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de Obra	1
e.	Maestro de Obra	1
f.	Operador de maquinaria	3
g.	Controlador de tránsito	2
h.	Cadenero de Obra	2
i.	Ayudante de Obra	7
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con Prisma	e) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	f) Camión Cama baja.	
c.	Motobomba de agua	g) Retroexcavadora	
d	Vibrocompactador		

SEÑALIZACIÓN:
Barricada de listones
Paletas Pare y Siga
Delineadores de bolardos.

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Nublado
b.	Tarde	Nublado

OBSERVACIONES:

Se solicita dejar señalización diurna y nocturna en el tramo y puntos específicos intervenidos, con el fin de mejorar la implementación del PMT garantizando la seguridad de transeuntes y peatones.

FIRMAS:

Interventoría

Nestor A Rachira R.
Residente de Obra

205

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Lunes, 11 de mayo de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Cuneteo, perfilado y excavación para cunetas y bordillos laterales de vía
Amarre e instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillos.
Levantamiento topográfico de chequeo de niveles y anchos de vía estructura de pavimento
Extendida, instalación y compactación de base granular abcisa K8+200-K8+100.

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de Obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de Obra	1
e.	Maestro de Obra	1
f.	Operador de maquinaria	3
g.	Controlador de tránsito	2
h.	Cadenero de obra	2
i.	Ayudante de Obra	7.
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con Prisma	e) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	f) Camión carrotanque	
c.	Motoniveladora	g) Excavadora.	
d	Vibrocompactador.		

SEÑALIZACIÓN:	
Barrera de tiferos	
Paletas Pare y Siga	
Reductores tubulares	

ESTADO DEL TIEMPO:		
a.	Mañana Nublado	
b.	Tarde Nublado	

OBSERVACIONES:

Interventoria recuerda que no se autorizan mayores ni menores cantidades de obra sin previa aprobación de entidad contratante.
Se solicita el cumplimiento de las obligaciones contractuales y especificaciones entregadas en diseños.

FIRMAS:

Nestor Medina R.
Residente de Obra

Interventoría

206

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Martes, 12 de mayo de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Cuneteo, perfilado y excavación para cunetas y bordillos laterales de vía.
levantamiento topográfico para chequeo de niveles y anchos de vía
Para estructura de pavimento.
Extendida, instalación y compactación de base granular abcisa K8+100 - K8+000

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de Obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de Apoyo Supervisión	1
d	Topografo de Obra	1
e.	Maestro de obra	1
f.	Operador de maquinaria	3
g.	Controlador de tránsito	2
h.	Ardenero de obra	2
i.	Ayudante deobra	7.
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con Prisma	e) Volqueta sencilla	
b.	Herramienta menor	f) Camión carro-tanque	
c.	Motoniveladoras	g) Mezcladoras -	
d	Vibrocompactadas.		

SEÑALIZACIÓN:	
Barricada de listones	
Paletas Pare y Siga	
Delineadores tubulares.	

ESTADO DEL TIEMPO:		
a.	Mañana	Nublado
b.	Tarde	Nublado

OBSERVACIONES:

Interventoría solicita cumplimiento en el PAGA y PMT, de acuerdo a condiciones contractuales y normatividad urgente.
Interventoria solicita el cumplimiento del personal mínimo ofertado Según obligaciones contractuales.

FIRMAS:

Interventoría

Nelson Molina P.
Residente de Obra

207

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Miercoles, 13 de mayo de 2026.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Cuneteo, perfilado y excavacion para bordillos y cunetas laterales de vía.
Amarre e instalación de acero de refuerzo para bordillos y cunetas de vía.
Levantamiento topográfico de anchos y niveles de estructura de pavimento.
Extendida, instalación y compactación de base granular abcisa K8+000 - K8+900

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de Obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de obra	1
e.	Maestro de obra.	1
f.	Operador de maquinaria.	3
g.	Controlador de transito	2
h.	Cadenero de obra	2
i.	Ayudante de Obra	9.
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con Prisma	e) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	f) Cumpon Carrotanque	
c.	Vibrocompactador	g) Mezcladora	
d	Motoniveladora		

SEÑALIZACIÓN:	
Barricada de listones	
Paletas Pare y Siga.	
Delineadores tubulares.	

ESTADO DEL TIEMPO:			
a.	Mañana	Nublado	
b.	Tarde	Nublado	

OBSERVACIONES:

Interventoría Solicita mejora en la señalizacion diurna y nocturna del frame y puntos intervenidos, garantizando la seguridad de peatones y transeuntes
Interventoría Solicita entrega de resultados de laboratorio y toma de muestras a materiales granulares según especificaciones de diseños y normatividad vigente.

FIRMAS:

Nestor M. Medina R.
Residente de Obra

Interventoría

208

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Jueves, 14 de mayo de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Coneteo, perfilado, excavación. para cunetas y bordillos laterales de vía.
Instalación y amarre de acero de refuerzo para bordillos y cunetas de vía.
levantamiento topográfico de chequeo de anchos y niveles de vía para estructura de pavimento.
Extendida, instalación y compactación de base granular abcisa K7+900 - K7+800

	PERSONAL:	Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de Obra	1
e.	Maestro de Obra	1
f.	Operador de maquinaria	3
g.	Controlador de tránsito	2
h.	Cadenero de Obra	2
i.	Ayudante de Obra	7.
j.		

	EQUIPO:		
a.	Estación total con Prisma	e) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	f) Camión Carro tanque.	
c.	Motoniveladora	g) Mezcladora	
d	Vibro Compactador		

SEÑALIZACIÓN:

Barricadas de listones
Paletas Pare y Siga
Delineadores tubulares.

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Nublado
b.	Tarde	Nublado

OBSERVACIONES:

Se solicita cumplimiento e implementación del SGSST, teniendo en cuenta la normatividad vigente y especificaciones de diseños y obligaciones contractuales.
Se solicita entrega de EPP's y dotación al personal en obra.
de acuerdo a las actividades programadas y en ejecución.

FIRMAS:

Interventoría

Nadia Medina R.
Residente de Obra

209

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Viernes, 15 de mayo de 2026.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Cuneteo, perfilado y excavación para cunetas y bordillos laterales de vía.
Levantamiento topográfico para control de niveles y anchos de vía para estructura de pavimento.
Sereo y compactación de base granular para lograr anchos y niveles diseñados.

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de Obra	1
e.	Maestro de Obra	1
f.	Operador de maquinaria	3
g.	Controlador de tránsito	2
h.	Cadenero de obra	2
i.	Ayudante de Obra	7.
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con prismas	e) Mezcladora	
b.	Herramienta menor	f) Volqueta Sencilla	
c.	Motoniveladora	g) Camión Carro tanque	
d	Vibrocompactador.		

SEÑALIZACIÓN:	
Barricada de listones	
Paletas Pare y Siga	
Delineadores tubulares.	

ESTADO DEL TIEMPO:		
a.	Mañana	Nublado
b.	Tarde	Nublado

OBSERVACIONES:

Se solicita entrega y toma de ensayos según anexo técnico y normatividad urgente a los materiales instalados en obra

FIRMAS:

Interventoría

Nesta Medina
Residente de Obra

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Sábado, 16 de mayo de 2026.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Cunteo, perfilado y excavación para cunetas y bordillos laterales de vía.
Amare e instalación de acero de refuerzo para vigas-bordillo y cunetas de vía.
Sello y compactación de base granular para anchos de vía y niveles diseñados.

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de Obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de obra	1
e.	Maestro de Obra	1
f.	Operador de maquinaria	3
g.	Cuadenero de Obra	2
h.	Controladi de tránsito	2
i.	Ayudante de obra	9.
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con Prismas	e) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	f) Camión Carrotanque.	
c.	Motoniveladora	g) Retroexcavadora.	
d	Vibrocompactador		

SEÑALIZACIÓN:

Barricada de listones
Paletas Pare y Sigue
Delineadores tubulares.

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Nublado
b.	Tarde	Nublado

OBSERVACIONES:

Se solicita mejora en la señalización diurna y nocturna en los tramos intervenidos, garantizando seguridad a peatones y transeuntes, así como la calidad de las obras ejecutadas.

FIRMAS:

Interventoría

Nasly A Rodriguez R.
Residente de Obra

211

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Martes, 19 de mayo de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Excavación y cuneteo para construcción de cunetas laterales de la vía.
Amarre e instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillos
Encofrado para cunetas y bordillos laterales de vía.
Extendida, instalación y compactación de base granular abcisa K7+800-K7+700
Chequeo topográfico de niveles y anchos de vía para estructura de pavimento.

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de obra	1
e.	Residente de obra	1
f.	Operador de maquinaria.	3
g.	Cadenero de obra	2
h.	Controlador de tránsito	2
i.	Ayudante de Obra	7.
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con Prisma	e) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	f) Mezcladora	
c.	Motoniveladora	g) Camión Carro-tanque.	
d	Vibrocompactador		

SEÑALIZACIÓN:

Barricada de listones
Pendones Aire y Siga
Delineadores tubulares.

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Soleado
b.	Tarde	Nublado

OBSERVACIONES:

Interventoría recuerda que no se autorizan mayores cantidades de obra sin previa aprobación de entidad contratante.
Se solicita el cumplimiento de las obligaciones contractuales y especificaciones entregadas en diseños.

FIRMAS:

Nestor Machuca P.
Residente de Obra

Interventoría

212

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Miercoles, 20 de mayo de 2026.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Cunteo, perfilado y excavación para cunetas y bordillos laterales de vía.
Amarre e instalación de acero de refuerzo para vigas-bordillo y cunetas de vía
Encofrado para posterior fundida de concreto de bordillos y cunetas.
Drageo topográfico de niveles y anchos de vía para estructura de pavimento.
Extendida, Instalación y Compactación de base granular abcisa K7+700-K7+660.

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de obra	1
e.	Maestro de obra	1
f.	Operador de maquinaria	3
g.	Controlador de tránsito	2
h.	Cadenero de obra	2
i.	Ayudante de Obra	7.
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con prisma	e) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	f) Camión Carro tanque	
c.	Motoniveladora	g) Retroexcavadora	
d	Vibrocompactador		

SEÑALIZACIÓN:

Barricada de listones
Paletas Pare y Siga
Delineadores flexibles

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Nublado
b.	Tarde	Lluvioso.

OBSERVACIONES:

Interventoría Solicita cumplimiento del PAGA y PMT, de acuerdo a condiciones contractuales y normatividad vigente.
Interventoría Solicita el cumplimiento del personal mínimo ofertado Según Condiciones contractuales.

FIRMAS:

Interventoría

Nesta Medina R.
Residente de Obra

213

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Jueves, 21 de mayo de 2026.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Realización de comité técnico de obra #18 en compañía de contratista de obra e interventoría.
Coneteo y perfilado para bordillos y cunetas laterales de vía.
Amarre e instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillos de vía.
Ajuste, reparación y estabilización de base granular en puntos identificados en comité de obra donde se evidencian fallos y acolchonamientos.

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de Obra	1
b.	Residente de interventoría – Director de interventoría – Siso de interventoría	1 – 1 – 1
c.	Profesional de Pavimentos – Profesional ambiental – Siso de Obra	1 – 1 – 1
d	Topografo de Obra	1
e.	Maestro de obra	1
f.	Operador de maquinaria	3
g.	Controlador de tránsito	2
h.	Auxiliar de Obra	7
i.	Cadenero de obra	2.
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con Prisma	e) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	f) Camión Carrotanque.	
c.	Vibro compactador	g) Mezcladora	
d	Motoniveladora		

SEÑALIZACIÓN:

Barricada de listones
Paletas pare y Siga
Delineadores tubulares.

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Nublado
b.	Tarde	Lluvioso

OBSERVACIONES:

Interventoría Solicita mejora en la señalización diurna y nocturna del tramo y puntos intervenidos, garantizando la Seguridad de peatones y transeuntes.
Interventoría Solicita entrega de resultados de laboratorio y toma de muestras a materiales granulares, según especificaciones de diseños y normatividad vigente.

FIRMAS:

Interventoría

Nestor A. Medina P.
Residente de Obra

214

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Viernes, 22 de mayo de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Encofrado para posterior fundida de concreto de bordillos y cunetas de vía fundida de concreto para bordillos y cunetas laterales de vía, Encofrado, amarre e instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillos de vía, Ajuste y reparación de capa de base granular en puntos indicados durante recorrido de comite de obra #18 para subsanar fallos y acolchonamientos

PERSONAL:		**Cantidad**
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de obra	1
e.	Maestro de Obra	1
f.	Operador de maquinaria	3
g.	Cadenero de Obra	2
h.	Controlador de tránsito	2
i.	Ayudante de Obra	7
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con Prisma	e) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	f) Mezcladora	
c.	Motoniveladora	g) Camión Carrotanque.	
d	Vibrocompactador		

SEÑALIZACIÓN:

Barricada de listones
Paletas Pare y Siga
Delineadores tubulares

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Nublado
b.	Tarde	Nublado

OBSERVACIONES:

Se Solicita Cumplimiento e implementación del SGSST, teniendo en cuenta la normatividad vigente (Especificaciones de diseño y obligaciones contractuales, Se solicita entrega de resultados de laboratorio de concretos fundidas en obra para verificación de calidad.

FIRMAS:

Interventoría

Nestor A Medina R.
Residente de Obra

215

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Sábado, 23 de mayo de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Conteo, perfilado y excavación para cunetas y bordillos laterales de vía.
Amarre e instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillos de vía.
Encofrado para posterior fundida de concreto para cunetas y bordillos de vía
Chequeo topografico de niveles y anchos de vía para estructura de pavimento.
Ajuste y reparación de capa de base granular en puntos indicados durante recorrido de comite de obra # 18 para subsanar fallos y acolchonamientos.

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de Obra	1
b.	Residente de interventoria	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de Obra	1
e.	Maestro de obra	1
f.	Operador de maquinaria	3
g.	Cadenero de obra	2
h.	Controlador de transito	2
i.	Ayudante de Obra	7.
j.		

EQUIPO:			
a.	Estación total con Prisma	e) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	f) Retroexcavadora	
c.	Retroexcavadora	g) Camión Carrotanque	
d	Ubicocomprobador -		

SEÑALIZACIÓN:

Barricadas de listones
Paletas Pare y Siga
Delineadores tubulares -

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Nublado
b.	Tarde	Nublado

OBSERVACIONES:

Se solicita mejora en la señalización diurna y nocturna en los tramos intervenidos así garantizando seguridad a transeúntes y peatones, como la calidad de las obras ejecutadas.

FIRMAS:

Nestor Medina R.
Residente de Obra

Interventoría

216

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Martes, 26 de mayo de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Imprimación de emulsión asfaltica para posterior instalación de carpeta asfáltica.
Extendido, instalación, compactación y sello de carpeta asfáltica.
Amarre e instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillos de vía.
Encofrado para posterior fundida de concreto para cunetas y bordillos laterales de vía

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de Obra	1
b.	Residente de Interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de Obra	1
e.	Maestro de obra	1
f.	Operador de maquinaria	3
g.	Cadenero de Obra	2
h.	Controladores de tránsito	2
i.	Ayudante de Obra	7.
j.	Cuadrilla de asfalto	1

EQUIPO:			
a.	Estación total con prisma	e) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor.	f) Mezcladora	
c.	Motoniveladora	g) Camión Carrotanque	
d	Vibrocompactador (2)	h) finisher	
		i) Compactador Sobrellantas.	

SEÑALIZACIÓN:

Barricada de listones
Paletas Pare y Siga
Delineadores tubulares.

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Nublado
b.	Tarde	Soleado

OBSERVACIONES:

Interventoría solicita entrega y toma de laboratorios de carpeta asfaltica según normatividad vigente, así como especificaciones contractuales. y de diseños
Interventoría solicita cumplimiento en el PAGA y PMT, de acuerdo a condiciones contractuales y normatividad vigente.

FIRMAS:

Interventoría

Nestor A Rodriguez R.
Residente de Obra

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Miercoles, 27 de mayo de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Imprimación de carpeta asfáltica para posterior instalación de carpeta asfáltica.
Extendida, instalación, compactación y sello de carpeta asfáltica.
Amarre e instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillos laterales de vía

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de obra	1
e.	Maestro de obra	1
f.	Operador de maquinaria.	3
g.	Cadenero de obra	2
h.	Controladores de transito	2
i.	Ayudante de obra	7.
j.	Cuadrilla de asfalto	1

EQUIPO:			
a.	Estación total con prismas	e) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	f) Retroexcavadora	
c.	Motoniveladora	g) Rumión Carrotanque	
d	Vibrocompactador	h) finisher	
		i) Compactador sobre llantas	

SEÑALIZACIÓN:

Paletas Pare y Siga.
Delineadores tubulares
Barricada de listones

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Lluvioso
b.	Tarde	Nublado

OBSERVACIONES:

Interventoría solicita mejora en la señalización diurna y nocturna del tramo y puntos intervenidos, garantizando la seguridad de peatones y transeuntes.
Interventoría Solicita entrega de resultados y toma de muestras a materiales granulares Según especificaciones de diseños y carpeta asfáltica instalada.

FIRMAS:

Nestor A Medina R
Residente de Obra

219

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Jueves, 28 de mayo de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Imprimación de emulsión asfáltica para posterior instalación de carpeta asfáltica.
Extendida, instalación, compactación y sello de carpeta asfáltica.
Amarre e instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillos laterales de vía
Encofrado para posterior fundida de concreto para cunetas y bordillos de vía

	PERSONAL:	Cantidad
a.	Residente de Obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de obra	1
e.	Maestro de Obra	1
f.	Operador de maquinaria	3
g.	Cadenero de Obra	2
h.	Controlador de tránsito	2
i.	Ayudante de Obra.	7
j.	Cuadrilla de asfalto	4

	EQUIPO:		
a.	Estación total con prisma	e) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	f) Mezcladora	
c.	Motoniveladora	g) Camión Carro tanque	
d	Vibrocompactador	h) Finisher	
		i) Compactador sobre llantas	

SEÑALIZACIÓN:

Barricada de listones
Paletas Pare y Siga
Delineadores tubulares.

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Nublado
b.	Tarde	Nublado

OBSERVACIONES:

Se solicita cumplimiento e implementación del SG557, teniendo en cuenta la normatividad vigente, especificaciones de diseños y obligaciones contractuales.
Se solicita entrega de EPP's y dotación al personal de obra de acuerdo a las actividades programadas y en ejecución.

FIRMAS:

Nestor A Medina M.
Residente de Obra

Interventoría

220

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Viernes, 29 de mayo de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Imprimación de emulsión asfaltica para posterior instalación de carpeta asfaltica.
Extendida, instalación, compactación y sello de carpeta asfáltica.
Encofrado para posterior fundida de concreto de bordillos y cunetas de vía
Fundida de concreto para bordillos y cunetas laterales de vía

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topografo de obra	1
e.	Maestro de Obra	1
f.	Operador de maquinaria	3
g.	Cadenero de obra	2
h.	Controladores de transito	2
i.	Ayudante de obra	7
j.	Cuadrilla de asfalto	1

EQUIPO:			
a.	Estación total con prisma	e) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta menor	f) Camión carrotanque	
c.	Motoniveladora	g) Mezcladora.	
d	Vibrocompactador	h) Finisher	
		i) Compactador sobre llantas	

SEÑALIZACIÓN:

Barricada de listones
Pistas Pare y siga.
Delineadores tubulares.

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Nublado
b.	Tarde	Nublado

OBSERVACIONES:

Se realiza toma de muestras a concretos fundidos en obra.
Se solicita entrega de resultados de concretos tomados en obra para verificación de calidad de las obras ejecutadas.

FIRMAS:

Nesta A Medina R.
Residente de Obra

Interventoría

221

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5
R/L JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ - C.C 6.775.637

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ALVAREZ - C.C 7.172.271

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO / TIERRASUA S.A.S.

LIBRO DIARIO DE OBRA

FECHA: Sábado, 30 de mayo de 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Imprimación de emulsión asfáltica para posterior instalación de carpeta asfáltica.
Extendida, instalación, compactación y sello de carpeta asfáltica.

PERSONAL:		Cantidad
a.	Residente de obra	1
b.	Residente de interventoría	1
c.	Profesional de apoyo Supervisión	1
d	Topógrafo de obra	1
e.	Operador de Maquinaria	3
f.	Maestro de Obra	1
g.	Cadenero de obra	2
h.	Controlador de tránsito	2
i.	Ayudante de obra	7
j.	Cuadrilla de asfalto	1

EQUIPO:			
a.	Estación total con prisma	e) Volqueta Sencilla	
b.	Herramienta Menor	f) Camión Carrotanque	
c.	Motoniveladora	g) Mezcladora.	
d	Vibrocompactador.	h) finisher	
		i) Compactador Sobre llantas.	

SEÑALIZACIÓN:

Barricada de listones
Paletas Pare y Siga
Reflectores tubulares.

ESTADO DEL TIEMPO:

a.	Mañana	Nublado
b.	Tarde	Nublado

OBSERVACIONES:

Se solicita toma de muestras y ensayos a la carpeta asfáltica, de acuerdo a especificaciones de diseño y normatividad vigente, para verificar y garantizar la calidad de las obras ejecutadas.

FIRMAS:

Interventoría

Nestor A Medina R.
Residente de Obra

222

Scanned with CamScanner

CORRESPONDENCIA ENVIADA

INFORME SEMANAL 36 DE INTERVENTORIA

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com>
para tecnica, rafaelcamilosuarezsuarez

lun, 4 may, 1:00 p.m.

Señores
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo a la ejecución del proyecto de referencia se hace envío del informe semanal 36 de interventoría, se anexa en archivo excel y PDF, firmado debidamente por los representantes legales de obra e interventoría.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive


INFORME AVANC...


INFORME AVANC...

Responder | Responder a todos | Reenviar

CITACION A COMITÉ TECNICO DE OBRA #17

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com> mar, 5 may, 8:36 a.m.
para tecnica, CONSORCIO, rafaelcamilosuarezsuarez

Señores
CONSORCIO SISA 25
ING. JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ / REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo al contrato de obra de la referencia y del proceso de avance de obra y seguimiento del mismo, se solicita y cita para el desarrollo del comité técnico del proceso contractual, para el día jueves 7 de mayo de 2026 a las 9:30 am, de forma presencial y en el sitio de obra, con presencia del personal de contratista como representante legal, director de obra, residente de obra y asesor SISO, se propone la siguiente agenda así:

1. Recorrido de la obra y recomendaciones de las partes.
2. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados en comités, de las solicitudes de interventoría y la entidad en comunicaciones previas.
3. Verificación de la ejecución del proyecto, en función del plazo vigente y de la programación de obra, se solicita tener en físico la programación de obra de acuerdo al reinicio #1 del contrato.
4. Verificación de estado de obra y procesos constructivos y ensayos realizados.
5. Seguimiento y control al SGSST, se solicita al contratista de obra realizar informe.
6. Solicitudes de contratista de obra.
7. Solicitudes de la entidad.
8. Recomendaciones y sugerencias de interventoría.
9. Otros y varios.
10. Compromisos

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo al contrato de obra de la referencia y del proceso de avance de obra y seguimiento del mismo, se solicita y cita para el desarrollo del comité técnico del proceso contractual, para el día jueves 7 de mayo de 2026 a las 9:30 am, de forma presencial y en el sitio de obra, con presencia del personal de contratista como representante legal, director de obra, residente de obra y asesor SISO, se propone la siguiente agenda así:

1. Recorrido de la obra y recomendaciones de las partes.
2. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados en comités, de las solicitudes de interventoría y la entidad en comunicaciones previas.
3. Verificación de la ejecución del proyecto, en función del plazo vigente y de la programación de obra, se solicita tener en físico la programación de obra de acuerdo al reinicio #1 del contrato.
4. Verificación de estado de obra y procesos constructivos y ensayos realizados.
5. Seguimiento y control al SGSST, se solicita al contratista de obra realizar informe.
6. Solicitudes de contratista de obra.
7. Solicitudes de la entidad.
8. Recomendaciones y sugerencias de interventoría.
9. Otros y varios.
10. Compromisos.

Se solicita verificar y validar la agenda, si existe alguna solicitud de inclusión se solicita se indique para anexar a la agenda.

Se solicita cumplir con la hora y requiere la presencia del director de obra, representante legal, asesor SISO, de manera indelegable al presente comité.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

Responder | Responder a todos | Reenviar

INFORME MENSUAL 9 DE INTERVENTORIA

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com>
para tecnica, rafaelcamilosuarezsuarez

mar, 5 may, 11:28 a.m.

Señores
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo a la ejecución del proyecto de referencia se hace envío del informe mensual 9 de interventoría, correspondiente al mes de abril de 2026, de acuerdo a las solicitudes, observaciones y ajustes requeridos.

De acuerdo a la documentación enviada por el contratista se encuentra en revisión el informe mensual de obra correspondiente al mes de abril, se envían observaciones para la subsanación del documento.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

1. INFORME MENSUAL FIRMADO.pdf

REMISION DOCUMENTACIÓN MODIFICATORIO DE OBRA #1

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com>
para tecnica, rafaelcamilosuarezsuarez

mié, 6 may, 2:35 p.m.

Señores
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo a la ejecución del proyecto de referencia y de las solicitudes expresadas por el contratista, de las observaciones indicadas por la entidad, se remite la documentación concerniente al modificatorio de obra #1 para su revisión, quedando atentos a cualquier inquietud y comentarios al respecto.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

MODIFICATORIO 1 vr 2.0.zip

INFORME 09, 01/04/2026 - 30/04/2026 Recibidos ×

CONSORCIO SISA 25 mié, 6 may, 6:05 p.m.

Señores. ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ Interventor REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. IPO 001-2025, CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com> mié, 6 may, 6:06 p.m.

para tecnica, rafaelcamilosuarezsuarez

Señores

TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo al contrato de obra de la referencia y del proceso de avance de obra y seguimiento del mismo, se remite informe mensual de obra, correspondiente al mes de abril de 2026, dado que el contratista realiza subsanación de las observaciones realizadas, cabe aclarar que se ha requerido a contratista la entrega de estos documentos en los plazos establecidos.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail Agregar todo a Drive

INFORME SEMANAL 37 DE INTERVENTORIA

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com>
para tecnica, rafaelcamilosuarezsuarez

mar, 12 may, 6:14 p.m.

Señores
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo a la ejecución del proyecto de referencia se hace envío del informe semanal 37 de interventoría, se anexa en archivo excel y PDF, firmado debidamente por los representantes legales de obra e interventoría.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

Agregar todo a Drive

ACTA PARCIAL 2 AUSTADA

Recibidos ×

CONSORCIO SISA 25 mié, 13 may, 10:51 a.m.

Señores ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ Interventor REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. IPO 001-2025, CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA -

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com> mié, 13 may, 10:52 a.m.

para tecnica, rafaelcamilosuarezsuarez, CONSORCIO

Señores
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

CC
CONSORCIO SISA 25
ING. JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ / REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo al contrato de obra de la referencia y del proceso de avance de obra y seguimiento del mismo, de la solicitud de contratista de obra de cobro parcial 2 y de la lista de chequeo emitida por la entidad contratante, se remite la documentación enviada por el contratista, la cual ha sido revisada y avalada por interventoría para el cobro del acta parcial 2.

Quedando atentos a comentarios y observaciones que puedan surgir.

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com> mié, 13 may, 10:52 a.m.

para tecnica, rafaelcamilosuarezsuarez, CONSORCIO

Señores
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

CC
CONSORCIO SISA 25
ING. JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ / REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo al contrato de obra de la referencia y del proceso de avance de obra y seguimiento del mismo, de la solicitud de contratista de obra de cobro parcial 2 y de la lista de chequeo emitida por la entidad contratante, se remite la documentación enviada por el contratista, la cual ha sido revisada y avalada por interventoría para el cobro del acta parcial 2.

Quedando atentos a comentarios y observaciones que puedan surgir.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

•••

Remisión oficio solicitud de prórroga contrato IPO 001-2025

Recibidos ×

CONSORCIO SISA 25 mar, 12 may, 9:42 p.m.

Señores. ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ Interventor REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. IPO 001-2025, CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com> jue, 14 may, 4:31 p.m.

para tecnica, rafaelcamilosuarezsuarez, CONSORCIO

Señores
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

CC
CONSORCIO SISA 25
ING. JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ / REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo al contrato de obra de la referencia y del proceso de avance de obra y seguimiento del mismo, de la solicitud de contratista de obra de prórroga al contrato de obra, se remite oficio de concepto de interventoría respecto al requerimiento.

Quedando atentos a comentarios y observaciones que puedan surgir.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com>
para tecnica, rafaelcamilosuarezsuarez, CONSORCIO

jue, 14 may, 4:31 p.m.

Señores
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

CC
CONSORCIO SISA 25
ING. JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ / REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo al contrato de obra de la referencia y del proceso de avance de obra y seguimiento del mismo, de la solicitud de contratista de obra de prórroga al contrato de obra, se remite oficio de concepto de interventoría respecto al requerimiento.

Quedando atentos a comentarios y observaciones que puedan surgir.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive

Umbita (Boyacá), 13 de mayo de 2026

Señores
CONSORCIO SISA 25
ING. JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ / REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

CC
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO R.
SUPERVISOR DELEGADO

OFC-INT-021

Asunto: CONCEPTO DE INTERVENTORÍA A SOLICITUD DE PRORROGA.

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Cordial saludo,

De acuerdo al desarrollo y ejecución de la obra del contrato de referencia, y de la solicitud elevada por el contratista de obra, cuyo asunto es SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRATO NO. IPO 001-2025., por un (01) mes, realizada mediante oficio recibido el día 12 mayo de 2026 a las 9:42 p.m., y de las funciones de la interventoría, nos permitimos entregar concepto para verificación, aprobación y/o respuesta de la entidad, así:

NUMERAL 1:

En calidad de contratistas de obra del proyecto en ejecución, nos permitimos solicitar muy respetuosamente a la Interventoría se estudie y tramite una prórroga al plazo contractual por un término de un (1) mes adicional, teniendo en cuenta diferentes situaciones que han incidido en el normal desarrollo de las actividades programadas, relacionándose a continuación:

1. Lo anterior se fundamenta principalmente en las condiciones climáticas adversas que se han venido presentando durante la ejecución de la obra, las cuales han afectado el rendimiento y avance de varias actividades constructivas, limitando la adecuada ejecución de los trabajos conforme a la programación establecida.

La interventoría considera, que de acuerdo a lo manifestado por el contratista de obra se corroboró en campo, y de los informes semanales y de la bitácora de obra validada por contratista, interventoría y entidad, se han tenido periodos de lluvia que han retrasado actividades propias del desarrollo del contrato, afectando el rendimiento, dado que se ha debido suspender actividades en el momento de la lluvia, y se han generado retrasos en su reinicio por la saturación de los materiales granulares. También se recuerda, que la interventoría ha recomendado

que se hagan los acopios de insumos acorde a la propuesta de flujo de inversión, y que se protejan los materiales de los efectos del clima, para evitar generar mayores retrasos.

NUMERAL 2:

2. De igual manera, se han presentado problemas operativos con la planta de materiales pétreos, por fallas mecánicas, afectando el normal suministro de material, situación que podría generar afectaciones en la continuidad y desarrollo oportuno de las actividades proyectadas.

La interventoría considera, que de acuerdo a lo manifestado por el contratista de obra se corroboró en campo, que ha habido días en los cuales no se ha podido laborar normalmente, dado que no se contaba con material de base granular especialmente, a partir de la razón de que la cantera presentaba problemas en el despacho, esta situación se evidenció específicamente en los primeros 3 días de la semana anterior. También se recuerda, que la interventoría ha recomendado que se hagan los acopios de insumos acorde a la propuesta de flujo de inversión, y que se protejan los materiales de los efectos del clima, para evitar generar mayores retrasos.

NUMERAL 3:

3. Adicionalmente, se ha requerido realizar trabajos de estabilización de taludes con el propósito de garantizar las condiciones de seguridad y

estabilidad dentro del corredor intervenido, actividades que demandaron mayores tiempos de ejecución.

La interventoría considera, que de acuerdo a lo manifestado por el contratista de obra se corroboró en campo, durante el tiempo que se ha intervenido el tramo vial, especialmente en las excavaciones y ampliaciones de la vía en donde se presentan taludes con actividad, lo cual en su momento fue solicitado realizar monitoreo constante y dejar en bitácora lo registrado, de igual manera se presentó propuesta de manejo y estabilización por parte del contratista, para lo cual se ha venido trabajando en dichas alternativas en especial en las zonas de encole de las alcantarillas, con el fin de contener y dar estabilidad y paisajismo, también para proteger las actividades realizadas tanto de obras de arte, como de la estructura de pavimento, lo cual ha requerido mano de

obra para la mitigación de las afectaciones que se generaron, debido a la actividad en estos puntos críticos del proyecto.

NUMERAL 4:

> 4. Así mismo, actualmente se encuentran en trámite el modificatorio N° 1 al contrato de obra, que incluye mayores cantidades de obra a ejecutar siendo requeridas para el adecuado cumplimiento y terminación integral del proyecto, las cuales también inciden directamente en el cronograma contractual.
>
> Por las razones anteriormente expuestas, solicitamos comedidamente se conceda una prórroga al contrato por el término de un (1) mes, con el fin de garantizar la correcta culminación de las actividades pendientes y asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones de calidad requeridas para el proyecto.
>
> Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para el respectivo trámite.

La interventoría considera, que de acuerdo a lo manifestado por el contratista de obra y de acuerdo a la solicitud de adicional de recursos al proyecto, con las mayores cantidades requeridas para la culminación del alcance del contrato, se requiere el tiempo de un (01) mes como lo manifiesta el constructor, para la ejecución de las actividades y obras técnicas, sin embargo es pertinente manifestar que la interventoría recomienda que se hagan los acopios de insumos acorde a la propuesta de flujo de inversión, y que se protejan los materiales de los efectos del clima, para evitar generar retrasos en la ejecución.

De acuerdo a lo solicitado por CONSORCIO SISA 25, y lo verificado en los numerales 1 a 4, la interventoría del proceso, concluye que de acuerdo a lo informado y solicitado por el contratista y en la revisión de los soportes, y como esfuerzo de todas las partes intervinientes en el proyecto para lograr cumplir con el objetivo y la función que se nos ha asignado, informa a la entidad contratante que el contratista de obra requiere de un (1,0) mes CALENDARIO, con base a la revisión de la solicitud del contratista, de los rendimientos de obra y de las actividades que han surgido realmente a la fecha y han retrasado las actividades.

Nuevamente la interventoría solicita al contratista de obra, al cumplimiento de sus compromisos y obligaciones derivados del contrato precitado, al incremento de personal, equipos e insumos, para acometer las actividades programadas y/o pendientes de inicio.

La Interventoría reitera, que de otorgarse por la entidad el plazo acá estimado para la culminación de las actividades por parte del contratista, estás deberán desarrollarse en el tiempo aquí definido, razón por la cual no se viabilizará tiempo adicional por las circunstancias ya mencionadas. De otorgarse por la entidad contratante, un plazo de un (1.0) mes de prórroga, se deberá otorgar una prórroga y adicional al contrato de interventoría, para acompañar el proceso completo de control y vigilancia de las actividades contractuales.

Sin perjuicio del concepto de esta Interventoría, es TIERRASUA SAS, como entidad contratante, quien está facultado para aprobar y realizar modificaciones contractuales, por tal motivo quedamos atentos a las determinaciones respecto a la aprobación de la prórroga del Contrato de obra IPO - 001 - 2025, la cual derivaría en una prórroga al Contrato de Interventoría IPVO - 017 - 2025, en un término igual al de obra.

Anexo: Oficio de solicitud de prórroga del contratista.

Sin otro en particular, atentos a los comentarios y pendientes de la entrega de la documentación requerida.

Atentamente,

ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
Director de Interventoría
INTERVENTORÍA DE OBRA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA IPVO-017-2025

cc. Archivo general.
Proyectó: Ing. David Mendivelso – residente de interventoría.
Aprobó: Ing. Jaime Pinzón – director de interventoría.

REMISION DOCUMENTACIÓN AJUSTADA MODIFICATORIO DE OBRA #1

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com>
para tecnica

vie, 15 may, 9:10 a.m.

MODIFICATORIO 1 vr 2.0.zip

Señores
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo a la ejecución del proyecto de referencia y de las solicitudes expresadas por el contratista, de las observaciones indicadas por la entidad, se remite la documentación concerniente al modificatorio de obra #1 para su revisión y respectivo trámite, quedando atentos a cualquier inquietud y comentarios al respecto.

Se aclara que dicha documentación fue remitida con anterioridad vía whatsapp a los profesionales de apoyo de la supervisión, por lo cual se remite por este medio ya completa y ajustada y de acuerdo a los formatos y nueva documentación solicitada.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

INFORME SEMANAL 38 DE INTERVENTORIA

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com>
para tecnica, rafaelcamilosuarezsuarez

mar, 19 may, 6:44 p.m. (hace 10 días)

Señores
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo a la ejecución del proyecto de referencia se hace envío del informe semanal 38 de interventoría, se anexa en archivo excel y PDF, firmado debidamente por los representantes legales de obra e interventoría.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

Agregar todo a Drive

CITACION A COMITÉ TECNICO DE OBRA #18

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com>
para tecnica, CONSORCIO, rafaelcamilosuarezsuarez

mar, 19 may, 6:45 p.m. (hace 10 días)

Señores
CONSORCIO SISA 25
ING. JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ / REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo al contrato de obra de la referencia y del proceso de avance de obra y seguimiento del mismo, se solicita y cita para el desarrollo del comité técnico del proceso contractual, para el día jueves 21 de mayo de 2026 a las 9:30 am, de forma presencial y en el sitio de obra, con presencia del personal de contratista como representante legal, director de obra, residente de obra y asesor SISO, se propone la siguiente agenda así:

1. Recorrido de la obra y recomendaciones de las partes.
2. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados en comités, de las solicitudes de interventoría y la entidad en comunicaciones previas.
3. Verificación de la ejecución del proyecto, en función del plazo vigente y de la programación de obra, se solicita tener en físico la programación de obra de acuerdo al reinicio #1 del contrato.
4. Verificación de estado de obra y procesos constructivos y ensayos realizados.
5. Seguimiento y control al SGSST, se solicita al contratista de obra realizar informe.
6. Solicitudes de contratista de obra.
7. Solicitudes de la entidad.
8. Recomendaciones y sugerencias de interventoría.
9. Otros y varios.

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo al contrato de obra de la referencia y del proceso de avance de obra y seguimiento del mismo, se solicita y cita para el desarrollo del comité técnico del proceso contractual, para el día jueves 21 de mayo de 2026 a las 9:30 am, de forma presencial y en el sitio de obra, con presencia del personal de contratista como representante legal, director de obra, residente de obra y asesor SISO, se propone la siguiente agenda así:

1. Recorrido de la obra y recomendaciones de las partes.
2. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados en comités, de las solicitudes de interventoría y la entidad en comunicaciones previas.
3. Verificación de la ejecución del proyecto, en función del plazo vigente y de la programación de obra, se solicita tener en físico la programación de obra de acuerdo al reinicio #1 del contrato.
4. Verificación de estado de obra y procesos constructivos y ensayos realizados.
5. Seguimiento y control al SGSST, se solicita al contratista de obra realizar informe.
6. Solicitudes de contratista de obra.
7. Solicitudes de la entidad.
8. Recomendaciones y sugerencias de interventoría.
9. Otros y varios.
10. Compromisos.

Se solicita verificar y validar la agenda, si existe alguna solicitud de inclusión se solicita se indique para anexar a la agenda.

Se solicita cumplir con la hora y requiere la presencia del director de obra, representante legal, asesor SISO, de manera indelegable al presente comité.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

Responder Responder a todos Reenviar

SOLICITUD DE ENTREGA DE RESULTADOS DE ENSAYOS.

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com>
para CONSORCIO, tecnica, rafaelcamilosuarezsuarez

mar, 19 may, 7:00 p.m. (hace 10 días)

Señores
CONSORCIO SISA 25
ING. JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ / REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

CC
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo al contrato de obra de referencia y del proceso de avance de obra y seguimiento del mismo, se realiza envío del oficio 22 de interventoría según las observaciones, consideraciones, solicitudes y requerimientos de obra.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

Umbita (Boyacá), 19 de mayo de 2026

Señores
CONSORCIO SISA 25
ING. JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ / REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

CC
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO R.
SUPERVISOR DELEGADO

OFC-INT-022

Asunto: SOLICITUD DE ENTREGA Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE ACUERDO A NORMATIVIDAD VIGENTE.

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la ejecución del contrato de referencia, de la revisión de la normatividad vigente, y a partir de los anexos adjuntos dentro de los estudios y diseños entregados por la entidad contratante, se reiteran las siguientes observaciones y solicitudes al contratista de obra para el seguimiento y control de obra.

Cabe aclarar que el contratista de obra realiza la entrega de un plan de inspección y ensayos, sin embargo, no se evidencia la entrega de periocidad de la toma de muestras a realizar ni se indica las fechas probables en las cuales se van a acometer en obra.

- Teniendo en cuenta el anexo técnico de ensayos a realizar para la ejecución del proyecto, incluido dentro de los estudios y diseños, se tienen los siguientes laboratorios, por lo cual se reitera la solicitud a contratista, entregar un plan de inspección y ensayos documento en el cual se presente la **periocidad** de cada ensayo de acuerdo a las condiciones en obra, dando cumplimiento a lo establecido contractualmente y normativamente, dado que no se aprueba instalación de material sin tener esta documentación.

ENSAYOS - CONTROL DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC	
1	INV E-732 Extracción cuantitativa del asfalto en mezclas para pavimentos
2	INV E-733 – Gravedad específica bulk.
3	INV E-748 – Estabilidad y flujo
4	INV E-735 – Gravedad específica máxima
5	INV E-736 – Vacíos con aire
6	INV E-755 – Contenido de agua.
7	INV E-749– Módulo resiliente.

8	Entrega de información de despachos de planta de cada vehículo que sale y control de calidad antes de instalar en obra.

- Teniendo en cuenta que ya se encuentran en la etapa de finalización de la instalación de la segunda capa de la estructura del pavimento, se solicita con prioridad la entrega de la documentación en cuanto a ensayos de la base granular específicamente de las densidades de compactación , así como para la carpeta asfáltica, como por ejemplo Ensayos de desempeño, Leyes de fatiga, Módulo resiliente, Módulo dinámico, TCR, dado que sin estos resultados no se puede aprobar el diseño de mezcla asfáltica, y por consiguiente la instalación del material en obra.

- Se recomienda realizar ensayos concernientes a la carpeta asfáltica, ya que estos tienen un tiempo previo para toma de muestras y datos que, según el avance ejecutado y proyectado en obra está en los límites de tiempo para ejecutar estos laboratorios y tener los soportes para poder autorizar los vaciados e instalación de estos materiales en obra.

Se recuerda y se reitera que sin tener la documentación previamente referenciada no se autorizan por parte de interventoría instalación de material granular en obra, dado que es importante cumplir con la información para revisión y dar cumplimiento al seguimiento y control de obra, garantizando la calidad en las actividades ejecutadas.

Sin otro en particular, atentos a los comentarios y pendientes de la entrega de la documentación requerida.

Atentamente,

ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
Director de Interventoría
INTERVENTORÍA DE OBRA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA IPVO-017-2025

cc. Archivo general.
Proyectó: Ing. David Mendivelso – residente de interventoría.
Aprobó: Ing. Jaime Pinzón – director de interventoría.

ACTA DE COMITE DE OBRA #17

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com>
para tecnica, CONSORCIO, rafaelcamilosuarezsuarez

mié, 20 may, 3:45 p.m. (hace 9 días)

Señores
CONSORCIO SISA 25
ING. JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ / REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo al contrato de obra de la referencia y del proceso de avance de obra y seguimiento del mismo, se realiza envío del acta de comité de obra #17, para su conocimiento y fines pertinentes.acta

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail Agregar a Drive

INFORME SEMANAL 39 DE INTERVENTORIA

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com>
para tecnica, rafaelcamilosuarezsuarez

lun, 25 may, 2:41 p.m. (hace 4 días)

Señores
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo a la ejecución del proyecto de referencia se hace envío del informe semanal 39 de interventoría, se anexa en archivo excel y PDF, firmado debidamente por los representantes legales de obra e interventoría.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive





ACTA PARCIAL 03 CONTRATO N° IPVO – 017 - 2025

Jaime Pinzón <interumbita@gmail.com>
para tecnica

mié, 27 may, 3:40 p.m. (hace 2 días)

Señores
TIERRASUA SAS
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

Cordial saludo

Referencia: CONTRATO DE OBRA IPO- 001-2025, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

De acuerdo a la ejecución del proyecto de referencia se hace envío del acta parcial de cobro 3 de interventoría con sus respectivos soportes, para revisión y aprobación.

Por favor confirmar el recibo del presente correo.

Atentamente

JAIME HUMBERTO PINZÓN A.
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA - PUENTE SISA

COBRO 3 INTER.zip

Responder Reenviar

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Resultados de laboratorio – Material Subbase Granular

Recibidos ×

CONSORCIO SISA 25
para mí

4 may 2026, 8:01a.m.

Señores.
ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
Interventor

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. IPO 001-2025, CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ÚMBITA - PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO SISA 25 Y TIERRASUA S.A.S.

ASUNTO: Resultados de laboratorio – Material Subbase Granular

Cordial saludo,

Por medio del presente se remiten adjuntos los resultados de laboratorio correspondientes a la caracterización del material granular tipo Subbase Granular, así como los ensayos de densidad del suelo en el terreno mediante el método del cono de arena, realizados sobre el material de subbase granular instalado en obra.

La documentación adjunta contiene los respectivos resultados y soportes técnicos para su revisión y fines pertinentes.

Quedamos atentos a cualquier observación o información adicional que se requiera.

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive



PDF Laboratorios Abri...

INFORME SST DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA No: IPO 001-2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: IPVO 017-2025

INFORME NUMERO: 10

FECHA DE CORTE DEL INFORME:

Del 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

CONTRATANTE: TIERRASUA S.A.S

INTERVENTORÍA: JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

INFORME DE INTERVENTORIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR PARTE DEL CONSORCIO SISA 25

Decreto 1072 del 2015
Res. 0312 de 2019.
Resolucion 4272 de 2021 “reglamento para el trabajo en alturas
Resolución 3461 de 2025, constitución y funcionamiento del CCL

Dirección: Calle 30 #10-36 Tunja
Email: Interumbita@gmail.com
Contacto: 314 -3600483

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

PROYECTO	N° IPO 001-2025
OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
CONTRATISTA	CONSORCIO SISA 25 NIT 901.969.390-5 R/L JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ CC 6.775.637 de Tunja
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES
PLAZO PRORROGA #1:	N/A
PLAZO TOTAL:	DIEZ (10) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	19 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO 1:	13 DE ENERO DE 2026
FECHA PROYECTADA DE FINALIZACIÓN	02 DE JULIO DE 2026

ELABORADO POR	**APROBADO POR**
María Clara Cáceres Estupiñán **Profesional especializado en SST** **Lic. 0315 Expedida por SSB**	Jaime Humberto Pinzón Álvarez **Director de interventoría.** **JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ**

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

2. OBJETIVOS 4

a. OBJETIVO GENERAL: 4

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 4

3. INFORME GENERAL 5

a. Relación del personal en obra en las fechas del corte. 5

b. Relación del personal por parte de la interventoría 6

c. Relación de personal retirado 6

d. Relación de maquinaria en obra 6

4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA. 7

a. Las actividades ejecutadas en esta fase del proyecto fueron: 7

5. ACTIVIDADES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 7

6. LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTA FASE DEL PROYECTO E INTERVENIDOS POR EL CONTRATISTA SISA 2025 FUERON: 8

a. AUSENTISMO LABORAL 9

7. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 9

8. ACTIVIDADES DEL SG-SST (DOCUMENTOS, CAPACITACIONES EJECUTADAS) 10

9. EVIDENCIAS REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST. 101

10. OBSERVACIONES 112

1. INTRODUCCIÓN

El decreto único reglamentario 1072 de 2015 del sector trabajo, expedido por el Ministerio del Trabajo, establece los parámetros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entre ellos, establece que se debe crear un mecanismo por medio del cual las personas e instituciones públicas y privadas, informen sobre el desempeño de este, a través de la implementación de los estándares mínimos, contemplados en la resolución 0312 de 2019, de igual manera se adopta las resoluciones 4272 de 2021 "reglamento para el trabajo en alturas" y la resolución 3461 de 2025, constitución y funcionamiento del CCL

Este mecanismo en el proceso constructivo, se intervine a través de las ARLs, interventorías, veedores ciudadanos, entidades de control entre otras, es por ello que la interventoría en cabeza de **JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ,** establece medidas de verificación de la implementación del SG-SST por parte del contratista CONSORCIO SISA 25, durante la ejecución del mejoramiento de la vía secundaria Umbita – puente sisa del municipio de Umbita – departamento de Boyacá

2. OBJETIVOS

a. OBJETIVO GENERAL:

Verificar la implementación del SG-SST, en la obra civil del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", en cumplimiento normativo, para con el reglamento único del sector trabajo decreto 1072 del 2015 y su documento anexo resolución 0312 de 2019, resolución

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de la implementación del SG-SST mediante el del plan de trabajo presentado por el contratista **CONSORCIO SISA 25.** (afiliaciones al SGSST).

- Verificar que el plan de trabajo presentado cumpla con los lineamientos del reglamento único del sector trabajo en cuanto a charlas de seguridad, vigilancia de estado de salud de los trabajadores, reporte e investigación de accidentes de trabajo.

- Verificar la conformación de la brigada de emergencia, el entrenamiento y el suministro de los elementos para la atención de emergencias (botiquín clase B o C, camilla de rescate, extintores.

- Verificación y seguimiento de la conformación de los comités reglamentarios COPASST, COCOLA. y la ejecución de las actividades de cada comité.

- Verificar la intervención a los peligros inmersos en las actividades diarias mediante el diligenciamiento de los ATS, y los PTSA si fuere el caso.

3. INFORME GENERAL

Información del personal en obra:

El contratista **CONSORCIO SISA 25,** ha venido contratando personal para la ejecución del proyecto en número y especificaciones necesarias según la fase del mismo:

a. Relación del personal en obra en las fechas del corte.

Tabla 01. Relación del personal en obra en las fechas del corte.

#	NOMBRES	CEDULA	EPS	ARL	PENSIÓN	CCF	PLANILLA #
1	YOFRE LEÓNIDAS LÓPEZ MERCHÁN	6,773,517	SANITAS	POSITIVA	COLPENSIONES		85630210
2	NÉSTOR ANDRÉS MEDINA ROA	1,049,618,290	FAMISANAR	POSITIVA	COLPENSIONES	COMFABOY	9504619191
3	JAIME ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ	6,775,637	SANITAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMFABOY	9504619191
4	ELIZABETH MAHECHA VALERO	52,797,064	SANITAS	POSITIVA	COLPENSIONES		9504530336
5	HUGO MAURICIO SUAREZ RINCÓN	1,049,621,129	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR		6016845698
6	DIEGO ALEXANDER CASTAÑEDA ARANGO	1,054,708,889	SANITAS	SURA	PORVENIR		4652416523
7	JULIÁN ANDRÉS CANTE TORRES	1,002,565,586	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	4651056345
8	CAMILO ANDRÉS MARTÍNEZ VELOSA	1,000,974,330	COMPENSAR	POSITIVA	PORVENIR	COMFABOY	9504619191
9	JHON ALEXANDER FONSECA RODRÍGUEZ	1,049,641,192	SANITAS	COLPATRIA	COLPENSIONES	COLPATRIA	9504317356
10	HÉCTOR JULIO DIAZ SÁNCHEZ	1,056,612,762	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMFABOY	9504619191
11	JUAN CARLOS GÓMEZ SIERRA	79,873,842	SALUD TOTAL	POSITIVA	PROTECCION	COMFABOY	9504619191
12	LUZ ADRIANA JUNCO	1,002,682,724	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMFABOY	9504619191
13	HOLMANT MORENO MENDOZA	74,329,975	NUEVA EPS	POSITIVA	PROTECCION	COMFABOY	9504619191
14	MILTON AUGUSTO PEDREROS VELOSA	1,056,612,181	NUEVA EPS	POSITIVA	COLFONDOS	COMFABOY	9504619191
15	FLOR DARY PLAZAS DIAZ	1,056,612,562	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMFABOY	9504619191
16	JOSÉ AGUSTÍN RAMOS MARTÍNEZ	1,056,614,050	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR	COMFABOY	9504619191
17	JEIDERTH DAMIÁN SEPÚLVEDA MORENO	1,007,859,149	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMFABOY	9504619191
18	NELSON LIBARDO SOLER CASTELBLANCO	1,056,612,577	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMFABOY	9504619191
19	SALVADOR VALERO SÁNCHEZ	4,291,064	SANITAS	POSITIVA	COLFONDOS	COMFABOY	9504619191
20	JOSE MENDOZA	74,329,901	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMFABOY	9504619191
21	HECTOR ANDRÉS MORENO	1,033,691,318	NUEVA EPS	POSITIVA	PROTECCION	COMFABOY	9504619191
22	HECTOR DELFIN MOLINA MOLINA	7,163,340	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR	COMFABOY	83737689
23	ANGEL QUERUBÍN CONTRERAS	7,171,652	SALUD TOTAL	POSITIVA	PORVENIR	COLPATRIA	9504317356

NOTA: se reciben planillas de aportes a la seguridad social correspondiente al mes de abril 2026.

b. Relación del personal por parte de la interventoría

Tabla 02 relación personal de la interventoría

CARGO	NOMBRE
Director De Interventoría	Jaime Humberto Pinzón Álvarez
Residente De Interventoría	Andrés David Mendivelso Álvarez
Profesional De Aseguramiento O Gestión De Calidad	María Clara Cáceres Estupiñán
Especialista Hidráulico E Hidrológico	Claudia Rocío Suarez Castillo
Especialista En Geotecnia	Jorge Andrés Roa Romero
Especialista En Pavimentos	Hernando Andrés Alvarez Arévalo

c. Relación de personal retirado

Tabla 03, Relación de personal retirado

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
JUAN CARLOS GÓMEZ SIERRA	79,873,842
JEIDERTH DAMIÁN SEPÚLVEDA MORENO	1,007,859,149

d. Relación de maquinaria en obra

En esta fase del proyecto el contratista **CONSORCIO SISA 25**, relaciona la siguiente maquinaria usada en el desarrollo de varias actividades:

EQUIPOS	CANTIDADES
Estación total topográfica	1
Volqueta sencilla	1
Motoniveladora	1
Vibro compactador	1
Camión carro tanque.	1
Finisher	1
Compactador sobre llantas	1

Tabla 4. Relación de vehículos, Periodo del 1 al 31 de mayo de 2026.

No	DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA				
	TIPO	**PLACA**	**RTM**	**SOAT**	**CONDUCTOR**
1	Volqueta	UFZ964	CERTIFICADO 175967567	PÓLIZA 23-09-2026	NÉSTOR OSWALDO CASTIBLANCO MARTÍNEZ

Nota: el contratista adjunta documentación anterior referenciada vigente**.**

4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA.

a. Las actividades ejecutadas en esta fase del proyecto fueron:

Descripción de actividades técnicas de obra.

El contratista en esta fase del proyecto realizo las siguientes actividades:

- Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para base granular.
- Trasporte de material de granular.
- Cuneteo, perfilado y excavación para construcción de cunetas bordillos laterales de vía.
- Amarre e instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillos de vía.
- Encofrado y posterior fundida de concreto para cunetas y bordillos laterales de vía.
- Imprimación de emulsión asfáltica.
- Extendida, instalación, compactación y sello de carpeta asfáltica.
- Paisajismo y contención de taludes activos en zonas de alcantarillas.

Nota: interventoría ha solicitado que todas las actividades se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

5. ACTIVIDADES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de acuerdo a los diseños aprobados.
- Verificación de afiliaciones y aportes a la seguridad social de los trabajadores al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
- Verificación del suministro de la dotación y de los EPP'S por parte del contratista a los trabajadores.
- Verificación del uso de los EPP'S durante la jornada laboral.
- Verificación de la implementación del plan de trabajo en SST por parte del contratista.
- Verificación del cumplimiento con el PAGA.
- Verificación del cumplimiento con el PMT.
- Acompañamiento y asesoría por parte de la líder SST al residente SST del contratista en la ejecución de actividades del SG-SST, pausa activa, charla sobre consecuencia de caídas al mismo nivel
- Inspección al botiquín y punto de hidratación.

LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTA FASE DEL PROYECTO E INTERVENIDOS POR EL CONTRATISTA SISA 2025 FUERON:

El contratista CONSORCIO SISA 25, realizo la intervención a los riesgos inmersos en cada actividad implementando el SG-SST contemplado en el del decreto 1072 del 2015 y resolución 0312 de 2019, junto a la resolución 4272 del 2021 y la resolución 3461 de 2025

La intervención se hizo en cuanto a los siguientes aspectos:

Afiliación al SGSST, realización de capacitaciones, pago de aportes a seguridad social en salud, suministro de EPP'S y Dotación, suministro de unidad sanitaria y punto de hidratación.
Realización de los ATS, inspección a la maquinaria amarilla.
Implementación del plan de trabajo vigencia 2026.

RIESGOS	CONSECUENCIA	MEDIDA DE INTERVENCIÓN
Riesgos biomecánicos: generados por la posición en bipedestación más del 99 % de la jornada laboral, sumado de manejo de herramientas manuales y manipulación manual de cargas.	Posible dolores o molestias osteomusculares, fatiga muscular, machucón en las manos, colpes en las piernas, tensión muscular, calambres. Posible caída a distinto nivel.	Calistenia diaria Pausas activas Verificación del estado de salud de los trabajadores. Actividad programada por cuadrillas. Mantenimiento a las carretillas Revisión a las herramientas manuales.
Riesgo psicosocial: Las actividades fueron rutinarias, monótonas y con alta carga mental y de concentración.	Estrés laboral Fatiga física Fatiga emocional Estrés laboral	Descansos y programación de actividades alternadas. Verificación del estado de salud. Pausas activas. Programación y coordinación de las actividades.
Riesgo físico: **Ruido:** Generado por la condición ambiental asociada al uso de maquinaria amarilla, herramienta manual **Vibración:** generada por la maquinaria amarilla las volquetas etc. y vehículos para el acopio de materiales. **Temperaturas extremas:** Generada por la exposición a	Lesiones leves, graves. Posible trauma y lesiones leves o graves a nivel osteomuscular. Posibles accidentes de trabajo. Posible golpe de calor, fatiga muscular	Suministro y uso de los EPP'S, (protección auditiva). Actividades alternas Descansos en la jornada laboral Suspensión de actividades en tiempo de lluvias fuertes.

temperaturas extremas, según los cambios climáticos		
Riesgo químico: este factor de riesgo se presentó durante la ejecución de esta fase del proyecto debido a la manipulación de productos o sustancias químicas como componentes del cemento, la oxidación de los aceros, los productos químicos componentes del pegante y limpiador de tuberías.	Posible irritación de la piel, alergias. Posible lesión en ojos Enfermedades gástricas ocasionado por el olor o inhalación del material particulado, generado por el polvillo del cemento e inflación de los productos químicos	Suministro y uso de EPP'S como protección auditiva, guantes. Suministro de ropa de labor (overol), suministro de tapabocas.

a. AUSENTISMO LABORAL

AUSENTISMO POR ACCIDENTE E INCIDENTES DE TRABAJO

Durante esta fase del proyecto el contratista no reportó accidentes de trabajo.

AUSENTISMO POR ENFERMEDAD COMÚN

No se reportó ausentismo por esta causa.

6. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El contratista entrego los siguientes elementos de protección personal a los trabajadores:

- Guantes
- Casco de seguridad
- Botas de seguridad
- Protección auditiva
- Monogafas o gafas de seguridad

Nota: los registros entregados por el contratista son:

- 4 formatos de ATS
- 2 formato de inspección a EPPS
- 4 registros de asistencia a capacitaciones
- 4 formato inspección a motoniveladora.
- 2 formatos inspección al vibro compactador
- Un acta del COPASST
- Un acta del comité de convivencia laboral
- 4 registros de asistencia a capacitaciones

7. ACTIVIDADES DEL SG-SST (DOCUMENTOS, CAPACITACIONES EJECUTADAS)

El contratista de obra adjunta registro de asistencia a las siguientes capacitaciones:

TEMA	FECHA
La importancia de los elementos de protección personal	14-05-2026
Cuidado de las manos – uso de guantes	21-05-2026
Prevenir riesgos prioritarios en la obra	21-05-2026
Higiene postural pausas activas	28-05-2026
Divulgación de campaña de seguridad vial	28-05-2026

INSPECCIONES

Inspecciones: el contratista adjunta los formatos de ATS y de inspecciones realizadas a las volquetas y a la motoniveladora, formatos de inspección a los EPPS y registros de asistencia a las capacitaciones

CONCEPTOS MEDICOS LABORALES

En esta fase del proyecto hubo ingresos nuevos y el contratista no presento los exámenes laborales de ingreso.

Actas comités reglamentarios:

El contratista presento acta de COPASST y acta de reunión del CCL correspondientes al mes de mayo de 2026.

8. EVIDENCIAS REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST.






9. OBSERVACIONES

El contratista debe:

- Continuar con la implementación del SG-SST mediante charlas de seguridad, soportadas con listas de asistencia y registro fotográfico y programadas en el plan de trabajó presentado.
- Se sugiere hacer entrega y socialización de los conceptos médicos laborales a los trabajadores y del diagnóstico de condiciones de salud (adjuntar evidencia de notificación a cada trabajador)
- Debe continuar con la entrega y reposición de EPPS, (botas de caucho con puntera, barbuquejos para los cascos, gafas de seguridad, cofias o cuellos) y las carpas, llevando registro de entrega
- Continuar con la entrega de dotación, evidenciando la entrega mediante registró de entrega
- El contratista debe continuar con la inspección a los equipos y herramientas de trabajo.
- Realizar los ATS diarios y adjuntarlos.
- La contratista debe continuar adjuntando los preoperacionales de las volquetas de manera legible.
- El contratista en el informe del componente de seguridad industrial no adjunto paz y salvos y conceptos médicos de retiro del personal retirado. JUAN CARLOS GÓMEZ SIERRA, JEIDERTH DAMIÁN SEPÚLVEDA MORENO.

.

REALIZO	**MARÍA CLARA CÁCERES E**	**REVISO Y APROBÓ:**	**JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ**
CARGO	SISO Interventoría	**CARGO**	Director de interventoría
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA INICIO CORTE	01 de mayo de 2026	**FECHA FINAL CORTE**	31 de mayo de 2026

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

TIERRASUA ¡Conectamos región!	**INFORME DE AVANCE SEMANAL**	**36**

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 FECHA DE INFORME	4	5	2026	**1.2 SEMANA:** Del 27/04/2026 hasta 03/05/2026			
1.3 CONTRATO OBRA No.	**IPO-001-2025**			**1.6 CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**IPVO-017-2025**		
1.4 CONTRATISTA:				**1.7 INTERVENTOR:**			
1.5 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	DD	MM	AAAA	**1.8 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA**	DD	MM	AAAA
	2	**7**	**2026**		**2**	**7**	**2026**

1.9 OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.1 ESTADO DEL TIEMPO	**Lunes**	**Martes**	**Miércoles**	**Jueves**	**Viernes**	**Sábado**	**Domingo**
	Nublado	Nublado lluvias leves	Nublado lluvias leves	Nublado	Nublado	N/A	N/A


2.2 DESCRIPCIÓN: *(Describir brevemente las actividades ejecutadas y localización).*

** Se realiza levantamiento topográfico de conformación de estructura de pavimento, materializando anchos de vías y niveles, mediante estacas testigos y chaflanes.*
** Se realiza extendido y compactación de base granular para conformación de estructura de pavimento K9+000 a K9+650*

3. CONTROL DE PLAZOS Y AVANCE DE EJECUCIÓN

3.1 PLAZO CONTRATO DE OBRA	**10**	Meses	**3.3 PLAZO CONTRATO INTERVENTORÍA**	**10**	Meses
3.2 PLAZO TRANSCURRIDO	**8.03**	Meses	**3.4 PLAZO TRANSCURRIDO**	**8.03**	Meses

% PROGRAMADO DE OBRA	**48.46%**
% AVANCE DE OBRA	**47.50%**
% DE ATRASO	**0.96%**
% PLAZO TRANSCURRIDO OBRA	**80.26%**
% PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORÍA	**80.26%**

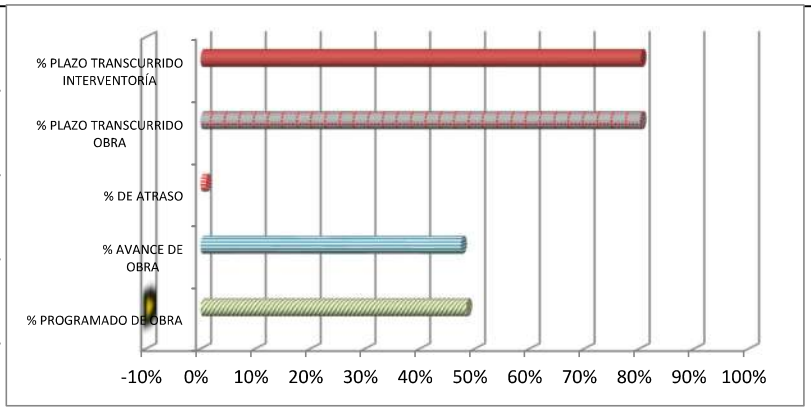

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO

4.1 OBSERVACIONES

En caso de posibles atrasos indique las causas y el responsable.

Se presenta un retraso leve de obra, respecto al avance programado, se solicita a contratista de obra mejorar los rendimientos para evitar mayores retrasos en obra, de igual manera se recomienda que se provea de suficiente material en obra, teniendo acopio de los diferentes materiales que se requieren según la programación de obra aprobada.

4.2 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

En caso de retrasos, por favor describir los compromisos, acciones correctivas y el tiempo previsto para subsanar.

1. Entrega de dotación a personal de obra.
2. Entrega de documentación requerida para seguimiento de la obra.
3. Seguimiento y control del SGSST.
4. Entrega de resultados de laboratorio de materiales usados en obra.
5. Entrega de caracterización de materiales granulares a usar en obra.
6. Seguimiento y control en la implementación del PAGA y PMT.
7. Entrega de certificados de afiliación del personal ingresado posterior a suscripción de acta de reinicio de obra y paz y salvos del personal retirado.
8. Entrega de informe mensual de abril con sus respectivos soportes.

4.3 ACCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

Describir las acciones correctivas y preventivas por parte de la interventoría.

1. Solicitudes y requerimientos a contratista de entrega de información y documentación para verificación, seguimiento y control de obra.
2. Cumplimiento de personal en obra de acuerdo a dedicaciones ofertadas.
3. Revisión de documentación entregada por parte de contratista de obra y envío de concepto y observaciones a la misma.
4. Revisión de informes de contratista de obra y realización de informes semanales y mensuales de interventoría.
5. Seguimiento diario a obra de las diferentes actividades ejecutadas y lugares de obra.
6. Solicitud de entrega de documentación por parte de contratista.

5. FIRMAS

x

Firma: _____

Nombre: JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

INTERVENTOR

Firma: _____

Nombre: CONSORCIO SISA 25
R/L JAIME ORLANDO GÓMEZ
CONTRATISTA

Nota: *Éste informe debe ser presentado al supervisor de interventoría, el primer día hábil de la semana. Adjuntar soportes y registros*

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción de la fotografía:
Extendida e instalación de base granular para estructura de pavimento.



Descripción de la fotografía:
Extendida e instalación de base granular para estructura de pavimento.



Descripción de la fotografía:
Compactación de base granular para estructura de pavimento.



Descripción de la fotografía:
Paisajismo y contención de taludes activos en zonas de alcantarillas.

TIERRASUA ¡Conectamos región!	**INFORME DE AVANCE SEMANAL**	**37**

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 FECHA DE INFORME	12	5	2026	**1.2 SEMANA:** Del 04/05/2026 hasta 10/05/2026				
1.3 CONTRATO OBRA No.	**IPO-001-2025**			**1.6 CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**IPVO-017-2025**			
1.4 CONTRATISTA:				**1.7 INTERVENTOR:**				
1.5 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	DD	MM	AAAA	**1.8 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA**	DD	MM	AAAA	
	2	**7**	**2026**		**2**	**7**	**2026**	

1.9 OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.1 ESTADO DEL TIEMPO	**Lunes**	**Martes**	**Miércoles**	**Jueves**	**Viernes**	**Sábado**	**Domingo**	
	Nublado lluvias leves	Nublado lluvias leves	Nublado lluvias leves	Nublado	Nublado	Nublado	N/A	


2.2 DESCRIPCIÓN: *(Describir brevemente las actividades ejecutadas y localización).*

** Se realiza levantamiento topográfico de conformación de estructura de pavimento, materializando anchos de vías y niveles, mediante estacas testigos y chaflanes.*
** Se realiza extendido y compactación de base granular para conformación de estructura de pavimento K8+650 a K8+200*
** Se inicia excavación manual para conformación de cunetas.*

3. CONTROL DE PLAZOS Y AVANCE DE EJECUCIÓN

3.1 PLAZO CONTRATO DE OBRA	**10**	Meses	**3.3 PLAZO CONTRATO INTERVENTORÍA**	**10**	Meses
3.2 PLAZO TRANSCURRIDO	**8.26**	Meses	**3.4 PLAZO TRANSCURRIDO**	**8.26**	Meses

% PROGRAMADO DE OBRA	**54.95%**
% AVANCE DE OBRA	**48.50%**
% DE ATRASO	**6.45%**
% PLAZO TRANSCURRIDO OBRA	**82.57%**
% PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORÍA	**82.57%**

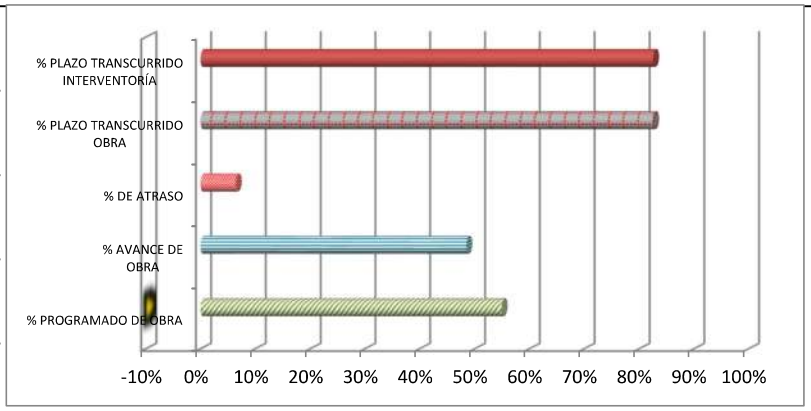

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO

4.1 OBSERVACIONES

En caso de posibles atrasos indique las causas y el responsable.

Se presenta un retraso leve de obra, respecto al avance programado, se solicita a contratista de obra mejorar los rendimientos para evitar mayores retrasos en obra, de igual manera se recomienda que se provea de suficiente material en obra, teniendo acopio de los diferentes materiales que se requieren según la programación de obra aprobada.

4.2 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

En caso de retrasos, por favor describir los compromisos, acciones correctivas y el tiempo previsto para subsanar.

1. Entrega de dotación a personal de obra.
2. Entrega de documentación requerida para seguimiento de la obra.
3. Seguimiento y control del SGSST.
4. Entrega de resultados de laboratorio de materiales usados en obra.
5. Entrega de caracterización de materiales granulares a usar en obra.
6. Seguimiento y control en la implementación del PAGA y PMT.
7. Entrega de certificados de afiliación del personal ingresado posterior a suscripción de acta de reinicio de obra y paz y salvos del personal retirado.
8. Entrega de informe mensual de abril con sus respectivos soportes.
9. Toma de densidades de compactación de base granular.

4.3 ACCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

Describir las acciones correctivas y preventivas por parte de la interventoría.

1. Solicitudes y requerimientos a contratista de entrega de información y documentación para verificación, seguimiento y control de obra.
2. Cumplimiento de personal en obra de acuerdo a dedicaciones ofertadas.
3. Revisión de documentación entregada por parte de contratista de obra y envío de concepto y observaciones a la misma.
4. Revisión de informes de contratista de obra y realización de informes semanales y mensuales de interventoría.
5. Seguimiento diario a obra de las diferentes actividades ejecutadas y lugares de obra.
6. Solicitud de entrega de documentación por parte de contratista.
7. Se realiza comité de obra #17, en compañía de supervisión de entidad contratante, equipos de contratista de obra e interventoría y delegados de la alcaldía municipal de Úmbita.

5. FIRMAS

x

Firma: _____

Nombre: JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

INTERVENTOR

Firma: _____

Nombre: CONSORCIO SISA 25
R/L JAIME ORLANDO GÓMEZ
CONTRATISTA

Nota: *Éste informe debe ser presentado al supervisor de interventoría, el primer día hábil de la semana. Adjuntar soportes y registros*

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción de la fotografía:
Excavación manual y replanteo para cunetas.



Descripción de la fotografía:
Extendida e instalación de base granular para estructura de pavimento.



Descripción de la fotografía:
Realización de comité de obra #17.



Descripción de la fotografía:
Paisajismo y contención de taludes activos en zonas de alcantarillas.

TIERRASUA ¡Conectamos región!	**INFORME DE AVANCE SEMANAL**	**38**

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 FECHA DE INFORME	19	5	2026	**1.2 SEMANA:** Del 11/05/2026 hasta 17/05/2026				
1.3 CONTRATO OBRA No.	IPO-001-2025			**1.6 CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	IPVO-017-2025			
1.4 CONTRATISTA:				**1.7 INTERVENTOR:**				
1.5 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	DD	MM	AAAA	**1.8 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA**	DD	MM	AAAA	
	2	7	2026		2	7	2026	

1.9 OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.1 ESTADO DEL TIEMPO	**Lunes**	**Martes**	**Miércoles**	**Jueves**	**Viernes**	**Sábado**	**Domingo**	
	Nublado	Nublado	Nublado	Nublado	Nublado	Nublado	N/A	


2.2 DESCRIPCIÓN: *(Describir brevemente las actividades ejecutadas y localización).*

** Se realiza levantamiento topográfico de conformación de estructura de pavimento, materializando anchos de vías y niveles, mediante estacas testigos y chaflanes.*
** Se realiza extendido y compactación de base granular para conformación de estructura de pavimento K8+200 a K7+800*
** Se continua excavación manual para conformación de cunetas.*

3. CONTROL DE PLAZOS Y AVANCE DE EJECUCIÓN

3.1 PLAZO CONTRATO DE OBRA	**10**	Meses	**3.3 PLAZO CONTRATO INTERVENTORÍA**	**10**	Meses
3.2 PLAZO TRANSCURRIDO	**8.49**	Meses	**3.4 PLAZO TRANSCURRIDO**	**8.49**	Meses

% PROGRAMADO DE OBRA	**59.79%**
% AVANCE DE OBRA	**53.00%**
% DE ATRASO	**6.79%**
% PLAZO TRANSCURRIDO OBRA	**84.87%**
% PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORÍA	**84.87%**

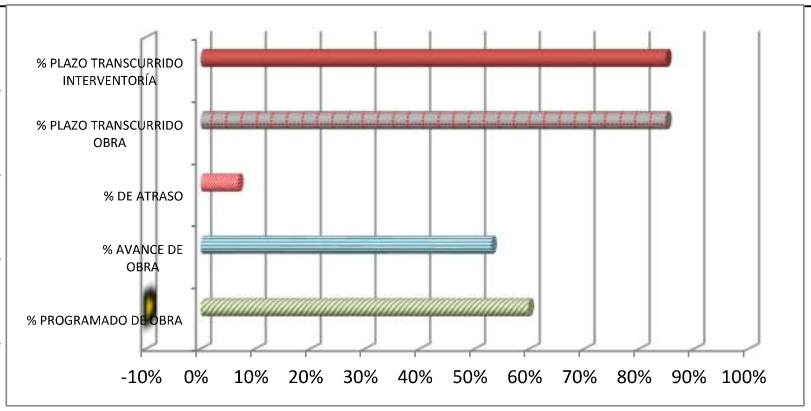

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO

4.1 OBSERVACIONES

En caso de posibles atrasos indique las causas y el responsable.

Se presenta un retraso leve de obra, respecto al avance programado, se solicita a contratista de obra mejorar los rendimientos para evitar mayores retrasos en obra, de igual manera se recomienda que se provea de suficiente material en obra, teniendo acopio de los diferentes materiales que se requieren según la programación de obra aprobada.

Se recomienda tomar acciones pertinentes por parte del contratista de obra, con el fin de evitar aumentar retrasos en la ejecución de obra y mejorar rendimientos en las actividades en ejecución.

4.2 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

En caso de retrasos, por favor describir los compromisos, acciones correctivas y el tiempo previsto para subsanar.

1. Entrega de dotación a personal de obra.
2. Entrega de documentación requerida para seguimiento de la obra.
3. Seguimiento y control del SGSST.
4. Entrega de resultados de laboratorio de materiales usados en obra.
5. Entrega de caracterización de materiales granulares a usar en obra.
6. Seguimiento y control en la implementación del PAGA y PMT.
7. Entrega de certificados de afiliación del personal ingresado posterior a suscripción de acta de reinicio de obra y paz y salvos del personal retirado.
8. Entrega de informe mensual de abril con sus respectivos soportes.
9. Toma de densidades de compactación de base granular.

4.3 ACCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

Describir las acciones correctivas y preventivas por parte de la interventoría.

1. Solicitudes y requerimientos a contratista de entrega de información y documentación para verificación, seguimiento y control de obra.
2. Cumplimiento de personal en obra de acuerdo a dedicaciones ofertadas.
3. Revisión de documentación entregada por parte de contratista de obra y envío de concepto y observaciones a la misma.
4. Revisión de informes de contratista de obra y realización de informes semanales y mensuales de interventoría.
5. Seguimiento diario a obra de las diferentes actividades ejecutadas y lugares de obra.
6. Solicitud de entrega de documentación por parte de contratista.

5. FIRMAS

x

Firma: _____

Nombre: JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ

INTERVENTOR

Firma: _____

Nombre: CONSORCIO SISA 25
R/L JAIME ORLANDO GÓMEZ
CONTRATISTA

Nota: *Éste informe debe ser presentado al supervisor de interventoría, el primer día hábil de la semana. Adjuntar soportes y registros*

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción de la fotografía:
Extendida e instalación de base granular para estructura de pavimento.



Descripción de la fotografía:
Instalación y compactación de granular para estructura de pavimento.



Descripción de la fotografía:
Extendida e instalación de base granular para estructura de pavimento.



Descripción de la fotografía:
Extendida e instalación de base granular para estructura de pavimento.

TIERRASUA ¡Conectamos región!	INFORME DE AVANCE SEMANAL	39

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 FECHA DE INFORME	25	5	2026	1.2 SEMANA: Del 18/05/2026 hasta 24/05/2026				
1.3 CONTRATO OBRA No.	IPO-001-2025			1.6 CONTRATO INTERVENTORÍA No.	IPVO-017-2025			
1.4 CONTRATISTA:				1.7 INTERVENTOR:				
1.5 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	DD	MM	AAAA	1.8 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	DD	MM	AAAA	
	2	7	2026		2	7	2026	

1.9 OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.1 ESTADO DEL TIEMPO	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
	N/A	Nublado	Nublado lluvias leves	Nublado	Nublado	Nublado	N/A


2.2 DESCRIPCIÓN: *(Describir brevemente las actividades ejecutadas y localización).*

** Se realiza levantamiento topográfico de conformación de estructura de pavimento, materializando anchos de vías y niveles, mediante estacas testigos y chaflanes.*
** Se realiza extendido y compactación de base granular para conformación de estructura de pavimento K7+800 a K7+660*
** Se continua excavación manual para conformación de cunetas.*
** Se realiza amarre e instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillo.*
** Se realiza encofrado para cunetas y bordillo y posterior fundida en concreto de 3000 PSI.*
** Se realiza reparación a compactación de subbase granular y estabilización de capa granular con el uso de cal y cemento para lograr compactación adecuada.*

3. CONTROL DE PLAZOS Y AVANCE DE EJECUCIÓN

3.1 PLAZO CONTRATO DE OBRA	10	Meses	3.3 PLAZO CONTRATO INTERVENTORÍA	10	Meses
3.2 PLAZO TRANSCURRIDO	8.72	Meses	3.4 PLAZO TRANSCURRIDO	8.72	Meses

% PROGRAMADO DE OBRA	67.76%
% AVANCE DE OBRA	55.00%
% DE ATRASO	12.76%
% PLAZO TRANSCURRIDO OBRA	87.17%
% PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORÍA	87.17%

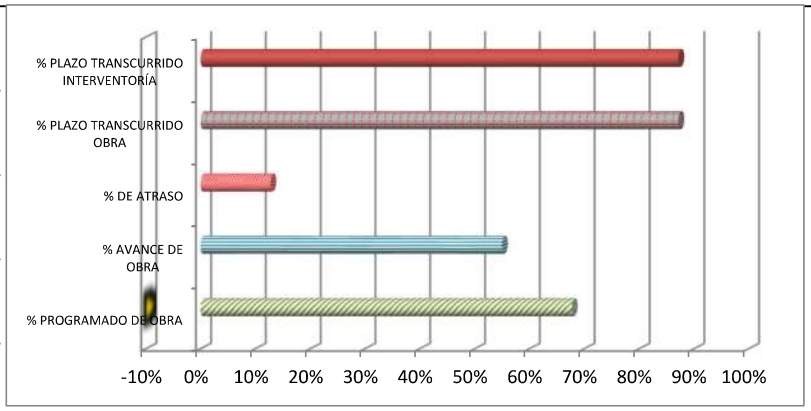

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO

4.1 OBSERVACIONES

En caso de posibles atrasos indique las causas y el responsable.

Se presenta un retraso leve de obra, respecto al avance programado, se solicita a contratista de obra mejorar los rendimientos para evitar mayores retrasos en obra, de igual manera se recomienda que se provea de suficiente material en obra, teniendo acopio de los diferentes materiales que se requieren según la programación de obra aprobada.

Se recomienda tomar acciones pertinentes por parte del contratista de obra, con el fin de evitar aumentar retrasos en la ejecución de obra y mejorar rendimientos en las actividades en ejecución.

4.2 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

En caso de retrasos, por favor describir los compromisos, acciones correctivas y el tiempo previsto para subsanar.

1. Entrega de dotación a personal de obra.
2. Entrega de documentación requerida para seguimiento de la obra.
3. Seguimiento y control del SGSST.
4. Entrega de resultados de laboratorio de materiales usados en obra.
5. Entrega de caracterización de materiales granulares a usar en obra.
6. Seguimiento y control en la implementación del PAGA y PMT.
7. Entrega de certificados de afiliación del personal ingresado posterior a suscripción de acta de reinicio de obra y paz y salvos del personal retirado.
8. Entrega de informe mensual de abril con sus respectivos soportes.
9. Toma de densidades de compactación de base granular.
10. Entrega de informes en los plazos establecidos.

4.3 ACCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

Describir las acciones correctivas y preventivas por parte de la interventoría.

1. Solicitudes y requerimientos a contratista de entrega de información y documentación para verificación, seguimiento y control de obra.
2. Cumplimiento de personal en obra de acuerdo a dedicaciones ofertadas.
3. Revisión de documentación entregada por parte de contratista de obra y envío de concepto y observaciones a la misma.
4. Revisión de informes de contratista de obra y realización de informes semanales y mensuales de interventoría.
5. Seguimiento diario a obra de las diferentes actividades ejecutadas y lugares de obra.
6. Solicitud de entrega de documentación por parte de contratista.
7. Se realiza comité técnico de obra #18, en compañía de equipo de contratista de obra.
8. Se realiza toma de densidades de compactación a la capa de base granular de la estructura de pavimento.

5. FIRMAS

x

Firma: _____

Nombre: JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ

INTERVENTOR

Firma: _____

Nombre: CONSORCIO SISA 25
R/L JAIME ORLANDO GÓMEZ
CONTRATISTA

Nota: *Éste informe debe ser presentado al supervisor de interventoría, el primer día hábil de la semana. Adjuntar soportes y registros*

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción de la fotografía:
Amarre e instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillos de vía.



Descripción de la fotografía:
Fundida de concreto para cunetas y bordillo de vía.



Descripción de la fotografía:
Toma de densidades de compactación de base granular.



Descripción de la fotografía:
Realización de pausa activa y actividades SST por interventoría.

TIERRASUA ¡Conectamos región!	**INFORME DE AVANCE SEMANAL**	**40**

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 FECHA DE INFORME	1	6	2026	**1.2 SEMANA:** Del 25/05/2026 hasta 31/05/2026				
1.3 CONTRATO OBRA No.	**IPO-001-2025**			**1.6 CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**IPVO-017-2025**			
1.4 CONTRATISTA:				**1.7 INTERVENTOR:**				
1.5 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	DD	MM	AAAA	**1.8 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA**	DD	MM	AAAA	
	2	**7**	**2026**		**2**	**7**	**2026**	

1.9 OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA UMBITA – PUENTE SISA DEL MUNICIPIO DE UMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.1 ESTADO DEL TIEMPO	**Lunes**	**Martes**	**Miércoles**	**Jueves**	**Viernes**	**Sábado**	**Domingo**
	N/A	Nublado	Nublado lluvias leves	Nublado	Nublado	Nublado	N/A


2.2 DESCRIPCIÓN: *(Describir brevemente las actividades ejecutadas y localización).*

** Se continua excavación manual para conformación de cunetas.*
** Se realiza amarre e instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillo.*
** Se realiza encofrado para cunetas y bordillo y posterior fundida en concreto de 3000 PSI.*
** Se realiza reparación a compactación de subbase granular y estabilización de capa granular con el uso de cal y cemento para lograr compactación adecuada.*
** Se realiza imprimación de emulsión asfáltica.*
** Se realiza extendida, instalación, compactación y sello de carpeta asfáltica.*

3. CONTROL DE PLAZOS Y AVANCE DE EJECUCIÓN

3.1 PLAZO CONTRATO DE OBRA	**10**	Meses	**3.3 PLAZO CONTRATO INTERVENTORÍA**	**10**	Meses
3.2 PLAZO TRANSCURRIDO	**8.95**	Meses	**3.4 PLAZO TRANSCURRIDO**	**8.95**	Meses

% PROGRAMADO DE OBRA	**78.84%**
% AVANCE DE OBRA	**65.91%**
% DE ATRASO	**12.93%**
% PLAZO TRANSCURRIDO OBRA	**89.47%**
% PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORÍA	**89.47%**

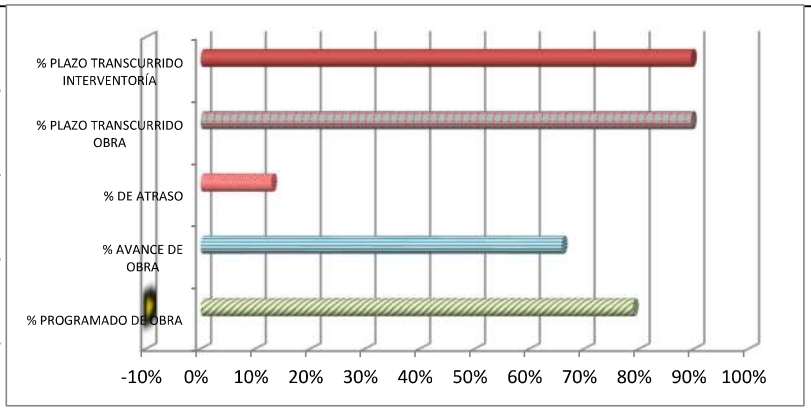

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO

4.1 OBSERVACIONES

En caso de posibles atrasos indique las causas y el responsable.

Se presenta un retraso leve de obra, respecto al avance programado, se solicita a contratista de obra mejorar los rendimientos para evitar mayores retrasos en obra, de igual manera se recomienda que se provea de suficiente material en obra, teniendo acopio de los diferentes materiales que se requieren según la programación de obra aprobada.

Se recomienda tomar acciones pertinentes por parte del contratista de obra, con el fin de evitar aumentar retrasos en la ejecución de obra y mejorar rendimientos en las actividades en ejecución.

4.2 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

En caso de retrasos, por favor describir los compromisos, acciones correctivas y el tiempo previsto para subsanar.

1. Entrega de dotación a personal de obra.
2. Entrega de documentación requerida para seguimiento de la obra.
3. Seguimiento y control del SGSST.
4. Entrega de resultados de laboratorio de materiales usados en obra.
5. Entrega de caracterización de materiales granulares a usar en obra.
6. Seguimiento y control en la implementación del PAGA y PMT.
7. Entrega de certificados de afiliación del personal ingresado posterior a suscripción de acta de reinicio de obra y paz y salvos del personal retirado.
8. Entrega de informe mensual de abril con sus respectivos soportes.
9. Toma de ensayos y laboratorios a la carpeta asfáltica.
10. Entrega de informes en los plazos establecidos.

4.3 ACCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

Describir las acciones correctivas y preventivas por parte de la interventoría.

1. Solicitudes y requerimientos a contratista de entrega de información y documentación para verificación, seguimiento y control de obra.
2. Cumplimiento de personal en obra de acuerdo a dedicaciones ofertadas.
3. Revisión de documentación entregada por parte de contratista de obra y envío de concepto y observaciones a la misma.
4. Revisión de informes de contratista de obra y realización de informes semanales y mensuales de interventoría.
5. Seguimiento diario a obra de las diferentes actividades ejecutadas y lugares de obra.
6. Solicitud de entrega de documentación por parte de contratista.
7. Se realiza toma de muestras y laboratorios al asfalto en obra, para verificación de calidad, seguimiento y control de obra.

x

5. FIRMAS

Firma: _____	**Firma: _____**
Nombre: JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ	**Nombre: CONSORCIO SISA 25**
	R/L JAIME ORLANDO GÓMEZ
INTERVENTOR	**CONTRATISTA**

Nota: *Éste informe debe ser presentado al supervisor de interventoría, el primer día hábil de la semana. Adjuntar soportes y registros*

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción de la fotografía:
Imprimación de emulsión asfáltica.



Descripción de la fotografía:
Extendida, instalación, compataación y sello de carpeta asfáltica.



Descripción de la fotografía:
Extendida, instalación, compactación y sello de carpeta asfáltica.



Descripción de la fotografía:
Extendida, instalación, compactación y sello de carpeta asfáltica.

CERTIFICADOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL INTERVENTORÍA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Señores:
TIERRASUA S.A.S
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

El suscrito, JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ, identificado con C.C. No 7.172.271 expedida en Tunja, en calidad de Director de interventoría de la firma empresa JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ, con NIT 7.172.271 - 2, y representada legalmente por JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ, certifico que la empresa JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ, se encuentran al día en pagos por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el Art 23 Decreto 1703 de 2002, Art 50 ley 789 de 2002, Art 1 ley 828 de 2003, Art. 23 ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y Decreto 723 de 2013.

Dada en Tunja al primer (01) días del mes de junio de 2026.

Atentamente,

ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTORÍA DE OBRA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA IPVO-017-2025

cc. TIERRASUA SAS / ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO R.
SUPERVISOR DELEGADO

cc. Archivo general.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172271		PINZON ALVAREZ JAIME HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Condominio El Lago Casa 41	TUNJA-BOYACA	7448924	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	285372630	9504377699	I	2026/05/20	2026/05/06	BANCOLOMBIA	0	$646,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7172271	PINZON ALVAREZ JAIME HUMBERTO	R																	230201	30	$1,823,500	$291,800	EPS037	30	$1,823,500	$228,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,823,500	$127,000	0	$0	$0	No	$646,800
Total	**Afiliados(1)**																					$1,823,500	$291,800			$1,823,500	$228,000			$0	$0			$1,823,500	$127,000		$0	$0		$646,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172271		PINZON ALVAREZ JAIME HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Condominio El Lago Casa 41	TUNJA-BOYACA	7448924	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	285372630	9504377699	I	2026/05/20	2026/05/06	BANCOLOMBIA	0	$646,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$291,800	$0	$0	$291,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$291,800	$0	$0	$291,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$127,000	$0	$0	$127,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$127,000	$0	$0	$127,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$228,000	$0	$0	$228,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$228,000	$0	$0	$228,000
TOTAL				1	$646,800	$0	$0	$646,800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	39724228
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA CLARA CACERES ESTUPINAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7411111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**5168540348**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/21		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996522574

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN									SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 39724228	CACERES ESTUPINAN MARIA CLARA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO	01																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$ 39724228	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ
IDENTIFICACIÓN:	NI-7172271
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-20
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37509686
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37509686
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	3	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 288.800	$ 290.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 70.100	$ 70.500
Subtotal Salud		2	4	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 358.900	$ 360.800
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 280.200	$ 281.700
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 4.400	$ 874.600	$ 879.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 280.200	$ 281.700
Subtotal Pensión		3	4	$ 0	$ 0	$ 7.400	$ 1.435.000	$ 1.442.400
14-11	890903790	ARL SURA	4	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 624.300	$ 627.500
Subtotal ARL		1	4	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 624.300	$ 627.500
CCF10	891800213	COMFABOY	4	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 358.900	$ 360.700
Subtotal CCF		1	4	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 358.900	$ 360.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 14.300	$ 2.777.100	$ 2.791.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/06/2026

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL DE OBRA EXPEDIDA POR INTERVENTORÍA

CERTIFICACIÓN DE PAGO SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Señores:
TIERRASUA S.A.S
ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR DESIGNADO

El suscrito, JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ, identificado con C.C. No 7.172.271 expedida en Tunja, en calidad de Director de interventoría de la firma empresa JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ, con NIT 7.172.271 - 2, y representada legalmente por JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ, certifico que CONSORCIO SISA 25, se encuentra a paz y salvo hasta el mes de abril de 2026 por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el Art 23 Decreto 1703 de 2002, Art 50 ley 789 de 2002, Art 1 ley 828 de 2003, Art. 23 ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y Decreto 723 de 2013.

Dada en Tunja al primer (01) días del mes de junio de 2026.

Atentamente,

ING. JAIME HUMBERTO PINZÓN ÁLVAREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTORÍA DE OBRA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA IPVO-017-2025

cc. TIERRASUA SAS / ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO R.
SUPERVISOR DELEGADO

cc. Archivo general.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-12, 01:07:22 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 85630210

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 12/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YOFRE LEONIDAS LOPEZ MERCHAN		
Documento	CC6773517	**Dirección**	CL 20 #18 - 82
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7400099
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TUNJA	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 6773517	YOFRE LEONIDAS LOPEZ MERCHAN	03	00																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 1.900	$ 501.000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901969390	5	CONSORCIO SISA 25	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 20 12 84	TUNJA-BOYACA	3118284350	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	302091245	9504619191	E	2026/05/25	2026/05/12	BANCOLOMBIA	0	$10,916,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1056612762	DIAZ HECTOR	X																	230301	23	$1,342,361	$214,800	EPS037	23	$1,342,361	$167,800	CCF10	23	$1,342,361	$53,700	14-23	23	$1,342,361	$93,500	23	$1,342,361	$67,200	No	$597,000
2	CC	6775637	GOMEZ JAIME																		25-14	30	$3,300,000	$528,000	EPS005	30	$3,300,000	$412,500	CCF10	30	$3,300,000	$132,000	14-23	30	$3,300,000	$229,700	30	$3,300,000	$165,000	No	$1,467,200
3	CC	79873842	GOMEZ JUAN		X																230201	8	$466,908	$74,800	EPS002	8	$466,908	$58,400	CCF10	8	$466,908	$18,700	14-23	8	$466,908	$32,500	8	$466,908	$23,500	No	$207,900
4	CC	1002682724	JUNCO LUZ																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$218,900	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
5	CC	1000974330	MARTINEZ CAMILO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
6	CC	1049618290	MEDINA NESTOR																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
7	CC	74329901	MENDOZA JOSE																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
8	CC	1033691318	MORENO HECTOR																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
9	CC	74329975	MORENO HOLMANT																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$218,900	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
10	CC	1056612181	PEDREROS MILTON																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$218,900	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
11	CC	1056612562	PLAZAS FLOR																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$218,900	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
12	CC	1056614050	RAMOS JOSE																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
13	CC	1007859149	SEPULVEDA JEIDERTH		X																230301	10	$583,635	$93,400	EPS041	10	$583,635	$73,000	CCF10	10	$583,635	$23,400	14-23	10	$583,635	$40,700	10	$583,635	$29,300	No	$259,800
14	CC	1056612577	SOLER NELSON	X																	230301	23	$1,342,361	$214,800	EPS041	23	$1,342,361	$167,800	CCF10	23	$1,342,361	$53,700	14-23	23	$1,342,361	$93,500	23	$1,342,361	$67,200	No	$597,000
15	CC	4291064	VALERO SALVADOR																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
Total	**Afiliados(15)**																						$24,544,315	$3,927,800			$24,544,315	$3,068,500			$24,544,315	$982,500			$24,544,315	$1,708,900		$24,544,315	$1,229,200		$10,916,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901969390	5	CONSORCIO SISA 25	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 20 12 84	TUNJA-BOYACA	3118284350	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	302091245	9504619191	E	2026/05/25	2026/05/12	BANCOLOMBIA	0	$10,916,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$3,927,800	$0	$0	$3,927,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$560,400	$0	$0	$560,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$808,200	$0	$0	$808,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,924,000	$0	$0	$1,924,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$635,200	$0	$0	$635,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,708,900	$0	$0	$1,708,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	15	$1,708,900	$0	$0	$1,708,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$982,500	$0	$0	$982,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	$982,500	$0	$0	$982,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	$3,068,500	$0	$0	$3,068,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$437,800	$0	$0	$437,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$605,600	$0	$0	$605,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$1,116,400	$0	$0	$1,116,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$58,400	$0	$0	$58,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$631,400	$0	$0	$631,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$737,300	$0	$0	$737,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	15	$737,300	$0	$0	$737,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$491,900	$0	$0	$491,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	15	$491,900	$0	$0	$491,900
TOTAL				15	$10,916,900	$0	$0	$10,916,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52797064		MAHECHA VALERO ELIZABETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 58D #1A-27Este	TUNJA-BOYACA	7428006	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	293105858	9504530336	I	2026/05/19	2026/05/08	NEQUI	0	$166,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$583,635	$93,400			$583,635	$73,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		**$166,400**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$583,635	$93,400			$583,635	$73,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		**$166,400**
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																					$583,635	$93,400			$583,635	$73,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		**$166,400**
1	CC	52797064	MAHECHA ELIZABETH	X	X														25-14	10	$583,635	$93,400	EPS005	10	$583,635	$73,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$166,400
Total	**Afiliados(1)**																				$583,635	$93,400			$583,635	$73,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$166,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$93,400	$0	$0	$93,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$93,400	$0	$0	$93,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$73,000	$0	$0	$73,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$73,000	$0	$0	$73,000
TOTAL				1	$166,400	$0	$0	$166,400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049621129
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			HUGO MAURICIO SUAREZ RINCON
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	3111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6016845698**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		2			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		303637060

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 219.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 219.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 42.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 42.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 541.800**
VALOR MORA:	**$ 1.000**
TOTAL PAGADO:	**$ 542.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1054708889
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIEGO ALEXNADER CASTANEDA ARANGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 26 N 25 35	TELÉFONO:	3322336
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4652416523**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril	AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996672764

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 121.900	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 121.900
SUBTOTALES:									**$ 121.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 121.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																												PENSIÓN									SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1054708889	CASTANEDA ARANGO DIEGO ALEXANDER	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	105470888	$ 121.900	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 621.000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1054708889
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIEGO ALEXNADER CASTANEDA ARANGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 26 N 25 35	TELÉFONO:	3322336
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4651056345			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9996673840

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 70.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 121.900	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 121.900
SUBTOTALES:									**$ 121.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 121.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 70.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																													PENSIÓN							SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1002565586	CANTE TORRES JULIAN ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	105470888	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 542.300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049644228		CRISTIAN FABIAN ROJAS RODRIGUEZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CRISTIAN ROJAS	CALLE 7 # 13 12	TUNJA-BOYACA	3134814561	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	283144176	9504317356	E	2026/05/08	2026/05/05	BANCOLOMBIA	0	$5,441,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CRISTIAN ROJAS (14 Afiliados)																								$18,559,594	$2,970,300			$18,559,594	$743,300			$18,557,110	$743,300			$18,559,594		$984,500		$0	$0		$5,441,400
Centro de Trabajo: OPERARIOS (6 Afiliados)																								$6,770,167	$1,083,600			$6,770,167	$271,200			$6,769,303	$271,200			$6,770,167		$471,400		$0	$0		$2,097,400
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (6 Afiliados)																								$6,770,167	$1,083,600			$6,770,167	$271,200			$6,769,303	$271,200			$6,770,167		$471,400		$0	$0		$2,097,400
1	CC	7171652	CONTRERAS ANGEL																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
2	CC	1056708594	CRUZ HECTOR	X																		230301	24	$1,400,724	$224,200	EPS037	24	$1,400,724	$56,100	CCF10	24	$1,400,724	$56,100	14-4	24	$1,400,724	6.960%	$97,500	24	$0	$0	Si	$433,900
3	CC	1049641192	FONSECA JHON																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,095	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
4	CC	1049621000	LOPEZ CARLOS		X																	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,337	$2,400	14-4	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
5	CC	1049641901	MOLINA JULIAN		X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
6	CC	1055227559	TENJO FABIO		X																	231001	1	$58,364	$9,400	EPS017	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,337	$2,400	14-4	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
Centro de Trabajo: TRASPORTE (8 Afiliados)																								$11,789,427	$1,886,700			$11,789,427	$472,100			$11,787,807	$472,100			$11,789,427		$513,100		$0	$0		$3,344,000
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (8 Afiliados)																								$11,789,427	$1,886,700			$11,789,427	$472,100			$11,787,807	$472,100			$11,789,427		$513,100		$0	$0		$3,344,000
7	CC	7170836	AMAYA JIMMY																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,095	$70,100	14-4	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
8	CC	1049627759	AMAYA JUAN																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
9	CC	7188315	CASTIBLANCO NESTOR																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
10	CC	7180434	CASTIBLANCO OSCAR	X																		25-14	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF10	4	$233,454	$9,400	14-4	4	$233,454	4.350%	$10,200	4	$0	$0	Si	$66,400
11	CC	7178212	GONZALEZ OMAR																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,095	$70,100	14-4	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
12	CC	1051241150	NIÑO JUAN	X																		230301	18	$1,050,543	$168,100	EPS037	18	$1,050,543	$42,100	CCF10	18	$1,050,543	$42,100	14-4	18	$1,050,543	4.350%	$45,700	18	$0	$0	Si	$298,000
13	CC	7165670	PULIDO JAIRO																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
14	CC	7183569	RODRIGUEZ JOSE																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
Total			**Afiliados(14)**																					$18,559,594	$2,970,300			$18,559,594	$743,300			$18,557,110	$743,300			$18,559,594		$984,500		$0	$0		$5,441,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$2,970,300	$0	$0	$2,970,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$887,400	$0	$0	$887,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,793,300	$0	$0	$1,793,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$984,500	$0	$0	$984,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	14	$984,500	$0	$0	$984,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$743,300	$0	$0	$743,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	14	$743,300	$0	$0	$743,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				14	$743,300	$0	$0	$743,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$72,500	$0	$0	$72,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$317,900	$0	$0	$317,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$212,700	$0	$0	$212,700
TOTAL				**14**	**$5,441,400**	**$0**	**$0**	**$5,441,400**

SuAporte | factura

Fecha creación reporte: 2026-04-13, 11:00:08 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 83737689

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

Fecha limite de pago: 2026-04-10

PAGADA 14/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HECTOR DELFIN MOLINA MOLINA				
Documento	CC7163340	**Dirección**	CR 2E #20 - 04		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3118483415		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	TUNJA	**Departamento**	BOYACA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC40023788	OLGA JANNETH MENDOZA SILVA	57	00																0	30	30	30	0	PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	AMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 76.200	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$	$	$ 218.900	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$	$	$ 575.300	$	$ 575.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
