


Id	Items	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**ZIPAQUIRA**	**406 días**	**vie 5/09/25**	**mié 5/05/27**
4		**ESTRUCTURA**	**337 días**	**mar 21/10/25**	**mar 9/03/27**
5		**GENERALES**	**153 días**	**mar 21/10/25**	**vie 5/06/26**
10		**CIMENTACION**	**312 días**	**jue 27/11/25**	**mar 9/03/27**
11		**PUNTO FIJO**	**186 días**	**lun 15/12/25**	**vie 18/09/26**
24		**EDIFICIO**	**312 días**	**jue 27/11/25**	**mar 9/03/27**
47		**PLATAFORMA**	**69 días**	**vie 27/03/26**	**vie 10/07/26**
54		**ESTRUCTURA**	**292 días**	**lun 29/12/25**	**mar 9/03/27**
55		**PUNTO FIJO**	**240 días**	**lun 29/12/25**	**mar 22/12/2**
66		**EDIFICIO**	**202 días**	**mar 12/05/26**	**mar 9/03/27**
79		**TANQUE**	**35 días**	**vie 19/06/26**	**mar 11/08/2**
83		**DESARENADOR**	**29 días**	**mié 26/08/26**	**lun 5/10/26**
91	**2**	**ARQUITECTURA**	**184 días**	**mié 5/08/26**	**mié 5/05/27**
92		**MAMPOSTERIA**	**82 días**	**mar 8/09/26**	**jue 7/01/27**
105		**DRYWALL**	**37 días**	**mar 8/09/26**	**jue 29/10/26**
109		**PINTURA**	**83 días**	**vie 6/11/26**	**mar 9/03/27**
112		**ENCHAPE**	**20 días**	**mar 22/09/26**	**mar 20/10/2**
114		**APARATOS SANITARIOS**	**37 días**	**mié 10/03/27**	**mar 4/05/27**
123		**PISOS**	**183 días**	**mié 5/08/26**	**mar 4/05/27**
132		**VENTANERIA**	**98 días**	**lun 9/11/26**	**lun 5/04/27**
143		**CARPINTERIA METALICA**	**75 días**	**mar 17/11/26**	**vie 5/03/27**
148		**ESPECIALES**	**25 días**	**mar 23/03/27**	**mié 28/04/27**
164		**SEÑALIZACION**	**5 días**	**jue 29/04/27**	**mié 5/05/27**
166		**PUERTAS**	**40 días**	**lun 22/02/27**	**mié 21/04/27**

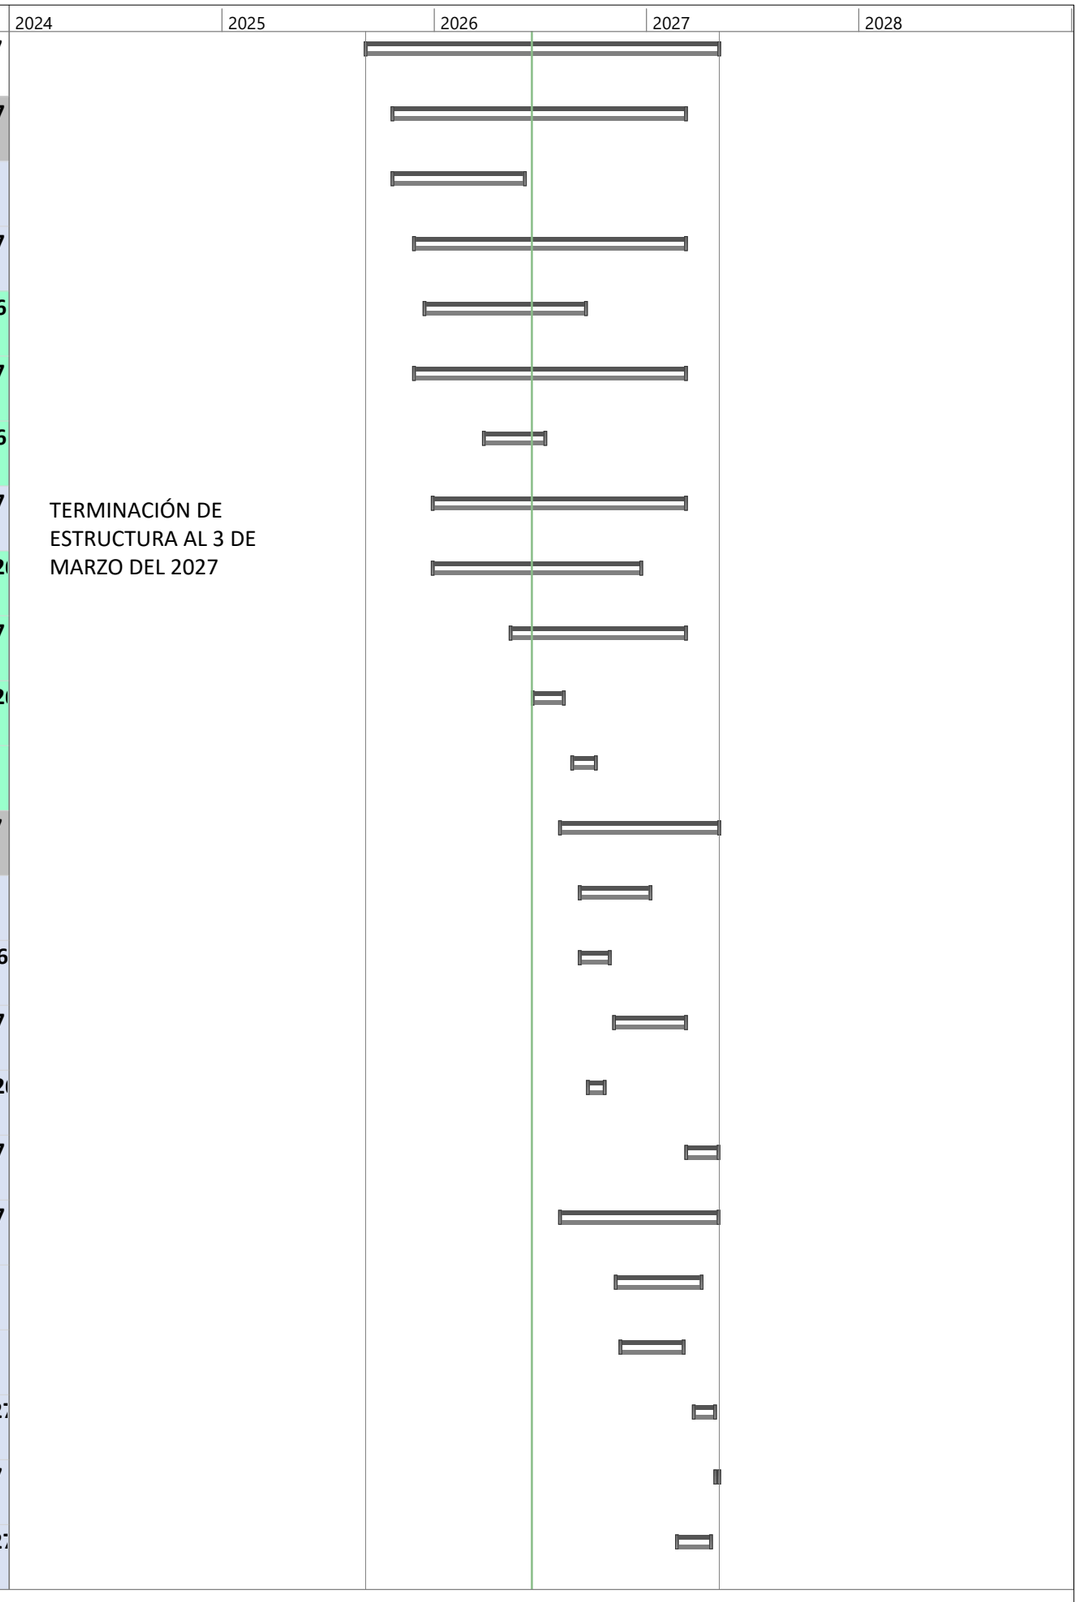

Id	Items	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
178		**CUBIERTA**	**25 días**	**jue 1/04/27**	**mié 5/05/27**
184		**SUELOS**	**25 días**	**jue 1/04/27**	**mié 5/05/27**
190	**3**	**DETECCION DE INCENDIOS**	**45 días**	**lun 18/01/27**	**vie 19/03/27**
207	**4**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**285 días**	**mié 4/03/26**	**mié 5/05/27**
208		**EQUIPOS**	**80 días**	**vie 8/01/27**	**mié 5/05/27**
235		**CANALIZACIONES**	**98 días**	**jue 24/09/26**	**mié 17/02/27**
248		**CABLEADO**	**123 días**	**jue 24/09/26**	**lun 29/03/27**
259		**SALIDAS INTERNAS**	**80 días**	**vie 8/01/27**	**mié 5/05/27**
268		**HVAC**	**30 días**	**vie 8/01/27**	**vie 19/02/27**
280		**MEDIA TENSION**	**20 días**	**mié 4/03/26**	**mié 1/04/26**
286		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA**	**20 días**	**lun 6/04/26**	**lun 4/05/26**
293		**SISTEMA DE APANTALLAMIENTO**	**20 días**	**mar 23/03/27**	**mié 21/04/27**
304	**5**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**254 días**	**mié 21/01/26**	**jue 4/02/27**
305		**RED HIDRAULICA**	**254 días**	**mié 21/01/26**	**jue 4/02/27**
330		**RED DE AGUAS SANITARIAS**	**193 días**	**lun 6/04/26**	**mié 20/01/27**
348		**RED DE AGUAS LLUVIAS**	**180 días**	**lun 6/04/26**	**mié 30/12/26**
370		**SISTEMA CONTRA INCENDIO**	**93 días**	**lun 14/09/26**	**vie 29/01/27**
403	**6**	**ILUMINACION**	**33 días**	**mié 17/02/27**	**mié 7/04/27**
424	**7**	**MECANICO**	**74 días**	**vie 8/01/27**	**mar 27/04/27**
425		**FANCOIL DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO CASSETE 4 VÍAS**	**74 días**	**vie 8/01/27**	**mar 27/04/27**
430		**FANCOIL DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO DUCTO DE ALTA ESTATICA**	**74 días**	**vie 8/01/27**	**mar 27/04/27**
433		**FANCOIL DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO PARED**	**74 días**	**vie 8/01/27**	**mar 27/04/27**
435		**INTERCAMBIADOR RECUPERADOR DE CALOR DE REFRIGERANTE VARIABLE**	**74 días**	**vie 8/01/27**	**mar 27/04/27**
440		**TABLEROS DE CONTROL**	**74 días**	**vie 8/01/27**	**mar 27/04/27**

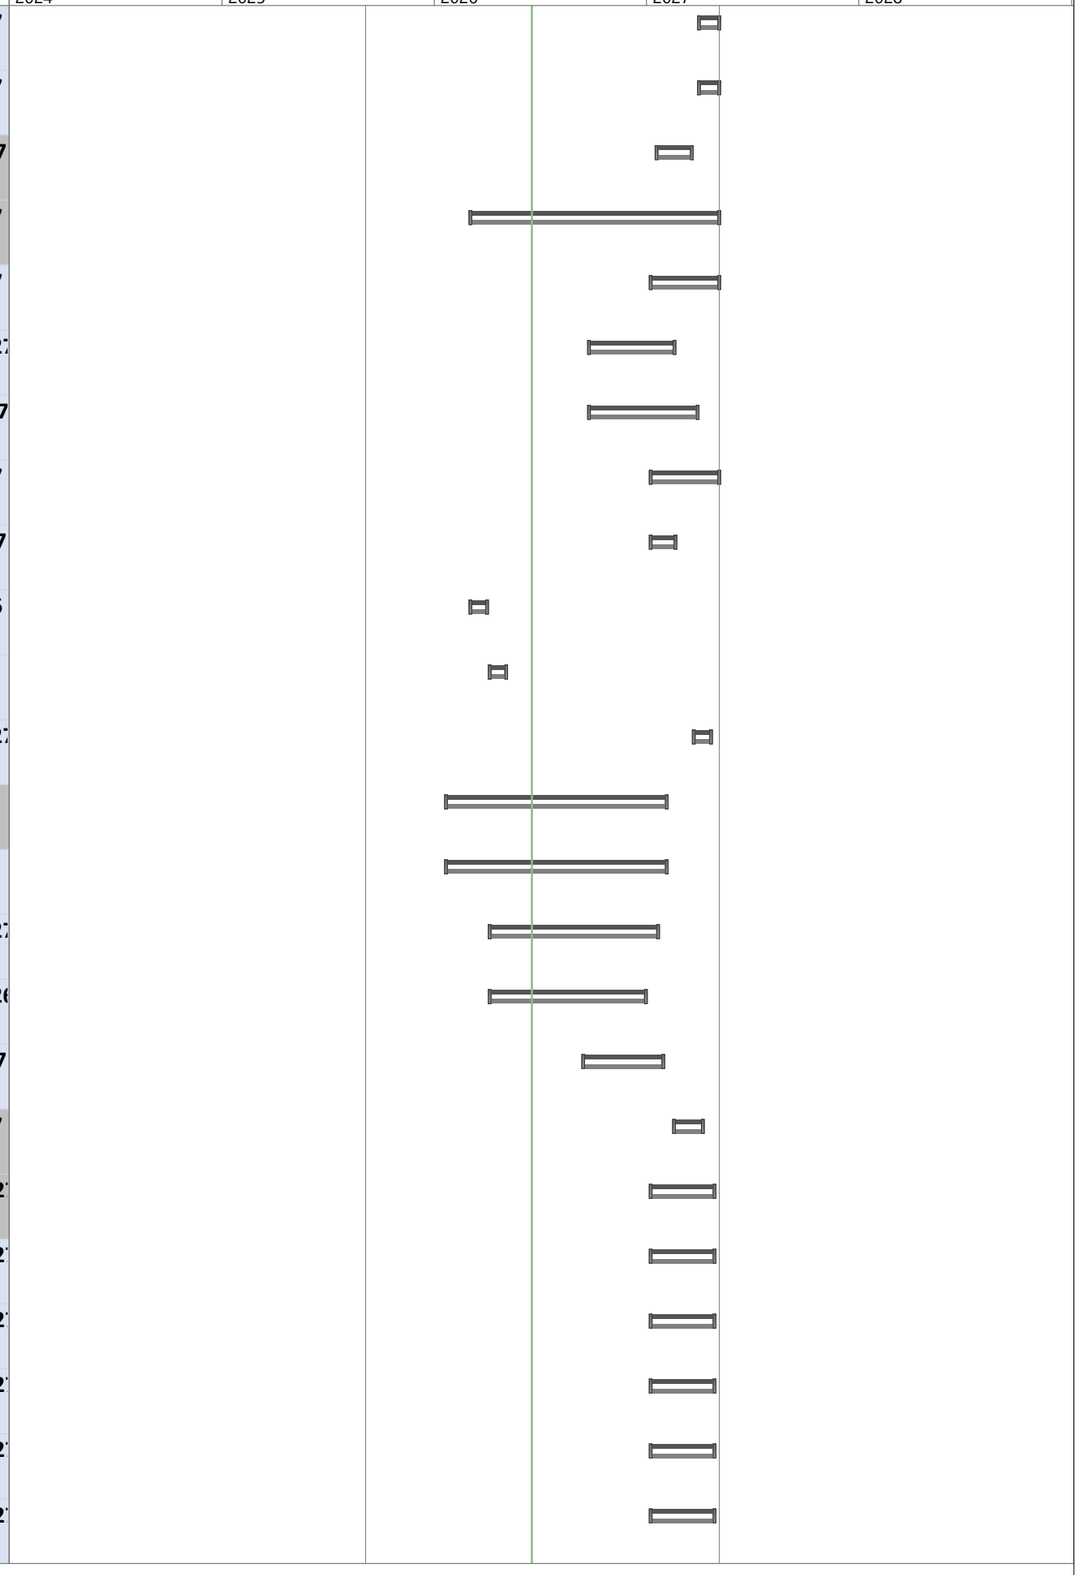

Id	Items	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
442		**TABLEROS DE FUERZA**	**74 días**	**vie 8/01/27**	**mar 27/04/2**
449		**UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL**	**74 días**	**vie 8/01/27**	**mar 27/04/2**
453		**UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO VERTICAL RECU**	**74 días**	**vie 8/01/27**	**mar 27/04/2**
457		**UNIDAD DE VENTILACION DE EXTRACCIÓN DE AIRE**	**74 días**	**vie 8/01/27**	**mar 27/04/2**
459		**UNIDAD DE VENTILACION DE SUMINISTRO DE AIRE**	**74 días**	**vie 8/01/27**	**mar 27/04/2**
462		**VENTILADOR DE IMPULSION TIPO JET**	**74 días**	**vie 8/01/27**	**mar 27/04/2**
464		**UNIDAD DE VENTILACION DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO**	**74 días**	**vie 8/01/27**	**mar 27/04/2**
466		**RED DE CONDUCTOS DE AIRE**	**74 días**	**vie 8/01/27**	**mar 27/04/2**
468		**DIFUSOR DE TECHO CON ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE**	**74 días**	**vie 8/01/27**	**mar 27/04/2**
475		**PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE**	**74 días**	**vie 8/01/27**	**mar 27/04/2**
477		**PERSIANA DE TOMA DE AIRE**	**74 días**	**vie 8/01/27**	**mar 27/04/2**
480		**REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBOS**	**74 días**	**vie 8/01/27**	**mar 27/04/2**
486		**TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN**	**74 días**	**vie 8/01/27**	**mar 27/04/2**
498		**ACCESORIOS TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN**	**74 días**	**vie 8/01/27**	**mar 27/04/2**
508		**SISTEMA DE CONTROL**	**74 días**	**vie 8/01/27**	**mar 27/04/2**
513	**8**	**PAISAJISMO**	**95 días**	**mié 16/12/26**	**mié 5/05/27**
514		**PISOS**	**95 días**	**mié 16/12/26**	**mié 5/05/27**
532		**MOBILIARIO**	**25 días**	**jue 28/01/27**	**mié 3/03/27**
537		**PAISAJISMO**	**20 días**	**lun 5/04/27**	**vie 30/04/27**
550		**PAISAJISMO CUBIERTA**	**23 días**	**lun 5/04/27**	**mié 5/05/27**
556	**9**	**CCTV**	**45 días**	**lun 1/03/27**	**mié 5/05/27**
561	**10**	**SYC**	**45 días**	**lun 1/03/27**	**mié 5/05/27**
576	**11**	**DOMOTICA**	**37 días**	**mié 9/12/26**	**mar 2/02/27**
577		**BMS**	**37 días**	**mié 9/12/26**	**mar 2/02/27**

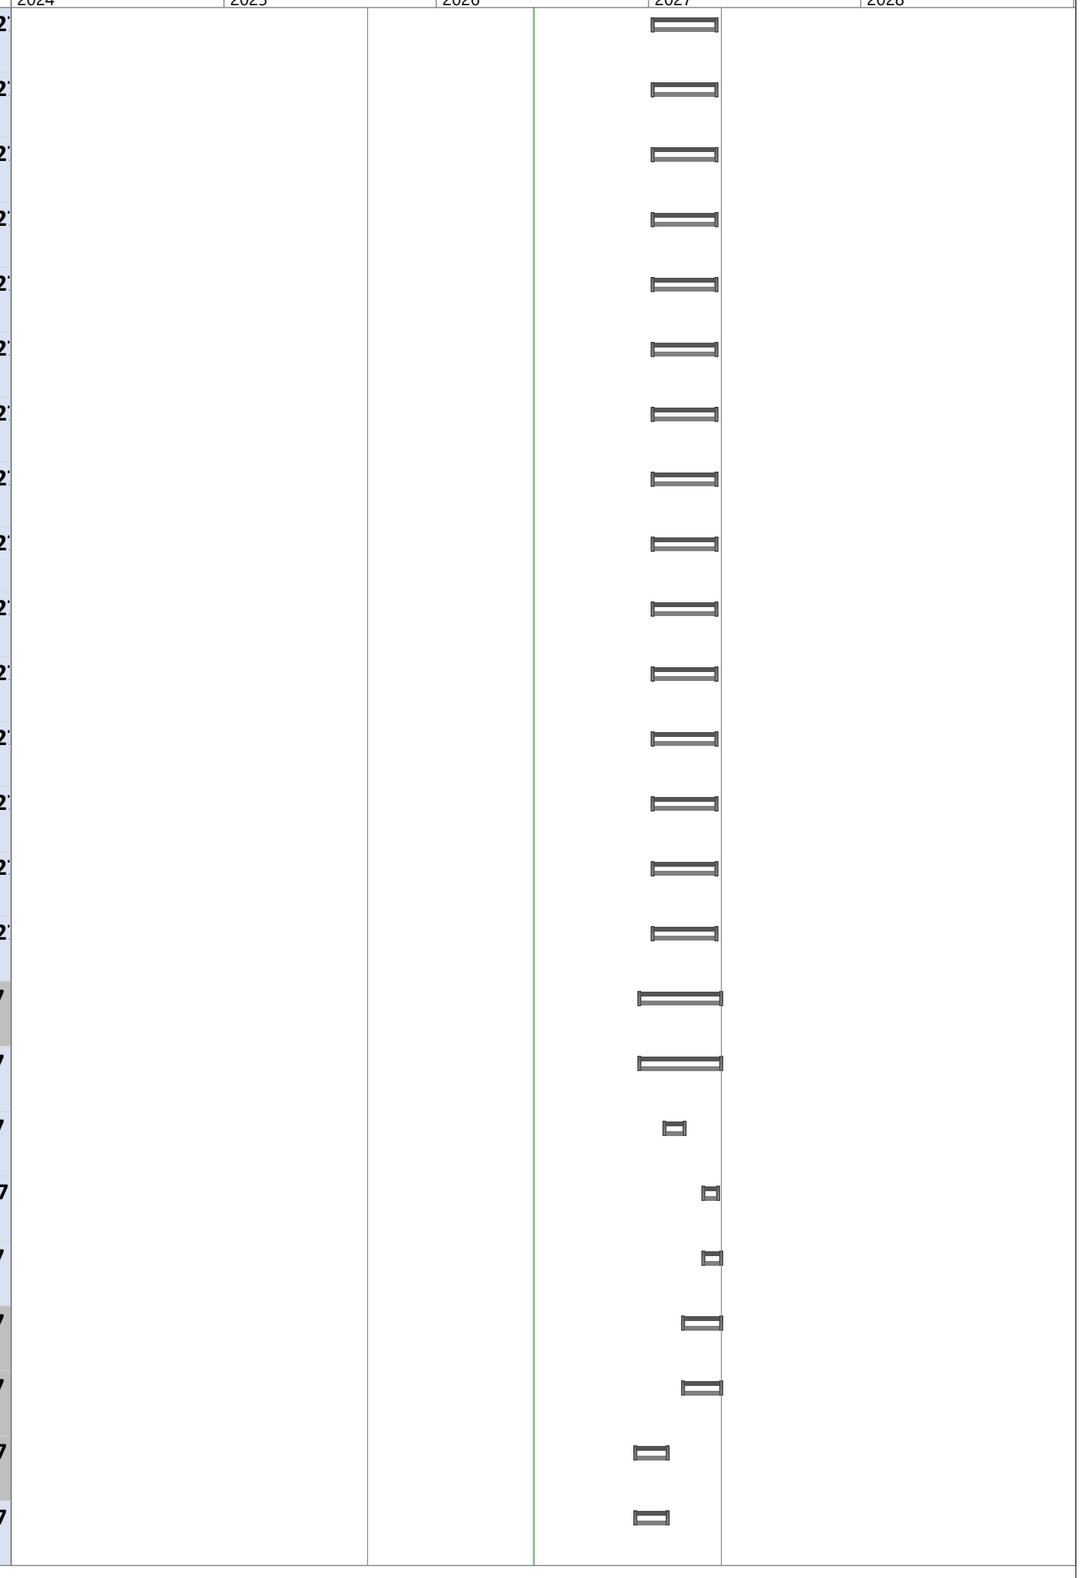

Id	Items	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
597	**12**	**TELEMATICA**	**131 días**	**mié 21/10/26**	**mar 4/05/27**
598		**TR2-MDA-P1-ZIPA**	**66 días**	**vie 23/10/26**	**lun 1/02/27**
616		**TR2-SERVIDORES-P1**	**37 días**	**mié 9/12/26**	**mar 2/02/27**
628		**TR1-P1**	**16 días**	**lun 25/01/27**	**lun 15/02/27**
644		**TR1-P2**	**12 días**	**mar 16/02/27**	**mié 3/03/27**
660		**TR1-P3**	**12 días**	**mar 2/03/27**	**mié 17/03/27**
678		**TR1-P4**	**12 días**	**mar 16/03/27**	**lun 5/04/27**
695		**PUNTO DE DATOS**	**41 días**	**mié 21/10/26**	**lun 21/12/26**
712		**AUDIO Y SONIDO SALA TIPO A**	**37 días**	**mié 10/03/27**	**mar 4/05/27**
741		**AUDIO Y SONIDO SALA TIPO B**	**27.01 días**	**mié 24/03/27**	**mar 4/05/27**
773		**AUDITORIO**	**41 días**	**mar 2/03/27**	**vie 30/04/27**
804		**AUDIO GENERAL**	**37 días**	**mar 9/03/27**	**lun 3/05/27**
817		**CUARTO DE CONTROL**	**30 días**	**vie 19/03/27**	**mar 4/05/27**
824	**13**	**TRANSPORTE VERTICAL**	**100 días**	**jue 3/12/26**	**vie 30/04/27**
827		**MOBILIARIO**	**122 días**	**mié 4/11/26**	**mar 4/05/27**
828	**14**	**MOBILIARIO**	**108 días**	**mié 4/11/26**	**mié 14/04/27**
844	**15**	**DOMOTICA**	**8 días**	**lun 5/04/27**	**mié 14/04/27**
848	**16**	**TELEMATICA**	**8 días**	**lun 5/04/27**	**mié 14/04/27**
863	**18**	**INTELIGENCIA ARTIFICIAL**	**12 días**	**mar 30/03/27**	**mié 14/04/27**
864		**Dotación espacial para cada centro**	**12 días**	**mar 30/03/27**	**mié 14/04/27**
875	**19**	**LEED-EDGE Y COMISIONAMIENTO**	**26 días**	**mar 30/03/27**	**mar 4/05/27**
879	**20**	**EVENTO**	**1 día**	**jue 2/10/25**	**jue 2/10/25**
881		**ÍTEMS NO PREVISTOS**	**305 días**	**jue 18/12/25**	**jue 18/03/27**
903		**GESTIÓN Y TRAMITES PARA CONEXIONES DEFINITIVAS**	64 días	lun 1/02/27	mié 5/05/27

