INFORME N°: 2	**PERÍODO DEL INFORME**
FECHA: Abril de 2026	**DESDE: 01 / 03 / 2026 HASTA 31 / 03/ 2026**



1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Se describe a continuación la información básica general de los proyectos de los que se derivan los contratos de obra e interventoría abajo relacionados:

BPIN del proyecto	**2025002200041**
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Valor total del proyecto	$35.057.712.170,48

Valor del proyecto antes de Interventoría	$32.764.216.981.,76
Valor de la Interventoría	$2.293.495.188,72
Fuente de financiación	ASIGNACIONES DIRECTAS GOBERNACION DEL CESAR VIGENCIAS 2025-2026-2027
BPIN del proyecto	**2025002200042**
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Valor total del proyecto	$ 158.035.764.933,00
Valor del proyecto antes de Interventoría	$ 147.696.976.572,44
Valor de la Interventoría	$ 10.338.788.360,56
Fuente de financiación	ASIGNACIONES DIRECTAS-ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL 60%-DEPARTAMENTO DEL CESAR.
Objetivo general del proyecto	• Mejorar el tránsito vehicular y peatonal en la zona urbana del Municipio de Valledupar. • Mejorar la intercomunicación terrestre en vías rurales de la subregión norte del Departamento del Cesar.
Producto (s) por entregar con el proyecto	• Vía urbana mejorada 14,62 kmts. • Vía secundaria mejorada – meta 23,94 kmts • Vía terciaria mejorada – meta 18,19 kmts

PROYECTO	LONGITUD KMTS	BPIN
MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	**11,659**	**2025002200042**
VIA VALLEDUPAR - LA TRAMACUA - LA MESA	**12,28**	
VIA LA MESA - EL MAMON	**6,135**	
VIA LA MESA - EL PALMAR	**12,049**	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	**14,62**	**2025002200041**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Modalidad de contratación	LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA
No. de proceso de selección	LOP-SIN-0006-2025
No. de contrato	2026040001
Objeto	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Contratante	GOBERNACIÓN DEL CESAR
Contratista	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE (Conformada por CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN S.A.S. con el 1% de participación, VIARIA S.A.S. con el 1% de participación, FEAE S.A.S. con el 10% de participación y por TRIADA INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S ZOMAC con el 88% de participación).
NIT	902022182-9
Representante legal	ALI ENRIQUE TAPIA ROYERO
Identificación.	77.187.121 de Valledupar
Valor inicial del contrato	$ 177.831.305.449,00 INCLUIDO AIU
Valor anticipo del contrato	$ 71.132.522.179,60
Valor adicional 01 del contrato	$ 0,00
Valor adicional 02 del contrato	$ 0,00
Valor actualizado del contrato	$ 177.831.305.449,00
Fecha de inicio	10 DE FEBERERO DE 2026
Fecha de suspensión No. 001	
Fecha de reinicio No. 001	
Fecha de suspensión No. 002	
Fecha de reinicio No. 002	
Fecha de terminación inicial	9 DE AGOSTO 2027
Fecha de terminación actualizada	
Plazo inicial del contrato	18 MESES
Prorroga 1	

Prorroga 2	
Plazo del actualizado del contrato	
Secretario de infraestructura	JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA
Supervisor técnico	SAID LOZANO LOZANO
Supervisor social	SADINA SOTO BONILLA
Supervisor sst	PAULA SUAREZ ROJAS
Supervisor ambiental	MARÍA JOSÉ RAMOS

3. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Modalidad de contratación	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
No. de proceso de selección	CMA-SIN-0004-2025
No. de contrato	2026050004
Objeto	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
Contratante	GOBERNACIÓN DEL CESAR
Contratista	CONSORCIO INTERNORTE PC. (conformado por CONSULTORIAS ASESORIAS Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A.S con el 90% de participación y por PROYECTOS Y GESTION AVANZADA DE INTERVENTORIAS S.A.S. con el 10% de participación)
NIT	902028286-3
Representante legal	DANIELA MARIA GRANADOS MIRANDA
Identificación.	1.083.025.371 de Santa Marta
Valor inicial del contrato	$ 12.632.283.517,00 INCLUIDO IVA
Valor anticipo del contrato	$5.052.913.406,8
Valor adicional 01 del contrato	$ 0,00
Valor adicional 02 del contrato	$ 0,00
Valor actualizado del contrato	$ 12.632.283.517,00 INCLUIDO IVA

Fecha de inicio	10 DE FEBERERO DE 2026
Fecha de suspensión No. 001	
Fecha de reinicio No. 001	
Fecha de suspensión No. 002	
Fecha de reinicio No. 002	
Fecha de terminación inicial	9 DE AGOSTO 2027
Fecha de terminación actualizada	
Plazo inicial del contrato	18 MESES
Prorroga 1	
Prorroga 2	
Plazo del actualizado del contrato	
Secretario de infraestructura	JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA
Supervisor técnico	SAID LOZANO LOZANO
Supervisor social	SADINA SOTO BONILLA
Supervisor sst	PAULA SUAREZ ROJAS
Supervisor ambiental	MARÍA JOSÉ RAMOS

CONTROL DE POLIZAS Y GARANTÍAS

(se relacionan los datos de las pólizas actualizadas del contrato).

POLIZAS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Casa aseguradora		**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. FECHA EXP. 21-01-2026**		
NÚMERO DE POLIZAS	**AMPARO**	**VALOR ($)**	**DESDE**	**HASTA**
CG-1071640	CUMPLIMIENTO	$ 53.349.391.634,70	08/01/2026	08/11/2027
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$ 71.132.522.179,60	08/01/2026	08/11/2027
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 8.891.565.272,45	08/01/2026	08/07/2030
	ESTABILIDAD DE OBRA	$ 53.349.391.634,70	08/07/2027	08/07/2032

CG-1017804	RESP. CIVIL EXT. CONT.	$ 8.891.565.272,45	08/01/2026	08/07/2027

POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO

Casa aseguradora		**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. FECHA EXP. 03-03-2026**		
NÚMERO DE POLIZAS	**AMPARO**	**VALOR ($)**	**DESDE**	**HASTA**
CG-1071640 ANEXO 2	CUMPLIMIENTO	$ 53.349.391.634,70	10/02/2026	11/12/2027
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$ 71.132.522.179,60	10/02/2026	11/12/2027
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 8.891.565.272,45	10/02/2026	10/08/2030
	ESTABILIDAD DE OBRA	$ 53.349.391.634,70	10/08/2027	10/08/2032
CG-1017804 ANEXO 2	RESP. CIVIL EXT. CONT.	$ 8.891.565.272,45	10/02/2026	10/08/2027

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRACTUALES O LEGALIZACION

Casa aseguradora		**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. FECHA EXP. 29-01-2026**		
NÚMERO DE POLIZAS	**AMPARO**	**VALOR ($)**	**DESDE**	**HASTA**
CG-1073004	CUMPLIMIENTO	$ 1.263.228.351,7	29/01/2026	29/11/2027
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$ 5.052.913.406,8	29/01/2026	29/11/2027
	PRESTACIONES SOCIALES	$ 1.263.228.351,7	29/01/2026	29/07/2030
	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 3.789.685.055,10	29/07/2027	29/07/2032

ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO

Casa aseguradora		**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. FECHA EXP. 29-01-2026**		
NÚMERO DE POLIZAS	**AMPARO**	**VALOR ($)**	**DESDE**	**HASTA**

CG-1073004	CUMPLIMIENTO	$ 1.263.228.351,7	29/01/2026	29/11/2027
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$ 5.052.913.406,8	29/01/2026	29/11/2027
	PRESTACIONES SOCIALES	$ 1.263.228.351,7	29/01/2026	29/07/2030
	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 3.789.685.055,10	29/07/2027	29/07/2032

4. CONTROL FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP					
N°	39025	VALOR	$ 32.764.216.981,76	FECHA	2 DE DICIEMBRE DE 2025
N°	39625	VALOR	$ 147.696.976.572,44	FECHA	2 DE DICIEMBRE DE 2025
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP					
N°	1884	VALOR	$ 106.297.542.322,53	FECHA	9 DE FEBRERO DE 2026
N°	1883	VALOR	$ 32.289.816.901,00	FECHA	9 DE FEBRERO DE 2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	99 - 8.1.4.08.10.001.01.004 - 10-7 - 2025002200042, MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, 99 - 8.1.4.09.10.001.01.01 - 15-2 - 2025002200042, MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR; 99 - 8.1.4.08.10.001.01.003 - 10-7 - 2025002200041, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRETERAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP (SGR)					
N°	6026	VALOR	$ 32.289.816.901,00	FECHA	6 DE FEBRERO DE 2026
N°	5926	VALOR	$ 47.824.309.297,32	FECHA	6 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP					
N°	39725	VALOR	$ 10.338.788.360,56	FECHA	2 DE DICIEMBRE DE 2025
N°	39125	VALOR	$ 2.293.495.188,72	FECHA	2 DE DICIEMBRE DE 2025
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP					
N°	1729	VALOR	$ 2.293.495.188,72	FECHA	5 DE FEBRERO DE 2026
N°	1728	VALOR	$ 7.488.208.429,23	FECHA	5 DE FEBRERO DE 2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	99 - 8.1.4.08.10.001.02.003 - 10-7 - 2025002200041, INTERVENTORIAS- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRETERAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR; 99 - 8.1.4.09.10.001.02.01 - 15-2 - 2025002200042, INTERVENTORIA-MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR				

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP (SGR)					
N°	5826	VALOR	$ 2.293.495.188,72	FECHA	5 DE FEBRERO DE 2026
N°	5726	VALOR	$ 7.488.208.429,23	FECHA	5 DE FEBRERO DE 2026

5. CONTROL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VALOR BRUTO	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR NETO	ORDDEN DE PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	
					No.	FECHA
ANTICIPO (40%)	$ 71.132.522.179,60		$ 0,00			
ACTA 1						
ACTA 2						
ACTA 3						
ACTA 4						
TOTALES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			
VALOR INICIAL	$ 177.831.305.449,00					
VALOR ADICION						
VALOR FINAL	$ 177.831.305.449,00					
SALDOS	$ 177.831.305.449,00	$ 0,00	$ 177.831.305.449,00			
AVANCE F	0,00%					

AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONCEPTO	VALOR BRUTO	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR NETO	ORDDEN DE PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	
					No.	FECHA
ANTICIPO (40%)	$ 5.052.913.406,80		$ 0,00			
TOTALES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			
VALOR INICIAL	$ 12.632.283.517,00					
VALOR ADICION						
VALOR FINAL	$ 12.632.283.517,00					
SALDOS	$ 12.632.283.517,00	$ 0,00	$ 12.632.283.517,00			
AVANCE F	0,00%					

Durante el presente periodo el contratista no tramito recursos de anticipo


PROGRAMACION INICIAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

1	10-02-2026 AL 9-03-2026	feb-26	0,96%
2	10-03-2026 AL 9-04-2026	mar-26	2,91%
3	10-04-2026 AL 9-05-2026	abr-26	9,42%
4	10-05-2026 AL 9-06-2026	may-26	18,86%
5	10-06-2026 AL 9-07-2026	jun-26	29,11%
6	10-07-2026 AL 9-08-2026	jul-26	40,34%
7	10-08-2026 AL 9-09-2026	ago-26	53,49%
8	10-09-2026 AL 9-10-2026	sep-26	65,49%
9	10-10-2026 AL 9-11-2026	oct-26	71,71%
10	10-11-2026 AL 9-12-2026	nov-26	76,01%
11	10-12-2026 AL 9-01-2027	dic-26	80,25%
12	10-01-2027 AL 9-02-2027	ene-27	84,44%
13	10-02-2027 AL 9-03-2027	feb-27	87,83%
14	10-03-2027 AL 9-04-2027	mar-27	91,42%
15	10-04-2027 AL 9-05-2027	abr-27	95,04%
16	10-05-2027 AL 9-06-2027	may-27	98,29%
17	10-06-2027 AL 9-07-2027	jun-27	99,50%
18	10/07/2027	jul-27	100,00%



PROGRAMACION INICIAL TRAMO TOCAIMO

1	10-02-2026 AL 9-03-2026	feb-26	0,00%
2	10-03-2026 AL 9-04-2026	mar-26	0,64%
3	10-04-2026 AL 9-05-2026	abr-26	3,23%
4	10-05-2026 AL 9-06-2026	may-26	10,62%
5	10-06-2026 AL 9-07-2026	jun-26	18,85%
6	10-07-2026 AL 9-08-2026	jul-26	30,08%
7	10-08-2026 AL 9-09-2026	ago-26	46,81%
8	10-09-2026 AL 9-10-2026	sep-26	63,28%
9	10-10-2026 AL 9-11-2026	oct-26	71,10%
10	10-11-2026 AL 9-12-2026	nov-26	75,88%
11	10-12-2026 AL 9-01-2027	dic-26	80,65%
12	10-01-2027 AL 9-02-2027	ene-27	85,43%
13	10-02-2027 AL 9-03-2027	feb-27	88,14%
14	10-03-2027 AL 9-04-2027	mar-27	91,68%
15	10-04-2027 AL 9-05-2027	abr-27	95,11%
16	10-05-2027 AL 9-06-2027	may-27	98,53%
17	10-06-2027 AL 9-07-2027	jun-27	99,81%
18	10/07/2027	jul-27	100,00%

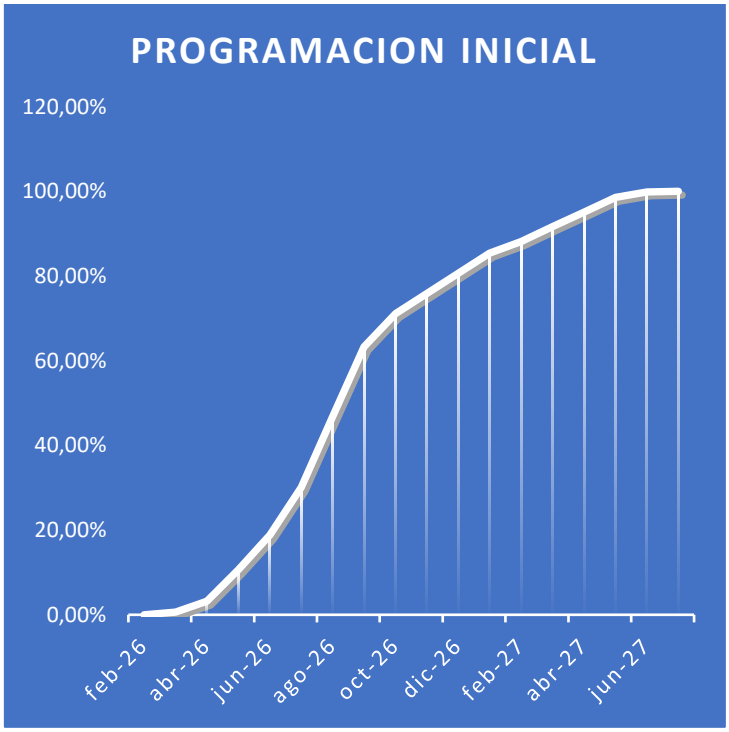


PROGRAMACION INICIAL VALLEDUPAR – LA MESA

GLORIETA - LA TRAMACUA - LA MESA			
1	10-02-2026 AL 9-03-2026	feb-26	1,92%
2	10-03-2026 AL 9-04-2026	mar-26	4,54%
3	10-04-2026 AL 9-05-2026	abr-26	11,61%
4	10-05-2026 AL 9-06-2026	may-26	22,89%
5	10-06-2026 AL 9-07-2026	jun-26	35,94%
6	10-07-2026 AL 9-08-2026	jul-26	49,75%
7	10-08-2026 AL 9-09-2026	ago-26	63,36%
8	10-09-2026 AL 9-10-2026	sep-26	72,76%
9	10-10-2026 AL 9-11-2026	oct-26	77,01%
10	10-11-2026 AL 9-12-2026	nov-26	80,38%
11	10-12-2026 AL 9-01-2027	dic-26	83,76%
12	10-01-2027 AL 9-02-2027	ene-27	87,03%
13	10-02-2027 AL 9-03-2027	feb-27	90,21%
14	10-03-2027 AL 9-04-2027	mar-27	93,38%
15	10-04-2027 AL 9-05-2027	abr-27	97,00%
16	10-05-2027 AL 9-06-2027	may-27	100,00%
17	10-06-2027 AL 9-07-2027	jun-27	100,00%
18	10/07/2027	jul-27	100,00%




PROGRAMACION INICIAL LA MESA - EL MAMON.

VIA LA MESA - EL MAMON			
1	10-02-2026 AL 9-03-2026	feb-26	0,07%
2	10-03-2026 AL 9-04-2026	mar-26	1,30%
3	10-04-2026 AL 9-05-2026	abr-26	4,65%
4	10-05-2026 AL 9-06-2026	may-26	9,63%
5	10-06-2026 AL 9-07-2026	jun-26	17,29%
6	10-07-2026 AL 9-08-2026	jul-26	25,02%
7	10-08-2026 AL 9-09-2026	ago-26	32,75%
8	10-09-2026 AL 9-10-2026	sep-26	40,49%
9	10-10-2026 AL 9-11-2026	oct-26	47,56%
10	10-11-2026 AL 9-12-2026	nov-26	54,50%
11	10-12-2026 AL 9-01-2027	dic-26	61,62%
12	10-01-2027 AL 9-02-2027	ene-27	68,75%
13	10-02-2027 AL 9-03-2027	feb-27	75,47%
14	10-03-2027 AL 9-04-2027	mar-27	82,54%
15	10-04-2027 AL 9-05-2027	abr-27	89,64%
16	10-05-2027 AL 9-06-2027	may-27	96,31%
17	10-06-2027 AL 9-07-2027	jun-27	99,72%
18	10/07/2027	jul-27	100,00%

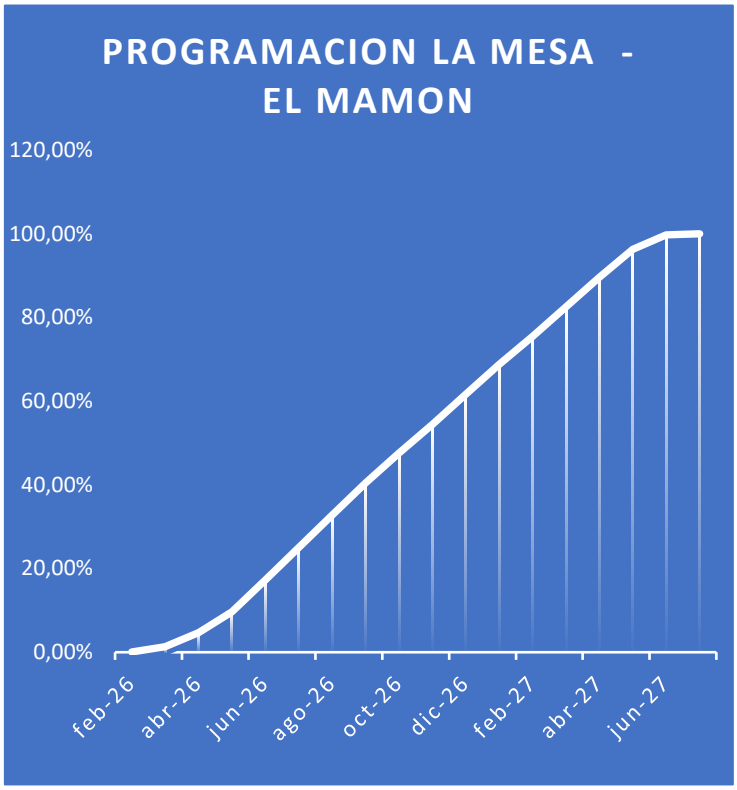

PROGRAMACION INICIAL LA MESA - EL PALMAR.

VIA LA MESA - EL PALMAR			
1	10-02-2026 AL 9-03-2026	feb-26	1,68%
2	10-03-2026 AL 9-04-2026	mar-26	5,38%
3	10-04-2026 AL 9-05-2026	abr-26	19,63%
4	10-05-2026 AL 9-06-2026	may-26	34,56%
5	10-06-2026 AL 9-07-2026	jun-26	49,58%
6	10-07-2026 AL 9-08-2026	jul-26	63,28%
7	10-08-2026 AL 9-09-2026	ago-26	76,95%
8	10-09-2026 AL 9-10-2026	sep-26	89,95%
9	10-10-2026 AL 9-11-2026	oct-26	93,66%
10	10-11-2026 AL 9-12-2026	nov-26	94,79%
11	10-12-2026 AL 9-01-2027	dic-26	95,49%
12	10-01-2027 AL 9-02-2027	ene-27	95,98%
13	10-02-2027 AL 9-03-2027	feb-27	96,47%
14	10-03-2027 AL 9-04-2027	mar-27	96,96%
15	10-04-2027 AL 9-05-2027	abr-27	97,79%
16	10-05-2027 AL 9-06-2027	may-27	98,61%
17	10-06-2027 AL 9-07-2027	jun-27	99,44%
18	10/07/2027	jul-27	100,00%

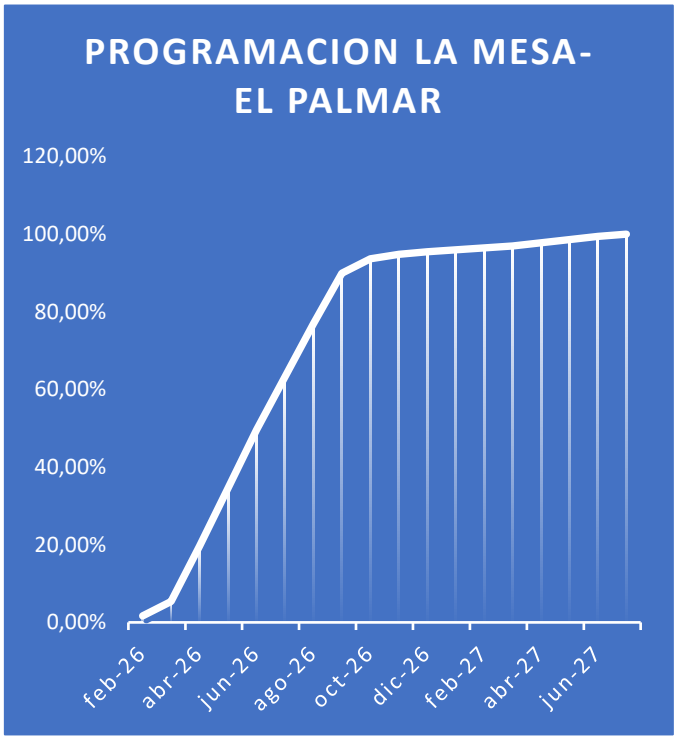

PROGRAMACION INICIAL PAVIMENTOS URBANOS VALLEDUPAR.

PROGRAMACION PVTOS VALLEDUPAR			
1	10-02-2026 AL 9-03-2026	feb-26	1,46%
2	10-03-2026 AL 9-04-2026	mar-26	4,06%
3	10-04-2026 AL 9-05-2026	abr-26	12,69%
4	10-05-2026 AL 9-06-2026	may-26	21,35%
5	10-06-2026 AL 9-07-2026	jun-26	29,29%
6	10-07-2026 AL 9-08-2026	jul-26	36,69%
7	10-08-2026 AL 9-09-2026	ago-26	44,04%
8	10-09-2026 AL 9-10-2026	sep-26	51,35%
9	10-10-2026 AL 9-11-2026	oct-26	58,57%
10	10-11-2026 AL 9-12-2026	nov-26	64,54%
11	10-12-2026 AL 9-01-2027	dic-26	70,50%
12	10-01-2027 AL 9-02-2027	ene-27	76,46%
13	10-02-2027 AL 9-03-2027	feb-27	82,43%
14	10-03-2027 AL 9-04-2027	mar-27	87,69%
15	10-04-2027 AL 9-05-2027	abr-27	92,47%
16	10-05-2027 AL 9-06-2027	may-27	96,26%
17	10-06-2027 AL 9-07-2027	jun-27	98,18%
18	10/07/2027	jul-27	100,00%



AVANCE FISICO CONTRATO GENERAL Y TRAMOS

Avance Físico Programado %	2.98%	Avance Físico Ejecutado %	3.56%	Avance o Atraso Físico %	0.58 %

TRAMOS	% EJECUTADO	% PROGRAMADO
TRAMO 1 - MEDIA LUNA - TOCAIMO - NUEVAS FLORES	1.30%	0.74%
TRAMO 2 - GLORIETA - LA TRAMACUA - LA MESA	5.95%	4.54%
TRAMO 2.1 - LA MESA - EL PALMAR	5.54%	5.38%
TRAMO 2.2 - LA MESA - EL MAMON	3.74%	1.70%
TRAMO 3 - VALLEDUPAR URBANO	3.39%	4.11%
TOTAL	**3.56%**	**2.98%**

6. REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCES

6.1 Tramo Valledupar – La mesa










10/03/2026, 10:18:34 a.m.
N 10.443388°, W 73.313974°


9/03/2026, 3:07:09 p.m.
N 10.442779°, W 73.314519°


10/03/2026, 7:55:33 a.m.
N 10.436143°, W 73.340324°


Valledupar, Cesar


10/03/2026, 3:45:16 p.m.
Valledupar, Cesar


9/03/2026, 3:31:08 p.m.
N 10.442357°, W 73.313813°





6.2 Tramo La Mesa – El mamon



6.3 Tramo La Mesa – El palmar













6.4 Tramo Nuevas Flores – Tocaimo









6.5 Tramo Pavimentos Urbanos Valledupar




CUSTOMIZE 07:47
2026.03.18 mié
Carrera 31 18A2-44,
Valledupar, Cesar,
Colombia
Villa Miriam:Pavimentos
Urbanos
Barrio Villa Miriam
Tramo 38

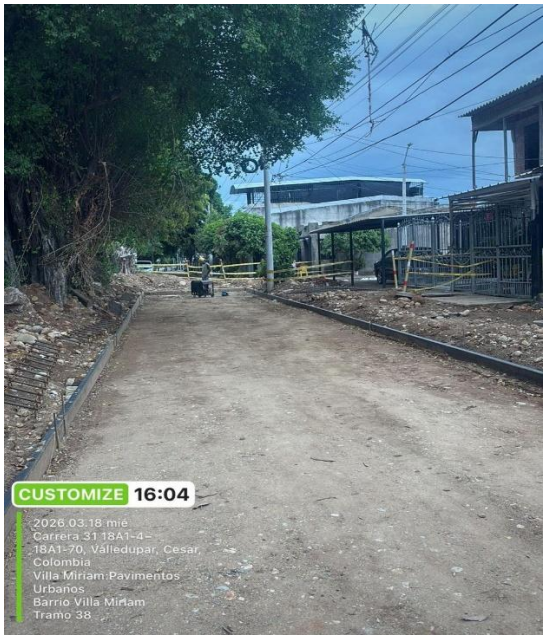
CUSTOMIZE 16:04
2026.03.18 mié
Carrera 31 18A1-4-
18A1-70, Valledupar, Cesar,
Colombia
Villa Miriam:Pavimentos
Urbanos
Barrio Villa Miriam
Tramo 38

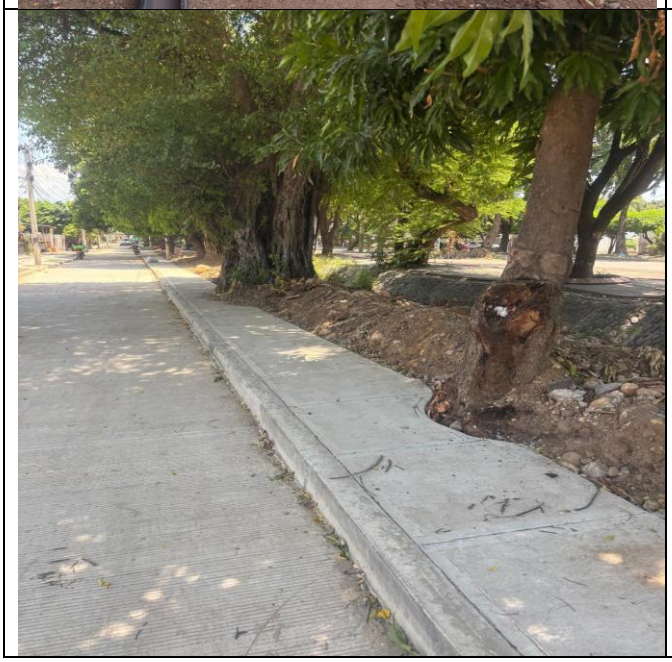


CUSTOMIZE 07:28
2026.03.18 mié
Carrera 31 18A2-44,
Valledupar, Cesar,
Colombia
Villa Miriam:Pavimentos
Urbanos
Barrio Villa Miriam
Tramo 38






CUSTOMIZE 07:17
2026.03.19 jue
Carrera 31 18A2-44,
Valledupar, Cesar,
Colombia
Villa Miriam:Pavimentos
Urbanos
Barrio Villa Miriam
Tramo 38


CUSTOMIZE 07:49
2026.03.19 jue
Carrera 31 18A1-4,
18A1-70, Valledupar, Cesar,
Colombia
Villa Miriam:Pavimentos
Urbanos
Barrio Villa Miriam
Tramo 38

















7. RELACIÓN DE AVANCES GENERALES

- Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de Marzo de 2026, el proyecto de MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR presentó un avance físico acumulado del 3.56%, lo cual evidencia un avance frente al cronograma establecido, dado que para la misma fecha el avance programado es del 2.98%.

8. DIFICULTADES Y OBSERVACIONES

1. Continúan las demoras en la obtención de permisos ambientales como ocupación de cauce y aprovechamiento forestal.
2. La unión temporal red Vial del norte y la interventoría externa, para el periodo informado, no ha completado el personal mínimo requerido por la entidad para la ejecución del contrato, a lo cual se requiere la entrega de la información en el menor tiempo posible.
3. Continúan las dificultades para la entrega de documentos contractuales establecidos en el documento técnico y en el proceso licitatorio, por lo que se le han hecho requerimientos por escrito tanto a interventoría como a obra, para la subsanación de estos.
4. Se manifiesta que continua la demora por parte de la interventoría en la entrega de los informes mensuales.
5. El contratista y la interventoría inician la revisión de los diseños hidráulicos en cada uno de los tramos.

9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1. Se recomienda la presentación de balances de obra en cada uno de los tramos.
2. Se recomienda fortalecer y optimizar las actividades administrativas orientadas a la debida subsanación de observaciones, con el fin de mitigar los impactos que han ocasionado retrasos en los procesos de verificación y revisión de los planes de trabajo e informes mensuales correspondientes.
3. Se recomienda a la interventoría externa la entrega a tiempo de sus informes mensuales, y la entrega cada lunes de los informes semanales.

Supervisor:



SAID LOZANO LOZANO
Profesional Especializado
