“REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA”



INFORME GESTIÓN DE CALIDAD

PERÍODO ABRIL 2026

Elaborado por:	Juan Guillermo Rodríguez- Luis Alejandro Castro	Mayo 10 de 2026
Revisado por:	Natalia Calderón Vásquez	Mayo 11 de 2026

CONTENIDO

1 OBJETIVOS DEL INFORME 4

2 MEZCLAS ASFÁLTICAS INSTALADAS DURANTE EL PERÍODO 4

3 DISEÑO MEZCLAS ASFÁLTICAS 4

3.1 PLANTA PAVIMENTAR 4
3.1.1 Mezcla asfáltica MDC-19+RAP 4
3.1.2 Mezcla asfáltica MSC-19 tibia + RAP 6
3.1.3 Mezcla asfáltica MSC-19 tibia + Fibra 7
3.1.4 Mezcla asfáltica MAM- 25 9
3.1.5 Mezcla asfáltica SMA 11
3.2 PLANTA PROCOPAL 13
3.2.1 Mezcla asfáltica MDC-19+RAP 13
3.2.2 Mezcla asfáltica MSC-19 tibia + RAP 15

4 ENSAYOS EJECUTADOS AL ASFALTO Y A LOS AGREGADOS UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS 20

4.1 PLANTA PAVIMENTAR 20
4.1.1 Calidad del asfalto 20
4.1.2 Calidad de los materiales pétreos 21
4.1.3 Resultados ensayos diarios parámetros diseño 22
4.1 PLANTA PROCOPAL 32
4.1.1 Calidad del asfalto 32
4.1.2 Calidad de los materiales pétreos 33
4.1.3 Resultados Ensayos diarios parámetros diseño 33

5 ENSAYOS DE LAS MEZCLAS ASLFATICAS 33

6 RESULTADOS EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS EN CAMPO 33

6.1 ENSAYOS DE CAMPO 34
6.2 ESPESORES DE PAVIMENTO INSTALADO 43

7 CALIDAD DE LA PINTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE VÍAS INTERVENIDAS 69

7.1 MATERIALES UTILIZADOS 69
7.2 PRUEBAS REALIZADAS 69
7.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO 69

8 OBRAS COMPLEMENTARIAS 70

9 ANEXOS 99

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Infraestructura Física del Municipio de Medellín, adjudicó al Consorcio VIALMED 2025, el contrato 4600105052 de 2025 "*CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA EN LA CIUDAD*", en el marco de su proyecto estratégico para la recuperación de los corredores viales que sirven de eje para la movilidad al interior del distrito.

La Secretaría de Infraestructura Física del Municipio de Medellín ha definido el siguiente alcance del proyecto: *"El alcance del contrato comprende la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada en las vías en pavimento asfáltico del Distrito de Medellín que presentan baches (conocidos como huecos), fallas tipo piel de cocodrilo, hundimientos, abultamientos, ondulaciones, ahuellamientos, grietas, agrietamiento en bloque, fractura de losas o cualquier otro tipo de afectación en la carpeta de rodadura, estructura del pavimento o infraestructura asociada, mediante actividades de conservación como la corrección de defectos superficiales en la capa de rodadura de las vías, la colocación de nuevas carpetas, el reemplazo de las existentes y las obras complementarias asociadas a la infraestructura vial, para preservar y mantener las condiciones de uso de los corredores viales, con el propósito de recuperar y prolongar su vida útil y garantizar las condiciones de seguridad y comodidad en el tránsito vehicular"*

Las intervenciones críticas contempladas corresponden a alguno de los siguientes casos:

- Mantenimiento puntual con mezcla asfáltica. Correspondiente a los rangos 0, 1 y 2 del formulario de precios, donde se instalará mezcla asfáltica MDC-19+ RAP y rangos 3 y 4, donde se instalará mezcla asfáltica MSC-19+RAP.
- Actividades de pavimentación con mezclas MSC-25+RAP, SMA, MAM-19, MAM-25, MSC-25, MSC-19. Correspondiente a los rangos 3 y 4 del formulario de precios, incluye fresado y pavimento colocado en mezcla tipo MSC-19 y MDC-19.
- Obras complementarias como fresado de pavimento
- Demarcación vial con pintura

Cada una de las mezclas asfálticas que se instalan cuentan con un diseño previo, aprobado por la Interventoría, que se utiliza como línea base para controlar la calidad de las mezclas asfálticas producidas por Pavimentar y Procopal, y para controlar la calidad del producto terminado, de acuerdo con las especificaciones técnicas indicadas en la norma INVIAS 2022 para pavimento. Así mismo la demarcación con pintura se lleva a cabo de acuerdo con la norma INVIAS 2022 y el Manual de Señalización Vial 2024

El Consorcio VIALMED 2025, como contratista de obra, presenta el informe de calidad correspondiente.

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

1 OBJETIVOS DEL INFORME

- Hacer el seguimiento al cumplimiento de requisitos de calidad del contrato, de manera que se garantice que todos los trabajos se lleven a cabo dentro del marco de las especificaciones, diseño y calidad.
- Asegurar que todos los hallazgos del seguimiento, que puedan afectar la calidad del producto terminado, generen la implementación de acciones correctivas y preventivas en pro del mejoramiento continuo y el cumplimiento de las expectativas del cliente.

2 MEZCLAS ASFÁLTICAS INSTALADAS DURANTE EL PERÍODO

En el mes de Abril 2026, se instalaron las siguientes mezclas:

PLANTA DE PRODUCCIÓN	TIPO DE MEZCLA
Pavimentar	MDC-19 tibia + RAP, MSC-19 tibia + RAP, MSC-19 tibia + Fibra, MAM- 25, MSC-25, SMA
Procopal	MDC-19 tibia + RAP, MSC-19 tibia + RAP, MSC-19 tibia + Fibra, MSC-25

3 DISEÑO MEZCLAS ASFÁLTICAS

El método de diseño permite determinar la granulometría y el contenido de asfalto óptimo para una mezcla asfáltica, que cumpla los parámetros especificados por la norma INVÍAS 2022. A partir de estos resultados se obtiene la fórmula de trabajo con la cual se produce la mezcla asfáltica en la planta. Tendremos un diseño, por tipo de mezcla instalado en el período correspondiente y por planta de producción.

El resumen de los diseños para las mezclas utilizadas en el mes de Abril 2026 se presenta a continuación.

3.1 PLANTA PAVIMENTAR

3.1.1 Mezcla asfáltica MDC-19+RAP

Procedencia de los materiales:


- Asfalto: cemento asfáltico de penetración 60/70 normalizado (asfalto líquido espumado), suministrado por Ecopetrol, con aditivo mejorador de adherencia y modificación de reología APS480 RAVASOL
- Materiales pétreos: Pavimentar

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

La **Fórmula de Trabajo** queda definida por los siguientes parámetros:

Granulometría

Tamiz	Combinación	Especificación		Tolerancias	
3/4"	**100,0**	100	100	100	100
1/2"	**88.5**	80	95	84	92
3/8"	**78.6**	70	88	75	83
No. 4	**53.7**	49	65	50	58
No. 10	**37.1**	29	45	34	40
No. 40	**19.6**	14	25	17	23
No. 80	**10.7**	8	17	8	14
No. 200	**5.5**	4	8	4,0	7,5

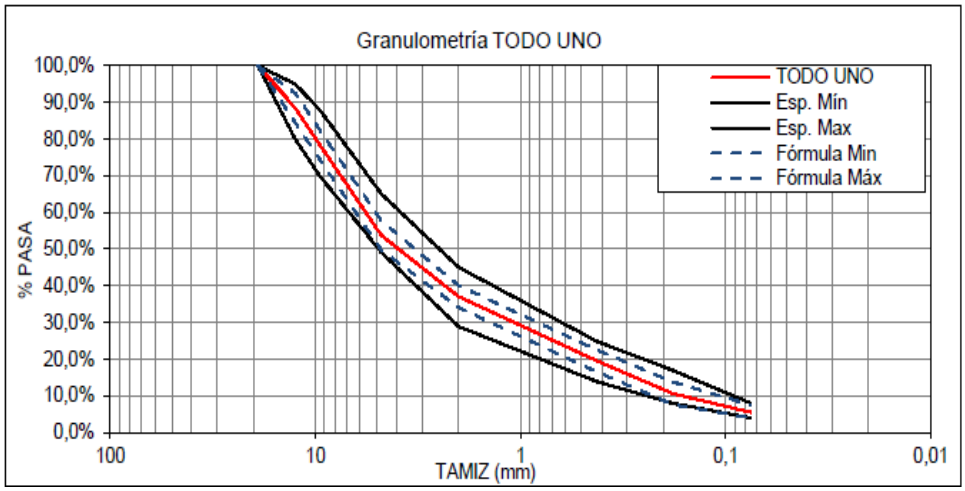

Proporciones:

Material	Proporción (%)
Triturado 3/4	22%
Arena triturada	35%
Arena procesada	28%
Material fresado	15%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Fórmula de trabajo

Parámetro	Especificación Invias artículo 450-22
Contenido óptimo de asfalto (%)	5.2
Densidad Bulk (g/cm^3)	2,464
Estabilidad (N)	14514
Flujo (mm)	2.9
Estabilidad/Flujo (kN/mm)	4.96
Vacíos con aire (%)	4.9
Vacíos en los agregados (%)	16.4
Vacíos llenos con asfalto (%)	70.3
Relación llenante/ligante efectivo	0.97
Concentración real del llenante	0.277
Espesor promedio de película de asfalto (µm)	8.0
Gravedad específica máxima	2.589

3.1.2 Mezcla asfáltica MSC-19 tibia + RAP


Procedencia de los materiales:

- Asfalto: cemento asfáltico de penetración 60/70 normalizado (asfalto líquido espumado), suministrado por Ecopetrol, con aditivo mejorador de adherencia y modificación de reología APS480 RAVASOL
- Materiales pétreos: Pavimentar

La **Fórmula de Trabajo** queda definida por los siguientes parámetros:

Granulometría

Tamiz	Combinación	Especificación		Tolerancias	
3/4"	**100.0**	100	100	100	100
1/2"	**87.0**	80	95	83	91
3/8"	**75.6**	65	80	72	80
No. 4	**45.8**	40	55	42	50
No. 10	**29.9**	24	38	27	33
No. 40	**14.9**	9	20	12	18
No. 80	**8.3**	6	12	6	11
No. 200	**4.9**	3	7	3.0	6.9

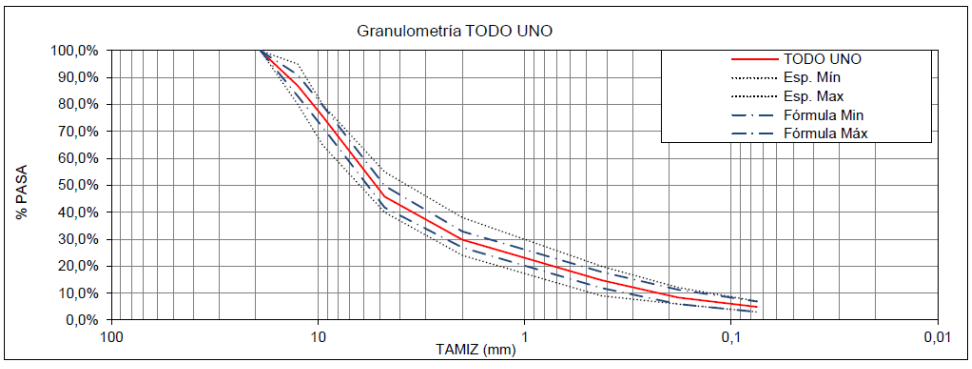

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Proporciones:

Material	Proporción (%)
Triturado 3/4	30%
Arena triturada	30%
Arena procesada	15%
Material fresado	25%

Fórmula de trabajo

Parámetro	Especificación Invias artículo 450-13
Contenido óptimo de asfalto (%)	4.9
Densidad (kg/m^3)	2.476
Estabilidad (N)	13491
Flujo (mm)	3.0
Estabilidad/Flujo (kN/mm)	4.4
Vacíos con aire (%)	4.8
Vacíos en los agregados (%)	15.8
Vacíos llenos con asfalto (%)	69.7
Relación llenante/ligante efectivo	0.93
Concentración real del llenante	0.264
Espesor promedio de película de asfalto (µm)	9.2
Gravedad específica máxima	2.608

3.1.3 Mezcla asfáltica MSC-19 tibia + Fibra

Procedencia de los materiales:


- Asfalto: cemento asfáltico de penetración 60/70 normalizado (asfalto líquido espumado), suministrado por Ecopetrol, con aditivo mejorador de adherencia y modificación de reología APS480 RAVASOL
- Materiales pétreos: Pavimentar

La **Fórmula de Trabajo** queda definida por los siguientes parámetros:

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Granulometría

Tamiz	Combinación	Especificación		Tolerancias	
3/4"	**100,0**	100	100	100,0	100,0
1/2"	**88,0**	80	95	84	92
3/8"	**76,0**	65	80	72	80
No. 4	**47,7**	40	55	44	52
No. 10	**31,2**	24	38	28	34
No. 40	**15,1**	9	20	12	18
No. 80	**8,9**	6	12	6	12
No. 200	**5,1**	3	7	3,1	7,0

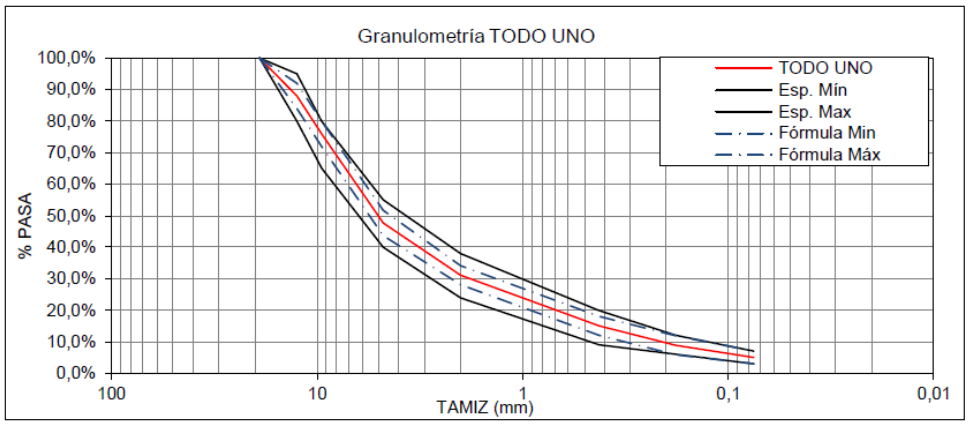

Proporciones:

Material	Proporción (%)
Triturado 3/4	30%
Arena triturada	50%
Arena procesada	20%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Fórmula de trabajo

Parámetro	Especificación Invias artículo 450-22
Contenido óptimo de asfalto (%)	4.9
Densidad Bulk (g/cm^3)	2,469
Estabilidad (N)	14516
Flujo (mm)	3.00
Estabilidad/Flujo (kN/mm)	4.75
Vacíos con aire (%)	4.8
Vacíos en los agregados (%)	15.8
Vacíos llenos con asfalto (%)	70.0
Relación llenante/ligante efectivo	0.97
Concentración real del llenante	0.270
Espesor promedio de película de asfalto (µm)	9.0
Gravedad específica máxima	2.590

3.1.4 Mezcla asfáltica MAM- 25

Procedencia de los materiales:


- Asfalto: El cemento asfáltico empleado en el diseño fue asfalto CAM-1 proveniente de Colbitumen, con aditivo mejorador de adherencia y modificador de reología APS480 RAVASOL.
- Materiales pétreos: Pavimentar

La **Fórmula de Trabajo** queda definida por los siguientes parámetros:

Granulometría

Tamiz	Combinación	Especificación		Tolerancias	
1”	**100**	100	100	100,0	100,0
3/4”	**86.6**	80	95	83	91
1/2”	**70.2**	65	80	66	74
3/8”	**62.9**	55	70	59	67
No. 4	**44.6**	40	55	41	49
No. 10	**30.1**	24	38	27	33
No. 40	**16.3**	10	20	13	19
No. 80	**10.4**	8	14	8	13
No. 200	**6.9**	6	9	6.0	8.9

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

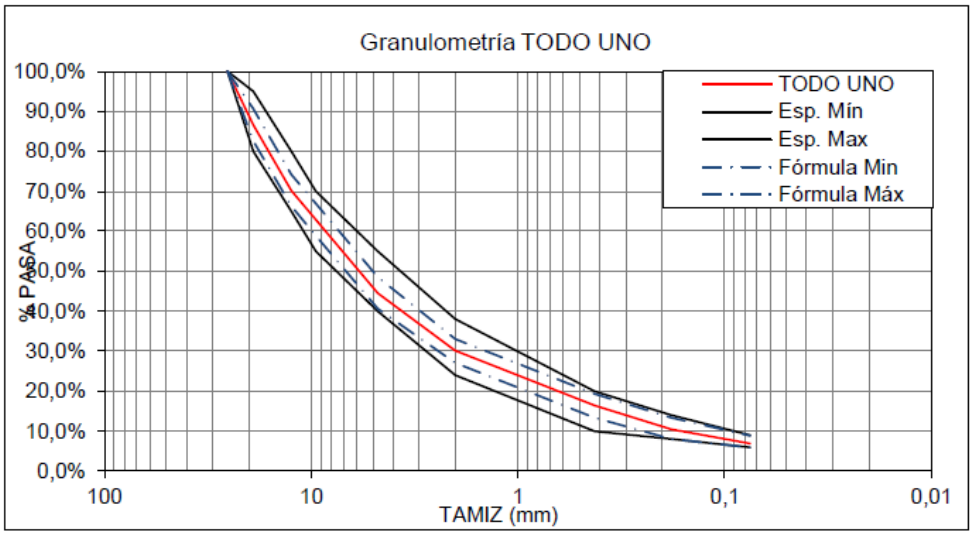

Proporciones:

Material	Proporción (%)
Triturado 3/4	45%
Arena triturada	39%
Filler planta Astec	2.8%
Arena procesada	13,2%

Fórmula de trabajo

Parámetro	Especificación Invias artículo 450-22
Contenido óptimo de asfalto (%)	5.0
Densidad Bulk (g/cm^3)	2,473
Estabilidad (N)	16537
Flujo (mm)	2.7
Estabilidad/Flujo (kN/mm)	6.1
Vacíos con aire (%)	4.6
Vacíos en los agregados (%)	16.1
Vacíos llenos con asfalto (%)	70.8
Relación llenante/ligante efectivo	1.3
Concentración real del llenante	0.330
Espesor promedio de película de asfalto (µm)	8.1
Gravedad específica máxima	2.593

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

3.1.5 Mezcla asfáltica SMA


Procedencia de los materiales:

Mezcla asfáltica según el protocolo AMAAC-PA-CR04/2015 como SMA-TIPO-B, adaptado al método Marshall con materiales procedentes de planta Copacabana y asfalto tipo III.

La **Fórmula de Trabajo** queda definida por los siguientes parámetros:

Granulometría

Tamiz	Combinación	Especificación		Tolerancias	
1/2"	**100.0**	100	100	100	100
3/8"	**75.7**	70	95	71	81
No. 4	**36.0**	30	50	32	40
No. 8	**26.4**	20	30	24	28
No. 200	**9.1**	8	12	8.1	10.1

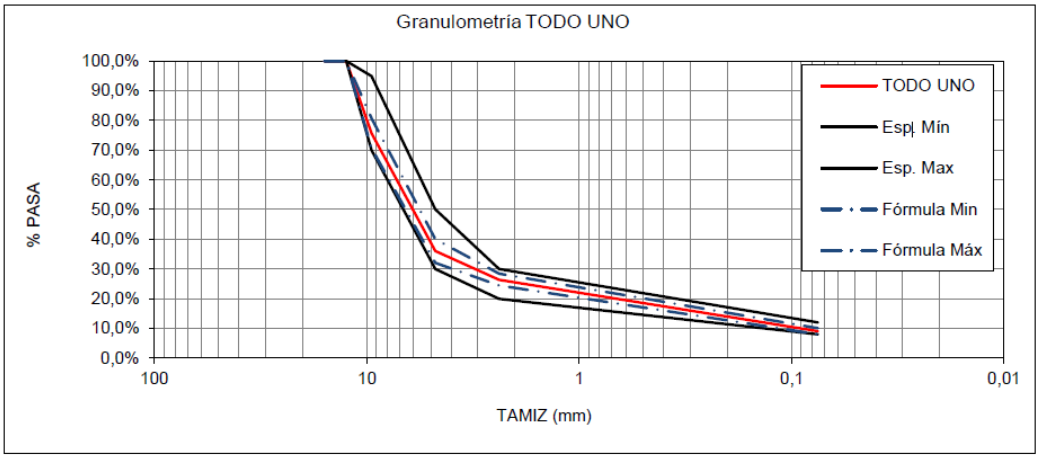

Proporciones:

Material	Proporción (%)
Triturado 1/2	65%
Arena triturada	20%
Arena ultra fina	10%
Carbonato de calcio (cal)	5%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Fórmula de trabajo

Parámetro	AMAAC-PA-CR-04-2015
Contenido óptimo de asfalto (%)	6.3
Densidad (kg/m^3)	2.488
Vacíos con aire (%)	3.8
Vacíos en los agregados (%)	17.3
Vacíos llenos con asfalto (%)	78.4
Gravedad específica máxima	2.581

3.1.6 Mezcla asfáltica MSC-25


Procedencia de los materiales:

- Asfalto: cemento asfáltico de penetración 60/70 normalizado (asfalto líquido espumado), suministrado por Ecopetrol
- Materiales pétreos: Pavimentar

La **Fórmula de Trabajo** queda definida por los siguientes parámetros:

Granulometría

Tamiz	Combinación	Especificación		Tolerancias	
1”	**100**	100	100	100,0	100,0
3/4”	**87.5**	80	95	83	91
1/2”	**72.2**	65	80	68	76
3/8”	**65.3**	55	70	61	69
No. 4	**47.7**	40	55	44	52
No. 10	**32.3**	24	38	29	35
No. 40	**15.8**	9	20	13	19
No. 80	**8.4**	6	12	6	11
No. 200	**4.6**	3	7	3.0	6.6

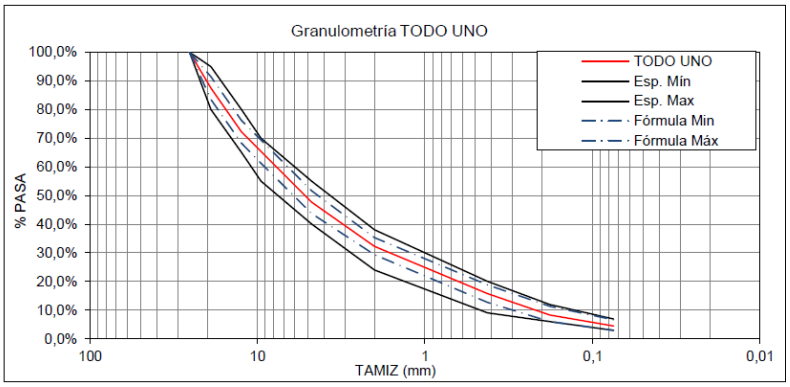

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Proporciones:

Material	Proporción (%)
Triturado 1/2	42%
Arena triturada	38%
Arena procesada	20%

Fórmula de trabajo

Parámetro	Especificación Invias artículo 450-22
Contenido óptimo de asfalto (%)	4.9
Densidad Bulk (g/cm^3)	2,460
Estabilidad (N)	15234
Flujo (mm)	3.1
Estabilidad/Flujo (kN/mm)	4.91
Vacíos con aire (%)	4.6
Vacíos en los agregados (%)	16.0
Vacíos llenos con asfalto (%)	69.8
Relación llenante/ligante efectivo	0.88
Concentración real del llenante	0.250
Espesor promedio de película de asfalto (µm)	9.4
Gravedad específica máxima	2.587

3.2 PLANTA PROCOPAL

3.2.1 Mezcla asfáltica MDC-19+RAP


Procedencia de los materiales:

- Asfalto: cemento asfáltico de penetración 60/70 normalizado, suministrado por MPI con aditivo reductor de temperatura (MT) y aditivo mejorador de adherencia.
- Materiales pétreos: Procopal, planta Girardota.

La **Fórmula de Trabajo** queda definida por los siguientes parámetros:

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Granulometría

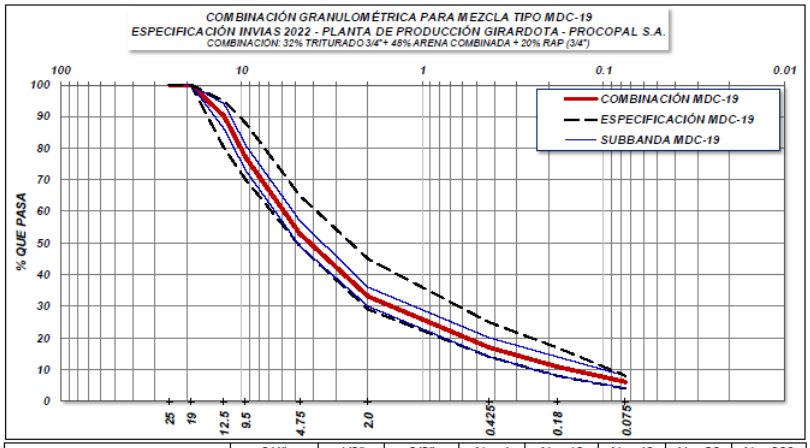

Tamiz	3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 80	No. 200
	19	12.5	9.5	4.75	2.0	0.425	0.18	0.075
% que pasa	100	90	77	53	33	17	11	6.1
MDC-19 Límite inferior	100	80	70	49	29	14	8	4
MDC-19 Límite superior	100	95	88	65	45	25	17	8

Proporciones de los agregados:

Material	Proporción (%)
Triturado 3/4	32%
Arena mezclada	48%
Material reciclado RAP	20%

Fórmula de trabajo

Parámetro	Fórmula de trabajo	Especificación INVÍAS Mezcla Tibia MDC-19 Rodadura - Art. 450-22/462-22	
		Tránsito NT2	Tránsito NT3
Número de golpes por cara	**75**	75	75
Contenido óptimo de asfalto total ($\%CA_{ME}$), %	**5.6%**	-	-
Contenido de asfalto 60-70 MT a adicionar ($\%M_{BA}$), %	**4.85%**	-	-
Contenido de asfalto que aporta el RAP ($\%M_{BR}$)	**0.75%**		
Gravedad específica bulk de la mezcla	**2.420**	-	-
Gravedad específica teórica máxima	**2.530**	-	-
Estabilidad Marshall	**11896 N**	≥ 7500 N	≥ 9000 N
Fluencia	**3.37 mm**	2 mm-4 mm	2 mm-3.5 mm
Vacíos con aire	**4.4%**	3% - 5%	3% - 5%
Vacíos en los agregados minerales	**15.8%**	≥ 15%	≥ 15%
Vacíos llenos con asfalto	**72.4%**	65% - 78%	65% - 75%
Relación llenante/ligante efectivo	**1.19**	0.8 a 1.2	0.8 a 1.2
Relación estabilidad/flujo	**3.5 kN/mm**	3 a 5 kN/mm	3 a 6 kN/mm
Espesor promedio de película de asfalto	**8.3 µm**	≥ 7.5 µm	≥ 7.5 µm
Adherencia, resistencia retenida en tracción indirecta	**83%**	≥ 80%	≥ 80%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

3.2.2 Mezcla asfáltica MSC-19 tibia + RAP


Procedencia de los materiales:

- Asfalto: cemento asfáltico de penetración 60/70 normalizado, suministrado por MPI con aditivo reductor de temperatura (MT) y aditivo mejorador de adherencia.
- Materiales pétreos: Procopal, planta Girardota.

La **Fórmula de Trabajo** queda definida por los siguientes parámetros:

Granulometría

Tamiz	3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 80	No.200
	19	12,7	9,5	4,75	2,0	0,425	0,18	0,074
Material que pasa, %	**100**	**84**	**70**	**48**	**32**	**15**	**9**	**5.0**
Especificación INVÍAS Artículo 450-22 para MSC-19								
Límite inferior	100	80	65	40	24	9	6	3
Límite superior	100	95	80	55	38	20	12	7
Tolerancias admisibles respecto a la fórmula de trabajo								
Límite inferior	100	80	66	44	29	12	6	3.0
Límite superior	100	88	74	52	35	18	12	7.0

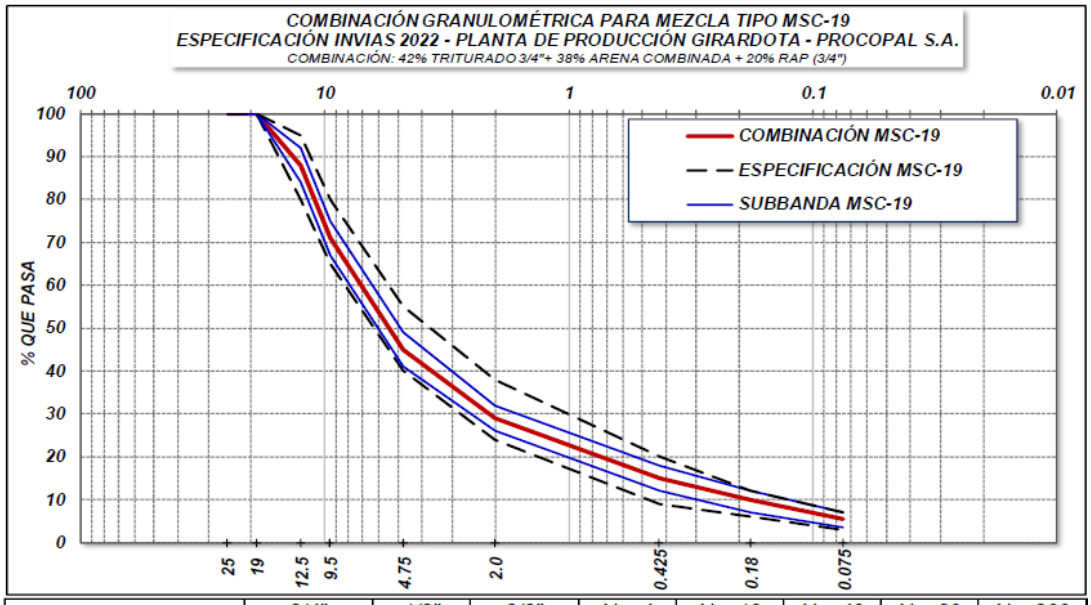

Tamiz	3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 80	No. 200
	19	12.5	9.5	4.75	2.0	0.425	0.18	0.075
% que pasa	**100**	**88**	**71**	**45**	**29**	**15**	**10**	**5.5**
MSC-19 Límite inferior	100	80	65	40	24	9	6	3
MSC-19 Límite superior	100	95	80	55	38	20	12	7

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Proporciones de los agregados:

Material	Proporción (%)
Triturado 3/4	42%
Arena mezclada	38%
Material reciclado RAP	20%

Fórmula de trabajo

Parámetro	*Fórmula de trabajo*	*Especificación INVÍAS Mezcla Tibia MSC-19 Rodadura - Art. 450-22/462-22*	
		Tránsito NT2	*Tránsito NT3*
Número de golpes por cara	***75***	*75*	*75*
Contenido óptimo de asfalto total (%CA_{ME}), %	***5.5%***	-	-
Contenido de asfalto 60-70 MT a adicionar (%M_{BA}), %	***4.74%***	-	-
Contenido de asfalto que aporta el RAP (%M_{BR})	***0.76%***		
Gravedad específica bulk de la mezcla	***2.400***	-	-
Gravedad específica teórica máxima	***2.516***	-	-
Estabilidad Marshall	***11182 N***	*≥ 7500 N*	*≥ 9000 N*
Fluencia	***3.38 mm***	*2 mm-4 mm*	*2 mm-3.5 mm*
Vacíos con aire	***4.6%***	*3% - 5%*	*3% - 5%*
Vacíos en los agregados minerales	***16.7%***	*≥ 15%*	*≥ 15%*
Vacíos llenos con asfalto	***72.3%***	*65% - 78%*	*65% - 75%*
Relación llenante/ligante efectivo	***1.06***	*0.8 a 1.2*	*0.8 a 1.2*
Relación estabilidad/flujo	***3.3 kN/mm***	*3 a 5 kN/mm*	*3 a 6 kN/mm*
Espesor promedio de película de asfalto	***9.8 µm***	*≥ 7.5 µm*	*≥ 7.5 µm*
Adherencia, resistencia retenida en tracción indirecta	***86%***	*≥ 80%*	*≥ 80%*

3.2.3 Mezcla asfáltica MSC-19 tibia + Fibra

Procedencia de los materiales:

- El cemento asfáltico empleado en los diseños, corresponde con un asfalto de penetración 60-70 con adición de aditivo mejorador de adherencia al 0.8%, suministrado por MPI
- Se emplean fibras sintéticas suministradas por Procopal S.A. La fibra empleada es FORTA-FI HMA en una dosificación del 0.05% de la mezcla total, es decir 500 gramos de fibra por cada tonelada de mezcla, según la recomendación del fabricante.


CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

- Materiales pétreos para el diseño de mezclas tipo MSC-19 con fibra, procedentes de la planta Girardota, fuente Santa fe de Antioquia

La **Fórmula de Trabajo** queda definida por los siguientes parámetros:

Granulometría

Tamiz	3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 80	No.200
	19	12,7	9,5	4,75	2,0	0,425	0,18	0,074
Material que pasa, %	**100**	**84**	**70**	**48**	**32**	**15**	**9**	**5.0**
Especificación INVÍAS Artículo 450-22 para MSC-19								
Límite inferior	100	80	65	40	24	9	6	3
Límite superior	100	95	80	55	38	20	12	7
Tolerancias admisibles respecto a la fórmula de trabajo								
Límite inferior	100	80	66	44	29	12	6	3.0
Límite superior	100	88	74	52	35	18	12	7.0

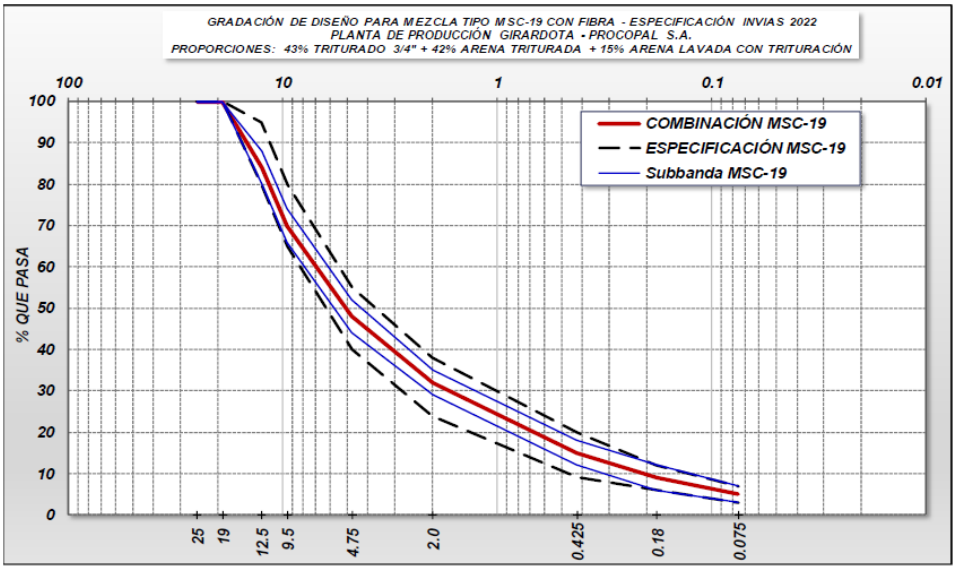

Tamiz	3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 80	No. 200
	19	12.5	9.5	4.75	2.0	0.425	0.18	0.075
GRADACIÓN DE DISEÑO % QUE PASA	**100**	**84**	**70**	**48**	**32**	**15**	**9**	**5.0**
MSC-19 Límite inferior	100	80	65	40	24	9	6	3
MSC-19 Límite superior	100	95	80	55	38	20	12	7

Proporciones:

Material	Proporción (%)
Triturado 3/4	43%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Material	Proporción (%)
Arena triturada	42%
Arena lavada	15%

Fórmula de trabajo

Parámetro	FÓRMULA DE TRABAJO MSC-19 CON FIBRA Invías Art. 450-22 Tránsito NT2 y NT3		
	Fórmula de trabajo	Especificación para NT2	Especificación para NT3
Número de golpes	75	75	75
Contenido óptimo de asfalto	5.1%	-	-
Gravedad específica bulk de la mezcla	2.427	-	-
Estabilidad Marshall	13671N	≥ 7500 N	≥ 9000 N
Fluencia	3.35 mm	2 mm - 4 mm	2 mm - 3.5 mm
Vacíos con aire	4.5%	3% - 5%	3% - 5%
Vacíos en los agregados	15.4%	≥ 15%	≥ 15%
Vacíos llenos con asfalto	70.9%	65%-78%	65%-75%
Relación llenante / ligante efectivo	1.04	0.8 a 1.2	0.8 a 1.2
Relación estabilidad/flujo	4.1 kN/mm	3 – 5 kN/mm	3 - 6 kN/mm
Concentración del llenante	0.275	≤ 0.326	≤ 0.326
Espesor promedio de película de asfalto, µm	9.1 µm	≥ 7.5 µm	≥ 7.5 µm
Adherencia, resistencia retenida en tracción indirecta	84%	≥ 80%	≥ 80%

3.2.4 Mezcla asfáltica MSC-25

Procedencia de los materiales:


- El cemento asfáltico empleado en los diseños corresponde con un asfalto de penetración 60-70 con adición de aditivo mejorador de adherencia al 0.8%, suministrado por MPI.
- Materiales pétreos de la planta Girardota, fuente Santa Fe de Antioquia.

La **Fórmula de Trabajo** queda definida por los siguientes parámetros:

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Granulometría

Tamiz	1"	3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 80	No.200
	25	19	12,5	9,5	4,75	2,0	0,425	0,18	0,074
Material que pasa, %	**100**	**89**	**71**	**63**	**47**	**31**	**14**	**9**	**4.8**
Especificación INVÍAS Artículo 450-22 para MSC-25									
Límite inferior	100	89	65	55	40	24	9	6	3
Límite superior	100	95	80	70	55	38	20	12	7
Tolerancias admisibles respecto a la fórmula de trabajo									
Límite inferior	100	85	67	59	43	28	11	6	3.0
Límite superior	100	93	75	67	51	34	17	12	6.8

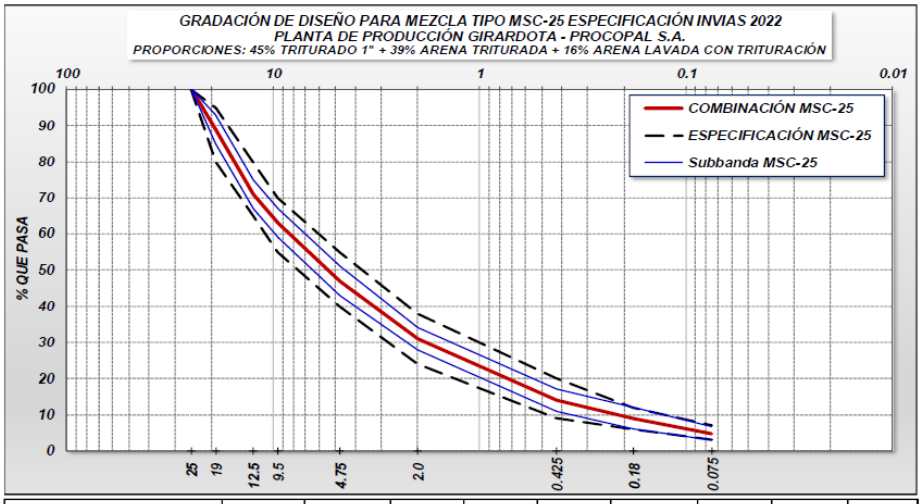

Tamiz	1"	3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 80	No. 200
	25	19	12.5	9.5	4.75	2.0	0.425	0.18	0.075
GRADACIÓN DE DISEÑO % QUE PASA	100	89	71	63	47	31	14	9	4.8
MSC-25 Límite inferior	100	80	65	55	40	24	9	6	3
MSC-25 Límite superior	100	95	80	70	55	38	20	12	7

Proporciones:

Material	Proporción (%)
Triturado 1”	45%
Arena triturada	39%
Arena lavada	16%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Fórmula de trabajo

Parámetro	FÓRMULA DE TRABAJO MSC-25 Invías Art. 450-22 Tránsito NT3		
	Fórmula de trabajo	Especificación para NT2	Especificación para NT3
Número de golpes	75	75	75
Contenido óptimo de asfalto	4.9%	-	-
Gravedad específica bulk de la mezcla	2.438	-	-
Estabilidad Marshall	13624 N	≥ 7500 N	≥ 9000 N
Fluencia	3.26 mm	2 mm - 4 mm	2 mm - 3.5 mm
Vacíos con aire	4.6%	3% - 5%	4% - 6%
Vacíos en los agregados	14.8%	≥ 15%	≥ 15%
Vacíos llenos con asfalto	69.3%	65%-78%	65%-75%
Relación llenante / ligante efectivo	1.07	0.8 a 1.2	0.8 a 1.2
Relación estabilidad/flujo	4.2 kN/mm	3 – 5 kN/mm	3 - 6 kN/mm
Concentración del llenante	0.288	≤ 0.318	≤ 0.318
Espesor promedio de película de asfalto, µm	8.8 µm	≥ 7.5 µm	≥ 7.5 µm
Adherencia, resistencia retenida en tracción indirecta	82%	≥ 80%	≥ 80%

4 ENSAYOS EJECUTADOS AL ASFALTO Y A LOS AGREGADOS UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS

4.1 PLANTA PAVIMENTAR

4.1.1 Calidad del asfalto

De acuerdo con los resultados de los ensayos aportados por ECOPETROL para el asfalto AC30, utilizado en la producción de las mezclas MDC-19+RAP, MSC-19+RAP, MSC-19+FIBRA de PAVIMENTAR, se verifica su conformidad con la Norma INVIAS.

CEMENTO ASFÁLTICO AC30

ENSAYO	FECHA	RESULTADO	NORMA INVIAS	
			MÍNIMO	MÁXIMO
Penetración (0,1mm)	23/09/2025	58	60	70
Punto de ablandamiento (°C)	23/09/2025	49,2	48	54
Índice de penetración	23/09/2025	-1	-1,2	0,6
Viscosidad absoluta a 60 °C (P)	23/09/2025	29094	1500	-
Ductilidad (cm)	23/09/2025	145	100	-
Solubilidad en tricloroetileno (%)	23/09/2025	99,96	99	-
Contenido de agua (%)	23/09/2025	-	-	0,2
Punto de ignición (°C)	23/09/2025	291	230	-
Contenido de parafinas (%)	23/09/2025	-	-	3
Peso específico 25~C (kg/m3)	23/09/2025	1023,3	-	-

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

ENSAYO	FECHA	RESULTADO	NORMA INVIAS	
			MÍNIMO	MÁXIMO
Pérdida de masa por calentamiento en película de masa en movimiento (%)	23/09/2025	-0,143	-	0,8
Penetración de residuo luego de pérdida por calentamiento (%)	23/09/2025	-	50	-
Incremento de punto de ablandamiento (°C)	23/09/2025	-	-	9
Índice de envejecimiento	23/09/2025	-	-	4
Temperatura de la mezcla (°C)	23/09/2025	-	-	-
Temperatura de compactación (°C)	23/09/2025	-	-	-
Grado de desempeño pg. asfalto original 60/70 (°C)	23/09/2025	-	-	-

Para la mezcla MAM-25 de PAVIMENTAR para el asfalto modificado tipo V, se verifica su conformidad con la Norma INVIAS.

CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO TIPO V

ENSAYO	FECHA	RESULTADO	NORMA INVIAS	
			MÍNIMO	MÁXIMO
Penetración (0,1mm)	22/09/2025	22	15	40
Punto de ablandamiento (°C)	22/09/2025	79,8	65	-
Índice de penetración	22/09/2025	N. A	-	-
Viscosidad absoluta a 60 °C (P)	22/09/2025	N. A	-	-
Ductilidad (cm)	22/09/2025	N. A	-	-
Solubilidad en tricloroetileno (%)	22/09/2025	N. A	-	-
Contenido de agua (%)	22/09/2025	-	-	0,2
Punto de ignición (°C)	22/09/2025	300	230	-
Contenido de parafinas (%)	22/09/2025	-	-	3
Peso específico 25~C (kg/m3)	22/09/2025	1,017	-	-
Pérdida de masa por calentamiento en película de masa en movimiento (%)	22/09/2025	-0,361	-	0,8
Penetración de residuo luego de pérdida por calentamiento (%)	22/09/2025	77,3	70	-
Incremento de punto de ablandamiento (°C)	22/09/2025	3	-	10
Índice de envejecimiento	22/09/2025	-	-	4
Temperatura de la mezcla (°C)	22/09/2025	-	-	-
Temperatura de compactación (°C)	22/09/2025	-	-	-
Grado de desempeño pg. asfalto original 60/70 (°C)	22/09/2025	88-22	-	-

4.1.2 Calidad de los materiales pétreos

La conformidad con la Norma INVIAS de los materiales utilizados por la planta PAVIMENTAR para la producción de las mezclas asfálticas MDC-19+RAP, MSC-19+RAP, MSC-19+FIBRA y MAM-25, fue verificada periódicamente concluyendo el cumplimiento de las especificaciones. El Anexo 4 contiene los resultados de los ensayos de los agregados.

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

4.1.3 Resultados ensayos diarios parámetros diseño

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en los ensayos diarios realizados a las mezclas asfálticas de la planta de producción de PAVIMENTAR, por parte del laboratorio de la planta de producción.


4.1.3.1 Granulometría

De la tabla y gráfica siguientes se concluye que las granulometrías de los pétreos utilizados en la producción de las mezclas asfálticas de PAVIMENTAR está dentro de los rangos la fórmula de trabajo y de la norma INVIAS.

MDC-19 TIBIA+RAP

Fecha	Tipo de Mezcla	GRANULOMETRÍA							
		3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 80	No. 200
6/04/2026	MDC-19+RAP	100	87,8	79,6	53,6	34,3	16,6	9,2	5,3
13/04/2026	MDC-19+RAP	100	90,8	83,6	56,5	37,6	18,6	10,2	5,1
20/04/2026	MDC-19+RAP	100	88,9	79,7	54,7	36,7	19,6	10,3	5,3
27/04/2026	MDC-19+RAP	100	93,4	80,8	53,1	35,6	18,2	9,4	4,9
Fórmula de trabajo		100	84,0	75,0	50,0	34,0	17,0	8,0	4,0
		100	92,0	83,0	58,0	40,0	23,0	14,0	7,5
Especificación INVIAS		100	80	70	49	29	14	8	4
		100	95	88	65	45	25	17	8

% que pasa por fuera del rango del INVIAS
% que pasa por fuera del rango del diseño, pero dentro de la banda del INVIAS
% que pasa por dentro del rango del diseño Marschall

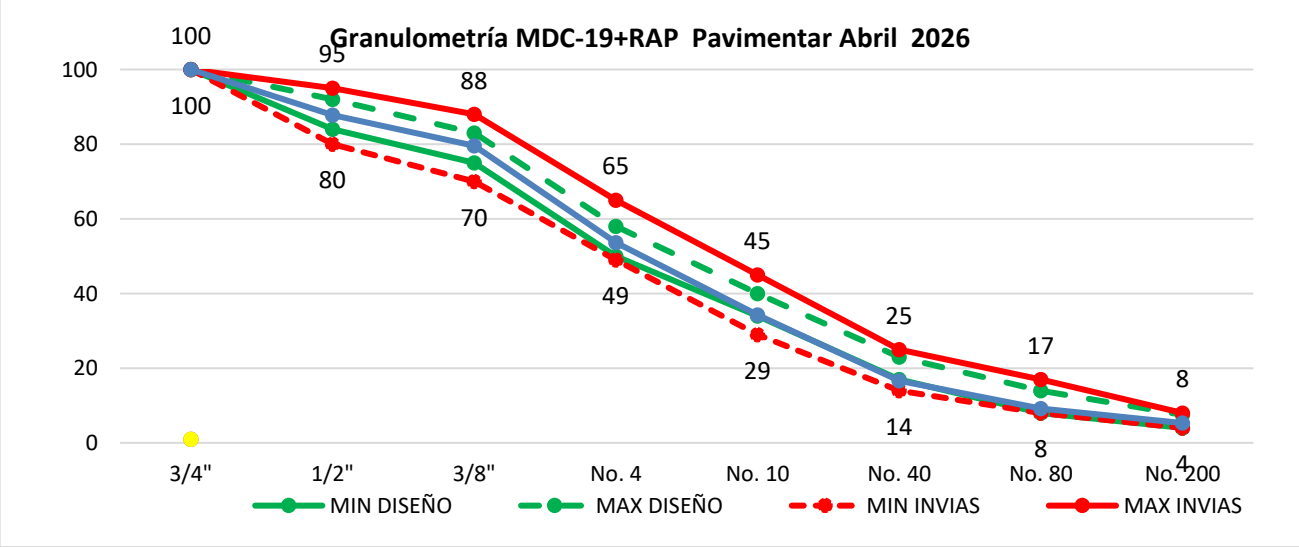

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com


MSC-19 TIBIA+ RAP

Fecha	Tipo de Mezcla	GRANULOMETRÍA							
		3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 80	No. 200
6/04/2026	MSC-19+RAP	100	85,9	76	47,2	29,6	14,5	9	4,7
Fórmula de trabajo		100	83,0	72,0	42,0	27,0	12,0	6,0	3,0
		100	91,0	80,0	50,0	33,0	18,0	11,0	6,9
Especificación INVIAS		100	80	65	40	24	9	6	3
		100	95	80	55	38	20	12	7

% que pasa por fuera del rango del INVIAS

% que pasa por fuera del rango del diseño, pero dentro de la banda del INVIAS

% que pasa por dentro del rango del diseño Marschall

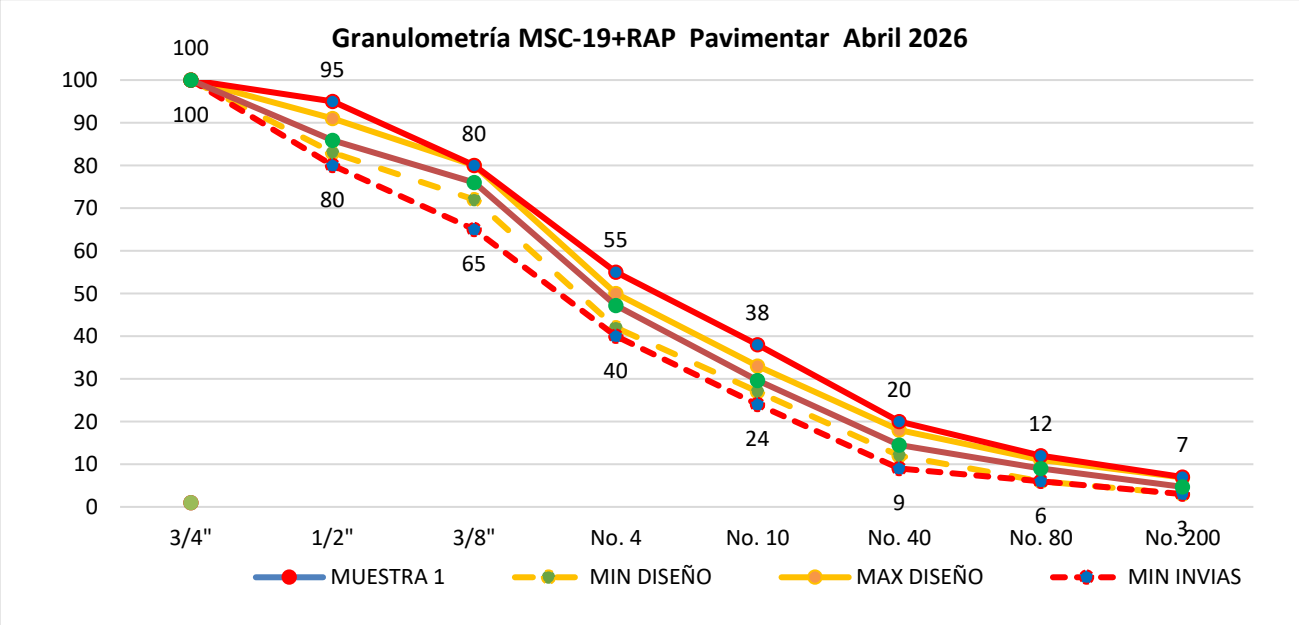


CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

4.1.3.2 Parámetros de diseño


Los siguientes son los resultados obtenidos para los ensayos diarios de las mezclas asfálticas producidas por PAVIMENTAR en Abril de 2026 y la respectiva verificación con la fórmula de trabajo y la especificación INVIAS. De las siguientes tablas y gráficas, se concluye que las mezclas instaladas provenientes de la planta PAVIMENTAR, cumplieron con los parámetros de diseño y especificaciones del INVIAS.


Parámetros mezcla MDC-19 TIBIA+RAP Pavimentar

Fecha	Tipo de Mezcla	% Asfalto mezclas instaladas	Gravedad específica	% vacios con aire (VA)	% vacios en el agregado mineral (VAM)	% Vacíos llenos con asfalto (VFA)	Estabilidad (N)	Flujo (mm)	Estabilidad/ flujo (Kn/mm)
6/04/2026	MDC-19+RAP	5	2446	5,1%	18%	71%	12078	2,7	4,4
7/04/2026	MDC-19+RAP	5,1	2437	5,0%	18%	72%	13229	3,1	4,3
8/04/2026	MDC-19+RAP	5,1	2428	5,3%	18%	71%	13418	3,0	4,5
9/04/2026	MDC-19+RAP	5,1	2430	5,2%	18%	71%	14772	3,0	5,0
10/04/2026	MDC-19+RAP	5	2442	5,2%	18%	71%	14375	3,0	4,8
13/04/2026	MDC-19+RAP	5,1	2457	5,1%	17%	70%	14766	2,9	4,9
20/04/2026	MDC-19+RAP	5,2	2424	5,2%	18%	72%	14973	3,1	4,9
27/04/2026	MDC-19+RAP	5	2425	5,1%	18%	72%	14130	2,9	4,9
28/04/2026	MDC-19+RAP	5,1	2437	5,3%	18%	70%	14055	3,2	4,4
29/04/2026	MDC-19+RAP	5,2	2442	5,1%	18%	71%	13668	2,9	4,7
30/04/2026	MDC-19+RAP	5,2	2435	5,1%	18%	72%	14374	2,8	5,1
Fórmula de trabajo		5,2	2464	4,9%					5,0
Especificación INVIAS		5,3-5,9	N/A	3-5					3 a 6

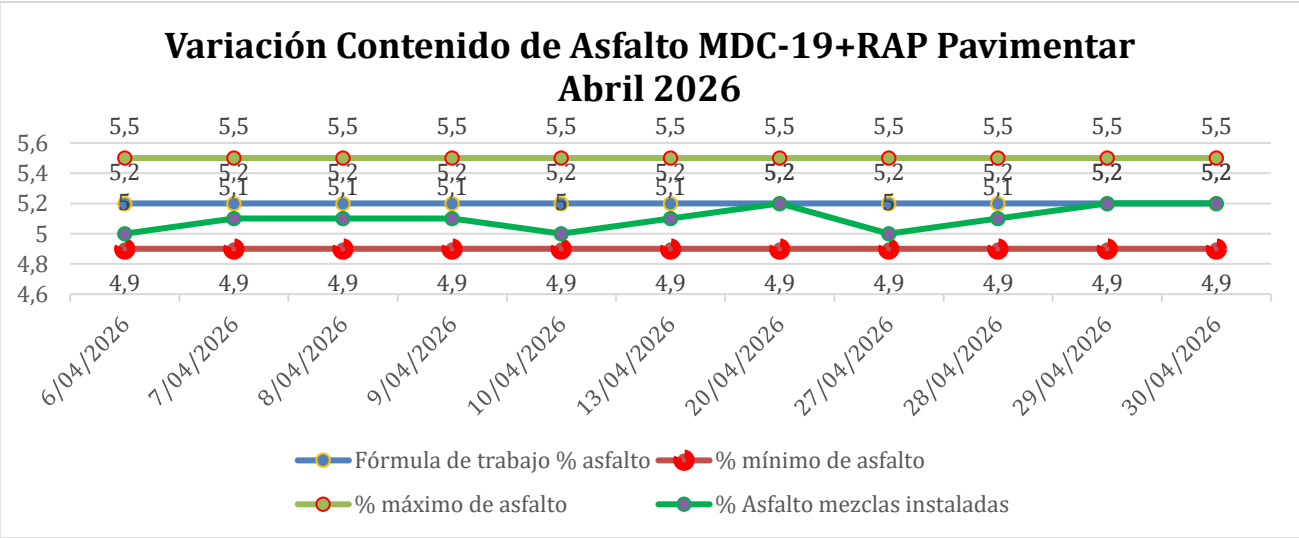



CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

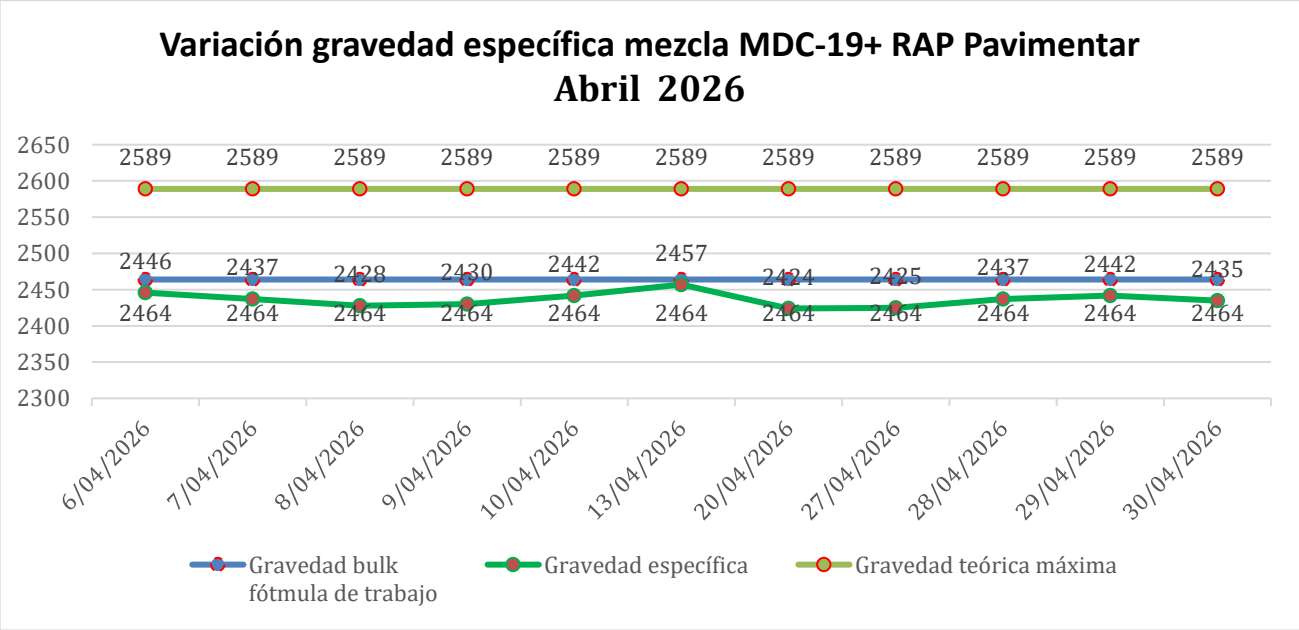

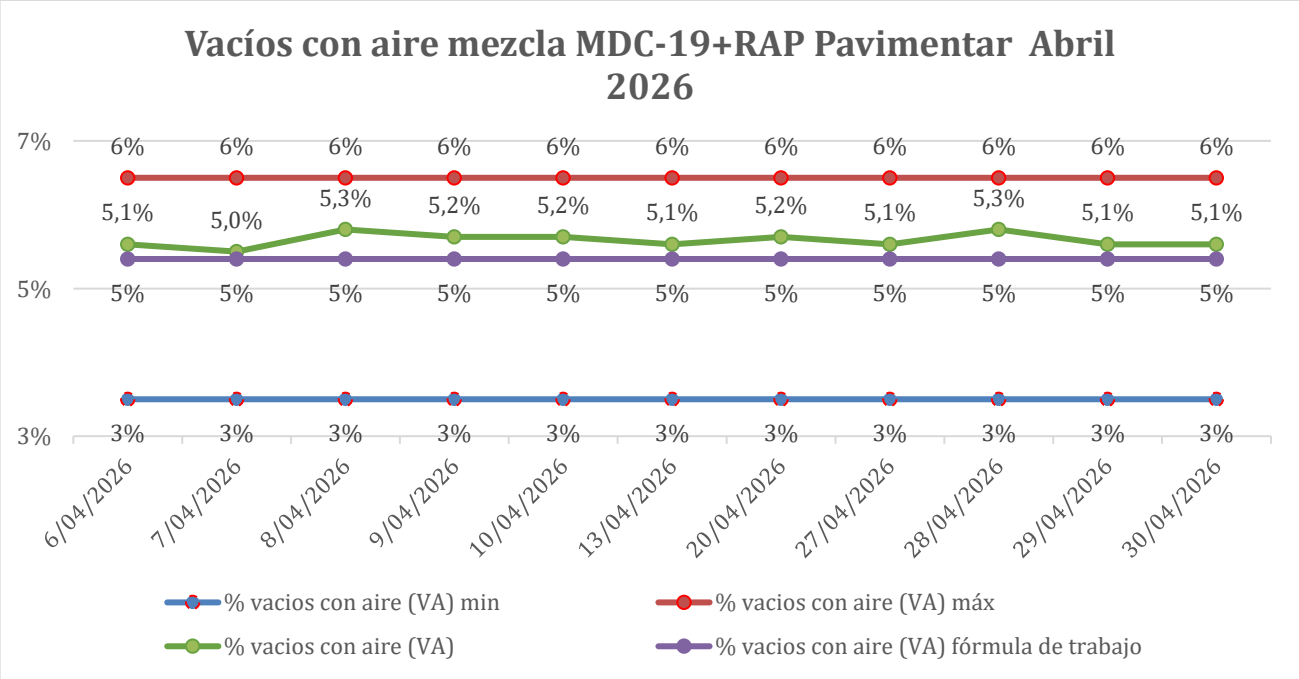



CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

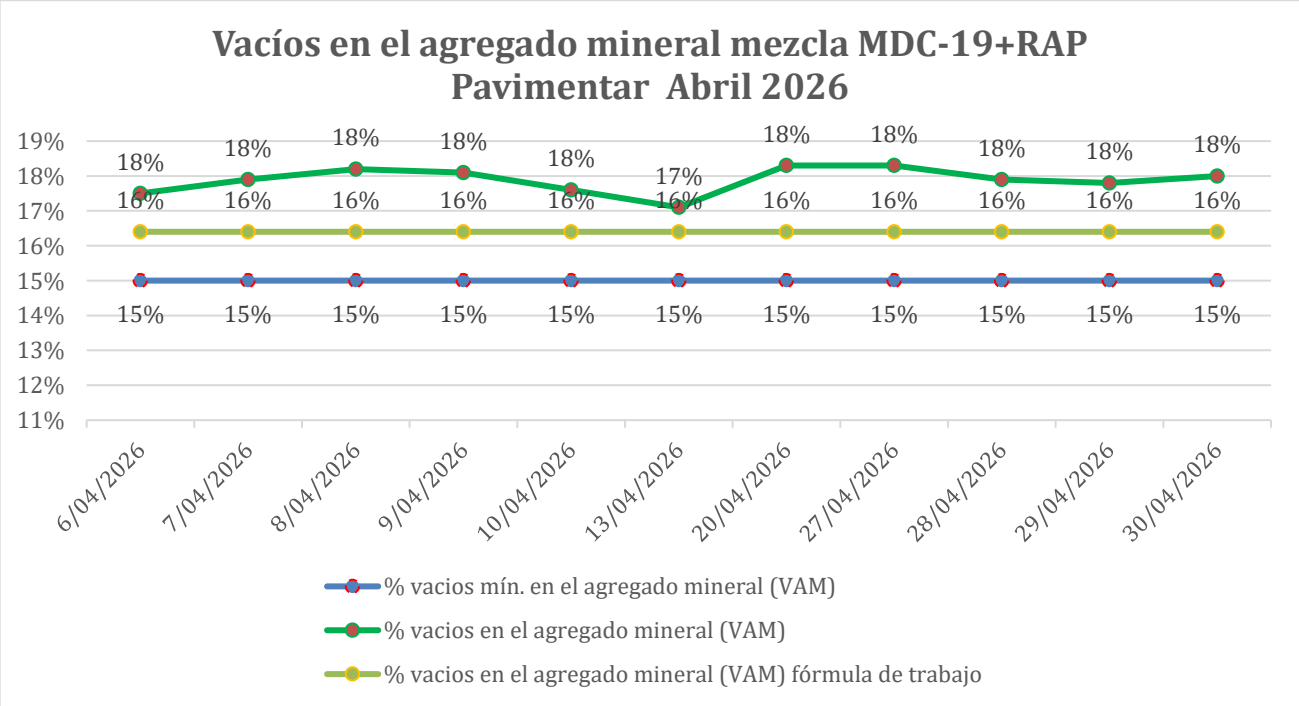

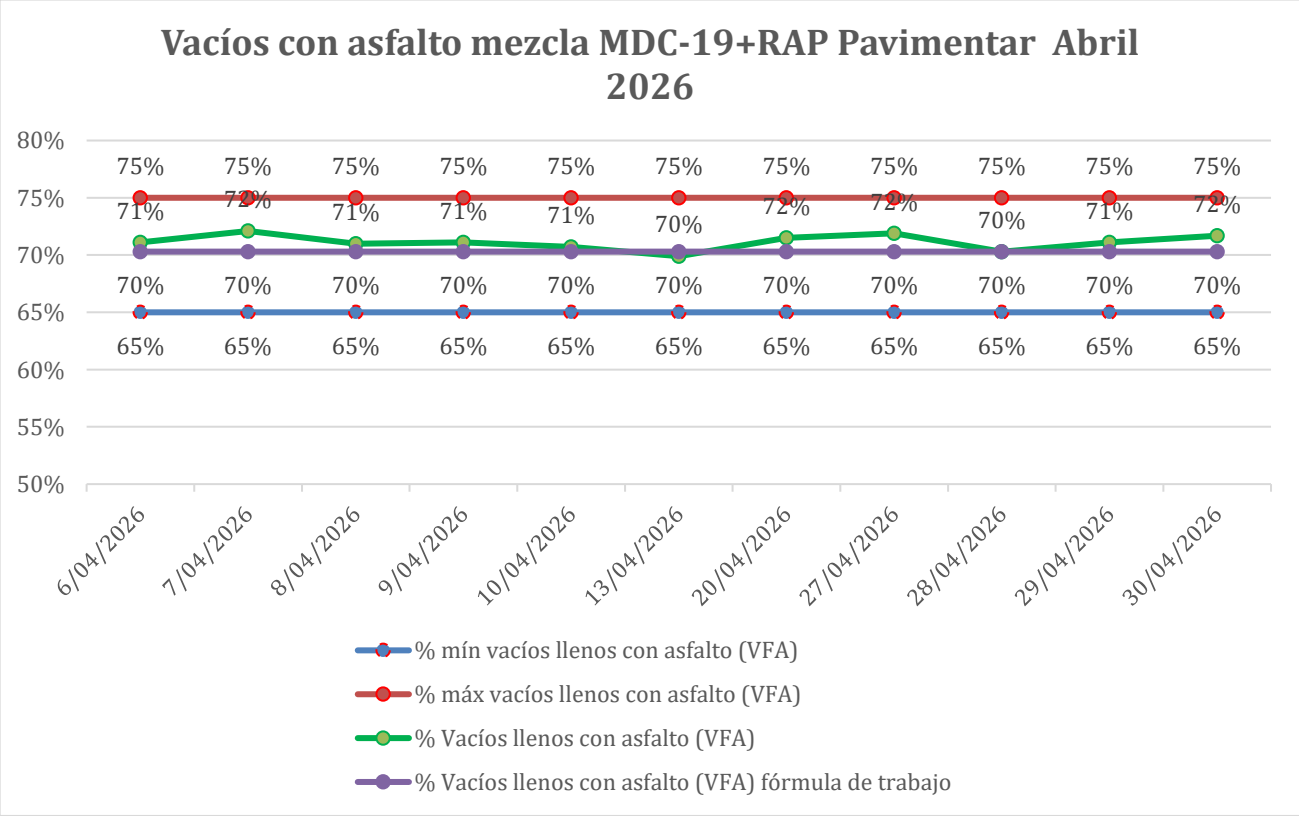

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

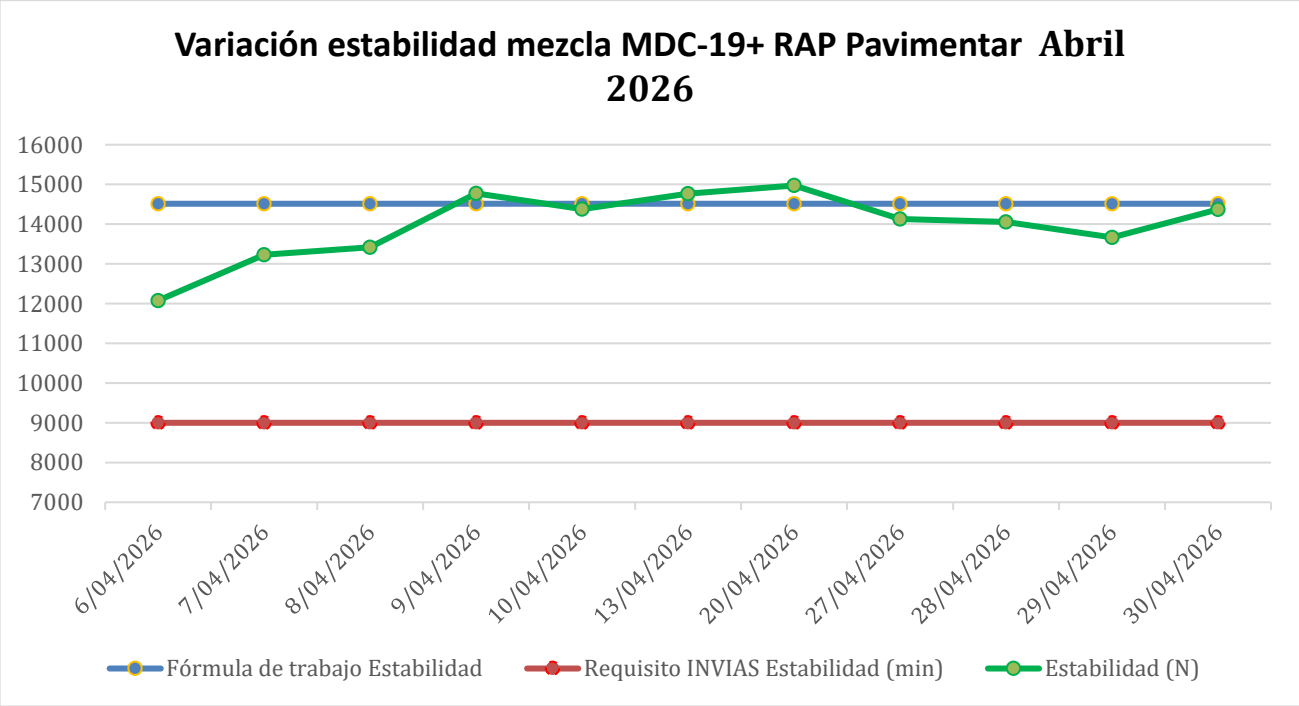

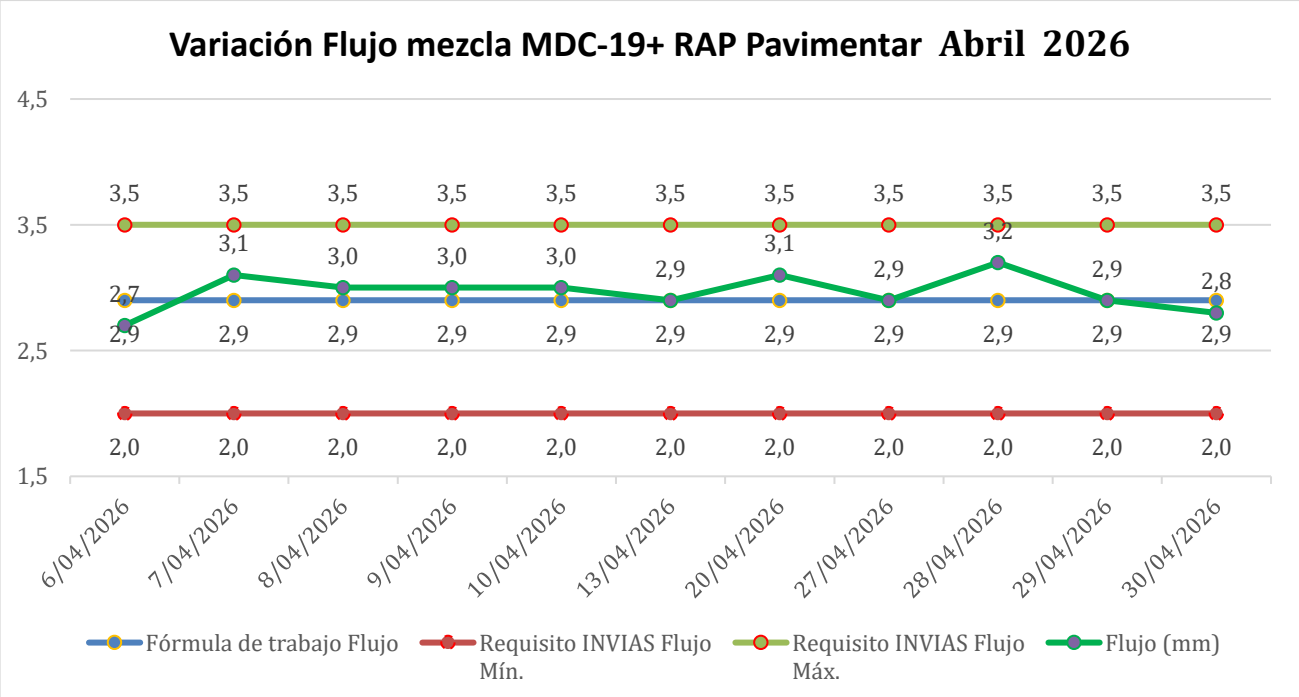



CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Parámetros mezcla MSC-19 TIBIA+RAP Pavimentar


Fecha	Tipo de Mezcla	% Asfalto mezclas instaladas	% vacios con aire (VA)	% vacios en el agregado mineral (VAM) fórmula de trabajo	Estabilidad (N)	Flujo (mm)	Estabilidad/ flujo (Kn/mm)
6/04/2026	MSC-19+RAP	4,8	4,9%	71%	12836	3,1	4,2
7/04/2026	MSC-19+RAP	4,9	5,2%	71%	12478	2,9	4,3
8/04/2026	MSC-19+RAP	4,8	5,2%	69%	13088	2,8	4,7
9/04/2026	MSC-19+RAP	5,0	5,3%	69%	13300	2,7	4,9
10/04/2026	MSC-19+RAP	4,9	4,9%	71%	14584	3,0	4,9
Fórmula de trabajo							
Especificación INVIAS							


CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

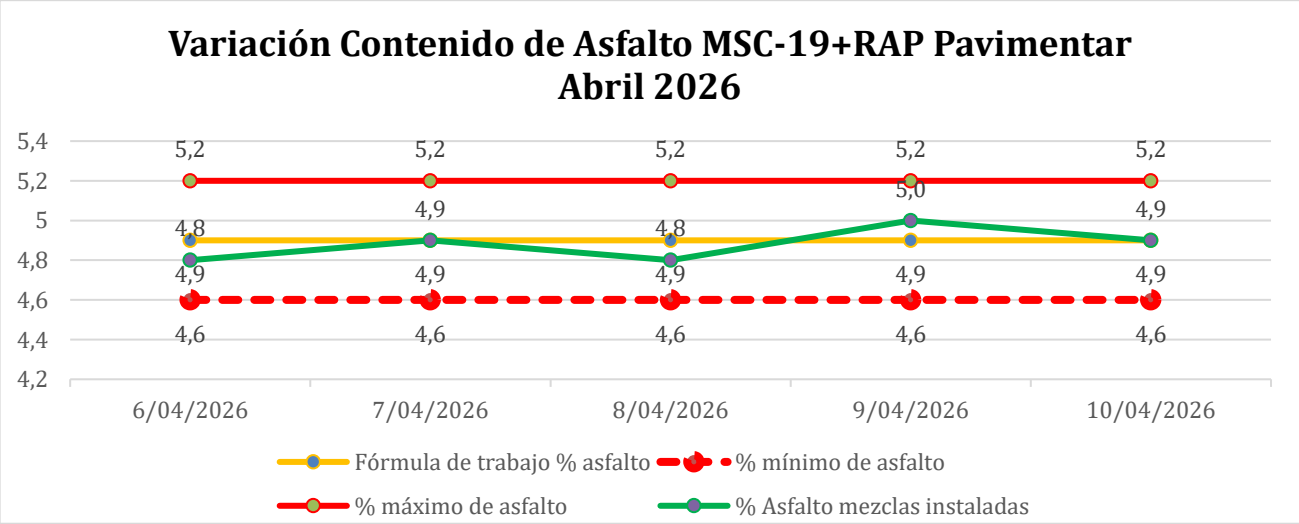

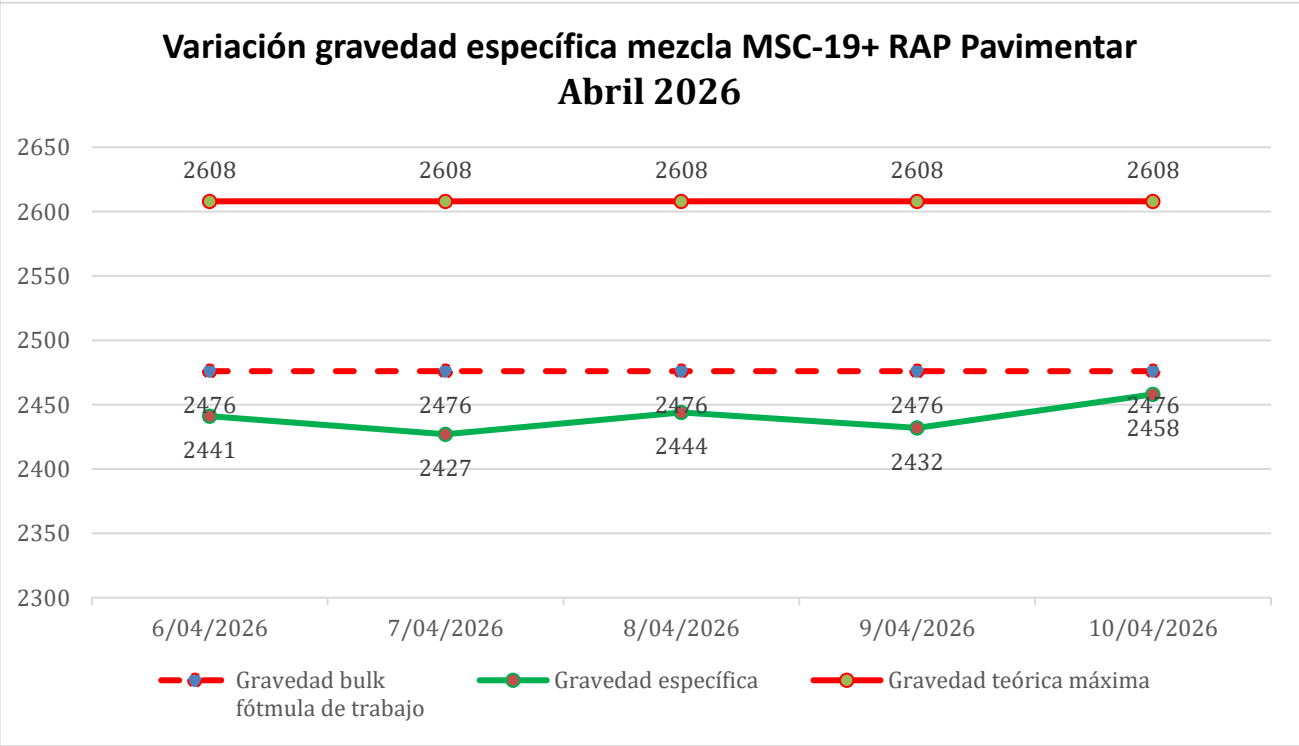



CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

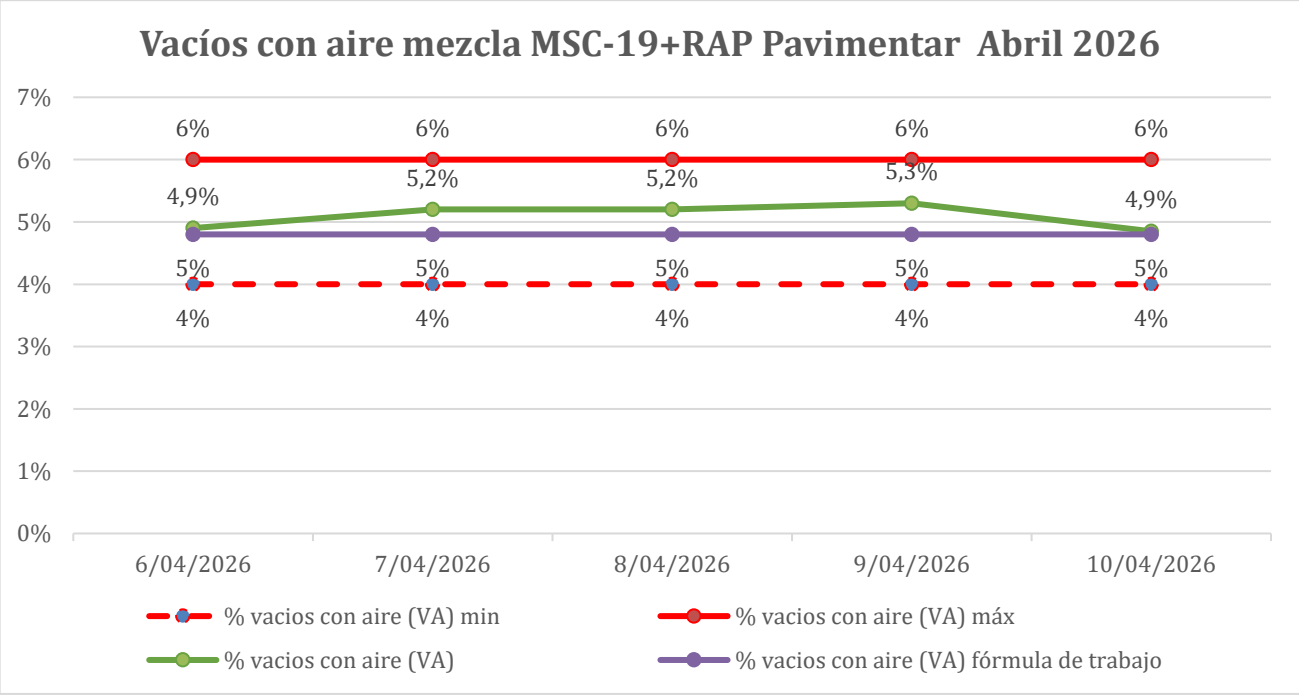

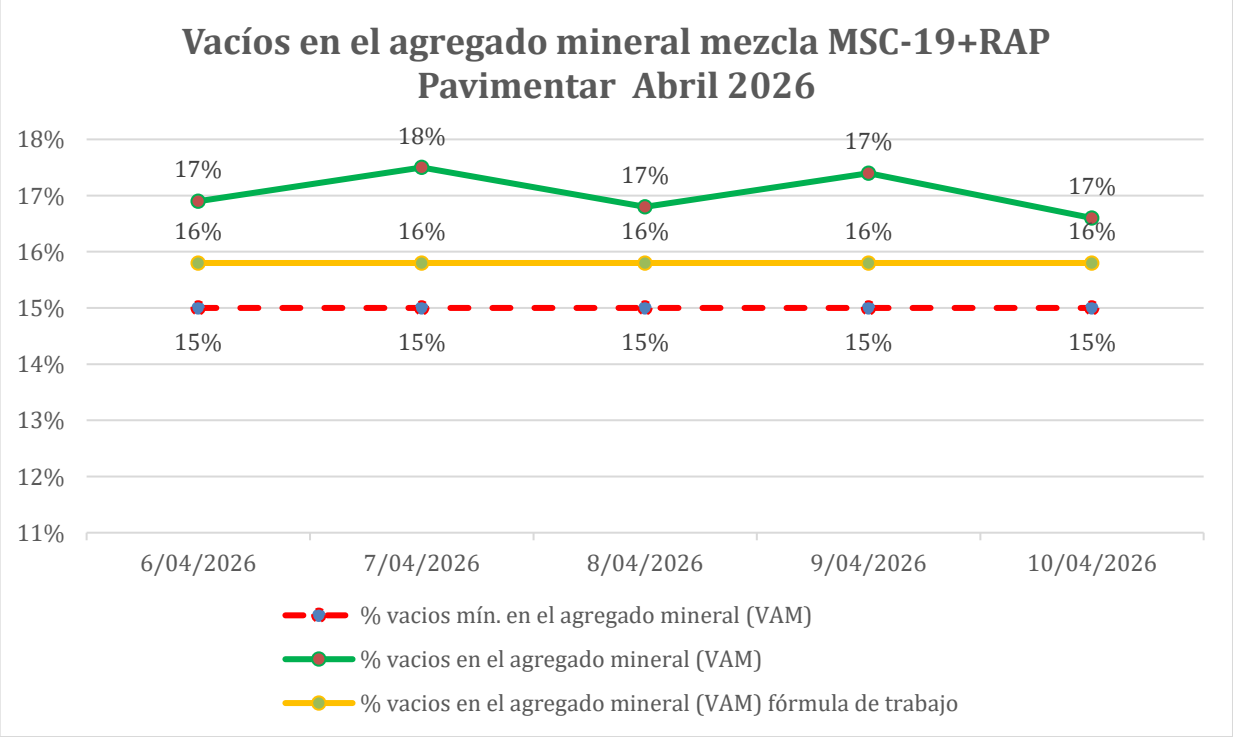


CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

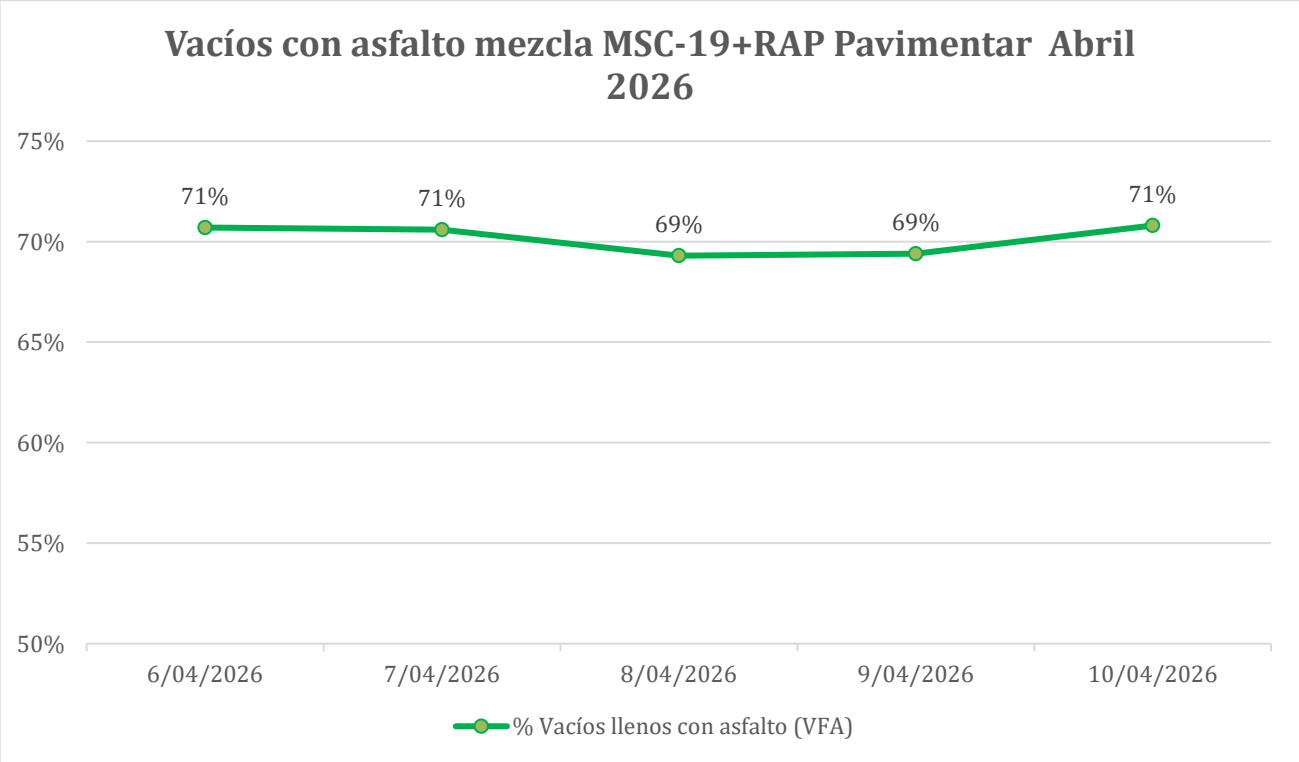

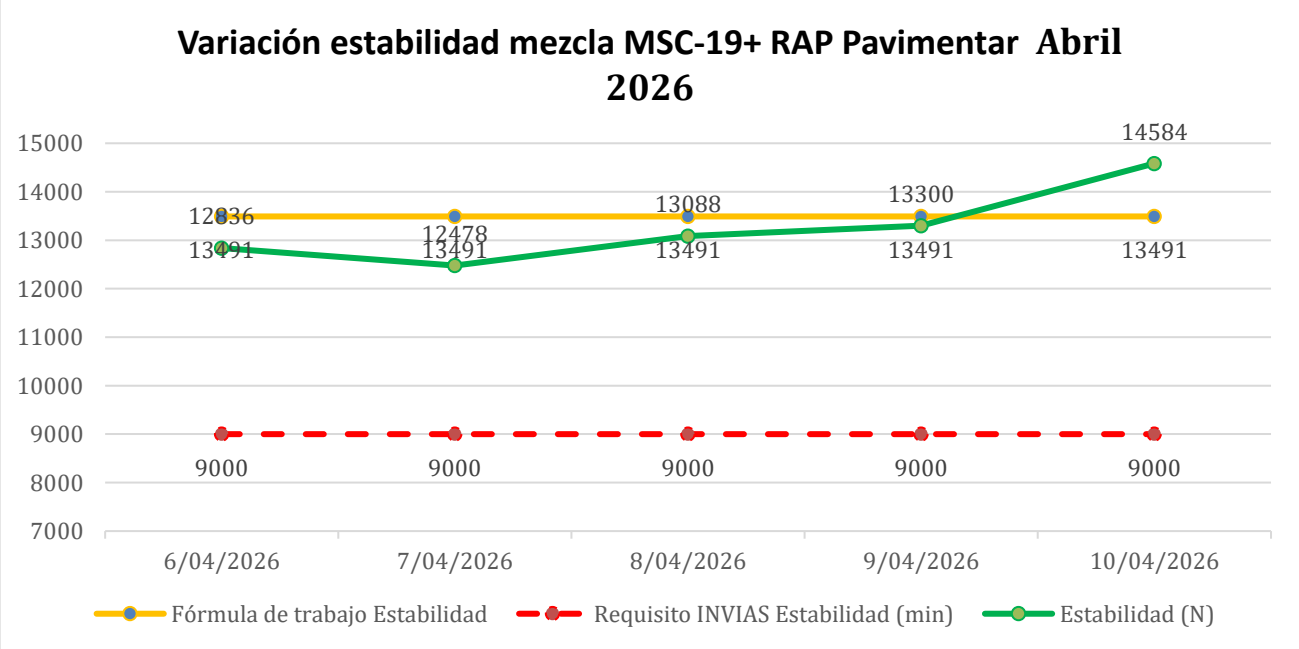

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

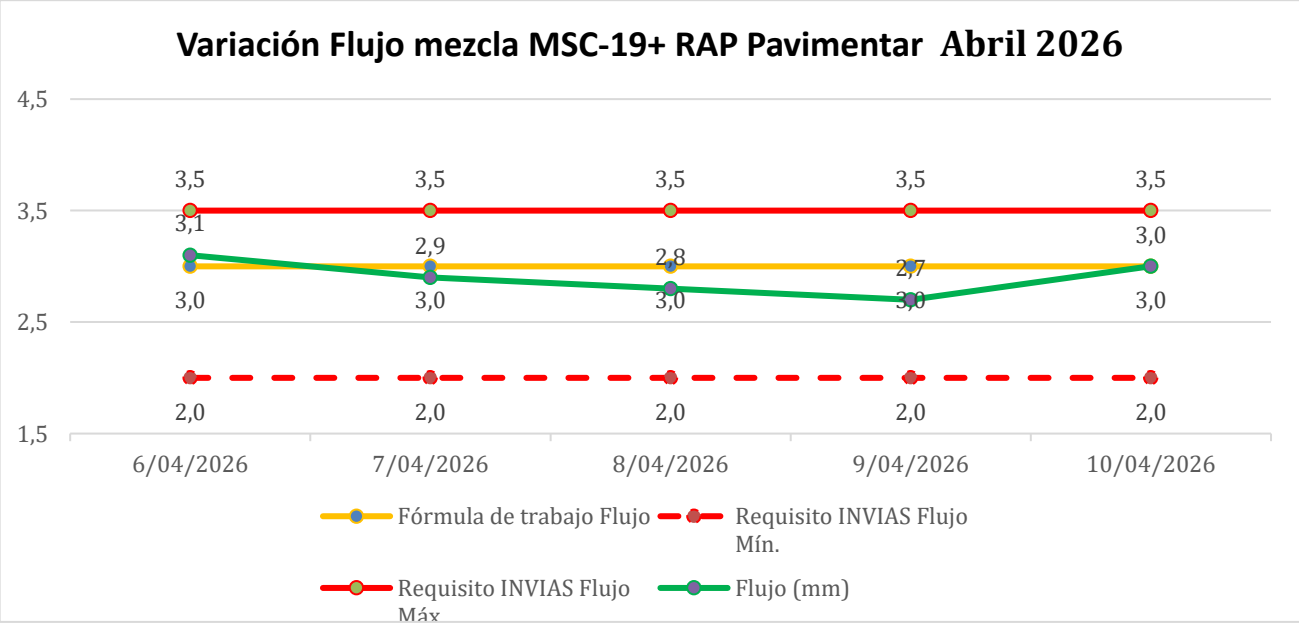

4.1 PLANTA PROCOPAL

4.1.1 Calidad del asfalto

Con base en los resultados de asfalto normalizado 60-70, aportados por MPI, utilizados en la producción de mezclas MDC-19 +RAP y MSC-19+ RAP, se verifica su conformidad con Norma INVIAS 2022.

CEMENTO ASFÁLTICO NORMALIZADO 60-70

ENSAYO	FECHA	RESULTADO	NORMA INVIAS	
			MINIMO	MAXIMO
Penetración (0,1mm)	18/09/2025	66	60	70
Punto de ablandamiento (°C)	18/09/2025	49,4	48	54
Índice de penetración	18/09/2025	-0,68	-1,2	0,6
Viscosidad absoluta a 60 °C (P)	18/09/2025	2498	1500	-
Ductilidad (cm)	18/09/2025	129	100	-
Solubilidad en tricloroetileno (%)	18/09/2025	99,48	99	-
Contenido de agua (%)	18/09/2025	0	-	0,2
Punto de ignición (°C)	18/09/2025	298	230	-
Contenido de parafinas (%)	18/09/2025	2,109	-	3
Peso específico 25~C (kg/m3)	18/09/2025	1,017	-	-
Pérdida de masa por calentamiento en película de masa en movimiento (%)	18/09/2025	-0,407	-	0,8
Penetración de residuo luego de pérdida por calentamiento (%)	18/09/2025	57,6	50	-
Incremento de punto de ablandamiento (°C)	18/09/2025	7,6	-	9
Índice de envejecimiento	18/09/2025	4	-	4
Temperatura de la mezcla (°C)	18/09/2025	135-145	-	-

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

ENSAYO	FECHA	RESULTADO	NORMA INVIAS	
			MINIMO	MAXIMO
Temperatura de compactación (°C)	18/09/2025	115-125	-	-
Grado de desempeño pg. asfalto original 60/70 (°C)	18/09/2025	64-22	-	-

4.1.2 Calidad de los materiales pétreos

La conformidad con la norma INVIAS de los materiales utilizados por la planta PROCOPAL para la producción de las mezclas asfálticas MDC-19 +RAP, MSC-19+ RAP, MSC-19+FIBRA y MSC-25 fue verificada periódicamente concluyendo el cumplimiento de las especificaciones. El Anexo 4 contiene los resultados de los ensayos realizados a los agregados.

4.1.3 Resultados Ensayos diarios parámetros diseño

A continuación, se presentan los resultados de los parámetros obtenidos en las plantas de producción de las mezclas asfálticas. Los resultados muestran el cumplimiento de especificaciones y por tanto la conformidad con la norma INVIAS 2022.

4.1.3.1 Granulometría

De la tabla y gráfica siguientes se concluye que las granulometrías de los pétreos utilizados en la producción de las mezclas asfálticas de PROCOPAL, están dentro de los rangos la fórmula de trabajo y de la norma INVIAS.

4.1.3.2 Parámetros de diseño

Los siguientes son los resultados obtenidos para los ensayos diarios de mezcla asfáltica MDC-19+RAP y MSC-19+RAPsuministradas por PROCOPAL, la respectiva verificación con la fórmula de trabajo y la especificación INVIAS, de donde se concluye que las mezclas instaladas cumplieron con los parámetros de diseño y especificaciones del INVIAS.

5 ENSAYOS DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS

De acuerdo con el plan de inspección y ensayos, el Consorcio Vialmed 2025, realizará un ensayo adicional semanal por mezcla instalada. En el anexo 10 se encuentran los resultados de dichos ensayos, realizados por EVALTEC Evaluaciones Técnicas S.A.S.

6 RESULTADOS EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS EN CAMPO

En el mes de Abril de 2026, se llevó a cabo la extracción de núcleos en campo sobre los pavimentos instalados en el alcance de este contrato. La elección de los sitios para extracción de

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

núcleos y el cálculo del porcentaje de compactación, estuvieron determinados por el tipo de intervención, así:

Tipo de intervención	Cantidad de núcleos	Periodicidad
Baches	2 por cuadrilla	Semanal
Fresado y pavimento	5 por cuadrilla	Semanal

6.1 ENSAYOS DE CAMPO

De estos núcleos se obtuvieron densidades que fueron verificadas con base en las especificaciones técnicas. Estos resultados se presentan en la siguiente tabla:

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Nucleo N°	Localizacion	Cuadrilla #	Comuna	Sector	Semana	Fecha de Regado	Jornada	Planta	Tipo de Intervención	Tipo de mezcla	Documento	Resultado individual	Resultado promedio o GCI (90)	Especificación	Cumplimiento promedio	Espesor	Espesor de diseño
835	Cl29 (Av. Pintuco) con CR43 [Despues del Puente], + 24mts carril derecho en sentido del flujo. Ver imagen	16	10	San Diego	25	8/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MAM-25	CL-0561-26-653-01-187 Rev0	96,4%	95,9%	93,0 %	CONFORME	21,90	20,00
836	Cl29 (Av. Pintuco) con CR43 [Despues del Puente], + 39mts carril derecho en sentido del flujo. Ver imagen	16	10	San Diego	25	8/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MAM-25	CL-0561-26-653-01-187 Rev0	96,0%				22,70	20,00
837	Cl29 (Av. Pintuco) con CR43 [Despues del Puente], + 53mts carril derecho en sentido del	16	10	San Diego	25	8/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MAM-25	CL-0561-26-653-01-187 Rev0	96,2%				19,70	20,00

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

	flujo. Ver imagen																
838	Cl29 (Av. Pintuco) con CR43 [Despues del Puente], + 64mts carril derecho en sentido del flujo. Ver imagen	16	10	San Diego	25	8/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MAM-25	CL-0561-26-653-01-187 Rev0	95,3%				24,20	20,00
839	Cl29 (Av. Pintuco) con CR43 [Despues del Puente], + 77mts carril derecho en sentido del flujo. Ver imagen	16	10	San Diego	25	8/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MAM-25	CL-0561-26-653-01-187 Rev0	95,8%				23,40	20,00
840	CR 29 CL 5 CL 6 + 10 M , SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE, COSTADO SUR	21	14	EL TESORO	25	9/01/2026	Nocturna	Pavimentar	RANGO 4	MSC-19 + RAP	CL-0562-26-653-01-188 Rev0	94,3%	94,4%	93,0 %	CONFORME	11,43	10,00

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

841	CR 29 CL 5 CL 6 + 20 M , SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE, COSTADO SUR	21	14	EL TESORO	25	9/01/2026	Nocturna	Pavimentar	RANGO 4	MSC-19 + RAP	CL-0562-26-653-01-188 Rev0	95,5%				12,58	10,00
842	CR 29 CL 5 CL 6 + 30 M , SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE, COSTADO SUR	21	14	EL TESORO	25	9/01/2026	Nocturna	Pavimentar	RANGO 4	MSC-19 + RAP	CL-0562-26-653-01-188 Rev0	92,8%				9,86	10,00
843	CR 29 CL 5 CL 6 + 40 M , SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE, COSTADO SUR	21	14	EL TESORO	25	9/01/2026	Nocturna	Pavimentar	RANGO 4	MSC-19 + RAP	CL-0562-26-653-01-188 Rev0	94,8%				10,24	10,00
844	CR 29 CL 5 CL 6 + 50 M , SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE, COSTADO SUR	21	14	EL TESORO	25	9/01/2026	Nocturna	Pavimentar	RANGO 4	MSC-19 + RAP	CL-0562-26-653-01-188 Rev0	94,6%				13,95	10,00
850	CL 18 sur 35	2	14	El Diamante N2	26	13/01/2026	Diurna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP	CL-0563-26-653-01-189 Rev0	92,1%	92,7%	98,0 %		14,00	10,00
851	CL 18 sur 35-56	2	14	El Diamante N2	26	13/01/2026	Diurna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP	CL-0563-26-653-01-189 Rev0	93,2%				16,90	10,00

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

852	Cl 64 CR 93 - 10	3	7	Cucaracho, Robledo	26	14/01/2026	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP	CL-0563-26-653-01-189 Rev0	93,5%	93,6%	98,0 %		10,82	10,00
853	Cl 64 CR 91D - 190	3	7	Cucaracho, Robledo	26	14/01/2026	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP	CL-0563-26-653-01-189 Rev0	93,7%				8,76	10,00
854	Cl 24 # 65D - 15	6	15	Trinidad	26	13/01/2026	Diurna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP	CL-0563-26-653-01-189 Rev0	93,1%	93,1%	98,0 %		14,65	10,00
855	Cl 24 # 65D - 15	6	15	Trinidad	26	13/01/2026	Diurna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP	CL-0563-26-653-01-189 Rev0	93,0%				14,26	N/A
856	CL 98 CR 85A-34	7	6	Picachito	26	13/01/2026	Diurna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP	CL-0564-26-653-01-190 Rev0	95,5%	94,2%	98,0 %		11,73	N/A
857	CL 98 CR 85A-24	7	6	Picachito	26	13/01/2026	Diurna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP	CL-0564-26-653-01-190 Rev0	92,8%				12,08	N/A
858	CR 52 CL 109B-33 LA FRANCIA	8	2	LA FRANCIA	26	14/01/2026	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP	CL-0565-26-653-01-191 Rev0	99,0%	99,7%	98,0 %	CONFORME	13,68	N/A
859	CR 52 CL 109B-33 LA FRANCIA	8	2	LA FRANCIA	26	14/01/2026	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP	CL-0565-26-653-01-191 Rev0	100,3%				15,46	N/A
860	CL 65 CR 74B-109	9	7	SAN GERMAN	26	14/01/2026	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP	CL-0565-26-653-01-191 Rev0	94,8%	95,3%	98,0 %		17,66	N/A
861	CL 65 CR 74C-11	9	7	SAN GERMAN	26	14/01/2026	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP	CL-0565-26-653-01-191 Rev0	95,8%				12,96	N/A
862	CL 73 CR 45A - 05	11	4	Manriquе central No.1	26	14/01/2026	Diurna	Procopal	bache	MDC-19 + RAP	CL-0565-26-653-01-191 Rev0	95,1%	95,1%	98,0 %		19,31	N/A

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

863	CR 45A CL 73 - 20	11	4	Manriquе central No.1	26	14/01/2026	Diurna	Procopal	bache	MDC-19 + RAP	CL-0565-26-653-01-191 Rev0	94,0%	94,0%	98,0 %		10,57	N/A
864	CL 103 CR 45 CR 45A	13	2	Moscú	26	13/01/2026	Diurna	Pavimentar	REHABILITACION	MSC-19 + RAP	CL-0566-26-653-01-192 Rev0	98,6%	98,2%	98,0 %	CONFORME	20,53	N/A
865	CL 103 CR 45 CR 45A	13	2	Moscú	26	13/01/2026	Diurna	Pavimentar	REHABILITACION	MSC-19 + RAP	CL-0566-26-653-01-192 Rev0	97,7%				26,20	N/A
866	CR 82 CL 42D - 03 (junto a reductor)	14	12	La America	26	15/01/2026	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP	CL-0564-26-653-01-190 Rev0	97,2%	96,9%	98,0 %		13,82	N/A
867	CR 82 CL 42D - 29 (junto a reductor)	14	12	La America	26	15/01/2026	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP	CL-0564-26-653-01-190 Rev0	96,6%				11,49	N/A
878	Av. Oriental CR9 CR50A [Punto referencia puente peatonal], +79mts carril derecho en sentido del flujo. Ver imagen	16	10	Prado	26	15/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	SMA	CL-0567-26-653-01-193 Rev0	95,5%	94,5%	93,0 %	CONFORME	5,79	5,00
879	Av. Oriental CR9 CR50A [Punto referencia puente peatonal], + 105mts carril derecho en	16	10	Prado	26	15/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	SMA	CL-0567-26-653-01-193 Rev0	94,3%				5,67	5,00


CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com


	sentido del flujo. Ver imagen																
880	Av. Oriental CR9 CR50A [Punto referencia puente peatonal], + 127mts carril derecho en sentido del flujo. Ver imagen	16	10	Prado	26	15/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	SMA	CL-0567-26-653-01-193 Rev0	94,1%				6,29	5,00
881	Av. Oriental CR9 CR50A [Punto referencia puente peatonal], + 152mts carril izquierdo en sentido del flujo. Ver imagen	16	10	Prado	26	15/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	SMA	CL-0567-26-653-01-193 Rev0	94,5%				4,93	5,00
882	Av. Oriental CR9 CR50A [Punto referencia puente peatonal], + 180mts carril izquierdo en sentido del flujo. Ver imagen	16	10	Prado	26	15/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	SMA	CL-0567-26-653-01-193 Rev0	94,0%				7,05	5,00

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

888	CR 29 CL 6A + 10 M , SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE, COSTADO Norte	21	14	EL TESORO	26	16/01/2026	Nocturna	Pavimentar	RANGO 4	MSC-19 + RAP	CL-0568-26-653-01-194 Rev0	93,8%	93,8%	93,0 %	CONFORME	11,28	10,00
889	CR 29 CL 6A + 20 M , SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE, COSTADO Norte	21	14	EL TESORO	26	16/01/2026	Nocturna	Pavimentar	RANGO 4	MSC-19 + RAP	CL-0568-26-653-01-194 Rev0	92,8%				10,25	10,00
890	CR 29 CL 6A + 30 M , SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE, COSTADO Norte	21	14	EL TESORO	26	16/01/2026	Nocturna	Pavimentar	RANGO 4	MSC-19 + RAP	CL-0568-26-653-01-194 Rev0	93,3%				11,20	10,00
891	CR 29 CL 6A + 40 M , SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE, COSTADO Norte	21	14	EL TESORO	26	16/01/2026	Nocturna	Pavimentar	RANGO 4	MSC-19 + RAP	CL-0568-26-653-01-194 Rev0	94,6%				11,18	10,00
892	CR 29 CL 6A + 50 M , SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE, COSTADO Norte	21	14	EL TESORO	26	16/01/2026	Nocturna	Pavimentar	RANGO 4	MSC-19 + RAP	CL-0568-26-653-01-194 Rev0	94,3%				11,35	10,00

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

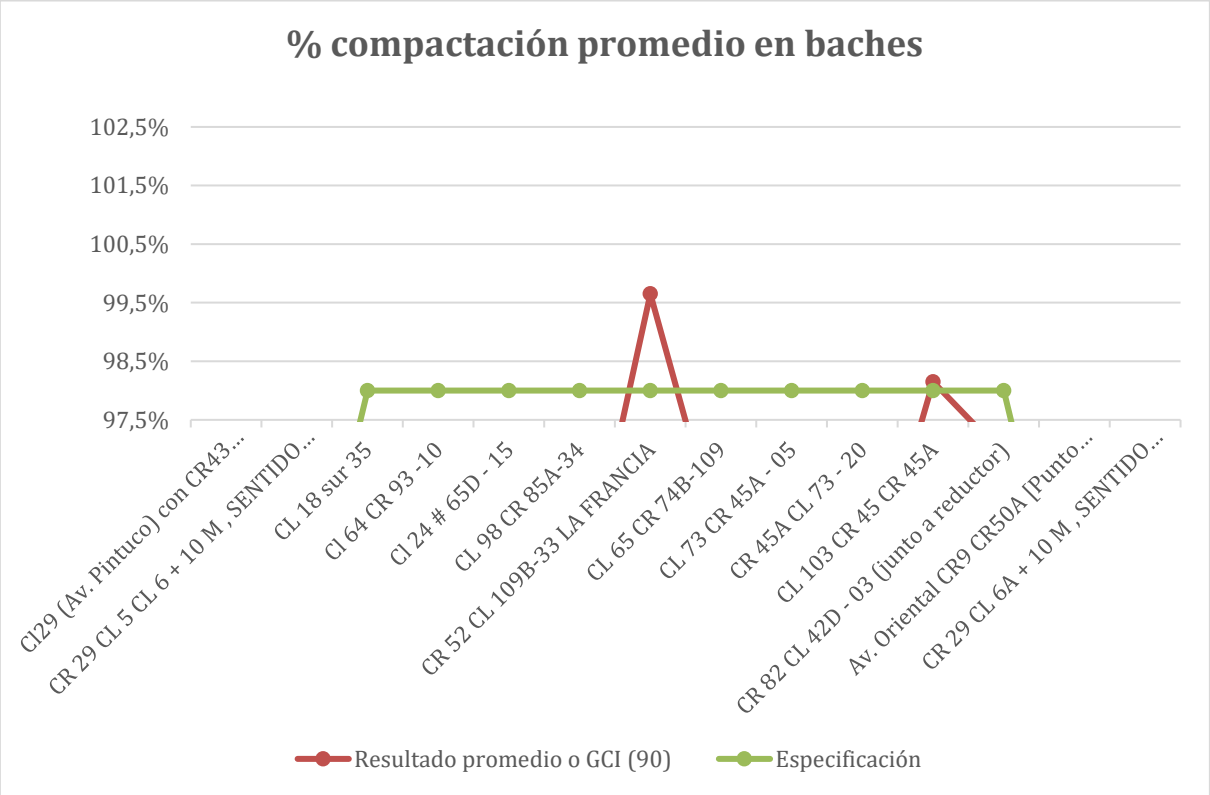

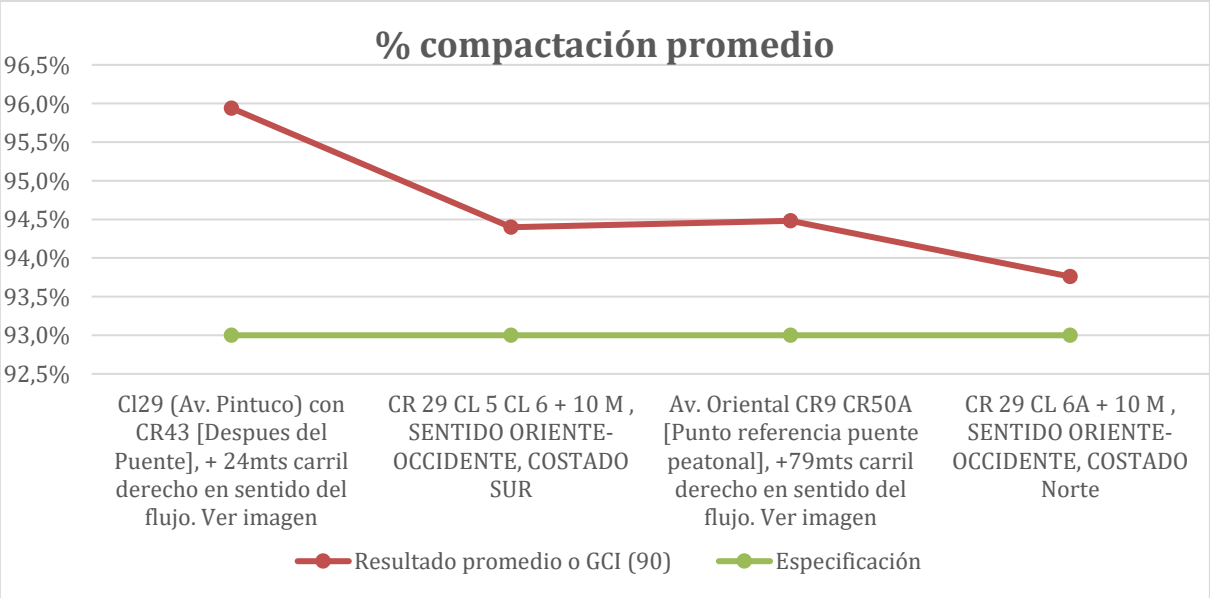

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Como puede observarse las densidades promedio obtenidas en el pavimento instalado están cumpliendo con las especificaciones INVIAS correspondientes.


Los resultados y gráficas anteriores corresponden a la información disponible entregada por Inteinsa hasta la fecha de corte de este informe.

6.2 ESPESORES DE PAVIMENTO INSTALADO

Para el periodo, se presentan resultado de baches en los cuales se obtuvo un espesor promedio de 15.01 cm.

Núcleo N°	Localización	Espesor	Espesor promedio
835	Cl29 (Av. Pintuco) con CR43 [Despues del Puente], + 24mts carril derecho en sentido del flujo. Ver imagen	21,90	15,01
840	CR 29 CL 5 CL 6 + 10 M , SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE, COSTADO SUR	11,43	14,38
850	CL 18 sur 35	14,00	14,68
852	Cl 64 CR 93 -10	10,82	14,75
854	Cl 24 # 65D - 15	14,65	15,24
856	CL 98 CR 85A-34	11,73	15,33
858	CR 52 CL 109B-33 LA FRANCIA	13,68	15,93
860	CL 65 CR 74B-109	17,66	16,38
862	CL 73 CR 45A - 05	19,31	16,06
863	CR 45A CL 73 - 20	10,57	14,97
864	CL 103 CR 45 CR 45A	20,53	17,18
866	CR 82 CL 42D - 03 (junto a reductor)	13,82	13,82
878	Av. Oriental CR9 CR50A [Punto referencia puente peatonal], +79mts carril derecho en sentido del flujo. Ver imagen	5,79	8,54
888	CR 29 CL 6A + 10 M , SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE, COSTADO Norte	11,28	11,28


CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

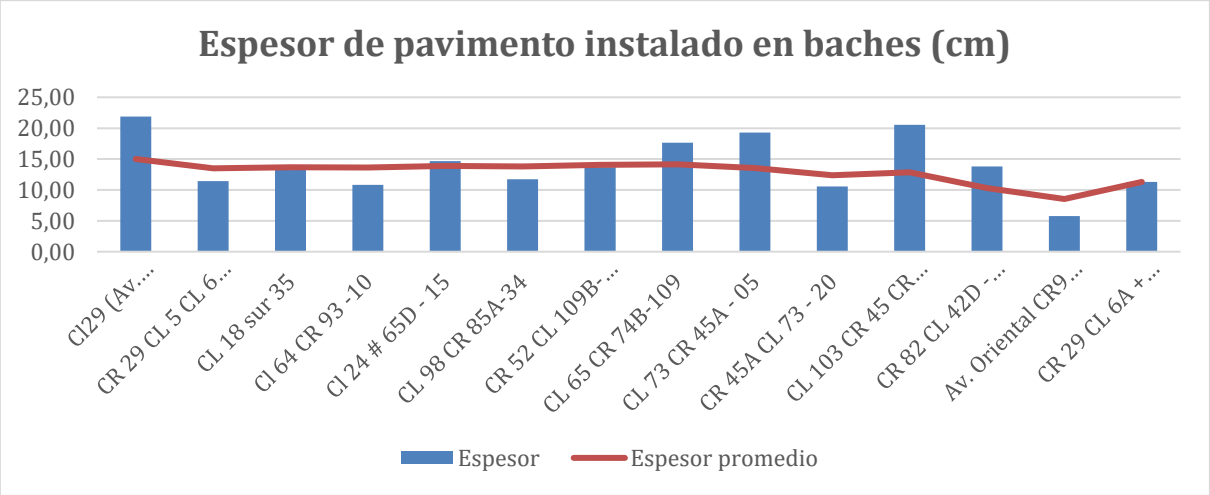

Adicional, se presentan resultado de masivos y rehabilitación en los cuales se obtuvo un espesor promedio de 11.98 cm.

Núcleo N°	Localización	Espesor	Espesor de diseño	Espesor promedio
835	Cl29 (Av. Pintuco) con CR43 [Despues del Puente], + 24mts carril derecho en sentido del flujo. Ver imagen	21,90	20,00	16,67
840	CR 29 CL 5 CL 6 + 10 M , SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE, COSTADO SUR	11,43	10,00	11,43
878	Av. Oriental CR9 CR50A [Punto referencia puente peatonal], +79mts carril derecho en sentido del flujo. Ver imagen	5,79	5,00	8,54
888	CR 29 CL 6A + 10 M , SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE, COSTADO Norte	11,28	10,00	11,28

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

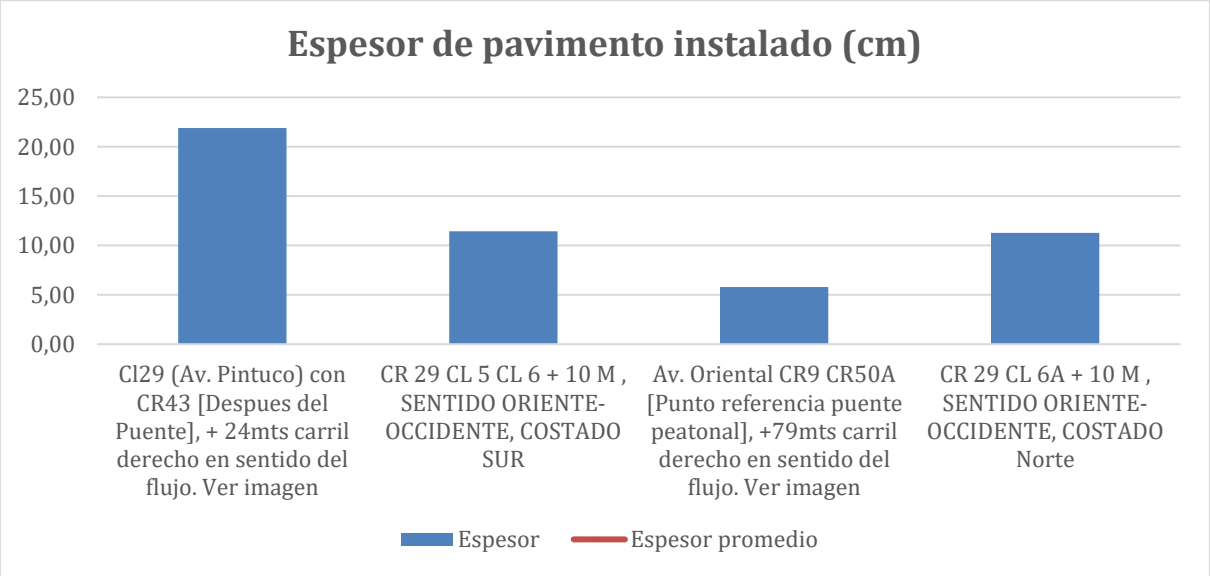

A la fecha de corte de este informe aún no se tienen algunos de los resultados de la extracción de núcleos solicitados en el mes de noviembre, sin embargo, se envió y se programó con el laboratorio la extracción de núcleos y el cálculo del porcentaje de compactación. Las siguientes son las direcciones seleccionadas para la verificación de la conformidad:

Nucleo N°	Localizacion	Cuadrilla #	Comuna	Sector	Semana	Fecha de Regado	Jornada	Planta	Tipo de Intervención	Tipo de mezcla
651	Cl 80 50c-13	8	4	MIRANDA	19	26/11/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
652	Cl 80 50c-25	8	4	MIRANDA	19	26/11/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
653	Cr 46 Cl 27-119	9	14	BARRIO COLOMBIA	19	26/11/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
654	Cr 46 Cl 27-113	9	14	BARRIO COLOMBIA	19	26/11/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
671	CR 39 CL 55-23	2	10	Boston	20	1/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
672	CL 56 CR 39 – 8	2	10	Boston	20	1/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
673	CL 70 CR 152ª – 245	3	60	Vereda El Uvito de San Cristóbal	20	3/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
674	CL 70 CR 152ª – 304	3	60	Vereda El Uvito de San Cristóbal	20	3/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

675	CR 55 CL 47ª SUR-50	4	80	San Antonio de Prado	20	3/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
676	CR 55 CL 47ª SUR-50	4	80	San Antonio de Prado	20	3/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
677	CR 53 CL 30ª +8.00m	5	16	Cerro Nutibara	20	2/12/2025	Nocturna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP
678	CR 53 CL 30ª +22.00m	5	16	Cerro Nutibara	20	2/12/2025	Nocturna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP
679	Cl 44E # 8B – 7	6	9	Bombona No. 2	20	1/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
680	Cl 44E # 8B – 7	6	9	Bombona No. 2	20	1/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
681	CL 102 CR 64-95	7	5	Belalcázar	20	3/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
682	CL 102 CR 64-89	7	5	Belalcázar	20	3/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
683	CR 50ª CL 82	8	4	Brasilia	20	3/12/2025	Diurna	Procopal	FALLOS	MDC-19 + RAP
684	CR 50B CL 81ª-06	8	4	Brasilia	20	3/12/2025	Diurna	Procopal	FALLOS	MDC-19 + RAP
685	Cr 25 Cl 56ª-25	9	8	El Pinal	20	3/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
686	CL 56ª CR 25-17	9	8	El Pinal	20	3/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
687	CR 41 CL 82-53	11	3	Manrique – Campo Valdez No 2	20	4/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
688	CR 41 CL 81-57	11	3	Manrique – Campo Valdez No 2	20	4/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
689	CR 36B CL 5 y 5B	13	14	LA FLORIDA	20	2/12/2025	Diurna	Procopal	REHABILITACION	MSC-19 + RAP
690	CR 36B CL 5 y 5B	13	14	LA FLORIDA	20	2/12/2025	Diurna	Procopal	REHABILITACION	MSC-19 + RAP
691	Cr 89db # 30ab – 59	14	16	Las Violetas	20	4/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
692	Cr 89db # 30ab – 30	14	16	Las Violetas	20	4/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
693	Cl29 con CR44, + 16mts	16	15	Barrio Colombia	20	3/12/2025	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MSC-19+FIBRA
694	Cl29 con CR44, + 36mts	16	15	Barrio Colombia	20	3/12/2025	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MSC-19+FIBRA
695	Cl29 con CR44, + 53mts	16	15	Barrio Colombia	20	3/12/2025	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MSC-19+FIBRA
696	Cl29 con CR44, + 72mts	16	15	Barrio Colombia	20	3/12/2025	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MSC-19+FIBRA
697	Cl29 con CR44,+ 23mts	16	15	Barrio Colombia	20	3/12/2025	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MSC-19+FIBRA
698	Cl37(AV.33) con CR46, + 15mts	16	15	Perpetuo socorro	20	5/12/2025	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MSC-19+FIBRA
699	Cl37(AV.33) con CR46, + 35mts	16	15	Perpetuo socorro	20	5/12/2025	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MSC-19+FIBRA

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

700	Cl37(AV.33) con CR46, + 48mts	16	15	Perpetuo socorro	20	5/12/2025	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MSC-19+FIBRA
701	Cl37(AV.33) con CR46, + 65mts	16	15	Perpetuo socorro	20	5/12/2025	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MSC-19+FIBRA
702	Cl37(AV.33) con CR46, + 79 mts	16	15	Perpetuo socorro	20	5/12/2025	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MSC-19+FIBRA
703	Cl30 con CR66B, + 35mts	16	15	Juan Pablo II, Belén	20	1/12/2025	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MSC-19+FIBRA
704	Cl30 con CR66B, + 79mts	16	15	Juan Pablo II, Belén	20	1/12/2025	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MSC-19+FIBRA
705	Cl30 con CR66B, + 123mts	16	15	Juan Pablo II, Belén	20	1/12/2025	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MSC-19+FIBRA
706	Cl30 con CR66B, + 153mts	16	15	Juan Pablo II, Belén	20	1/12/2025	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MSC-19+FIBRA
707	Cl30 con CR66B, + 194mts	16	15	Juan Pablo II, Belén	20	1/12/2025	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MSC-19+FIBRA
708	Cl 46 # 56 – 58	21	10	Corazón de Jesús	19	3/12/2025	Nocturna	Pavimentar	R4	MSC-19 + RAP
709	Cl 46 # 56 – 44	21	10	Corazón de Jesús	19	3/12/2025	Nocturna	Pavimentar	R4	MSC-19 + RAP
710	Cl 46 # 56 – 42	21	10	Corazón de Jesús	19	3/12/2025	Nocturna	Pavimentar	R4	MSC-19 + RAP
711	Cl 46 # 56 – 34	21	10	Corazón de Jesús	19	3/12/2025	Nocturna	Pavimentar	R4	MSC-19 + RAP
712	Cl 46 # 56 – 26	21	10	Corazón de Jesús	19	3/12/2025	Nocturna	Pavimentar	R4	MSC-19 + RAP
713	CL 1B Sur CR 30 – 41	2	14	LOS NARANJOS	21	12/12/202	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
714	CL 1B Sur CR 30 – 58	2	14	LOS NARANJOS	21	12/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
715	CL 62D CR 108BB – 65	3	60	Área expansión de Pajarito	21	10/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
716	CL 62D CR 110 – 77+100m	3	60	Área expansión de Pajarito	21	10/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
717	CR 74 CL 60 - 23	4	7	ROBLEDO SAN GERMAN	21	12/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
718	CR 74 CL 60 - 25	4	7	ROBLEDO SAN GERMAN	21	12/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
719	CR 32 CL 16 +9.00m	5	9	LA ASOMADERA N2	21	9/12/2025	Nocturna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP
720	CR 32 CL 16 +8.00m	5	9	LA ASOMADERA N2	21	9/12/2025	Nocturna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP
721	Cr 9 # 52 – 53	6	9	Las Estancias	21	9/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
722	Cr 9 # 53 – 24	6	9	Las Estancias	21	9/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
723	CL27A CR 80	7	16	Belen La Palma	21	11/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
724	CL27A CR 80-09	7	16	Belen La Palma	21	11/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
725	CR 51 CL 68	8	4	SAN PEDRO	21	10/12/2025	Diurna	Procopal	FALLOS	MDC-19 + RAP
726	CR 51 CL 68	8	4	SAN PEDRO	21	10/12/2025	Diurna	Procopal	FALLOS	MDC-19 + RAP

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

727	CR 24 CL 56C-78	9	8	EL PINAL	21	10/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
728	CR 24 CL 56C-78	9	8	EL PINAL	21	10/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
729	CR 35 CL 77-21	11	3	Manrique	21	11/12/2025	Diurna	Procopal	bache	MDC-19 + RAP
730	CR 35 CL 77-31	11	3	Manrique	21	11/12/2025	Diurna	Procopal	bache	MDC-19 + RAP
731	CL 34ª 84ª-228	13	SAP	El salado	21	9/12/2025	Diurna	Procopal	REHABILITACION	MSC-19 + RAP
732	CL 34ª 84ª-228	13	SAP	El salado	21	9/12/2025	Diurna	Procopal	REHABILITACION	MSC-19 + RAP
733	Cq 2 x Cr 73	14	11	Laureles	21	11/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 RAP
734	Cq 4 x Cr 73	14	11	Laureles	21	11/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 RAP
735	Cl 58 # 31 – 94	15	8	Enciso	21	12/12/2025	Diurna	Pavimentar	Rango 4	MSC-19 + RAP
736	Cl 58 # 31 – 114	15	8	Enciso	21	12/12/2025	Diurna	Pavimentar	Rango 4	MSC-19 + RAP
737	Cl 58 # 31 – 130	15	8	Enciso	21	12/12/2025	Diurna	Pavimentar	Rango 4	MSC-19 + RAP
738	Cl 59 con Cr 32	15	8	Enciso	21	12/12/2025	Diurna	Pavimentar	Rango 4	MSC-19 + RAP
739	Cl 59 # 32 – 02	15	8	Enciso	21	12/12/2025	Diurna	Pavimentar	Rango 4	MSC-19 + RAP
745	CR 28 CL 108E + 15m	17	1	SANTO DOMINGO SAVIO 2	21	12/12/2025	Nocturna	Procopal	Fallo	MSC-19+RAP
746	CR 28 CL 108E + 30m	17	1	SANTO DOMINGO SAVIO 2	21	12/12/2025	Nocturna	Procopal	Fallo	MSC-19+RAP
747	CR 28 CL 108E + 45m	17	1	SANTO DOMINGO SAVIO 2	21	12/12/2025	Nocturna	Procopal	Fallo	MSC-19+RAP
748	CR 28 CL 108E + 60m	17	1	SANTO DOMINGO SAVIO 2	21	12/12/2025	Nocturna	Procopal	Fallo	MSC-19+RAP
749	CR 28 CL 108E + 75m	17	1	SANTO DOMINGO SAVIO 2	21	12/12/2025	Nocturna	Procopal	Fallo	MSC-19+RAP
765	CL 11ª CR 31ª – 44	2	14	POBLADO	22	15/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
766	CL 11ª CR 31ª – 3	2	14	POBLADO	22	15/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
767	CL 68 CR 149 – 29	3	60	Travesias, San Cristobal	22	17/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
768	CL 68 CR 149 – 07	3	60	Travesias, San Cristobal	22	17/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
769	CR 74 CL 60 - 20	4	7	ROBLEDO SAN GERMAN	22	15/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
770	CR 74 CL 60 - 24	4	7	ROBLEDO SAN GERMAN	22	15/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
771	CR 45 #46-63	5	10	BARRIO COLON	22	16/12/2025	Nocturna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP
772	CR 45 #46-73	5	10	BARRIO COLON	22	16/12/2025	Nocturna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP
773	Cl 52 # 11 – 57	6	8	Las Estancias	22	15/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

774	Cl 52 # 11 – 63	6	8	Las Estancias	22	15/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
775	Cl 27ª CR 78ª – 51	7	16	La Palma	22	16/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
776	Cl 27ª CR 78ª – 32	7	16	La Palma	22	16/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
777	CR 50ª CL 106-90	8	2	LA FRANCIA	22	17/12/2025	Diurna	Procopal	FALLOS	MDC-19 + RAP
778	CR 50ª CL 106-92	8	2	LA FRANCIA	22	17/12/2025	Diurna	Procopal	FALLOS	MDC-19 + RAP
779	CR 23 CL 56BB-26	9	8	EL PINAL	22	17/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
780	CR 23 CL 56BB-32	9	8	EL PINAL	22	17/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
781	CR 43 CL 87 – 07	11	3	Manrique	22	18/12/2025	Diurna	Procopal	bache	MDC-19 + RAP
782	CR 43 CL 88 – 01	11	3	Manrique	22	18/12/2025	Diurna	Procopal	bache	MDC-19 + RAP
783	CL 42ª CR 21 CR 22ª-30	13	9	CATALUÑA	22	16/12/2025	Diurna	Procopal	REHABILITACION	MSC-19 + RAP
784	CL 42ª CR 21 CR 22ª-30	13	9	CATALUÑA	22	16/12/2025	Diurna	Procopal	REHABILITACION	MSC-19 + RAP
785	Cr 81 Cl 49 – 37	14	12	La América	22	18/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
786	Cr 81 Cl 49 – 09	14	12	La América	22	18/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
787	Calle 58 # 32-14	15	8	Enciso	21	15/12/2025	Diurna	Pavimentar	Fallo – rango4	MSC-19 + RAP
788	Calle 58 con Cr 35	15	8	Enciso	21	15/12/2025	Diurna	Pavimentar	Fallo – rango4	MSC-19 + RAP
789	Calle 58 # 35-02	15	8	Enciso	21	15/12/2025	Diurna	Pavimentar	Fallo – rango4	MSC-19 + RAP
790	Calle 58 # 35-18	15	8	Enciso	21	15/12/2025	Diurna	Pavimentar	Fallo – rango4	MSC-19 + RAP
791	Calle 58 # 35-34	15	8	Enciso	21	15/12/2025	Diurna	Pavimentar	Fallo – rango4	MSC-19 + RAP
792	CR 73 # 32ª (Cruce)	21	16	Belén	22	16/12/2025	Diurna	Procopal	R4	MSC-19 + RAP
793	CR 73 # 32 – 28	21	16	Belén	22	16/12/2025	Diurna	Procopal	R4	MSC-19 + RAP
794	CR 73 # 32 – 18	21	16	Belén	22	16/12/2025	Diurna	Procopal	R4	MSC-19 + RAP
795	CR 73 # 30c – 132	21	16	Belén	22	16/12/2025	Diurna	Procopal	R4	MSC-19 + RAP
796	CR 73 # 30c – 128	21	16	Belén	22	16/12/2025	Diurna	Procopal	R4	MSC-19 + RAP
802	Cl 1aa 66-06	2	15	CRISTO REY	23	22/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
803	Cl 1aa 66-06	2	15	CRISTO REY	23	22/12/2025	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
804	CR 92 CL 34D	13	13	Belencito	23	23/12/2025	Diurna	Procopal	REHABILITACION	MSC-19 + RAP
805	CR 92 CL 34D	13	13	Belencito	23	23/12/2025	Diurna	Procopal	REHABILITACION	MSC-19 + RAP
806	CL 16 A SUR CR 9F + 200	21	14	Los Balsos	23	22/12/2025	Diurna	Procopal	R4	MSC-19 + RAP
807	CL 16 A SUR CR 9F + 225	21	14	Los Balsos	23	22/12/2025	Diurna	Procopal	R4	MSC-19 + RAP

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

808	CL 16 A SUR CR 9F + 300	21	14	Los Balsos	23	22/12/2025	Diurna	Procopal	R4	MSC-19 + RAP
809	CL 16 A SUR CR 9F + 330	21	14	Los Balsos	23	22/12/2025	Diurna	Procopal	R4	MSC-19 + RAP
810	CL 16 A SUR CR 9F + 400	21	14	Los Balsos	23	22/12/2025	Diurna	Procopal	R4	MSC-19 + RAP
811	CR 53 ENTRE CL 70 Y CL 73 + 30 M	23	4	SEVILLA (UDEA)	23	23/12/2025	Diurna	Procopal	MASIVO	MSC-19+FIBRA
812	CR 53 ENTRE CL 70 Y CL 73 + 70 M	23	4	SEVILLA (UDEA)	23	23/12/2025	Diurna	Procopal	MASIVO	MSC-19+FIBRA
813	CR 53 ENTRE CL 70 Y CL 73 + 112 M	23	4	SEVILLA (UDEA)	23	23/12/2025	Diurna	Procopal	MASIVO	MSC-19+FIBRA
814	CR 53 ENTRE CL 70 Y CL 73 + 165 M	23	4	SEVILLA (UDEA)	23	23/12/2025	Diurna	Procopal	MASIVO	MSC-19+FIBRA
815	CR 53 ENTRE CL 70 Y CL 73 + 200 M	23	4	SEVILLA (UDEA)	23	23/12/2025	Diurna	Procopal	MASIVO	MSC-19+FIBRA
816	CL 10B 22-20	2	14	Altos del poblado	25	6/01/2026	Diurna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP
817	CL 10B 22-25	2	14	Altos del poblado	25	6/01/2026	Diurna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP
818	CR 143 # 68-153	3	60	Travesia San Cristobal	25	6/01/2026	Diurna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP
819	CR 143 # 68-173	3	60	Travesia San Cristobal	25	6/01/2026	Diurna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP
820	Cr 39B # 43 – 86	6	9	El Salvador	25	6/01/2026	Diurna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP
821	Cr 39B # 43 – 92	6	9	El Salvador	25	6/01/2026	Diurna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP
822	CL 68 CR 33-80	8	3	VERSALLES 1	25	7/01/2026	Diurna	Pavimentar	Fallos	MDC-19 + RAP
823	CL 68 CR 33-88	8	3	VERSALLES 1	25	7/01/2026	Diurna	Pavimentar	Fallos	MDC-19 + RAP
824	CL 56 CR 25ª-19	9	8	EL PINAL	25	7/01/2026	Diurna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP
825	CL 56 CR 25AA	9	8	EL PINAL	25	7/01/2026	Diurna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP
826	CR 64B – CL 111B	11	5	Hector Habad Gomez	25	7/01/2026	Diurna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP
827	CR 64B – CL 111B	11	5	Hector Habad Gomez	25	7/01/2026	Diurna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP
828	CR 92 CL 34D	13	13	Belencito	25	8/01/2026	Diurna	Pavimentar	Mantenimiento	MSC-19 + RAP
829	CR 92 CL 34D	13	13	Belencito	25	8/01/2026	Diurna	Pavimentar	Mantenimiento	MSC-19 + RAP
829 A	CR 77 CL 45B-115	14	11	Velódromo	25	8/01/2026	Diurna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP
829 B	CR 77 CL 45B-153	14	11	Velódromo	25	8/01/2026	Diurna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP
830	Cl29 con CR48 + 20mts	16	15	Santa fe	22	17/12/2025	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MSC-19+FIBRA
831	Cl29 con CR48 + 41mts	16	15	Santa fe	22	17/12/2025	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MSC-19+FIBRA

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

832	Cl29 con CR48 + 55mts	16	15	Santa fe	22	17/12/2025	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MSC-19+FIBRA
833	Cl29 con CR48 + 74mts	16	15	Santa fe	22	17/12/2025	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MSC-19+FIBRA
834	Cl29 con CR48 + 89mts	16	15	Santa fe	22	17/12/2025	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MSC-19+FIBRA
845	CR 53 ENTRE CL 70 Y CL 67 + 10 M	23	4	SEVILLA (UDEA)	25	8/01/2026	Diurna	Pavimentar	Masivo	MSC-25
846	CR 53 ENTRE CL 70 Y CL 67 + 50 M	23	4	SEVILLA (UDEA)	25	8/01/2026	Diurna	Pavimentar	Masivo	MSC-25
847	CR 53 ENTRE CL 70 Y CL 67 + 75 M	23	4	SEVILLA (UDEA)	25	8/01/2026	Diurna	Pavimentar	Masivo	MSC-25
848	CR 53 ENTRE CL 70 Y CL 67 + 90 M	23	4	SEVILLA (UDEA)	25	8/01/2026	Diurna	Pavimentar	Masivo	MSC-25
849	CR 53 ENTRE CL 70 Y CL 67 + 115 M	23	4	SEVILLA (UDEA)	25	8/01/2026	Diurna	Pavimentar	Masivo	MSC-25
868	Cl29 entre CR48 y CR45 + 25mts	15	14	Barrio Colombia	26	14/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MAM-25
869	Cl29 entre CR48 y CR45 + 50mts	15	14	Barrio Colombia	26	14/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MAM-25
870	Cl29entre CR48 y CR45+75mts	15	14	Barrio Colombia	26	14/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MAM-25
871	Cl29) entre CR48 y CR45 + 100mts	15	14	Barrio Colombia	26	14/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MAM-25
872	Cl29 entre CR48 y CR45 +125 mts	15	14	Barrio Colombia	26	14/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MAM-25
873	Cl29 entre CR45 y CR44, + 8mts	15	14	Barrio Colombia	27	19/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MAM-25
874	Cl29 entre CR45 y CR44, + 16mts carril	15	14	Barrio Colombia	27	19/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MAM-25
875	Cl29 entre CR45 y CR44, + 24mts carril	15	14	Barrio Colombia	27	19/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MAM-25
876	Cl29 entre CR45 y CR44, + 32mts	15	14	Barrio Colombia	27	19/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MAM-25
877	Cl29 entre CR45 y CR44, + 40mts	15	14	Barrio Colombia	27	19/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MAM-25
883	CR43 CL29 + 22mts	16	10	San Diego	26	16/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MAM-25
884	CR43 CL29 + 37mts	16	10	San Diego	26	16/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MAM-25
885	CR43 CL29 + 53mts	16	10	San Diego	26	16/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MAM-25
886	CR43 CL29 + 68mts	16	10	San Diego	26	16/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MAM-25
887	CR43 CL29 +	16	10	San Diego	26	16/01/2026	Noctur	Paviment	Rehabilit	MAM-25

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

	85mts						na	ar	ación	
893	CR 53 ENTRE CL 70 Y CL 67 + 5 M	23	4	SEVILLA (UDEA)	26	14/01/2026	Diurna	Procopal	MASIVO	MSC-25
894	CR 53 ENTRE CL 70 Y CL 67 + 40 M	23	4	SEVILLA (UDEA)	26	14/01/2026	Diurna	Procopal	MASIVO	MSC-25
895	CR 53 ENTRE CL 70 Y CL 67 + 65 M	23	4	SEVILLA (UDEA)	26	14/01/2026	Diurna	Procopal	MASIVO	MSC-25
896	CR 53 ENTRE CL 70 Y CL 67 + 73 M	23	4	SEVILLA (UDEA)	26	14/01/2026	Diurna	Procopal	MASIVO	MSC-25
897	CR 53 ENTRE CL 70 Y CL 67 + 90 M	23	4	SEVILLA (UDEA)	26	14/01/2026	Diurna	Procopal	MASIVO	MSC-25
898	CL 50c 39-66	2	10	Boston	27	20/01/2026	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
899	CL 49ª 40	2	10	Boston	27	20/01/2026	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
900	Cl 38B sur #69 – 54	3	80	San Antonio de Prado	27	23/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP
901	CR 69C # 38 sur – 37	3	80	San Antonio de Prado	27	23/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP
902	Cl 17 # 111 – 61	6	70	Corregimiento Altavista	27	19/01/2026	Diurna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP
903	Cl 17 # 111 – 61 + 1	6	70	Corregimiento Altavista	27	19/01/2026	Diurna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP
904	CR 27ª #49 – 36	7	9	Buenos Aires	27	23/01/2026	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
905	CR 27ª #49 – 36	7	9	Buenos Aires	27	23/01/2026	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
906	CL 68 46 ESTE 265 E-40	8	CORREGIMIENTO	MAZO	27	21/01/2026	Diurna	Procopal	FALLOS	MDC-19 + RAP
907	CL 68 46 ESTE 265 E-55	8	CORREGIMIENTO	MAZO	27	21/01/2026	Diurna	Procopal	FALLOS	MDC-19 + RAP
908	CL 19 47ª ESTE E-47	9	90	SANTA ELENA	27	21/01/2026	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
909	CL 19 47ª ESTE E-45	9	90	SANTA ELENA	27	21/01/2026	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
910	Cl 56sur CR 70 – 50	11	80	San Antonio De Prado	27	20/01/2026	Nocturna	Pavimentar	bache	MDC-19 + RAP
911	Cl 56sur CR 70 – 54	11	80	San Antonio De Prado	27	20/01/2026	Nocturna	Pavimentar	bache	MDC-19 + RAP
912	CL 8ª CR 112 – 82	13	70	BUGA PATIO BONITO	27	20/01/2026	Diurna	Pavimentar	REHABILITACION	MSC-19 + RAP
913	CL 8ª CR 112 – 82	13	70	BUGA PATIO BONITO	27	20/01/2026	Diurna	Pavimentar	REHABILITACION	MSC-19 + RAP
914	CL 37B CR 84ª – 10	14	13	Santa Mónica	27	22/01/2026	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

915	CL 37B CR 84ª – 55	14	13	Santa Mónica	27	22/01/2026	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
916	Calle 6 entre CR25 CL5	16	14	El Tesoro	27	19/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	SMA
917	Calle 6 entre CR25 CL5	16	14	El Tesoro	27	19/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	SMA
918	Calle 6 entre CR25 CL5	16	14	El Tesoro	27	19/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	SMA
919	Calle 6 entre CR25 CL5	16	14	El Tesoro	27	19/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	SMA
920	Calle 6 entre CR25 CL5	16	14	El Tesoro	27	19/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	SMA
921	Cl 6ª #29-50 a 29-90 + 10 M	21	14	EL TESORO	27	20/01/2026	Nocturna	Pavimentar	RANGO 4	MSC-19 + RAP
922	Cl 6ª #29-50 a 29-90 + 20 M	21	14	EL TESORO	27	20/01/2026	Nocturna	Pavimentar	RANGO 4	MSC-19 + RAP
923	Cl 6ª #29-50 a 29-90 + 30 M	21	14	EL TESORO	27	20/01/2026	Nocturna	Pavimentar	RANGO 4	MSC-19 + RAP
924	Cl 6ª #29-50 a 29-90 + 40 M	21	14	EL TESORO	27	20/01/2026	Nocturna	Pavimentar	RANGO 4	MSC-19 + RAP
925	Cl 6ª #29-50 a 29-90 + 50 M	21	14	EL TESORO	27	20/01/2026	Nocturna	Pavimentar	RANGO 4	MSC-19 + RAP
926	CR 53 ENTRE CL 70 Y CL 67 + 7,5 M	23	4	SEVILLA (UDEA)	27	20/01/2026	Diurna	Procopal	MASIVO	MSC-25
927	CR 53 ENTRE CL 70 Y CL 67 + 35 M	23	4	SEVILLA (UDEA)	27	20/01/2026	Diurna	Procopal	MASIVO	MSC-25
928	CR 53 ENTRE CL 70 Y CL 67 + 70 M	23	4	SEVILLA (UDEA)	27	20/01/2026	Diurna	Procopal	MASIVO	MSC-25
929	CR 53 ENTRE CL 70 Y CL 67 + 82 M	23	4	SEVILLA (UDEA)	27	20/01/2026	Diurna	Procopal	MASIVO	MSC-25
930	CR 53 ENTRE CL 70 Y CL 67 + 100 M	23	4	SEVILLA (UDEA)	27	20/01/2026	Diurna	Procopal	MASIVO	MSC-25
931	Cr 35 7 sur	2	14	LOS BALSOS N2	28	27/01/2026	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
932	Cr 35 7 sur-5	2	14	LOS BALSOS N3	28	27/01/2026	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
933	Cr 94B Cl 63 – 305	3	7	San Antonio de Prado	28	28/01/2026	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
934	Cr 94B Cl 63 – 257	3	7	San Antonio de Prado	28	28/01/2026	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
935	Cl 18 # 109 – 55	6	70	Corregimiento Altavista	28	26/01/2026	Diurna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP
936	Cl 18 # 110 – 48	6	70	Corregimiento Altavista	28	26/01/2026	Diurna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP
937	CL 110 CR 68ª-102	7	5	Tejelo	28	28/01/2026	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
938	CL 110 CR 68ª-80	7	5	Tejelo	28	28/01/2026	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
939	CL 31 44ª 189	8	10	PERPETUO SOCORRO	28	28/01/2026	Diurna	Procopal	FALLOS	MDC-19 + RAP

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

940	CL34 44ª 56	8	10	PERPETUO SOCORRO	28	28/01/2026	Diurna	Procopal	FALLOS	MDC-19 + RAP
941	CL 65 CR 70-177	9	7	ECOPARQUE CERRO EL VOLADOR	28	28/01/2026	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
942	CL 65 CR 70-243	9	7	ECOPARQUE CERRO EL VOLADOR	28	28/01/2026	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
943	Cl 53 CR 49-155	11	10	La Candelaria	28	28/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP
944	CL 53 CR 47-55	11	10	La Candelaria	28	28/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Bache	MDC-19 + RAP
945	CL 118 CR 30+30	13	1	SANTO DOMINGO SAVIO 2	28	26/01/2026	Diurna	Pavimentar	REHABILITACION	MSC-19 + RAP
946	CL 118 CR 30+30	13	1	SANTO DOMINGO SAVIO 2	28	26/01/2026	Diurna	Pavimentar	REHABILITACION	MSC-19 + RAP
947	CR81 CL43 22	14	12	La America	28	29/01/2026	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
948	CR81 CL43 70	14	12	La America	28	29/01/2026	Diurna	Procopal	Bache	MDC-19 + RAP
949	CL29 #44-59	15	10	Barrio Colombia	28	29/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MSC-19+FIBRA
950	CL29 #44-31	15	10	Barrio Colombia	28	29/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MSC-19+FIBRA
951	CL29 #44-17	15	10	Barrio Colombia	28	29/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MSC-19+FIBRA
952	CL29 #43ª-89	15	10	Barrio Colombia	28	29/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MSC-19+FIBRA
953	CL29 #43ª-83 + 6mts	15	10	Barrio Colombia	28	29/01/2026	Nocturna	Pavimentar	Rehabilitación	MSC-19+FIBRA
954	Tr 7ª Cr 29d + 10 M	21	14	El Tesoro	28	29/01/2026	Nocturna	Pavimentar	RANGO 4	MSC-19 + RAP
955	Tr 7ª Cr 29d + 20 M	21	14	El Tesoro	28	29/01/2026	Nocturna	Pavimentar	RANGO 4	MSC-19 + RAP
956	Tr 7ª Cr 29d + 30 M	21	14	El Tesoro	28	29/01/2026	Nocturna	Pavimentar	RANGO 4	MSC-19 + RAP
957	Tr 7ª Cr 29d + 40 M	21	14	El Tesoro	28	29/01/2026	Nocturna	Pavimentar	RANGO 4	MSC-19 + RAP
958	Tr 7ª Cr 29d + 50 M	21	14	El Tesoro	28	29/01/2026	Nocturna	Pavimentar	RANGO 4	MSC-19 + RAP
959	CR 78ª # 46 – 67	23	11	VELÓDROMO	28	28/01/2026	Diurna	Pavimentar	RANGO 4	MSC-19 + RAP
960	CR 78ª # 46 – 80	23	11	VELÓDROMO	28	28/01/2026	Diurna	Pavimentar	RANGO 4	MSC-19 + RAP
961	CR 78ª # 46 – 98	23	11	VELÓDROMO	28	28/01/2026	Diurna	Pavimentar	RANGO 4	MSC-19 + RAP
962	CL 47 # 78ª – 22	23	11	VELÓDROMO	28	28/01/2026	Diurna	Pavimentar	RANGO 4	MSC-19 + RAP

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

963	CL 47 # 78ª – 9	23	11	VELÓDROMO	28	28/01/2026	Diurna	Pavimentar	RANGO 4	MSC-19 + RAP
964	Cl 63 105ª – 33	2	60	Área de expansión Pajarito	29	3/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
965	Cl 63 98 – 14	2	60	Área de expansión Pajarito	29	3/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
966	CL 63 # 120ª – 72	3	60	San Cristobal	29	5/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
967	CL 63 # 120ª – 22	3	60	San Cristobal	29	5/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
968	Cl 50 # 36 – 95	6	9	Buenos Aires	29	2/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
969	Cl 50 # 36 – 97	6	9	Buenos Aires	29	2/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
970	Cr 70 # 117 – 43	7	5	Florencia	29	5/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
971	Cr 70 # 117 – 45	7	5	Florencia	29	5/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
972	Cr 86 # 98BB – 13	8	6	Picachito	29	4/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
973	Cr 86 # 98BB – 07	8	6	Picachito	29	4/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
974	Cr 75 # 64 – 77	9	7	Ecoparque Cerro El Volador	29	4/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
975	Cl 63 # 75 – 112	9	7	Ecoparque Cerro El Volador	29	4/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
976	Cl 74 # 64C – 44	11	5	El Progreso	29	4/02/2026	Nocturna	Pavimentar S.A.	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
977	Cl 74 # 64C – 11	11	5	El Progreso	29	4/02/2026	Nocturna	Pavimentar S.A.	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
978	Cr 48 con Cl 10ª	13	14	Manila	29	2/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
979	Cr 48 con Cl 10ª	13	14	Manila	29	2/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
980	Cl 35D # 88 – 25	14	12	La América	29	5/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
981	Cl 35D # 88 – 57	14	12	La América	29	5/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
982	Cr 46 entre Cl 29 y Cl 30 + 5 m, sentido Sur – Norte, costado oriental	21	10	Perpetuo Socorro	29	6/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
983	Cr 46 entre Cl 29 y Cl 30 + 5 m, sentido Sur – Norte, costado occidental	21	10	Perpetuo Socorro	29	6/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

984	Cr 46 entre Cl 29 y Cl 30 + 10 m, sentido Sur – Norte, costado oriental	21	10	Perpetuo Socorro	29	6/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
985	Cr 46 entre Cl 29 y Cl 30 + 10 m, sentido Sur – Norte, costado occidental	21	10	Perpetuo Socorro	29	6/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
986	Cr 46 entre Cl 29 y Cl 30 + 15 m, sentido Sur – Norte, costado oriental	21	10	Perpetuo Socorro	29	6/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
987	Cl 24 # 50 – 35	23	15	Santa Fé	29	5/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
988	Cl 24 # 50 – 43	23	15	Santa Fé	29	5/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
989	Cl 24 # 50 – 67	23	15	Santa Fé	29	5/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
990	Cl 24 # 50 – 75	23	15	Santa Fé	29	5/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
991	Cl 24 # 50 – 91	23	15	Santa Fé	29	5/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
992	Dg 74B # 33ª – 136	2	11	Laureles	30	10/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
993	Tv 33AA # 74ª – 34	2	11	Laureles	30	10/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
994	Cr 52 # 120 - 124	3	60	La Loma	30	13/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
995	Cr 52 con Cl 117	3	60	La Loma	30	13/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
996	Cr 31 # 46 – 55	6	9	Buenos Aires	30	9/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
997	Cr 31 # 46 – 55	6	9	Buenos Aires	30	9/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
998	Cr 74 # 115 – 72	7	5	Florencia	30	11/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
999	Cr 74 # 115 – 74	7	5	Florencia	30	11/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1000	Cl 91D # 84 – 08	8	6	Kennedy	30	11/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1001	Cl 91D # 84 – 07	8	6	Kennedy	30	11/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1002	Cl 57 # 65 – 38	9	11	Carlos E. Restrepo	30	11/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1003	Cl 57 # 65 – 90	9	11	Carlos E. Restrepo	30	11/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1004	Cl 57 # 51 – 49	11	10	Estación Villa	30	11/02/2026	Nocturna	Pavimentar S.A.	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1005	Cl 57 # 51 – 04	11	10	Estación Villa	30	11/02/2026	Nocturna	Pavimentar S.A.	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

1006	Cr 48 # 112ª – 118	13	1	La Isla	30	2/09/2026	Diurna	Procopal S.A	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1007	Cr 48 # 112ª – 118	13	1	La Isla	30	2/09/2026	Diurna	Procopal S.A	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1008	Cr 99 # 49AE – 25	14	13	Metropolitano	30	12/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1009	Cr 99 # 49AE – 29	14	13	Metropolitano	30	12/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1010	Puente Guayaquil + 211 m, carril central en sentido del flujo	15	10	Perpetuo Socorro	30	12/02/2026	Nocturna	Pavimentar S.A.	Rehabilitación	MAM-25
1011	Puente Guayaquil + 243 m, carril central en sentido del flujo	15	10	Perpetuo Socorro	30	12/02/2026	Nocturna	Pavimentar S.A.	Rehabilitación	MAM-25
1012	Puente Guayaquil + 280 m, carril central en sentido del flujo	15	10	Perpetuo Socorro	30	12/02/2026	Nocturna	Pavimentar S.A.	Rehabilitación	MAM-25
1013	Puente Guayaquil + 317 m, carril central en sentido del flujo	15	10	Perpetuo Socorro	30	12/02/2026	Nocturna	Pavimentar S.A.	Rehabilitación	MAM-25
1014	Puente Guayaquil + 352 m, carril central en sentido del flujo	15	10	Perpetuo Socorro	30	12/02/2026	Nocturna	Pavimentar S.A.	Rehabilitación	MAM-25
1015	Cr 22 entre Cr 25 y Cl 49 + 5 m, sentido oriente – occidente, costado sur	21	9	Miraflores	30	12/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1016	Cr 22 entre Cr 25 y Cl 49 + 5 m, sentido oriente – occidente, costado norte	21	9	Miraflores	30	12/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1017	Cr 22 entre Cr 25 y Cl 49 + 10 m, sentido oriente – occidente, costado sur	21	9	Miraflores	30	12/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1018	Cr 22 entre Cr 25 y Cl 49 + 10 m, sentido oriente – occidente,	21	9	Miraflores	30	12/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

	costado norte									
1019	Cr 22 entre Cr 25 y Cl 49 + 15 m, sentido oriente – occidente, costado sur	21	9	Miraflores	30	12/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1020	Cl 92 # 42B – 12	23	3	La Salle	30	12/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1021	Cl 92 # 42B – 26	23	3	La Salle	30	12/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1022	Cl 92 # 42B – 38	23	3	La Salle	30	12/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1023	Cl 92 # 42B – 44	23	3	La Salle	30	12/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1024	Cl 92 # 42B – 52	23	3	La Salle	30	12/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1025	Cl 41 # 30 -58	2	9	La Milagrosa	31	17/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1026	Cl 41 # 31 -73	2	9	La Milagrosa	31	17/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1027	Cl 63 # 120 – 41	3	60	Pedregal Alto	31	18/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1028	Cl 63 # 120 – 36	3	60	Pedregal Alto	31	18/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1029	Cr 41 # 62 – 05	6	8	Villa Hermosa	31	16/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1030	Cr 41 # 62 – 25	6	8	Villa Hermosa	31	16/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1031	Cl 39 # 103 – 69	7	13	Veinte de Julio	31	20/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1032	Cr 106ª # 38 – 35	7	13	Veinte de Julio	31	20/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1033	Cl 62D # 108BB – 294	8	7	Santa Margarita	31	18/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1034	Cl 62D # 108BB – 294	8	7	Santa Margarita	31	18/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1035	Cl 51 # 70ª – 28	9	11	Cuarta Brigada	31	18/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

1036	Cl 51 # 70ª – 29	9	11	Cuarta Brigada	31	18/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1037	Cl 44 # 96 – 01	11	12	Campo Alegre	31	18/02/2026	Nocturna	Pavimentar S.A.	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1038	Cl 44 # 95 – 18	11	12	Campo Alegre	31	18/02/2026	Nocturna	Pavimentar S.A.	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1039	Cr 72 entre Cl 106C y Cl 107	13	5	Tejelo	31	16/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1040	Cr 72 entre Cl 106C y Cl 107	13	5	Tejelo	31	16/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1041	Glorieta virtual CL 40 con CR 108, costado sur-oriental (parche grande orilla de vía)	14	13	Antonio Nariño	31	19/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1042	Glorieta virtual CL 40 con CR 108, costado sur-oriental (parche pequeño orilla de vía)	14	13	Antonio Nariño	31	19/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1043	Puente Guayaquil + 211 m, carril central en sentido del flujo	15	10	Perpetuo Socorro	31	17/02/2026	Nocturna	Pavimentar S.A.	Rehabilitación	MSC-19 + Fibra
1044	Puente Guayaquil + 243 m, carril central en sentido del flujo	15	10	Perpetuo Socorro	31	17/02/2026	Nocturna	Pavimentar S.A.	Rehabilitación	MSC-19 + Fibra
1045	Puente Guayaquil + 280 m, carril central en sentido del flujo	15	10	Perpetuo Socorro	31	17/02/2026	Nocturna	Pavimentar S.A.	Rehabilitación	MSC-19 + Fibra
1046	Puente Guayaquil + 317 m, carril central en sentido del flujo	15	10	Perpetuo Socorro	31	17/02/2026	Nocturna	Pavimentar S.A.	Rehabilitación	MSC-19 + Fibra
1047	Puente Guayaquil + 352 m, carril central en sentido del flujo	15	10	Perpetuo Socorro	31	17/02/2026	Nocturna	Pavimentar S.A.	Rehabilitación	MSC-19 + Fibra
1048	Cr 26 entre Cl 49 y Cl 48 + 5 m, sentido oriente – occidente, costado norte	21	9	Miraflores	31	20/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

1049	Cr 26 entre Cl 49 y Cl 48 + 10 m, sentido oriente – occidente, costado norte	21	9	Miraflores	31	20/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1050	Cr 26 entre Cl 49 y Cl 48 + 15 m, sentido oriente – occidente, costado norte	21	9	Miraflores	31	20/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1051	Cr 26 entre Cl 49 y Cl 48 + 20 m, sentido oriente – occidente, costado norte	21	9	Miraflores	31	20/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1052	Cr 26 entre Cl 49 y Cl 48 + 25 m, sentido oriente – occidente, costado norte	21	9	Miraflores	31	20/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1053	CL 62 # 46 – 08	23	10	Prado	31	18/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1054	CL 62 # 46 - 16	23	10	Prado	31	18/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1055	CL 62 # 46 - 32	23	10	Prado	31	18/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1056	CL 62 # 46 - 40	23	10	Prado	31	18/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1057	CL 62 # 46 - 62	23	10	Prado	31	18/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1058	Cr 71 con Dg 74B	2	16	Rosales	32	24/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1059	Cr 72ª # 31 – 16	2	16	Rosales	32	24/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1060	Cl 63 122 – 27	3	60	Pedregal Alto	32	23/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1061	Cl 63 122 – 28	3	60	Pedregal Alto	32	23/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

1062	Cl 101 40 – 57	6	1	Moscú No.2	32	23/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1063	Cl 101 40 – 66	6	1	Moscú No.2	32	23/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1064	Cl 39 # 106ª – 141	7	13	Veinte de Julio	32	23/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1065	Cl 39ª con Cr 101ª	7	13	Veinte de Julio	32	23/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1066	Cr 62 # 48BA Sur – 73	8	80	El Limonar No. 2	32	25/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1067	Cr 62 # 48BA Sur – 73	8	80	El Limonar No. 3	32	25/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1068	Cr 26ª # 57AA – 27	9	8	El Pinal	32	25/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1069	Cr 26ª # 57AA – 26	9	8	El Pinal	32	25/02/2026	Diurna	Pavimentar S.A.	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1070	Cr 54C # 30 – 223 (Autopista Sur – calzada occidental)	11	16	Cerro Nutibara	32	25/02/2026	Nocturna	Pavimentar S.A.	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1071	Cr 54C # 30 – 185 (Autopista Sur – calzada occidental)	11	16	Cerro Nutibara	32	25/02/2026	Nocturna	Pavimentar S.A.	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1072	Cl 57C entre Cr 30 y Cr 31	13	8	Enciso	32	23/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1073	Cl 57C entre Cr 30 y Cr 31	13	8	Enciso	32	23/02/2026	Diurna	Procopal S.A	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1074	Cl 12B Sur 51 – 02, costado canalización	14	15	Guayabal	32	26/02/2025	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1075	Cl 12B Sur 51 – 14, costado canzalización	14	15	Guayabal	32	26/02/2025	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1076	Cr 78 entre Cl 30 y Cl 30 + 5 m, costado occidental	21	16	Belén	32	26/02/2025	Diurna	Procopal S.A	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1077	Cr 78 entre Cl 30 y Cl 30 + 10 m, costado occidental	21	16	Belén	32	26/02/2025	Diurna	Procopal S.A	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1078	Cr 78 entre Cl 30 y Cl 30 + 15 m, costado occidental	21	16	Belén	32	26/02/2025	Diurna	Procopal S.A	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1079	Cr 78 entre Cl 30 y Cl 30 + 20 m, costado occidental	21	16	Belén	32	26/02/2025	Diurna	Procopal S.A	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1080	Cr 78 entre Cl 30 y Cl 30 + 25 m, costado occidental	21	16	Belén	32	26/02/2025	Diurna	Procopal S.A	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

1081	CR 45 36 – 10	23	10	Perpetuo Socorro	32	23/02/2026	Nocturna	Pavimentar S.A.	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1082	Cr 45 36 – 22	23	10	Perpetuo Socorro	32	23/02/2026	Nocturna	Pavimentar S.A.	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1083	Cr 45 36 – 36	23	10	Perpetuo Socorro	32	23/02/2026	Nocturna	Pavimentar S.A.	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1084	Cr 45 36 – 42	23	10	Perpetuo Socorro	32	23/02/2026	Nocturna	Pavimentar S.A.	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1085	Cr 45 36 – 60	23	10	Perpetuo Socorro	32	23/02/2026	Nocturna	Pavimentar S.A.	Fallos	MSC-19 (tibia) + RAP
1086	Cr 107 Cl 106 - 526	3		Vereda Yolombo	33	46086	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1087	Cr 107 Cl 106 - 492	3		Vereda Yolombo	33	46087	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1088	CR 64 # 96 A -380	2	5	TRICENTENARIO	33	46084	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1089	CR 64 # 96 A -384	2	5	TRICENTENARIO	33	46084	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1090	Cl 36B # 33 - 39	6	9	LA MILAGROSA	33	46056	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1091	Cl 36B # 33 - 43	6	9	LA MILAGROSA	33	3/0322026	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1092	CL 57D CR 24BB-41	9	8	LOS MANGOS	33	46056	Diurna	Pavimentar S.A.S	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1093	CL 57D CR 24BB-41	9	8	LOS MANGOS	33	3/0322026	Diurna	Pavimentar S.A.S	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1094	CR 55 CL 12 SUR-14	7	8	LA COLINA	33	46086	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1095	CR 55 CL 12 SUR-12	7	8	LA COLINA	33	46086	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

1096	CR 96 C CL 49A - 28	8	13	LA PRADERA	33	46085	Diurna	Pavimentar S.A.S	Fallos	MDC-19 (tibia) + RAP
1097	CR 96 C CL 49A - 5	8	13	LA PRADERA	33	46085	Diurna	Pavimentar S.A.S	Fallos	MDC-19 (tibia) + RAP
1098	CL 57C CR 30 CR 31	13	8	ENCISO	33	46076	Diurna	Procopal S.A	Rehabilitacion	MDC-19 (tibia) + RAP
1099	CL 57C CR 30 CR 31	13	8	ENCISO	33	46076	Diurna	Procopal S.A	Rehabilitacion	MDC-19 (tibia) + RAP
1100	CL 68 CR 51D - 14, Costado nororiental	14	4	SEVILLA	33	46086	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1101	CR 51D CL 67A - 81, Costado suroccidental	14	4	SEVILLA	33	46086	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1102	CR 55 ENTRE CL 42 Y CL 44, Rampa de acceso avenida ferrocarril + 5 M , SENTIDO SUR-NORTE , COSTADO OCCIDENTAL -	21	10	CENTRO ADMINISTRATIVO	33	46085	NOCTURNA	Pavimentar S.A.S	RANGO 4	MSC-19 (tibia) + RAP
1103	CR 55 ENTRE CL 42 Y CL 44, Rampa de acceso avenida ferrocarril + 15 M , SENTIDO SUR-NORTE , COSTADO OCCIDENTAL -	21	10	CENTRO ADMINISTRATIVO	33	46085	NOCTURNA	Pavimentar S.A.S	RANGO 4	MSC-19 (tibia) + RAP
1104	CR 55 ENTRE CL 42 Y CL 44, Rampa de acceso avenida ferrocarril + 25 M , SENTIDO SUR-NORTE , COSTADO OCCIDENTAL -	21	10	CENTRO ADMINISTRATIVO	33	46085	NOCTURNA	Pavimentar S.A.S	RANGO 4	MSC-19 (tibia) + RAP
1105	CR 55 ENTRE CL 42 Y CL 44, Rampa de acceso avenida ferrocarril + 35 M , SENTIDO SUR-NORTE , COSTADO OCCIDENTAL -	21	10	CENTRO ADMINISTRATIVO	33	46085	NOCTURNA	Pavimentar S.A.S	RANGO 4	MSC-19 (tibia) + RAP
1100	CL 68 CR 51D - 14, Costado nororiental	14	4	SEVILLA	33	46086	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

1101	CR 51D CL 67A - 81, Costado suroccidental	14	4	SEVILLA	33	46086	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1102	CR 55 ENTRE CL 42 Y CL 44, Rampa de acceso avenida ferrocarril + 5 M , SENTIDO SUR-NORTE , COSTADO OCCIDENTAL -	21	10	CENTRO ADMINISTRATIVO	33	46085	NOCTURNA	Pavimentar S.A.S	RANGO 4	MSC-19 (tibia) + RAP
1103	CR 55 ENTRE CL 42 Y CL 44, Rampa de acceso avenida ferrocarril + 15 M , SENTIDO SUR-NORTE , COSTADO OCCIDENTAL -	21	10	CENTRO ADMINISTRATIVO	33	46085	NOCTURNA	Pavimentar S.A.S	RANGO 4	MSC-19 (tibia) + RAP
1104	CR 55 ENTRE CL 42 Y CL 44, Rampa de acceso avenida ferrocarril + 25 M , SENTIDO SUR-NORTE , COSTADO OCCIDENTAL -	21	10	CENTRO ADMINISTRATIVO	33	46085	NOCTURNA	Pavimentar S.A.S	RANGO 4	MSC-19 (tibia) + RAP
1105	CR 55 ENTRE CL 42 Y CL 44, Rampa de acceso avenida ferrocarril + 35 M , SENTIDO SUR-NORTE , COSTADO OCCIDENTAL -	21	10	CENTRO ADMINISTRATIVO	33	46085	NOCTURNA	Pavimentar S.A.S	RANGO 4	MSC-19 (tibia) + RAP
1106	CR 55 ENTRE CL 42 Y CL 44, Rampa de acceso avenida ferrocarril + 45 M , SENTIDO SUR-NORTE , COSTADO OCCIDENTAL -	21	10	CENTRO ADMINISTRATIVO	33	46085	NOCTURNA	Pavimentar S.A.S	RANGO 4	MSC-19 (tibia) + RAP
1107	CL 16 A # 48 - 37	2	14	Villa Carlota	34	46091	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

1108	CL 7 SUR # 42 -70	2	14	Los balsos N2	34	46091	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1109	CR 128 Cl 55a - 31	3	13	San Javier - La Loma	34	46091	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1110	CR 128 Cl 57 - 05	3	13	San Javier - La Loma	34	46091	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1111	Cl 49 # 20B - 13	6	9	Buenos Aires	34	46090	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1112	Cl 49 # 20B - 27	6	9	Buenos Aires	34	46090	Diurna	Procopal S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1113	CR 55 CL13 SUR - 55	7	15	La Colina	34	46091	Diurna	Pavimentar S.A.S	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1114	CR 55 CL13 SUR - 55	7	15	La Colina	34	46091	Diurna	Pavimentar S.A.S	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1115	CR 97 CL 49 - 52	8	13	LA PRADERA	34	46092	Diurna	Pavimentar S.A.S	Fallos	MDC-19 (tibia) + RAP
1116	CR 96 CC CL 49 - 61	8	13	LA PRADERA	34	46092	Diurna	Pavimentar S.A.S	Fallos	MDC-19 (tibia) + RAP
1117	CR 16 CL 56C-36	9	8	VILLA TINA	34	46092	Diurna	Pavimentar S.A.S	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1118	CR 16 CL 56C-30	9	8	VILLA TINA	34	46092	Diurna	Pavimentar S.A.S	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1119	CR 86 CL 49E-149	2	12	CALASANZ PARTE ALTA	35	46099	DIURNO	Pavimentar S.A	FALLOS	MDC-19 (tibia) + RAP
1120	CR 86 CL 49E-257	2	12	CALASANZ PARTE ALTA	35	46099	DIURNO	Pavimentar S.A	FALLOS	MDC-19 (tibia) + RAP
1121	CR 17 CL 55-09	3	8	VILLA TINA	34	46092	DIURNO	Pavimentar S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1122	CL 57CC CR 24B-32	3	8	VILLA TINA	35	46099	DIURNO	Pavimentar S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1123	TV 51A CR 67B Y CL 67B+200	10	11	CARLOS E RESTREPO	35	46098	NOCTURNO	Pavimentar S.A	MASIVOS	MAM-25
1124	TV 51A CR 67B Y CL 67B+200	10	11	CARLOS E RESTREPO	35	46098	NOCTURNO	Pavimentar S.A	MASIVOS	MAM-25
1125	TV 51A CR 67B Y CL 67B+200	10	11	CARLOS E RESTREPO	35	46098	NOCTURNO	Pavimentar S.A	MASIVOS	MAM-25
1126	TV 51A CR 67B Y CL 67B+200	10	11	CARLOS E RESTREPO	35	46098	NOCTURNO	Pavimentar S.A	MASIVOS	MAM-25
1127	TV 51A CR 67B Y CL 67B+200	10	11	CARLOS E RESTREPO	35	46098	NOCTURNO	Pavimentar S.A	MASIVOS	MAM-25
1128	CL 76 CR 91 - 91	12	7	Robledo	35	46100	DIURNO	Pavimentar S.A	Bache	MDC-19 RAP
1129	CL 76 CR 89 C -76	12	7	Robledo	35	46100	DIURNO	Pavimentar S.A	Bache	MDC-19 RAP
1130	CL 76 CR 91 - 91	12	7	Robledo	35	46100	DIURNO	Pavimentar S.A	Bache	MDC-19 RAP

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

1131	CL 76 CR 89 C -76	12	7	Robledo	35	46100	DIURNO	Pavimentar S.A	Bache	MDC-19 RAP
1132	CL 61 # 45D. En todo el cruce, figura en forma de L	13	8	Villa Hermosa	35	46099	DIURNO	Procopal S.A	Bache	MDC-19 con RAP
1133	CR 39A CL 65. figura en forma de L	13	8	Villa Hermosa	35	46100	DIURNO	Procopal S.A	Bache	MDC-19 con RAP
1134	CL 8 SUR #52B-56	14	15	La Colina	35	46100	DIURNO	Pavimentar S.A	Bache	MDC-19+RAP
1135	CL 8 SUR #52B-56	14	15	La Colina	35	46100	DIURNO	Pavimentar S.A	Bache	MDC-19+RAP
1136	Cl 57 # 40A - 36	1	10	Boston	36	46105	DIURNO	Pavimentar S.A	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP
1137	Cl 57 # 40A - 52	1	10	Boston	36	46105	DIURNO	Pavimentar S.A	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP
1138	CL 45E CR 73-27	2	11	FLORIDANUEVA	36	46106	DIURNO	Pavimentar S.A	FALLOS	MDC-19 (tibia) + RAP
1139	CL 45E CR 73-31	2	11	FLORIDANUEVA	36	46106	DIURNO	Pavimentar S.A	FALLOS	MDC-19 (tibia) + RAP
1140	CR 15A CL 56C-06	3	8	VILLA TINA	36	46107	DIURNO	Pavimentar S.A	Bache	MDC-19 RAP
1141	CL 56C CR 15A-11	3	8	VILLA TINA	36	46107	DIURNO	Pavimentar S.A	Bache	MDC-19 RAP
1142	Cra 57 x cl 42a y 41 +5m	5	10	La alpujarra	36	46105	NOCTURNA	Pavimentar S.A	RANGO 4	MSC-19 (TIBIA) + RAP
1143	Cra 57 x cl 42a y 41 +10m	5	10	La alpujarra	36	46105	NOCTURNA	Pavimentar S.A	RANGO 4	MSC-19 (TIBIA) + RAP
1144	Cra 57 x cl 42a y 41+15m	5	10	La alpujarra	36	46105	NOCTURNA	Pavimentar S.A	RANGO 4	MSC-19 (TIBIA) + RAP
1145	Cra 57 x cl 42a y 41 +20m	5	10	La alpujarra	36	46105	NOCTURNA	Pavimentar S.A	RANGO 4	MSC-19 (TIBIA) + RAP
1146	Cra 57 x cl 42a y 41 +25m	5	10	La alpujarra	36	46105	NOCTURNA	Pavimentar S.A	RANGO 4	MSC-19 (TIBIA) + RAP
1147	CR 95 CL 70 C- 01	12	7	Robledo	36	46106	DIURNO	Pavimentar S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1148	CR 95 CL 70 C -07	12	7	Robledo	36	46106	DIURNO	Pavimentar S.A	Bache	MDC-19 (tibia) + RAP
1149	CR 51A CL 12B SUR-101	14	15	Guayabal	36	46107	DIURNO	Pavimentar S.A	Bache	MDC-19+RAP
1150	CR 51A CL 12B SUR-97	14	15	Guayabal	36	46107	DIURNO	Pavimentar S.A	Bache	MDC-19+RAP
1151	Cl 40C # 22B - 95	1	9	Cataluña	37	3/30/2026	DIURNO	Pavimentar S.A	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP
1152	Cl 40C # 22B - 117	1	9	Cataluña	37	3/30/2026	DIURNO	Pavimentar S.A	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP
1153	CR 86 - 14	2	12	CALASANZ	37	3/30/2026	DIURNO	Pavimentar S.A	FALLOS	MDC-19 (TIBIA) + RAP
1154	CR 88 - 46	2	12	CALASANZ	37	3/30/2026	DIURNO	Pavimentar S.A	FALLOS	MDC-19 (TIBIA) + RAP
1155	CR 51 CL 36 Y CL 37 + 5 M , SENTIDO NORTE- SUR	5	10	La Candelaria	37	46111	NOCTURNA	Pavimentar S.A	RANGO 4	MSC-19 + RAP

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

	, COSTADO ORIENTAL									
1156	CR 51 CL 36 Y CL 37 + 10 M , SENTIDO NORTE- SUR , COSTADO ORIENTAL	5	10	La Candelaria	37	46111	NOCTURNA	Pavimentar S.A	RANGO 4	MSC-19 + RAP
1157	CR 51 CL 36 Y CL 37 + 15 M , SENTIDO NORTE- SUR , COSTADO ORIENTAL	5	10	La Candelaria	37	46111	NOCTURNA	Pavimentar S.A	RANGO 4	MSC-19 + RAP
1158	CR 51 CL 36 Y CL 37 + 20 M , SENTIDO NORTE- SUR , COSTADO ORIENTAL	5	10	La Candelaria	37	46111	NOCTURNA	Pavimentar S.A	RANGO 4	MSC-19 + RAP
1159	CR 51 CL 36 Y CL 37 + 25 M , SENTIDO NORTE- SUR , COSTADO ORIENTAL	5	10	La Candelaria	37	46111	NOCTURNA	Pavimentar S.A	RANGO 4	MSC-19 + RAP
1160	Cr 15d # 47 - 35	1	9	Los Cerros El Vergel	38	46177	DIURNO	Pavimentar S.A	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP
1161	Cr 15d # 47 - 59	1	9	Los Cerros El Vergel	38	46177	DIURNO	Pavimentar S.A	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP
1162	CR 89 CL 68 - 73	2	7	PALENQUE	38	46238	DIURNO	Pavimentar S.A	FALLOS	MDC-19 (TIBIA) + RAP
1163	CR 89 CL 68 - 08	2	7	PALENQUE	38	46238	DIURNO	Pavimentar S.A	FALLOS	MDC-19 (TIBIA) + RAP
1164	CR 10 CL 55-09	3	8	LAS ESTANCIAS	38	45873	DIURNO	Pavimentar S.A	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP
1165	CR 10 CL 55 +6M	3	8	LAS ESTANCIAS	38	45873	DIURNO	Pavimentar S.A	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP
1166	CL 35 entre CR 51 y CR 52 + 5 M , SENTIDO NORTE- SUR , COSTADO ORIENTAL	10	10	La Candelaria	38	46089	NOCTURNA	Pavimentar S.A	RANGO 4	MSC-19 + RAP
1167	CL 35 entre CR 51 y CR 52 + 10 M , SENTIDO NORTE- SUR , COSTADO ORIENTAL	10	10	La Candelaria	38	46089	NOCTURNA	Pavimentar S.A	RANGO 4	MSC-19 + RAP
1168	CL 35 entre CR 51 y CR 52 + 15 M , SENTIDO NORTE- SUR , COSTADO ORIENTAL	10	10	La Candelaria	38	46089	NOCTURNA	Pavimentar S.A	RANGO 4	MSC-19 + RAP

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

1169	CL 35 entre CR 51 y CR 52 + 20 M , SENTIDO NORTE- SUR , COSTADO ORIENTAL	10	10	La Candelaria	38	46089	NOCTURNA	Pavimentar S.A	RANGO 4	MSC-19 + RAP
1170	CL 35 entre CR 51 y CR 52 + 25 M , SENTIDO NORTE- SUR , COSTADO ORIENTAL	10	10	La Candelaria	38	46089	NOCTURNA	Pavimentar S.A	RANGO 4	MSC-19 + RAP
1171	Cl 78 # 91B - 18	1	7	Aures No 1	40	4/20/2026	DIURNO	Pavimentar S.A	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP
1172	Cr 91B # 77EE - 48	1	7	Aures No 1	40	4/20/2026	DIURNO	Pavimentar S.A	Bache	MDC-19 (TIBIA) + RAP

Los resultados de los ensayos (densidad y espesores) serán presentados en el próximo informe.

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

7 CALIDAD DE LA PINTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE VÍAS INTERVENIDAS

La señalización vial horizontal, se realiza atendiendo la norma NTC 1360, NTC 4744-3, NTC 5129, la resolución 1885 de 2015 de Ministerio de Transporte, norma Invias 2022.

7.1 MATERIALES UTILIZADOS

- Pintura plástica en frío blanca PINTUFLEX.
- Pintura acrílica blanca y amarilla.

El ANEXO 7 contiene el certificado de calidad de la pintura.

7.2 PRUEBAS REALIZADAS

En laboratorio se realizaron diferentes pruebas de deslizamiento.

El ANEXO 14. Ensayo deslizamiento.

En campo se han realizado mediciones y controles del espesor de las capas de pintura. Con respecto a las mediciones de espesor, todas las pinturas plástico en frio aplicadas en noviembre cumplen con un espesor > 40 mils de acuerdo con las especificaciones técnicas, esto se evidencia en el registro fotográfico de los ensayos realizados durante la ejecución de la demarcación vial, que se muestra a continuación.

7.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO









Se realiza registro de mediciones de ensayo de reflectividad de demarcación vial y los ensayos de fricción y lisura en pintura adjunto en el anexo 8.

8 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Durante el mes de Abril 2026, el Consocio Vialmed 2025, ejecutó actividades de obras complementarías en los frentes 10, 18 y 19, se realiza ensayo de compresión al concreto instalado. A continuación, se relacionan los resultados obtenidos en cada una de las actividades ejecutadas:

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO					
ESTRUCTURA	**FECHA DE TOMA DE MUESTRA**	**EDAD (DÍAS)**	**RESISTENCIA MEDIDA (Mpa)**	**RESISTENCIA DE DISEÑO (Mpa)**	**% RESISTENCIA DE DISEÑO**
Zapata muro lateral derecho vía	12/09/2025	7	25.8	21.0	123%
Zapata muro lateral derecho vía	12/09/2025	7	28.1	21.0	134%
Zapata muro lateral derecho vía	3/10/2025	28	27.4	21.0	130%
Zapata muro lateral derecho vía	3/10/2025	28	26.0	21.0	124%
Zapata muro lateral derecho vía	13/09/2025	7	22.4	21.0	107%
Zapata muro lateral derecho vía	13/09/2025	7	16.6	21.0	79%
Zapata muro lateral derecho vía	4/10/2025	28	20.6	21.0	98%
Zapata muro lateral derecho vía	4/10/2025	28	19.3	21.0	92%
Pavimento rígido	19/09/2025	7	15.4	28.0	55%
Pavimento rígido	19/09/2025	7	17.3	28.0	62%
Pavimento rígido	10/10/2025	28	22.0	28.0	79%
Pavimento rígido	10/10/2025	28	21.8	28.0	78%
Pavimento rígido vía Las Violetas	20/09/2025	7	36.2	28.0	129%
Pavimento rígido vía Las Violetas	20/09/2025	7	40.0	28.0	143%
Pavimento rígido vía Las Violetas	11/10/2025	28	44.0	28.0	157%
Pavimento rígido vía Las Violetas	11/10/2025	28	43.0	28.0	154%
Vástago muro lateral derecho vía existente	23/09/2025	7	23.3	21.0	111%
Vástago muro lateral derecho vía existente	23/09/2025	7	24.5	21.0	117%
Vástago muro lateral derecho vía existente	14/10/2025	28	30.1	21.0	143%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Vástago muro lateral derecho vía existente	14/10/2025	28	30.5	21.0	145%
Vástago muro lateral derecho vía existente	11/11/2025	56	26.0	21.0	124%
Vástago muro lateral derecho vía existente	11/11/2025	56	28.0	21.0	133%
Pavimento rígido - Carrera 43A con calle 10A	25/09/2025	7	30.4	28.0	109%
Pavimento rígido - Carrera 43A con calle 10A	25/09/2025	7	28.2	28.0	101%
Pavimento rígido - Carrera 43A con calle 10A	16/10/2025	28	31.8	28.0	114%
Pavimento rígido - Carrera 43A con calle 10A	16/10/2025	28	30.0	28.0	107%
Pavimento rígido - Carrera 65D No. 34-53	29/09/2025	7	31.9	28.0	114%
Pavimento rígido - Carrera 65D No. 34-53	29/09/2025	7	30.9	28.0	110%
Pavimento rígido - Carrera 65D No. 34-53	20/10/2025	28	38.1	28.0	136%
Pavimento rígido - Carrera 65D No. 34-53	20/10/2025	28	39.6	28.0	141%
Pavimento rígido - Calle 32F No. 66B-168	1/10/2025	7	38.9	28.0	139%
Pavimento rígido - Calle 32F No. 66B-168	1/10/2025	7	37.8	28.0	135%
Pavimento rígido - Calle 32F No. 66B-168	22/10/2025	28	46.8	28.0	167%
Pavimento rígido - Calle 32F No. 66B-168	22/10/2025	28	37.9	28.0	135%
Pavimento rígido - Unicentro carrera 65D con calle 34	6/10/2025	7	34.3	28.0	123%
Pavimento rígido - Unicentro carrera 65D con calle 34	6/10/2025	7	37.0	28.0	132%
Pavimento rígido - Unicentro carrera 65D con calle 34	27/10/2025	28	36.3	28.0	130%
Pavimento rígido - Unicentro carrera 65D con calle 34	27/10/2025	28	34.7	28.0	124%
Vástago muro Picachito	9/10/2025	7	15.3	21.0	73%
Vástago muro Picachito	9/10/2025	7	15.7	21.0	75%
Vástago muro Picachito	30/10/2025	28	23.3	21.0	111%
Vástago muro Picachito	30/10/2025	28	22.7	21.0	108%
Pompeyano	15/10/2025	7	17.4	28.0	62%

pavimento rígido Andalucia					
Pompeyano pavimento rígido Andalucia	15/10/2025	7	38.5	28.0	138%
Pompeyano pavimento rígido Andalucia	5/11/2025	28	39.9	28.0	143%
Pompeyano pavimento rígido Andalucia	5/11/2025	28	12.3	28.0	44%
Pavimento rígido Enciso	18/10/2025	7	32.7	28.0	117%
Pavimento rígido Enciso	18/10/2025	7	32.9	28.0	118%
Pavimento rígido Enciso	8/11/2025	28	45.8	28.0	164%
Pavimento rígido Enciso	8/11/2025	28	38.7	28.0	138%
Pavimento rígido Enciso	22/10/2025	7	43.8	28.0	156%
Pavimento rígido Enciso	22/10/2025	7	26.6	28.0	95%
Pavimento rígido Enciso	12/11/2025	28	30.2	28.0	108%
Pavimento rígido Enciso	12/11/2025	28	35.4	28.0	126%
Andén Manrique	24/10/2025	7	10.2	21.0	49%
Andén Manrique	24/10/2025	7	14.0	21.0	67%
Andén Manrique	14/11/2025	28	18.7	21.0	89%
Andén Manrique	14/11/2025	28	15.5	21.0	74%
Andén Manrique	27/01/2026	102	21.6	21.0	103%
Andén Manrique	27/01/2026	102	24.3	21.0	116%
Pavimento rígido. Tercer tramo Enciso	29/10/2025	7	27.9	28.0	100%
Pavimento rígido. Tercer tramo Enciso	29/10/2025	7	43.6	28.0	156%
Pavimento rígido. Tercer tramo Enciso	19/11/2025	28	45.5	28.0	163%
Pavimento rígido. Tercer tramo Enciso	19/11/2025	28	45.1	28.0	161%
Pavimento rígido. Primer tramo lateral izquierdo Enciso	3/11/2025	7	19.2	28.0	69%
Pavimento rígido. Primer tramo lateral izquierdo Enciso	3/11/2025	7	21.7	28.0	78%
Pavimento rígido. Primer tramo lateral izquierdo Enciso	24/11/2025	28	42.3	28.0	151%
Pavimento rígido. Primer tramo lateral izquierdo Enciso	24/11/2025	28	13.7	28.0	49%
Losa Pueblito Paisa	31/10/2025	7	41.6	28.0	149%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Losa Pueblito Paisa	31/10/2025	7	40.4	28.0	144%
Losa Pueblito Paisa	21/11/2025	28	45.5	28.0	163%
Losa Pueblito Paisa	21/11/2025	28	47.2	28.0	169%
Pavimento rígido segundo tramo Enciso	4/11/2025	7	37.5	28.0	134%
Pavimento rígido segundo tramo Enciso	4/11/2025	7	43.0	28.0	154%
Pavimento rígido segundo tramo Enciso	25/11/2025	28	36.2	28.0	129%
Pavimento rígido segundo tramo Enciso	25/11/2025	28	30.8	28.0	110%
Pavimento rígido tercer tramo Enciso	6/11/2025	7	38.5	28.0	138%
Pavimento rígido tercer tramo Enciso	6/11/2025	7	39.0	28.0	139%
Pavimento rígido tercer tramo Enciso	27/11/2025	28	43.8	28.0	156%
Pavimento rígido tercer tramo Enciso	27/11/2025	28	37.6	28.0	134%
Pavimento rígido. Lateral izquierdo. Tercer tramo	12/11/2025	7	38.3	28.0	137%
Pavimento rígido. Lateral izquierdo. Tercer tramo	12/11/2025	7	42.4	28.0	151%
Pavimento rígido. Lateral izquierdo. Tercer tramo	3/12/2025	28	42.7	28.0	153%
Pavimento rígido. Lateral izquierdo. Tercer tramo	3/12/2025	28	48.5	28.0	173%
Pavimento rígido. Lateral izquierdo. Cuarto tramo	14/11/2025	7	39.8	28.0	142%
Pavimento rígido. Lateral izquierdo. Cuarto tramo	14/11/2025	7	21.6	28.0	77%
Pavimento rígido. Lateral izquierdo. Cuarto tramo	5/12/2025	28	25.2	28.0	90%
Pavimento rígido. Lateral izquierdo. Cuarto tramo	5/12/2025	28	11.2	28.0	40%
Pavimento rígido. Lateral izquierdo. Quinto tramo	17/11/2025	7	41.6	28.0	149%
Pavimento rígido. Lateral izquierdo. Quinto tramo	17/11/2025	7	44.1	28.0	158%
Pavimento rígido. Lateral izquierdo. Quinto tramo	8/12/2025	28	27.8	28.0	99%
Pavimento rígido. Lateral izquierdo. Quinto tramo	8/12/2025	28	29.2	28.0	104%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Pavimento rígido. Lateral izquierdo. Tranvía	18/11/2025	7	37.3	28.0	133%
Pavimento rígido. Lateral izquierdo. Tranvía	18/11/2025	7	44.2	28.0	158%
Pavimento rígido. Lateral izquierdo. Tranvía	9/12/2025	28	39.2	28.0	140%
Pavimento rígido. Lateral izquierdo. Tranvía	9/12/2025	28	49.1	28.0	175%
Pavimento rígido. Lateral derecho. Tranvía	20/11/2025	7	40.6	28.0	145%
Pavimento rígido. Lateral derecho. Tranvía	20/11/2025	7	13.9	28.0	50%
Pavimento rígido. Lateral derecho. Tranvía	11/12/2025	28	41.9	28.0	150%
Pavimento rígido. Lateral derecho. Tranvía	11/12/2025	28	38.8	28.0	139%
Vaciado de andén calle 10A con carrera 38. Equina Pesqueira	25/11/2025	7	17.4	21.0	83%
Vaciado de andén calle 10A con carrera 38. Equina Pesqueira	25/11/2025	7	19.6	21.0	93%
Vaciado de andén calle 10A con carrera 38. Equina Pesqueira	16/12/2025	28	36.8	21.0	175%
Vaciado de andén calle 10A con carrera 38. Equina Pesqueira	16/12/2025	28	34.6	21.0	165%
Vaciado de andén calle 10A con carrera 38. Equina Pesqueira	29/11/2025	7	23.1	21.0	110%
Vaciado de andén calle 10A con carrera 38. Equina Pesqueira	29/11/2025	7	33.1	21.0	158%
Vaciado de andén calle 10A con carrera 38. Equina Pesqueira	20/12/2025	28	25.7	21.0	122%
Vaciado de andén calle 10A con carrera 38. Equina Pesqueira	20/12/2025	28	29.0	21.0	138%
Vaciado de andén calle 10	5/12/2025	7	28.6	21.0	136%
Vaciado de andén calle 10	5/12/2025	7	29.8	21.0	142%
Vaciado de andén calle 10	26/12/2025	28	22.5	21.0	107%
Vaciado de andén	26/12/2025	28	21.6	21.0	103%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

calle 10					
Vaciado de andén calle 10	8/12/2025	7	27.8	21.0	132%
Vaciado de andén calle 10	8/12/2025	7	29.1	21.0	139%
Vaciado de andén calle 10	29/12/2025	28	32.6	21.0	155%
Vaciado de andén calle 10	29/12/2025	28	29.2	21.0	139%
Vaciado de andén calle 10	9/12/2025	7	28.8	21.0	137%
Vaciado de andén calle 10	9/12/2025	7	18.8	21.0	90%
Vaciado de andén calle 10	30/12/2025	28	30.2	21.0	144%
Vaciado de andén calle 10	30/12/2025	28	25.6	21.0	122%
Vaciado de andén calle 10A	10/12/2025	7	25.9	21.0	123%
Vaciado de andén calle 10A	10/12/2025	7	25.4	21.0	121%
Vaciado de andén calle 10A	31/12/2025	28	12.7	21.0	60%
Vaciado de andén calle 10A	31/12/2025	28	27.7	21.0	132%
Vaciado de andén calle 10A	19/12/2025	14	15.4	21.0	73%
Vaciado de andén calle 10A	19/12/2025	14	20.4	21.0	97%
Vaciado de andén calle 10A	2/01/2026	28	28.9	21.0	138%
Vaciado de andén calle 10A	2/01/2026	28	29.3	21.0	140%
Vaciado Pompeyano rígido Belén Rosales	22/12/2025	7	25.8	28.0	92%
Vaciado Pompeyano rígido Belén Rosales	22/12/2025	7	25.8	28.0	92%
Vaciado Pompeyano rígido Belén Rosales	12/01/2026	28	43.7	28.0	156%
Vaciado Pompeyano rígido Belén Rosales	12/01/2026	28	33.9	28.0	121%
Vaciado de andenes en La ladera	29/12/2025	7	26.0	21.0	124%
Vaciado de andenes en La ladera	29/12/2025	7	27.4	21.0	130%
Vaciado de andenes en La ladera	19/01/2026	28	32.2	21.0	153%
Vaciado de andenes en La ladera	19/01/2026	28	33.8	21.0	161%
Vaciado tramo 1 - La Colinita	30/12/2025	7	19.8	28.0	71%
Vaciado tramo 1 - La Colinita	30/12/2025	7	25.6	28.0	91%
Vaciado tramo 1 - La	20/01/2026	28	32.4	28.0	116%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Colinita					
Vaciado tramo 1 - La Colinita	20/01/2026	28	35.0	28.0	125%
Vaciado tramo 2 - La Colinita	15/01/2026	7	24.3	28.0	87%
Vaciado tramo 2 - La Colinita	15/01/2026	7	32.2	28.0	115%
Vaciado tramo 2 - La Colinita	5/02/2026	28	37.1	28.0	133%
Vaciado tramo 2 - La Colinita	5/02/2026	28	46.4	28.0	166%
Vaciado tramo 3 - La Colinita	20/01/2026	7	25.2	28.0	90%
Vaciado tramo 3 - La Colinita	20/01/2026	7	24.8	28.0	89%
Vaciado tramo 3 - La Colinita	10/02/2026	28	57.9	28.0	207%
Vaciado tramo 3 - La Colinita	10/02/2026	28	54.6	28.0	195%
Vaciado tramo 4 - La Colinita	22/01/2026	7	37.6	28.0	134%
Vaciado tramo 4 - La Colinita	22/01/2026	7	30.9	28.0	110%
Vaciado tramo 4 - La Colinita	12/02/2026	28	34.6	28.0	124%
Vaciado tramo 4 - La Colinita	12/02/2026	28	48.6	28.0	174%
Vaciado tramo 5 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	27/01/2026	7	23.4	28.0	84%
Vaciado tramo 5 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	27/01/2026	7	29.3	28.0	105%
Vaciado tramo 5 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	17/02/2026	28	47.0	28.0	168%
Vaciado tramo 5 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	17/02/2026	28	48.1	28.0	172%
Vaciado tramo de andén	26/01/2026	7	18.4	21.0	88%
Vaciado tramo de andén	26/01/2026	7	17.3	21.0	82%
Vaciado tramo de andén	16/02/2026	28	24.6	21.0	117%
Vaciado tramo de andén	16/02/2026	28	21.5	21.0	102%
Vaciado tramo 6 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	29/01/2026	7	22.1	28.0	79%
Vaciado tramo 6 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	29/01/2026	7	24.9	28.0	89%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Vaciado tramo 6 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	19/02/2026	28	28.1	28.0	100%
Vaciado tramo 6 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	19/02/2026	28	49.9	28.0	178%
Vaciado tramo 7 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	30/01/2026	7	26.3	28.0	94%
Vaciado tramo 7 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	30/01/2026	7	25.3	28.0	90%
Vaciado tramo 7 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	20/02/2026	28	57.9	28.0	207%
Vaciado tramo 7 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	20/02/2026	28	35.2	28.0	126%
Vaciado tramo 8 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	31/01/2026	7	19.6	28.0	70%
Vaciado tramo 8 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	31/01/2026	7	17.6	28.0	63%
Vaciado tramo 8 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	21/02/2026	28	27.2	28.0	97%
Vaciado tramo 8 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	21/02/2026	28	36.0	28.0	129%
Vaciado andén tramo 2	29/01/2026	7	17.3	21.0	82%
Vaciado andén tramo 2	29/01/2026	7	10.7	21.0	51%
Vaciado andén tramo 2	19/02/2026	28	20.5	21.0	98%
Vaciado andén tramo 2	19/02/2026	28	21.2	21.0	101%
Vaciado de rampa en cruce peatonal	31/01/2026	7	24.5	21.0	117%
Vaciado de rampa en cruce peatonal	31/01/2026	7	18.3	21.0	87%
Vaciado de rampa en cruce peatonal	31/01/2026	28	29.2	21.0	139%
Vaciado de rampa en cruce peatonal	31/01/2026	28	26.6	21.0	127%
Andén Manrique	27/01/2026	102	108.3	21.0	515%
Andén Manrique	27/01/2026	102	102.5	21.0	488%
Vaciado tramo 8 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	3/02/2026	7	45.2	28.0	161%
Vaciado tramo 8 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	3/02/2026	7	45.9	28.0	164%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Vaciado tramo 8 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	24/02/2026	28	42.7	28.0	153%
Vaciado tramo 8 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	24/02/2026	28	43.5	28.0	155%
Vaciado tramo 9 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	4/02/2026	7	22.9	28.0	82%
Vaciado tramo 9 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	4/02/2026	7	25.0	28.0	89%
Vaciado tramo 9 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	25/02/2026	28	22.9	28.0	82%
Vaciado tramo 9 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	25/02/2026	28	25.0	28.0	89%
Vaciado tramo 10 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	5/02/2026	7	12.2	28.0	44%
Vaciado tramo 10 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	5/02/2026	7	14.9	28.0	53%
Vaciado tramo 10 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	26/02/2026	28	59.1	28.0	211%
Vaciado tramo 10 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	26/02/2026	28	51.9	28.0	185%
Vaciado escalas en separador. Avenida Las Vegas	4/02/2026	7	15.3	21.0	73%
Vaciado escalas en separador. Avenida Las Vegas	4/02/2026	7	19.0	21.0	90%
Vaciado escalas en separador. Avenida Las Vegas	28/01/2026	28	17.5	21.0	83%
Vaciado escalas en separador. Avenida Las Vegas	28/01/2026	28	16.0	21.0	76%
Vaciado tramo 11 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	6/02/2026	7	44.6	28.0	159%
Vaciado tramo 11 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	6/02/2026	7	44.2	28.0	158%
Vaciado tramo 11 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	27/02/2026	28	49.2	28.0	176%
Vaciado tramo 11 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	27/02/2026	28	43.5	28.0	155%
Vaciado andenes La	9/02/2026	7	14.5	21.0	69%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Colinita					
Vaciado andenes La Colinita	9/02/2026	7	12.2	21.0	58%
Vaciado andenes La Colinita	2/03/2026	28	26.7	21.0	127%
Vaciado andenes La Colinita	2/03/2026	28	22.2	21.0	106%
Vaciado de ajustes de viga y losa en Monterrey	9/02/2026	7	14.2	21.0	68%
Vaciado de ajustes de viga y losa en Monterrey	9/02/2026	7	15.6	21.0	74%
Vaciado de ajustes de viga y losa en Monterrey	2/03/2026	28	33.6	21.0	160%
Vaciado de ajustes de viga y losa en Monterrey	2/03/2026	28	37.4	21.0	178%
Vaciado andenes La Colinita	10/02/2026	7	21.2	21.0	101%
Vaciado andenes La Colinita	10/02/2026	7	18.2	21.0	87%
Vaciado andenes La Colinita	3/03/2026	28	32.2	21.0	153%
Vaciado andenes La Colinita	3/03/2026	28	26.6	21.0	127%
Vaciado de andenes en Las Vegas	14/02/2026	7	17.5	21.0	83%
Vaciado de andenes en Las Vegas	14/02/2026	7	22.8	21.0	109%
Vaciado de fajas en concreto en cárcamos de San Juan	11/02/2026	7	15.3	28.0	55%
Vaciado de fajas en concreto en cárcamos de San Juan	11/02/2026	7	14.7	28.0	53%
Vaciado de fajas en concreto en cárcamos de San Juan	4/03/2026	28	30.7	28.0	110%
Vaciado de fajas en concreto en cárcamos de San Juan	4/03/2026	28	31.0	28.0	111%
Vaciado de fajas en concreto en cárcamos de San Juan	14/02/2026	7	39.4	28.0	141%
Vaciado de fajas en concreto en cárcamos de San Juan	14/02/2026	7	23.5	28.0	84%
Pompeyano rígido No. 8A. Primer tramo Belén Rosales	11/02/2026	7	4.6	28.0	16%
Pompeyano rígido No. 8A. Primer tramo Belén Rosales	11/02/2026	7	8.9	28.0	32%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Vaciado de fajas en concreto en San Juan	13/02/2026	7	25.3	28.0	90%
Vaciado de fajas en concreto en San Juan	13/02/2026	7	19.8	28.0	71%
Pompeyano rígido No. 8A. Segundo tramo Belén Rosales	19/02/2026	7	17.8	28.0	64%
Pompeyano rígido No. 8A. Segundo tramo Belén Rosales	19/02/2026	7	12.1	28.0	43%
Vaciado fajas en concreto cárcamos de San Juan	16/02/2026	7	20.7	28.0	74%
Vaciado fajas en concreto cárcamos de San Juan	16/02/2026	7	20.2	28.0	72%
Vaciado fajas en concreto cárcamos de San Juan	11/02/2026	7	30.2	28.0	108%
Vaciado fajas en concreto cárcamos de San Juan	11/02/2026	7	29.1	28.0	104%
Vaciado ajustes en concreto viga Carabobo	18/02/2026	7	8.9	21.0	42%
Vaciado ajustes en concreto viga Carabobo	18/02/2026	7	13.7	21.0	65%
Pompeyano rígido No. 5. Primer tramo Belén Rosales	24/02/2026	7	38.6	28.0	138%
Pompeyano rígido No. 5. Primer tramo Belén Rosales	24/02/2026	7	45.1	28.0	161%
Pompeyano rígido No. 5. Segundo tramo Belén Rosales	25/02/2026	7	43.9	28.0	157%
Pompeyano rígido No. 5. Segundo tramo Belén Rosales	25/02/2026	7	45.3	28.0	162%
Fajas en concreto para construcción de cárcamos	24/02/2026	7	41.3	28.0	148%
Fajas en concreto para construcción de cárcamos	24/02/2026	7	43.7	28.0	156%
Vaciado ajuste viga Carabobo	24/02/2026	7	41.2	28.0	147%
Vaciado ajuste viga Carabobo	24/02/2026	7	43.2	28.0	154%
Fajas en concreto para construcción de cárcamos San Juan	26/02/2026	7	34.4	28.0	123%
Fajas en concreto para construcción de	26/02/2026	7	27.0	28.0	96%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

cárcamos San Juan					
Vaciado de tapas de cárcamo en Volador	24/02/2026	7	34.5	28.0	123%
Vaciado de tapas de cárcamo en Volador	24/02/2026	7	28.6	28.0	102%
Vaciado pompeyano rígido 5.1 Belén Rosales	27/02/2026	7	22.5	28.0	80%
Vaciado pompeyano rígido 5.1 Belén Rosales	27/02/2026	7	14.6	28.0	52%
Vaciado ajustes San Juan	4/03/2026	7	9.9	28.0	35%
Vaciado ajustes San Juan	4/03/2026	7	11.4	28.0	41%
Vaciado de andenes La Colinita	9/02/2026	7	14,5	21,0	69%
Vaciado de andenes La Colinita	9/02/2026	7	12,2	21,0	58%
Vaciado de andenes La Colinita	2/03/2026	28	26,7	21,0	127%
Vaciado de andenes La Colinita	2/03/2026	28	22,2	21,0	104%
Vaciado de ajustes de viga y losa en Monterrey	9/02/2026	7	14,2	28,0	50%
Vaciado de ajustes de viga y losa en Monterrey	9/02/2026	7	15,6	28,0	56%
Vaciado de ajustes de viga y losa en Monterrey	2/03/2026	28	33,6	28,0	119%
Vaciado de ajustes de viga y losa en Monterrey	2/03/2026	28	37,4	28,0	132%
Vaciado andenes La Colinita	10/02/2026	7	21,2	21,0	101%
Vaciado andenes La Colinita	10/02/2026	7	18,2	21,0	86%
Vaciado andenes La Colinita	3/03/2026	28	32,2	21,0	153%
Vaciado andenes La Colinita	3/03/2026	28	26,6	21,0	125%
Vaciado de andenes en Las Vegas	14/02/2026	7	17,5	21,0	82%
Vaciado de andenes en Las Vegas	14/02/2026	7	22,8	21,0	108%
Vaciado de andenes en Las Vegas	7/03/2026	28	22,9	21,0	108%
Vaciado de andenes en Las Vegas	7/03/2026	28	23,7	21,0	112%
Vaciado de fajas en concreto en cárcamos de San Juan	11/02/2026	7	15,3	28,0	55%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Vaciado de fajas en concreto en cárcamos de San Juan	11/02/2026	7	14,7	28,0	52%
Vaciado de fajas en concreto en cárcamos de San Juan	4/03/2026	28	30,7	28,0	108%
Vaciado de fajas en concreto en cárcamos de San Juan	4/03/2026	28	31,0	28,0	110%
Vaciado de fajas en concreto en cárcamos de San Juan	14/02/2026	7	39,4	28,0	140%
Vaciado de fajas en concreto en cárcamos de San Juan	14/02/2026	7	23,5	28,0	83%
Vaciado de fajas en concreto en cárcamos de San Juan	7/03/2026	28	29,1	28,0	103%
Vaciado de fajas en concreto en cárcamos de San Juan	7/03/2026	28	37,4	28,0	132%
Pompeyano rígido No. 8A. Primer tramo Belén Rosales	18/02/2026	7	4,6	28,0	16%
Pompeyano rígido No. 8A. Primer tramo Belén Rosales	18/02/2026	7	8,9	28,0	31%
Pompeyano rígido No. 8A. Primer tramo Belén Rosales	11/03/2026	28	19,2	28,0	68%
Pompeyano rígido No. 8A. Primer tramo Belén Rosales	11/03/2026	28	19,6	28,0	69%
Vaciado de fajas en concreto en San Juan	13/02/2026	7	25,3	28,0	89%
Vaciado de fajas en concreto en San Juan	13/02/2026	7	19,8	28,0	70%
Vaciado de fajas en concreto en San Juan	6/03/2026	28	55,1	28,0	197%
Vaciado de fajas en concreto en San Juan	6/03/2026	28	48,2	28,0	170%
Pompeyano rígido No. 8A. Segundo tramo Belén Rosales	19/02/2026	7	17,8	28,0	63%
Pompeyano rígido No. 8A. Segundo tramo Belén Rosales	19/02/2026	7	12,1	28,0	43%
Pompeyano rígido No. 8A. Segundo tramo Belén Rosales	12/03/2026	28	47,8	28,0	171%
Pompeyano rígido No. 8A. Segundo tramo Belén Rosales	12/03/2026	28	16,9	28,0	60%
Vaciado fajas en concreto cárcamos de	16/02/2026	7	20,7	28,0	73%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

San Juan					
Vaciado fajas en concreto cárcamos de San Juan	16/02/2026	7	20,2	28,0	71%
Vaciado fajas en concreto cárcamos de San Juan	9/03/2026	28	43,5	28,0	154%
Vaciado fajas en concreto cárcamos de San Juan	9/03/2026	28	48,1	28,0	172%
Vaciado fajas en concreto cárcamos de San Juan	18/02/2026	7	30,2	28,0	108%
Vaciado fajas en concreto cárcamos de San Juan	18/02/2026	7	29,1	28,0	104%
Vaciado fajas en concreto cárcamos de San Juan	11/03/2026	28	35,6	28,0	127%
Vaciado fajas en concreto cárcamos de San Juan	11/03/2026	28	38,0	28,0	136%
Vaciado ajustes en concreto viga Carabobo	18/02/2026	7	8,9	21,0	42%
Vaciado ajustes en concreto viga Carabobo	18/02/2026	7	13,7	21,0	65%
Vaciado ajustes en concreto viga Carabobo	11/03/2026	28	20,1	21,0	95%
Vaciado ajustes en concreto viga Carabobo	11/03/2026	28	37,5	21,0	179%
Pompeyano rígido No. 5. Primer tramo Belén Rosales	24/02/2026	7	38,6	28,0	136%
Pompeyano rígido No. 5. Primer tramo Belén Rosales	24/02/2026	7	45,1	28,0	161%
Pompeyano rígido No. 5. Primer tramo Belén Rosales	17/03/2026	28	48,3	28,0	171%
Pompeyano rígido No. 5. Primer tramo Belén Rosales	17/03/2026	28	42,5	28,0	150%
Pompeyano rígido No. 5. Segundo tramo Belén Rosales	25/02/2026	7	43,9	28,0	157%
Pompeyano rígido No. 5. Segundo tramo Belén Rosales	25/02/2026	7	45,3	28,0	162%
Pompeyano rígido No. 5. Segundo tramo Belén Rosales	18/03/2026	28	43,7	28,0	154%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Pompeyano rígido No. 5. Segundo tramo Belén Rosales	18/03/2026	28	40,3	28,0	142%
Fajas en concreto para construcción de cárcamos	24/02/2026	7	41,3	28,0	147%
Fajas en concreto para construcción de cárcamos	24/02/2026	7	43,7	28,0	156%
Fajas en concreto para construcción de cárcamos	17/03/2026	28	52,5	28,0	187%
Fajas en concreto para construcción de cárcamos	17/03/2026	28	51,6	28,0	184%
Vaciado ajuste viga Carabobo	24/02/2026	7	41,2	28,0	147%
Vaciado ajuste viga Carabobo	24/02/2026	7	43,2	28,0	154%
Vaciado ajuste viga Carabobo	17/03/2026	28	40,0	28,0	141%
Vaciado ajuste viga Carabobo	17/03/2026	28	42,0	28,0	148%
Fajas en concreto para construcción de cárcamos San Juan	26/02/2026	7	34,4	28,0	123%
Fajas en concreto para construcción de cárcamos San Juan	26/02/2026	7	27,0	28,0	97%
Fajas en concreto para construcción de cárcamos San Juan	19/03/2026	28	41,3	28,0	147%
Fajas en concreto para construcción de cárcamos San Juan	19/03/2026	28	41,7	28,0	149%
Vaciado de tapas de cárcamo en Volador	24/02/2026	7	34,5	28,0	123%
Vaciado de tapas de cárcamo en Volador	24/02/2026	7	28,6	28,0	101%
Vaciado de tapas de cárcamo en Volador	17/03/2026	28	30,3	28,0	107%
Vaciado de tapas de cárcamo en Volador	17/03/2026	28	29,7	28,0	105%
Vaciado pompeyano rígido 5.1 Belén Rosales	27/02/2026	7	22,5	28,0	80%
Vaciado pompeyano rígido 5.1 Belén Rosales	27/02/2026	7	14,6	28,0	52%
Vaciado pompeyano rígido 5.1 Belén Rosales	20/03/2026	28	35,4	28,0	125%
Vaciado pompeyano rígido 5.1 Belén Rosales	20/03/2026	28	47,0	28,0	168%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Vaciado ajustes San Juan	4/03/2026	7	9,9	28,0	35%
Vaciado ajustes San Juan	4/03/2026	7	9,9	28,0	35%
Vaciado ajustes San Juan	4/03/2026	7	11,4	28,0	41%
Vaciado ajustes San Juan	25/03/2026	28	13,9	28,0	49%
Vaciado ajustes San Juan	25/03/2026	28	11,2	28,0	40%
Vaciado losa calle 10A	5/03/2026	7	25,7	28,0	92%
Vaciado losa calle 10A	5/03/2026	7	22,3	28,0	79%
Vaciado losa calle 10A	26/03/2026	28	30,3	28,0	107%
Vaciado losa calle 10A	26/03/2026	28	26,4	28,0	93%
Vaciado muros laterales cárcamo calle 10A	7/03/2026	7	25,7	28,0	92%
Vaciado muros laterales cárcamo calle 10A	7/03/2026	7	23,3	28,0	83%
Vaciado muros laterales cárcamo calle 10A	28/03/2026	28	32,3	28,0	116%
Vaciado muros laterales cárcamo calle 10A	28/03/2026	28	22,6	28,0	80%
Vaciado losa calle 10A lateral izquierdo	10/03/2026	7	20,0	28,0	71%
Vaciado losa calle 10A lateral izquierdo	10/03/2026	7	20,2	28,0	72%
Vaciado losa calle 10A lateral izquierdo	31/03/2026	28	24,0	28,0	86%
Vaciado losa calle 10A lateral izquierdo	31/03/2026	28	12,8	28,0	46%
Vaciado muros laterales cárcamo calle 10A lateral izquierdo	11/03/2026	7	13,4	28,0	47%
Vaciado muros laterales cárcamo calle 10A lateral izquierdo	11/03/2026	7	17,2	28,0	62%
Vaciado muros laterales cárcamo Suramericana	12/03/2026	7	17,9	28,0	63%
Vaciado muros laterales cárcamo Suramericana	12/03/2026	7	17,1	28,0	60%
Vaciado vigas de contención La Asomadera	13/03/2026	7	24,3	28,0	87%
Vaciado vigas de contención La Asomadera	13/03/2026	7	25,4	28,0	91%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Vaciado vigas de contención La Asomadera	14/03/2026	7	20,4	28,0	73%
Vaciado vigas de contención La Asomadera	14/03/2026	7	15,6	28,0	55%
Vaciado muros laterales cárcamo Suramericana	13/03/2026	7	33,8	28,0	121%
Vaciado muros laterales cárcamo Suramericana	13/03/2026	7	16,7	28,0	59%
Vaciado de muros cárcamos 2 y 3 losa cárcamo 2	19/03/2026	7	18,9	28,0	67%
Vaciado de muros cárcamos 2 y 3 losa cárcamo 2	19/03/2026	7	13,8	28,0	49%
Vaciado losa cárcamo 1	16/03/2026	7	24,5	28,0	88%
Vaciado losa cárcamo 1	16/03/2026	7	18,5	28,0	65%
Vaciado de cárcamo Caicedo	18/03/2026	7	19,2	28,0	68%
Vaciado de cárcamo Caicedo	18/03/2026	7	14,0	28,0	49%
MED VIAL F#18 28/01/2026 M-104 - Andén en Cr 48 entre Cll 15 sur y DG 47A	31/03/2026	62	35,2	21,0	168%
MED VIAL F#18 28/01/2026 M-105 - Andén en Cr 48 entre Cll 15 sur y DG 47A	31/03/2026	62	34,3	21,0	163%
Pompeyano rígido No. 5. Primer tramo Belén Rosales	24/02/2026	7	38,6	28,0	136%
Pompeyano rígido No. 5. Primer tramo Belén Rosales	24/02/2026	7	45,1	28,0	161%
Pompeyano rígido No. 5. Primer tramo Belén Rosales	17/03/2026	28	48,3	28,0	171%
Pompeyano rígido No. 5. Primer tramo Belén Rosales	17/03/2026	28	42,5	28,0	150%
Pompeyano rígido No. 5. Segundo tramo Belén Rosales	25/02/2026	7	43,9	28,0	157%
Pompeyano rígido No. 5. Segundo tramo Belén	25/02/2026	7	45,3	28,0	162%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Rosales					
Pompeyano rígido No. 5. Segundo tramo Belén Rosales	18/03/2026	28	43,7	28,0	154%
Pompeyano rígido No. 5. Segundo tramo Belén Rosales	18/03/2026	28	40,3	28,0	142%
Fajas en concreto para construcción de cárcamos	24/02/2026	7	41,3	28,0	147%
Fajas en concreto para construcción de cárcamos	24/02/2026	7	43,7	28,0	156%
Fajas en concreto para construcción de cárcamos	17/03/2026	28	52,5	28,0	187%
Fajas en concreto para construcción de cárcamos	17/03/2026	28	51,6	28,0	184%
Vaciado ajuste viga Carabobo	24/02/2026	7	41,2	28,0	147%
Vaciado ajuste viga Carabobo	24/02/2026	7	43,2	28,0	154%
Vaciado ajuste viga Carabobo	17/03/2026	28	40,0	28,0	141%
Vaciado ajuste viga Carabobo	17/03/2026	28	42,0	28,0	148%
Fajas en concreto para construcción de cárcamos San Juan	26/02/2026	7	34,4	28,0	123%
Fajas en concreto para construcción de cárcamos San Juan	26/02/2026	7	27,0	28,0	97%
Fajas en concreto para construcción de cárcamos San Juan	19/03/2026	28	41,3	28,0	147%
Fajas en concreto para construcción de cárcamos San Juan	19/03/2026	28	41,7	28,0	149%
Vaciado de tapas de cárcamo en Volador	24/02/2026	7	34,5	28,0	123%
Vaciado de tapas de cárcamo en Volador	24/02/2026	7	28,6	28,0	101%
Vaciado de tapas de cárcamo en Volador	17/03/2026	28	30,3	28,0	107%
Vaciado de tapas de cárcamo en Volador	17/03/2026	28	29,7	28,0	105%
Vaciado pompeyano rígido 5.1 Belén Rosales	27/02/2026	7	22,5	28,0	80%
Vaciado pompeyano rígido 5.1 Belén Rosales	27/02/2026	7	14,6	28,0	52%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Vaciado pompeyano rígido 5.1 Belén Rosales	20/03/2026	28	35,4	28,0	125%
Vaciado pompeyano rígido 5.1 Belén Rosales	20/03/2026	28	47,0	28,0	168%
Vaciado ajustes San Juan	25/03/2026	28	13,9	28,0	49%
Vaciado ajustes San Juan	25/03/2026	28	11,2	28,0	40%
Vaciado losa calle 10A	3/05/2026	7	25,7	28,0	92%
Vaciado losa calle 10A	3/05/2026	7	22,3	28,0	79%
Vaciado losa calle 10A	26/03/2026	28	30,3	28,0	107%
Vaciado losa calle 10A	26/03/2026	28	26,4	28,0	93%
Vaciado muros laterales cárcamo calle 10A	3/07/2026	7	25,7	28,0	92%
Vaciado muros laterales cárcamo calle 10A	3/07/2026	7	23,3	28,0	83%
Vaciado muros laterales cárcamo calle 10A	28/03/2026	28	32,3	28,0	116%
Vaciado muros laterales cárcamo calle 10A	28/03/2026	28	22,6	28,0	80%
Pompeyano rígido No. 8A. Primer tramo Belén Rosales	18/02/2026	7	4,6	28,0	16%
Pompeyano rígido No. 8A. Primer tramo Belén Rosales	18/02/2026	7	8,9	28,0	31%
Pompeyano rígido No. 8A. Primer tramo Belén Rosales	3/11/2026	28	19,2	28,0	68%
Pompeyano rígido No. 8A. Primer tramo Belén Rosales	3/11/2026	28	19,6	28,0	69%
Vaciado de fajas en concreto en San Juan	13/02/2026	7	25,3	28,0	89%
Vaciado de fajas en concreto en San Juan	13/02/2026	7	19,8	28,0	70%
Vaciado de fajas en concreto en San Juan	3/06/2026	28	55,1	28,0	197%
Vaciado de fajas en concreto en San Juan	3/06/2026	28	48,2	28,0	170%
Pompeyano rígido No. 8A. Segundo tramo Belén Rosales	19/02/2026	7	17,8	28,0	63%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Pompeyano rígido No. 8A. Segundo tramo Belén Rosales	19/02/2026	7	12,1	28,0	43%
Pompeyano rígido No. 8A. Segundo tramo Belén Rosales	3/12/2026	28	47,8	28,0	171%
Pompeyano rígido No. 8A. Segundo tramo Belén Rosales	3/12/2026	28	16,9	28,0	60%
Vaciado ajustes en concreto viga Carabobo	18/02/2026	7	8,9	21,0	42%
Vaciado ajustes en concreto viga Carabobo	18/02/2026	7	13,7	21,0	65%
Vaciado ajustes en concreto viga Carabobo	3/11/2026	28	20,1	21,0	95%
Vaciado ajustes en concreto viga Carabobo	3/11/2026	28	37,5	21,0	179%
Pompeyano rígido No. 5. Primer tramo Belén Rosales	24/02/2026	7	38,6	28,0	136%
Pompeyano rígido No. 5. Primer tramo Belén Rosales	24/02/2026	7	45,1	28,0	161%
Pompeyano rígido No. 5. Primer tramo Belén Rosales	17/03/2026	28	48,3	28,0	171%
Pompeyano rígido No. 5. Primer tramo Belén Rosales	17/03/2026	28	42,5	28,0	150%
Pompeyano rígido No. 5. Segundo tramo Belén Rosales	25/02/2026	7	43,9	28,0	157%
Pompeyano rígido No. 5. Segundo tramo Belén Rosales	25/02/2026	7	45,3	28,0	162%
Pompeyano rígido No. 5. Segundo tramo Belén Rosales	18/03/2026	28	43,7	28,0	154%
Pompeyano rígido No. 5. Segundo tramo Belén Rosales	18/03/2026	28	40,3	28,0	142%
Fajas en concreto para construcción de cárcamos	24/02/2026	7	41,3	28,0	147%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Fajas en concreto para construcción de cárcamos	24/02/2026	7	43,7	28,0	156%
Fajas en concreto para construcción de cárcamos	17/03/2026	28	52,5	28,0	187%
Fajas en concreto para construcción de cárcamos	17/03/2026	28	51,6	28,0	184%
Vaciado ajuste viga Carabobo	24/02/2026	7	41,2	28,0	147%
Vaciado ajuste viga Carabobo	24/02/2026	7	43,2	28,0	154%
Vaciado ajuste viga Carabobo	17/03/2026	28	40,0	28,0	141%
Vaciado ajuste viga Carabobo	17/03/2026	28	42,0	28,0	148%
Fajas en concreto para construcción de cárcamos San Juan	26/02/2026	7	34,4	28,0	123%
Fajas en concreto para construcción de cárcamos San Juan	26/02/2026	7	27,0	28,0	97%
Fajas en concreto para construcción de cárcamos San Juan	19/03/2026	28	41,3	28,0	147%
Fajas en concreto para construcción de cárcamos San Juan	19/03/2026	28	41,7	28,0	149%
Vaciado de tapas de cárcamo en Volador	24/02/2026	7	34,5	28,0	123%
Vaciado de tapas de cárcamo en Volador	24/02/2026	7	28,6	28,0	101%
Vaciado de tapas de cárcamo en Volador	17/03/2026	28	30,3	28,0	107%
Vaciado de tapas de cárcamo en Volador	17/03/2026	28	29,7	28,0	105%
Vaciado pompeyano rígido 5.1 Belén Rosales	27/02/2026	7	22,5	28,0	80%
Vaciado pompeyano rígido 5.1 Belén Rosales	27/02/2026	7	14,6	28,0	52%
Vaciado pompeyano rígido 5.1 Belén Rosales	20/03/2026	28	35,4	28,0	125%
Vaciado pompeyano rígido 5.1 Belén Rosales	20/03/2026	28	47,0	28,0	168%
Vaciado ajustes San Juan	3/04/2026	7	9,9	28,0	35%
Vaciado ajustes San Juan	3/04/2026	7	11,4	28,0	41%
Vaciado ajustes San Juan	25/03/2026	28	13,9	28,0	49%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Vaciado ajustes San Juan	25/03/2026	28	11,2	28,0	40%
Vaciado losa calle 10A	3/05/2026	7	25,7	28,0	92%
Vaciado losa calle 10A	3/05/2026	7	22,3	28,0	79%
Vaciado losa calle 10A	26/03/2026	28	30,3	28,0	107%
Vaciado losa calle 10A	26/03/2026	28	26,4	28,0	93%
Vaciado muros laterales cárcamo calle 10A	3/07/2026	7	25,7	28,0	92%
Vaciado muros laterales cárcamo calle 10A	3/07/2026	7	23,3	28,0	83%
Vaciado muros laterales cárcamo calle 10A	28/03/2026	28	32,3	28,0	116%
Vaciado muros laterales cárcamo calle 10A	28/03/2026	28	22,6	28,0	80%
Vaciado andenes La Colinita	10/02/2026	7	21,2	21,0	101%
Vaciado andenes La Colinita	10/02/2026	7	18,2	21,0	86%
Vaciado andenes La Colinita	3/03/2026	28	32,2	21,0	153%
Vaciado andenes La Colinita	3/03/2026	28	26,6	21,0	125%
Vaciado de andenes en Las Vegas	14/02/2026	7	17,5	21,0	82%
Vaciado de andenes en Las Vegas	14/02/2026	7	22,8	21,0	108%
Vaciado de andenes en Las Vegas	7/03/2026	28	22,9	21,0	108%
Vaciado de andenes en Las Vegas	7/03/2026	28	23,7	21,0	112%
Vaciado de fajas en concreto en cárcamos de San Juan	11/02/2026	7	15,3	28,0	55%
Vaciado de fajas en concreto en cárcamos de San Juan	11/02/2026	7	14,7	28,0	52%
Vaciado de fajas en concreto en cárcamos de San Juan	4/03/2026	28	30,7	28,0	108%
Vaciado de fajas en concreto en cárcamos de San Juan	4/03/2026	28	31,0	28,0	110%
Vaciado de fajas en concreto en cárcamos de San Juan	14/02/2026	7	39,4	28,0	140%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

Vaciado de fajas en concreto en cárcamos de San Juan	14/02/2026	7	23,5	28,0	83%
Vaciado de fajas en concreto en cárcamos de San Juan	7/03/2026	28	29,1	28,0	103%
Vaciado de fajas en concreto en cárcamos de San Juan	7/03/2026	28	37,4	28,0	132%
Vaciado de rampa en cruce peatonal	21/02/2026	28	29,2	21,0	139%
Vaciado de rampa en cruce peatonal	21/02/2026	28	26,6	21,0	127%
Vaciado tramo 9 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	25/02/2026	28	57,1	28,0	204%
Vaciado tramo 9 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	25/02/2026	28	42,7	28,0	153%
Vaciado escalas en separador. Avenida Las Vegas	25/02/2026	28	17,5	21,0	83%
Vaciado escalas en separador. Avenida Las Vegas	25/02/2026	28	16,0	21,0	76%
Vaciado fajas en concreto cárcamos de San Juan	8/04/2026	56	43,0	28,0	154%
Vaciado fajas en concreto cárcamos de San Juan	8/04/2026	56	35,5	28,0	127%

	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO					
No.	**ESTRUCTURA**	**FECHA DE TOMA DE MUESTRA**	**EDAD (DÍAS)**	**MÓDULO DE ROTURA (Mpa)**	**MÓDULO DE ROTURA DE DISEÑO (MPa)**	**% RESISTENCIA DE DISEÑO**
	Pompeyano Calle 107 con carrera 47	19/09/2025	7	3.15	4.00	79%
	Pompeyano Calle 107 con carrera 47	19/09/2025	7	3.40	4.00	85%
	Pompeyano Calle 107 con carrera 47	10/10/2025	28	3.65	4.00	91%
	Pompeyano Calle 107 con carrera 47	10/10/2025	28	3.65	4.00	91%
	Pompeyano carrera 89DB No. 29C-45	20/09/2025	7	4.55	4.00	114%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

	Pompeyano carrera 89DB No. 29C-45	20/09/2025	7	4.25	4.00	106%
	Pompeyano carrera 89DB No. 29C-45	11/10/2025	28	4.60	4.00	115%
	Pompeyano carrera 89DB No. 29C-45	11/10/2025	28	4.50	4.00	113%
	Pompeyano carrera 43A con calle 10	25/09/2025	7	3.40	4.00	85%
	Pompeyano carrera 43A con calle 10	25/09/2025	7	3.90	4.00	98%
	Pompeyano carrera 43A con calle 10	16/10/2025	28	4.40	4.00	110%
	Pompeyano carrera 43A con calle 10	16/10/2025	28	4.35	4.00	109%
	Pompeyano carrera 65D No. 34-53	29/09/2025	7	4.00	4.00	100%
	Pompeyano carrera 65D No. 34-53	29/09/2025	7	3.95	4.00	99%
	Pompeyano carrera 65D No. 34-53	20/10/2025	28	4.55	4.00	114%
	Pompeyano carrera 65D No. 34-53	20/10/2025	28	4.70	4.00	118%
	Pompeyano Calle 32F No. 66B-206	1/10/2025	7	4.75	4.00	119%
	Pompeyano Calle 32F No. 66B-206	1/10/2025	7	4.40	4.00	110%
	Pompeyano Calle 32F No. 66B-206	22/10/2025	28	5.00	4.00	125%
	Pompeyano Calle 32F No. 66B-206	22/10/2025	28	4.90	4.00	123%
	Pompeyano Carrera 65D con calle 34	6/10/2025	7	4.60	4.00	115%
	Pompeyano Carrera 65D con calle 34	6/10/2025	7	4.65	4.00	116%
	Pompeyano Carrera 65D con calle 34	27/10/2025	28	4.95	4.00	124%
	Pompeyano Carrera 65D con calle 34	27/10/2025	28	5.00	4.00	125%
	Pompeyano Calle 107 con carrera 49B	15/10/2025	7	4.35	4.00	109%
	Pompeyano Calle 107 con carrera 49B	15/10/2025	7	4.45	4.00	111%
	Pompeyano Calle 107 con carrera 49B	5/11/2025	28	4.90	4.00	123%
	Pompeyano Calle 107 con carrera 49B	5/11/2025	28	5.25	4.00	131%
	Pompeyano Enciso los Mangos	18/10/2025	7	4.60	4.00	115%
	Pompeyano Enciso los Mangos	18/10/2025	7	4.45	4.00	111%
	Pompeyano Enciso los Mangos	8/11/2025	28	5.40	4.00	135%
	Pompeyano Enciso los Mangos	8/11/2025	28	5.60	4.00	140%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

	Pompeyano Enciso los Mangos	22/10/2025	7	4.90	4.00	123%
	Pompeyano Enciso los Mangos	22/10/2025	7	4.15	4.00	104%
	Pompeyano Enciso los Mangos	12/11/2025	28	5.60	4.00	140%
	Pompeyano Enciso los Mangos	12/11/2025	28	5.65	4.00	141%
	Pompeyano Enciso los Mangos	29/10/2025	7	5.05	4.00	126%
	Pompeyano Enciso los Mangos	29/10/2025	7	5.30	4.00	133%
	Pompeyano Enciso los Mangos	19/11/2025	28	6.00	4.00	150%
	Pompeyano Enciso los Mangos	19/11/2025	28	6.05	4.00	151%
	Pompeyano Enciso los Mangos	3/11/2025	7	5.10	4.00	128%
	Pompeyano Enciso los Mangos	3/11/2025	7	4.10	4.00	103%
	Pompeyano Enciso los Mangos	24/11/2025	28	5.10	4.00	128%
	Pompeyano Enciso los Mangos	24/11/2025	28	5.70	4.00	143%
	Pompeyano Enciso los Mangos	4/11/2025	7	5.00	4.00	125%
	Pompeyano Enciso los Mangos	4/11/2025	7	4.85	4.00	121%
	Pompeyano Enciso los Mangos	25/11/2025	28	5.80	4.00	145%
	Pompeyano Enciso los Mangos	25/11/2025	28	5.15	4.00	129%
	Pompeyano Enciso los Mangos	6/11/2025	7	4.30	4.00	108%
	Pompeyano Enciso los Mangos	6/11/2025	7	4.45	4.00	111%
	Pompeyano Enciso los Mangos	27/11/2025	28	5.00	4.00	125%
	Pompeyano Enciso los Mangos	27/11/2025	28	5.45	4.00	136%
	Pompeyano Enciso los Mangos	12/11/2025	7	5.05	4.00	126%
	Pompeyano Enciso los Mangos	12/11/2025	7	5.10	4.00	128%
	Pompeyano Enciso los Mangos	3/12/2025	28	5.20	4.00	130%
	Pompeyano Enciso los Mangos	3/12/2025	28	6.80	4.00	170%
	Pompeyano Enciso los Mangos	14/11/2025	7	4.70	4.00	118%
	Pompeyano Enciso los Mangos	14/11/2025	7	4.95	4.00	124%
	Pompeyano Enciso los Mangos	5/12/2025	28	5.50	4.00	138%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

	Pompeyano Enciso los Mangos	5/12/2025	28	5.80	4.00	145%
	Pompeyano Enciso los Mangos	17/11/2025	7	5.95	4.00	149%
	Pompeyano Enciso los Mangos	17/11/2025	7	5.10	4.00	128%
	Pompeyano Enciso los Mangos	8/12/2025	28	6.10	4.00	153%
	Pompeyano Enciso los Mangos	8/12/2025	28	6.50	4.00	163%
	Pompevano Tranvía Plaza	18/11/2025	7	5.40	4.00	135%
	Pompevano Tranvía Plaza	18/11/2025	7	5.70	4.00	143%
	Pompevano Tranvía Plaza	9/12/2025	28	5.80	4.00	145%
	Pompevano Tranvía Plaza	9/12/2025	28	6.10	4.00	153%
	Pompevano Tranvía Plaza	20/11/2025	7	5.05	4.00	126%
	Pompevano Tranvía Plaza	20/11/2025	7	5.70	4.00	143%
	Pompevano Tranvía Plaza	11/12/2025	28	5.60	4.00	140%
	Pompevano Tranvía Plaza	11/12/2025	28	6.35	4.00	159%
	Vaciado tramo 1 - La Colinita	30/12/2025	7	5.75	4.00	144%
	Vaciado tramo 1 - La Colinita	30/12/2025	7	5.25	4.00	131%
	Vaciado tramo 1 - La Colinita	20/01/2026	28	5.95	4.00	149%
	Vaciado tramo 1 - La Colinita	20/01/2026	28	5.30	4.00	133%
	Vaciado tramo 2 - La Colinita	15/01/2026	7	4.75	4.00	119%
	Vaciado tramo 2 - La Colinita	15/01/2026	7	5.40	4.00	135%
	Vaciado tramo 2 - La Colinita	5/02/2026	28	5.00	4.00	125%
	Vaciado tramo 2 - La Colinita	5/02/2026	28	6.05	4.00	151%
	Vaciado tramo 3 - La Colinita	20/01/2026	7	4.85	4.00	121%
	Vaciado tramo 3 - La Colinita	20/01/2026	7	5.25	4.00	131%
	Vaciado tramo 3 - La Colinita	10/02/2026	28	5.15	4.00	129%
	Vaciado tramo 3 - La Colinita	10/02/2026	28	5.40	4.00	135%
	Vaciado tramo 4 - La Colinita	22/01/2026	7	5.15	4.00	129%
	Vaciado tramo 4 - La Colinita	22/01/2026	7	5.60	4.00	140%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

	Vaciado tramo 4 - La Colinita	12/02/2026	28	6.85	4.00	171%
	Vaciado tramo 4 - La Colinita	12/02/2026	28	6.70	4.00	168%
	Vaciado tramo 5 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	27/01/2026	7	4.90	4.00	123%
	Vaciado tramo 5 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	27/01/2026	7	5.25	4.00	131%
	Vaciado tramo 5 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	17/02/2026	28	6.25	4.00	156%
	Vaciado tramo 5 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	17/02/2026	28	5.90	4.00	148%
	Vaciado tramo 6 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	29/01/2026	7	5.65	4.00	141%
	Vaciado tramo 6 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	29/01/2026	7	5.15	4.00	129%
	Vaciado tramo 6 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	19/02/2026	28	5.80	4.00	145%
	Vaciado tramo 6 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	19/02/2026	28	6.00	4.00	150%
	Vaciado tramo 7 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	30/01/2026	7	5.10	4.00	128%
	Vaciado tramo 7 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	30/01/2026	7	5.25	4.00	131%
	Vaciado tramo 7 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	20/02/2026	28	7.10	4.00	178%
	Vaciado tramo 7 - La Colinita. Carril "subiendo" tramo largo	20/02/2026	28	6.25	4.00	156%
	Vaciado tramo 8 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	3/02/2026	7	5.65	4.00	141%
	Vaciado tramo 8 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	3/02/2026	7	6.10	4.00	153%
	Vaciado tramo 8 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	24/02/2026	28	6.65	4.00	166%
	Vaciado tramo 8 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	24/02/2026	28	6.65	4.00	166%
	Vaciado tramo 9 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	4/02/2026	7	6.65	4.00	166%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

	Vaciado tramo 9 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	4/02/2026	7	6.10	4.00	153%
	Vaciado tramo 9 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	25/02/2026	28	6.65	4.00	166%
	Vaciado tramo 9 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	25/02/2026	28	6.65	4.00	166%
	Vaciado tramo 10 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	5/02/2026	7	5.50	4.00	138%
	Vaciado tramo 10 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	5/02/2026	7	6.10	4.00	153%
	Vaciado tramo 10 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	26/02/2026	28	6.60	4.00	165%
	Vaciado tramo 10 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	26/02/2026	28	6.85	4.00	171%
	Vaciado tramo 11 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	6/02/2026	7	5.30	4.00	133%
	Vaciado tramo 11 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	6/02/2026	7	4.90	4.00	123%
	Vaciado tramo 11 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	27/02/2026	28	6.10	4.00	153%
	Vaciado tramo 11 - La Colinita. Carril "bajando" tramo largo	27/02/2026	28	5.90	4.00	148%
	Pompeyano rígido No. 8A. Primer tramo Belén Rosales	18/02/2026	7	4.30	4.00	108%
	Pompeyano rígido No. 8A. Primer tramo Belén Rosales	18/02/2026	7	4.60	4.00	115%
	Pompeyano rígido No. 5. Primer tramo Belén Rosales	24/02/2026	7	4.20	4.00	105%
	Pompeyano rígido No. 5. Primer tramo Belén Rosales	24/02/2026	7	4.80	4.00	120%
	Pompeyano rígido No. 8A. Primer tramo Belén Rosales	11/03/2026	28	5,2	4	130%
	Pompeyano rígido No. 8A. Primer tramo Belén Rosales	11/03/2026	28	5,35	4	134%

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

El Anexo 9 contiene los resultados de ensayos de resistencia del concreto relacionados en las tablas anteriores.

Los certificados de calidad de las mezclas de concreto suministrados por ARGOS, se entregan por parte del proveedor 28 días después del suministro.

En el Anexo 11, se adjuntan los certificados de calidad de las obras complementarias ejecutadas en el mes de Abril 2026:

- Base granular
- Arena de concreto
- Triturado 1 ½”
- Triturado ¾”
- Cuellos y tapas de MH
- Cemento estructural
- Adoquín
- Guía táctil

Se incluye el Anexo 12, el cual contine los certificados de calidad de los aceros instalados durante el periodo.

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com

9 ANEXOS

- ANEXO 1. Informes diarios de calidad de las mezclas
- ANEXO 2. Certificados de asfalto
- ANEXO 3. TSR mezcla asfáltica
- ANEXO 4. Ensayos de agregados
- ANEXO 5. Certificados de emulsión y polybit
- ANEXO 6. Resultado núcleos
- ANEXO 7. Certificado calidad pintura
- ANEXO 8. Ensayo de reflectividad en pintura
- ANEXO 9. Certificados de agregados y resistencia del concreto
- ANEXO 10. Ensayos EVALTEC
- ANEXO 11. Certificados de calidad obras complementarias
- ANEXO 12. Certificado de calidad acero
- ANEXO 13. Certificado de calibración equipo de topografía
- ANEXO 14. Ensayos deslizamiento.
- ANEXO 15. Resultados IRI

CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33Sur No. 32D-25. Barrio La Magnolia Municipio de Envigado
PBX: 300 202 31 09 – admon.vialmed2025@gmail.com
