CL-0470-26-653-01-181 Rev0

Itagüí, 17 de abril de 2026

Ingeniera
NATALIA CALDERÓN
300 707 7481, directora.vialmed2025@gmail.com
CONSORCIO VIALMED 2025
Transversal 33sur No. 32D-25
Envigado

Referencia: Informe de ensayos de resistencia a la compresión simple sobre cilindros de concreto para el Proyecto: Malla vial Medellín 2025.

Respetada Ingeniera Calderón:

Por medio de la presente, estamos haciendo entrega de los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión simple de cilindros de concreto realizados sobre cuarenta y seis (46) muestras, las cuales fueron recibidas entre el 16 de febrero y 16 de marzo de 2026.

Los ensayos realizados se relacionan a continuación:

Ensayo	Norma	Acreditado ONAC Si/No
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	INV. E 410-13	Si (*)

(*) Para las muestras que se muestran en la siguiente tabla, los ensayos son no acreditados, por presentarse desviación en el método de ensayo de acuerdo con la norma INV E 410-13, ya que no se cumple con el valor de diferencia mínima entre la medida de sus diámetros, que debe ser hasta 2%.

No.	Localización	Fecha de vaciado
246	Vaciado de muros cárcamos 2 y 3 losa cárcamo 2	2026/03/12
13	Vaciado de cárcamo Caicedo	2026/03/11

En INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S. contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 22-LAB-006, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.

Carrera 45A N° 73A-59 Itagüí PBX/FAX: (57)(4)322 19 53 www.inteinsapavimentos.com.co
Itagüí - Antioquia - Colombia

El presente informe consta de catorce (14) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas y como se recibieron, además no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización de Inteinsa Pavimentos S.A.S.

Inteinsa Pavimentos S.A.S. no se hace responsable de la información suministrada por el cliente, en cuanto a procedencia de las muestras, tipo y cantidad de muestra a ensayar, nombre del cliente, nombre del proyecto y demás información que pueda afectar la validez de los resultados.
En caso de presentarse desviaciones, como la duda acerca de la adecuación o no coincidencia con la descripción suministrada de las muestras recibidas, Inteinsa Pavimentos S.A.S. no se responsabiliza por los resultados que puedan ser afectados por dicha desviación.
Inteinsa Pavimentos S.A.S. proporciona acceso razonable a las áreas pertinentes del laboratorio, para presenciar actividades de laboratorio específicas del cliente.

Si se requieren las muestras testigos de los ensayos de laboratorio específicas del cliente, se preparan, embalan y envían para propósitos de verificación.

Uso del símbolo de acreditado de ONAC: Se aclara que de acuerdo con el RAC-3.0-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado del Organismo Nacional de Acreditación ONAC, el símbolo de acreditado y/o la referencia a la condición de acreditado, es de uso exclusivo de Inteinsa Pavimentos S.A.S., por lo tanto, nuestros clientes no lo pueden utilizar en sus publicaciones, publicidad, documentos de tipo comercial o transaccional, en caso de incumplimiento de este requisito, se informará a las autoridades competentes para que se tomen las medidas que consideren pertinentes.

Para cualquier información adicional comuníquese con nosotros a través de los correos electrónicos lina.gomez@inteinsapavimentos.com.co y/o gerencia@inteinsapavimentos.com.co.

Quedamos atentos a sus comentarios e inquietudes.

Cordialmente.

LINA MARÍA GÓMEZ CANO
Esp. En vías y Transportes
Directora Técnica
INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S.

Carrera 45A N° 73A-59 Itagüí PBX/FAX: (57)(4)322 19 53 www.inteinsapavimentos.com.co
Itagüí - Antioquia - Colombia

INFORME DE RESULTADOS ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE DE CILINDROS DE CONCRETO, PROYECTO: MALLA VIAL MEDELLÍN 2025

Preparado para:

I-653-01-181 Rev0

Informe Final

Abril de 2026

Carrera 45A N° 73A-59 Itagüí PBX/FAX: (57)(4)322 19 53 www.inteinsapavimentos.com.co
Itagüí - Antioquia - Colombia

CONTROL DE INFORMES				
DOCUMENTO				**CÓDIGO**
INFORME DE RESULTADOS ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE DE CILINDROS DE CONCRETO, PROYECTO: MALLA VIAL MEDELLÍN 2025				I-653-01-181 Rev0
REVISIÓN No.	**FECHA**	**ELABORÓ**	**REVISÓ Y AUTORIZÓ**	**VERIFICÓ**
0	2026-04-17	Jantevis A. Jantevis Johanna Aguirre Laboratorista	Lina María Gómez C. Directora Técnica	Natalia Calderón Ingeniera directora
1	MODIFICACIÓN:			
2	MODIFICACIÓN:			
3	MODIFICACIÓN:			

Carrera 45A N° 73A-59 Itagüí PBX/FAX: (57)(4)322 19 53 www.inteinsapavimentos.com.co
Itagüí - Antioquia - Colombia

TABLA DE CONTENIDO

1 GENERALIDADES 7
1.1 INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN 7
1.2 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 7
2 PROCEDIMIENTO 9
2.1 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE DE CILINDROS DE CONCRETO, INV. E 410-13 9
3 RESULTADOS 10
3.1 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO, INV. E 410-13 10
4 ANEXOS 11

Carrera 45A N° 73A-59 Itagüi PBX/FAX: (57)(4)322 19 53 www.inteinsapavimentos.com.co
Itagüi - Antioquia - Colombia

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Resultados ensayos de compresión simple de cilindros de concreto..... 10

Carrera 45A N° 73A-59 Itagüi PBX/FAX: (57)(4)322 19 53 www.inteinsapavimentos.com.co
Itagüi - Antioquia - Colombia

1 GENERALIDADES

Como parte de la asesoría que INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S viene prestando a CONSORCIO VIALMED 2025, responsable del proyecto Malla Vial Medellín 2025, en días pasados recibimos cuarenta y seis (46) muestras de cilindros de concreto con una resistencia de diseño de 28 MPa, para determinarles la resistencia a la compresión. Dichas muestras fueron tomadas por personal de CONSORCIO VIALMED 2025 y transportadas por personal de INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S hasta nuestras instalaciones.

Para la consecución del objetivo planteado, en el laboratorio de INTEINSA PAVIMENTOS se procedió a curar los cilindros en un cuarto o tanque a temperatura y humedad controlada, y se fueron fallando a la compresión teniendo en cuenta la fecha de elaboración y la edad requerida.

1.1 INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición U reportada, se establece como la incertidumbre estándar combinada de la medición $u_c(x)$, multiplicada por el factor de cobertura k=2, que corresponde a un nivel de confianza de 95.45% y no menor a este valor.

1.2 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

La declaración de conformidad se basa en la regla de decisión simple no binaria con zona de seguridad, de acuerdo con los lineamientos de la guía ILAC-G8:09/2019, de la siguiente manera:

- Cumple: Cuando el resultado se encuentra dentro de los límites de la especificación y fuera de la zona de seguridad.
- No cumple: Cuando el resultado se encuentra fuera de los límites de la especificación y fuera de la zona de seguridad.
- Cumple condicionado: Cuando el resultado se encuentra dentro de los límites de la especificación y dentro de la zona de seguridad.

Carrera 45A N° 73A-59 Itagüí PBX/FAX: (57)(4)322 19 53 www.inteinsapavimentos.com.co
Itagüí - Antioquia - Colombia

- No cumple condicionado: Cuando el resultado se encuentra fuera de los límites de la especificación y dentro de la zona de seguridad.

Notas:

- La zona de seguridad, es el intervalo entre el límite de tolerancia y el límite de aceptación correspondiente, con una dimensión del intervalo de w=|TL-AL|; para nuestro caso la zona de seguridad es igual a la incertidumbre expandida.
- Inteinsa Pavimentos reporta el riesgo específico, el cual es la probabilidad de que se acepte un resultado cuando es no conforme, o que sea rechazado un resultado cuando es conforme. Este riesgo está basado en el reporte de un resultado único.

Carrera 45A N° 73A-59 Itagüi PBX/FAX: (57)(4)322 19 53 www.inteinsapavimentos.com.co
Itagüi - Antioquia - Colombia

2 PROCEDIMIENTO

2.1 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE DE CILINDROS DE CONCRETO, INV. E 410-13

El método consiste en aplicar una carga axial a la compresión, por medio de un equipo de compresión, sobre cilindros de concreto moldeados, con una velocidad de carga establecida, hasta que se presenta la falla.

La resistencia a la compresión se determina dividiendo la máxima carga aplicada durante el ensayo por el área transversal del cilindro.

Carrera 45A N° 73A-59 Itagüi PBX/FAX: (57)(4)322 19 53 www.inteinsapavimentos.com.co
Itagüi - Antioquia - Colombia

3 RESULTADOS

3.1 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO, INV. E 410-13

En la Tabla 1 se presentan los resultados de los ensayos realizados a los cilindros de concreto.

Tabla 1 Resultados ensayos de compresión simple de cilindros de concreto

Elemento fallado	Rango de resistencias obtenidas (MPa)	Rango del % con relación a la resistencia de diseño (%)	Resistencia de diseño (MPa)
Cilindros	12.8 – 48.1	46 - 172	28

La incertidumbre de la medición del ensayo se presenta en la tabla anexa, pero la declaración de conformidad no aplica para muestras cuya resistencia se obtuvo con edades de curado inferiores a 28 días.

En el Anexo, se presentan los resultados obtenidos.

Carrera 45A N° 73A-59 Itagüí PBX/FAX: (57)(4)322 19 53 www.inteinsapavimentos.com.co
Itagüí - Antioquia - Colombia

4 ANEXOS
RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO

Carrera 45A N° 73A-59 Itagüi PBX/FAX: (57)(4)322 19 53 www.inteinsapavimentos.com.co
Itagüi - Antioquia - Colombia

				RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E-410-13											Código	FL-TC-28		
															Versión	6		
															Fecha elaboración	2022/09/15		
															PÁGINA 1 DE 1			
CONS No.	ELEMENTO A ENSAYAR	No.	LOCALIZACIÓN	FECHA DE VACIADO	FECHA DE PRUEBA	EDAD	DIÁMETRO PROMEDIO (D) (mm)	LONGITUD (L) (mm)	ÁREA (mm^2)	L/D	CARGA MÁXIMA (kN)	RESISTENCIA A MEDIDA (MPa)	RESISTENCIA CORREGIDA (MPa)	INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN (U) (MPa)	RESISTENCIA DE DISEÑO (MPa)	% RESISTENCIA DE DISEÑO	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	RIESGO (%)	TIPO DE FALLA
0163	Cilindros INV E-410-13	19	Vaciado fajas en concreto cárcamos de San Juan	2026/02/09	2026/02/16	7	108,25	203	9203	2	190,89	20,7	20,5	0,86	28	73%	N.A	N.A	4.
0163	Cilindros INV E-410-13	20	Vaciado fajas en concreto cárcamos de San Juan	2026/02/09	2026/02/16	7	108,25	205	9203	2	185,75	20,2	20,0	0,86	28	71%	N.A	N.A	4.
0163	Cilindros INV E-410-13	21	Vaciado fajas en concreto cárcamos de San Juan	2026/02/09	2026/03/09	28	107,50	205	9076	2	395,08	43,5	43,2	0,86	28	154%	Cumple	0,00	4.
0163	Cilindros INV E-410-13	22	Vaciado fajas en concreto cárcamos de San Juan	2026/02/09	2026/03/09	28	103,75	208	8454	2	406,35	48,1	48,1	0,86	28	172%	Cumple	0,00	3.
0163	Cilindros INV E-410-13	25	Vaciado fajas en concreto cárcamos de San Juan	2026/02/11	2026/02/18	7	102,00	207	8171	2	246,61	30,2	30,2	0,86	28	108%	N.A	N.A	4.
0163	Cilindros INV E-410-13	26	Vaciado fajas en concreto cárcamos de San Juan	2026/02/11	2026/02/18	7	102,25	206	8211	2	238,98	29,1	29,1	0,86	28	104%	N.A	N.A	3.
0163	Cilindros INV E-410-13	27	Vaciado fajas en concreto cárcamos de San Juan	2026/02/11	2026/03/11	28	100,75	207	7972	2	284,12	35,6	35,6	0,86	28	127%	Cumple	0,00	1.
0163	Cilindros INV E-410-13	28	Vaciado fajas en concreto cárcamos de San Juan	2026/02/11	2026/03/11	28	101,50	207	8091	2	307,19	38,0	38,0	0,86	28	136%	Cumple	0,00	3.
0163	Cilindros INV E-410-13	29	Vaciado fajas en concreto cárcamos de San Juan	2026/02/11	2026/04/08	56	101,75	200	8131	2	349,51	43,0	42,8	0,86	28	153%	Cumple	0,00	1.
0163	Cilindros INV E-410-13	30	Vaciado fajas en concreto cárcamos de San Juan	2026/02/11	2026/04/08	56	103,75	200	8454	2	299,77	35,5	35,2	0,86	28	126%	Cumple	0,00	4.
0253	Cilindros INV E-410-13	61	Vaciado losa calle 10A lateral izquierdo	2026/03/03	2026/03/10	7	106,00	200	8825	2	176,66	20,0	19,8	0,86	28	71%	N.A	N.A	1.
0253	Cilindros INV E-410-13	62	Vaciado losa calle 10A lateral izquierdo	2026/03/03	2026/03/10	7	100,25	206	7893	2	159,15	20,2	20,2	0,86	28	72%	N.A	N.A	4.
0253	Cilindros INV E-410-13	63	Vaciado losa calle 10A lateral izquierdo	2026/03/03	2026/03/31	28	101,50	205	8091	2	194,54	24,0	24,0	0,86	28	86%	No cumple	100	2.
0253	Cilindros INV E-410-13	64	Vaciado losa calle 10A lateral izquierdo	2026/03/03	2026/03/31	28	104,50	202	8577	2	110,21	12,8	12,8	0,86	28	46%	No cumple	100	4.
0253	Cilindros INV E-410-13	67	Vaciado muros laterales cárcamo calle 10A lateral izquierdo	2026/03/04	2026/03/11	7	107,00	200	8992	2	120,15	13,4	13,2	0,86	28	47%	N.A	N.A	1.
0253	Cilindros INV E-410-13	68	Vaciado muros laterales cárcamo calle 10A lateral izquierdo	2026/03/04	2026/03/11	7	99,25	205	7737	2	133,26	17,2	17,2	0,86	28	62%	N.A	N.A	1.
0253	Cilindros INV E-410-13	69	Vaciado muros laterales cárcamo calle 10A lateral izquierdo	2026/03/04	2026/04/01	28	102,50	202	8252	2	239,07	29,0	28,9	0,86	28	103%	Cumple	14,68	2.
0253	Cilindros INV E-410-13	70	Vaciado muros laterales cárcamo calle 10A lateral izquierdo	2026/03/04	2026/04/01	28	101,75	201	8131	2	227,04	27,9	27,9	0,86	28	99%	No cumple condicionado	56,70	3.
0260	Cilindros INV E-410-13	233	Vaciado muros laterales cárcamo Suramericana	2026/03/05	2026/03/12	7	109,00	200	9331	2	167,43	17,9	17,7	0,86	28	63%	N.A	N.A	3.
0260	Cilindros INV E-410-13	234	Vaciado muros laterales cárcamo Suramericana	2026/03/05	2026/03/12	7	107,00	199	8992	2	153,79	17,1	16,9	0,86	28	60%	N.A	N.A	1.
0260	Cilindros INV E-410-13	235	Vaciado muros laterales cárcamo Suramericana	2026/03/05	2026/04/02	28	107,00	200	8992	2	266,09	29,6	29,3	0,86	28	105%	Cumple	7,14	4.
0260	Cilindros INV E-410-13	236	Vaciado muros laterales cárcamo Suramericana	2026/03/05	2026/04/02	28	107,25	199	9034	2	218,41	24,2	23,9	0,86	28	85%	No cumple	100	3.
0269	Cilindros INV E-410-13	118	Vaciado vigas de contención La Asomadera	2026/03/06	2026/03/13	7	100,50	204	7933	2	192,80	24,3	24,3	0,86	28	87%	N.A	N.A	1.

EQUIPO UTILIZADO		
EQUIPO	**CÓDIGO**	**FECHA CALIBRACIÓN**
Prensa para concretos - marco de compresión	IE-539, IE-540	2025/09/08


REALIZÓ		APROBÓ	
Laboratorista	Cristian Buitrago Castro	**Director Técnico**	Lina María Gómez Cano

				RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E-410-13										Código	FL-TC-28			
														Versión	6			
														Fecha elaboración	2022/09/15			
														PÁGINA 1 DE 1				
CONS No.	**ELEMENTO A ENSAYAR**	**No.**	**LOCALIZACIÓN**	**FECHA DE VACIADO**	**FECHA DE PRUEBA**	**EDAD**	**DIÁMETRO PROMEDIO (D) (mm)**	**LONGITUD (L) (mm)**	**ÁREA (mm^2)**	**L/D**	**CARGA MÁXIMA (kN)**	**RESISTENCIA MEDIDA (MPa)**	**RESISTENCIA CORREGIDA (MPa)**	**INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN (U) (MPa)**	**RESISTENCIA DE DISEÑO (MPa)**	**% RESISTENCIA DE DISEÑO**	**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**	**RIESGO (%)**	**TIPO DE FALLA**
0269	Cilindros INV E-410-13	119	Vaciado vigas de contención La Asomadera	2026/03/06	2026/03/13	7	100,00	204	7854	2	199,15	25,4	25,4	0,86	28	91%	N.A	N.A	1.
0269	Cilindros INV E-410-13	120	Vaciado vigas de contención La Asomadera	2026/03/06	2026/04/03	28	102,00	204	8171	2	244,76	30,0	30,0	0,86	28	107%	Cumple	1,16	4.
0269	Cilindros INV E-410-13	121	Vaciado vigas de contención La Asomadera	2026/03/06	2026/04/03	28	101,50	204	8091	2	258,05	31,9	31,9	0,86	28	114%	Cumple	0,00	2.
0269	Cilindros INV E-410-13	124	Vaciado vigas de contención La Asomadera	2026/03/07	2026/03/14	7	100,00	205	7854	2	160,13	20,4	20,4	0,86	28	73%	N.A	N.A	3.
0269	Cilindros INV E-410-13	125	Vaciado vigas de contención La Asomadera	2026/03/07	2026/03/14	7	106,50	200	8908	2	138,83	15,6	15,4	0,86	28	55%	N.A	N.A	4.
0269	Cilindros INV E-410-13	126	Vaciado vigas de contención La Asomadera	2026/03/07	2026/04/04	28	102,75	204	8292	2	185,62	22,4	22,3	0,86	28	80%	No cumple	100	4.
0269	Cilindros INV E-410-13	127	Vaciado vigas de contención La Asomadera	2026/03/07	2026/04/04	28	103,25	204	8373	2	200,21	23,9	23,9	0,86	28	85%	No cumple	100	3.
0273	Cilindros INV E-410-13	239	Vaciado muros laterales cárcamo Suramericana	2026/03/06	2026/03/13	7	100,25	206	7893	2	266,97	33,8	33,8	0,86	28	121%	N.A	N.A	4.
0273	Cilindros INV E-410-13	240	Vaciado muros laterales cárcamo Suramericana	2026/03/06	2026/03/13	7	107,25	201	9034	2	151,09	16,7	16,6	0,86	28	59%	N.A	N.A	4.
0273	Cilindros INV E-410-13	241	Vaciado muros laterales cárcamo Suramericana	2026/03/06	2026/04/03	28	101,75	204	8131	2	308,16	37,9	37,9	0,86	28	135%	Cumple	0,00	3.
0273	Cilindros INV E-410-13	242	Vaciado muros laterales cárcamo Suramericana	2026/03/06	2026/04/03	28	101,75	204	8131	2	241,28	29,7	29,7	0,86	28	106%	Cumple	2,59	3.
0285	Cilindros INV E-410-13	245	Vaciado de muros cárcamos 2 y 3 losa cárcamo 2	2026/03/12	2026/03/19	7	102,00	204	8171	2	154,35	18,9	18,9	0,86	28	67%	N.A	N.A	1.
0285	Cilindros INV E-410-13	246	Vaciado de muros cárcamos 2 y 3 losa cárcamo 2	2026/03/12	2026/03/19	7	107,25	200	9034	2	124,41	13,8	13,6	0,86	28	49%	N.A	N.A	3.
0285	Cilindros INV E-410-13	247	Vaciado de muros cárcamos 2 y 3 losa cárcamo 2	2026/03/12	2026/04/09	28	107,00	203	8992	2	138,26	15,4	15,2	0,86	28	54%	No cumple	100	4.
0285	Cilindros INV E-410-13	248	Vaciado de muros cárcamos 2 y 3 losa cárcamo 2	2026/03/12	2026/04/09	28	106,50	203	8908	2	188,69	21,2	21,0	0,86	28	75%	No cumple	100	3.
0285	Cilindros INV E-410-13	239	Vaciado losa cárcamo 1	2026/03/09	2026/03/16	7	101,75	203	8131	2	199,52	24,5	24,5	0,86	28	88%	N.A	N.A	4.
0285	Cilindros INV E-410-13	240	Vaciado losa cárcamo 1	2026/03/09	2026/03/16	7	107,75	200	9119	2	168,47	18,5	18,3	0,86	28	65%	N.A	N.A	4.
0285	Cilindros INV E-410-13	241	Vaciado losa cárcamo 1	2026/03/09	2026/04/06	28	105,75	198	8783	2	242,20	27,6	27,3	0,86	28	97%	No cumple condicionado	79,59	1.
0285	Cilindros INV E-410-13	242	Vaciado losa cárcamo 1	2026/03/09	2026/04/06	28	101,50	203	8091	2	240,30	29,7	29,7	0,86	28	106%	Cumple	2,41	1.
0294	Cilindros INV E-410-13	13	Vaciado de cárcamo Caicedo	2026/03/11	2026/03/18	7	102,00	201	8171	2	156,65	19,2	19,1	0,86	28	68%	N.A	N.A	1.
0294	Cilindros INV E-410-13	14	Vaciado de cárcamo Caicedo	2026/03/11	2026/03/18	7	106,00	199	8825	2	123,41	14,0	13,8	0,86	28	49%	N.A	N.A	1.
0294	Cilindros INV E-410-13	15	Vaciado de cárcamo Caicedo	2026/03/11	2026/04/08	28	105,75	203	8783	2	188,64	21,5	21,3	0,86	28	76%	No cumple	100	4.
0294	Cilindros INV E-410-13	16	Vaciado de cárcamo Caicedo	2026/03/11	2026/04/08	28	106,75	202	8950	2	191,95	21,4	21,3	0,86	28	76%	No cumple	100	4.

EQUIPO UTILIZADO		
EQUIPO	**CÓDIGO**	**FECHA CALIBRACIÓN**
Prensa para concretos - marco de compresión	IE-539, IE-540	2025/09/08

REALIZÓ		**APROBÓ**	
Laboratorista	Cristian Buitrago Castro	**Director Técnico**	Lina María Gómez Cano

Patrones típicos de falla de cilindros de concreto

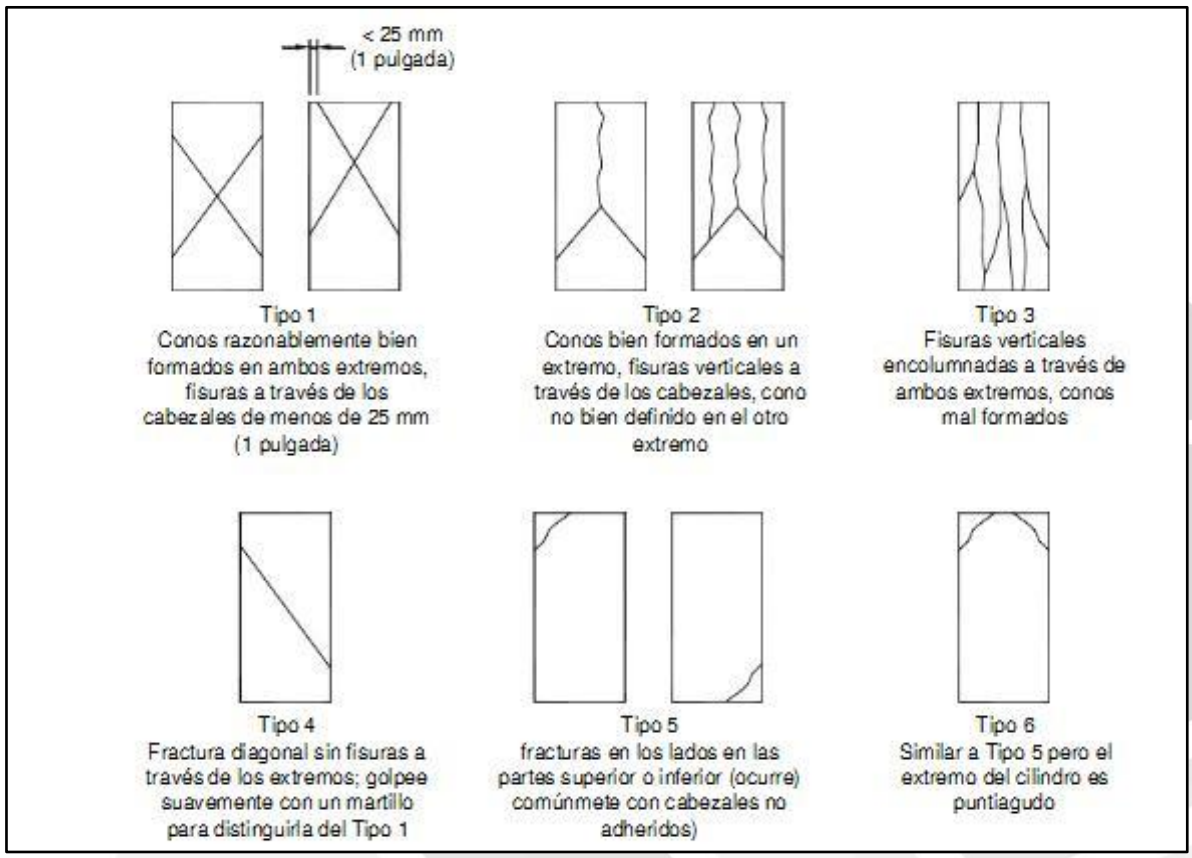

Carrera 45A N° 73A-59 Itagüi PBX/FAX: (57)(4)322 19 53 www.inteinsapavimentos.com.co
Itagüi - Antioquia - Colombia
