FECHA D/M/A: 07 de abril de 2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Puntuales.

RANGO: 1 | CANTIDAD: 12,09t.

ZONA: 03

COMUNA: Buenos Aires

BARRIO: El Salvador

FRENTE DE TRABAJO: C01

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 7am.
TERMINACIÓN: 2pm.

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se realiza traslado de cuadrilla hacia límite del barrio Salvador y Corona, se atiende mediático frente a la iglesia del Salvador, además se atienden otras 2 zonas con cajas y aplicación de pavimento, se realizaron 2 mitigaciones más en la zona. Se instala señalización de obra y se controla con Pare y Siga al flujo vehicular propio al inicio de las actividades. Durante las demoliciones se realiza acopio controlado para un posterior cargue y retiro. Temperaturas de compactación medidas 127.8, 128.5, 130.8, 128.8, 117.1. No se afecta señalización vial en la zona intervenida. Se recibe visita de profesional de interventoría Jose Luis E. y por parte del contratista profesional SST.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Alejandro R. — Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Miguel Londoño — Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Juan Manuel Holguín — Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Jose Luis Guzman A. — Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 07-04-26

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCL
1	Tecnólogo/Ingeniero	Alejandro Riquame			Consorcio
2	Encargado				
3	Liguero	Diego Manco.			Cyp
4	Rastrillero	Yobani cuesta.			
5	Rastrillero	Jaime Sarria.			
6	Ayudante	Jarvi Rino			
7	Ayudante				
8	Ayudante	Fabar Munoz			
9	Ayudante	Bayun mesa			
10	Ayudante				
11	Ayudante	Manuel tapias			
12	Ayudante	Jonal Ortiz			
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Faustino Catano.			
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Hector moreno.			
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor	185 Atlas	—		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Bandi mikasa	—		
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marma	=		
10	Placa vibratoria	Rana.	=		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton.	—		
16	Volqueta(s)	y Sencilla	=		
		1 Remolcador	—		

Powered by CamScanner

Boxcar = 164532, 160757

FECHA (D/M/A): 07-04-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	(Ton)
5007882	158075	2A	CR35A 39A 24	1.66	4.28	0.12	7.10	0.85	2.05
5007882	158075	2B	CR35A 39A 24	3.28	1.30	0.12	4.26	0.51	1.23
5007881	167793	3	CR35A CL39A	4.53	2.17	0.12	9.83	1.179	2.84
5007881	167794	7	CR35A 39 36	12.15	1.7	0.12	20.65	2.48	5.97
TOTALES									12.09

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
539919	TT0095	12.09	12.09	145°	26084	TT0095	S	1	Baumtax

Powered by CamScanner

Hubaal

REMISION DE MATERIALES 20260407 08:35
PAVIMENTAR S.A
NIT: 890.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 Versión 1

TIQUETE DE BASCULA: 539919
PLACA: TT0095
CONDUCTOR: JHON ESTIVEN GUTIERREZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfáltica MDC 1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,09 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VIAL MED
2026 #2149
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:19.490,00

ENTRADA: 07 abr 2026 - 08:35 a.
SALIDA: 07 abr 2026 - 08:35 a.
TEMPERATURA:145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Andres Q

FIRMA DEL CONDUCTOR

Alejandro

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES

Hubaal

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

Estructuras y Pavimentos SAS

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26084

PROVEEDOR: Fanalca 2053
VALE POR UN VIAJE: Escobos 07/04/26
PLACA No: TTO 095 CAPACIDAD: 7 M3
DESTINO: Alumbrador
RECIBIDO POR: Oliver Quiroz

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.


Firma Autorizada

Calle 10 Sur Nº 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 07-04-2026

10. ESQUEMAS

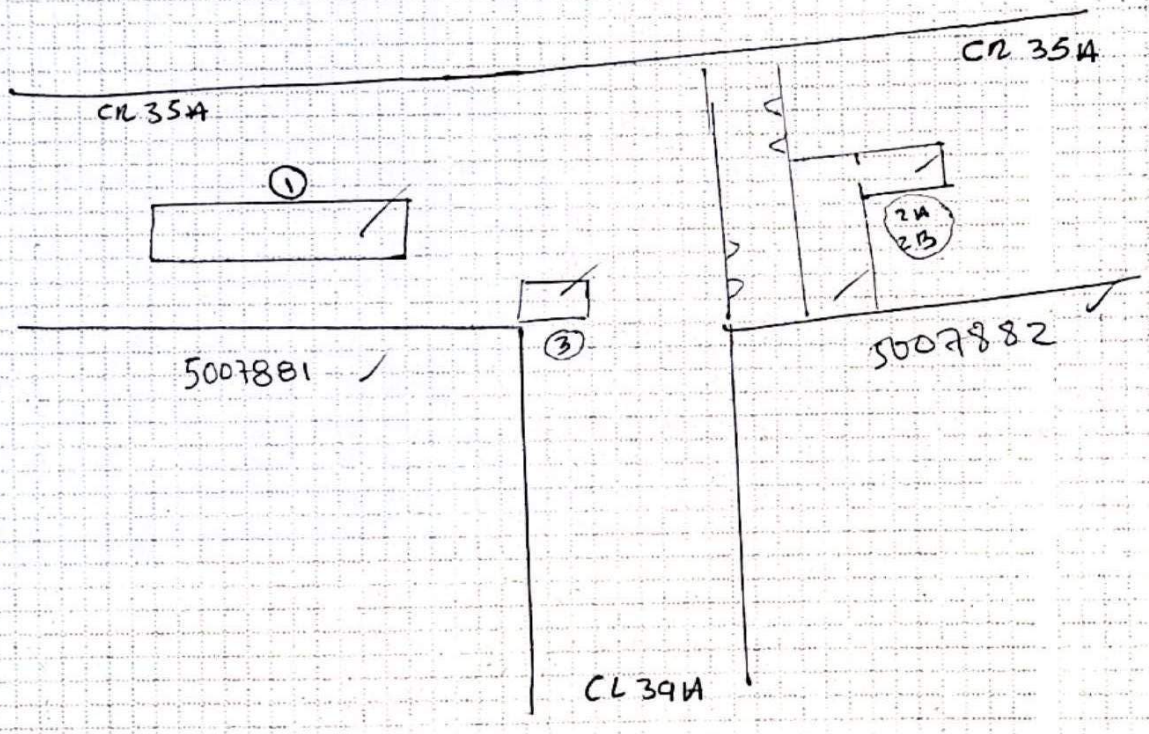

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento puntuales.	FRENTE	C 01
RANGO:	1	CANTIDAD:	12,09Km.
BARRIO	El salvador.	DIRECCIÓN	CR35A CL39A

Powered by CamScanner

Michael

20240407 13:02

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 900.040.014-4
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 26094
PLACA: TT0095
CONDUCTOR: ANDRES QUINTERO

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUN-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED 02058
PESO TARA: 7.100,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 07 abr 2024 -a01:52 p.
SALIDA: 07 abr 2024 -a 01:52 p.
TEMPERATURA:0,00°

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Alejandro

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sun. - Suministros a Terceros
Peso bruto :18100
Peso tara : 7100
Peso neto : 10700

Powered by CamScanner
