FECHA (D/M/A): 08-04-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Bunteados mantenimiento

RANGO: 1 CANTIDAD: 12.08t

ZONA: 03

COMUNA: Buenos Aires

BARRIO: Los Conos, El vergel.

FRENTE DE TRABAJO: Col

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 2000377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7 am

TERMINACIÓN: 1:30 Pm.

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se traslado la cuadrilla nuevamente hacia el barrio los Conos el vergel para intervenir cl 47A cr 16AA donde se realiza marcación puntual. Se instala señalización de obra y se inicia con demoliciones controladas, acamado interno para acopio temporal, posteriormente se realiza cargue manual y retiro del material hacia botadero autorizado Paumares Se realizo imprimación sobre base granular encontrada. esto despues de una limpieza y compactación. no se encontro señalización vial en el punto, se localizan 3 huecos mas que no se logran intervenir 2 de ellos sobre cr 16AA saliendo a cl 49 y 01 otro en cruce de cl 49 con cr 15D.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Alejandro R. — Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Michael Jaramillo — Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA: JPG	FIRMA:
NOMBRE: Juan David Pedraza V. — Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Jose Luis Guzman A. — Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 08-04-26

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCU.
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Alejandro Rojeme	-		
2	Encargado				
3	Liguero	Diego manco	/		
4	Rastrillero	Yobani Cuesta	/		
5	Rastrillero	Jaime Serna	/		
6	Ayudante	Deivi Rino	/		
7	Ayudante				
8	Ayudante	Fabor Quiroz	/		
9	Ayudante	Brayan meza	/		
10	Ayudante	Manuel farias	/		
11	Ayudante	Daniel ortiz	/		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante	Leidi Ana Ponce.			
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Jose mauricio Sanchez hurtado	-		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Hector moreno	-		
29	Conductor Volqueta(s)	Jhon Gutierrez	-		
		Andres Quintero	-		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor	185	-		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Bandi mikasa.	-		
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmol	-		
10	Placa vibratoria	Nuna.	-		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton	-		
16	Volqueta(s)	Sanalla	/		
		+ demolador	-		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 08-04-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	[illegible]
5011175	167797	1	CL 47 16AA 11	2.8	2.4	0.10	6.72	0.672	1.62
5011175	167798	2	CL 47 16AA 17	3	1.16	0.105	3.48	0.365	0.88
5011175	167799	3	CL 47 16AA 27	3.13	2.7	0.11	8.45	0.929	2.24
5011175	167800	4A	CL 47 16AA 29	3.55	3.3	0.11	11.715	1.288	3.11
5011178	167801	5	CL 47 Y CR 16AA	3.53	4.61	0.10	16.27	1.62	3.92
5011175	167800	4B	CL 47 16AA 29	2	.58	0.11	1.16	0.127	0.31
TOTALES									12.08

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
540020	TTO095	12.08	12.08	148°	26085	TTO095	S	1	Parmenlan

Powered by CamScanner

Michael londoño

REMISION DE MATERIALES 20260408 08:30
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 540020
PLACA: TTO095
CONDUCTOR: JHON ESTIVEN GUTIERREZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,08 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VIALMED
2026 #2149
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:19.480,00

ENTRADA: 08 abr 2026 -m08:30 a.
SALIDA: 08 abr 2026 -m 08:30 a.
TEMPERATURA:148,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Andres Q.

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Michael

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

Estructuras y Pavimentos SAS

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26085

PROVEEDOR: Tanke #1 2059
VALE POR UN VIAJE: Ecomovil
PLACA No: TTO 095 / CAPACIDAD: 7 M3
DESTINO: Pavimentar UOV - Cmw
RECIBIDO POR:

08/04/26

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.


Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 08-04-2026

10. ESQUEMAS

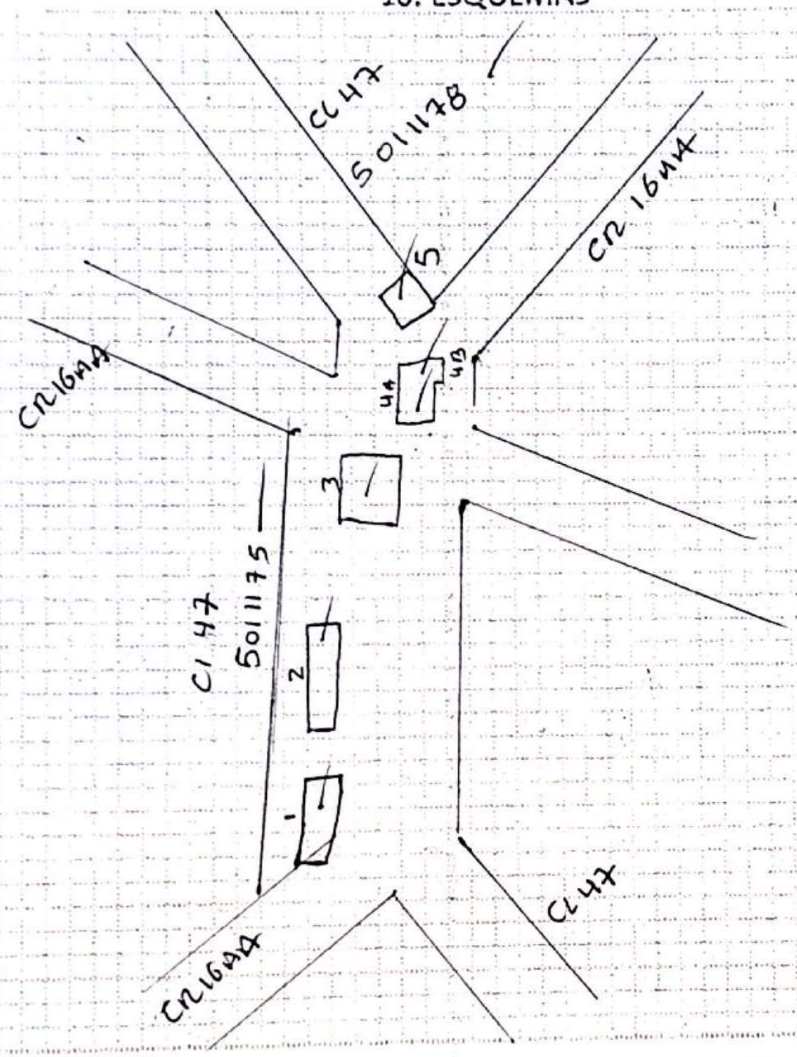

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntuales	FRENTE	C 01
RANGO:	1	CANTIDAD:	12.08 ft
BARRIO	Los Cerros El Vergel	DIRECCIÓN	CL 47 y CR 16AA

Powered by CamScanner

Richard Londoño

20260408 13:06

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.090.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 26085.
PLACA: -TH0095
CONDUCTOR: ANDRES QUINTERO

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR
OS
MALLA VIAL NEB #2058
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 08 abr 2026 -a01:20 p.
SALIDA: 08 abr 2026 -a 01:20 p.
TEMPERATURA:0,00°

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto :18610
Peso tara : 7400
Peso neto : 11210

Powered by CamScanner
