FECHA (D/M/A): 09-04-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntuales		
RANGO:	1	CANTIDAD:	12,04 t
ZONA	03	FRENTE DE TRABAJO:	C01
COMUNA	Buenos Aires		
BARRIO	~~Los Conos Altavista~~ → Miraflores.		

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7 am.	
TERMINACIÓN: 1:30 pm.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Traslado de cuadrilla hacia cr 27 entre cl 46 y 47 Se realiza marcación Puntual para huecos con areas afectadas que quedan sin intervenir dando solo hueq fallos, Se realiza Mantenimiento Puntual. Se inicia con instalación de la Señalizacion de obra, Valla, balizas y mallas, Se deja habilitado el Paso vehicular. Se realiza Proceso de demolición hasta nivel de base Granular. Se ejecutan 4 intervenciones mas 3 mitigaciones en esta cuadra Segmento 5007871, NO Se afecta Señalización horizontal Pero Se recomienda la demarcación del PARE en el cruce con Calle 46 Se finaliza de manera exitosa la Jornada en el Punto y no quedaron huecos ni baches en este Segmento, Sin embargo Si algunos fallos Puntuales.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Alvaro Vo.Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Michael Londoño Vo.Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan David Rodriguez Vo.Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Jose Luis Cuzman A Vo.Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09-04-26

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Alo Sandro Riguame	✓		
2	Encargado				
3	Liguero	Diego manco-	✓		
4	Rastrillero	Yobani Cuesta	✓		
5	Rastrillero	Jaime serna	✓		
6	Ayudante	Alvi Ring	✓		
7	Ayudante				
8	Ayudante	Esther Quiroz	✓		
9	Ayudante	Brayan mora.	✓		
10	Ayudante	Manuel tabias	✓		
11	Ayudante	Janet ortiz	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jeyder Ana Ponce-	✓		
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora	Jose mauricio Sanchez.	✓		
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Hector moreno	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Jhon Gutierrez	✓		
		Andres Quintero	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor	185	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Bandi mikasa	✓		
7	Compactador llantas	-			
8	Cortador Asfalto	-			
9	Equipo Imprimación	marmeq.			
10	Placa vibratoria	Rana.	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton	✓		
16	Volqueta(s)	Sencilla.	✓		
		Semoledor	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09-04-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5007821	162008	4	CR 27 46 34	3.35	1.6	0.13	5.36	0.696	1.68
5007821	167740	3A	CR27 46 79	2.55	1.5	0.12	3.825	0.459	1.11
5007821	167740	3B	CR27 4679	3.22	1.64	0.12	5.28	0.63	1.53
5007821	155155	2	CR27 46 71	4.02	1.76	0.13	8.13	1.05	2.55
5007821	~~165968~~ (2)	1A	CR27 46 - 98	1.25	0.7	0.12	0.875	0.105	0.25
5007821	165962	1B	CR27 46 98	4.07	3.64	0.12	16.998	2.04	4.92
TOTALES									17.04 T

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
540150	TTO095	12.04	12.04	148°	26086	TTO095	S	1	Baumontes

Powered by CamScanner

Richard londoño

PEMISION DE MATERIALES 20260409 08:21
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 540150
PLACA: TTO095
CONDUCTOR: JHON ESTIVEN GUTIERREZ

PRODUCTO:14524 9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 - 70 - RAP
CANT. NETA: 12,04 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V00000368? SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 M2149
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:19.440,00

ENTRADA: 09 abr 2026 - 08:24 a.
SALIDA: 09 abr 2026 - 08:24 a.
TEMPERATURA:148,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Andres O.

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Richard londoño

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

Estructuras y Pavimentos sas

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26086

PROVEEDOR: Fonte el 2053
VALE POR UN VIAJE: Esmeralda
PLACA No: TTO 095 CAPACIDAD: 7 M3
DESTINO: Pavimentar
RECIBIDO POR:

21/04/26

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.


Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09-04-2026

10. ESQUEMAS

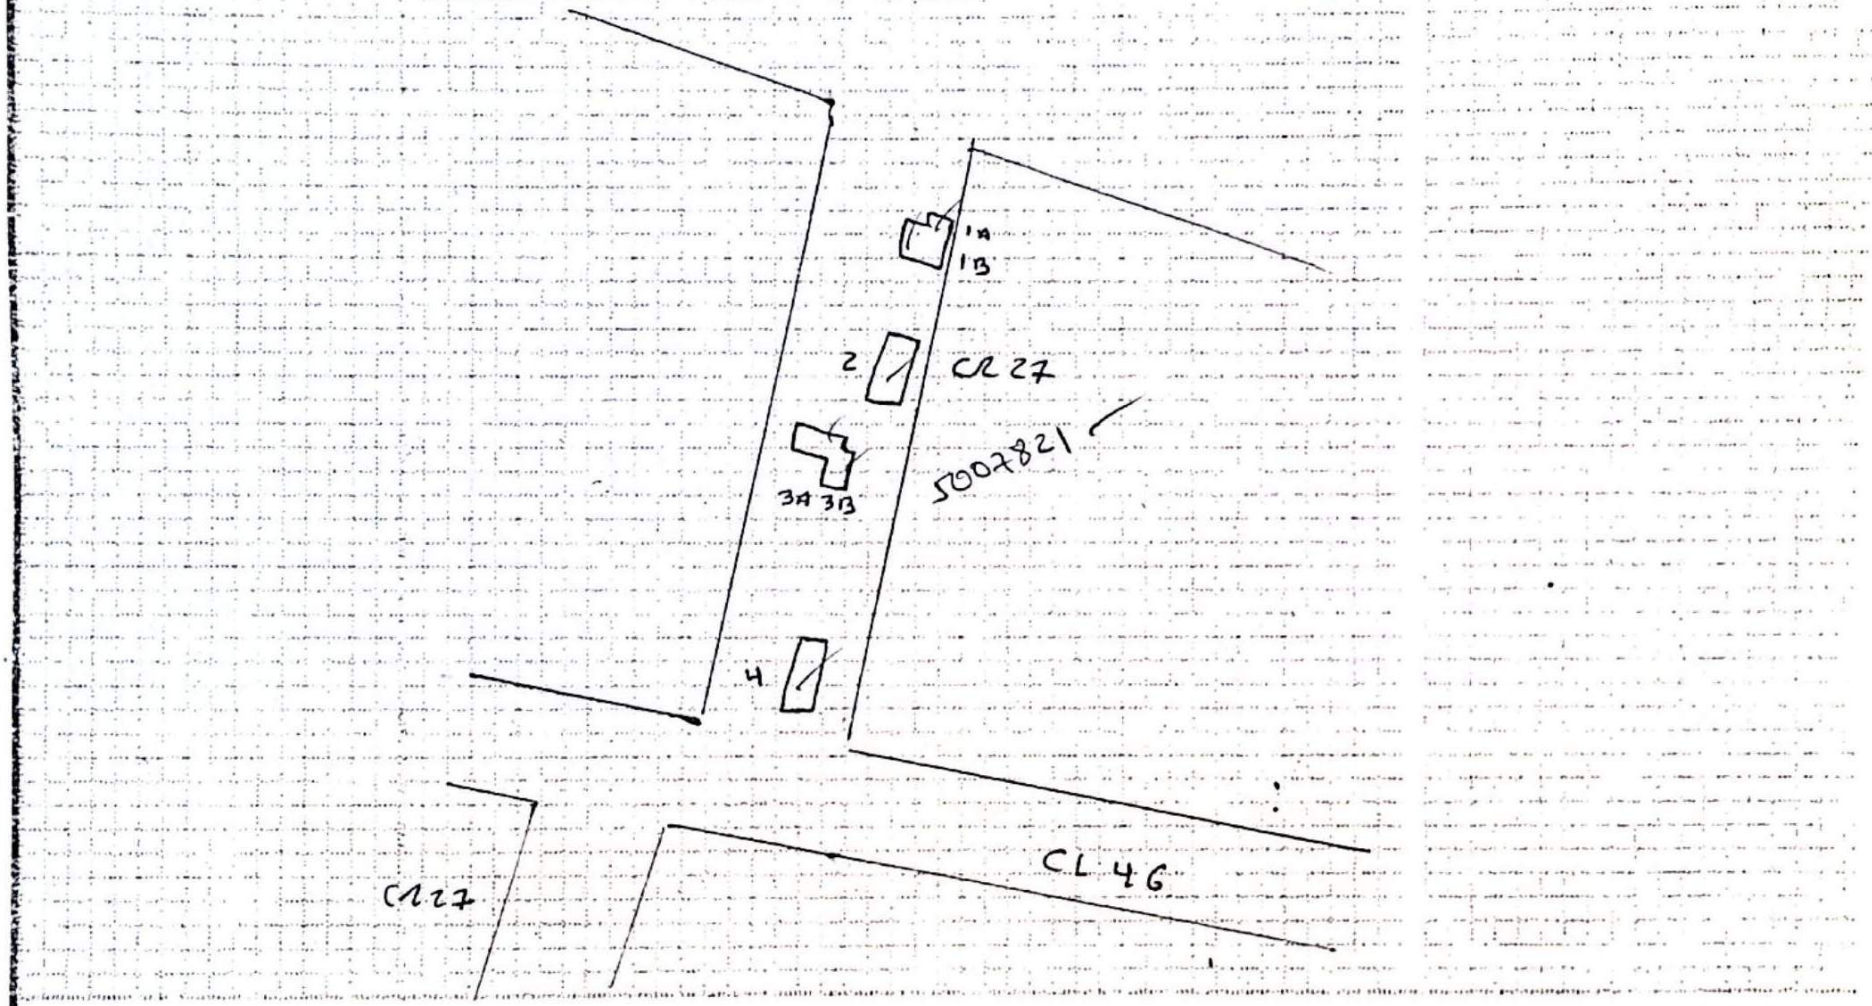

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimientos Puntuales	FRENTE	C01
RANGO:	1	CANTIDAD:	12.04 t
BARRIO	mira flores	DIRECCIÓN	CR 27 Y CL 46

Powered by CamScanner

Michael Londoño

20240410 04:36

REVISION DE MATERIALES
PAVIMENTAC S.A
NIT: 800.040.014-4
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 24084.
PLACA: TT0095
CONDUCTOR: ANDRES QUINTERO

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900283322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUN-2058- EYP ESCOMBROS.
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.400,00-
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 10 abr 2024 - 07:01 a.
SALIDA: 10 abr 2024 - 07:01 a.
TEMPERATURA:0,00°

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto :17560
Peso tara : 7400
Peso neto : 10160

Powered by CamScanner
