FECHA (D/M/A): 10 - 04 - 2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Bonitos

RANGO: 4 | CANTIDAD: 10,02 t

ZONA: 03

COMUNA: Buenos aires

BARRIO: Buenos aires

FRENTE DE TRABAJO: C01

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7am.

TERMINACIÓN: 2 8m

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Traslado de cuadrilla hacia cra 32 entre cll 47 y 50 se realizan intervenciones puntuales seleccionadas se instala señalización provisional de obra y se realizan desvios controlados con balizas, mallas y maletines, se cuenta con 2 auxiliares de transito se inician demoliciones y acopio temporal, bestamexmento se realiza cargue y retiro. se retira carpeta existente en puntos seleccionados se encontraron asposeres altas. se logra intervenir 4 puntos y al final de la jornada queda un punto pendiente de segunda capa.. se tomaron temperaturas de descarga y de compactacion para la mezcla 139.6° y 134.3., se deja observación que en la cra 32 la señalización se encontro muy deteriorada se recomienda analisis para demarción.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10-04-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Alejandro Riquame.	✓		
2	Encargado				
3	Liguero	Diego manco	✓		
4	Rastrillero	Yobani Cresta	✓		
5	Rastrillero	Jaime Serna	✓		
6	Ayudante	Jairo Pino	✓		
7	Ayudante				
8	Ayudante	Fabar Quiroz	✓		
9	Ayudante	Brayan mesa	✓		
10	Ayudante	Manuel tabia?	✓		
11	Ayudante	Jonat Ortiz	✓		
12	Ayudante	Leidi Ana Ponce	✓		
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Jose mauricio sanchez	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Hector moreno.	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Jhon Gutierrez	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor	185	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Bendi mikasa	✓		
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria	mavma Rana	✓ ✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	foton	✓		
16	Volqueta(s)	sencilla Semolodon	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10-04-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5008151	167812	1	CR 32 48 53	3.21	1.8	0.14	5.78	0.81	1.95
5008151	167813	2A	CR32 48 18	3.6	1.72	0.12	6.19	0.74	1.79
5008151	167813	2B	CR 32 48 18	3.36	1.25	0.12	4.19	0.56	1.21
5008241	167814	3	CR32 47 65	4.15	1.76	0.13	7.30	0.95	2.29
5008239	167815	4A	CR32 47 32	2.44	2.9	0.12	7.08	0.85	2.05
5008239	167815	4B	CR32 47 32	2.8	0.90	0.12	2.52	0.30	0.73
TOTALES								4.16	10,02

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
540266	TT0095	10.02	10.02	148°	26087	TT0093	S	1	Parmenlar
							-		

Powered by CamScanner

C# 1 Michael.

REMISION DE MATERIALES 20260410 08:12
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 540266
PLACA: TTO095
CONDUCTOR: JHON ESTIVEN GUTIERREZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-19 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,00 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VIAL MED
2026 #2149
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:17.420,00

ENTRADA: 10 abr 2026 - 08:13 a.
SALIDA: 10 abr 2026 - 08:13 a.
TEMPERATURA:148,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Michael.

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

Estructuras y Pavimentos sas

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS No 26087

PROVEEDOR: Frente #1 2053
VALE POR UN VIAJE: Cuadrilla 10/03/26
PLACA No: TTO 095 CAPACIDAD: 7 M3
DESTINO: Pavimentos
RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.


Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10-04-2026

10. ESQUEMAS

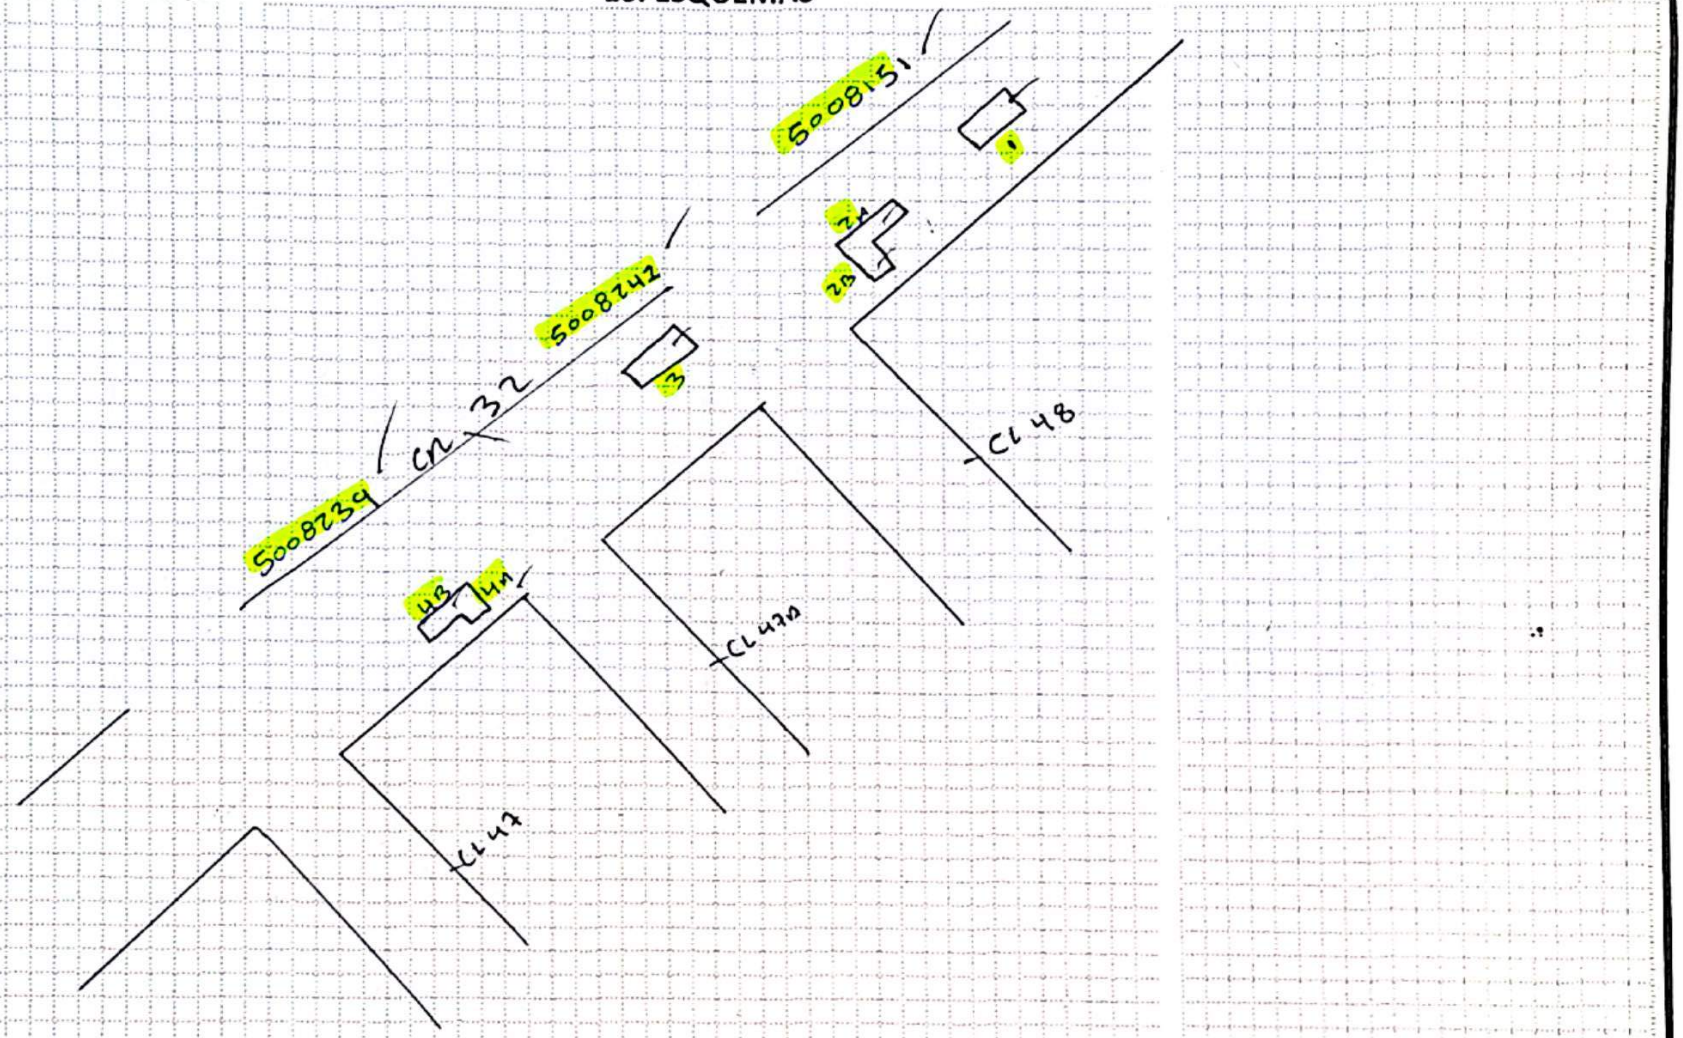

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Bordadas Mantenimiento	FRENTE	C 01
RANGO:	1	CANTIDAD:	10.02 Ton
BARRIO	Buenos Aires	DIRECCIÓN	CR 32 CL 47 CL 49

Powered by CamScanner

Michael.

REMISION DE MATERIALES 20260410 13:41
PAVIMENTAR S.A
NIT: 900.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 26087
PLACA: TT0095
CONDUCTOR: ANDRES QUINTERO

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: \\000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL NED M2058
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 10 abr 2026 -a02:09 p.
SALIDA: 10 abr 2026 -a 02:09 p.
TEMPERATURA:0,00°

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto :16500
Peso tara : 7400
Peso neto : 9100

Powered by CamScanner
