FECHA (D/M/A): 13-04-2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento bordillos
RANGO: 1	CANTIDAD: 12,03ton.
ZONA	3
COMUNA	Buenos aires
BARRIO	Buenos aires
FRENTE DE TRABAJO:	01

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025
CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377
CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 7am
TERMINACIÓN: 4:30pm.

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Nublado
TARDE: lloviznas esporadicas.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se realizan actividades sobre cr 32 con cl 46 y en cr 32 #47-32 y 47-02, tambien se ejecutan 2 cuadros en cr 32 # 46-42 y 46-36. Se instala previamente la señalización de obra y se inicia con demoliciones, acopio interno temporal para un posterior cargue y retiro. Durante las actividades se tuvo tiempo de espera 2 horas debido a fallas con el compresor. Se continua despues de esto 12pm, se realizo conecto proceso de imprimación y se procede con aplicación de mezcla asfaltica las temperaturas de aplicación fueron 140.2, 141.7, 138.9 144°.

Señalización afectada: cr 32 con cl 46 BARC y cinta distancia
cr 32 con cl 47 Flecha frontal.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Yudo Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Michael londoño. Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Luis Restrepo Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Jose Luis Guzman A. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 13-04-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACI
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Alo Santos Aguirre	—		Consorcio
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero	Yuhani Cuesta	—		F y P
5	Rastrillero	Jaime Serna	—		
6	Ayudante	Daivi Pino	—		
7	Ayudante				
8	Ayudante	Fabar Olivar	—		
9	Ayudante	Brayan mesa	—		
10	Ayudante	manuel tarias	—		
11	Ayudante	Yanel ovtiz	—		
12	Ayudante	Leidi ana Ponce	—		
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Evelis Hernandez -	—		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Conductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Hector moreno	/		
29	Conductor Volqueta(s)	Jhon Gutierrez	/		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor	185.	—		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas	Bandi mikasa	—		
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria	marma -	—		
11	Soplador	Rana	—		
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Falcon	—		
16	Volqueta(s)	Sarcilla	—		
	martillo neumatico	demoledor	—		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 13-04-2026.

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	(Ton)
500456	191535	1	CR 32 46 42	1	1.16	0.14	1.16	0.16	0.39
500456	167822	2	CR 32 46 36	1.75	1.6	0.12	2	0.24	0.58
500823	167821	3A	CR 32 47 02	3.46	2.2	0.14	7.61	1.06	2.57
500823	167821	3B	CR 32 47 02	3.84	1.94	0.14	7.45	1.04	2.51
500823	167815	4A	CR 32 47 32	2.39	2	0.18	4.78	0.86	2.07
500823	167815	4B	CR 32 47 32	1.30	0.90	0.14	1.17	0.16	0.39
500794	167823	5A	CR 32 CL 46	2.6	1.55	0.15	4.03	0.60	1.46
500794	167823	5B	CR 32 CL 46	2.07	2.75	0.15	5.69	0.85	2.06
TOTALES									12.03

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
540390	TTO095	12.03	12.03	148°	26088	TTO095	S	1	Sanmontan

Powered by CamScanner

Manuel Londoño

20260413 09:34
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 540390
PLACA: TTO095
CONDUCTOR: JHON ESTIVEN GUTIERREZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,03 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VIAL MED
2026 M2149
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:19.430,00

ENTRADA: 13 abr 2026 - 09:35 a.
SALIDA: 13 abr 2026 - 09:35 a.
TEMPERATURA:148,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Manuel Londoño

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26088

PROVEEDOR: Fark - 1 - 205
VALE POR UN VIAJE: Exambio
13/04/2026
PLACA No: TTO 095 CAPACIDAD: 7 M3
DESTINO: Pavimentar
RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.


Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 13-04-2026

10. ESQUEMAS

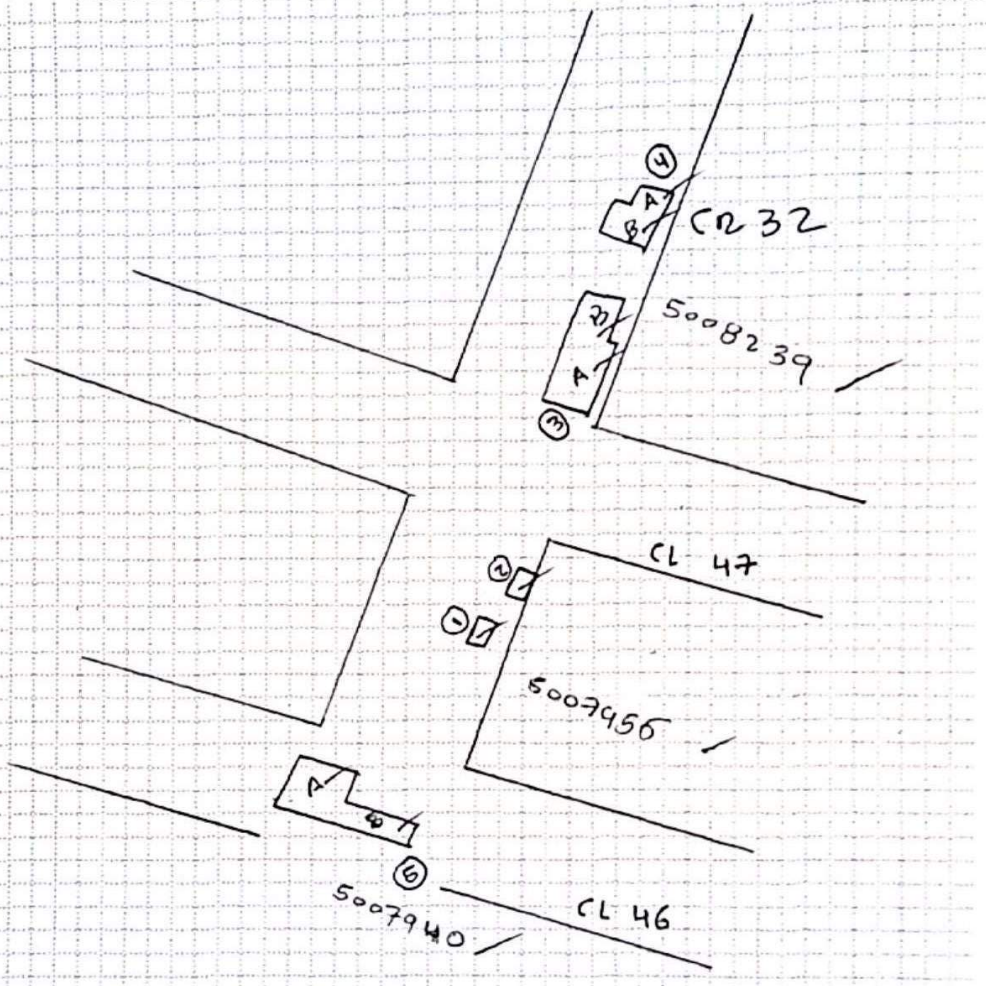

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Bordillos Hto.	FRENTE	C01
RANGO:	1	CANTIDAD:	12.03 Ton.
BARRIO	Buenos aires	DIRECCIÓN	CR 32 46 47

Powered by CamScanner

Alexander Londoño

EMISION DE MATERIALES 20260414 08:15
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.018-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 26008
PLACA: TT0095
CONDUCTOR: ANDRES QUINTERO

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE: 00243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V0000003596 SUN-2050- EYP ESCOMBR
OS
MALLA VIAL NED #2050
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 14 abr 2026 a 08:40 a.
SALIDA: 14 abr 2026 a 08:40 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto :17100
Peso tara : 7400
Peso neto : 9700

Powered by CamScanner
