FECHA (D/M/A): 14-04-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (FOR RANGOS O ACTIVIDAD): OBRAS DE PARCHEO/BACHE

RANGO: 1 | CANTIDAD:

ZONA: 3
COMUNA: 4
BARRIO: BUENOS AIRES

FRENTE DE TRABAJO: 1

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 7:00 a.m.
TERMINACIÓN: 1:30 p.m.

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleada
TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1. Delimitación y señalización del área a intervenir
2. Marcación del área a intervenir (Retroexcavadora)
3. Demolición en área de pavimento a intervenir
4. Acopio del material producto de la demolición.
5. Encargado del SST realiza capacitación de prevención de actos y condiciones inseguras
6. Cargue y descargue de equipo, Intervenir, Herramientas
7. Imprimación del área a intervenir
8. Aplicación de mezcla asfáltica MC-19 en áreas demarcadas
9. Colocación y retiro de señalización #VER DIGITAL.
10. Labor la 1:30 p.m. se termina con la actividad programada para la C1.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Alejandro Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	NOMBRE: Diego Leonardo Tejada Restrepo Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA: JRG	FIRMA:
NOMBRE: Juan Pablo Restrepo Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: José Luis Guzmán A Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 14-04-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA SI	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	ALEJANDRO RIQUELME	X		
2	Encargado	TITO PORTO ZAPATA	X		
3	Lujuero	EDGAR CANO	X		
4	Rastrillero	GIOVANNY CUELLO	X		
5	Rastrillero	JAIME A. RIVERA	X		
6	Ayudante				
7	Ayudante	FABIAN ALBOR	X		
8	Ayudante/Ranillero	JOSE LOZANO	X		
9	Ayudante	DANIEL TAPIAS	X		
10	Ayudante	DAVID PORTO	X		
11	Ayudante	BRYAN MEJIA	X		
12	Ayudante	PABLO PORTO VILLAMIZAR	X		
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	FREDY HERNANDEZ	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Conductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	HECTOR MORENO	X		
29	Conductor Volqueta(s)				
30	AUX VIAL	LUZ DINGA PONCE	X		
31	AUX VIAL	JANETH CORTES	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN SI	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	HUSQVARNA LT6420	X		
2	Compresor	ATLAS COPCO	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación/Humidificador	NO REGISTRA	X		
10	Placa vibratoria	HONDA	X		NO 12
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	FOTON	X		CMP-LOTA-
16	Volqueta(s)	INTERNACIONAL			PLACA TTO 695

FECHA (D/M/A): 14-04-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
1008147	167852	1	CRA 31 48-18	4,75	1,90	0,12	9,03	1,08	2.61
1008155	167853	2A	CRA 31 48.24	1,90	1,50	0,14	2,85	0,40	0,96
		2B	CRA 31 48.24	2,67	3,06	0,14	8,17	1,14	2,76
1008155	167854	3A	CRA 31 48-24(+1)	1,70	1,70	0,14	2,89	0,40	0,98
		3B	CRA 31 48.24(+1)	2,50	2,88	0,14	7,20	1,01	2,43
1008150	167851	4	CRA 31 x CRA 48A	1,50	1,62	0,13	2,43	0,32	0,76
1008150	167856	5	CRA 31 x CRA 48A(+1)	3,30	1,60	0,12	5,28	0,63	1,53
TOTALES									12,03

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
20260414	TT009F	12,03	—	145.0	26089	TT009S	Sencilla	1	Pavimentos

Ricardo Londoño

20260414 09:27

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.010-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 540380
PLACA: TT0095
CONDUCTOR: JHON ESTIVEN GUTIERREZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. META: 12,03 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: 9000003687 SUM-2149-ETP MALLA VI
AL,NEB
2026 #2149
PESO TARA: 7.000,00
PESO BRUTO:19.430,00

ENTRADA: 14 abr 2026 -a09:27 a.
SALIDA: 14 abr 2026 -a 09:27 a.
TEMPERATURA:145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Andres Q.


FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

CONCEPTO:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras > Sum. - Suministros a terceros

ECHA (D/M/A): 14-04-2026

10. ESQUEMAS

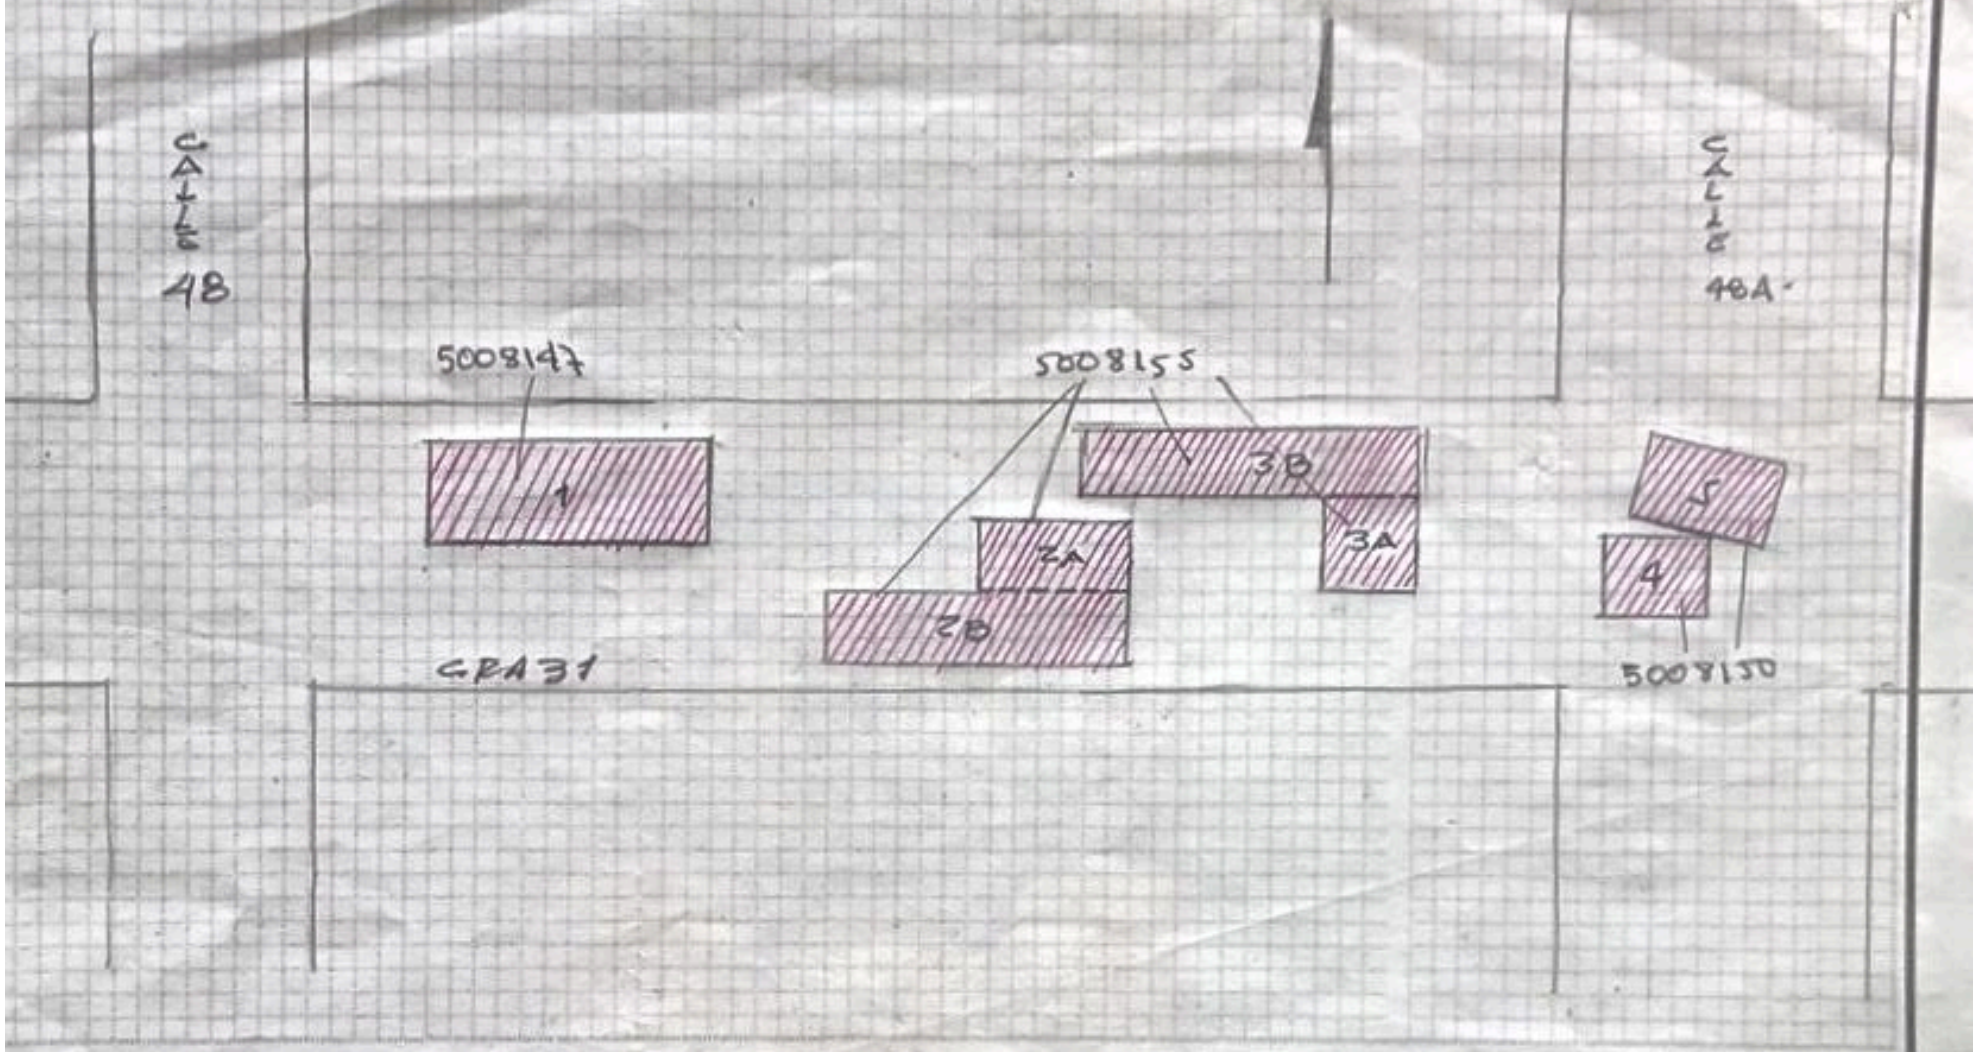

TIPO DE INTERVENCIÓN:	BACHE.	FRENTE	1
RANGO:	1	CANTIDAD:	12.02
BARRIO	BUENOS AIRES	DIRECCIÓN	CRA 31 48-01

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 26089**

PROVEEDOR: Fonte #1 2059

VALE POR UN VIAJE: Exorbitado

PLACA No: T10 015

14/04/26

DESTINO: Pavimentar

CAPACIDAD: 7 M3

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3815450 - Medellín/ Colombia

Hechael Londoño

PAVIMENTAR S.A

PLACA: T10015

CONDUCTOR: ANDRES RICARDO

PRODUCTO: 3276 Exorbitante (viaje)

CANT. NETA: 1.00 Tranche

CLIENTE: 900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: VIA [illegible] - CIT ESCUELA DE MALLA VIAL MED 82058

FIRMA DEL OPERARIO DE LA BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES

Peso bruto $7400

Peso tara $ 7600

Peso neto $ 30020
