FECHA (D/M/A): 23-04-2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual
RANGO: 7	CANTIDAD: 12.04t
ZONA: 5	FRENTE DE TRABAJO: 7
COMUNA: 14	
BARRIO: Patio Bonito	

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 7:00am
TERMINACIÓN: 2:30pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleada
TARDE:

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se inicia actividades con la localización de los puntos de parcheo, se instala la señalización vial y se demarcan las áreas de trabajo. instalación de baño portatil, camilla papeleras de colores para depositar residuos, almacenamiento de reactivos con su respectiva rotulación, actividades de demolición de pavimento en mal estado, retiro de escombros, limpieza, compactación de base granular, verificación de espesores, riego de imprimación, colocación de mezcla UDC-7a compactada mecanicamente.
Hora de llegada de la mezcla a la obra 11:53am
Verificación de temperatura de la mezcla.
Patologías: desgaste del pavimento, descascaramiento, huecos, grietas
Al terminar la jornada el contratista realiza limpieza general de la obra, retira las señalizaciones y cerramientos.
Volqueta que trae la mezcla WLW 714, marca freightliner, conductor Alexis Ujeja.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Alvaro R. — Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Fernando Rodriguez — Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Jesus Garcia. A — Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 23-04-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Alejandro Riquenne	X		Consorcio
2	Encargado		X		FyP
3	Liguero	Diego Cano		X	FyP
4	Rastrillero	Jaime Serna	X		FyP
5	Rastrillero	Giovanny Cuesta	X		FyP
6	Ayudante	Deiby Tino	X		FyP
7	Ayudante	Brayam Ulesa	X		FyP
8	Ayudante	Fyber Quiroz	X		FyP
9	Ayudante	Manuel Tapias			
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jose Lozano			FyP Laura Ríos
17	Operador compresor	Jhon Jairo Herrera			
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Hector Moreno	X		Hector Moreno
29	Conductor Volqueta(s)	Andres Quintero		X	Inge Onix
30	Control vial	Leidy Usuga	X		Consorcio
31	Control vial	Janeth Cruz	X		Consorcio
32	Control vial	Leidy Ana Ponce	X		Consorcio

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Husquarna LP 65001	X		
2	Compresor	Doosan C185, modelo 2075	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Llanita - Herramienta manual	X		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton WCV 774 Furia, modelo 2014	X		
16	Volqueta(s)	International ITO 095, modelo 2013		X	Volqueta varada

FECHA (D/M/A): 23-04-2026


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5003629	167883	1	CR47 CL7 -178	7.70	0.80	0.76	6.16	0.99	2.37
5003629	164500	2	CR47 CL7 - 170	3.26	2.25	0.141	7.34	1.03	2.48
5003629	164501	3	CR47 CL7 - 159	5.15	2.38	0.74	12.26	1.72	4.12
5003629	167884	4	CR47 CL7 -95	7.70	7.50	0.12	10.65	1.28	3.07
TOTALES									12.04

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
547493	WLW774	12.04		144	26093	WLW 774	Sencilla	1	Pavimentar

FECHA (D/M/A): 23-04-2026

10. ESQUEMAS

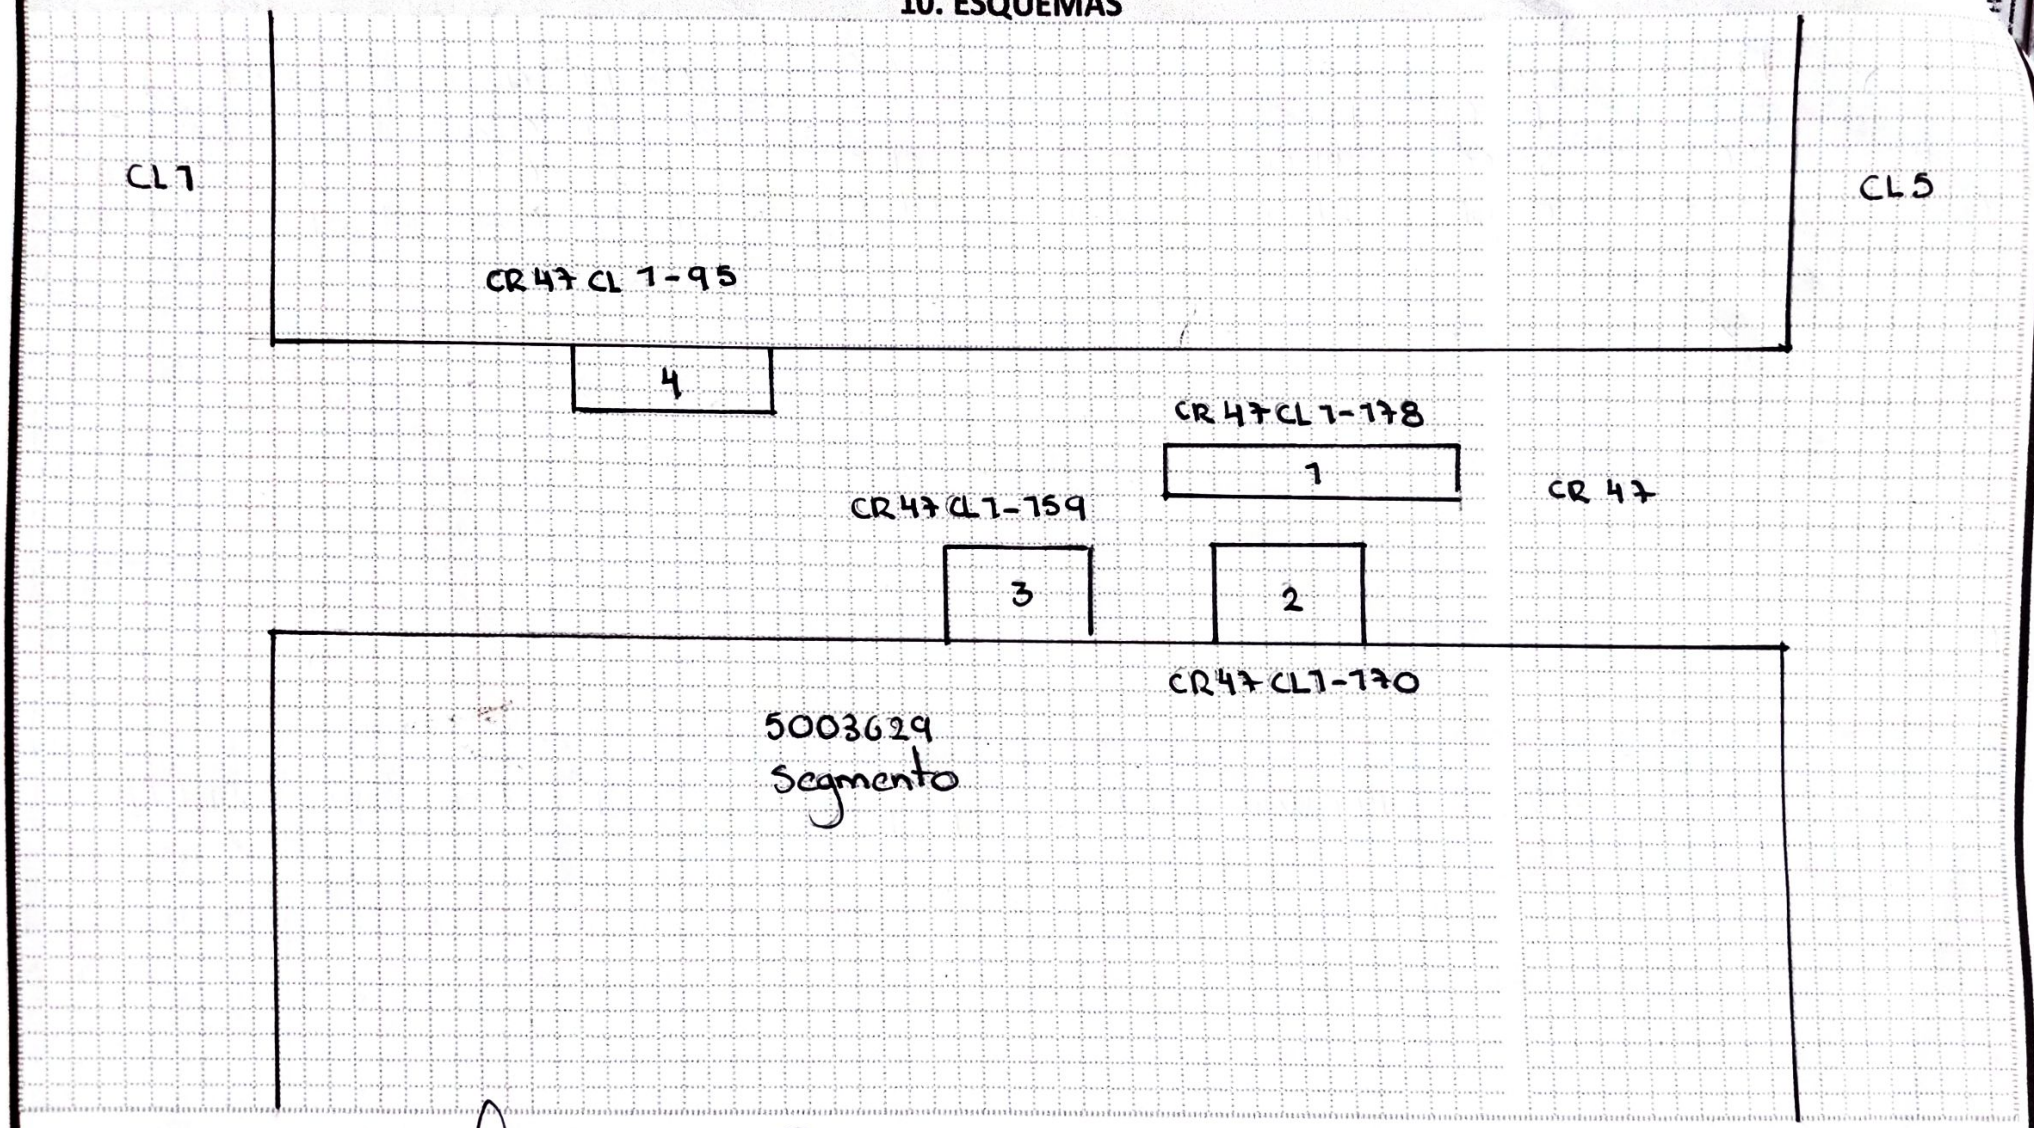

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	7
RANGO:	7	CANTIDAD:	12.04t
BARRIO	Patio Bonito	DIRECCIÓN	CR 47 CL 7-170

20260423 09:16

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 541493
PLACA: WLW714
CONDUCTOR: JHON EDINSON YALY

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,04 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 7.910,00
PESO BRUTO:19.950,00

ENTRADA: 23 abr 2026 -m09:49 a.
SALIDA: 23 abr 2026 -m 09:49 a.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20260423 14:04

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 26093
PLACA: WLW714
CONDUCTOR: EDIOSN YALI

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR
OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.910,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 23 abr 2026 -m03:24 p.
SALIDA: 23 abr 2026 -m 03:24 p.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 19290
Peso tara : 7910
Peso neto : 11380

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26093

PROVEEDOR: Frente #1 2058

VALE POR UN VIAJE: Escombros

23/04/26

PLACA No: WLW 714 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Reviventai

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Alejandra

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia
