FECHA (D/M/A): 29-04-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Puntual

RANGO: (0) 7 | CANTIDAD: 4.88 t

ZONA: 3

COMUNA: 8

BARRIO: Trece de Noviembre

FRENTE DE TRABAJO: 7

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 7:00 am
TERMINACIÓN: 7:00 pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Se presenta fallas mecanicas en la colqueta

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Nublado con brisa de 7:00 am a 9:30 am

TARDE: Nublado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se inicia actividades con la localización de los puntos de parcheo, se instala la señalización vial y se demarcan las areas de trabajo, instalación de baño portatil, canalla, papeleras de colores para deposito de residuos, almacenamiento de reactivos con su respectiva rotulación, limpieza de vía, verificación de niveles, verificación de espesores, riego de imprimación, colocación de mezcla UDC-19 compactada mecanicamente.

Hora de llegada de la mezcla a la obra 5:00pm

Patologías: Pavimento rigido con piel de cocodrilo, grietas, descascaramiento, huecos, area a intervenir presenta desgaste.

En el inicio de las labores se presentaron complicaciones en la intervención debido a la acumulación de basuras por parte de la comunidad, en el area de trabajo.

La colqueta presento fallas mecanicas en el trayecto para traer la mezcla pero fue subsanado.

Se realiza acompañamiento ssf consorcio, se realiza pausa activa y charla de seguridad, inspecciones generales.

5. VISITANTES

Paula Estrada

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 29-04-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Alejandro Riquelme	X		Consorcio
2	Encargado				
3	Liguero	Diego Cano	X		EyP
4	Rastrillero	Jaime Alexis Sana	X		EyP
5	Rastrillero	Yaukary Cuesta			
6	Ayudante				
7	Ayudante	Deiby Pino	X		EyP
8	Ayudante	Brayan Mesa	X		EyP
9	Ayudante	Felber Quiroz	X		EyP
10	Ayudante	Manuel Tejerías	X		EyP
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jose Lozano	X		EyP
17	Operador compresor	Jhan Jairo Ospina	X		EyP
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Hector Moreno	X		Hector Moreno
29	Conductor Volqueta(s)	Andres Quintero	X		Inge Onix
30	Control Vial	Janeth Ortiz	X		Consorcio
31	Control vial	Angela Gonzalez	X		Consorcio

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
Rodillo manual	Hyoguang LP 6500	X		
Compresor	Kaeser Sigma Fluid Mol 5-460	X		
Fresadora				
Finisher				
Retroexcavadora				
Vibrocompactador				
Compactador llantas				
Cortador Asfalto				
Equipo Imprimación	Llanita - Herramienta manual	X		
Placa vibratoria				
Soplador				
Mini cargador				
Barredora				
Carrotanque				
Camión	Ford WCY 774 Furgon, modelo 2014	X		
Volqueta(s)	International, JTO 095, modelo 2013	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 29-04-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5077548	767924	1A	CL 56H CR 77A-02	1.40	1.30	0.041	1.82	0.07	0.18
5077548	767924	1B	CL 56H CR 77A-02	3.70	3.70	0.04	11.47	0.46	1.10
5077857	767925	2A	CR 77A CL 56H-07	11.50	1.84	0.04	32.20	1.29	3.09
5077857	767925	2B	CR 77A CL 56H-07	3.00	1.78	0.04	5.34	0.21	0.51
TOTALES									4.88

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
547950	TTO095	4.88		123.3	—	—	—	—	—

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 29 - 04 - 2026

10. ESQUEMAS

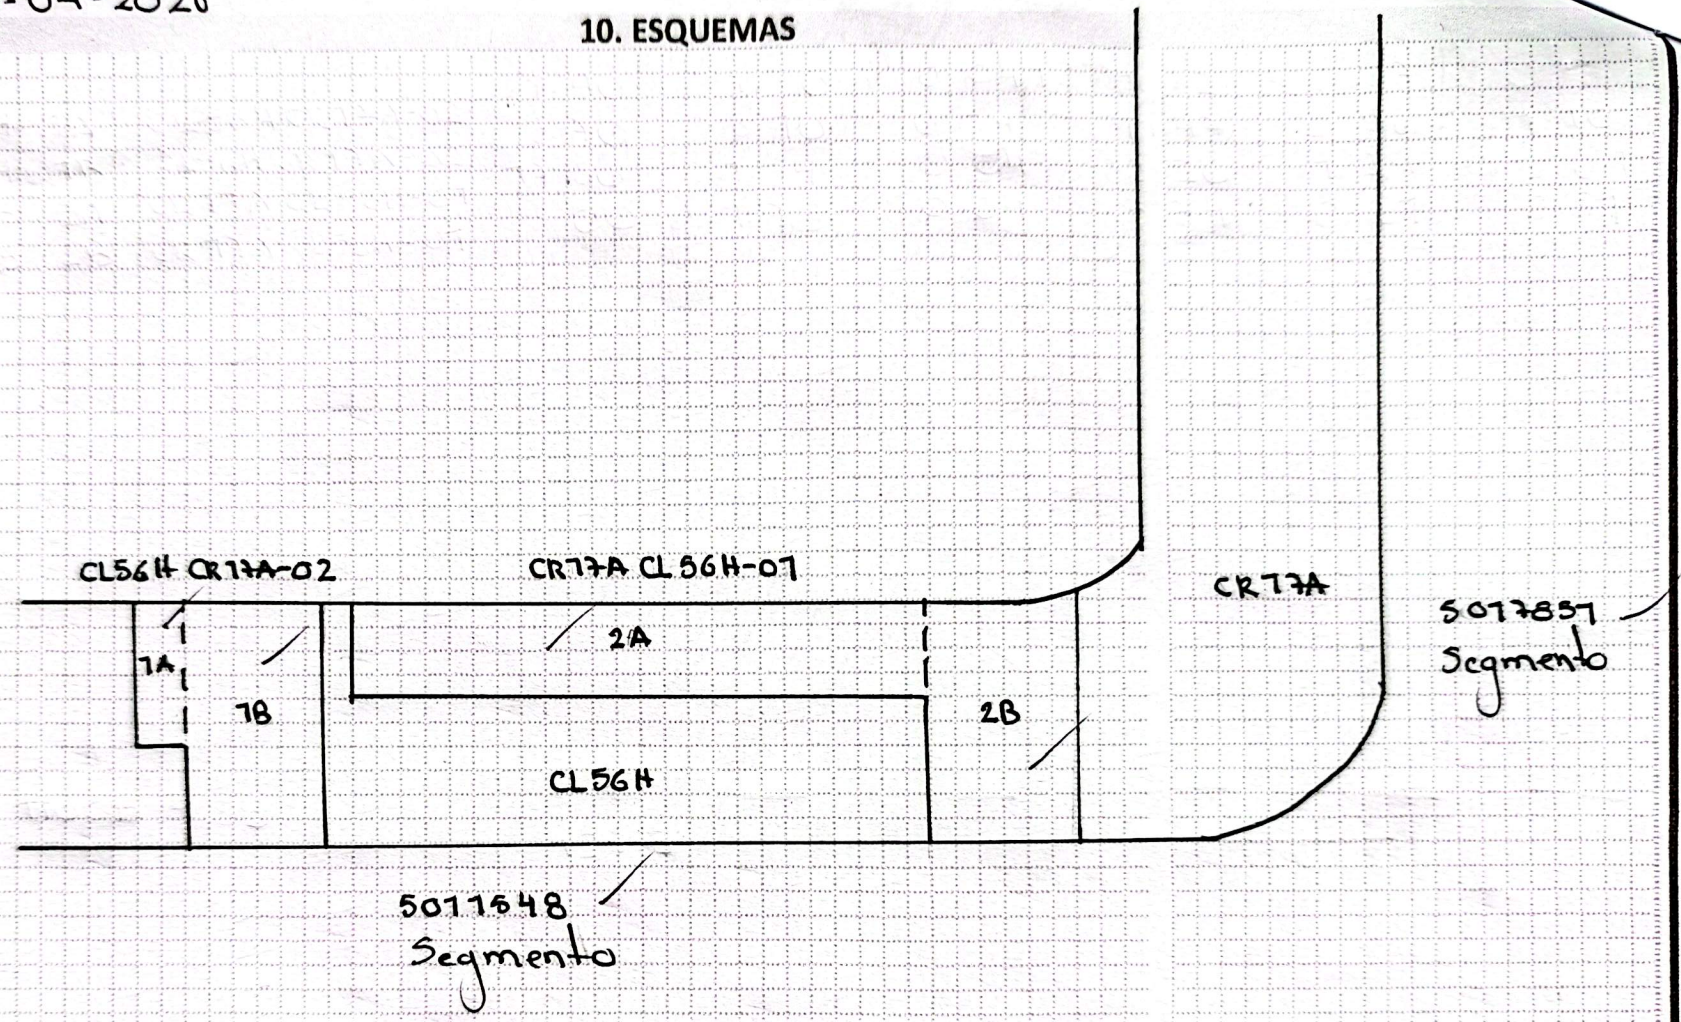

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	7
RANGO:	(0) 7	CANTIDAD:	4.88t
BARRIO	Trece de Noviembre	DIRECCIÓN	CL5GH CR17A-02

Powered by CamScanner

20260429 09:03

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A.
NIT: 900.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 501950
PLACA: TTO095
CONDUCTOR: JHON ESTIVEN GUTIERREZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 + RAP
CANT. NETA: 4,88 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 7,400,00
PESO BRUTO:12.280,00

ENTRADA: 29 abr 2026 - 09:04 a.
SALIDA: 29 abr 2026 - 09:04 a.
TEMPERATURA:146,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Powered by CamScanner
