FECHA (D/M/A): 30-04-2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual
RANGO:	(0) T
CANTIDAD:	4.87 t
ZONA	3
COMUNA	8
BARRIO	Llanaditas
FRENTE DE TRABAJO:	1

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377

CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 7:00 am
TERMINACIÓN: 1:30 pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleada
TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se inicia actividades con la localización de los puntos de parcheo, se instala la señalización vial y se demarcan las áreas de trabajo, instalación de baño portátil, camilla, papeleras de colores para deposito de residuos, almacenamiento de reactivos con su respectiva rotulación, limpieza de vía, verificación de niveles, verificación de espesores, riego de imprimación, colocación de mezcla MDC-19 compactada mecanicamente.
Hora de llegada de la mezcla a la obra
Patologías: Pavimento rigido con piel de cocodrilo, grietas, huecos, desprendimientos.
Al finalizar la jornada el contratista realiza limpieza general de la obra, retira las señalizaciones y cerramientos.
Retiro de escombros en la volqueta hasta su lugar de disposición.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Alejandro P. Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan David Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Jose Luis Guzman A. Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 30-04-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINC
1	Tecnólogo/Ingeniero	Alejandra Riquelme	X		Consorcio
2	Encargado				
3	Ligero	Diego Cano	X		EyP
4	Rastrillero	Jaime Alexis Seina	X		EyP
5	Rastrillero	Yovany Cuesta	X		
6	Ayudante				
7	Ayudante	Yeiby Pino	X		EyP
8	Ayudante	Brayan Mesa	X		EyP
9	Ayudante	Isbel Quiroz	X		EyP
10	Ayudante	Manuel Tapias	X		EyP
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jose Lozano	X		EyP
17	Operador compresor	Jhon Jairo Ospina	X		EyP
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Conductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Hector Uarela	X		Hector Uarela
29	Conductor Volqueta(s)	Andres Quintero	X		Ingeonix
30	Control vial	Janeth Ortiz	X		Consorcio
31	Control vial	Angela Gonzalez	X		Consorcio


8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Husqvarna LP 65001	X		
2	Compresor	Kaeser Sigma Fluid Uol 5-460	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo imprimación	Uarita - Herramienta manual	X		
10	Placa vibratoria				
11	Sopladora				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 30-04-2026

10. ESQUEMAS

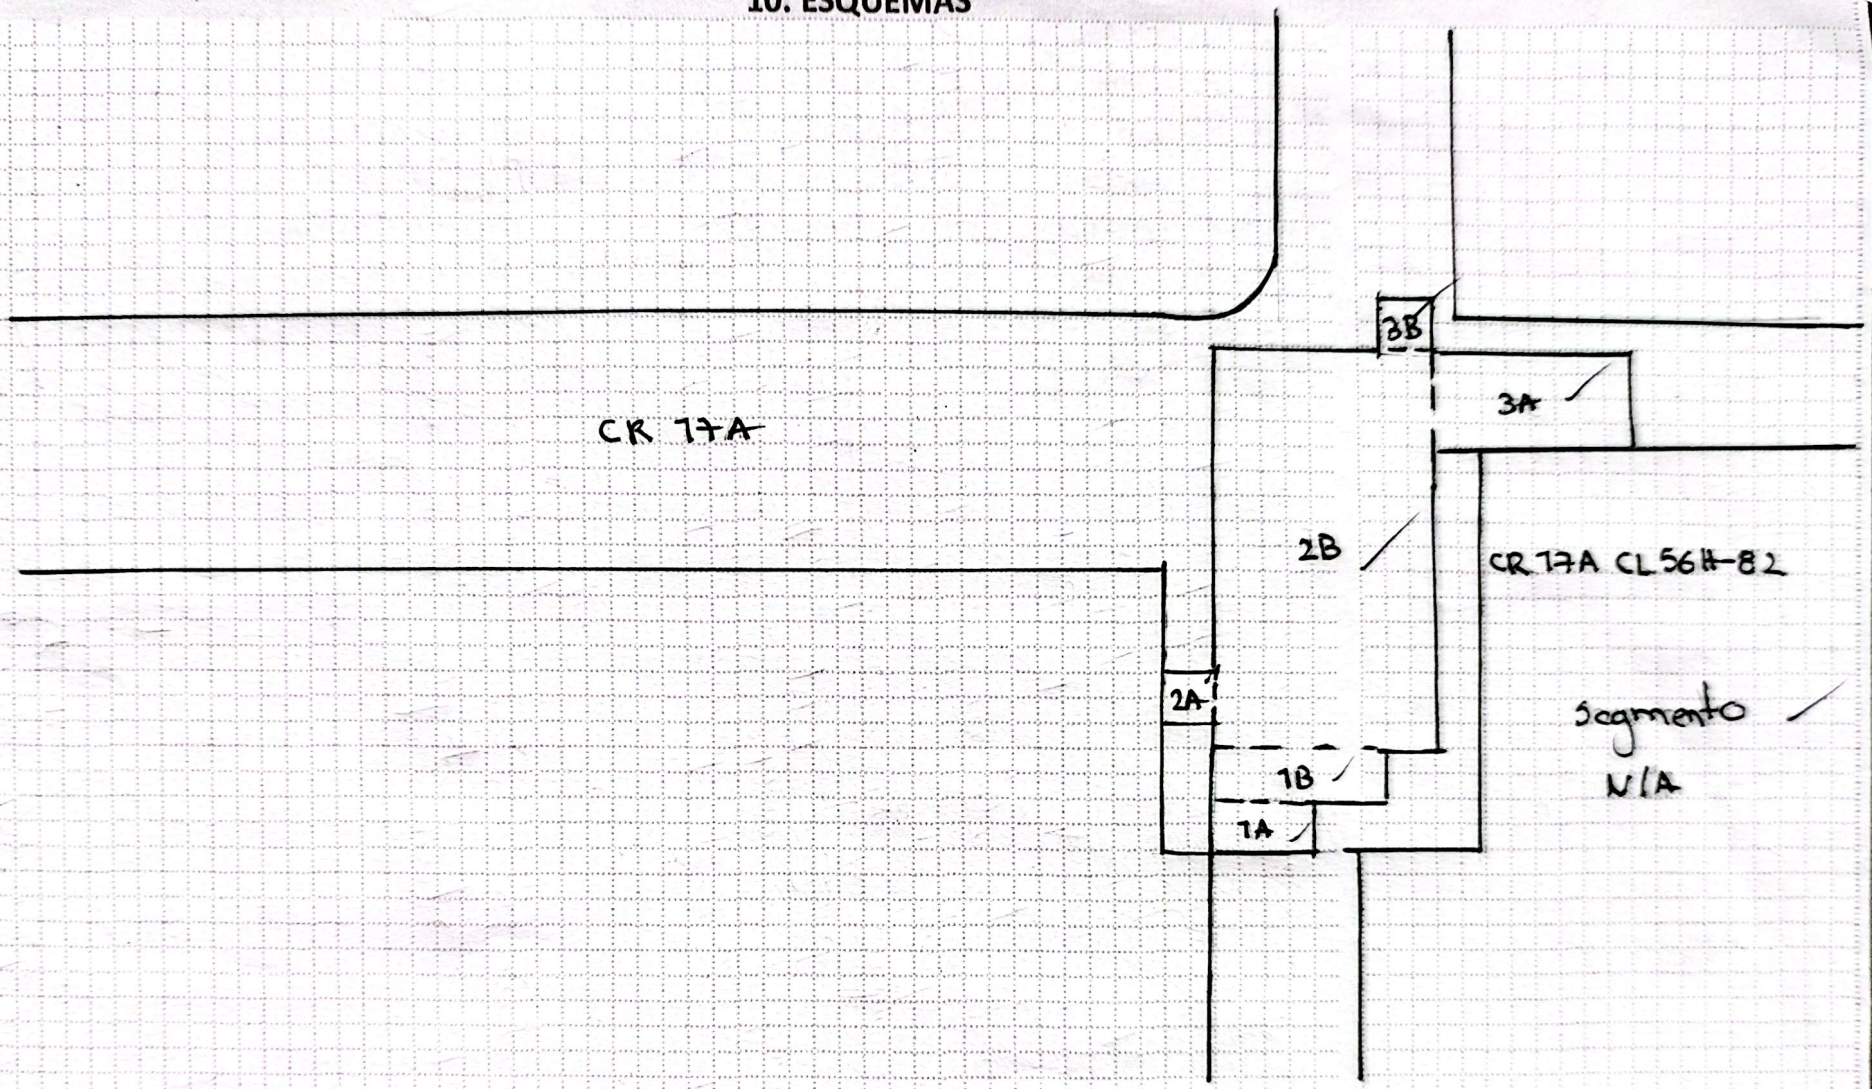

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Parcial	FRENTE	1
RANGO:	(0) 7	CANTIDAD:	4.87 t
BARRIO	Manaditas	DIRECCIÓN	CR 77A CL 56H-82

Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS

Nº 26095

PROVEEDOR: Tarle #1 2053

VALE POR UN VIAJE: Escombros

30/04/26

PLACA No: T10015 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Pavimentar

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 30-04-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
N/A	167926	1A	CR 17A CL 56H - 82	1.50	0.90	0.05	1.35	0.07	0.76
N/A	167926	1B	CR 17A CL 56H - 82	2.67	2.42	0.05	6.46	0.32	0.78
N/A	167927	2A	CR 17A CL 56H - 82	1.00	0.80	0.05	0.80	0.04	0.10
N/A	167927	2B	CR 17A CL 56H - 82	7.50	3.55	0.05	26.63	1.33	3.20
N/A	167937	3A	CR 17A CL 56H - 82	3.30	1.55	0.046	5.12	0.24	0.56
N/A	167937	3B	CR 17A CL 56H - 82	0.85	0.65	0.05	0.55	0.03	0.07
TOTALES									4.87

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
542775	TTO 095	4.87		143	26095	TTO 095	Sencilla	1	Pavimenta

Powered by CamScanner

20260430 09:12

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 542115
PLACA: TT0095
CONDUCTOR: JHON ESTIVEN GUTIERREZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 4,87 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003687 SUM-2149-EYP MALLA VI
ALMED
2026 #2149
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:12.270,00

ENTRADA: 30 abr 2026 -m09:14 a.
SALIDA: 30 abr 2026 -m 09:14 a.
TEMPERATURA:146,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20260430 11:58

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 24095
PLACA: TT0095
CONDUCTOR: ANDRES QUINTERO

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058-EYP ESCOMBRO
OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 30 abr 2026 -m01:21 p.
SALIDA: 30 abr 2026 -m 01:21 p.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto 8880
Peso tara : 7400
Peso neto : 1480

Powered by CamScanner
