FECHA (D/M/A): 17 Abril 2026.			**BITACORA DE OBRA**

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):			
RANGO: N/A	CANTIDAD: N/A.		
ZONA: 5		FRENTE DE TRABAJO: 5	
COMUNA: IV EL POBLADO			
BARRIO: AV EL POBLADO.			

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8 pm	Nocturno
TERMINACIÓN: 5:30 Am	
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Seco
	TARDE: Seco.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Instalacion de señalizacion Vertical.
Demarcacion de las areas a intervenir.
Demoliciones para reparaciones de MH. se extrae tapa y cuello.
Evacuacion del material sobrante de la demolicion.
Se instala MH en concreto prefabricado.
Imprimacion superficie en emulsion asfaltica.
Aplicacion de Mezcla asfaltica. Perimetro MH.
Aseo y limpieza areas intervenidas.
Retiro señalizacion instalada.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Alejandro Cano (Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA)	(Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR)
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Luis Alejandro Cano Rojas (Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA)	NOMBRE: José Luis Guzman A (Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR)

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero				
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante				
7	Ayudante				
8	Ayudante				
9	Ayudante				
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Conductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 17 ABRIL 2026

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			Area	Vol	Ton
				L (m)	DENSIDAD MEZCLA	e (m)	(m3)	(m2)	(kg)
2001030		MH	CR43A CL 8		2,41	0,24	1,3		0,8
2001030		MH	CR43A CL 8		2,41	0,24	1,3		0,8
2001030		MH	CR43A CL 8		2,41	0,24	1,3		0,8
								total	2,26
								TON por remision	3,03
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 17 abril 2026

10. ESQUEMAS

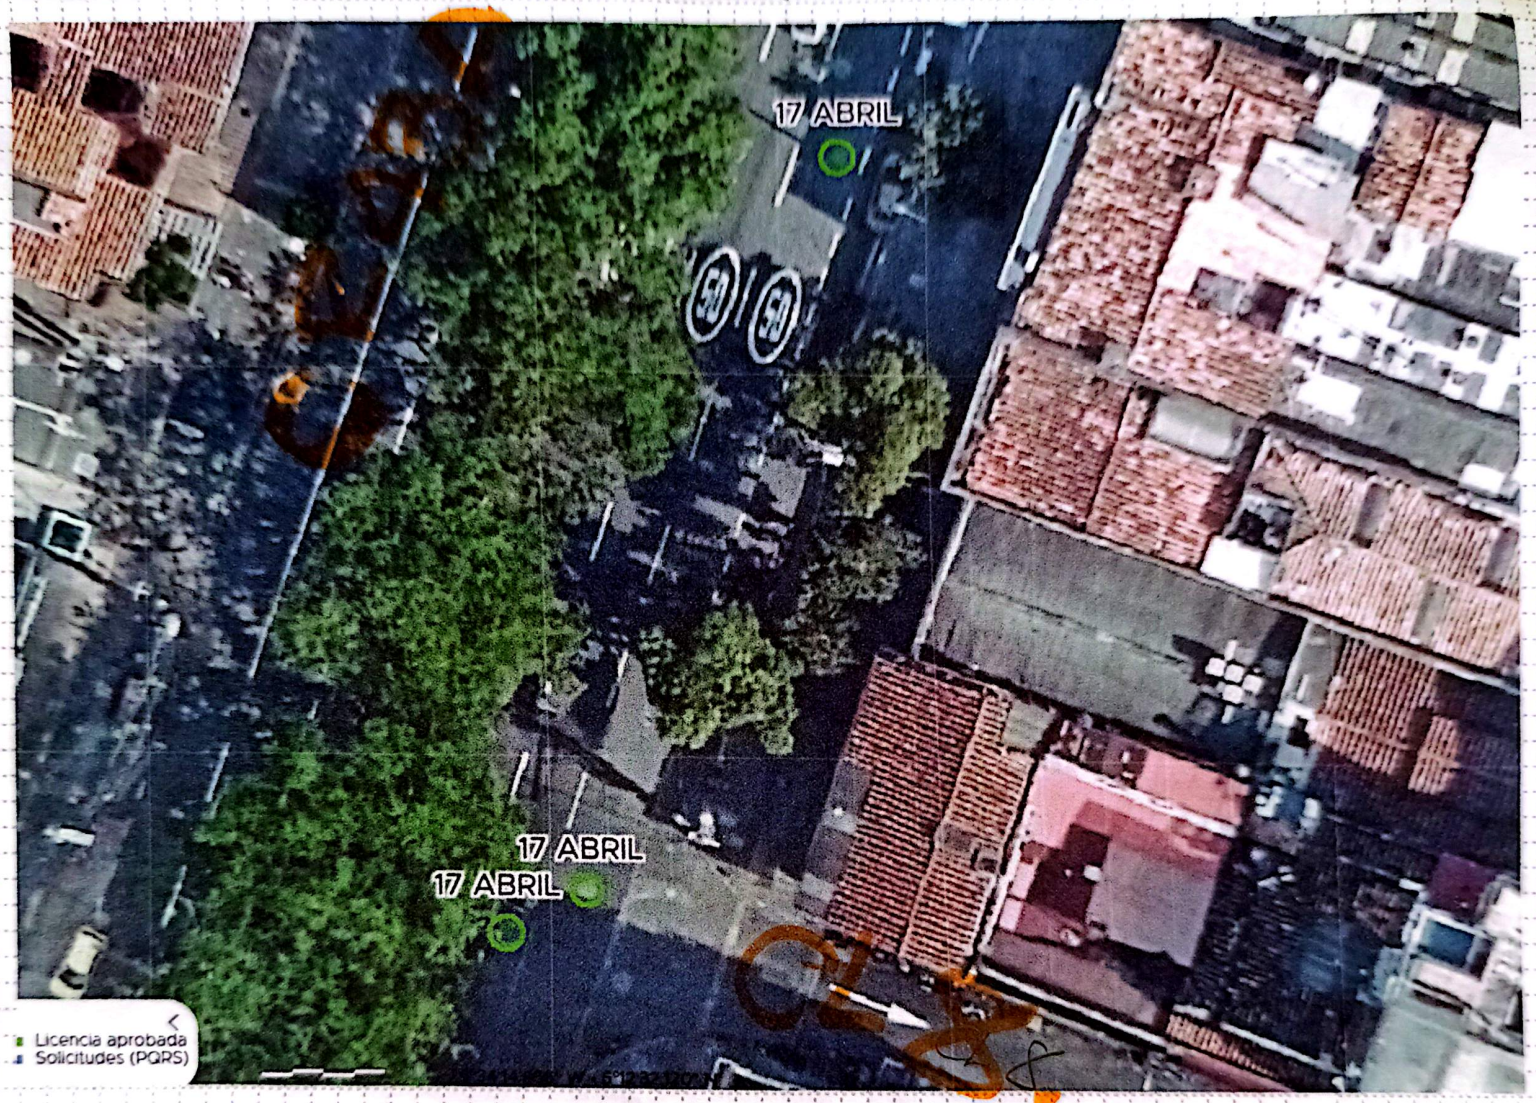

TIPO DE INTERVENCIÓN:	REALCES	FRENTE	
RANGO:	N/A	CANTIDAD:	
BARRIO	AV EL POBLADO	DIRECCIÓN	CR43A CL 8.

Powered by CamScanner
