FECHA (D/M/A): 21 Abril 2026.

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Realces.

RANGO: N/A. CANTIDAD: N/A.

ZONA: 3

COMUNA: 9 Buenos Aires.

BARRIO: LA ASOMADERA No 2.

FRENTE DE TRABAJO: 5

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — **CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — **CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 8 PM

TERMINACIÓN: 5:30 Am.

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Nocturno.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Seco

TARDE: seco.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Instalacion de senalizacion vertical.
Demarcacion de las areas a intervenir.
Demolicion para MH. se extraen Cuello y TAPA.
Extraccion de Material sobrante de excavacion o demolicion.
Se instala MH. en concreto prefabricado
Nivelacion en superficie. con Emulsion asfaltica.
aplicacion de mezcla en el perimetro del MH.
Aseo y limpieza areas intervenidas.
Retiro / senalizacion vertical.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Alejandro Castro
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: Jose Alejandro Castro Rogel
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA

Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR

FIRMA

NOMBRE: José Luis Guzman. S
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero				
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante				
7	Ayudante				
8	Ayudante				
9	Ayudante				
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				

Powered by CamScanner

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			Area	Vol	Ton
				L (m)	DENSIDAD MEZCLA	e (m)	(m3)	(m2)	(kg)
2001047		MH	CR 35 +200		2,41	0,335	1,3		1,0
2001047		MH	CR 35 +200		2,41	0,335	1,3		1,0
								total	2,10
								TON por remision	3,01
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

Powered by CamScanner


FECHA (D/M/A): 21 abril 2026

10. ESQUEMAS

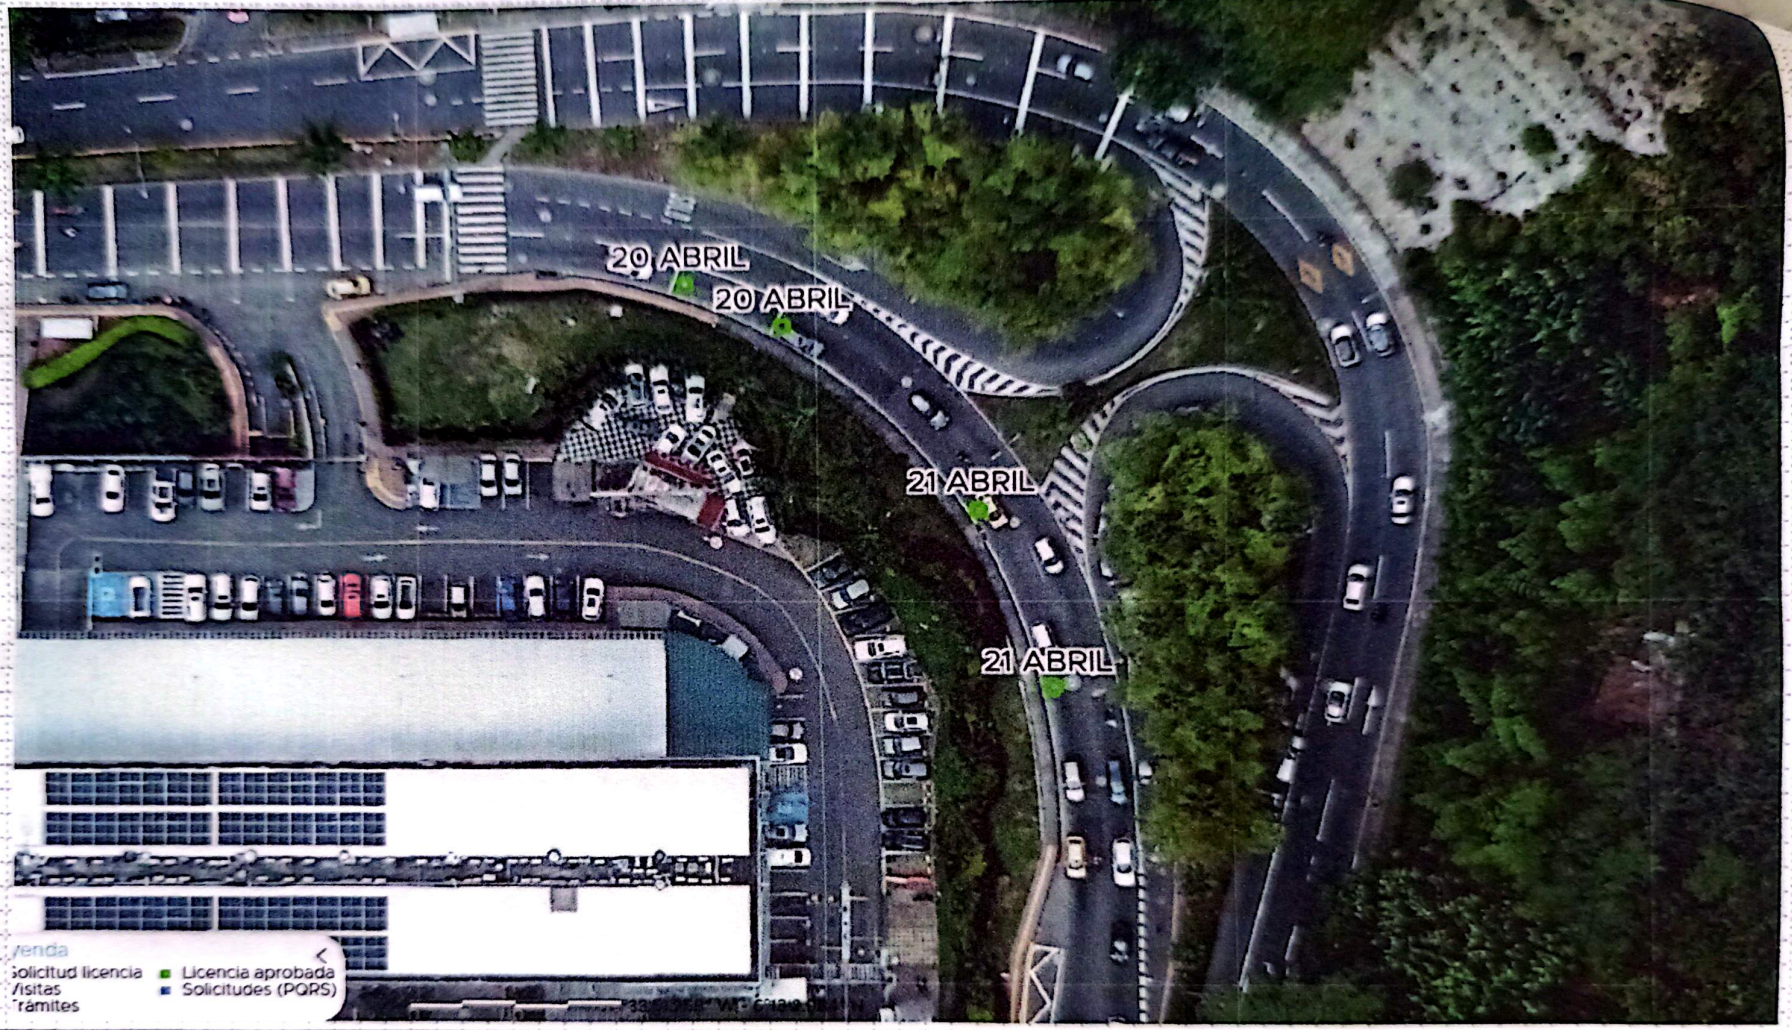

TIPO DE INTERVENCIÓN:	REALCES	FRENTE	
RANGO:	N/A	CANTIDAD:	Segmento 2001047.
BARRIO	LA ASOMADERA No 2	DIRECCIÓN	CR 35 + 200

Powered by CamScanner

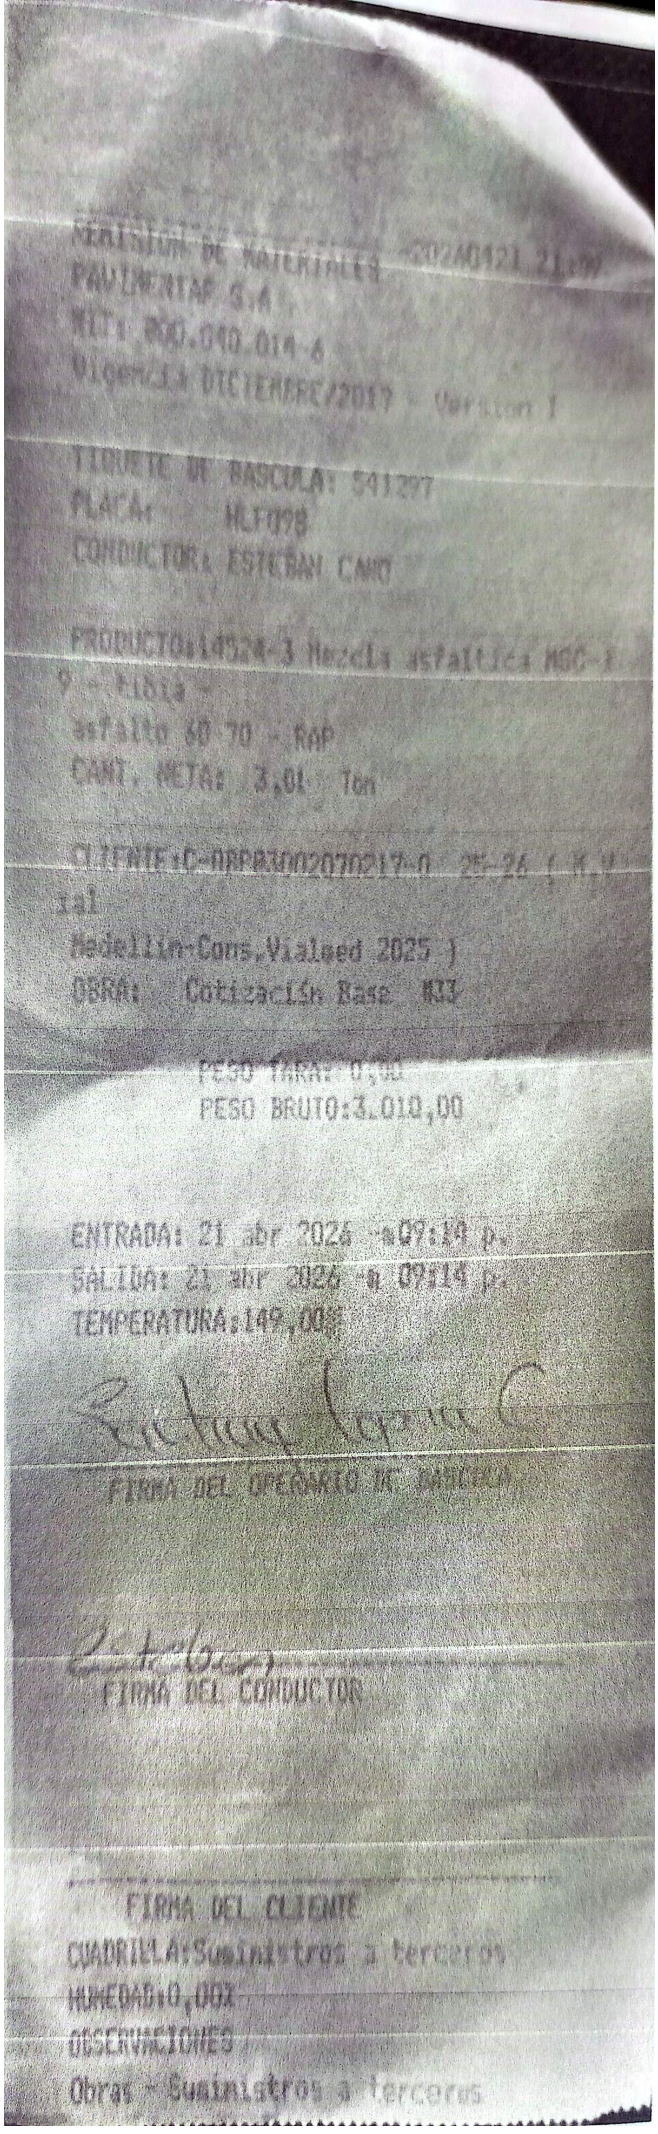

EMISION DE MATERIALES 20240421 21:09
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.010.014-6
Oficina DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 541297
PLACA: HLF098
CONDUCTOR: ESTEBAN CANO

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - Fibra -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. META: 3,01 Ton

CLIENTE:C-ORPA900207021?-0 25-26 (M V
ial
Medellin-Cons.Vialsed 2025)
OBRA: Cotizacion Base M33

PESO TARA: 0,00
PESO BRUTO:3.010,00

ENTRADA: 21 abr 2026 a 09:10 p.
SALIDA: 21 abr 2026 a 09:14 p.
TEMPERATURA:149,00°

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Suministros a terceros

Powered by CamScanner
