FECHA (D/M/A): 06-04-2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	OBRAS Complementarias		
RANGO:	N.A	CANTIDAD:	36,33.
ZONA		FRENTE DE TRABAJO:	6
COMUNA	16		
BARRIO	Belen		

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES: INICIO: 7:00 a.m. TERMINACIÓN: 5:30 p.m.	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Nivelacion de Superficie con Base Granular e 0.15 m.
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Nublada TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Favor revisar el baño movil esté ocupado con otros elementos y realizar mantenimiento, Conservar senderos Limpios y despejados.

1. Señalización y Delimitación del AREA INTERVENIDA
2. Instalación de Tranqueta Tacha y Tambores de Alerta, Según Normatividad.
3. Instalación de Malla Electrosoldada D-84
4. Nivelación y Nivelado de Concreto f'c=21 MPa para Anden, de Acuerdo a Interna de Mezcla de la Firma Interventoria Pavimentos S.A.S.
5. Limpieza en General del frente de Trabajo Intervenido
6. Riego, Nivelación y Compactación de Base Granular e= 0.15 m.

5. VISITANTES

Jorge Morales

6. FIRMAS

NOMBRE: Jhonatan Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	NOMBRE: Diego Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: David Arroyo Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. DIRECTOR RESIDENTE INTERVENTORIA

FECHA (D/M/A): 06-03-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA SI	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero				
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante				
7	Ayudante				
8	Ayudante				
9	Ayudante				
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				
30	AUX VIAL				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN SI	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				
17					

ECHA (D/M/A): 06.04-2026


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
				32,14	1.17	0,10		3,76	CARRIL
				1,60	1,32	0,10		0,21	BERMA
								3,97	ACUMULADO
								3,97	PROYECTADO
									ACUMULADO
									TOTAL
				-33,60	0,20		-6,72		MALLA 2-04
				32,0	1,17		37,44		
				1,60	1,32		2,11		
				7x(-0,50)	0,60		-2,10		
TOTALES							30,73		

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

FECHA (D/M/A): 06-04-2026

10. ESQUEMAS

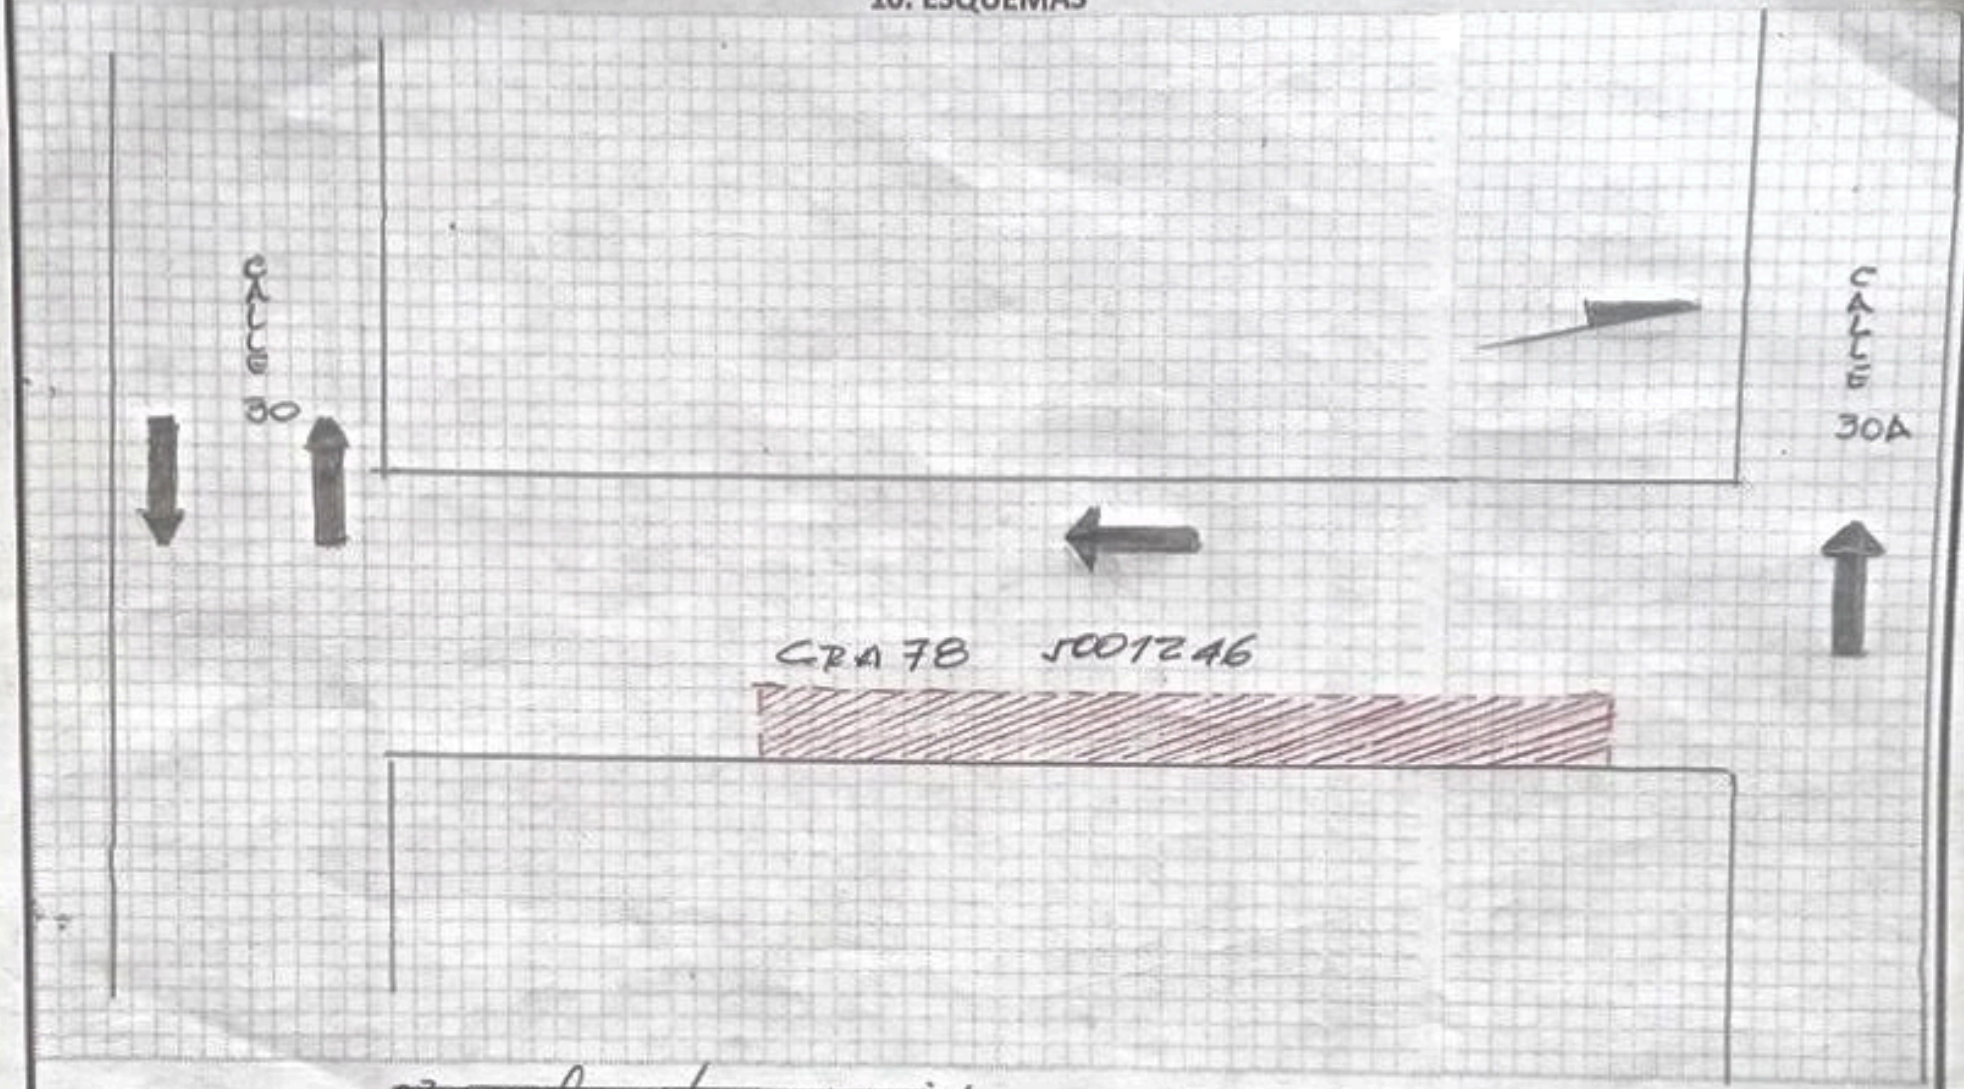

TIPO DE INTERVENCIÓN:	OBRAS COMPLEMENTARIAS	FRENTE	6
RANGO:	N.A	CANTIDAD:	30,93 M2
BARRIO	BOLIVIA	DIRECCIÓN	KRA 78 ENTRE CALLE 30 A Y CALLE 30
