FECHA (D/M/A): 07/04/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Señalización

RANGO: —

CANTIDAD: —

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

ZONA: 5

COMUNA: 14

BARRIO: El Tesoro.

FRENTE DE TRABAJO: 8.

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 8:00 PM

TERMINACIÓN: 4:30 AM.

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: —

TARDE: —

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Personal llega al lugar citado Tesoro para terminar la toma de Actividad faltante y flechas, se comienza en el cierre del mismo con señalización Verticales y encintado para Aplicación de plastico en frio. se Realiza y se espera secado mientras el carro Auxilia la otra cuadrilla el cual queda el carro en noche para las 2 cuadrillas en la misma zona. se pasan de carril y se realizan las flechas. al secar se Baja la cuadrilla a la glorieta de la cl 29 entre el 6 y el 6A para seguir en la misma zona con la otra cuadrilla. se Realizan flechas, pares - triangulos CEDA el paso - Linea central.

Jornada terminada a las 4:30 AM.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Tatiana Henao Perez. Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA Cristian D. Cortes A.
NOMBRE: Daniel Duque G. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 07/04/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luisa Fernandez	—		
2	Encargado	Diego londoño	—		
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Cristian camilo	—		
7	Ayudante	Julian valencia	—		
8	Ayudante	Andres lopera	—		
9	Ayudante	yeiny yuliana	—		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jhonatan montoya	—		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	JAC 330	—		
16	Volqueta(s)				

Powered by CamScanner

Plastico en frío

D/M/A): 07/04/2026


9. CALCULO DE CANTIDADES


ENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
4001054	4.1.3		Cl 6 CR 29 Cl 8.	—	30,85m	30,85m	Linea Exter Achurado 0,12
4001054	4.1.5		" " "	—	67,1 m	67,1 m	Linea Inter Achurado 0,40
4001674	4.1.1		" " "	1	1,2 m^2	1,2 m^2	flecha de frente
4001054	4.1.1		" " "	1	1,5 m^2	1,5 m^2	flecha solo giro
4001054	4.1.1		" " "	1	2,1 m^2	2,1 m^2	Texto PARE
4001054	4.1.5		" " "	—	4,5 m	4,5 m	Linea de PARE 0,40
3000192	4.1.1		CR 29 Cl 6 Cl 6A	1	2,2 m^2	2,2 m^2	flecha frente y giro
3000192	4.1.1		" " "	7	1,2 m^2	8,4 m^2	flecha de frente
5019140	4.1.1		" " "	4	1,43 m^2	5,72 m^2	Triangulo cada el paso
5019141	4.1.5		" " "	—	9,6m	9,6 m	Doble cada el paso 0,40
5019141	4.1.3		" " "	—	21 m	21 m	Linea de eje 0,12
			TOTALES				

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 07/04/2026.

10. ESQUEMAS

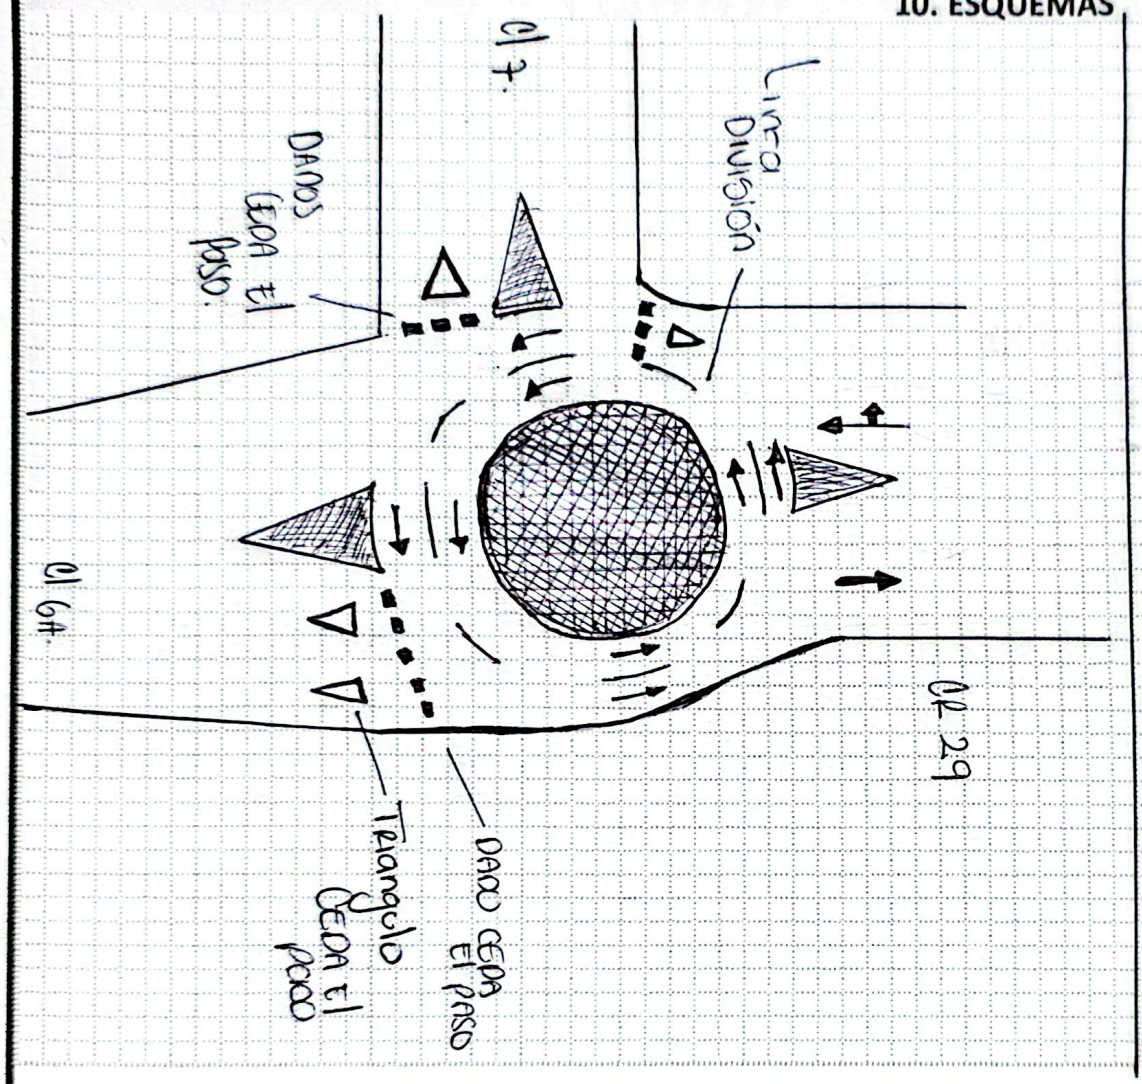

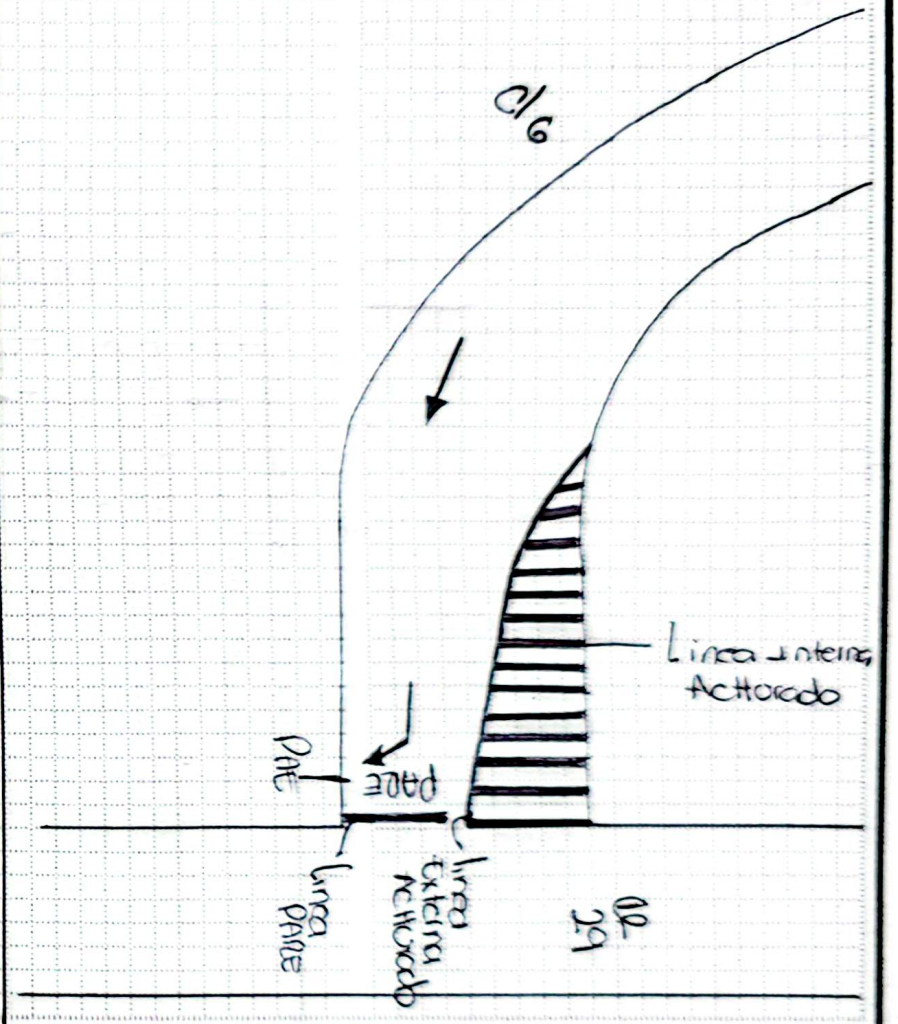

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Señalización	FRENTE	8
RANGO:	/	CANTIDAD:	/
BARRIO	El Tesoro	DIRECCIÓN	Cl 6 entre el 5 Cr 29 / Cr 29 Cl 6 el 7

Powered by CamScanner
