INFORME DE SUPERVISION - CONTRATO DE OBRA
No. SAMC-008-2025
DICIEMBRE – 2025
ACTA FINAL

SAMC-008-2025 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y MURO – BATEA PARA LA HABILITACIÓN DE LA VÍA DE LA VEREDA PIZARRA BOLÍVAR EN ANILLO VIAL QUE CONDUCE A LA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ".

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE
Nit: 901.433.327-1
SAS R/L MAIRON ALEJANDRO ZARATE
C.C. 1.055.553.055 DE OTANCHE

VALOR CONTRATADO
CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y PESOS ($173.364.752,00) M/CTE

ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE OTANCHE - BOYACA
NIT 891.801.362-1

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE OBRA No. SAMC-008-2025

CONVENIO		CONTRATO	X	TIPO	OBRA		
No. Contrato	**SAMC-008-2025**		Fecha de suscripción del contrato		**DÍA**	**MES**	**AÑO**
					23	09	2025
Objeto del Contrato:	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y MURO – BATEA PARA LA HABILITACIÓN DE LA VÍA DE LA VEREDA PIZARRA BOLÍVAR EN ANILLO VIAL QUE CONDUCE A LA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ".						
Supervisor:	**ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ**						
Contratista:	**CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE** Nit: 901.433.327-1, **R/L MAIRON ALEJANDRO ZARATE BELTRAN.** C.C. 1.055.553.055 DE OTANCHE CORREO ELECTRÓNICO: construccionesdeoccidente@gmail.com						

Ejecución del Contratista	Día	Mes	Año
Acta de Inicio:	29	09	2025
Fecha de Terminación Inicial:	12	12	2025
Fecha de Prorroga No. 001:	11	12	2025
Prorroga No. 001:	Diecinueve (19) días		
Fecha de Terminación Final:	31	12	2025


Valor inicial del contrato:	$173.364.752,00	**Valor Adición:** $ 0,00	
Valor total del Contrato:	$173.364.752,00		
Duración inicial del contrato:	Cuarenta y cinco (45) días	**Prorroga según *otro si* No.1**: Diecinueve (19) *días*	
Duración del contrato:	Noventa y cuatro (94) días		
Registro Presupuestal:	**No.**	**Código Presupuestal:**	**Denominación Presupuestal:**
	20250902300001	2.3.2.02.02.005.07	Construcción y/o mejoramiento de vías urbanas y ruralas

BALANCE PRESUPUESTAL

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	**(+)**	**(-)**
(+) Valor inicial del contrato	**$ 173.364.752,00**	
(+) Valor Adición	$ 0,00	
(=) Valor total contrato	**$ 173.364.752,00**	
(-) Anticipo		$ 0.00
(-) Valor actas parciales		$ 0,00
(-) Valor a pagar presente acta		**$ 173.364.752,00**
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 173.364.752,00**	**$ 173.364.752,00**

A la fecha no se han realizado pagos.

Localización Vereda Pizarra Bolívar

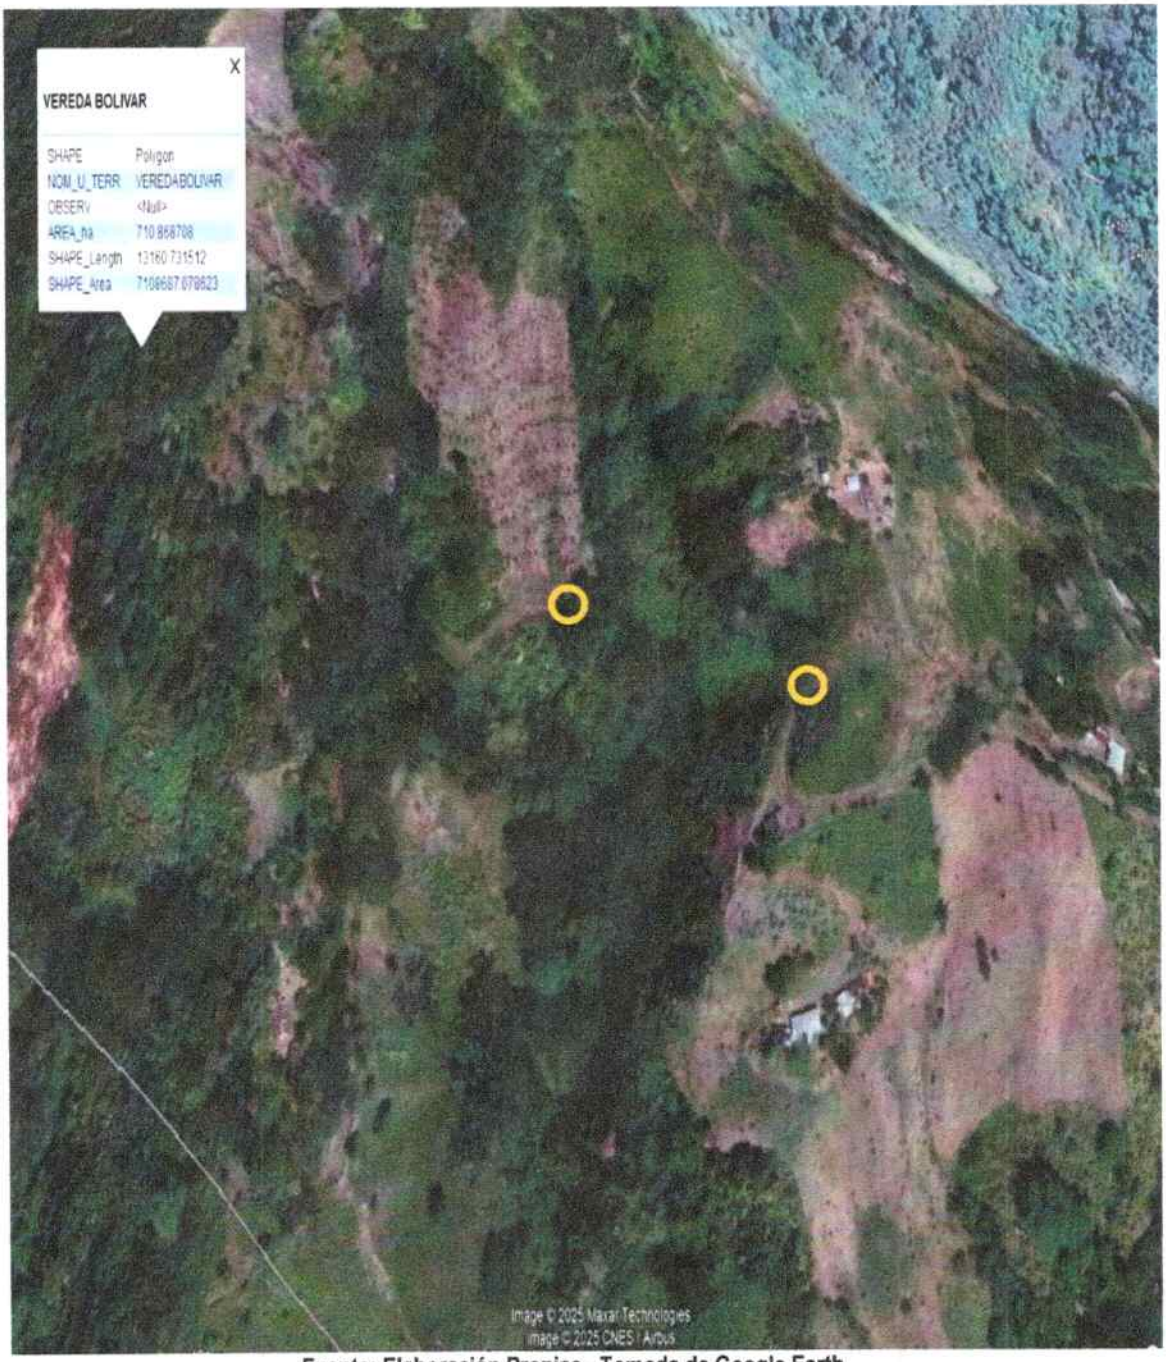

Fuente: Elaboración Propias - Tomada de Google Earth
Municipio de Otanche - Boyacá

SABANA DE CANTIDADES CONTRATADAS – RESUPUESTO INICIAL

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	DESCRIPCION	UND.	CANTID	INCREMENTO X DISTANIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. PRELIMINARES								
1,01	1.01.68	GOBERNACION	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	m²	36,00	0,00%	$ 8.282,55	$ 298.172,00
Subtotal								**$ 298.172,00**
2. ALCANTARILLA								
2,01	3.02.02	GOBERNACION	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	40,030		$ 33.084,97	$ 1.324.392,00
2,02	3.03.22	GOBERNACION	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3	2,660	12,00%	$ 671.264,71	$ 1.999.832,00
2,03	3.03.26	GOBERNACION	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	M3	1,030	12,00%	$ 1.034.770,28	$ 1.193.711,00
2,04	3.03.24	GOBERNACION	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	M3	5,710	12,00%	$ 1.344.598,62	$ 8.598.977,00
2,05	3.03.27	GOBERNACION	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETOREFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	M	6,000	12,00%	$ 910.329,23	$ 6.117.412,00
2,06	6.03.02	GOBERNACION	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	kg	578,900	12,00%	$ 9.102,76	$ 5.901.936,00
2,07	3.03.12	GOBERNACION	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	M3	15,590		$ 130.395,46	$ 2.032.865,00
2,08	3.12.03	GOBERNACION	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-km	1.245,64		$ 3.006,25	$ 3.744.705,00
Subtotal								**$ 30.913.830,00**
3. ESTRUCTURA								
3,01	3.02.02	GOBERNACION	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	12,030		$ 33.084,97	$ 398.012,00
3,02	3.03.22	GOBERNACION	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3	2,640	12,00%	$ 671.264,71	$ 1.984.795,00
3,03	1.02.11	GOBERNACION	CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	M3	9,720	12,00%	$ 1.131.221,25	$ 12.314.927,00
3,04	2.07.01	GOBERNACION	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3	9,110	12,00%	$ 1.305.600,70	$ 13.321.305,00
3,05	2.07.02	GOBERNACION	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	5,400	12,00%	$ 1.250.141,78	$ 7.560.857,00
3,06	3.10.12	GOBERNACION	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	kg	3434,060	12,00%	$ 9.102,76	$ 35.010.540,00
3,07	3.03.02	GOBERNACION	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M3	13,500	12,00%	$ 299.711,20	$ 4.531.633,00
3,08	3.03.08	GOBERNACION	DRENAJES EN TUBERIA DE PVC 4" PERFORADA INCLUYE GRAVILLA FINA	M	7,000	12,00%	$ 45.805,50	$ 359.115,00

3,09	3.03.09	GOBERNACION	DRENES HORIZONTALES TUBERIA PVC PERFORADA CON FILTRO 2"	M	20,220	12,00%	$	292.991,45	$	6.635.202,00
3,10	3.03.12	GOBERNACION	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	M3	162,000		$	130.395,46	$	21.124.065,00
3,11	3.12.03	GOBERNACION	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-km	12943,800		$	3.006,25	$	38.912.299,00
Subtotal									**$**	**142.152.750,00**
								SUBTOTAL OBRAS	**$**	**173.364.752,00**
			ADMINISTRACION							
			IMPREVISTO							
			UTILIDAD							
			VALOR TOTAL						$	173.364.752,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION			PORCENTAJE
ADMINISTRACION		A=	23,00%
IMPREVISTO		I=	3,00%
UTILIDAD		U=	4,00%
TOTAL A.I.U.		A.I.U.=	30,00%

VALOR CONTRATADO: **CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y PESOS ($173.364.752,00) M/CTE**

SABANA DE CANTIDADES EJECUTADAS

CONDICIONES ORIGINALES									CANTIDADES		VALORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
Nº	ESPECIFICACIONES ITEMS	ESPECIFICACIONES GOBERN	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	INCREMENTO X DISTANCIA	VALOR TOTAL	(+)	(-)	Mayores (+)	Menores (-)	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR
			1.PRELIMINARES													
1,01	1.01.68	GOBERN	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	36,00	8.282,55		298.172			$ 0,00		36,00	$ 298.172,00	36,00	$ 298.171,69
			2.ALCANTARILLA													
2,01	3.02.02	GOBERN	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR	M3	40,030	$ 33.084,97		$ 1.324.392,00			$ 0,00	$ -	40,03	$ 1.324.391,51	40,03	$ 1.324.391,51

			INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM													
2,02	3.03.22	GOBERN	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3	2,660	$ 671.264,71	12,00%	$ 1.999.832,00			$ 0,00	$ -	2,66	$ 1.999.831,83	2,66	$ 1.999.831,83
2,03	3.03.26	GOBERN	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	M3	1,030	$ 1.034.770,28	12,00%	$ 1.193.711,00	1,01		$ 1.168.214,26	$ -	2,04	$ 2.361.925,25	2,04	$ 2.361.925,25
2,04	3.03.24	GOBERN	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	M3	5,710	$ 1.344.598,62	12,00%	$ 8.598.977,00	1,01		$ 1.517.998,06	$ -	6,72	$ 10.116.975,15	6,72	$ 10.116.975,15
2,05	3.03.27	GOBERN	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETOREFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	M	6,000	$ 910.329,23	12,00%	$ 6.117.412,00			$ 0,00	$ -	6,00	$ 6.117.412,39	6,00	$ 6.117.412,39
2,06	6.03.02	GOBERN	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	KG	578,900	$ 9.102,76	12,00%	$ 5.901.936,00			$ 0,00	$ -	578,90	$ 5.901.935,70	578,90	$ 5.901.935,70
2,07	3.03.12	GOBERN	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	M3	15,590	$ 130.395,46		$ 2.032.865,00			$ 0,00	$ -	15,59	$ 2.032.865,22	15,59	$ 2.032.865,22
2,08	3.12.03	GOBERN	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	1.245,640	$ 3.006,25		$ 3.744.705,00			$ 0,00	$ -	1.245,64	$ 3.744.705,25	1.245,64	$ 3.744.705,25
			3.ESTRUCTURA					**$ 30.913.830,00**								
3,01	3.02.02	GOBERN	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	12,03	$ 33.084,97		$ 398.012,00			$ 0,00	$ -	12,03	$ 398.012,24	12,03	$ 398.012,24
3,02	3.03.22	GOBERN	GOBERN	M3	2,64	$ 671.264,71	12,00%	$ 1.984.795,00			$ 0,00	$ -	2,64	$ 1.984.795,50	2,64	$ 1.984.795,50
3,03	1.02.11	GOBERN	CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	M3	9,72	$ 1.131.221,25	12,00%	$ 12.314.927,00			$ 0,00	$ -	9,72	$ 12.314.926,98	9,72	$ 12.314.926,98

366

3,04	2.07.01	GOBERN	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3	9,11	$ 1.305.600,70	12,00%	$ 13.321.305,00	2,28		$ 3.331.240,18	$ -	11,39	$ 16.652.773,84	11,39	$ 16.652.774,15
3,05	2.07.02	GOBERN	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	5,40	$ 1.250.141,78	12,00%	$ 7.560.857,00			$ 0,00	$ -	5,40	$ 7.560.857,46	5,40	$ 7.560.857,46
3,06	3.10.12	GOBERN	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	3.434,06	$ 9.102,76	12,00%	$ 35.010.540,00		590,23	$ 0,00	$ 6.017.452,50	2.843,83	$ 28.993.087,00	2.843,83	$ 28.993.087,00
3,07	3.03.02	GOBERN	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M3	13,50	$ 299.711,20	12,00%	$ 4.531.633,00			$ 0,00	$ -	13,50	$ 4.531.633,40	13,50	$ 4.531.633,40
3,08	3.03.08	GOBERN	DRENAJES EN TUBERIA DE PVC 4" PERFORADA INCLUYE GRAVILLA FINA	M	7,00	$ 45.805,50	12,00%	$ 359.115,00			$ 0,00	$ -	7,00	$ 359.115,12	7,00	$ 359.115,12
3,09	3.03.09	GOBERN	DRENES HORIZONTALES TUBERIA PVC PERFORADA CON FILTRO 2"	M	20,22	$ 292.991,45	12,00%	$ 6.635.202,00			$ 0,00	$ -	20,22	$ 6.635.201,62	20,22	$ 6.635.201,62
3,10	3.03.12	GOBERN	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	M3	162,00	$ 130.395,46		$ 21.124.065,00			$ 0,00	$ -	162,00	$ 21.124.064,52	162,00	$ 21.124.064,52
3,11	3.12.03	GOBERN	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	12.943,80	$ 3.006,25		$ 38.912.299,00			$ 0,00	$ -	12.943,80	$ 38.912.298,75	12.943,80	$ 38.912.298,75
								$ 142.152.750,00								
								$ 173.364.752			**$ 6.017.452,50**	**$ 6.017.452,50**		**$ 173.364.981**		**$ 173.364.981**
			ADMINISTRACION		**ADMINISTRACION**			23,00%								
			IMPREVISTO		**IMPREVISTO**			3,00%								
			UTILIDAD		**UTILIDAD**			4,00%								
			TOTAL A.I.U.		**TOTAL A.I.U**			30,00%								

ACTA A PAGAR: **CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y PESOS ($173.364.752,00) M/CTE**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Documentos originales que reposan en la carpeta del contrato No. **SAMC-008-2025.**

Anexo No. 01. - Bitácora de actividades.
Anexo No. 02. - Resistencias de concreto.

23/12/2025

ANDRY FABIAN JIMENEZ MENDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

Proyecto: Ing. Andry Jiménez.
Archivado en: CONTRATO DE OBRA No. SAMC-008-2025

República de Colombia – Departamento de Boyacá
Municipio de Otanche
PROCESO: CONTRATACION
NIT 891.801.362-1

CODIGO: SG210-03	INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA	11/03/2024	VERSION: 1

CIUDAD Y FECHA	viernes, 5 de diciembre de 2025						
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE SAS			C.C. O NIT:	901.433.327-1		
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)	MAIRON ALEJANDRO ZARATE BELTRAN						
RÉGIMEN DEL IMPUESTO DE VENTAS	RESP. IVA	X	SIMPLIFICADO		TIPO DE CONTRATO	OBRA	
N° CONTRATO: SAMC-008-2025	AÑO CONTRATO:	2025	EJECUCIÓN	DÍA	MES	AÑO	
			INICIO	29	9	2025	
			PRORROGA No. 001	11	12	2026	
			TERMINACIÓN FINAL	31	12	2025	
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y MURO – BATEA PARA LA HABILITACIÓN DE LA VÍA DE LA VEREDA PIZARRA BOLÍVAR EN ANILLO VIAL QUE CONDUCE A LA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ".						
PERIODO DE PAGO:	DESDE:	29-sep-25	HASTA:	29-dic-25	PAGO No.	1	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ						

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 173.364.752,00	
(+) Valor adiciones	$ -	
(=) Valor total contrato	**$ 173.364.752,00**	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor Pagos Realizados		$ -
(-)Valor a pagar		**$ 173.364.752,00**
(-) Valor pendiente de ejecución		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 173.364.752,00**	**$ 173.364.752,00**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: "CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y PESOS ($173.364.752,00) M/CTE".

República de Colombia – Departamento de Boyacá
Municipio de Otanche
PROCESO: CONTRATACIÓN
NIT: 891.801.362-1

CODIGO: SG210-03	INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA	11/03/2024	VERSION: 1

(*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron causados, en ningun caso puede ser inferior al salario minimo mensual legal vigente.. (**)Todos los empleadores, persona natural o jurídica, público o privado que empleen uno o más trabajadores permanentes, están obligados a pagar aportes parafiscales a la Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF. (***) Sujetos pasivos del impuesto para la equidad CREE

NUMERO PLANILLA DE APORTES		92586936	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(*):	$	178.000,00	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)	$	227.800,00	APORTES ARL (*):	$	99.100,00
VALOR APORTES SENA(**)	$ 28.500,00	VALOR APORTES ICBF (**)	$	42.800,00	VALOR APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN (**)	$	57.000,00	AUTORRETENEDOR CREE (***)			
NUMERO PLANILLA DE APORTES		92050459	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(*):	$	178.000,00	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)	$	227.800,00	APORTES ARL (*):	$	99.100,00
VALOR APORTES SENA(**)	$ 28.500,00	VALOR APORTES ICBF (**)	$	42.800,00	VALOR APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN (**)	$	57.000,00	AUTORRETENEDOR CREE (***)	$	-	
NUMERO PLANILLA DE APORTES		91221714	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(*):	$	178.000,00	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)	$	227.800,00	APORTES ARL (*):	$	99.100,00
VALOR APORTES SENA(**)	$ 28.500,00	VALOR APORTES ICBF (**)	$	-	VALOR APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN (**)	$	57.000,00	AUTORRETENEDOR CREE (***)	$	-	
NUMERO PLANILLA DE APORTES		91221702	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(*):	$	181.300,00	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)	$	232.000,00	APORTES ARL (*):	$	101.000,00
VALOR APORTES SENA(**)	$ 29.100,00	VALOR APORTES ICBF (**)	$	43.600,00	VALOR APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN (**)	$	57.000,00	AUTORRETENEDOR CREE (***)	$	-	
NUMERO PLANILLA DE APORTES		89226210	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(*):	$	57.000,00	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)	$	227.800,00	APORTES ARL (*):	$	99.100,00
VALOR APORTES SENA(**)	$ -	VALOR APORTES ICBF (**)	$	-	VALOR APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN (**)	$	57.000,00	AUTORRETENEDOR CREE (***)	$	-	

ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES	SI	X	NO		TOTAL ANEXOS	No. FOLIOS	12	CD	

NOTA: LOS ANEXOS MENCIONADOS REPOSAN EN LA CARPETA CONTRACTUAL, EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL MUNICIPIO.

En mi calidad de contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. (Decreto 2271 de junio 18 de 2009, articulo 4, parágrafo 1.

Mairon Alejandro Zarate.

FIRMA DEL CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE S.A.S. R/L MAIRON ALEJANDRO ZARATE BELTRAN
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor y/o interventor del Contrato de No. SAMC-008-2025 arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas segun las evidencias verificadas, para el periodo del informe.

SUPERVISOR	ALCALDE MUNICIPAL
ANDRY FABIAN JIMENEZ MENDEZ	WILIAR PEÑA SUATERNA
Secretario de planeacion e infraestructura	

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE – BOYACÁ

C E R T I F I C A:

Que, **CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE SAS** NIT. 901.433.327-1, correo electrónico: construccionesdeoccidente@gmail.com; **R/L MAIRON ALEJANDRO ZARATE BELTRAN,** ha venido cumpliendo con el contrato de Obra No. **SAMC-008-2025**, el cual tiene como objetivo principal: **"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y MURO – BATEA PARA LA HABILITACIÓN DE LA VÍA DE LA VEREDA PIZARRA BOLÍVAR EN ANILLO VIAL QUE CONDUCE A LA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ"**, acuerdo a las especificaciones descritas en el contrato:

CONTRATO No:	**SAMC-008-2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 173.364.752,00**
OTRO SI	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 173.364.752,00**
VALOR ACTAS PARCIALES	$0,00
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 173.364.752,00**
VALOR PENDIENTE POR EJECUCION	$ 00

El valor de pago de la presente Acta es por un valor de: **"CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y PESOS ($173.364.752,00) M/CTE".**

Que, **CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE SAS** NIT 901.433.327-1, correo electrónico: construccionesdeoccidente@gmail.com ; **R/L MAIRON ALEJANDRO ZARATE BELTRAN,** ha cumplido con el pago de seguridad social.

Para constancia, se firma al día (29) día del mes de diciembre del 2025, para fines pertinentes.

29/12/2025

ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

Proyectó: Ing. Andry Jiménez.
Archivado en: CONTRATO DE OBRA No. SAMC-008-2025.
