ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL - BOYACÁ NIT. 891.801.129-1	GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-GCT-01 Versión 1	Página 1 de 1 01/02/2025

INFORME DEL CONTRATISTA

INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	Fecha del presente informe	18/06/2026

PERIODO REPORTE	22/05/2026 - 18/06/2026	CONVENIO No.	35
FECHA DE INICIO	24/12/2025	FINALIZACIÓN	15/06/2026
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MACANAL	SUPERVISOR:	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA

OBJETO CONTRACTUAL

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE ASOJUNTAS MACANAL Y EL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACÁ, ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

REPORTE DEL CONTRATISTA			*REPORTE DEL SUPERVISION*			
ITEM	*ACTIVIDADES PACTADAS*	*ACTIVIDADES EJECUTADAS*	*VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES*			*OBSERVACIONES*
			T	*P*	*N*	
1	Realizar trabajos de acuerdo con las descripciones anteriormente convenidas	Se realizan los trabajos de acuerdo a las actividades expuestas en el presupuesto y las especificaciones tecnicas, los cuales se van avanzando como se muestra en el anexo de las realizacion de los trabajos		X		
2	Garantizar el cumplimiento de las actividades o servicios establecidos en el convenio con personal de la comunidad de la vereda donde se realizan los trabajos.	se garantiza el cumplimiento de las actvidadesdeservicio establecidas en el convenio personal de la comunidad los trabajos realizados y la participacion de la misma comunidad		X		
3	Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los Estudios y Documentos soporte de la contratación	se garantiza la calidad delos bienes materiales expuestos y necesarios en la realziacion del convenio		X		

4	Atender las instrucciones y lineamientos teniendo en cuenta lo establecido en los documentos o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.	se atiende los lineamientos tanto expuestos por el supervisor del convenio de acuerdo a la realizacion del convenio		X		
5	Encontrarse a paz y salvo por el pago de aportes de sus empleados de las personas que JAC emplee para la ejecución del presente convenio, mediante certificación a la fecha, expedida por el presidente.	Se hace el pago de seguridad social de acuerdo a los aportes de sus empleados de las personas que integran la JAC		X		
6	Rendir un informe detallado de la ejecución de las actividades objeto del convenio.fa.	se rinde el inforem detallado de las activiidades a cobrar		X		
7	recibir el apoyo técnico, administrativo y contable, y aplicarlo en la ejecución del objeto y el alcance del Convenio de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021	se realiza la actividad		X		
8	Entregar, con el acta de terminación del convenio, registro fotográfico que evidencie la ejecución del objeto del convenio.	Cuando se realiza la entrega de el total de las placa huellas se realziara el acta de entrgea según correspondan			X	

INSTRUCTIVO:

Actividades pactadas: El proveedor debe incluir las actividades consignadas en la minuta.

Actividades pactadas: El proveedor debe argumentar de manera explicita, el desarrollo de cada actividad pactada.

Verificacion ejecucion de actividades: El informe debe presentarse de manera periodica según las clausulas de ejecucion teniendo presente que se deben verificar si la actividad se desarrollo ***T***= TOTALMENTE, ***P***= PARCIALMENTE, ***N***= No se ejecuto.

Observaciones: Se registraran todas aquellas novedades por parte del contratista para demostrar por medio de registro fotografico, y/o documental el cumplimiento debido de la misma.

Adicionalmente como proveedor entrego estos documentos: Ejemplo:FACTURA -, ACTA PARCIAL DE PAGO Y COPIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE . No. De planilla MAYO

FIRMAS

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MACANAL

CONTRATISTA

MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA

SUPERVISIOR

INFORME DE EJECUCION 2

CONVENIO SOLIDARIO No. 35 DE 2025

CUENTA DE COBRO DEL 22 DE MAYO DE 2026 al 18 de Junio de 2026

(18 de Junio de 2026)

CONVENIO SOLIDARIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MACANAL Y ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MACANAL

CONVENIO NO:	35 de 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MACANAL
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE ASOJUNTAS MACANAL Y EL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACÁ, ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MACANAL 900262051-4 JOSÉ AURELIANO VANEGAS VEGA 3.232.836 expedida en Bogotá DC
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y UN PESOS ($199.974.041,00) M/CTE
ADICION CONTRATO	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($99.987.020,50) M/CTE
TOTAL CONTRATO	DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($299.961.061,50) M/CTE
PLAZO:	SIETE (07) DIAS CALENDARIO
PLAZO PRORROGA 01	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO:	VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA 1	QUINCE (15) DE JUNIO DE 2026
PRORROGA 2 NUEVA FECHA DE TERMINACION	TREINTA (30) DE JULIO DE 2026

VALOR INICIAL	$199.974.041,00	
VALOR ADICIONAL	$99.987.020,50	
VALOR ACTA 01		$97.717.149,00
VALOR ACTA 02		$105.349.177,57
SALDO POR GIRAR		$96.894.734,93
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$299.961.061,50	$299.961.061,50

ACTIVIDADES EJECUTADAS

PLACA HUELLA VEREDA VEGA-SECTOR PAMORROSOS- CORDENADAS- N 4° 55" 2.97" W 73° 18" 20.73" Y N 4° 55" 43" 3.72" W 73° 19" 99.7".

TRAMO 1



CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 28 MPa - (4000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)



TRAMO 2



CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 28 MPa - (4000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)





CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)

TRAMO 3



CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 28 MPa - (4000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)



SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO: Se realiza la instalación del concreto ciclópeo de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos presentados.



SUMINISTRO DE ACERO 3/8 : Realización de instalación de varillas de acero de 3/8 a lo largo de la placa huella según se muestra en el informe.


PLACA HUELLA AGUA BLANCA CHIQUITA-SECTOR LA ESCUELA - CORDENADAS- N 4° 58" 35" W 73° 14" 29" Y N 4° 58" 33" W 73° 14" 26".



CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)



EXTENDIDA Y COMPACTA: Compactación de la vía de acuerdo a la zona a realizar en la cual se cuenta con el terreno listo para realización de la instalación de el acero y concreto respectivamente

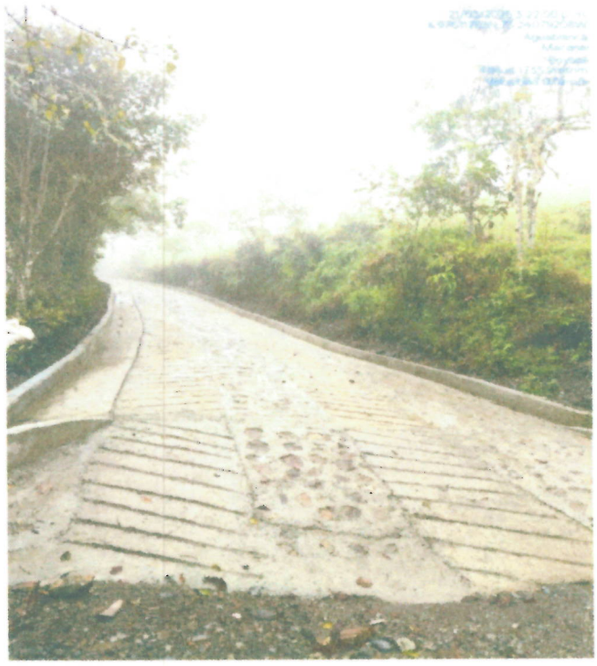

CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)



CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 28 MPa - (4000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)



SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO: Se realiza la instalación del concreto ciclópeo de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos presentados.



SUMINISTRO DE ACERO 3/8 : Realización de instalación de varillas de acero de 3/8 a lo largo de la placa huella según se muestra en el informe.

PRESUPUESTO PROYECTO PLACA HUELLA SECTOR BATA 2 - COORDENADAS- N 4° 57" 51" W 73° 20" 36" Y N 4° 57" 48" W 73° 20" 38



SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO: Se realiza la instalación del concreto ciclópeo de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos presentados..



SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO: Se realiza la instalación del concreto ciclópeo de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos presentados.



CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)



CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 28 MPa - (4000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)



SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO: Se realiza la instalación del concreto ciclópeo de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos presentados.



SUMINISTRO DE ACERO 3/8 : Realización de instalación de varillas de acero de 3/8 a lo largo de la placa huella según se muestra en el informe.

PRESUPUESTO PROYECTO PLACA HUELLA VEREDA VIJAGUAL SECTOR LOS JUANES - COORDENADAS- N 4° 58" 05" W 73° 17" 54" Y N 4° 58" 07" W 73° 17" 50".

TRAMO 1



CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 28 MPa - (4000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS) CON CONCRETO DE 3000 PSI Y CICLOPEDO MAS VARILLAS



CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 28 MPa - (4000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS) CON CONCRETO DE 3000 PSI Y CICLOPEDO MAS VARILLAS





CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)



CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 28 MPa - (4000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)







SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO: Se realiza la instalación del concreto ciclópeo de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos presentados.

TRAMO 2



SUMINISTRO DE ACERO 3/8 : Realización de instalación de varillas de acero de 3/8 a lo largo de la placa huella según se muestra en el informe.

JOSE AURELIANO VANEGAS VEGA
R/L: ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MACANAL
