
CRONOGRAMA CON PRORROGA No. 02 C.O. No. ICCU-139 DE 2025 "INTERVENCIÓN DE VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**CRONOGRAMA EJECUCIÓN C.O. No. ICCU-139 DE 2025_CAMINOS VECINALES LOTE 2**	**484.75 días**	**1/04/25**	**17/10/26**
2	Inicio contractual	0 días	1/04/25	1/04/25
3	**CARACTERIZACION VIAL Y ENSAYOS**	**65 días**	**1/04/25**	**30/06/25**
4	Proyección de suscripción prórroga No. 02	0 días	16/06/26	16/06/26
5	**1 - MANTA**	**333.5 días**	**1/07/25**	**24/07/26**
6	PRELIMINARES	133 días	1/07/25	3/12/25
7	Movilización de maquinaria y equipos	6 días	1/07/25	8/07/25
8	Transporte de materiales provenientes de explanación, canales, prestamos, sobrecarreos y derrumbes	0 días	3/12/25	3/12/25
9	Socialización de PMT, actas de vecindad y actas de entorno	18 días	9/07/25	1/08/25
10	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	114.75 días	7/10/25	17/02/26
11	Afirmado	2 días	15/02/26	17/02/26
12	Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	2 días	7/10/25	8/10/25
13	Remocion de alcantarillas	4 días	28/10/25	1/11/25
14	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	7 días	4/11/25	11/11/25
15	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	5 días	2/12/25	6/12/25
16	MANTENIMIENTO RASANTE	129.5 días	24/02/26	24/07/26
17	Capa estabilizada con productos químicos no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)	26 días	24/02/26	23/06/26
18	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2	22 días	29/06/26	24/07/26
19	ALCANTARILLAS	212.5 días	5/11/25	10/07/26
20	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (bases)	5 días	11/12/25	17/12/25
21	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (elevaciones)	10 días	12/12/25	24/12/25
22	Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques	5 días	6/11/25	12/11/25
23	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	15 días	10/11/25	26/11/25
24	Relleno para estructuras	5 días	7/11/25	13/11/25
25	Cuneta estabilizada con quimico y cemento	20 días	17/06/26	10/07/26
26	Rocería (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	2 días	13/01/26	14/01/26
27	Limpieza de alcantarillas con diámetro menor o igual a e= 36, incluye rectificación de descoles, y retiro de sobrantes a una distancia de 5 km	8 días	18/11/25	27/11/25
28	Limpieza a mano de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	8 días	15/01/26	26/01/26
29	Grava de 3/4 para cama de tubería y atraques	5 días	6/11/25	12/11/25
30	Suministro e instalación de tubería de PVC corrugada e=36	5 días	5/11/25	11/11/25
31	**4 - CHOCONTÁ**	**302.5 días**	**4/08/25**	**22/07/26**
32	PRELIMINARES	104 días	4/08/25	3/12/25
33	Movilización de maquinaria y equipos	6 días	4/08/25	11/08/25
34	Transporte de materiales provenientes de explanación, canales, prestamos, sobrecarreos y derrumbes	0 días	3/12/25	3/12/25
35	Socialización de PMT, actas de vecindad y actas de entorno	18 días	12/08/25	4/09/25
36	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	90 días	7/10/25	20/01/26
37	Afirmado	0 días	20/01/26	20/01/26
38	Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	0 días	7/10/25	7/10/25
39	Remocion de alcantarillas	8 días	28/10/25	5/11/25
40	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	9 días	4/11/25	13/11/25
41	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	7 días	2/12/25	9/12/25
42	MANTENIMIENTO RASANTE	57.75 días	12/05/26	17/07/26
43	Gestión y traslado de estabilizante	8 días	12/05/26	20/05/26
44	Capa estabilizada con productos químicos no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)	25 días	21/05/26	30/06/26
45	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2	21 días	23/06/26	17/07/26
46	ALCANTARILLAS	221.5 días	6/11/25	22/07/26
47	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (bases)	6 días	11/12/25	18/12/25
48	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (elevaciones)	13 días	16/12/25	1/01/26
49	Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques	6 días	6/11/25	13/11/25
50	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	14.63 días	10/11/25	29/11/25
51	Relleno para estructuras	6 días	7/11/25	14/11/25
52	Cuneta estabilizada con quimico y cemento	34 días	12/06/26	22/07/26
53	Rocería (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	9 días	13/01/26	22/01/26
54	Limpieza de alcantarillas con diámetro menor o igual a e= 36, incluye rectificación de descoles, y retiro de sobrantes a una	3 días	18/11/25	20/11/25
55	Limpieza a mano de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	15 días	15/01/26	3/02/26
56	Grava de 3/4 para cama de tubería y atraques	6 días	14/11/25	21/11/25
57	Suministro e instalación de tubería de PVC corrugada e=36	9 días	14/11/25	24/11/25
58	**5 - UBATÉ**	**252 días**	**7/10/25**	**28/07/26**
59	PRELIMINARES	31 días	11/05/26	16/06/26
60	Movilización de maquinaria y equipos	6 días	8/06/26	13/06/26
61	Transporte de materiales provenientes de explanación, canales, prestamos, sobrecarreos y derrumbes	0 días	11/05/26	11/05/26
62	Socialización de PMT, actas de vecindad y actas de entorno	2 días	15/06/26	16/06/26
63	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	185.75 días	7/10/25	11/05/26
64	Afirmado	0 días	11/05/26	11/05/26
65	Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	2 días	7/10/25	8/10/25
66	Remocion de alcantarillas	0 días	28/10/25	28/10/25
67	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	0 días	4/11/25	4/11/25
68	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	14 días	2/12/25	18/12/25
69	MANTENIMIENTO RASANTE	36 días	15/05/26	28/07/26
70	Gestión y traslado de estabilizante	1 día	15/06/26	17/06/26
71	Capa estabilizada con productos químicos no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)	23 días	17/06/26	14/07/26
72	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2	20 días	4/07/26	28/07/26
73	ALCANTARILLAS	227 días	5/11/25	28/07/26
74	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (bases)	2 días	11/12/25	13/12/25
75	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (elevaciones)	5 días	12/12/25	18/12/25
76	Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques	3 días	13/03/26	17/03/26
77	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	8 días	10/11/25	19/11/25
78	Relleno para estructuras	2 días	7/11/25	11/11/25
79	Cuneta estabilizada con quimico y cemento	32 días	20/06/26	28/07/26
80	Rocería (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	0 días	11/05/26	11/05/26
81	Limpieza de alcantarillas con diámetro menor o igual a e= 36, incluye rectificación de descoles, y retiro de sobrantes a una	2 días	18/11/25	20/05/26
82	Limpieza a mano de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	14 días	12/05/26	28/05/26
83	Grava de 3/4 para cama de tubería y atraques	2 días	6/11/25	8/11/25
84	Suministro e instalación de tubería de PVC corrugada e=36	3 días	5/11/25	8/11/25
85	**2 - SUSA**	**399.25 días**	**9/07/25**	**17/10/26**
86	PRELIMINARES	378.25 días	9/07/25	23/09/26
87	Movilización de maquinaria y equipos	6 días	31/08/26	5/09/26
88	Transporte de materiales provenientes de explanación, canales, prestamos, sobrecarreos y derrumbes	0 días	7/09/26	7/09/26
89	Socialización de PMT, actas de vecindad y actas de entorno	18 días	9/07/25	23/09/26
90	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	300.75 días	7/10/25	22/09/26
91	Afirmado	2 días	21/09/26	22/09/26
92	Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	0 días	7/10/25	7/10/25
93	Remocion de alcantarillas	7 días	28/10/25	4/11/25
94	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	0 días	4/11/25	4/11/25
95	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	17 días	2/12/25	20/12/25
96	MANTENIMIENTO RASANTE	106.25 días	16/06/26	17/10/26
97	Gestión y traslado de estabilizante	20 días	16/06/26	9/07/26
98	Capa estabilizada con productos químicos no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)	18 días	23/09/26	14/10/26
99	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2	15 días	30/09/26	17/10/26
100	ALCANTARILLAS	296.25 días	5/11/25	16/10/26
101	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (bases)	12 días	11/12/25	26/12/25
102	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (elevaciones)	29 días	12/12/25	16/01/26
103	Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques	16 días	13/03/26	2/04/26
104	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	38.5 días	17/11/25	2/01/26
105	Relleno para estructuras	12 días	12/11/25	27/11/25
106	Cuneta estabilizada con quimico y cemento	17 días	26/09/26	16/10/26
107	Rocería (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	27.63 días	13/01/26	14/02/26
108	Limpieza de alcantarillas con diámetro menor o igual a e= 36, incluye rectificación de descoles, y retiro de sobrantes a una	7 días	18/11/25	25/11/25
109	Limpieza a mano de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	18 días	12/05/26	1/06/26
110	Grava de 3/4 para cama de tubería y atraques	12 días	7/11/25	22/11/25
111	Suministro e instalación de tubería de PVC corrugada e=36	9 días	5/11/25	15/11/25
112	**10 - SIMIJACA**	**284 días**	**20/11/25**	**17/10/26**
113	PRELIMINARES	244 días	20/11/25	1/09/26
114	Movilización de maquinaria y equipos	6 días	3/08/26	13/08/26
115	Transporte de materiales provenientes de explanación, canales, prestamos, sobrecarreos y derrumbes	0 días	19/12/25	19/12/25
116	Socialización de PMT, actas de vecindad y actas de entorno	18 días	20/11/25	1/09/26
117	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	233 días	16/12/25	14/09/26
118	Afirmado	0 días	14/09/26	14/09/26
119	Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	0 días	16/12/25	16/12/25
120	Remocion de alcantarillas	0 días	16/12/25	16/12/25
121	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	0 días	17/12/25	17/12/25
122	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	0 días	16/12/25	16/12/25
123	MANTENIMIENTO RASANTE	118 días	2/06/26	17/10/26
124	Gestión y traslado de estabilizante	20 días	2/06/26	25/06/26
125	Capa estabilizada con productos químicos no tradicionales (incluye el suministro de producto estabilizador)	19 días	15/09/26	7/10/26
126	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2	16 días	29/09/26	17/10/26
127	ALCANTARILLAS	40.25 días	31/08/26	16/10/26
128	Cuneta estabilizada con quimico y cemento	25 días	17/09/26	16/10/26
129	Limpieza a mano de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	11 días	31/08/26	11/09/26
130	**11 - TAUSA**	**79 días**	**16/07/26**	**16/10/26**
131	PRELIMINARES	37 días	16/07/26	28/08/26
132	Movilización de maquinaria y equipos	6 días	16/07/26	23/07/26
133	Transporte de materiales provenientes de explanación, canales, prestamos, sobrecarreos y derrumbes	0 días	28/08/26	28/08/26
134	Socialización de PMT, actas de vecindad y actas de entorno	18 días	23/07/26	13/08/26
135	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	13 días	13/08/26	28/08/26
136	Afirmado	0 días	28/08/26	28/08/26
137	Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	0 días	13/08/26	13/08/26
138	Remocion de alcantarillas	0 días	13/08/26	13/08/26
139	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	0 días	13/08/26	13/08/26
140	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	0 días	13/08/26	13/08/26
141	MANTENIMIENTO RASANTE	70.5 días	27/07/26	16/10/26
142	Gestión y traslado de estabilizante	20 días	27/07/26	18/08/26
143	Capa estabilizada con productos químicos no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)	22 días	28/08/26	23/09/26
144	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2	19 días	24/09/26	16/10/26
145	ALCANTARILLAS	51 días	13/08/26	12/10/26
146	Cuneta estabilizada con quimico y cemento	31 días	5/09/26	12/10/26
147	Limpieza a mano de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	13 días	13/08/26	28/08/26
148	**7 - SESQUILÉ**	**289 días**	**17/10/25**	**19/09/26**
149	PRELIMINARES	233.25 días	17/10/25	16/07/26
150	Movilización de maquinaria y equipos	6 días	22/06/26	27/06/26
151	Transporte de materiales provenientes de explanación, canales, prestamos, sobrecarreos y derrumbes	0 días	22/06/26	22/06/26
152	Socialización de PMT, actas de vecindad y actas de entorno	18 días	17/10/25	16/07/26
153	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	190 días	12/11/25	22/06/26
154	Afirmado	0 días	22/06/26	22/06/26
155	Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	0 días	12/11/25	12/11/25
156	Remocion de alcantarillas	1 día	18/11/25	19/11/25
157	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	0 días	21/11/25	21/11/25

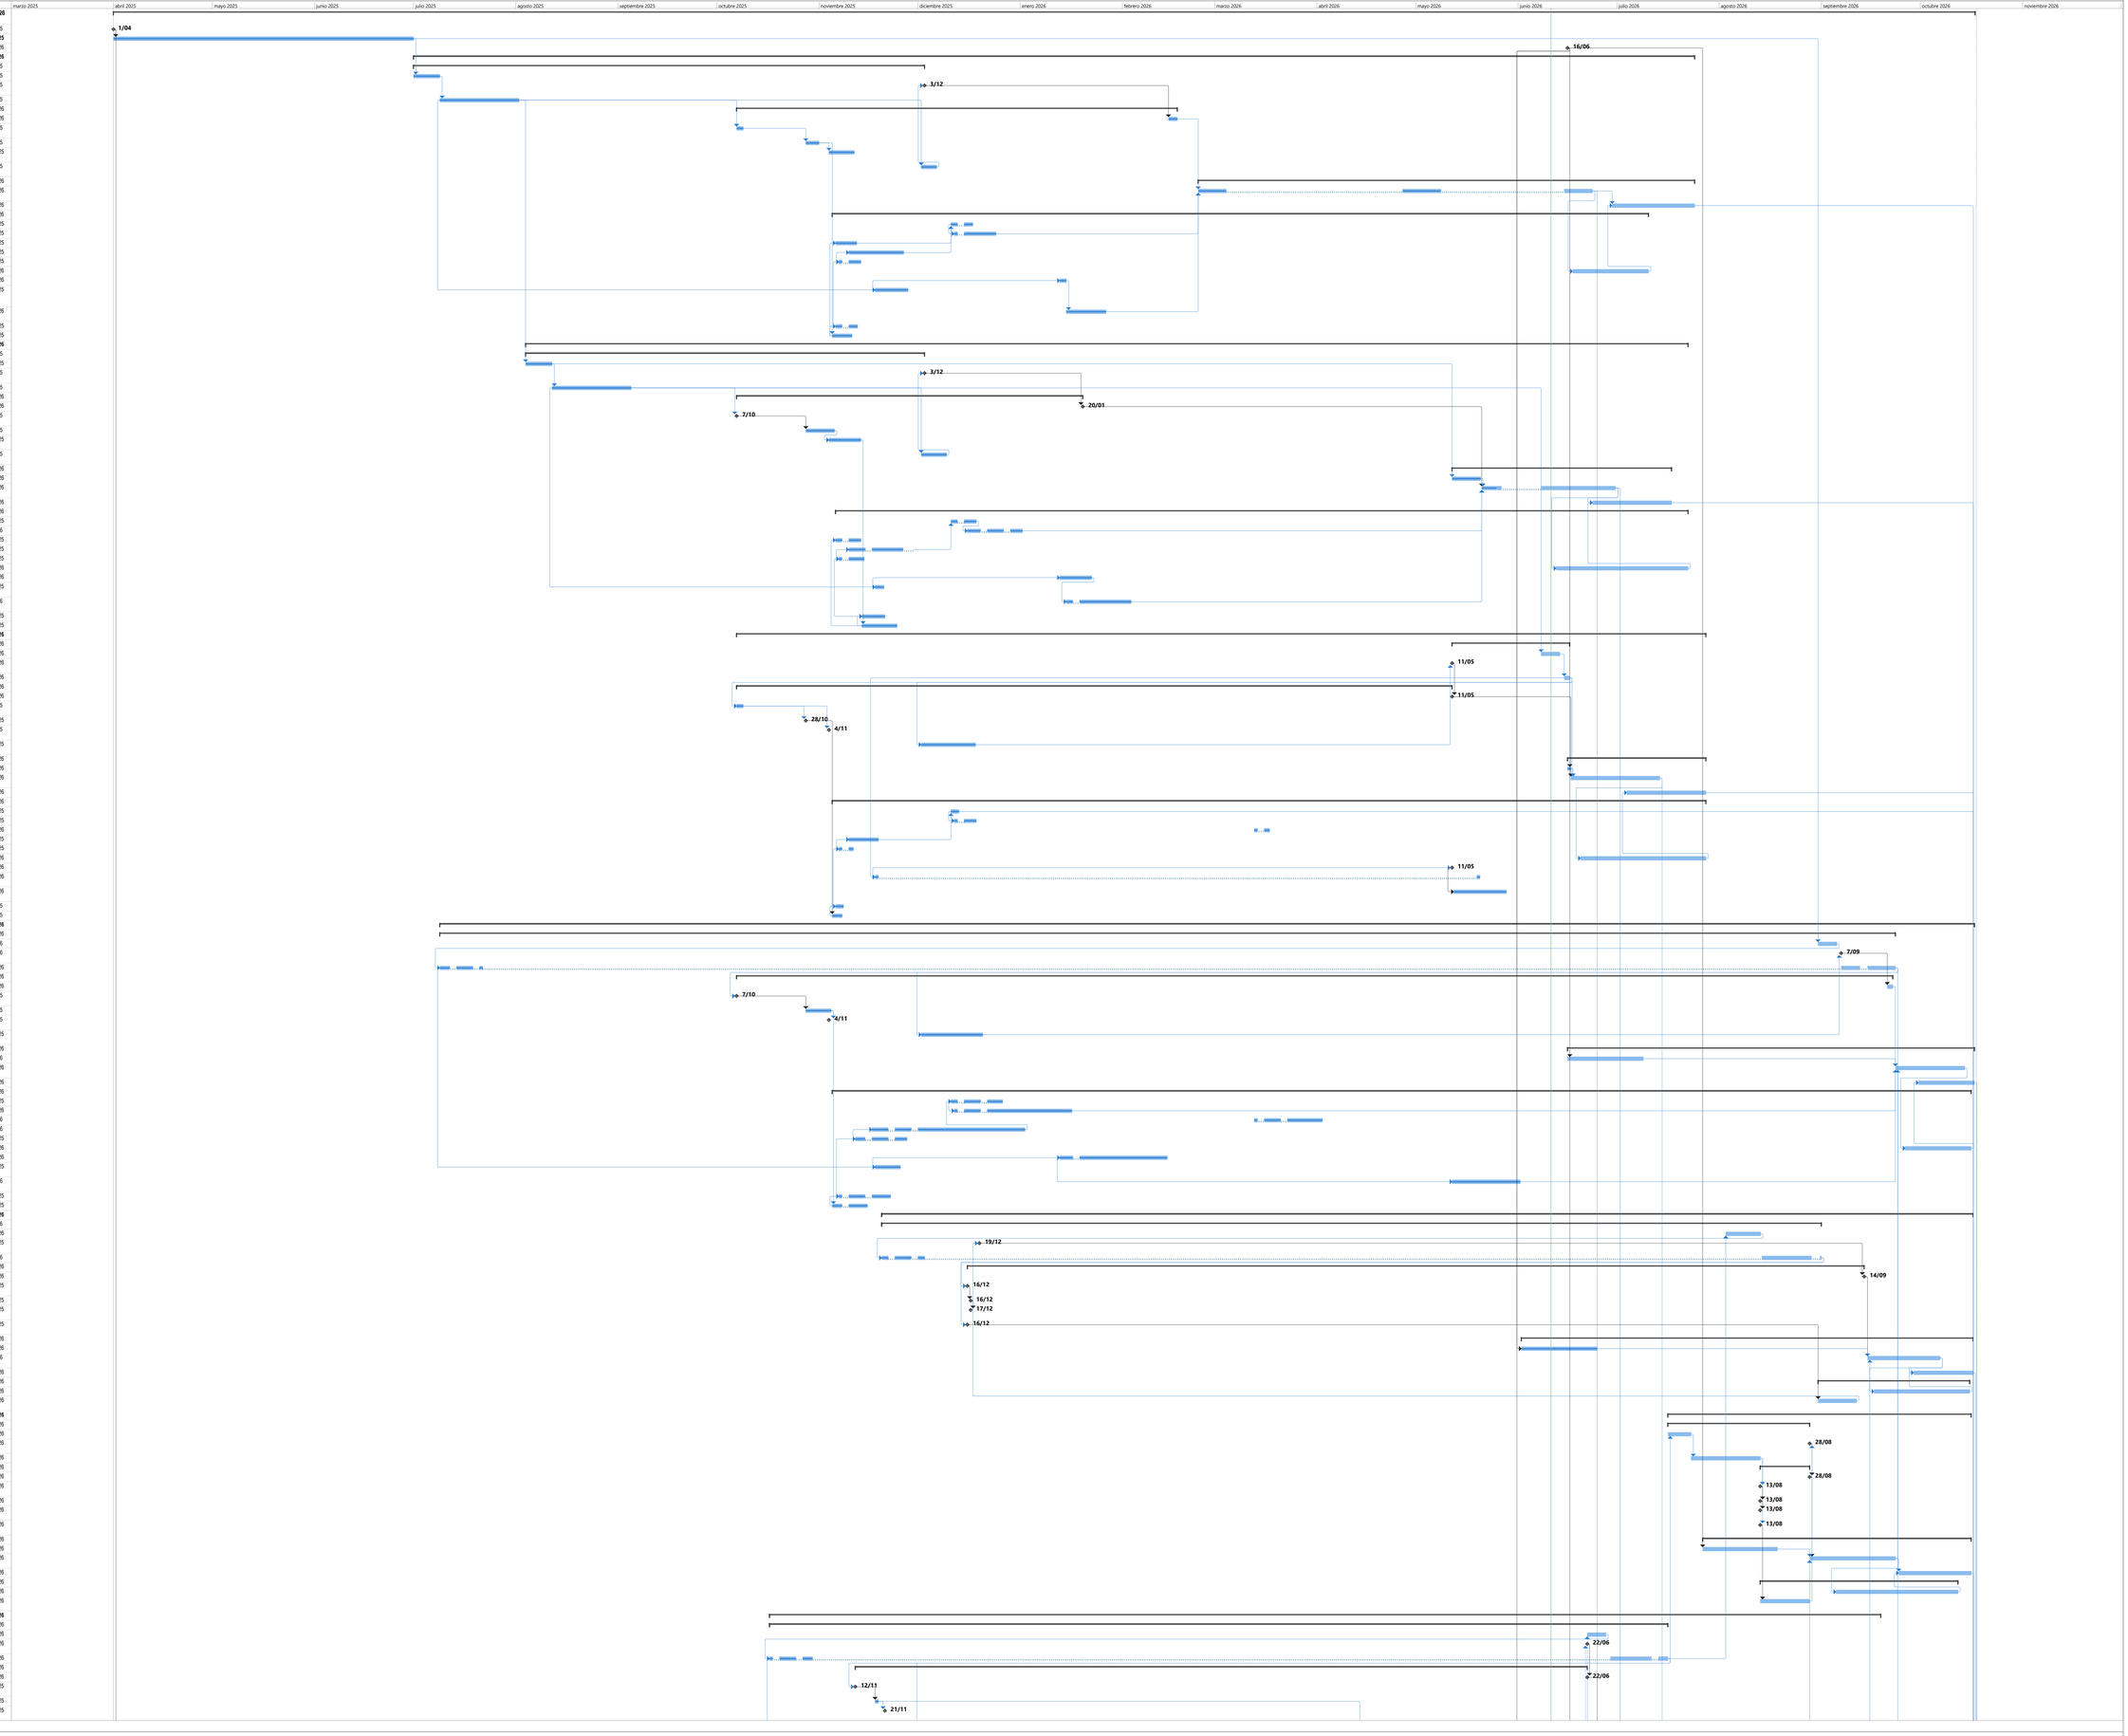


Proyecto: PROGRAMACIÓN VE
Fecha: 11/06/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

CRONOGRAMA CON PRORROGA No. 02 C.O. No. ICCU-139 DE 2025 "INTERVENCIÓN DE VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
158	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	12 días	2/12/25	15/12/25
159	MANTENIMIENTO RASANTE	94 días	2/06/26	19/09/26
160	Gestión y traslado de estabilizante	20 días	2/06/26	25/06/26
161	Capa estabilizada con productos químicos no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)	54 días	25/06/26	27/08/26
162	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2	46 días	28/07/26	19/09/26
163	ALCANTARILLAS	259 días	18/11/25	16/09/26
164	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (bases)	8 días	24/04/26	9/05/26
165	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (elevaciones)	18 días	24/04/26	25/05/26
166	Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques	9 días	14/04/26	18/05/26
167	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	27 días	14/04/26	8/06/26
168	Relleno para estructuras	9 días	14/04/26	16/05/26
169	Cuneta estabilizada con químico y cemento	70 días	26/06/26	16/09/26
170	Rocería (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	9 días	12/05/26	21/05/26
171	Limpieza de alcantarillas con diámetro menor o igual a e= 36, incluye rectificación de descoles, y retiro de sobrantes a una	9 días	18/11/25	29/11/25
172	Limpieza a mano de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	8 días	22/05/26	30/05/26
173	Grava de 3/4 para cama de tubería y atraques	8 días	14/04/26	27/04/26
174	Suministro e instalación de tubería de PVC corrugada e=36	9 días	14/04/26	28/04/26
175	**3 - LA PALMA**	**355.25 días**	**12/09/25**	**30/09/26**
176	PRELIMINARES	355.25 días	12/09/25	30/09/26
177	Movilización de maquinaria y equipos	6 días	23/09/26	30/09/26
178	Transporte de materiales provenientes de explanación, canales, prestamos, sobrecarreos y derrumbes	8 días	4/12/25	29/06/26
179	Socialización de PMT, actas de vecindad y actas de entorno	18 días	12/09/25	4/09/25
180	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	233.24 días	7/10/25	6/07/26
181	Afirmado	6 días	29/06/26	6/07/26
182	Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	0 días	7/10/25	7/10/25
183	Remocion de alcantarillas	5 días	28/10/25	3/11/25
184	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	0 días	4/11/25	4/11/25
185	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	23 días	12/05/26	18/06/26
186	MANTENIMIENTO RASANTE	89 días	16/06/26	28/09/26
187	Gestión y traslado de estabilizante	14 días	16/06/26	2/07/26
188	Capa estabilizada con productos químicos no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)	64 días	2/07/26	15/09/26
189	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2	56 días	24/07/26	28/09/26
190	ALCANTARILLAS	274 días	5/11/25	21/09/26
191	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (bases)	15 días	24/12/25	13/07/26
192	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (elevaciones)	33 días	24/12/25	24/06/26
193	Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques	16.99 días	13/03/26	17/07/26
194	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	50 días	18/11/25	14/07/26
195	Relleno para estructuras	16 días	13/11/25	3/12/25
196	Cuneta estabilizada con químico y cemento	60 días	13/07/26	21/09/26
197	Rocería (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	21 días	13/01/26	6/02/26
198	Limpieza de alcantarillas con diámetro menor o igual a e= 36, incluye rectificación de descoles, y retiro de sobrantes a una	23.99 días	18/11/25	23/06/26
199	Limpieza a mano de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	34 días	2/06/26	10/07/26
200	Grava de 3/4 para cama de tubería y atraques	16 días	10/11/25	12/06/26
201	Suministro e instalación de tubería de PVC corrugada e=36	16.99 días	5/11/25	13/06/26
202	MUROS	29 días	22/05/26	24/07/26
203	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (bases)	25 días	29/06/26	24/07/26
204	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (elevaciones)	15 días	1/07/26	17/07/26
205	Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques	19 días	22/06/26	13/07/26
206	Relleno para estructuras	7 días	8/07/26	15/07/26
207	Material granular filtrante	2 días	6/07/26	7/07/26
208	Suministro e instalación de geotextil nt 2500 (estabilización, filtro y separación)	4 días	3/07/26	7/07/26
209	Tubería drenaje PVC 110	5 días	29/06/26	3/07/26
210	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	13 días	24/06/26	8/07/26
211	**5 - VILLAGONZ**	**286 días**	**18/11/25**	**17/10/26**
212	PRELIMINARES	16 días	29/06/26	17/07/26
213	Movilización de maquinaria y equipos	6 días	29/06/26	6/07/26
214	Transporte de materiales provenientes de explanación, canales, prestamos, sobrecarreos y derrumbes	0 días	17/07/26	17/07/26
215	Socialización de PMT, actas de vecindad y actas de entorno	2 días	6/07/26	8/07/26
216	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	8 días	8/07/26	17/07/26
217	Afirmado	0 días	17/07/26	17/07/26
218	Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	0 días	8/07/26	8/07/26
219	Remocion de alcantarillas	0 días	8/07/26	8/07/26
220	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	0 días	8/07/26	8/07/26
221	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	8 días	8/07/26	17/07/26
222	MANTENIMIENTO RASANTE	106 días	16/06/26	17/10/26
223	Gestión y traslado de estabilizante	10 días	16/06/26	27/06/26
224	Capa estabilizada con productos químicos no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)	8 días	6/10/26	15/10/26
225	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2	7 días	9/10/26	17/10/26
226	ALCANTARILLAS	285 días	18/11/25	16/10/26
227	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (bases)	2 días	21/07/26	23/07/26
228	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (elevaciones)	5 días	21/07/26	27/07/26
229	Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques	3 días	17/07/26	21/07/26
230	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	8 días	9/07/26	18/07/26
231	Relleno para estructuras	4 días	9/07/26	14/07/26
232	Cuneta estabilizada con químico y cemento	8 días	7/10/26	16/10/26
233	Rocería (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	3.5 días	13/01/26	16/01/26
234	Limpieza de alcantarillas con diámetro menor o igual a e= 36, incluye rectificación de descoles, y retiro de sobrantes a una	2.5 días	18/11/25	8/07/26
235	Limpieza a mano de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	3 días	12/05/26	14/05/26
236	Grava de 3/4 para cama de tubería y atraques	4 días	8/07/26	13/07/26
237	Suministro e instalación de tubería de PVC corrugada e=36	4 días	8/07/26	13/07/26
238	**6 - TOPAIPI**	**158.25 días**	**13/04/26**	**15/10/26**
239	PRELIMINARES	59 días	13/04/26	20/06/26
240	Movilización de maquinaria y equipos	6 días	25/05/26	30/05/26
241	Transporte de materiales provenientes de explanación, canales, prestamos, sobrecarreos y derrumbes	0 días	13/04/26	13/04/26
242	Socialización de PMT, actas de vecindad y actas de entorno	18 días	1/06/26	20/06/26
243	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	97 días	13/04/26	4/08/26
244	Afirmado	0 días	13/04/26	13/04/26
245	Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	0 días	20/06/26	20/06/26
246	Remocion de alcantarillas	11 días	22/06/26	3/07/26
247	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	0 días	3/07/26	3/07/26
248	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	38 días	22/06/26	4/08/26
249	MANTENIMIENTO RASANTE	104 días	16/06/26	15/10/26
250	Gestión y traslado de estabilizante	10 días	16/06/26	27/06/26
251	Capa estabilizada con productos químicos no tradicionales (incluye el suministro de producto estabilizador)	72 días	14/07/26	6/10/26
252	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2	65 días	31/07/26	15/10/26
253	ALCANTARILLAS	105.25 días	15/06/26	15/10/26
254	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (bases)	13 días	18/08/26	1/09/26
255	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (elevaciones)	28 días	18/08/26	18/09/26
256	Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques	14 días	5/08/26	20/08/26
257	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	42 días	11/07/26	28/08/26
258	Relleno para estructuras	14 días	11/07/26	27/07/26
259	Cuneta estabilizada con químico y cemento	82 días	11/07/26	15/10/26
260	Rocería (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	21 días	18/06/26	11/07/26
261	Limpieza de alcantarillas con diámetro menor o igual a e= 36, incluye rectificación de descoles, y retiro de sobrantes a una distancia de 5 km	18 días	15/06/26	4/07/26
262	Limpieza a mano de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	40 días	22/06/26	6/08/26
263	Grava de 3/4 para cama de tubería y atraques	13 días	8/07/26	22/07/26
264	Suministro e instalación de tubería de PVC corrugada e=36	14 días	4/07/26	20/07/26
265	MUROS	24 días	7/07/26	3/08/26
266	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (bases)	8 días	11/07/26	20/07/26
267	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (elevaciones)	16 días	16/07/26	3/08/26
268	Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques	8 días	7/07/26	15/07/26
269	Relleno para estructuras	8 días	23/07/26	31/07/26
270	Material granular filtrante	6 días	21/07/26	27/07/26
271	Suministro e instalación de geotextil nt 2500 (estabilización, filtr	6 días	18/07/26	24/07/26
272	Tubería drenaje PVC 110	5 días	14/07/26	18/07/26
273	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	20 días	9/07/26	31/07/26
274	**8 - YACOPI**	**106 días**	**16/06/26**	**17/10/26**
275	PRELIMINARES	19 días	16/06/26	8/07/26
276	Movilización de maquinaria y equipos	6 días	16/06/26	23/06/26
277	Transporte de materiales provenientes de explanación, canales, prestamos, sobrecarreos y derrumbes	6 días	1/07/26	8/07/26
278	Socialización de PMT, actas de vecindad y actas de entorno	5 días	23/06/26	29/06/26
279	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	28 días	29/06/26	31/07/26
280	Afirmado	20 días	8/07/26	31/07/26
281	Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	4.5 días	29/06/26	3/07/26
282	Remocion de alcantarillas	8 días	29/06/26	8/07/26
283	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	4.5 días	8/07/26	13/07/26
284	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	2 días	29/06/26	1/07/26
285	MANTENIMIENTO RASANTE	77 días	20/07/26	17/10/26
286	Concreto clase D, fc =3000 PSI (Bases) Huellas y Vigas	45 días	25/07/26	16/09/26
287	Concreto ciclópeo clase G, 2000 PSI 40% rajón para bases	40 días	12/08/26	28/09/26
288	Cuneta de concreto clase E, 2500 PSI fundida en el lugar	40 días	1/09/26	17/10/26
289	Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	30 días	29/07/26	24/08/26
290	ALCANTARILLAS	61 días	26/06/26	5/09/26
291	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (bases)	19 días	14/08/26	5/09/26
292	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (elevaciones)	19 días	14/08/26	5/09/26
293	Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques	19 días	1/08/26	24/08/26
294	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	25 días	16/07/26	14/08/26
295	Relleno para estructuras	19 días	9/07/26	31/07/26
296	Cuneta en geomembrana de polietileno HDPE 0.75mm	0 días	24/08/26	24/08/26
297	Rocería (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	10.5 días	30/06/26	11/07/26
298	Limpieza de alcantarillas con diámetro menor o igual a e= 36, incluye rectificación de descoles, y retiro de sobrantes a una	10.5 días	26/06/26	8/07/26
299	Limpieza a mano de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	8.5 días	3/07/26	13/07/26
300	Grava de 3/4 para cama de tubería y atraques	19 días	6/07/26	28/07/26
301	Suministro e instalación de tubería de PVC corrugada e=36	27 días	29/06/26	30/07/26
302	MUROS	30 días	11/07/26	15/08/26
303	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (bases)	8 días	18/07/26	28/07/26
304	Concretos clase D, f´c =3000 PSI (elevaciones)	8 días	25/07/26	4/08/26
305	Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques	8 días	11/07/26	21/07/26
306	Relleno para estructuras	9 días	5/08/26	15/08/26
307	Material granular filtrante	8 días	1/08/26	11/08/26
308	Suministro e instalación de geotextil nt 2500 (estabilización, filtr	8 días	29/07/26	7/08/26
309	Tubería drenaje PVC 110	8 días	22/07/26	31/07/26
310	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	9 días	15/07/26	25/07/26
311	**PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)**	**410 días**	**1/04/25**	**17/10/26**
312	**GUIA DE MANEJO AMBIENTAL (PAGA)**	**410 días**	**1/04/25**	**17/10/26**
313	Final contractual	0 días	17/10/26	17/10/26

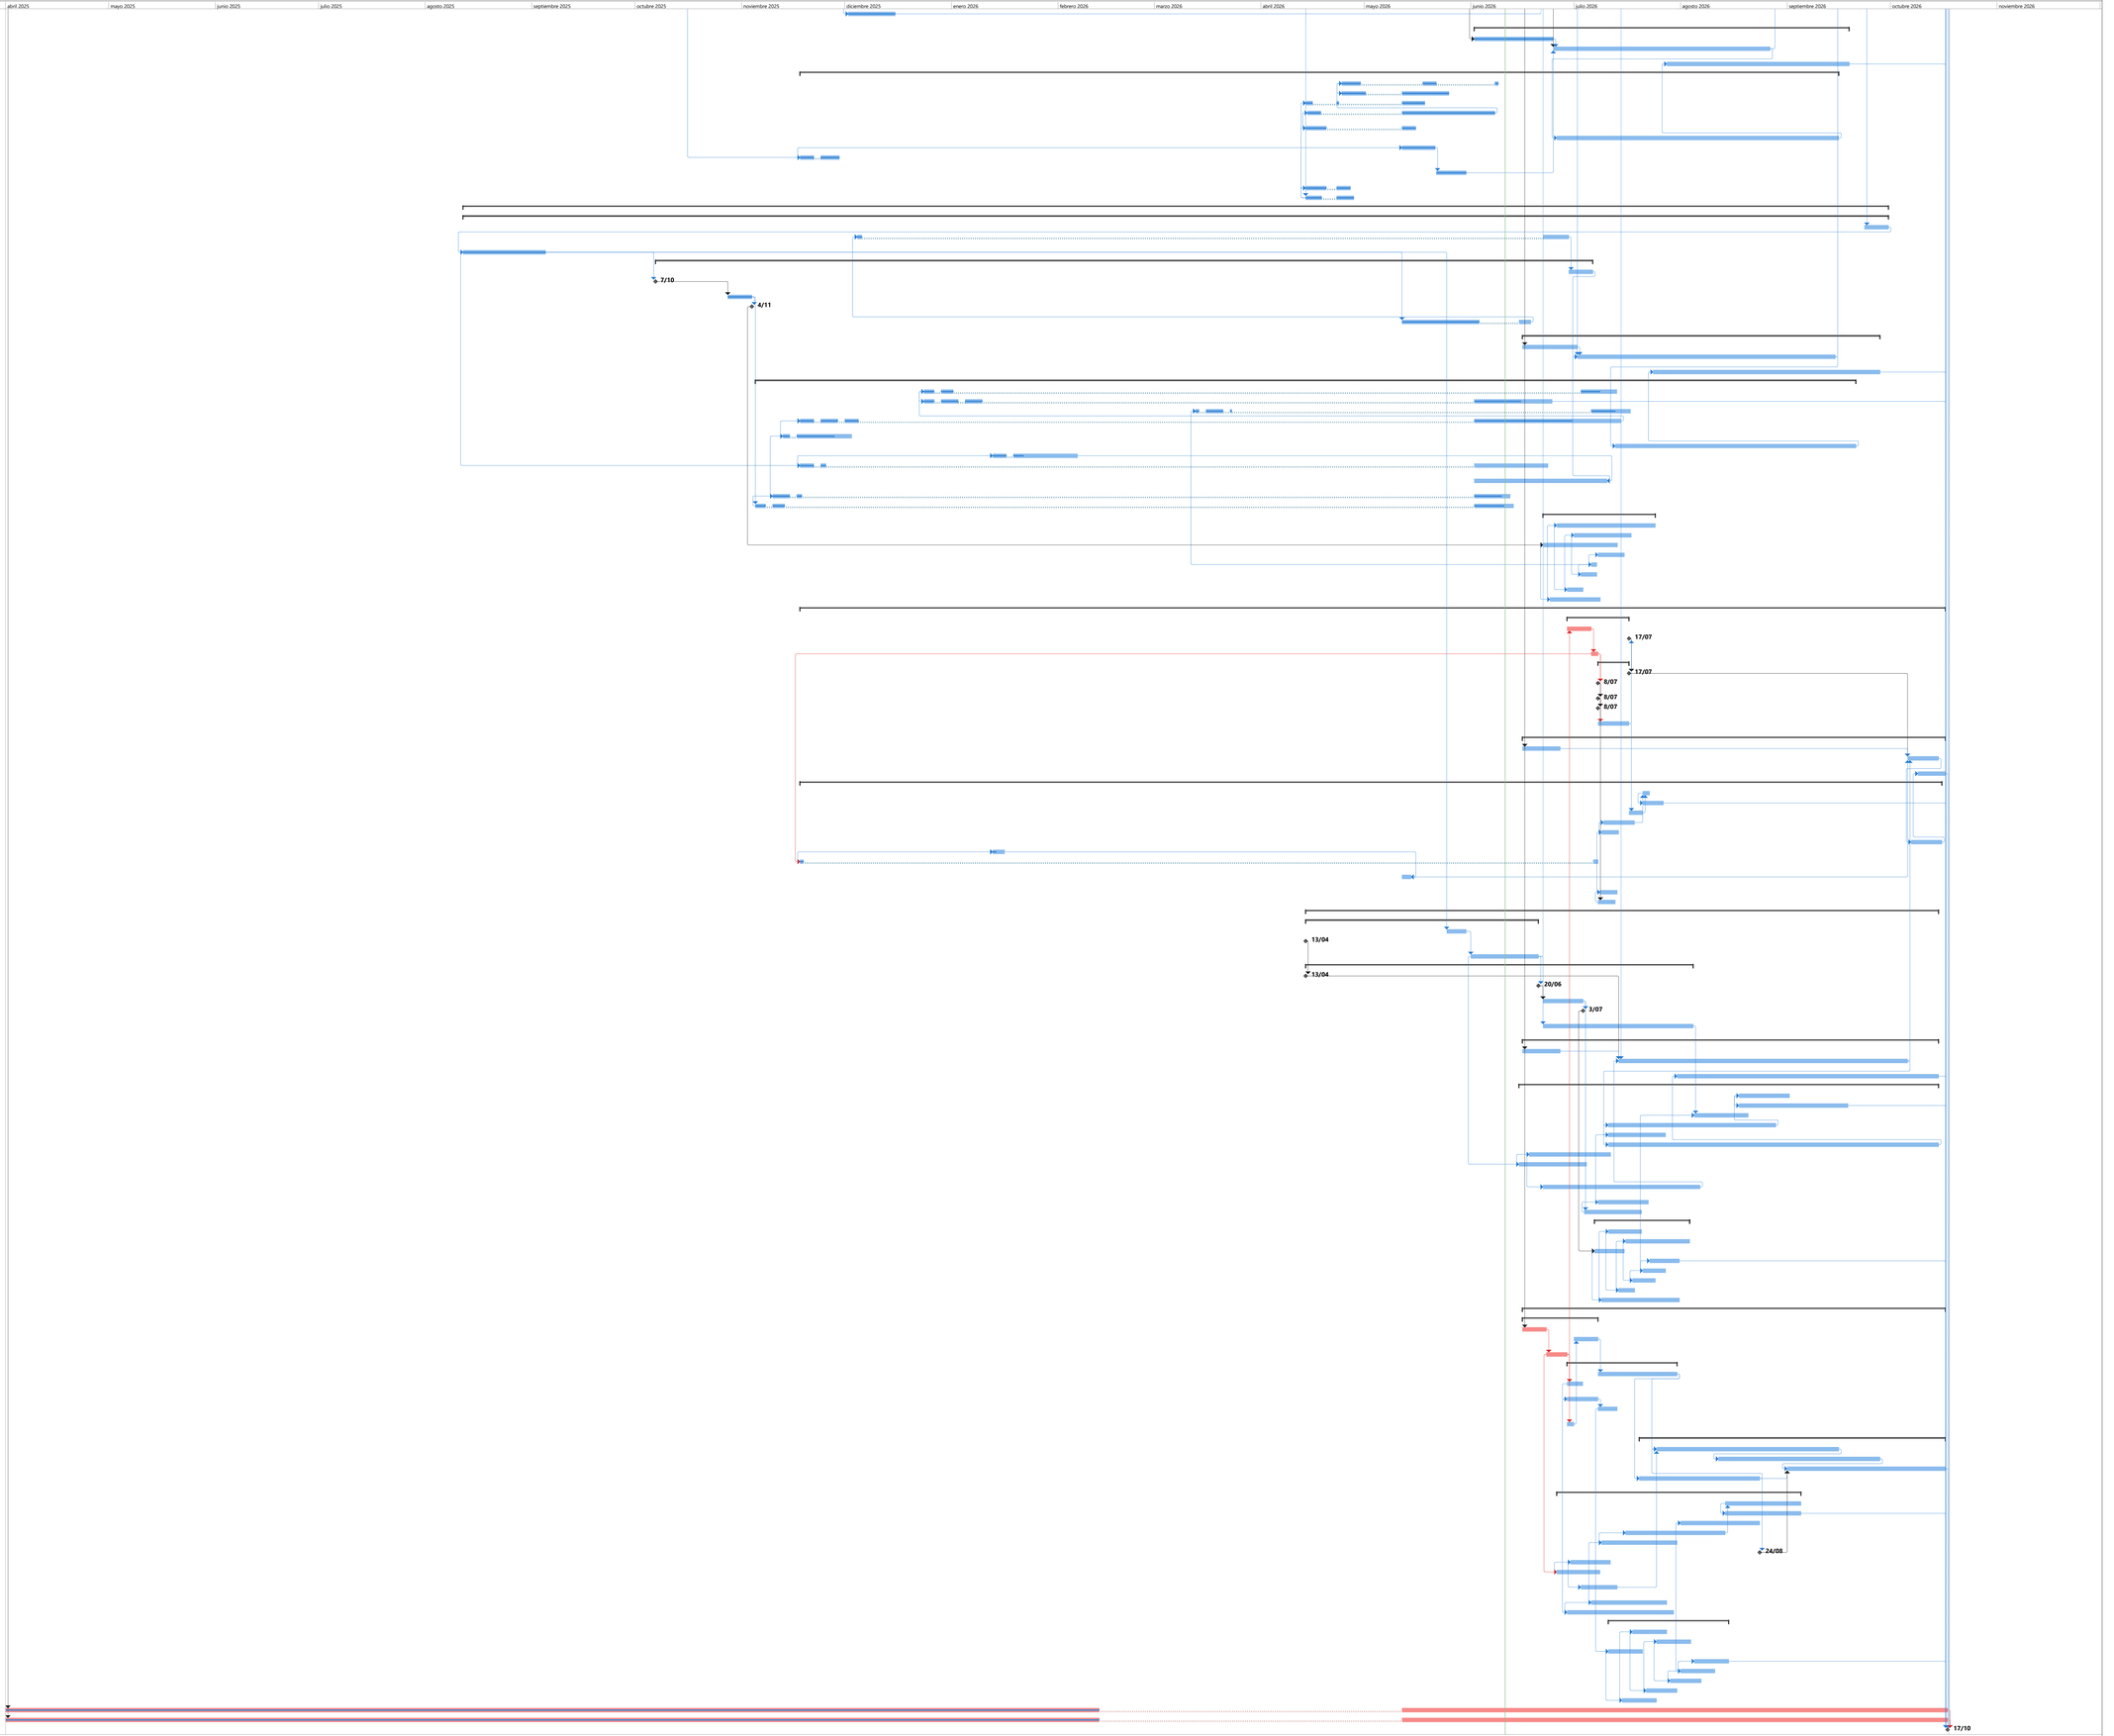

Proyecto: PROGRAMACIÓN VE
Fecha: 11/06/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual
