CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA
NIT. 901.944.326-5
Calle 9 No. 5-50 OF: 202 Neiva – Email: consorciointerventoresestadio@gmail.com

Contrato de Interventoria
No. 000300/2025

Of. CIEH-180

Garzón, 12 de junio de 2026.

Ingeniero
CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS
Secretario de infraestructura y obras públicas / Supervisor
Municipio De Garzón
infraestructura@garzon-huila.gov.co
Ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. 000300 DE 2025 con objeto "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: "ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE FÚTBOL ORLANDO LOSADA BUENDÍA ETAPA II DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA"".

Asunto: Cobro de "Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 4".

Cordial saludo,

Comedidamente me permito presentar mediante "Anexos" a la presente, los documentos para el trámite de cobro y desembolso, del Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 4, para su revisión y aprobación respectiva.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE
Rep. Legal CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA
Interventoría externa.

Anexos:

- INFORME DE INTERVENTORIA PARA COBRO DE ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA NO. 4.

- ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA NO. 4.
- CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE CUMPLIMIENTO PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – Contador público.
- DOCUMENTOS PERSONALES DEL CONTADOR PÚBLICO (CÉDULA. TARJETA PROFESIONAL, VIGENCIA DE LA METRÍCULA PROFESIONAL).
- CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE CUMPLIMIENTO PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – Representante legal.
- PLANILLAS DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (MARZO Y ABRIL DE 2026).
- FACTURA ELECTRÓNICA.
- CERTIFICACIÓN CUENTA BANCARIA.
- REGÍSTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT).

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA
NIT 901.944.326-5
CL 9 5 50
Tel: 3164679967
Neiva - Colombia
lizzyduartef@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 4

Señores	MUNICIPIO DE GARZON		
NIT	891.180.022-6	**Teléfono**	(608) 8332992 - Ext. 000
Dirección	CR 8 7 74	**Ciudad**	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/06/2026, 15:31
Expedición	19/06/2026, 15:31
Vencimiento	19/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Acta Parcial No. 04 Contrato de Interventoría No. 300 de 2025 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE FÚTBOL ORLANDO LOSADA BUENDÍA ETAPA II DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA	1.00	19 %	57,939,826.05	68,948,393.00

Total items: 1

Total Bruto	57,939,826.05
IVA 19%	11,008,566.95
Total a Pagar	68,948,393.00

Valor en Letras:
Sesenta y ocho millones novecientos cuarenta y ocho mil trescientos noventa y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-19 por $ 68,948,393.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101221465 aprobado en 20251105 prefijo FV desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 1c21b69aea73e2ac3bd2ba617cdc835da8f5629ff0d119844354a79747c4b4c2976e6813f98a876a39a2973ef204e91a

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siga SAS - Nit 830.048.145-4, Nombre Software: Siga Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Banco Caja Social
Su banco amigo.

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONSORCIO INTERVENTORES ESTADI Identificado con NI 9019443265

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina NEIVA, con las siguientes caracteristicas:

Cuenta de Ahorros

Número:	24147829632
Fecha de apertura:	24 de Julio de 2025
Condiciones de uso:	Individual, 2 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN IINTERESE**, realizada en la Oficina 0101 NEIVA de la ciudad de NEIVA, el día Jueves, 26 de marzo de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 2 5 Solicitud de Inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141177516655

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		16. Buzón electrónico
9 0 1 9 4 4 3 2 6	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica	1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Huila	4 1	Neiva	0 0 1

41. Dirección principal: CL 9 # 5 - 50 OF 202

42. Correo electrónico: juancamilopolania@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 4 6 7 9 9 8 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 5 0 4 1 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 1 4 4 9 5 5

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores				
54. Código	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
			57. Modo			
			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

964. Nombre: POLANIA ANDRADE JUAN CAMILO

965. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141177516655

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 4 4 3 2 6	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Régimen	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 4 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 1	
76. Fecha de registro	2 0 2 5 0 5 0 2	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	2 9 8	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 5 0 4 1 4	
81. Hasta	2 0 2 6 0 4 1 4	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141177516655

(415)7703212489984(8020) 000014117751665 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 4 4 3 2 6	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Representación

1

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN	1 8	2 0 2 5 0 4 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía	1 3 1 0 7 5 2 4 6 4 3 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
POLANIA	ANDRADE	JUAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL	1 9	2 0 2 5 0 4 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía	1 3 1 2 1 2 1 5 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ANDRADE	ZAMBRANO	JAMES	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141177516655

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Neiva	13	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 4 4 3 2 6	5			

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 2 1 2 1 5 4 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ANDRADE	ZAMBRANO	JAMES	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
684,242,709	5 0	2 0 2 5 0 4 1 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 7 5 2 4 6 4 3 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
POLANIA	ANDRADE	JUAN	CAMILO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
132,848,542	1 0	2 0 2 5 0 4 1 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 1 4 5 4 5 0	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INTERVENTORÍA Y GESTIÓN INTERGES S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
531,384,167	4 0	2 0 2 5 0 4 1 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: "ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE FÚTBOL ORLANDO LOSADA BUENDÍA ETAPA II DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA"

ACTA DE RECIBO PARCIAL NO.: 4

Alcaldía Municipal Garzón

MUNICIPIO DE GARZÓN

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA	CONTRATO NO.:	008 DE 2025
SUPERVISOR:	ING. CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS	VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 1.328.485.418,00
FECHA DE INICIO:	1/2/2025	VALOR ANTICIPO:	$ 0,00
ACTA SUSPENSION NO. 1:	N.A.	VALOR MODIFICACION:	$ 0,00
ACTA DE REINICIO NO. 1:	N.A.	VALOR VIGENTE:	$ 1.328.485.418,00
ACTA SUSPENSION NO. 2	N.A.	VALOR EJECUTADO:	$ 934.279.068,33
ACTA DE REINICIO NO. 2:	N.A.	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 68.048.393,28
ACTA DE TERMINACION:	1/1/2026		

FECHA ACTA: 31-05-26

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRATADAS CONDICIONES INICIALES							MODIFICACIONES			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACTAS ACUMULADAS	
NO.	CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	G	CONDICIONES MODIFICADAS			% EJECUCION	V/TOTAL	% EJECUCION	V/TOTAL	% EJECUCION	V/TOTAL
		SUELDO MES BÁSICO	CANT.	% DEDICACIÓN	F.M.	VALOR MES (A * B * C * D)	N° DE MESES	TOTAL PARCIAL (E * F)									
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
1	PERSONAL PROFESIONAL																
1.1	Ingeniero Director de Interventoria (Dedicacion 50%)	$ 12.500.000	1	50%	2,01	$ 12.562.500	12	$ 150.750.000	N.A.	N.A.	N.A.	44,00%	$ 66.420.450	5,10%	$ 7.692.930	49,25%	$ 74.244.375
1.2	Residente de Interventoria (Ingeniero Civil) (Dedicacion 100%)	$ 9.800.000	1	100%	2,01	$ 19.698.000	12	$ 236.376.000	N.A.	N.A.	N.A.	44,00%	$ 83.618.174	5,10%	$ 9.680.602	49,25%	$ 116.898.780
1.3	Ingeniero Eléctrico (Dedicación 50%)	$ 8.000.000	1	50%	2,01	$ 8.040.000	12	$ 96.480.000	N.A.	N.A.	N.A.	44,00%	$ 42.505.088	5,10%	$ 5.007.312	49,25%	$ 47.516.400
1.4	Ingeniero Hidrosanitario (Dedicación 50%)	$ 8.000.000	1	50%	2,01	$ 8.040.000	12	$ 96.480.000	N.A.	N.A.	N.A.	44,00%	$ 42.505.088	5,10%	$ 5.007.312	49,25%	$ 47.516.400
1.5	Especialista Estructural (Dedicación 30%)	$ 8.000.000	1	30%	2,01	$ 4.824.000	12	$ 57.888.000	N.A.	N.A.	N.A.	44,00%	$ 25.503.453	5,10%	$ 3.004.387	49,25%	$ 28.509.840
1.6	Especialista Sanitaria (Dedicación 10%)	$ 6.600.000	1	10%	2,01	$ 1.326.600	12	$ 15.919.200	N.A.	N.A.	N.A.	44,00%	$ 7.010.448	5,10%	$ 826.062	49,25%	$ 7.836.510
1.7	Ingeniero SISO (Dedicación 100%)	$ 9.800.000	1	100%	2,01	$ 19.698.000	12	$ 236.376.000	N.A.	N.A.	N.A.	44,00%	$ 83.618.174	5,10%	$ 9.850.602	49,25%	$ 93.468.780
1.8	Secretaria (Dedicación 100%)	$ 2.500.000	1	100%	2,01	$ 5.025.000	12	$ 60.300.000	N.A.	N.A.	N.A.	44,00%	$ 26.568.180	5,10%	$ 3.129.570	49,25%	$ 29.697.750
1.9	Comisión Topografica Topógrafo, 1 Cadenero con equipo topográfico	$ 6.000.000	1	60%	2,01	$ 7.236.000	12	$ 86.832.000	N.A.	N.A.	N.A.	44,00%	$ 38.258.179	5,10%	$ 4.508.581	49,25%	$ 42.766.760
							SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 874.832.400	N.A.	N.A.	N.A.	44,00%	$ 385.491.215	5,10%	$ 45.403.842	49,25%	$ 430.895.057
	OTROS COSTOS DIRECTOS																
2	OTROS COSTOS	UND		CANTIDAD	% DEDICACION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL										
2.1	Ensayos de Laboratorio (Incluye Equipos y Transporte)	MES		12	100%	$ 9.728.450	$ 116.741.400		N.A.	N.A.	N.A.	44,00%	$ 51.366.462	5,10%	$ 6.058.805	49,25%	$ 57.495.286
2.2	Alquiler de de vehículo con conductor y combustible	MES		12	100%	$ 5.000.000	$ 60.000.000		N.A.	N.A.	N.A.	44,00%	$ 26.406.000	5,10%	$ 3.114.000	49,25%	$ 29.550.000
2.3	Comprobaciones(Peluco, Seccorres, cocinita, cremas, cobres, etc.)	MES		12	100%	$ 1.500.000	$ 18.000.000		N.A.	N.A.	N.A.	44,00%	$ 7.920.000	5,10%	$ 934.200	49,25%	$ 8.865.000
2.4	Oficina	MES		12	100%	$ 2.300.000	$ 27.600.000		N.A.	N.A.	N.A.	44,00%	$ 12.144.000	5,10%	$ 1.432.440	49,25%	$ 13.591.000
2.5	Fotocopias(Fotocopias(Impresiones(Fotografias,papeleria,cds,fotocopias)	MES		12	100%	$ 1.000.000	$ 12.000.000		N.A.	N.A.	N.A.	44,00%	$ 5.280.000	5,10%	$ 622.800	49,25%	$ 5.910.000
							SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 241.541.400	N.A.	N.A.	N.A.	44,00%	$ 106.116.462	5,10%	$ 12.516.245	49,25%	$ 118.959.286
	RESUMEN GENERAL																
							COSTO TOTAL (1 + 2)	$ 1.116.373.800					$ 491.607.677		$ 57.920.086		$ 549.854.343
							I.VA (19%)	$ 212.111.022					$ 93.405.458		$ 11.008.567		$ 104.414.025
							VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	$ 1.328.485.418					$ 585.300.675		$ 68.928.653		$ 654.279.068

VALOR A COBRAR	5,10%	$	68.048.393

VALOR A COBRAR: SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS.

CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
SUPERVISOR

JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE
REP. LEGAL CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA
INTERVENTORÍA

INFORME DE INTERVENTORÍA

PARA COBRO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA NO. 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.

000300 DE 2025

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: "ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE FÚTBOL ORLANDO LOSADA BUENDÍA ETAPA II DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA".

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA.

NIT. 901.944.326-5.

SUPERVISOR:

ING. CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS

PERIODO:

DEL 20 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2026.

1. INTRODUCCIÓN

El presente es el informe de interventoría para el cobro del Acta De Recibo Parcial De Interventoría No. 4, del periodo comprendido del 20 de marzo al 31 de mayo de 2026, de la gestión realizada por el contratista y el desarrollo de la obra en el periodo informado.

En este informe se comunica los acontecimientos más importantes que ha tenido el proyecto durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, en el cual se ha realizado un seguimiento y control de las actividades de obra realizadas por el contratista, además de la socialización de dificultades técnicas, financieras y jurídicas acerca del cumplimiento del objeto contractual, que permiten la adecuación y remodelación del estadio de fútbol Orlando Losada Buendía, en su etapa II del Municipio de Garzón, Huila".

El Contratista de obra cuenta con la totalidad de insumos suficientes que le permiten adelantar la construcción del proyecto, en cumplimiento de los planos y diseños suministrados por la entidad Contratante, en cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y de actividades del presupuesto de obra, además de las normas técnicas colombianas.

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO NO.:	000300 DE 2025.
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA.
NIT. NO.:	901.944.326-5.
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE.
C.C. NO.:	1.075.246.439 DE NEIVA.
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: "ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE FÚTBOL ORLANDO LOSADA BUENDÍA ETAPA II DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA".
VALOR INICIAL:	$1.328.485.418.
ANTICIPO (%):	0%.
ANTICIPO ($):	$0.
VALOR ADICIONAL:	N/A.
VALOR TOTAL:	$1.328.485.418.
PLAZO INICIAL:	12 MESES.
PLAZO ADICIONAL:	N/A.
PLAZO TOTAL:	12 MESES.
FECHA DE INICIO:	2 DE JULIO DE 2025.
SUSPENSIÓN NO. 1:	N/A.
REINICIO NO. 1:	N/A.
SUSPENSIÓN NO. 2:	N/A.
REINICIO NO. 2:	N/A.
FINALIZACIÓN INICIAL:	01 DE JULIO DE 2026.
FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	01 DE JULIO DE 2026.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en el departamento del Huila, Municipio de Garzón, dentro de la villa deportiva localizada en el sur del municipio.



Localización de la obra.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la adecuación y remodelación de la etapa II del estadio de fútbol Orlando Losada Buendía del Municipio de Garzón, Huila; mediante la construcción de la tribuna oriental y la construcción de obras de urbanismo y paisajismo del estadio, además de la construcción de cerramientos internos y perimetrales.

La obra estaré compuesta por tres (3) módulos estructurales, los cuales se incorporan entre sí alzándose del suelo en 4 niveles o pisos, con capacidad para el accedo de personas con movilidad reducida, espectadores de todas las edades, además contará con la instalación de baterías sanitarias para hombres y mujeres, como también zonas de camerinos en su primer piso, oficinas administrativas y zonas de entrenamiento para diferentes disciplinas deportivas.

El proyecto representa un gran desarrollo para el municipio, partiendo desde la generación de empleo con la vinculación de mano de obra no calificada de la región, para finalmente ofrecer espacios modernos y de alta competencia para la comunidad del municipio de Garzón y sus alrededores.

5. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MENSUAL DE LA OBRA

Durante el periodo del 20 de marzo al 31 de mayo de 2026, la obra presenta un avance físico del CINCO COMA DIECINUEVE POR CIENTO (5,19%), mediante el cual se han realizado distintas actividades de obra de la estructura en concreto, partiendo desde localización y replanteo;

Excavación manual sin clasificar – Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada; Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente; Solado en concreto de limpieza (e= 10 cm) de 1.700 P.S.I.; Concreto para Columnas de 280 KG/CM2; concreto para Placa aligerada de 280 KG/CM2 - Incluye: Vigas - viguetas - riostras y placa; Concreto de viga de cimentación de 210 Kg/cm2; Placa de piso en concreto de 3000 psi e=0,10m con acabado superficial liso para aplicación de resina y/o enchape; Concreto para Tribuna con acabado a la vista en concreto de 280 KG/CM2 - Incluye formaleta, vaciado de concreto, materiales, equipos y todo lo necesario para su correcta ejecución; Pozo altura entre 1.5 - 2m, en concreto reforzado, incluye concreto, formaleta, tapa con su aro, escalones; Pozo altura entre 2-2.5m, en concreto reforzado, incluye concreto, formaleta, tapa con su aro, escalones; Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I.; Suministro e instalación de malla electrosoldada 5 mm y 6 mm de 15x15.

Paralelamente el contratista adelantó actividades de tipo administrativo relacionadas con la consecución de su equipo de trabajo de la mano de obra no calificada, además de organizar su logística como trasporte de materiales, disponibilidad de equipos y herramientas ya sean comprados o alquilados, como también en lo que corresponde a la compra de materiales para la construcción de la obra y el transporte de equipos, herramientas y materiales en especial del concreto premezclado.

6. CONTROL Y SEGUIMIENTO ACTIVIDADES OPERATIVAS

El contratista realiza actividades de localización y replanteo para la realización de actividades de excavaciones, rellenos, solados de limpieza,

suministro e instalación de aceros de refuerzo, fundición de columnas en concretos, fundición de placa aligerada, fundición de graderías, construcción de pozos de inspección sanitarios, instalación de malla electrosoldada, entre otras.

CONTROL Y SEGUIMIENTO A ENSAYO DE LABORATORIOS

En este periodo se realizan actividades de control y seguimiento de las especificaciones técnicas, cumplimiento de planos y diseños, y de normas técnicas colombianas, verificando la calidad de los materiales, de las actividades y de los procesos constructivos de la obra.

Las actividades de obra realizadas hasta el momento corresponden la construcción de la tribuna oriental mediante la realización de actividades de aceros de refuerzo, fundición de concretos en columnas, de placas de contrapiso, de placas aligeradas, de pozos de inspección entre otros. Paralelamente se realizan actividades de suministro e instalación de aceros de refuerzo y mallas electrosoldadas.

Mediante este tipo de actividades se llevaron a cabo inspecciones técnicas de campo para la verificación de especificaciones técnicas tanto de los materiales como de las actividades.

Para las actividades de fundición de concretos la interventoría realiza la toma de muestras de concretos para realizar ensayo de asentamiento (slung) en sitio, y la fundición de cilindros de concreto para el ensayo de resistencia a la compresión del material, ensayo que se realiza en laboratorio una vez adquieren las edades de rotura.

Las actividades de fundición se realiza el control mediante la inspección de especificaciones técnicas del material, considerando que el concreto es premezclado, se inspecciona la resistencia indicada en el concreto suministrado allegado en los camiones mixer, igualmente se inspecciona en la fundición de los elementos de concreto, el control de procesos constructivos adecuados para las prácticas de ingeniería.

Los ensayos de asentamiento realizados para los concretos de 4.000 psi arrojan resultados favorables acordes a los indicados en los diseños de mezclas de los concretos suministrados por el contratista, con asentamientos de 6" + - 1".

Los ensayos de resistencia a la compresión de los concretos igualmente arrojan buenos resultados superando la resistencia mínima solicitada de 4.000 psi de acuerdo a los diseños estructurales del proyecto.

Para la actividad de suministro e instalación de aceros de refuerzo se verifican especificaciones técnicas, diámetros, dimensiones y espaciamientos, además de los adecuados procesos constructivos para este tipo de materiales y actividades:

Para la realización de las actividades de solados de limpieza, se verifican los espesores del solado y las ubicaciones de los mismos, además de la consistencia del material motero en cumplimiento de especificaciones técnicas indicadas para el proyecto, dándose cabal cumplimiento a los mismos adecuadamente.

Contrato de Interventoria
No. 000300/2025

CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

NO	FECHA DE TOMA	ELEMENTO	LOCALIZACIÓN / UBICACIÓN	ENSAYO	RESISTENCIA REQUERIDA (PSI)	ROTURA									CUMPLE	
						7 DÍAS			14 DÍAS			28 DÍAS				
						FECHA	RESISTENCIA OBTENIDA	%	FECHA	RESISTENCIA OBTENIDA	%	FECHA	RESISTENCIA OBTENIDA	%	SI	NO
8	25/11/25	COLUMNAS	BLOQUE CENTRAL - 1ER PISO	1	4000	2/12/25	3104,46	77,61%				23/12/25	4043,61	101,09%	X	
				2	4000	2/12/25	3081,18	77,03%				23/12/25	4311,70	107,79%	X	
9	27/11/25	COLUMNAS	BLOQUE NORTE - 1ER PISO	1	4000				11/12/25	3721,08	93,03 %	25/12/25	4811,72	120,29%	X	
				2	4000				11/12/25	3889,23	97,23 %	25/12/25	4738,37	118,46%	X	
10	4/12/25	MURO DE CONTENCION	BLOQUE CENTRAL - MURO POSTERIOR	1	4000	11/12/25	3224,41	80,61%				1/01/26	4699,61	117,49%	X	
				2	4000	11/12/25	3144,41	78,61%				1/01/26	4678,36	116,96%	X	
12	23/12/25	PLACA ALIGERADA		1	4000	1/01/26						22/01/26				
				2	4000	1/01/26						22/01/26				
13	27/01/26	PLACA ALIGERADA	BLOQUE CENTRAL	1	4000	3/02/26	4114,20	102,86%				24/02/26	4286,24	107,16%	X	
				2	4000	3/02/26	4214,63	105,37%				24/02/26	4483,20	112,08%	X	
14	4/02/26	COLUMNAS	BLOQUE SUR - 2DO PISO	1	4000	11/02/26	2551,82	63,80%				4/03/26	4079,72	101,99%	X	
				2	4000	11/02/26	2446,13	61,15%				4/03/26	4108,22	102,71%	X	
15	11/02/26	COLUMNAS	BLOQUE CENTRAL - 2DO PISO	1	4000	18/02/26	3094,87	77,37%				11/03/26	4257,28	106,43%	X	
16	16/02/26	PLACA ALIGERADA	BLOQUE NORTE - 2DO PISO	1	4000	23/02/26	4161,06	104,03%				16/03/26	4117,87	102,95%	X	
				2	4000	23/02/26	4174,14	104,35%				16/03/26	4305,39	107,63%	X	
19	6/03/26	VIGAS AEREAS	BLOQUE SUR - 3ER NIVEL	1	4000	13/03/26	3658,62	91,47%				3/04/26	4103,30	102,58%	X	
20	16/04/26	PLACA DE CONTRAPISO	BLOQUE SUR	1	3000	23/04/26	3771,62	125,72%				14/05/26			X	
				2	3000	23/04/26	3694,89	123,16%		14/05/26		14/05/26			X	

Nota: Se adjunta mediante Anexos, los resultados de los ensayos de laboratorio. Actualmente nos encontramos a la espera de la entrega de algunos resultados de ensayos del laboratorio de la Interventoria.

7. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPO

En el presente periodo el Contratista no realiza cobro de anticipo del contrato de obra, toda vez que este ya fue consumido en su totalidad en el periodo del Acta de recibo Parcial De Obra No. 1.

En el Acta De Recibo Parcial De Obra No. 1, se realiza una amortización del anticipo del contrato, proporcional a su porcentaje de anticipo, es decir del 30%; el valor a amortizar en la presente acta de recibo parcial de obra es equivalente a $804.254.523,516.

El contrato de interventoría no tuvo anticipo.

8. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL

La Interventoría verifica la vinculación a la obra de todo el equipo de trabajo profesional presentado por el Contratista para desempeñar los cargos de director de obra, Residente de obra, ingeniero eléctrico, ingeniero hidrosanitario, especialista estructural, especialista en geotecnia, profesional HSEQ, topógrafo, inspector de obra y cadenero, dando cumplimiento a ese componente de manera adecuada.

Adicional a lo anterior, el contratista a vinculado personal obrero que desempeña los cargos de Maestro de obra, Oficiales y ayudantes de construcción.

9. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS

Durante este periodo se vinculan equipos de obra y maquinaria, dado que las actividades de obra desarrolladas de construcción de la obra requieren la utilización de herramienta menor, equipos y maquinaria de construcción. Se espera que para el próximo periodo el Contratista realice más actividades de obra para que el avance sea mucho mayor y representativo que permitan considerar un avance favorable para la obra, diferentes a las ejecutadas en el presente periodo.

10. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES

Durante este periodo se realizan las siguientes actividades de obra del presupuesto:

a) Localización y replanteo.
b) Excavación manual sin clasificar – Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada;
c) Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente;
d) Solado en concreto de limpieza (e= 10 cm) de 1.700 P.S.I.;
e) Concreto para Columnas de 280 KG/CM2;
f) Concreto para Placa aligerada de 280 KG/CM2 - Incluye: Vigas - viguetas - riostras y placa;
g) Concreto de viga de cimentación de 210 Kg/cm2;
h) Placa de piso en concreto de 3000 psi e=0.10m con acabado superficial liso para aplicación de resina y/o enchape;

i) Concreto para Tribuna con acabado a la vista en concreto de 280 KG/CM2 - Incluye formaleta, vaciado de concreto, materiales, equipos y todo lo necesario para su correcta ejecución;
j) Pozo altura entre 1.5 - 2m, en concreto reforzado, incluye concreto, formaleta, tapa con su aro, escalones;
k) Pozo altura entre 2-2.5m, en concreto reforzado, incluye concreto, formaleta, tapa con su aro, escalones;
l) Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I.;
m) Suministro e instalación de malla electrosoldada 5 mm y 6 mm de 15x15.

Los materiales suministrados han sido básicamente recebo, mortero, concretos de 4.000 psi., acero de refuerzo de 60.000 psi., y malla electrosoldada.

11. CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Durante este periodo se verificaron las afiliaciones al sistema de seguridad social integral del personal profesional propuesto para desempeñar los cargos solicitados en el pliego de condiciones que antecedió el contrato de obra, así como también del personal obrero con mano de obra no calificada.

12. RELACION DE ACTAS REALIZADAS

ORDEN	FECHA	ACTO	DESCRIPCIÓN
1	17/04/2026	Acta de comité técnico de obra No. 18	Acta de comité técnico de obra No. 18
2	24/04/2026	Acta de comité de veeduría No. 4	Acta de comité de veeduría No. 4
3	14/05/2026	Acta de comité técnico de obra No. 19	Acta de comité técnico de obra No. 19
4	28/05/2026	Acta de comité técnico de obra No. 20	Acta de comité técnico de obra No. 20
5	31/05/2026	Acta de recibo parcial de obra No. 4	Acta de recibo parcial de obra No. 4
6	31/05/2026	Acta de recibo parcial de interventoría No. 4	Acta de recibo parcial de interventoría No. 4

13. ESTADO DEL TIEMPO

El estado del tiempo para este periodo ha sido mayormente soleado, sin embargo, ha habido lluvias moderadas y fuertes que han causado afectaciones en el rendimiento de la obra de algunas actividades.

14. AVANCE DE INTERVENTORÍA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 000300 DE 2025 CON OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: "ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE FÚTBOL ORLANDO LOSADA BUENDÍA ETAPA II DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA".	UND.	1,00	1.328.485.418	1.328.485.418	0,0519	$68.948.393	0,4925	$654.279.068
					TOTAL:	5,19%	$68.948.393	49,25%	$654.279.068

Contrato de Interventoria
No. 000300/2025

15. CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRATADAS							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACTAS ACUMULADAS	
		CONDICIONES INICIALES												
NO.	CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	G	% EJECUCION	V/TOTAL	% EJECUCION	V/TOTAL	% EJECUCION	V/TOTAL
		SUELDO MES BÁSICO	CANT	% DEDICACIÓN	F.M.	VALOR MES (A * B * C * D)	N° DE MESES	TOTAL PARCIAL (E * F)						
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
1	PERSONAL PROFESIONAL													
1.1	Ingeniero Director de Interventoria (Dedicacion 50%)	$ 12.500.000	1	50%	2,01	$ 12.562.500	12	$ 150.750.000	44,06%	$ 66.420.450	5,19%	$ 7.823.925	49,25%	$ 74.244.375
1.2	Residente de Interventoria (Ingeniero Civil) (Dedicacion 100%)	$ 5.800.000	1	100%	2,01	$ 11.658.000	12	$ 139.896.000	44,06%	$ 61.638.178	5,19%	$ 7.260.602	49,25%	$ 68.898.780
1.3	Ingeniero Eléctrico (Dedicacion 50%)	$ 8.000.000	1	50%	2,01	$ 8.040.000	12	$ 96.480.000	44,06%	$ 42.509.088	5,19%	$ 5.007.312	49,25%	$ 47.516.400
1.4	Ingeniero Hidrosanitario (Dedicación 50%)	$ 8.000.000	1	50%	2,01	$ 8.040.000	12	$ 96.480.000	44,06%	$ 42.509.088	5,19%	$ 5.007.312	49,25%	$ 47.516.400
1.5	Especialista Estructural (Dedicacion 30%)	$ 8.000.000	1	30%	2,01	$ 4.824.000	12	$ 57.888.000	44,06%	$ 25.505.453	5,19%	$ 3.004.387	49,25%	$ 28.509.840
1.6	Especialista Geotecnia (Dedicacion 30%)	$ 6.400.000	1	30%	2,01	$ 3.859.200	12	$ 46.310.400	44,06%	$ 20.404.362	5,19%	$ 2.403.510	49,25%	$ 22.807.872
1.7	Ingeniero SISO (Dedicación 100%)	$ 5.800.000	1	100%	2,01	$ 11.658.000	12	$ 139.896.000	44,06%	$ 61.638.178	5,19%	$ 7.260.602	49,25%	$ 68.898.780
1.8	Secretaria (Dedicación 100%)	$ 2.500.000	1	100%	2,01	$ 5.025.000	12	$ 60.300.000	44,06%	$ 26.568.180	5,19%	$ 3.129.570	49,25%	$ 29.697.750
1.9	Comisión Topográfica Topógrafo, 1 Cadenero con equipo topográfico	$ 6.000.000	1	60%	2,01	$ 7.236.000	12	$ 86.832.000	44,06%	$ 38.258.179	5,19%	$ 4.506.581	49,25%	$ 42.764.760
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL:							$ 874.832.400	44,06%	$ 385.451.155	5,19%	$ 45.403.802	49,25%	$ 430.854.957

Contrato de Interventoría
No. 000300/2025

OTROS COSTOS DIRECTOS													
2	OTROS COSTOS	UND		CANTIDAD	% DEDICACION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
2.1	Ensayos de Laboratorio (incluye Equipos y Transporte)	MES		12	100%	$ 9.728.492	$ 116.741.901	44,06%	$ 51.436.482	5,19%	$ 6.058.905	49,25%	$ 57.495.386
2.2	Alquiler de de vehiculo con conductor y combustible	MES		12	100%	$ 5.000.000	$ 60.000.000	44,06%	$ 26.436.000	5,19%	$ 3.114.000	49,25%	$ 29.550.000
2.3	Comunicacionestelefono,lascorreo,socializaciones,videos,etc.)	MES		12	100%	$ 1.500.000	$ 18.000.000	44,06%	$ 7.930.800	5,19%	$ 934.200	49,25%	$ 8.865.000
2.4	Oficina	MES		12	100%	$ 2.300.000	$ 27.600.000	44,06%	$ 12.160.560	5,19%	$ 1.432.440	49,25%	$ 13.593.000
2.5	Edicióndeinformes(incluyefotografias,papeleria,cds,fotocopias)	MES		12	100%	$ 1.600.000	$ 19.200.000	44,06%	$ 8.459.520	5,19%	$ 996.480	49,25%	$ 9.456.000
						SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 241.541.901	44,06%	$ 106.423.362	5,19%	$ 12.536.025	49,25%	$ 118.959.386
RESUMEN GENERAL													
						COSTO TOTAL (1 + 2):	$ 1.116.374.301		$ 491.874.517		$ 57.939.826		$ 549.814.343
						IVA (19%):	$ 212.111.117		$ 93.456.158		$ 11.008.567		$ 104.464.725
						VALOR TOTAL INTERVENTORÍA:	$ 1.328.485.418		$ 585.330.675		$ 68.948.393		$ 654.279.068

16. RESUMEN FINANCIERO

	OBRA			INTERVENTORÍA		
VALOR DEL CONTRATO:	$19.185.725.514		100,00%	$ 1.328.485.418		100,00%
VALOR ACUMULADO ANTERIOR:		$8.453.262.656,66	44,06%		$ 585.330.676	44,06%
VALOR ACTA NO. 4		$995.902.188,51	5,19%		$ 68.948.393	5,19%
SALDO POR EJECUTAR:		$9.736.560.668,83	50,75%		$ 674.206.349	50,75%
SUMAS IGUALES:	**$ 19.185.725.514**	**$ 19.185.725.514**	**100,00%**	**$ 1.328.485.418**	**$ 1.328.485.418**	**100,00%**

17. RELACION DE PERSONAL DE LA INTERVENTORIA

ORDEN	CARGO	NOMBRE
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LUIS CARLOS FONSECA SANABRIA
2	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	WILLIAM PARRA OLAYA
4	INGENIERO ELÉCTRICO	OSCAR EDUARDO ANDRADE CACHAYA
5	INGENIERO HIDROSANITARIO	FRANKLIN ORLANDO VERGARA MONTES
6	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	EDGAR MAURICIO PERDOMO VARGAS
7	INGENIERO SISO	JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS
8	SECRETARIO	CARLOS EDUARDO JAVELA RAMIREZ
9	TOPÓGRAFO	FRANCISCO JAVIER ARIAS SOLÓRZANO
10	CADENERA	IVONNE JULIETH MEDINA CAMPOS

18. CRONOLOGÍA DEL PROYECTO

ORDEN	FECHA	ACTO	DESCRIPCIÓN
236	1/04/2026	Oficio No. CIEH-145 de la Interventoría al Contratista	Comunicado del "procedimiento a seguir", para el inicio de próximas actividades de obra.
237	9/04/2026	Oficio de la supervisión a la interventoría	Requerimiento de entrega documental en medio físico de informes y soportes contractuales.
238	13/04/2026	Oficio No. CIEH-146 de la Interventoría a la Supervisión	Respuesta a oficio No. SIOP-0159-2026 con asunto "Requerimiento de entrega documental en medio físico de informes y soportes contractuales", de fecha 09/04/26.
239	16/04/2026	Oficio No. CIEH-147 de la Interventoría a la Supervisión y	Invitación a comité técnico de obra No. 18.

		Contratista	
240	16/04/2026	Oficio No. CIEH-148 de la Interventoría a la Supervisión, Contratista y Comité de veeduría	Invitación a comité de veeduría No. 4.
241	16/04/2026	Oficio No. CIEH-149 de la Interventoría a la Supervisión	Entrega de informes semanales de interventoría Nos. 38, 39, 40 y 41.
242	17/04/2026	Acta de comité técnico de obra No. 18	Acta de comité técnico de obra No. 18
243	22/04/2026	Oficio No. CIEH-152 de la Interventoría a la Supervisión	Entrega de informe semanal de interventoría No. 42.
244	22/04/2026	Oficio No. CIEH-153 de la Interventoría a la Supervisión	Concepto de viabilidad de modificación del contrato de obra.
245	24/04/2026	Acta de comité de veeduría No. 4	Acta de comité de veeduría No. 4
246	29/04/2026	Oficio No. CIEH-154 de la Interventoría a la Supervisión	Entrega de informe semanal de interventoría No. 43.
247	29/04/2026	Oficio No. CIEH-155 de la Interventoría a la Supervisión	Entrega de informes mensuales de interventoría No. 7 (Alcaldía) – enero 2026.
248	30/04/2026	Oficio No. CIEH-155 de la Interventoría a la Supervisión	Nueva solicitud de documentos del contrato.
249	5/05/2026	Oficio de la supervisión a la interventoría	Entrega inmediata de informes mensuales con soportes
250	6/05/2026	Oficio del Contratista a la Interventoría	Informe SST – Abril
251	6/05/2026	Oficio No. CIEH-157 de la Interventoría a la Supervisión	Entrega de informes mensuales de interventoría No. 8 (Alcaldía) – Febrero 2026.
252	7/05/2026	Oficio No. CIEH-158 de la Interventoría a la Supervisión	Entrega de informes mensuales de interventoría No. 9 (Alcaldía) – Marzo 2026.
253	7/05/2026	Oficio de la supervisión a la interventoría	Solicitud de aclaración técnica y documental frente a observaciones formuladas por la CGR
254	9/05/2026	Oficio No. CIEH-159 de la Interventoría a la Supervisión	Entrega de informe semanal de interventoría No. 44.

255	9/05/2026	Oficio No. CIEH-160 de la Interventoría a la Supervisión y Contratista	Invitación a comité técnico de obra No. 19.
256	10/05/2026	Oficio del Copntratista a la Inmterventoría	Solicitud de suspensión temporal del Contrato de Obra No. 000295 de 2025.
257	11/05/2026	Oficio No. CIEH-161 de la Interventoría a la Supervisión	Respuesta a oficio No. SIOP-0214-2026 con asunto "Solicitud de aclaración técnica y documental frente a observaciones formuladas por la Contraloría General de la República – Contrato de obra No. 295 de 2025", de fecha 07/05/26.
258	11/05/2026	Oficio No. CIEH-162 de la Interventoría a la Supervisión y Contratista	Reprogramación de comité técnico de obra No. 19 y proyecto de actas de comité técnico Nos. 14, 15, 16 y 17.
259	13/05/2026	Oficio No. CIEH-163 de la Interventoría a la Supervisión	Entrega de informe semanal de interventoría No. 45.
260	14/05/2026	Acta de comité técnico de obra No. 19	Acta de comité técnico de obra No. 19
261	15/05/2026	Oficio No. CIEH-163 de la Interventoría a la Supervisión	Subsanación de observación realizadas por la CGR sobre las cantidades pagadas del ítem No. 14,6.
262	16/05/2026	Oficio No. CIEH-165 de la Interventoría a la Supervisión	Incumplimiento en compromiso de entrega de APU balance No. 2.
263	19/05/2026	Oficio No. CIEH-166 de la Interventoría a la Supervisión	Entrega de documentos para modificación No. 1 de los contratos de obra e interventoría.
264	19/05/2026	Oficio del Contratista a la Interventoría	Respuesta a Oficio CIEH-156 - E...sanación de Documentación Contractual
265	20/05/2026	Oficio No. CIEH-167 de la Interventoría a la Supervisión	Entrega de informe semanal de interventoría No. 46.
266	25/05/2026	Oficio No. CIEH-168 de la Interventoría al Contratista	Observaciones frente al nuevo balance económico del contrato presentado.
267	26/05/2026	Oficio No. CIEH-169 de la Interventoría al Contratista	Observaciones frente al nuevo balance económico del contrato presentado – componente eléctrico NP
268	27/05/2026	Oficio No. CIEH-170 de la Interventoría al Contratista	Nuevas observaciones frente al nuevo balance económico del contrato presentado.

269	27/05/2026	Oficio No. CIEH-171 de la Interventoría al Contratista	Recordatorio del canal institucional oficial de la Interventoría.
270	27/05/2026	Oficio No. CIEH-172 de la Interventoría a la Supervisión y Contratista	Invitación a comité técnico de obra No. 20.
271	20/05/2026	Oficio No. CIEH-173 de la Interventoría al Contratista	Entrega de PLAN DE CONTINGENCIA DE OBRA para mitigar atrasos en avance de obra.
272	28/05/2026	Acta de comité técnico de obra No. 20	Acta de comité técnico de obra No. 20
273	29/05/2026	Oficio No. CIEH-174 de la Interventoría al Contratista	Entrega de informe semanal de interventoría No. 47.
274	29/05/2026	Oficio No. CIEH-175 de la Interventoría al Contratista	Respuesta a su correo electrónico de fecha 19/05/26 con asunto "Respuesta a oficio CIEH-156 – Entregas y subsanación de documentos contractuales".
275		Correo del Contratista a la Interventoría	ENVIO NUEVAMENTE DE INFORMES
276	29/05/2026	Correo del Contratista a la Interventoría	Presentación No previstos componente electrico – Contrato de Obra No. 000295 de 2025.
277	30/05/2026	Correo del Contratista a la Interventoría	Presentación No previstos componente Tanque de almacenamiento – Contrato de Obra No. 000295 de 2025.
278	30/05/2026	Correo del Contratista a la Interventoría	Presentación no previstos componente pintura puntos fijos tribuna occidental – Contrato de Obra No. 000295 de 2025.
279	30/05/2026	Correo del Contratista a la Interventoría	Presentación no previstos componente vía – circulación posterior tribuna occidental – Contrato de Obra No. 000295 de 2025.
280	30/05/2026	Correo del Contratista a la Interventoría	Presentación no previstos componente silletería tribuna occidental – Contrato de Obra No. 000295 de 2025.
281	30/05/2026	Correo del Contratista a la Interventoría	Presentación Componente alternativas bancos de suplentes y banco para árbitros – Contrato de Obra No. 000295 de 2025.
282	30/05/2026	Correo del Contratista a la Interventoría	Entrega formal componente pisos de tribuna occidental – Contrato de Obra No. 000295 de 2025.

283	30/05/2026	Correo del Contratista a la Interventoría	Entrega formal No previstos Componente Hidosdanitario. Contrato de Obra No. 000295 de 2025.
284	31/05/2026	Acta de recibo parcial de obra No. 4	Acta de recibo parcial de obra No. 4
285	31/05/2026	Acta de recibo parcial de interventoria No. 4	Acta de recibo parcial de interventoría No. 4

19. REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalación y amarre de aceros de refuerzo para vigas aéreas del 3er nivel



Instalación de formaleta metálica para fundición de vigas aéreas del 3er nivel.



Fundición de vigas aéreas del 3er nivel.



Fundición de vigas aéreas del 3er nivel.



Fundición de columnas del 3er nivel



Fundición de columnas del 3er nivel



Fundición de columnas del 3er nivel



Fundición de columnas del 3er nivel



Fundición de columnas en concreto de 4.000 psi.



Fundición de columnas en concreto de 4.000 psi.



Fundición de columnas.



Fundición de columnas.



Fundición de columnas en concreto de 4.000 psi.



Fundición de columnas en concreto de 4.000 psi.



Instalación y amarre de aceros de refuerzo en vigas inclinadas de la gradería.



Instalación y amarre de aceros de refuerzo en vigas inclinadas de la gradería.



Instalación de aceros en vigas inclinadas



Instalación de aceros en vigas inclinadas



Instalación y amarre de acero de refuerzo.



Instalación y amarre de acero de refuerzo.



Instalación de estructura provisional



Instalación de estructura provisional



Instalación de estructura provisional para fundición de vigas del 4to nivel y vigas inclinadas.



Instalación de estructura provisional para fundición de vigas del 4to nivel y vigas inclinadas.



Instalación de estructura provisional para fundición de vigas del 4to nivel y vigas inclinadas.



Instalación y amarre de aceros de refuerzo en vigas del 4to nivel y vigas aéreas.



Instalación de formaleta para vigas inclinadas de las graderías.



Instalación de formaleta para vigas inclinadas de las graderías



Instalación y amarre de aceros de refuerzo en vigas del 4to nivel.



Instalación y amarre de aceros de refuerzo en vigas del 4to nivel.



Instalación de aceros de refuerzo en vigas, viguetas y riostras en placa de 4to nivel.



Instalación de aceros de refuerzo en vigas, viguetas y riostras en placa de 4to nivel.



Instalación de aceros de refuerzo en vigas, viguetas y riostras en placa de 4to nivel.



Instalación de aceros de refuerzo en vigas, viguetas y riostras en placa de 4to nivel.



Instalación de malla electrosoldada en placa aligerada del 4to nivel.



Instalación de malla electrosoldada en placa aligerada del 4to nivel.



Instalación de malla electrosoldada en placa aligerada del 4to nivel.



Instalación de malla electrosoldada en placa aligerada del 4to nivel.



Instalación de formaleta para vigas aéreas y placa aligerada del 4to nivel.



Instalación de formaleta para vigas aéreas y placa aligerada del 4to nivel.



Fundición de placa aligerada del 4to piso.



Fundición de placa aligerada del 4to piso.



Fundición de placa aligerada del 4to piso.



Fundición de placa aligerada del 4to piso.



Fundición de placa aligerada del 4to piso.



Fundición de placa aligerada del 4to piso.



Placa aligerada del 4to piso.



Placa aligerada del 4to piso.



Vigas aéreas del 4to piso.



Instalación y amarre de aceros de refuerzo en placa aligerada del 4to piso.



Instalación y amarre de aceros de refuerzo en placa aligerada del 4to piso.



Instalación y amarre de aceros de refuerzo en placa aligerada del 4to piso.



Instalación y amarre de aceros de refuerzo en placa aligerada del 4to piso.



Fundición de vigas inclinadas de las graderías.



Fundición de vigas inclinadas de las graderías.



Fundición de vigas inclinadas de las graderías.



Fundición de vigas inclinadas de las graderías.



Fundición de vigas inclinadas de las graderías.



Fundición de vigas aéreas inclinadas de las graderías.



Fundición de vigas aéreas inclinadas de las graderías.



Fundición de vigas aéreas inclinadas de las graderías.



Fundición de vigas aéreas inclinadas de las graderías.



Fundición de vigas inclinadas de las graderías.



Instalación y amarre de aceros de refuerzo en tanque de almacenamiento de agua potable.



Instalación y amarre de aceros de refuerzo en tanque de almacenamiento de agua potable.



Instalación y amarre de aceros de refuerzo en el tanque de almacenamiento de agua potable.



Instalación y amarre de aceros de refuerzo en el tanque de almacenamiento de agua potable.



Instalación y amarre de aceros de refuerzo en el tanque de almacenamiento de agua potable.



Instalación de aceros de refuerzo en el tanque de almacenamiento de agua potable.



Instalación de aceros de refuerzo en el tanque de almacenamiento de agua potable.



Instalación y amarre de acero de refuerzo en tanque de almacenamiento de agua potable.



Instalación y amarre de acero de refuerzo en tanque de almacenamiento de agua potable.



Instalación y amarre de acero de refuerzo en tanque de almacenamiento de agua potable.



Instalación y amarre de acero de refuerzo en tanque de almacenamiento de agua potable.



Instalaciones hidrosanitarias - Desagües.



Instalaciones hidrosanitarias - Desagües.



Instalaciones hidrosanitarias - Desagües.



Instalaciones hidrosanitarias - Desagües.



Instalaciones hidrosanitarias - puntos de desagüe sanitarios.



Instalaciones hidrosanitarias - puntos de desagüe sanitarios.



Instalaciones hidrosanitarias - aguas servidas



Instalaciones hidrosanitarias - aguas servidas



Instalaciones hidrosanitarias - aguas servidas.



Instalaciones hidrosanitarias - aguas servidas.



Instalaciones hidrosanitarias - aguas servidas.



Instalaciones hidrosanitarias



Instalaciones hidrosanitarias



Instalación de tuberías de las redes hidrosanitarias.



Instalación de tuberías de las redes sanitarias.



Instalación de tuberías sanitarias.



Instalación de tuberías sanitarias.



Instalaciones eléctricas.



Instalaciones eléctricas - Excavaciones y canalizaciones



Instalaciones eléctricas



Instalaciones eléctricas



Excavaciones manuales para instalaciones eléctricas.



Excavaciones manuales para instalaciones eléctricas



Instalaciones eléctricas.



Instalaciones eléctricas.



Instalaciones eléctricas.



Instalaciones eléctricas.



Instalaciones eléctricas.



Instalaciones eléctricas.



Rellenos en recebo compactado mecánicamente



Rellenos en recebo compactado mecánicamente.



Rellenos en recebo compactado mecánicamente.



Relleno en recebo compactado.



Relleno en recebo compactado.



Ensayo de densidades en rellenos.



Ensayo de densidades de los rellenos.



Ensayo de densidades de los rellenos.



Instalaciones hidráulicas.



Instalaciones hidráulicas.



Instalaciones hidrosanitarias



Instalaciones hidrosanitarias



Instalación de tuberías hidráulicas.



Instalación de tuberías hidráulicas.



Instalación de tuberías hidráulicas.



Instalación de tuberías hidráulicas.




Instalación de tuberías hidráulicas.



Instalación de tuberías hidráulicas.



Instalación de tuberías hidráulicas.

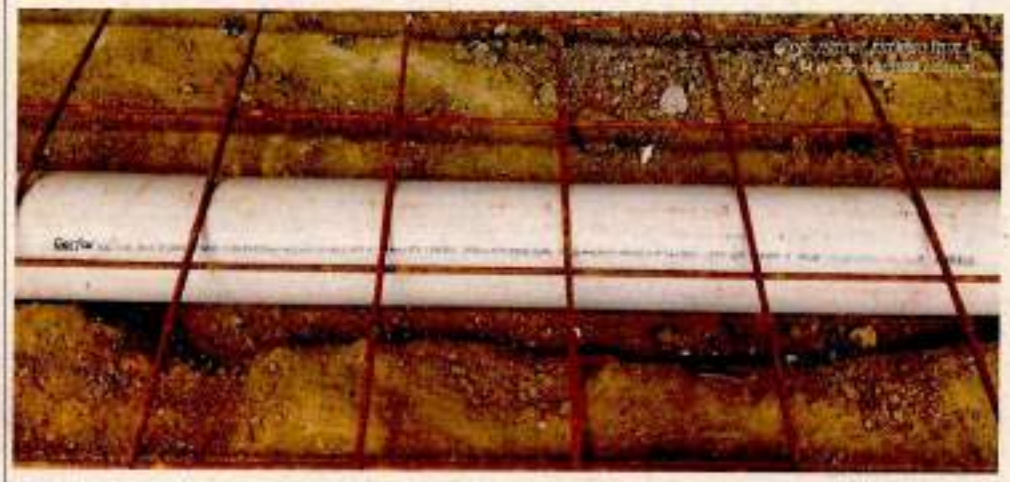


Instalación de tuberías hidráulicas.



Instalación de tuberías hidráulicas.



Instalación de malla electrosoldada en placa de contrapiso.

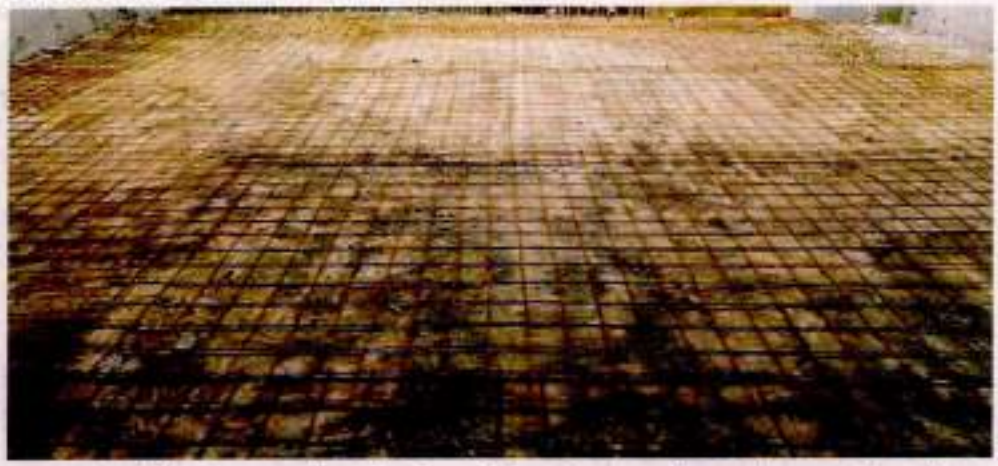

Instalación de malla electrosoldada en placa de contrapiso.



Instalación de malla electrosoldada en placa de contrapiso.



Instalación de malla electrosoldada.



Instalación de malla electrosoldada.



Fundición de placa de contrapiso



Fundición de placa de contrapiso



Fundición de placa de contrapiso



Fundición de placa de contrapiso



Fundición de placa de contrapiso



Fundición de placa de contrapiso.



Fundición de placa de contrapiso.



Fundición de placa de contrapiso.



Fundición de placa de contrapiso.



Fundición de placa de contrapiso.



Fundición de placa de contrapiso.



Fundición de placa de contrapiso.



Fundición de placa de contrapiso.



Fundición de placa de contrapiso.



Placa de contrapiso



Aplicación de antisol para el control de curado en placa de contrapiso.



Aplicación de antisol para el control de curado en placa de contrapiso.



Fundición de placa de contrapiso.



Fundición de placa de contrapiso.



Fundición de placa de contrapiso.



Fundición de placa de contrapiso.



Fundición de placa de contrapiso.



Placa de contrapiso.



Placa de contrapiso.



Placa de contrapiso.



Placa de contrapiso.



Placa de contrapiso.




Placa de contrapiso.



Placa de contrapiso.



Instalación de reflectores para la iluminación del estadio.

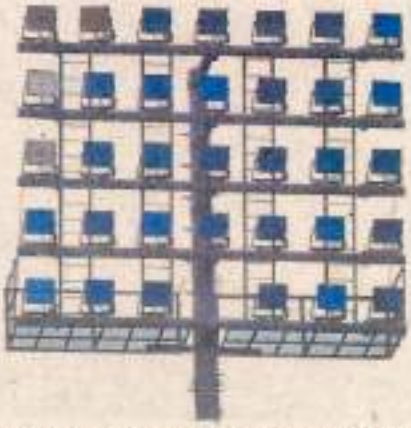

Instalación de reflectores para la iluminación del estadio.



Instalación de reflectores para la iluminación del estadio.



Toma de muestras del concreto premezclado utilizado



Construcción de muro del cerramiento tipo 1.



Construcción de muro del cerramiento tipo 1.



Construcción de muro del cerramiento tipo 1.



Construcción de muro del cerramiento tipo 1.



Construcción de muro del cerramiento tipo 1.



Construcción de muro del cerramiento tipo 1.



Tala de árboles para urbanismo posterior de la tribuna occidental.



Tala de árboles para urbanismo posterior de la tribuna occidental.



Tala de árboles para urbanismo posterior de la tribuna occidental.



Tala de árboles para urbanismo posterior de la tribuna occidental.



Toma de muestras del concreto premezclado utilizado



Control de calidad mediante la verificación de planos, diseños y especificaciones técnicas.



Control de calidad mediante la verificación de planos, diseños y especificaciones técnicas.



Control de calidad mediante la verificación de planos, diseños y especificaciones técnicas.



Control de calidad mediante la verificación de planos, diseños y especificaciones técnicas.



Control de calidad mediante la verificación de planos, diseños y especificaciones técnicas.




Control de calidad mediante la verificación de planos, diseños y especificaciones técnicas.




Control de calidad mediante la verificación de planos, diseños y especificaciones técnicas.



Control de calidad mediante la verificación de planos, diseños y especificaciones técnicas.

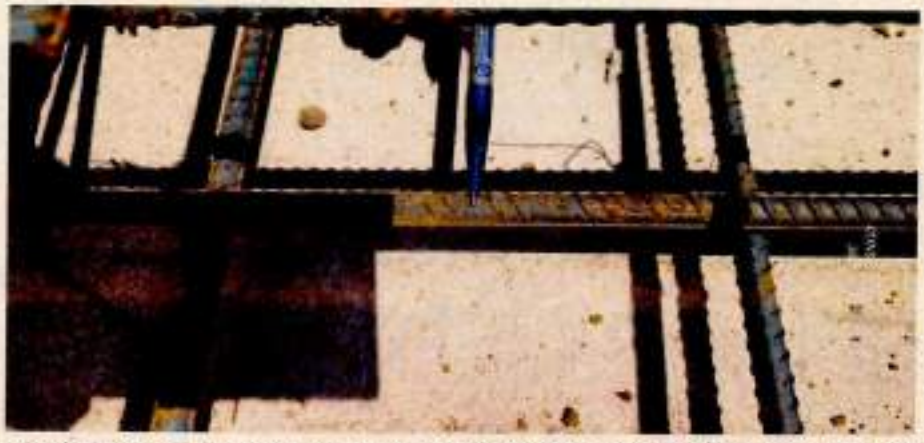

Control de calidad mediante la verificación de planos, diseños y especificaciones técnicas.

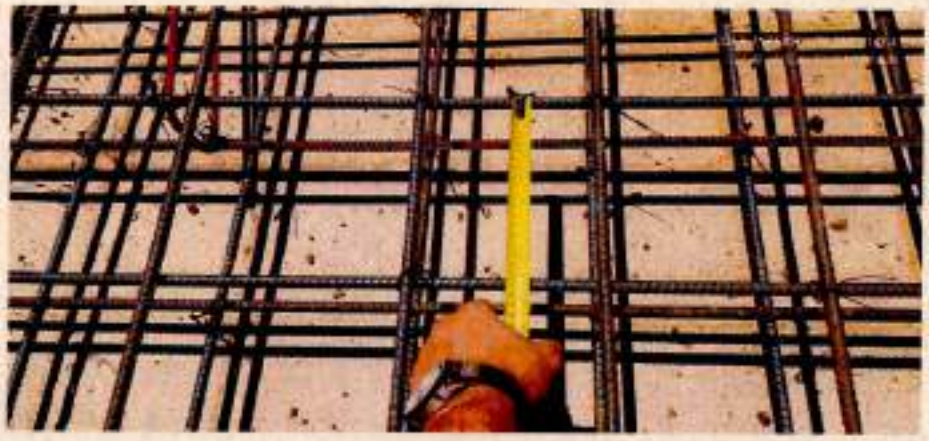

Control de calidad mediante la verificación de planos, diseños y especificaciones técnicas.



Llegada de materiales a la obra - bloques de mampostería.



Llegada de materiales a la obra - bloques de mampostería.



Llegadas a la obra de aceros de refuerzo.



Llegadas a la obra de aceros de refuerzo.



Llegadas a la obra de aceros de refuerzo.



Visita e inspección de obra de la Contraloría General de la República.



Visita e inspección de obra de la Contraloría General de la República.



Visita e inspección de obra de la Contraloría General de la República.



Visita e inspección de obra de la Contraloría General de la República.



Inspección de obra de profesionales del equipo de trabajo del contratista y la interventoría.



Inspección de obra de profesionales del equipo de trabajo del contratista y la interventoría.



Inspección de obra por parte del equipo de profesionales de la interventoría.



Inspección de obra por parte del equipo de profesionales de la interventoría.



Inspección de obra por parte del equipo de profesionales de la interventoría.



Inspección de obra por parte del equipo de profesionales de la interventoría.



Inspección de obra por parte del equipo de profesionales de la interventoría.



Inspección de obra por parte del equipo de profesionales de la interventoría



Presencia de fuertes lluvias en la zona



Presencia de fuertes lluvias en la zona



Afectaciones causadas por las fuertes lluvias en la zona.



Afectaciones causadas por las fuertes lluvias en la zona.



Equipos para compactación de rellenos



Equipos para compactación de rellenos

ING. JUAN CAMILO POLANÍA ANDRADE
Rep. Legal CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA
Interventoría.

Contrato de Interventoría
No. 000300/2025

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, MARCO ANTONIO GOMEZ SANCHEZ identificado con C.C. No. 1.075.228.605 de Neiva (Huila), con matricula profesional No. 242226-T, inscrita ante la Junta Central de Contadores; en mi calidad de contador público del CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA identificado con NIT. No. 901.944.326-5, bajo la gravedad de juramento certifico que el consorcio ha realizado el pago de la seguridad social integral y de parafiscales, de todos los trabajadores, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha.

En constancia se firma en Neiva, a los 12 días del mes de junio de 2026.

Atentamente,

MARCO ANTONIO GOMEZ SANCHEZ
Contador Público del CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA
Interventoría externa.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.075.228.605
GOMEZ SANCHEZ
APELLIDOS
MARCO ANTONIO
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 14-MAY-1988
PITAL
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
23-MAY-2006 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-1908100-50151381-M-1075228605-20060823
02359 00241A 02 21043780

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

242226-T



MARCO ANTONIO
GOMEZ SANCHEZ
C.C. 1075228605
RES. INSCRIPCION 394 DEL 18/05/2018
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

249095 268782

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F7F7F71B7B65F965F8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARCO ANTONIO GOMEZ SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075228605 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 242226-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Contrato de Interventoría
No. 000300/2025

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE identificado con C.C. No. 1.075.246.439 de Neiva (Huila), en mi calidad de representante legal del CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA identificado con NIT. No. 901.944.326-5, bajo la gravedad de juramento certifico que el consorcio ha realizado el pago de la seguridad social integral y de parafiscales, de todos los trabajadores, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha.

En constancia se firma en Neiva, a los 12 días del mes de junio de 2026.

Atentamente,

JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE
Representante Legal del CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA
Interventoría externa.

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37685771
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-06-12

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA	TIPO DE PERSONA	Juridica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901944326	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 9 #5-50	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	YESISALASST@GMAIL.COM	TELÉFONO	3108023853
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1075246439	PRIMER APELLIDO	POLANIA	SEGUNDO APELLIDO	ANDRADE
PRIMER NOMBRE	JUAN	SEGUNDO NOMBRE	CAMILO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 04	Año: 2026	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
10		$32.435.810		37685771

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-80244826	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	ANDRADE CACHAYA OSCAR EDUARDO	$4.000.000
CC-4377250	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	ARIAS SOLORZANO FRANCISCO JAVIER	$1.750.905
CC-1077843672	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	CERQUERA MANCHOLA RAFAEL ARBEY	$5.800.000
CC-78716085	01	No	No	No	41	1	5421002	Integral	ESPITIA LOPEZ LUIS ANGEL	$2.400.000
CC-1049626098	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	FONSECA SANABRIA LUIS CARLOS	$6.250.000
CC-76319787	01	No	No	No	41	1	5421002	Integral	GONZALEZ CASAS JULIAN LIZANDRO	$5.800.000
CC-1075276612	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	JAVELA RAMIREZ CARLOS EDUARDO	$1.800.000
CC-1075246303	01	No	No	No	41	1	5421002	Integral	PERDOMO VARGAS EDGAR MAURICIO	$1.920.000
CC-1075312201	01	No	No	No	41	1	4411101	Fijo	VALLEJO RAMIREZ ERICK SANTIAGO	$1.750.905
CC-10540724	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	VERGARA MONTES FRANKLIN ORLANDO	$4.000.000

NOVEDADES																														
Identificación	IMG	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 80244826																													0		
CC - 4377250																													0		
CC - 1077843672																													0		
CC - 78716085																													0		
CC - 1049626098																													0		
CC - 76319787																													0		
CC - 1075276612																													0		
CC - 1075246303																													0		
CC - 1075312201																													0		
CC - 10540724																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificacion	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 80244826	COLPENSIONES	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$0	$0	$0
CC - 4377250	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1077843672	PORVENIR	30	$5.800.000	0.1600000	$928.000	$0	$0	$928.000	$0	$0	$0
CC - 78716085	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1049626098	COLPENSIONES	30	$6.250.000	0.1600000	$1.000.000	$0	$0	$1.000.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 76319787	PORVENIR	30	$4.060.000	0.1600000	$649.600	$0	$0	$649.600	$0	$0	$0
CC - 1075276612	PORVENIR	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0
CC - 1075246303	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1075312201	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 10540724	PORVENIR	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cod CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 80244826	SANITAS	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.000.000	7112	0.0696000	$278.400
CC - 4377250	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	7112	0.0696000	$121.900
CC - 1077843672	SANITAS	30	$5.800.000	0.0400000	$232.000	$0	0	$0	0	$0	30	$5.800.000	7112	0.0696000	$403.700
CC - 78716085	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	7112	0.0696000	$121.900
CC - 1049626098	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$6.250.000	0.0400000	$250.000	$0	0	$0	0	$0	30	$6.250.000	7112	0.0696000	$435.000
CC - 76319787	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.060.000	0.0400000	$162.400	$0	0	$0	0	$0	30	$4.060.000	7112	0.0696000	$282.600
CC - 1075276612	SANITAS	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	7112	0.0696000	$125.300
CC - 1075246303	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	7112	0.0696000	$121.900
CC - 1075312201	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	7112	0.0696000	$121.900
CC - 10540724	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.000.000	7112	0.0696000	$278.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-80244826	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-4377250	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1077843672	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$5.800.000	0.0400000	$232.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-78716085	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.680.000	0.0400000	$67.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049624098	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$6.250.000	0.0400000	$250.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-76319787	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$4.060.000	0.0400000	$162.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075276612	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075246303	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.344.000	0.0400000	$53.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075312201	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10540724	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 04										
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA										
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	5	$2.785.800	$0	$0	$0	$0	35	$70.300	$0	$0	$2.856.100
COLPENSIONES	5	$2.480.600	$0	$0	$0	$0	35	$62.600	$0	$0	$2.543.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	$70.100	$0	0	$0	0	$0	$70.100	35	$1.800	$0	$71.900	$0	0	$0	$0	$71.900	$0	$0	$71.900
SANITAS	5	$604.200	$0	0	$0	0	$0	$604.200	35	$15.300	$0	$619.500	$0	0	$0	$0	$619.500	$0	$0	$619.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$642.500	$0	0	$0	0	$0	$642.500	35	$16.300	$0	$659.800	$0	0	$0	$0	$658.800	$0	$0	$658.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	10	$2.291.000	0	$0	$0	$2.291.000	35	$57.900	$2.348.900	0	$0	$22.910	$2.348.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	10	$1.297.600	35	$32.800	$1.330.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$1.350.200
PENSIONES	2	$5.399.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	$2.348.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.330.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$10.428.800

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37190082
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-04-29

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA	TIPO DE PERSONA	Juridica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901944326	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 9 #5-50	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	YESISALASST@GMAIL.COM	TELÉFONO	3108023853
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1075246439	PRIMER APELLIDO	POLANIA	SEGUNDO APELLIDO	ANDRADE
PRIMER NOMBRE	JUAN	SEGUNDO NOMBRE	CAMILO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 03	Año: 2026	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.800.000		37190082

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extranjero obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1075276612	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	JAVELA RAMIREZ CARLOS EDUARDO	$1.800.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1075276612																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1075276612	PORVENIR	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EC	Valor EC	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cod CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1075276612	SANITAS	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	7112	0.0696000	$125.300

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1075276612	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 03											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$288.000	$0	$0	$0	$0	20	$3.900	$0	$0	$291.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC IMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$72.000	$0	0	$0	0	$0	$72.000	20	$1.000	$0	$73.000	$0	0	$0	$0	$73.000	$0	$0	$73.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$125.300	0	$0	$0	$125.300	20	$1.700	$127.000	0	$0	$1.253	$127.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$72.000	20	$1.000	$73.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$73.000
PENSIONES	1	$291.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$127.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$73.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$564.900

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37685668
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-06-12

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA	TIPO DE PERSONA	Juridica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901944326	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 9 #5-50	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	YESISALASST@GMAIL.COM	TELÉFONO	3108023853
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1075246439	PRIMER APELLIDO	POLANIA	SEGUNDO APELLIDO	ANDRADE
PRIMER NOMBRE	JUAN	SEGUNDO NOMBRE	CAMILO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 03	Año: 2026	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
9		$30.635.810		37685668

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-80244826	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	ANDRADE CACHAYA OSCAR EDGARDO	$4.000.000
CC-4377250	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	ARIAS SOLORZANO FRANCISCO JAVIER	$1.750.905
CC-1077843672	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	CERQUERA MANCHOLA RAFAEL ARBEY	$5.800.000
CC-78716085	01	No	No	No	41	1	5421002	Integral	ESPITIA LOPEZ LUIS ANGEL	$2.400.000
CC-1049626098	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	FONSECA SANABRIA LUIS CARLOS	$6.250.000
CC-76319787	01	No	No	No	41	1	5421002	Integral	GONZALEZ CASAS JULIAN LIZANDRO	$5.800.000
CC-1075246303	01	No	No	No	41	1	5421002	Integral	PERDOMO VARGAS EDGAR MAURICIO	$1.920.000
CC-1075312201	01	No	No	No	41	1	4411101	Fijo	VALLEJO RAMIREZ ERICK SANTIAGO	$1.750.905
CC-10540724	01	No	No	No	41	1	5421002	Fijo	VERGARA MONTES FRANKLIN ORLANDO	$4.000.000

NOVEDADES																												
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 80244826																												0		
CC - 4377250																												0		
CC - 1077843672																												0		
CC - 78716085																												0		
CC - 1049626098																												0		
CC - 76319787																												0		
CC - 1075246303																												0		
CC - 1075312201																												0		
CC - 10540724																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 80244826	COLPENSIONES	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$0	$0	$0
CC - 4377250	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1077843672	PORVENIR	30	$5.800.000	0.1600000	$928.000	$0	$0	$928.000	$0	$0	$0
CC - 78716085	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1049626098	COLPENSIONES	30	$6.250.000	0.1600000	$1.000.000	$0	$0	$1.000.000	$0	$0	$0
CC - 76319787	PORVENIR	30	$4.060.000	0.1600000	$649.600	$0	$0	$649.600	$0	$0	$0
CC - 1075246303	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1049626098	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$6.250.000	0.0400000	$250.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-76319787	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$4.060.000	0.0400000	$162.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075246303	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.344.000	0.0400000	$53.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075312201	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10540724	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 03										
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA										
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	4	$2.497.800	$0	$0	$0	$0	64	$112.800	$0	$0	$2.610.600
COLPENSIONES	5	$2.480.600	$0	$0	$0	$0	64	$112.100	$0	$0	$2.592.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	$70.100	$0	0	$0	0	$0	$70.100	64	$3.200	$0	$73.300	$0	0	$0	$0	$73.300	$0	$0	$73.300
SANITAS	4	$532.200	$0	0	$0	0	$0	$532.200	64	$24.100	$0	$556.300	$0	0	$0	$0	$556.300	$0	$0	$556.300
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$642.500	$0	0	$0	0	$0	$642.500	64	$29.100	$0	$671.600	$0	0	$0	$0	$671.600	$0	$0	$671.600

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1075312201	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 10540724	PORVENIR	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cod CP	Tarifa	Cot Obl
CC - 80244826	SANITAS	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.000.000	7112	0.0696000	$278.400
CC - 4377250	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	7112	0.0696000	$121.900
CC - 1077843672	SANITAS	30	$5.800.000	0.0400000	$232.000	$0	0	$0	0	$0	30	$5.800.000	7112	0.0696000	$403.700
CC - 78716085	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	7112	0.0696000	$121.900
CC - 1049626098	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$6.250.000	0.0400000	$250.000	$0	0	$0	0	$0	30	$6.250.000	7112	0.0696000	$435.000
CC - 76319787	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.060.000	0.0400000	$162.400	$0	0	$0	0	$0	30	$4.060.000	7112	0.0696000	$282.600
CC - 1075246303	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	7112	0.0696000	$121.900
CC - 1075312201	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	7112	0.0696000	$121.900
CC - 10540724	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.000.000	7112	0.0696000	$278.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-80244826	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4377250	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1077843672	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$5.800.000	0.0400000	$232.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-78716085	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.680.000	0.0400000	$67.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NUM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	9	$2.165.700	0	$0	$0	$2.165.700	64	$97.800	$2.263.500	0	$0	$21.657	$2.263.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	9	$1.225.600	64	$55.400	$1.281.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$1.301.200
PENSIONES	2	$5.203.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	$2.263.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.281.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$10.049.000
