

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración
28		**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 5.417.497,93**	**37 días**
29		**4.2**	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 3.426.761,05**	**12 días**
30		4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	18.00	**$ 1.539.022,04**	12 días
31		4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	12.00	**$ 881.911,42**	12 días
32		4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	16.00	**$ 763.622,56**	12 días
33		4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	2.00	**$ 242.205,03**	12 días
34		**4.3**	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**			**$ 671.614,16**	**12 días**
35		4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	48.00	**$ 671.614,16**	12 días
36		**4.5**	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 711.693,74**	**12 días**
37		4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7.00	**$ 415.154,68**	12 días
38		4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	5.00	**$ 296.539,06**	12 días
39		**4.6**	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 257.656,72**	**12 días**
40		4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	4.00	**$ 257.656,72**	12 días
41		**4.9**	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 349.772,26**	**5 días**
42		4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	60.00	**$ 349.772,26**	5 días
43		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 1.336.498,99**	**3 días**
44		5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTAL	UN	2.00	**$ 236.936,62**	3 días
45		5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA L	UN	2.00	**$ 423.026,50**	3 días
46		5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESOR	UN	2.00	**$ 377.799,04**	3 días
47		5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	2.00	**$ 498.736,83**	3 días
48		**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 53.924.141,77**	**21 días**
49		**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 47.572.796,91**	**21 días**
50		7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	21.76	**$ 919.980,85**	9 días
51		7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	647.05	**$ 42.088.198,37**	4 días
52		7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	173.45	**$ 4.564.617,69**	8 días
53		**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 6.351.344,86**	**10 días**
54		7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	21.76	**$ 4.276.644,16**	10 días
55		7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	1.80	**$ 126.599,93**	5 días
56		7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO H=10 CM, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	24.15	**$ 1.948.100,77**	5 días
57		**8**	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 6.088.257,68**	**12 días**
58		8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	56.15	**$ 6.088.257,68**	12 días
59		**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 6.807.730,83**	**3 días**
60		**9.2**	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 1.763.546,96**	**3 días**

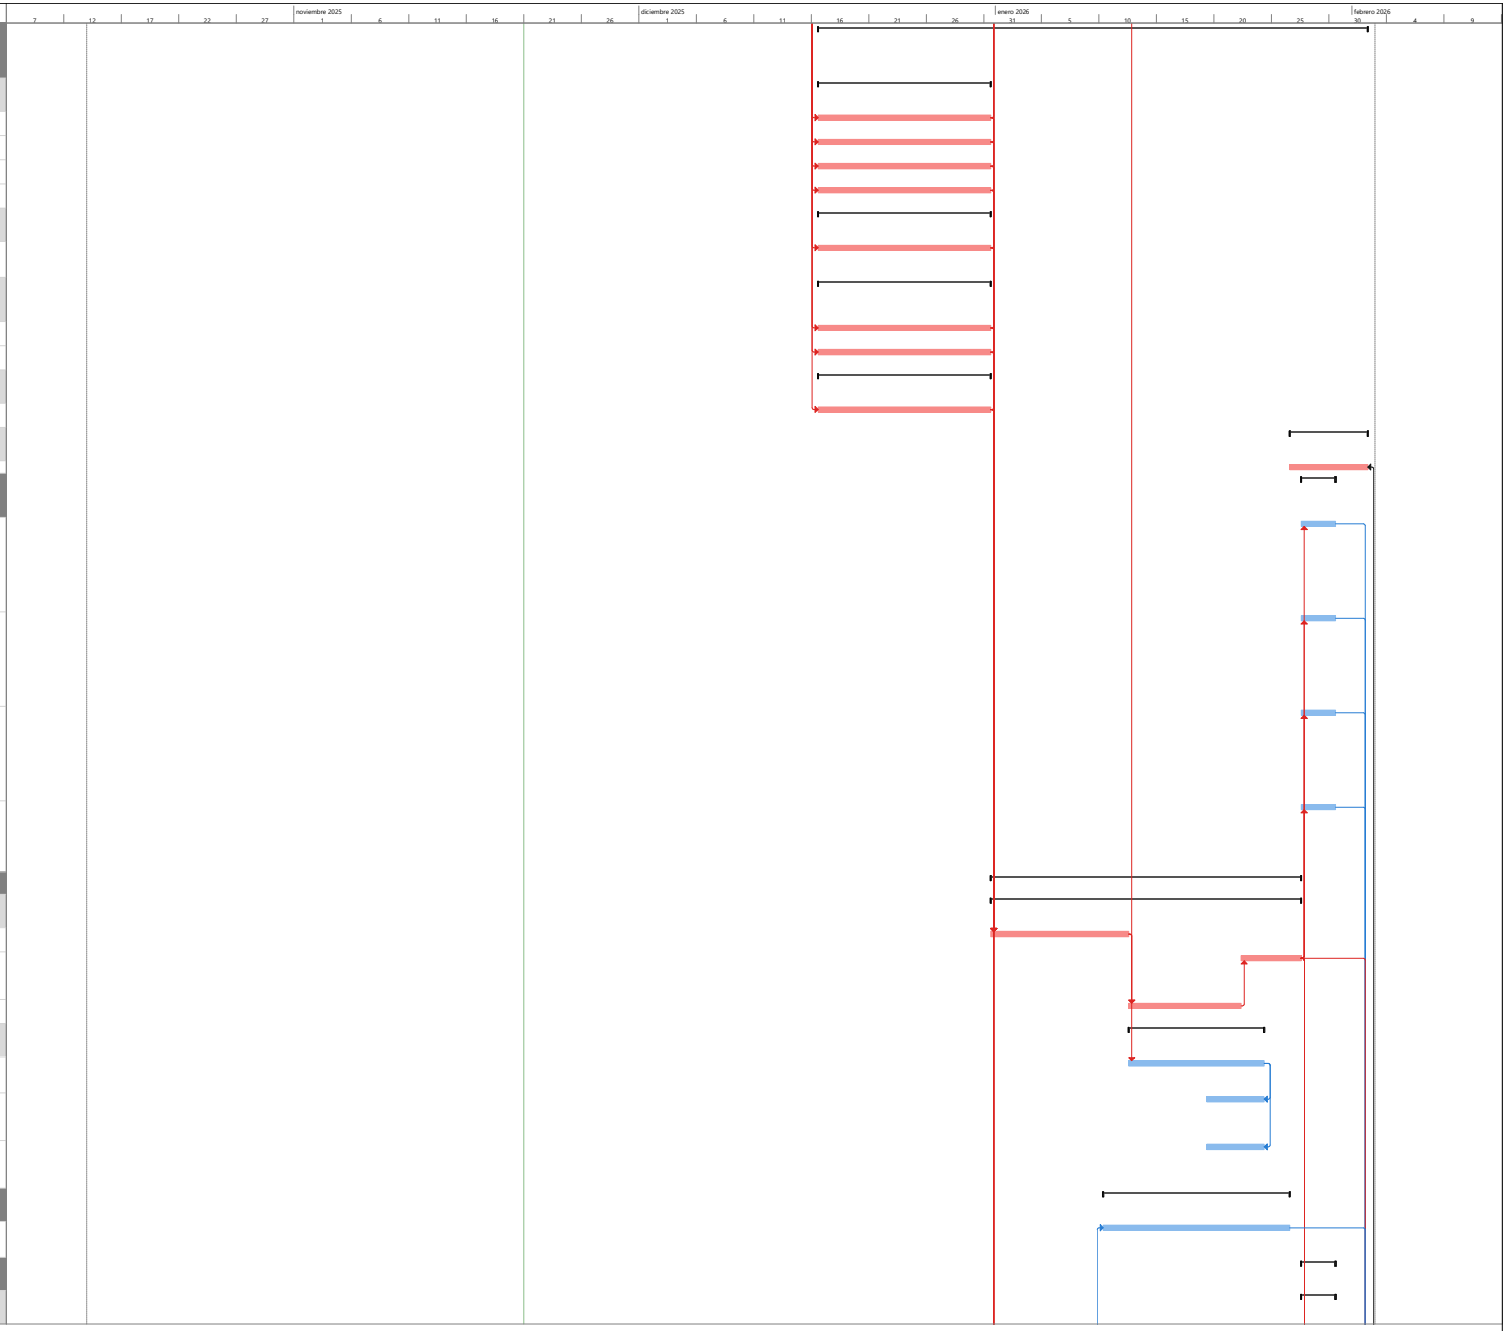


Proyecto: PROGRAMACION ED
Fecha: vie 21/11/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración
61		9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	3.60	**$ 1.763.546,96**	3 días
62		**9.3**	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 5.044.183,87**	**3 días**
63		9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ANGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE	M2	3.36	**$ 3.970.086,54**	3 días
64		9.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE ORINALES EN ACRILICO RECUPERADO DE 10 MM DISEÑO DE ANIMALES, MODULOS DE 40 X 90 X 1 CM, INCLUYE SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" ANCLADO AL PISO	UND	2.00	**$ 1.074.097,33**	3 días
65		**10**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 7.333.396,29**	**3 días**
66		10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	5.00	**$ 4.076.973,45**	3 días
67		10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	**$ 1.151.620,94**	3 días
68		10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00	**$ 1.888.539,85**	3 días
69		10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00	**$ 153.584,81**	3 días
70		10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2.00	**$ 62.677,24**	3 días
71		**11**	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 18.175.645,26**	**3 días**
72		11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	19.68	**$ 18.175.645,26**	3 días
73		**12**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 13.830.782,25**	**24 días**
74		**12.1**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 2.550.389,90**	**18 días**
75		12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	56.15	**$ 2.159.624,73**	10 días
76		12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	33.42	**$ 390.765,17**	8 días
77		**12.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 11.240.741,32**	**6 días**
78		12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	517.65	**$ 10.241.561,52**	6 días
79		12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	33.42	**$ 999.179,80**	6 días
80		**12.3**	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 39.651,03**	**6 días**
81		12.3.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	1.71	**$ 39.651,03**	6 días
82		**14**	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 684.367,36**	**2 días**
83		14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	3.70	**$ 684.367,36**	2 días
84		**16**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 67.176.026,71**	**4 días**
85		16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	17.60	**$ 1.959.178,63**	4 días
86		16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	857.90	**$ 65.216.848,08**	4 días
87		**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 94.708,22**	**2 días**
88		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	21.76	**$ 94.708,22**	2 días
89			FIN			$ 0,00	0 días

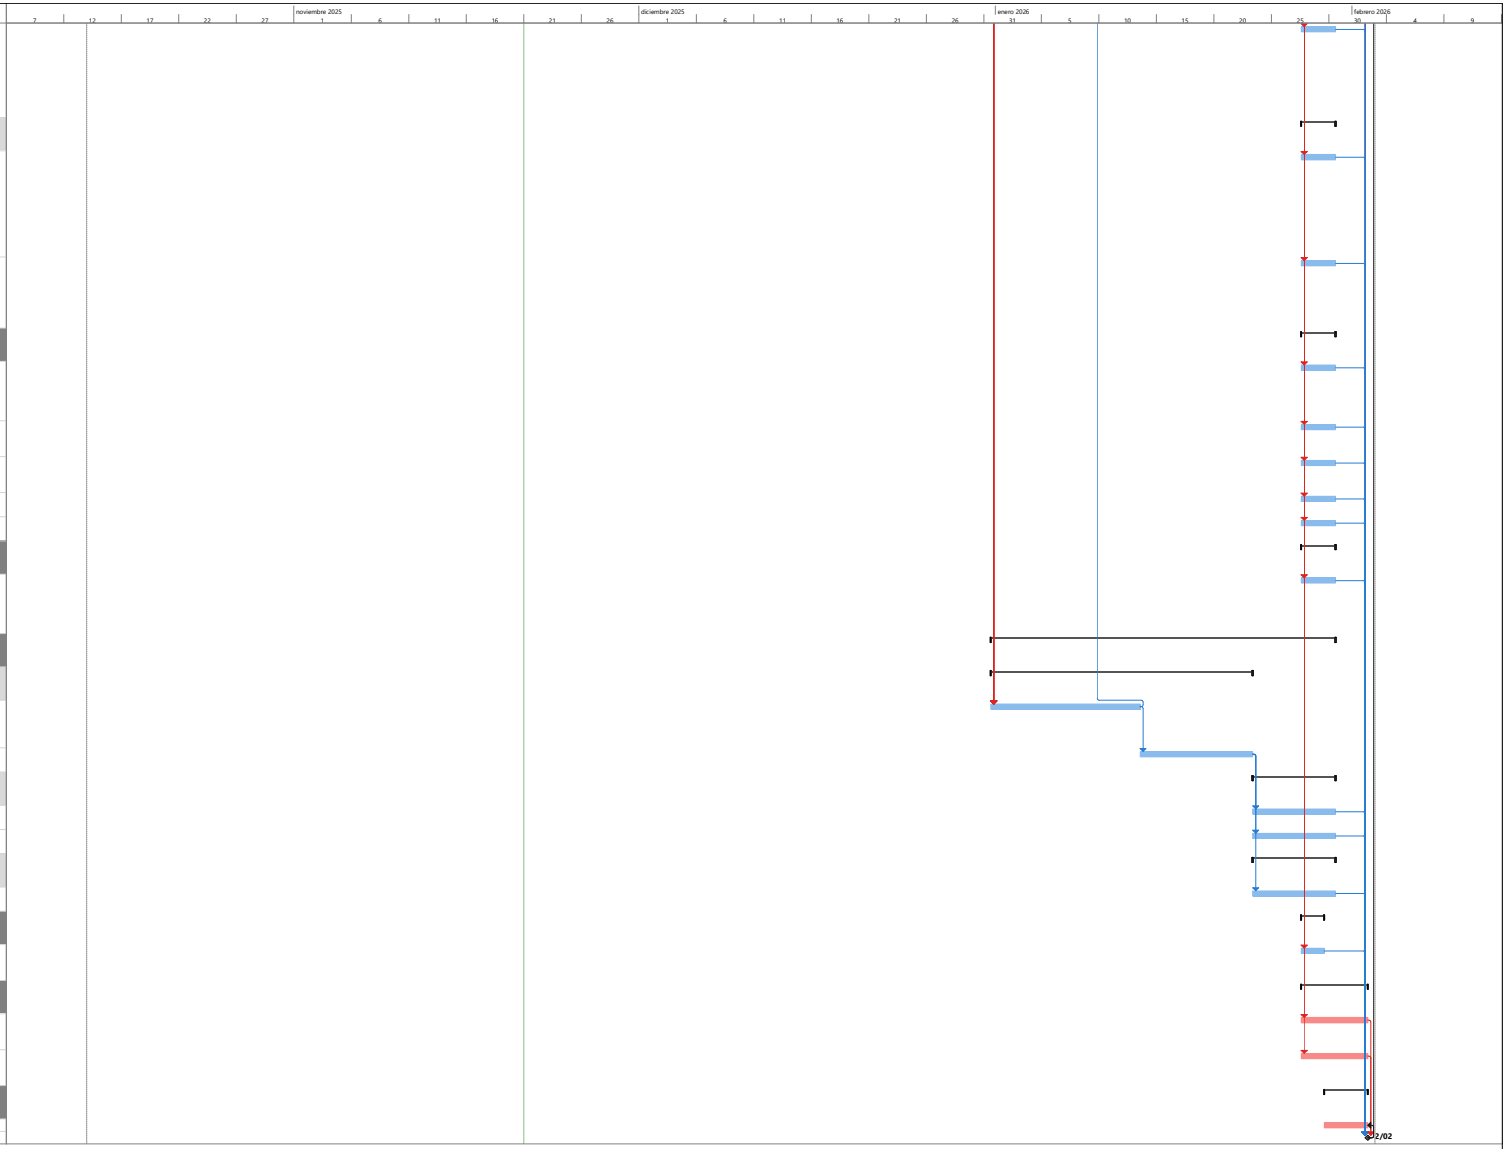

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración
1			**CONTRATO CO1.PCCNTR.8154784 JAIRO ANIBAL NIÑO**			**$ 317.670.305,98**	**109 días**
2			ACTA DE INICIO			$ 0,00	0 días
3			ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			$ 0,00	21 días
4			INICIO			$ 0,00	0 días
5		**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 23.678.164,84**	47 días
6		**1.2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**$ 19.889.039,06**	30 días
7		1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	89.28	**$ 2.435.286,99**	30 días
8		1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	250.10	**$ 7.609.698,66**	30 días
9		1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	66.83	**$ 1.295.945,18**	30 días
10		1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.74	**$ 1.508.671,74**	30 días
11		1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28.00	**$ 521.982,66**	30 días
12		1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	33.40	**$ 929.416,85**	30 días
13		1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.04	**$ 83.341,09**	30 días
14		1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	58.00	**$ 1.171.508,05**	30 días
15		1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2"(INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	67.02	**$ 1.141.401,50**	30 días
16		1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	12.00	**$ 111.716,06**	30 días
17		1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	9.00	**$ 55.785,72**	30 días
18		1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	89.28	**$ 1.709.842,35**	30 días
19		1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2"(INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	128.18	**$ 944.686,41**	30 días
20		1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	35.00	**$ 369.755,80**	30 días

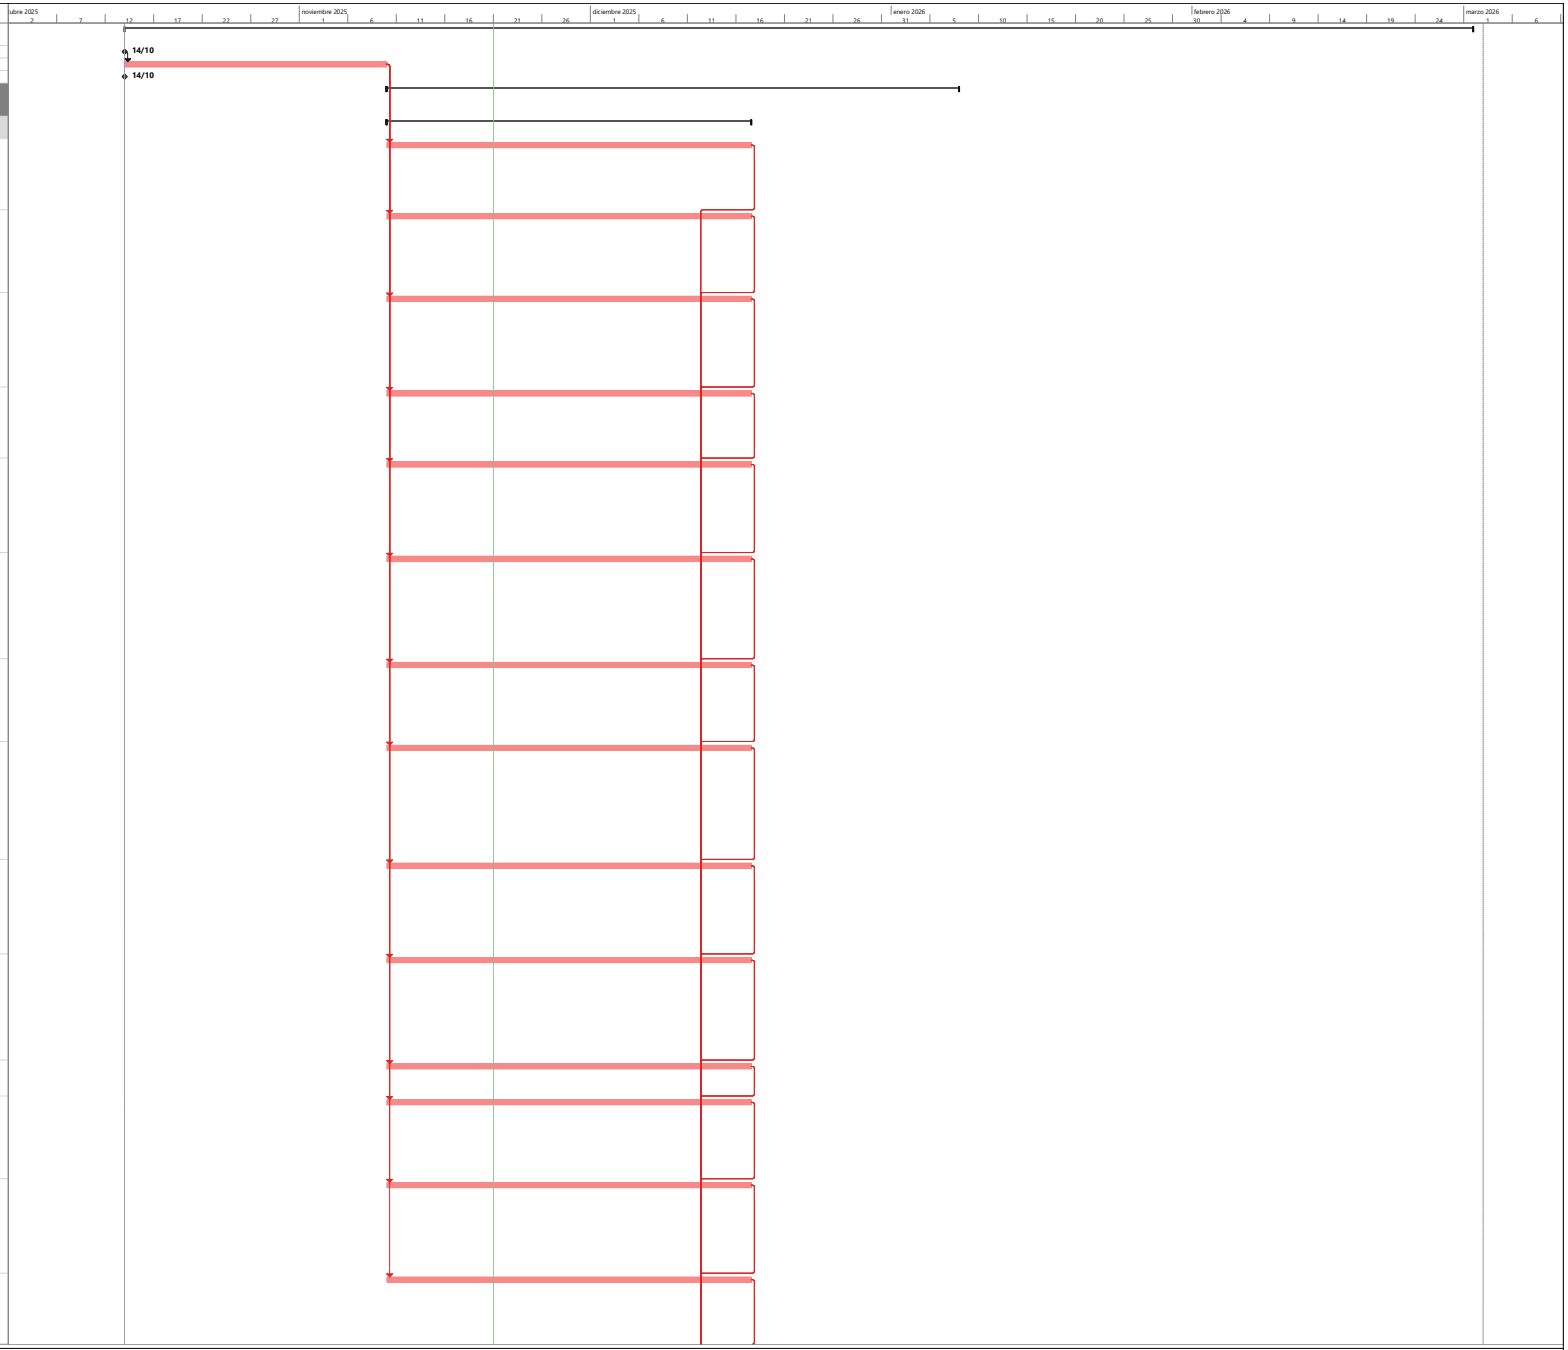


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración
21		**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 2.953.096,70**	10 días
22		1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO<= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFEC	M	152.00	**$ 2.650.959,79**	10 días
23		1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2"DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	17.32	**$ 302.136,91**	10 días
24		**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 836.029,08**	20 días
25		**2.1**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 367.614,42**	10 días
26		2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	5.91	**$ 367.614,42**	10 días
27		**2.2**	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 468.414,66**	10 días
28		2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	0.74	**$ 468.414,66**	10 días
29		**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 12.293.703,33**	15 días
30		**4.2**	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 6.872.959,20**	15 días
31		4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4"INCLUYE ACCESORIOS	M	43.00	**$ 2.907.041,61**	15 días
32		4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3"INCLUYE ACCESORIOS	M	23.00	**$ 1.469.852,35**	15 días
33		4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2"INCLUYE ACCESORIOS	M	36.00	**$ 1.527.245,11**	15 días
34		4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3"INCLUYE ACCESORIOS	UN	9.00	**$ 968.820,13**	15 días
35		**4.3**	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**			**$ 2.117.963,55**	15 días
36		4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	151.37	**$ 2.117.963,55**	15 días
37		**4.5**	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 2.787.467,13**	15 días
38		4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	25.00	**$ 1.482.695,28**	15 días
39		4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	22.00	**$ 1.304.771,85**	15 días
40		**4.6**	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 515.313,45**	15 días
41		4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	8	**$ 515.313,45**	15 días
42		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 4.826.069,67**	51 días
43		5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERIA PVC Ø3/4"HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTAL	UN	4.00	**$ 473.873,24**	15 días

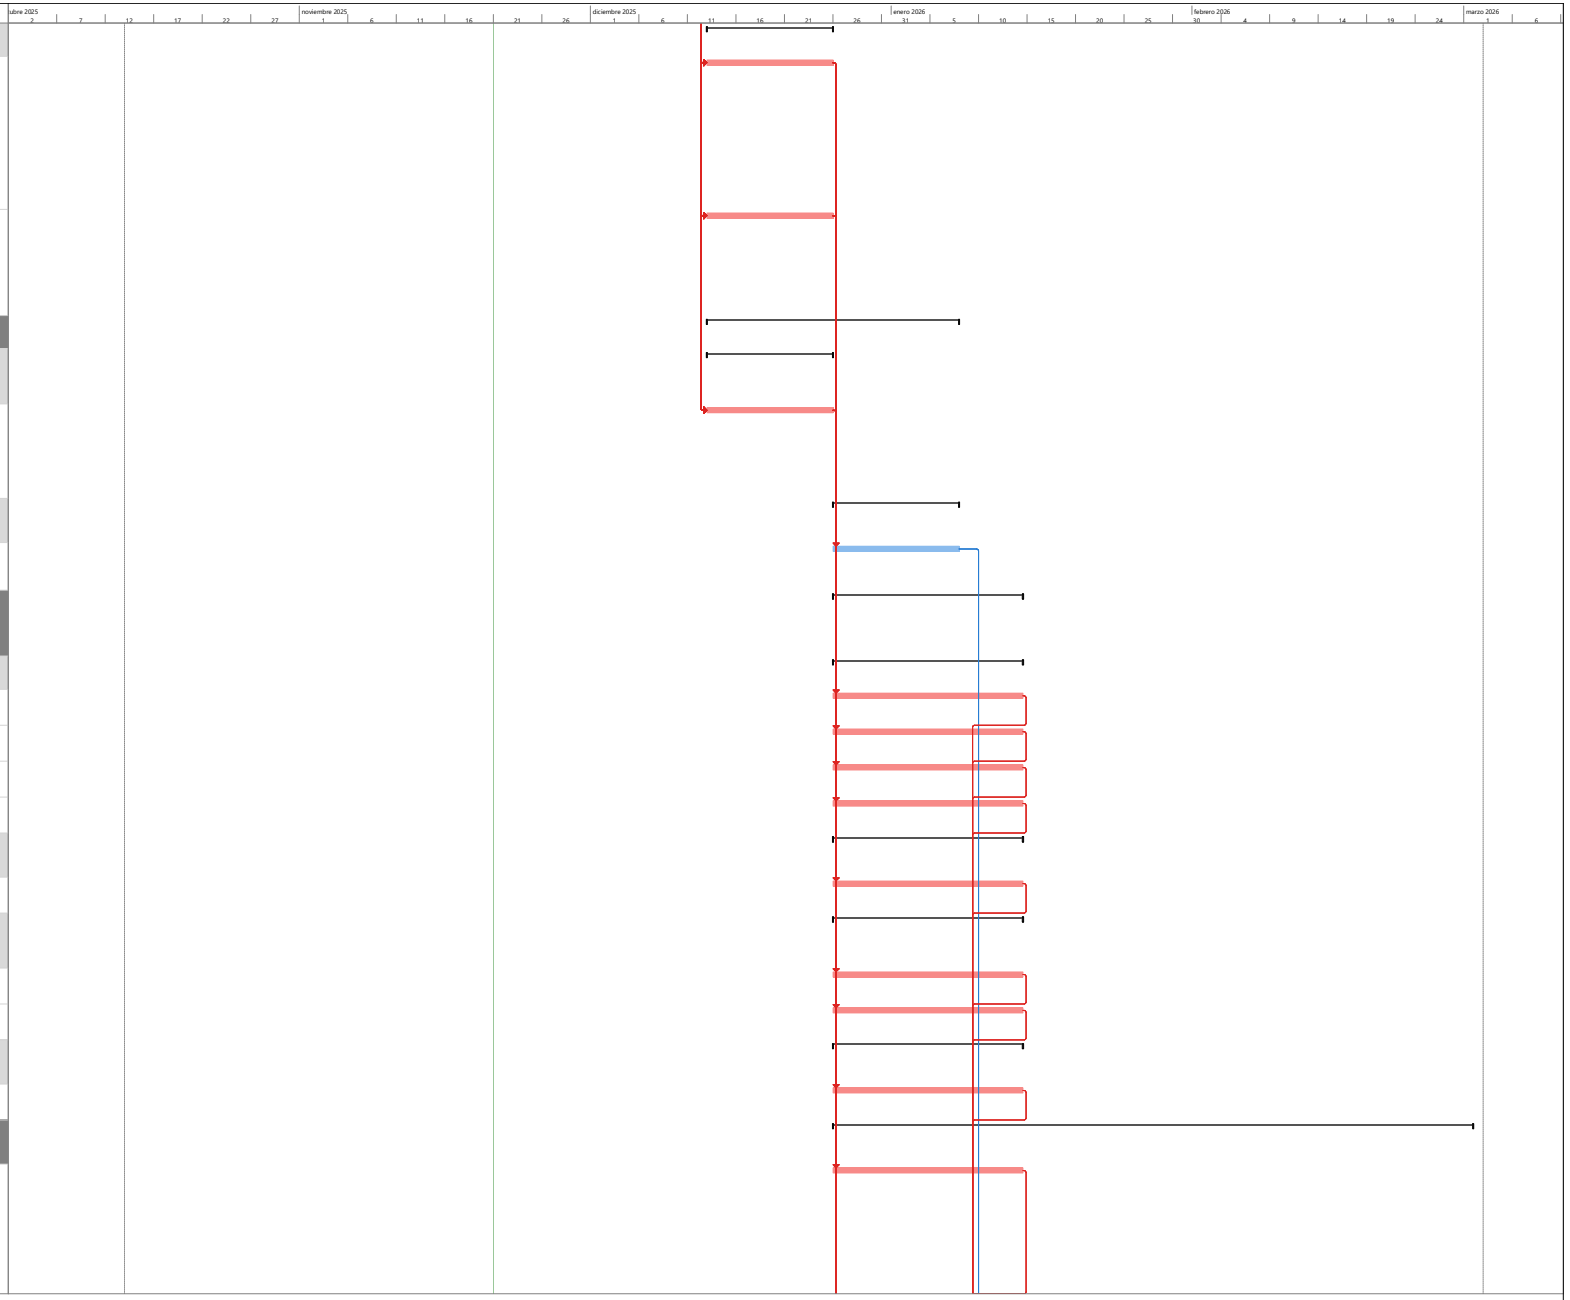

Proyecto: PROGRAMACION JAI
Fecha: vie 21/11/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración
44		5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4"HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA L	UN	4.00	$ 846.052,99	15 días
45		5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4"HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESOR	UN	8.00	$ 1.511.196,13	15 días
46		5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00	$ 1.994.947,31	5 días
47		**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 83.844.364,37	39 días
48		**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 5.298.714,87	26 días
49		7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	81.01	$ 3.424.892,84	26 días
50		7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	71.20	$ 1.873.822,03	26 días
51		**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 78.545.649,50	18 días
52		7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	81.01	$ 15.921.035,00	18 días
53		7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	4.00	$ 281.333,78	5 días
54		7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO H=10 CM, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	71.20	$ 5.743.712,29	5 días
55		7.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	255.60	$ 56.599.568,43	18 días
56		**8**	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 20.351.380,45	18 días
57		8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	187.68	$ 20.351.380,45	18 días
58		**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 20.944.931,30	5 días
59		**9.2**	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 5.660.049,79	5 días
60		9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD,	M2	3.04	$ 1.362.874,38	5 días
61		9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	8.77	$ 4.297.175,41	5 días
62		**9.3**	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 15.284.881,51	5 días

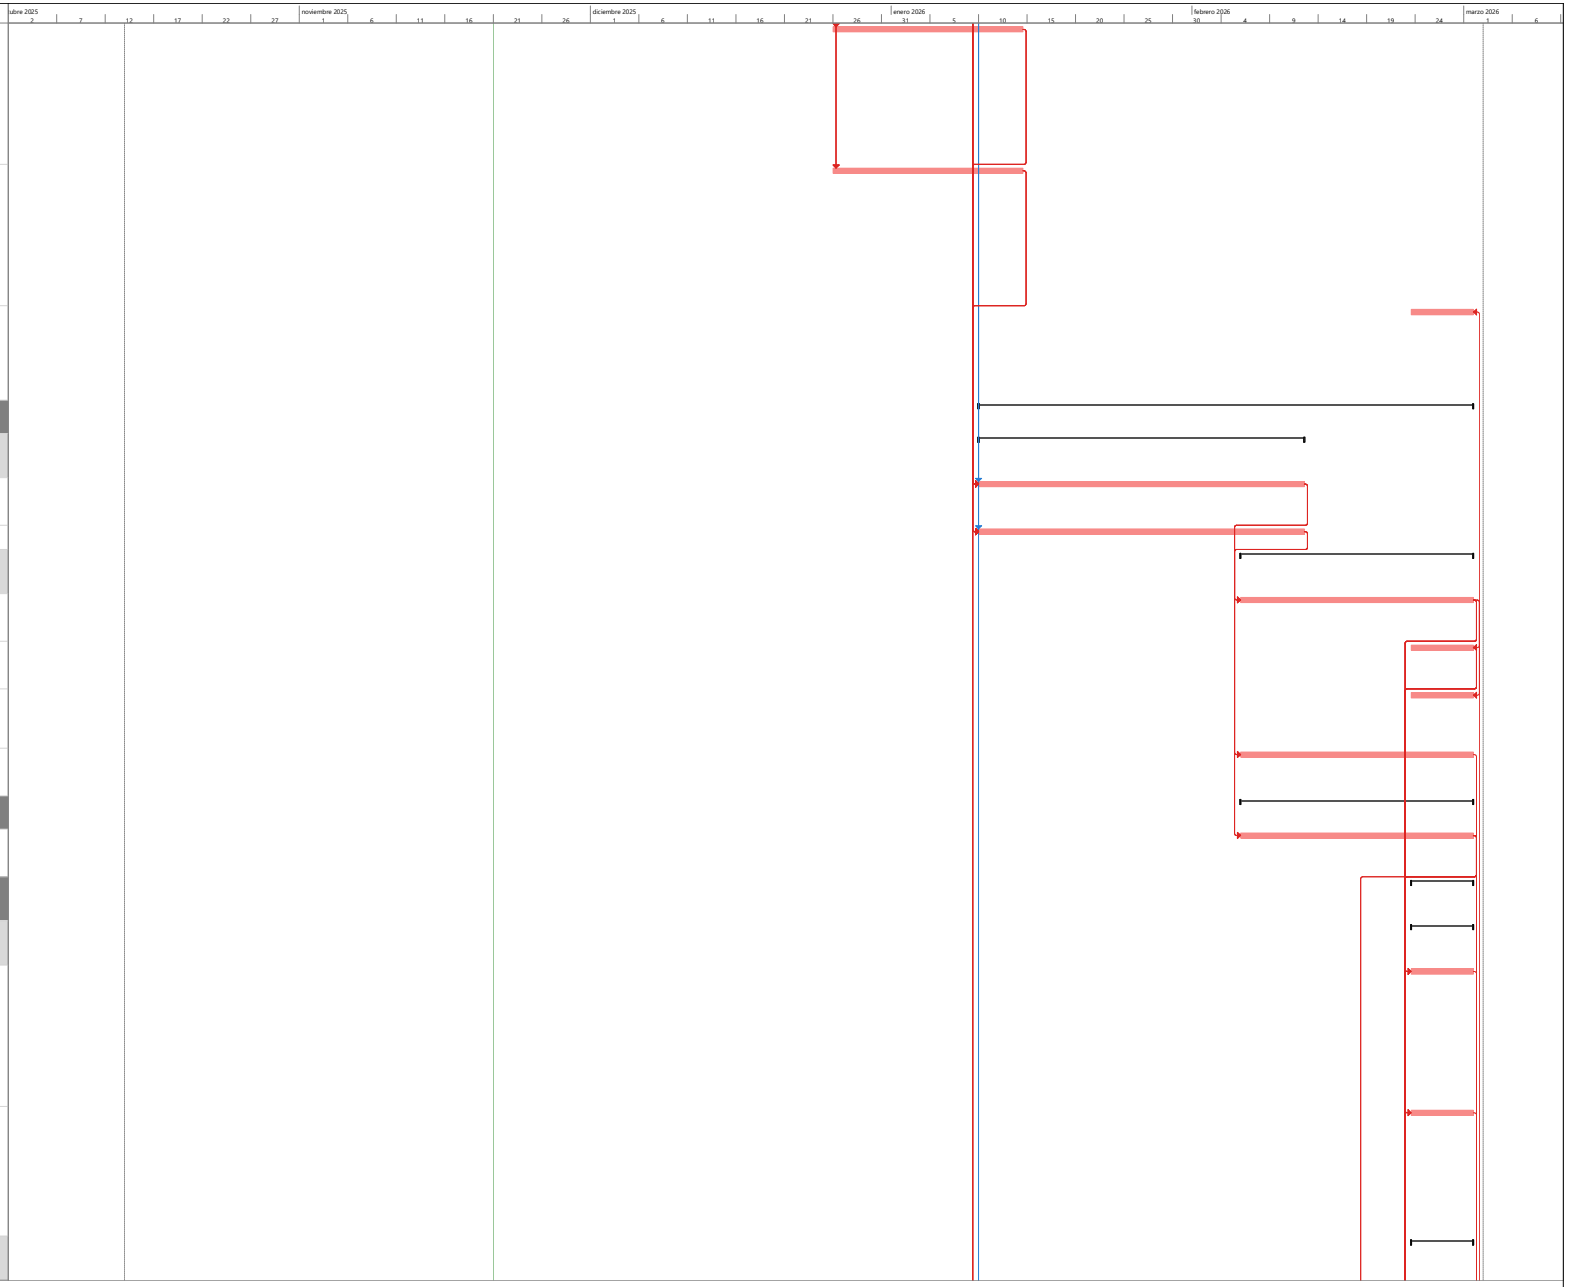

Proyecto: PROGRAMACION JAI
Fecha: vie 21/11/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración
63		9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE	M2	12.03	**$ 14.210.784,19**	5 días
64		9.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE ORINALES EN ACRILICO RECUPERADO DE 10 MM DISEÑO DE ANIMALES, MODULOS DE 40 X 90 X 1 CM, INCLUYE SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2"ANCLADO AL PISO	UND	2.00	**$ 1.074.097,32**	5 días
65		**10**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 28.818.147,02**	5 días
66		10.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4"Y SELLANTE)	UN	15.00	**$ 15.561.591,04**	5 días
67		10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	6.00	**$ 4.326.424,87**	5 días
68		10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	24.00	**$ 8.309.575,29**	5 días
69		10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	10.00	**$ 307.169,63**	5 días
70		10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4"A 3"	UN	11.00	**$ 313.386,19**	5 días
71		**11**	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 98.721.526,44	5 días
72		11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	96.12	**$ 88.772.509,21**	5 días
73		11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	9.60	**$ 9.949.017,23**	5 días
74		**12**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 12.315.115,79**	39 días
75		**12.1**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 8.771.129,23**	39 días
76		12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	193.97	**$ 7.461.055,49**	26 días
77		12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	112.04	**$ 1.310.073,74**	18 días
78		**12.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 3.524.556,11	18 días
79		12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	117.89	**$ 3.524.556,11**	18 días
80		**12.3**	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 19.430,45**	3 días
81		12.3.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	0.84	**$ 19.430,45**	3 días
82		**14**	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 2.806.352,52	5 días
83		14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1"EN ALUMINIO	M2	15.16	**$ 2.806.352,52**	5 días
84		**16**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 8.717.972,37**	12 días
85		16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20.40	**$ 1.357.160,01**	12 días

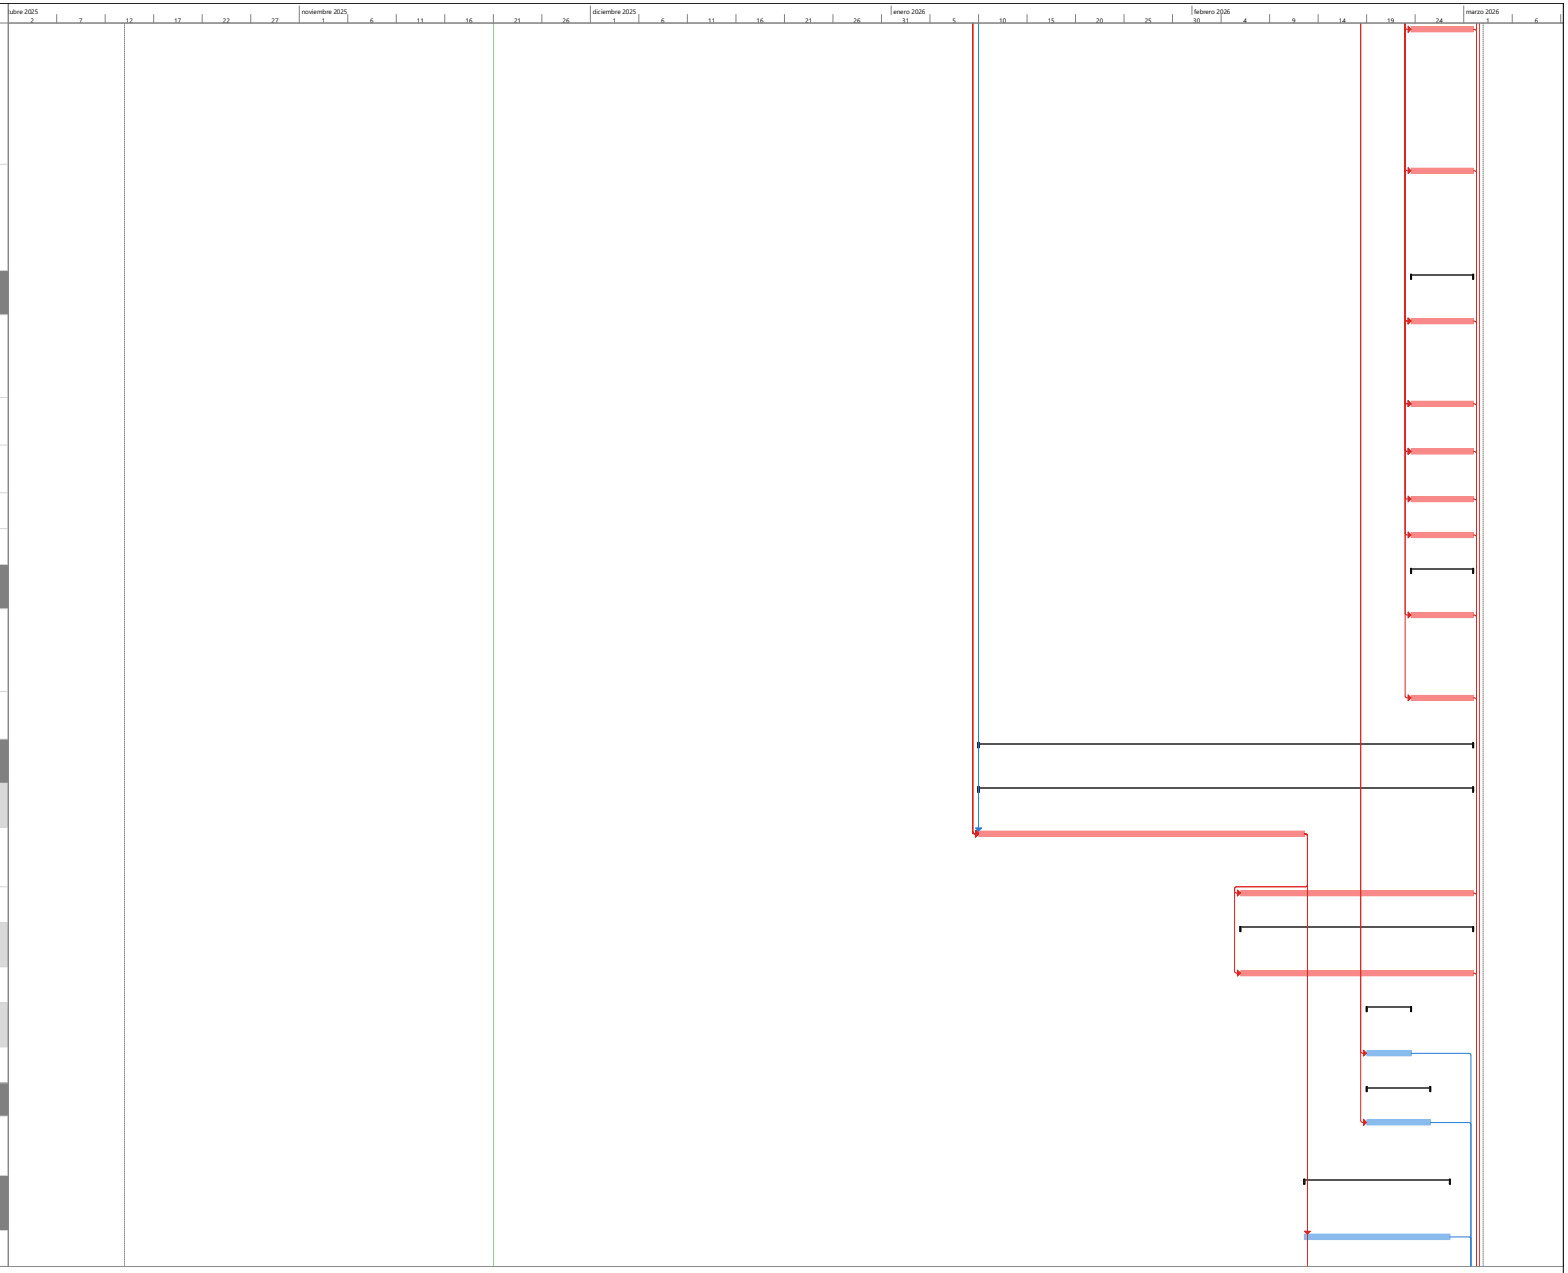

Proyecto: PROGRAMACION JAI
Fecha: vie 21/11/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración
86		16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	23.00	**$ 7.360.812,36**	12 días
87		**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 352.577,88**	5 días
88		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	81.01	**$ 352.577,88**	5 días
89			FIN			$ 0,00	0 días



Proyecto: PROGRAMACION JAI
Fecha: vie 21/11/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	UNIDAD	CANTIDAD	Costo
1			**CONTRATO DARIO ECHANDIA**	**166 días**			**$ 372.022.105,03**
2			ACTA DE INICIO	0 días			$ 0,00
3			ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	27 días			$ 0,00
4		**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**30 días**			**$ 15.479.368,19**
5		**1.2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**30 días**			**$ 15.479.368,19**
6		1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	30 días	M2	12.00	**$ 249.814,37**
7		1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	30 días	M2	439.44	**$ 15.076.143,10**
8		1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	30 días	UN	22.00	**$ 153.410,72**
9		**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**30 días**			**$ 194.001.347,78**
10		**2.5**	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**30 días**			**$ 194.001.347,78**
11		2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	30 días	KG	8,037.71	**$ 194.001.347,78**
12		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**18 días**			**$ 9.323.428,71**
13		5.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	18 días	M	76.65	**$ 1.088.805,76**
14		5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESOR	18 días	UN	22.00	**$ 4.155.789,37**
15		5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA, INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	18 días	UN	22.00	**$ 4.078.833,58**
16		**12**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10 días**			**$ 18.363.672,86**
17		**12.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10 días**			**$ 18.363.672,86**
18		12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	10 días	M2	364.14	**$ 8.238.952,58**
19		12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	10 días	M2	364.14	**$ 10.124.720,28**
20		**16**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11 días**			**$ 118.614.634,04**
21		16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	11 días	M	49.20	**$ 5.476.795,00**
22		16.1.2	CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE. INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	11 días	M	49.20	**$ 3.128.458,25**
23		16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	11 días	M	20.96	**$ 1.394.415,22**
24		16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE D	11 días	M2	439.44	**$ 108.614.965,57**
25		**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**75 días**			**$ 16.239.653,45**
26		18.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO	75 días	KG	**7,527.24**	**$ 16.239.653,45**

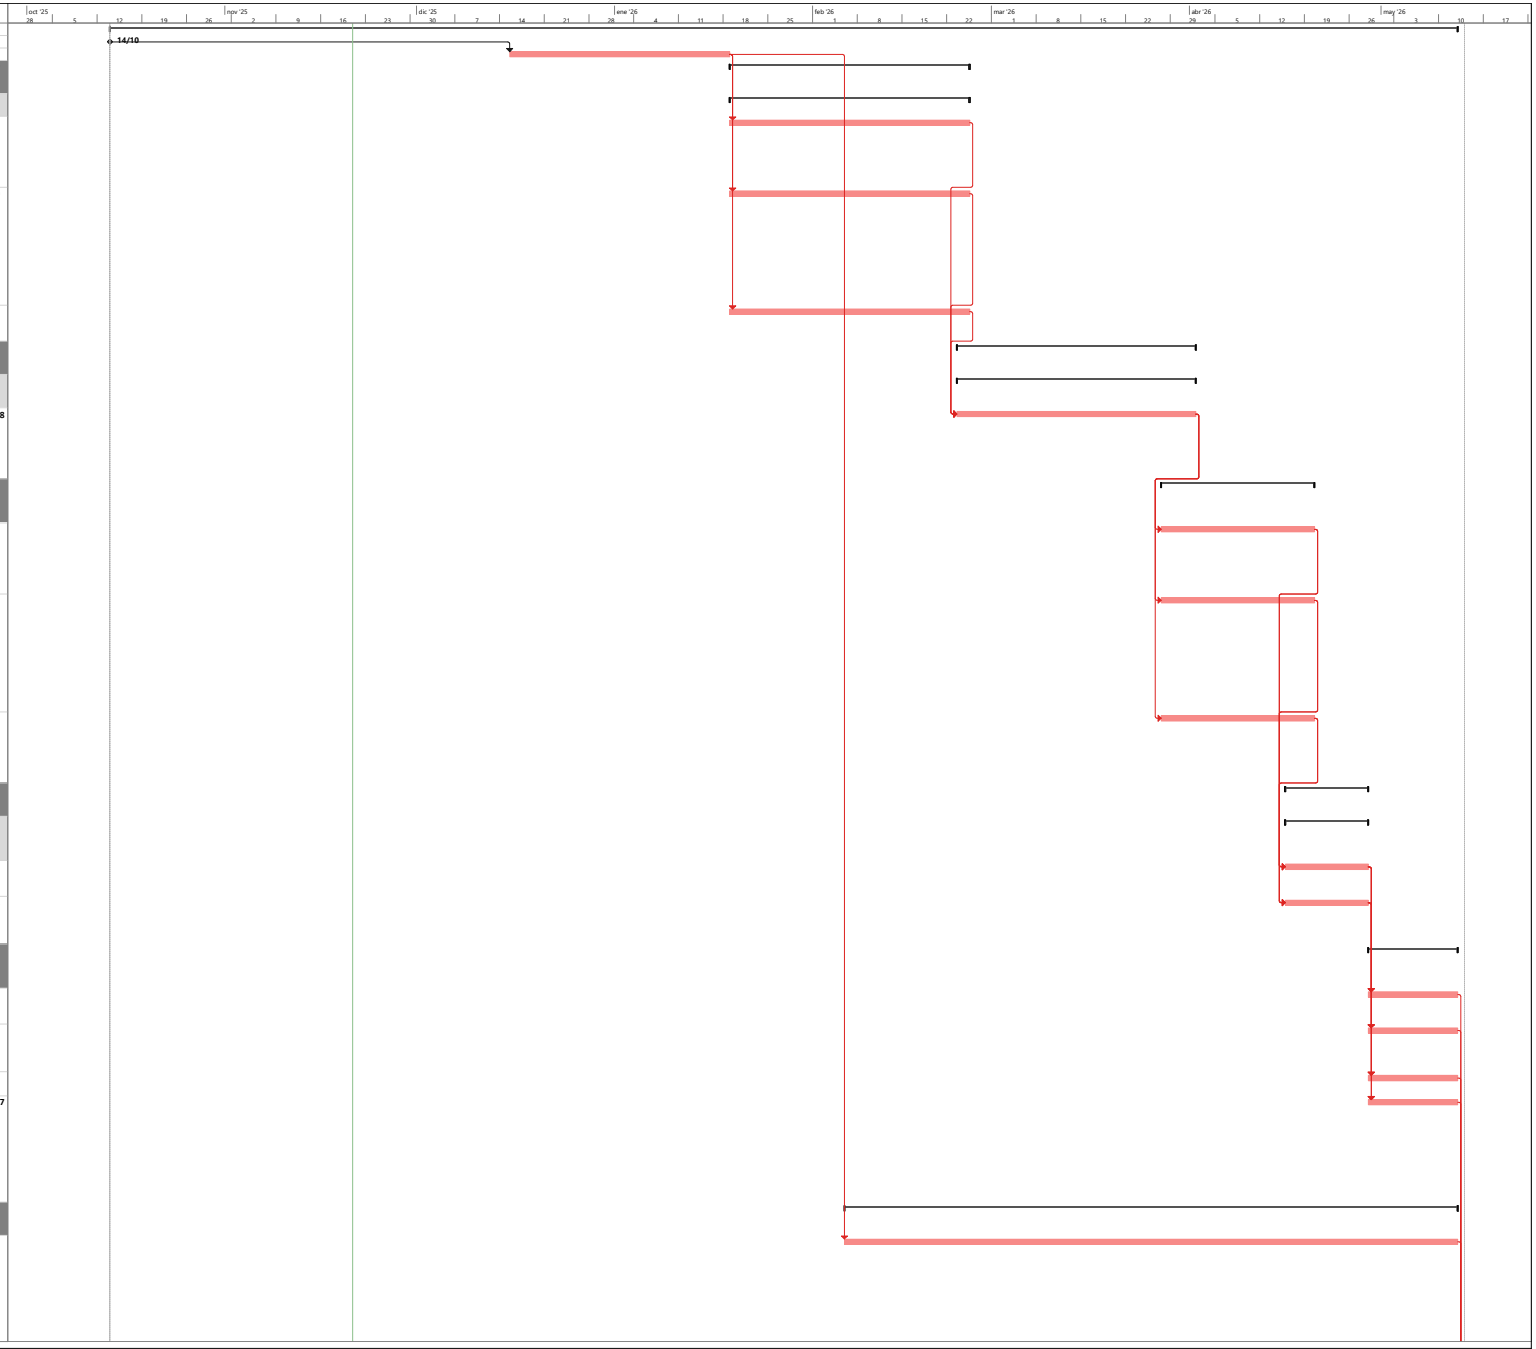

Proyecto: DARIO ECHANDIA V2
Fecha: vie 21/11/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	UNIDAD	CANTIDAD	Costo
27			FIN	0 días			$ 0,00

oct '25 | nov '25 | dic '25 | ene '26 | feb '26 | mar '26 | abr '26 | may '26

13/05

Proyecto: DARIO ECHANDIA V2
Fecha: vie 21/11/25

Tarea, División, Hito, Resumen, Resumen del proyecto, Tarea inactiva, Hito inactivo, Resumen inactivo, Tarea manual, solo duración, Informe de resumen manual, Resumen manual, solo el comienzo, solo fin, Tareas externas, Hito externo, Fecha límite, Tareas críticas, División crítica, Progreso, Progreso manual

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13-04-2026	Inicio	8:00 am	Fin		Lugar	
Asunto	Avance contractual / Verificacion Compromisos adquiridos Grupo 07						
Fecha de Elaboración	13-04-2026	Elaborado por	John Harry Arango Gutierrez			Próxima Reunión	

- <<Descripción de las actividades>>

FRENTES EJECUCION

- DARIO ECHANDIA
Sin Sobsanar observaciones presentadas el dia 06/04/2026
- JAIRO ANIBAL NIÑO
Entrega parcial de baños Reparcheo general de baños FDS 1ra y 2da NO.
- EQUIPO HUMANA.
Instalacion mobiliario aseo, reparchos pintura, instalacion divisiones baños FDS. Instalacion aparatos sanitarios.
- VILLAS DEL PROGRESO
Instalacion espejos, instalacion divisiones baños instalacion aparatos sanitarios generales
- EL PORVENIR
INSTALACION MESON ESPEJOS DIVISIONES DE BAÑOS, APARATOS SANITARIOS, REMATES GENERALES
- ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
INSTALACION MESON ESPEJOS, DIVISIONES DE BAÑOS, APARATOS SANITARIOS, REMATES GENERALES
- PARDO DE TARSO
ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA
- ELVIS LOPEZ DE MESA
INSTALACION MESON ESPEJOS DIVISIONES BAÑOS, APARATOS SANITARIOS, REMATES GENERALES, IMPERMEABILIZACION CUBIERTA
- NIEVES ECHANDIA.
INSTALACION BANCOS DE CERRAMIENTO
- ENTREGADAS:
- OSABER II SA OK
- EDUARDO MANOTAS OK
- EDUARDO MEDINA OK
- SAN RAFAEL OK
- OSABER II SA OK
- MARSELLA OK
- JOHN F KENNEDY OK
- SAN JOSE OK
- NICOLAS ESGUERRA OK, PENDIENTE DOCUMENTACION.
- BERNARDO JARAMILLO PENDIENTE PERMISOS

- <<Compromisos adquiridos>>

FECHAS APROXIMADAS ENTREGA

- ELVIS LOPEZ DE MESA: CUBIERTA 04/05/2026
BAÑOS 20/04/2026
- EDUARDO HUMAÑA: 20/04/2026
- JAIRO ANIBAL NIÑO: 20/04/2026
- PARDO DE TARSO: 20/04/2026

NOMBRE: John Harry Arango CARGO: DIR INTERVENTORIA	NOMBRE: Dir Obra CARGO: Wilve Rusty	NOMBRE: Nieves Martinez CARGO: Residente Interventoria
NOMBRE: CARGO:	NOMBRE: CARGO:	NOMBRE: CARGO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	28-04-2026	Inicio	8:00 am	Fin		Lugar	Colegio Dario Echandia
Asunto	Avance Contractual Grupo 07						
Fecha de Elaboración	28.04.2026	Elaborado por	John Harry Arango Gutierrez			Próxima Reunión	

- <<Descripción de las actividades>>

FRENTES DE EJECUCION

- DARIO ECHANDIA
FDS. ALTURAS GENERALES, INSTALACION CUBIERTA.
- JAIME ANIBAL NIÑO
FDS INSTALACION TARAS REFUERZO, INST CANALETAS Y MATALICA, BAÑOS 1ro Y 2do
- EDUARDO HUMAÑA
PTO ILUMINACION, FILTRACION
- VILLAS DE PROGRESO
PTO INSTALACION PUNTUAL
- EL PORVENIR
PTO EMBOQUILLADA MAMPOSTERIA
- ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
PTO ASEO GENERAL FILTRACION
- RADIO DE TARSO
2 OFC
INSTALACION CUBIERTA
- LUIS LOPEZ DE MESA
2 OFC
INSTALACION MUEBLE GRIS
- REYES ECHANDIA
PINTURA CERRAMIENTO

EMERGENCIAS

- ISABEL II SA PTO FALTA SEÑ
- ISABEL II SB OK
- CIUDAD MANDALA OK
- ORLANDO HIGUITA OK
- SAN RAFAEL PTE SHUT
- MARSELLA OK
- JOHN F KENNEDY OK
- NICOLAS ESGUERRA COLEGIO SED
- FERNANDO SARMIENTO PTO INICIO

- JUAN SANTIAGO PEREZ PTO DISEÑO SED
- SAN BERNARDINO PTO INICIO
- LLANOS ORIENTALES PTO PPTO, PROGRAMACION.
- ALFONSO LOPEZ PUMAREJO PTO PPTO, PROGRAMACION MP
- CARLOS PIZANO VISITA
- LOS ALMENDROS OK PT PPTO.

- <<Compromisos adquiridos>>

FECHAS PROXIMAS ENTREGAS:

- LUIS LOPEZ DE MESA & BAÑOS CUBIERTA: 04-05-2026
- EDUARDO HUMAÑA: 04.05.2026
- JAIME ANIBAL NIÑO: 04.05.2026
- RADIO DE TARSO: 04.05.2026

- REYES CEHALUDA 04-05-2026

NOMBRE: John Harry Arango
CARGO: Sup. Interventoria

NOMBRE: Paola Moreno
CARGO: Res. obra

NOMBRE: Jhoreg Martinez
CARGO: Residente Interventoria

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

FECHA:	21/03/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**53**	
CORTE DEL INFORME:	***21/03/2026***	

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	19	**DEL**	15-mar-26	**AL**	21-mar-26

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.8169111	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.8154784
Fecha de Iniciación	14/10/2025	**Fecha de Iniciación**	14/10/2025
Fecha de Terminación	13/05/2026	**Fecha de Terminación**	13/05/2026
Plazo Inicial	7 MESES	**Plazo Inicial**	7 MESES
Valor inicial	$ 880,146,577.00	**Valor inicial**	$ 2,975,834,553.00
Adiciones	$ 83,867,649.00	**Adiciones**	$ 523,987,595.00
Prorroga	N.A.	**Prorroga**	N.A.
Suspensión	N.A.	**Suspensión**	N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES
No.	**FRENTE**	PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	PROGRAMADO ACUM	EJECUTADO ACUM	DESVIACIÓN	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**
1	PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	65.00%	72.83%	70.00%	72.75%	2.75%	BAÑO: Instalacion de enchape, media cañas y instalación de tubería e instalación de piso en vinisol y pintura
2	PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	24.00%	20.64%	25.40%	20.64%	-4.76%	Cocina: Instalacion de piso, cambio de tuberias
3	EL PORVENIR	53.31%	61.11%	54.40%	56.62%	2.22%	BAÑO: instalacion de enchape, media cañas y instalación manto en cubierta
4	VILLAS DEL PROGRESO	62.80%	71.51%	65.34%	76.72%	11.38%	BAÑO Y CANCHA: Instalación de enchape, Fundicion de placa
5	PABLO DE TARSO	38.37%	37.30%	45.40%	76.86%	31.46%	Desmonte e instalación de cubierta
6	JAIRO ANIBAL NIÑO	53.20%	63.21%	54.76%	64.36%	9.60%	BAÑO Y SALONS DE PREESCOLAR: Instalación de enchape, media caña y piso
7	LUIS LOPEZ DE MESA	18.90%	29.82%	22.89%	26.07%	3.18%	BAÑO: Instalacion de manto de aluminio sobre cubierta y enchape
8	EDUARDO UMAÑA LUNA	64.30%	71.01%	66.34%	71.71%	5.37%	BAÑO: Instalacion de enchape
9	DARIO ECHANDIA	77.43%	92.62%	81.54%	92.72%	11.18%	CUBIERTA: Instalación de cubierta
10	LLANO ORIENTAL - ALFONSO REYES ECHANDIA						0
TOTALES		**50.81%**	**57.78%**	**54.01%**	**62.05%**	**8.04%**	

3. RESUMEN FINANCIERO

PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 261,167,046	$ 189,999,283	**$ 71,167,763**		0.00%	72.75%

PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 85,000,000	$ 17,546,978	**$ 67,453,022**		0.00%	20.64%

EL PORVENIR

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 110,086,654	$ 62,332,513	**$ 47,754,141**		0.30%	56.62%

VILLAS DEL PROGRESO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 166,676,454	$ 127,881,035	**$ 38,795,419**		5.20%	76.72%

PABLO DE TARSO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 189,976,713	$ 146,019,300	**$ 43,957,413**		39.56%	76.86%

JAIRO ANIBAL NIÑO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 203,141,470	$ 130,732,721	**$ 72,408,750**		1.10%	64.36%

LUIS LOPEZ DE MESA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 292,710,605	$ 76,309,686	**$ 216,400,918**		0.00%	26.07%

EDUARDO UMAÑA LUNA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 76,965,087	$ 55,190,934	**$ 21,774,152**		0.70%	71.71%

DARIO ECHANDIA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 795,148,175	$ 737,293,689	**$ 57,854,486**		0.10%	92.72%

FECHA:	21/03/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**53**	
CORTE DEL INFORME:	***21/03/2026***	

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	19	**DEL**	15-mar-26	**AL**	21-mar-26

EMERGENCIAS

BALANCE EMERGENCIAS	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 114,665,609	$ 98,869,449	**$ 15,796,160**		2.10%	86.22%

4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

OBSERVACIONES: Para la presente semana, se actualizo nuevamente el balance, lo que modifica valores y cantidades a nivel general.

RECOMENDACIONES:
- Mantener orden y aseo en la obras, así como la señalización
- Continuar con el uso correcto de EPP
- Apertura de más frentes de obra

CONCLUSIONES:
- Se avanzó en tres frentes de trabajo con actividades de cerramiento, demoliciones, desmontes, pañete, e Instalación de pisos, cubiertas, enchape.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

1. Se continua con avances en los frentes de obra en los siguientes colegios: Alfonso Lopez Michelsen, El Porvenir, Villas del progreso, Jairo Anibal Niño, Eduardo Umaña Luna , Luis Lopez de Mesa y Dario Echandia.

2. Se continua con avance en los frentes de obra en las emergencias en los siguientes colegios: Orlando Higuita.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente semana se continúa con el mismo personal aprobado a la fecha. Se evidenció la ejecución de actividades en los colegios, Luis López de Mesa, Alfonso López Michelsen, Villas del Progreso, El Porvenir, Jairo Aníbal Niño, Darío Echandía, Dario Echandia Sede B, Colegio Eduardo Uñama Luna, Colegio Pablo de Tarso.
Durante el periodo reportado, en el colegio Villas del Progreso se observó que el cerramiento del área de intervención fue desinstalado. Frente a esta situación, se informó oportunamente al contratista, quien manifestó que dicha acción no fue ejecutada por el consorcio. No obstante, se recomienda realizar la reposición inmediata del cerramiento perimetral, con el fin de controlar el acceso al área intervenida y prevenir posibles incidentes o afectaciones a la comunidad educativa.

Por otra parte, se evidencia que el personal asignado a las actividades de pintura en el colegio Eduardo Umaña Luna se encuentra utilizando adecuadamente los EPP y la dotación requerida. De igual manera, en los colegios Alfonso López Michelsen y Villas del Progreso se verifica el cumplimiento en el uso adecuado de EPP por parte del personal operativo. En el colegio Pablo de Tarso se observa que el área intervenida cuenta con la debida señalización, garantizando condiciones seguras en la zona de trabajo y permitiendo una adecuada delimitación del área de intervención.
En el colegio Luis López de Mesa, la inspectora SST realizó la entrega de EPP y equipos de protección contra caídas (EPCC) para la ejecución de trabajos en altura. Se observa la correcta instalación de la línea de vida, debidamente anclada a la estructura existente de la cubierta, como medida de control para mitigar el riesgo de caída. Adicionalmente, se evidenció la capacitación al personal operativo en los lineamientos de SST, fortaleciendo las condiciones seguras durante la ejecución de las actividades.
trabajadas: 44
Total de horas capacitación: 20 minutos
Número de accidentes de trabajo: 0
Número de días de incapacidad por AT:0
Número de días de incapacidad por enfermedad común: 0

REPORTE PERSONAL
DIRECTOR OBRA: 1 INSPECTORES SST: 1
RESIDENTE OBRA: 1 PERSONAL OPERATIVO: 49

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

IED Cultura Alfonso López Michelsen: Se realizo recorrido en el frente, se acopio los residuos de demolición adecuadamente (cubierto y señalizado), pero se recomienda realizar el retiro total de los RCD y implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).
IED Villas del progreso: Se realizo recorrido en el frente, se encuentran residuos de demolición acopiados y embalados adecuadamente, se recomendó al contratista disponer el material, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente
IED El Porvenir: Se realizo recorrido en el frente, presenta señalización en el frente de obra. Se acopio materiales de construcción y los residuos adecuadamente, al igual se recomienda realizar la disposición e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Jairo Aníbal Niño: Se realizo recorrido en el frente, se sigue reportando un volumen medio- alto respecto a los RCD en la parte del parqueadero de bicicletas acopiados adecuadamente, al igual se recomendó disponerlo, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Darío Echandía: Se realizo recorrido en el frente, se presenta el cerramiento adecuado, se evidencia materiales debidamente acopiados, se evidencian luminarias acopiadas en el aula 108, por lo que se recomienda realizar la disposición total de los residuos con los adecuados gestores, mantener orden en el frente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Eduardo Umaña Luna: Se realizo recorrido en el frente, se encuentra el cerramiento adecuado, el material de construcción y los RCD se encuentran acopiados adecuadamente, pero se recomienda disponerlo al igual que implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Pablo de torso: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con la debida señalización, se evidencia un volumen bajo de residuos, se recomendó disponerlos, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Luis López de mesa: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia gran volumen de residuos y material acopiados adecuadamente, por lo que se recomienda al contratista realizar la debida disposición adecuada ya que cuenta con la cantidad mínima para su recolección y garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente.

OTROS

ING JHONER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING HARRY ARANGO
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA:	21/03/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**53**	
CORTE DEL INFORME:	***21/03/2026***	

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA

Alfonso Lopez Michelsen



Pintura



Pintura



Pintura



Pintura

Alfonso Lopez Michelsen Cocina



Instalacion de piso



Instalacion de piso

	
Pintura	Instalacion de piso

El Porvenir

	
Pintura	Pintura

	
Pintura	Pintura
Villas del Progreso	
	
Pintura Pintura	Pintura
	
Pintura Pintura	Pintura
Jairo Anibal Niño	
	
Instalacion de piso	Instalacion de piso

	
Instalacion de piso	Instalacion de piso

Eduardo Umaña Luna

	
Pintura	Pintura
	
Pintura	Pintura

Dario Echandia	
	
Pintura	Pintura
	
Pintura	Pintura
Luis Lopez De Mesa	



Pintura



Pintura



Manto para cubierta



Manto para cubierta

Pablo de Tarso



Instalacion de estructura



Instalacion de estructura





Instalacion de estructura



Instalacion de estructura

FECHA: 21/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES 53 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			GRUPO	7
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154784	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDU 2025	
21/3/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169111	INTERVENTOR:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S	

TIPO DE INTERVENCION 17 ###	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
Alfonso Lopez Michelsen	Mejoramiento de baterias sanitarias y salones de preescolar	BAÑO: Instalacion de enchape, media cañas y instalación de tuberia e instalación de piso en vinisol y pintura		 	
Alfonso Lopez Michelsen Cocina	Mejoramiento de cocina	Cocina: Instalacion de piso, cambio de tuberias		 	
El Porvenir	Mejoramiento de cubierta y baterias sanitarias	BAÑO: instalacion de enchape, media cañas y instalación manto en cubierta		 	
Villas del Progreso	Mejoramiento de baterias y canchas sanitarias	BAÑO Y CANCHA: Instalación de enchape, Fundicion de placa		 	
Pablo de Tarso	Desmonte e instalación de cubierta	Desmonte e instalación de cubierta		 	
Jairo Anibal Niño	Mejoramiento de baterias sanitarias y pisos preescolar	BAÑO Y SALONS DE PREESCOLAR: Instalación de enchape, media caña y piso		 	
Luis Lopez de Mesa	Mejoramiento de baterias sanitarias	BAÑO: Instalacion de manto de aluminio sobre cubierta y enchape		 	
Eduardo Umaña	Mejoramiento de baterias sanitarias y cerramiento	BAÑO: Instalacion de enchape		 	
Dario Echandia	Desmonte e instalación de cubierta	CUBIERTA: Instalación de cubierta		 	

EMERGENCIA No. 1 Colegio Orlando Higuita						
EMERGENCIA No. 2 San Bernardino						
EMERGENCIA No. 3 Isabel II						
EMERGENCIA No. 4 Jhon F Kennedy						

EMERGENCIA No. 5 Marsella						
EMERGENCIA No. 6 Nelson Mandela						
EMERGENCIA No. 7 Bicentenario						
EMERGENCIA No. 8 San Jose						
EMERGENCIA No. 9 Nicolas Esguerra						

FECHA: 21/03/2026	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 53 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA		GRUPO 7
CORTE DEL INFORME: 21 de marzo de 2026	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO EDU 2025	
		CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169111	CO1.PCCNTR.8154784	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,278,928	$ 2,451,846,958
INICIO	14 de octubre de 2025	14 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ 83,867,649.00	$ 523,987,595.00
TERMINACION INICIAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	PRORROGAS			TOTAL	$ 880,146,577.00	$ 2,975,834,553.00
TERMINACION FINAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	TOTAL	211	211			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	05/12/2025	$ 83,867,649.00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	05/12/2025	$ 523,987,595.00		
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMENTO DESDE	CUMPLIMENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400-47	5 9 2025	5 10 2026	5 4 2026	5 4 2031	5 9 2025	5 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMENTO DESDE	CUMPLIMENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
895-47	14 10 2025	15 1 2027	14 10 2025	15 5 2027	14 10 2025	15 1 2027	895-74	5 4 2026	15 5 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (31082024)	PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	dic-2025	ene-2026	feb-2026	mar-2026	abr-2026	may-2026	jun-2026	jul-2026	ago-2026	sep-2026	oct-2026	nov-2026	dic-2026	ene-2027	feb-2027	mar-2027
751	PORTAL DEL SOL -	Bosa	A	Portal del Sol Alfonso Lopez Michelsen	72.83%	72.75%	70.00%		$ 261,167,045.68	$ 189,999,283	12/11/2025	09/04/2026																			
751	PORTAL DEL SOL -	Bosa	A	Portal del Sol Alfonso Lopez Michelsen	20.64%	20.64%	25.40%		$ 85,000,000.00	$ 17,546,978	11/01/2026	13/05/2026																			
742	EL PORVENIR	Bosa	B	El Recuerdo Santa Fe	51.11%	56.62%	54.46%		$ 110,086,654.11	$ 62,332,513	19/11/2025	30/03/2026																			
764	VILLAS DEL PROGRESO	Bosa	B	Enrique Dussel	71.51%	76.72%	85.34%		$ 186,876,454.24	$ 127,881,035	12/11/2025	09/04/2026																			
714	PABLO DE TARSO	Bosa	A	Pablo de Tarso	37.30%	76.85%	45.46%		$ 189,976,712.63	$ 146,019,300	19/11/2025	19/03/2026																			
836	JAIRO ANIBAL NIÑO	Kennedy	A	Patio Bonito I	63.21%	64.36%	64.76%		$ 203,141,470.45	$ 130,732,721	26/11/2025	19/03/2026																			
712	LUIS LOPEZ DE MESA	Bosa	A	Luis Lopez de Mesa	29.82%	26.07%	22.89%		$ 292,715,604.53	$ 76,309,686	11/12/2025	09/04/2026																			
814	EDUARDO UMAÑA LUNA	Kennedy	A	Dindalito	71.01%	71.71%	86.14%		$ 76,965,086.69	$ 55,190,934	19/11/2025	02/02/2026																			
833	DARIO ECHANDIA	Kennedy	B	Los Patios	92.62%	92.72%	81.54%		$ 795,148,174.67	$ 737,293,688	12/11/2025	26/03/2026																			
748	LLANO ORIENTAL -	Bosa	A	San José de Maryland San Pedro -					$ 135,987,595.00	$ -	14/10/2025	13/05/2026																			
	TOTAL FRENTES DE OBRA					62.08%	54.01%		$ 2,316,859,798	$ 1,543,306,140																					
	EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
747	LA LIBERTAD - ORLANDO	Bosa	A	Orlando Higuita - Holanda la Libertad	100.00%	97.97%	100.00%		$ 82,116,894	$ 80,447,215	19/11/2025	15/01/2026																			
729	SAN BERNARDINO	Bosa	A	San Bernardino	0.00%	0.00%	0.00%		$ 3,922,944	$ -	24/11/2025	31/12/2025																			
838	ISABEL II	Kennedy	B	Pio XII	100.00%	100.00%	100.00%		$ 1,998,374	$ 1,998,374	29/11/2025	19/12/2025																			
850	JOHN F. KENNEDY	Kennedy	A	John F. kennedy	100.00%	100.00%	100.00%		$ 1,992,384	$ 1,992,384	29/11/2025	12/12/2025																			
817	MARSELLA	Kennedy	A	Bas-Med. Marsella	100.00%	100.00%	100.00%		$ 4,787,213	$ 4,787,213	28/11/2025	18/12/2025																			
890	NELSON MANDELA	Kennedy	A	Compartir Tintal	100.00%	73.42%	70.00%		$ 12,103,257	$ 8,885,550	26/11/2025	16/01/2026																			
763	BICENTENARIO	Bosa	A	San José de Maryland	0.00%	0.00%	0%		$ 6,998,068	$ -	27/11/2025	16/01/2026																			
821	SAN JOSE	Bosa	B	El Descanso	100.00%	100.00%	100%		$ 778,713	$ 778,713																					
859	NACIONAL NICOLAS	Kennedy	A	Nicolas Esquerra																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	TOTAL FRENTES DE OBRA					71.42%	71.28%		$ 114,665,609	$ 98,869,449																					

ACUMULADO FRENTES DE OBRA

TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	9	0	9	$ 1,543,306,140
ACUMULADO EMERGENCIAS				
0	6	2	8	$ 98,869,449
TOTAL				
0	15	2	17	$ 1,642,175,589


FRENTES POR LOCALIDAD


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20	TOTAL OBRA	9		20		31			
10		21		10		21		32			
11		22		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	62.05%	0.00%	74.88%
PROGRAMADO	54.01%		
ATRASO	8.04%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			









OBSERVACIONES:

BALANCE SEMANAL POR CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS

		CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2026
GRUPOS	ITEM	CPF	751	IED		Alfonso Lopez Michelsen	SEMANA				
	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si es su defecto la SED no lo puede aportar).	M2	30.69	30.69	30.69	$ 4,435.43	$ 136,123.36	$ (21.73)	100.02%	100.02%	
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	3.79	3.79	3.79	$ 29,040.55	$ 110,063.69	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.01	34.22	34.22	$ 30,062.36	$ 1,028,734.01	$ 174,018.99	85.53%	85.53%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	450.72	450.72	450.72	$ 30,426.62	$ 13,713,897.10	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	113.46	113.46	113.46	$ 10,621.20	$ 1,205,080.81	$ (9.03)	100.00%	100.00%	
	1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	76.42	76.42	76.42	$ 28,815.57	$ 2,202,085.58	$ (0.00)	100.00%	100.00%	
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	123.57	123.57	123.57	$ 11,807.73	$ 1,459,080.75	$ 31.29	100.00%	100.00%	
	1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11.00	11.00	11.00	$ 19,332.69	$ 212,659.60	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10.80	8.64	8.64	$ 30,969.00	$ 267,631.62	$ 66,907.91	80.00%	80.00%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	18.00	18.00	18.00	$ 25,467.57	$ 458,416.20	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	5.00	5.00	5.00	$ 6,973.21	$ 34,866.07	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.01	34.22	34.22	$ 21,107.13	$ 722,286.03	$ 122,180.74	85.53%	85.53%	
	1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	1.60	1.60	1.60	$ 8,364.64	$ 13,383.43	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	18.00	18.00	18.00	$ 13,694.66	$ 246,503.87	$ -	100.00%	100.00%	
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	84.44	84.44	84.44	$ 20,392.00	$ 1,721,900.34	$ -	100.00%	100.00%	
	4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	27.38	27.38	27.38	$ 13,991.96	$ 383,099.91	$ -	100.00%	100.00%	
	4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	13.00	13.00	13.00	$ 59,307.81	$ 771,001.55	$ -	100.00%	100.00%	
	4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	11.00	11.00	11.00	$ 59,307.81	$ 652,385.92	$ -	100.00%	100.00%	
	4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/2"	UN	2.00	2.00	2.00	$ 201,917.88	$ 403,835.76	$ -	100.00%	100.00%	
	4.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN	2.00	2.00	2.00	$ 85,229.37	$ 170,458.73	$ -	100.00%	100.00%	
1	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	2.00	2.00	$ 118,468.31	$ 236,936.62	$ -	100.00%	100.00%	
	5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	5.00	5.00	5.00	$ 185,401.53	$ 927,007.63	$ -	100.00%	100.00%	
	7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	450.72	450.72	450.72	$ 39,814.42	$ 17,945,153.58	$ -	100.00%	100.00%	
	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	40.01	34.22	34.22	$ 42,278.54	$ 1,446,771.78	$ 244,733.58	85.53%	85.53%	
	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	40.01	34.22	34.22	$ 196,536.97	$ 6,725,495.26	$ 1,137,673.93	85.53%	85.53%	
	7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	12.00	12.00	12.00	$ 70,333.44	$ 844,001.34	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	450.72	450.72	450.72	$ 241,797.92	$ 108,983,157.06	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	116.40	116.40	116.40	$ 14,350.87	$ 1,670,440.94	$ (57.40)	100.00%	100.00%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	63.34	63.34	63.34	$ 76,716.07	$ 4,859,196.00	$ (0.00)	100.00%	100.00%	
	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	112.85	112.85	112.85	$ 108,436.36	$ 12,237,043.59	$ 59.64	100.00%	100.00%	
	9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	4.59			$ 853,515.01	$ -	$ 3,919,682.35	0.00%	0.00%	
	9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	7.92			$ 1,181,573.48	$ -	$ 9,358,061.97	0.00%	0.00%	
	10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	4.00			$ 721,070.81	$ -	$ 2,884,283.25	0.00%	0.00%	
	10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	11.00			$ 377,707.97	$ -	$ 4,154,787.65	0.00%	0.00%	
	10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00	4.00	4.00	$ 38,396.20	$ 153,584.81	$ -	100.00%	100.00%	
	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20,	M2	33.87			$ 923,559.19	$ -	$ 31,283,720.51	0.00%	0.00%	
	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80			$ 1,036,355.99	$ -	$ 1,865,440.78	0.00%	0.00%	
	12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	112.53	112.53	112.53	$ 38,464.50	$ 4,328,410.46	$ (63.47)	100.00%	100.00%	
	12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	66.93	66.93	66.93	$ 29,897.64	$ 2,001,049.05	$ -	100.00%	100.00%	
	12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	59.26	59.26	59.26	$ 26,897.83	$ 1,593,965.52	$ -	100.00%	100.00%	
	14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	7.92			$ 185,164.49	$ -	$ 1,466,502.74	0.00%	0.00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	30.69	30.69	30.69	$ 4,352.40	$ 133,575.16	$ (21.33)	100.02%	100.02%	
GRUPOS	ITEM	CPF	751	IED		Alfonso Lopez Michelsen Cocina	SEMANA				
	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.93	3.93	3.93	$ 30,062.36	$ 118,145.08	$ 72.15	99.94%	99.94%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.93	3.93	3.93	$ 30,426.62	$ 119,576.63	$ 73.02	99.94%	99.94%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2.00	2.00	2.00	$ 25,467.57	$ 50,935.13	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13.09	13.09	13.09	$ 21,107.13	$ 276,292.35	$ -	100.00%	100.00%	
	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	7.35	7.35	7.35	$ 85,501.22	$ 628,434.00	$ -	100.00%	100.00%	
	4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2.00	2.00	2.00	$ 71,024.47	$ 142,048.94	$ -	100.00%	100.00%	
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	4.00	4.00	4.00	$ 5,829.54	$ 23,318.15	$ -	100.00%	100.00%	
	5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	5.00			$ 534,497.49	$ -	$ 2,672,487.43	0.00%	0.00%	
	5.1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	127.73			$ 53,182.31	$ -	$ 6,792,908.92	0.00%	0.00%	
	5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°6 (T) AWG THHN	M	150.20			$ 83,551.35	$ -	$ 12,549,412.59	0.00%	0.00%	
	5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	30.00			$ 185,401.53	$ -	$ 5,562,045.79	0.00%	0.00%	
1	5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	2.00			$ 819,132.39	$ -	$ 1,638,264.79	0.00%	0.00%	
	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	13.09	13.09	13.09	$ 42,278.54	$ 553,426.14	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	12.60	12.60	12.60	$ 196,536.97	$ 2,476,365.88	$ (0.00)	100.00%	100.00%	
	7.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	90.50	90.50	90.50	$ 19,490.72	$ 1,763,909.67	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	22.42	22.42	22.42	$ 76,716.07	$ 1,719,974.33	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	131.64	131.64	131.64	$ 67,713.97	$ 8,913,587.98	$ -	100.00%	100.00%	
	10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	6.00	6.00	6.00	$ 31,338.62	$ 188,031.72	$ -	100.00%	100.00%	
	11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EYECTORA BARNES IC0027 VOLTAJE 220 TRIFASICA (360 GPM DESCARGA 3" 3HP)	UN	3.00			$ 6,591,038.86	$ -	$ 19,773,116.58	0.00%	0.00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	131.64	131.64	131.64	$ 4,352.40	$ 572,932.00	$ -	100.00%	100.00%	

	19.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMATICO CON 2 BOMBAS DE 2HP 110/220 TANQUE HIDRONEUMATICO POR MEMBRANA DE 200LTS, MARCA PEARL, TABLERO DE CONTROL CON NORMA RETIE (INCLUYE 2 BOMBAS ALTA PRESIÓN CAUDAL 2.33LPS H.MAQ 50MT 1 TANQUE HIDROACUMULADOR MEMBRANA 200LTS VERTICAL CON MANOMETRO ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN ENTRE BOMBAS Y TANQUE EN HIERRO GALVANIZADO (HG), 1 FLAUTA DE DESCARGA EN 3" INCLUYE COPA DE DESCARGA 3 A 2, 2 REGISTROS EN BRONCE TIPO COMPUERTA, 2 VÁLVULAS CHEQUE HIDRONEUMATICO EN BRONCE, 1 TABLERO DE CONTROL EN COFRE METÁLICO CON NORMA RETIE 2- PRESOSTATOS RANGO 40/60, 1 SENSOR DE NIVEL (FLOTADOR), 1 MANOMETRO EN GLICERINA CON CARATULA DE 2" (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	UN	1.00			$ 18,464,640.51	$ -	$ 18,464,640.51	0.00%	0.00%	

	ITEM	CPF	742	IED	El Porvenir				SEMANA				
	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	7.75	7.75	7.75	$ 29,040.55	$ 225,064.28	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	58.31	58.31	58.31	$ 30,426.62	$ 1,774,176.45	$ 121.71	99.99%	99.99%	
	1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2.97	2.97	2.97	$ 20,817.86	$ 61,829.06	$ (33.31)	100.05%	100.05%	
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	106.35	106.35	106.35	$ 10,621.20	$ 1,129,564.11	$ 42.48	100.00%	100.00%	
	1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	63.15	63.15	63.15	$ 28,815.57	$ 1,819,703.02	$ 0.00	100.00%	100.00%	
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	106.35	106.35	106.35	$ 11,807.73	$ 1,255,751.70	$ 47.23	100.00%	100.00%	
	1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	10.00	10.00	10.00	$ 19,332.69	$ 193,326.91	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.75	10.97	10.97	$ 30,969.00	$ 339,822.84	$ 55,124.82	86.04%	86.04%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	24.00	24.00	24.00	$ 25,467.57	$ 611,221.59	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4.00	4.00	4.00	$ 6,973.21	$ 27,892.86	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	24.00	24.00	24.00	$ 13,694.66	$ 328,671.82	$ -	100.00%	100.00%	
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	97.49	97.49	97.49	$ 20,392.00	$ 1,988,015.92	$ -	100.00%	100.00%	
	2.3.7	PERFORACIÓN NÚCLEO 3" E= 0.10 M	UN	2.00	2.00	2.00	$ 162,040.52	$ 324,081.04	$ -	100.00%	100.00%	
	3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	2.44	2.44	2.44	$ 68,498.74	$ 167,383.52	$ -	100.00%	100.00%	
	2.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	5.50	5.50	5.50	$ 85,501.22	$ 470,256.73	$ -	100.00%	100.00%	
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	100.00	100.00	100.00	$ 5,829.54	$ 582,953.76	$ -	100.00%	100.00%	
	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	2.00	2.00	$ 118,468.31	$ 236,936.62	$ -	100.00%	100.00%	
	5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00	4.00	4.00	$ 211,513.25	$ 846,052.99	$ -	100.00%	100.00%	
2	5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA, INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	4.00	4.00	4.00	$ 185,401.53	$ 741,606.11	$ -	100.00%	100.00%	
	7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	57.35	57.35	57.35	$ 65,046.28	$ 3,730,404.34	$ -	100.00%	100.00%	
	7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	30.30	30.30	30.30	$ 26,316.62	$ 797,393.56	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	52.48	52.48	52.48	$ 14,350.87	$ 753,133.51	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	72.85	72.85	72.85	$ 76,716.07	$ 5,588,535.70	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	44.37	44.37	44.37	$ 67,713.97	$ 3,004,360.49	$ -	100.00%	100.00%	
	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	106.35	106.35	106.35	$ 108,436.36	$ 11,532,640.97	$ (433.75)	100.00%	100.00%	
	9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	4.51			$ 853,515.01	$ -	$ 3,849,352.71	0.00%	0.00%	
	9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	5.09			$ 1,181,573.48	$ -	$ 6,011,845.87	0.00%	0.00%	$ 400,789.72
	10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	4.00			$ 721,070.81	$ -	$ 2,884,283.25	0.00%	0.00%	
	10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	10.00			$ 377,707.97	$ -	$ 3,777,079.68	0.00%	0.00%	
	10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	5.00	5.00	5.00	$ 38,396.20	$ 191,981.02	$ -	100.00%	100.00%	
	10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	12.00	12.00	6.00	$ 948,374.57	$ 11,380,494.82	$ -	100.00%	100.00%	
	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	9.00			$ 923,559.19	$ -	$ 8,312,032.73	0.00%	0.00%	
	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2.70			$ 1,036,355.99	$ -	$ 2,798,161.17	0.00%	0.00%	
	12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	106.35	106.35	106.35	$ 38,464.50	$ 4,090,853.69	$ -	100.00%	100.00%	
	12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	68.62	68.62	68.62	$ 29,897.64	$ 2,051,683.69	$ -	100.00%	100.00%	
	12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	30.00	30.00	30.00	$ 26,897.83	$ 806,934.96	$ -	100.00%	100.00%	
	14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	4.68			$ 185,164.49	$ -	$ 866,569.80	0.00%	0.00%	
	16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	58.00	58.00	58.00	$ 86,678.38	$ 5,027,346.09	$ -	100.00%	100.00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	100.64	58.00	58.00	$ 4,352.40	$ 252,439.20	$ 185,586.34	57.63%	57.63%	

	ITEM	CPF	764	IED	Villas del Progreso				SEMANA				
	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	43.80	43.80	43.80	$ 29,040.55	$ 1,271,976.18	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13.80	13.80	13.80	$ 30,426.62	$ 419,887.41	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	63.53	63.53	63.53	$ 10,621.20	$ 674,764.53	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	27.20	27.20	27.20	$ 28,815.57	$ 783,783.41	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	63.53	63.53	63.53	$ 11,807.73	$ 750,144.86	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8.00	8.00	8.00	$ 19,332.69	$ 154,661.53	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.68	7.68	7.68	$ 30,969.00	$ 237,841.92	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5.00	5.00	5.00	$ 25,467.57	$ 127,337.83	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	20.00	20.00	20.00	$ 19,332.69	$ 386,653.82	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	2.00	2.00	2.00	$ 6,973.21	$ 13,946.43	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	8.00	8.00	8.00	$ 13,694.66	$ 109,557.27	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.44	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13.80	13.80	13.80	$ 97,993.28	$ 1,352,307.29	$ -	100.00%	100.00%	
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	29.10	29.10	29.10	$ 20,392.00	$ 593,407.15	$ -	100.00%	100.00%	
	1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	84.00	84.00	84.00	$ 17,444.42	$ 1,465,331.21	$ -	100.00%	100.00%	
	1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	21.00	21.00	21.00	$ 36,375.35	$ 763,882.36	$ -	100.00%	100.00%	
	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	44.69	44.69	44.69	$ 96,359.46	$ 4,306,304.16	$ -	100.00%	100.00%	
	2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	41.16	41.16	41.16	$ 22,734.26	$ 935,742.11	$ -	100.00%	100.00%	
	2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM. DE 0.15 X 0.15 M	KG	837.41	837.41	837.41	$ 7,440.60	$ 6,230,828.83	$ -	100.00%	100.00%	
	3.2.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	M	3.20	3.20	3.20	$ 40,900.51	$ 130,881.62	$ -	100.00%	100.00%	
	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	56.00	56.00	56.00	$ 85,501.22	$ 4,788,068.54	$ -	100.00%	100.00%	
	4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	10.00	10.00	10.00	$ 47,726.41	$ 477,264.10	$ -	100.00%	100.00%	
	4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	8.00	8.00	8.00	$ 121,102.52	$ 968,820.13	$ -	100.00%	100.00%	
	4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	18.60	18.60	18.60	$ 13,991.96	$ 260,250.49	$ -	100.00%	100.00%	

4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7.00	7.00	7.00	$ 59,307.81	$ 415,154.68	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	8.00	8.00	8.00	$ 59,307.81	$ 474,462.49	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	6.00	6.00	6.00	$ 169,748.96	$ 1,018,493.74	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	2.00	2.00	2.00	$ 90,824.54	$ 181,649.09	$ -	100.00%	100.00%	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	3.00	3.00	3.00	$ 64,414.18	$ 193,242.54	$ -	100.00%	100.00%	
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	3.00	3.00	3.00	$ 71,024.47	$ 213,073.42	$ -	100.00%	100.00%	
4.7.8	RENIVELACIÓN DE CAJAS DE INSPECCION	UN	1.00	1.00	1.00	$ 78,661.93	$ 78,661.93	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	60.00	60.00	60.00	$ 5,829.54	$ 349,772.26	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.13	SUSPENSION DE SALIDA SANITARIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8.00	8.00	8.00	$ 30,698.48	$ 245,587.85	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	2.00	2.00	2.00	$ 118,468.31	$ 236,936.62	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	2.00	2.00	2.00	$ 185,401.53	$ 370,803.05	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	13.80	13.80	13.80	$ 42,278.54	$ 583,443.91	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.8	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALLANADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) E= 10 CM	M2	401.60	401.60	401.60	$ 143,272.97	$ 57,538,425.88	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.9	JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	365.00	365.00	365.00	$ 36,001.71	$ 13,140,625.46	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	13.80	13.80	13.80	$ 196,536.97	$ 2,712,210.25	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	4.92	4.92	4.92	$ 70,333.44	$ 346,040.55	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	30.20	30.20	30.20	$ 14,350.87	$ 433,396.19	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	387.00	387.00	387.00	$ 19,237.61	$ 7,444,954.30	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	32.67	32.67	32.67	$ 76,716.07	$ 2,506,314.07	$ -	100.00%	100.00%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	63.76	63.76	63.76	$ 108,436.36	$ 6,913,902.52	$ -	100.00%	100.00%	
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	4.18			$ 853,515.01	$ -	$ 3,564,278.70	0.00%	0.00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	1.18			$ 1,181,573.48	$ -	$ 1,391,420.93	0.00%	0.00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			$ 721,070.81	$ -	$ 1,442,141.63	0.00%	0.00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	8.00			$ 377,707.97	$ -	$ 3,021,663.74	0.00%	0.00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00	4.00	4.00	$ 38,396.20	$ 153,584.81	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	8.00	8.00	8.00	$ 31,338.62	$ 250,708.95	$ -	100.00%	100.00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	17.04			$ 923,559.19	$ -	$ 15,737,448.63	0.00%	0.00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2.16			$ 1,036,355.99	$ -	$ 2,238,528.94	0.00%	0.00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	63.76	63.76	63.76	$ 38,464.50	$ 2,452,496.67	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	14.25	14.25	14.25	$ 29,897.64	$ 426,049.14	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	14.07	14.07	14.07	$ 18,044.38	$ 253,830.30	$ -	100.00%	100.00%	
12.3.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	1.80			$ 23,132.00	$ -	$ 41,637.60	0.00%	0.00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	2.21			$ 185,164.49	$ -	$ 408,843.19	0.00%	0.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	416.78	400.60	400.60	$ 4,352.40	$ 1,743,571.44	$ 70,436.63	96.12%	96.12%	

ITEM	CPF	714	IED	Pablo de Tarso			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar).	M2	151.50	151.50	151.50	$ 4,435.43	$ 671,967.71	$ -	100.00%	100.00%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	15.30	15.30	15.30	$ 29,040.55	$ 444,320.45	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	37.88	37.88	37.88	$ 28,054.90	$ 1,062,719.64	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERIA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	156.26	156.26	156.26	$ 34,307.63	$ 5,360,909.58	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4.00	4.00	4.00	$ 6,973.21	$ 27,892.86	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	8.00	8.00	8.00	$ 8,364.64	$ 66,917.15	$ -	100.00%	100.00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	1,268.93	50.00	50.00	$ 6,772.33	$ 338,616.72	$ 8,255,001.57	3.94%	3.94%	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	4,608.04	4147.24	4147.24	$ 24,136.40	$ 100,099,366.64	$ 11,122,137.39	90.00%	90.00%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	170.00	35.00	35.00	$ 9,730.63	$ 340,571.95	$ 1,313,634.67	20.59%	20.59%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.80	6.80	6.80	$ 13,991.96	$ 95,145.34	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	5.00	5.00	5.00	$ 5,234.93	$ 26,174.66	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	4.00	4.00	4.00	$ 185,401.53	$ 741,606.11	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	108.54	108.54	108.54	$ 22,625.78	$ 2,455,802.60	$ (113.13)	100.00%	100.00%	
13.1.4	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL 6 MM UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN ÁREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA HASTA 60 CM)	M	37.88	37.88	37.88	$ 84,841.00	$ 3,213,777.02	$ 0.00	100.00%	100.00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	17.70	17.70	17.70	$ 111,316.98	$ 1,970,310.59	$ 0.00	100.00%	100.00%	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm, PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	150.66	59.66	59.66	$ 247,166.77	$ 14,745,969.47	$ 22,492,176.03	39.60%	39.60%	
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	32.50	32.50	32.50	$ 202,701.31	$ 6,587,792.64	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	59.66	59.66	59.66	$ 4,352.40	$ 259,664.18	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	2,133.00	2,133.00	2,133.00	$ 3,520.76	$ 7,509,774.25	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	836	IED	Jairo Anibal Niño			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	3.80	3.80	3.80	$ 29,040.55	$ 110,354.10	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	207.43	207.43	207.43	$ 30,426.62	$ 6,311,394.62	$ 12.17	100.00%	100.00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6.84	6.84	6.84	$ 20,817.86	$ 142,394.19	$ (0.00)	100.00%	100.00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	168.45	168.45	168.45	$ 10,621.20	$ 1,789,140.33	$ 32.29	100.00%	100.00%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	120.31	120.31	120.31	$ 28,815.57	$ 3,466,800.79	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	168.45	168.45	168.45	$ 11,807.73	$ 1,989,011.51	$ 35.90	100.00%	100.00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	20.00	20.00	20.00	$ 19,332.69	$ 386,653.82	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	25.17	21.05	21.05	$ 30,969.00	$ 651,897.45	$ 127,697.57	83.62%	83.62%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.04			$ 27,437.53	$ -	$ 83,341.50	0.00%	0.00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	40.00	40.00	40.00	$ 25,467.57	$ 1,018,702.66	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12.25	12.25	12.25	$ 8,364.64	$ 102,466.88	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	31.00	31.00	31.00	$ 13,694.66	$ 424,534.44	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	121.96	121.96	121.96	$ 20,392.00	$ 2,487,008.12	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	8.00	8.00	8.00	$ 19,766.59	$ 158,132.74	$ -	100.00%	100.00%	

4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	4.25	4.25	4.25	$ 13,991.96	$ 59,465.84	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	13.00	13.00	13.00	$ 59,307.81	$ 771,001.55	$ -	100.00%	100.00%	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	5.00	5.00	5.00	$ 64,414.18	$ 322,070.90	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERIA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00			$ 118,468.31	$ -	$ 592,341.55	0.00%	0.00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	207.43	207.43	207.43	$ 39,814.42	$ 8,258,704.31	$ 15.93	100.00%	100.00%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	1.35	1.35	1.35	$ 196,536.97	$ 265,324.92	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	207.43	207.43	207.43	$ 241,797.92	$ 50,156,141.88	$ 96.72	100.00%	100.00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	90.30	90.30	90.30	$ 14,350.87	$ 1,295,883.31	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	118.39	98.30	98.30	$ 76,716.07	$ 7,541,189.68	$ 1,541,225.89	83.03%	83.03%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	53.42	16.03	16.03	$ 67,713.97	$ 1,085,151.57	$ 2,532,020.34	30.00%	30.00%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	191.29	184.50	184.50	$ 108,436.36	$ 20,006,509.01	$ 736,445.56	96.45%	96.45%	
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	9.02	3.97	3.97	$ 660,241.67	$ 2,621,159.43	$ 3,332,899.95	44.02%	44.02%	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS; CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	3.04			$ 448,682.89	$ -	$ 1,362,874.28	0.00%	0.00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	8.17	2.45	2.45	$ 1,181,573.48	$ 2,894,855.03	$ 6,760,963.46	29.98%	29.98%	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	6.00	6.00	6.00	$ 815,394.69	$ 4,892,368.12	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	5.00			$ 575,810.47	$ -	$ 2,879,052.34	0.00%	0.00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00			$ 721,070.81	$ -	$ 2,163,212.44	0.00%	0.00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH. ACOPLE Y SIFÓN)	UN	16.00			$ 377,707.97	$ -	$ 6,043,327.49	0.00%	0.00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	10.00			$ 38,396.20	$ -	$ 383,962.03	0.00%	0.00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	7.00			$ 31,338.62	$ -	$ 219,370.33	0.00%	0.00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	15.64	4.06	4.06	$ 923,559.19	$ 3,749,650.32	$ 10,698,509.68	25.95%	25.95%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2.70			$ 1,036,355.99	$ -	$ 2,798,161.17	0.00%	0.00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	191.29	184.50	184.50	$ 38,464.50	$ 7,096,700.69	$ 261,231.67	96.45%	96.45%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	21.19			$ 11,692.56	$ -	$ 247,718.47	0.00%	0.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	72.64			$ 29,897.64	$ -	$ 2,171,863.23	0.00%	0.00%	
12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	72.64			$ 26,897.83	$ -	$ 1,953,947.28	0.00%	0.00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	10.22	3.07	3.07	$ 185,164.49	$ 567,936.52	$ 1,325,185.21	30.00%	30.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	60.77	25.30	25.30	$ 4,352.40	$ 110,115.72	$ 154,383.26	41.63%	41.63%	

ITEM	CPF	712	IED	Luis Lopez de Mesa			SEMANA				
Item	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance fisico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	7.80	7.80	7.80	$ 29,040.55	$ 226,516.31	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	701.99	701.99	701.99	$ 30,062.36	$ 21,103,477.22	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56.41	56.41	56.41	$ 10,621.20	$ 599,105.51	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	32.84	32.84	32.84	$ 28,815.57	$ 946,303.20	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56.41	56.41	56.41	$ 11,807.73	$ 666,033.70	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	6.00	6.00	6.00	$ 19,332.69	$ 115,996.15	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	12.00	12.00	12.00	$ 25,467.57	$ 305,610.80	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4.00	4.00	4.00	$ 5,207.00	$ 20,828.00	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	701.99	701.99	701.99	$ 16,844.46	$ 11,824,640.79	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.38	DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	14.80	14.80	14.80	$ 8,364.64	$ 123,796.72	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	8.00	8.00	8.00	$ 13,694.66	$ 109,557.27	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	74.56	74.56	74.56	$ 20,392.00	$ 1,520,427.40	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	1.50	1.50	1.50	$ 47,726.41	$ 71,589.61	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	1.60	1.60	1.60	$ 21,103.11	$ 33,764.98	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	18.66	18.66	18.66	$ 13,991.96	$ 261,090.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	8.00	8.00	8.00	$ 59,307.81	$ 474,462.49	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	5.00	5.00	5.00	$ 59,307.81	$ 296,539.06	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	2.00	2.00	2.00	$ 90,824.54	$ 181,649.09	$ -	100.00%	100.00%	
4.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN	1.00	1.00	1.00	$ 121,077.02	$ 121,077.02	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	56.00	8.00	8.00	$ 5,829.54	$ 46,636.30	$ 279,817.86	14.29%	14.29%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERIA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	1.00	1.00	$ 118,468.31	$ 118,468.31	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	4.00	4.00	4.00	$ 185,401.53	$ 741,606.11	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	701.99	158.95	158.95	$ 65,046.28	$ 10,339,106.71	$ 35,322,733.63	22.64%	22.64%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	113.76	90.32	90.32	$ 26,316.62	$ 2,376,917.05	$ 616,861.55	79.40%	79.40%	
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	0.95	0.95	0.95	$ 70,333.44	$ 66,816.77	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	50.09	50.09	50.09	$ 14,350.87	$ 718,834.94	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	46.90	46.90	46.90	$ 76,716.07	$ 3,597,983.78	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	23.66	23.66	23.66	$ 67,713.97	$ 1,602,112.52	$ -	100.00%	100.00%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	47.61	47.61	47.61	$ 108,436.36	$ 5,162,449.22	$ 206.03	100.00%	100.00%	
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	2.32	2.32	2.32	$ 489,874.00	$ 1,136,752.62	$ -	100.00%	100.00%	
9.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	1.60			$ 698,853.48	$ -	$ 1,118,584.89	0.00%	0.00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	4.79			$ 1,181,573.48	$ -	$ 5,663,754.33	0.00%	0.00%	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	6.00			$ 815,394.69	$ -	$ 4,892,368.12	0.00%	0.00%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			$ 575,810.47	$ -	$ 1,151,620.93	0.00%	0.00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH. ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			$ 377,707.97	$ -	$ 1,888,539.84	0.00%	0.00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	1.00	1.00	1.00	$ 38,396.20	$ 38,396.20	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2.00			$ 31,338.62	$ -	$ 62,677.24	0.00%	0.00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	8.51			$ 923,559.19	$ -	$ 7,861,335.84	0.00%	0.00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.44			$ 1,036,355.99	$ -	$ 1,492,352.63	0.00%	0.00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	58.63	58.63	58.63	$ 38,464.50	$ 2,255,173.78	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	25.11	25.11	25.11	$ 29,897.64	$ 750,819.43	$ -	100.00%	100.00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	0.55			$ 185,164.49	$ -	$ 101,840.47	0.00%	0.00%	
16.1.4	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	701.99	91.09	91.09	$ 86,678.38	$ 7,895,533.71	$ 52,951,822.83	12.98%	12.98%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	727.10	105.60	105.60	$ 4,352.40	$ 459,613.44	$ 2,705,016.60	14.52%	14.52%	
19.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR DE PASAJEROS MEDIA CABINA USO PARA PERSONAS CON DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD Y PASAJEROS, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 500 KG CARGA VIVA Y TOTAL CON CABINA 890 KG APROX, 2 PARADAS, FOSO CON MEDIDAS 1.60M DE ANCHO X 1.60M DE FONDO APROX.; POSO CON MEDIDAS 1.60M DE ANCHO X 1.60M DE FONDO X 1.00M DE ALTURA APROX., MEDIDAS DE CABINA: 1.50 M DE ANCHO X 1.20M DE FONDO X 1.60M DE ALTURA, PARA EL COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA	UN	1.27			$ 76,917,022.98	$ -	$ 97,684,619.18	0.00%	0.00%	

ITEM	CPF	814	IED	Eduardo Umaña Luna			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas. si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	21.76	21.76	21.76	$ 4,435.43	$ 96,514.97	$ (0.00)	100.00%	100.00%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico	M	6.40	6.40	6.40	$ 29,040.55	$ 185,859.53	$ (0.00)	100.00%	100.00%	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.21	3.21	3.21	$ 30,062.36	$ 96,644.48	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1.89	1.89	1.89	$ 20,817.86	$ 39,345.76	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	66.41	66.41	66.41	$ 10,621.20	$ 705,300.47	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20.97	20.97	20.97	$ 28,815.57	$ 604,262.43	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	69.88	69.88	69.88	$ 11,807.73	$ 825,147.54	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5.00	5.00	5.00	$ 19,332.69	$ 96,663.46	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6.80	6.80	6.80	$ 30,969.00	$ 210,589.20	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11.00	11.00	11.00	$ 25,467.57	$ 280,143.23	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	3.00			$ 6,973.21	$ -	$ 20,919.64	0.00%	0.00%	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA CONVENCIONAL GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.21	3.21	3.21	$ 21,107.13	$ 67,753.89	$ 101.31	99.85%	99.85%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	10.50	10.50	10.50	$ 8,364.64	$ 87,828.75	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	5.00	5.00	5.00	$ 13,694.66	$ 68,473.30	$ -	100.00%	100.00%	
1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2	549.44	549.44	549.44	$ 50,276.25	$ 27,623,780.82	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	46.09	46.09	46.09	$ 20,392.00	$ 939,867.21	$ (0.00)	100.00%	100.00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	7.00	7.00	7.00	$ 36,375.35	$ 254,627.45	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE REFUERZO	M	0.95			$ 101,698.85	$ -	$ 96,613.91	0.00%	0.00%	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	3.74	3.74	3.74	$ 68,498.74	$ 256,185.29	$ 205.50	99.92%	99.92%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	1.00	1.00	1.00	$ 85,501.22	$ 85,501.22	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	2.00	2.00	2.00	$ 47,726.41	$ 95,452.82	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	48.00	48.00	48.00	$ 13,991.96	$ 671,614.16	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7.00	7.00	7.00	$ 59,307.81	$ 415,154.68	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	5.00	5.00	5.00	$ 59,307.81	$ 296,539.06	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	1.00	1.00	1.00	$ 169,748.96	$ 169,748.96	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	2.00	2.00	2.00	$ 90,824.54	$ 181,649.09	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	3.00	3.00	3.00	$ 170,346.24	$ 511,038.72	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	44.00	44.00	44.00	$ 5,829.54	$ 256,499.65	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.13	SUSPENSION DE SALIDA SANITARIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1.00			$ 30,698.48	$ -	$ 30,698.48	0.00%	0.00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00			$ 118,468.31	$ -	$ 118,468.31	0.00%	0.00%	
5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00			$ 211,513.25	$ -	$ 211,513.25	0.00%	0.00%	
5.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	2.00			$ 180,924.58	$ -	$ 361,849.16	0.00%	0.00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	3.21	3.21	3.21	$ 42,278.54	$ 135,714.13	$ 202.94	99.85%	99.85%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	3.21	3.21	3.21	$ 196,536.97	$ 631,827.07	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	1.80	1.80	1.80	$ 70,333.44	$ 126,600.20	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	24.70	24.70	24.70	$ 14,350.87	$ 354,466.42	$ (0.00)	100.00%	100.00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	37.48	37.48	37.48	$ 76,716.07	$ 2,875,318.36	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	24.15	20.15	20.15	$ 67,713.97	$ 1,364,436.49	$ 270,950.68	83.43%	83.43%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	72.77	72.77	72.77	$ 108,436.36	$ 7,890,914.15	$ 0.00	100.00%	100.00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ANGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.73			$ 1,181,573.48	$ -	$ 3,225,695.60	0.00%	0.00%	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4 " Y SELLANTE)	UN	5.00			$ 815,394.69	$ -	$ 4,076,973.43	0.00%	0.00%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			$ 575,810.47	$ -	$ 1,151,620.93	0.00%	0.00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			$ 377,707.97	$ -	$ 1,888,539.84	0.00%	0.00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00	2.00	2.00	$ 38,396.20	$ 76,792.41	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2.00	1.00	1.00	$ 31,338.62	$ 31,338.62	$ 31,338.62	50.00%	50.00%	
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	1.00	1.00	1.00	$ 948,374.57	$ 948,374.57	$ -	100.00%	100.00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	6.80			$ 923,559.19	$ -	$ 6,280,202.51	0.00%	0.00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	0.72			$ 1,036,355.99	$ -	$ 746,176.31	0.00%		
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	69.35	69.35	69.35	$ 38,464.50	$ 2,667,513.24	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	38.54	38.54	38.54	$ 29,897.64	$ 1,152,246.08	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0.60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	3.90	3.90	3.90	$ 18,044.38	$ 70,373.09	$ -	100.00%	100.00%	
12.3.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	12.00	12.00	12.00	$ 29,063.32	$ 348,759.82	$ -	100.00%	100.00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	2.82			$ 185,164.49	$ -	$ 521,830.56	0.00%	0.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	368.76	320.30	320.30	$ 4,352.40	$ 1,394,073.72	$ 210,917.30	86.86%	86.86%	

ITEM	CPF	833	IED	Dario Echandia			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de intervenorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	123.63	123.63	123.63	$ 3,404.25	$ 420,873.79	$ -	100.00%	100.00%	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	15.60	15.60	15.60	$ 2,407.88	$ 37,562.95	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.80	12.80	12.80	$ 20,817.86	$ 266,468.66	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	224.64	224.64	224.64	$ 28,054.90	$ 6,302,252.92	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERIA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	686.67	686.67	686.67	$ 34,307.63	$ 23,557,934.93	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	57.00	57.00	57.00	$ 11,171.61	$ 636,781.56	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	57.00	57.00	57.00	$ 6,973.21	$ 397,473.22	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	253.30	253.30	253.30	$ 4,099.29	$ 1,038,350.46	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	6.25	6.25	6.25	$ 8,364.64	$ 52,279.02	$ -	100.00%	100.00%	
1.3.3	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN).	UN	11.00	11.00	11.00	$ 177,967.63	$ 1,957,643.90	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	26.00	26.00	26.00	$ 36,375.35	$ 945,759.11	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.16	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	0.85	0.85	0.85	$ 1,307,170.35	$ 1,113,709.14	$ -	100.00%	100.00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	80.60	80.60	80.60	$ 6,772.33	$ 545,850.15	$ -	100.00%	100.00%	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	16806.93	16806.93	16806.93	$ 24,136.40	$ 405,658,812.14	$ -	100.00%	100.00%	
3.1.13	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2	69.18	69.18	69.18	$ 12,825.52	$ 887,305.53	$ -	100.00%	100.00%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	108.00	108.00	108.00	$ 9,730.63	$ 1,050,907.74	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.25	6.25	6.25	$ 27,619.66	$ 172,622.88	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	13.00	13.00	13.00	$ 118,468.31	$ 1,540,088.04	$ -	100.00%	100.00%	

5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	2.00	2.00	$ 163,656.94	$ 327,313.87	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	27.00	27.00	27.00	$ 197,624.40	$ 5,335,858.93	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	126.65			$ 24,422.99	$ -	$ 3,093,171.73	0.00%	0.00%	
5.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	50.00			$ 46,585.41	$ -	$ 2,329,270.56	0.00%	0.00%	

5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	62.00	62.00	62.00	$	188,899.52	$ 11,711,770.04	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	49.00	49.00	49.00	$	185,401.53	$ 9,084,674.79	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	1,161.22	800.00	800.00	$	29,762.38	$ 23,809,904.64	$ 10,750,731.48	68.89%	68.89%	
13.1.4	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL 6 MM UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN ÁREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA HASTA 60 CM)	M	449.28	358.03	358.03	$	84,841.00	$ 30,375,622.66	$ 7,741,741.10	79.69%	79.69%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	17.00	17.00	17.00	$	111,316.98	$ 1,892,388.70	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	40.00	28.60	28.60	$	24,947.96	$ 713,511.56	$ 284,406.71	71.50%	71.50%	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	642.87	642.87	642.87	$	247,166.77	$ 158,896,101.17	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	6.20	6.20	6.20	$	134,793.16	$ 835,717.58	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	716.95	300.53	300.53	$	4,352.40	$ 1,308,026.77	$ 1,812,411.17	41.92%	41.92%	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	13184.70	13184.70	13184.70	$	3,520.76	$ 46,420,122.18	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	748	IED		Alfonso Reyes Echandia		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de carpetas asfalticas y placas de concha se debe aplicar)	m2	73.41			$ 6,575.47	$ -	$ 482,716.28	0.00%	0.00%	$ 2,230.40
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	m2	73.41			$ 29,040.55	$ -	$ 2,131,914.99	0.00%	0.00%	$ 9,850.56
1.2.16	DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMINETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	176.00			$ 113,509.25	$ -	$ 19,977,628.49	0.00%	0.00%	$ 38,502.34
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	2.00			$ 22,734.26	$ -	$ 45,468.52	0.00%	0.00%	$ 7,711.46
2.2.11	MUROS DE CONTENCIÓN 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	6.00			$ 1,429,703.14	$ -	$ 8,578,218.82	0.00%	0.00%	$ 484,955.30
2.3.3	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	64.00			$ 172,618.86	$ -	$ 11,047,607.19	0.00%	0.00%	$ 58,552.32
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	480.00			$ 6,772.33	$ -	$ 3,250,720.51	0.00%	0.00%	$ 2,297.18
4.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	73.41			$ 93,453.39	$ -	$ 6,860,568.29	0.00%	0.00%	$ 31,699.39
4.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1800	M2	73.41			$ 12,287.16	$ -	$ 902,020.75	0.00%	0.00%	$ 4,167.80
9.3.4	CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 M.	M	73.41			$ 1,122,317.90	$ -	$ 82,391,214.44	0.00%	0.00%	$ 380,690.23
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	73.41			$ 4,352.40	$ -	$ 319,516.89	0.00%	0.00%	$ 1,476.33

ITEM	CPF	747	IED		Orlando Higuita		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	173.65	173.65		$ 30,062.36	$ 5,220,329.09	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	116.70	144.84		$ 10,621.20	$ 1,538,352.21	$ (298,809.88)	124.11%	124.11%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	116.70	144.84		$ 11,807.73	$ 1,710,206.97	$ (332,190.98)	124.11%	124.11%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	25.00	4.00		$ 6,973.21	$ 27,892.86	$ 146,437.50	16.00%	16.00%	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	173.65	152.28		$ 16,844.46	$ 2,565,038.63	$ 360,001.43	87.69%	87.69%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+60ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN	UN	25.00	25.00		$ 62,547.34	$ 1,563,683.40	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	153.00	153.00		$ 42,278.54	$ 6,468,617.23	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	150.00	150.00		$ 26,316.62	$ 3,947,492.88	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC. ANCHO 6 CM	M	74.66	74.66		$ 19,490.72	$ 1,455,176.92	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	116.70	116.70		$ 22,625.78	$ 2,640,428.99	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	116.70	116.70		$ 29,897.64	$ 3,489,054.59	$ -	100.00%	100.00%	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	116.70	116.70		$ 121,679.71	$ 14,200,022.39	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	173.65	173.65		$ 86,678.38	$ 15,051,700.83	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.25	AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA)	M2	173.65	173.65		$ 106,127.58	$ 18,429,054.68	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	290.35	290.35		$ 4,352.40	$ 1,263,719.34	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN)	M2	116.70	116.70		$ 7,510.23	$ 876,444.26	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	838	IED		Isabel II		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	10.26	10.26		$ 4,352.40	$ 44,633.86	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1.00	1.00		$ 1,953,740.13	$ 1,953,740.13	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	850	IED		Jhon F Kennedy		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	8.88	8.88		$ 4,352.40	$ 38,644.09	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1.00	1.00		$ 1,953,740.13	$ 1,953,740.13	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	817	IED		Marsella		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	27.59	27.59		$ 4,352.40	$ 120,102.30	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.2	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<15M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1.00	1.00		$ 739,630.79	$ 739,630.79	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.6	PODA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	4.00	4.00		$ 976,870.07	$ 3,907,480.26	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	890	IED		Nelson Mandela		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.08	17.08	17.08	$ 30,426.62	$ 519,686.74	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22.00	22.00	22.00	$ 17,444.42	$ 383,777.22	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	11.00	11.00	11.00	$ 85,501.22	$ 940,513.46	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	UN	22.00	22.00	22.00	$ 20,568.77	$ 452,513.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	16.00	16.00	16.00	$ 5,829.54	$ 93,272.60	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	34.16	34.16	34.16	$ 42,278.54	$ 1,444,235.06	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.30	TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	34.16	34.16	34.16	$ 127,154.36	$ 4,343,592.99	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.3	PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	8.54	8.54	8.54	$ 36,604.35	$ 312,601.18	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMICO CERTIFICADO)	M2	8.54	8.54	8.54	$ 11,692.56	$ 99,854.42	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	8.54	8.54	8.54	$ 17,192.65	$ 146,825.23	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	34.16	34.16	34.16	$ 4,352.40	$ 148,677.98	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	763	IED		Bicentenario		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	15.00			$ 6,772.33	$ -	$ 101,585.02	0.00%	0.00%	
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2	25.20			$ 195,409.37	$ -	$ 4,924,316.07	0.00%	0.00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	50.40			$ 22,625.78	$ -	$ 1,140,339.51	0.00%	0.00%	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	36.60			$ 18,025.63	$ -	$ 659,738.13	0.00%	0.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	36.60			$ 4,352.40	$ -	$ 159,297.84	0.00%	0.00%	

ITEM	CPF	729	IED		San bernardino		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2.00			$ 122,747.05	$ -	$ 245,494.11	0.00%	0.00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.60			$ 20,817.86	$ -	$ 158,111.68	0.00%	0.00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2' A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	2.40			$ 16,375.74	$ -	$ 39,301.77	0.00%	0.00%	
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	0.18			$ 633,678.64	$ -	$ 114,062.15	0.00%	0.00%	
2.2.17	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2	1.20			$ 128,126.62	$ -	$ 153,751.94	0.00%	0.00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	13.32			$ 6,772.33	$ -	$ 90,174.99	0.00%	0.00%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	7.60			$ 136,417.61	$ -	$ 1,036,091.73	0.00%	0.00%	

3.1.11	RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	M2	15.19			$ 137,324.25	$ -	$ 2,085,955.30	0.00%	0.00%	
ITEM	**CPF**	**821**	**IED**		**San Jose**		**SEMANA**				
Ítem	**Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	8.98	8.98		$ 4,352.40	$ 39,081.94	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.2	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<15M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1.00	1.00		$ 739,630.79	$ 739,630.79	$ -	100.00%	100.00%	

FECHA:	28/03/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**46**	
CORTE DEL INFORME:	***28/03/2026***	

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	20	**DEL**	22-mar-26	**AL**	28-mar-26

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.8169111	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.8154784
Fecha de Iniciación	14/10/2025	**Fecha de Iniciación**	14/10/2025
Fecha de Terminación	13/05/2026	**Fecha de Terminación**	13/05/2026
Plazo Inicial	7 MESES	**Plazo Inicial**	7 MESES
Valor inicial	$ 880,146,577.00	**Valor inicial**	$ 2,975,834,553.00
Adiciones	$ 83,867,649.00	**Adiciones**	$ 523,987,595.00
Prorroga	N.A.	**Prorroga**	N.A.
Suspensión	N.A.	**Suspensión**	N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES
No.	**FRENTE**	PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	PROGRAMADO ACUM	EJECUTADO ACUM	DESVIACIÓN	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**
1	PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	70.00%	72.75%	71.00%	72.75%	1.75%	BAÑO: Instalacion de enchape, media cañas y instalación de tubería e instalación de piso en vinisol y pintura
2	PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	25.40%	20.64%	27.00%	20.64%	-6.36%	Cocina: Instalacion de piso, cambio de tuberias
3	EL PORVENIR	54.40%	56.62%	55.00%	56.62%	1.62%	BAÑO: instalacion de enchape, media cañas y instalación manto en cubierta
4	VILLAS DEL PROGRESO	65.34%	76.72%	71.66%	76.72%	5.06%	BAÑO Y CANCHA: Instalación de enchape, Fundicion de placa
5	PABLO DE TARSO	45.40%	76.86%	53.30%	84.89%	31.59%	Desmonte e instalación de cubierta
6	JAIRO ANIBAL NIÑO	54.76%	64.36%	58.44%	66.12%	7.68%	BAÑO Y SALONES DE PREESCOLAR: Instalación de enchape, media caña y piso
7	LUIS LOPEZ DE MESA	22.89%	26.07%	25.65%	26.50%	0.85%	BAÑO: Instalacion de manto de aluminio sobre cubierta y enchape
8	EDUARDO UMAÑA LUNA	66.34%	71.71%	70.87%	77.62%	6.75%	BAÑO: Instalacion de enchape
9	DARIO ECHANDIA	81.54%	92.72%	87.44%	93.11%	5.67%	CUBIERTA: Instalación de cubierta
10	LLANO ORIENTAL - ALFONSO REYES ECHANDIA						0
TOTALES		**54.01%**	**62.05%**	**57.82%**	**63.89%**	**6.07%**	

3. RESUMEN FINANCIERO

PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 261,167,046	$ 189,999,201	**$ 71,167,845**		0.00%	72.75%

PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 85,000,000	$ 17,547,123	**$ 67,452,877**		0.00%	20.64%

EL PORVENIR

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 110,086,654	$ 62,332,258	**$ 47,754,396**		0.00%	56.62%

VILLAS DEL PROGRESO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 166,676,454	$ 127,881,035	**$ 38,795,419**		0.00%	76.72%

PABLO DE TARSO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 189,976,713	$ 161,279,428	**$ 28,697,285**		8.03%	84.89%

JAIRO ANIBAL NIÑO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 203,141,470	$ 134,309,246	**$ 68,832,224**		1.80%	66.12%

LUIS LOPEZ DE MESA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 292,710,605	$ 77,567,596	**$ 215,143,009**		0.40%	26.50%

EDUARDO UMAÑA LUNA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 76,965,087	$ 59,741,035	**$ 17,224,052**		5.90%	77.62%

DARIO ECHANDIA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 795,148,175	$ 740,341,373	**$ 54,806,801**		0.40%	93.11%

FECHA:	28/03/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**46**	
CORTE DEL INFORME:	***28/03/2026***	

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	20	**DEL**	22-mar-26	**AL**	28-mar-26

EMERGENCIAS

BALANCE EMERGENCIAS	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 114,665,609	$ 98,869,449	**$ 15,796,160**		2.10%	86.22%

4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

OBSERVACIONES: Para la presente semana, se actualizo nuevamente el balance, lo que modifica valores y cantidades a nivel general.

RECOMENDACIONES:
- Mantener orden y aseo en la obras, así como la señalización
- Continuar con el uso correcto de EPP
- Apertura de más frentes de obra

CONCLUSIONES:
- Se avanzó en tres frentes de trabajo con actividades de cerramiento, demoliciones, desmontes, pañete, e Instalación de pisos, cubiertas, enchape.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

1. Se continua con avances en los frentes de obra en los siguientes colegios: Alfonso Lopez Michelsen, El Porvenir, Villas del progreso, Jairo Anibal Niño, Eduardo Umaña Luna , Luis Lopez de Mesa y Dario Echandia.

2. Se continua con avance en los frentes de obra en las emergencias en los siguientes colegios: Orlando Higuita.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente semana se aprobó el personal que va a realizar la instalación de los mesones en el frente de obra Jairo Anibal Niño . De igual manera, se evidenció la ejecución de actividades en los colegios, Luis López de Mesa, Alfonso López Michelsen, Villas del Progreso, El Porvenir, Jairo Aníbal Niño, Dario Echandia Sede B, Colegio Eduardo Uñama Luna, Colegio Pablo de Tarso.
Durante el periodo reportado, en el colegio Darío Echandía se verificó que el personal cumplió con el EPP. Adicionalmente, se realizaron jornadas de orden y aseo, asegurando la limpieza y disposición adecuada de los materiales y herramientas de trabajo, así como el mantenimiento de las USP.
En el colegio Pablo de Tarso, se evidenciaron actividades similares de orden y aseo, enfocadas principalmente en la recolección y disposición adecuada de escombros y residuos generados por las labores realizadas en el sitio, contribuyendo así a mantener un entorno seguro y limpio. Por otra parte, en el colegio Eduardo Umaña Luna, se identificó la necesidad de mejorar el cerramiento perimetral y la señalización existente, dado que algunos tramos del cerramiento se encuentran caídos o deteriorados.

Así mismo, se realizó un llamado de atención al contratista respecto a la ejecución de actividades en la IED Luis López de Mesa, debido a que se evidenció personal realizando labores en altura sobre la cubierta sin el uso adecuado de EPP y sin la implementación de EPCC, tales como arnés, línea de vida y puntos de anclaje certificados.
Como consecuencia de esta situación, se procedió a la suspensión temporal de las actividades en el colegio. Posteriormente, el contratista realizó las correcciones pertinentes y entregó los EPCC requeridos, cumpliendo así con las medidas de seguridad establecidas.

Se recibió por parte del contratista el Informe Mensual SST No. 5, el cual fue retornado con observaciones mediante el oficio UNIOBRAS-LOTE3-365, a fin de que se realicen las correcciones y ajustes correspondientes según los requerimientos establecidos.
trabajadas: 44
Total de horas capacitación: 20 minutos
Número de accidentes de trabajo: 0
Número de días de incapacidad por AT:0
Número de días de incapacidad por enfermedad común: 0

REPORTE PERSONAL
DIRECTOR OBRA: 1 INSPECTORES SST: 1
RESIDENTE OBRA: 1 PERSONAL OPERATIVO: 49

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

IED Cultura Alfonso López Michelsen: Se realizo recorrido en el frente, se acopio los residuos de demolición adecuadamente (cubierto y señalizado), pero se recomienda realizar el retiro total de los RCD y implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).
IED Villas del progreso: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento adecuado, se encuentran dos bolsas de lonas de residuos acopiados adecuadamente, se recomendó al contratista disponer el material, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente.
IED El Porvenir: Se realizo recorrido en el frente, presenta señalización en el frente de obra. Se acopio materiales de construcción y los residuos adecuadamente, al igual se recomienda realizar la disposición e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Jairo Anibal Niño: Se realizo recorrido en el frente, se realizó la disposición adecuada de los residuos, al igual se recomendó garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Darío Echandía: Se realizo recorrido en el frente, se presenta el cerramiento adecuado, se reporta el ingreso de materiales que fueron debidamente acopiados, se evidencian luminarias acopiadas en el aula 108, se realizó la disposición de parte de residuos, al igual se recomienda realizar la disposición de las luminarias con el gestor adecuado, mantener orden en el frente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Eduardo Umaña Luna: Se realizo recorrido en el frente, se encuentra el cerramiento adecuado con su debida señalización, el material de construcción y los RCD se encuentran acopiados adecuadamente, pero se recomienda disponerlo, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente al igual que implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Pablo de torso: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con la debida señalización, se evidencia material de construcción y un volumen bajo de residuos, se recomendó disponerlos, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Luis López de mesa: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento adecuado, se evidencia gran volumen de residuos y material acopiados adecuadamente, por lo que se recomienda al contratista realizar la debida disposición adecuada ya que cuenta con la cantidad mínima para su recolección y garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente.

OTROS

ING JHONER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING HARRY ARANGO
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA:	28/03/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**46**	
CORTE DEL INFORME:	***28/03/2026***	

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA

Alfonso Lopez Michelsen



Pintura



Pintura



Pintura



Pintura

Alfonso Lopez Michelsen Cocina

0

Pintura

0.00

Pintura

0	0
Pintura	Pintura

El Porvenir

	
Pintura	Instalacion de piso

	
Pintura	Pintura
Villas del Progreso	
	
Pintura Pintura	Pintura
	
Pintura Pintura	Pintura
Jairo Anibal Niño	
	
Instalacion de piso	Instalacion de piso

	
Instalacion de piso	Instalacion de piso
Eduardo Umaña Luna	
	
Pintura	Pintura
	
Pintura	Pintura

Dario Echandia



Pintura



Pintura



Pintura



Pintura

Luis Lopez De Mesa



Pintura



Pintura



Manto para cubierta



Manto para cubierta

Pablo de Tarso



Instalacion de estructura



Instalacion de estructura



Instalacion de estructura



Instalacion de estructura

FECHA: 28/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES 46 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA				
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			GRUPO	7
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154784	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDU 2025	
28/3/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169111	INTERVENTOR:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S	

TIPO DE INTERVENCION 17 ###	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE		ESTADO ACTUAL O FINAL
Alfonso Lopez Michelsen	Mejoramiento de baterias sanitarias y salones de preescolar	BAÑO: Instalacion de enchape, media cañas y instalación de tuberia e instalación de piso en vinisol y pintura				
Alfonso Lopez Michelsen Cocina	Mejoramiento de cocina	Cocina: Instalacion de piso, cambio de tuberias				
El Porvenir	Mejoramiento de cubierta y baterias sanitarias	BAÑO: instalacion de enchape, media cañas y instalación manto en cubierta				
Villas del Progreso	Mejoramiento de baterias y canchas sanitarias	BAÑO Y CANCHA: Instalación de enchape, Fundicion de placa				
Pablo de Tarso	Desmonte e instalación de cubierta	Desmonte e instalación de cubierta				
Jairo Anibal Niño	Mejoramiento de baterias sanitarias y pisos preescolar	BAÑO Y SALONES DE PREESCOLAR: Instalación de enchape, media caña y piso				
Luis Lopez de Mesa	Mejoramiento de baterias sanitarias	BAÑO: Instalacion de manto de aluminio sobre cubierta y enchape				
Eduardo Umaña	Mejoramiento de baterias sanitarias y cerramiento	BAÑO: Instalacion de enchape				
Dario Echandia	Desmonte e instalación de cubierta	CUBIERTA: Instalación de cubierta				

EMERGENCIA No. 1 Colegio Orlando Higuita						
EMERGENCIA No. 2 San Bernardino						
EMERGENCIA No. 3 Isabel II						
EMERGENCIA No. 4 Jhon F Kennedy						

EMERGENCIA No. 5 Marsella						
EMERGENCIA No. 6 Nelson Mandela						
EMERGENCIA No. 7 Bicentenario						
EMERGENCIA No. 8 San Jose						
EMERGENCIA No. 9 Nicolas Esguerra						

FECHA:	28/03/2026	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	46 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA	GRUPO 7
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDU 2025	
28 de marzo de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S	

DATOS:	FECHAS INTERVENTORIA	FECHAS OBRA	ETAPA:	PLAZOS EN DIAS INTERVENTORIA	PLAZOS EN DIAS OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169111	CO1.PCCNTR.8154784	INICIAL	211	211
INICIO	14 de octubre de 2025	14 de octubre de 2025	SUSPENSIONES		
TERMINACION INICIAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	PRORROGAS		
TERMINACION FINAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	TOTAL	211	211

VALOR CONTRATO	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	$ 796,278,928	$ 2,451,846,958
ADICIÓNES	$ 83,867,649.00	$ 523,987,595.00
TOTAL	$ 880,146,577.00	$ 2,975,834,553.00

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	05/12/2025	$ 83,867,649.00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	05/12/2025	$ 523,987,595.00		
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMENTO DESDE	CUMPLIMENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400-47	5 9 2025	5 10 2026	5 4 2026	5 4 2031	5 9 2025	5 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMENTO DESDE	CUMPLIMENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
895-47	14 10 2025	15 1 2027	14 10 2025	15 5 2027	14 10 2025	15 1 2027	895-74	5 4 2026	15 5 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (31082924)	PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA
751	PORTAL DEL SOL -	Bosa	A	Portal del Sol Alfonso Lopez Michelsen	72.75%	72.75%	71.00%		$ 261,167,045.68	$ 189,999,201	12/11/2025	09/04/2026
751	PORTAL DEL SOL -	Bosa	A	Portal del Sol Alfonso Lopez Michelsen	20.64%	20.64%	27.00%		$ 85,000,000.00	$ 17,547,123	11/01/2026	13/05/2026
742	EL PORVENIR	Bosa	B	El Recuerdo Santa Fe	56.62%	56.62%	68.00%		$ 110,086,654.11	$ 62,332,298	19/11/2025	30/03/2026
764	VILLAS DEL PROGRESO	Bosa	B	Enrique Dussel	76.72%	76.72%	71.66%		$ 166,876,454.24	$ 127,981,035	12/11/2025	09/04/2026
714	PABLO DE TARSO	Bosa	A	Pablo de Tarso	76.56%	84.69%	83.30%		$ 189,976,712.63	$ 161,279,428	19/11/2025	19/03/2026
836	JAIRO ANIBAL NIÑO	Kennedy	A	Patio Bonito I	64.36%	66.12%	68.44%		$ 203,141,470.45	$ 134,309,246	26/11/2025	19/03/2026
712	LUIS LOPEZ DE MESA	Bosa	A	Luis Lopez de Mesa	26.97%	26.50%	25.65%		$ 292,715,604.53	$ 77,567,596	11/12/2025	09/04/2026
814	EDUARDO UMAÑA LUNA	Kennedy	A	Dindalito	71.71%	77.82%	78.87%		$ 76,965,086.69	$ 59,741,035	19/11/2025	02/02/2026
833	DARIO ECHANDIA	Kennedy	B	Los Patios	92.72%	93.11%	87.44%		$ 796,148,174.67	$ 740,341,373	12/11/2025	26/03/2026
748	LLANO ORIENTAL -	Bosa	A	San José de Maryland San Pedro -					$ 135,987,595.00	$ -	14/10/2025	13/05/2026
	TOTAL FRENTES DE OBRA				63.89%		67.82%		$ 2,316,859,756	$ 1,570,998,295		
	EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO											
747	LA LIBERTAD - ORLANDO	Bosa	A	Orlando Higuita - Holanda la Libertad	100.00%	97.97%	100.00%		$ 82,116,894	$ 80,447,215	19/11/2025	15/01/2026
729	SAN BERNARDINO	Bosa	A	San Bernardino	0.00%	0.00%	0.00%		$ 3,922,944	$ -	24/11/2025	31/12/2025
838	ISABEL II	Kennedy	B	Pio XII	100.00%	100.00%	100.00%		$ 1,998,374	$ 1,998,374	29/11/2025	19/12/2025
850	JOHN F. KENNEDY	Kennedy	A	John F. kennedy	100.00%	100.00%	100.00%		$ 1,992,384	$ 1,992,384	29/11/2025	12/12/2025
817	MARSELLA	Kennedy	A	Bas-Med. Marsella	100.00%	100.00%	100.00%		$ 4,787,213	$ 4,787,213	28/11/2025	18/12/2025
890	NELSON MANDELA	Kennedy	A	Compartir Tintal	100.00%	73.42%	70.00%		$ 12,103,037	$ 8,885,550	26/11/2025	16/01/2026
763	BICENTENARIO	Bosa	A	San José de Maryland	0.00%	0.00%	0%		$ 6,986,068	$ -	27/11/2025	16/01/2026
821	SAN JOSE	Kennedy	B	El Descanso	100.00%	100.00%	100%		$ 778,713	$ 778,713		
859	NACIONAL NICOLAS	Kennedy	A	Nicolas Esquerra								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	TOTAL FRENTES DE OBRA				71.42%		71.25%		$ 114,685,609	$ 98,869,449		

ACUMULADO FRENTES DE OBRA

TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	9	0	9	$ 1,570,998,295
ACUMULADO EMERGENCIAS				
0	6	2	8	$ 98,869,449
TOTAL				
0	15	2	17	$ 1,669,867,745
FRENTES POR LOCALIDAD				

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23	
2		13		2		13		24	
3		14		3		14		25	
4		15		4		15		26	
5		16		5		16		27	
6		17		6		17		28	
7		18		7		18		29	
8		19		8		19		30	
9		20		9		20		31	
10	TOTAL OBRA	21		10		21		32	
11	$ -	22		11		22		33	

No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
TOTAL INTERVENTORIA	
$ -	


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	63.89%	0.00%	78.20%
PROGRAMADO	57.82%		
ATRASO	6.07%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			


AVANCE GENERAL




EMERGENCIAS



AVANCE FÍSICO



AVANCE DE LOS FRENTES



OBSERVACIONES:

BALANCE SEMANAL POR CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS

		CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2026
GRUPOS	**ITEM**	**CPF**	**751**	**IED**		**Alfonso Lopez Michelsen**	**SEMANA**				
	Ítem	**Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
	1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si es su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	30.69	30.69		$ 4,435.43	$ 136,101.63	$ -	100.00%	100.00%	
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	3.79	3.79		$ 29,040.55	$ 110,063.69	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.01	34.22		$ 30,062.36	$ 1,028,734.01	$ 174,018.99	85.53%	85.53%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	450.72	450.72		$ 30,426.62	$ 13,713,897.10	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	113.46	113.46		$ 10,621.20	$ 1,205,071.78	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	76.42	76.42		$ 28,815.57	$ 2,202,085.58	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	123.57	123.57		$ 11,807.73	$ 1,459,112.04	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11.00	11.00		$ 19,332.69	$ 212,659.60	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10.80	8.64		$ 30,969.00	$ 267,631.62	$ 66,907.91	80.00%	80.00%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	18.00	18.00		$ 25,467.57	$ 458,416.20	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	5.00	5.00		$ 6,973.21	$ 34,866.07	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.01	34.22		$ 21,107.13	$ 722,286.03	$ 122,180.74	85.53%	85.53%	
	1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	1.60	1.60		$ 8,364.64	$ 13,383.43	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	18.00	18.00		$ 13,694.66	$ 246,503.87	$ -	100.00%	100.00%	
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	84.44	84.44		$ 20,392.00	$ 1,721,900.34	$ -	100.00%	100.00%	
	4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	27.38	27.38		$ 13,991.96	$ 383,099.91	$ -	100.00%	100.00%	
	4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	13.00	13.00		$ 59,307.81	$ 771,001.55	$ -	100.00%	100.00%	
	4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	11.00	11.00		$ 59,307.81	$ 652,385.92	$ -	100.00%	100.00%	
	4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/2"	UN	2.00	2.00		$ 201,917.88	$ 403,835.76	$ -	100.00%	100.00%	
	4.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN	2.00	2.00		$ 85,229.37	$ 170,458.73	$ -	100.00%	100.00%	
1	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	2.00		$ 118,468.31	$ 236,936.62	$ -	100.00%	100.00%	
	5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	5.00	5.00		$ 185,401.53	$ 927,007.63	$ -	100.00%	100.00%	
	7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	450.72	450.72		$ 39,814.42	$ 17,945,153.58	$ -	100.00%	100.00%	
	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	40.01	34.22		$ 42,278.54	$ 1,446,771.78	$ 244,733.58	85.53%	85.53%	
	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	40.01	34.22		$ 196,536.97	$ 6,725,495.26	$ 1,137,673.93	85.53%	85.53%	
	7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	12.00	12.00		$ 70,333.44	$ 844,001.34	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	450.72	450.72		$ 241,797.92	$ 108,983,157.06	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	116.40	116.40		$ 14,350.87	$ 1,670,383.54	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	63.34	63.34		$ 76,716.07	$ 4,859,196.00	$ -	100.00%	100.00%	
	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	112.85	112.85		$ 108,436.36	$ 12,237,103.23	$ -	100.00%	100.00%	
	9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	4.59			$ 853,515.01	$ -	$ 3,919,682.35	0.00%	0.00%	
	9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	7.92			$ 1,181,573.48	$ -	$ 9,358,061.97	0.00%	0.00%	
	10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	4.00			$ 721,070.81	$ -	$ 2,884,283.25	0.00%	0.00%	
	10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	11.00			$ 377,707.97	$ -	$ 4,154,787.65	0.00%	0.00%	
	10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00	4.00		$ 38,396.20	$ 153,584.81	$ -	100.00%	100.00%	
	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20,	M2	33.87			$ 923,559.19	$ -	$ 31,283,720.51	0.00%	0.00%	
	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80			$ 1,036,355.99	$ -	$ 1,865,440.78	0.00%	0.00%	
	12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	112.53	112.53		$ 38,464.50	$ 4,328,346.99	$ -	100.00%	100.00%	
	12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	66.93	66.93		$ 29,897.64	$ 2,001,049.05	$ -	100.00%	100.00%	
	12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	59.26	59.26		$ 26,897.83	$ 1,593,965.52	$ -	100.00%	100.00%	
	14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	7.92			$ 185,164.49	$ -	$ 1,466,502.74	0.00%	0.00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	30.69	30.69		$ 4,352.40	$ 133,553.83	$ -	100.00%	100.00%	
GRUPOS	**ITEM**	**CPF**	**751**	**IED**		**Alfonso Lopez Michelsen Cocina**	**SEMANA**				
	Ítem	**Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
	1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.93	3.93		$ 30,062.36	$ 118,217.23	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.93	3.93		$ 30,426.62	$ 119,649.66	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2.00	2.00		$ 25,467.57	$ 50,935.13	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13.09	13.09		$ 21,107.13	$ 276,292.35	$ -	100.00%	100.00%	
	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	7.35	7.35		$ 85,501.22	$ 628,434.00	$ -	100.00%	100.00%	
	4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2.00	2.00		$ 71,024.47	$ 142,048.94	$ -	100.00%	100.00%	
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	4.00	4.00		$ 5,829.54	$ 23,318.15	$ -	100.00%	100.00%	
	5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	5.00			$ 534,497.49	$ -	$ 2,672,487.43	0.00%	0.00%	
	5.1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	127.73			$ 53,182.31	$ -	$ 6,792,908.92	0.00%	0.00%	
	5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°6 (T) AWG THHN	M	150.20			$ 83,551.35	$ -	$ 12,549,412.59	0.00%	0.00%	
	5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	30.00			$ 185,401.53	$ -	$ 5,562,045.79	0.00%	0.00%	
1	5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	2.00			$ 819,132.39	$ -	$ 1,638,264.79	0.00%	0.00%	
	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	13.09	13.09		$ 42,278.54	$ 553,426.14	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	12.60	12.60		$ 196,536.97	$ 2,476,365.88	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	90.50	90.50		$ 19,490.72	$ 1,763,909.67	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	22.42	22.42		$ 76,716.07	$ 1,719,974.33	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	131.64	131.64		$ 67,713.97	$ 8,913,587.98	$ -	100.00%	100.00%	
	10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	6.00	6.00		$ 31,338.62	$ 188,031.72	$ -	100.00%	100.00%	
	11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EYECTORA BARNES IC0027 VOLTAJE 220 TRIFASICA (360 GPM DESCARGA 3" 3HP)	UN	3.00			$ 6,591,038.86	$ -	$ 19,773,116.58	0.00%	0.00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	131.64	131.64		$ 4,352.40	$ 572,932.00	$ -	100.00%	100.00%	

	19.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMATICO CON 2 BOMBAS DE 2HP 110/220 TANQUE HIDRONEUMATICO POR MEMBRANA DE 200LTS, MARCA PEARL, TABLERO DE CONTROL CON NORMA RETIE (INCLUYE 2 BOMBAS ALTA PRESIÓN CAUDAL 2.33LPS H.MAQ 50MT 1 TANQUE HIDROACUMULADOR MEMBRANA 200LTS VERTICAL CON MANOMETRO ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN ENTRE BOMBAS Y TANQUE EN HIERRO GALVANIZADO (HG), 1 FLAUTA DE DESCARGA EN 3" INCLUYE COPA DE DESCARGA 3 A 2, 2 REGISTROS EN BRONCE TIPO COMPUERTA, 2 VÁLVULAS CHEQUE HIDRONEUMATICO EN BRONCE, 1 TABLERO DE CONTROL EN COFRE METÁLICO CON NORMA RETIE 2- PRESOSTATOS RANGO 40/60, 1 SENSOR DE NIVEL (FLOTADOR), 1 MANOMETRO EN GLICERINA CON CARATULA DE 2" (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	UN	1.00			$ 18,464,640.51	$ -	$ 18,464,640.51	0.00%	0.00%	

	ITEM	CPF	742	IED	El Porvenir			SEMANA				
	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	7.75	7.75		$ 29,040.55	$ 225,064.28	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	58.31	58.31		$ 30,426.62	$ 1,774,298.15	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2.97	2.97		$ 20,817.86	$ 61,795.75	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	106.35	106.35		$ 10,621.20	$ 1,129,606.59	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	63.15	63.15		$ 28,815.57	$ 1,819,703.02	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	106.35	106.35		$ 11,807.73	$ 1,255,798.93	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	10.00	10.00		$ 19,332.69	$ 193,326.91	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.75	10.97		$ 30,969.00	$ 339,822.84	$ 55,124.82	86.04%	86.04%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	24.00	24.00		$ 25,467.57	$ 611,221.59	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4.00	4.00		$ 6,973.21	$ 27,892.86	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	24.00	24.00		$ 13,694.66	$ 328,671.82	$ -	100.00%	100.00%	
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	97.49	97.49		$ 20,392.00	$ 1,988,015.92	$ -	100.00%	100.00%	
	2.3.7	PERFORACIÓN NÚCLEO 3" E= 0.10 M	UN	2.00	2.00		$ 162,040.52	$ 324,081.04	$ -	100.00%	100.00%	
	3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	2.44	2.44		$ 68,498.74	$ 167,383.52	$ -	100.00%	100.00%	
	2.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	5.50	5.50		$ 85,501.22	$ 470,256.73	$ -	100.00%	100.00%	
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	100.00	100.00		$ 5,829.54	$ 582,953.76	$ -	100.00%	100.00%	
	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	2.00		$ 118,468.31	$ 236,936.62	$ -	100.00%	100.00%	
	5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00	4.00		$ 211,513.25	$ 846,052.99	$ -	100.00%	100.00%	
2	5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA, INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	4.00	4.00		$ 185,401.53	$ 741,606.11	$ -	100.00%	100.00%	
	7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	57.35	57.35		$ 65,046.28	$ 3,730,404.34	$ -	100.00%	100.00%	
	7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	30.30	30.30		$ 26,316.62	$ 797,393.56	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	52.48	52.48		$ 14,350.87	$ 753,133.51	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	72.85	72.85		$ 76,716.07	$ 5,588,535.70	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	44.37	44.37		$ 67,713.97	$ 3,004,360.49	$ -	100.00%	100.00%	
	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	106.35	106.35		$ 108,436.36	$ 11,532,207.23	$ -	100.00%	100.00%	
	9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	4.51			$ 853,515.01	$ -	$ 3,849,352.71	0.00%	0.00%	
	9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	5.09			$ 1,181,573.48	$ -	$ 6,011,845.87	0.00%	0.00%	$ 400,789.72
	10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	4.00			$ 721,070.81	$ -	$ 2,884,283.25	0.00%	0.00%	
	10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	10.00			$ 377,707.97	$ -	$ 3,777,079.68	0.00%	0.00%	
	10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	5.00	5.00		$ 38,396.20	$ 191,981.02	$ -	100.00%	100.00%	
	10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	12.00	12.00	6.00	$ 948,374.57	$ 11,380,494.82	$ -	100.00%	100.00%	
	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	9.00			$ 923,559.19	$ -	$ 8,312,032.73	0.00%	0.00%	
	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2.70			$ 1,036,355.99	$ -	$ 2,798,161.17	0.00%	0.00%	
	12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	106.35	106.35		$ 38,464.50	$ 4,090,853.69	$ -	100.00%	100.00%	
	12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	68.62	68.62		$ 29,897.64	$ 2,051,683.69	$ -	100.00%	100.00%	
	12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	30.00	30.00		$ 26,897.83	$ 806,934.96	$ -	100.00%	100.00%	
	14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	4.68			$ 185,164.49	$ -	$ 866,569.80	0.00%	0.00%	
	16.1.4	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	58.00	58.00		$ 86,678.38	$ 5,027,346.09	$ -	100.00%	100.00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	100.64	58.00		$ 4,352.40	$ 252,439.20	$ 185,586.34	57.63%	57.63%	

	ITEM	CPF	764	IED	Villas del Progreso			SEMANA				
	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	43.80	43.80		$ 29,040.55	$ 1,271,976.18	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13.80	13.80		$ 30,426.62	$ 419,887.41	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	63.53	63.53		$ 10,621.20	$ 674,764.53	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	27.20	27.20		$ 28,815.57	$ 783,783.41	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	63.53	63.53		$ 11,807.73	$ 750,144.86	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8.00	8.00		$ 19,332.69	$ 154,661.53	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.68	7.68		$ 30,969.00	$ 237,841.92	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5.00	5.00		$ 25,467.57	$ 127,337.83	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	20.00	20.00		$ 19,332.69	$ 386,653.82	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	2.00	2.00		$ 6,973.21	$ 13,946.43	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	8.00	8.00		$ 13,694.66	$ 109,557.27	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.44	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13.80	13.80		$ 97,993.28	$ 1,352,307.29	$ -	100.00%	100.00%	
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS. TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	29.10	29.10		$ 20,392.00	$ 593,407.15	$ -	100.00%	100.00%	
	1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	84.00	84.00		$ 17,444.42	$ 1,465,331.21	$ -	100.00%	100.00%	
	1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	21.00	21.00		$ 36,375.35	$ 763,882.36	$ -	100.00%	100.00%	
	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	44.69	44.69		$ 96,359.46	$ 4,306,304.16	$ -	100.00%	100.00%	
	2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	41.16	41.16		$ 22,734.26	$ 935,742.11	$ -	100.00%	100.00%	
	2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM. DE 0.15 X 0.15 M	KG	837.41	837.41		$ 7,440.60	$ 6,230,828.83	$ -	100.00%	100.00%	
	3.2.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	M	3.20	3.20		$ 40,900.51	$ 130,881.62	$ -	100.00%	100.00%	
	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	56.00	56.00		$ 85,501.22	$ 4,788,068.54	$ -	100.00%	100.00%	
	4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	10.00	10.00		$ 47,726.41	$ 477,264.10	$ -	100.00%	100.00%	
	4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	8.00	8.00		$ 121,102.52	$ 968,820.13	$ -	100.00%	100.00%	
	4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	18.60	18.60		$ 13,991.96	$ 260,250.49	$ -	100.00%	100.00%	

	4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7.00	7.00		$ 59,307.81	$ 415,154.68	$ -	100.00%	100.00%	
	4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	8.00	8.00		$ 59,307.81	$ 474,462.49	$ -	100.00%	100.00%	
	4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	6.00	6.00		$ 169,748.96	$ 1,018,493.74	$ -	100.00%	100.00%	
	4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	2.00	2.00		$ 90,824.54	$ 181,649.09	$ -	100.00%	100.00%	
	4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	3.00	3.00		$ 64,414.18	$ 193,242.54	$ -	100.00%	100.00%	
	4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	3.00	3.00		$ 71,024.47	$ 213,073.42	$ -	100.00%	100.00%	
3	4.7.8	RENIVELACIÓN DE CAJAS DE INSPECCION	UN	1.00	1.00		$ 78,661.93	$ 78,661.93	$ -	100.00%	100.00%	
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	60.00	60.00		$ 5,829.54	$ 349,772.26	$ -	100.00%	100.00%	
	4.9.13	SUSPENSION DE SALIDA SANITARIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8.00	8.00		$ 30,698.48	$ 245,587.85	$ -	100.00%	100.00%	
	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	2.00	2.00		$ 118,468.31	$ 236,936.62	$ -	100.00%	100.00%	
	5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	2.00	2.00		$ 185,401.53	$ 370,803.05	$ -	100.00%	100.00%	
	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	13.80	13.80		$ 42,278.54	$ 583,443.91	$ -	100.00%	100.00%	
	7.1.8	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALLANADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) E= 10 CM	M2	401.60	401.60		$ 143,272.97	$ 57,538,425.88	$ -	100.00%	100.00%	
	7.1.9	JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	365.00	365.00		$ 36,001.71	$ 13,140,625.46	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	13.80	13.80		$ 196,536.97	$ 2,712,210.25	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	4.92	4.92		$ 70,333.44	$ 346,040.55	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	30.20	30.20		$ 14,350.87	$ 433,396.19	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	387.00	387.00		$ 19,237.61	$ 7,444,954.30	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	32.67	32.67		$ 76,716.07	$ 2,506,314.07	$ -	100.00%	100.00%	
	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	63.76	63.76		$ 108,436.36	$ 6,913,902.52	$ -	100.00%	100.00%	
	9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	4.18			$ 853,515.01	$ -	$ 3,564,278.70	0.00%	0.00%	
	9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	1.18			$ 1,181,573.48	$ -	$ 1,391,420.93	0.00%	0.00%	
	10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			$ 721,070.81	$ -	$ 1,442,141.63	0.00%	0.00%	
	10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	8.00			$ 377,707.97	$ -	$ 3,021,663.74	0.00%	0.00%	
	10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00	4.00		$ 38,396.20	$ 153,584.81	$ -	100.00%	100.00%	
	10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	8.00	8.00		$ 31,338.62	$ 250,708.95	$ -	100.00%	100.00%	
	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	17.04			$ 923,559.19	$ -	$ 15,737,448.63	0.00%	0.00%	
	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2.16			$ 1,036,355.99	$ -	$ 2,238,528.94	0.00%	0.00%	
	12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	63.76	63.76		$ 38,464.50	$ 2,452,496.67	$ -	100.00%	100.00%	
	12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	14.25	14.25		$ 29,897.64	$ 426,049.14	$ -	100.00%	100.00%	
	12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	14.07	14.07		$ 18,044.38	$ 253,830.30	$ -	100.00%	100.00%	
	12.3.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	1.80			$ 23,132.00	$ -	$ 41,637.60	0.00%	0.00%	
	14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	2.21			$ 185,164.49	$ -	$ 408,843.19	0.00%	0.00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	416.78	400.60		$ 4,352.40	$ 1,743,571.44	$ 70,436.63	96.12%	96.12%	

ITEM	CPF	714	IED	Pablo de Tarso			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar).	M2	151.50	151.50		$ 4,435.43	$ 671,967.71	$ -	100.00%	100.00%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	15.30	15.30		$ 29,040.55	$ 444,320.45	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	37.88	37.88		$ 28,054.90	$ 1,062,719.64	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERIA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	156.26	156.26		$ 34,307.63	$ 5,360,909.58	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4.00	4.00		$ 6,973.21	$ 27,892.86	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	8.00	8.00		$ 8,364.64	$ 66,917.15	$ -	100.00%	100.00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	1,268.93	50.30	0.30	$ 6,772.33	$ 340,648.42	$ 8,252,969.87	3.96%	3.96%	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	4,608.04	4600.00	452.76	$ 24,136.40	$ 111,027,447.36	$ 194,056.67	99.83%	99.83%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	170.00	480.00	445.00	$ 9,730.63	$ 4,670,701.06	$ (3,016,494.43)	282.35%	282.35%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.80	6.80		$ 13,991.96	$ 95,145.34	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	5.00	5.00		$ 5,234.93	$ 26,174.66	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	4.00	4.00		$ 185,401.53	$ 741,606.11	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	108.54	108.54		$ 22,625.78	$ 2,455,689.47	$ -	100.00%	100.00%	
13.1.4	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL 6 MM UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN ÁREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA HASTA 60 CM)	M	37.88	37.88		$ 84,841.00	$ 3,213,777.02	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	17.70	17.70		$ 111,316.98	$ 1,970,310.59	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	150.66	59.66		$ 247,166.77	$ 14,745,969.47	$ 22,492,176.03	39.60%	39.60%	
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	32.50	32.50		$ 202,701.31	$ 6,587,792.64	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	59.66	59.66		$ 4,352.40	$ 259,664.18	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	2,133.00	2,133.00		$ 3,520.76	$ 7,509,774.25	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	836	IED	Jairo Anibal Niño			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	3.80	3.80		$ 29,040.55	$ 110,354.10	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	207.43	207.43		$ 30,426.62	$ 6,311,406.79	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6.84	6.84		$ 20,817.86	$ 142,394.19	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	168.45	168.45		$ 10,621.20	$ 1,789,172.62	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	120.31	120.31		$ 28,815.57	$ 3,466,800.79	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	168.45	168.45		$ 11,807.73	$ 1,989,047.41	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	20.00	20.00		$ 19,332.69	$ 386,653.82	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	25.17	21.05		$ 30,969.00	$ 651,897.45	$ 127,697.57	83.62%	83.62%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.04			$ 27,437.53	$ -	$ 83,341.50	0.00%	0.00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	40.00	40.00		$ 25,467.57	$ 1,018,702.66	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12.25	12.25		$ 8,364.64	$ 102,466.88	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	31.00	31.00		$ 13,694.66	$ 424,534.44	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	121.96	121.96		$ 20,392.00	$ 2,487,008.12	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	8.00	8.00		$ 19,766.59	$ 158,132.74	$ -	100.00%	100.00%	

4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	4.25	4.25		$ 13,991.96	$ 59,465.84	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	13.00	13.00		$ 59,307.81	$ 771,001.55	$ -	100.00%	100.00%	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	5.00	5.00		$ 64,414.18	$ 322,070.90	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00			$ 118,468.31	$ -	$ 592,341.55	0.00%	0.00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	207.43	207.43		$ 39,814.42	$ 8,258,720.24	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	1.35	1.35		$ 196,536.97	$ 265,324.92	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	207.43	207.43		$ 241,797.92	$ 50,156,238.60	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	90.30	90.30		$ 14,350.87	$ 1,295,883.31	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	118.39	98.30		$ 76,716.07	$ 7,541,189.68	$ 1,541,225.89	83.03%	83.03%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	53.42	16.03		$ 67,713.97	$ 1,085,151.57	$ 2,532,020.34	30.00%	30.00%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	191.29	184.50		$ 108,436.36	$ 20,006,509.01	$ 736,445.56	96.45%	96.45%	
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	9.02	3.97		$ 853,515.01	$ 3,388,454.61	$ 4,308,543.79	44.02%	44.02%	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FUOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	3.04			$ 448,682.89	$ -	$ 1,362,874.28	0.00%	0.00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ANGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	8.17	2.45		$ 1,181,573.48	$ 2,894,855.03	$ 6,760,963.46	29.98%	29.98%	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	6.00	6.00		$ 815,394.69	$ 4,892,368.12	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	5.00	3.00	3.00	$ 575,810.47	$ 1,727,431.40	$ 1,151,620.93	60.00%	60.00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00	1.50	1.50	$ 721,070.81	$ 1,081,606.22	$ 1,081,606.22	50.00%	50.00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	16.00			$ 377,707.97	$ -	$ 6,043,327.49	0.00%	0.00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	10.00			$ 38,396.20	$ -	$ 383,962.03	0.00%	0.00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	7.00			$ 31,338.62	$ -	$ 219,370.33	0.00%	0.00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	15.64	4.06		$ 923,559.19	$ 3,749,650.32	$ 10,698,509.68	25.95%	25.95%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2.70			$ 1,036,355.99	$ -	$ 2,798,161.17	0.00%	0.00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	191.29	184.50		$ 38,464.50	$ 7,096,700.69	$ 261,231.67	96.45%	96.45%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	21.19			$ 11,692.56	$ -	$ 247,718.47	0.00%	0.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	72.64			$ 29,897.64	$ -	$ 2,171,863.23	0.00%	0.00%	
12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	72.64			$ 26,897.83	$ -	$ 1,953,947.28	0.00%	0.00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	10.22	3.07		$ 185,164.49	$ 567,936.52	$ 1,325,185.21	30.00%	30.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	60.77	25.30		$ 4,352.40	$ 110,115.72	$ 154,383.26	41.63%	41.63%	

ITEM	CPF	712	IED	Luis Lopez de Mesa			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	7.80	7.80		$ 29,040.55	$ 226,516.31	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	701.99	701.99		$ 30,062.36	$ 21,103,477.22	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56.41	56.41		$ 10,621.20	$ 599,105.51	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	32.84	32.84		$ 28,815.57	$ 946,303.20	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56.41	56.41		$ 11,807.73	$ 666,033.70	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	6.00	6.00		$ 19,332.69	$ 115,996.15	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	12.00	12.00		$ 25,467.57	$ 305,610.80	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4.00	4.00		$ 5,207.00	$ 20,828.00	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	701.99	701.99		$ 16,844.46	$ 11,824,640.79	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	14.80	14.80		$ 8,364.64	$ 123,796.72	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	8.00	8.00		$ 13,694.66	$ 109,557.27	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	74.56	74.56		$ 20,392.00	$ 1,520,427.40	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	1.50	1.50		$ 47,726.41	$ 71,589.61	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	1.60	1.60		$ 21,103.11	$ 33,764.98	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	18.66	18.66		$ 13,991.96	$ 261,090.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	8.00	8.00		$ 59,307.81	$ 474,462.49	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	5.00	5.00		$ 59,307.81	$ 296,539.06	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	2.00	2.00		$ 90,824.54	$ 181,649.09	$ -	100.00%	100.00%	
4.6.3	SUMINISTRO REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN	1.00	1.00		$ 121,077.07	$ 121,077.07	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	56.00	8.00		$ 5,829.54	$ 46,636.30	$ 279,817.80	14.29%	14.29%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	1.00		$ 118,468.31	$ 118,468.31	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	4.00	4.00		$ 185,401.53	$ 741,606.11	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	701.99	158.95		$ 65,046.28	$ 10,339,106.71	$ 35,322,733.63	22.64%	22.64%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	113.76	90.32		$ 26,316.62	$ 2,376,917.05	$ 616,861.55	79.40%	79.40%	
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	0.95	0.95		$ 70,333.44	$ 66,816.77	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	50.09	50.09		$ 14,350.87	$ 718,834.94	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	46.90	46.90		$ 76,716.07	$ 3,597,983.78	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	23.66	23.66		$ 67,713.97	$ 1,602,112.52	$ -	100.00%	100.00%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	47.61	47.61		$ 108,436.36	$ 5,162,655.25	$ -	100.00%	100.00%	
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO).	M2	2.32	2.32		$ 489,874.00	$ 1,136,752.62	$ -	100.00%	100.00%	
9.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	1.60			$ 698,853.48	$ -	$ 1,118,584.89	0.00%	0.00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ANGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	4.79			$ 1,181,573.48	$ -	$ 5,663,754.33	0.00%	0.00%	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	6.00			$ 815,394.69	$ -	$ 4,892,368.12	0.00%	0.00%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			$ 575,810.47	$ -	$ 1,151,620.93	0.00%	0.00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			$ 377,707.97	$ -	$ 1,888,539.84	0.00%	0.00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	1.00	1.00		$ 38,396.20	$ 38,396.20	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2.00			$ 31,338.62	$ -	$ 62,677.24	0.00%	0.00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	8.51			$ 923,559.19	$ -	$ 7,861,335.84	0.00%	0.00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.44			$ 1,036,355.99	$ -	$ 1,492,352.63	0.00%	0.00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	58.63	58.63		$ 38,464.50	$ 2,255,173.78	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	25.11	25.11		$ 29,897.64	$ 750,819.43	$ -	100.00%	100.00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	0.55			$ 185,164.49	$ -	$ 101,840.47	0.00%	0.00%	
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	701.99	105.60	14.51	$ 86,678.38	$ 9,153,237.01	$ 51,694,119.53	15.04%	15.04%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	727.10	105.60		$ 4,352.40	$ 459,613.44	$ 2,705,016.60	14.52%	14.52%	
19.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR DE PASAJEROS MEDIA CABINA USO PARA PERSONAS CON DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD Y PASAJEROS, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 500 KG CARGA VIVA Y TOTAL CON CABINA 890 KG APROX, 2 PARADAS, FOSO CON MEDIDAS 1.60M DE ANCHO X 1.60M DE FONDO APROX.; POSO CON MEDIDAS 1.60M DE ANCHO X 1.60M DE FONDO X 1.00M DE ALTURA APROX., MEDIDAS DE CABINA: 1.50 M DE ANCHO X 1.20M DE FONDO X 1.60M DE ALTURA, PARA EL COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA	UN	1.27			$ 76,917,022.98	$ -	$ 97,684,619.18	0.00%	0.00%	

ITEM	CPF	814	IED	Eduardo Umaña Luna			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas. si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	21.76	21.76		$ 4,435.43	$ 96,514.97	$ -	100.00%	100.00%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico	M	6.40	6.40		$ 29,040.55	$ 185,859.53	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.21	3.21		$ 30,062.36	$ 96,644.48	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1.89	1.89		$ 20,817.86	$ 39,345.76	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	66.41	66.41		$ 10,621.20	$ 705,300.47	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20.97	20.97		$ 28,815.57	$ 604,262.43	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	69.88	69.88		$ 11,807.73	$ 825,147.54	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5.00	5.00		$ 19,332.69	$ 96,663.46	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6.80	6.80		$ 30,969.00	$ 210,589.20	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11.00	11.00		$ 25,467.57	$ 280,143.23	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	3.00			$ 6,973.21	$ -	$ 20,919.64	0.00%	0.00%	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA (INCLUYE MARMOL 30x30 CM) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.21	3.21		$ 21,107.13	$ 67,855.21	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	10.50	10.50		$ 8,364.64	$ 87,828.75	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	5.00	5.00		$ 13,694.66	$ 68,473.30	$ -	100.00%	100.00%	
1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2	549.44	549.44		$ 50,276.25	$ 27,623,780.82	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	46.09	46.09		$ 20,392.00	$ 939,867.21	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	7.00	7.00		$ 36,375.35	$ 254,627.45	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE REFUERZO	M	0.95	0.26	0.26	$ 101,698.85	$ 26,441.70	$ 70,172.21	27.37%	27.37%	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	3.74	3.74		$ 68,498.74	$ 256,390.79	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	1.00	1.00		$ 85,501.22	$ 85,501.22	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	2.00	2.00		$ 47,726.41	$ 95,452.82	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	48.00	48.00		$ 13,991.96	$ 671,614.16	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7.00	7.00		$ 59,307.81	$ 415,154.68	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	5.00	5.00		$ 59,307.81	$ 296,539.06	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	1.00	1.00		$ 169,748.96	$ 169,748.96	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	2.00	2.00		$ 90,824.54	$ 181,649.09	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	3.00	3.00		$ 170,346.24	$ 511,038.72	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	44.00	44.00		$ 5,829.54	$ 256,499.65	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.13	SUSPENSION DE SALIDA SANITARIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1.00			$ 30,698.48	$ -	$ 30,698.48	0.00%	0.00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	1.00	1.00	$ 118,468.31	$ 118,468.31	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	1.00	1.00	$ 211,513.25	$ 211,513.25	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	2.00	2.00	2.00	$ 180,924.58	$ 361,849.16	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	3.21	3.21		$ 42,278.54	$ 135,917.06	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	3.21	3.21		$ 196,536.97	$ 631,827.07	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	1.80	1.80		$ 70,333.44	$ 126,600.20	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	24.70	24.70		$ 14,350.87	$ 354,466.42	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	37.48	37.48		$ 76,716.07	$ 2,875,318.36	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	24.15	20.15		$ 67,713.97	$ 1,364,436.49	$ 270,950.68	83.43%	83.43%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	72.77	72.77		$ 108,436.36	$ 7,890,914.15	$ -	100.00%	100.00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ANGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.73	1.03	1.03	$ 1,181,573.48	$ 1,217,020.69	$ 2,008,674.92	37.73%	37.73%	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4 " Y SELLANTE)	UN	5.00	2.50	2.50	$ 815,394.69	$ 2,038,486.72	$ 2,038,486.72	50.00%	50.00%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	1.00	1.00	$ 575,810.47	$ 575,810.47	$ 575,810.47	50.00%	50.00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			$ 377,707.97	$ -	$ 1,888,539.84	0.00%	0.00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00	2.00		$ 38,396.20	$ 76,792.41	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2.00	1.00		$ 31,338.62	$ 31,338.62	$ 31,338.62	50.00%	50.00%	
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	1.00	1.00		$ 948,374.57	$ 948,374.57	$ -	100.00%	100.00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	6.80			$ 923,559.19	$ -	$ 6,280,202.51	0.00%	0.00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	0.72			$ 1,036,355.99	$ -	$ 746,176.31	0.00%		
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	69.35	69.35		$ 38,464.50	$ 2,667,513.24	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	38.54	38.54		$ 29,897.64	$ 1,152,246.08	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0.60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	3.90	3.90		$ 18,044.38	$ 70,373.09	$ -	100.00%	100.00%	
12.3.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	12.00	12.00		$ 29,063.32	$ 348,759.82	$ -	100.00%	100.00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	2.82			$ 185,164.49	$ -	$ 521,830.56	0.00%	0.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	368.76	320.30		$ 4,352.40	$ 1,394,073.72	$ 210,917.30	86.86%	86.86%	

ITEM	CPF	833	IED	Dario Echandia			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de intervenorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	123.63	123.63		$ 3,404.25	$ 420,873.79	$ -	100.00%	100.00%	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	15.60	15.60		$ 2,407.88	$ 37,562.95	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.80	12.80		$ 20,817.86	$ 266,468.66	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	224.64	224.64		$ 28,054.90	$ 6,302,252.92	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERIA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	686.67	686.67		$ 34,307.63	$ 23,557,934.93	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	57.00	57.00		$ 11,171.61	$ 636,781.56	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	57.00	57.00		$ 6,973.21	$ 397,473.22	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	253.30	253.30		$ 4,099.29	$ 1,038,350.46	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	6.25	6.25		$ 8,364.64	$ 52,279.02	$ -	100.00%	100.00%	
1.3.3	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN).	UN	11.00	11.00		$ 177,967.63	$ 1,957,643.90	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	26.00	26.00		$ 36,375.35	$ 945,759.11	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.16	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	0.85	0.85		$ 1,307,170.35	$ 1,113,709.14	$ -	100.00%	100.00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	80.60	80.60		$ 6,772.33	$ 545,850.15	$ -	100.00%	100.00%	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA: INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	16806.93	16806.93		$ 24,136.40	$ 405,658,812.14	$ -	100.00%	100.00%	
3.1.13	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2	69.18	69.18		$ 12,825.52	$ 887,305.53	$ -	100.00%	100.00%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	108.00	108.00		$ 9,730.63	$ 1,050,907.74	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.25	6.25		$ 27,619.66	$ 172,622.88	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	13.00	13.00		$ 118,468.31	$ 1,540,088.04	$ -	100.00%	100.00%	

5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	2.00		$ 163,656.94	$ 327,313.87	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	27.00	27.00		$ 197,624.40	$ 5,335,858.93	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	126.65			$ 24,422.99	$ -	$ 3,093,171.73	0.00%	0.00%	
5.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	50.00			$ 46,585.41	$ -	$ 2,329,270.56	0.00%	0.00%	

5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	62.00	62.00		$ 188,899.52	$ 11,711,770.04	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	49.00	49.00		$ 185,401.53	$ 9,084,674.79	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	1,161.22	835.63	35.63	$ 29,762.38	$ 24,870,338.27	$ 9,690,297.85	71.96%	71.96%	
13.1.4	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL 6 MM UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN ÁREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA HASTA 60 CM)	M	449.28	378.90	20.87	$ 84,841.00	$ 32,146,254.29	$ 5,971,109.47	84.33%	84.33%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	17.00	17.00		$ 111,316.98	$ 1,892,388.70	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	40.00	28.60		$ 24,947.96	$ 713,511.56	$ 284,406.71	71.50%	71.50%	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	642.87	642.87		$ 247,166.77	$ 158,896,101.17	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	6.20	6.20		$ 134,793.16	$ 835,717.58	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	716.95	350.30	49.77	$ 4,352.40	$ 1,524,645.72	$ 1,595,792.23	48.86%	48.86%	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	13184.70	13184.70		$ 3,520.76	$ 46,420,122.18	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	748	IED		Alfonso Reyes Echandia		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de carpetas asfalticas y placas de concha se debe aplicar)	m2	73.41			$ 6,575.47	$ -	$ 482,716.28	0.00%	0.00%	$ 2,230.40
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	m2	73.41			$ 29,040.55	$ -	$ 2,131,914.99	0.00%	0.00%	$ 9,850.56
1.2.16	DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMINETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	176.00			$ 113,509.25	$ -	$ 19,977,628.49	0.00%	0.00%	$ 38,502.34
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	2.00			$ 22,734.26	$ -	$ 45,468.52	0.00%	0.00%	$ 7,711.46
2.2.11	MUROS DE CONTENCIÓN 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	6.00			$ 1,429,703.14	$ -	$ 8,578,218.82	0.00%	0.00%	$ 484,955.30
2.3.3	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	64.00			$ 172,618.86	$ -	$ 11,047,607.19	0.00%	0.00%	$ 58,552.32
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	480.00			$ 6,772.33	$ -	$ 3,250,720.51	0.00%	0.00%	$ 2,297.18
4.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	73.41			$ 93,453.39	$ -	$ 6,860,568.29	0.00%	0.00%	$ 31,699.39
4.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1800	M2	73.41			$ 12,287.16	$ -	$ 902,020.75	0.00%	0.00%	$ 4,167.80
9.3.4	CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 M.	M	73.41			$ 1,122,317.90	$ -	$ 82,391,214.44	0.00%	0.00%	$ 380,690.23
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	73.41			$ 4,352.40	$ -	$ 319,516.89	0.00%	0.00%	$ 1,476.33

ITEM	CPF	747	IED		Orlando Higuita		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	173.65	173.65		$ 30,062.36	$ 5,220,329.09	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	116.70	144.84		$ 10,621.20	$ 1,538,352.21	$ (298,809.88)	124.11%	124.11%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	116.70	144.84		$ 11,807.73	$ 1,710,206.97	$ (332,190.98)	124.11%	124.11%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	25.00	4.00		$ 6,973.21	$ 27,892.86	$ 146,437.50	16.00%	16.00%	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	173.65	152.28		$ 16,844.46	$ 2,565,038.63	$ 360,001.43	87.69%	87.69%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+60ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN	UN	25.00	25.00		$ 62,547.34	$ 1,563,683.40	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	153.00	153.00		$ 42,278.54	$ 6,468,617.23	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	150.00	150.00		$ 26,316.62	$ 3,947,492.88	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC. ANCHO 6 CM	M	74.66	74.66		$ 19,490.72	$ 1,455,176.92	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	116.70	116.70		$ 22,625.78	$ 2,640,428.99	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	116.70	116.70		$ 29,897.64	$ 3,489,054.59	$ -	100.00%	100.00%	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	116.70	116.70		$ 121,679.71	$ 14,200,022.39	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	173.65	173.65		$ 86,678.38	$ 15,051,700.83	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.25	AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA)	M2	173.65	173.65		$ 106,127.58	$ 18,429,054.68	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	290.35	290.35		$ 4,352.40	$ 1,263,719.34	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN)	M2	116.70	116.70		$ 7,510.23	$ 876,444.26	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	838	IED		Isabel II		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	10.26	10.26		$ 4,352.40	$ 44,633.86	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<=20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1.00	1.00		$ 1,953,740.13	$ 1,953,740.13	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	850	IED		Jhon F Kennedy		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	8.88	8.88		$ 4,352.40	$ 38,644.09	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<=20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1.00	1.00		$ 1,953,740.13	$ 1,953,740.13	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	817	IED		Marsella		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	27.59	27.59		$ 4,352.40	$ 120,102.30	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.2	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<15M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1.00	1.00		$ 739,630.79	$ 739,630.79	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.6	PODA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<=20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	4.00	4.00		$ 976,870.07	$ 3,907,480.26	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	890	IED		Nelson Mandela		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.08	17.08	17.08	$ 30,426.62	$ 519,686.74	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22.00	22.00	22.00	$ 17,444.42	$ 383,777.22	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	11.00	11.00	11.00	$ 85,501.22	$ 940,513.46	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	UN	22.00	22.00	22.00	$ 20,568.77	$ 452,513.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	16.00	16.00	16.00	$ 5,829.54	$ 93,272.60	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	34.16	34.16	34.16	$ 42,278.54	$ 1,444,235.06	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.30	TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	34.16	34.16	34.16	$ 127,154.36	$ 4,343,592.99	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.3	PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	8.54	8.54	8.54	$ 36,604.35	$ 312,601.18	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMICO CERTIFICADO)	M2	8.54	8.54	8.54	$ 11,692.56	$ 99,854.42	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	8.54	8.54	8.54	$ 17,192.65	$ 146,825.23	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	34.16	34.16	34.16	$ 4,352.40	$ 148,677.98	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	763	IED		Bicentenario		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	15.00			$ 6,772.33	$ -	$ 101,585.02	0.00%	0.00%	
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2	25.20			$ 195,409.37	$ -	$ 4,924,316.07	0.00%	0.00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	50.40			$ 22,625.78	$ -	$ 1,140,339.51	0.00%	0.00%	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	36.60			$ 18,025.63	$ -	$ 659,738.13	0.00%	0.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	36.60			$ 4,352.40	$ -	$ 159,297.84	0.00%	0.00%	

ITEM	CPF	729	IED		San bernardino		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2.00			$ 122,747.05	$ -	$ 245,494.11	0.00%	0.00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.60			$ 20,817.86	$ -	$ 158,111.68	0.00%	0.00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2' A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	2.40			$ 16,375.74	$ -	$ 39,301.77	0.00%	0.00%	
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	0.18			$ 633,678.64	$ -	$ 114,062.15	0.00%	0.00%	
2.2.17	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2	1.20			$ 128,126.62	$ -	$ 153,751.94	0.00%	0.00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	13.32			$ 6,772.33	$ -	$ 90,174.99	0.00%	0.00%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	7.60			$ 136,417.61	$ -	$ 1,036,091.73	0.00%	0.00%	

3.1.11	RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	M2	15.19			$ 137,324.25	$ -	$ 2,085,955.30	0.00%	0.00%	
ITEM	**CPF**	**821**	**IED**		**San Jose**		**SEMANA**				
Ítem	**Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	8.98	8.98		$ 4,352.40	$ 39,081.94	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.2	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<15M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1.00	1.00		$ 739,630.79	$ 739,630.79	$ -	100.00%	100.00%	

FECHA:	04/04/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**39**	
CORTE DEL INFORME:	***04/04/2026***	

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	21	**DEL**	29-mar-26	**AL**	04-abr-26

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.8169111	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.8154784
Fecha de Iniciación	14/10/2025	**Fecha de Iniciación**	14/10/2025
Fecha de Terminación	13/05/2026	**Fecha de Terminación**	13/05/2026
Plazo Inicial	7 MESES	**Plazo Inicial**	7 MESES
Valor inicial	$ 880,146,577.00	**Valor inicial**	$ 2,975,834,553.00
Adiciones	$ 83,867,649.00	**Adiciones**	$ 523,987,595.00
Prorroga	N.A.	**Prorroga**	N.A.
Suspensión	N.A.	**Suspensión**	N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES
No.	**FRENTE**	PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	PROGRAMADO ACUM	EJECUTADO ACUM	DESVIACIÓN	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**
1	PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	71.00%	72.75%	80.00%	94.45%	14.45%	BAÑO: Instalacion de enchape, media cañas y instalación de tubería e instalación de piso en vinisol y pintura
2	PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	27.00%	20.64%	30.00%	20.64%	-9.36%	Cocina: Instalacion de piso, cambio de tuberias
3	EL PORVENIR	55.00%	56.62%	100.00%	100.00%	0.00%	BAÑO: instalacion de enchape, media cañas y instalación manto en cubierta
4	VILLAS DEL PROGRESO	71.66%	76.72%	100.00%	100.00%	0.00%	BAÑO Y CANCHA: Instalación de enchape, Fundicion de placa
5	PABLO DE TARSO	53.30%	84.89%	60.00%	85.35%	25.35%	Desmonte e instalación de cubierta
6	JAIRO ANIBAL NIÑO	58.44%	66.12%	62.30%	69.96%	7.66%	BAÑO Y SALONES DE PREESCOLAR: Instalación de enchape, media caña y piso
7	LUIS LOPEZ DE MESA	25.65%	26.07%	27.60%	31.42%	3.82%	BAÑO: Instalacion de manto de aluminio sobre cubierta y enchape
8	EDUARDO UMAÑA LUNA	70.87%	77.62%	75.45%	83.17%	7.72%	BAÑO: Instalacion de enchape
9	DARIO ECHANDIA	87.44%	93.11%	100.00%	100.00%	0.00%	CUBIERTA: Instalación de cubierta
10	LLANO ORIENTAL - ALFONSO REYES ECHANDIA						0
TOTALES		**57.82%**	**63.84%**	**70.59%**	**76.11%**	**5.52%**	

3. RESUMEN FINANCIERO

PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 261,167,046	$ 246,677,196	**$ 14,489,850**		21.70%	94.45%

PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 85,000,000	$ 17,547,123	**$ 67,452,877**		0.00%	20.64%

EL PORVENIR

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 110,086,654	$ 110,086,654	**$ -**		43.40%	100.00%

VILLAS DEL PROGRESO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 166,676,454	$ 166,676,454	**$ -**		23.30%	100.00%

PABLO DE TARSO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 189,976,713	$ 162,150,718	**$ 27,825,995**		0.46%	85.35%

JAIRO ANIBAL NIÑO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 203,141,470	$ 142,126,492	**$ 61,014,979**		3.80%	69.96%

LUIS LOPEZ DE MESA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 292,710,605	$ 91,983,666	**$ 200,726,939**		5.40%	31.42%

EDUARDO UMAÑA LUNA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 76,965,087	$ 64,015,165	**$ 12,949,922**		5.60%	83.17%

DARIO ECHANDIA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 795,148,175	$ 795,148,175	**$ -**		6.90%	100.00%

FECHA:	04/04/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**39**	
CORTE DEL INFORME:	***04/04/2026***	

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	21	**DEL**	29-mar-26	**AL**	04-abr-26

EMERGENCIAS

BALANCE EMERGENCIAS	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 114,665,609	$ 100,539,128	**$ 14,126,481**		2.10%	87.68%

4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:
- Mantener orden y aseo en la obras, así como la señalización
- Continuar con el uso correcto de EPP
- Apertura de más frentes de obra

CONCLUSIONES:
- Se avanzó en tres frentes de trabajo con actividades de cerramiento, demoliciones, desmontes, pañete, e Instalación de pisos, cubiertas, enchape.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

1. Se continua con avances en los frentes de obra en los siguientes colegios: Alfonso Lopez Michelsen, El Porvenir, Villas del progreso, Jairo Anibal Niño, Eduardo Umaña Luna , Luis Lopez de Mesa y Dario Echandia.

2. Se continua con avance en los frentes de obra en las emergencias en los siguientes colegios: Orlando Higuita.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente semana, se mantiene el personal previamente aprobado para el ingreso y ejecución de actividades, asegurando que todo el personal cumpla con los requisitos establecidos por la interventoría. De igual manera, se evidenció la ejecución de actividades en los colegios, Luis López de Mesa, Alfonso López Michelsen, Villas del Progreso, El Porvenir, Jairo Aníbal Niño, Dario Echandia Sede B, Colegio Eduardo Uñama Luna, Colegio Pablo de Tarso.
Durante el periodo reportado, se evidenció que las USP fueron recogidas, dejando únicamente las necesarias en el colegio El Porvenir. Se validó que las USP presentes se encuentran en correcto estado y con mantenimiento adecuado, asegurando condiciones higiénicas y seguras para su uso. Así mismo, se recomienda al contratista realizar la reposición de guantes de seguridad para el personal, garantizando que todos los trabajadores cuenten con los EPP necesarios para el desarrollo seguro de sus actividades.
En el colegio Alfonso López Michelsen, se observó la instalación de señalización adecuada indicando el funcionamiento del cerramiento en las áreas donde se están ejecutando actividades en los baños. Asimismo, se verificó que los residuos generados se mantienen cubiertos y gestionados correctamente, garantizando condiciones seguras y ordenadas en el área de trabajo.
En el colegio Luis López de Mesa, se constató la señalización perimetral en las zonas de acopio de materiales, se verificó que el personal cuenta con el uso adecuado de los EPP y EPCC, se validaron los puntos de anclaje para las actividades realizadas en cubierta, asegurando la seguridad en trabajos en altura.
En el colegio Pablo de Tarso, se verificó que el contratista mantiene la señalización en la reja que delimita las actividades de obra del área escolar, la cual permanece cerrada, garantizando la seguridad de los estudiantes y del personal de obra.
Adicionalmente, se constató la instalación de señalización de área restringida, informando a las personas sobre la limitación de acceso y reforzando las medidas de seguridad en el frente de obra
En los demás frentes de obra, se constató que el personal cuenta con dotación completa y uso adecuado de EPP durante la ejecución de las actividades. Adicionalmente, los cerramientos perimetrales se encuentran en buen estado, cumpliendo con las normas de seguridad establecidas. trabajadas: 44

REPORTE PERSONAL

Total de horas capacitación: 20 minutos — DIRECTOR OBRA: 1 — INSPECTORES SST: 1
Número de accidentes de trabajo: 0 — RESIDENTE OBRA: 1 — PERSONAL OPERATIVO: 49
Número de días de incapacidad por AT:0
Número de días de incapacidad por enfermedad común: 0

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

IED Cultura Alfonso López Michelsen: Se realizo recorrido en el frente, se acopio los residuos de demolición adecuadamente (cubierto y señalizado), pero se recomienda realizar el retiro total de los RCD y implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).
IED Villas del progreso: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento adecuado, se encuentran bolsas de lonas de residuos acopiados adecuadamente, se recomendó al contratista disponer el material, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente.
IED El Porvenir: Se realizo recorrido en el frente, presenta señalización en el frente de obra. Se acopio materiales de construcción y los residuos adecuadamente, al igual se recomienda realizar la disposición e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Jairo Aníbal Niño: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia residuos embalados, al igual se recomendó disponerlo, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Darío Echandía: Se realizo recorrido en el frente, se presenta el cerramiento adecuado, se reporta el ingreso de materiales que fueron debidamente acopiados, se evidencian luminarias acopiadas expuestas a las condiciones meteorológicas, al igual se recomienda realizar la disposición con el gestor adecuado, mantener orden en el frente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Eduardo Umaña Luna: Se realizo recorrido en el frente, se encuentra el cerramiento adecuado con su debida señalización, el material de construcción y los RCD se encuentran acopiados adecuadamente, pero se recomienda disponerlo, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente al igual que implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Pablo de torso: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con la debida señalización, se evidencia material de construcción y un volumen medio de residuos, se recomendó disponerlos, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Luis López de mesa: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento adecuado, se evidencia gran volumen de residuos y material acopiados adecuadamente, por lo que se recomienda al contratista realizar la debida disposición adecuada ya que cuenta con la cantidad mínima para su recolección y garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente.

OTROS

ING JHONER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING HARRY ARANGO
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA:	04/04/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**39**	
CORTE DEL INFORME:	***04/04/2026***	

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA

Alfonso Lopez Michelsen



Pintura



Pintura



Instalacion Sanitarios



Instalacion mesones

Alfonso Lopez Michelsen Cocina

0

Pintura

0.00

Pintura

0	0
Pintura	Pintura

El Porvenir

	
Instalacion Sanitarios Instalacion Sanitarios	Pintura Pintura



Instalacion Sanitarios



Instalacion Sanitarios

Villas del Progreso



Piso



Instalacion de mesones



Instalacion de mesones



Pintura

Jairo Anibal Niño



Instalacion de Sanitarios



Instalacion de Sanitarios

	
Pintura	Pintura
Eduardo Umaña Luna	
	
Pintura	Pintura
	
Instalacion de Mesones	Instalacion tomas electricas

Dario Echandia



Pintura



Pintura




Pintura



Pintura

Luis Lopez De Mesa

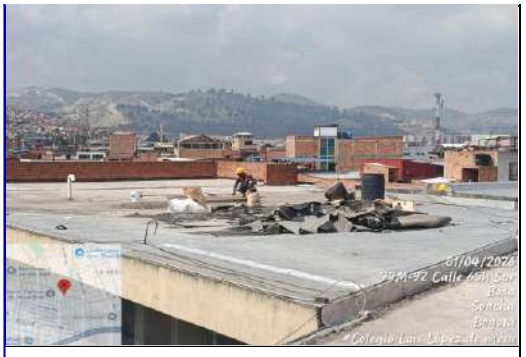

Cubierta



Cubierta



Manto para cubierta



Instalacion Sanitarios

Pablo de Tarso



Instalacion de estructura



Instalacion de estructura




Instalacion de estructura



Instalacion de estructura

FECHA: 04/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES 39 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANANCIA				
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			GRUPO	7
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154784	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDU 2025	
4/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169111	INTERVENTOR:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S	

TIPO DE INTERVENCION 21 ###	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE		ESTADO ACTUAL O FINAL
Alfonso Lopez Michelsen	Mejoramiento de baterias sanitarias y salones de preescolar	BAÑO: Instalacion de enchape, media cañas y instalación de tuberia e instalación de piso en vinisol y pintura				
Alfonso Lopez Michelsen Cocina	Mejoramiento de cocina	Cocina: Instalacion de piso, cambio de tuberias				
El Porvenir	Mejoramiento de cubierta y baterias sanitarias	BAÑO: instalacion de enchape, media cañas y instalación manto en cubierta				
Villas del Progreso	Mejoramiento de baterias y canchas sanitarias	BAÑO Y CANCHA: Instalación de enchape, Fundicion de placa				
Pablo de Tarso	Desmonte e instalación de cubierta	Desmonte e instalación de cubierta				
Jairo Anibal Niño	Mejoramiento de baterias sanitarias y pisos preescolar	BAÑO Y SALONES DE PREESCOLAR: Instalación de enchape, media caña y piso				
Luis Lopez de Mesa	Mejoramiento de baterias sanitarias	BAÑO: Instalacion de manto de aluminio sobre cubierta y enchape				
Eduardo Umaña	Mejoramiento de baterias sanitarias y cerramiento	BAÑO: Instalacion de enchape				
Dario Echandia	Desmonte e instalación de cubierta	CUBIERTA: Instalación de cubierta				

EMERGENCIA No. 1 Colegio Orlando Higuita						
EMERGENCIA No. 2 San Bernardino						
EMERGENCIA No. 3 Isabel II						
EMERGENCIA No. 4 Jhon F Kennedy						

EMERGENCIA No. 5 Marsella						
EMERGENCIA No. 6 Nelson Mandela						
EMERGENCIA No. 7 Bicentenario						
EMERGENCIA No. 8 San Jose						
EMERGENCIA No. 9 Nicolas Esguerra						

FECHA: 04/04/2026	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 39 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		GRUPO 7
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA		
CORTE DEL INFORME: 4 de abril de 2026	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO EDU 2025	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S

DATOS:	FECHAS INTERVENTORIA	FECHAS OBRA	ETAPA:	PLAZOS EN DIAS INTERVENTORIA	PLAZOS EN DIAS OBRA	VALOR CONTRATO ETAPA:	VALOR CONTRATO INTERVENTORIA	VALOR CONTRATO OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169111	CO1.PCCNTR.8154784	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,278,928	$ 2,451,846,958
INICIO	14 de octubre de 2025	14 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ 83,867,649.00	$ 523,987,595.00
TERMINACION INICIAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	PRORROGAS			TOTAL	$ 880,146,577.00	$ 2,975,834,553.00
TERMINACION FINAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	TOTAL	211	211			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	05/12/2025	$ 83,867,649.00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	05/12/2025	$ 523,987,595.00		
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400-47	5 9 2025	5 10 2026	5 4 2026	5 4 2031	5 9 2025	5 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
895-47	14 10 2025	15 1 2027	14 10 2025	15 5 2027	14 10 2025	15 1 2027	895-74	5 4 2026	15 5 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (31082024)	PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	dic-2025	ene-2026	feb-2026	mar-2026	abr-2026	may-2026	jun-2026	jul-2026	ago-2026	sep-2026	oct-2026	nov-2026	dic-2026	ene-2027	feb-2027	mar-2027
751	PORTAL DEL SOL -	Bosa	A	Portal del Sol Alfonso Lopez Michelsen	72.75%	94.45%	80.00%		$ 261,167,045.68	$ 246,677,196	12/11/2025	09/04/2026																			
751	PORTAL DEL SOL -	Bosa	A	Portal del Sol Alfonso Lopez Michelsen	20.64%	20.64%	30.00%		$ 85,000,000.00	$ 17,547,123	11/01/2026	13/05/2026																			
742	EL PORVENIR	Bosa	B	El Recuerdo Santa Fe	58.62%	100.00%	100.00%		$ 110,086,654.11	$ 110,086,654.11	19/11/2025	30/03/2026																			
764	VILLAS DEL PROGRESO	Bosa	B	Enrique Dussel	76.72%	100.00%	100.00%		$ 166,676,454.24	$ 166,676,454.24	12/11/2025	09/04/2026																			
714	PABLO DE TARSO	Bosa	A	Pablo de Tarso	84.89%	85.35%	85.00%		$ 189,976,712.63	$ 162,150,715	19/11/2025	19/03/2026																			
836	JAIRO ANIBAL NIÑO	Kennedy	A	Patio Bonito I	66.12%	69.99%	80.00%		$ 203,141,470.45	$ 142,126,492	26/11/2025	19/03/2026																			
712	LUIS LOPEZ DE MESA	Bosa	A	Luis Lopez de Mesa	26.97%	31.42%	27.60%		$ 292,715,604.53	$ 91,903,666	11/12/2025	09/04/2026																			
814	EDUARDO UMAÑA LUNA	Kennedy	A	Dindalito	77.62%	83.17%	76.45%		$ 76,965,086.69	$ 64,015,165	19/11/2025	02/02/2026																			
833	DARIO ECHANDIA	Kennedy	B	Los Patios	93.11%	100.00%	100.00%		$ 795,140,174.67	$ 795,140,174.67	12/11/2025	26/03/2026																			
748	LLANO ORIENTAL -	Bosa	A	San José de Maryland San Pedro -					$ 135,987,595.00	$ -	14/10/2025	13/05/2026																			
	TOTAL FRENTES DE OBRA					76.11%		70.59%	$ 2,316,859,798	$ 1,796,411,642																					
	EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
747	LA LIBERTAD - ORLANDO	Bosa	A	Orlando Higuita - Holanda la Libertad	100.00%	100.00%	100.00%		$ 82,116,894	$ 82,116,894	19/11/2025	15/01/2026																			
729	SAN BERNARDINO	Bosa	A	San Bernardino	0.00%	0.00%	0.00%		$ 3,922,944	$ -	24/11/2025	31/12/2025																			
838	ISABEL II	Kennedy	B	Pio XII	100.00%	100.00%	100.00%		$ 1,998,374	$ 1,998,374	29/11/2025	19/12/2025																			
850	JOHN F. KENNEDY	Kennedy	A	John F. kennedy	100.00%	100.00%	100.00%		$ 1,992,384	$ 1,992,384	29/11/2025	12/12/2025																			
817	MARSELLA	Kennedy	A	Bas-Med. Marsella	100.00%	100.00%	100.00%		$ 4,787,213	$ 4,787,213	28/11/2025	18/12/2025																			
890	NELSON MANDELA	Kennedy	A	Campanita Tintal	100.00%	73.42%	70.00%		$ 12,103,037	$ 8,885,550	26/11/2025	16/01/2026																			
763	BICENTENARIO	Bosa	A	San José de Maryland	0.00%	0.00%	0%		$ 6,998,050	$ -	27/11/2025	16/01/2026																			
821	SAN JOSE	Kennedy	B	El Descanso	100.00%	100.00%	100%		$ 778,713	$ 778,713																					
859	NACIONAL NICOLAS	Kennedy	A	Nicolas Esquerra																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	TOTAL FRENTES DE OBRA					71.68%		71.25%	$ 114,665,609	$ 100,539,128																					

ACUMULADO FRENTES DE OBRA

TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
3	6	0	9	$ 1,796,411,642
ACUMULADO EMERGENCIAS				
1	5	2	8	$ 100,539,128
TOTAL				
4	11	2	17	$ 1,896,950,771
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	

AVANCE GENERAL

AVANCE	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
	76.11%	0.00%	81.52%
PROGRAMADO	70.59%		
ATRASO	5.52%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			


AVANCE GENERAL




EMERGENCIAS



AVANCE FÍSICO



AVANCE DE LOS FRENTES



OBSERVACIONES:

BALANCE SEMANAL POR CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS

		CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2026
GRUPOS	ITEM	CPF	751	IED		Alfonso Lopez Michelsen	SEMANA				
	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si es su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	30.69	30.69		$ 4,435.43	$ 136,101.63	$ -	100.00%	100.00%	
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	3.79	3.79		$ 29,040.55	$ 110,063.69	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.01	40.01		$ 30,062.36	$ 1,202,753.00	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	450.72	450.72		$ 30,426.62	$ 13,713,897.10	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	113.46	113.46		$ 10,621.20	$ 1,205,071.78	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.12	21	M	46,110.00	76.42		$ 28,815.57	$ 2,202,085.58	############	0.17%	0.17%	
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	123.57	123.57		$ 11,807.73	$ 1,459,112.04	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11.00	11.00		$ 19,332.69	$ 212,659.60	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10.80	10.80		$ 30,969.00	$ 334,539.53	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	18.00	18.00		$ 25,467.57	$ 458,416.20	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	5.00	5.00		$ 6,973.21	$ 34,866.07	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.01	40.01		$ 21,107.13	$ 844,466.77	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	1.60	1.60		$ 8,364.64	$ 13,383.43	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	18.00	18.00		$ 13,694.66	$ 246,503.87	$ -	100.00%	100.00%	
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	84.44	84.44		$ 20,392.00	$ 1,721,900.34	$ -	100.00%	100.00%	
	4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	27.38	27.38		$ 13,991.96	$ 383,099.91	$ -	100.00%	100.00%	
	4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	13.00	13.00		$ 59,307.81	$ 771,001.55	$ -	100.00%	100.00%	
	4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	11.00	11.00		$ 59,307.81	$ 652,385.92	$ -	100.00%	100.00%	
	4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/2"	UN	2.00	2.00		$ 201,917.88	$ 403,835.76	$ -	100.00%	100.00%	
	4.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN	2.00	2.00		$ 85,229.37	$ 170,458.73	$ -	100.00%	100.00%	
1	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	2.00		$ 118,468.31	$ 236,936.62	$ -	100.00%	100.00%	
	5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	5.00	5.00		$ 185,401.53	$ 927,007.63	$ -	100.00%	100.00%	
	7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	450.72	450.72		$ 39,814.42	$ 17,945,153.58	$ -	100.00%	100.00%	
	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	40.01	40.01		$ 42,278.54	$ 1,691,505.36	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	40.01	40.01		$ 196,536.97	$ 7,863,169.19	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	12.00	12.00		$ 70,333.44	$ 844,001.34	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	450.72	450.72		$ 241,797.92	$ 108,983,157.06	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	116.40	116.40		$ 14,350.87	$ 1,670,383.54	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	63.34	63.34		$ 76,716.07	$ 4,859,196.00	$ -	100.00%	100.00%	
	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	112.85	112.85		$ 108,436.36	$ 12,237,103.23	$ -	100.00%	100.00%	
	9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	4.59	4.59		$ 853,515.01	$ 3,919,682.35	$ -	100.00%	100.00%	
	9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	7.92	7.92	7.92	$ 1,181,573.48	$ 9,358,061.97	$ -	100.00%	100.00%	
	10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	4.00	4.00	4.00	$ 721,070.81	$ 2,884,283.25	$ -	100.00%	100.00%	
	10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	11.00	11.00	6.00	$ 377,707.97	$ 4,154,787.65	$ -	100.00%	100.00%	
	10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00	4.00		$ 38,396.20	$ 153,584.81	$ -	100.00%	100.00%	
	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20,	M2	33.87	33.87	11.00	$ 923,559.19	$ 31,283,720.51	$ -	100.00%	100.00%	
	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	1.80		$ 1,036,355.99	$ 1,865,440.78	$ -	100.00%	100.00%	
	12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	112.53	112.53		$ 38,464.50	$ 4,328,346.99	$ -	100.00%	100.00%	
	12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	66.93	66.93		$ 29,897.64	$ 2,001,049.05	$ -	100.00%	100.00%	
	12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	59.26	59.26		$ 26,897.83	$ 1,593,965.52	$ -	100.00%	100.00%	
	14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	7.92	7.92	7.92	$ 185,164.49	$ 1,466,502.74	$ -	100.00%	100.00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	30.69	30.69		$ 4,352.40	$ 133,553.83	$ -	100.00%	100.00%	
GRUPOS	ITEM	CPF	751	IED		Alfonso Lopez Michelsen Cocina	SEMANA				
	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.93	3.93		$ 30,062.36	$ 118,217.23	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.93	3.93		$ 30,426.62	$ 119,649.66	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2.00	2.00		$ 25,467.57	$ 50,935.13	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13.09	13.09		$ 21,107.13	$ 276,292.35	$ -	100.00%	100.00%	
	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	7.35	7.35		$ 85,501.22	$ 628,434.00	$ -	100.00%	100.00%	
	4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2.00	2.00		$ 71,024.47	$ 142,048.94	$ -	100.00%	100.00%	
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	4.00	4.00		$ 5,829.54	$ 23,318.15	$ -	100.00%	100.00%	
	5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	5.00			$ 534,497.49	$ -	$ 2,672,487.43	0.00%	0.00%	
	5.1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	127.73			$ 53,182.31	$ -	$ 6,792,908.92	0.00%	0.00%	
	5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG THHN	M	150.20			$ 83,551.35	$ -	$ 12,549,412.59	0.00%	0.00%	
	5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	30.00			$ 185,401.53	$ -	$ 5,562,045.79	0.00%	0.00%	
1	5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	2.00			$ 819,132.39	$ -	$ 1,638,264.79	0.00%	0.00%	
	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	13.09	13.09		$ 42,278.54	$ 553,426.14	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	12.60	12.60		$ 196,536.97	$ 2,476,365.88	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	90.50	90.50		$ 19,490.72	$ 1,763,909.67	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	22.42	22.42		$ 76,716.07	$ 1,719,974.33	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	131.64	131.64		$ 67,713.97	$ 8,913,587.98	$ -	100.00%	100.00%	
	10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	6.00	6.00		$ 31,338.62	$ 188,031.72	$ -	100.00%	100.00%	
	11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EYECTORA BARNES IC0027 VOLTAJE 220 TRIFASICA (360 GPM DESCARGA 3" 3HP)	UN	3.00			$ 6,591,038.86	$ -	$ 19,773,116.58	0.00%	0.00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	131.64	131.64		$ 4,352.40	$ 572,932.00	$ -	100.00%	100.00%	

	19.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMATICO CON 2 BOMBAS DE 2HP 110/220 TANQUE HIDRONEUMATICO POR MEMBRANA DE 200LTS, MARCA PEARL, TABLERO DE CONTROL CON NORMA RETIE (INCLUYE 2 BOMBAS ALTA PRESIÓN CAUDAL 2.33LPS H.MAQ 50MT 1 TANQUE HIDROACUMULADOR MEMBRANA 200LTS VERTICAL CON MANOMETRO ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN ENTRE BOMBAS Y TANQUE EN HIERRO GALVANIZADO (HG), 1 FLAUTA DE DESCARGA EN 3" INCLUYE COPA DE DESCARGA 3 A 2, 2 REGISTROS EN BRONCE TIPO COMPUERTA, 2 VÁLVULAS CHEQUE HIDRONEUMATICO EN BRONCE, 1 TABLERO DE CONTROL EN COFRE METÁLICO CON NORMA RETIE 2- PRESOSTATOS RANGO 40/60, 1 SENSOR DE NIVEL (FLOTADOR), 1 MANOMETRO EN GLICERINA CON CARATULA DE 2" (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	UN	1.00			$ 18,464,640.51	$ -	$ 18,464,640.51	0.00%	0.00%	

	ITEM	CPF	742	IED	El Porvenir			SEMANA				
	Item	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	7.75	7.75		$ 29,040.55	$ 225,064.28	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	58.31	58.31		$ 30,426.62	$ 1,774,298.15	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2.97	2.97		$ 20,817.86	$ 61,795.75	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	106.35	106.35		$ 10,621.20	$ 1,129,606.59	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMINAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	63.15	63.15		$ 28,815.57	$ 1,819,703.02	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	106.35	106.35		$ 11,807.73	$ 1,255,798.93	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	10.00	10.00		$ 19,332.69	$ 193,326.91	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.75	12.75		$ 30,969.00	$ 394,947.66	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	24.00	24.00		$ 25,467.57	$ 611,221.59	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4.00	4.00		$ 6,973.21	$ 27,892.86	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	24.00	24.00		$ 13,694.66	$ 328,671.82	$ -	100.00%	100.00%	
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	97.49	97.49		$ 20,392.00	$ 1,988,015.92	$ -	100.00%	100.00%	
	2.3.7	PERFORACIÓN NÚCLEO 3" E= 0.10 M	UN	2.00	2.00		$ 162,040.52	$ 324,081.04	$ -	100.00%	100.00%	
	3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	2.44	2.44		$ 68,498.74	$ 167,383.52	$ -	100.00%	100.00%	
	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	5.50	5.50		$ 85,501.22	$ 470,256.73	$ -	100.00%	100.00%	
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	100.00	100.00		$ 5,829.54	$ 582,953.76	$ -	100.00%	100.00%	
	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	2.00		$ 118,468.31	$ 236,936.62	$ -	100.00%	100.00%	
	5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00	4.00		$ 211,513.25	$ 846,052.99	$ -	100.00%	100.00%	
	5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA, INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	4.00	4.00		$ 185,401.53	$ 741,606.11	$ -	100.00%	100.00%	
2	7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	57.35	57.35		$ 65,046.28	$ 3,730,404.34	$ -	100.00%	100.00%	
	7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	30.30	30.30		$ 26,316.62	$ 797,393.56	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	52.48	52.48		$ 14,350.87	$ 753,133.51	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	72.85	72.85		$ 76,716.07	$ 5,588,535.70	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	44.37	44.37		$ 67,713.97	$ 3,004,360.49	$ -	100.00%	100.00%	
	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	106.35	106.35		$ 108,436.36	$ 11,532,207.23	$ -	100.00%	100.00%	
	9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJA LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	4.51	4.51		$ 853,515.01	$ 3,849,352.71	$ -	100.00%	100.00%	
	9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	5.09	5.09	2.00	$ 1,181,573.48	$ 6,011,845.87	$ -	100.00%	100.00%	
	10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	4.00	4.00	4.00	$ 721,070.81	$ 2,884,283.25	$ -	100.00%	100.00%	
	10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	10.00	10.00	5.00	$ 377,707.97	$ 3,777,079.68	$ -	100.00%	100.00%	
	10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	5.00	5.00	5.00	$ 38,396.20	$ 191,981.02	$ -	100.00%	100.00%	
	10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	12.00	12.00		$ 948,374.57	$ 11,380,494.82	$ -	100.00%	100.00%	
	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	9.00	9.00	5.00	$ 923,559.19	$ 8,312,032.73	$ -	100.00%	100.00%	
	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2.70	2.70		$ 1,036,355.99	$ 2,798,161.17	$ -	100.00%	100.00%	
	12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	106.35	106.35		$ 38,464.50	$ 4,090,853.69	$ -	100.00%	100.00%	
	12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	68.62	68.62		$ 29,897.64	$ 2,051,683.69	$ -	100.00%	100.00%	
	12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	30.00	30.00		$ 26,897.83	$ 806,934.96	$ -	100.00%	100.00%	
	14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	4.68	4.68	2.00	$ 185,164.49	$ 866,569.80	$ -	100.00%	100.00%	
	16.1.4	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	58.00	58.00		$ 86,678.38	$ 5,027,346.09	$ -	100.00%	100.00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	100.64	100.64		$ 4,352.40	$ 438,025.54	$ -	100.00%	100.00%	
	NP-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DOBLE DESCARGA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS	UND	10.00	10.00		$ 995,640.29	$ 9,956,402.93	$ -	100.00%	100.00%	

	ITEM	CPF	764	IED	Villas del Progreso			SEMANA				
	Item	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	43.80	43.80		$ 29,040.55	$ 1,271,976.18	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13.80	13.80		$ 30,426.62	$ 419,887.41	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	63.53	63.53		$ 10,621.20	$ 674,764.53	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMINAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	27.20	27.20		$ 28,815.57	$ 783,783.41	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	63.53	63.53		$ 11,807.73	$ 750,144.86	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8.00	8.00		$ 19,332.69	$ 154,661.53	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.68	7.68		$ 30,969.00	$ 237,841.92	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5.00	5.00		$ 25,467.57	$ 127,337.83	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	20.00	20.00		$ 19,332.69	$ 386,653.82	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	2.00	2.00		$ 6,973.21	$ 13,946.43	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	8.00	8.00		$ 13,694.66	$ 109,557.27	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.44	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) .	M2	13.80	13.80		$ 97,993.28	$ 1,352,307.29	$ -	100.00%	100.00%	
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	29.10	29.10		$ 20,392.00	$ 593,407.15	$ -	100.00%	100.00%	
	1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	84.00	84.00		$ 17,444.42	$ 1,465,331.21	$ -	100.00%	100.00%	
	1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	21.00	21.00		$ 36,375.35	$ 763,882.36	$ -	100.00%	100.00%	
	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	44.69	44.69		$ 96,359.46	$ 4,306,304.16	$ -	100.00%	100.00%	
	2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	41.16	41.16		$ 22,734.26	$ 935,742.11	$ -	100.00%	100.00%	
	2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM DE 0.15 X 0.15 M	KG	837.41	837.41		$ 7,440.60	$ 6,230,828.83	$ -	100.00%	100.00%	
	3.2.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	M	3.20	3.20		$ 40,900.51	$ 130,881.62	$ -	100.00%	100.00%	

4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	56.00	56.00		$ 85,501.22	$ 4,788,068.54	$ -	100.00%	100.00%		
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	10.00	10.00		$ 47,726.41	$ 477,264.10	$ -	100.00%	100.00%		
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	8.00	8.00		$ 121,102.52	$ 968,820.13	$ -	100.00%	100.00%		
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	18.60	18.60		$ 13,991.96	$ 260,250.49	$ -	100.00%	100.00%		
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7.00	7.00		$ 59,307.81	$ 415,154.68	$ -	100.00%	100.00%		
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	8.00	8.00		$ 59,307.81	$ 474,462.49	$ -	100.00%	100.00%		
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	6.00	6.00		$ 169,748.96	$ 1,018,493.74	$ -	100.00%	100.00%		
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	2.00	2.00		$ 90,824.54	$ 181,649.09	$ -	100.00%	100.00%		
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	3.00	3.00		$ 64,414.18	$ 193,242.54	$ -	100.00%	100.00%		
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	3.00	3.00		$ 71,024.47	$ 213,073.42	$ -	100.00%	100.00%		
4.7.8	RENIVELACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	1.00	1.00		$ 78,661.93	$ 78,661.93	$ -	100.00%	100.00%		
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	60.00	60.00		$ 5,829.54	$ 349,772.26	$ -	100.00%	100.00%		
4.9.13	SUSPENSION DE SALIDA SANITARIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8.00	8.00		$ 30,698.48	$ 245,587.85	$ -	100.00%	100.00%		
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	2.00	2.00		$ 118,468.31	$ 236,936.62	$ -	100.00%	100.00%		
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	2.00	2.00		$ 185,401.53	$ 370,803.05	$ -	100.00%	100.00%		
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	13.80	13.80		$ 42,278.54	$ 583,443.91	$ -	100.00%	100.00%		
7.1.8	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALLANADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) E= 10 CM	M2	401.60	401.60		$ 143,272.97	$ 57,538,425.88	$ -	100.00%	100.00%		
7.1.9	JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	M	365.00	365.00		$ 36,001.71	$ 13,140,625.46	$ -	100.00%	100.00%		
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	13.80	13.80		$ 196,536.97	$ 2,712,210.25	$ -	100.00%	100.00%		
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	4.92	4.92		$ 70,333.44	$ 346,040.55	$ -	100.00%	100.00%		
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	30.20	30.20		$ 14,350.87	$ 433,396.19	$ -	100.00%	100.00%		
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	387.00	387.00		$ 19,237.61	$ 7,444,954.30	$ -	100.00%	100.00%		
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	32.67	32.67		$ 76,716.07	$ 2,506,314.07	$ -	100.00%	100.00%		
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	63.76	63.76		$ 108,436.36	$ 6,913,902.52	$ -	100.00%	100.00%		
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	4.18	4.18		$ 853,515.01	$ 3,564,278.70	$ -	100.00%	100.00%		
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 60 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	1.18	1.18	1.18	$ 1,181,573.48	$ 1,391,420.93	$ -	100.00%	100.00%		
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	2.00	2.00	$ 721,070.81	$ 1,442,141.63	$ -	100.00%	100.00%		
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	8.00	8.00	8.00	$ 377,707.97	$ 3,021,663.74	$ -	100.00%	100.00%		
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00	4.00		$ 38,396.20	$ 153,584.81	$ -	100.00%	100.00%		
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	8.00	8.00		$ 31,338.62	$ 250,708.95	$ -	100.00%	100.00%		
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	17.04	17.04	6.00	$ 923,559.19	$ 15,737,448.63	$ -	100.00%	100.00%		
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2.16	2.16		$ 1,036,355.99	$ 2,238,528.94	$ -	100.00%	100.00%		
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	63.76	63.76		$ 38,464.50	$ 2,452,496.67	$ -	100.00%	100.00%		
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	14.25	14.25		$ 29,897.64	$ 426,049.14	$ -	100.00%	100.00%		
12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	14.07	14.07		$ 18,044.38	$ 253,830.30	$ -	100.00%	100.00%		
12.3.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	1.80	1.80		$ 23,132.00	$ 41,637.60	$ -	100.00%	100.00%		
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	2.21	2.21		$ 185,164.49	$ 408,843.19	$ -	100.00%	100.00%		
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	416.78	416.78		$ 4,352.40	$ 1,814,008.07	$ -	100.00%	100.00%		

ITEM	CPF	714	IED	Pablo de Tarso			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	151.50	151.50		$ 4,435.43	$ 671,967.71	$ -	100.00%	100.00%		
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	15.30	15.30		$ 29,040.55	$ 444,320.45	$ -	100.00%	100.00%		
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	37.88	37.88		$ 28,054.90	$ 1,062,719.64	$ -	100.00%	100.00%		
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	156.26	156.26		$ 34,307.63	$ 5,360,909.58	$ -	100.00%	100.00%		
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4.00	4.00		$ 6,973.21	$ 27,892.86	$ -	100.00%	100.00%		
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	8.00	8.00		$ 8,364.64	$ 66,917.15	$ -	100.00%	100.00%		
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	1,268.93	150.30	100.00	$ 6,772.33	$ 1,017,881.86	$ 7,575,736.43	11.84%	11.84%		
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	4,608.04	4608.04	8.04	$ 24,136.40	$ 111,221,504.03	$ -	100.00%	100.00%		
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	170.00	480.00		$ 9,730.63	$ 4,670,701.06	$ (3,016,494.43)	282.35%	282.35%		
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.80	6.80		$ 13,991.96	$ 95,145.34	$ -	100.00%	100.00%		
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	5.00	5.00		$ 5,234.93	$ 26,174.66	$ -	100.00%	100.00%		
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	4.00	4.00		$ 185,401.53	$ 741,606.11	$ -	100.00%	100.00%		
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	108.54	108.54		$ 22,625.78	$ 2,455,689.47	$ -	100.00%	100.00%		
13.1.4	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL 6 MM UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN ÁREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA HASTA 60 CM)	M	37.88	37.88		$ 84,841.00	$ 3,213,777.02	$ -	100.00%	100.00%		
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	17.70	17.70		$ 111,316.98	$ 1,970,310.59	$ -	100.00%	100.00%		
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	150.66	59.66		$ 247,166.77	$ 14,745,969.47	$ 22,492,176.03	39.60%	39.60%		
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	32.50	32.50		$ 202,701.31	$ 6,587,792.64	$ -	100.00%	100.00%		
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	59.66	59.66		$ 4,352.40	$ 259,664.18	$ -	100.00%	100.00%		
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	2,133.00	2,133.00		$ 3,520.76	$ 7,509,774.25	$ -	100.00%	100.00%		

ITEM	CPF	836	IED	Jairo Aníbal Niño			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	3.80	3.80		$ 29,040.55	$ 110,354.10	$ -	100.00%	100.00%		
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	207.43	207.43		$ 30,426.62	$ 6,311,406.79	$ -	100.00%	100.00%		
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6.84	6.84		$ 20,817.86	$ 142,394.19	$ -	100.00%	100.00%		
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	168.45	168.45		$ 10,621.20	$ 1,789,172.62	$ -	100.00%	100.00%		
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	120.31	120.31		$ 28,815.57	$ 3,466,800.79	$ -	100.00%	100.00%		
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	168.45	168.45		$ 11,807.73	$ 1,989,047.41	$ -	100.00%	100.00%		
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	20.00	20.00		$ 19,332.69	$ 386,653.82	$ -	100.00%	100.00%		
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	25.17	21.05		$ 30,969.00	$ 651,897.45	$ 127,697.57	83.62%	83.62%		
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.04			$ 27,437.53	$ -	$ 83,341.50	0.00%	0.00%		
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	40.00	40.00		$ 25,467.57	$ 1,018,702.66	$ -	100.00%	100.00%		
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12.25	12.25		$ 8,364.64	$ 102,466.88	$ -	100.00%	100.00%		
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	31.00	31.00		$ 13,694.66	$ 424,534.44	$ -	100.00%	100.00%		

1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	121.96	121.96		$ 20,392.00	$ 2,487,008.12	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	8.00	8.00		$ 19,766.58	$ 158,132.74	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	4.25	4.25		$ 13,991.96	$ 59,465.84	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	13.00	13.00		$ 59,307.81	$ 771,001.55	$ -	100.00%	100.00%	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	5.00	5.00		$ 64,414.18	$ 322,070.90	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00			$ 118,468.31	$ -	$ 592,341.55	0.00%	0.00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	207.43	207.43		$ 39,814.42	$ 8,258,720.24	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	1.35	1.35		$ 196,536.97	$ 265,324.92	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	207.43	207.43		$ 241,797.92	$ 50,156,238.60	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	90.30	90.30		$ 14,350.87	$ 1,295,883.31	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	118.39	98.30		$ 76,716.07	$ 7,541,189.88	$ 1,541,225.89	83.03%	83.03%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	53.42	16.03		$ 67,713.97	$ 1,085,151.57	$ 2,532,020.34	30.00%	30.00%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	191.29	184.50		$ 108,436.36	$ 20,006,509.01	$ 736,445.56	96.45%	96.45%	
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELICULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	9.02	3.97		$ 853,515.01	$ 3,388,454.61	$ 4,308,543.79	44.02%	44.02%	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	3.04			$ 448,682.89	$ -	$ 1,362,874.28	0.00%	0.00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ANGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	8.17	2.45		$ 1,181,573.48	$ 2,894,855.03	$ 6,760,963.46	29.98%	29.98%	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	6.00	6.00		$ 815,394.69	$ 4,892,368.12	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	5.00	3.00	3.00	$ 575,810.47	$ 1,727,431.40	$ 1,151,620.93	60.00%	60.00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00	1.50	1.50	$ 721,070.81	$ 1,081,606.22	$ 1,081,606.22	50.00%	50.00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	16.00	7.00	7.00	$ 377,707.97	$ 2,643,955.78	$ 3,399,371.71	43.75%	43.75%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	10.00			$ 38,396.20	$ -	$ 383,962.03	0.00%	0.00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	7.00			$ 31,338.62	$ -	$ 219,370.33	0.00%	0.00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	15.64	9.06	5.00	$ 923,559.19	$ 8,367,446.28	$ 6,080,713.72	57.91%	57.91%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2.70			$ 1,036,355.99	$ -	$ 2,798,161.17	0.00%	0.00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	191.29	184.50		$ 38,464.50	$ 7,096,700.69	$ 261,231.67	96.45%	96.45%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	21.19			$ 11,692.56	$ -	$ 247,718.47	0.00%	0.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	72.64			$ 29,897.64	$ -	$ 2,171,863.23	0.00%	0.00%	
12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	72.64			$ 26,897.83	$ -	$ 1,953,947.28	0.00%	0.00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	10.22	6.07	3.00	$ 185,164.49	$ 1,123,429.98	$ 769,691.74	59.34%	59.34%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	60.77	25.30		$ 4,352.40	$ 110,115.72	$ 154,383.26	41.63%	41.63%	

ITEM	CPF	712	IED		Luis Lopez de Mesa		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	7.80	7.80		$ 29,040.55	$ 226,516.31	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	701.99	701.99		$ 30,062.36	$ 21,103,477.22	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56.41	56.41		$ 10,621.20	$ 599,105.51	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	32.84	32.84		$ 28,815.57	$ 946,303.20	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56.41	56.41		$ 11,807.73	$ 666,033.70	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS; ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	6.00	6.00		$ 19,332.69	$ 115,996.15	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	12.00	12.00		$ 25,467.57	$ 305,610.80	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4.00	4.00		$ 5,207.00	$ 20,828.00	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	701.99	701.99		$ 16,844.46	$ 11,824,640.79	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	14.80	14.80		$ 8,364.64	$ 123,796.72	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	8.00	8.00		$ 13,694.66	$ 109,557.27	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	74.56	74.56		$ 20,392.00	$ 1,520,427.40	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	1.50	1.50		$ 47,726.41	$ 71,589.61	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	1.60	1.60		$ 21,103.11	$ 33,764.98	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	18.66	18.66		$ 13,991.96	$ 261,090.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	8.00	8.00		$ 59,307.81	$ 474,462.49	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	5.00	5.00		$ 59,307.81	$ 296,539.06	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	2.00	2.00		$ 90,824.54	$ 181,649.09	$ -	100.00%	100.00%	
4.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN	1.00	1.00		$ 121,077.07	$ 121,077.07	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	56.00	8.00		$ 5,829.54	$ 46,636.30	$ 279,817.80	14.29%	14.29%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	1.00		$ 118,468.31	$ 118,468.31	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	4.00	4.00		$ 185,401.53	$ 741,606.11	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHEBENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	701.99	158.95		$ 65,046.28	$ 10,339,106.71	$ 35,322,733.63	22.64%	22.64%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	113.76	90.32		$ 26,316.62	$ 2,376,917.05	$ 616,861.55	79.40%	79.40%	
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	0.95	0.95		$ 70,333.44	$ 66,816.77	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	50.09	50.09		$ 14,350.87	$ 718,934.94	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	46.90	46.90		$ 76,716.07	$ 3,597,983.78	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	23.66	23.66		$ 67,713.97	$ 1,602,112.52	$ -	100.00%	100.00%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	47.61	47.61		$ 108,436.36	$ 5,162,655.25	$ -	100.00%	100.00%	
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO).	M2	2.32	2.32		$ 489,874.00	$ 1,136,752.62	$ -	100.00%	100.00%	
9.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	1.60			$ 698,853.48	$ -	$ 1,118,584.89	0.00%	0.00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ANGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	4.79	3.00	3.00	$ 1,181,573.48	$ 3,544,720.44	$ 2,119,033.88	62.59%	62.59%	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	6.00	6.00	6.00	$ 815,394.69	$ 4,892,368.12	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	2.00	2.00	$ 575,810.47	$ 1,151,620.93	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00	3.00	3.00	$ 377,707.97	$ 1,133,123.90	$ 755,415.94	60.00%	60.00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	1.00	1.00		$ 38,396.20	$ 38,396.20	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2.00			$ 31,338.62	$ -	$ 62,677.24	0.00%	0.00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	8.51	4.00	4.00	$ 923,559.19	$ 3,694,236.77	$ 4,167,099.07	46.99%	46.99%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.44			$ 1,036,355.99	$ -	$ 1,492,352.63	0.00%	0.00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	58.63	58.63		$ 38,464.50	$ 2,255,173.78	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	25.11	25.11		$ 29,897.64	$ 750,819.43	$ -	100.00%	100.00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	0.55			$ 185,164.49	$ -	$ 101,840.47	0.00%	0.00%	
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	701.99	105.60	14.51	$ 86,678.38	$ 9,153,237.01	$ 51,694,119.53	15.04%	15.04%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	727.10	105.60		$ 4,352.40	$ 459,613.44	$ 2,705,016.60	14.52%	14.52%	

19.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR DE PASAJEROS MEDIA CABINA USO PARA PERSONAS CON DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD Y PASAJEROS, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 500 KG CARGA VIVA Y TOTAL CON CABINA 890 KG APROX. 2 PARADAS, FOSO CON MEDIDAS 1.60M DE ANCHO X 1.60M DE FONDO APROX.; POSO CON MEDIDAS 1.60M DE ANCHO X 1.60M DE FONDO X 1.00M DE ALTURA APROX., MEDIDAS DE CABINA: 1.50 M DE ANCHO X 1.20M DE FONDO X 1.60M DE ALTURA, PARA EL COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA	UN	1.27			$ 76,917,022.98	$ -	$ 97,684,619.18	0.00%	0.00%	

ITEM	CPF	814	IED	Eduardo Umaña Luna			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas. si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	21.76	21.76		$ 4,435.43	$ 96,514.97	$ -	100.00%	100.00%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico	M	6.40	6.40		$ 29,040.55	$ 185,859.53	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.21	3.21		$ 30,062.36	$ 96,644.48	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1.89	1.89		$ 20,817.86	$ 39,345.76	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	66.41	66.41		$ 10,621.20	$ 705,300.47	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20.97	20.97		$ 28,815.57	$ 604,262.43	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	69.88	69.88		$ 11,807.73	$ 825,147.54	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5.00	5.00		$ 19,332.69	$ 96,663.46	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6.80	6.80		$ 30,969.00	$ 210,589.20	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11.00	11.00		$ 25,467.57	$ 280,143.23	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	3.00			$ 6,973.21	$ -	$ 20,919.64	0.00%	0.00%	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA (INCLUYE GRANO MARMOL 30x30 CM) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.21	3.21		$ 21,107.13	$ 67,855.21	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	10.50	10.50		$ 8,364.64	$ 87,828.75	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	5.00	5.00		$ 13,694.66	$ 68,473.30	$ -	100.00%	100.00%	
1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2	549.44	549.44		$ 50,276.25	$ 27,623,780.82	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	46.09	46.09		$ 20,392.00	$ 939,867.21	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	7.00	7.00		$ 36,375.35	$ 254,627.45	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE REFUERZO	M	0.95	0.26		$ 101,698.85	$ 26,441.70	$ 70,172.21	27.37%	27.37%	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	3.74	3.74		$ 68,498.74	$ 256,390.79	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	1.00	1.00		$ 85,501.22	$ 85,501.22	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	2.00	2.00		$ 47,726.41	$ 95,452.82	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	48.00	48.00		$ 13,991.96	$ 671,614.16	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7.00	7.00		$ 59,307.81	$ 415,154.68	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	5.00	5.00		$ 59,307.81	$ 296,539.06	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	1.00	1.00		$ 169,748.96	$ 169,748.96	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	2.00	2.00		$ 90,824.54	$ 181,649.09	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	3.00	3.00		$ 170,346.24	$ 511,038.72	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	44.00	44.00		$ 5,829.54	$ 256,499.65	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.13	SUSPENSION DE SALIDA SANITARIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1.00			$ 30,698.48	$ -	$ 30,698.48	0.00%	0.00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	1.00		$ 118,468.31	$ 118,468.31	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	1.00		$ 211,513.25	$ 211,513.25	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	2.00	2.00		$ 180,924.58	$ 361,849.16	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	3.21	3.21		$ 42,278.54	$ 135,917.06	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	3.21	3.21		$ 196,536.97	$ 631,827.07	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	1.80	1.80		$ 70,333.44	$ 126,600.20	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	24.70	24.70		$ 14,350.87	$ 354,466.42	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	37.48	37.48		$ 76,716.07	$ 2,875,318.36	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	24.15	20.15		$ 67,713.97	$ 1,364,436.49	$ 270,950.68	83.43%	83.43%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	72.77	72.77		$ 108,436.36	$ 7,890,914.15	$ -	100.00%	100.00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ANGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.73	1.03		$ 1,181,573.48	$ 1,217,020.69	$ 2,008,674.92	37.73%	37.73%	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4 " Y SELLANTE)	UN	5.00	2.50		$ 815,394.69	$ 2,038,486.72	$ 2,038,486.72	50.00%	50.00%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	1.00		$ 575,810.47	$ 575,810.47	$ 575,810.47	50.00%	50.00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00	3.00	3.00	$ 377,707.97	$ 1,133,123.90	$ 755,415.94	60.00%	60.00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00	2.00		$ 38,396.20	$ 76,792.41	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2.00	1.00		$ 31,338.62	$ 31,338.62	$ 31,338.62	50.00%	50.00%	
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	1.00	1.00		$ 948,374.57	$ 948,374.57	$ -	100.00%	100.00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	6.80	3.00	3.00	$ 923,559.19	$ 2,770,677.58	$ 3,509,524.93	44.12%	44.12%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	0.72			$ 1,036,355.99	$ -	$ 746,176.31	0.00%		
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	69.35	69.35		$ 38,464.50	$ 2,667,513.24	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	38.54	38.54		$ 29,897.64	$ 1,152,246.08	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0.60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	3.90	3.90		$ 18,044.38	$ 70,373.09	$ -	100.00%	100.00%	
12.3.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	12.00	12.00		$ 29,063.32	$ 348,759.82	$ -	100.00%	100.00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	2.82	2.00	2.00	$ 185,164.49	$ 370,328.98	$ 151,501.58	70.97%	70.97%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	368.76	320.30		$ 4,352.40	$ 1,394,073.72	$ 210,917.30	86.86%	86.86%	

ITEM	CPF	833	IED	Dario Echandia			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de intervenorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	123.63	123.63		$ 3,404.25	$ 420,873.79	$ -	100.00%	100.00%	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	15.60	15.60		$ 2,407.88	$ 37,562.95	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.80	12.80		$ 20,817.86	$ 266,468.66	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	224.64	224.64		$ 28,054.90	$ 6,302,252.92	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERIA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	686.67	686.67		$ 34,307.63	$ 23,557,934.93	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	57.00	57.00		$ 11,171.61	$ 636,781.56	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	57.00	57.00		$ 6,973.21	$ 397,473.22	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	253.30	253.30		$ 4,099.29	$ 1,038,350.46	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	6.25	6.25		$ 8,364.64	$ 52,279.02	$ -	100.00%	100.00%	
1.3.3	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN).	UN	11.00	11.00		$ 177,967.63	$ 1,957,643.90	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	26.00	26.00		$ 36,375.35	$ 945,759.11	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.16	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	0.85	0.85		$ 1,307,170.35	$ 1,113,709.14	$ -	100.00%	100.00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	80.60	80.60		$ 6,772.33	$ 545,850.15	$ -	100.00%	100.00%	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	16806.93	16806.93		$ 24,136.40	$ 405,658,812.14	$ -	100.00%	100.00%	
3.1.13	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2	69.18	69.18		$ 12,825.52	$ 887,305.53	$ -	100.00%	100.00%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	108.00	108.00		$ 9,730.63	$ 1,050,907.74	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.25	6.25		$ 27,619.66	$ 172,622.88	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	13.00	13.00		$ 118,468.31	$ 1,540,088.04	$ -	100.00%	100.00%	

5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	2.00		$ 163,656.94	$ 327,313.87	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	27.00	27.00		$ 197,624.40	$ 5,335,858.93	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	126.65	126.65		$ 24,422.99	$ 3,093,171.73	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	50.00	50.00		$ 46,585.41	$ 2,329,270.56	$ -	100.00%	100.00%	

5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	62.00	62.00		$ 188,899.52	$ 11,711,770.04	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	49.00	49.00		$ 185,401.53	$ 9,084,674.79	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	1,161.22	1,161.22	100.00	$ 29,762.38	$ 34,560,636.12	$ -	100.00%	100.00%	
13.1.4	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL 6 MM UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN ÁREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA HASTA 60 CM)	M	449.28	449.28		$ 84,841.00	$ 38,117,363.76	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	17.00	17.00		$ 111,316.98	$ 1,892,388.70	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	40.00	40.00		$ 24,947.96	$ 997,918.27	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	642.87	642.87		$ 247,166.77	$ 158,896,101.17	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	6.20	6.20		$ 134,793.16	$ 835,717.58	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	716.95	716.95		$ 4,352.40	$ 3,120,437.95	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	13184.70	13184.70		$ 3,520.76	$ 46,420,122.18	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	748	IED		Alfonso Reyes Echandia		SEMANA			
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de carpetas asfalticas y placas de concha se debe aplicar)	m2	73.41			$ 6,575.47	$ -	$ 482,716.28	0.00%	0.00%	$ 2,230.40
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	m2	73.41			$ 29,040.55	$ -	$ 2,131,914.99	0.00%	0.00%	$ 9,850.56
1.2.16	DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMINETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	176.00			$ 113,509.25	$ -	$ 19,977,628.49	0.00%	0.00%	$ 38,502.34
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	2.00			$ 22,734.26	$ -	$ 45,468.52	0.00%	0.00%	$ 7,711.46
2.2.11	MUROS DE CONTENCIÓN 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	6.00			$ 1,429,703.14	$ -	$ 8,578,218.82	0.00%	0.00%	$ 484,955.30
2.3.3	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	64.00			$ 172,618.86	$ -	$ 11,047,607.19	0.00%	0.00%	$ 58,552.32
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	480.00			$ 6,772.33	$ -	$ 3,250,720.51	0.00%	0.00%	$ 2,297.18
4.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	73.41			$ 93,453.39	$ -	$ 6,860,568.29	0.00%	0.00%	$ 31,699.39
4.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1800	M2	73.41			$ 12,287.16	$ -	$ 902,020.75	0.00%	0.00%	$ 4,167.80
9.3.4	CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 M.	M	73.41			$ 1,122,317.90	$ -	$ 82,391,214.44	0.00%	0.00%	$ 380,690.23
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	73.41			$ 4,352.40	$ -	$ 319,516.89	0.00%	0.00%	$ 1,476.33

ITEM	CPF	747	IED		Orlando Higuita		SEMANA			
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	173.65	173.65		$ 30,062.36	$ 5,220,329.09	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	116.70	144.84		$ 10,621.20	$ 1,538,352.21	$ (298,809.88)	124.11%	124.11%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	116.70	144.84		$ 11,807.73	$ 1,710,206.97	$ (332,190.98)	124.11%	124.11%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	25.00	4.00		$ 6,973.21	$ 27,892.86	$ 146,437.50	16.00%	16.00%	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	173.65	152.28		$ 16,844.46	$ 2,565,038.63	$ 360,001.43	87.69%	87.69%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+60ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN	UN	25.00	25.00		$ 62,547.34	$ 1,563,683.40	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	153.00	153.00		$ 42,278.54	$ 6,468,617.23	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MONTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	150.00	150.00		$ 26,316.62	$ 3,947,492.88	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC. ANCHO 6 CM	M	74.66	74.66		$ 19,490.72	$ 1,455,176.92	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	116.70	116.70		$ 22,625.78	$ 2,640,428.99	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	116.70	116.70		$ 29,897.64	$ 3,489,054.59	$ -	100.00%	100.00%	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	116.70	116.70		$ 121,679.71	$ 14,200,022.39	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	173.65	173.65		$ 86,678.38	$ 15,051,700.83	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.25	AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA)	M2	173.65	173.65		$ 106,127.58	$ 18,429,054.68	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	290.35	290.35		$ 4,352.40	$ 1,263,719.34	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN)	M2	116.70	116.70		$ 7,510.23	$ 876,444.26	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	838	IED		Isabel II		SEMANA			
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	10.26	10.26		$ 4,352.40	$ 44,633.86	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<=20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1.00	1.00		$ 1,953,740.13	$ 1,953,740.13	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	850	IED		Jhon F Kennedy		SEMANA			
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	8.88	8.88		$ 4,352.40	$ 38,644.09	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<=20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1.00	1.00		$ 1,953,740.13	$ 1,953,740.13	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	817	IED		Marsella		SEMANA			
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	27.59	27.59		$ 4,352.40	$ 120,102.30	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.2	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<15M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1.00	1.00		$ 739,630.79	$ 739,630.79	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.6	PODA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<=20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	4.00	4.00		$ 976,870.07	$ 3,907,480.26	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	890	IED		Nelson Mandela		SEMANA			
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.08	17.08	17.08	$ 30,426.62	$ 519,686.74	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22.00	22.00	22.00	$ 17,444.42	$ 383,777.22	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	11.00	11.00	11.00	$ 85,501.22	$ 940,513.46	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	UN	22.00	22.00	22.00	$ 20,568.77	$ 452,513.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	16.00	16.00	16.00	$ 5,829.54	$ 93,272.60	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	34.16	34.16	34.16	$ 42,278.54	$ 1,444,235.06	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.30	TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	34.16	34.16	34.16	$ 127,154.36	$ 4,343,592.99	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.3	PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	8.54	8.54	8.54	$ 36,604.35	$ 312,601.18	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMICO CERTIFICADO)	M2	8.54	8.54	8.54	$ 11,692.56	$ 99,854.42	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	8.54	8.54	8.54	$ 17,192.65	$ 146,825.23	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	34.16	34.16	34.16	$ 4,352.40	$ 148,677.98	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	763	IED		Bicentenario		SEMANA			
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	15.00			$ 6,772.33	$ -	$ 101,585.02	0.00%	0.00%	
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2	25.20			$ 195,409.37	$ -	$ 4,924,316.07	0.00%	0.00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	50.40			$ 22,625.78	$ -	$ 1,140,339.51	0.00%	0.00%	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 80 CM)	M	36.60			$ 18,025.63	$ -	$ 659,738.13	0.00%	0.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	36.60			$ 4,352.40	$ -	$ 159,297.84	0.00%	0.00%	

ITEM	CPF	729	IED		San bernardino		SEMANA			
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2.00			$ 122,747.05	$ -	$ 245,494.11	0.00%	0.00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.60			$ 20,817.86	$ -	$ 158,111.68	0.00%	0.00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2' A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	2.40			$ 16,375.74	$ -	$ 39,301.77	0.00%	0.00%	
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	0.18			$ 633,678.64	$ -	$ 114,062.15	0.00%	0.00%	
2.2.17	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2	1.20			$ 128,126.62	$ -	$ 153,751.94	0.00%	0.00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	13.32			$ 6,772.33	$ -	$ 90,174.99	0.00%	0.00%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	7.60			$ 136,417.61	$ -	$ 1,036,091.73	0.00%	0.00%	

3.1.11	RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	M2	15.19			$ 137,324.25	$ -	$ 2,085,955.30	0.00%	0.00%	
ITEM	**CPF**	**821**	**IED**		**San Jose**		**SEMANA**				
Ítem	**Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	8.98	8.98		$ 4,352.40	$ 39,081.94	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.2	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<15M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1.00	1.00		$ 739,630.79	$ 739,630.79	$ -	100.00%	100.00%	

FECHA:	11/04/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**32**	
CORTE DEL INFORME:	***11/04/2026***	

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	22	**DEL**	05-abr-26	**AL**	11-abr-26

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.8169111	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.8154784
Fecha de Iniciación	14/10/2025	**Fecha de Iniciación**	14/10/2025
Fecha de Terminación	13/05/2026	**Fecha de Terminación**	13/05/2026
Plazo Inicial	7 MESES	**Plazo Inicial**	7 MESES
Valor inicial	$ 880,146,577.00	**Valor inicial**	$ 2,975,834,553.00
Adiciones	$ 83,867,649.00	**Adiciones**	$ 523,987,595.00
Prorroga	N.A.	**Prorroga**	N.A.
Suspensión	N.A.	**Suspensión**	N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES
No.	**FRENTE**	PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	PROGRAMADO ACUM	EJECUTADO ACUM	DESVIACIÓN	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**
1	PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	80.00%	94.45%	100.00%	100.00%	0.00%	BAÑO: Instalacion de enchape, media cañas y instalación de tubería e instalación de piso en vinisol y pintura
2	PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	30.00%	20.64%	35.00%	20.64%	-14.36%	Cocina: Instalacion de piso, cambio de tuberias
3	EL PORVENIR	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
4	VILLAS DEL PROGRESO	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
5	PABLO DE TARSO	60.00%	85.35%	82.00%	87.01%	5.01%	Desmonte e instalación de cubierta
6	JAIRO ANIBAL NIÑO	62.30%	69.96%	68.00%	73.71%	5.71%	BAÑO Y SALONES DE PREESCOLAR: Instalación de enchape, media caña y piso
7	LUIS LOPEZ DE MESA	27.60%	31.42%	30.00%	35.14%	5.14%	BAÑO: Instalacion de manto de aluminio sobre cubierta y enchape
8	EDUARDO UMAÑA LUNA	75.45%	83.17%	85.00%	94.21%	9.21%	BAÑO: Instalacion de enchape
9	DARIO ECHANDIA	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
10	LLANO ORIENTAL - ALFONSO REYES ECHANDIA			20.00%	13.20%	-6.80%	CERRAMIENTO: Instalación de cerramiento
TOTALES		**70.59%**	**76.11%**	**72.00%**	**72.39%**	**0.39%**	

3. RESUMEN FINANCIERO

PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 261,167,046	$ 261,167,046	$ -		5.60%	100.00%

PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 85,000,000	$ 17,547,123	**$ 67,452,877**		0.00%	20.64%

EL PORVENIR

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 110,086,654	$ 110,086,654	$ -		0.00%	100.00%

VILLAS DEL PROGRESO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 166,676,454	$ 166,676,454	$ -		0.00%	100.00%

PABLO DE TARSO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 189,976,713	$ 165,299,619	**$ 24,677,093**		1.66%	87.01%

JAIRO ANIBAL NIÑO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 203,141,470	$ 149,741,594	**$ 53,399,876**		3.80%	73.71%

LUIS LOPEZ DE MESA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 292,710,605	$ 102,862,558	**$ 189,848,046**		3.70%	35.14%

EDUARDO UMAÑA LUNA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 76,965,087	$ 72,509,610	**$ 4,455,477**		11.00%	94.21%

DARIO ECHANDIA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 795,148,175	$ 795,148,175	$ -		0.00%	100.00%

FECHA:	11/04/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**32**	
CORTE DEL INFORME:	***11/04/2026***	

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	22	**DEL**	05-abr-26	**AL**	11-abr-26

EMERGENCIAS

BALANCE EMERGENCIAS	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 114,665,609	$ 100,539,128	**$ 14,126,481**		2.10%	87.68%

4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:
- Mantener orden y aseo en la obras, así como la señalización
- Continuar con el uso correcto de EPP
- Apertura de más frentes de obra

CONCLUSIONES:
- Se avanzó en tres frentes de trabajo con actividades de cerramiento, demoliciones, desmontes, pañete, e Instalación de pisos, cubiertas, enchape.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

1. Se continua con avances en los frentes de obra en los siguientes colegios: Alfonso Lopez Michelsen, El Porvenir, Villas del progreso, Jairo Anibal Niño, Eduardo Umaña Luna , Luis Lopez de Mesa y Dario Echandia.

2. Se continua con avance en los frentes de obra en las emergencias en los siguientes colegios: Orlando Higuita.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente semana, se mantiene el personal previamente aprobado para el ingreso y ejecución de actividades, asegurando que todo el personal cumpla con los requisitos establecidos por la interventoría. De igual manera, se evidenció la ejecución de actividades en los colegios, Luis López de Mesa, Alfonso López Michelsen, Villas del Progreso, El Porvenir, Jairo Anibal Niño, Dario Echandia Sede B, Colegio Eduardo Uñama Luna, Colegio Pablo de Tarso.
Durante el periodo reportado, se evidenció la reposición de elementos de protección personal (EPP), tales como gafas de seguridad, guantes y tapabocas, al personal operativo de la institución educativa El Porvenir, garantizando la disponibilidad de estos elementos para la ejecución segura de las actividades.
Así mismo, se verificó el inicio de actividades en el colegio Alfonso Reyes Echandía, donde se recomienda al contratista implementar de manera prioritaria el cerramiento perimetral y la señalización preventiva, con el fin de controlar el acceso, delimitar las áreas de trabajo y mitigar riesgos para la comunidad educativa.
Con respecto a los demás frentes de obra activos, se evidenció el cumplimiento en el uso de EPP y dotación por parte del personal, así como la realización de charlas de seguridad, diligenciamiento de Análisis de Trabajo Seguro y gestión de permisos de trabajo, conforme a las actividades ejecutadas, fortaleciendo el control de riesgos y la prevención de incidentes.
Finalmente, se realizó la aprobación del Informe Mensual de SST No. 5 V2 del contratista, mediante oficio UNIOBRAS-LOTE3-411, evidenciando el cumplimiento de los requerimientos documentales del componente SST.
trabajadas: 44

REPORTE PERSONAL

Total de horas capacitación: 20 minutos
Número de accidentes de trabajo: 0
Número de días de incapacidad por AT:0
Número de días de incapacidad por enfermedad común: 0

DIRECTOR OBRA: 1 INSPECTORES SST: 1
RESIDENTE OBRA: 1 PERSONAL OPERATIVO: 49

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

IED Cultura Alfonso López Michelsen: Se realizo recorrido en el frente, se acopio los materiales de construcción, se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).
IED Villas del progreso: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento adecuado sin señalización, se encuentran bolsas de lonas de residuos acopiados adecuadamente, se recomendó al contratista disponer el material, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente.
IED El Porvenir: Se realizo recorrido en el frente, presenta señalización en el frente de obra. No se evidencian residuos ya que se realizó la recolección por parte de gestor autorizado, se evidencia fugas hidráulicas en el frente, por lo que se cierra las válvulas para evitar el gasto hidráulico, pero se recomienda al contratista arreglar el problema, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Jairo Aníbal Niño: Se realizo recorrido en el frente, se realizó la disposición de los residuos, se recomienda mantener las jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Darío Echandía: Se realizo recorrido en el frente, se presenta el cerramiento adecuado, se reporta el ingreso de materiales que fueron debidamente acopiados, se evidencian luminarias acopiadas expuestas a las condiciones meteorológicas, al igual se recomienda realizar la disposición con el gestor adecuado, mantener orden en el frente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Eduardo Umaña Luna: Se realizo recorrido en el frente, se encuentra el cerramiento adecuado con su debida señalización, se evidencia material de construcción acopiado, los RCD fueron debidamente dispuestos, se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente al igual que implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Pablo de torso: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con la debida señalización, se evidencia material de construcción y un volumen medio de residuos, se recomendó disponerlos, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Luis López de mesa: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento adecuado, se evidencia gran volumen de residuos (RCD y RESPEL) acopiados adecuadamente, por lo que se recomienda al contratista realizar la debida disposición adecuada ya que cuenta con la cantidad mínima para su recolección y garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente.

OTROS

ING JHONER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING HARRY ARANGO
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA:	11/04/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**32**	
CORTE DEL INFORME:	***11/04/2026***	

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA

Alfonso Lopez Michelsen



Pintura



Pintura



Instalacion Sanitarios



Instalacion mesones

Alfonso Lopez Michelsen Cocina

0

Pintura

0.00

Pintura

Jairo Anibal Niño



Instalacion de Sanitarios



Instalacion de Sanitarios



Pintura



Pintura

Eduardo Umaña Luna



Pintura



Pintura

	
Instalacion de Mesones	Instalacion tomas electricas

Luis Lopez De Mesa

	
Cubierta	Cubierta
	
Manto para cubierta	Instalacion Sanitarios

Pablo de Tarso



Instalacion de estructura



Instalacion de estructura



Instalacion de estructura



Instalacion de estructura

Alfonso Reyes Echandia



Cerramiento



Cerramiento



Cerramiento



Cerramiento

FECHA: 11/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES 32 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			GRUPO	7
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154784	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDU 2025	
11/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169111	INTERVENTOR:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S	

TIPO DE INTERVENCION 21 ###	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE		ESTADO ACTUAL O FINAL
Alfonso Lopez Michelsen	Mejoramiento de baterias sanitarias y salones de preescolar	BAÑO: Instalacion de enchape, media cañas y instalación de tuberia e instalación de piso en vinisol y pintura				
Alfonso Lopez Michelsen Cocina	Mejoramiento de cocina	Cocina: Instalacion de piso, cambio de tuberias				
El Porvenir	Mejoramiento de cubierta y baterias sanitarias	BAÑO: instalacion de enchape, media cañas y instalación manto en cubierta				
Villas del Progreso	Mejoramiento de baterias y canchas sanitarias	BAÑO Y CANCHA: Instalación de enchape, Fundicion de placa				
Pablo de Tarso	Desmonte e instalación de cubierta	Desmonte e instalación de cubierta				
Jairo Anibal Niño	Mejoramiento de baterias sanitarias y pisos preescolar	BAÑO Y SALONES DE PREESCOLAR: Instalación de enchape, media caña y piso				
Luis Lopez de Mesa	Mejoramiento de baterias sanitarias	BAÑO: Instalacion de manto de aluminio sobre cubierta y enchape				
Eduardo Umaña	Mejoramiento de baterias sanitarias y cerramiento	BAÑO: Instalacion de enchape				
Dario Echandia	Desmonte e instalación de cubierta	CUBIERTA: Instalación de cubierta				

ALFONSO REYES ECHANDIA	CERRAMIENTO	CERRAMIENTO: Instalación de cerramiento				
EMERGENCIA No. 2 San Bernardino						
EMERGENCIA No. 3 Isabel II						
EMERGENCIA No. 4 Jhon F Kennedy						

EMERGENCIA No. 5 Marsella						
EMERGENCIA No. 6 Nelson Mandela						
EMERGENCIA No. 7 Bicentenario						
EMERGENCIA No. 8 San Jose						
EMERGENCIA No. 9 Nicolas Esguerra						

FECHA:	11/04/2026	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	32 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA	GRUPO 7
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDU 2025	
11 de abril de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169111	CO1.PCCNTR.8154784	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,278,928	$ 2,451,846,958
INICIO	14 de octubre de 2025	14 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ 83,867,649.00	$ 523,987,595.00
TERMINACION INICIAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	PRORROGAS			TOTAL	$ 880,146,577.00	$ 2,975,834,553.00
TERMINACION FINAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	TOTAL	211	211			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	05/12/2025	$ 83,867,649.00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	05/12/2025	$ 523,987,595.00		
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400-47	5 9 2025	5 10 2026	5 4 2026	5 4 2031	5 9 2025	5 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
895-47	14 10 2025	15 1 2027	14 10 2025	15 5 2027	14 10 2025	15 1 2027	895-74	5 4 2026	15 5 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (31082924)	PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA
751	PORTAL DEL SOL -	Bosa	A	Portal del Sol Alfonso Lopez Michelsen	94.45%	100.00%	100.00%		$ 261,167,045.68	$ 261,167,045.68	12/11/2025	09/04/2026
751	PORTAL DEL SOL -	Bosa	A	Portal del Sol Alfonso Lopez Michelsen	20.64%	20.64%	35.00%		$ 85,000,000.00	$ 17,547,123	11/01/2026	13/05/2026
742	EL PORVENIR	Bosa	B	El Recuerdo Santa Fe	100.00%	100.00%	100.00%		$ 110,086,654.11	$ 110,086,654.11	19/11/2025	30/03/2026
764	VILLAS DEL PROGRESO	Bosa	B	Enrique Dussel	100.00%	100.00%	100.00%		$ 166,676,454.24	$ 166,676,454.24	12/11/2025	09/04/2026
714	PABLO DE TARSO	Bosa	A	Pablo de Tarso	86.35%	87.01%	92.00%		$ 189,976,712.63	$ 165,299,619	19/11/2025	19/03/2026
836	JAIRO ANIBAL NIÑO	Kennedy	A	Patio Bonito I	69.96%	73.71%	88.00%		$ 203,141,470.45	$ 149,741,594	26/11/2025	19/03/2026
712	LUIS LOPEZ DE MESA	Bosa	A	Luis Lopez de Mesa	31.42%	35.14%	38.00%		$ 292,710,604.53	$ 102,862,598	11/12/2025	09/04/2026
814	EDUARDO UMAÑA LUNA	Kennedy	A	Dindalito	83.17%	94.21%	94.00%		$ 79,965,086.69	$ 72,905,610	19/11/2025	02/02/2026
833	DARIO ECHANDIA	Kennedy	B	Los Patios	100.00%	100.00%	100.00%		$ 795,148,174.67	$ 795,148,174.67	12/11/2025	26/03/2026
748	LLANO ORIENTAL -	Bosa	A	San José de Maryland San Pedro -	0.00%	13.20%	20.00%		$ 135,987,595.00	$ 17,948,083	14/10/2025	13/05/2026
	TOTAL FRENTES DE OBRA				78.14%		72.00%		$ 2,316,859,756	$ 1,841,038,834		

EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO

747	LA LIBERTAD - ORLANDO	Bosa	A	Orlando Higuita - Holanda la Libertad	100.00%	100.00%	100.00%		$ 82,116,894	$ 82,116,894	19/11/2025	15/01/2026
729	SAN BERNARDINO	Bosa	A	San Bernardino	0.00%	0.00%	0.00%		$ 3,922,944	$ -	24/11/2025	31/12/2025
838	ISABEL II	Kennedy	B	Pio XII	100.00%	100.00%	100.00%		$ 1,998,374	$ 1,998,374	29/11/2025	19/12/2025
850	JOHN F. KENNEDY	Kennedy	A	John F. kennedy	100.00%	100.00%	100.00%		$ 1,992,384	$ 1,992,384	29/11/2025	12/12/2025
817	MARSELLA	Kennedy	A	Bas-Med. Marsella	100.00%	100.00%	100.00%		$ 4,787,213	$ 4,787,213	28/11/2025	18/12/2025
890	NELSON MANDELA	Kennedy	A	Campanita Tintal	100.00%	73.42%	70.00%		$ 12,103,037	$ 8,885,550	26/11/2025	16/01/2026
763	BICENTENARIO	Bosa	A	San José de Maryland	0.00%	0.00%	0%		$ 6,998,068	$ -	27/11/2025	16/01/2026
821	SAN JOSE	Kennedy	B	El Descanso	100.00%	100.00%	100%		$ 778,713	$ 778,713		
859	NACIONAL NICOLAS	Kennedy	A	Nicolas Esquerra								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	TOTAL FRENTES DE OBRA				71.68%		71.25%		$ 114,665,609	$ 100,539,128		

ACUMULADO FRENTES DE OBRA

TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
4	5	0	9	$ 1,841,038,834
ACUMULADO EMERGENCIAS				
1	5	2	8	$ 100,539,128
TOTAL				
5	10	2	17	$ 1,941,577,962
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23	
2		13		2		13		24	
3		14		3		14		25	
4		15		4		15		26	
5		16		5		16		27	
6		17		6		17		28	
7		18		7		18		29	
8		19		8		19		30	
9		20		9		20		31	
10		21	TOTAL OBRA	10		21		32	
11		22	$ -	11		22		33	$ -


									TOTAL INTERVENTORIA
34		35		36		37		38	
39		40							


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	78.14%	0.00%	84.83%
PROGRAMADO	72.00%		
ATRASO	6.14%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			









OBSERVACIONES:

BALANCE SEMANAL POR CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS

		CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2026
GRUPOS	ITEM	CPF	751	IED		Alfonso Lopez Michelsen	SEMANA				
	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si es su defecto la SED no le puede aportar)	M2	30.69	30.69		$ 4,435.43	$ 136,101.63	$ -	100.00%	100.00%	
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	3.79	3.79		$ 29,040.55	$ 110,063.69	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.01	40.01		$ 30,062.36	$ 1,202,753.00	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	450.72	450.72		$ 30,426.62	$ 13,713,897.10	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	113.46	113.46		$ 10,621.20	$ 1,205,071.78	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.12	21	M	46,110.00	76.42		$ 28,815.57	$ 2,202,085.58	############	0.17%	0.17%	
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	123.57	123.57		$ 11,807.73	$ 1,459,112.04	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11.00	11.00		$ 19,332.69	$ 212,659.60	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10.80	10.80		$ 30,969.00	$ 334,539.53	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	18.00	18.00		$ 25,467.57	$ 458,416.20	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	5.00	5.00		$ 6,973.21	$ 34,866.07	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.01	40.01		$ 21,107.13	$ 844,466.77	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	1.60	1.60		$ 8,364.64	$ 13,383.43	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	18.00	18.00		$ 13,694.66	$ 246,503.87	$ -	100.00%	100.00%	
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	84.44	84.44		$ 20,392.00	$ 1,721,900.34	$ -	100.00%	100.00%	
	4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	27.38	27.38		$ 13,991.96	$ 383,099.91	$ -	100.00%	100.00%	
	4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	13.00	13.00		$ 59,307.81	$ 771,001.55	$ -	100.00%	100.00%	
	4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	11.00	11.00		$ 59,307.81	$ 652,385.92	$ -	100.00%	100.00%	
	4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/2"	UN	2.00	2.00		$ 201,917.88	$ 403,835.76	$ -	100.00%	100.00%	
	4.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN	2.00	2.00		$ 85,229.37	$ 170,458.73	$ -	100.00%	100.00%	
1	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	2.00		$ 118,468.31	$ 236,936.62	$ -	100.00%	100.00%	
	5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	5.00	5.00		$ 185,401.53	$ 927,007.63	$ -	100.00%	100.00%	
	7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	450.72	450.72		$ 39,814.42	$ 17,945,153.58	$ -	100.00%	100.00%	
	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	40.01	40.01		$ 42,278.54	$ 1,691,505.36	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	40.01	40.01		$ 196,536.97	$ 7,863,169.19	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	12.00	12.00		$ 70,333.44	$ 844,001.34	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	450.72	450.72		$ 241,797.92	$ 108,983,157.06	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	116.40	116.40		$ 14,350.87	$ 1,670,383.54	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	63.34	63.34		$ 76,716.07	$ 4,859,196.00	$ -	100.00%	100.00%	
	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	112.85	112.85		$ 108,436.36	$ 12,237,103.23	$ -	100.00%	100.00%	
	9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	4.59	4.59		$ 853,515.01	$ 3,919,682.35	$ -	100.00%	100.00%	
	9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	7.92	7.92		$ 1,181,573.48	$ 9,358,061.97	$ -	100.00%	100.00%	
	10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	4.00	4.00		$ 721,070.81	$ 2,884,283.25	$ -	100.00%	100.00%	
	10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	11.00	11.00		$ 377,707.97	$ 4,154,787.65	$ -	100.00%	100.00%	
	10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00	4.00		$ 38,396.20	$ 153,584.81	$ -	100.00%	100.00%	
	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20,	M2	33.87	33.87		$ 923,559.19	$ 31,283,720.51	$ -	100.00%	100.00%	
	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	1.80		$ 1,036,355.99	$ 1,865,440.78	$ -	100.00%	100.00%	
	12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	112.53	112.53		$ 38,464.50	$ 4,328,346.99	$ -	100.00%	100.00%	
	12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	66.93	66.93		$ 29,897.64	$ 2,001,049.05	$ -	100.00%	100.00%	
	12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	59.26	59.26		$ 26,897.83	$ 1,593,965.52	$ -	100.00%	100.00%	
	14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	7.92	7.92		$ 185,164.49	$ 1,466,502.74	$ -	100.00%	100.00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	30.69	30.69		$ 4,352.40	$ 133,553.83	$ -	100.00%	100.00%	
GRUPOS	ITEM	CPF	751	IED		Alfonso Lopez Michelsen Cocina	SEMANA				
	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.93	3.93		$ 30,062.36	$ 118,217.23	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.93	3.93		$ 30,426.62	$ 119,649.66	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2.00	2.00		$ 25,467.57	$ 50,935.13	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13.09	13.09		$ 21,107.13	$ 276,292.35	$ -	100.00%	100.00%	
	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	7.35	7.35		$ 85,501.22	$ 628,434.00	$ -	100.00%	100.00%	
	4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2.00	2.00		$ 71,024.47	$ 142,048.94	$ -	100.00%	100.00%	
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	4.00	4.00		$ 5,829.54	$ 23,318.15	$ -	100.00%	100.00%	
	5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	5.00			$ 534,497.49	$ -	$ 2,672,487.43	0.00%	0.00%	
	5.1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	127.73			$ 53,182.31	$ -	$ 6,792,908.92	0.00%	0.00%	
	5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°6 (T) AWG THHN	M	150.20			$ 83,551.35	$ -	$ 12,549,412.59	0.00%	0.00%	
	5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	30.00			$ 185,401.53	$ -	$ 5,562,045.79	0.00%	0.00%	
1	5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	2.00			$ 819,132.39	$ -	$ 1,638,264.79	0.00%	0.00%	
	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	13.09	13.09		$ 42,278.54	$ 553,426.14	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	12.60	12.60		$ 196,536.97	$ 2,476,365.88	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	90.50	90.50		$ 19,490.72	$ 1,763,909.67	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	22.42	22.42		$ 76,716.07	$ 1,719,974.33	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	131.64	131.64		$ 67,713.97	$ 8,913,587.98	$ -	100.00%	100.00%	
	10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	6.00	6.00		$ 31,338.62	$ 188,031.72	$ -	100.00%	100.00%	
	11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EYECTORA BARNES IC0027 VOLTAJE 220 TRIFASICA (360 GPM DESCARGA 3" 3HP)	UN	3.00			$ 6,591,038.86	$ -	$ 19,773,116.58	0.00%	0.00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	131.64	131.64		$ 4,352.40	$ 572,932.00	$ -	100.00%	100.00%	

	19.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMATICO CON 2 BOMBAS DE 2HP 110/220 TANQUE HIDRONEUMATICO POR MEMBRANA DE 200LTS, MARCA PEARL, TABLERO DE CONTROL CON NORMA RETIE (INCLUYE 2 BOMBAS ALTA PRESIÓN CAUDAL 2.33LPS H.MAQ 50MT 1 TANQUE HIDROACUMULADOR MEMBRANA 200LTS VERTICAL CON MANOMETRO ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN ENTRE BOMBAS Y TANQUE EN HIERRO GALVANIZADO (HG), 1 FLAUTA DE DESCARGA EN 3" INCLUYE COPA DE DESCARGA 3 A 2, 2 REGISTROS EN BRONCE TIPO COMPUERTA, 2 VÁLVULAS CHEQUE HIDRONEUMATICO EN BRONCE, 1 TABLERO DE CONTROL EN COFRE METÁLICO CON NORMA RETIE 2- PRESOSTATOS RANGO 40/60, 1 SENSOR DE NIVEL (FLOTADOR), 1 MANOMETRO EN GLICERINA CON CARATULA DE 2" (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	UN	1.00			$ 18,464,640.51	$ -	$ 18,464,640.51	0.00%	0.00%	
	ITEM	**CPF**	**742**	**IED**	**El Porvenir**				**SEMANA**				
	Item	**Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**	
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	7.75	7.75		$ 29,040.55	$ 225,064.28	$ -	100.00%	100.00%		
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	58.31	58.31		$ 30,426.62	$ 1,774,298.15	$ -	100.00%	100.00%		
	1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2.97	2.97		$ 20,817.86	$ 61,795.75	$ -	100.00%	100.00%		
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	106.35	106.35		$ 10,621.20	$ 1,129,606.59	$ -	100.00%	100.00%		
	1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMINAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	63.15	63.15		$ 28,815.57	$ 1,819,703.02	$ -	100.00%	100.00%		
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	106.35	106.35		$ 11,807.73	$ 1,255,798.93	$ -	100.00%	100.00%		
	1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	10.00	10.00		$ 19,332.69	$ 193,326.91	$ -	100.00%	100.00%		
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.75	12.75		$ 30,969.00	$ 394,947.66	$ -	100.00%	100.00%		
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	24.00	24.00		$ 25,467.57	$ 611,221.59	$ -	100.00%	100.00%		
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4.00	4.00		$ 6,973.21	$ 27,892.86	$ -	100.00%	100.00%		
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	24.00	24.00		$ 13,694.66	$ 328,671.82	$ -	100.00%	100.00%		
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	97.49	97.49		$ 20,392.00	$ 1,988,015.92	$ -	100.00%	100.00%		
	2.3.7	PERFORACIÓN NÚCLEO 3" E= 0.10 M	UN	2.00	2.00		$ 162,040.52	$ 324,081.04	$ -	100.00%	100.00%		
	3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	2.44	2.44		$ 68,498.74	$ 167,383.52	$ -	100.00%	100.00%		
	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	5.50	5.50		$ 85,501.22	$ 470,256.73	$ -	100.00%	100.00%		
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	100.00	100.00		$ 5,829.54	$ 582,953.76	$ -	100.00%	100.00%		
	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	2.00		$ 118,468.31	$ 236,936.62	$ -	100.00%	100.00%		
	5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00	4.00		$ 211,513.25	$ 846,052.99	$ -	100.00%	100.00%		
	5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA, INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	4.00	4.00		$ 185,401.53	$ 741,606.11	$ -	100.00%	100.00%		
2	7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	57.35	57.35		$ 65,046.28	$ 3,730,404.34	$ -	100.00%	100.00%		
	7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	30.30	30.30		$ 26,316.62	$ 797,393.56	$ -	100.00%	100.00%		
	7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	52.48	52.48		$ 14,350.87	$ 753,133.51	$ -	100.00%	100.00%		
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	72.85	72.85		$ 76,716.07	$ 5,588,535.70	$ -	100.00%	100.00%		
	7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	44.37	44.37		$ 67,713.97	$ 3,004,360.49	$ -	100.00%	100.00%		
	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	106.35	106.35		$ 108,436.36	$ 11,532,207.23	$ -	100.00%	100.00%		
	9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJA LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	4.51	4.51		$ 853,515.01	$ 3,849,352.71	$ -	100.00%	100.00%		
	9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	5.09	5.09		$ 1,181,573.48	$ 6,011,845.87	$ -	100.00%	100.00%		
	10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	4.00	4.00		$ 721,070.81	$ 2,884,283.25	$ -	100.00%	100.00%		
	10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	10.00	10.00		$ 377,707.97	$ 3,777,079.68	$ -	100.00%	100.00%		
	10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	5.00	5.00		$ 38,396.20	$ 191,981.02	$ -	100.00%	100.00%		
	10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	12.00	12.00		$ 948,374.57	$ 11,380,494.82	$ -	100.00%	100.00%		
	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	9.00	9.00		$ 923,559.19	$ 8,312,032.73	$ -	100.00%	100.00%		
	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2.70	2.70		$ 1,036,355.99	$ 2,798,161.17	$ -	100.00%	100.00%		
	12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	106.35	106.35		$ 38,464.50	$ 4,090,853.69	$ -	100.00%	100.00%		
	12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	68.62	68.62		$ 29,897.64	$ 2,051,683.69	$ -	100.00%	100.00%		
	12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	30.00	30.00		$ 26,897.83	$ 806,934.96	$ -	100.00%	100.00%		
	14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	4.68	4.68		$ 185,164.49	$ 866,569.80	$ -	100.00%	100.00%		
	16.1.4	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	58.00	58.00		$ 86,678.38	$ 5,027,346.09	$ -	100.00%	100.00%		
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	100.64	100.64		$ 4,352.40	$ 438,025.54	$ -	100.00%	100.00%		
	NP-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DOBLE DESCARGA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS	UND	10.00	10.00		$ 995,640.29	$ 9,956,402.93	$ -	100.00%	100.00%		
	ITEM	**CPF**	**764**	**IED**	**Villas del Progreso**				**SEMANA**				
	Item	**Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**	
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	43.80	43.80		$ 29,040.55	$ 1,271,976.18	$ -	100.00%	100.00%		
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13.80	13.80		$ 30,426.62	$ 419,887.41	$ -	100.00%	100.00%		
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	63.53	63.53		$ 10,621.20	$ 674,764.53	$ -	100.00%	100.00%		
	1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMINAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	27.20	27.20		$ 28,815.57	$ 783,783.41	$ -	100.00%	100.00%		
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	63.53	63.53		$ 11,807.73	$ 750,144.86	$ -	100.00%	100.00%		
	1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8.00	8.00		$ 19,332.69	$ 154,661.53	$ -	100.00%	100.00%		
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.68	7.68		$ 30,969.00	$ 237,841.92	$ -	100.00%	100.00%		
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5.00	5.00		$ 25,467.57	$ 127,337.83	$ -	100.00%	100.00%		
	1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	20.00	20.00		$ 19,332.69	$ 386,653.82	$ -	100.00%	100.00%		
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	2.00	2.00		$ 6,973.21	$ 13,946.43	$ -	100.00%	100.00%		
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	8.00	8.00		$ 13,694.66	$ 109,557.27	$ -	100.00%	100.00%		
	1.2.44	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) .	M2	13.80	13.80		$ 97,993.28	$ 1,352,307.29	$ -	100.00%	100.00%		
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	29.10	29.10		$ 20,392.00	$ 593,407.15	$ -	100.00%	100.00%		
	1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	84.00	84.00		$ 17,444.42	$ 1,465,331.21	$ -	100.00%	100.00%		
	1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	21.00	21.00		$ 36,375.35	$ 763,882.36	$ -	100.00%	100.00%		
	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	44.69	44.69		$ 96,359.46	$ 4,306,304.16	$ -	100.00%	100.00%		
	2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	41.16	41.16		$ 22,734.26	$ 935,742.11	$ -	100.00%	100.00%		
	2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM DE 0.15 X 0.15 M	KG	837.41	837.41		$ 7,440.60	$ 6,230,828.83	$ -	100.00%	100.00%		
	3.2.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	M	3.20	3.20		$ 40,900.51	$ 130,881.62	$ -	100.00%	100.00%		

4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	56.00	56.00		$ 85,501.22	$ 4,788,068.54	$ -	100.00%	100.00%		
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	10.00	10.00		$ 47,726.41	$ 477,264.10	$ -	100.00%	100.00%		
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	8.00	8.00		$ 121,102.52	$ 968,820.13	$ -	100.00%	100.00%		
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	18.60	18.60		$ 13,991.96	$ 260,250.49	$ -	100.00%	100.00%		
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7.00	7.00		$ 59,307.81	$ 415,154.68	$ -	100.00%	100.00%		
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	8.00	8.00		$ 59,307.81	$ 474,462.49	$ -	100.00%	100.00%		
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	6.00	6.00		$ 169,748.96	$ 1,018,493.74	$ -	100.00%	100.00%		
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	2.00	2.00		$ 90,824.54	$ 181,649.09	$ -	100.00%	100.00%		
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	3.00	3.00		$ 64,414.18	$ 193,242.54	$ -	100.00%	100.00%		
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	3.00	3.00		$ 71,024.47	$ 213,073.42	$ -	100.00%	100.00%		
4.7.8	RENIVELACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	1.00	1.00		$ 78,661.93	$ 78,661.93	$ -	100.00%	100.00%		
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	60.00	60.00		$ 5,829.54	$ 349,772.26	$ -	100.00%	100.00%		
4.9.13	SUSPENSION DE SALIDA SANITARIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8.00	8.00		$ 30,698.48	$ 245,587.85	$ -	100.00%	100.00%		
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	2.00	2.00		$ 118,468.31	$ 236,936.62	$ -	100.00%	100.00%		
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	2.00	2.00		$ 185,401.53	$ 370,803.05	$ -	100.00%	100.00%		
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	13.80	13.80		$ 42,278.54	$ 583,443.91	$ -	100.00%	100.00%		
7.1.8	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALLANADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) E= 10 CM	M2	401.60	401.60		$ 143,272.97	$ 57,538,425.88	$ -	100.00%	100.00%		
7.1.9	JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	M	365.00	365.00		$ 36,001.71	$ 13,140,625.46	$ -	100.00%	100.00%		
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	13.80	13.80		$ 196,536.97	$ 2,712,210.25	$ -	100.00%	100.00%		
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	4.92	4.92		$ 70,333.44	$ 346,040.55	$ -	100.00%	100.00%		
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	30.20	30.20		$ 14,350.87	$ 433,396.19	$ -	100.00%	100.00%		
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	387.00	387.00		$ 19,237.61	$ 7,444,954.30	$ -	100.00%	100.00%		
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	32.67	32.67		$ 76,716.07	$ 2,506,314.07	$ -	100.00%	100.00%		
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	63.76	63.76		$ 108,436.36	$ 6,913,902.52	$ -	100.00%	100.00%		
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	4.18	4.18		$ 853,515.01	$ 3,564,278.70	$ -	100.00%	100.00%		
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 60 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	1.18	1.18		$ 1,181,573.48	$ 1,391,420.93	$ -	100.00%	100.00%		
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	2.00		$ 721,070.81	$ 1,442,141.63	$ -	100.00%	100.00%		
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	8.00	8.00		$ 377,707.97	$ 3,021,663.74	$ -	100.00%	100.00%		
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00	4.00		$ 38,396.20	$ 153,584.81	$ -	100.00%	100.00%		
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	8.00	8.00		$ 31,338.62	$ 250,708.95	$ -	100.00%	100.00%		
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	17.04	17.04		$ 923,559.19	$ 15,737,448.63	$ -	100.00%	100.00%		
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2.16	2.16		$ 1,036,355.99	$ 2,238,528.94	$ -	100.00%	100.00%		
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	63.76	63.76		$ 38,464.50	$ 2,452,496.67	$ -	100.00%	100.00%		
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	14.25	14.25		$ 29,897.64	$ 426,049.14	$ -	100.00%	100.00%		
12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	14.07	14.07		$ 18,044.38	$ 253,830.30	$ -	100.00%	100.00%		
12.3.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	1.80	1.80		$ 23,132.00	$ 41,637.60	$ -	100.00%	100.00%		
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	2.21	2.21		$ 185,164.49	$ 408,843.19	$ -	100.00%	100.00%		
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	416.78	416.78		$ 4,352.40	$ 1,814,008.07	$ -	100.00%	100.00%		

ITEM	CPF	714	IED	Pablo de Tarso			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	151.50	151.50		$ 4,435.43	$ 671,967.71	$ -	100.00%	100.00%		
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	15.30	15.30		$ 29,040.55	$ 444,320.45	$ -	100.00%	100.00%		
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	37.88	37.88		$ 28,054.90	$ 1,062,719.64	$ -	100.00%	100.00%		
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	156.26	156.26		$ 34,307.63	$ 5,360,909.58	$ -	100.00%	100.00%		
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4.00	4.00		$ 6,973.21	$ 27,892.86	$ -	100.00%	100.00%		
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	8.00	8.00		$ 8,364.64	$ 66,917.15	$ -	100.00%	100.00%		
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	1,268.93	250.30	100.00	$ 6,772.33	$ 1,695,115.30	$ 6,898,502.99	19.73%	19.73%		
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	4,608.04	4608.04		$ 24,136.40	$ 111,221,504.03	$ -	100.00%	100.00%		
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	170.00	480.00		$ 9,730.63	$ 4,670,701.06	$ (3,016,494.43)	282.35%	282.35%		
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.80	6.80		$ 13,991.96	$ 95,145.34	$ -	100.00%	100.00%		
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	5.00	5.00		$ 5,234.93	$ 26,174.66	$ -	100.00%	100.00%		
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	4.00	4.00		$ 185,401.53	$ 741,606.11	$ -	100.00%	100.00%		
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	108.54	108.54		$ 22,625.78	$ 2,455,689.47	$ -	100.00%	100.00%		
13.1.4	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL 6 MM UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN ÁREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA HASTA 60 CM)	M	37.88	37.88		$ 84,841.00	$ 3,213,777.02	$ -	100.00%	100.00%		
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	17.70	17.70		$ 111,316.98	$ 1,970,310.59	$ -	100.00%	100.00%		
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	150.66	69.66	10.00	$ 247,166.77	$ 17,217,637.17	$ 20,020,508.34	46.24%	46.24%		
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	32.50	32.50		$ 202,701.31	$ 6,587,792.64	$ -	100.00%	100.00%		
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	59.66	59.66		$ 4,352.40	$ 259,664.18	$ -	100.00%	100.00%		
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	2,133.00	2,133.00		$ 3,520.76	$ 7,509,774.25	$ -	100.00%	100.00%		

ITEM	CPF	836	IED	Jairo Aníbal Niño			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	3.80	3.80		$ 29,040.55	$ 110,354.10	$ -	100.00%	100.00%		
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	207.43	207.43		$ 30,426.62	$ 6,311,406.79	$ -	100.00%	100.00%		
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6.84	6.84		$ 20,817.86	$ 142,394.19	$ -	100.00%	100.00%		
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	168.45	168.45		$ 10,621.20	$ 1,789,172.62	$ -	100.00%	100.00%		
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	120.31	120.31		$ 28,815.57	$ 3,466,800.79	$ -	100.00%	100.00%		
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	168.45	168.45		$ 11,807.73	$ 1,989,047.41	$ -	100.00%	100.00%		
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	20.00	20.00		$ 19,332.69	$ 386,653.82	$ -	100.00%	100.00%		
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	25.17	21.05		$ 30,969.00	$ 651,897.45	$ 127,697.57	83.62%	83.62%		
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.04			$ 27,437.53	$ -	$ 83,341.50	0.00%	0.00%		
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	40.00	40.00		$ 25,467.57	$ 1,018,702.66	$ -	100.00%	100.00%		
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12.25	12.25		$ 8,364.64	$ 102,466.88	$ -	100.00%	100.00%		
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	31.00	31.00		$ 13,694.66	$ 424,534.44	$ -	100.00%	100.00%		

1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	121.96	121.96		$ 20,392.00	$ 2,487,008.12	$ -	100.0%	100.0%	
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	8.00	8.00		$ 19,766.58	$ 158,132.74	$ -	100.0%	100.0%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	4.25	4.25		$ 13,991.96	$ 59,465.84	$ -	100.0%	100.0%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	13.00	13.00		$ 59,307.81	$ 771,001.55	$ -	100.0%	100.0%	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	5.00	5.00		$ 64,414.18	$ 322,070.90	$ -	100.0%	100.0%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00			$ 118,468.31	$ -	$ 592,341.55	0.00%	0.00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	207.43	207.43		$ 39,814.42	$ 8,258,720.24	$ -	100.0%	100.0%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	1.35	1.35		$ 196,536.97	$ 265,324.92	$ -	100.0%	100.0%	
7.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	207.43	207.43		$ 241,797.92	$ 50,156,238.60	$ -	100.0%	100.0%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	90.30	90.30		$ 14,350.87	$ 1,295,883.31	$ -	100.0%	100.0%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	118.39	118.39	20.09	$ 76,716.07	$ 9,082,415.76	$ 0.00	100.0%	100.0%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	53.42	16.03		$ 67,713.97	$ 1,085,151.57	$ 2,532,020.34	30.00%	30.00%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	191.29	184.50		$ 108,436.36	$ 20,006,509.01	$ 736,445.56	96.45%	96.45%	
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELICULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	9.02	3.97		$ 853,515.01	$ 3,388,454.61	$ 4,308,543.79	44.02%	44.02%	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	3.04			$ 448,682.89	$ -	$ 1,362,874.28	0.00%	0.00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ANGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	8.17	2.45		$ 1,181,573.48	$ 2,894,855.03	$ 6,760,963.46	29.98%	29.98%	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	6.00	6.00		$ 815,394.69	$ 4,892,368.12	$ -	100.0%	100.0%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	5.00	5.00	2.00	$ 575,810.47	$ 2,879,052.34	$ -	100.0%	100.0%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00	1.50		$ 721,070.81	$ 1,081,606.22	$ 1,081,606.22	50.00%	50.00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	16.00	7.00		$ 377,707.97	$ 2,643,955.78	$ 3,399,371.71	43.75%	43.75%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	10.00			$ 38,396.20	$ -	$ 383,962.03	0.00%	0.00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	7.00			$ 31,338.62	$ -	$ 219,370.33	0.00%	0.00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	15.64	13.94	4.88	$ 923,559.19	$ 12,874,415.14	$ 1,573,744.86	89.11%	89.11%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2.70			$ 1,036,355.99	$ -	$ 2,798,161.17	0.00%	0.00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	191.29	184.50		$ 38,464.50	$ 7,096,700.69	$ 261,231.67	96.45%	96.45%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	21.19			$ 11,692.56	$ -	$ 247,718.47	0.00%	0.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	72.64			$ 29,897.64	$ -	$ 2,171,863.23	0.00%	0.00%	
12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	72.64			$ 26,897.83	$ -	$ 1,953,947.28	0.00%	0.00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	10.22	8.31	2.24	$ 185,164.49	$ 1,538,716.90	$ 354,404.83	81.28%	81.28%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	60.77	25.30		$ 4,352.40	$ 110,115.72	$ 154,383.26	41.63%	41.63%	

ITEM	CPF	712	IED		Luis Lopez de Mesa		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	7.80	7.80		$ 29,040.55	$ 226,516.31	$ -	100.0%	100.0%	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	701.99	701.99		$ 30,062.36	$ 21,103,477.22	$ -	100.0%	100.0%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56.41	56.41		$ 10,621.20	$ 599,105.51	$ -	100.0%	100.0%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	32.84	32.84		$ 28,815.57	$ 946,303.20	$ -	100.0%	100.0%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56.41	56.41		$ 11,807.73	$ 666,033.70	$ -	100.0%	100.0%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS; ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	6.00	6.00		$ 19,332.69	$ 115,996.15	$ -	100.0%	100.0%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	12.00	12.00		$ 25,467.57	$ 305,610.80	$ -	100.0%	100.0%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4.00	4.00		$ 5,207.00	$ 20,828.00	$ -	100.0%	100.0%	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	701.99	701.99		$ 16,844.46	$ 11,824,640.79	$ -	100.0%	100.0%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	14.80	14.80		$ 8,364.64	$ 123,796.72	$ -	100.0%	100.0%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	8.00	8.00		$ 13,694.66	$ 109,557.27	$ -	100.0%	100.0%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	74.56	74.56		$ 20,392.00	$ 1,520,427.40	$ -	100.0%	100.0%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	1.50	1.50		$ 47,726.41	$ 71,589.61	$ -	100.0%	100.0%	
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	1.60	1.60		$ 21,103.11	$ 33,764.98	$ -	100.0%	100.0%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	18.66	18.66		$ 13,991.96	$ 261,090.00	$ -	100.0%	100.0%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	8.00	8.00		$ 59,307.81	$ 474,462.49	$ -	100.0%	100.0%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	5.00	5.00		$ 59,307.81	$ 296,539.06	$ -	100.0%	100.0%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	2.00	2.00		$ 90,824.54	$ 181,649.09	$ -	100.0%	100.0%	
4.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN	1.00	1.00		$ 121,077.07	$ 121,077.07	$ -	100.0%	100.0%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	56.00	8.00		$ 5,829.54	$ 46,636.30	$ 279,817.80	14.29%	14.29%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	1.00		$ 118,468.31	$ 118,468.31	$ -	100.0%	100.0%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	4.00	4.00		$ 185,401.53	$ 741,606.11	$ -	100.0%	100.0%	
7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHEBENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	701.99	158.95		$ 65,046.28	$ 10,339,106.71	$ 35,322,733.63	22.64%	22.64%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	113.76	113.76	23.44	$ 26,316.62	$ 2,993,778.60	$ 0.00	100.0%	100.0%	
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	0.95	0.95		$ 70,333.44	$ 66,816.77	$ -	100.0%	100.0%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	50.09	50.09		$ 14,350.87	$ 718,934.94	$ -	100.0%	100.0%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	46.90	46.90		$ 76,716.07	$ 3,597,983.78	$ -	100.0%	100.0%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	23.66	23.66		$ 67,713.97	$ 1,602,112.52	$ -	100.0%	100.0%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	47.61	47.61		$ 108,436.36	$ 5,162,655.25	$ -	100.0%	100.0%	
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO).	M2	2.32	2.32		$ 489,874.00	$ 1,136,752.62	$ -	100.0%	100.0%	
9.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	1.60			$ 698,853.48	$ -	$ 1,118,584.89	0.00%	0.00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ANGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	4.79	3.00		$ 1,181,573.48	$ 3,544,720.44	$ 2,119,033.88	62.59%	62.59%	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	6.00	6.00		$ 815,394.69	$ 4,892,368.12	$ -	100.0%	100.0%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	2.00		$ 575,810.47	$ 1,151,620.93	$ -	100.0%	100.0%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00	3.00		$ 377,707.97	$ 1,133,123.90	$ 755,415.94	60.00%	60.00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	1.00	1.00		$ 38,396.20	$ 38,396.20	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2.00			$ 31,338.62	$ -	$ 62,677.24	0.00%	0.00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	8.51	4.00		$ 923,559.19	$ 3,694,236.77	$ 4,167,099.07	46.99%	46.99%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.44	1.44	1.44	$ 1,036,355.99	$ 1,492,352.63	$ -	100.0%	100.0%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	58.63	58.63		$ 38,464.50	$ 2,255,173.78	$ -	100.0%	100.0%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	25.11	25.11		$ 29,897.64	$ 750,819.43	$ -	100.0%	100.0%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	0.55	0.55	0.55	$ 185,164.49	$ 101,840.47	$ -	100.0%	100.0%	
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	701.99	205.60	100.00	$ 86,678.38	$ 17,821,075.09	$ 43,026,281.45	29.29%	29.29%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	727.10	105.60		$ 4,352.40	$ 459,613.44	$ 2,705,016.60	14.52%	14.52%	

19.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR DE PASAJEROS MEDIA CABINA USO PARA PERSONAS CON DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD Y PASAJEROS, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 500 KG CARGA VIVA Y TOTAL CON CABINA 890 KG APROX. 2 PARADAS, FOSO CON MEDIDAS 1.60M DE ANCHO X 1.60M DE FONDO APROX.; POSO CON MEDIDAS 1.60M DE ANCHO X 1.60M DE FONDO X 1.00M DE ALTURA APROX., MEDIDAS DE CABINA: 1.50 M DE ANCHO X 1.20M DE FONDO X 1.60M DE ALTURA, PARA EL COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA	UN	1.27			$ 76,917,022.98	$ -	$ 97,684,619.18	0.00%	0.00%	

ITEM	CPF	814	IED	Eduardo Umaña Luna			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas. si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	21.76	21.76		$ 4,435.43	$ 96,514.97	$ -	100.00%	100.00%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico	M	6.40	6.40		$ 29,040.55	$ 185,859.53	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.21	3.21		$ 30,062.36	$ 96,644.48	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1.89	1.89		$ 20,817.86	$ 39,345.76	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	66.41	66.41		$ 10,621.20	$ 705,300.47	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20.97	20.97		$ 28,815.57	$ 604,262.43	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	69.88	69.88		$ 11,807.73	$ 825,147.54	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5.00	5.00		$ 19,332.69	$ 96,663.46	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6.80	6.80		$ 30,969.00	$ 210,589.20	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11.00	11.00		$ 25,467.57	$ 280,143.23	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	3.00	3.00	3.00	$ 6,973.21	$ 20,919.64	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBRIGRESADA (INCLUYO MARMOL 30x30 CM) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.21	3.21		$ 21,107.13	$ 67,855.21	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	10.50	10.50		$ 8,364.64	$ 87,828.75	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	5.00	5.00		$ 13,694.66	$ 68,473.30	$ -	100.00%	100.00%	
1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2	549.44	549.44		$ 50,276.25	$ 27,623,780.82	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	46.09	46.09		$ 20,392.00	$ 939,867.21	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	7.00	7.00		$ 36,375.35	$ 254,627.45	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE REFUERZO	M	0.95	0.95	0.69	$ 101,698.85	$ 96,613.91	$ -	100.00%	100.00%	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	3.74	3.74		$ 68,498.74	$ 256,390.79	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	1.00	1.00		$ 85,501.22	$ 85,501.22	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	2.00	2.00		$ 47,726.41	$ 95,452.82	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	48.00	48.00		$ 13,991.96	$ 671,614.16	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7.00	7.00		$ 59,307.81	$ 415,154.68	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	5.00	5.00		$ 59,307.81	$ 296,539.06	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	1.00	1.00		$ 169,748.96	$ 169,748.96	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	2.00	2.00		$ 90,824.54	$ 181,649.09	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	3.00	3.00		$ 170,346.24	$ 511,038.72	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	44.00	44.00		$ 5,829.54	$ 256,499.65	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.13	SUSPENSION DE SALIDA SANITARIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1.00			$ 30,698.48	$ -	$ 30,698.48	0.00%	0.00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	1.00		$ 118,468.31	$ 118,468.31	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	1.00		$ 211,513.25	$ 211,513.25	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	2.00	2.00		$ 180,924.58	$ 361,849.16	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	3.21	3.21		$ 42,278.54	$ 135,917.06	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	3.21	3.21		$ 196,536.97	$ 631,827.07	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	1.80	1.80		$ 70,333.44	$ 126,600.20	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	24.70	24.70		$ 14,350.87	$ 354,466.42	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	37.48	37.48		$ 76,716.07	$ 2,875,318.36	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	24.15	24.15	4.00	$ 67,713.97	$ 1,635,292.37	$ 94.80	99.99%	99.99%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	72.77	72.77		$ 108,436.36	$ 7,890,914.15	$ -	100.00%	100.00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ANGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.73	2.73	1.70	$ 1,181,573.48	$ 3,225,695.60	$ (0.00)	100.00%	100.00%	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4 " Y SELLANTE)	UN	5.00	5.00	2.50	$ 815,394.69	$ 4,076,973.43	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	2.00	1.00	$ 575,810.47	$ 1,151,620.93	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00	3.00		$ 377,707.97	$ 1,133,123.90	$ 755,415.94	60.00%	60.00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00	2.00		$ 38,396.20	$ 76,792.41	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2.00	1.00		$ 31,338.62	$ 31,338.62	$ 31,338.62	50.00%	50.00%	
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	1.00	1.00		$ 948,374.57	$ 948,374.57	$ -	100.00%	100.00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	6.80	6.80	3.80	$ 923,559.19	$ 6,280,202.51	$ 0.00	100.00%	100.00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	0.72			$ 1,036,355.99	$ -	$ 746,176.31	0.00%		
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	69.35	69.35		$ 38,464.50	$ 2,667,513.24	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	38.54	38.54		$ 29,897.64	$ 1,152,246.08	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0.60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	3.90	3.90		$ 18,044.38	$ 70,373.09	$ -	100.00%	100.00%	
12.3.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	12.00	12.00		$ 29,063.32	$ 348,759.82	$ -	100.00%	100.00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	2.82	2.00		$ 185,164.49	$ 370,328.98	$ 151,501.58	70.97%	70.97%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	368.76	320.30		$ 4,352.40	$ 1,394,073.72	$ 210,917.30	86.86%	86.86%	

ITEM	CPF	833	IED	Dario Echandia			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de intervenorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	123.63	123.63		$ 3,404.25	$ 420,873.79	$ -	100.00%	100.00%	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	15.60	15.60		$ 2,407.88	$ 37,562.95	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.80	12.80		$ 20,817.86	$ 266,468.66	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	224.64	224.64		$ 28,054.90	$ 6,302,252.92	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERIA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	686.67	686.67		$ 34,307.63	$ 23,557,934.93	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	57.00	57.00		$ 11,171.61	$ 636,781.56	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	57.00	57.00		$ 6,973.21	$ 397,473.22	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	253.30	253.30		$ 4,099.29	$ 1,038,350.46	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	6.25	6.25		$ 8,364.64	$ 52,279.02	$ -	100.00%	100.00%	
1.3.3	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN).	UN	11.00	11.00		$ 177,967.63	$ 1,957,643.90	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	26.00	26.00		$ 36,375.35	$ 945,759.11	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.16	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	0.85	0.85		$ 1,307,170.35	$ 1,113,709.14	$ -	100.00%	100.00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	80.60	80.60		$ 6,772.33	$ 545,850.15	$ -	100.00%	100.00%	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	16806.93	16806.93		$ 24,136.40	$ 405,658,812.14	$ -	100.00%	100.00%	
3.1.13	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2	69.18	69.18		$ 12,825.52	$ 887,305.53	$ -	100.00%	100.00%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	108.00	108.00		$ 9,730.63	$ 1,050,907.74	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.25	6.25		$ 27,619.66	$ 172,622.88	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	13.00	13.00		$ 118,468.31	$ 1,540,088.04	$ -	100.00%	100.00%	

5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	2.00		$ 163,656.94	$ 327,313.87	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	27.00	27.00		$ 197,624.40	$ 5,335,858.93	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	126.65	126.65		$ 24,422.99	$ 3,093,171.73	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	50.00	50.00		$ 46,585.41	$ 2,329,270.56	$ -	100.00%	100.00%	

5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	62.00	62.00		$ 188,899.52	$ 11,711,770.04	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	49.00	49.00		$ 185,401.53	$ 9,084,674.79	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	1,161.22	1,161.22		$ 29,762.38	$ 34,560,636.12	$ -	100.00%	100.00%	
13.1.4	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL 6 MM UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN ÁREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA HASTA 60 CM)	M	449.28	449.28		$ 84,841.00	$ 38,117,363.76	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	17.00	17.00		$ 111,316.98	$ 1,892,388.70	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	40.00	40.00		$ 24,947.96	$ 997,918.27	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	642.87	642.87		$ 247,166.77	$ 158,896,101.17	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	6.20	6.20		$ 134,793.16	$ 835,717.58	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	716.95	716.95		$ 4,352.40	$ 3,120,437.95	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	13184.70	13184.70		$ 3,520.76	$ 46,420,122.18	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	748	IED		Alfonso Reyes Echandia		SEMANA			
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de carpetas asfalticas y placas de concha se debe aplicar)	m2	73.41			$ 6,575.47	$ -	$ 482,716.28	0.00%	0.00%	$ 2,230.40
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	m2	73.41			$ 29,040.55	$ -	$ 2,131,914.99	0.00%	0.00%	$ 9,850.56
1.2.16	DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMINETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	176.00	158.12	158.12	$ 113,509.25	$ 17,948,083.05	$ 2,029,545.44	89.84%	89.84%	$ 38,502.34
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	2.00			$ 22,734.26	$ -	$ 45,468.52	0.00%	0.00%	$ 7,711.46
2.2.11	MUROS DE CONTENCIÓN 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	6.00			$ 1,429,703.14	$ -	$ 8,578,218.82	0.00%	0.00%	$ 484,955.30
2.3.3	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	64.00			$ 172,618.86	$ -	$ 11,047,607.19	0.00%	0.00%	$ 58,552.32
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	480.00			$ 6,772.33	$ -	$ 3,250,720.51	0.00%	0.00%	$ 2,297.18
4.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	73.41			$ 93,453.39	$ -	$ 6,860,568.29	0.00%	0.00%	$ 31,699.39
4.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1800	M2	73.41			$ 12,287.16	$ -	$ 902,020.75	0.00%	0.00%	$ 4,167.80
9.3.4	CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 M.	M	73.41			$ 1,122,317.90	$ -	$ 82,391,214.44	0.00%	0.00%	$ 380,690.23
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	73.41			$ 4,352.40	$ -	$ 319,516.89	0.00%	0.00%	$ 1,476.33

ITEM	CPF	747	IED		Orlando Higuita		SEMANA			
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	173.65	173.65		$ 30,062.36	$ 5,220,329.09	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	116.70	144.84		$ 10,621.20	$ 1,538,352.21	$ (298,809.88)	124.11%	124.11%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	116.70	144.84		$ 11,807.73	$ 1,710,206.97	$ (332,190.98)	124.11%	124.11%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	25.00	4.00		$ 6,973.21	$ 27,892.86	$ 146,437.50	16.00%	16.00%	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	173.65	152.28		$ 16,844.46	$ 2,565,038.63	$ 360,001.43	87.69%	87.69%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+60ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN	UN	25.00	25.00		$ 62,547.34	$ 1,563,683.40	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	153.00	153.00		$ 42,278.54	$ 6,468,617.23	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	150.00	150.00		$ 26,316.62	$ 3,947,492.88	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC. ANCHO 6 CM	M	74.66	74.66		$ 19,490.72	$ 1,455,176.92	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	116.70	116.70		$ 22,625.78	$ 2,640,428.99	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	116.70	116.70		$ 29,897.64	$ 3,489,054.59	$ -	100.00%	100.00%	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	116.70	116.70		$ 121,679.71	$ 14,200,022.39	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	173.65	173.65		$ 86,678.38	$ 15,051,700.83	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.25	AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA)	M2	173.65	173.65		$ 106,127.58	$ 18,429,054.68	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	290.35	290.35		$ 4,352.40	$ 1,263,719.34	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN)	M2	116.70	116.70		$ 7,510.23	$ 876,444.26	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	838	IED		Isabel II		SEMANA			
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	10.26	10.26		$ 4,352.40	$ 44,633.86	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<=20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1.00	1.00		$ 1,953,740.13	$ 1,953,740.13	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	850	IED		Jhon F Kennedy		SEMANA			
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	8.88	8.88		$ 4,352.40	$ 38,644.09	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<=20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1.00	1.00		$ 1,953,740.13	$ 1,953,740.13	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	817	IED		Marsella		SEMANA			
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	27.59	27.59		$ 4,352.40	$ 120,102.30	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.2	TALA DE ARBOLES CLASE II (9M<H<15M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1.00	1.00		$ 739,630.79	$ 739,630.79	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.6	PODA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<=20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	4.00	4.00		$ 976,870.07	$ 3,907,480.26	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	890	IED		Nelson Mandela		SEMANA			
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.08	17.08	17.08	$ 30,426.62	$ 519,686.74	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22.00	22.00	22.00	$ 17,444.42	$ 383,777.22	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	11.00	11.00	11.00	$ 85,501.22	$ 940,513.46	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	UN	22.00	22.00	22.00	$ 20,568.77	$ 452,513.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	16.00	16.00	16.00	$ 5,829.54	$ 93,272.60	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	34.16	34.16	34.16	$ 42,278.54	$ 1,444,235.06	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.30	TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	34.16	34.16	34.16	$ 127,154.36	$ 4,343,592.99	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.3	PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	8.54	8.54	8.54	$ 36,604.35	$ 312,601.18	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	8.54	8.54	8.54	$ 11,692.56	$ 99,854.42	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	8.54	8.54	8.54	$ 17,192.65	$ 146,825.23	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	34.16	34.16	34.16	$ 4,352.40	$ 148,677.98	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	763	IED		Bicentenario		SEMANA			
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	15.00			$ 6,772.33	$ -	$ 101,585.02	0.00%	0.00%	
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2	25.20			$ 195,409.37	$ -	$ 4,924,316.07	0.00%	0.00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	50.40			$ 22,625.78	$ -	$ 1,140,339.51	0.00%	0.00%	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	36.60			$ 18,025.63	$ -	$ 659,738.13	0.00%	0.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	36.60			$ 4,352.40	$ -	$ 159,297.84	0.00%	0.00%	

ITEM	CPF	729	IED		San bernardino		SEMANA			
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2.00			$ 122,747.05	$ -	$ 245,494.11	0.00%	0.00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.60			$ 20,817.86	$ -	$ 158,111.68	0.00%	0.00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2' A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	2.40			$ 16,375.74	$ -	$ 39,301.77	0.00%	0.00%	
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	0.18			$ 633,678.64	$ -	$ 114,062.15	0.00%	0.00%	
2.2.17	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2	1.20			$ 128,126.62	$ -	$ 153,751.94	0.00%	0.00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	13.32			$ 6,772.33	$ -	$ 90,174.99	0.00%	0.00%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	7.60			$ 136,417.61	$ -	$ 1,036,091.73	0.00%	0.00%	

3.1.11	RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	M2	15.19			$ 137,324.25	$ -	$ 2,085,955.30	0.00%	0.00%	
ITEM	**CPF**	**821**	**IED**		**San Jose**		**SEMANA**				
Ítem	**Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	8.98	8.98		$ 4,352.40	$ 39,081.94	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.2	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<15M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1.00	1.00		$ 739,630.79	$ 739,630.79	$ -	100.00%	100.00%	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8169111 DE 2025
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154784

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3

UNIOBRAS DEL ORIENTE

UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S

INFORME MENSUAL No. 006
Periodo del informe: 14 de marzo 2026 al 13 de abril de 2026

Elaboró	Aprobó
Katerin Carolina Núñez Osorio	**Arq. Harry Arango Gutiérrez**
Profesional SST	Director de interventoría
	

Barrancabermeja
Número de contacto: 3161147965
Correo electrónico: lote3uniobras@gmail.com

CONTENIDO

1. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4

1.1 Introducción. 4

1.2 Objetivos. 5

1.3 Delimitación Área De Influencia Directa. 5

1.4 Información Del Contrato. 10

2. CONTROL DE PERSONAL Y EQUIPOS INTERVENTORÍA. 11

2.1 Ingreso de personal de Obra. 12

2.2 Personal Operativo de Obra 12

2.3 Registro de exámenes de ingreso 14

2.4 Personal Retirado. 15

2.5 Porcentaje de Personal Femenino. 15

3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES 16

4. SEÑALIZACIÓN. 21

4.1 Señalización del campamento. 21

4.2 Señalización y Demarcación de Maquinaria, Equipos, Herramientas y Vehículos. 22

4.3 Señalización Plan de Emergencia. 22

4.4 Señalización Prohibitiva, de obligación y salvamento y demarcación del frente de trabajo. 23

4.5 Señalización de las áreas destinadas para la movilidad. 23

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 24

5.1 Registro Uso de los EPP. 24

6. ADMINISTRAACIÓN DE LOS RIESGOS. 25

6.1 Panorama de Factor de Riesgos por proceso constructivo de acuerdo con la Matriz de Riesgos 25

6.2 Procedimiento estándares de trabajo seguro por proceso constructivo. 26

6.3 Permisos de trabajo para labores de alto riesgo. 26

6.4 Inspecciones SST. 26

7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 28
7.1 Documentación de maquinaria, equipos y vehículos....28
7.2 Programación de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos. 27
7.3 Control Pre operacional de la maquinaria, equipos y vehículos. 29
7.4 Horarios de trabajo de la maquinaria....29
7.5 Control diario de horómetro. 29
7.6 Evidencia de información de entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos. 29
8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 29
8.1 Pagos de Seguridad Social. 28
9. EMERGENCIAS....32
9.1 Recursos Definidos en el Plan De Emergencias.. 32
9.2 Conformación de las Brigadas de Emergencia.. 33
9.3 Simulacros de Emergencia....33
10. BIENESTAR....33
10.1 Instalaciones Provisionales.. 33
10.2 Baterías de Baños.. 34
10.3 Sistema de Hidratación.. 35
11. ORDEN Y ASEO....35
11.1 Registro de Orden y Aseo en los frentes de Obra.. 35
12. DIVULGACIÓN....36
12.1 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Política en Seguridad y Salud en el Trabajo.. ..36
12.2 Actividades de Promoción y Prevención Establecidas en el SGSST.. 36
13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL....36
14. INDICADORES SST 37

15. REPORTE Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD 37

15.1 Registro Estadístico, Caracterización e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, tanto del Personal como de Terceros... 38

15.2 Procedimiento de Reporte e Investigación de los Accidentes e Incidentes de Trabajo Incluido en el SGSST... 38

15.3 Planes de Acción derivados de las investigaciones de Accidentes e Incidentes... 38

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 39

17. ANEXOS 40

1. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST.

1.1. INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento del contrato de interventoría **No. CO1.PCCNTR.8169111 de 2025**, UNIOBRAS, en su calidad de Interventor, presenta a la Secretaría de Educación Distrital –SED– el Informe mensual N° 6 en el cual se realiza el seguimiento al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, correspondiente al periodo del 14 de marzo 2026 al 13 de abril de 2026, en desarrollo del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8154784, suscrito entre la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO y el CONSORCIO EDU 25, cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". Lote 7.

El presente informe muestra las actividades realizadas por parte de la interventoría (UNIOBRAS) y contratista de obra (Consorcio Edu 2025) desde el área SST para el periodo comprendido entre el 14 de marzo 2026 al 13 de abril de 2026. Para este periodo se reporta el ingreso del personal de la interventoría y se anexan las planillas correspondientes al pago de la seguridad social (EPS, ARL y AFP).

A continuación, se citan las actividades realizadas por parte del contratista de obra durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo 2026 al 13 de abril de 2026, las cuales fueron verificadas por parte del área SST de la interventoría:

- **Actividades SST**
  - Compilación y entrega de documentos para ingreso de personal.
  - Inducción, notificación de riesgos, evaluación inducción de personal operativo
  - Análisis de la actividad a ejecutar – ATS
  - Compilación de planillas de seguridad
  - Entrega de dotación y EPP´S
  - Inspección de elementos SST
  - Inspecciones preoperacionales
  - Charla de 5 minutos y capacitación mensual
  - Señalización de áreas
  - Demarcación y delimitación de zonas.

En relación con los aspectos de SST, el contratista efectuó la entrega planillas del personal activo, debido que durante el periodo no sé registro ingreso de personal. Así mismo, tanto el contratista como la interventoría anexan las planillas de seguridad del personal administrativo y operativo correspondiente a este periodo**. (Ver anexo 2. Planillas de Seguridad Social).**

El contratista, dentro del informe de gestión SST, anexa los respectivos ATS correspondientes a las actividades ejecutadas en la obra, para un total de 3 ATS durante el periodo evaluado. Se informa que en este periodo se realizaron trabajados en alturas procedentes de la actividad de cubierta, se diligenció 1 permiso de trabajo en caliente y 5 permisos para trabajo en alturas

Asimismo, el contratista incluye las inspecciones de las herramientas disponibles en la obra y presenta el registro de 38 charlas diarias. De igual manera, el contratista presenta la documentación de ingreso del personal, la cual fue presentada previo al inicio de labores en los frentes de trabajo asignados.

Asimismo, durante el periodo reportado no se registraron accidentes laborales; en consecuencia, no se generaron investigaciones de accidentes, informes FURAT, lecciones aprendidas ni socializaciones asociadas.

Se evidencia que todo el personal ingresó a la obra con las afiliaciones correspondientes a ARL, EPS, AFP, así como con el examen médico de ingreso. Esta información se encuentra adjunta en el informe presentado por el contratista e incluye la respectiva firma de aprobación de esta interventoría. Del mismo modo, el personal de interventoría cuenta con esta documentación desde antes del inicio de las actividades de obra**.**

1.2. OBJETIVOS.

- Dar a conocer el avance en cada una de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, realizadas durante el período en mención.
- Verificar el reporte de avance mensual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo presentada por el Contratista
- Revisar y verificar la documentación de todo el personal que ingresó en el periodo del 14 de marzo 2026 al 13 de abril de 2026 a la obra.
- Realizar el seguimiento a los pagos de seguridad social del contratista, como de interventoría.
- Hacer seguimiento del personal que se retira en el periodo del 14 de marzo 2026 al 13 de abril de 2026.
- Verificar la emisión de los permisos para actividades de alto riesgo y la elaboración de los respectivos ATS asociados cuando aplique.
- Consolidar la información de ingreso del personal de interventoría y efectuar el seguimiento a los pagos de seguridad social correspondientes.
- Verificar la entrega de documentación de todo el personal y maquinaria que ingresa a obra.
- Hacer seguimiento de las afiliaciones y pagos de seguridad de todo el personal que trabaja en obra.
- Gestionar, cuando aplique, la entrega de los elementos de protección personal (EPP) al personal de

interventoría.

- Dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Lista de Chequeo de la SED.

1.3. DELIMITACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA.

- **Institución Educativa Distrital El Porvenir – Sede B**

  La IED El Porvenir – Sede B – El Recuerdo se encuentra ubicada en la localidad de Bosa en la dirección CL 58 SUR # 104 A - 50 en el Suroccidente de la ciudad.



Imagen 1 – IED El Porvenir – Sede B, Fuente Google Earth

- **Institución Educativa Distrital Luis López de Mesa– Sede A**

  La IED Luis López de Mesa – Sede A –se encuentra ubicada en la localidad de Bosa en la dirección CL 65 H SUR # 78 A - 03 en el Suroccidente de la ciudad



Imagen 2 – IED Luis López de Mesa – Sede A, Fuente Google Earth

- **Institución Educativa Distrital Villas del Progreso**

La IED Villas del Progreso –El Porvenir VII Etapa Enrique Dussel Sede B se encuentra ubicada en la localidad de Bosa en la dirección CALLE 55 Sur No 103-96 en el Suroccidente de la ciudad.



Imagen 3 – IED Villas del Progreso, Fuente Google Earth

- **Institución Educativa Distrital Pablo de Tarso – Sede A**

La IED Pablo de Tarso – Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Bosa en la dirección CL 66 SUR # 78 J – 02 en el Suroccidente de la ciudad



Imagen 4 – IED Pablo de Tarso – Sede A, Fuente Google Earth

- **Institución Educativa Distrital Jairo Aníbal Niño – Sede A**

La IED Jairo Aníbal Niño – Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy en la dirección KR 87 H BIS # 39 A - 23 SUR en el Suroccidente de la ciudad



Imagen 5 – IED Jairo Aníbal Niño – Sede A, Fuente Google Earth

- **Institución Educativa Distrital Darío Echandía – Sede B**

La IED Darío Echandía – Sede B – Los Patios se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy en la dirección KR 88 F BIS # 2 – 09 en el Suroccidente de la ciudad.



Imagen 6 – IED Darío Echandía – Sede B, Fuente Google Earth

- **Institución Educativa Distrital Alfonso López Michelsen – Sede A**

La IED Alfonso López Michelsen – Sede A – Portal del Sol se encuentra ubicada en la localidad de Bosa en la dirección KR 98 B # 74 - 68 SUR en el Suroccidente de la ciudad.



Imagen 7 – IED Alfonso López Michelsen – Sede A, Fuente Google Earth

- **Institución Educativa Distrital Eduardo Umaña Luna– Sede A**

La IED Eduardo Umaña Luna – Sede A –Dindalito se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy en la dirección KR 93 A # 42 A - 37 SUR en el Suroccidente de la ciudad.

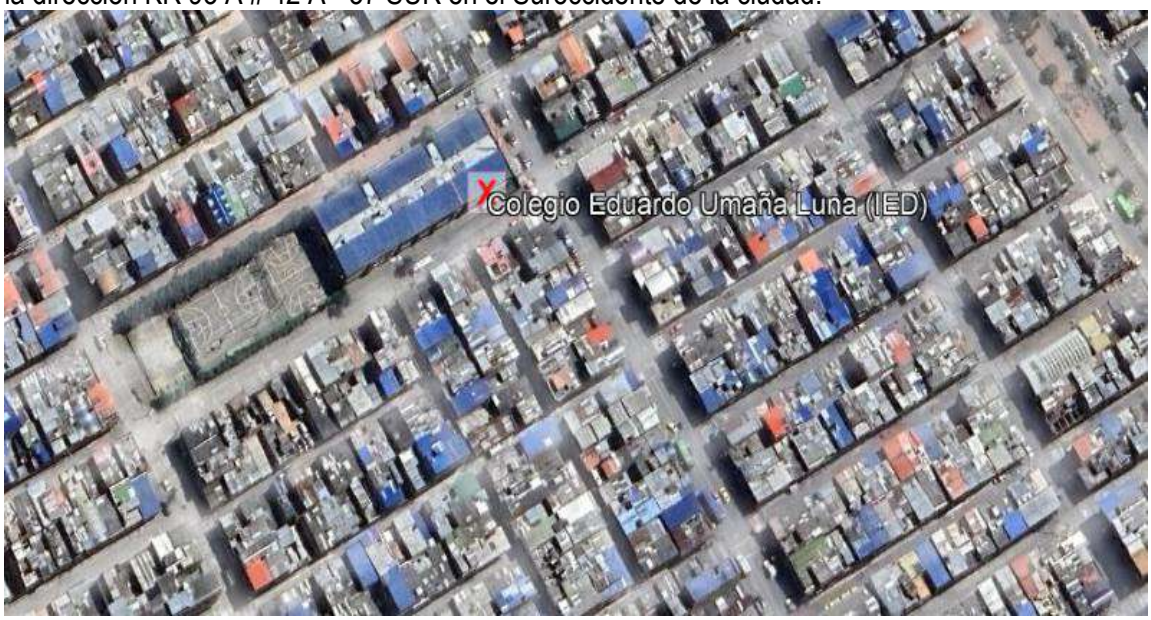


Imagen 8 – IED Eduardo Umaña Luna – Sede A, Fuente Google Earth

1.4. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

1.5. Información general del contrato.

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.8154784 de 2025
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
VALOR INICIAL	$2.451.846.958
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Andrés Ivanno Galeano
FECHA DE INICIACIÓN:	14/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	13/05/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A

2. CONTROL DE PERSONAL Y EQUIPOS DE INTERVENTORÍA

Durante el periodo de ejecución, la interventoría dio continuidad al cumplimiento de la planta administrativa de los profesionales que se establecen en los estudios previos, en el sitio de los trabajos se cuenta con el personal requerido y se cuenta con un grupo de Especialistas a disposición. A continuación, se relaciona el personal de interventoría aprobado por la Secretaria Distrital de Integración Social.

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	John Harry Arango Gutiérrez	Director de Interventoría	100%
2	Claudia Marcela Forero	Profesional de apoyo	100%
3	Jhoner Andrés Martínez	Residente 1	100%
4	Víctor Alfonso Mora	Residente 2	100%
5	Miller Arley Marín Castellanos	Residente 3	100%
6	Javier Alejandro Maestra Robayo	Residente 4	100%
7	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%
8	Edison Jair López Castro	Especialista. Ambiental	60%
9	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%
10	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%
11	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%
12	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%
13	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%
14	Yuleiny Tatiana Acosta Ramírez	Técnico SST 1	100%

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
15	Juan Sebastián Brochero Osorio	Técnico SST 2	100%
16	Luis Felipe Moyano Segura	Técnico SST 3	100%
17	Paul Alberto Rangel Páez	Técnico SST 4	100%
18	Decio Eljure Valencia	Técnico SST 5	100%
19	Karen Liseth Higuera Araque	Técnico SST 6	100%
20	Fredy Alberto Bermúdez Otálora	Técnico SST 7	100%
21	Marco Antonio Carrero	Inspector Interventoría 1	100%
22	María Auxiliadora Cárdenas Lizarazo	Inspector Interventoría 2	100%
23	Jonathan Wilmer Casallas Junca	Inspector Interventoría 3	100%
24	Anyeli Mayed Curiel Acosta	Inspector Interventoría 4	100%
25	Etelberto Riquelme	Inspector Interventoría 5	100%
26	Lizeth Alejandra Escobar Maldonado	Inspector Interventoría 6	100%
27	Dayana Tejada Flórez	Inspector Interventoría 7	100%
28	Jhon Alexander Tovar Ortiz	Inspector Interventoría	100%
29	Lorena Jiménez Tamayo	Inspector Interventoría	100%
30	Huber Alfonso Molina Sarmiento	Inspector Interventoría	100%

Ver Planilla de Seguridad Social Interventoría

2.1. Ingreso Personal de Obra

En el periodo del 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026, se pudo evidenciar que el contratista presentó documentación de ingreso de trabajadores operativos, los cuales son trabajadores de mano de obra no

calificada. Esta información se encuentra en el Anexo 3. Documentación y Planillas de Seguridad Social vigentes del informe SST No 6 del contratista.

2.2 Personal Operativo de Obra

Consorcio EDU 2025

Para el periodo entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026 se presenta el siguiente personal activo:

Tabla 1. Personal Consorcio EDU 2025

Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Fecha de ingreso	Contratista
Wilver Franciny Russy Ladino	80.212.380	Director de Obra	18/11/2025	Consorcio EDU 2025
Karen Lisseth Salamanca Rojas	1.057.588.784	Residente HSEQ	18/11/2025	Consorcio EDU 2025
Paula Mariana Moreno Páez	1.014.285.166	Residente de Obra	18/11/2025	Consorcio EDU 2025
Juan Esteban Forero Becerra	1.049.655.976	Inspector de Obra	18/11/2025	Consorcio EDU 2025
Luis Fernando Zabala Fúquene	1.013.619.814	Inspector de Obra	18/11/2025	Consorcio EDU 2025
Stefany Katerin González Orjuela	1.000.005.655	Inspectora SST	18/11/2025	Consorcio EDU 2025
Oscar Javier Velásquez Avendaño	1.019.029.155	Inspector SST	18/11/2025	Consorcio EDU 2025
Livinton García Ramírez	1.010.176.635	Oficial de Obra	18/11/2025	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
Cindy Patricia Olarte Minorta	1.192.781.206	Inspector SST	18/11/2025	Consorcio EDU 2025

Personal Operativo

Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Fecha de ingreso	Contratista
Nicolas Stiven Rivera Tobón	1.001.638.278	Ayudante de Obra	27/11/2025	GEORGY PAOLO RUSSI LADINO

Esneyder Alexander Suarez Galeano	1.039.705.039	Ayudante de Obra	18/11/2025	GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
Wilson Asprilla Salgado	1.012.916.233	Oficial de Obra	19/11/2025	GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
Manuel Eduardo Barjemo González	2.66.579.78	Ayudante de Obra	09/04/2026	GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
Remy Castro	2.000.015.012	Oficial de Obra	09/01/2026	GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
Cirilo Bermejo	73.561.565	Maestro de obra	18/11/2025	GEORGY PAOLO RUSSI LADINO

. Tabla 2. Personal Operativo radicado

Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Fecha de ingreso	Contratista
Manuel Eduardo Barjemo González	2.66.579.78	Ayudante de Obra	09/04/2026	LUIS LOPEZ DE MESA

2.3. Registro de exámenes de ingreso

- **Personal Interventoría**

Para el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026, por parte de interventoría no se presenta ingreso de personal.

La información se encuentra soportada en el Anexo del Informe SST N.º 6.

- **Personal Contratista**

Para el periodo comprendido entre el 14 de febrero de 2026 y el 13 de marzo de 2026, se evidencia que el contratista presentó 01 examen médico ocupacional de ingreso, con sus respectivas recomendaciones médicas.

2.4. Personal Retirado

Para el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026, no se presentaron retiro de personal por parte de la interventoría ni por parte del contratista.

Porcentaje Personal Femenino

- **Personal Interventoría**

Por cuenta de la interventoría para el periodo entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026 se cuenta con el equipo de 29 trabajadores de interventoría, de los cuales 11 son mujeres y 15 son hombres lo que corresponde al 37,5% de personal femenino vinculado a la interventoría, cumpliendo con el porcentaje mínimo que exigió la SED en la etapa contractual.

Tabla 3. Personal Femenino Interventoría

	Cantidad	Porcentaje
Mujeres	11	37,93%
Hombres	18	62,06%
TOTAL	29	100%

- **Personal Contratista**

Para el periodo entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026, el contratista cuenta con 3 mujeres y 11 hombres, lo que corresponde al 21,4% de personal femenino vinculado a la interventoría.

Tabla 3. Personal Femenino Contratista

	Cantidad	Porcentaje
Mujeres	04	26,6 %
Hombres	11	73,4 %
TOTAL	15	100%

3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES

- **Personal Interventoría**

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo al 13 de abril de 2026 no se generaron ingresos por parte de interventoría. No obstante, en cumplimiento de sus obligaciones y del plan de trabajo definido, la interventoría desarrolló la capacitación mensual en SST, enfocada en Manejo de cargas, riesgo biomecánico e higiene postural. Esta actividad tuvo como objetivo promover hábitos seguros en el manejo de cargas, la higiene postural y la adopción de posturas adecuadas en puestos de trabajo de oficina, con el fin de prevenir riesgos biomecánicos y mejorar el bienestar laboral. **Ver Anexo 3. Capacitación Mensual**

Personal Contratista - Inducciones

Para el periodo entre el 14 de marzo 2026 al 13 de abril de 2026, se pudo evidenciar, que el contratista presentó 01 inducción con la respectiva evaluación del trabajador que ingreso a obra. Así mismo, se contó con el registro de las charlas de seguridad impartidas, las cuales estuvieron orientadas a reforzar las medidas preventivas, los riesgos asociados a las actividades ejecutadas y el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas para la obra.

- **Capacitaciones y Charlas de seguridad**

Villas del Progreso

No	TEMA	FECHA
1	Uso correcto herramientas manuales	30/03/2026
2	Riesgo químico	04/04/2026
3	Acopio correcto material	13/04/2026

Sede B – El Porvenir

No	TEMA	FECHA
1	Manipulación segura y conexiones	28/03/2026
2	Riesgo eléctrico	31/03/2026
3	Cortes y manipulación materiales	02/04/2026

Sede A- Jairo Aníbal Niño

No	TEMA	FECHA
1	Prevención caídas al mismo nivel	14/03/2026
2	Uso seguro herramientas eléctricas	25/03/2026
3	Actos y condiciones inseguras	01/04/2026
4	Manejo adecuado sustancias químicas	06/04/2026

Sede B – Darío Echandía

No	TEMA	FECHA
1	Uso correcto escaleras	21/03/2026
2	Reporte incidentes o accidentes	27/03/2026

3	Fatiga laboral	04/04/2026
4	Trabajo en equipo y comunicación	10/04/2026
5	Protección ojos	11/04/2026

Sede A – Luis López de Mesa

No	TEMA	FECHA
1	Uso correcto guantes	16/03/2026
2	Correcto uso de herramientas manuales	17/03/206
3	Trabajo en alturas	18/03/2026
4	Accesos a cubierta	19/03/2026
5	Buena postura (manejo de cargas)	20/03/2026
6	Orden y aseo	21/03/2026
7	Importancia señalización en obra	24/03/2026
8	Recomendaciones (uso epps,acceso cubierta,uso adecuado instalaciones del colegio)	25/03/2026
9	Orden y aseo	26/03/2026
10	Elementos de protección personal y contra caídas	27/03/2026
11	Limpieza herramientas manuales	28/03/2026
12	Recomendaciones (restricciones instalaciones y áreas del colegio)	30/03/2026
13	Orden y aseo	31/03/2026
14	Disposición correcta de residuos	01/04/2026
15	Recomendaciones trabajo en alturas	07/04/2026
16	Limpieza antes durante y despues	08/04/2026
17	Manipulación manual de cargas	09/04/2026
18	Orden y aseo	10/04/2026
19	Recomendaciones diarias	13/04/2026

Sede A – Pablo de Tarso

No	TEMA	FECHA
1	Trabajo en alturas	16/03/2026
2	Trabajo en caliente	18/03/2026
3	Uso epcc	28/03/2026
4	Caída objetos alturas	10/04/2026

En el Anexo 4 “Charlas de Seguridad” y el Anexo 5 “Pausas Activas” del Informe No. 6 presentado por el contratista, se evidencia la participación y asistencia del personal a las actividades programadas, conforme a lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Registro Fotográfico – Inducciones y Capacitaciones	
	

4. SEÑALIZACIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026, el Consorcio EDU 2025 adelantó la instalación de la señalización y demarcación correspondiente a las áreas de acopio de materiales, así como la señalización preventiva, de prohibición y de obligatoriedad en todos los frentes de obra. De igual manera, se ejecutó la demarcación de las rutas y puntos de evacuación como parte de la señalización de emergencia.

Asimismo, para este periodo, el contratista anexó la inspección de los equipos y maquinaria utilizados en la obra, evidenciando el cumplimiento de los controles establecidos en materia de SST. Esta información se encuentra en el Anexo 12. Registro Fotográfico





Señalización en Cerramiento Perimetral

4.1. Señalización y Demarcación de Maquinaria, Equipos, Herramientas y Vehículos

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026, el Consorcio EDU 2025 registró el ingreso de herramientas manuales, escaleras tipo tijera. Por lo tanto, el contratista anexa las inspecciones preoperacionales, las cuales se pueden evidenciar en el Anexo 09. del informe Mensual SST No 6 del contratista.

4.2. Señalización y Demarcación de Maquinaria

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026, el Consorcio EDU 2025 no cuenta con señalización de maquinaria, dado que durante el periodo evaluado no se registró el ingreso ni la operación de maquinaria en la obra, por lo cual dicha señalización no resulta necesaria.

4.3. Señalización Plan de Emergencia

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026, el Consorcio EDU 2025 ha implementado la señalización de acuerdo al plan de emergencia dentro del campamento de obra y áreas transitables de manera visible para su respectiva identificación, en la actualidad se cuenta con la señalización de los equipos de emergencias.

4.4. Señalización Prohibitiva, de obligación y salvamento y demarcación del frente de trabajo

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026, el Consorcio EDU 2025 realiza la demarcación de áreas de trabajo que están siendo intervenidas dentro del área de influencia directa, de igual manera se instala dentro y fuera de la obra la respectiva señalización prohibitiva y de obligación como se observa en el registro fotográfico.

Registro Fotográfico – Señalización





4.5. Señalización de las áreas destinadas para la movilidad.

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026, el Consorcio EDU 2025 realiza la instalación de señalización con cinta de peligro en aras de identificar las áreas de tránsito para el personal vinculado a obra y visitantes que ingresan a la misma; de igual manera, se encuentran demarcados y señalizados los senderos peatonales siendo estas áreas las que se encuentran al interior de obra destinadas para el paso seguro de todo personal vinculado al proyecto, como se observa en el registro fotográfico.

Registro Fotográfico – Señalización	
	

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Para este periodo, se pudo evidenciar que todo el personal, tanto de interventoría como del contratista hizo uso de los respectivos EPP en obra.

5.1. Registro Uso de los EPP

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026 se pudo evidenciar que el Consorcio EDU 2025 anexó el formato de entrega de EPP de los trabajadores operativos, al igual que el registro fotográfico donde se evidencia su uso adecuado en obra. Esta información se encuentra en el Anexo 2. Entrega de EPP y en el Anexo 14. Registro Fotográfico, informe mensual SST No 6 Contratista.

Registro Fotográfico – Entrega de EPP



6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

6.1. Panorama de Factor de Riesgos por proceso constructivo de acuerdo con la Matriz de Riesgos

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026 se pudo evidenciar que el Consorcio EDU 2025 anexa la matriz IPER Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en los procesos constructivos y riesgo identificados, donde se realizó la previa socialización de esta con el personal vinculado a obra a la fecha.

Procedimiento estándares de trabajo seguro por proceso constructivo.

El Consorcio EDU 2025 para este periodo del 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026 anexa el diligenciamiento de 3 análisis de trabajo seguro de las actividades que se realizaron en este periodo en la obra. Esta información se encuentra contenida en el Anexo 8. ATS, informe SST No 6 del contratista. Para la IED Luis López de Mesa se presentan 3 ATS.

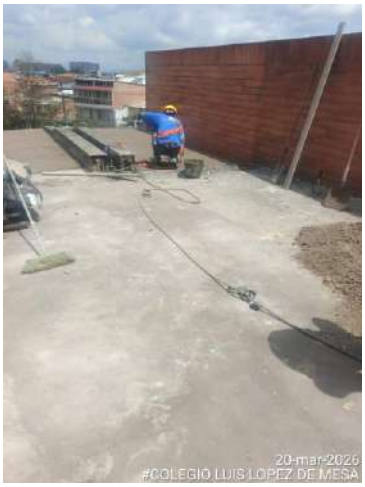Registro Fotográfico – Actividades – ATS	
	



6.2. Permisos de trabajo para labores de alto riesgo

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026 el Consorcio EDU 2025 Ingeniería realizó actividades de alto riesgo, por consiguiente, el contratista realizó el diligenciamiento de 1 permiso de trabajo en caliente y 5 permisos de trabajo en alturas . Esta información se encuentra en el Anexo 08. Permisos de trabajo del informe mensual SST No 6 del contratista.

Registro Fotográfico – Actividades de alto riesgo	
	

6.3. Inspecciones SST

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026, el Consorcio EDU 2025 Ingeniería realiza 11 inspecciones en obra en total, en aras de minimizar los posibles peligros y riesgos a los que pueden encontrarse expuestos el personal vinculado a obra de acuerdo con la actividad desempeñada. Esta información se encuentra en el Anexo 08. Inspecciones de obra del informe mensual No 6 del contratista.

- **Sede B - Villas Del Progreso**

No	Inspección realizada	No de inspección
1	Inspección Locativa	1

- **Sede B – El Porvenir**

No	Inspección realizada	No de inspección
1	Inspección Escalera Tipo Tijera	1
2	Lista de Chequeo Orden y Aseo	1

- . **Sede B – Darío Echandía**

No	Inspección realizada	No de inspección
1	Inspección Herramienta Manual	1
2	Lista de Chequeo Orden y Aseo	1

- . **Sede A – Luis López de Mesa**

No	Inspección realizada	No de inspección
1	Inspección Escalera Tipo Tijera	1
2	Inspección Elementos de protección personal	1
3	Inspección Locativa	1
4	Lista de Chequeo Orden y Aseo	1


- **Sede A – Pablo de Tarso**

No	Inspección realizada	No de inspección

1	Inspección Escalera Tipo Tijera	1
2	Inspección Locativa	1

Registro Fotográfico – Inspecciones de seguridad



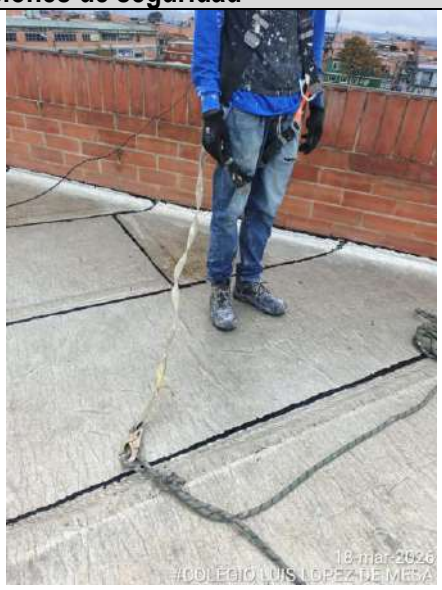

7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

7.1 Documentación de maquinaria, equipos y vehículos

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026, el Consorcio EDU 2025 no reportó el ingreso de maquinaria pesada ni de vehículos al frente de obra. Esta situación obedeció a que las actividades ejecutadas en dicho intervalo no requerían el uso de estos equipos, priorizando labores de reconocimiento, alistamiento y organización operativa por parte del contratista.

7.2. Programación de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026, el Consorcio EDU 2025, no se registraron actividades de mantenimiento preventivo ni correctivo asociadas a dichos equipos. La situación fue informada por el contratista como parte del reporte operativo del periodo.

7.3. Control Pre operacional de la maquinaria, equipos y vehículos

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026, el Consorcio EDU 2025, no se registraron actividades de preoperacionales asociadas a maquinaria, equipos y vehículos, debido que durante este periodo no se presentaron dichos ingresos.

8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

8.1. Pagos de Seguridad Social

Personal Interventoría

Uniobras SAS, para el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026 anexó el soporte de pago de la Seguridad Social correspondiente a los 29 profesionales (Ver Anexo 2. Planillas de SS) que conforman el equipo de interventoría. Dicho pago se encuentra registrado bajo la planilla N.° 9494765318, cumpliendo así con las obligaciones laborales y contractuales establecidas.

Personal Contratista

Consorcio EDU 2025

Nombres y Apellidos	Número de Planilla	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor	Cargo
Wilver Franciny Russy Ladino	75119549	AFP- Marzo Salud - Abril	13/04/2026	$ 5.885.600	Director de Obra
Karen Lisseth Salamanca Rojas	75917053	AFP- Marzo Salud - Abril	21/11/2025	$5.000.000	Residente HSEQ
Paula Mariana Moreno Páez	67647312	AFP- Febrero Salud - Marzo	19/01/2026	$ 2.831.832	Residente de Obra
Juan Esteban Forero Becerra	67646231	AFP- Febrero Salud - Marzo	19/03/2026	$ 3.468.300	Inspector de Obra
Luis Fernando Zabala Fúquene	73212715	AFP- Marzo Salud - Marzo	06/04/2026	$1.750.905	Inspector de Obra
Stefany Katerin González Orjuela	67647312	AFP- Febrero Salud - Marzo	19/02/2026	$ 2.600.000	Inspectora SST
Oscar Javier Velásquez Avendaño	75592789	AFP- Marzo Salud - Abril	20/04/2026	$2.600.000	Inspector SST
Livinton García Ramírez	75119549	AFP- Marzo Salud - Abril	13/04/2026	$1.750.905	Oficial de Obra

Cindy Patricia Olarte Minorta	75592789	AFP- Marzo Salud - Abril	20/04/2026	$ 1.405.838	Inspector SST

Personal Operativo

Nombres y Apellidos	Número de Planilla	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor	Cargo
Nicolas Stiven Rivera Tobón	73214304	AFP- Marzo Salud - Abril	16/04/2026	$1.750.905	Ayudante de Obra
Wilson Asprilla Salgado	73214304	AFP- Marzo Salud - Abril	16/04/2026	$1.750.905	Oficial de Obra
Manuel Eduardo Barjemo González	73214304	AFP- Marzo Salud - Abril	16/04/2026	$1.750.905	Ayudante de Obra
Esneyder Alexander Suarez Galeano	73214304	AFP- Marzo Salud - Abril	16/04/2026	$1.750.905	Ayudante de Obra
Remy Castro	73214304	AFP- Marzo Salud - Abril	16/04/2026	$1.750.905	Oficial de Obra
Cirilo Bermejo	73215152	AFP- Marzo Salud - Marzo	16/04/2026	$1.750.905	Maestro de Obra

9. EMERGENCIAS

9.1. Recursos Definidos en el Plan De Emergencias.

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026, el Consorcio EDU 2025 instala los equipos de emergencia, rutas de evacuación, punto de encuentro, cada frente de obra cuenta con la señalización de 1 botiquín tipo A, 1 camilla rígida, 1 extintor de 10 libras ABC de emergencia.



Plan de Emergencia

9.2. Conformación de las Brigadas de Emergencia

De acuerdo con el informe de Gestión SST entrega por el Consorcio EDU 2025, para este periodo del 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026, se evidencia que el contratista realiza las reuniones de las brigadas, cumpliendo los lineamientos de la lista de chequeo de la SED. se realiza actualización en el plan de emergencias donde se ubican los esquemas de las rutas de salida y punto de encuentro. Esta información se encuentra en el Anexo 11 del informe SST mensual No 6 del contratista.

9.3. Simulacros de Emergencia

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026, el Consorcio EDU 2025 no realiza simulacro se ejecutó simulacros de emergencia en los frentes de obra. Esta situación fue reportada en la información mensual del contratista, indicando que la actividad será programada para un periodo posterior conforme al plan de emergencias establecido.

10. BIENESTAR

10.1 Instalaciones Provisionales

Durante los recorridos realizados en las sedes asignadas al contratista Consorcio EDU 2025, se evidenció la presencia y adecuación de un campamento permanente de obra. Este espacio cuenta con las áreas básicas necesarias para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas, cumpliendo con las condiciones mínimas requeridas para el apoyo logístico y la gestión en campo.

10.2. Baterías de Baños

De acuerdo con lo evidenciado en los diferentes frentes de obra, durante este periodo el Consorcio EDU 2025 hizo uso de las baterías sanitarias fijas existentes en cada institución educativa, las cuales fueron asignadas exclusivamente para el personal del consorcio. Esta medida garantiza la disponibilidad de servicios sanitarios adecuados durante la ejecución de las actividades en obra.



USP

11. ORDEN Y ASEO

11.1. Registro de Orden y Aseo en los frentes de Obra

Se pudo evidenciar que el Consorcio EDU 2025 realiza jornadas de orden y aseo diarias en cada uno de los frentes de obra, como se evidencia en el registro fotográfico

	
Orden y Aseo	

12. DIVULGACIÓN

12.1. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Política en Seguridad y Salud en el Trabajo

Se evidenció que el Consorcio EDU 2025 para este periodo, realizó en obra las inducciones y notificación de riesgos de un trabajador que ingreso a trabajar en el periodo. De igual manera se evidencia la divulgación del reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en las Charlas realizas.

12.2. Actividades de Promoción y Prevención Establecidas en el SGSST

El Consorcio EDU 2025, para este periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026, realizó 38 charlas de 5 minutos y 1 capacitación mensual, con ello se cumple con el cronograma y programa de capacitaciones y charlas del SGSST.

13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El Consorcio EDU 2025, para este periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026, hace entrega de la reunión mensual de:

COPASST: El contratista anexa el acta de reunión del COPASST sobre investigación de accidentes e incidentes laborales, revisión de causas, medidas correctivas y preventivas.

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL): El contratista anexa el acta de reunión del CCL sobre Resolución de conflictos, herramientas de mediación y conciliación, procedimientos internos para resolver conflictos interpersonales y capacitación en manejo de conflictos

Esta información se encuentra en el Anexo 6 y Anexo 7 del informe mensual SST No 6 del contratista

14. INDICADORES SST

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026 no se presentan accidentes de obra, incidencia por enfermedad laboral y ausentismo por causa médica.

- **Índice de frecuencia de accidentes de trabajo**

$$IF\ AT = \frac{\text{No. de AT que se presentaron en el mes} * 100}{\text{No. de trabajadores en el mes}}$$

$$IF\ AT = 0\%$$

- **Índice de severidad de accidente de trabajo**

$$IS\ AT = \frac{\text{No. de días incapacidad por AT en el mes + No. de días cargados en el mes} * 100}{\text{No. de trabajadores en el mes}}$$

$$IS\ AT = 0\%$$

- **Proporción de letalidad de accidentes de trabajo**

$$\text{Letalidad AT} = \frac{\text{No. de AT mortales que se presentaron en el año} * 100}{\text{No. Total de AT que se presentaron en el año}}$$

$$\text{Letalidad AT} = 0\%$$

- **Indicador de prevalencia de enfermedad laboral**

$$\text{Enfermedad Laboral} = \frac{\text{No. Casos de enfermedad laboral} * 100000}{\text{Promedio de trabajadores en el año}}$$

Prevalencia EL = 0%

- **Ausentismo con causa médica**

$$\text{Ausentismo por causa médica} = \frac{\text{No. de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes} * 100}{\text{No. Días programados de trabajo en el mes}}$$

Ausentismo por causa médica = 0/0*100 = 0%

15. REPORTE Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD

15.1. Registro Estadístico, Caracterización e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, tanto del Personal como de Terceros.

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026, no se presentan accidentes laborales en la obra, por consiguiente, no se anexa reporte de la ARL e investigación de accidente laboral, con ello se cumple con los lineamientos de la lista de chequeo de la SED y el SGSST. (Ver Anexo 10 Certificado de accidentalidad emitido por la ARL del contratista)

15.2. Procedimiento de Reporte e Investigación de los Accidentes e Incidentes de Trabajo Incluido en el SGSST.

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026, no se presentan accidentes laborales en la obra, por consiguiente, no se anexa reporte a de la ARL e investigación de accidente laboral, con ello se cumple con los lineamientos de la lista de chequeo de la SED y el SGSST.

15.3. Planes de Acción derivados de las investigaciones de Accidentes e Incidentes

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026, no se presentan accidentes laborales en la obra, por consiguiente, no se anexa planes derivados de la investigación de accidente laboral, con ello se cumple con los lineamientos de la lista de chequeo de la SED y el SGSST.

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ En el periodo 14 de marzo de 2026 al 13 de abril de 2026esta interventoría realiza verificación a la documentación y registros presentados por el contratista de obra de acuerdo con las actividades a realizadas.
- ✓ Las actividades desarrolladas durante el periodo se ejecutaron dentro de condiciones controladas, manteniendo coherencia entre la planeación, la ejecución operativa y los lineamientos de seguridad definidos para el proyecto.
- ✓ Se recomienda al contratista dar continuidad al uso adecuado, permanente y obligatorio de los Elementos de Protección Personal y a la correcta dotación del personal en todos los frentes de obra activos, garantizando su utilización conforme a las actividades ejecutadas y a los riesgos asociados, con el fin de prevenir incidentes y accidentes de trabajo.
- ✓ El control permanente en campo y la verificación preventiva antes del inicio de actividades contribuyeron a la identificación temprana de condiciones o actos inseguros, permitiendo su corrección inmediata y reduciendo la probabilidad de materialización de riesgos.
- ✓ Durante el periodo reportado, tanto el contratista como la interventoría no registraron eventualidades asociadas a emergencias, ni la ocurrencia de accidentes de trabajo o incidentes, conforme a lo evidenciado en los indicadores de SST presentados. Lo anterior refleja el cumplimiento de las medidas preventivas implementadas en obra, así como la aplicación de los protocolos de seguridad establecidos, contribuyendo a la continuidad segura de las actividades y al control de los riesgos laborales durante el periodo evaluado.

17. ANEXOS SST

Anexo 1. Lista de Chequeo_14/03/2026 – 13/04/2026

Anexo 2. Planillas de Seguridad Social Interventoría marzo 2026- abril 2026

Anexo 3. Capacitación Mensual No 6_Interventoría.

ANEXOS SST

Barrancabermeja
Número de contacto: 3161147965
Correo electrónico: lote3uniobras@gmail.com

Proyecto:	Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de La Secretaría de Educación del Distrito, Así como la Ejecución de Obras Menores, que Permitan a Través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas".		
Contratista:	Consorcio EDU 25	**Interventoría:**	UNIOBRAS
Contrato:	CO1.PCCNTR.8154784 DE 2025	**Contrato:**	No. CO1.PCCNTR.8169111 DE 2025
Informe No.:	No 6- Marzo 2026 - Abril 2026	**Periodo:**	14 de Marzo 2026 al 13 de Abril del 2026

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN SST DE LA INTERVENTORÍA

INFORME SST

REQUERIMIENTO SST	ÍTEM	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS Y SOPORTES
1. GESTIÓN DOCUMENTAL	1.1.	La Interventoría presenta el informe mensual de gestión SST. Éste es entregado oportunamente a la Interventoría en la fecha acordada con la supervisión del proyecto.	100%				*Se realiza entrega del informe mensual SST No 6 de interventoría en los tiempos estipulados.*
	1.2.	La documentación del SGSST, tanto del Contratista como de la Interventoría, original y actualizada reposa en el campamento de obra.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista e interventoría*
	1.3.	El informe mensual de gestión SST de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión SST de la Interventoría".	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista e interventoría*
	1.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*
2. INGRESO DE PERSONAL	2.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra afiliado a una ARP, EPS Y AFP desde antes de su ingreso.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista e interventoría*
	2.2.	Se realiza el debido registro de ingreso del personal nuevo y se suministra la documentación obligatoria de cada trabajador. Se actualiza semana a semana el formato de control y seguimiento del personal que labora en la obra.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista e interventoría, donde se evidencian las planillas de SS del personal administrativo y operativo.*
	2.3.	Se efectúa examen médico de ingreso y egreso por cargo, de acuerdo con el protocolo de exámenes médicos ocupacionales, y su validez es verificada por el profesional encargado. Se mantiene actualizado el diagnóstico de condiciones de salud del personal.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista e interventoría*
	2.4.	Se cuenta con el paz y salvo de retiro de cada trabajador vinculado al proyecto. En el caso de las empresas subcontratadas, presentan certificación de paz y salvo, discriminando el personal que fue vinculado al proyecto.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	2.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*
3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES	3.1.	Se da cumplimiento y cobertura al cronograma de inducción, capacitación y entrenamiento, incluido en el SGSST.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	3.2.	Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se hace antes de iniciar las labores propias del cargo y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	3.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*
4. SEÑALIZACIÓN	4.1.	Se cumple con la señalización del campamento, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	4.2.	Se cumple con la señalización y demarcación de maquinaria, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.	100%				*Durante este periodo reportado el contratista no realiza demarcación de maquinaria debido a que no se presentó ingreso*
	4.3.	Se cumple con la señalización del plan de emergencia de acuerdo con lo establecido en el SGSST.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	4.4.	Se cumple con la señalización prohibitiva, de obligación y de salvamento y la demarcación para los frentes de obra incluida en el SGSST y aprobada por interventoría.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	4.5.	Las áreas destinadas para la movilidad, se encuentran libres de obstáculos de tal manera que no se impida o dificulte el paso o la circulación requerida.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	4.6.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	5.1.	Todo el personal cuenta con los Elementos de Protección Personal y hace uso permanente de los mismos al interior de la obra. Los EPP son los adecuados para la actividad y están normalizados. El Contratista garantiza el recambio oportuno y lleva un registro formal de entrega.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	5.2.	Todo el personal cuenta con el uniforme requerido debidamente contramarcado y con el documento de identificación personal visible dado por el empleador. Se hace uso permanente tanto del uniforme como del documento al interior de la obra.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	5.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*
	6.1.	El contratista mantiene actualizado el Panorama de Factores de Riesgo por cada proceso constructivo e interviene mensualmente los riesgos priorizados de acuerdo al diagnóstico inicial de la Matriz de Riesgos, cumpliendo los planes de acción derivados.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*

6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS	6.2.	El Contratista tiene documentados los procedimientos y estándares de trabajo seguro por cada proceso constructivo los socializa, actualiza y se ejecutan según lo establecido.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	6.3.	El contratista implementa los permisos de trabajo para las labores de alto riesgo y cumple los estándares de seguridad definidos en el SGSST.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	6.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					
7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	7.1.	Antes del ingreso de vehículos a la obra el Contratista cuenta con la siguiente documentación: revisión técnico mecánica, SOAT, y constancia del último mantenimiento efectuado. Para la maquinaria, cuenta con la constancia del último mantenimiento efectuado y un documento expedido por personal idóneo en el que certifica que se encuentra en óptimas condiciones, de acuerdo con los parámetros exigidos por el fabricante, para garantizar una operación adecuada y segura.			N/A		*Durante este periodo reportado el contratista no reporta ingreso de vehículos ni maquinaria a los frentes de obra.*
	7.2.	Se cumple con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.			N/A		Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaira, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización
	7.3.	Se realiza diariamente el control preoperacional a la maquinaria, equipos y vehículos, y se reportan las observaciones encontradas por escrito. El Contratista establece, ejecuta y controla las deficiencias encontradas, e informa a la Interventoría.			N/A		*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	7.4.	Se cumplen los horarios de trabajo establecidos de acuerdo a la actividad y tipo de maquinaria.			N/A		Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización
	7.5.	Toda la maquinaria de la obra cuenta con su horómetro en perfecto funcionamiento y se lleva un control diario de horas trabajadas para realizar el mantenimiento preventivo.			N/A		Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización
	7.6.	El Contratista informa a la Interventoría con mínimo dos horas de anticipación la entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos.			N/A		Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización
	7.7.	El Contratista implementa mecanismos de control que permitan establecer la idoneidad de los operadores de la maquinaria para desarrollar las actividades.			N/A		Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización
	7.8.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					
8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	8.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra al día en los pagos de Seguridad Social y se lleva registro semanal en el formato correspondiente.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	8.2.	El Contratista realiza seguimiento al estado de las afiliaciones de ARP, EPS y AFP de todo el personal que labora en la obra.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	8.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					
9. EMERGECIAS	9.1.	Se cuenta con todos los recursos definidos en el plan de emergencias y contingencias incluido en el SGSST.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	9.2.	Se han conformado las Brigadas de emergencia, están activas, entrenadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento según lo ofertado, se ejecuta y existen los soportes.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	9.3.	Se realizan simulacros de emergencias, se revisa su resultado, se establecen planes de acción y se cumplen las acciones derivadas y se cuenta con los soportes respectivos.	100%				*A la fecha de elaboración del presente informe, el contratista no ha ejecutado el simulacro de evacuación, toda vez que su realización se encuentra programada para una etapa posterior del desarrollo del contrato.*
	9.4.	Se tienen registradas y analizadas las emergencias ocurridas en la obra y se notifican a Interventoría en forma inmediata.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	9.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					
10. BIENESTAR	10.1.	Las instalaciones provisionales cuentan con vestieres, donde los espacios cumplen con lo establecido en la Resolución 2400/79 para el manejo de ropas, implementos personales y Elementos de Protección Personal.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	10.2.	Se posee un baño por cada 15 trabajadores y el baño recibe mantenimiento y limpieza periódica.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	10.3.	Se cuenta con un sistema de hidratación para el personal que labora en cada uno de los frentes de obra	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	10.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					

11. ORDEN Y ASEO	11.1.	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados, limpios y debidamente señalizado.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	11.2.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					
12. DIVULGACIÓN	12.1.	El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran publicados en un lugar visible de la obra, están socializados y se cuenta con los soportes respectivos.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	12.2.	Se realizan las actividades de promoción y prevención establecidas en el SGSST.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	12.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					
13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	13.1.	El COPASST cumple con el cronograma de reuniones mensuales y su plan de trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple con el plan de acción derivado del comité.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	13.2.	El Comité de Convivencia Laboral cumple con el cronograma de reuniones trimestrales y su plan de trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple con el plan de acción derivado del comité.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	13.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					
14. INDICADORES DE SST	14.1.	Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura, cumplimiento e impacto, de acuerdo con el SGSST. Se generan las acciones de mejoramiento y se mide su efectividad.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	14.2.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*
15. REPORTE Y ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD	15.1.	Se tiene registro estadístico, caracterización e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, tanto del personal como de terceros.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	15.2.	Se implementa el procedimiento de reporte e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo incluido en el SGSST. Se establece plan de acción, se mide la efectividad de éste y se realizan los ajustes necesarios.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	15.3.	Se cumplen los planes de acción derivados de las investigaciones de accidentes e incidentes. Se mide su efectividad y se realizan los ajustes necesario.	100%				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe SST No 6 Marzo 2026 - Abril 2026 del contratista*
	15.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*

NOTA: el informe mensual de gestión SST de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional SST de la Interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento SST y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

RADICACIÓN:

ELABORÓ: Katerin Nuñez Osorio

NOMBRE: Katerin Nuñez Osorio
CARGO: Profesional SST
EMPRESA: UNIOBRAS
FECHA: 17/04/2026

OFICIO DE RADICACIÓN _____

FECHA: *17/04/2026*

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 829000956	3	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ULOTE3	CR 03 50 20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3107799503	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	1941339942	9494765318	E	2026/04/15	2026/04/14	BANCOLOMBIA	0	$38,360,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1096242581	ACOSTA RAMIREZ YULEINY TATIANA																		230301	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
2	CC	79905278	ARANGO GUTIERREZ JOHN HARRY																		230301	30	$9,900,000	$1,683,000	EPS005	30	$9,900,000	$396,000	CCF24	30	$9,900,000	$396,000	14-11	30	$9,900,000	$689,100	30	$0	$0	Si	$3,164,100
3	CC	1018417359	BARRERA DONCEL CHRISTIAN FABIAN																		230301	30	$3,300,000	$528,000	EPS008	30	$3,300,000	$132,000	CCF24	30	$3,300,000	$132,000	14-11	30	$3,300,000	$229,700	30	$0	$0	Si	$1,021,700
4	CC	93376173	BERMUDEZ OTALORA FREDY ALBERTO																		25-14	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
5	CC	1095921445	BETANCUR DOMINGUEZ SILVIA JULIANA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
6	CC	1054567138	BROCHERO OSORIO JUAN SEBASTIAN																		230201	30	$2,750,000	$440,000	EPS002	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
7	CC	1090488111	CARDENAS LIZARAZO MARIA AUXILIADORA																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
8	CC	80471240	CARRERO MARCO ANTONIO																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
9	CC	1030613586	CASALLAS JUNCA JONATHAN WILMER																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
10	CC	1018487457	CURIEL ACOSTA ANYELI MARYED																		230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
11	CC	16505486	ELJURE VALENCIA DECIO																		25-14	30	$2,750,000	$440,000	EPS037	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
12	CC	1005483549	ESCOBAR MALDONADO LIZETH ALEJANDRA																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
13	CC	52712303	FORERO CASTRO CLAUDIA MARCELA																		25-14	30	$6,350,000	$1,016,000	EPS005	30	$6,350,000	$254,000	CCF24	30	$6,350,000	$254,000	14-11	30	$6,350,000	$442,000	30	$0	$0	Si	$1,966,000
14	CC	79258510	FRANCO GUZMAN ETELBERTO RIQUELME																		230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
15	CC	1052394844	HIGUERA ARAQUE KAREN LISETH																		25-14	30	$2,750,000	$440,000	EPS010	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
16	CC	1001200861	JIMENEZ TAMAYO LORENA		X																230301	6	$500,000	$80,000	EPS008	6	$500,000	$20,000	CCF24	6	$500,000	$20,000	14-11	6	$500,000	$34,800	6	$0	$0	Si	$154,800
17	CC	80164338	LOPEZ CASTRO EDISON JAIR																		25-14	30	$8,400,000	$1,428,000	EPS005	30	$8,400,000	$336,000	CCF24	30	$8,400,000	$336,000	14-11	30	$8,400,000	$584,700	30	$0	$0	Si	$2,684,700
18	CC	1233495366	MARIN CASTELLANOS MILLER ARLEY																		230301	30	$8,950,000	$1,521,600	EPS005	30	$8,950,000	$358,000	CCF24	30	$8,950,000	$358,000	14-11	30	$8,950,000	$623,000	30	$0	$0	Si	$2,860,600
19	CC	1012460713	MARTINEZ TOVAR JHONER ANDRES																		230301	30	$8,950,000	$1,521,600	EPS010	30	$8,950,000	$358,000	CCF24	30	$8,950,000	$358,000	14-11	30	$8,950,000	$623,000	30	$0	$0	Si	$2,860,600
20	CC	1065013090	MESTRA ROBAYO JAVIER ALEJANDRO																		230201	30	$8,950,000	$1,521,600	EPS005	30	$8,950,000	$358,000	CCF24	30	$8,950,000	$358,000	14-11	30	$8,950,000	$623,000	30	$0	$0	Si	$2,860,600
21	CC	1033722593	MOLINA SARMIENTO HUBER ALFONSO																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
22	CC	1022366202	MORA VILLAREAL VICTOR ALFONSO																		230301	30	$8,950,000	$1,521,600	EPS008	30	$8,950,000	$358,000	CCF24	30	$8,950,000	$358,000	14-11	30	$8,950,000	$623,000	30	$0	$0	Si	$2,860,600
23	CC	1073231766	MOYANO SEGURA LUIS FELIPE																		25-14	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
24	CC	7316778	NIVIA QUINTERO GERMAN ADOLFO																		230301	30	$3,600,000	$576,000	EPS005	30	$3,600,000	$144,000	CCF24	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	$250,600	30	$0	$0	Si	$1,114,600
25	CC	1054552084	NUÑEZ OSORIO KATERIN CAROLINA																		25-14	30	$3,600,000	$576,000	EPS037	30	$3,600,000	$144,000	CCF24	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	$250,600	30	$0	$0	Si	$1,114,600
26	CC	80199878	OLARTE ORTIZ DIEGO FERNANDO																		230301	30	$3,600,000	$576,000	EPS001	30	$3,600,000	$144,000	CCF24	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	$250,600	30	$0	$0	Si	$1,114,600
27	CC	88002563	RANGEL PAEZ PAUL ALBERTO																		230301	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
28	CC	1005683359	TEJADA FLOREZ DAYANA																		230301	30	$2,500,000	$400,000	ESSC07	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
29	CC	1000595990	TOVAR ORTIZ JHON ALEXANDER																		230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 829000956	3	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ULOTE3	CR 03 50 20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3107799503	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	1941339942	9494765318	E	2026/04/15	2026/04/14	BANCOLOMBIA	0	$38,360,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				30	$20,085,600	$0	$20,085,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$6,436,200	$0	$6,436,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$10,487,800	$0	$10,487,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$3,161,600	$0	$3,161,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$8,502,400	$0	$8,502,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	30	$8,502,400	$0	$8,502,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$4,886,100	$0	$4,886,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	30	$4,886,100	$0	$4,886,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				30	$4,886,100	$0	$4,886,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$144,000	$0	$144,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$610,000	$0	$610,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$568,000	$0	$568,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$200,000	$0	$200,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$100,000	$0	$100,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$354,000	$0	$354,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$110,000	$0	$110,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$2,800,100	$0	$2,800,100
TOTAL				**30**	**$38,360,200**	**$0**	**$38,360,200**

UNIOBRAS DEL ORIENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

NOMBRE DE LA CAPACITACION: Manejo de cargas, riesgo biomecánico e higiene postural.
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Katerin Nuñez
LUGAR: Interventoria (Meet)
FECHA: 8:00 am - 02/04/2026 **HORARIO:** 8:40 am

Nº	PARTICIPANTE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Koren Higuera	1053394844	Técnico SST	
2	Angeli Mayed Cunel	1018487457	Inspector	Angeli Cuni ell
3	Etelberto Franco	19258510	Inspector	Etelberto Franco
4	Claudia Marcela Forero	88002563	Apoy. Interventl.	
5	Tatiana Acosta	1096242581	Técnico SST	Tatiana Acosta
6	Paul Rangel Páez	52712303	Técnico SST	
7	María Cardenas	1090488111	Inspector	Mario C.
8	Luis Felipe Moyano	1073231769	Inspector	Luis. F. Moyano
9	Jair López.	8104336?	Espe. Ambiental	
10	Angie Paola Toro	1128627947	Inspectora	
11				
12				

FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN:
CARGO: Residente SST

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2022

Yo, **MARIAM LUZ GUTIERREZ CORREA**, identificada con **CEDULA DE CIUDADANÍA 46.644.261**, en mi condición de Representante Legal de **UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS** identificada con **NIT 829000956-3,** certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiera lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual, de acuerdo a la oferta en el proceso de licitación SED-CM-ADCCEE-018-2025.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Barrancabermeja, a los 06 días del mes de abril del 2026.

Atentamente,

miriam gutierrez

UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS
MARIAM LUZ GUTIERREZ CORREA
CC 46.644.261
Representante Legal Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8169111
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154784

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3

UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S

INFORME MENSUAL No. 06

Periodo del informe: 14 de marzo al 13 de abril de 2026

Elaboró	Aprobó
Edison Jair López Castro	**Arq. Harry Arango Gutiérrez**
Profesional Ambiental	Director de interventoría
	

Barrancabermeja
Número de contacto: 3161147965
Correo electrónico: lote3uniobras@gmail.com

Contenido

1. Introducción 3

2. Objetivos 4

2.1. Objetivo general 4

2.2. Objetivos específicos 4

3. Localización 5

- Institución Educativa Distrital El Porvenir – Sede B 5
- Institución Educativa Distrital Luis López de Mesa– Sede A 5
- Institución Educativa Distrital Villas del Progreso 6
- Institución Educativa Distrital Pablo de Tarso – Sede A 7
- Institución Educativa Distrital Jairo Aníbal Niño – Sede A 7
- Institución Educativa Distrital Darío Echandía – Sede B 8
- Institución Educativa Distrital Alfonso López Michelsen – Sede A 8
- Institución Educativa Distrital Eduardo Umaña Luna– Sede A 9

4. Estado contractual y de gestión 9

5. Personal Interventoría 10

6. Resumen de obras en fase de ejecución 12

7. Actividades de gestión ambiental realizadas por la interventoría 13

8. Actividades de gestión ambiental realizadas por el contratista 15

9. Permisos y tramites ambientales 22

10. Conclusiones y recomendaciones 25

11. Anexos 25

1. Introducción

En cumplimiento del contrato de interventoría **No CO1. PCCNTR. 8169111 DE 2025**, UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS, presenta a la Secretaría de Educación Distrital – SED – el Informe Mensual Ambiental No 6 correspondiente al **Lote 7** para el periodo 14 de marzo al 13 de abril del 2026, en desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR. 8154784 de 2025, suscrito entre la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO –SED- y el CONSORCIO EDU25, cuyo objeto es ***"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS SEDES ADMINISTRATIVAS".***

En el presente documento se relacionan los requisitos cumplidos por parte del contratista y objeto de seguimiento por parte de interventoría para el este periodo frente al componente ambiental. De igual manera se hace una verificación sobre lo estipulado en el PMA correspondiente ya que allí se consigna todas las medidas e indicadores que se deben aplicar en esta fase del contrato.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Presentar información clara y detallada, que permita tener una visión integral de cada una de las actividades que se desarrollaron para dar cumplimiento a la Gestión Ambiental, durante el desarrollo del contrato CO1.PCCNTR. 8154784 de 2025.

2.2. Objetivos específicos

- Presentar de manera descriptiva el avance en cada una de las actividades de la gestión ambiental realizadas durante el período comprendido del 14 de marzo al 13 de abril de 2026.
- Verificar el reporte de avance mensual de la gestión ambiental presentada por el Contratista.
- Verificar el cumplimiento del proyecto en el componente ambiental, entregando el análisis de los aspectos más relevantes del periodo
- Presentar las acciones, recomendaciones y conclusiones de la Interventoría de acuerdo a la gestión ambiental del periodo.

3. Localización

- Institución Educativa Distrital El Porvenir – Sede B

La IED El Porvenir – Sede B – El Recuerdo se encuentra ubicada en la localidad de Bosa en la dirección CL 58 SUR # 104 A - 50 en el Suroccidente de la ciudad.



Imagen 1 – IED El Porvenir – Sede B, Fuente Google Earth

- Institución Educativa Distrital Luis López de Mesa– Sede A

La IED Luis López de Mesa – Sede A –se encuentra ubicada en la localidad de Bosa en la dirección CL 65 H SUR # 78 A - 03 en el Suroccidente de la ciudad



Imagen 2 – IED Luis López de Mesa – Sede A, Fuente Google Earth

○ Institución Educativa Distrital Villas del Progreso

La IED Villas del Progreso –El Porvenir VII Etapa Enrique Dussel Sede B se encuentra ubicada en la localidad de Bosa en la dirección CALLE 55 Sur No 103-96 en el Suroccidente de la ciudad.



Imagen 3 – IED Villas del Progreso, Fuente Google Earth

- Institución Educativa Distrital Pablo de Tarso – Sede A

La IED Pablo de Tarso – Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Bosa en la dirección CL 66 SUR # 78 J – 02 en el Suroccidente de la ciudad



Imagen 4 – IED Pablo de Tarso – Sede A, Fuente Google Earth

- Institución Educativa Distrital Jairo Aníbal Niño – Sede A

La IED Jairo Aníbal Niño – Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy en la dirección KR 87 H BIS # 39 A - 23 SUR en el Suroccidente de la ciudad



Imagen 5 – IED Jairo Aníbal Niño – Sede A, Fuente Google Earth

- Institución Educativa Distrital Darío Echandía – Sede B

La IED Darío Echandía – Sede B – Los Patios se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy en la dirección KR 88 F BIS # 2 – 09 en el Suroccidente de la ciudad.



Imagen 6 – IED Darío Echandía – Sede B, Fuente Google Earth

- Institución Educativa Distrital Alfonso López Michelsen – Sede A

La IED Alfonso López Michelsen – Sede A – Portal del Sol se encuentra ubicada en la localidad de Bosa en la dirección KR 98 B # 74 - 68 SUR en el Suroccidente de la ciudad.



Imagen 7 – IED Alfonso López Michelsen – Sede A, Fuente Google Earth

- Institución Educativa Distrital Eduardo Umaña Luna– Sede A

La IED Eduardo Umaña Luna – Sede A –Dindalito se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy en la dirección KR 93 A # 42 A - 37 SUR en el Suroccidente de la ciudad.

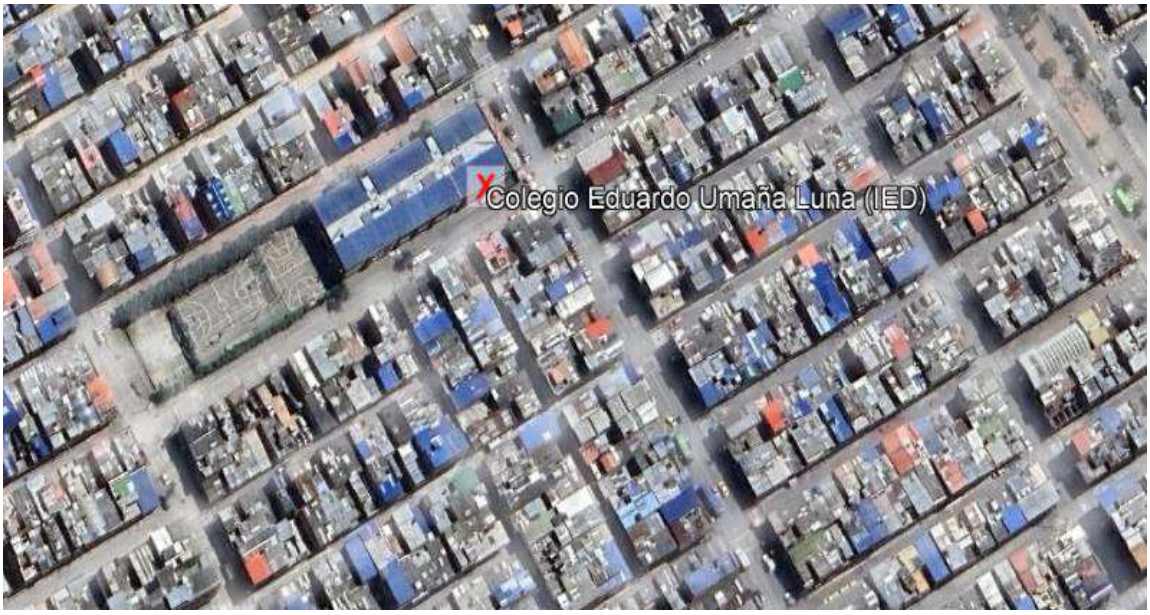


Imagen 8 – IED Eduardo Umaña Luna – Sede A, Fuente Google Earth

4. Estado contractual y de gestión

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.8154784 del 2025
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA

	FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
VALOR INICIAL	$2.451.846.958
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Andrés Ivanno Galeano
FECHA DE INICIACIÓN:	14/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	13/05/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A

5. Personal Interventoría

Durante el periodo de ejecución, la interventoría dio continuidad al cumplimiento de la planta administrativa de los profesionales que se establecen en los estudios previos, en el sitio de los trabajos se cuenta con el personal requerido y se cuenta con un grupo de Especialistas a disposición.

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	John Harry Arango Gutiérrez	Director de Interventoría	100%
2	Claudia Marcela Forero	Profesional de apoyo	100%
3	Jhoner Andrés Martínez	Residente 1	100%

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
4	Víctor Alfonso Mora	Residente 2	100%
5	Miller Arley Marín Castellanos	Residente 3	100%
6	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%
7	Edison Jair López Castro	Especialista. Ambiental	60%
8	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%
9	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%
10	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%
11	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%
12	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%
13	Yuleiny Tatiana Acosta Ramírez	Técnico SST 1	100%
14	Juan Sebastián Brochero Osorio	Técnico SST 2	100%
15	Luis Felipe Moyano Segura	Técnico SST 3	100%
16	Paul Alberto Rangel Páez	Técnico SST 4	100%
17	Decio Eljure Valencia	Técnico SST 5	100%
18	Karen Liseth Higuera Araque	Técnico SST 6	100%
19	Marco Antonio Carrero	Inspector Interventoría 1	100%
20	María Auxiliadora Cárdenas Lizarazo	Inspector Interventoría 2	100%
21	Jonathan Wilmer Casallas Junca	Inspector Interventoría 3	100%

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
22	Anyeli Mayed Curiel Acosta	Inspector Interventoría 4	100%
23	Etelberto Riquelme	Inspector Interventoría 5	100%

6. Resumen de obras en fase de ejecución

Durante el periodo comprendido entre 14 de marzo y 13 de abril se realizan las siguientes actividades:

IED Villas del progreso – Sede B

- Aplicación de pintura
- Instalación de interruptores
- Cambio de luminaria

IED El Porvenir – Sede B

- Aplicación de pintura
- Instalación de interruptores
- Cambio de luminaria

IED Luis López de mesa - Sede A

- Pendientado para Terraza Media Caña
- Instalación de Manto Asfaltico
- Instalación de Enchape
- Instalación de media caña

IED Dario Echandía – Sede B

- Instalación de Luminarias
- Aplicación de Pintura en Esmalte sobre Muros
- Instalación de tomas

IED Alfonso López Michelsen – Sede A

- Desmonte de Piso
- Limpieza de Caja
- Aplicación de pintura
- Instalación de alistado de piso
- Sondeo de tuberías
- Instalación de tableta de gres

IED Jairo Aníbal Niño – Sede A

- Destronque de Piso
- Instalación de Mediacaña

IED Eduardo Umaña Luna – Sede A

- Desmonte e instalación de aparatos sanitarios
- Instalación de Mediacaña
- Instalación de piso
- Enchape de muros

IED Jairo Aníbal Niño – Sede A

- Destronque de Piso
- Instalación de Mediacaña

IED Pablo de Tarso

- Instalación de estructura
- Instalación de tapas Drywall
- Aplicación de pintura

7. Actividades de gestión ambiental realizadas por la interventoría

- Reconocimiento de documentación general del proyecto, tales como:

  ✔ Contrato de Obra

  ✔ Apéndice Ambiental

  ✔ Anexo técnico

- ✔ Plan Institucional de Gestión ambiental (PIGA) de la SDE
- ✔ Guía para la elaboración del programa de RCD de la SDA

- Revisión del presupuesto
- Inspección de las actividades ejecutadas en los frentes de obra
- Reporte de imprevistos o novedades

INDICADORES AMBIENTALES

- **Programa de capacitación**

Personal capacitado = Se realizo dos capacitaciones a 7 asistentes y 11 asistentes, respectivamente, como anexo se presenta las planillas de capacitaciones

$$\frac{N°\ de\ personas\ capacitadas}{Total\ personal}\ x100$$

$$\frac{7}{24}\ x\ 100 = 29{,}16\%$$

$$\frac{11}{24}\ x\ 100 = 45{,}83\%$$

Cumplimiento de temáticas planificadas = Se realizo dos capacitaciones respecto al manejo de materiales de construcción y actualización de requisitos legales ambientales, el día 19 de marzo y 08 de abril, respectivamente.

$$\frac{N°\ de\ \ capacitaciones\ realizadas}{N°\ de\ capacitaciones\ programadas}\ x100$$

$$\frac{2}{2}\ \text{x 100 = 100\%}$$

- **Programa de reciclaje**

Residuos aprovechados = Se reutilizo el papel que se utilizó para la impresión a doble cara en otros formatos, por lo que se estaría aprovechando el material al igual se comparte la ficha técnica del papel como anexo

$$\frac{Peso\ residuos\ aprovechados}{Peso\ total\ residuos\ generados}\ x100$$

$$\frac{\mathbf{0,18\ kg}}{\mathbf{0,18\ kg}} \boldsymbol{x100} = \mathbf{100\%}$$

- **Programa de movilidad sostenible**

Número de desplazamientos optimizados: Se ha optimizado las visitas por medio de movilidad sostenible como lo es en bicicleta o caminata entre puntos cercanos, al igual que se ha realizado visitas de manera grupal.

Reuniones virtuales: Se ha optimizado por reuniones virtuales en este periodo, en temas que no requieren la visita técnica en campo, por lo que presenta porcentaje igual a 37,5 %

$$\frac{\boldsymbol{Reuniones\ virtuales}}{\boldsymbol{Total\ de\ reuniones\ al\ mes}}\ \boldsymbol{x100}$$

$$\frac{\mathbf{9}}{\mathbf{24}} \boldsymbol{x100} = \mathbf{37,5\%}$$

8. Actividades de gestión ambiental realizadas por el contratista

- Se dio Apertura del PIN Ambiental con el numero 27913 ante la secretaria Distrital de Ambiente (SDA)
- Reconocimiento de documentación general del proyecto, tales como:

✔ Contrato de Obra

✔ Apéndice Ambiental

✔ Anexo técnico

✔ Plan Institucional de Gestión ambiental (PIGA) de la SDE

✔ Guía para la elaboración del programa de RCD de la SDA y normatividad vigente nacional

Cuadro de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales del contratista

ITEM	CUMPLE	NOTA
Cargue reporte mensual RCD	No	No se ha realizado el cargue del PIN Ambiental por falta de algunos certificados del mes de marzo
Anexos RCD (I, III, V y VI del decreto 507 de 2023)	SI	Se le solicito al contratista estos documentos para realizar el seguimiento al cargue del pin ambiental
Meta de aprovechamiento	SI	Durante este periodo la meta de aprovechamiento es del 0%, ya que no se dispuso RCD a una planta de aprovechamiento
Meta de circularidad	No	El contratista no ha realizado compra de material de centros de aprovechamiento
Protocolo manejo de asbesto	SI	Se evidencia información anexo al informe del contratista
Inventario de sumideros	NA	No se evidencian sumideros en las instituciones educativas

8.1. GESTIÓN DOCUMENTAL

Durante el periodo, se dio aprobación al informe ambiental del contratista, al igual que ya se encuentran aprobados el Plan de Manejo Ambiental (PMA) mediante oficio UNIOBRAS-LOTE3-071 y el plan de gestión de residuos de construcción y demolición (PGRCD) mediante oficio UNIOBRAS-LOTE3-072 el día 28 de noviembre que presento el contratista.

8.2. PROGRAMA DE CAMPAMENTOS

El espacio destinado para el campamento ira cambiando de acuerdo con el orden de las intervenciones y el contratista de obra.

8.3. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo al 13 de abril de 2026, el contratista reporto que ingreso material e insumos a los frentes de obra, por lo cual se anexa a este informe la información presentada por el contratista.





Meta de circularidad:

$$\frac{\boldsymbol{Cantidad\ de\ material\ valorizado\ usado\ en\ obra}}{\boldsymbol{Cantidad\ de\ material\ petreo\ a\ usar\ en\ obra}}\ \boldsymbol{x100}$$

$$\frac{\boldsymbol{0\ m3}}{\boldsymbol{0\ m3}}\ \boldsymbol{x100 = 0\%}$$

Durante este periodo la meta de circularidad es del 0%, ya que no ha realizado compra en centros de aprovechamiento

8.4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES

Los frentes de obra cuentan con puntos ecológicos para realizar la separación en la fuente de los residuos convencionales generados durante este periodo, las empresas de aseo de Bogotá serán las encargadas de realizar la recolección de estos residuos, tres veces por semana, dependiendo del sector en donde se ubique el colegio.

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo al 13 de abril de 2026, no se han generado residuos que no sean RCD, además se presenta anexo al informe del contratista el formato de cambio de cubiertas reportado por el contratista.

8.5. MANEJO DE RCD

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo al 13 de abril de 2026, el CONSORCIO EDU 25 realizó la disposición del material RCD, pero no se ha presentado los vales y/o certificados correspondientes

PERIODO	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	CANTIDAD (m3)
MAR-ABR	-	-
	Total	-



Meta de aprovechamiento:

$$\frac{\textbf{\textit{Cantidad de RCD reutilizado}}}{\textbf{\textit{Cantidad de RCD generado en el periodo}}}\ \boldsymbol{x100}$$

$$\frac{\mathbf{0}\ \boldsymbol{m3}}{\mathbf{0}\ \boldsymbol{m3}}\ \boldsymbol{x100} = \mathbf{0}\%$$

Durante este periodo la meta de aprovechamiento es del 0%, ya que no se realizó disposición de RCD. Al igual se reporta que se está cumpliendo con la meta en el contrato.

Consolidado RCD

Mes	Aprovechable (Ton)	No Aprovechable (Ton)
Diciembre	8,96	0
Enero	61,44	0
Febrero	0	0
Marzo	0	2,2





8.6 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo al 13 de abril de 2026 no se generó ni ingreso residuos peligrosos y/o especiales a los frentes de obra.

8.7. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo al 13 de abril de 2026 se reportan sustancias químicas dentro de los frentes de obra que cuentan con las fichas de seguridad y procedimiento de uso adecuadas. En el informe del contratista anexa todas las sustancias utilizadas en el periodo.





8.8. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo al 13 de abril de 2026, el Consorcio EDU 25 hizo uso de las baterías sanitarias fijas existentes en cada institución educativa, las cuales fueron asignadas exclusivamente para el personal del consorcio. Esta medida garantiza la disponibilidad de servicios sanitarios adecuados durante la ejecución de las actividades en obra, el contratista presenta los soportes de limpieza de los baños.





8.9 MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo al 13 de abril de 2026 se reporta el cerramiento perimetral adecuado, asimismo se reporta que no ingreso maquinaria ni vehículos, al igual deben contar con la documentación al día, realizar actividades como limpieza, mantenimiento teniendo en cuenta las medidas de manejo ambiental adecuadas.





8.10 MANEJO DE FAUNA, FLORA Y PAISAJE

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo al 13 de abril de 2026 no se evidencian zonas verdes ni individuos arbóreos cercanos a los frentes. Como anexo se presenta la certificación de no intervención de zonas verdes

8.11 MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

Durante el periodo comprendido entre el 14 de febrero al 13 de marzo de 2026, el contrato no requiere tramite de valla de obra ni publicidad exterior visual en los frentes de obra

8.12. CAPACITACIONES AMBIENTALES

Durante el periodo comprendido entre el 14 de febrero al 13 de marzo de 2026, el contratista reporta una (1) capacitación ambiental sobre las energías renovables a 8 asistentes, se presenta anexo a este informe la evaluación realizada en la capacitación presentada por el contratista.

8.13. ORDEN Y ASEO

Durante el periodo comprendido entre el 14 de febrero al 13 de marzo de 2026, los frentes de obra se encuentran debidamente demarcados y señalizados. Al igual el contratista en cada frente ha garantizado semanalmente jornadas de orden y aseo.





8.14. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL, INTERVENTORIA Y SED

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo al 13 de abril de 2026 no se realizaron visitas ni requerimientos por la Autoridad Ambiental.

9. Correspondencia

A continuación, se resume la correspondencia enviada y recibida durante el periodo.

FECHA DE ENVIO	OFICIO	ENVIADA A	TIPO	OBJETIVO
18/03/2026	UNIOBRAS-LOTE3-346	Consorcio EDU2025	Ambiental	Reiteración de requerimiento de proyección para cumplimiento de meta de

				aprovechamiento y circularidad de RCD
18/03/2026	UNIOBRAS-LOTE3-350	Consorcio EDU2025	Ambiental	Solicitud informes mensuales N°5 de los componentes ambiental y SST
06/03/2026	UNIOBRAS-LOTE3-356	Consorcio EDU2025	Ambiental	Solicitud manejo y disposición RCD
24/03/2026	UNIOBRAS-LOTE3-357	Consorcio EDU2025	Ambiental	Observaciones informe ambiental mensual N°5
25/03/2026	UNIOBRAS-LOTE3-376	Consorcio EDU2025	Ambiental	Segunda reiteración de requerimiento de proyección para cumplimiento de meta de aprovechamiento y circularidad de RCD
26/03/2026	UNIOBRAS-LOTE3-381	SED	Ambiental	Entrega de documentos – Componente ambiental
27/03/2026	UNIOBRAS-LOTE3-390	Consorcio EDU2025	Ambiental	Reiteración observaciones informe ambiental mensual N°5
06/04/2026	UNIOBRAS-LOTE3-393	Consorcio EDU2025	Ambiental	Tercera reiteración de requerimiento de proyección para cumplimiento de

				meta de aprovechamiento y circularidad de RCD
08/04/2026	UNIOBRAS-LOTE3-407	Consorcio EDU2025	Ambiental	Segunda reiteración observaciones informe ambiental mensual N°5
13/04/2026	UNIOBRAS-LOTE3-415	Consorcio EDU2025	Ambiental	Aprobación informe ambiental mensual N°5

Como respuesta a los comunicados anteriormente evidenciados, se presentan los siguientes reportes de correspondencia recibida.

FECHA DE ENVIO	OFICIO	ENVIADA POR	TIPO	OBJETIVO
20/03/2026	0158-012SED-25	Consorcio EDU2025	Ambiental	Informe mensual ambiental N°5
09/04/2026	0166-012SED-25	Consorcio EDU2025	Ambiental	Respuesta OFICIO UNIOBRAS-LOTE3-357 - Subsanación informe ambiental

10. Permisos y tramites ambientales

Concesión de aguas: No se requiere porque el agua será suministrada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá o por un tercero, lo cual se verificará en su momento.

Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (PGRCD): Se está en la elaboración del documento, dentro del cual se especificarán los materiales, estimaciones de las cantidades, estimación de costos del manejo de RCD e indicadores y demás información conforme a la Guía para la Elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición -RCD establecido por la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA).

Permiso de valla fija: De conformidad con los documentos contractuales, no se requiere la instalación de la valla ni tramito ante autoridad ambiental.

Permiso de ocupación de cauce: No se requiere porque no se realizará ninguna intervención que requiera un permiso de ocupación de cauce.

11. Conclusiones y recomendaciones

- El contratista ha realizado las actividades bajo las especificaciones técnicas – ambientales del plan de gestión de residuos de construcción y demolición (PGRCD) Y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) actividades y/o programas que garanticen el uso adecuado de manejo de residuos, control de emisiones de polvo y ruido, protección de fuentes hídricas, manejo responsable de materiales peligrosos y conservación de las áreas intervenidas, implementando capacitaciones y inspecciones periódicas que permita prevenir impactos dentro del proyecto

- Se recomienda al contratista reportar los materiales que ingresan de centro de aprovechamiento y la disposición de los RCD al igual que presentar los anexos del decreto 507 de 2023 para mantener actualizada la información respecto al cargue mensual al PIN Ambiental

- Se recomienda fortalecer la gestión integral de residuos, realizando la separación en la fuente, almacenamiento temporal adecuado, transporte con gestor autorizado y los soportes de disposición final y/o aprovechamiento

- Se han realizado medidas preventivas para minimizar los impactos ambientales y sociales en las instituciones, especialmente en el control de ruido, manejo de polvo, señalización en áreas intervenidas y seguridad en zonas de tránsito para el personal externo como interno.

- El informe No. 5 a la fecha del presente informe ha sido remitido por el contratista y se remitió observaciones

12. Anexos

- Lista de chequeo Interventoría Lote 7
- Cronograma de Capacitaciones
- Planilla de capacitación Uniobras del oriente S.A.S
- Ficha técnica Papel
- Capacitación Consorcio Edu 2025
- Oficio UNIOBRAS-LOTE3-346 Reiteración de requerimiento de proyección para cumplimiento de meta de aprovechamiento y circularidad de RCD
- Oficio UNIOBRAS-LOTE3-350 Solicitud informes mensuales N°5 de los componentes ambiental y SST
- Oficio UNIOBRAS-LOTE3-356 Solicitud manejo y disposición RCD
- Oficio UNIOBRAS-LOTE3-357 Observaciones informe ambiental mensual N°5
- Oficio UNIOBRAS-LOTE3-376 Segunda reiteración de requerimiento de proyección para cumplimiento de meta de aprovechamiento y circularidad de RCD
- Oficio UNIOBRAS-LOTE3-381 Entrega de documentos – Componente ambiental
- Oficio UNIOBRAS-LOTE3-390 Reiteración observaciones informe ambiental mensual N°5
- Oficio UNIOBRAS-LOTE3-393 Tercera reiteración de requerimiento de proyección para cumplimiento de meta de aprovechamiento y circularidad de RCD
- Oficio UNIOBRAS-LOTE3-407 Segunda reiteración observaciones informe ambiental mensual N°5
- Oficio UNIOBRAS-LOTE3-415 Aprobación informe ambiental mensual N°5
- Certificación No intervención en zonas verdes

Proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.						
Contratista:	CONSORCIO EDU 2025		**Interventoría:**		UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S		
Contrato:	CO1.PCCNTR.8154784		**Contrato:**		CO1.PCCNTR.8169111		
Informe No.:	6		**Periodo:**		14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL		
FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA							
INFORME AMBIENTAL							
REQUERIMIENTO AMBIENTAL	**ÍTEM**	**PARÁMETRO A EVALUAR**	**CUMPLE 100%**	**NO CUMPLE 0%**	**N/A**	**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS Y SOPORTES**
1. GESTIÓN DOCUMENTAL	1.1.	Se aprueba el informe mensual de gestión ambiental del Contratista, atendiendo los lineamientos dados por la SED y dentro del plazo acordado con el supervisor del proyecto.	X			El contratista presenta el informe N°6 pero se envian observaciones	*Aprobación de la interventoría del informe mensual de gestión ambiental del contratista de obra*
	1.2.	La documentación ambiental original y actualizada del proyecto reposa en el campamento de obra.	X			Se encuentra documentacion actualizada en el campamento de obra	*Lista de chequeo de la documentación encontrada en el campamento de la obra*
	1.3.	Se hace un adecuado y efectivo seguimiento y cumplimiento a los permisos y licencias (otorgadas o en tramite) requeridos para el proyecto.			X	No se han requerido permisos y licencias ambientales para el contrato	*Lista de chequeo de cada una de las obligaciones y disposiciones de los actos administrativos emitidos para el proyecto y relación de la respectiva evidencia aceptada por la Interventoría*
	1.4.	El informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión ambiental de la Interventoría"	X			Se presenta informe mensual de gestion ambiental bajo estructura y lineamientos de la SED	*El informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a la presente Lista de Chequeo*
	1.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
2. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS	2.1.	Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra, se encuentran protegidos y demarcados de acuerdo con lo establecido en el PMA.	X			Los materiales de construccion se encuentran acopiados y protegidos en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	2.2.	La mezcla de concreto se hace en una batea metálica y/o sobre plástico y no se contamina el suelo.	X			La mezcla de concreto se hace generalmente en una batea metalica para no contaminar el suelo	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	2.3.	La madera utilizada fue aprobada por la Interventoría y cuenta con certificación de registro en el libro de operaciones.			X	No se ha utilizado madera en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	2.4.	Las zonas verdes se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción, escombros o de residuos generados por los tratamientos a la vegetación.	X			La Zona verde se encuentra libre de materiales o residuos	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	2.5.	Se utilizan materiales provenientes únicamente de proveedores que cuentan con los permisos ambientales y mineros requeridos.	X			En el PMA presentado por el contratista se presenta los proveedores y antes de entrar, se aprueban por interventoria	*La interventoría verifica la legalidad de los proveedores utilizados*
	2.6.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
	3.1.	El campamento y zonas comunes cuentan con equipamiento adecuado y suficiente para la recolección y clasificación en la fuente de residuos sólidos convencionales generados, de acuerdo con lo establecido en el PMA.	X			Los frentes de obra cuentan con puntos ecologicos para la separacion y recoleccion de los residuos solidos convencionales	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*

3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES	3.2.	Los residuos sólidos convencionales se disponen adecuadamente con gestores autorizados.	X			En el PMA Y PGRCD presentado por el contratista se verifico los gestores para realizar la disposicion	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	3.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
4. MANEJO DE RCD	4.1.	El proyecto cuenta con PIN para el manejo del aplicativo web de la SDA, asignado por la SED. Los reportes mensuales de RCD están debidamente diligenciados a la fecha y se encuentra actualizado el aplicativo web de la SDA.		X		Se realiza la apertura del Pin Ambiental con numero 27913 y se tiene cargada informacion hasta el mes de enero, por lo que se le solicito al contratista cargar informacion	*Revisión y aprobación de la documentación cargada al aplicativo web de la SDA del PIN del proyecto*
	4.2.	Los RCD son acopiados y clasificados correctamente de acuerdo al PGRCD al interior de la obra.	X			En los frentes de obra se encuentran acopiados y clasificados los RCD	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	4.3.	Durante su permanencia en obra, los RCD son protegidos y demarcados de acuerdo al PMA.	X			En los frentes de obra se encuentran protegidos los RCD	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	4.4.	Se realiza reutilización temporal o permantente de los RCD generados en la obra, de acuerdo con lo exigido en la normatividad vigente.			X	No se han reutilzado los RCD generados en este periodo	*Información diligenciada y registro fotográfico reportado en el Anexo 3 del PIN.*
	4.5.	Los RCD que deben ser dispuestos con gestores autorizados son retirados dentro de las 24 horas siguientes a su generación en el frente de obra.			X	No se realizo disposicion durante el periodo	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	4.6.	Las volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con las disposiciones de la SDA, cuentan con PIN y no se excede la capacidad de la volqueta en volumen o peso ni el borde superior más bajo del platón.	X			Las volquetas cuentan con pin- trans de la SDA y se verifico que no excediera la capacidad de la volqueta	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría, acompañado del archivo CSV mensual de registro de viajes de volquetas del PIN cargado al aplicativo web de la SDA. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	4.7.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
5. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES	5.1.	Los residuos se clasifican y acopian en lugares seguros de acuerdo a lo establecido en el PMA.	X			Los residuos peligrosos fueron acopiados adecuadamente para posteriormente hacer la disposicion ante el gestor autorizado	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	5.2.	Los residuos se disponen en su totalidad con gestores autorizados por la SDA y se presenta la certificación correspondiente.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Las cantidades generadas y los certificados de disposición se incluyeron correctamente en el reporte mensual de RCD del PIN ambiental y están disponibles en el aplicativo web de la SDA*
	5.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
6. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	6.1.	Las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con prácticas seguras de manipulación, almacenamiento y transporte, con las hojas de seguridad en español y se cumplen las medidas incluidas en ellas.	X			Las sustantias quimicas que ingresaron estan inventariadas y cuentan con la ficha de seguridad correspondiente	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría, acompañado del seguimiento al inventario de sustancias químicas. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*

QUÍMICOS							
	6.2.	Se cuenta con un lugar de acopio seguro, correctamente señalizado y dotado con kit de derrames.		X		No cuentan con kit de derrames en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	6.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA	7.1.	Previo al inicio de actividades constructivas, se cuenta con un inventario de sumideros del área de influencia debidamente numerados y caracterizados de acuerdo el área de influencia indirecta del proyecto.			X	No aplica ya que no se cuenta con sumideros cerca a los frentes	*Garantizar que el documento permanezca en la obra y que el Contratista reporte su seguimiento en todos los informes mensuales*
	7.2.	Los sumideros definidos permanecen limpios, en mejores condiciones a las iniciales y cuentan con proteccion permanente.			X	No aplica ya que no se cuenta con sumideros cerca a los frentes	*Lista de chequeo y registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría del estado de cada uno de los sumideros inventariados. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	7.3.	Se garantiza el manejo adecuado de las aguas residuales domésticas generadas, evitando contaminar cuerpos de agua cercanos y descargas no autorizadas.	X			Se garantizo el manejo adecuado de las aguas residuales dometicas generadas	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría y verificación de la documentación presentada por el Contratista. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	7.4.	Se efectúa tratamiento al agua procedente de la actividad de corte de materiales y del sistema de limpieza de llantas de vehículos y maquinaria utilizados.	X			Se garantizo el tratamiento de agua	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	7.5.	No se realizan actividades de obra que afecten y/o alteren las condiciones de las fuentes hídricas y sus zonas de ronda.	X			No se realizan actividades de obra que alteren las coindiciones de las fuentes hidricas	*Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista, si aplica*
	7.6.	Los acopios de materiales pétreos y granulares se encuentran alejados de los sumideros y cuerpos de agua.	X			Los acopios de materiales estan alejados de sumideros y cuerpos de agua	*Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista, si aplica*
	7.7.	Los granulares finos se mantienen confinados para evitar acción de arrastre por lluvia.	X			Todos los materiales se encuentran acopiados adecuadamente	*Cuando aplique*
	7.8.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista, si aplica*
	8.1.	La obra cuenta con cerramiento en perfecto estado en todo el perímetro del proyecto y en las áreas puntuales que se requiera.	X			En todos los frentes de obra cuentan con cerramiento perimetral y puntual	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.2.	Se realiza la humectación de superficies desprovistas de acabados en los momentos requeridos.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.3.	Se realiza el cubrimiento adecuado de materiales granulares y RCD de forma permanente, para evitar su dispersión.	X			Se acopian adecuadamente los materiales y RCD en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*

8. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	8.4.	Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o adoquines, se tienen adecuados sistemas para evitar emisiones y ruido (casetas de corte).			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.5.	El Contratista limpia permanentemente las vías de acceso a los frentes de trabajo para evitar dispersión de material particulado.	X			Durante y despues del retiro de residuos se garantizo la limpieza de las vias de acceso para evitar la dispersion del material particulado	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.6.	Se cuenta con un sistema de limpieza de llantas para evitar el arrastre de material adherido a las mismas desde la zona del proyecto hacia las vías aledañas.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.7.	Los vehículos y maquinaria utilizados cuentan con la documentación obligatoria vigente que garantiza su buen funcionamiento, para evitar la emisión irregular de gases y material particulado.	X			Previo al ingreso de los vehiculos y maquinaria deben ser aprobados por interventoria	*Lista de chequeo de la documentación encontrada en el campamento de la obra*
	8.9.	Las volquetas que transportan materiales o RCD desde y hacía la obra cuentan con el cubrimiento total y adecuado de la carga.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.10.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
9. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y PAISAJE	9.1.	El Contratista cumple con la protección de los individuos vegetales (en el área de influencia del proyecto y relacionados en el inventario forestal).			X	No se encuentran individuos arboreos en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	9.2.	Se presenta y cumple la programación para la ejecución de los tratamientos a la vegetación aprobada por la Interventoría.			X	No se han presentado programacion para tratamientos de vegetacion	*Programación de tratamientos silviculturales*
	9.3.	Previo a la ejecución de los tratamientos se implementa y se cumple el procedimiento para el manejo de la Avifauna aprobado por la Interventoría.			X	No se han presentado programacion para tratamientos de vegetacion	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Formato de registro de avifauna*
	9.4.	El Contratista cumple con el procedimiento de tala incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	9.5.	El Contratista cumple con el procedimiento de bloqueo - traslado, incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Fichas de registro y seguimiento de árboles trasladado. Plano de localización georeferenciada*
	9.6.	El Contratista cumple con el procedimiento de empradización y manejo de zonas verdes incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Formato de registro de manejo de zonas verdes*
	9.7.	El Contratista cumple con la disposición de los residuos de tratamientos a la vegetación según lo aprobado por la Interventoría y presenta la certificación correspondiente.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Relación de volúmenes generados y dispuestos. Certificación de disposición final de residuos vegetales*
	9.8.	Se implementa en su totalidad el diseño paisajístico aprobado por la Interventoría y propuesto para el proyecto.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Consolidado de especies plantadas vs especies propuestas*

	9.9.	El Contratista actualiza y/o genera el código único de identificación del SIGAU de los individuos arbóreos objeto de tratamiento de las actividades de tala, bloqueo y traslado, aprobados en los Actos Administrativos emitidos por la SDA y para los individuos arbóreos resultantes de la implementación del Diseño Paisajístico, cuando se requiera el uso de zonas de espacio público.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Consolidado de especies plantadas vs especies propuesta. Actas de reunión con JBB para asignación de sitios de plantación y aprobación del diseño. Acta JBB asignación códigos SIGAU. Plano de localización georeferenciada de los árboles*
	9.10.	Se realiza el mantenimiento de los árboles trasladados de acuerdo con cronograma presentado en el PMA.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Fichas de seguimietno de árboles trasladados*
	9.11.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
10. MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	10.1.	El contratista radica en interventoría la documentación requerida para el trámite de valla de obra, 10 días depués de firmada el acta de inicio			X	No se requiere tramite de valla de obra para el contrato	*Radicado de la documentación en interventoría*
	10.2	Una vez recibido el registro de la valla por parte de la SDA, el contratista instala la valla dentro del plazo establecido en el mismo			X	No se requiere tramite de valla de obra para el contrato	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría.*
	10.3	El contratista realiza el pago por servicio de evaluación del aviso en fachada del colegio, y presenta la documentación para el trámite de registro, a la Interventoría 10 días después de finalizadas las fachadas donde será instalado			X	No se requiere para el contrato	*Radicado de la documentación en interventoría*
	10.4	El aviso en fachada se ajusta a los criterios establecidos en el Manual de Publicidad Exterior Visual de la SDA y a la normatividad vigente			X	No se requiere para el contrato	*Montaje del aviso*
	10.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
11. CAPACITACIONES AMBIENTALES	11.1.	El Contratista cumple con las actividades de capacitación programadas en el mes y lleva el control de asistencia del personal capacitado.	X			El contratista reporta una capacitación ambiental sobre las energías renovables a 8 asistentes	*Seguimiento de la ejecución de las capacitaciones programadas por el Contratista, acompañada de registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Lista de chequeo de asistentes vs el personal convocado por cada mes.*
	11.2.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
12. ORDEN Y ASEO	12.1.	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y se cumple con los progamas de manejo de los diferentes residuos según lo define el PMA.	X			Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	12.2.	El campamento de la obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado.	X			El campamento de obra se encuentra en debidas coindiciones	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	12.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
	13.1.	La Interventoría realiza seguimiento a la subsanación de las observaciones realizadas por la SED en su totalidad y de manera oportuna. Se reporta la gestión realizada en el informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría.	X			Se han cumplido con los requerimientos de la autoridad ambiental y la SED en este periodo	*Relación de observaciones realizadas por la SED y su correspondiente respuesta y subsanación, acompañada de la gestión realizada por la Interventoría.*

13. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y SED	13.2.	El Contratista, en cabeza del profesional ambiental, atiende las visitas de la autoridad ambiental y presenta, de manera oportuna, el informe de subsanación atendiendo todas observaciones realizadas. El informe de subsanación radicado en la SDA cuenta con la aprobación de la Interventoría.			X	No se han realizado visitas de la autoridad ambiental y la SED en este periodo	*Relación y respuesta a las visitas realizadas por la SDA. Se entrega toda la documentación relacionada y aprobada por la Interventoría.*
	13.3.	Se presenta toda la documentación relacionada con las visitas de la SDA al proyecto y los respectivos informes de subsanación en el informe mensual de gestión ambiental del Contratista.			X	No se han realizado visitas de la SDA en este periodo	*Lista de chequeo de la documentación encontrada en el campamento de la obra*
	13.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*

NOTA: el informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional ambiental de la Interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento ambiental y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

RADICACIÓN:

ELABORÓ: 

NOMBRE: Edson Jair Lopez
CARGO: Especialista ambiental
EMPRESA: Uniobras del oriente S.A.S
FECHA: 29 de abril

OFICIO DE RADICACIÓN SED: _____

FECHA:

PLAN/ PROGRAMA	ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	POBLACION OBJETO	ACCION	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7			
						SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
INDUCCION	1	Inducción al Personal nuevo: Generalidades del PAI componente B. Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8169111 (INT)	P					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					E					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
FORMACION, ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION INTERVENTORIA	2	Problemática ambiental/ dispocision y getion de residuos solidos	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8169111 (INT)	P						X																					
					E						X																					
	3	Programa de transporte sostenible	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8169111 (INT)	P									X																		
					E									X																		
	4	Manejo de cerramiento de los frentes	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8169111 (INT)	P													X														
					E													X														
	5	Posconsumo	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8169111 (INT)	P																	X										
					E																	X										
	6	Manejo de materiales de construcción	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8169111 (INT)	P																					X						
					E																					X						
	7	Orden y aseo	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8169111 (INT)	P											X																
					E											X																
	8	Uso eficiente de y ahorro de agua y energia	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8169111 (INT)	P															X												
					E															X												
	9	Conocimiento y manejo de sustancias químicas y hojas de seguridad	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8169111 (INT)	P																			X								
					E																			X								
	10	Actualización Requisitos legales ambientales.	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8169111 (INT)	P																							X				
					E																							X				
	11	Manejo de reciduos peligrosos	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8169111 (INT)	P																										X	
					E																											

PROGRAMADO	0	5	6	6	6	6	5
EJECUTADO	0	5	6	6	6	6	0
INCUMPLMIENTO	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
REPROGRAMADO							

UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S NIT: 829000956-3	FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	CÓDIGO: UNIOBRAS - FT-005 Versión 01 Pagina 1 de 1 Fecha: 12/10/2025
FECHA: 19 marzo 2025 LUGAR: Obra interventoria	Capacitación ☐ Charla ☑ Reunión Gerencial ☐	Inducción ☐ Otra/Cual:

HORA INICIO: 11:30 am HORA FIN: 12:00 pm

TEMA: manejo de materiales de construccion

DESCRIPCIÓN DEL TEMA: conjunto de practicas orientadas al almacenamiento, uso y disposicion adecuada de los materiales para prevenir impactos

Nº	ASISTENTE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Maria Cardenas	1090488611	Inspector	Maria C
2	Delcio Valencia	16505486	Tecnico SST	
3	victor mora	1012276502	Residente	Victor Mora
4	Christian Barrera	1018417359	profesional C&P	
5	Juan Brochero	1054671778	Tecnico SST	
6	Jonathan Casallas	1030613106	Inspector	
7	Ethelberto franco	79258510	Inspector	Ethelberto Franco
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

CARGO: Especialista ambiental

UNIOBRAS DEL ORIENTE UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S NIT: 829000956-3	FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	CÓDIGO: UNIOBRAS - FT-005 Versión 01 Pagina 1 de 1 Fecha: 12/10/2025
FECHA: 08-abril-2026 LUGAR: Virtual	Capacitación ☐ Charla ☒ Reunión Gerencial ☐	Inducción ☐ Otra/Cual:

HORA INICIO: 4:00 pm HORA FIN: 4:30 pm

TEMA: Actualizacion requisitos legales ambientales

DESCRIPCIÓN DEL TEMA: Identificacion, revision de las normas, permisos, licencias y demas obligaciones ambientales aplicables al proyecto

Nº	ASISTENTE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jhon Arango	79905978	Director	
2	Maria Cardenas	1090408911	inspector	
3	Jonathan Casallas	1030613886	Inspector	
4	Jhoner martinez	1012460713	Residente	
5	Claudia Forero	52912707	profesional apoyo	
6	miller marin	1277497766	Residente	
7	Estalberto franco	79258510	Inspector	
8	Marco carrero	90491240	Inspector	
9	Delcio valencia	16505486	Tecnico SST	
10	Luis noyano	1077271966	Tecnico SST	
11	paul paez	8500763	Tecnico SST	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				


FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

CARGO: Especialista ambiental

REPROGRAF®

Papel de caña de azúcar


Papel de caña de azúcar



Impreso en PROPALCOTE SBS de 225 gr.

Papel blanco multipropósito elaborado 100% con pulpa virgen de caña de azúcar. Excelente calidad y óptimo desempeño en todas las tecnologías de impresión.

USOS



CARACTERÍSTICAS

- Corte exacto hoja a hoja.
- Libre de Polvillo.
- No se deforma, resiste las altas temperaturas del proceso de fotocopiado a dos caras.
- Envoltura resistente a la humedad.
- Tecnología alcalina.
- Excelente opacidad y lisura.
- Compatible con todas las tecnologías de impresión.

ESPECIFICACIONES

FORMATO	DIMENSIONES		PESO	GRAMAJE	BLANCURA	HOJAS X RESMA	RESMAS X CAJA
	cm	plg					
Carta	21.6 x 27.9	8.5 x 11.0	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10
Oficio	21.6 x 33.0	8.5 x 13.0	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10
A4	21.0 x 29.7	8.3 x 11.7	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10

SELLOS Y CERTIFICACIONES




- 100% libre de cloro elemental.
- Libre de ácido que garantiza durabilidad y permanencia.
- Certificado con Sello Ambiental Colombiano.
- Proceso de producción certificado en gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad Industrial/Salud Ocupacional.
- Producto 100% reciclable, biodegradable y renovable en cortos períodos de tiempo.

REPROGRAF®

Papel de caña de azúcar


Papel de caña de azúcar

Papel blanco multipropósito elaborado 100% con pulpa virgen de caña de azúcar. Excelente calidad y óptimo desempeño en todas las tecnologías de impresión.



Impreso en PROPALCOTE SBS de 225 gr.

USOS



CARACTERÍSTICAS

- Corte exacto hoja a hoja.
- Libre de Polvillo.
- No se deforma, resiste las altas temperaturas del proceso de fotocopiado a dos caras.
- Envoltura resistente a la humedad.
- Tecnología alcalina.
- Excelente opacidad y lisura.
- Compatible con todas las tecnologías de impresión.

ESPECIFICACIONES

FORMATO	DIMENSIONES		PESO	GRAMAJE	BLANCURA	HOJAS X RESMA	RESMAS X CAJA
	cm	plg					
Carta	21.6 x 27.9	8.5 x 11.0	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10
Oficio	21.6 x 33.0	8.5 x 13.0	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10
A4	21.0 x 29.7	8.3 x 11.7	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10

SELLOS Y CERTIFICACIONES



- 100% libre de cloro elemental.
- Libre de ácido que garantiza durabilidad y permanencia.
- Certificado con Sello Ambiental Colombiano.
- Proceso de producción certificado en gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad Industrial/Salud Ocupacional.
- Producto 100% reciclable, biodegradable y renovable en cortos períodos de tiempo.

Natural Copy Paper

earth pact
100% sweet cane paper

Papel de caña de azúcar



Papel natural multipropósito elaborado 100% con pulpa virgen de caña de azúcar y libre de químicos blanqueadores y matizantes. Apariencia única que hace visible su compromiso ambiental.

Impreso en EARTH PACT Natural Offset de 200gr.

USOS



CARACTERÍSTICAS

- Corte exacto hoja a hoja.
- Libre de Polvillo.
- No se deforma, resiste las altas temperaturas del proceso de fotocopiado a dos caras.
- Envoltura resistente a la humedad.
- Tecnología alcalina.
- Excelente opacidad y lisura.
- Compatible con todas las tecnologías de impresión.
- Tono natural, único en el mercado.

ESPECIFICACIONES

FORMATO	DIMENSIONES		PESO	GRAMAJE	HOJAS X RESMA	RESMAS X CAJA
	cm	plg				
Carta	21.6 x 27.9	8.5 x 11.0	19.1 lb	72 gr/m²	500	10
Oficio	21.6 x 33.0	8.5 x 13.0	19.1 lb	72 gr/m²	500	10
A4	21.0 x 29.7	8.3 x 11.7	19.1 lb	72 gr/m²	500	10

SELLOS Y CERTIFICACIONES



- 100% libre de cloro elemental.
- Libre de ácido que garantiza durabilidad y permanencia.
- Certificado con Sello Ambiental Colombiano.
- Proceso de producción certificado en gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad Industrial/Salud Ocupacional.
- Producto libre de químicos blanqueadores.
- Producto 100% reciclable, biodegradable y renovable en cortos períodos de tiempo.

Natural Copy Paper

earth pact
100% sweet cane paper

Papel de caña de azúcar



Papel natural multipropósito elaborado 100% con pulpa virgen de caña de azúcar y libre de químicos blanqueadores y matizantes. Apariencia única que hace visible su compromiso ambiental.

Impreso en EARTH PACT Natural Offset de 200gr.

USOS



CARACTERÍSTICAS

- Corte exacto hoja a hoja.
- Libre de Polvillo.
- No se deforma, resiste las altas temperaturas del proceso de fotocopiado a dos caras.
- Envoltura resistente a la humedad.
- Tecnología alcalina.
- Excelente opacidad y lisura.
- Compatible con todas las tecnologías de impresión.
- Tono natural, único en el mercado.

ESPECIFICACIONES

FORMATO	DIMENSIONES		PESO	GRAMAJE	HOJAS X RESMA	RESMAS X CAJA
	cm	plg				
Carta	21.6 x 27.9	8.5 x 11.0	19.1 lb	72 gr/m²	500	10
Oficio	21.6 x 33.0	8.5 x 13.0	19.1 lb	72 gr/m²	500	10
A4	21.0 x 29.7	8.3 x 11.7	19.1 lb	72 gr/m²	500	10

SELLOS Y CERTIFICACIONES



- 100% libre de cloro elemental.
- Libre de ácido que garantiza durabilidad y permanencia.
- Certificado con Sello Ambiental Colombiano.
- Proceso de producción certificado en gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad Industrial/Salud Ocupacional.
- Producto libre de químicos blanqueadores.
- Producto 100% reciclable, biodegradable y renovable en cortos períodos de tiempo.

SEDE B - VILLAS DEL PROGRESO

EDU CONSORCIO EDU2025	**EVALUACION ENERGIAS RENOVABLES**

NOMBRE: Nicolas Rivera	CARGO: Ayudante	FECHA: 21-03-26	NOTA: 5.0


1. ¿Qué son las energías renovables?

   a. Son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de recursos naturales: el sol, el viento, el agua
   b. Son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de carbón y el petróleo y sus derivados
   c. Ninguna de las anteriores


2. Marque con una X las que Si correspondan a una característica de energía renovable:


   (X) Ayudan a potenciar el autoconsumo
   (X) Son energías beneficiosas para el medio ambiente
   ( ) Son energías que solo se pueden usar en las ciudades

3. Encierre en un círculo los tipos de energías renovables que existen:









FIRMA

SEDE B – EL PORVENIR

EDU CONSORCIO EDU2025	**EVALUACION ENERGIAS RENOVABLES**

NOMBRE:	CARGO:	FECHA:	NOTA:
Cirilo Bermeo	Maestro	21-03-26	50


1. ¿Qué son las energías renovables?

   a. Son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de recursos naturales: el sol, el viento, el agua
   b. Son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de carbón y el petróleo y sus derivados
   c. Ninguna de las anteriores


2. Marque con una X las que Si correspondan a una característica de energía renovable:


   (X) Ayudan a potenciar el autoconsumo
   (X) Son energías beneficiosas para el medio ambiente
   ( ) Son energías que solo se pueden usar en las ciudades

3. Encierre en un círculo los tipos de energías renovables que existen:





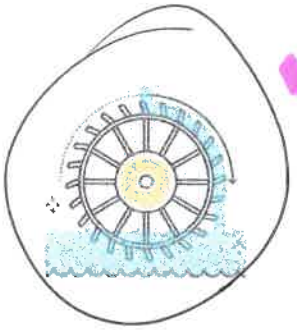



FIRMA

EDU CONSORCIO EDU2025	**EVALUACION ENERGIAS RENOVABLES**

NOMBRE: Nicolas Rivera	CARGO: Ayudante	FECHA: 21-03-26	NOTA: 5.0


1. ¿Qué son las energías renovables?

   a. Son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de recursos naturales: el sol, el viento, el agua
   b. Son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de carbón y el petróleo y sus derivados
   c. Ninguna de las anteriores


2. Marque con una X las que Si correspondan a una característica de energía renovable:


   (X) Ayudan a potenciar el autoconsumo
   (X) Son energías beneficiosas para el medio ambiente
   ( ) Son energías que solo se pueden usar en las ciudades

3. Encierre en un círculo los tipos de energías renovables que existen:









FIRMA

SEDE A- JAIRO ANIBAL NIÑO

EDU CONSORCIO EDU2025	EVALUACION ENERGIAS RENOVABLES

NOMBRE: Jorge Rinoon	CARGO: Maestro	FECHA: 21-03-2026	NOTA: 50


1. ¿Qué son las energías renovables?

   a. Son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de recursos naturales: el sol, el viento, el agua
   b. Son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de carbón y el petróleo y sus derivados
   c. Ninguna de las anteriores


2. Marque con una X las que Si correspondan a una característica de energía renovable:


   (X) Ayudan a potenciar el autoconsumo
   (X) Son energías beneficiosas para el medio ambiente
   ( ) Son energías que solo se pueden usar en las ciudades

3. Encierre en un círculo los tipos de energías renovables que existen:









JORGE R

FIRMA

EDU CONSORCIO EDU2025	**EVALUACION ENERGIAS RENOVABLES**

NOMBRE: Darwin Zambrano	CARGO: Oficial	FECHA: 21-03-2026	NOTA: 50


1. ¿Qué son las energías renovables?

   a. Son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de recursos naturales: el sol, el viento, el agua
   b. Son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de carbón y el petróleo y sus derivados
   c. Ninguna de las anteriores


2. Marque con una X las que Si correspondan a una característica de energía renovable:


   (x) Ayudan a potenciar el autoconsumo
   (x) Son energías beneficiosas para el medio ambiente
   ( ) Son energías que solo se pueden usar en las ciudades

3. Encierre en un círculo los tipos de energías renovables que existen:

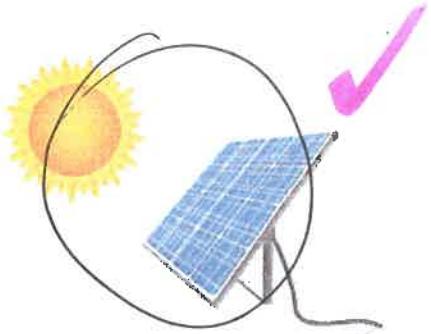





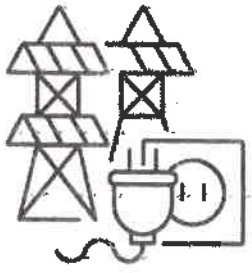

FIRMA

SEDE B- DARIO ECHANDIA

EDU CONSORCIO EDU2025	EVALUACION ENERGIAS RENOVABLES

NOMBRE: Remy Castro	CARGO: Oficial	FECHA: 21-03-26	NOTA: 50


1. ¿Qué son las energías renovables?

   a. Son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de recursos naturales: el sol, el viento, el agua
   b. Son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de carbón y el petróleo y sus derivados
   c. Ninguna de las anteriores

2. Marque con una X las que Si correspondan a una característica de energía renovable:


   (x) Ayudan a potenciar el autoconsumo
   (x) Son energías beneficiosas para el medio ambiente
   ( ) Son energías que solo se pueden usar en las ciudades

3. Encierre en un círculo los tipos de energías renovables que existen:









FIRMA

SEDE A- LUIS LOPEZ DE MESA

EDU CONSORCIO EDU2025	EVALUACION ENERGIAS RENOVABLES

NOMBRE: Eshelda Suarez	CARGO: Ayudante	FECHA: 21-03-2026	NOTA: 50


1. ¿Qué son las energías renovables?

   a. Son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de recursos naturales: el sol, el viento, el agua
   b. Son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de carbón y el petróleo y sus derivados
   c. Ninguna de las anteriores


2. Marque con una X las que Si correspondan a una característica de energía renovable:

   (x) Ayudan a potenciar el autoconsumo
   (x) Son energías beneficiosas para el medio ambiente
   ( ) Son energías que solo se pueden usar en las ciudades

3. Encierre en un círculo los tipos de energías renovables que existen:









Yolanda Suarez

FIRMA

EDU CONSORCIO EDU2025	**EVALUACION ENERGIAS RENOVABLES**

NOMBRE:	CARGO:	FECHA:	NOTA:
Cirilo Bermeo	Maestro	21-03-26	50


1. ¿Qué son las energías renovables?

   a. Son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de recursos naturales: el sol, el viento, el agua
   b. Son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de carbón y el petróleo y sus derivados
   c. Ninguna de las anteriores


2. Marque con una X las que Si correspondan a una característica de energía renovable:


   (X) Ayudan a potenciar el autoconsumo
   (X) Son energías beneficiosas para el medio ambiente
   ( ) Son energías que solo se pueden usar en las ciudades

3. Encierre en un círculo los tipos de energías renovables que existen:









FIRMA

UNIOBRAS-LOTE3-346

Bogotá, 18 de marzo de 2026

Señores:
CONSORCIO EDU 2025
Wilver Franciny Russy Ladino
Representante Legal

Referencia 1: Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8169111 "*Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas".*

Referencia 2: Contrato de obra CO1.PCCNTR.8154784 **"***Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaria de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas; LOTE 7."*

Asunto: Reiteración de Requerimiento de proyección para cumplimiento de meta de aprovechamiento y circularidad de RCD

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales dentro del contrato marco de referencia y conforme a lo establecido en el decreto 507 de 2023, se reitera la solicitud del oficio UNIOBRAS-LOTE3-328 con asunto "Requerimiento de proyección para cumplimiento de meta de aprovechamiento y circularidad de RCD" se evidencia que a la fecha no se ha recibido la solicitud requerida, lo cual impide realizar el debido seguimiento al marco del contrato

En ese sentido, se reitera el requerimiento para que se remita lo solicitado anteriormente, lo cual debe incluir como mínimo:

- **Proyección actualizada del porcentaje de aprovechamiento de RCD**, que permita evidenciar el cumplimiento de la meta mínima del 50% de aprovechamiento, indicando los volúmenes estimados de residuos generados, los materiales susceptibles de valorización y los mecanismos previstos para su aprovechamiento a través de gestores autorizados

- **Proyección del cumplimiento de la meta de circularidad del 8%**, especificando los materiales provenientes de RCD valorizados o reciclados que se incorporó o se tiene previsto incorporar en el proyecto, así como los frentes de obra o actividades en los cuales se realizara su utilización.

- **Estrategias y medidas de gestión** que permitan garantizar el cumplimiento de las metas mencionadas, incluyendo la articulación con gestores autorizados, centros de tratamiento y/o proveedores de materiales reciclados

La información solicitada deberá remitirse dentro de los siguientes tres (3) días hábiles contados a partir de la recepción del presente requerimiento, con el fin de realizar el respectivo seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato, agradezco su atención y quedamos atentos a la pronta remisión de lo requerido.

Cordialmente,



JOHN HARRY ARANGO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA
UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S

UNIOBRAS-LOTE3-350

Bogotá, 18 de marzo de 2026

Señores:
CONSORCIO EDU 2025
Wilver Franciny Russy Ladino
Representante Legal

Referencia 1: Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8169111 "*Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas".*

Referencia 2: Contrato de obra CO1.PCCNTR.8154784 **"***Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaria de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas; LOTE 7."*

Asunto: Solicitud Informes mensuales N°5 de los componentes Técnico, ambiental y SST

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales dentro del contrato marco de referencia, se evidencia que a la fecha no se ha recibido la entrega del informe mensual N°5 Tecnico, ambiental y SST, respectivamente, incumpliendo lo establecido en el cronograma de entregables y en las obligaciones contractuales relacionadas con la gestión ambiental del proyecto.

La falta de presentación oportuna de estos informes afecta el proceso de verificación técnica, el seguimiento a medidas de mitigación y la trazabilidad institucional ante los entes de control. En consecuencia, se requiere:

1. **Remitir en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles** los informes ambientales y SST pendientes debidamente estructurados con soporte fotográfico técnico y documental.

2. **Asegurar la entrega periódica** de los informes ambientales y de seguridad y salud en el trabajo (SST) subsiguientes. De acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos, deberán ser presentados de manera independiente el día dieciséis (16) de cada mes, incluyendo la información correspondiente al periodo inmediatamente anterior

Agradezco su atención y quedamos atentos a la pronta remisión de lo requerido.

Cordialmente,



JOHN HARRY ARANGO GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORÍA
UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S

UNIOBRAS-LOTE3-356

Bogotá, 24 de marzo de 2026

Señores:

CONSORCIO EDU 2025
Wilver Franciny Russy Ladino
Representante Legal

Referencia 1: Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8169111 "*Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas".*

Referencia 2: Contrato de obra CO1.PCCNTR.8154784 **"***Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaria de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas; LOTE 7."*

Asunto: Solicitud Manejo y Disposición residuos de Construcción y Demolición (RCD)

Cordial Saludo,

En atención al cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato Marco de Referencia, se permite informar que, como resultado del recorrido de obra efectuado el día 24 de marzo de 2026, se evidenció una situación que requiere atención por parte del contratista.

Durante la inspección realizada en las instituciones educativas Jairo Aníbal Niño, Darío Echandía, Eduardo Umaña Luna y Luis López de mesa, se constató la presencia de material de construcción acumulado desde haces unas semanas en el frente de obra, sin que haya efectuado su correcta disposición final a través de un gestor autorizado. Esta situación resulta contraria a la obligación del contratista de garantizar la gestión integral de residuos de Construcción y Demolición (RCD) conforme a lo establecido en la Resolución 472 de 2017, la Resolución 1257 de 2021, el Decreto 507 de 2023 y lo definido en el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y demolición (PGRCD) aprobado para el proyecto.

En las áreas de acopio se evidencio la ausencia de protección, señalización adecuada y limita las actividades por parte de los trabajadores, lo cual contraviene las disposiciones técnicas, ambientales y SST vigentes.










En este sentido, se solicita la implementación de las medidas correctivas correspondientes en un periodo no mayor a tres (3) días calendario, que incluyan la disposición oportuna de los residuos mediante un gestor autorizado en el menor tiempo posible.

Barrancabermeja
Número de contacto: 3161147965
Correo electrónico: uniobrasdeloriente@gmail.com / lote3uniobras@gmail.com

Lo anterior, con el fin de asegurar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental y las obligaciones contractuales establecidas, evitando posibles afectaciones ambientales o contingencias administrativas posteriores.

Cordialmente,



JOHN HARRY ARANGO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA
UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S

UNIOBRAS-LOTE3-357

Bogotá, 24 de marzo de 2026

Señores:

CONSORCIO EDU 2025
Wilver Franciny Russy Ladino
Representante Legal

Referencia 1: Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8169111 "*Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas".*

Referencia 2: Contrato de obra CO1.PCCNTR.8154784 **"***Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaria de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas; LOTE 7."*

Asunto: Observaciones informe ambiental mensual N°5 - Respuesta oficio 0158-012 SED-25

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales dentro del contrato marco de referencia, nos dirigimos a usted con el fin de remitir las observaciones correspondientes al INFORME MENSUAL N°5 entregado mediante la comunicación relacionada en el asunto; ante esto se solicita:

- Ajustar el ítem de manejo de residuos sólidos con la información del certificado de plástico no aprovechable

- Se debe presentar el anexo I y V correspondientes al Decreto 507 de 2023

- Se debe relacionar tema con respecto a los ciclos parqueaderos

- Subsanado el informe mensual, todos los anexos deben estar en PDF y firmados para su aprobación

Cordialmente,



JOHN HARRY ARANGO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA
UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S

UNIOBRAS-LOTE3-376

Bogotá, 25 de marzo de 2026

Señores:
CONSORCIO EDU 2025
Wilver Franciny Russy Ladino
Representante Legal

Referencia 1: Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8169111 "*Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas".*

Referencia 2: Contrato de obra CO1.PCCNTR.8154784 **"***Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaria de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas; LOTE 7."*

Asunto: Segunda reiteración de Requerimiento de proyección para cumplimiento de meta de aprovechamiento y circularidad de RCD

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales dentro del contrato marco de referencia y conforme a lo establecido en el decreto 507 de 2023, se reitera la solicitud del oficio UNIOBRAS-LOTE3-328 con asunto "Requerimiento de proyección para cumplimiento de meta de aprovechamiento y circularidad de RCD" se evidencia que a la fecha no se ha recibido la solicitud requerida, lo cual impide realizar el debido seguimiento al marco del contrato.

En ese sentido, se reitera el requerimiento para que se remita lo solicitado anteriormente, lo cual debe incluir como mínimo:

- **Proyección actualizada del porcentaje de aprovechamiento de RCD**, que permita evidenciar el cumplimiento de la meta mínima del 50% de aprovechamiento,


indicando los volúmenes estimados de residuos generados, los materiales susceptibles de valorización y los mecanismos previstos para su aprovechamiento a través de gestores autorizados

- **Proyección del cumplimiento de la meta de circularidad del 8%**, especificando los materiales provenientes de RCD valorizados o reciclados que se incorporó o se tiene previsto incorporar en el proyecto, así como los frentes de obra o actividades en los cuales se realizara su utilización.

- **Estrategias y medidas de gestión** que permitan garantizar el cumplimiento de las metas mencionadas, incluyendo la articulación con gestores autorizados, centros de tratamiento y/o proveedores de materiales reciclados

La información solicitada deberá remitirse dentro de los siguientes tres (3) días hábiles contados a partir de la recepción del presente requerimiento, con el fin de realizar el respectivo seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato, agradezco su atención y quedamos atentos a la pronta remisión de lo requerido.

Cordialmente,



UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
JHON HARRY ARANGO GUTIERREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UNIOBRAS-LOTE3-381

Bogotá, 26 de marzo de 2026

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Julián Téllez
Supervisor SED

Referencia 1: Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8169111 "*Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas".*

Referencia 2: Contrato de obra CO1.PCCNTR.8154784 **"***Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaria de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas; LOTE 7."*

Asunto: Entrega de documentos – componente ambiental

Cordial saludo,

En el marco de las actividades de seguimiento y control adelantadas por la interventoría, nos permitimos realizar la entrega de los documentos correspondientes al componente ambiental, los cuales fueron previamente solicitados por el especialista ambiental de la Secretaria de educación para su revisión y verificación, así:

- Plan de Manejo Ambiental (PMA)
- Formato de sistemas ahorradores de agua y energía
