15.5.3. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA

A partir de la Identificación de factores o causas de la problemática, se presentarán propuestas de mejora que busquen promover el aumento de eficiencia y eficacia de los procesos. Una vez planteadas las mejoras se realizará una medición de indicadores como herramienta de mejora basada en datos, la cual se definirá bajo los siguientes criterios para lograr la oportunidad de mejora como:

1. Se dará cumplimiento de la política SIG
2. Se identificarán los resultados a través de la medición de indicadores de los procesos.
3. Se contará con la participación y ejecución de los colaboradores, proveedores y contratistas de **CONSORCIO EDU 2025**
4. Se capacitará constantemente a los colaboradores de los contenidos del sistema integrado de gestión.
5. **CONSORCIO EDU 2025,** participará activamente en la gestión del cambio en pro de mejoramiento.
6. Se contará con el control de procesos de investigación de incidentes y accidentes de trabajo cuando se requiera.

15.5.4. DIVULGACIÓN, PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN

Se realizará capacitaciones donde la divulgación de la información sea de manera eficiente y entendible para todos los colaboradores, se utilizará medios de comunicación como avisos, actividades de participación, correo electrónico, la voz a voz, entre otras opciones.

15.5.5. PREPARACION Y DESARROLLO DE LA AUDITORIA

15.5.5.1. PLANEACION DE AUDITORIAS

Para el desarrollo del **Plan de auditorías,** se realizará teniendo en cuenta los criterios descritos en el numeral a auditar basado en documentos vigentes de los procesos correspondientes.

El auditor será el responsable de definir el objetivo y alcance de la auditoria, planeando la ejecución y registro en el **Plan de auditorías,** incluyendo fechas, horas y responsables de los procesos auditar.

La planeación de la auditoría debe ser lo suficientemente flexible para permitir cambios o modificaciones en el alcance de la auditoria, que pueden llegar a ser desarrollados en las actividades de verificación.

Con base en la documentación suministrada se preparará la **Lista de Verificación,** por proceso auditar.

15.5.5.2. PERIODICIDAD DE LAS AUDITORIAS

En **CONSORCIO EDU 2025** se realizarán auditorias anuales para verificar el cumplimiento que la empresa le está dando al Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, ISO 9001-2015, ISO14001-2015, ISO 45001:2018 y cuáles son las medidas preventivas que se están tomando para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales dentro de la población trabajadora

15.5.5.3. ASIGANCION DE TAREAS Y PREPARACION DE LOS DOCUMENTOS

El auditor asignará las responsabilidades frente a los procesos que cada uno debe auditar, dichas asignaciones deben considerar la necesidad de independencia y competencia de los auditores y el uso eficaz de los recursos asignados para el desempeño de sus funciones.

Se pueden realizar cambios en la asignación de las tareas a medida que se va desarrollando la auditoria. Se preparará la documentación que sea necesaria como referencia y los que serán los registros de auditoría.

15.5.5.4. REALIZACION E INICIO DE AUDITORIAS

Se realizará reuniones de apertura donde se confirma el Plan de auditoría y se aclaran las dudas que se presenten. Se informa sobre la metodología a seguir en la realización de la auditoria y se acuerda la fecha y ejecución de las actividades.

15.5.5.5. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

A través de entrevistas, revisión de la documentación, observaciones de las actividades, entre otras; el equipo auditor revisa la información correspondiente a los procesos del sistema integrado de gestión donde podrán hallar información para la realización de la autoría.

De acuerdo con la verificación documental se tendrá en cuenta; la aplicabilidad de os registros asociados que sean correspondientes y el contenido del documento, con el fin de dar control a la política integrada de la organización, que el contenido sea acorde a las normas y que se halla divulgado de manera eficaz y efectiva.

Los hallazgos encontrados por los auditores (conformes o no conformes) serán analizados para determinar observaciones de fortalezas y oportunidades de mejora; para este paso se requiere diligenciar **Lista de Verificación.**

Luego de tener conocimiento de los hallazgos, estos serán registrados en el **informe de auditoría** y se registrara también en el **Solicitud de acciones**

correctivas y de mejora continua, estableciendo los planes de acciones para cerrar esas observaciones o No conformidades.

15.5.5.6. INFORME DE LA AUDITORIA

Obteniendo la información correspondiente para la ejecución se realizará el **informe de auditoría** teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Fecha, alcance y objetivos de la auditoría.
- Fortalezas y oportunidades de mejora.
- No conformidades presentadas.
- Observaciones respecto a los procesos.
- Recomendaciones para la mejora.
- Conclusiones de la actividad realizada.

Este informe es presentado al Gerente y con esta información se adelantan las acciones de Mejora que solicita el equipo auditor, se define la fecha de seguimiento de las acciones de mejora para verificarlas en el formato **Solicitud Acciones Correctivas o de Mejora.** Posteriormente se realizarán programas de verificación para el seguimiento y eficiencia de las acciones tomadas con el fin de cerrar las No conformidades.

15.6. REGISTROS ASOCIADOS

- Solicitud de acciones correctivas o de mejora.
- Selección de auditores.
- Plan de auditorías**.**
- Lista de Verificación**.**
- Informe de auditoría**.**

16. CONTROL DE PROCESOS

16.1. OBJETO

Establecer un procedimiento que garantice el control efectivo de todos los procesos relacionados con “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”, asegurando que se realicen conforme a los requisitos

planificados y cumpliendo con los estándares de calidad, ambientales y de seguridad establecidos por la norma ISO 9001:2015.

16.2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos operativos, técnicos, administrativos y de gestión involucrados en la ejecución del proyecto de relimpia de canales de drenajes pluviales. Incluye la planificación, ejecución, monitoreo y mejora continua de cada proceso.

16.3. RESPONSABLES

- Gerente de Proyecto: Responsable de la aprobación y supervisión general de todos los procesos, asegurando su alineación con los objetivos del proyecto.
- Coordinador de Calidad: Responsable de la implementación y monitoreo del control de procesos, verificando que se cumplan los estándares establecidos.
- Coordinador de proyectos: Encargado de la ejecución directa de los procesos operativos y de asegurar que se cumplan los planes y procedimientos establecidos.
- Supervisores de Procesos: Responsables de la supervisión diaria de los procesos asignados, asegurando la correcta implementación de los controles y reportando cualquier desviación.
- Personal Operativo: Encargado de ejecutar las actividades conforme a los procedimientos y directrices establecidas, asegurando la calidad en cada tarea.

16.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

16.4.1. Identificación y Documentación de Procesos

Todos los procesos clave del proyecto deben ser identificados y documentados en el Mapa de Procesos. Esto incluye la descripción de cada proceso, su secuencia, interacción, criterios de aceptación, recursos necesarios y puntos de control. Cada proceso tendrá un responsable designado que supervisará su correcto funcionamiento.

16.4.2. Planificación de Procesos

Antes de la ejecución de cada proceso, se desarrollará un plan que incluirá:

- Objetivos del Proceso: Metas específicas que deben alcanzarse en cada etapa del proceso.
- Recursos Necesarios: Identificación de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para la ejecución del proceso.

- Criterios de Aceptación: Estándares y criterios que deben cumplirse para considerar que el proceso ha sido exitoso.
- Indicadores de Desempeño: Métricas clave que se utilizarán para medir la efectividad y eficiencia del proceso.

16.4.3. Ejecución del Proceso

El proceso será ejecutado conforme a los procedimientos documentados y las instrucciones de trabajo específicas. Durante la ejecución, los responsables deben asegurarse de:

- Cumplir con los Estándares de Calidad: Siguiendo las directrices establecidas en el Plan de Calidad.
- Minimizar Impactos Ambientales: Asegurando que las actividades se realicen conforme al Plan de Manejo Ambiental.
- Mantener la Seguridad en el Trabajo: Cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo aplicables.

16.4.4. Monitoreo y Control del Proceso

Durante la ejecución de los procesos, se realizarán monitoreos continuos utilizando los indicadores de desempeño establecidos. Cualquier desviación de los estándares establecidos será registrada en un Registro de No Conformidades y se tomarán acciones correctivas según el procedimiento correspondiente.

16.4.5. Revisión de los Procesos

Al final de cada ciclo de ejecución, se llevará a cabo una revisión del proceso para evaluar su efectividad y eficiencia. Esta revisión incluirá:

- Análisis de Desempeño: Evaluación de los resultados obtenidos en comparación con los objetivos planificados.
- Identificación de Mejoras: Propuestas para mejorar el proceso basadas en las lecciones aprendidas y las mejores prácticas.
- Actualización de Documentación: Revisión y actualización de la documentación del proceso, incluyendo planes y procedimientos, según sea necesario.

16.4.6. Mejora Continua

El control de procesos debe estar orientado hacia la mejora continua, utilizando la retroalimentación de las revisiones y los resultados del monitoreo para implementar mejoras en la ejecución de los procesos futuros.

17. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS ACTIVIDADES

17.1. OBJETO

El objetivo de este procedimiento es establecer las directrices para la realización de inspecciones y pruebas en las actividades de mantenimiento a todo costo de un "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS", con el fin de asegurar que los trabajos ejecutados cumplan con los estándares de calidad especificados en el Plan de Calidad del **CONSORCIO EDU 2025** y con los requisitos de la norma ISO 9001:2015

17.2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las actividades de inspección y pruebas realizadas durante las fases de ejecución del proyecto, incluyendo la verificación de materiales, equipos, procedimientos de trabajo y la calidad final de las obras. Abarca desde la recepción de materiales hasta la finalización de los trabajos, asegurando la conformidad con las especificaciones técnicas y los requisitos contractuales

17.3. RESPONSABLES

- Responsable de Calidad: Coordina y supervisa todas las actividades de inspección y pruebas, asegurando su correcta ejecución y documentación.
- Residentes de Obra: Realizan las inspecciones diarias en el sitio, documentan los hallazgos y reportan cualquier no conformidad.
- Jefe de Proyecto: Asegura que los recursos necesarios para las inspecciones y pruebas estén disponibles y que se cumplan los cronogramas establecidos.
- Personal Técnico: Realiza las pruebas específicas según los procedimientos técnicos establecidos y reporta los resultados al Responsable de Calidad.

17.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

17.4.1. Inspección de materiales y equipos

- ✓ **Recepción de Materiales**: Todos los materiales recibidos en el sitio de obra deben ser inspeccionados para verificar que cumplen con las

especificaciones técnicas del proyecto. Se revisará la documentación de los proveedores y se realizarán inspecciones visuales y dimensionales.

- ✓ **Inspección de Equipos**: Antes de su uso, todos los equipos deben ser inspeccionados para asegurar que están en condiciones óptimas de operación y que cumplen con los estándares de seguridad requeridos

17.4.2. Inspección Durante la Ejecución de las Obras

- **Inspección de Procedimientos de Trabajo:** Durante la ejecución de los trabajos, los residentes de Obra deben verificar que se sigan los procedimientos aprobados y que se cumplan los requisitos de seguridad y medio ambiente.
- **Control de Calidad en Sitio:** Se realizarán inspecciones diarias para verificar la correcta ejecución de las tareas, incluyendo la remoción de escombros, desechos y el manejo adecuado de materiales retirados.

17.4.3. Pruebas de Calidad:

- ✓ **Pruebas de Conformidad:** Se llevarán a cabo pruebas específicas en materiales (como arena, grava, concreto, etc.) para asegurar que cumplen con los estándares de calidad especificados.
- ✓ **Pruebas Operacionales:** Para equipos y maquinaria, se realizarán pruebas operativas para garantizar que funcionen correctamente bajo las condiciones específicas del proyecto

Ref. Artículo	Descripción
1	PRELIMINARES
1.1	OBRAS PRELIMINARES
1.1.2	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MADERA VARA DE CLAVO Y LAMINA ONDULADA DE ZINC TIPO ACESCO Ó SIMILAR, H=2.15 m. INCLUYE PUERTA DE DOS NAVES DE 2.00 m. CADA UNA. + PASADOR DE SEGURIDAD ó CADENA Y CANDADO.
1.1.4	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE
1.1.5	Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada cal 10 de 2" H= 2.50 mts. Incluye marco en ángulo de 1 1/2" x 1/4", diagonales, tubería cuadrada 9x9 de 2.5 mm, platinas de 0,15x0,15 x 1/4", esmalte anticorrosivo y pintura gris. (INCLUYE CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI VIGAS DE CIMENTACIÓN)
1.1.6	Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada cal 10 de 2" H= 0,70 mts. Incluye marco en ángulo de 1 1/2" x 1/4", diagonales, tubería cuadrada 9x9 de 2.5 mm, platinas de 0,15x0,15 x 1/4", esmalte anticorrosivo y pintura gris (para fijar sobre cerramiento existente).
1.2	DEMOLICIONES - RETIROS

1.2.1	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.2.2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.2.3	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.2.4	DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.2.5	DEMOLICIÓN MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.2.6	DEMOLICIÓN MUROS PANELES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.2.7	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.2.8	DEMOLICIÓN PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.2.9	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.2.10	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.2.11	DEMOLICIÓN PISOS EN TABLÓN (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.2.12	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.2.13	Demolición afinados de piso e=5 cm (incluye cargue, retiro, disposición de escombros
1.2.14	DEMOLICIÓN MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.2.15	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONC. REFZDO. (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.2.16	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO
1.2.17	Demolición de vigas y/o columnas en concreto.
1.2.18	Demolición de placa maciza de piso, e=25cm.
1.2.19	Demolición de muro en concreto reforzado e=0,20m.
1.2.20	demolición de muros (e=0,15) en altura de 17m, incluye cargue y transporte
1.2.21	DEMOLICIÓN DE PAÑETES (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)
1.3	DESMONTES-RETIROS
1.3.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.2	DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.3	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.4	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.5	DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.6	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)
1.3.7	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.8	DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES)
1.3.9	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES METÁLICAS PAÑOS
1.3.10	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES MODULARES
1.3.11	DESMONTE CANCHA MÚLTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.12	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SÓLO P´ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON REINSTALACIÓN DEL MISMO APARATO SANITARIO)
1.3.13	ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.14	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.15	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.16	REPARACIÓN DE DOMOS ACRÍLICOS (INC. SOPORTES METÁLICOS)
1.3.17	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.18	REPARACIÓN DE DOMOS ACRÍLICOS (INC. SOPORTES METÁLICOS)
1.3.19	Desmonte de Puertas.

1.3.20	Desmonte de bajante incluye retiro
1.3.21	Desmonte de teja ondulada eternit
1.3.22	Desmonte de flanche en lamina galvanizada.
1.3.23	Desmonte de bancas.
1.3.24	Desmonte de mesas en acero inoxidable
1.3.25	DESMONTE E INSTALACIÓN NUEVAMENTE DE PARLANTE DE SONIDO
1.3.26	DESMONTE E INSTALACIÓN NUEVAMENTE DE DETECTOR DE HUMO
1.3.27	DESMONTE E INSTALACIÓN NUEVAMENTE DE PUERTA DE BAÑOS O DUCHAS MANTENIMIENTO INCLUYE HERRAJES, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE BISAGRAS
1.3.28	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE BASE Y TELEVISOR
1.3.29	DESMONTE DE CÁMARA DE SEGURIDAD
1.3.30	DESMONTE DE HOJA PUERTA PARA APERTURA DE REJILLA DE VENTILACIÓN E INSTALACIÓN DE LA MISMA
1.3.31	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE LOCKERS EN MADERA
1.3.32	DESMONTE DE CONCERTINA EN ACERO
1,3,33	FLANCHE, CANAL EN LAMINA C-20 HASTA 50 CM (incluye accesorios de fijacion y sellamiento)
1,3,34	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMOS EN ACRILICO DE 1,2 X 1,2 M X 3mm
1,3,35	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMOS EN ACRILICO DE 0,56 X 0,56 M x3mm
2	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL TIERRA H<2.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)
2.1.2	Relleno en recebo B-200, Incluye compactación.
3.1	CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN
3.1.1	CONCRETO CICLOPEO - 40% CONC. 2500 PSI
3.1.2	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI
3.2	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERÍA Y OTROS
3.2.1	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
3.2.2	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR
3.2.3	GROUTING CONCRETO FLUIDO
3.3	OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN
3.3.1	FILTRO DRENANTE DETRÁS DE MURO CON GEOTEXTIL HASTA H=1,8 M (VER PLANOS Y ESPECIFICACIÓN)
3.3.2	MUROS GAVIONES EN MALLA DE TRIPLE TORSIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO, CALIBRE BWG 12 CON HUECOS DE 10 X 10 CMS. - (INC. PIEDRA ½ ZONGA Y AMARRES)
3.3.3	CUNETA EN CONCRETO 30*30 (VER PLANOS Y ESPECIFICACIÓN)
3.3.4	PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA)
3.3.5	GEODREN PLANAR DE 100 MM DETRÁS DEL MURO (VER PLANOS Y ESPECIFICACION)
4	CONCRETO ESTRUCTURA

4.1	ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
4.1.1	CONCRETO PARA COLUMNAS 3000 PSI
4.2	ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO
4.2.1	CONCRETO PARA VIGAS AÉREAS 3000 PSI
4.2.2	CONCRETO PARA VIGAS CANALES 3000 PSI
4.3	LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO
4.3.1	LOSA STEELDECK 2" CAL 22 - E = 10 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MALLA ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15)
4.3.2	RAMPA - LOSA MACIZA CONCRETO 3000 PSI - H = 15 cm
4.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO
4.4.1	MUROS ARQUITECTONICOS EN CONCRETO
4.4.2	LUCERNARIOS EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10
4.5	ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
4.5.1	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm
4.5.2	MESONES EN CONCRETO DE 40 cm
4.6	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA
4.6.1	CAJAS INSPECCION 40 x 60 x 45 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)
4.6.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)
4.6.3	CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)
4.6.4	CAJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)
4.6.5	MARCOS CAJAS TAPAS DE INSPECCIÓN
4.6.6	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)
4.6.7	CAJA PARA MEDIDOR DE 1" - SEGÚN ESPECIF. EAAB 1020 X 1020 X 950 (mm)
4.7	VARIOS
4.7.1	CAMARAS ELECTRICAS DOBLES
4.7.2	DUCTO ELECTRICO PVC 3"
4.7.3	CINTA SIKA PVC O-22 O SIMILAR
5	MAMPOSTERIA
5.1	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO
5.1.1	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm
5.1.2	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm
5.1.3	MURO EN EN LADRILLO PRENSADO SANTAFE O SIMILAR E = 12 CM
5.2	ELEMENTOS EN MAMPOSTERIA
5.2.1	ALFAJIAS LADRILLO TOLETE COMUN
5.2.2	REMATES LADRILLO TOLETE PRENSADO
5.3	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
5.3.1	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)

5.3.2	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)
5.3.3	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 5/8" - 14 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)
5.3.4	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/4" - 17 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)
5.3.5	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 7/8" - 20 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)
5.3.6	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1" - 23 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)
5.3.7	JUNTA DILATACION ICOPOR 2 CM. H = 0.50
5.4	VARIOS - MAMPOSTERIA
5.4.1	BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 MS
5.4.2	BORDILLO PARA DUCHAS. H = 20 cm (CON ENCHAPE)
5.4.3	CHAZOS PARA CARPINTERIA
5.4.4	MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS E=12 cms
5.4.5	INSTALACION DE DIVISIONES MODULARES
5.4.6	Suministro e instalacion de muro en lamina de Superboard, doble cara.
5.5	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS - ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
5.5.1	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50
5.5.2	SARDINEL TIPO A10 Suministro e Instalación. Incluye 3 cm Mortero 2000 PSI 3HUECOS
5.5.3	LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 1:5 y Arena de Sello).
5.5.4	DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M
6	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
6.1	ACOMETIDA
6.1.1	INSTALACIÓN ACOMETIDA DE 2" (MANO DE OBRA)
6.1.2	ACOMETIDA PVC Ø 1/2" - 5 MT
6.1.3	ACOMETIDA PVC Ø 3/4" - 5 MT
6,1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR ELÉCTRICO
6.2	CONEXION A TANQUES
6.2.1	CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC
6.2.2	Suministro e instalación del tanque hidroacumulador de 200 lt vertical, incluye: mantenimiento del diafragma, pintura poliuretano, revisión válvula de inyección de aire y soporte de caucho
6.2.3	Tubería de interconexión de tanque, incluye: tubería pvc, registro de 1 1/2", accesorios pvc, 1 manómetro y accesorios en HG

6.2.4	Mantenimiento de la descarga general, incluye: 1 cheque hidro de 3", 1 registro de 3", 2 niples de 3", 1 coupling de 3", 1 brida sin cuello de 3" y 1 universal de 1 1/4"
6.2.5	Impermeabilización de tanque de reserva elevado con sikaplan NTR 12 medidas internas de: 2,75x3,50x1,27, incluye: arreglo de grietas internas
6.2.6	Modificación del tanque suavizador, cambio del filtro, unión y tubería de drenaje.
6.2.7	Mantenimiento de tanque de agua caliente. Incluye pelada, limpieza con grata, aplicación de película de anticorrosivo epóxico y aplicación de película de pintura epóxica para agua potable.
6.2.8	Reparación y puesta en servicio de Tanque de condensación duplex de capacidad 100 Gal descripción detallada en cotización)
6.2.9	Reparación y puesta en servicio de sistema de suavización tanque de resina, tanque de salmuera y tuberías (descripción detallada en cotización)
6.2.10	Asegurar y fijar tapa de tanque aéreo para almacenamiento de agua
6.2.11	Suministro e instalación de tanque de agua de 5000 lt PVC incluye accesorios
6.2.12	Impermeabilización de tanque de reserva elevado con Sika 121, incluye el arreglo de grietas internas con mortero sika 1 y sika dur 32 primer
6.2.13	Reparación de fisura del tanque de condensado y puesta en funcionamiento.
6,2,14	LAVADO Y DESNFECCIÓN DEL INTERIOR DEL TANQUE A NIVEL, CON CAPACIDAD DE 160 M3, INCLUYE PRUEBA MICROBILOGICA
6,2,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR ELÉCTRICO
6,2,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR MECÁNICO 1/2" EN BRONCE
6,2,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR MECÁNICO 2" EN BRONCE
6,2,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR MECANICO 2 1/2" EN BRONCE
6.3	MANTENIMIENTO BOMBAS
6.3.1	Mantenimiento de las dos bombas del sistema de presión, incluye instalación de válvula reguladora de presión a 60PSI, calibración de los presostatos a 90 y 85 PSI. Incluye revisión de conexión de motores y tableros, incluye instalación de dos válvulas desairadoras de 1" con accesorios.
6.3.2	Mantenimiento equipo de presión de agua potable, revisión succión de la bomba, incluye: 1 biching de 2 x 1 1/2", 2 niples de 1 1/2" y 1 coupling de 1 1/2"
6.3.3	Cambio de tubería de la descarga de la bomba, incluye: 3 niples de 1 1/2", 1 registro de 1 1/2", 1 cheque de 1 1/2" y 1 unión coupling de 1 1/2"
6.3.4	Cambio de flauta, incluye: 2 Tees de 3", 3 niples de 3", 1 copa de 3 x 1 1/2", 1 brida de 3", 2 niples de 1 1/2" y 8 uniones coupling de 3"
6,3,5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA BOMBAS TANQUE PRINCIPAL RECLUSORIO
6,3,5	MANTENIMIENTO
6.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA
6.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"
6.4.2	ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"
6.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"
6.4.4	ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/4"

6.4.5	ACCESORIOS PVC-P Ø 2"
6.4.6	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE
6.4.7	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE
6.4.8	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1" ó EQUIVALENTE
6.4.9	REGISTRO PASO DIRECTO RED WHITE DE 1 1/4"
6.4.10	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE
6.4.11	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE
6.4.12	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1" ó EQUIVALENTE
6.4.13	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1 1/2" ó EQUIVALENTE
6.4.14	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 2" ó EQUIVALENTE
6.4.15	CHEQUE HIDRO DE 2"
6.4.16	TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2"
6.4.17	TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4"
6.4.18	TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4".
6.4.19	TUBERIA PVCP RDE 13.5 DE 1"
6.4.20	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1"
6.4.21	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/4"
6.4.22	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/2"
6.4.23	ACCESORIO HG DE 1"
6.4.24	ACCESORIOS PVC-P 1 1/2"
6.4.25	TUBERIA PRESION PVC 2"
6.4.26	REGISTRO RED WHITE 2"
6.4.27	REGISTRO RED WHITE 1 1/2"
6,4,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA DE 6" PVC. INLCUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN
6.5	RED DE AGUA CALIENTE
6.5.1	ACCESORIOS CPVC DE 1/2"
6.5.2	ACCESORIOS CPVC DE 3/4"
6.5.3	TUBERIA CPVC DE 1/2"
6.5.4	TUBERIA CPVC DE 3/4"
6.6	PUNTOS HIDRAULICOS
6.6.1	PUNTO SUMINISTRO GALVANIZADO (INC. ACCESORIOS)
6.6.2	PUNTO HIDRÁULICO AGUA CALIENTE
6.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)
6.6.4	Suministro e instalación de punto hidráulico de 1/2" (incluye accesorios)
6.6.5	REPARACIONES HIDRÁULICAS PVC DE 1/2" - 3/4" Y 1"
6.6.6	REUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA CALIENTE
6.6.7	REUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA
6.6.8	REPARACION DE TUBERIA DE 1/2" y flotador para tanque de almacenamiento (incluye desmonte de tubería, instalación de niples, codos, flotador, chazos y abrazaderas)
6.6.9	ADECUACION POSTERIOR DE CONEXION DE AGUA POTABLE CON PUSH DE SANITARIO (INCLUYE DESMONTE DE EXITENTE, FABRICACION DE MUÑECO EN PVC, ACOPLES, ACCESORIOS Y CONEXIÓN NUEVA CON PUSH)

6.6.10	DESMONTE DE TUBERIA PVC AZUL EN DIAMETROS ENTRE (1"- 2") QUE NO CUMPLE CON NORMA EN CORREDOR DE SERVICIOS (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS)
6.6.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DE PRUEBA ,INCLUYE MANOMETRO DE GLICERINA, NIPLES, VALVULA DE CORTE DE 1/2" Y ACCESORIOS GALV DE 1/2"
6.6.12	Desmonte de grifería existente
6.6.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMBOLO POMA PARA DUCHA (INCLUYE DESMONTE DE EMBOLO DAÑADO , INSTALACION DE POMA NUEVA)
6.6.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE SANITARIO
6.6.15	Suministro e instalación de grifería válvula de pedal (incluye manguera flexometalica de 1 mt)
6.6.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDICAÑA EN PVC
6,6,17	PRESURIZACION DE RED (RECORRIDO DE LOS DIFERENTES PABELLONES, INSPECCIONANDO QUE TODA LA RED QUEDE CON AGUA Y NO QUEDEN LLAVES CON FUGA, APLICA PARA TRABAJOS EN TUBERIAS MAYORES DE 2")
6,6,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO U 3"
6,6,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO U 4"
6,6,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO U 6"
6,6,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PIE AMIGO PARA TUBERIA
6.7	HASTA 6 " DE 50*50 CM
6.7.1	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"
6.7.2	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"
6.7.3	REPARACIONES SANITARIAS EN 2"
6.7.4	REPARACIONES TUBERIA PVC SANITARIA DE 3"
6.7.5	REPARACIONES TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"
6.7.6	REUBICACIÓN SALIDA SANITARIA
6.8	DESAGÜES E INSTALACIONES
6.8.1	DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS
6.8.2	TUBERIA PVC CORRUGADA PARA FILTRO DIAMETRO 4"
6.8.3	TUBERIA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)
6.8.4	TUBERIA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)
6.8.5	REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)
6.9	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS
6.9.1	TUBERIA NOVAFORT - D = 110 MM - EQ Ø 4" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS).
6.9.2	TUBERIA NOVAFORT - D = 160 MM - EQ Ø 6" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS)
6.9.3	TUBERIA NOVAFORT - D = 200 MM - EQ Ø 8" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS)
6.9.4	ACCESORIO PVC-S Ø 2"
6.9.5	ACCESORIO PVC-S Ø 3"
6.9.6	ACCESORIO PVC-S Ø 4"
6.9.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)
6.9.8	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)

6.9.9	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)
6.9.10	TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (incluye atraque en concreto)
6.9.11	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 6". Incluye accesorios.
6.9.12	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 8". Incluye accesorios.
6.9.13	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"
6.9.14	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"
69.15	Sondeo y revisión de cajas de inspección y tuberias con diámetros de 3" a 10" con equipos especiales (Hidrojet - Limpiador), incluye transporte y disposición certificada de residuos contaminados extraidos. Vactor
6.9.16	Desobstrupcion de cajas de inspección y tuberias con diámetros de 2" a 4" con equipos especiales (Destapador de cañerias -hidrolavadora).
6.9.17	ACCESORIO PVC-S Ø 6"
6.10	DRENAJES
6.10.1	Filtro Geodren 45x45 con tuberia filtro de D=100 mm (inlcuye geotextil y gravilla)
6.10.2	GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación).
6.10.3	GEOTEXTIL NT 2500 (Incluye Suministro e Instalación).
6.11	BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N.
6.11.1	BAJANTE A.N. PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS)
6.11.2	BAJANTE A.N. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)
6.11.3	BAJANTE A.N. PVC Ø 6" (INC. ACCESORIOS)
6.11.4	VENTILACION Y REVENTILACION PVC Ø 2" (INC. ACCESORIOS)
6.11.5	VENTILACION Y REVENTILACION PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS)
6.12	RED DE GAS
6.12.1	ACCESORIO DE COBRE DE 1"
6.12.2	ACCESORIO DE COBRE DE 3/4"
6.12.3	ACOMETIDA DE GAS UNIFAMILIAR
6.12.4	ADAPTADOR MACHO COBRE COBRE Ø 1/2"
6.12.5	ADAPTADOR MACHO COBRE COBRE Ø 3/4"
6.12.6	BUSHING HG 3/4" x 1/2"
6.12.7	BUSHING HG 1" x 1/2"
6.12.8	CODO HG Ø 1/2"
6.12.9	CODO HG Ø 3/4"
6.12.10	ACCESORIO HG DE 1"
6.12.11	ACCESORIO HG DE 2"
6.12.12	ACCESORIOS DE COBRE DE 1/2"
6.12.13	CODO DE COBRE Ø 3/4"
6.12.14	ACCESORIOS DE COBRE DE 1"
6.12.15	CONDUCTO EVACUACION GAS 15 x 22
6.12.16	INSTALACION INTERNA PUNTO PRINCIPAL 15 m
6.12.17	INSTALACION INTERNA PUNTO ADICIONAL 6 m
6.12.18	ELEVADOR DE GAS Ø 1/2"
6.12.19	MANGUERA DE CONEXION FLEXIBLE
6.12.20	UNIVERSAL DE COBRE Ø 1/2"
6.12.21	UNIVERSAL DE COBRE Ø 3/4"

6.12.22	UNIVERSAL HG DE Ø 1 1/2"
6.12.23	UNIVERSAL HG DE Ø 1"
6.12.24	UNIVERSAL HG DE Ø 2"
6.12.25	PUNTO DE GAS DE 1/2"
6.12.26	PUNTO DE GAS DE 3/4"
6.12.27	REGISTRO DE BOLA PARA GAS 1/2"
6.12.28	REGISTRO DE BOLA PARA GAS DE 3/4"
6.13	MANTENIMIENTO Y ASESORIOS PARA GAS
6.13.1	Cambio de válvula por escape.
6.13.2	Corrección escape de conexión estufa.
6.13.3	Cambio de dos válvulas de 1 mt para estufa comercial de 2 puestos y mantenimiento de equipo.
6.13.4	Cambio de tubería en tren de válvulas de 3/4" por escapes.
6.13.5	Independización de dos estufas enanas por válvula compartida.
6.13.6	Suministro de tren de válvulas para independización de puntos.
6.13.7	Soporte a la red.
6.13.8	Suministro y cambio de manguera para rancho.
6.13.9	Mantenimiento de equipo incluye cambio de válvulas de 1mt y limpieza de quemadores.
6.13.10	CALDERAS: Pintura anticorrosiva amarillo ocre.
6.13.11	Suministro de reguladores asociados a tercera etapa para regular presión alta en la entrada de los equipos.
6.13.12	CALDERA: Suministro de válvula de 3/4" para el tren de válvulas.
6.13.13	CALDERA: Suministro polo a tierra para aterrizar tubería con certificado, tapa registro y señalización.
7.1	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS
7.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC
7.1.2	SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC
7.1.3	SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE- PVC
7.1.4	SALIDA + BOTON TIMBRE - PVC
7.1.5	SALIDA + CAMPANA TIMBRE - PVC
7.1.6	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC
7.1.7	SALIDA PARA LAMPARA INCANDESCENTE (INCLUYE ROSETA) - PVC
7.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC
7.1.9	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) LUMINEX O EQUIVALENTE PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - PVC
7.1.10	SALIDA + TOMA BIFASICA 20 A 250V (GFCI) - PVC
7.1.11	SALIDA + TRIFASICA NEMA 14-30R 208 V (3fases + tierra) - PVC
7.1.12	SALIDA PARA LAMPARA INCANDESCENTE (INCLUYE ROSETA) - EMT
7.1.13	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT
7.1.14	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE - PVC
7.1.15	SALIDA PUNTO ALARMA - EMT
7.1.16	Punto eléctrico para tomacorriente doble.
7.1.17	Suministro e instalación de cable AWG No 6.

7.1.18	Suministro e instalación de toma regulada.
7.1.19	Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas
7.1.20	Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 25W, 95-227V, 2320 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas.
7.1.21	Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 9W, 95-227V, 870 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas
7.1.22	Suministro e instalación de Luminaria Panel LED de 60*60 45W 6.000K 95-227V, 4.100LM, Marco Satín o Blanco, 50.000 horas.
7.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN-THWN N 10 600V NE
7.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DESNUDO NO 1/0
7,1,25	Suministro e instalación de contactor principal Sirius de 12A AC3 110V. Incluye desmonte.
7,1,26	Suministro e instalación de reloj escalera click de 1.200 watt 120V. AC. Incluye desmonte
7,1,27	suministro e instalación de panel led de 120x30
7,1,28	suministro e instalación de panel led de 60x30
7,1,29	Instalación de fotocelda para alumbrado exterior
7,1,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE Y MONTAJE DE NUEVA)
7,1,31	REPARACION ELECTRICA (INCLUYE REVISION DE FALLO, INSPECCION DE TABLEROS ELECTRICOS, ADECUACIONES MINIMAS, REVISION DE BREAKERS. NO INCLUYE ACCESORIOS O REPUESTOS ELECTRICOS)
7,1,32	CODILLOS
7.2	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES
7.2.1	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS
7.2.2	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS
7.2.3	TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS
7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TRIPLEX 3*12 PROCABLEZ RO/VE/BL.
7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1/2"*3 COLMENA.
7.2.6	TUBERIA EMT 1 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS
7.2.7	CABLEADO 1#12
7.2.8	CABLEADO 1#10
7.2.9	CABLEADO 2#12
7.2.10	CABLEADO 2#10
7.2.11	CABLEADO 2#8
7.2.12	CABLEADO 3#12
7.3	TABLEROS E INTERRUPTORES
7.3.1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.
7.3.2	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.

7.3.3	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A
7.3.4	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 15/30 A
7.3.5	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 40/60 A
7.3.6	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A
7.3.7	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A
7.3.8	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 125/225 A
7.3.9	mantenimiento a botonera de lámparas, incluye revisión, reparación y cableado, no incluye accesorios
7.3.10	mantenimiento y revisión a tablero de breakers ,incluye cambio a breaker de 30 amp a 40 amp
7.4	TELEVISION Y TELEFONOS
7.4.1	CAJA DE PASO 60X50 MAMPOSTERIA
7.4.2	STRIP TELEFONICO 10 PARES, CON CAJA STRIP 30X30X15 Y REGLETA 10 PARES
7.5	PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
7.5.1	TIERRA TABLERO GRAL. DIST. 1 VARILLA Y CABLE 1/0 (Un metro de cable)
7.5.2	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 8' + CONECTOR
7.5.3	SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 0.6 M DE ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE TRES OCTAVOS TIPO 1 ABRAZADERA PARA FIJACIÓN DE CABLE
7.5.4	GRAPA CUADRADA DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE CONCRETO APROBADAS PARA INTEMPERIE.
7.6	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA
7.6.1	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA 2 x 3" PVC
7.6.2	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA 1 x 2" PVC
7.6.3	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA 2 x 2" PVC
7.7	CÁMARAS DE INSPECCIÓN
7.7.1	CAJA DE PASO EN MAMPOSTERÍA 30X30 CMS TIPO AP 280 CODENSA
7.7.2	CÁMARA ENERGÍA CON MARCO Y TAPA 71.5X71.5 CS 274
7.7.3	CÁMARA ENERGÍA CON MARCO Y TAPA 130.5X80.5 CS 275
7.7.4	CÁMARA ENERGÍA CON MARCO Y TAPA 161X130.5 CS 276
8	PAÑETES
8.1	PAÑETES SOBRE MUROS
8.1.1	FILOS Y DILATACIONES
8.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.
8.1.3	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4
8.1.4	Resane de techo con estuco plástico.
8.1.5	Resane de filos con mortero.
8.1.6	RESANES GENERALES
8.1.7	ESTUCO PARA EXTERIORES
8.2	PAÑETES BAJO PLACAS
8.2.1	PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4
8.2.2	PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:5

8.2.3	PAÑETE RUSTICO BAJO PLACAS 1:5
9	PISOS
9.1	BASES PISOS Y AFINADOS
9.1.1	AFINADO PISOS VINISOL MORTERO 1:4 H=4 cm
9.1.2	AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm
9.1.3	Cancha Asfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-A blando + Geotextil
9.1.4	Cancha Asfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-B medio Geotextil
9.1.5	Cancha Asfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-C duros+ geotextil
9.1.6	Placa contrapiso concreto 0.10 m 2500 psi +reforz (fy=60.000 psi).
9.1.7	Fresado y reposición de pavimento flexible E=0,10M
9.2	ACABADOS PISOS
9.2.1	Lijada, pulida y aplicación de cera para piso en madera (3 capas)
9.2.2	ADOQUÍN NATURAL 15 X 15 MOORE O EQUIVALENTE
9.2.3	ADOQUÍN ECOLÓGICO
9.2.4	BALDOSÍN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)
9.2.5	CERÁMICA 33 X 33
9.2.6	GRANITO PULIDO
9.2.7	LOSETA PREFABRICADA CONCRETO TIPO A50 - 40 x 40 x 6 cm (Incluye Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 1:5, Hecho en Obra)
9.2.8	PULIDA Y BRILLO GRANITO
9.2.9	Pulida de baldosa en granito
9.2.10	VINISOL TRAFICO PESADO 3 mm
9.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE PISOS ANCHO 5 CMS INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA
9.2.12	Suministro e instalación de cenefa en granito pulido
9.2.13	Suministro e instalación de piso en madera maciza sapan lacada ; incluye Yumbolon.
9.2.14	DILATADORES PLÁSTICOS PARA PISO.
9.2.15	Piso en gravilla mona.
9.2.16	Suministro e instalación de pintura epóxica para piso, incluye alistamiento de la superficie y media caña
9.2.17	Alistamiento de superficies para aplicación de pintura incluye desengrase.
9.2.18	Picada de alistado endurecido para generar superficie rugosa para instalación de piso en cerámica
9.3	GUARDAESCOBAS
9.3.1	GUARDA ESCOBA EN GRANITO H = 0.065
9.3.2	GUARDA ESCOBA EN GRAVILLA LAVADA
9.3.3	Suministro e instalación de guardaescoba en cerámica Stone Blanco 7,5cm.
9.3.4	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3
9.3.5	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m
9.3.6	MEDIA CAÑA EN GRANITO H = 0.065
9.3.7	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA
10	GRADAS
10.1.1	AFINADO ENDURECIDO P´PASOS ESCALERA MORTERO 1:3

10.1.2	CONCRETO BASE GRADAS DE 0.30 - 3000 PSI
10.1.3	GRADAS EN GRANITO PULIDO DE 0.30
10.1.4	GRADAS EN GRAVILLA LAVADA DE 0.30
10.2	CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES
10.2.1	PIRLAN DE ALUMINIO
10.2.2	CENEFAS EN CONCRETO DE 0.30 - 3000 PSI
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
11.1.1	IMPERMEABILIZACIÓN CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO
11.1.2	MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE
11.1.3	Impermeabilización con Broncosil
11.1.4	RETIRO EMULSIÓN ASFÁLTICA DE PLACA DE CUBIERTA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL(INCLUYE EQUIPOS, COPAS DIAMANTADAS ,RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES CERTIFICADOS EN CUBIERTA
11.1.6	Aplicación de silicona sellante para marcos de ventanas
11.1.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BOQUILLA SOBRE LADRILLO
11,1,8	CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE EXISTENTES
11.2	CUBIERTAS
11.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MODULAR TIPO SÁNDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm. y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGÚN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIÉSTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).
11.2.2	MONTAJE/DESMONTE TEJA ACRÍLICA
11.2.3	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 6
11.2.4	TEJA TRANSPARENTE TIPO AJOVER No 6
11.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
11.2.6	Suministro e instalación de cubierta tipo thermo sky o similar 2.5mm. Incluye accesorios de instalación, andamio, herramientas y equipos
11.2.7	Suministro e instalación de caballete tipo thermo sky o similar 2.5mm. Incluye accesorios de instalación, andamio, herramientas y equipos.
11.2.8	Limpieza y mantenimiento de cubierta en teja Eternit (cambio de tejas dañadas y ajustes de tejas existentes y estructura metálica, tornillería y lijada con grata en cerda metálica.
11.2.9	Suministro e instalación de perfil estructural para cubierta de domos, 4x8 calibre 2MM (100X50), estructura de cama de escombros de tanque de subestación. Incluye andamios y 3 capas de lona de cerramiento

11.2.10	Suministro e instalación de canal PVC para recolección de aguas de lluvias en cubierta inclinada, incluye desagüe para bajantes en los extremos.
11.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS, EN CUBIERTA INCLINADA. INCLUYE DESAGÜE PARA BAJANTES EN LOS EXTREMOS.
11,2,12	DESMONTE Y REUBICACION DE LOSA EN CONCRETO DE 0,5*1,0*0,07m
11.3	ACCESORIOS Y OTROS
11.3.1	CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20
11.3.2	CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20
11.3.3	TRAGANTES Ø 4"
11.3.4	TRAGANTES Ø 6"
11.3.5	Tragante cúpula de 5"x3".
11.3.6	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm.
11.3.7	Flanche cal. 20 en lámina galvanizada desarrollo 30 cm
11.3.8	Suministro e instalación de perfil en C 220 x 80 mm L=6m.
12	CARPINTERÍA METÁLICA
12.1	CARPINTERÍA EN ALUMINIO
12.1.1	VENTANAS ALUMINIO CORREDIZAS + VIDRIO TEMPLADO 5 mm.
12.1.2	VENTANAS ALUMINIO FIJAS + VIDRIO TEMPLADO 5 MM
12.1.3	VENTANAS SERIE 3831 ALUMINIO
12.1.4	VENTANAS SERIE 3831/5020 ALUMINIO
12.1.5	VENTANAS SERIE 5020 ALUMINIO
12.1.6	VENTANAS SERIE 8025 ALUMINIO
12.1.7	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm
12.1.8	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL - INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm
12.1.9	VENTANAS SERIE 3831 ALUMINIO INCLUYE VIDRIO TEMPLADO 5 mm.
12.1.10	Suministro e Instalación de marcos en aluminio soporte 60*60. Incluye pintura electroestática
12.1.11	Bastidor grande: estructura metálica con impresión en banner 13 onzas a 1440 DPI Tamaño: 6,0 x 0,66
12.1.12	Bastidor pequeño: estructura metálica con impresión en banner 13 onzas a 1440 DPI Tamaño: 1,25 x 0,40
12.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUESINA PROYECTANTE EN ALUMINIO PESADO Y POLICARBONATO 6MM.
12.1.14	Suministro e instalación de puerta en acero inoxidable 1,00 X 2,00m
12.1.15	Mantenimiento puertas en aluminio y marco, incluye recorte por cambio de nivel de piso
12.1.16	Suministro e instalación de puertas de medidas entre 740 mm y 900 mm (ancho) x 2.280 mm (alto) con marco profundo. Incluye HOJA entamborada en mdf con relleno para aislamiento acústico (FRESCAZA O HICOPOR) de medidas entre: 740 mm y 900 mm (ancho) x 2.280 mm (alto) x 40 mm (espesor), con herrajes a la vista en acero. Marco profundo de la puerta de acuerdo a las medidas de la puerta 740-900mm (ancho) x 2.280 mm (alto)

	x 210 mm (profundidad) y 36 mm de espesor en triplex fenólico con pintura y diseño especial según referencia.
12.1.17	Suministro e instalación de puerta en aluminio , incluye marco en aluminio, vidrio de 6mm incoloro y cerradura (0,80x2,00m).
12.1.18	Arreglo pasadores para puerta exterior, incluye cadena y candado
12.1.19	Suministro e instalación de ventana de paso de alimentos fabricada en lámina de acero inoxidable calibre 18 tipo 304 acabado satinado y resistente a los ácidos. Marco de 8 cm de ancho asegurado a muro y dintel con epóxica, chazos y tornillos cabeza avellanada y en su parte inferior tendrá un accesorio con orificio para colocación de pasador o candado. Ventana entamborada de 5 cm de espesor con alma en estructura metálica e inyectada en los espacios vacíos con poliuretano para mayor resistencia y absorción de golpes, bisagras en acero inoxidable que permite elevarla y ser asegurada en la parte superior a un ángulo con orificio para colocación de candado o pasador para mayor seguridad. Dimensiones: 1.28X0.28m
12.1.20	Suministro e instalación de puerta para poceta lavatraperos en el patio de rancho fabricada en lámina de acero inoxidable calibre 18 tipo 304 acabado satinado y resistente a los ácidos con los bordes interiores redondeados. Marco de 7,5 cm de ancho anclado a la pared por medio de epóxica, chazos y tornillos cabeza avellanada y con imanes en la parte central superior para mayor adherencia de las puertas y evitar que se abran. Cubierta en lámina de acero asegurada a la pared con chazos, tornillos y con un 5% de pendiente, en todas las juntas sobre la pared se recubrirá con silicona transparente antihongos para una mayor asepsia. Dos puertas plegables de 3 cm de espesor y con alma en estructura metálica e inyectada en los espacios vacíos con poliuretano para mayor resistencia y absorción de golpes con bisagras y manija en acero inoxidable para cada una. Dimensiones: 1.20X1.50m
12.1.21	Suministro e instalación de cárcamos para impedir el paso de los residuos y facilitar la salida del agua, en acero inoxidable calibre 20 tipo 304 acabado satinado y marco superior soldado en ángulo de 1"x1/8" con rejilla compuesta de travesaños en varilla lisa de 3/8" en acero inoxidable, bandeja inferior con medias caña para mejor y rápida limpieza. Dimensiones: 1.0m largo x 0.20m ancho x 0.08m profundidad.
12.1.22	Suministro e instalación de protector para paso de carros transportadores de comida, se compone de soporte cilíndrico en acero inoxidable 304 de una pulgada de diámetro por cinco centímetros de largo con una platina de una pulgada de ancho por 3/16" de espesor la cual se soldara al soporte cilíndrico, la platina llevara un doblez superior y otro inferior, este accesorio se anclara a muro con un chazo expansivo metálico de 1/2" de diámetro por 2" de largo, y de este soporte se asegurara una lámina en calibre 14 de diez centímetros de desarrollo con doblez leve superior e inferior, con tornillo cabeza de avellana en acero inoxidable (los soportes se instalaran en la parte superior e inferior). Dimensiones: 1.0 ml
12.1.23	Suministro e instalación de puerta metálica de 1,03*2,005 con dos hojas tipo panel y bandeja de recibo tipo escritorio incl. 2 cerraduras de seguridad

12,1,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA PARA PROTEGER TUBERIA FABRICADO EN ANGULO 2" Y MALLA DESPLEGADA, HASTA 0,6 MT, ACABADO EN ESMALTE
12,1,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA EN ARCO DE 9M DE LARGO X 1,5M ALTO, CON ANGULO DE 1 1/2" x1/8"
12.2	CARPINTERÍA EN LAMINA
12.2.1	INSTALACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA
12.2.2	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE)
12.2.3	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)
12.2.4	PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE)
12.2.5	PUERTAS VENTANAS LAMINA (ANTIC - ESMALTE)
12.2.6	REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)
12.2.7	REJAS LAMINA (ANTIC - ESMALTE)
12.2.8	REJILLAS PISO Ø 30 cm
12.2.9	VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE)
12.2.10	VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE)
12.2.11	RECONSTRUCCIÓN DE REJAS DE PROTECCIÓN (ANTIC - ESMALTE)
12.2.12	RECONSTRUCCIÓN DE VENTANAS EN LÁMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)
12.2.13	BARANDA Y PASAMANOS TUBO DE 1 1/2"
12.2.14	Suministro e instalación de reja tipo bancaria para ventanas.
12.2.15	cerramiento cuarto maquinas en malla eslabonada en calibre 10 con marco en ángulo 3/16" X1 1/4" y parales en tubo galvanizado 2" incluye puerta de acceso.
12.2.16	puerta persiana para cuarto de máquinas en lámina cal. 18 (1x1,90)m.
12.2.17	puerta persiana para cuarto de máquinas en lámina cal. 18
12.2.18	Reja con malla expandida para ductos en cubierta de (0,90x0,20)m
12.2.19	reja en malla expandida para cuarto de ventilación cubierta zona administrativa h=0,40m
12.2.20	Mantenimiento de puerta doble hoja cuarto ventilación cubierta zona administrativa, incluye retiro de puerta y marco, cambio de marco metálico, reinstalación de puerta, anticorrosivo, esmalte y todo lo necesario para su correcta instalación. 2,0X2,10 M C.18
12.2.21	Mantenimiento portón garaje acceso Cra 9 incluye parte inferior instalación de rodachinas ,arreglo riel, mantenimiento riel y rodachinas parte superior ,incluye pintura anticorrosivo, esmalte y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
12.2.22	MANTENIMIENTO DE PUERTAS INTERNAS 1,00X2,26 ZONA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN (INC CORTES, CAMBIO DE LAMINA OXIDADA POR NUEVA, LIMPIEZA, LIJADA, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, AJUSTE DE BISAGRAS Y PASADORES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
12.2.23	MANTENIMIENTO DE PUERTA REJA PRINCIPAL DE ENTRADA A CELDAS 1,20X2,26 ZONA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN (INC CORTES, CAMBIO DE LAMINA OXIDADA POR NUEVA, LIMPIEZA, LIJADA, ANTICORROSIVO,

	PINTURA ESMALTE, AJUSTE DE BISAGRAS Y PASADORES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
12.2.24	Refuerzo de reja para nichos perimetrales de 37.5 x 37.5, incluye desmontes de reja existente, marco en ángulo 1 1/2 , soldadura para marco, reinstalación , anticorrosivo y esmalte
12.2.25	fabricación, suministro e instalación de puerta con marco de emergencia de 1.00 x 2.20 m en cal 16, anticorrosivo y pintura electrostática
12.2.26	Manija redonda de 40 cm x 6cm en tubo redondo de 11/2 soldada a puerta incluye anticorrosivo y pintura
12.2.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA PARA VENTANA 60x30 cm (INCLUYE MARCO EN ANGULO METÁLICO 3/4" X 1/8", MALLA EXPANDIDA CL 12 X 1/2")
12,2,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCION DE UN METRO DE ALTURA EN TUBERIA REDONDA DE 1 1/4" C-20 AGUA NEGRA , ACABADO EN ESMALTE
12.3	CARPINTERÍA DE MADERA MARCOS Y PUERTAS
12.3.1	HOJA PUERTA FORTEC PROVIDENZA - B = 0.81
12.3.2	HOJA PUERTA FORTEC PROVIDENZA - B = 1.0
12.3.3	HOJA PUERTA FLORMORADO - B = 060
12.3.4	HOJA PUERTA FLORMORADO - B = 080
12.3.5	HOJA PUERTA FLORMORADO - B = 090
12.3.6	HOJA PUERTA FLORMORADO - B = 080
13	ENCHAPES
13.1	ENCHAPE SOBRE MUROS
13.1.1	ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc. win y remate en aluminio)
13.1.2	ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA O EQUIVALENTE
13.1.3	Emboquillado de enchape actual y retiro de boquilla existente
13.1.4	JUEGO DE INCRUSTACIONES
13.2	ENCHAPE SOBRE MESONES
13.2.1	ENCHAPE PARED EGEO 20.5 x 20.5 MESONES
13.2.2	ENCHAPE MESONES B = 60 cm. - CERÁMICA 20 x 20
13.2.3	GRANITO PULIDO MESONES LAVAMANOS - B = 60 cm.
13.2.4	GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN
13.3	VARIOS - ENCHAPES
13.3.1	ENCHAPES EN PIEDRA MUÑECA
13.3.2	PIRLAN DUCHA ACUACER - MACEDONIA 20 x 30 O EQUIVALENTE
13.3.3	ENCHAPE EN MÁRMOL NEGRO SAN GIL 30 x 15 ALFA O EQUIVALENTE
13.3.4	WIN DE ALUMINIO
14	ILUMINACIÓN
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS
14.1.1	INSTALACIÓN DE LÁMPARA FLUORESCENTE (6P) B/PLACA
14.1.2	INSTALACIÓN DE LÁMPARA FLUORESCENTE (4P) B/PLACA
14.1.3	LÁMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMÉTICA
14.1.4	LÁMPARA 4x20 T8 BAJO PLACA - HERMÉTICA

14.1.5	LÁMPARA 4x48 T8 BAJO PLACA - HERMÉTICA
14.1.6	Suministro e instalación de lámparas herméticas
14.1.7	BALASTO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 2X40
14.1.8	BALASTO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 2X48
14.1.9	BALASTO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 2X96
14.1.10	BALASTO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 4X20
14.1.11	BALASTO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 4X48
14.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 200W
14.2	BALAS Y APLIQUES
14.2.1	BALA FLUORESCENTE DE 50 W
14.2.2	BALA INCANDESCENTE 60 W
14.2.3	BALA INCANDESCENTE 150W
14.2.4	Desmonte montaje para reubicación de lámparas bala led de 5" o similar
14.3	LÁMPARAS DE DESCARGA
14.3.1	LUMINARIA SODIO 150 W
14.3.2	LUMINARIA EXTERNA DE SODIO 250W SOBRE MURO
14.3.3	LUMINARIA SODIO 400 W
14.3.4	PROYECTOR SODIO 150 W
14.3.5	REFLECTOR DE PISO 250 W
14.3.6	REFLECTOR DE PISO 400 W
14.3.7	SOPORTE PROYECTORES
14.3.8	Lámpara tipo METAL HALIDE 250 W de Roy Alpha, cerrada uso industrial, similar a la INDULUX-BC sobre techo
14.3.9	LUMINARIA METAL HALIDE 400W
14.3.10	Desmonte de lámparas, no incluye andamio
14.3.11	Desmonte de lámparas, incluye andamio
14.3.12	Suministro e instalación de tapa eléctrica metálica.
14.4	ALUMBRADO ORNAMENTAL P´EXTERIORES
14.4.1	SALIDA PARA LÁMPARA SODIO 250W ALUMBRADO EXTERIOR
14.4.2	LÁMPARA P´ALUMBRADO PUBLICO SODIO 250W - 208V TIPO CALIMA II, ALUMBRADO PERIMETRAL POSTE METÁLICO 9 m.
14.4.3	FAROL ORNAMENTAL 150 W SODIO EN POSTE METÁLICO, 6 m X 3", SIMILAR A LA DJK DE ROY ALPHA (ZONAS VERDES)
14.4.4	PANTALLA LED 24W 60X60 DE INCRUSTAR
14.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED DE 2X19 W PARA SOBREPONER , INCLUYE TUBOS
14.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO BALA LED DE 1X8 W PARA INCRUSTAR , INCLUYE LED
14.4.7	Suministro e instalación de lámpara exterior tipo tortuga de 10w con rejilla color negro. (Incluye Bombillo)
14.4.8	Suministro e instalación de Reflector de 100W
14.4.9	Suministro e instalación de Reflector de 50W
15	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
15.1	APARATOS SANITARIOS
15.1.1	DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACIÓN)

15.1.2	GRIFERÍA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXIÓN Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR.
15.1.3	KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN P´ORINAL, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR
15.1.4	GRIFERÍA LAVAMANOS. (SUM E INSTALACIÓN)
15.1.5	GRIFERÍA LAVAPLATOS PRISMA SOBREPONER (SUM E INSTALACIÓN)
15.1.6	INSTALACIÓN DE FLOTADOR PARA SANITARIOS
15.1.7	INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAMANOS
15.1.8	INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAPLATOS
15.1.9	INSTALACIÓN DE GRIFERÍA ORINAL
15.1.10	INSTALACIÓN DE GRIFERÍA SANITARIOS
15.1.11	INSTALACIÓN DE LLAVES INDIVIDUALES
15.1.12	INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS (SÓLO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON DESMONTE DEL MISMO APARATO SANITARIO)
15.1.13	LAVAMANOS BLANCO ACUACER (SUM E INSTALACIÓN)
15.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER.
15.1.15	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF. 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR.
15.1.16	KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN P´ORINAL, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR
15.1.17	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXIÓN Ø 5/8" REF. 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR.
15.1.18	SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO PARA CONEXIÓN POSTERIOR DE ALTA PRESIÓN TIPO MANCESA Ó SIMILAR CON GRIFERÍA ANTIVANDALICA (SUM E INSTALACIÓN).
15.1.19	SANITARIO ACUACER BLANCO (SUM E INSTALACIÓN)
15.1.20	POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERÍA (SUM E INSTALACIÓN)
15.1.21	SANITARIO CON GRIFERÍA ANTIVANDALICA (SUM E INSTALACIÓN)
15.1.22	SANITARIO INSTITUCIONAL FLUXÓMETRO (SUM E INSTALACIÓN)
15.1.23	SANITARIO MINUSV. FLUXÓMETRO (SUM E INSTALACIÓN)
15.1.24	SANITARIO ACUACER BLANCO (SUM E INSTALACIÓN)
15.1.25	SANITARIO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXIÓN SUPERIOR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA DE ALTA PRESIÓN
15.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI
15.1.27	CAMBIO DE ACOPLE SANITARIO
15.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL MANCESA O SIMILAR
15.1.29	Suministro e instalación de sanitario
15.1.30	ASEGURAR LAVAMANOS DE PEDESTAL.
15.1.31	Suministro e instalación de grifería lavamanos de mesón con sensor cuello alto, agua fría, con sistema de generador incorporado, consumo 1,0 gpm, metálica cromada, Importada.
15.1.32	Suministro e instalación de acople para lavamanos, 40 cms de largo, metálico cromado, Importado.

15.1.33	Suministro e instalación de barra de seguridad abatible en acero inoxidable, Importado.
15.1.34	Suministro e instalación de barra de seguridad 24" de largo, en acero inoxidable satinado, de sobreponer en la pared con escudo y tornillos escondidos, incluye tornillos en acero inoxidable. Importado Moen o similar.
15.1.35	Suministro e instalación de lavamanos de colgar con un solo orificio cumple con la ADA.
15.1.36	Suministro de punto sanitario D= 3"
15.1.37	Desmonte e instalación de aparato sanitario en celda existente. Incluye retiro de cordón de Sika, corte de tornillos, suministro de tornillos, tuercas, arandelas y soldaduras. No incluye accesorios PVC-P ni tubería sanitaria.
15.1.38	Desmonte de push existente, instalación de push antivandálico en duchas. Incluye demolición de muro en concreto, ampliación de hueco en platina de acero y adaptación de platina con tornillos.
15.1.39	Desmonte e instalación de émbolo push antivandálico para sanitario o ducha.
15.1.40	Suministro e instalación de codo metálico antivandálico para sanitario. Incluye desmonte.
15.1.41	Suministro e instalación de extensor en bronce con roscas en los extremos, escudos y contratuerca.
15.1.42	Suministro e instalación de tubería p.v.c Conduit de 11/2"
15,1,43	LLAVE GALVANIZADA ARMADA CON REGISTRO DE BOLA 1/2", CODO GALVANIZADO 1/2", NIPLE 1/2" GALVANIZADO
15,1,44	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO COMBINADO CON LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE
15,1,45	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE ALTA PRESION EN ACERO INOXIDABLE
15.2	ACCESORIOS
15.2.1	BARRAS AYUDA MINUSVÁLIDOS (SUM E INSTALACIÓN)
15.2.2	DISPENSADOR DE PAPEL A. INOXIDABLE.
15.2.3	DISPENSADOR JABÓN DE 36 ONZA ACERO INOX
15.2.4	DISPENSADOR TOALLAS ACERO INOX. (SUM E INSTALACIÓN)
15.2.5	JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E INSTALACIÓN)
15.2.6	PAPELERA ACERO INOX. 400 MS (SUM E INSTALACIÓN)
15.2.7	PAPELERA ACUACER (SUM E INSTALACIÓN)
15.2.8	REJILLA CON SOSCO 3 x 2" (SUM E INSTALACIÓN)
15.2.9	REJILLA PLÁSTICA 3 x 2" (SUM E INSTALACIÓN)
15.2.10	REJILLA SIFÓN 20 x 20" (SUM E INSTALACIÓN)
15.2.11	REJILLA SIFÓN S 4.5 x 3.5" (SUM E INSTALACIÓN)
15.2.12	REJILLA VENTILACIÓN 15 x 15 (SUM E INSTALACIÓN)
15.2.13	REJILLA VENTILACIÓN 20 x 20 (SUM E INSTALACIÓN)
15.2.14	TAPARREGISTRO 15 x 15 (SUM E INSTALACIÓN)
15.2.15	TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACIÓN)
15.2.16	SECADOR ELÉCTRICO P´MANOS (SUM E INSTALACIÓN)
15.2.17	Suministro e instalación de desagüe con rejilla para lavamanos, sencillo, con rebose, metálico, cromado.

15.2.18	Suministro e instalación de sifón en P, para lavamanos, metálico cromado. Importado.
15.2.19	Suministro de tapa para tanque sanitario.
15,2,20	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES DE 16" INCLUYE SOPORTE, USO DE ANDAMIO Y EQUIPOS PARA TRABAJAR EN ALTURAS
15,2,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE 8" DE MURO
15.3	OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
15.3.1	LLAVE INDIVIDUAL LAVAMANOS (SUM E INSTALACIÓN)
15.3.2	LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACIÓN)
15.3.3	LLAVE TERMINAL CROMADA Ø 1/2" (SUM E INSTALACIÓN)
15.3.4	TANQUE PLÁSTICO 1000 LTS. (SUM E INSTALACIÓN)
15.3.5	INSTALACIÓN TANQUE P´SANITARIO (M.O.)
15.3.6	REVISIÓN y REPARACIÓN TANQUE P´SANITARIO (LAVADO, CAMBIO FLOTADOR y ACCESORIOS)
15.3.7	TANQUE PLÁSTICO 5000 LTS. (SUM E INSTALACIÓN)
15.3.8	Cambio de llave para mezclador lavamanos 8".
15.4	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACIÓN)
15.4.1	SANITARIO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXIÓN POSTERIOR DE ALTA PRESIÓN TIPO MANCESA O SIMILAR
15.4.2	SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESIÓN P´SANITARIO DE CONEXIÓN POSTERIOR, DOCOL Ó SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN POSTERIOR)
15.4.3	SANITARIO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXIÓN SUPERIOR DE ALTA PRESIÓN TIPO MANCESA Ó SIMILAR
15.4.4	KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, DOCOL Ó SIMILAR
15.4.5	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO CONEXIÓN Ø 5/8" REF. 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR
15.4.6	SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESIÓN P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL Ó SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN POSTERIOR)
15.4.7	LAVAMANOS REDONDO EN ACERO INOX 304 PULIDO, INT 34 CM - EXT 38 CM - H 15 CM, 43-AA-94106 TRAMONTINA Ó SIMILAR.
15.4.8	GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR
15.4.9	DUCHA ANTIVANDÁLICA DE ACCIÓN HIDROMECÁNICA, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-17125106 DOCOL Ó SIMILAR
15.4.10	SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P´CONEXIÓN SUPERIOR REF. 21-AA-2640 MANCESA Ó SIMILAR
15.4.11	KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA, METÁLICO CROMADO IMPORTADO, REF. 4-AA-880 DOCOL Ó SIMILAR.

15.4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI
15.4.13	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO
15.4.14	LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERÍA RESISTENTE A QUÍMICOS, DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGÜE Y SIFÓN CROMADOS , SUMINISTRO Ø 1/2", PRESIÓN ENTRE 40 y 60 PSI - REF. 12-AA-7260-BT DOCOL Ó SIMILAR.
15.4.15	Suministro e instalación de push antivandálico para sanitario.
15,4,16	SUMINISTRO DE PUSH E INSTALACIÓN DE REGADERA PARA DUCHA ANTIVANDALICA (INLCUYE RECORES, MANGUERAS Y PERFORACIÓN DE PANTALLA EN CONCRETO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)
15,4,17	INSPECCION, DIARIA Y ARRANQUE DE CALDERA
15,4,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH LEED, CONEXIÓN Ø 1/2", O SIMILAR
16	CIELOS RASOS Y DIVISIONES
16.1	CIELOS RASOS
16.1.1	ARMADURA MADERA Y MALLA
16.1.2	CIELO RASO BÓVEDAS DRYWALL
16.1.3	CIELO RASO PLANO DRYWALL
16.1.4	Suministro e instalación de muro en drywall para cerramiento (una cara)
16.1.5	CIELO RASO YESO (OCULTO Y/O SEMIOCULTO)
16.1.6	CIELO RASO DURACUSTIC 5/8"
16.1.7	CIELO RASO EN LAMINA PLANA ETERNIT 122 X 122 X 4
16.1.8	Cielo raso en lámina alfajor cal. 14 incluye estructura de soporte metálica con tubería pesada 4*8, platina de 1 1/2"*1/8, con soldadura pesada 70/18 y anclado al concreto con perno y chazo expansivo de 1/2 *2 1/2".
16.1.9	Suministro e instalación de tapa para cielo raso en lámina de alfajor. (1,00*1,00)
16.1.10	Nivelación de cielo raso
16.1.11	Suministro e instalación de cornisa en yeso para cielo raso
16.1.12	LAMINA PLANA ETERNIT 244 x 122 x 6
16.1.13	LAMINA PLANA ETERNIT 122 x 61 x 4
16.1.14	LISTÓN M.H. PINO ROMERON
16.1.15	LISTÓN M.H. PEINE MONO
16.1.16	LISTÓN M.H. AMARILLO
16.1.17	LUXALON ACERO ACÚSTICO 80B
16.1.18	LUXALON ACERO 130B LISO DECOR
16.1.19	LUXALON ACERO 84R COBR V5 DECOR
16.1.20	LUXALON MADERALUM 84R V5 ACUSTIC
16.1.21	MALLA PARA PAÑETAR
16.1.22	TABLEX 19 mm
16.1.23	TRIPLEX PIZANO RH 2.44 x 1.53 - 9 mm
16,1,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO REDONDO TIPO BURBUJA EN ACRILICO COLOR CRISTAL DE 3MM DE ESPESOR, DIAMETRO HASTA 1.00 M, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
17	DIVISIONES

17.1.1	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE
17.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑOS EN LAMINA CALIBRE 18 (INC PINTURA HORNO)
18	PINTURA
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA
18.1.1	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERÍA
18.1.2	ESTUCO
18.1.3	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS
18.1.4	FILOS Y DILATACIONES
18.1.5	VINILO S/PAÑETE - 2 MANOS
18.1.6	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS
18.1.7	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS
18.2	PINTURA SOBRE METAL
18.2.1	ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA
18.2.2	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL
18.2.3	ESMALTE S/ LAMINA LLENA
18.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL
18.2.5	ESMALTE S/ MARCOS LAMINA
18.2.6	WASH-PRIMER S/ALUMINIO
18.3	PINTURA SOBRE MADERA
18.3.1	BARNIZ S/MUEBLES
18.3.2	ESMALTE S/ MADERA LLENA
18.3.3	ESMALTE S/ MADERA LINEAL
18.3.4	ESMALTE S/ MARCOS MADERA
18.3.5	ESMALTE S/MUEBLES
18.3.6	LACA PISOS MADERA
18.3.7	TINTILLA S/ MUEBLES
18.3.8	TINTILLA S/ MADERA LLENA
18.3.9	TINTILLA S/ MADERA LINEAL
18.4	VARIOS - PINTURA
18.4.1	HIDROFUGO FACHADAS
18.4.2	COLORPLAST FACHADA
18.4.3	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)
18.4.4	ESTUCO Y PINTURA TABLEROS
18.4.5	LÍNEAS TRAFICO 0.10
18.4.6	MARMOPLAST FACHADA
18.4.7	SILCOPLAST FACHADA
18.4.8	PINTURA EPÓXICA
18.4.9	Remoción de pintura suelta manual.
18.4.10	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS
18.4.11	Suministro de pintura para Murales GALONES
18.4.12	Aplicación de pintura epóxica máximo 30cm
18.4.13	Aplicación de pintura epóxica para pisos

18,4,14	UMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTICAPA EN RESINA EPOXICA INCLUYE DESTRONCADA CON DOBLE SELLO
18,4,15	LINEAS DE DEMARCACION EN RESINA EPOXICA DE 0,1 m DE ANCHO
18,4,16	PINTURA EPOXICA BLANCA PARA TECHOS (DOS MANOS)
19	CERRADURAS Y VIDRIOS
19.1	CERRADURA SAFE ALCOBA CLASIC 141 - ALUMINO SATINADO
19.1.1	CERRADURA SAFE BAÑO CLASIC 152 - ALUMINO SATINADO
19.1.2	CERRADURA SAFE CLOSET 145 ALUMINIO SATINADO
19.1.3	CERRADURA SAFE ENTRADA 142A ALUMINIO SATINADO
19.1.4	CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL
19.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE LF 5308 O EQUIVALENTE
19.1.6	CERRADURA SAFE SOBREPONER 143A ALUMINIO SATINADO
19.1.7	CERRADURA SAFE TERRAZA 149 ALUMINIO SATINADO
19.1.8	CERRADURA SCHLAGE ALCOBA A-50 WS
19.1.9	CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S
19.1.10	CERRADURA SCHLAGE CLOSET A-71 WS
19.1.11	CERRADURA SCHLAGE ENTRADA A-80 PD
19.1.12	CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD
19.1.13	CERRADURA SCHLAGE PASO A-10 S
19.1.14	CERRADURA SCHLAGE TERRAZA A-30 S
19.1.15	INSTALACIÓN POMA
19.1.16	Mantenimiento preventivo a cerraduras de celdas. Incluye desmonte y montaje, lubricación de cilindro e interna y retiro de residuos u objetos extraños. No incluye emergencia.
19.1.17	Fabricación y suministro de llave nueva para cerraduras Medeco de puertas de celdas. El Presente valor aplica para cantidad menor o igual a 5 unidades de llaves por requerimiento.
19.1.18	Fabricación y suministro de llave nueva para cerraduras Medeco de puertas de celdas. El Presente valor aplica para cantidad mayor o igual a 6 unidades de llaves por requerimiento.
19.1.19	INSTALACIÓN PORTÓN MADERA
19.2	HERRAJES
19.2.1	BRAZO RETENEDOR DORMA No. 2
19.2.2	BISAGRA DE VAIVÉN
20	VIDRIOS Y ESPEJOS
20.1.1	ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm
20.1.2	INSTALACIÓN ESPEJOS (M.O.)
20.1.3	VIDRIO CRUDO INCOLORO 4 mm - TIPO PELDAR O SIMILAR
20.1.4	VIDRIO CRUDO INCOLORO 5 mm - TIPO PELDAR O SIMILAR
20.1.5	VIDRIO CRUDO INCOLORO 6 mm - TIPO PELDAR O SIMILAR
20.1.6	VIDRIO CRISTAL TEMPLADO BRONCE - 6 mm
20.1.7	VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO - 6 mm

20.1.8	VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO - 10 mm
20.1.9	VIDRIO GRABADO INCOLORO - 4 mm
20.1.10	Suministro e instalación de vidrio de seguridad (Incluye película)
20.1.11	Mantenimiento y ajuste de puerta en vidrio de seguridad, Incluye desmonte, ajuste, nivelación, lubricación y reinstalación
20.1.12	Suministro e instalación de puerta de 1.200 mm (ancho) x 2.280 mm (alto) con montante fijo con vidrio a doble cara y marco profundo. Incluye HOJA entamborada en mdf con relleno para aislamiento acústico (FRESCAZA O HICOPOR) de medidas: 900 mm (ancho) x 2.280 mm (alto) x 40 mm (espesor), con herrajes a la vista en acero. MONTANTE fijo reticular de 300 mm (ancho) x 2.280 mm (alto) x 210 mm (profundidad) y 36 mm de espesor, con divisiones cada 310 mm; con vidrio espejo de fábrica en 4mm ennichado dentro del montante hacia la cara exterior y vidrio laminado de 4mm ennichado en la cara interior. Marco profundo de la puerta y del montante de 1.200 mm (ancho) x 2.280 mm (alto) x 210 mm (profundidad) y 36 mm de espesor en triplex fenólico con pintura y diseño especial según referencia.
20.1.13	Suministro y reposición de Vidrio Templado - Laminado 4MM+ 2 PVB 0.38 Hielo+4MM
20.1.14	Suministro e instalación de película reflectiva para vidrios
20.1.15	Vidrio laminado 3-3 de seguridad 60*23
20.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 5 + 5 LAMINADO EN CRUDO (60X35) + PELÍCULA ESPEJO + PERFIL EN ALUMINIO
20.1.17	LIMPIEZA DE VIDRIOS
20.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 3 + 3 LAMINADO + PERFILARÍA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA - REF. ALU. 8025
21	OBRAS EXTERIORES
21.1	ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS
21.1.1	ADOQUÍN CONCRETO COLOR GRIS TRAFICO PESADO 20x10x8cm (Inc. Sumin., Instalación y Compactación. Inc. 4cm Arena de Peña)
21.1.2	BASE ASFALTO MDCI 1350 - E = 7 cm
21.1.3	JUNTAS DILATACIÓN ASFALTO
21.1.4	RODADURA B-1350. 2.5 CMS
21.1.5	SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)
21.1.6	BASE ESTABILIZADA B-600 - CEMENTO 5%
21.1.7	RODADURA B-1350 - E= 10 cm
21.1.8	BORDILLO PREFABRICADO A80 Suministro e Instalación Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI
21.1.9	SARDINEL TIPO A10 Suministro e Instalación Incluye 3cm Mortero 2000 PSI 3HUECOS
21.1.10	ESCALERA EN CONCRETO AFINADO SOBRE TERRENO (VER PLANOS y ESPECIFICACIÓN)
21.2	CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO
21.2.1	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA
21.2.2	CERRAMIENTO EN MAMPOSTERÍA H=2,40 m

21.2.3	PORTÓN EN TUBO Y MALLA ONDULADA
21.2.4	CERRAMIENTO TÍPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACIÓN H= 2.40
21.2.5	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=2.50M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓN EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES. VIGA=30*30 CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.
21.2.6	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M,(ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO. DE 3" E= 3,81MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.
21.2.7	Suministro e instalación de anjeo en fibra de vidrio gris en áreas de ventanas y puertas para impedir el paso de roedores y basuras hacia la parte interior del sitio. Incluye desmonte.
21.2.8	Suministro e instalación de malla tipo zaranda 14*14 en acero galvanizado soportado en ángulo metálico de 3/4 de pulgada por 1/8 pisado con una platina de 1/2 pulgada, el ángulo y la platina tendrán acabado en anticorrosivo y pintura tipo esmalte, el anjeo no llevará procesos de pintura por ser galvanizado, la fijación se hará por medio de tornillería tipo avellana.
21.2.9	CANECA TIPO M120 (En malla metálica. Incluye Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra).
21,2,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR EN VARILLA CUADRADA (3/4") METÁLICO CON ÁNGULO EN LAMINA DE 1/8" DE ESPESOR, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y SONDADURA.
21,2,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO PLASTICO
21.3	ZONAS VERDES
21.3.1	ARBOLES
21.3.2	JARDINERAS
21.3.3	JARDINES ORNAMENTALES
21.3.4	PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA)
21.3.5	TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACIÓN
21.4	OTROS - ZONAS EXTERIORES
21.4.1	CUNETA TRAPEZOIDAL 3000 PSI RFZO. H:20 - B:30 - b:20 (INC. BASE EN RECEBO)
24.4.2	CANAL EN CONCRETO CON LADRILLO REJILLA SECCIÓN ,20 X ,40
21.4.3	CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5).
21.4.4	SERVICIO DE GRÚA PH(INCLUYE CANASTA PARA CARGA Y TRASIEGO DE MATERIALES Y ESCOMBROS)
22	ASEO Y LIMPIEZA
22.1	ASEO GENERAL
22.1.1	LIMPIEZA DE FACHADAS
22.1.2	LIMPIEZA MUROS INTERIORES
22.1.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES
22.1.4	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES
22.1.5	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN

22.1.6	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS
23	EQUIPOS
23,1,1	MANTENIMIENTO SEMESTRAL SISTEMA DE CALDERA CONTINENTAL DE 100 BHP
23,1,2	MANTENIMIENTO SEMESTRAL EQUIPOS DE DETECCIÓN DE METALES. EXISTENTES EN LA CARCEL
23,1,3	PRUEBA DE DESEMPEÑO O PITOMETRIA PARA BOMBA DE SISTEMA CONTRA INCENDIO
23,1,4	SUMINISTRO -INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA PARA IMPERMEABILIZAR TANQUE DE AGUA POTABLE
23,1,5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIOS
23,1,6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SECADORA 70KG
23,1,7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORA DE 70 KG
23,1,8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRENSA DE PLANCHADO
23,1,9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y PRUEBAS
23,1,10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ANUALES DEL SISTEMA DE EXTINCION DE LA RED CONTRAINCENDIOS
23,1,11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJE DE IMPULSION BOMBA VERTICAL DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y PRUEBAS

De las actividades anteriormente mencionadas, se realizarán pruebas o ensayos en aquellas que así lo requieran. Para las demás, se llevará a cabo la inspección correspondiente de los suministros, desmontes, mantenimientos, aseo, limpieza, entre otras, con el fin de verificar que se encuentren ejecutadas de la mejor manera y con la calidad que caracteriza al **CONSORCIO EDU 2025.**

17.4.4. Registro y Documentación de Inspecciones y Pruebas

- ✓ **Registro de Inspecciones:** Todos los resultados de las inspecciones deben ser registrados en formatos específicos, incluyendo la identificación del elemento inspeccionado, fecha, inspector responsable, observaciones y cualquier acción correctiva tomada.
- ✓ **Registro de Pruebas:** Los resultados de todas las pruebas realizadas deben ser documentados y archivados. Estos registros deben incluir detalles sobre los métodos de prueba, resultados obtenidos y cualquier desviación detectada.
- ✓ **Reporte de No Conformidades:** Cualquier no conformidad detectada durante las inspecciones o pruebas debe ser reportada inmediatamente al Responsable de Calidad, quien gestionará las acciones correctivas correspondientes.

17.4.5. Acciones Correctivas

- ✓ **Identificación de No Conformidades:** En caso de detectar no conformidades durante las inspecciones o pruebas, se documentará el hallazgo y se determinarán las acciones correctivas necesarias.
- ✓ **Implementación de Acciones Correctivas:** Las acciones correctivas serán implementadas bajo la supervisión del Responsable de Calidad, y su eficacia será verificada mediante inspecciones adicionales.

17.4.6. Revisión y Mejora Continua

- ✓ **Evaluación de Resultados:** Los resultados de las inspecciones y pruebas serán revisados periódicamente por el Comité de Calidad del **CONSORCIO EDU 2025** para identificar oportunidades de mejora
- ✓ **Actualización del Procedimiento:** Basado en la experiencia y los resultados obtenidos, este procedimiento será revisado y actualizado para mejorar continuamente su eficacia.

17.5. REGISTROS

- Actas de entrega parcial.
- Resultados de pruebas y ensayos.
- Inspecciones de áreas.
- Acta de entrega final.

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — COLOMBIA 2024
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — AMÉRICA LATINA 2019

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
8950824584

PÓLIZA No: 895 - 47 - 994000008920 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS BOGOTÁ FÁCIL SEGUROS LTDA** COD. AGENCIA: 895 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	10	2025	17	10	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

DIRECCIÓN: CL 8 F # 79 - 94 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3118461620

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

BENEFICIARIO: **BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	14/10/2025	15/01/2027	490,369,392.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	14/10/2025	15/05/2029	245,184,696.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	490,369,392.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 80212380 - RUSSY LADINO, WILVER FRANCINY - PART: 10.00%
NIT 901109885 - WRUSSY INGENIEROS SAS - PART: 90.00%

BENEFICIARIOS
NIT 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.8154784, DE FECHA 03/09/2025, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *1,225,923,480.00	$ **********0	$********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
ABILITY AGENCIA DE SEGUROS E INVERSI	6141	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000895082458

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

C6D12578070CFE7A5E

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS BOGOTÁ FÁCIL SEGUROS LTDA COD. AGENCIA: 895 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000008920** ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

ASEGURADO: **BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

BENEFICIARIO: **BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

TEXTO ITEM 1

LOTE 7

NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 2 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA

POR DISPOSICIÓN DEL ARTIULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO AL CONTRATO DE OBRA NO.CO1.PCCNTR.8154784 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE ACLARAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS DE LA PRESENTE POLIZA

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2024
Somos a Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
8950824592

PÓLIZA No: 895 -74 - 994000005611 **ANEXO:4**

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS BOGOTÁ FÁCIL SEGUROS LTDA** COD. AGE: 895 RAMO: 74 PAP:

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS		DIA	MES	AÑO
VIGENCIA DE LA PÓLIZA	05	04	2026	23:59		15	05	2026	23:59	40		31	10	2025
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	DIAS		FECHA DE IMPRESIÓN		
FECHA DE EXPEDICIÓN	31	10	2025											

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION

VIGENCIA DEL ANEXO	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
	05	04	2026	23:59		15	05	2026	23:59	40
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

DIRECCIÓN: CL 8 F # 79 - 94 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3118461620

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

DIRECCIÓN: CL 8 F # 79 - 94 CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL** TELÉFONO: 3118461620

BENEFICIARIO: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CONSORCIO EDU 2025 NIT : 901977278

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.

DIRECCION: AVENIDA EL DORADO N 66-63

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 427,050,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	427,050,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	427,050,000.00		
	RCE PATRONAL	427,050,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	427,050,000.00		
	GASTOS MEDICOS	427,050,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BENEFICIARIOS
NIT 901977278 - CONSORCIO EDU 2025

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No CO1.PCCNTR.8154784 REFERENTE A ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

LOTE 7

ASEGURADO: CONSORCIO EDU2025 NIT 901.977.278-1 Y/O SECRETARIA DE EDUCACION NIT. 899.999.061-9

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*******0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
ABILITY AGENCIA DE SEGUROS E INVERSI	6141	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR **FIRMA TOMADOR**

(415)7701861000019(8020)000000000007000895082459

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

C6D12578070CF87B58 CLIENTE ALFORERO 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS BOGOTÁ FÁCIL SEGUROS LTDA COD. AGENCIA: 895 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000005611** ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

ASEGURADO: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

BENEFICIARIO: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

TEXTO ITEM 1

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y/O SECRETARIA DE EDUCACION NIT. 899.999.061-9

LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CUENTA CON UN AMPARO BÁSICO.
1.1 AMPARO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.
1.2 AMPARO CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS SALVO EN EL EVENTO EN QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
1.3 AMPARO VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.
1.4 AMPARO PATRONAL.
1.5 AMPARO GASTOS MÉDICOS.
1.6 AMPARO GASTOS DE DEFENSA.
1.7 AMPARO PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
1.8 AMPARO DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

TODAS LAS COBERTURAS QUE SE INDICAN ESTÁN CONTEMPLADAS DENTRO DE LA SUMA ASEGURADA DEL AMPARO BÁSICO, CUYO VALOR SERÁ EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE LA PRESENTE POLIZA SE ENCUENTRA ACTUALIZADA CONFORME AL ACTA DE INICIO DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025.

SE ACLARA LA VIGENCIA ASI:
DESDE 14/10/2025 HASTA 15/05/2026

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 03/09/2025

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000005611 **ANEXO:** 4 **TIPO DE MOVIMIENTO:** 0 **PAGINA:** 3

TOMADOR: CONSORCIO EDU 2025 **IDENTIFICACION:** 901.977.278-1

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CONSORCIO EDU 2025	901977278-1	AVENIDA EL DORADO N 66-63	BOGOTÁ, D.C.	0.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE TODO RIESGO CONTRATISTA

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2024
Somos a Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
8950827934

PÓLIZA No: 895 -86 - 994000000031 ANEXO:4

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS BOGOTÁ FÁCIL SEGUROS LTDA** COD. AGE: 895 RAMO: 86 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO)	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO)
31 / 10 / 2025	14 / 10 / 2025 / 23:59	15 / 05 / 2026 / 23:59	213	31 / 10 / 2025

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION

VIGENCIA DEL ANEXO	DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	DIAS
	05 / 04 / 2026 / 23:59	15 / 05 / 2026 / 23:59	40

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**
DIRECCIÓN: CL 8 F # 79 - 94 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3118461620

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**
DIRECCIÓN: CL 8 F # 79 - 94 CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL** TELÉFONO: 3118461620
BENEFICIARIO: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CONSORCIO EDU 2025 NIT : 901977278

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.

DIRECCION: CALLE 8F No. 79-94

ACTIVIDAD: C29 - CONTRATISTAS

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: SERVICIOS MANZANA: 8F-80

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
OBRA CIVIL		$ 2,451,846,958.00		
	AMPARO PRINCIPAL	2,451,846,958.00		
	TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMOTO Y ERUPCION VOLCANICA.	2,451,846,958.00		
	ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL O POPULAR, HUELGA,	2,451,846,958.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV en AMPARO PRINCIPAL; 3.00 % SOBRE VALOR DE LA OBRA O PROYECTO - Mínimo: 3.00 S.V.P en TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMOTO Y ERUPCION VOLCANICA.; 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 5.00 SMMLV en ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL O POPULAR, HUELGA, ACTOS DE AUTORIDAD Y ACTOS MAL INTENCIONADOS

BENEFICIARIOS
NIT 901977278 - CONSORCIO EDU 2025

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*******0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
ABILITY AGENCIA DE SEGUROS E INVERSI	6141	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000895082793

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

C6D12578070CF87B57

CLIENTE

ALFORERO 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

POLIZA SEGURO DE TODO RIESGO CONTRATISTA

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS BOGOTÁ FÁCIL SEGUROS LTDA COD. AGENCIA: 895 RAMO: 86 No PÓLIZA: **994000000031** ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

ASEGURADO: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

BENEFICIARIO: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

TEXTO DE LA POLIZA

OBJETO DEL SEGURO

Aseguradora Solidaria de Colombia, en consideración a las declaraciones que aparecen en la solicitud presentada para esta póliza, las cuales serán base y parte integrante de la misma, y con sujeción a la suma asegurada y a los demás términos, condiciones y/o excepciones del presente contrato, conviene en amparar al asegurado contra los daños y/o pérdidas materiales ocurridos durante la vigencia del seguro.

TOMADOR CONSORCIO EDU 2025
ASEGURADO BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION, CONSORCIO EDU 2025
BENEFICIARIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION, CONSORCIO EDU 2025

PROYECTO CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.8154784

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. SEGÚN CONDICIONES DEL CONTRATO

DIRECCIÓN PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, BOGOTA

CIUDAD/ DEPARTAMENTO BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

AMPAROS BÁSICOS PRINCIPALES

AMPARO

AMPARO A. Todo riesgo de pérdida o daño material por cualquier causa no expresamente excluida en las condiciones generales de la póliza, ni amparable bajo los amparos adicionales B, C y D, aplicable a demás eventos mencionados, incluyendo incendio, explosión, impacto de rayo, extinción de incendio, daños por agua; negligencia, impericia, descuido, sabotaje por empleados del Tomador de la póliza sin uso de explosivos; corto circuito, arco voltaico, sobretensión, acción indirecta de la electricidad atmosférica; caída de aeronaves o parte de ellas.

VALOR ASEGURADO / SUBLÍMITES Hasta el 100% del valor asegurado.

DEDUCIBLE 10.00% del valor de la pérdida, mínimo 3 SMMLV

AMPARO B. Terremoto, temblor, erupción volcánica, maremoto o tsunami.

VALOR ASEGURADO / SUBLÍMITES Hasta el 100% del valor asegurado

DEDUCIBLE 3.00% del valor del proyecto al momento del siniestro, mínimo 3 SMMLV

AMPARO C. Ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundaciones, desbordamiento y alza del nivel de aguas, enfangamiento, hundimientos o deslizamiento de terreno, derrumbes, caída de rocas y desprendimiento de tierra.

VALOR ASEGURADO / SUBLÍMITES Hasta el 100% del valor asegurado

DEDUCIBLE
12.00% del valor de la pérdida, mínimo 5 SMMLV

AMPARO AMIT HMACCP ST. Amparo para asonada, motín, conmoción civil o popular, huelga, actos mal intencionados, sabotaje y terrorismo.

VALOR ASEGURADO / SUBLÍMITES Hasta 100% del valor asegurado

DEDUCIBLE 10.00% del valor de la perdida, 5 SMMLV

ACTOS DE AUTORIDAD. La cobertura se extiende a amparar las pérdidas, destrucción física o daños materiales de los bienes asegurados, ordenados por la autoridad competente con el propósito de aminorar o evitar la propagación de cualquier siniestro amparado.

POLIZA SEGURO DE TODO RIESGO CONTRATISTA

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS BOGOTÁ FÁCIL SEGUROS LTDA COD. AGENCIA: 895 RAMO: 86 No PÓLIZA: **994000000031** ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

ASEGURADO: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

BENEFICIARIO: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

TEXTO DE LA POLIZA

VALOR ASEGURADO / SUBLÍMITES Hasta el 50% del valor asegurado

DEDUCIBLE 10.00% del valor de la pérdida, mínimo 5 SMMLV

AMPAROS ADICIONALES

Munchener 005 cronograma de avance de los trabajos de construcción.

VALOR ASEGURADO / SUBLÍMITES
4 semanas

DEDUCIBLE No aplica

COBERTURA DE GASTOS POR OCURRENCIA DE SINIESTROS

10.00% VA evento /20.00% VA vigencia. Máximo: $200.000.000
Sublímite: $50.000.000 evento / $200.000.000 vigencia.

AMPARO G - Remoción de escombros.
Munchener 006 - Amparo de gastos adicionales. Flete expreso, y los gastos extraordinarios por concepto de horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días feriados y flete expreso.
Munchener 007 - Amparo de gastos adicionales por flete aéreo.
Gastos para la extinción, para evitar la extensión y propagación del siniestro.
Gastos para la preservación de los bienes asegurados.
Amparo de gastos adicionales por honorarios profesionales y gastos de viaje y estadía.
Gastos adicionales de salvamento y rescate.
Gastos para la demostración de la ocurrencia y cuantía de la pérdida.

DEDUCIBLE

Aplica el del amparo afectado

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

1. Condiciones de acuerdo al Condicionado General No. 08/03/2021-1502-P-12-GENER-CL-SUSG-28-D00I 02/10/2020-1502-NT-P-12-P021020MGG12G120.
Consultar en: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/Clausulados/Generales/CL-SUSG-28-TODO-RIESGO-CONSTRUCCI%C3%93N-Y-MONTAJE-08032021.pdf
2. No se renuncia a aplicación de infraseguro.
3. Cláusula de 72 horas, para fenómenos de la naturaleza.
4.El presupuesto de construcción, el cronograma de construcción, los estudios geotécnicos o de suelos o estructurales y actas de vecindades hacen parte integrante de la póliza.
5. Aseguradora Solidaria de Colombia no responderá por lucro cesante, demora o paralización del trabajo, sea total o parcialmente.
6. Cláusula de cancelación 30 días, excepto para HMACCP-AMIT-ST 10 días.
7. Aplica restablecimiento automático del valor asegurado en caso de siniestro, con prima adicional a prorrata. Esta condición no es aplicable a HMACCP, AMIT, ST.
8. Anticipo de indemnización hasta el 50% una vez demostrada ocurrencia y cuantía del siniestro. Máximo COL$ 1.000.000.000.
9. Aviso de siniestro 30 días.
10 Respecto a la agravación del riesgo en las condiciones generales, el asegurado deberá informar a la Compañía todo cambio que implique una modificación de los diseños y/o procedimientos constructivos de la obra y que se pretendan implementar con posterioridad a la fecha de inicio de vigencia del presente seguro. La Compañía se reserva derecho de extender la cobertura a tales modificaciones.
11. Designación y nombramiento de ajustador.
12. Derechos sobre el salvamento.
13. Este contrato es de mera indemnización y jamás podrá constituir para el Asegurado fuente de enriquecimiento.

ENDOSOS Y CONDICIONES ADICIONALES APLICABLES SEGÚN TEXTOS SOLIDARIA
Endoso 001: Huelga, motín y conmoción civil.
Endoso 005: Cronograma de avance de los trabajos de construcción y/o montaje.
Endoso 006: Horas extra, trabajo nocturno, trabajo en días festivos, flete expreso.
Endoso 007: Flete aéreo.
Endoso 008: Obras situadas en zonas sísmicas.
Endoso 100: Prueba de maquinaria e instalaciones.
Endoso 102: Cables subterráneos, tuberías y demás instalaciones.
Endoso 103: Cosechas, bosques y cultivos.

CLIENTE

POLIZA SEGURO DE TODO RIESGO CONTRATISTA

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS BOGOTÁ FÁCIL SEGUROS LTDA COD. AGENCIA: 895 RAMO: 86 No PÓLIZA: **994000000031** ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

ASEGURADO: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

BENEFICIARIO: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

TEXTO DE LA POLIZA

Endoso 107: Campamentos y almacenes de materiales de construcción.
Endoso 109: Almacenaje de material de construcción.
Endoso 110: Medidas de seguridad contra inundaciones.
Endoso 111: Remoción de escombros después del corrimiento de tierras.
Endoso 117: Tendido de tuberías de agua y desages.
Endoso 119: Propiedad existente.
Endoso 121: Cimentaciones por pilotaje y tablestacados para fosas de obra.
Endoso 214: Asentamiento del subsuelo.

CONDICIONES PARTICULARES POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN

1. En caso de suspensión del proyecto por insuficientes fondos, quiebra insolvencia y temas financieros similares, la prórroga otorgada, previo pago de la prima, no será superior a 2 meses, para períodos mayores la Compañía se reserva el derecho de otorgar o limitar dicha prórroga.
2. Primera opción de compra del salvamento con plazo de treinta (30) días hábiles para que le informe si hará uso de tal opción o no, siempre y cuando supere o iguale la mejor oferta.
3. En caso de variaciones en el estado del riesgo con relación a información suministrada en la solicitud del seguro, las condiciones de cotización y/o de aseguramiento pueden ser modificadas a discreción de la Aseguradora.
4. Prórrogas sujetas a siniestralidad cero y a decisión de la Aseguradora en caso de reclamaciones en curso o indemnizadas. En ningún caso la vigencia total de la póliza incluyendo prórrogas superará 36 meses.
Los amparos adicionales y las coberturas por ocurrencias de siniestros otorgados, forman parte del Valor Asegurado y no operan en exceso, ni en adición a éste, a menos que se indique lo contrario en la póliza

1. Incremento del valor asegurado con pago de prima correspondiente y autorización previa de la Aseguradora.
2. La expedición de la póliza queda sujeta a las recomendaciones, garantías e información del informe de inspección.
3. Cláusula de exclusión de pérdidas y datos cibernéticos,
4. Cláusula de exclusión de enfermedades contagiosas LMA 5394, de acuerdo con el texto de las condiciones generales.
5. Cláusula de salvedad de daños materiales
La obligación del asegurador a indemnizar queda limitada a los pagos por daños resultantes de daños materiales a la propiedad asegurada que sucedan en forma accidental, súbita e imprevista que hagan necesaria una reparación o reposición y que sean consecuencia directa de los peligros cubiertos, así como también la pérdida de beneficios siempre que esta se deba a un daño material cubierto.
6. La sección de RCE solo se extiende al período de construcción y no incluye el periodo de mantenimiento.

Condiciones particulares relativas el cronograma de avance de los trabajos de construcción y/o montaje (Munchener 005)
El Asegurador no indemnizará al Asegurado con respecto a pérdidas o daños causados por o resultantes de o agravados por una desviación del cronograma de avance de los trabajos de construcción y/o montaje que exceda de los plazos citados en este documento, a menos que dicha desviación haya sido aprobada por escrito por el Asegurador antes de ocurrir la pérdida o daño.

Condiciones concernientes a estructuras en zonas sísmicas (Munchener 008)
La Compañía solo indemnizará por pérdida, daño o responsabilidad resultantes de un temblor, si el asegurado puede probar que el riesgo sísmico fue tenido en cuenta en el diseño, de acuerdo con los reglamentos oficiales para diseño sísmico válidos para el sitio de construcción, y que ha respetado las especificaciones en cuanto a materiales y mano de obra, conservando además en la construcción las dimensiones que sirvieron de base al diseño.

Condiciones especiales aplicables a la cobertura tendido de tuberías de agua y desages (Munchener 117)
La Compañía indemnizará al Asegurado las pérdidas, daños o responsabilidades debidos a la inundación y al encenagamiento de tuberías, zanjas y pozos, pero sólo hasta la longitud abierta de las mismas, indicada en la carátula de la póliza, por siniestro, en excavación parcial o total. Sin embargo, la indemnización sólo se pagará si:

Una vez tendidas las tuberías, éstas son protegidas por medio del relleno adecuado, en forma tal que, en caso de inundarse la zanja, no sufre cambio alguno la colocación de las tuberías;

Una vez tendidas las tuberías, éstas son protegidas inmediatamente contra la penetración de agua, lodo o similares;

Una vez finalizada la prueba de presión de las tuberías, las secciones de la zanja correspondientes hayan sido rellenadas.

Condiciones especiales aplicables al amparo adicional para cables, tuberías y demás instalaciones subterráneas (Munchener 102)
La cobertura otorgada bajo esta condición se limita a los costos de reparación de dichos cables, tuberías y/o instalaciones subterráneas de propiedad de terceros afectados, quedando por lo tanto excluida toda indemnización por daños consecuenciales y multas convencionales.

CLIENTE

POLIZA SEGURO DE TODO RIESGO CONTRATISTA

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS BOGOTÁ FÁCIL SEGUROS LTDA COD. AGENCIA: 895 RAMO: 86 No PÓLIZA: **994000000031** ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

ASEGURADO: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

BENEFICIARIO: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

TEXTO DE LA POLIZA

Condiciones especiales aplicables a la cobertura de propiedad existente o de propiedad que queda bajo el cuidado, la custodia o bajo la supervisión del asegurado (Munchener 119)
La Compañía indemnizará al Asegurado los daños en propiedad existente sólo bajo la condición de que se encuentre en estado seguro antes de comenzar las obras civiles y que se tomen las medidas de seguridad necesarias.
En cuanto a eventuales daños por vibración, eliminación o debilitamiento de elementos portantes, el Asegurador indemnizará al Asegurado sólo los daños o pérdidas que se originen por el derrumbe total o parcial de la propiedad asegurada, pero no los daños de menor importancia que constituyan un peligro tanto para la estabilidad de la propiedad asegurada como también para los mismos usuarios.

Condiciones especiales aplicables a la cobertura de la vibración, eliminación o del debilitamiento de elementos portantes (Munchener 120)
El amparo otorgado, queda sujeto a las siguientes condiciones especiales:

En caso de responsabilidad por pérdidas o daños en propiedad, terrenos o edificios, la Compañía indemnizará al asegurado tales daños o pérdidas sólo cuando tengan por consecuencia el derrumbe total o parcial.

En caso de responsabilidad por pérdidas o daños en propiedad, terrenos o edificios, la Compañía indemnizará al asegurado tales daños o pérdidas sólo sujeto a que la referida propiedad, los terrenos o edificios se encontraran en estado seguro antes de comenzar las obras civiles y cuando se hayan encaminado las necesarias medidas de seguridad.

Antes de comenzar las obras el asegurado elaborará por su propia cuenta, actas de vecindades o un informe sobre el estado en que se encuentren la propiedad, los terrenos o los edificios que posiblemente se hallen amenazados.

Todos los demás términos y condiciones de la póliza seguro todo riesgo construcción y/o montaje no modificados por las presentes condiciones adicionales, continúan vigentes y se modifican únicamente por lo que aquí se establece.

EXCLUSIONES APLICABLES

1. Exposiciones provenientes de, relacionadas con, ningún país, organización o persona que se encuentre actualmente sancionado, embargado o con el que haya limitaciones comerciales impuestas por la oficina de control de activos extranjeros del Departamento de Tesorería de los estados unidos de América (U.S. Treaseury Department: office of Foreign Assets Control).
2. Exclusión: Cualquier evento o amparo adicional no contratado.
3. RCE patronal, RCE Vehículos propios y no propios. En caso de que el cliente tome una póliza de RCE correlativa independiente, de esta póliza se excluyen las coberturas otorgadas para RCE.
4. Obras civiles aseguradas recibidas o puestas en operación.
5. Hurto.
6. Responsabilidad civil contractual y extracontractual diferente a la indicada en este documento.
7. Trabajos con explosivos para la cobertura de RCE.
8. Exclusión de pérdidas o daños en cosechas, bosques y cultivos (Munchener 103): La Aseguradora no indemnizará al Asegurado las pérdidas, daños o responsabilidades directa o indirectamente causados en cosechas, bosques y/o cultivos durante la ejecución de los trabajos de construcción.
9. Exclusiones aplicables al amparo de contratistas y/o subcontratistas independientes: la Compañía no indemnizará los daños o perjuicios causados directa o indirectamente por y/o como consecuencia de:

Reclamaciones mutuas entre asegurado, contratistas y/o subcontratistas independientes.
Trabajos de ampliación de los predios del asegurado o construcción de nuevos predios.
Los daños a los bienes muebles destinados al desarrollo de las actividades normales del asegurado.
Responsabilidad civil -cruzada- entre los contratistas y subcontratistas, entendiéndose como tal, los perjuicios patrimoniales que se causen estas personas entre sí.

10. Exclusiones aplicables a la cobertura de propiedad existente o de propiedad que queda bajo el cuidado, la custodia o bajo la supervisión del asegurado (Munchener 119): la Compañía no indemnizará bajo esta cobertura con respecto a:

Los daños previsibles teniendo en cuenta el tipo de los trabajos de construcción y su ejecución.

Los costos por concepto de prevención o aminoración de daños que hay que invertir en el transcurso del periodo del seguro.

Las reclamaciones o responsabilidad civil derivada del hurto o hurto calificado debidas a cualquier causa.

11. Exclusiones aplicables a la cobertura de la vibración, eliminación o del debilitamiento de elementos portantes (Munchener 120-210): la Compañía no indemnizará en caso de responsabilidad por:

Daños previsibles teniendo en cuenta el tipo de los trabajos de construcción o su ejecución.
Daños de menor importancia que no perjudican la estabilidad de la propiedad asegurada, de los terrenos o edificios ni constituyen un peligro para los usuarios.
Costos por concepto de prevención o aminoración de daños que hay que invertir en el transcurso del periodo del seguro.

CLIENTE

POLIZA SEGURO DE TODO RIESGO CONTRATISTA

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS BOGOTÁ FÁCIL SEGUROS LTDA COD. AGENCIA: 895 RAMO: 86 No PÓLIZA: **994000000031** ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

ASEGURADO: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

BENEFICIARIO: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

TEXTO DE LA POLIZA

Esta cobertura no ampara la maquinaria de construcción y/o montaje ni el equipo de construcción y/o montaje.

12. Todos los demás términos y condiciones no modificados por las presentes exclusiones, continúan vigentes de acuerdo al clausulado general: 08/03/2021-1502-P-12-GENER-CL-SUSG-28-D00I 02/10/2020-1502-NT-P-12-P021020MGG12G120.
Consultar en: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/Clausulados/Generales/CL-SUSG-28-TODO-RIESGO-CONSTRUCCI%C3%93N-Y-MONTAJE-08032021.pdf de Aseguradora Solidaria de Colombia.

GARANTÍAS APLICABLES

1. Mantener las medidas de seguridad contra sustracción de equipo y herramienta en la obra; para ello se debe mantener la contratación de vigilancia 24 horas al día.
2. Mantener protegida durante la vigencia de la póliza la obra en construcción por medio de un cerramiento, que impida el fácil acceso de personal no autorizado, e instalar vallas o elementos que impida la caída y expulsión de elementos al exterior del predio. Adicionalmente, se debe contar señalización visible, reflectiva e iluminada para vehículos y peatones.
En la obra debe existir una línea telefónica sea móvil o fija provisional y en servicio para poder avisar a las autoridades competentes en caso de emergencia

1. Las derivadas del proceso de inspección y los programas de control de riesgos.
2. En adición a lo expresado en las condiciones generales de la póliza, el asegurado deberá informarle a la Compañía todo cambio que implique una modificación en los diseños y/o procedimientos constructivos y estructurales de la obra/montaje y que se pretendan implementar con posterioridad a la fecha de inicio de vigencia del presente seguro. También se debe informar sobre las suspensiones o modificaciones en el cronograma de obra que registre el proyecto. La Compañía se reserva el derecho de extender la cobertura del seguro a tales modificaciones.
3. Se debe contar con 2 extintores de mínimo 10 libras que sean vigentes, visibles, accesibles y señalizados en los almacenes de obra y en obra se debe cumplir con las exigencias de extintores por la normatividad colombiana en materia de construcción.
4. El diseño y la construcción y/o montaje de la obra debe seguir las normas establecidas en el código colombiano de construcciones sismo - resistentes vigentes que para tal efecto sea válido en el sitio de construcción y montaje, el que prevalezca de ellos.
5. La cobertura de HMACC, AMIT y ST se otorga bajo la garantía que el Asegurado no contratará coberturas o límites adicionales que operen en exceso del límite aquí propuesto. En caso contrario la cobertura será inválida de manera automática.
6. Las instalaciones eléctricas deben estar debidamente aisladas y entubadas en los casos que aplique, manteniendo la distancia de material combustible e inflamable y protegidas de la intemperie.
7. El diseño eléctrico y la construcción y/o montaje de la obra eléctrica, debe seguir las normas establecidas en el código colombiano, tales como, pero sin limitarse a:

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP).
Código Eléctrico Colombiano, norma NTC 2050.
Normas IEC, Normas ANSI, Normas IEEE, Normas ASTM.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN SOLICITUD SE REALIZA LAS SIGUIENTES ACLARACIONES
ASEGURADOS: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION O SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL CON NIT: 899.999.061-9 DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO NO. 66-63, TELÉFONO 3241000 Y CONSORCIO EDU 2025 NIT NO. 901.977.278-1.
BENEFICIARIOS: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION O SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL CON NIT: 899.999.061-9 DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO NO. 66-63, TELÉFONO 3241000 TERCEROS AFECTADOS

CONSORCIO EDU 2025 NIT 901.977.278-1
CC 80212380 - RUSSY LADINO, WILVER FRANCINY - PART: 10.00%
NIT 901109885 - WRUSSY INGENIEROS SAS - PART: 90.00%
Lote 7
CPF Localidad Colegio Sede Educativa Dirección Zona
742 BOSA EL PORVENIR SEDE B - EL RECUERDO CL 58 SUR 104 A - 50 SUR OCCIDENTE

712 BOSA LUIS LOPEZ DE MESA SEDE ALUIS LOPEZ DE MESA CL 65 H SUR 78 A -05 SUR OCCIDENTE

764 BOSA VILLAS DEL PROGRESO EL PORVENIR VII ETAPA - ENRRIQUE DUSSEL CARRERA 102 A No 56 F 49 SUR SUR OCCIDENTE

714 BOSA PABLO DE TARZO SEDE A - PABLO DE TARZO CL 66 SUR 78 J - 02 SUR OCCIDENTE

836 KENEDY JAIRO ANIBAL NIÑO SEDE A - ANTES PATIO BONITO I KR87 H BIS 39 - 23 SUR SUR OCCIDENTE

833 KENEDY DARIO ECHANDIA SEDE B - LOS PATIOS KR 88 F BIS 09 SUR OCCIDENTE

751 BOSA ALFONDO LOPEZ MICHELSEN SEDE A - ALFONDO LOPEZ MICHELSEN- PORTAL DEL SOL KR 98 B 74 - 68 SUR
SUR OCCIDENTE

CLIENTE

POLIZA SEGURO DE TODO RIESGO CONTRATISTA

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS BOGOTÁ FÁCIL SEGUROS LTDA COD. AGENCIA: 895 RAMO: 86 No PÓLIZA: **994000000031** ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

ASEGURADO: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

BENEFICIARIO: **CONSORCIO EDU 2025** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.977.278-1**

TEXTO DE LA POLIZA

814 KENEDY EDUARDO UMAÑA LUNA SEDE A DINDALITO KR 93 A 42 A - 37 SUR SUR OCCIDENTE

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA

DERIVADAS DE CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.8154784, DE FECHA 03/09/2025, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

LOTE 7

ASEGURADOS: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION O SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL CON NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO NO. 66-63, TELÉFONO 3241000 Y CONSORCIO EDU 2025 NIT NO. 901.977.278-1.
BENEFICIARIOS: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION O SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL CON NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO NO. 66-63, TELÉFONO 3241000 TERCEROS AFECTADOS

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE LA PRESENTE POLIZA SE ENCUENTRA ACTUALIZADA CONFORME AL ACTA DE INICIO DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025

SE ACLARA LA VIGENCIA ASI:
DESDE 14/10/2025 HASTA 15/05/2026

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 03/09/2025

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE TODO RIESGO CONTRATISTA

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000000031 **ANEXO:** 4 **TIPO DE MOVIMIENTO:** 0 **PAGINA:** 8

TOMADOR: CONSORCIO EDU 2025 **IDENTIFICACION:** 901.977.278-1

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CONSORCIO EDU 2025	901977278-1	CALLE 8F No. 79-94	BOGOTÁ, D.C.	0.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — COLOMBIA 2024
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — AMÉRICA LATINA 2019

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4009887326

PÓLIZA No: 400 - 47 - 994000109845 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **CABECERA** COD. AGENCIA: 400 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	05	09	2025

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	05	09	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **829.000.956-3**

DIRECCIÓN: CARRERA 36 34 INTERCAMBIADOR CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER TELÉFONO: 3124447506

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

BENEFICIARIO: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	05/09/2025	05/10/2026	159,255,785.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	05/09/2025	05/04/2029	79,627,892.80
CALIDAD DEL SERVICIO	05/04/2026	05/04/2031	159,255,785.60

BENEFICIARIOS
NIT 899999061 - BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO1.PCCNTR.8169111, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***398,139,464.00	$ ********2,508,824	$****15,000.00	$ ******479,527	$ ********3,003,351

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
CLAUDIA MILENA SANCHEZ QUIROGA	10714	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000400988732

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CAD820710707FB7D5D

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf


Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración
1			**CONTRATO PABLO TARSO**			**$ 196.115.258,01**	**152 días**
2			ACTA DE INICIO			$ 0,00	0 días
3			ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			$ 0,00	20 días
4			INICIO			$ 0,00	0 días
5		**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 10.742.319,18**	**22 días**
6		**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 264.617,89**	**22 días**
7		1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	59.66	**$ 264.617,89**	22 días
8		**1.2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**$ 10.477.701,29**	**22 días**
9		1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	23.73	**$ 6.084.289,61**	22 días
10		1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	124.66	**$ 4.276.788,78**	22 días
11		1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	4.00	**$ 44.686,43**	22 días
12		1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	8.60	**$ 71.936,47**	22 días
13		**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 153.738.032,29**	**17 días**
14		**2.1**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 13.803.458,51**	**8 días**
15		2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	25.08	**$ 1.558.802,02**	8 días
16		2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	72.45	**$ 12.244.656,49**	8 días
17		**2.2**	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 25.903.196,15**	**8 días**
18		2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	17.37	**$ 11.006.997,31**	8 días

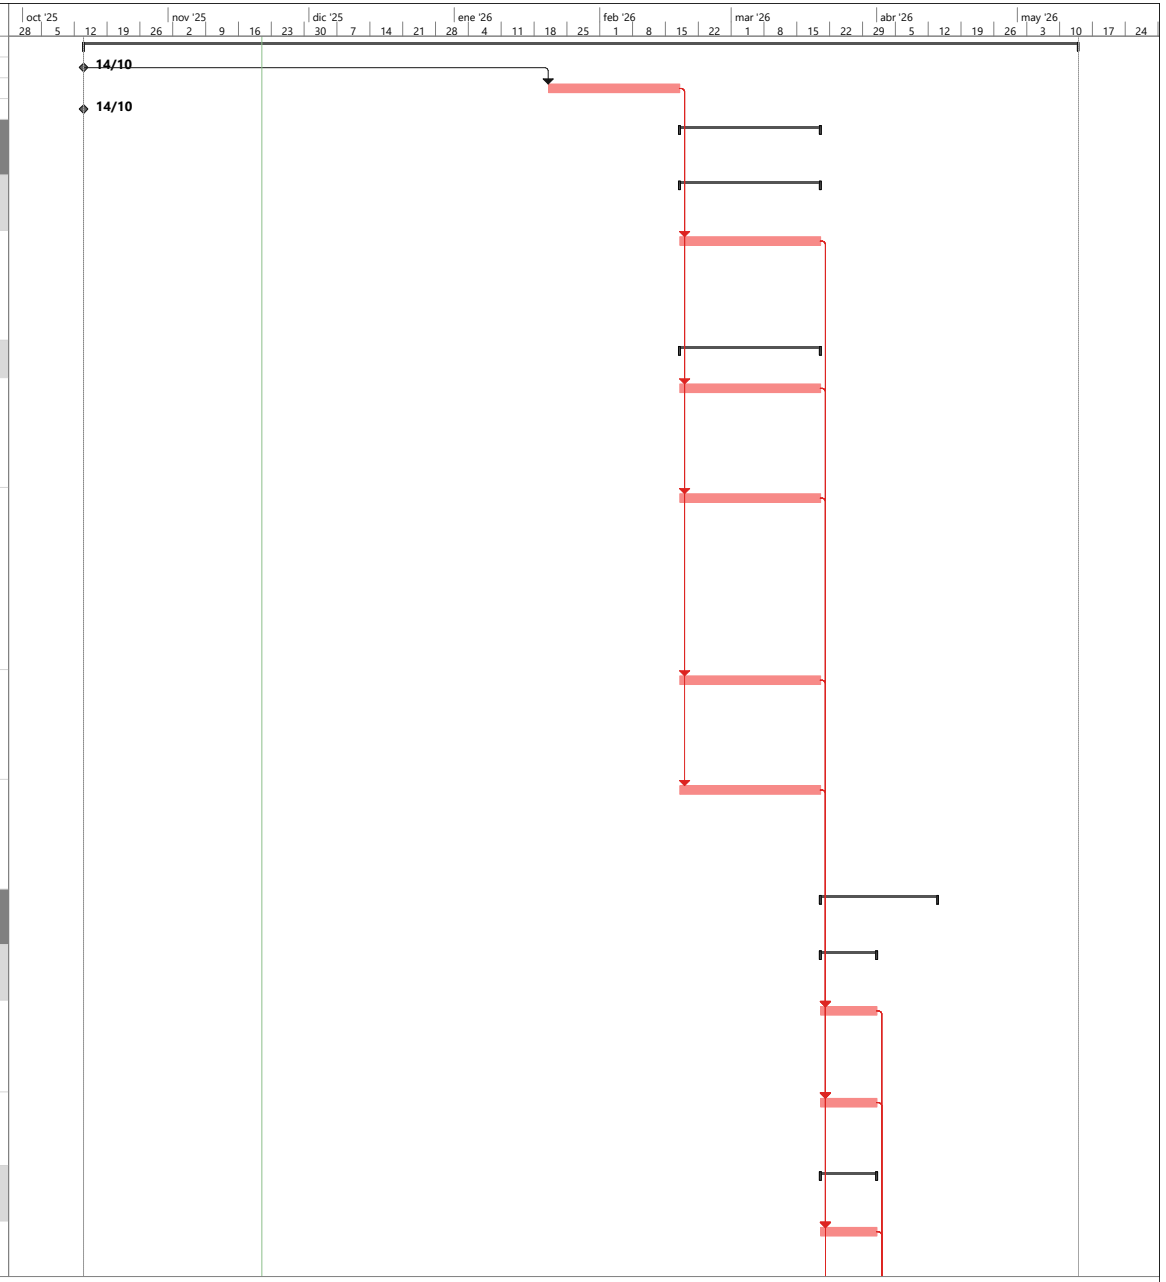

Proyecto: PROGRAMACION PA
Fecha: vie 21/11/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración
19		2.2.3	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3	2.38	**$ 2.330.749,04**	8 días
20		2.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	18.25	**$ 12.565.449,80**	8 días
21		**2.3**	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 49.232.380,27**	**9 días**
22		2.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	131.00	**$ 49.232.380,27**	9 días
23		**2.5**	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 64.798.997,36**	**9 días**
24		2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	2,684.70	**$ 64.798.997,36**	9 días
25		**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 7.070.693,43**	**16 días**
26		**4.1**	**REDES DE ALCANTARILLADO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 3.504.679,71**	**9 días**
27		4.1.2	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=200 MM (INCLUYE RELLENO)	M	13.50	**$ 2.391.191,15**	9 días
28		4.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	7.50	**$ 1.113.488,56**	9 días
29		**4.2**	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 1.061.206,18**	**7 días**
30		4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	8.00	**$ 684.009,79**	7 días
31		4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	5.00	**$ 213.448,39**	7 días
32		4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	3.00	**$ 143.179,23**	7 días
33		4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	UN	1.00	**$ 20.568,77**	7 días
34		**4.3**	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**			**$ 146.505,80**	**7 días**
35		4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	8.60	**$ 120.331,14**	7 días
36		4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	5.00	**$ 26.174,66**	7 días
37		**4.7**	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 2.358.301,74**	**7 días**
38		4.7.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	2.00	**$ 1.218.021,15**	7 días
39		4.7.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00	**$ 1.140.280,59**	7 días
40		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 1.753.071,73**	**7 días**

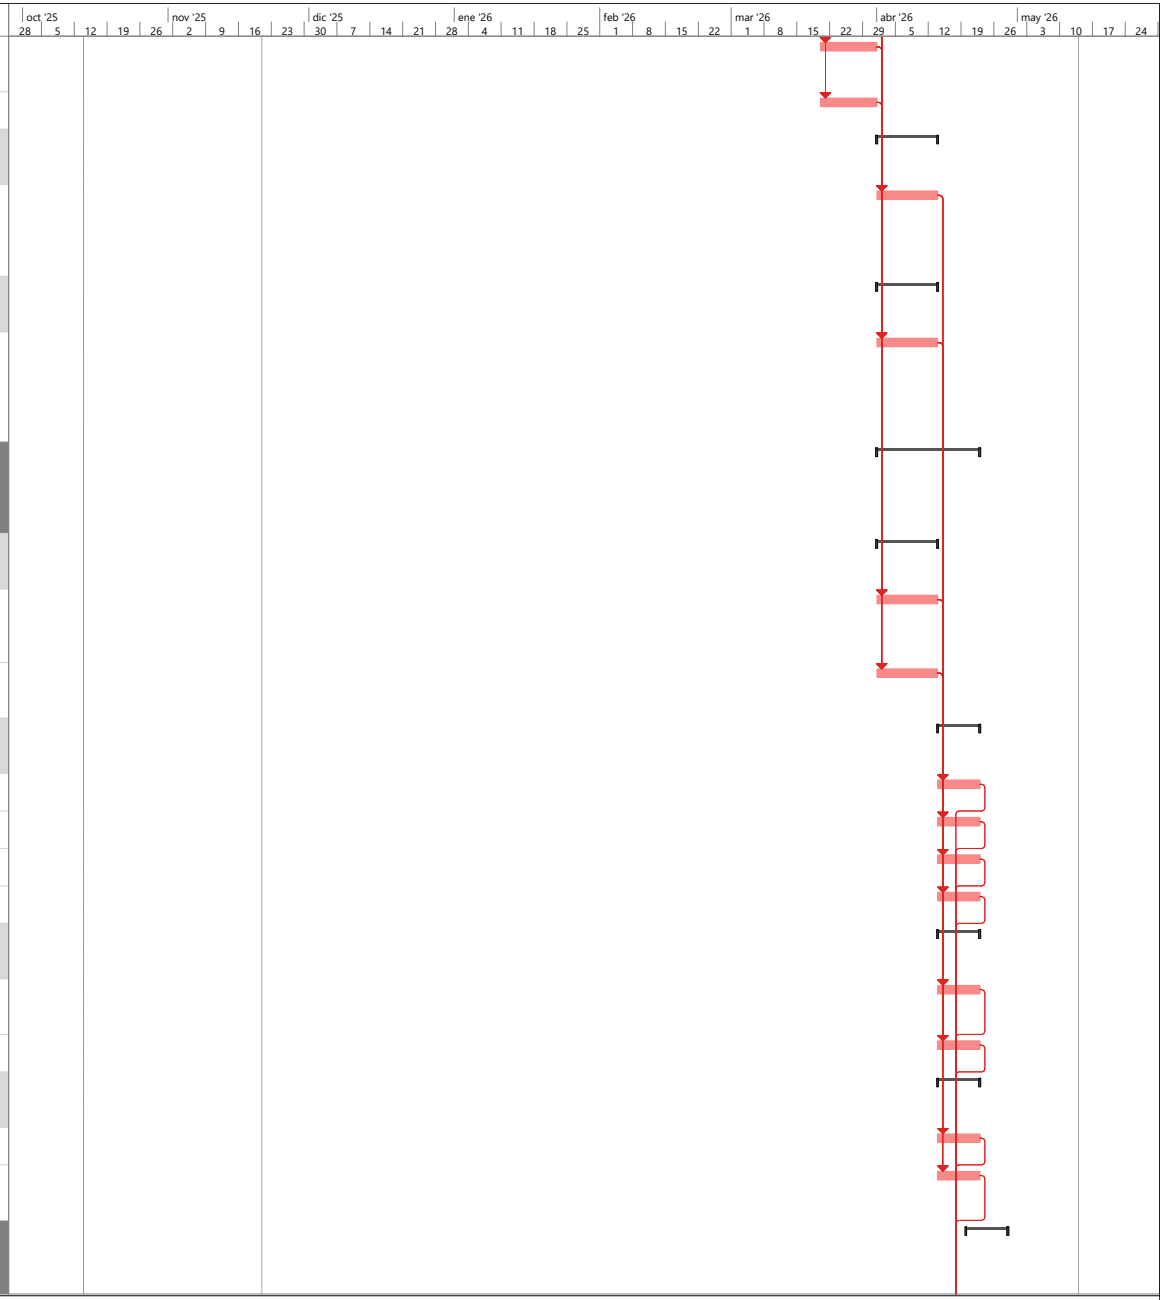

Proyecto: PROGRAMACION PA
Fecha: vie 21/11/25

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración
41		5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESOR	UN	4.00	**$ 755.598,07**	7 días
42		5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	4.00	**$ 997.473,66**	7 días
43		**12**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 2.455.689,71**	**148 días**
44		**12.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 0,00	1 día
45		12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	108.54	**$ 2.455.689,71**	7 días
46		**16**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 17.856.172,35**	**7 días**
47		16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	17.70	**$ 1.970.310,06**	7 días
48		16.1.2	CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	12.80	**$ 813.908,18**	7 días
49		16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	4.90	**$ 325.984,05**	7 días
50		16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE D	M2	59.66	**$ 14.745.970,06**	7 días
51		**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 2.499.279,32**	**4 días**
52		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	59.66	**$ 259.664,18**	4 días
53		18.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO	KG	1,038.08	**$ 2.239.615,14**	4 días
54			FIN			$ 0,00	0 días

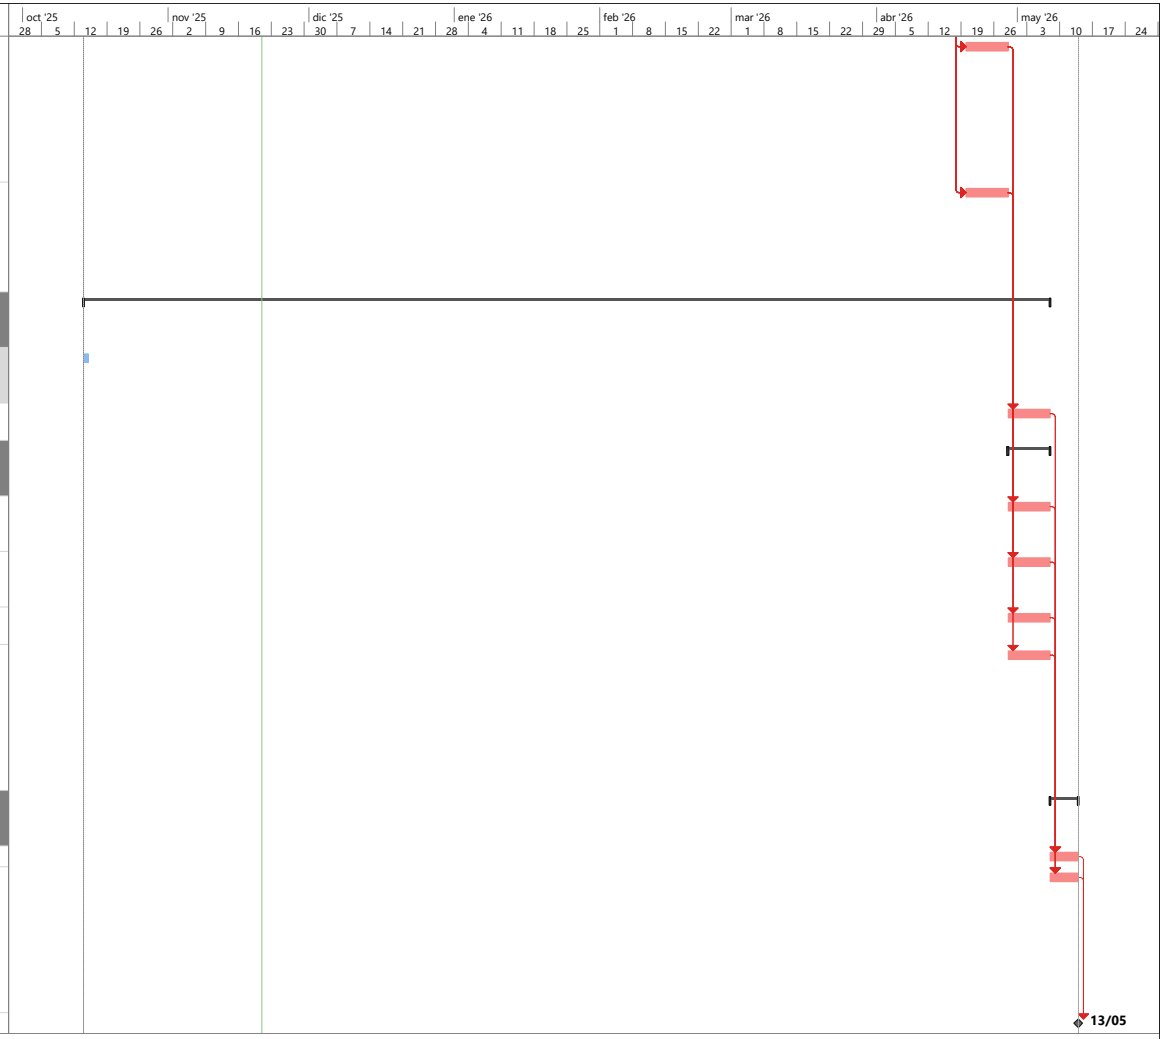


Proyecto: PROGRAMACION PA
Fecha: vie 21/11/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración
1			**CONTRATO CO1.PCCNTR.8154784 ALFONSO LOPEZ MICHELSEN**			**$ 192.319.747,99**	**132 días**
2			ACTA DE INICIO			$ 0,00	0 días
3			ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			**$ 0,00**	22 días
4			INICIO			$ 0,00	0 días
5		**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 16.586.928,12**	**43 días**
6		**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 136.101,56**	**30 días**
7		1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	30.69	**$ 136.101,56**	30 días
8		**1.2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**$ 15.405.532,75**	**30 días**
9		1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	30.69	**$ 922.466,41**	30 días
10		1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	352.66	**$ 10.730.283,76**	30 días
11		1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	21.82	**$ 454.224,50**	30 días
12		1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	83.43	**$ 985.154,36**	30 días
13		1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2.00	**$ 38.665,38**	30 días
14		1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10.80	**$ 334.540,20**	30 días
15		1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	29.36	**$ 567.607,87**	30 días
16		1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5.00	**$ 55.858,03**	30 días
17		1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMOS CERTIFICADOS)	UN	5.00	**$ 34.866,07**	30 días
18		1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	30.69	**$ 647.674,62**	30 días
19		1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	51.26	**$ 428.771,66**	30 días
20		1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	15.00	**$ 205.419,89**	30 días
21		**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 1.045.293,81**	**15 días**
22		1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFEC	M	51.26	**$ 1.045.293,81**	15 días
23		**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 5.651.466,86**	**20 días**
24		**4.2**	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 3.112.715,96**	**20 días**
25		4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	17.50	**$ 1.496.272,09**	20 días
26		4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.00	**$ 440.955,71**	20 días
27		4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	14.48	**$ 691.078,09**	20 días
28		4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	4.00	**$ 484.410,07**	20 días
29		**4.3**	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**			**$ 857.706,71**	**20 días**
30		4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	61.30	**$ 857.706,71**	20 días
31		**4.5**	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 1.423.387,47**	**20 días**
32		4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	13.00	**$ 771.001,55**	20 días
33		4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	11.00	**$ 652.385,92**	20 días
34		**4.6**	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 257.656,72**	**20 días**
35		4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	4.00	**$ 257.656,72**	20 días
36		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 2.851.302,77**	**5 días**
37		5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTAL	UN	2.00	**$ 236.936,62**	5 días
38		5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA L	UN	2.00	**$ 423.026,50**	5 días
39		5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESOR	UN	5.00	**$ 944.497,58**	5 días

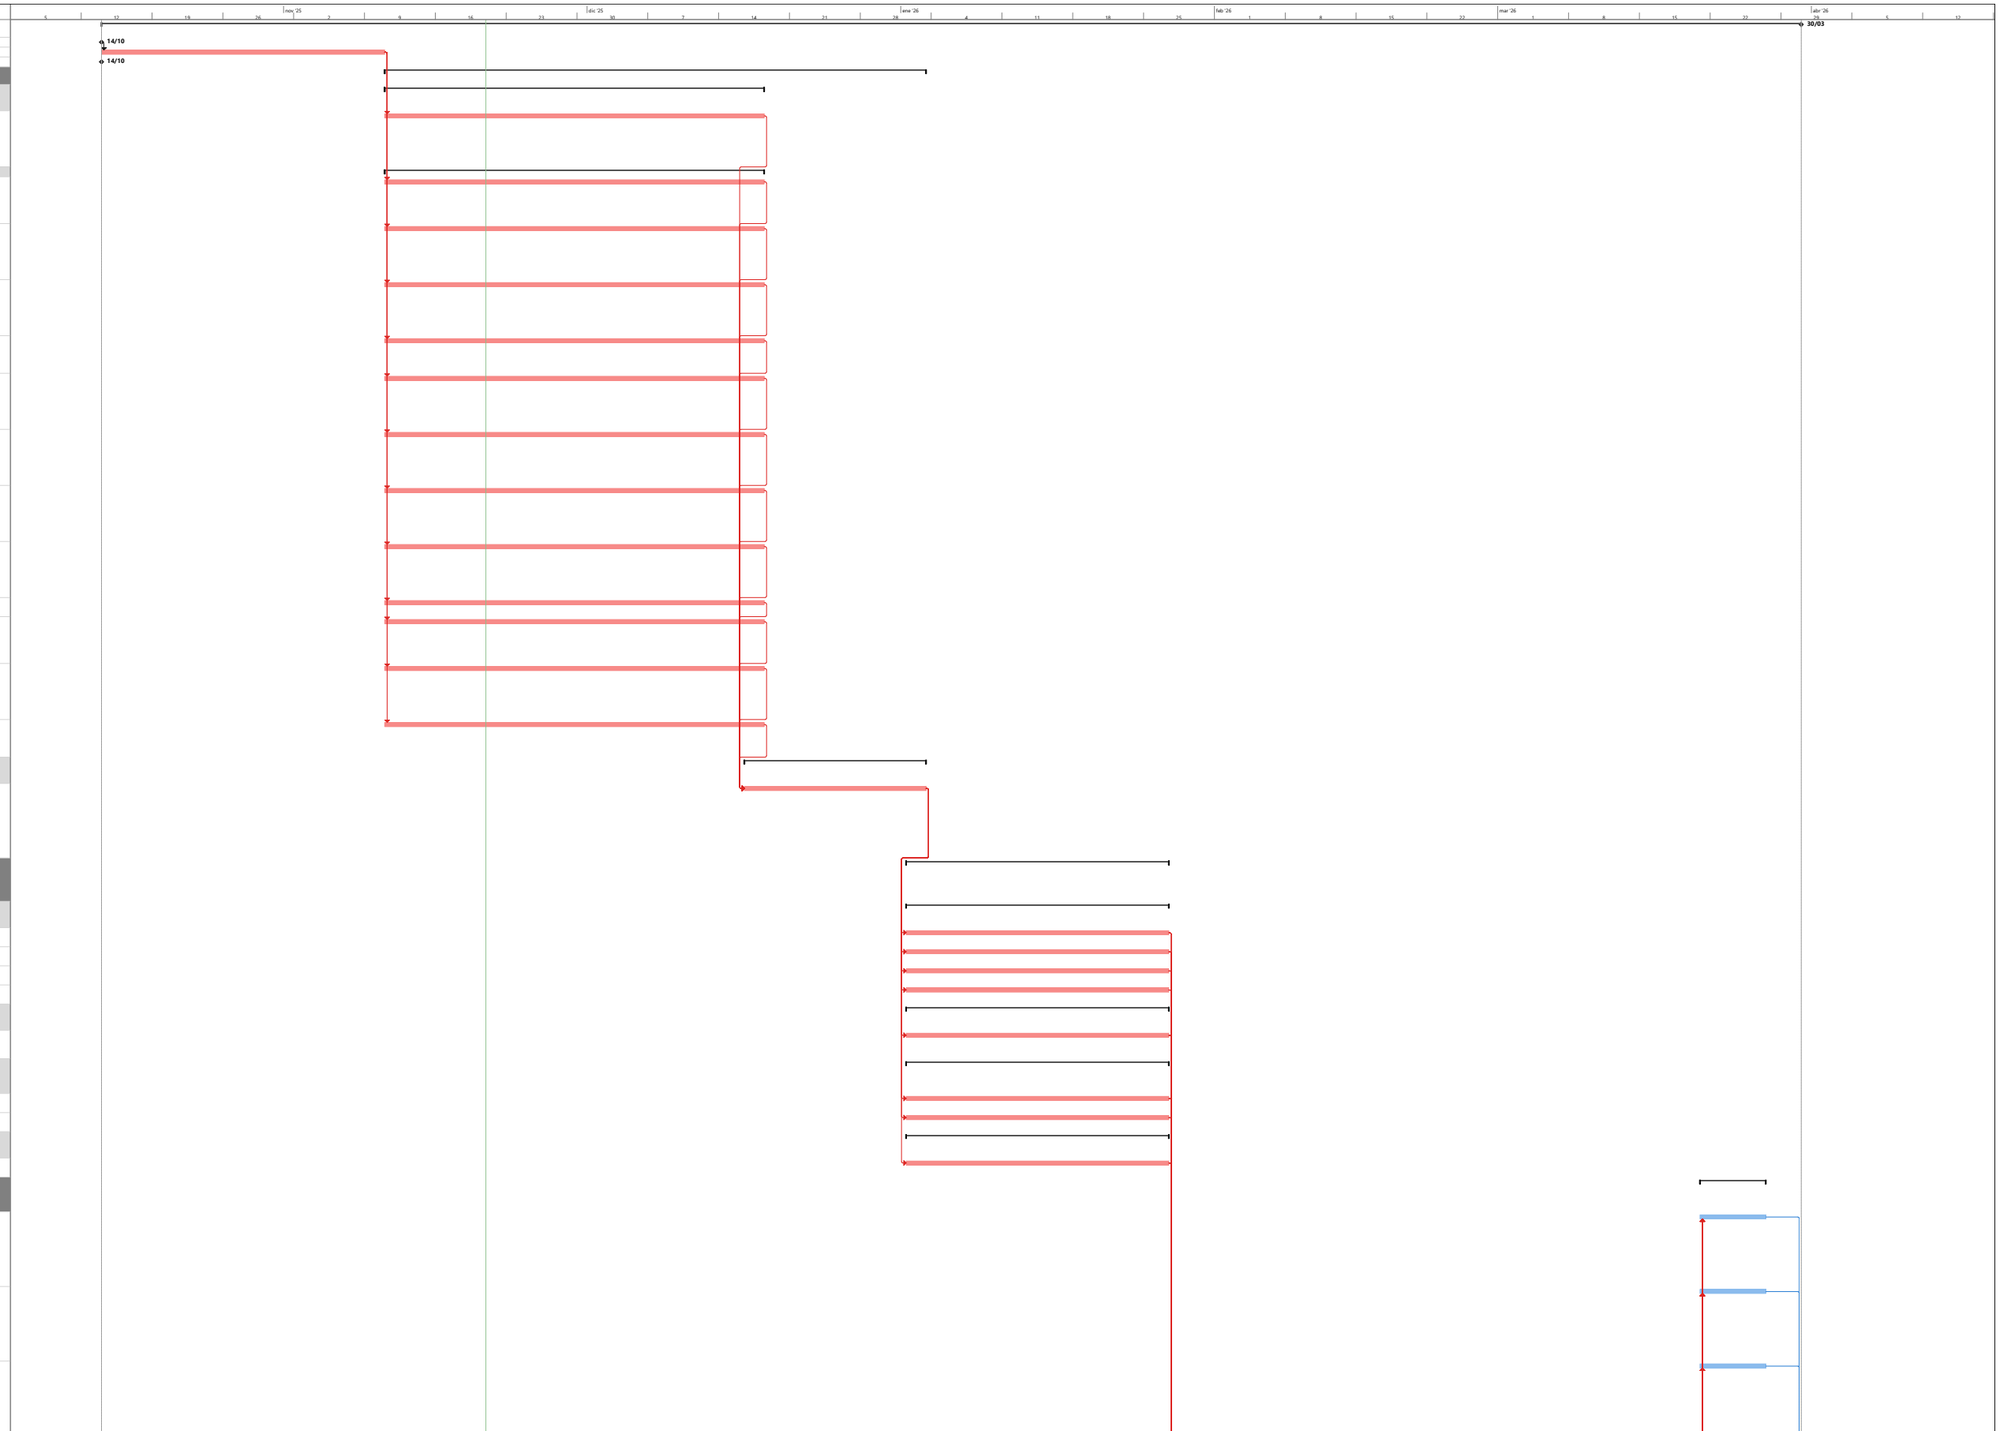

Id	Modo de tarea	ITIM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración
40		5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	5.00	**$ 1.246.842,07**	3 días
41		**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 91.683.968,95**	**42 días**
42		**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 2.803.422,36**	**24 días**
43		7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	30.69	**$ 1.297.321,88**	24 días
44		7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	57.23	**$ 1.506.100,48**	24 días
45		**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 88.880.546,59**	**20 días**
46		7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	30.69	**$ 6.030.756,42**	20 días
47		7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	2.00	**$ 140.666,89**	20 días
48		7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO H=10 CM, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	57.23	**$ 4.616.555,86**	20 días
49		7.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	352.66	**$ 78.092.567,42**	20 días
50		**8**	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 9.047.170,50**	**20 días**
51		8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	**83.43**	**$ 9.047.170,50**	20 días
52		**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 13.218.905,74**	**10 días**
53		**9.2**	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 2.249.697,98**	**10 días**
54		9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	4.59	**$ 2.249.697,98**	10 días
55		**9.3**	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 10.969.207,76**	**10 días**
56		9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE	M2	7.92	**$ 9.358.061,77**	10 días
57		9.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE ORINALES EN ACRILICO RECUPERADO DE 10 MM DISEÑO DE ANIMALES, MODULOS DE 40 X 90 X 1 CM, INCLUYE SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" ANCLADO AL PISO	UND	3.00	**$ 1.611.145,99**	5 días
58		**10**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 16.654.964,82**	**10 días**
59		10.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	9.00	**$ 9.336.954,63**	10 días
60		10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	4.00	**$ 2.884.283,25**	10 días
61		10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	11.00	**$ 4.154.787,65**	10 días
62		10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00	**$ 153.584,81**	3 días
63		10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	4.00	**$ 125.354,48**	3 días
64		**11**	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 31.283.720,05**	**10 días**
65		11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	33.87	**$ 31.283.720,05**	10 días
66		**12**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 3.741.262,77**	**49 días**
67		**12.1**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 2.389.826,50**	**39 días**
68		12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	48.39	**$ 1.861.297,83**	24 días
69		12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMOS CERTIFICADOS)	M2	45.20	**$ 528.528,67**	15 días
70		**12.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 1.351.436,27**	**10 días**
71		12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	45.20	**$ 1.351.436,27**	10 días
72		**14**	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 1.466.503,01**	**5 días**
73		14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	7.92	**$ 1.466.503,01**	5 días
74		**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 133.554,40**	**5 días**
75		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	30.69	**$ 133.554,40**	5 días
76			FIN			$ 0,00	0 días

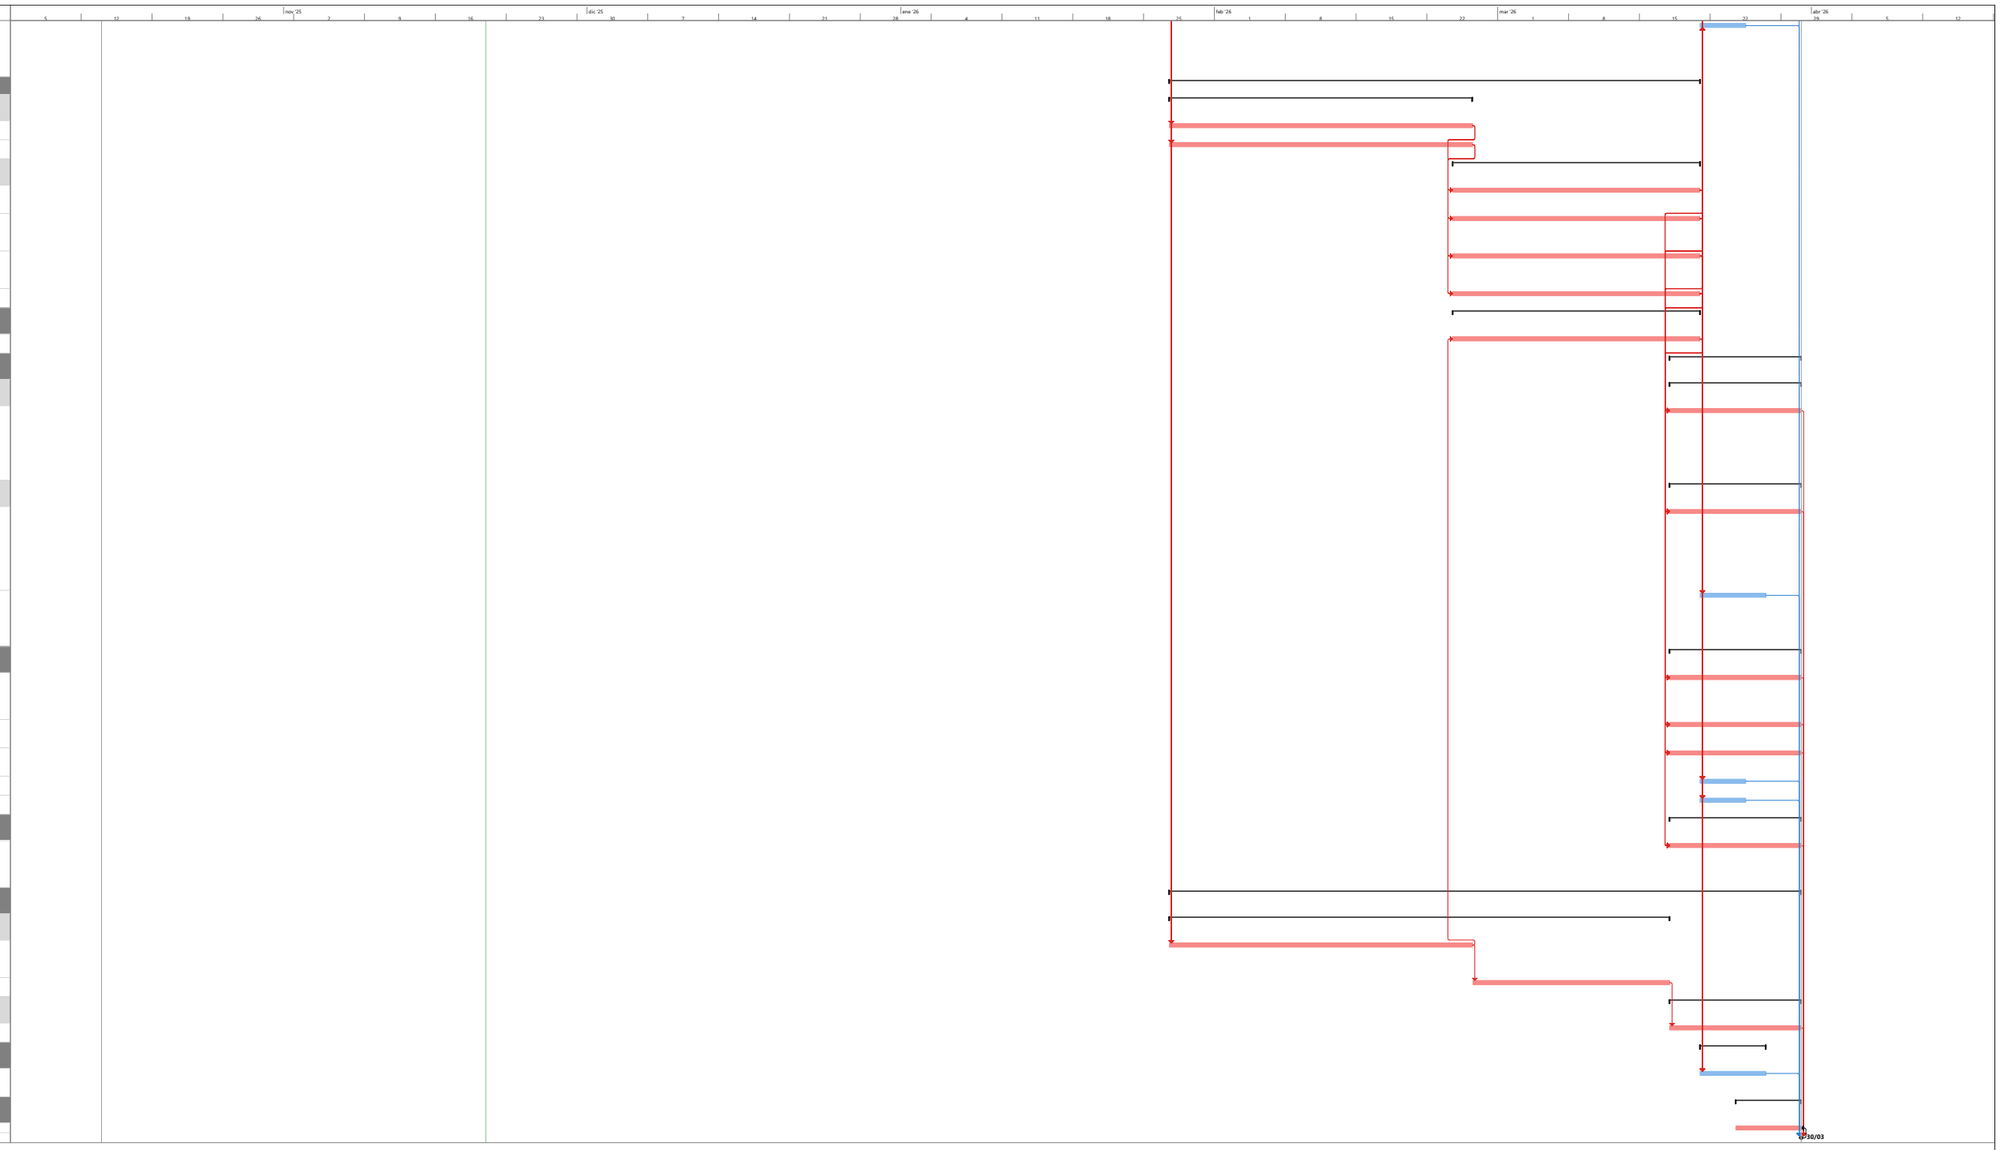


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	UNIDAD	CANTIDAD	Costo
1			**CONTRATO**	**166 días**			**$ 272.549.391,00**
2			ACTA DE INICIO	0 días			$ 0,00
3			ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0 días			$ 0,00
4			INICIO	0 días			$ 0,00
5		**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**43 días**			**$ 29.407.385,71**
6		**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**15 días**			**$ 2.543.952,36**
7		1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	15 días	M	87.60	$ 2.543.952,36
8		**1.2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**17 días**			**$ 26.270.025,79**
9		1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	17 días	M2	402.13	$ 23.027.894,91
10		1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	17 días	M2	14.12	$ 429.764,01
11		1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	17 días	M2	13.40	$ 278.917,86
12		1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	17 días	M2	46.99	$ 554.798,42
13		1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	17 días	UN	2.00	$ 38.665,38
14		1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	17 días	M2	6.06	$ 187.774,59
15		1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	17 días	UN	5.00	$ 127.337,83
16		1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	17 días	M	20.00	$ 386.653,82
17		1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	17 días	UN	4.00	$ 44.686,43
18		1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	17 días	UN	2.00	$ 13.946,43
19		1.2.34	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	17 días	UN	2.00	$ 835.818,83
20		1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	17 días	M	28.00	$ 234.210,01
21		1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	17 días	UN	8.00	$ 109.557,27
22		**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**14 días**			**$ 593.407,56**
23		1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFEC	14 días	M	29.10	$ 593.407,56
24		**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16 días**			**$ 57.000.375,05**
25		**2.1**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16 días**			**$ 57.000.375,05**
26		2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	16 días	M3	249.90	$ 24.080.228,90
27		2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	16 días	M3	178.50	$ 32.920.146,15
28		**2.3**	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16 días**			**$ 32.921.805,42**

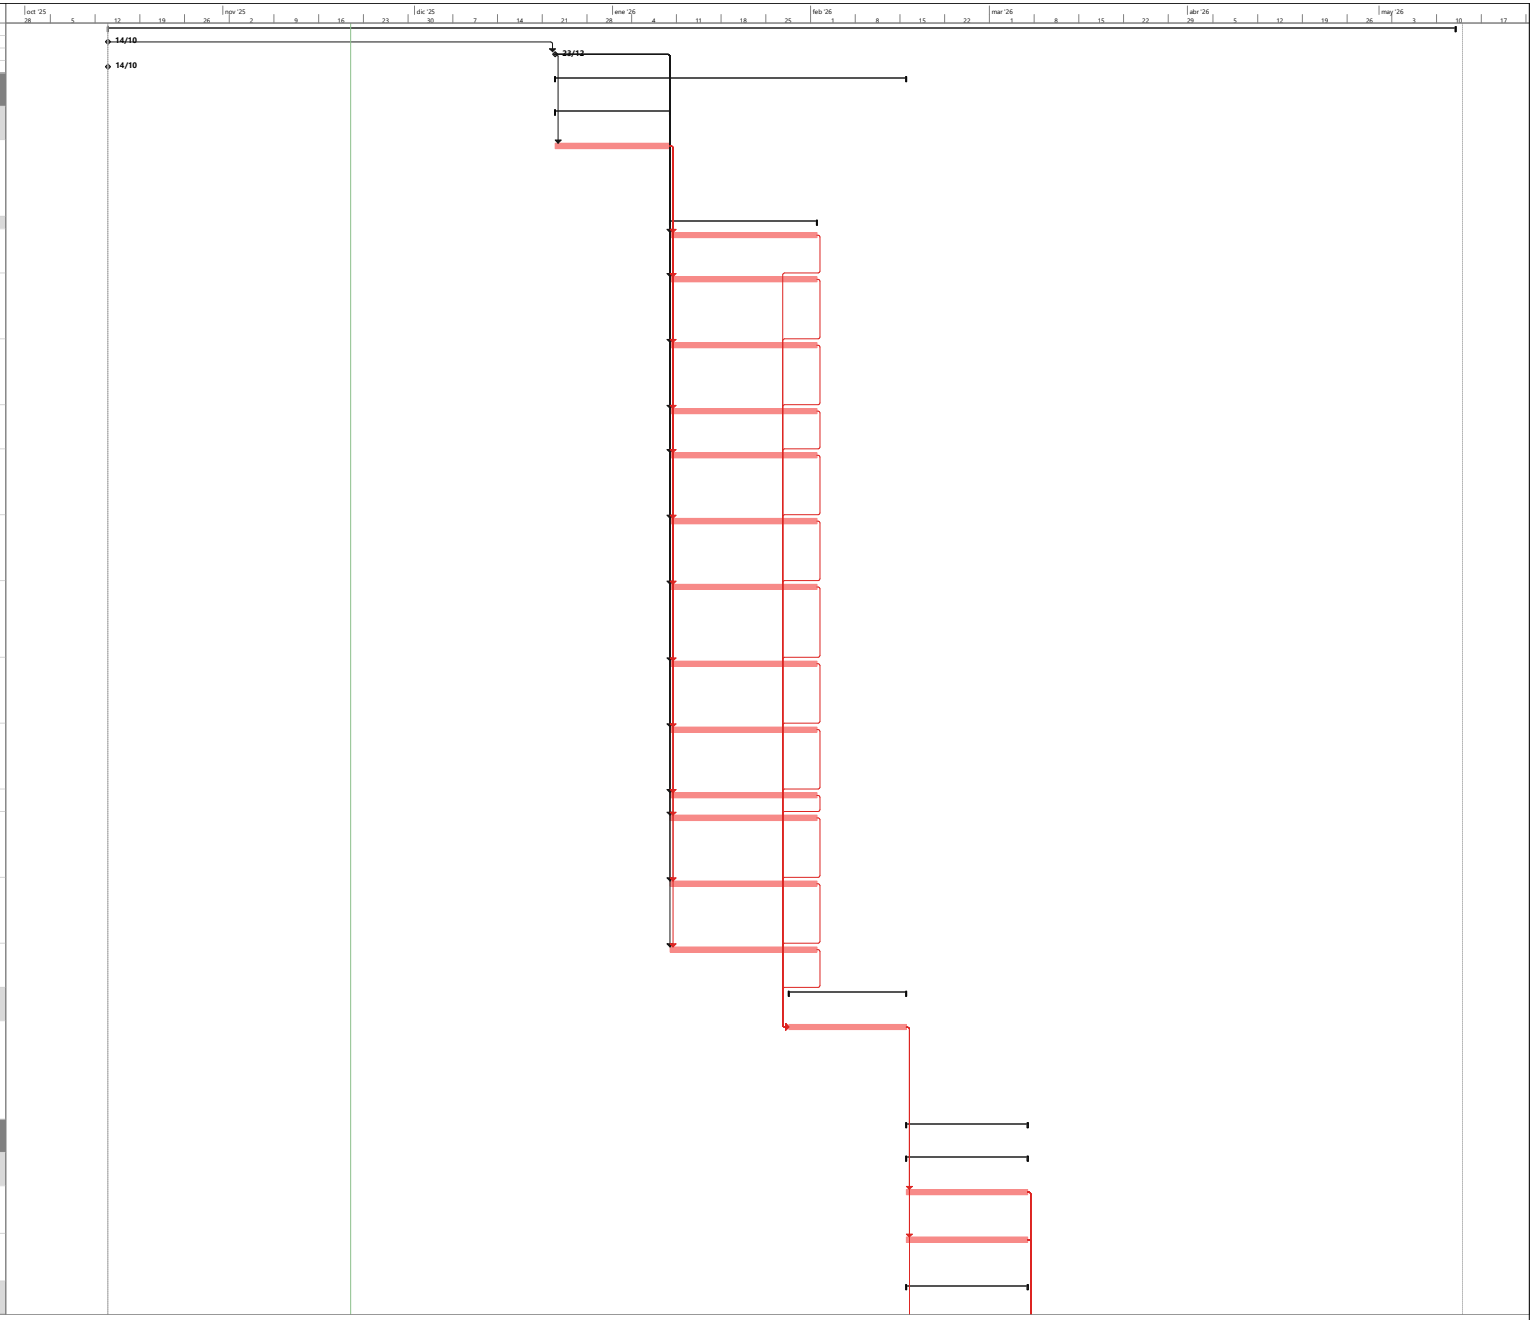


Proyecto: VILLAS DEL PROGRES
Fecha: vie 21/11/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	UNIDAD	CANTIDAD	Costo
29		2.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	16 días	M	87.60	$ 32.921.805,42
30		**2.4**	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16 días**			**$ 1.367.741,03**
31		2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	16 días	KG	201.96	$ 1.367.741,03
32		**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**17 días**			**$ 22.664.690,47**
33		**4.2**	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**17 días**			**$ 3.853.735,50**
34		4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	17 días	M	5.00	$ 427.506,12
35		4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	17 días	M	22.00	$ 1.616.837,59
36		4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	17 días	M	10.00	$ 477.264,10
37		4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	17 días	UN	11.00	$ 1.332.127,69
38		**4.3**	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	**17 días**			**$ 260.250,75**
39		4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	17 días	M	18.60	$ 260.250,75
40		**4.5**	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**17 días**			**$ 889.617,17**
41		4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	17 días	UN	7.00	$ 415.154,68
42		4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	17 días	UN	8.00	$ 474.462,49
43		**4.6**	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**17 días**			**$ 257.656,72**
44		4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	17 días	UN	4.00	$ 257.656,72
45		**4.7**	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**17 días**			**$ 9.572.036,47**
46		4.7.6	CAJA DE INSPECCIÓN 1 M X 1 M EN CONCRETO REFORZADO HASTA 1,50 M DE ALTURA CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M (INCLUYE ACERO)	17 días	UN	3.00	$ 9.572.036,47
47		**4.8**	**REDES DE DRENAJE AGUAS DE INFILTRACIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**17 días**			**$ 7.831.393,86**
48		4.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	17 días	M	83.80	$ 7.831.393,86
49		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 días**			**$ 1.536.498,98**
50		5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTAL	6 días	UN	2.00	$ 236.936,62
51		5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA L	6 días	UN	2.00	$ 423.026,50
52		5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESOR	6 días	UN	2.00	$ 377.799,03
53		5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	6 días	UN	2.00	$ 498.736,83
54		**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**16 días**			**$ 82.884.807,68**
55		**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10 días**			**$ 48.471.170,94**
56		7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	10 días	M2	14.12	$ 597.168,03
57		7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	10 días	M	22.11	$ 581.860,97
58		7.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CONCRETO PARA CANCHA E=0,10m. INCLUYE IMPRIMANTE EPOXICO BASE AGUA PARA RECUBRIMIENTOS EN PISOS DE CANCHAS (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	10 días	M2	402.13	$ 47.292.141,94
59		**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 días**			**$ 34.413.636,74**

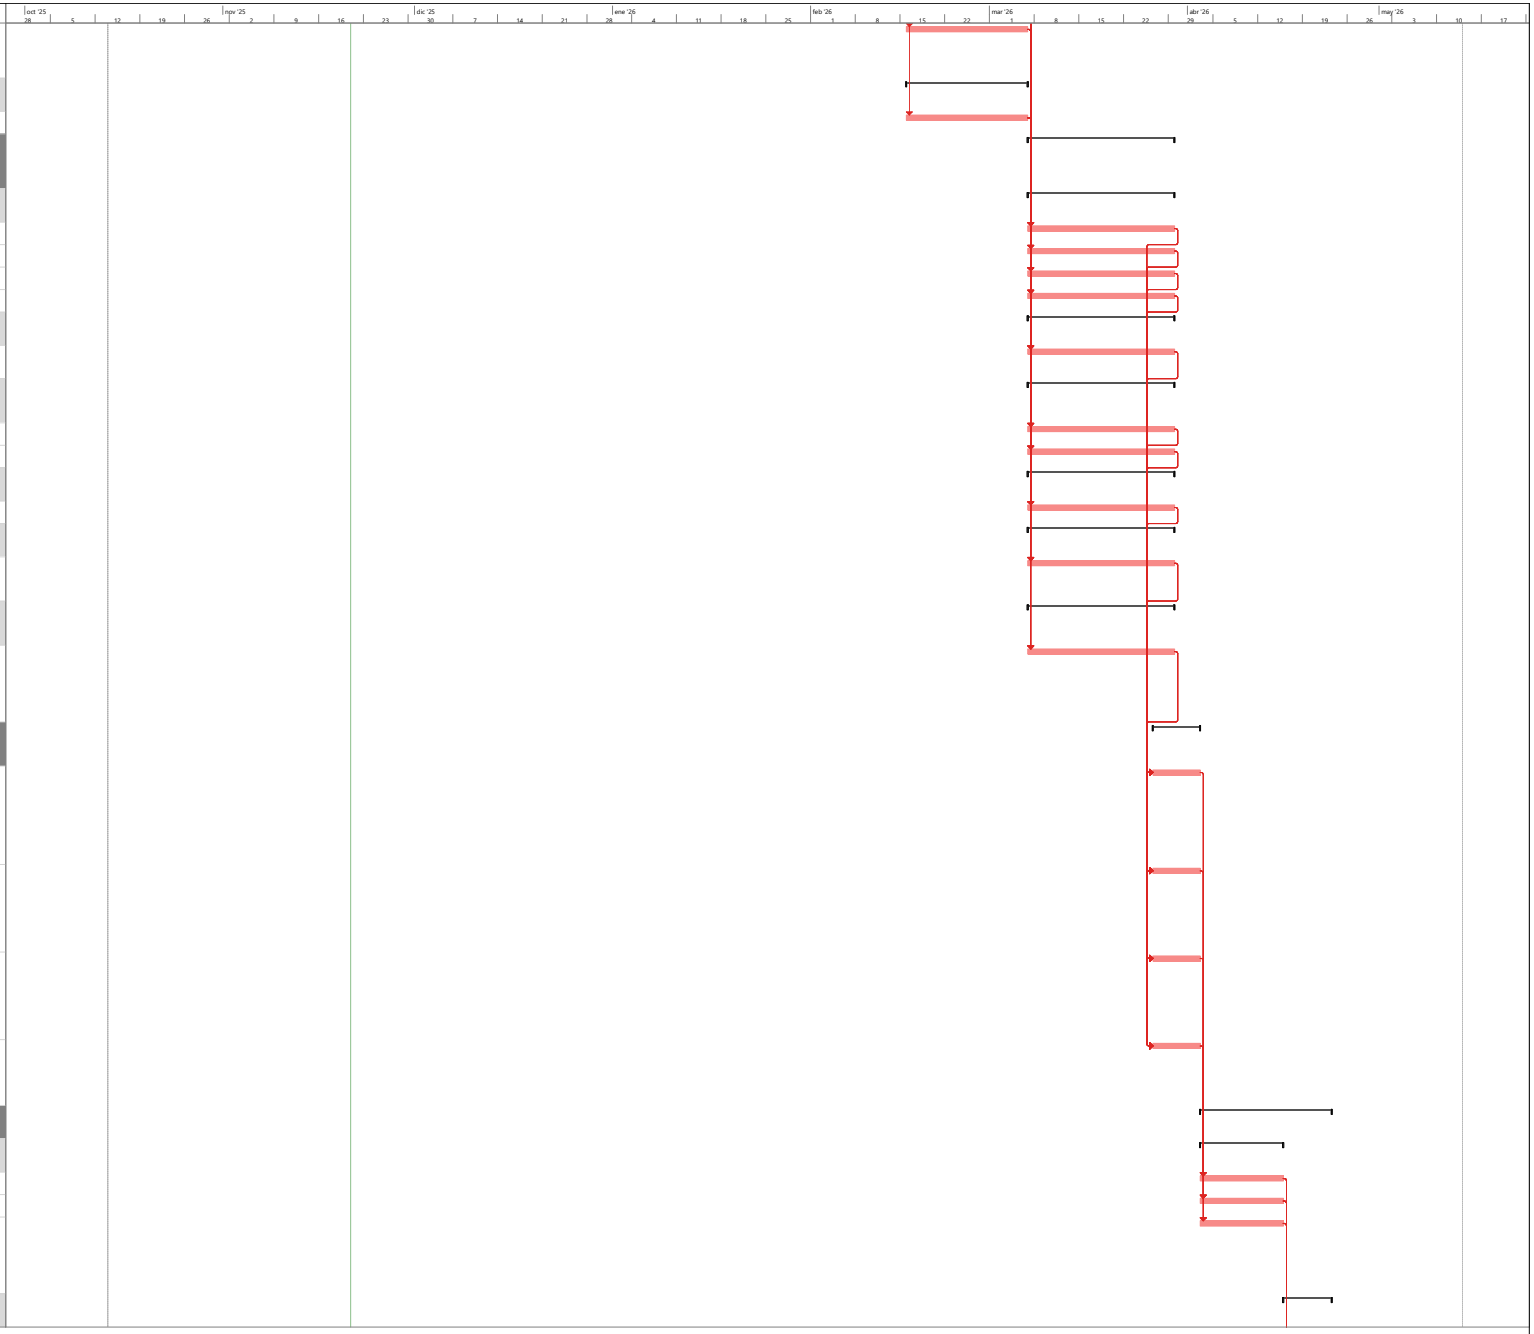


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	UNIDAD	CANTIDAD	Costo
60		7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	6 días	M2	14.12	$ 2.776.006,26
61		7.2.2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33	6 días	M2	14.12	$ 547.116,77
62		7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	6 días	M	1.74	$ 122.380,11
63		7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO H=10 CM, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	6 días	M	22.11	$ 1.783.541,21
64		7.2.21	WIN DE ALUMINIO	6 días	M	28.60	$ 410.435,34
65		7.2.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	6 días	M2	402.13	$ 25.857.735,67
66		7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX+0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	6 días	M	151.60	$ 2.916.421,38
67		**8**	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 días**			**$ 7.979.181,28**
68		8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	6 días	M2	73.58	$ 7.979.181,28
69		**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10 días**			**$ 3.437.134,48**
70		**9.2**	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 días**			**$ 2.045.713,71**
71		9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	6 días	M2	4.18	$ 2.045.713,71
72		**9.3**	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**5 días**			**$ 1.391.420,77**
73		9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE	5 días	M2	1.18	$ 1.391.420,77
74		**10**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10 días**			**$ 9.867.264,45**
75		10.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	10 días	UN	5.00	$ 5.187.197,02
76		10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	10 días	UN	2.00	$ 1.442.141,63
77		10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	10 días	UN	8.00	$ 3.021.663,75
78		10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	10 días	UN	4.00	$ 153.584,81
79		10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	10 días	UN	2.00	$ 62.677,24
80		**11**	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10 días**			**$ 20.754.132,85**
81		11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	10 días	M2	21.26	$ 19.634.868,32
82		11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	9 días	M2	1.08	$ 1.119.264,53
83		**12**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 días**			**$ 2.258.054,59**
84		**12.1**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 días**			**$ 1.790.368,45**
85		12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	6 días	M2	46.55	$ 1.790.368,45
86		**12.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 días**			**$ 426.049,07**
87		12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	6 días	M2	14.25	$ 426.049,07
88		**12.3**	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 días**			**$ 41.637,07**
89		12.3.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	6 días	M2	1.80	$ 41.637,07
90		**14**	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**2 días**			**$ 408.843,03**
91		14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	2 días	M2	2.21	$ 408.843,03
92		**18**	**ASEO Y DISPOSICION FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**3 días**			**$ 61.475,98**
93		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	3 días	M2	14.12	$ 61.475,98
94			FIN	0 días			$ 0,00

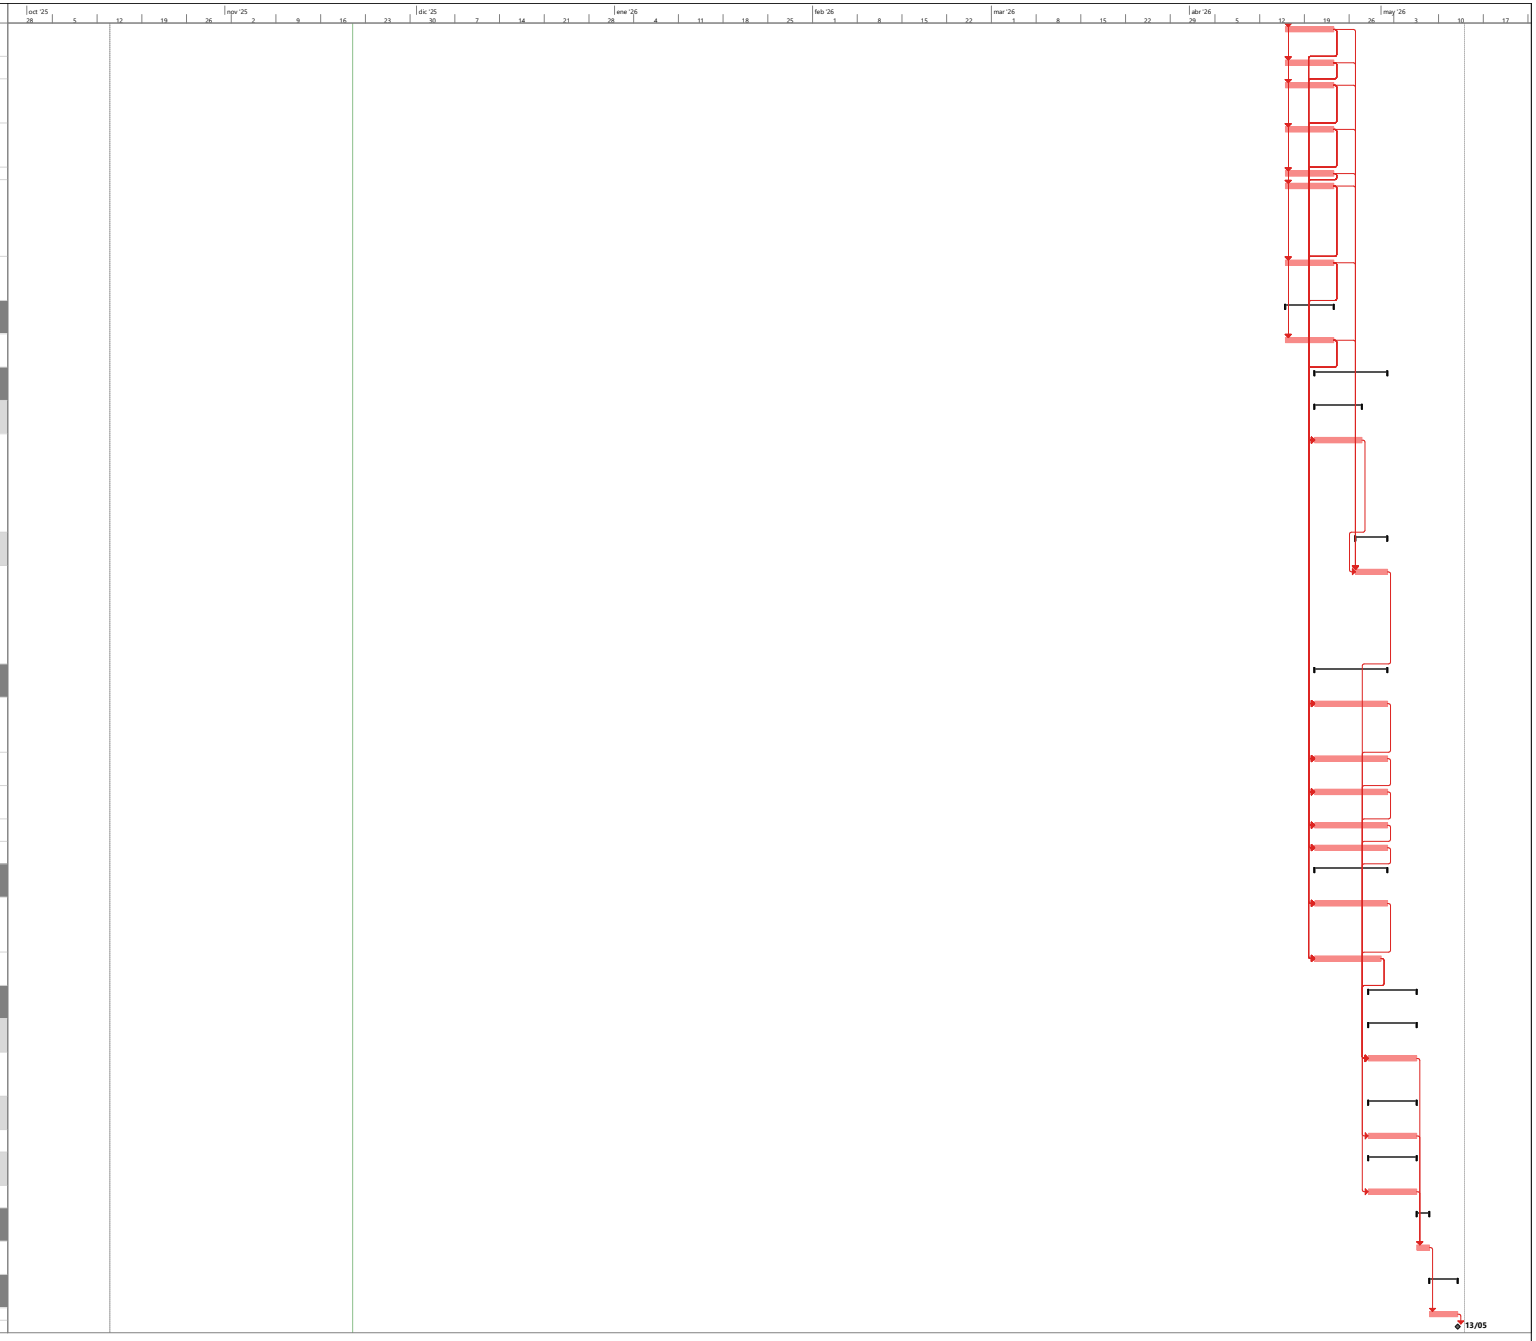


Proyecto: VILLAS DEL PROGRES
Fecha: vie 21/11/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	UNIDAD	CANTIDAD	Costo
1			**CONTRATO CDI.PCCNTR.8154784**	**107 días**			**$ 263.294.280,02**
2			LUIS LÓPEZ MESA	0 días			$ 0,00
3			ACTA DE INICIO	0 días			$ 0,00
4			DOCUMENTACION PRELIMINAR	20 días			$ 0,00
5		**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)**	**11 días**			**$ 36.023.230,56**
6		**1.2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**22 días**			**$ 35.105.590,63**
7		1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	22 días	M2	694.30	**$ 20.872.238,22**
8		1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	22 días	M2	10.98	**$ 228.580,01**
9		1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	22 días	M2	29.18	**$ 344.495,81**
10		1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	22 días	UN	2.00	**$ 38.665,38**
11		1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	22 días	M2	1.60	**$ 43.916,39**
12		1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	22 días	UN	6.00	**$ 152.805,40**
13		1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	22 días	M	54.82	**$ 1.059.818,78**
14		1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APAÑATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	22 días	UN	3.00	**$ 33.514,82**
15		1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	22 días	UN	3.00	**$ 20.919,64**
16		1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	22 días	M2	675.62	**$ 11.380.451,97**
17		1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	22 días	M2	21.71	**$ 458.270,22**
18		1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	22 días	M	43.32	**$ 362.356,72**
19		1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	22 días	UN	8.00	**$ 109.557,27**
20		**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**14 días**			**$ 917.639,93**
21		1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFEC	14 días	M	45	**$ 917.639,93**
22		**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**14 días**			**$ 8.673.506,92**
23		**4.2**	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**14 días**			**$ 7.152.171,70**
24		4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	14 días	M	36.05	**$ 3.082.318,79**
25		4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	14 días	M	23.82	**$ 1.750.594,21**
26		4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	14 días	M	43.52	**$ 2.077.053,67**
27		4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	14 días	UN	2.00	**$ 242.205,03**
28		**4.3**	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	**14 días**			**$ 562.197,50**
29		4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	14 días	M	40.18	**$ 562.197,50**

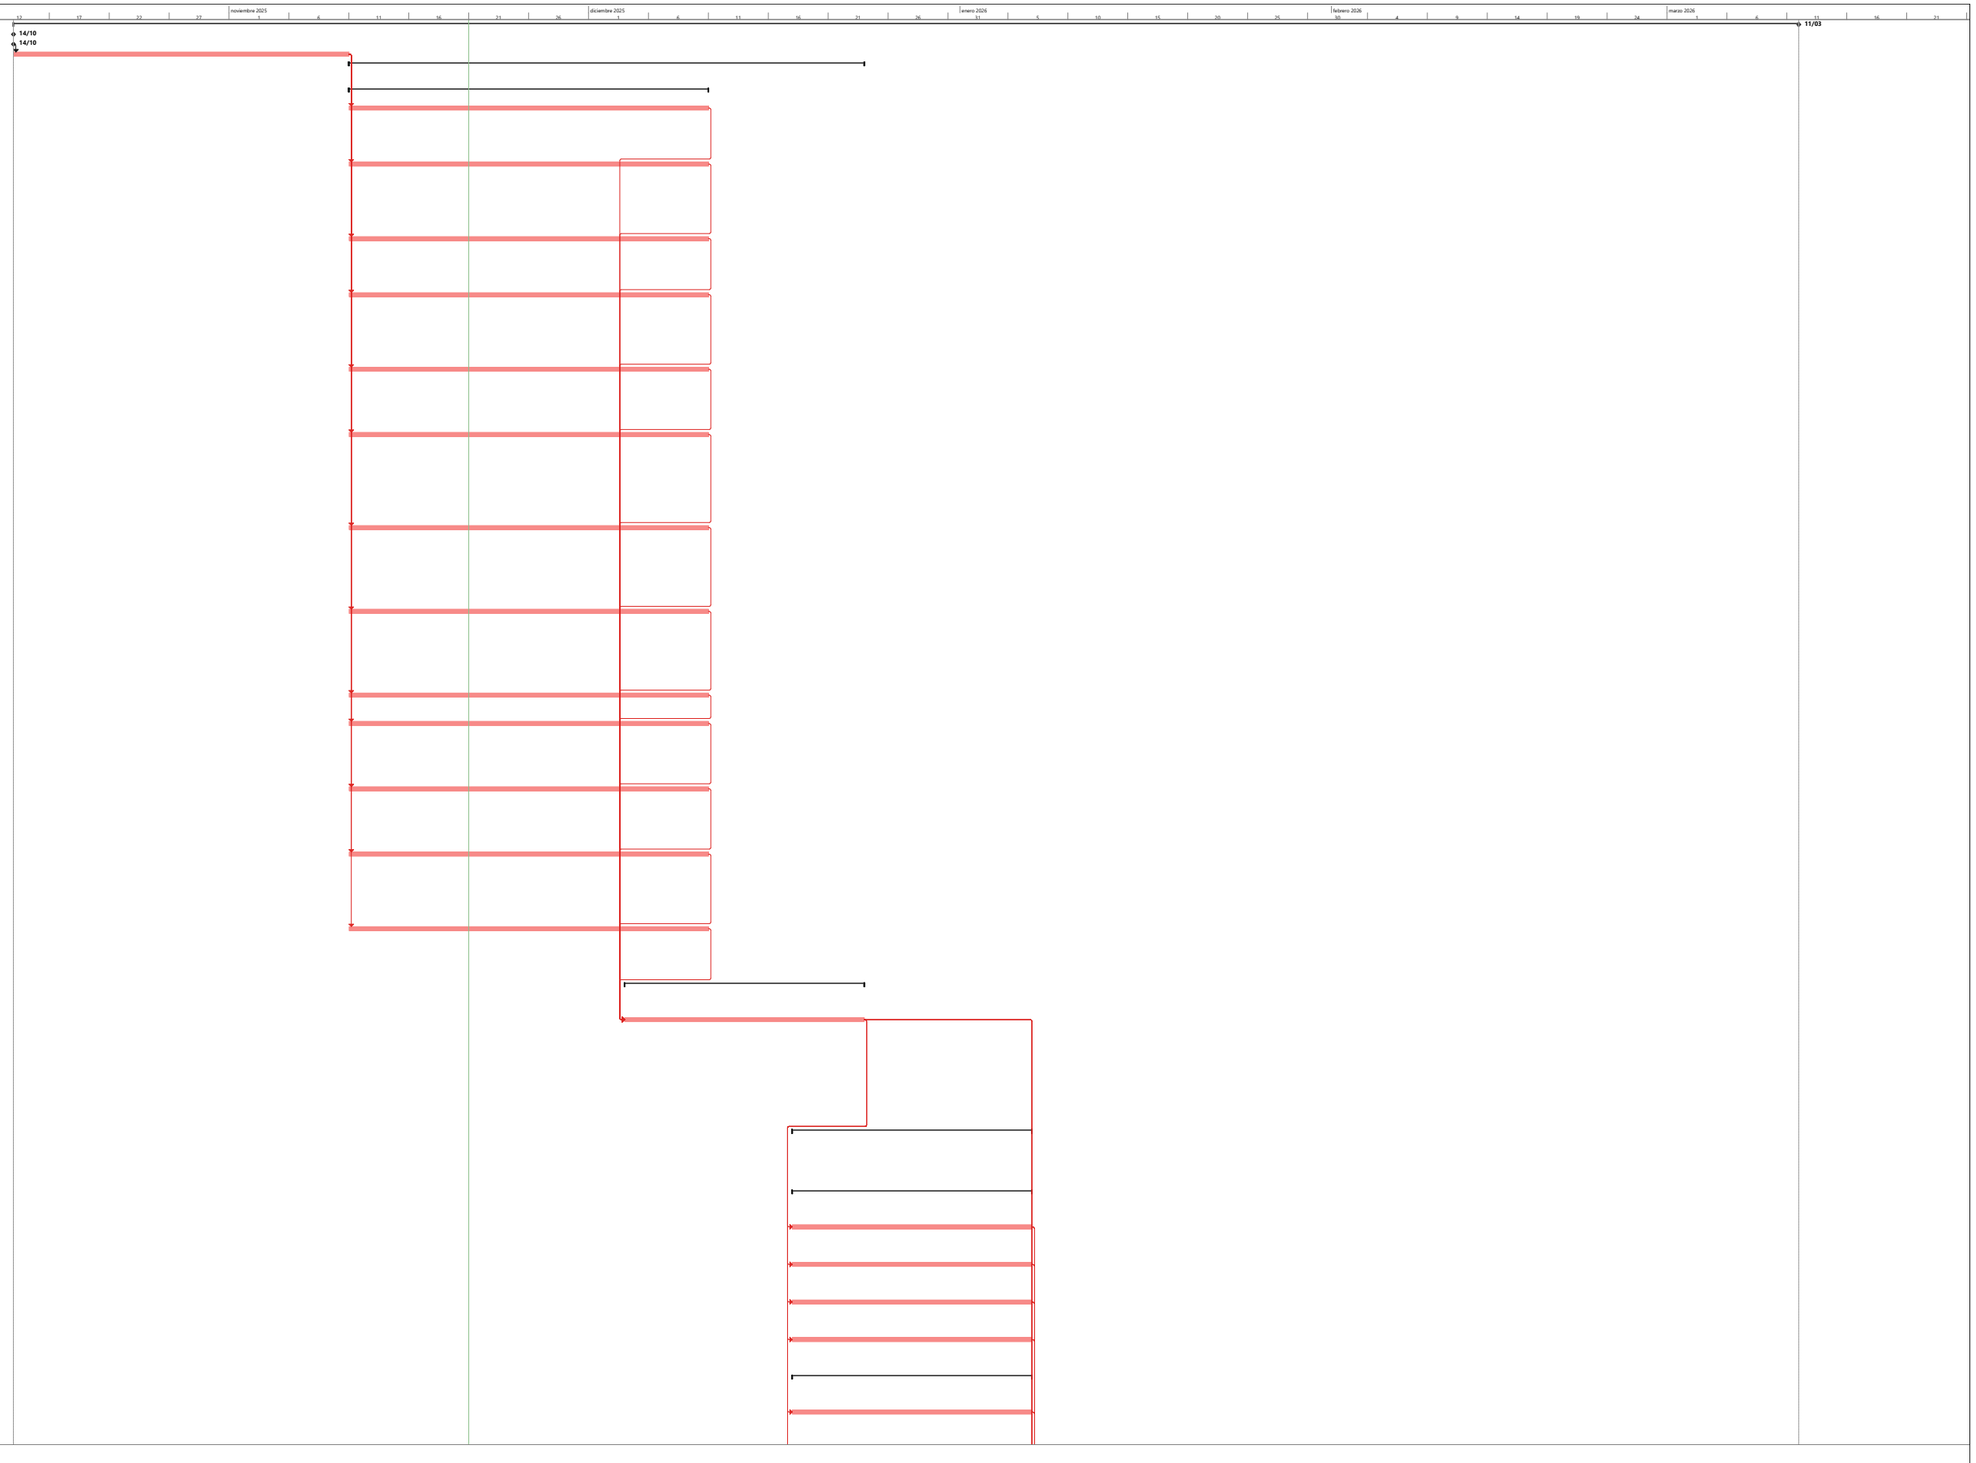


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	UNIDAD	CANTIDAD	Costo
10		**4.5**	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**14 días**			**$ 830.309,36**
11		4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	14 días	UN	8.00	**$ 474.462,49**
12		4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	14 días	UN	6.00	**$ 355.846,87**
13		**4.6**	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**14 días**			**$ 128.828,36**
14		4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	14 días	UN	2.00	**$ 128.828,36**
15		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**46 días**			**$ 2.083.053,29**
16		5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTAL	13 días	UN	1.00	**$ 118.468,31**
17		5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA L	13 días	UN	1.00	**$ 211.513,25**
18		5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESOR	13 días	UN	4.00	**$ 755.598,07**
19		5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	2 días	UN	4.00	**$ 997.473,66**
40		**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**15 días**			**$ 44.854.967,98**
41		**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**15 días**			**$ 42.429.442,42**
42		7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	15 días	M2	25.11	**$ 1.061.740,53**
43		7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	15 días	M2	567.52	**$ 36.915.119,01**
44		7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	15 días	M	169.19	**$ 4.452.582,88**
45		**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**15 días**			**$ 2.425.525,56**
46		7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	5 días	M	7.35	**$ 516.951,29**
47		7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO H=10 CM, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	15 días	M	23.66	**$ 1.908.574,27**
48		**8**	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**13 días**			**$ 6.387.508,59**
49		8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	13 días	M2	**58.91**	**$ 6.387.508,59**
50		**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11 días**			**$ 8.456.141,37**
51		**9.2**	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11 días**			**$ 1.136.753,14**
52		9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	11 días	M2	2.32	**$ 1.136.753,14**
53		**9.3**	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11 días**			**$ 7.319.388,23**
54		9.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	11 días	M2	1.60	**$ 1.118.585,55**
55		9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE	11 días	M2	4.79	**$ 5.663.754,02**

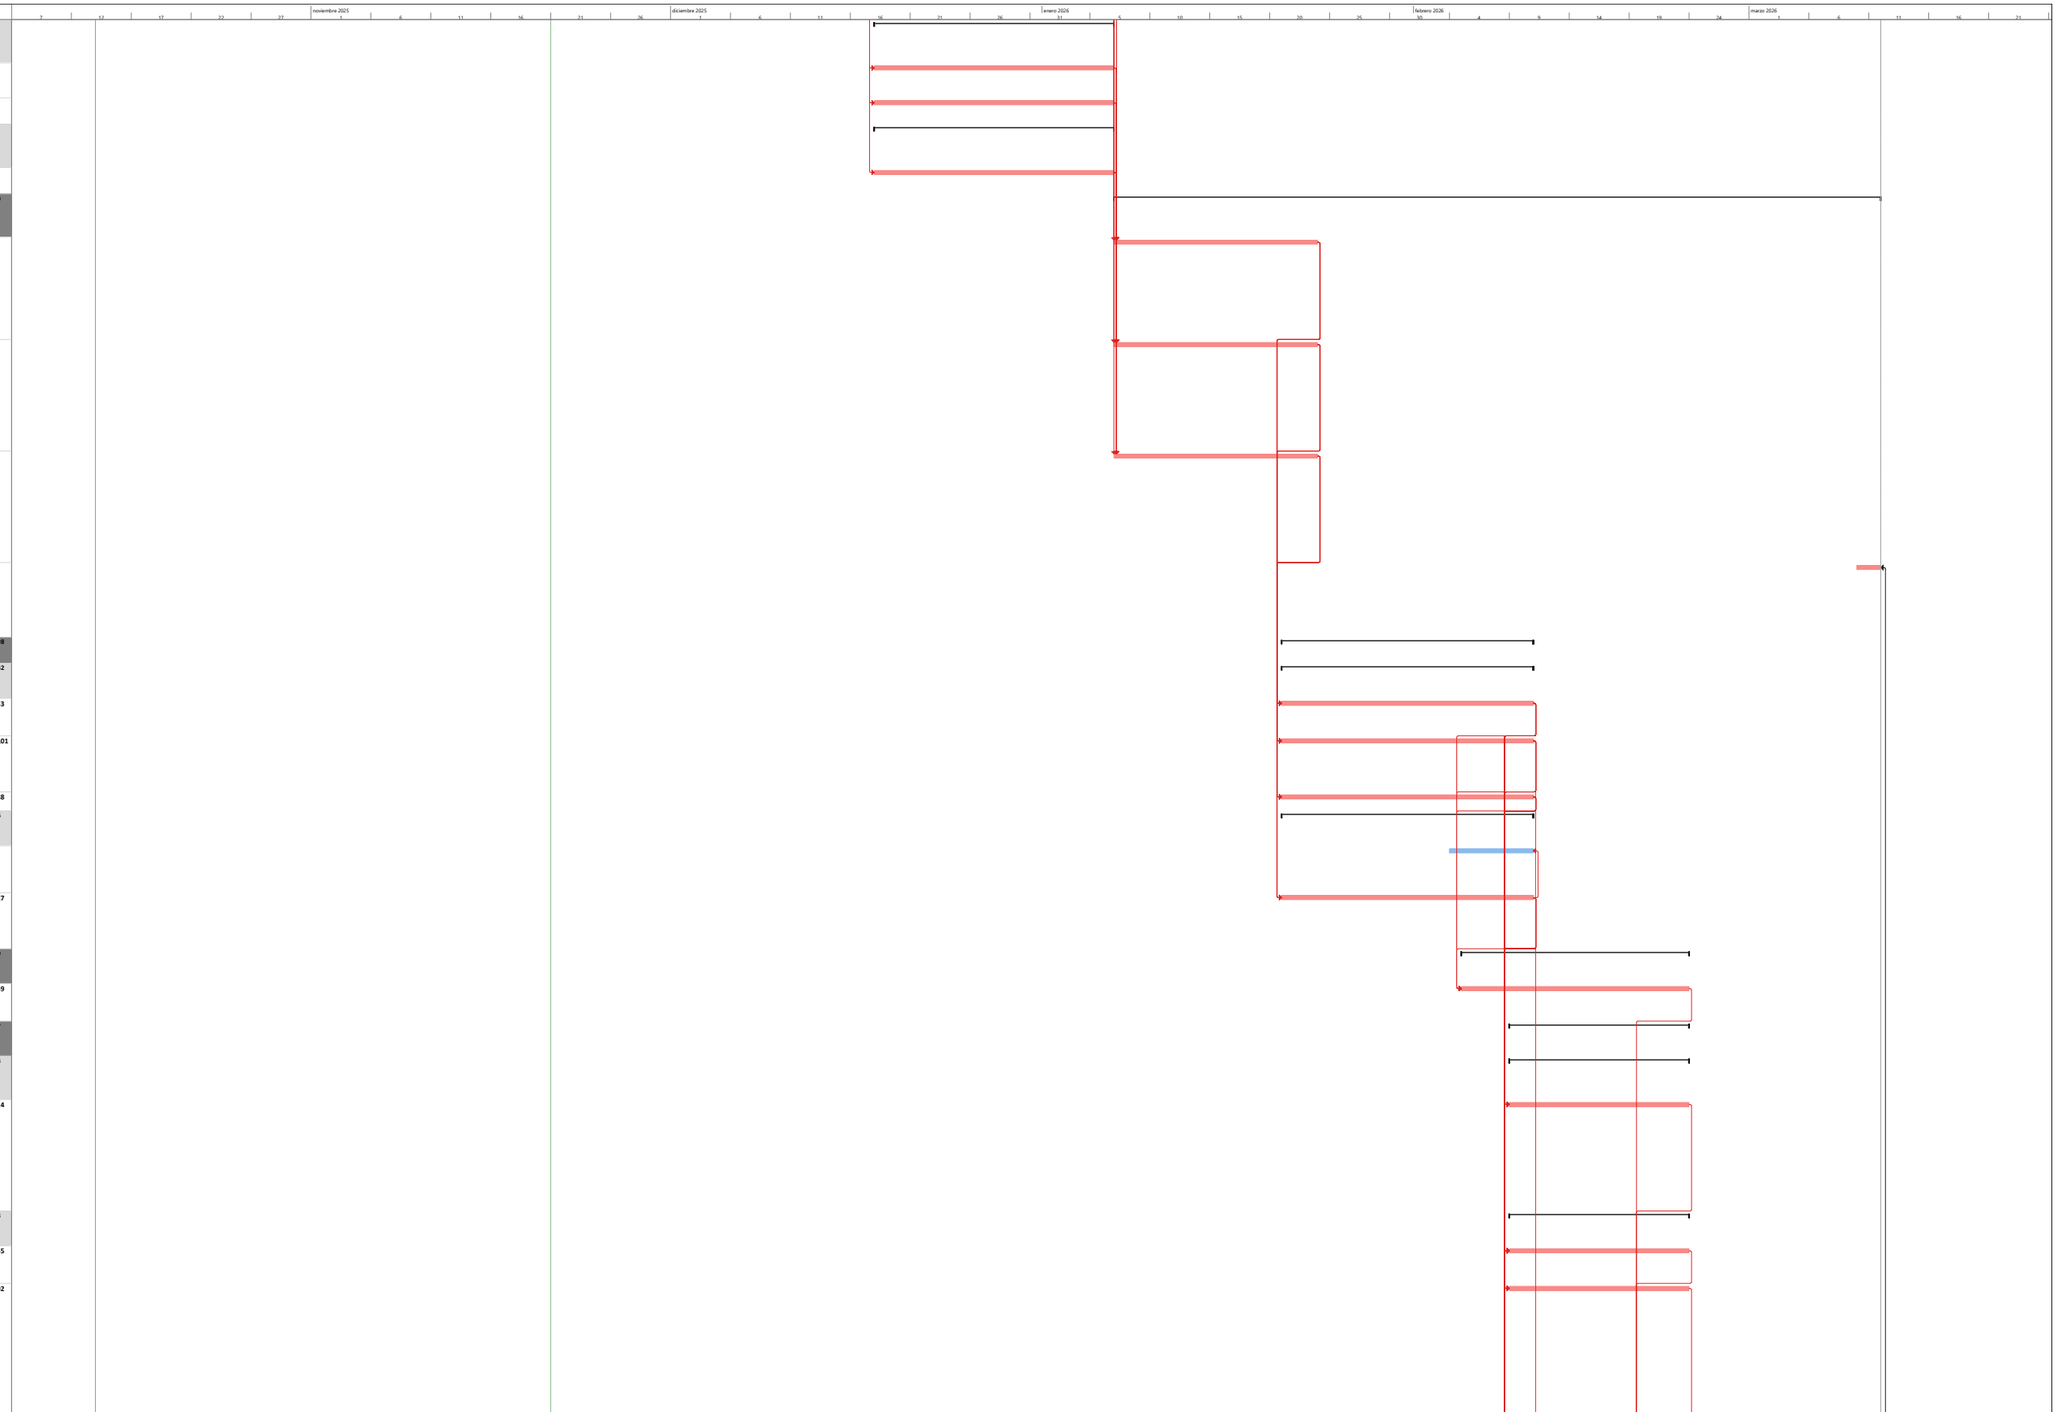

Id	Modo de tarea	ITIM	Nombre de tarea	Duración	UNIDAD	CANTIDAD	Costo
56		9.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE ORINALES EN ACRILICO RECUPERADO DE 10 MM DISEÑO DE ANIMALES, MODULOS DE 40 X 90 X 1 CM, INCLUYE SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" ANCLADO AL PISO	11 días	UND	1.00	$ 537.048,66
57		**10**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11 días**			**$ 9.265.101,21**
58		10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LINEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	11 días	UN	7.00	**$ 5.707.762,81**
59		10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LINEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	11 días	UN	1.00	**$ 1.151.620,94**
60		10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	11 días	UN	6.00	**$ 2.266.247,81**
61		10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	11 días	UN	2.00	**$ 76.792,41**
62		10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	11 días	UN	2.00	**$ 62.677,24**
63		**11**	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10 días**			**$ 17.732.336,50**
64		11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	10 días	M2	19.20	**$ 17.732.336,50**
65		**12**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 días**			**$ 3.027.698,18**
66		**12.1**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 días**			**$ 3.027.698,18**
67		**12.1.2**	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	6 días	M2	58.91	**$ 2.265.775,07**
68		**12.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 días**			**$ 750.819,80**
69		12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	6 días	M2	25.11	**$ 750.819,80**
70		**12.3**	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**3 días**			**$ 11.103,31**
71		12.3.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	3 días	M2	0.48	**$ 11.103,31**
72		**14**	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**14 días**			**$ 101.840,80**
73		14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	14 días	M2	0.55	**$ 101.840,80**
74		**16**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**21 días**			**$ 49.191.783,71**
75		16.1.4	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	21 días	M2	745.62	**$ 49.191.783,71**
76		**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**8 días**			**$ 580.087,87**
77		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	8 días	M2	25.11	**$ 580.087,87**
78		**19**	**MANTENIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**15 días**			**$ 76.917.023,04**
79		19.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR DE PASAJEROS MEDIA CABINA USO PARA PERSONAS CON DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD Y PASAJEROS, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 500 KG CARGA VIVA Y TOTAL CON CABINA 890 KG APROX, 2 PARADAS, FOSO CON MEDIDAS 1.60M DE ANCHO X 1.60M DE	15 días	UN	1.00	**$ 76.917.023,04**
80			FIN	0 días			$ 0,00

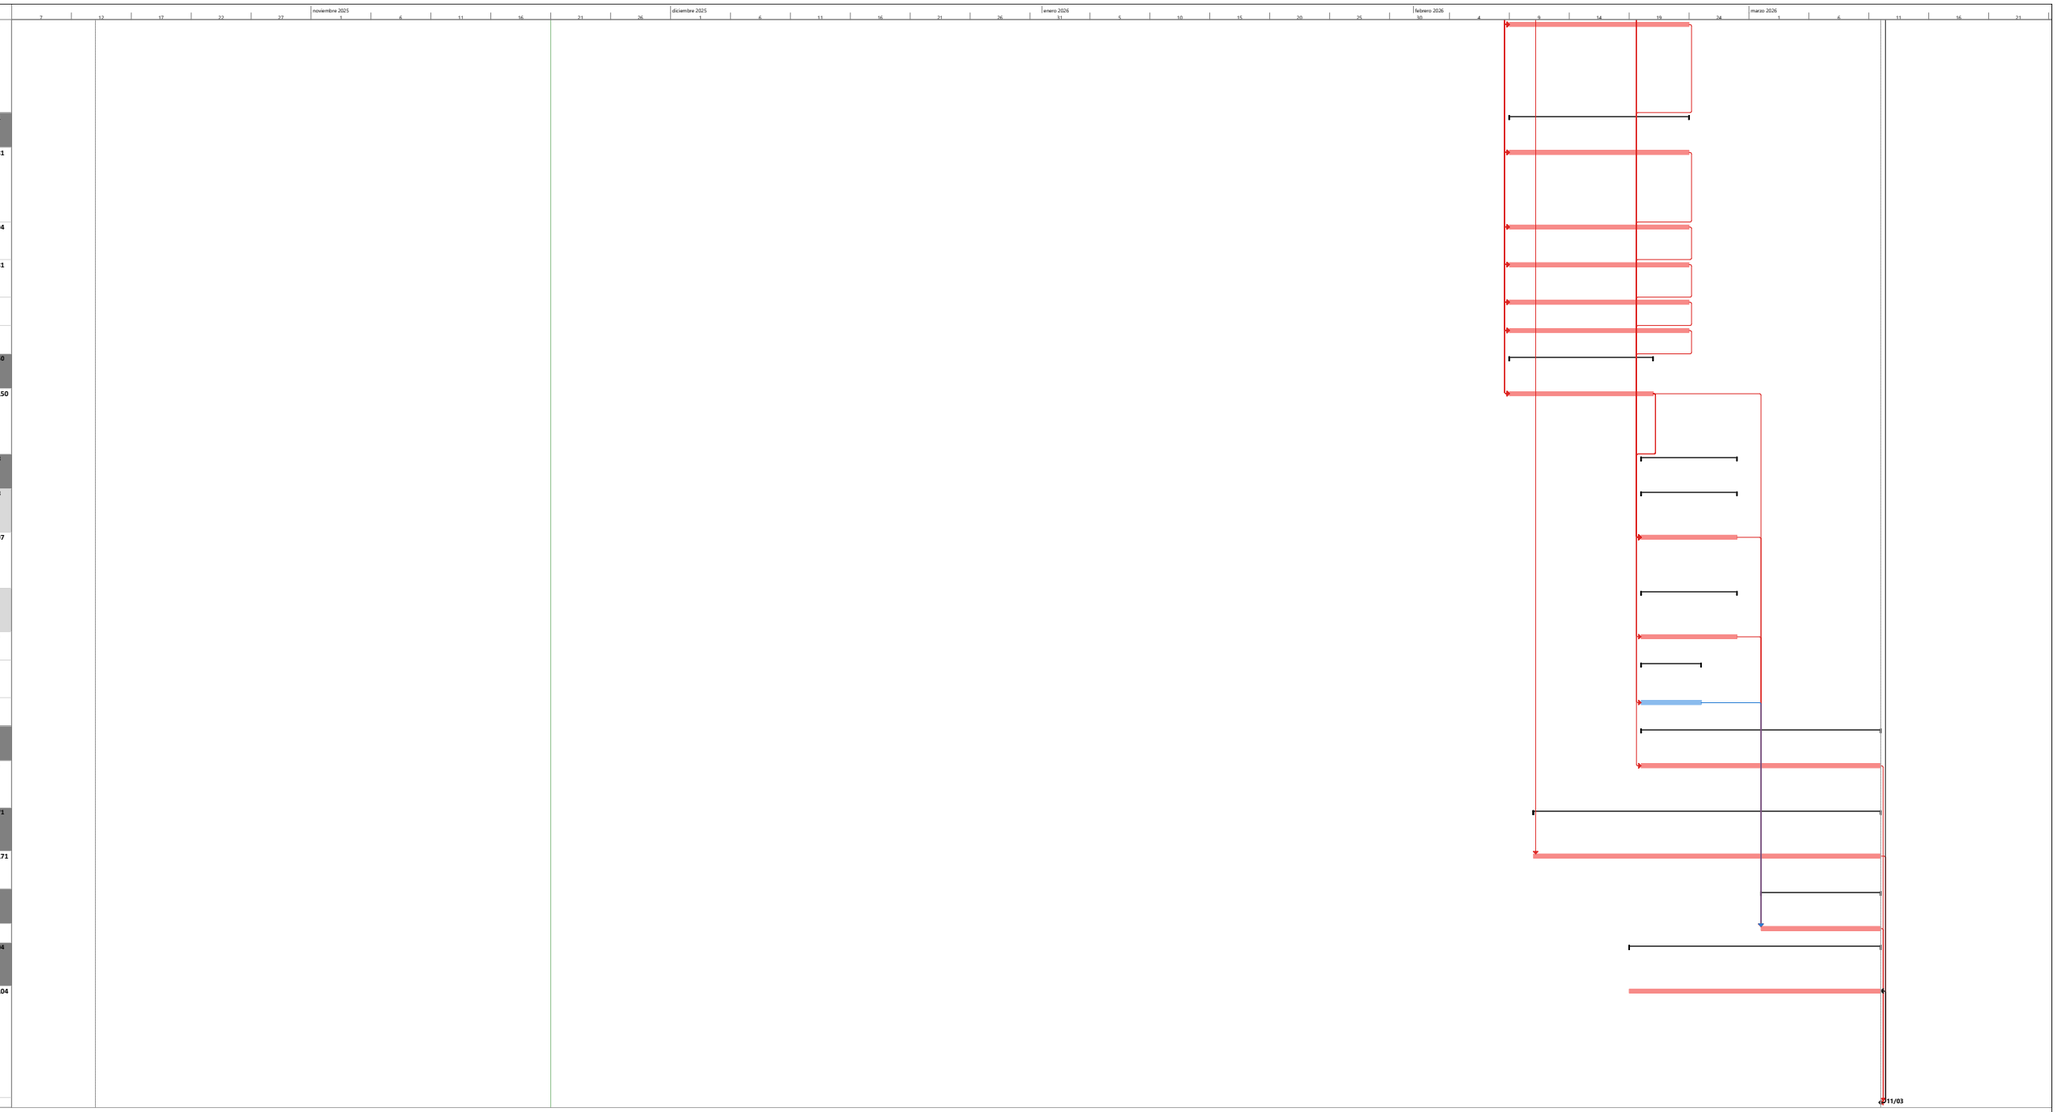


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración
1			**CONTRATO EL PORVENIR SEDE B**			**$ 282.259.511,...**	**131 días**
2			ACTA DE INICIO			$ 0,00	0 días
3			ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			$ 0,00	21 días
4			INICIO			$ 0,00	0 días
5		**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 23.389.801,63**	**40 días**
6		**1.2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**$ 18.656.206,38**	**30 días**
7		1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)		76.69	**$ 2.305.624,31**	30 días
8		1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)		108.27	**$ 3.294.211,03**	30 días
9		1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)		76.49	**$ 1.592.310,14**	30 días
10		1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)		115.56	**$ 1.364.465,35**	30 días
11		1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)		12.00	**$ 231.992,29**	30 días
12		1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)		21.23	**$ 657.410,60**	30 días
13		1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)		11.70	**$ 320.904,46**	30 días
14		1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)		37.00	**$ 942.299,96**	30 días
15		1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)		66.71	**$ 1.289.586,66**	30 días

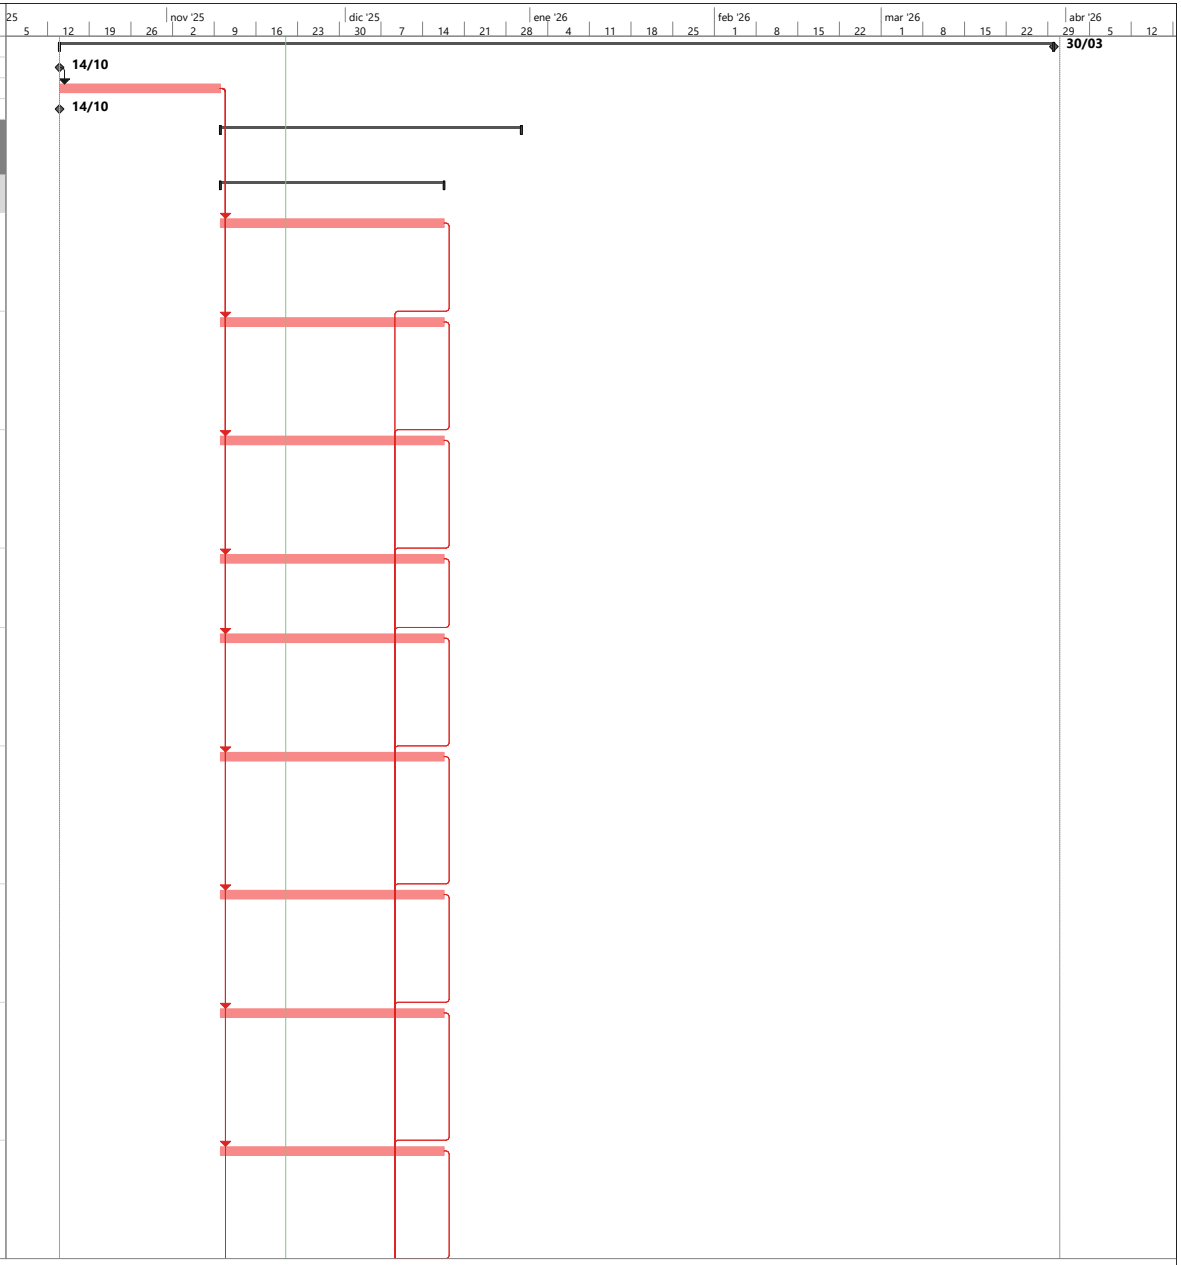

Proyecto:
PROGRAMACION EL PORVENIR SEDE
Fecha: vie 21/11/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración
16		1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN		98.41	**$ 3.376.158,02**	30 días
17		1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)		9.00	**$ 100.544,46**	30 días
18		1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)		76.69	**$ 1.618.804,87**	30 días
19		1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)		149.07	**$ 1.246.917,07**	30 días
20		1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)		23.00	**$ 314.977,16**	30 días
21		**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 4.733.595,25**	**15 días**
22		1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFEC		232.13	**$ 4.733.595,25**	15 días
23		**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 972.243,13**	**15 días**
24		**2.3**	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 972.243,13**	**15 días**
25		2.3.7	PERFORACIÓN NÚCLEO 3" E= 0.10 M		6.00	**$ 972.243,13**	15 días
26		**3**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 515.428,62**	**8 días**
27		**3.1**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 515.428,62**	**8 días**
28		3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5		7.32	**$ 515.428,62**	8 días
29		**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 14.775.029,34**	**72 días**

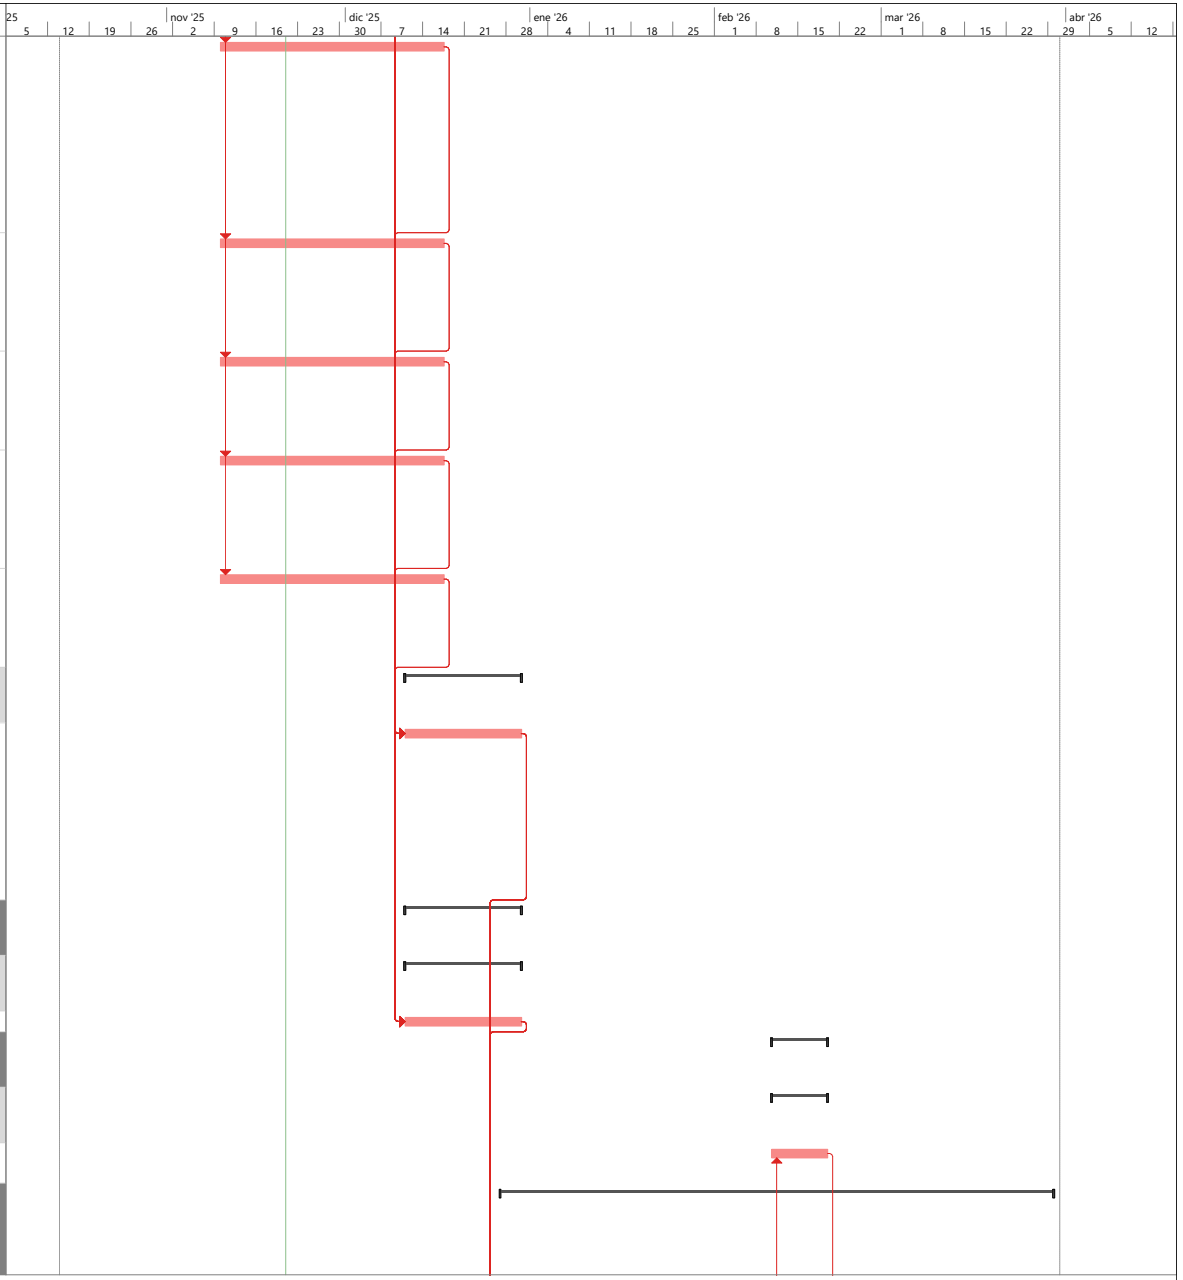

Proyecto:
PROGRAMACION EL PORVENIR SEDE
Fecha: vie 21/11/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración
30		**4.2**	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 9.621.167,69**	**20 días**
31		4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS		67.65	**$ 5.784.157,47**	20 días
32		4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS		12.96	**$ 952.464,49**	20 días
33		4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS		29.99	**$ 1.431.315,53**	20 días
34		4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS		12.00	**$ 1.453.230,20**	20 días
35		**4.3**	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**			**$ 2.060.177,07**	**20 días**
36		4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS		147.24	**$ 2.060.177,07**	20 días
37		**4.5**	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 2.490.928,07**	**20 días**
38		4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"		24.00	**$ 1.423.387,47**	20 días
39		4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"		18.00	**$ 1.067.540,60**	20 días
40		**4.6**	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 515.313,45**	**20 días**
41		4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"		8.00	**$ 515.313,45**	20 días
42		**4.9**	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 87.443,06**	**5 días**
43		4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES		15.00	**$ 87.443,06**	5 días
44		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 4.314.334,57**	**4 días**
45		5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTAL		4.00	**$ 473.873,24**	4 días
46		5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA L		4.00	**$ 846.052,99**	4 días
47		5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESOR		8.00	**$ 1.511.196,13**	4 días

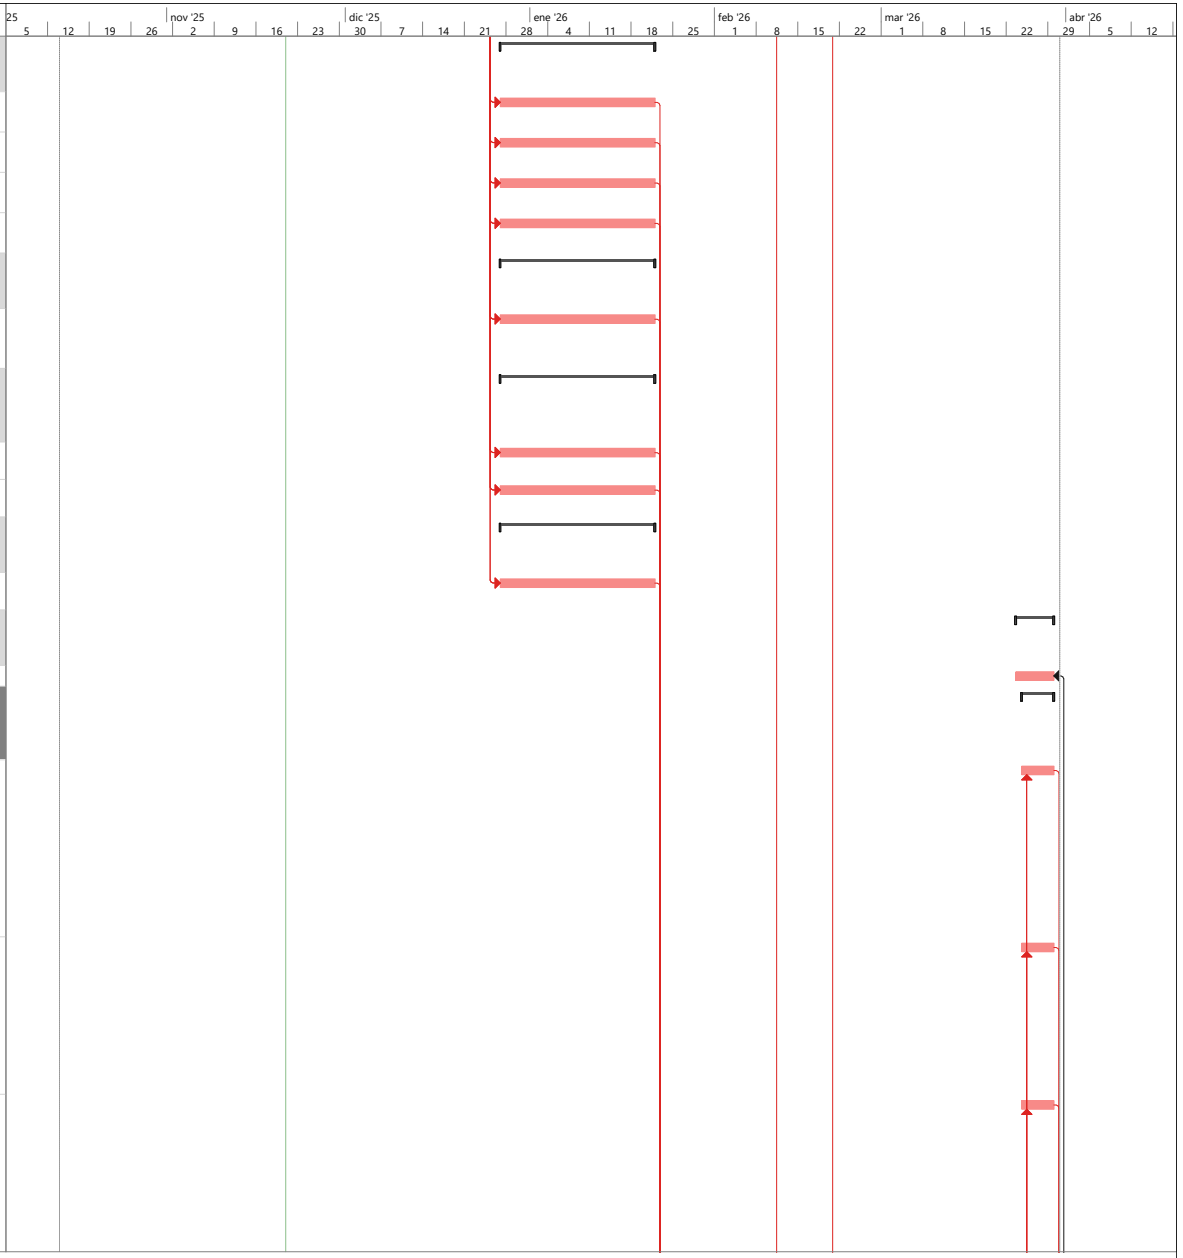

Proyecto:
PROGRAMACION EL PORVENIR SEDE
Fecha: vie 21/11/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica	
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual	


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración
48		5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS		8.00	**$ 1.483.212,21**	3 días
49		**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 30.289.331,90**	**48 días**
50		**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 14.465.327,29**	**46 días**
51		7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M		76.69	**$ 3.242.540,68**	15 días
52		7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE		108.27	**$ 7.042.392,12**	16 días
53		7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO		158.85	**$ 4.180.394,49**	15 días
54		**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 15.824.004,61**	**33 días**
55		7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO		76.69	**$ 15.073.344,18**	32 días
56		7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE		3.76	**$ 264.453,16**	5 días
57		7.2.21	WIN DE ALUMINIO		33.88	**$ 486.207,27**	12 días
58		**8**	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 14.982.541,06**	**12 días**
59		8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX		138.17	**$ 14.982.541,06**	12 días
60		**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 24.736.493,11**	**4 días**
61		**9.2**	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 12.645.263,42**	**4 días**
62		9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)		9.50	**$ 4.655.762,28**	4 días
63		9.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 3+3 MM INCOLORO Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)		14.58	**$ 7.989.501,14**	4 días
64		**9.3**	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 12.091.229,69**	**4 días**

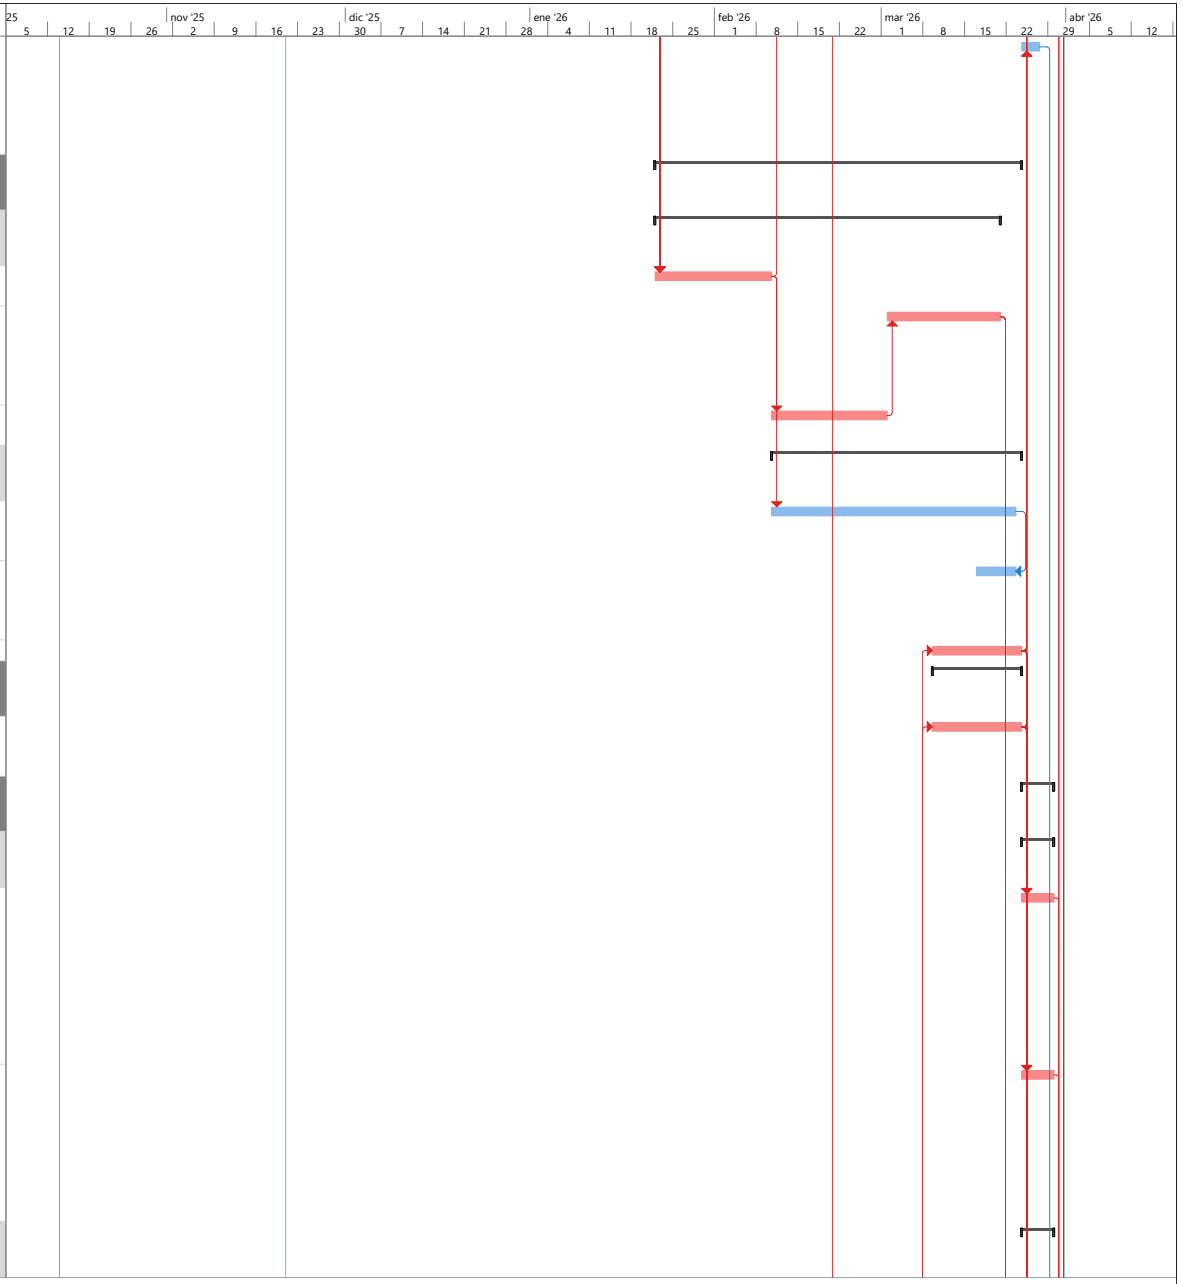

Proyecto:
PROGRAMACION EL PORVENIR SEDE
Fecha: vie 21/11/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración
65		9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE		8.87	**$ 10.480.083,70**	4 días
66		9.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE ORINALES EN ACRILICO RECUPERADO DE 10 MM DISEÑO DE ANIMALES, MODULOS DE 40 X 90 X 1 CM, INCLUYE SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" ANCLADO AL PISO		3.00	**$ 1.611.145,99**	4 días
67		**10**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 27.748.232,06**	**4 días**
68		10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)		6.00	**$ 4.892.368,12**	4 días
69		10.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)		10.00	**$ 10.374.394,04**	4 días
70		10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)		4.00	**$ 2.303.241,87**	4 días
71		10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)		4.00	**$ 2.884.283,25**	4 días
72		10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)		18.00	**$ 6.798.743,43**	4 días
73		10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA		8.00	**$ 307.169,63**	4 días
74		10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"		6.00	**$ 188.031,72**	4 días
75		**11**	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 89.832.487,43**	**4 días**
76		11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"		93.63	**$ 86.474.693,86**	4 días
77		11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL		3.24	**$ 3.357.793,57**	4 días
78		**12**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 8.744.816,63**	**29 días**
79		**12.1**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 6.451.826,34**	**15 días**
80		12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)		167.73	**$ 6.451.826,34**	15 días

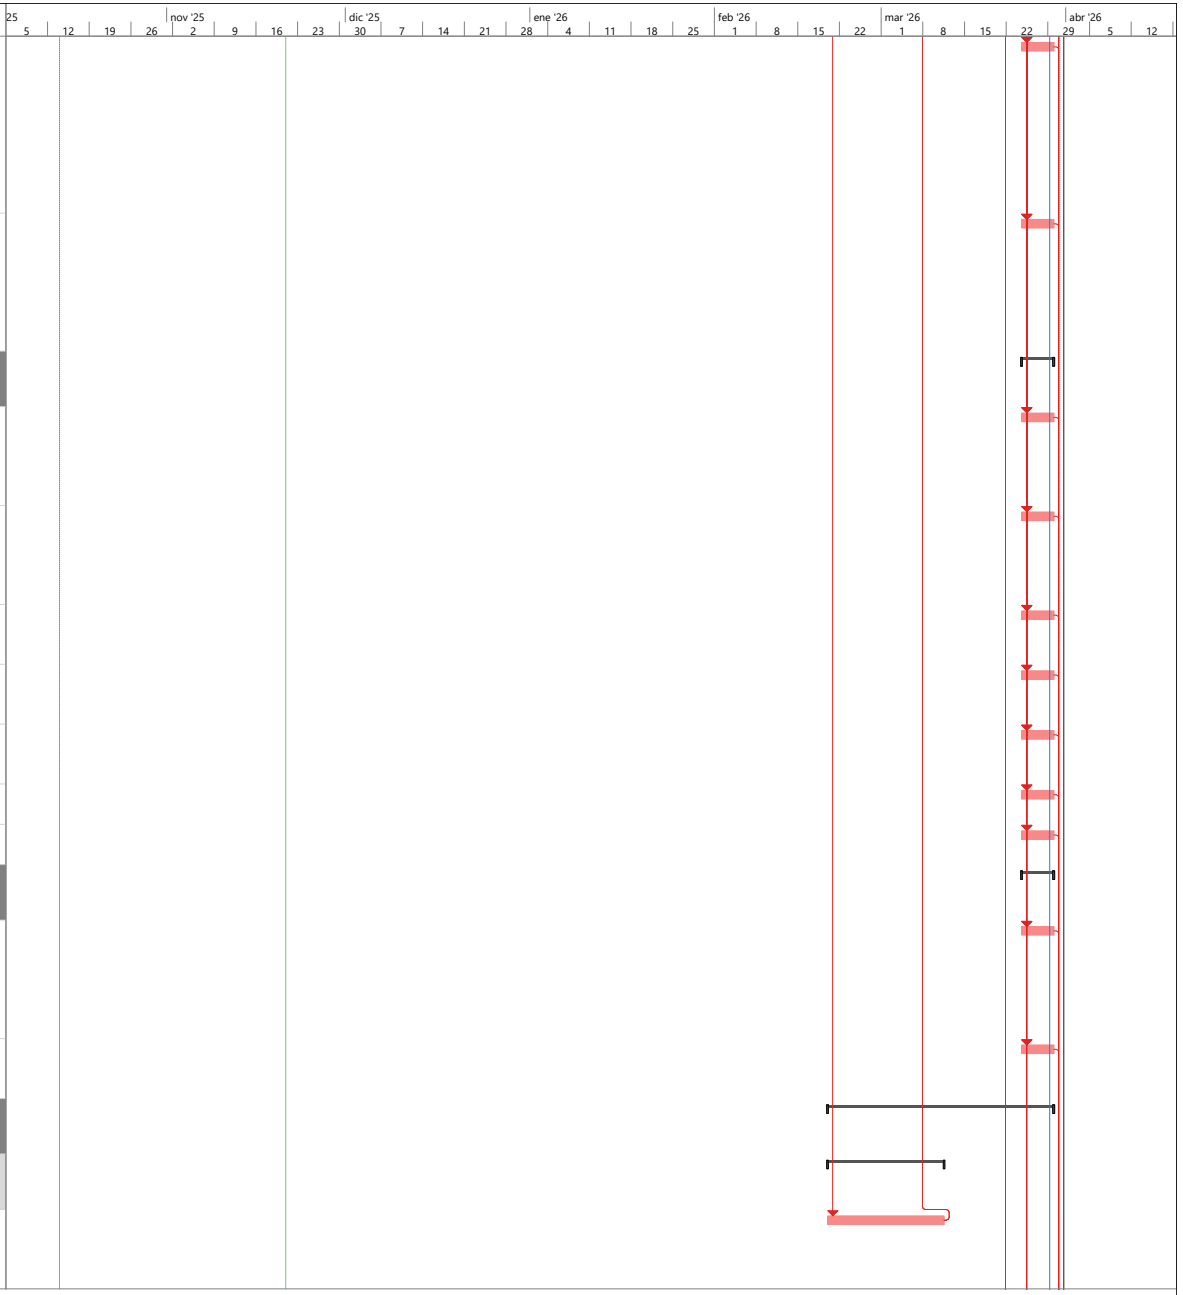

Proyecto:
PROGRAMACION EL PORVENIR SEDE
Fecha: vie 21/11/25

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración
81		**12.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 2.292.990,29**	**4 días**
82		12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO		76.69	**$ 2.292.990,29**	4 días
83		**14**	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 1.477.613,02**	**4 días**
84		14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO		7.98	**$ 1.477.613,02**	4 días
85		**16**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 40.147.353,18**	**6 días**
86		16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO		54.46	**$ 6.062.322,70**	3 días
87		16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)		108.27	**$ 9.384.442,66**	6 días
88		16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE D		92.51	**$ 22.864.705,32**	6 días
89		16.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH		13.62	**$ 1.835.882,50**	3 días
90		**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 333.806,31**	**5 días**
91		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA		76.69	**$ 333.806,31**	5 días
92			FIN			$ 0,00	0 días

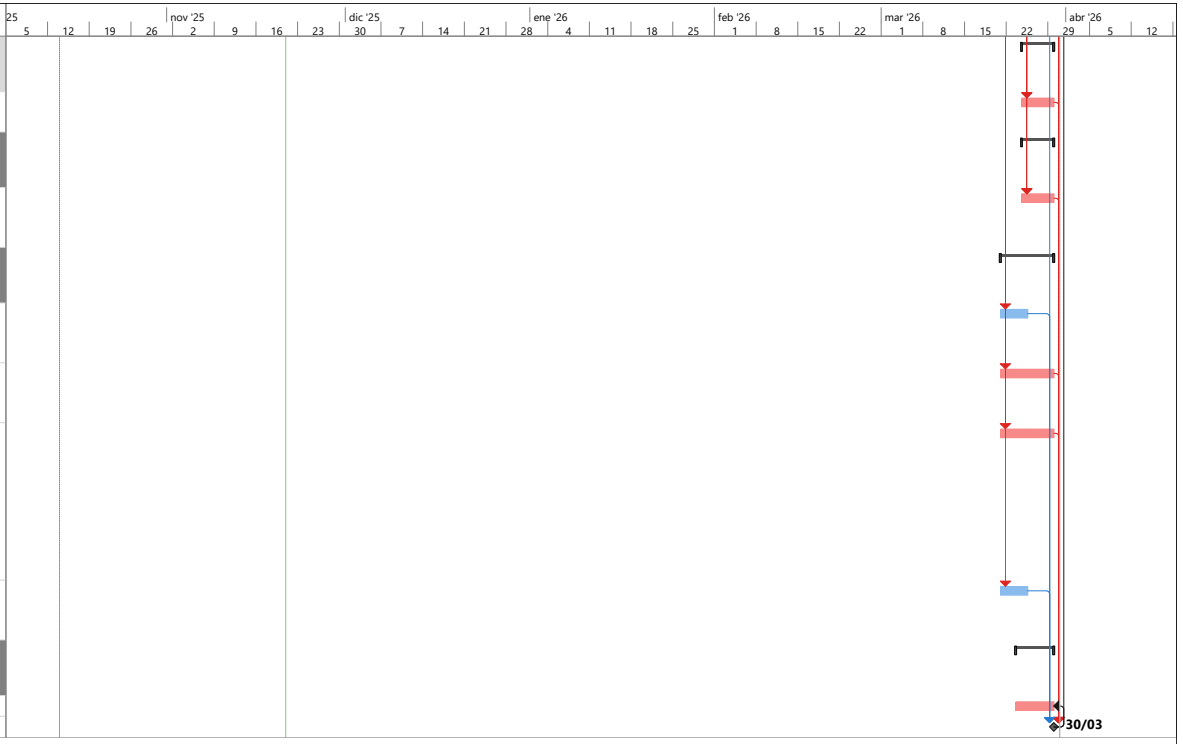

Proyecto:
PROGRAMACION EL PORVENIR SEDE
Fecha: vie 21/11/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración
1			**CONTRATO EDUARDO UMAÑA SEDE A**			**$ 199.641.603,96**	**87 días**
2			ACTA DE INICIO			$ 0,00	0 días
3			ACTIVIDADES ADINISTRATIVA			$ 0,00	21 días
4			INCIO			$ 0,00	0 días
5		**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 17.942.911,06**	**31 días**
6		**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 96.514,81**	**23 días**
7		1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	21.76	**$ 96.514,81**	23 días
8		**1.2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**$ 16.940.991,25**	**23 días**
9		1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	20.82	**$ 626.018,42**	23 días
10		1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34.72	**$ 722.712,68**	23 días
11		1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.82	**$ 434.705,66**	23 días
12		1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2.00	**$ 38.665,38**	23 días
13		1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	8.88	**$ 275.004,72**	23 días
14		1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11.00	**$ 280.143,23**	23 días
15		1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	40.50	**$ 782.974,00**	23 días
16		1.2.22	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2.00	**$ 324.260,50**	23 días
17		1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	4.00	**$ 44.686,43**	23 días
18		1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	3.00	**$ 20.919,64**	23 días
19		1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	752.40	**$ 12.673.776,39**	23 días
20		1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	20.82	**$ 439.534,82**	23 días
21		1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	25.00	**$ 209.116,08**	23 días
22		1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	5.00	**$ 68.473,30**	23 días
23		**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 905.405,00**	**8 días**
24		1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFEC	M	44.40	**$ 905.405,00**	8 días
25		**3**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 629.639,61**	**9 días**
26		**3.1**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 629.639,61**	**9 días**
27		3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	8.94	**$ 629.639,61**	9 días

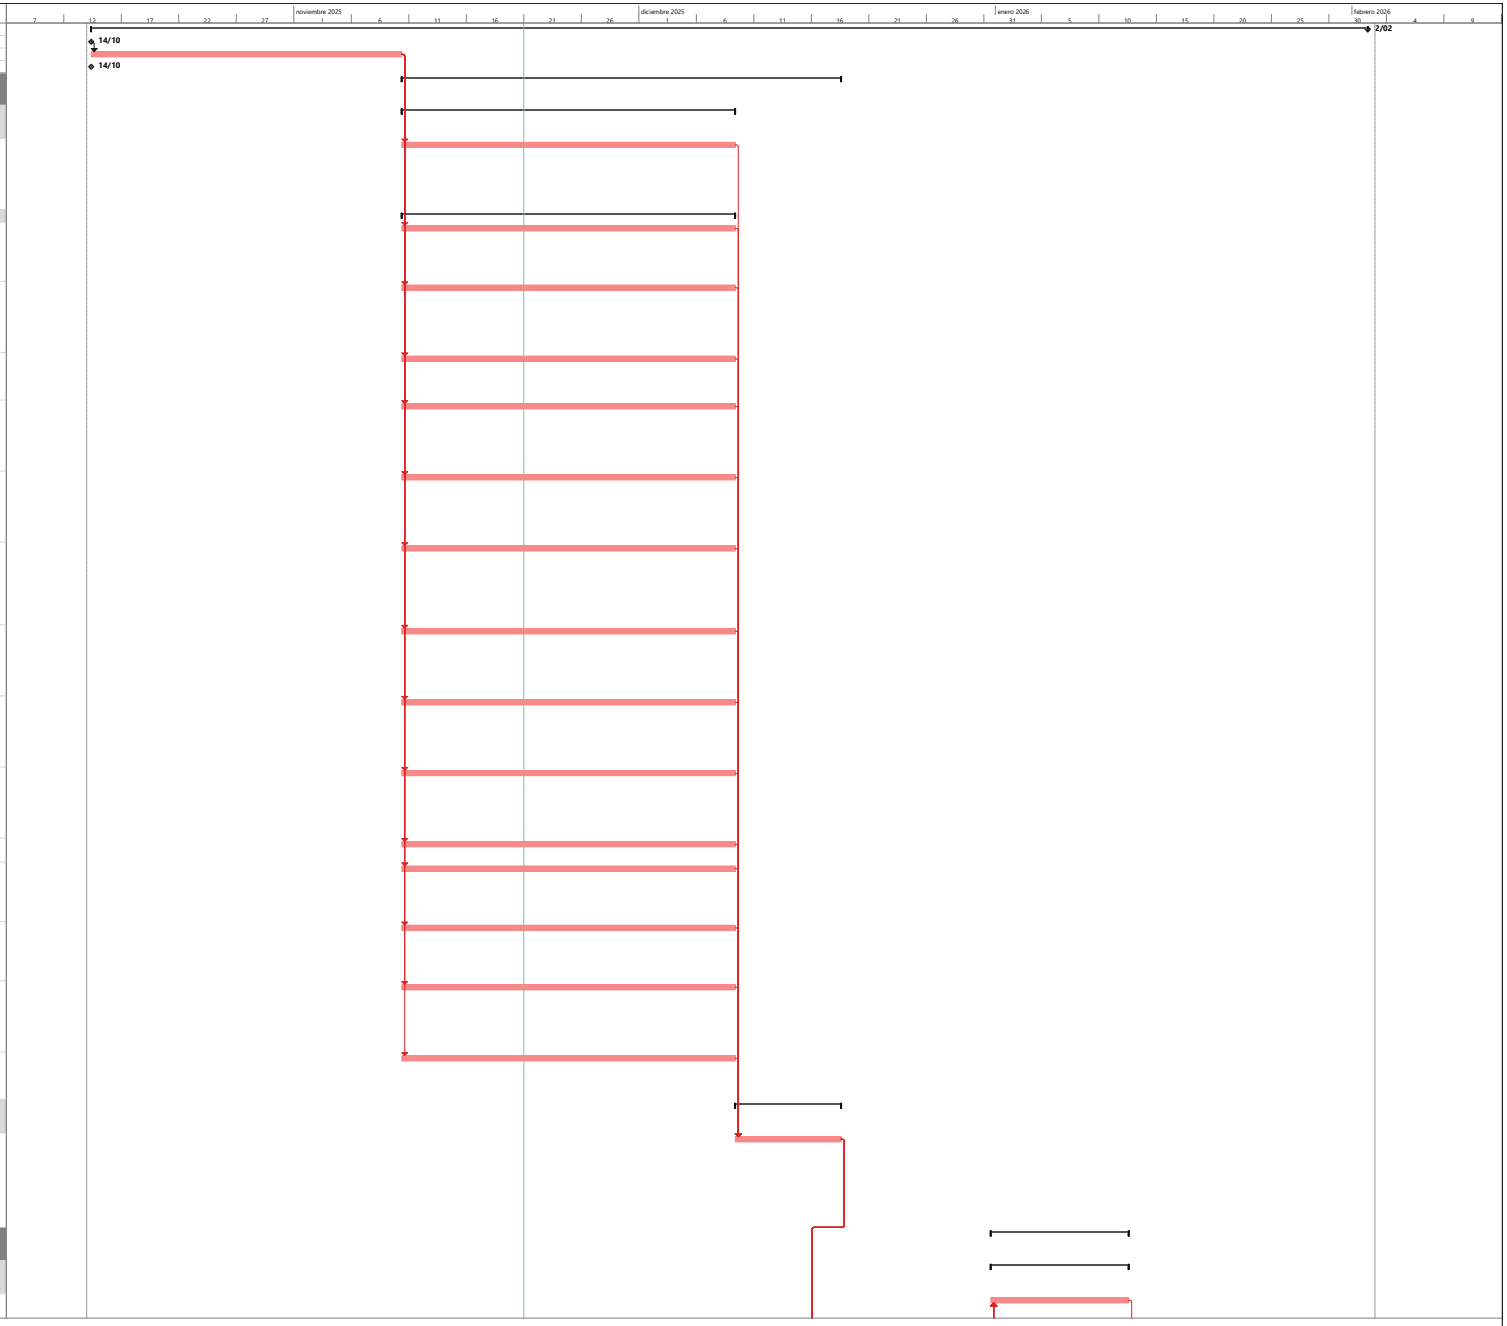

Proyecto: PROGRAMACION ED
Fecha: vie 21/11/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración
28		**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 5.417.497,93**	**37 días**
29		**4.2**	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 3.426.761,05**	**12 días**
30		4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	18.00	**$ 1.539.022,04**	12 días
31		4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	12.00	**$ 881.911,42**	12 días
32		4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	16.00	**$ 763.622,56**	12 días
33		4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	2.00	**$ 242.205,03**	12 días
34		**4.3**	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**			**$ 671.614,16**	**12 días**
35		4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	48.00	**$ 671.614,16**	12 días
36		**4.5**	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 711.693,74**	**12 días**
37		4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7.00	**$ 415.154,68**	12 días
38		4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	5.00	**$ 296.539,06**	12 días
39		**4.6**	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 257.656,72**	**12 días**
40		4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	4.00	**$ 257.656,72**	12 días
41		**4.9**	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 349.772,26**	**5 días**
42		4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	60.00	**$ 349.772,26**	5 días
43		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 1.336.498,99**	**3 días**
44		5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTAL	UN	2.00	**$ 236.936,62**	3 días
45		5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA L	UN	2.00	**$ 423.026,50**	3 días
46		5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESOR	UN	2.00	**$ 377.799,04**	3 días
47		5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	2.00	**$ 498.736,83**	3 días
48		**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 53.924.141,77**	**21 días**
49		**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 47.572.796,91**	**21 días**
50		7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	21.76	**$ 919.980,85**	9 días
51		7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	647.05	**$ 42.088.198,37**	4 días
52		7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	173.45	**$ 4.564.617,69**	8 días
53		**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 6.351.344,86**	**10 días**
54		7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	21.76	**$ 4.276.644,16**	10 días
55		7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	1.80	**$ 126.599,93**	5 días
56		7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO H=10 CM, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	24.15	**$ 1.948.100,77**	5 días
57		**8**	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 6.088.257,68**	**12 días**
58		8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	56.15	**$ 6.088.257,68**	12 días
59		**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 6.807.730,83**	**3 días**
60		**9.2**	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 1.763.546,96**	**3 días**

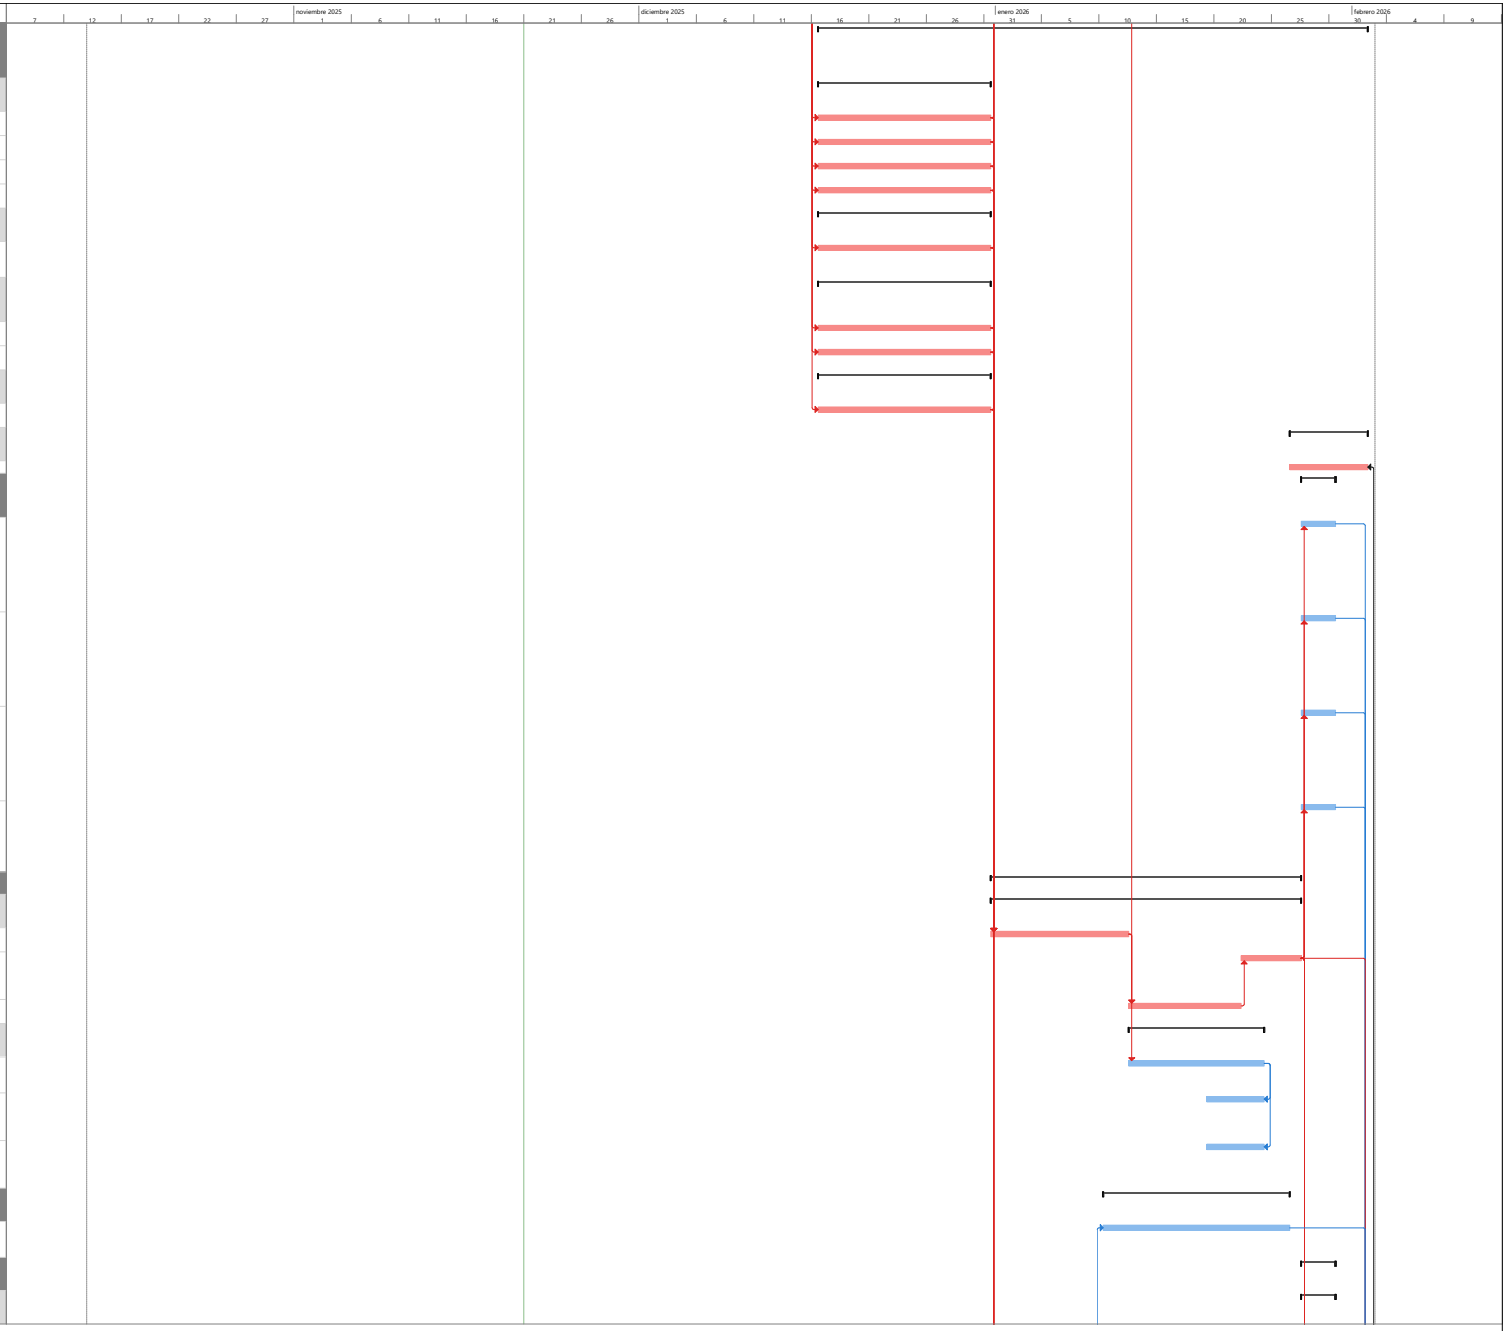

Proyecto: PROGRAMACION ED
Fecha: vie 21/11/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración
61		9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	3.60	$ 1.763.546,96	3 días
62		**9.3**	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 5.044.183,87**	**3 días**
63		9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ANGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE	M2	3.36	$ 3.970.086,54	3 días
64		9.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE ORINALES EN ACRILICO RECUPERADO DE 10 MM DISEÑO DE ANIMALES, MODULOS DE 40 X 90 X 1 CM, INCLUYE SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" ANCLADO AL PISO	UND	2.00	$ 1.074.097,33	3 días
65		**10**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 7.333.396,29**	**3 días**
66		10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	5.00	$ 4.076.973,45	3 días
67		10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	$ 1.151.620,94	3 días
68		10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00	$ 1.888.539,85	3 días
69		10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00	$ 153.584,81	3 días
70		10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2.00	$ 62.677,24	3 días
71		**11**	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 18.175.645,26**	**3 días**
72		11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	19.68	$ 18.175.645,26	3 días
73		**12**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 13.830.782,25**	**24 días**
74		**12.1**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 2.550.389,90**	**18 días**
75		12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	56.15	$ 2.159.624,73	10 días
76		12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	33.42	$ 390.765,17	8 días
77		**12.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 11.240.741,32**	**6 días**
78		12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	517.65	$ 10.241.561,52	6 días
79		12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	33.42	$ 999.179,80	6 días
80		**12.3**	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 39.651,03**	**6 días**
81		12.3.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	1.71	$ 39.651,03	6 días
82		**14**	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 684.367,36**	**2 días**
83		14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	3.70	$ 684.367,36	2 días
84		**16**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 67.176.026,71**	**4 días**
85		16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	17.60	$ 1.959.178,63	4 días
86		16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	857.90	$ 65.216.848,08	4 días
87		**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 94.708,22**	**2 días**
88		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	21.76	$ 94.708,22	2 días
89			FIN			$ 0,00	0 días

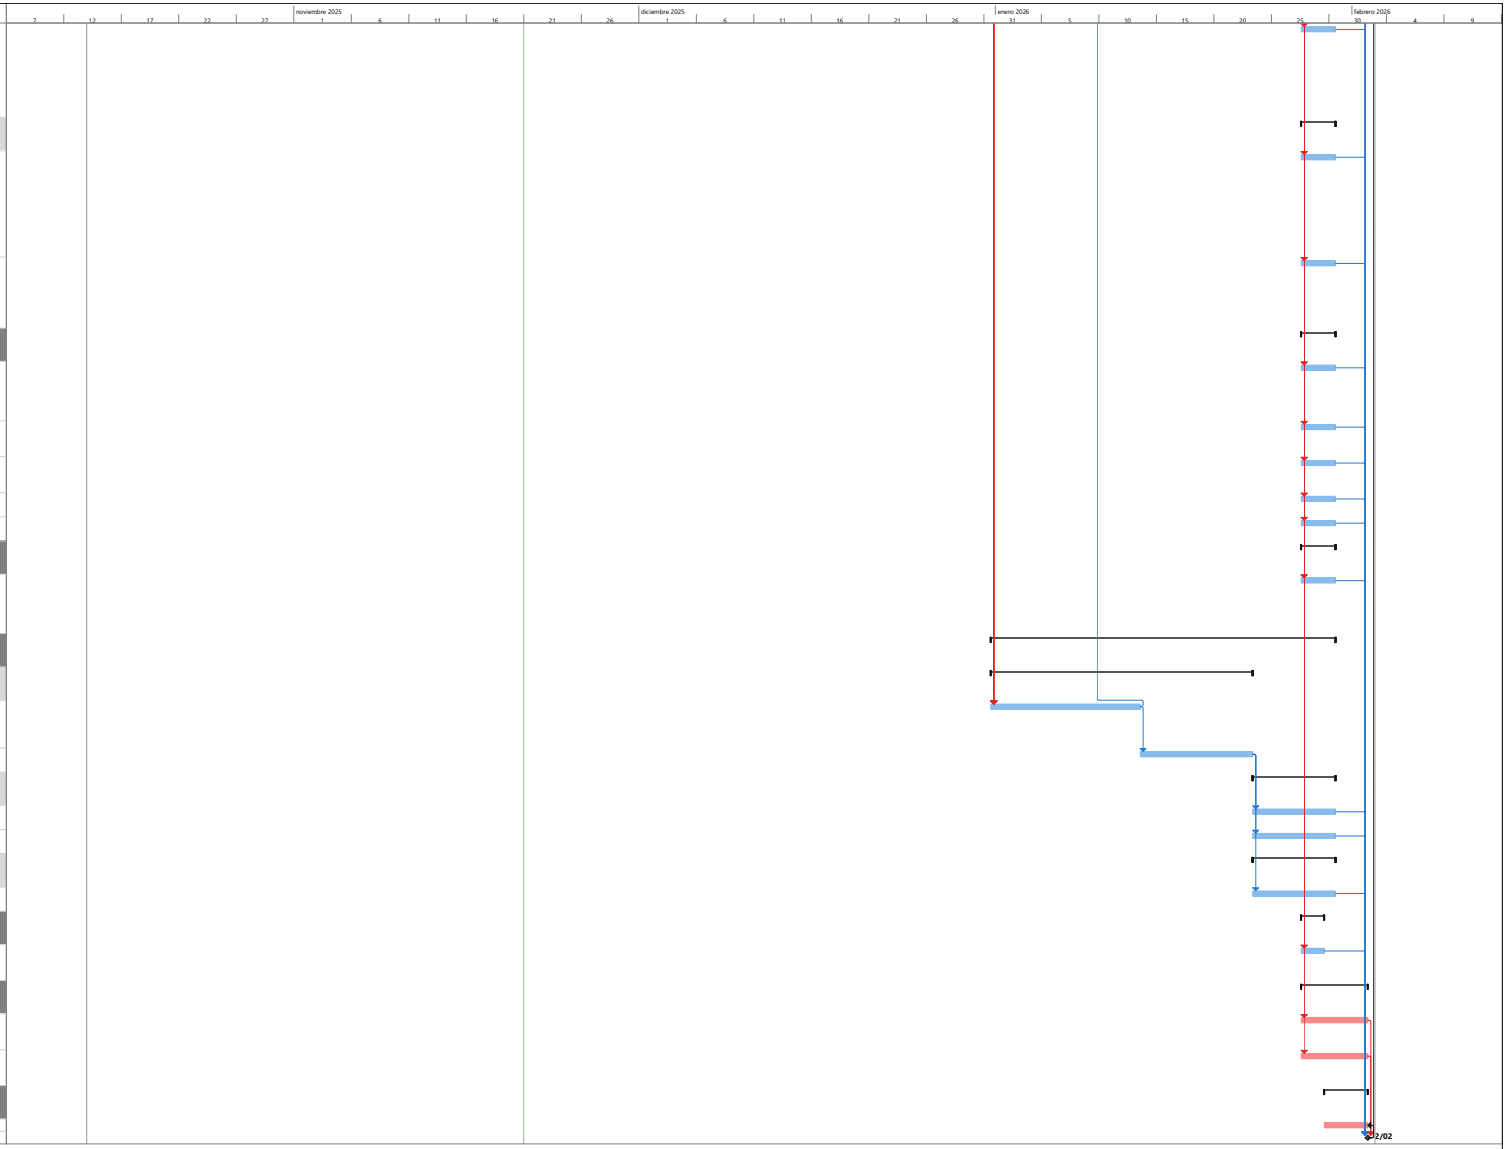

Proyecto: PROGRAMACION ED
Fecha: vie 21/11/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración
1			**CONTRATO CO1.PCCNTR.8154784 JAIRO ANIBAL NIÑO**			**$ 317.670.305,98**	**109 días**
2			ACTA DE INICIO			$ 0,00	0 días
3			ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			$ 0,00	21 días
4			INICIO			$ 0,00	0 días
5		**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 23.678.164,84**	47 días
6		**1.2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**$ 19.889.039,06**	30 días
7		1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	89.28	**$ 2.435.286,99**	30 días
8		1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	250.10	**$ 7.609.698,66**	30 días
9		1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	66.83	**$ 1.295.945,18**	30 días
10		1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.74	**$ 1.508.671,74**	30 días
11		1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28.00	**$ 521.982,66**	30 días
12		1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	33.40	**$ 929.416,85**	30 días
13		1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.04	**$ 83.341,09**	30 días
14		1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	58.00	**$ 1.171.508,05**	30 días
15		1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2"(INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	67.02	**$ 1.141.401,50**	30 días
16		1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	12.00	**$ 111.716,06**	30 días
17		1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	9.00	**$ 55.785,72**	30 días
18		1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	89.28	**$ 1.709.842,35**	30 días
19		1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2"(INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	128.18	**$ 944.686,41**	30 días
20		1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	35.00	**$ 369.755,80**	30 días

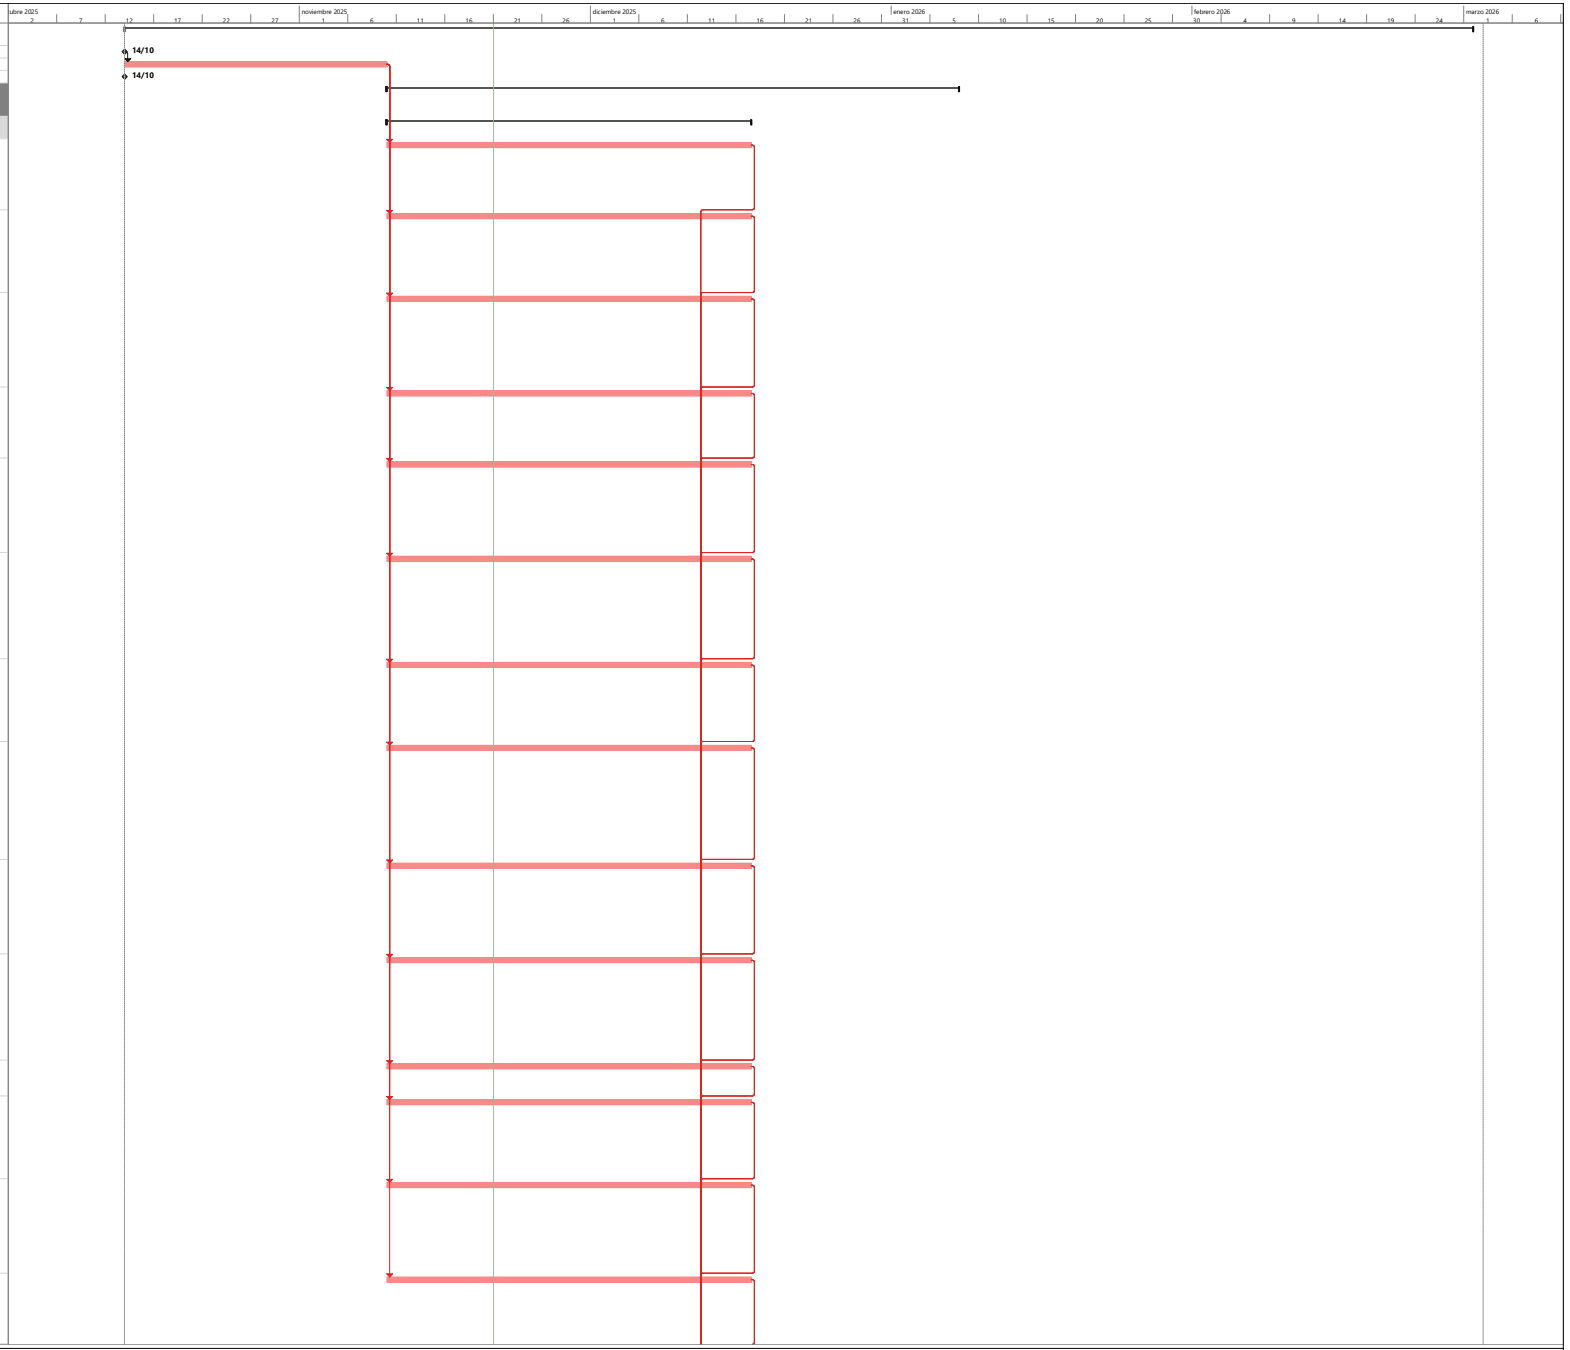

Proyecto: PROGRAMACION JAI
Fecha: vie 21/11/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración
21		**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 2.953.096,70**	10 días
22		1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO<= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFEC	M	152.00	**$ 2.650.959,79**	10 días
23		1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2"DE PROFUNDIDIAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	17.32	**$ 302.136,91**	10 días
24		**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 836.029,08**	20 días
25		**2.1**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 367.614,42**	10 días
26		2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	5.91	**$ 367.614,42**	10 días
27		**2.2**	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 468.414,66**	10 días
28		2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	0.74	**$ 468.414,66**	10 días
29		**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 12.293.703,33**	15 días
30		**4.2**	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 6.872.959,20**	15 días
31		4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4"INCLUYE ACCESORIOS	M	43.00	**$ 2.907.041,61**	15 días
32		4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3"INCLUYE ACCESORIOS	M	23.00	**$ 1.469.852,35**	15 días
33		4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2"INCLUYE ACCESORIOS	M	36.00	**$ 1.527.245,11**	15 días
34		4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3"INCLUYE ACCESORIOS	UN	9.00	**$ 968.820,13**	15 días
35		**4.3**	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**			**$ 2.117.963,55**	15 días
36		4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	151.37	**$ 2.117.963,55**	15 días
37		**4.5**	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 2.787.467,13**	15 días
38		4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	25.00	**$ 1.482.695,28**	15 días
39		4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	22.00	**$ 1.304.771,85**	15 días
40		**4.6**	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 515.313,45**	15 días
41		4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	8	**$ 515.313,45**	15 días
42		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 4.826.069,67**	51 días
43		5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERIA PVC Ø3/4"HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTAL	UN	4.00	**$ 473.873,24**	15 días

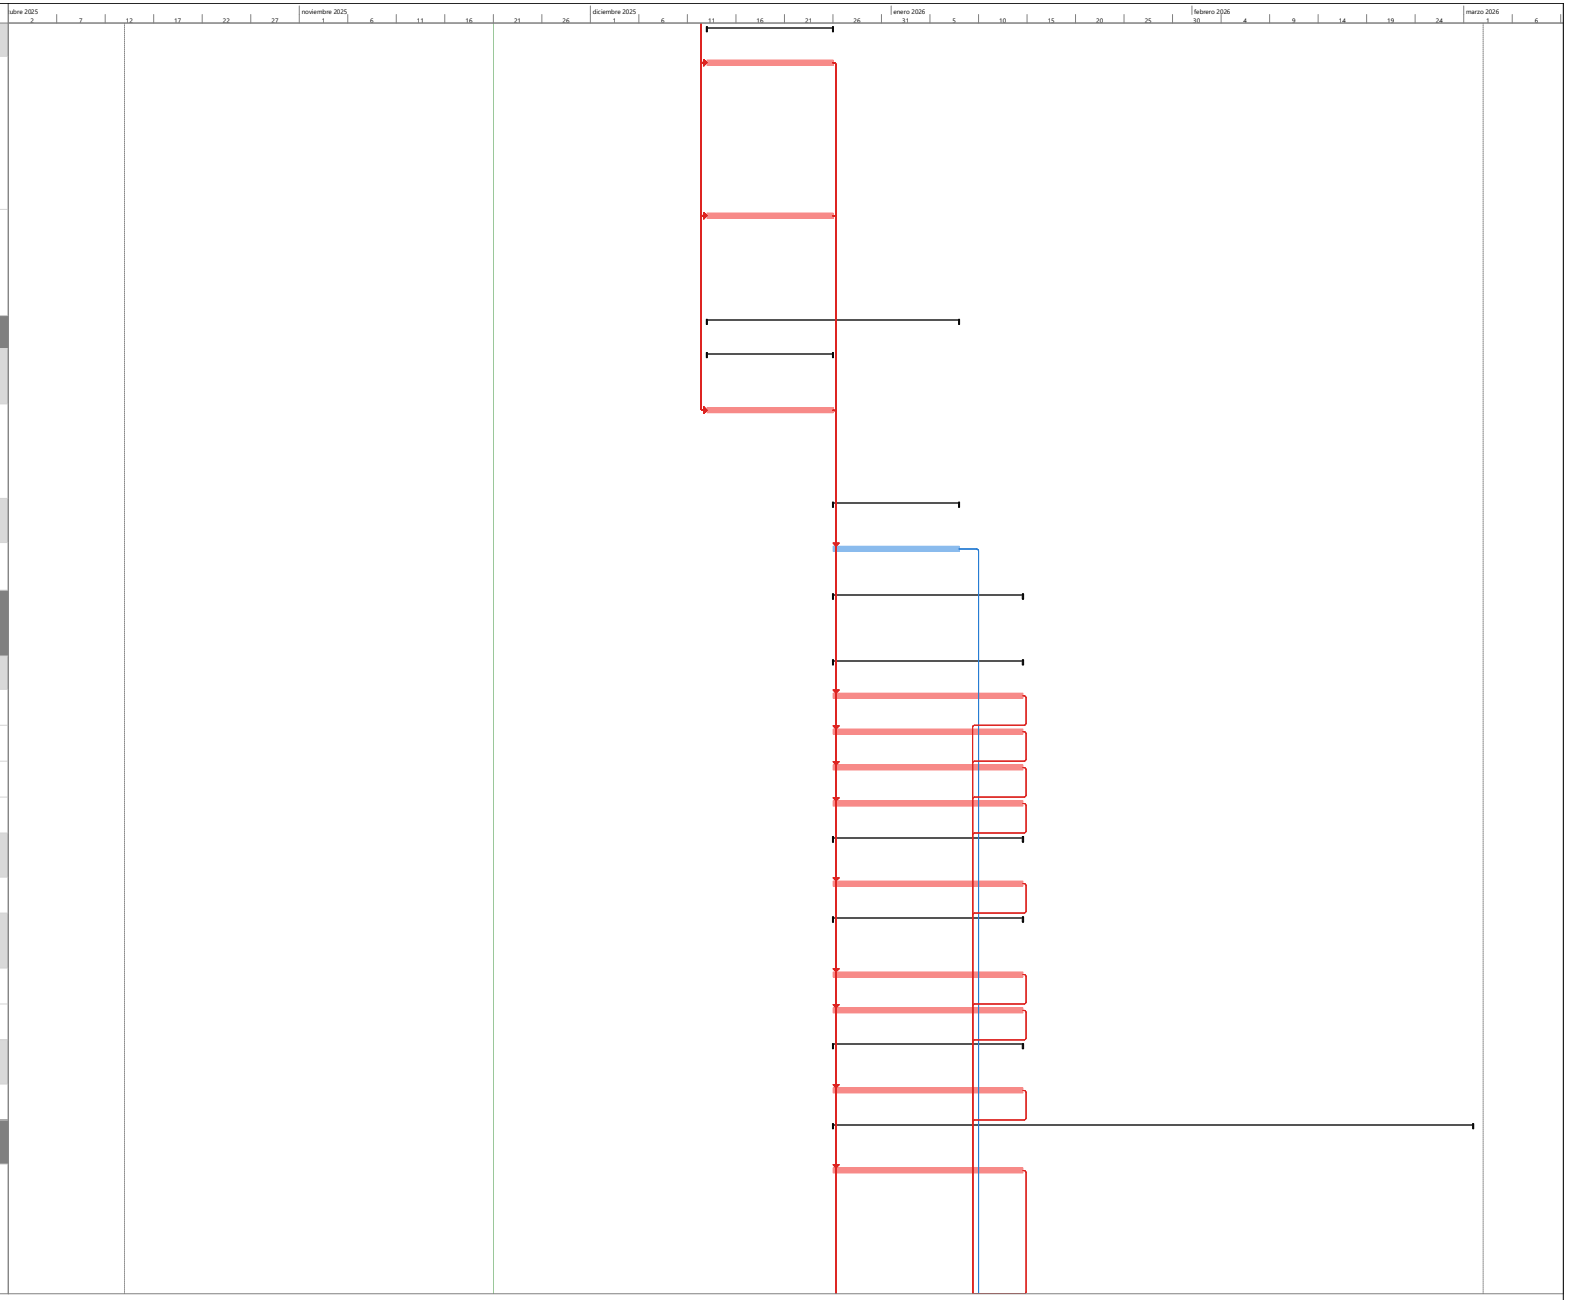


Proyecto: PROGRAMACION JAI
Fecha: vie 21/11/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración
44		5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4"HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA L	UN	4.00	$ 846.052,99	15 días
45		5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4"HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESOR	UN	8.00	$ 1.511.196,13	15 días
46		5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00	$ 1.994.947,31	5 días
47		**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 83.844.364,37	39 días
48		**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 5.298.714,87	26 días
49		7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	81.01	$ 3.424.892,84	26 días
50		7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	71.20	$ 1.873.822,03	26 días
51		**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 78.545.649,50	18 días
52		7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	81.01	$ 15.921.035,00	18 días
53		7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	4.00	$ 281.333,78	5 días
54		7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO H=10 CM, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	71.20	$ 5.743.712,29	5 días
55		7.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	255.60	$ 56.599.568,43	18 días
56		**8**	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 20.351.380,45	18 días
57		8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	187.68	$ 20.351.380,45	18 días
58		**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 20.944.931,30	5 días
59		**9.2**	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 5.660.049,79	5 días
60		9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD,	M2	3.04	$ 1.362.874,38	5 días
61		9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	8.77	$ 4.297.175,41	5 días
62		**9.3**	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 15.284.881,51	5 días

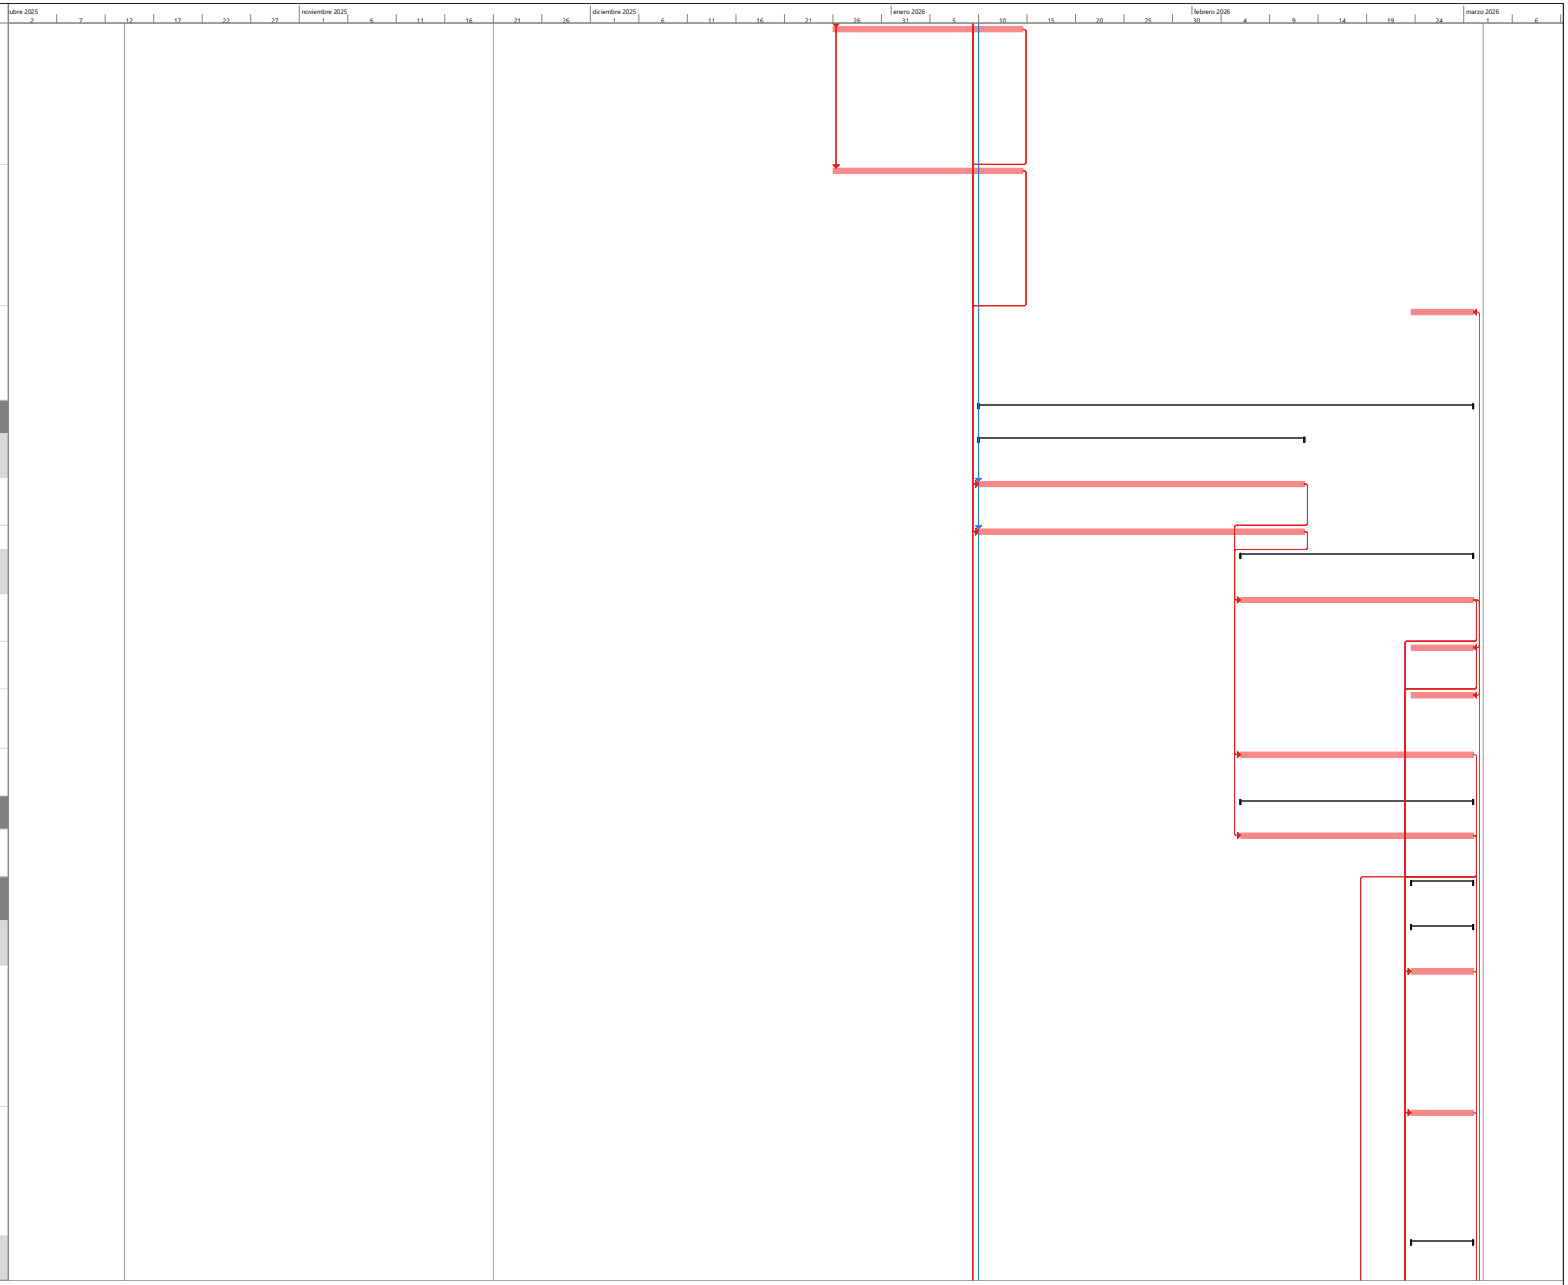

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración
63		9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE	M2	12.03	**$ 14.210.784,19**	5 días
64		9.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE ORINALES EN ACRILICO RECUPERADO DE 10 MM DISEÑO DE ANIMALES, MODULOS DE 40 X 90 X 1 CM, INCLUYE SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2"ANCLADO AL PISO	UND	2.00	**$ 1.074.097,32**	5 días
65		**10**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 28.818.147,02**	5 días
66		10.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4"Y SELLANTE)	UN	15.00	**$ 15.561.591,04**	5 días
67		10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	6.00	**$ 4.326.424,87**	5 días
68		10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	24.00	**$ 8.309.575,29**	5 días
69		10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	10.00	**$ 307.169,63**	5 días
70		10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4"A 3"	UN	11.00	**$ 313.386,19**	5 días
71		**11**	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 98.721.526,44	5 días
72		11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	96.12	**$ 88.772.509,21**	5 días
73		11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	9.60	**$ 9.949.017,23**	5 días
74		**12**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 12.315.115,79**	39 días
75		**12.1**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 8.771.129,23**	39 días
76		12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	193.97	**$ 7.461.055,49**	26 días
77		12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	112.04	**$ 1.310.073,74**	18 días
78		**12.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 3.524.556,11	18 días
79		12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	117.89	**$ 3.524.556,11**	18 días
80		**12.3**	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 19.430,45**	3 días
81		12.3.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	0.84	**$ 19.430,45**	3 días
82		**14**	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 2.806.352,52	5 días
83		14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1"EN ALUMINIO	M2	15.16	**$ 2.806.352,52**	5 días
84		**16**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 8.717.972,37**	12 días
85		16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20.40	**$ 1.357.160,01**	12 días

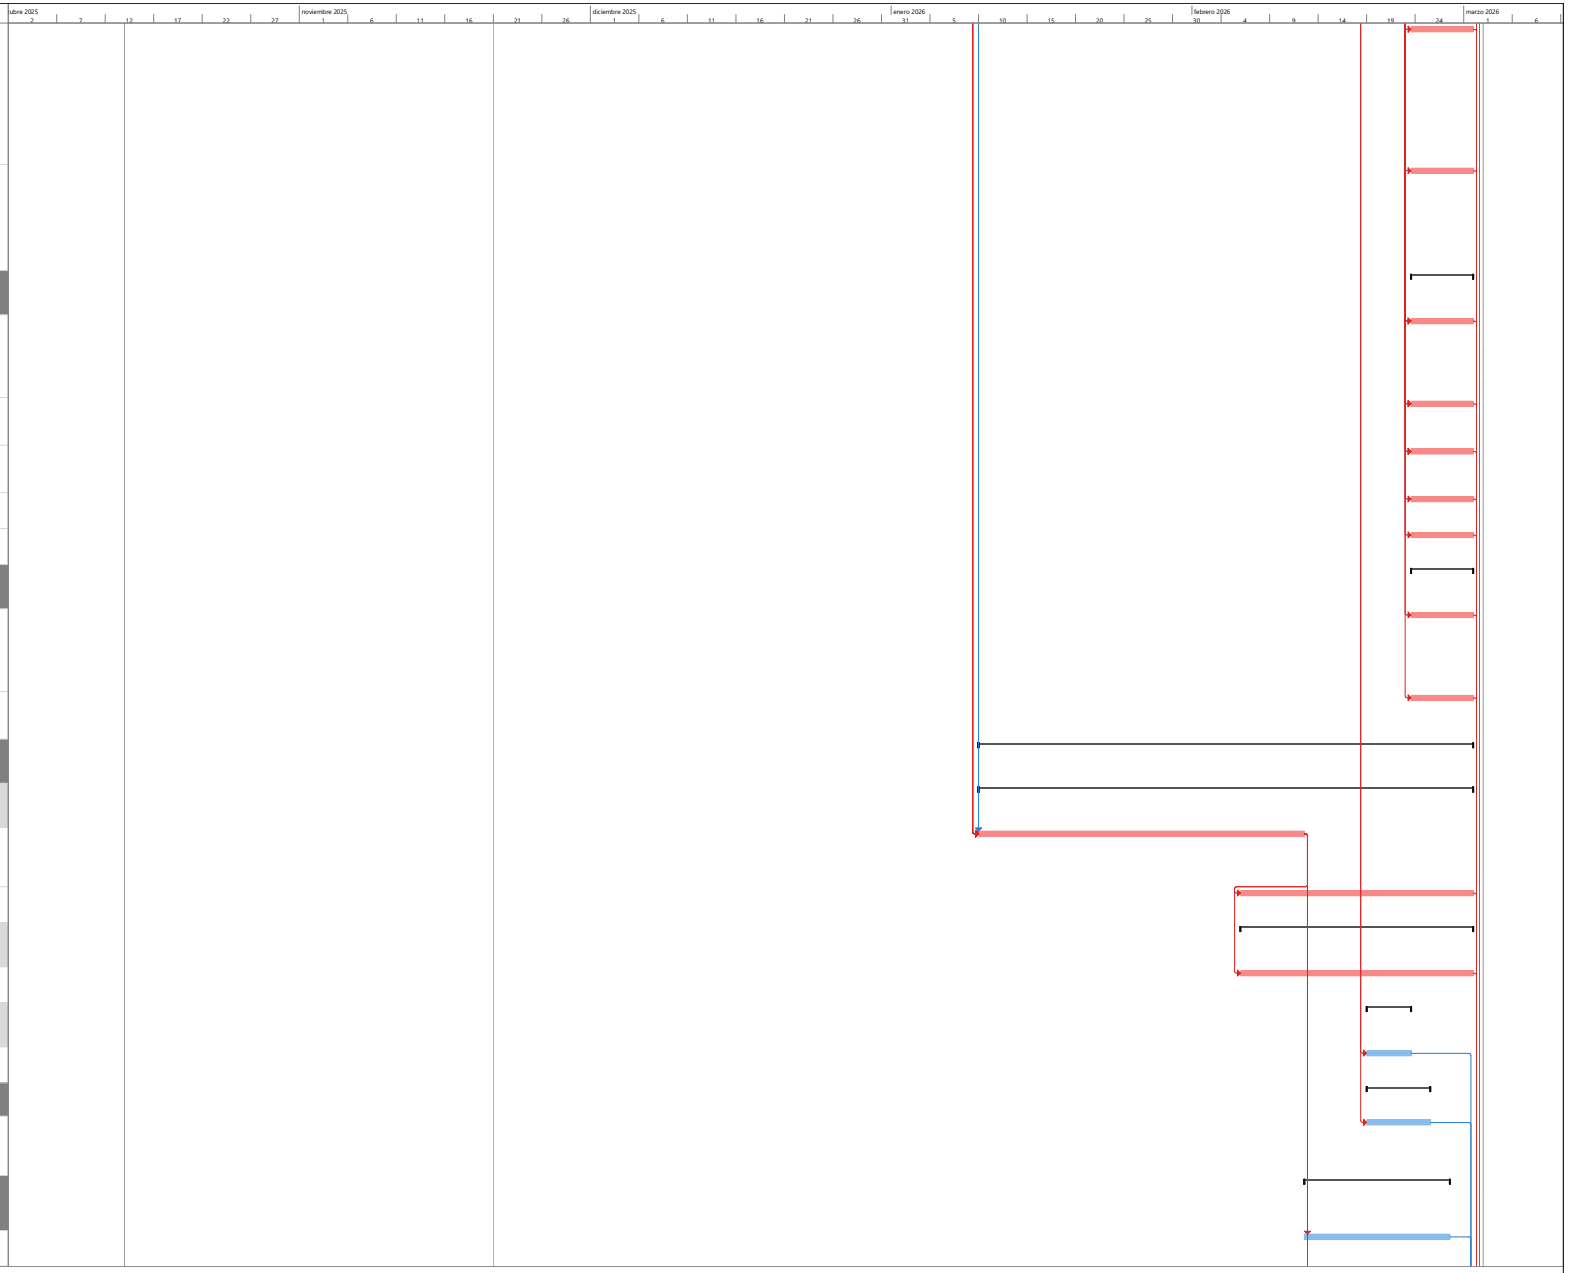


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración
86		16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	23.00	**$ 7.360.812,36**	12 días
87		**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 352.577,88**	5 días
88		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	81.01	**$ 352.577,88**	5 días
89			FIN			$ 0,00	0 días



Proyecto: PROGRAMACION JAI
Fecha: vie 21/11/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	UNIDAD	CANTIDAD	Costo
1			**CONTRATO DARIO ECHANDIA**	**166 días**			**$ 372.022.105,03**
2			ACTA DE INICIO	0 días			$ 0,00
3			ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	27 días			$ 0,00
4		**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**30 días**			**$ 15.479.368,19**
5		**1.2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**30 días**			**$ 15.479.368,19**
6		1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	30 días	M2	12.00	**$ 249.814,37**
7		1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	30 días	M2	439.44	**$ 15.076.143,10**
8		1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	30 días	UN	22.00	**$ 153.410,72**
9		**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**30 días**			**$ 194.001.347,78**
10		**2.5**	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**30 días**			**$ 194.001.347,78**
11		2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	30 días	KG	8,037.71	**$ 194.001.347,78**
12		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**18 días**			**$ 9.323.428,71**
13		5.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	18 días	M	76.65	**$ 1.088.805,76**
14		5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESOR	18 días	UN	22.00	**$ 4.155.789,37**
15		5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA, INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	18 días	UN	22.00	**$ 4.078.833,58**
16		**12**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10 días**			**$ 18.363.672,86**
17		**12.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10 días**			**$ 18.363.672,86**
18		12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	10 días	M2	364.14	**$ 8.238.952,58**
19		12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	10 días	M2	364.14	**$ 10.124.720,28**
20		**16**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**11 días**			**$ 118.614.634,04**
21		16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	11 días	M	49.20	**$ 5.476.795,00**
22		16.1.2	CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE. INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	11 días	M	49.20	**$ 3.128.458,25**
23		16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	11 días	M	20.96	**$ 1.394.415,22**
24		16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE D	11 días	M2	439.44	**$ 108.614.965,57**
25		**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**75 días**			**$ 16.239.653,45**
26		18.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO	75 días	KG	**7,527.24**	**$ 16.239.653,45**

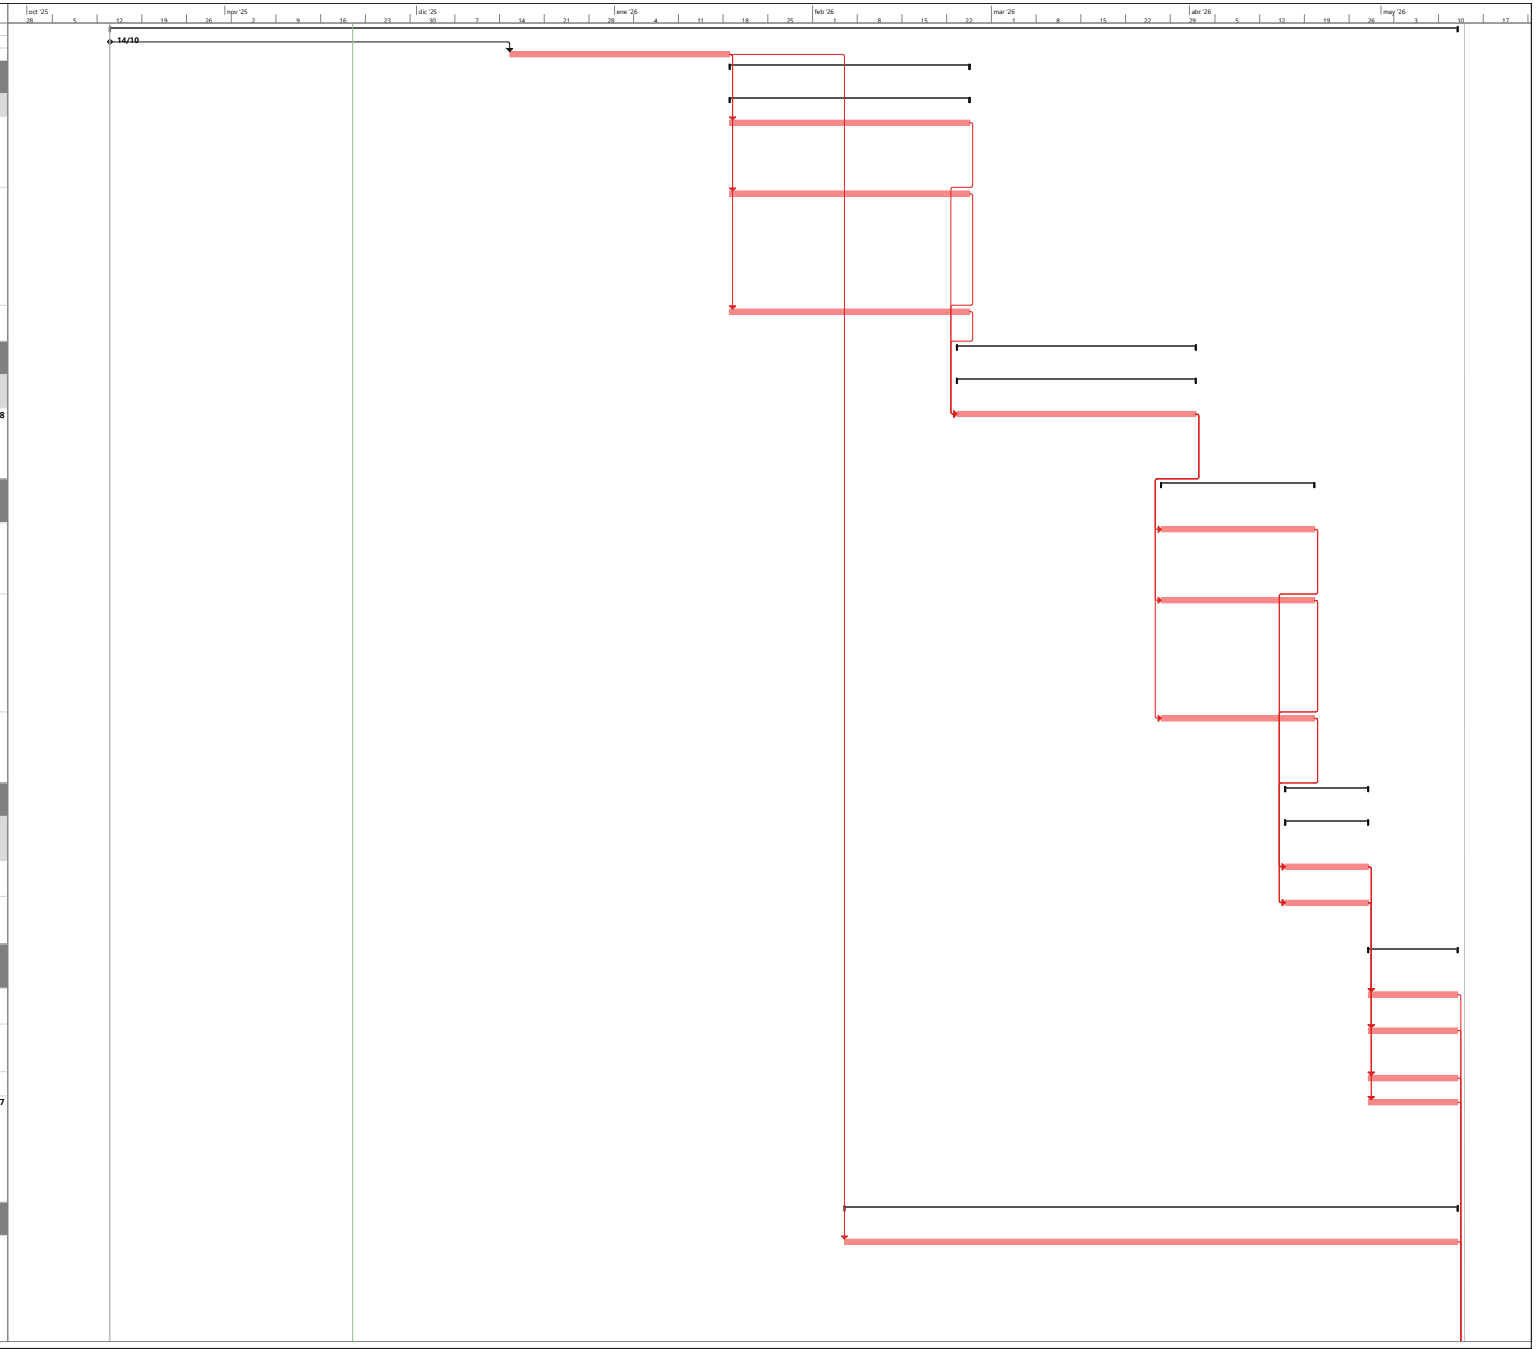

Proyecto: DARIO ECHANDIA V2
Fecha: vie 21/11/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	UNIDAD	CANTIDAD	Costo
27			FIN	0 días			$ 0,00

oct '25 | nov '25 | dic '25 | ene '26 | feb '26 | mar '26 | abr '26 | may '26

13/05

Proyecto: DARIO ECHANDIA V2
Fecha: vie 21/11/25

Tarea, Hito, Resumen del proyecto, Hito inactivo, Tarea manual, Informe de resumen manual, solo el comienzo, Tareas externas, Fecha límite, División crítica, Progreso manual
División, Resumen, Tarea inactiva, Resumen inactivo, solo duración, Resumen manual, solo fin, Hito externo, Tareas críticas, Progreso

FECHA:	20/02/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**81**	
CORTE DEL INFORME:	***21/02/2026***	

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	15	**DEL**	15-feb-26	**AL**	21-feb-26

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.8169111	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.8154784
Fecha de Iniciación	14/10/2025	**Fecha de Iniciación**	14/10/2025
Fecha de Terminación	13/05/2026	**Fecha de Terminación**	13/05/2026
Plazo Inicial	7 MESES	**Plazo Inicial**	7 MESES
Valor inicial	$ 880,146,577.00	**Valor inicial**	$ 2,975,834,553.00
Adiciones	$ 83,867,649.00	**Adiciones**	$ 523,987,595.00
Prorroga	N.A.	**Prorroga**	N.A.
Suspensión	N.A.	**Suspensión**	N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES
No.	**FRENTE**	PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	PROGRAMADO ACUM	EJECUTADO ACUM	DESVIACIÓN	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**
1	PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	50.00%	50.29%	55.00%	72.83%	17.83%	BAÑO: Instalacion de enchape, media cañas y instalación de tubería e instalación de piso en vinisol
2	PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	0.00%	0.00%	20.00%	20.64%	0.64%	Cocina: Instalacion de piso, cambio de tuberias
3	EL PORVENIR	13.50%	13.98%	42.00%	46.16%	4.16%	BAÑO: instalacion de enchape, media cañas y instalación manto en cubierta
4	VILLAS DEL PROGRESO	20.00%	24.74%	53.50%	63.39%	9.89%	BAÑO Y CANCHA: Instalación de enchape, Fundicion de placa
5	PABLO DE TARSO	23.00%	23.34%	27.92%	28.85%	0.93%	Desmonte e instalación de cubierta
6	JAIRO ANIBAL NIÑO	20.00%	24.31%	40.10%	58.37%	18.27%	BAÑO Y SALONS DE PREESCOLAR: Instalación de enchape, media caña y piso
7	LUIS LOPEZ DE MESA	9.00%	9.12%	13.32%	16.84%	3.52%	BAÑO: Instalacion de manto de aluminio sobre cubierta y enchape
8	EDUARDO UMAÑA LUNA	20.00%	20.40%	37.14%	64.83%	27.69%	BAÑO: Instalacion de enchape
9	DARIO ECHANDIA	90.00%	99.03%	60.60%	88.03%	27.43%	CUBIERTA: Instalación de cubierta
10	LLANO ORIENTAL - ALFONSO REYES ECHANDIA						0
TOTALES		**27.28%**	**29.47%**	**38.84%**	**51.10%**	**12.26%**	

3. RESUMEN FINANCIERO

PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 259,947,350	$ 189,321,651	**$ 70,625,699**		22.50%	72.83%

PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 85,000,000	$ 17,546,978	**$ 67,453,022**		20.64%	20.64%

EL PORVENIR

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 99,553,816	$ 45,957,723	**$ 53,596,093**		32.20%	46.16%

VILLAS DEL PROGRESO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 171,376,301	$ 108,628,512	**$ 62,747,788**		38.60%	63.39%

PABLO DE TARSO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 179,468,691	$ 51,775,862	**$ 127,692,829**		5.51%	28.85%

JAIRO ANIBAL NIÑO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 207,779,941	$ 121,283,326	**$ 86,496,616**		34.10%	58.37%

LUIS LOPEZ DE MESA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 302,922,429	$ 50,998,355	**$ 251,924,074**		7.70%	16.84%

EDUARDO UMAÑA LUNA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 75,659,453	$ 49,050,259	**$ 26,609,194**		44.40%	64.83%

DARIO ECHANDIA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 799,164,222	$ 703,483,011	**$ 95,681,211**		-11.00%	88.03%

FECHA:	20/02/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**81**	
CORTE DEL INFORME:	***21/02/2026***	

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	15	**DEL**	15-feb-26	**AL**	21-feb-26

EMERGENCIAS

BALANCE EMERGENCIAS	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 68,564,814	$ 57,655,046	**$ 10,909,768**		17.20%	84.09%

4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

OBSERVACIONES: Para el presente informe se realizo un balance de mayores y menores, por lo tanto se evidencia diferencias en los % y valores presentados en el informe anterior (14).

RECOMENDACIONES:
- Mantener orden y aseo en la obras, así como la señalización
- Continuar con el uso correcto de EPP
- Apertura de más frentes de obra

CONCLUSIONES:
- Se avanzó en tres frentes de trabajo con actividades de cerramiento, demoliciones, desmontes, pañete, e Instalación de pisos, cubiertas, enchape.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

1. Se continua con avances en los frentes de obra en los siguientes colegios: Alfonso Lopez Michelsen, El Porvenir, Villas del progreso, Jairo Anibal Niño, Eduardo Umaña Luna , Luis Lopez de Mesa y Dario Echandia.

2. Se continua con avance en los frentes de obra en las emergencias en los siguientes colegios: Orlando Higuita, Nelson Mandela.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente semana se aprobó el ingreso de 3 trabajadores operativos para los diferentes frentes de obra. Se evidenció la ejecución de actividades en los colegios, Luis López de Mesa, Alfonso López Michelsen, Villas del Progreso, El Porvenir, Jairo Anibal Niño, Darío Echandía, Orlando Higuita, Dario Echandia Sede B, Colegio Eduardo Uñama Luna, Colegio Pablo de Tarso.
Con respecto a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, esta interventoría realizó la verificación del personal presente en obra, constatando que el mismo corresponde al listado previamente aprobado. Así mismo, se efectuó supervisión permanente a las actividades en desarrollo, verificando el uso adecuado y continuo de los EPP por parte de los trabajadores, conforme a la matriz de riesgos y a las disposiciones establecidas en el SG-SST. No se evidenciaron incumplimientos en materia de protección personal durante las inspecciones realizadas.
En cuanto a las condiciones locativas, se evidenció que el cerramiento instalado cumple con las especificaciones técnicas recomendadas, garantizando la delimitación del frente de obra, el control de acceso y la prevención de riesgos a terceros. Igualmente, cuenta con señalización preventiva visible y en buen estado, acorde con la naturaleza de las actividades ejecutadas.
Respecto al Colegio Luis López de Mesa, se constató que las actividades se están ejecutando con la puerta de acceso cerrada, lo cual permite un adecuado control de ingreso y salida del personal autorizado, asegurando la separación entre la comunidad educativa y el área intervenida. El frente de trabajo se encuentra en condiciones óptimas de orden y aseo, sin presencia de materiales dispersos, obstrucciones o interferencias que puedan generar riesgos operativos.
En relación con el Colegio Villas del Progreso – Sede B, se verificó que el cerramiento del área correspondiente a la cancha fue ajustado conforme a las observaciones previamente emitidas por esta interventoría. Actualmente, dicho cerramiento cumple con las condiciones técnicas y de seguridad requeridas para el control de acceso, la correcta delimitación del frente de obra y la mitigación de riesgos a terceros, especialmente a la población estudiantil. trabajadas: 44

REPORTE PERSONAL

Total de horas capacitación: 20 minutos
Número de accidentes de trabajo: 0
Número de días de incapacidad por AT:0
Número de días de incapacidad por enfermedad común: 0

DIRECTOR OBRA: 1 INSPECTORES SST: 1
RESIDENTE OBRA: 1 PERSONAL OPERATIVO: 49

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

IED Cultura Alfonso López Michelsen: Se realizo recorrido en el frente, se realizó el retiro total de los Residuos, se recomienda realizar jornada de aseo periodicamente y implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).
IED Villas del progreso: Se realizo recorrido en el frente, se encuentra el cerramiento adecuado, se acopio los residuos de demolición, pero sin su debida protección ni señalización ubicados en los frentes de los baños, se recomienda embalar estos residuos y realizar jornadas de aseo periódicamente.
IED El Porvenir: Se realizo recorrido en el frente, presenta señalización en el frente de obra. Se dispuso adecuadamente los RCDs que se encontraban acopiados en parte de parqueadero, en los baños se recomienda garantizar una jornada de aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Jairo Aníbal Niño: Se realizo recorrido en el frente, se reporta un volumen medio respecto a los RCD en la parte del parqueadero de bicicletas, al igual se recomendó disponerlo adecuadamente, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Darío Echandía: Se realizo recorrido en el frente, se recomienda mantener orden en el frente, se presenta el cierre adecuadamente, se evidencia materiales debidamente acopiados al igual que se presenta residuos en el frente, por lo que se recomendó realizar la disposición total de los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Orlando Higuita: Se realizo recorrido en el frente, se realizó el retiro de la mayoría de residuos que se encontraban en el parqueadero, pero todavía se siguen evidenciando laminas de PVC y tablones de madera por lo se recomendó al contratista disponer adecuadamente todo el material, garantizar jornada de aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Eduardo Umaña Luna: Se realizo recorrido en el frente, se encuentra el cerramiento adecuado, el material RCD fue dispuesto adecuadamente, la zona se encuentra limpia, al igual se recomendó implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Pablo de torso: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia acopio de materiales de construcción y RCD adecuado por lo que se recomienda hacer la disposición adecuada de todos los residuos ante los gestores autorizados, se recomendó al contratista implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Luis López de mesa: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia residuos y material acopiado adecuadamente pero un volumen medio, por lo que se recomienda al contratista realizar la debida disposición adecuadamente y garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente.

OTROS

ING JHONER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING HARRY ARANGO
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA:	20/02/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**81**	
CORTE DEL INFORME:	***21/02/2026***	

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA

Alfonso Lopez Michelsen



Instalacion de Enchape



Instalacion de Enchape



Instalacion de Enchape



Instalacion de enchape

Alfonso Lopez Michelsen Cocina



Instalacion de piso



Instalacion de piso



Instalacion de Media caña



Instalacion de enchape

El Porvenir



Instalacion de enchape



Instalacion de enchape




Instalacion de enchape



Instalacion de enchape

Villas del Progreso



Instalacion de media caña



Instalacion de media caña




Instalacion de media caña



Cancha

Jairo Anibal Niño

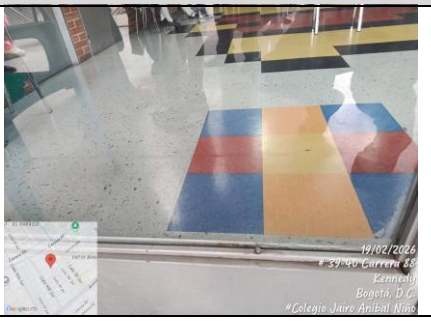

Instalacion de piso



Instalacion de piso



Instalacion de enchape



Instalacion de enchape

Eduardo Umaña Luna



Instalacion de enchape



Instalacion de enchape



Instalacion de enchape



Instalacion de enchape

Orlando Higuita




Instalacion de techo



Instalacion de techo

	
Instalacion de techo	Instalacion de media caña

Dario Echandia

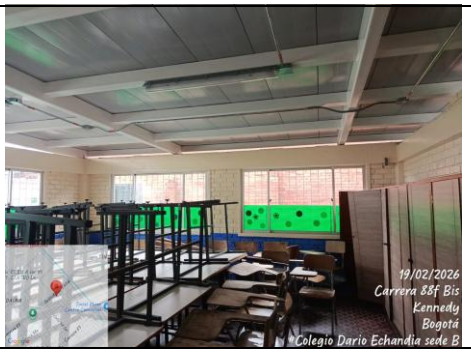	
Montaje de estructura	Montaje de estructura
	
Montaje de estructura	Montaje de estructura

Luis Lopez De Mesa



Instalacion de enchape



Instalacion de enchape



Instalacion de enchape




Manto para cubierta

Pablo de Tarso



Instalacion de estructura

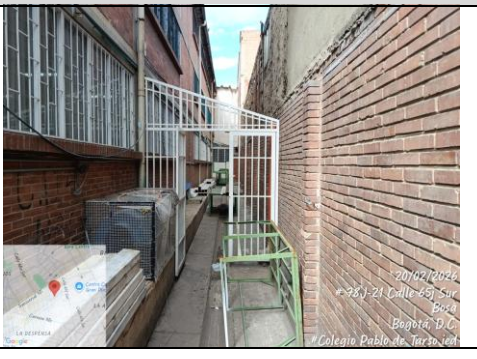

Instalacion de estructura




Instalacion de estructura



Instalacion de estructura

FECHA:	20/02/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	81 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANANCIA					
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				GRUPO	7
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154784	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDU 2025			
21/2/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169111	INTERVENTOR:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S			

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE		ESTADO ACTUAL O FINAL
3 ###						
Alfonso Lopez Michelsen	Mejoramiento de baterias sanitarias y salones de preescolar	BAÑO: Instalacion de enchape, media cañas y instalación de tuberia e instalación de piso en vinisol				
Alfonso Lopez Michelsen Cocina	Mejoramiento de cocina	Cocina: Instalacion de piso, cambio de tuberias				
El Porvenir	Mejoramiento de cubierta y baterias sanitarias	BAÑO: instalacion de enchape, media cañas y instalación manto en cubierta				
Villas del Progreso	Mejoramiento de baterias y canchas sanitarias	BAÑO Y CANCHA: Instalación de enchape, Fundicion de placa				
Pablo de Tarso	Desmonte e instalación de cubierta	Desmonte e instalación de cubierta				
Jairo Anibal Niño	Mejoramiento de baterias sanitarias y pisos preescolar	BAÑO Y SALONS DE PREESCOLAR: Instalación de enchape, media caña y piso				
Luis Lopez de Mesa	Mejoramiento de baterias sanitarias	BAÑO: Instalacion de manto de aluminio sobre cubierta y enchape				
Eduardo Umaña	Mejoramiento de baterias sanitarias y cerramiento	BAÑO: Instalacion de enchape				
Dario Echandia	Desmonte e instalación de cubierta	CUBIERTA: Instalación de cubierta				

EMERGENCIA No. 1 Colegio Orlando Higuita	**Mejoramiento Cocina**	**COCINAS: Instalacion de media cañas**				
EMERGENCIA No. 2 San Bernardino						
EMERGENCIA No. 3 Isabel II						
EMERGENCIA No. 4 Jhon F Kennedy						

EMERGENCIA No. 5 Marsella						
EMERGENCIA No. 6 Nelson Mandela						
EMERGENCIA No. 7 Bicentenario						
EMERGENCIA No. 8 San Jose						
EMERGENCIA No. 9 Nicolas Esguerra						

FECHA:	20/02/2026	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	81 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA	GRUPO 7
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDU 2025	
21 de febrero de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S	

DATOS:	FECHAS INTERVENTORIA	FECHAS OBRA	ETAPA:	PLAZOS EN DIAS INTERVENTORIA	PLAZOS EN DIAS OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169111	CO1.PCCNTR.8154784	INICIAL	211	211
INICIO	14 de octubre de 2025	14 de octubre de 2025	SUSPENSIONES		
TERMINACION INICIAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	PRORROGAS		
TERMINACION FINAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	TOTAL	211	211

VALOR CONTRATO	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	$ 796,278,928	$ 2,451,846,958
ADICIÓNES	$ 83,867,649.00	$ 523,987,595.00
TOTAL	$ 880,146,577.00	$ 2,975,834,553.00

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	05/12/2025	$ 83,867,649.00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	05/12/2025	$ 523,987,595.00		
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMENTO DESDE	CUMPLIMENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400-47	5 9 2025	5 10 2026	5 4 2026	5 4 2031	5 9 2025	5 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMENTO DESDE	CUMPLIMENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
895-47	14 10 2025	15 1 2027	14 10 2025	15 5 2027	14 10 2025	15 1 2027	895-74	5 4 2026	15 5 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (31082924)	PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	dic-2025	ene-2026	feb-2026	mar-2026	abr-2026	may-2026	jun-2026	jul-2026	ago-2026	sep-2026	oct-2026	nov-2026	dic-2026	ene-2027	feb-2027	mar-2027
751	PORTAL DEL SOL -	Bosa	A	Portal del Sol Alfonso Lopez Michelsen	50.29%	72.83%	55.00%		$ 259,947,350.30	$ 189,321,651	14/10/2025	30/03/2026																			
751	PORTAL DEL SOL -	Bosa	A	Portal del Sol Alfonso Lopez Michelsen	0.00%	20.64%	20.00%		$ 85,000,000.00	$ 17,546,978	14/10/2025	30/03/2026																			
742	EL PORVENIR	Bosa	B	El Recuerdo Santa Fe	13.56%	46.16%	46.16%		$ 99,553,815.81	$ 45,957,723	14/10/2025	30/03/2026																			
764	VILLAS DEL PROGRESO	Bosa	B	Enrique Dussel	24.74%	63.39%	63.39%		$ 171,376,300.91	$ 108,625,512	14/10/2025	13/05/2026																			
714	PABLO DE TARSO	Bosa	A	Pablo de Tarso	23.34%	28.85%	27.92%		$ 179,463,691.28	$ 51,775,862	14/10/2025	13/05/2026																			
836	JAIRO ANIBAL NIÑO	Kennedy	A	Patio Bonito I	24.31%	58.37%	49.16%		$ 207,779,941.37	$ 121,283,336	14/10/2025	02/03/2026																			
712	LUIS LOPEZ DE MESA	Bosa	A	Luis Lopez de Mesa	9.12%	16.84%	13.32%		$ 392,922,428.82	$ 50,998,398	14/10/2025	11/03/2026																			
814	EDUARDO UMAÑA LUNA	Kennedy	A	Dindalito	20.40%	64.83%	37.14%		$ 75,655,462.87	$ 49,050,289	14/10/2025	02/02/2026																			
833	DARIO ECHANDIA	Kennedy	B	Los Patios	99.03%	88.03%	80.60%		$ 799,164,221.64	$ 703,483,011	14/10/2025	13/09/2026																			
748	LLANO ORIENTAL -	Bosa	A	San José de Maryland San Pedro -					$ 135,987,095.00	$ -	14/10/2025	13/05/2026																			
	TOTAL FRENTES DE OBRA				51.10%	38.84%			$ 2,316,859,798	$ 1,338,045,678																				
	EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																													
747	LA LIBERTAD - ORLANDO	Bosa	A	Orlando Higuita - Holanda la Libertad	99.96%	100.00%	100.00%		$ 42,499,555	$ 42,499,555	19/11/2025	15/01/2026																			
729	SAN BERNARDINO	Bosa	A	San Bernardino	0.00%	0.00%			$ 3,923,717	-	24/11/2025	31/12/2025																			
838	ISABEL II	Kennedy	B	Pio XII	0.00%	100.00%	100.00%		$ 2,126,520	$ 2,126,520	29/11/2025	19/12/2025																			
850	JOHN F. KENNEDY	Kennedy	A	John F. kennedy	0.00%	100.00%	100.00%		$ 2,377,567	$ 2,377,567	29/11/2025	12/12/2025																			
817	MARSELLA	Kennedy	A	Bas-Med. Marsella	0.00%	100.00%	100.00%		$ 6,727,687	$ 6,727,687	28/11/2025	18/12/2025																			
890	NELSON MANDELA	Kennedy	A	Comuneros Tintal	0.00%	100.00%	100.00%		$ 3,923,717	$ 3,923,717	28/11/2025	16/01/2026																			
763	BICENTENARIO	Bosa	A	San José de Maryland	0.00%	0.00%			$ 6,986,050	$ -	27/11/2025	16/01/2026																			
821	SAN JOSE	Kennedy	B	El Descanso	0.00%																										
859	NACIONAL NICOLAS	Kennedy	A	Nicolas Esquerra	0.00%																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	TOTAL FRENTES DE OBRA				71.43%	#####			$ 68,564,814	$ 57,655,046																					

ACUMULADO FRENTES DE OBRA

TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	9	0	9	$ 1,338,045,678
ACUMULADO EMERGENCIAS				
1	4	2	7	$ 57,655,046
TOTAL				
1	13	2	16	$ 1,395,700,724
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20	TOTAL OBRA	9		20		31			
10		21		10		21		32			
11		22		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	51.10%	0.00%	61.61%
PROGRAMADO	38.84%		
ATRASO	12.26%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			


AVANCE GENERAL



EMERGENCIAS



AVANCE FÍSICO



AVANCE DE LOS FRENTES



OBSERVACIONES:

BALANCE SEMANAL POR CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS

		CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2026
GRUPOS	ITEM	CPF	751	IED	Alfonso Lopez Michelsen		SEMANA				
	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	30.69	30.69	30.69	$ 4,435.43	$ 136,101.63	$ -	100.00%	100.00%	
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	3.79	3.79	3.79	$ 29,040.55	$ 110,063.69	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.01	40.01	40.01	$ 30,062.36	$ 1,202,753.00	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	455.72	450.72	450.72	$ 30,426.62	$ 13,713,897.10	$ 152,133.12	98.90%	98.90%	
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	113.46	113.46	113.46	$ 10,621.20	$ 1,205,071.78	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	76.42	76.42	76.42	$ 28,815.57	$ 2,202,085.58	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	123.57	123.57	123.57	$ 11,807.73	$ 1,459,112.04	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11.00	11.00	11.00	$ 19,332.69	$ 212,659.60	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10.80	6.80	6.80	$ 30,969.00	$ 210,589.20	$ 123,950.33	62.95%	62.95%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	18.00	18.00	18.00	$ 25,467.57	$ 458,416.20	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBRORESISTA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.01	40.01	40.01	$ 21,107.13	$ 844,496.32	$ (29.55)	100.00%	100.00%	
	1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	1.60	1.60	1.60	$ 8,364.64	$ 13,383.43	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	18.00	18.00	18.00	$ 13,694.66	$ 246,503.87	$ -	100.00%	100.00%	
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	84.44	84.44	84.44	$ 20,392.00	$ 1,721,900.34	$ -	100.00%	100.00%	
	4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	27.38	27.38	27.38	$ 13,991.96	$ 383,099.91	$ -	100.00%	100.00%	
	4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	13.00	13.00	13.00	$ 59,307.81	$ 771,001.55	$ -	100.00%	100.00%	
	4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	11.00	11.00	11.00	$ 59,307.81	$ 652,385.92	$ -	100.00%	100.00%	
	4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/2"	UN	2.00	2.00	2.00	$ 201,917.88	$ 403,835.76	$ -	100.00%	100.00%	
	4.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN	2.00	2.00	2.00	$ 85,229.37	$ 170,458.73	$ -	100.00%	100.00%	
1	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00			$ 118,468.31	$ -	$ 236,936.62	0.00%	0.00%	
	7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	455.72	450.72	450.72	$ 39,814.42	$ 17,945,153.58	$ 199,084.02	98.90%	98.90%	
	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	40.01	40.01	40.01	$ 42,278.54	$ 1,691,564.55	$ (59.19)	100.00%	100.00%	
	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	40.01	40.01	40.01	$ 196,536.97	$ 7,863,444.35	$ (275.15)	100.00%	100.00%	
	7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	12.00	12.00	12.00	$ 70,333.44	$ 844,001.34	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	455.72	450.72	450.72	$ 241,797.92	$ 108,983,157.06	$ 1,209,062.12	98.90%	98.90%	
	7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	116.40	116.40	116.40	$ 14,350.87	$ 1,670,440.94	$ (57.40)	100.00%	100.00%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	63.34	63.34	63.34	$ 76,716.07	$ 4,859,196.00	$ (0.00)	100.00%	100.00%	
	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	112.85	112.85	112.85	$ 108,436.36	$ 12,237,043.59	$ 59.64	100.00%	100.00%	
	9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELICULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	4.59			$ 489,874.00	$ -	$ 2,249,697.37	0.00%	0.00%	
	9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	7.92			$ 1,181,573.48	$ -	$ 9,358,061.97	0.00%	0.00%	
	10.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	9.00			$ 1,037,439.40	$ -	$ 9,336,954.63	0.00%	0.00%	
	10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	4.00			$ 721,070.81	$ -	$ 2,884,283.25	0.00%	0.00%	
	10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	11.00			$ 377,707.97	$ -	$ 4,154,787.65	0.00%	0.00%	
	10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00			$ 38,396.20	$ -	$ 153,584.81	0.00%	0.00%	
	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ESTANDARIZADO DE 1"	M2	33.87			$ 923,559.19	$ -	$ 31,283,720.51	0.00%	0.00%	
	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80			$ 1,036,355.99	$ -	$ 1,865,440.78	0.00%	0.00%	
	12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	112.53	112.53	112.53	$ 38,464.50	$ 4,328,410.46	$ (63.47)	100.00%	100.00%	
	12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	45.20	45.20	45.20	$ 29,897.64	$ 1,351,373.33	$ 62.79	100.00%	100.00%	
	12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	48.40	48.20	48.20	$ 26,897.83	$ 1,296,475.50	$ 5,379.57	99.59%	99.59%	
	14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	7.92			$ 185,164.49	$ -	$ 1,466,502.74	0.00%	0.00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	30.69	30.69	30.69	$ 4,352.40	$ 133,575.16	$ (21.33)	100.02%	100.02%	

GRUPOS	ITEM	CPF	751	IED	Alfonso Lopez Michelsen Cocina		SEMANA				
	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.93	3.93	3.93	$ 30,062.36	$ 118,145.08	$ 72.15	99.94%	99.94%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.93	3.93	3.93	$ 30,426.62	$ 119,576.63	$ 73.02	99.94%	99.94%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2.00	2.00	2.00	$ 25,467.57	$ 50,935.13	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBRORESISTA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13.09	13.09	13.09	$ 21,107.13	$ 276,292.35	$ -	100.00%	100.00%	
	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	7.35	7.35	7.35	$ 85,501.22	$ 628,434.00	$ -	100.00%	100.00%	
	4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2.00	2.00	2.00	$ 71,024.47	$ 142,048.94	$ -	100.00%	100.00%	
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	4.00	4.00	4.00	$ 5,829.54	$ 23,318.15	$ -	100.00%	100.00%	
	5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	5.00			$ 534,497.49	$ -	$ 2,672,487.43	0.00%	0.00%	
	5.1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	127.73			$ 53,182.31	$ -	$ 6,792,908.92	0.00%	0.00%	
	5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG THHN	M	150.20			$ 83,551.35	$ -	$ 12,549,412.59	0.00%	0.00%	
	5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES , ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	30.00			$ 185,401.53	$ -	$ 5,562,045.79	0.00%	0.00%	
1	5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A, MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	2.00			$ 819,132.39	$ -	$ 1,638,264.79	0.00%	0.00%	
	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	13.09	13.09	13.09	$ 42,278.54	$ 553,426.14	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	12.60	12.60	12.60	$ 196,536.97	$ 2,476,365.88	$ (0.00)	100.00%	100.00%	
	7.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	90.50	90.50	90.50	$ 19,490.72	$ 1,763,909.87	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	22.42	22.42	22.42	$ 76,716.07	$ 1,719,974.33	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	131.64	131.64	131.64	$ 67,713.97	$ 8,913,587.98	$ -	100.00%	100.00%	
	10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	6.00	6.00	6.00	$ 31,338.62	$ 188,031.72	$ -	100.00%	100.00%	
	11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EYECTORA BARNES IC0027 VOLTAJE 220 TRIFASICA (390 GPM DESCARGA 3" 3HP)	UN	3.00			$ 6,591,038.86	$ -	$ 19,773,116.58	0.00%	0.00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	131.64	131.64	131.64	$ 4,352.40	$ 572,932.00	$ -	100.00%	100.00%	
	19.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMATICO CON 2 BOMBAS DE 2HP 110/220 TANQUE HIDRONEUMATICO POR MEMBRANA DE 200LTS, MARCA PEARL, TABLERO DE CONTROL CON NORMA RETIE (INCLUYE 2 BOMBAS ALTA PRESIÓN, CAUDAL 2.33LP/S H.MAQ 50MT 1 TANQUE HIDROACUMULADOR MEMBRANA 200LTS VERTICAL CON MANOMETRO ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN ENTRE BOMBAS Y TANQUE EN HIERRO GALVANIZADO (HG), 1 FLAUTA DE DESCARGA EN 3" INCLUYE COPA DE DESCARGA 3 A 2, 2 REGISTROS EN BRONCE TIPO COMPUERTA, 2 VÁLVULAS CHEQUE HIDRONEUMATICO EN BRONCE, 1 TABLERO DE CONTROL EN COFRE METÁLICO CON NORMA RETIE 2- PRESOSTATOS RANGO 40/60, 1 SENSOR DE NIVEL (FLOTADOR), 1 MANOMETRO EN GLICERINA CON CARATULA DE 2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	UN	1.00			$ 18,464,640.51	$ -	$ 18,464,640.51	0.00%	0.00%	

	ITEM	CPF	742	IED	El Porvenir		SEMANA				

	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	7.75	7.75	7.75	$ 29,040.55	$ 225,064.28	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDASCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	58.31	58.31	58.31	$ 30,426.62	$ 1,774,298.15	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2.97	2.97	2.97	$ 20,817.86	$ 61,795.75	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	107.83	106.35	106.35	$ 10,621.20	$ 1,129,606.59	$ 15,676.88	98.63%	98.63%	
	1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	63.15	63.15	63.15	$ 28,815.57	$ 1,819,703.02	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	116.21	106.35	106.35	$ 11,807.73	$ 1,255,798.93	$ 116,381.67	91.52%	91.52%	
	1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	10.00	10.00	10.00	$ 19,332.69	$ 193,326.91	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.75	8.97	8.97	$ 30,969.00	$ 277,791.93	$ 117,155.73	70.34%	70.34%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	24.00	24.00	24.00	$ 25,467.57	$ 611,221.59	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	24.00	24.00	24.00	$ 13,694.66	$ 328,671.82	$ -	100.00%	100.00%	
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	96.03	96.03	96.03	$ 20,392.00	$ 1,958,182.43	$ -	100.00%	100.00%	
	2.3.7	PERFORACIÓN NÚCLEO 3" E= 0.10 M	UN	2.00	2.00	2.00	$ 162,040.52	$ 324,081.04	$ -	100.00%	100.00%	
	3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	2.44	2.44	2.44	$ 68,498.74	$ 167,383.52	$ -	100.00%	100.00%	
	2.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	5.50	5.50	5.50	$ 85,501.22	$ 470,256.73	$ -	100.00%	100.00%	
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	100.00	100.00	100.00	$ 5,829.54	$ 582,953.76	$ -	100.00%	100.00%	
	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00			$ 118,468.31	$ -	$ 236,936.62	0.00%	0.00%	
2	5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00			$ 211,513.25	$ -	$ 846,052.99	0.00%	0.00%	
	7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	57.35	57.35	57.35	$ 65,046.28	$ 3,730,404.34	$ -	100.00%	100.00%	
	7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	30.30	30.30	30.30	$ 26,316.62	$ 797,393.56	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	57.40	52.48	52.48	$ 14,350.87	$ 753,133.51	$ 70,606.27	91.43%	91.43%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	72.85	72.85	72.85	$ 76,716.07	$ 5,588,535.70	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	44.37	44.37	44.37	$ 67,713.97	$ 3,004,360.49	$ -	100.00%	100.00%	
	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	106.35	106.35	106.35	$ 108,436.36	$ 11,532,640.97	$ (433.75)	100.00%	100.00%	
	9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ANGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	5.09			$ 1,181,573.48	$ -	$ 6,011,845.87	0.00%	0.00%	
	10.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	10.00			$ 1,037,439.40	$ -	$ 10,374,394.03	0.00%	0.00%	
	10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	4.00			$ 721,070.81	$ -	$ 2,884,283.25	0.00%	0.00%	
	10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	10.00			$ 377,707.97	$ -	$ 3,777,079.68	0.00%	0.00%	
	10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	5.00			$ 38,396.20	$ -	$ 191,981.02	0.00%	0.00%	
	10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	6.00			$ 948,374.57	$ -	$ 5,690,247.41	0.00%	0.00%	
	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1".	M2	9.00			$ 923,559.19	$ -	$ 8,312,032.73	0.00%	0.00%	
	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2.70			$ 1,036,355.99	$ -	$ 2,798,161.17	0.00%	0.00%	
	12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	106.35	106.35	106.35	$ 38,464.50	$ 4,090,853.69	$ -	100.00%	100.00%	
	12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	68.62			$ 29,897.64	$ -	$ 2,051,683.69	0.00%	0.00%	
	14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	4.68			$ 185,164.49	$ -	$ 866,569.80	0.00%	0.00%	
	16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	58.00	58.00	58.00	$ 86,678.38	$ 5,027,346.09	$ -	100.00%	100.00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	100.64	58.11	58.11	$ 4,352.40	$ 252,917.96	$ 185,107.57	57.74%	57.74%	
	ITEM	CPF	764	IED		Villas del Progreso		SEMANA				
	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	43.80	43.80	43.80	$ 29,040.55	$ 1,271,976.18	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDASCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	15.11	13.80	13.80	$ 30,426.62	$ 419,887.41	$ 39,816.28	91.34%	91.34%	
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	53.05	63.53	63.53	$ 10,621.20	$ 674,764.53	$ (111,352.61)	119.76%	119.76%	
	1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	35.20	27.20	27.20	$ 28,815.57	$ 783,783.41	$ 230,524.53	77.27%	77.27%	
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	53.05	63.53	63.53	$ 11,807.73	$ 750,144.86	$ (123,792.20)	119.76%	119.76%	
	1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8.00	8.00	8.00	$ 19,332.69	$ 154,661.53	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6.86	7.68	7.68	$ 30,969.00	$ 237,841.92	$ (25,354.32)	111.93%	111.93%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5.00	5.00	5.00	$ 25,467.57	$ 127,337.83	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	20.00	20.00	20.00	$ 19,332.69	$ 386,653.82	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	8.00	8.00	8.00	$ 13,694.66	$ 109,557.27	$ -	100.00%	100.00%	
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS. TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	29.10	29.10	29.10	$ 20,392.00	$ 593,407.15	$ -	100.00%	100.00%	
	1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	60.00	60.00	60.00	$ 17,444.42	$ 1,046,665.15	$ -	100.00%	100.00%	
	1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	21.00	21.00	21.00	$ 36,375.35	$ 763,882.36	$ -	100.00%	100.00%	
	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	14.40	44.69	44.69	$ 96,359.46	$ 4,306,304.16	$ (2,918,727.97)	310.35%	310.35%	
	2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM. DE 0.15 X 0.15 M	KG	834.68	834.68	834.68	$ 7,440.60	$ 6,210,517.75	$ -	100.00%	100.00%	
	4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	60.00			$ 134,053.92	$ -	$ 8,043,235.20	0.00%	0.00%	
	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	30.00	30.00	30.00	$ 85,501.22	$ 2,565,036.72	$ -	100.00%	100.00%	
	4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	22.00			$ 73,492.62	$ -	$ 1,616,837.59	0.00%	0.00%	
	4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	10.00	10.00	10.00	$ 47,726.41	$ 477,264.10	$ -	100.00%	100.00%	
	4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3". INCLUYE ACCESORIOS	UN	11.00	11.00	11.00	$ 121,102.52	$ 1,332,127.68	$ -	100.00%	100.00%	
	4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	18.60	18.60	18.60	$ 13,991.96	$ 260,250.49	$ -	100.00%	100.00%	
	4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7.00	7.00	7.00	$ 59,307.81	$ 415,154.68	$ -	100.00%	100.00%	
	4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	8.00	8.00	8.00	$ 59,307.81	$ 474,462.49	$ -	100.00%	100.00%	
	4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	2.00	6.00	6.00	$ 169,748.96	$ 1,018,493.74	$ (678,995.83)	300.00%	300.00%	
	4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	2.00	2.00	2.00	$ 90,824.54	$ 181,649.09	$ -	100.00%	100.00%	
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	60.00	60.00	60.00	$ 5,829.54	$ 349,772.26	$ -	100.00%	100.00%	
	4.9.13	SUSPENSION DE SALIDA SANITARIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8.00	8.00	8.00	$ 30,698.48	$ 245,587.85	$ -	100.00%	100.00%	
3	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00			$ 118,468.31	$ -	$ 236,936.62	0.00%	0.00%	
	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	15.11	13.80	13.80	$ 42,278.54	$ 583,443.91	$ 55,325.70	91.34%	91.34%	
	7.1.8	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALLANADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) E= 10 CM	M2	401.67	401.60	401.60	$ 143,272.97	$ 57,538,425.88	$ 10,716.82	99.98%	99.98%	
	7.1.9	JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	M	107.16	107.16	107.16	$ 36,001.71	$ 3,857,943.63	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	14.12	14.12	14.12	$ 196,536.97	$ 2,775,102.08	$ 904.07	99.97%	99.97%	
	7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	4.92	4.92	4.92	$ 70,333.44	$ 346,040.55	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	30.58	30.20	30.20	$ 14,350.87	$ 433,396.19	$ 5,453.33	98.76%	98.76%	
	7.2.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	178.50			$ 72,430.63	$ -	$ 12,928,867.81	0.00%	0.00%	
	7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	303.20	303.20	303.20	$ 19,237.61	$ 5,832,842.75	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	46.15	32.67	32.67	$ 76,716.07	$ 2,506,314.07	$ 1,034,132.65	70.79%	70.79%	
	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	73.58	63.76	63.76	$ 108,436.36	$ 6,913,902.52	$ 1,065,278.83	86.65%	86.65%	

9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	4.18			$ 853,515.01	$ -	$ 3,564,278.70	0.00%	0.00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLUCUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ANGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	1.18			$ 1,181,573.48	$ -	$ 1,391,420.93	0.00%	0.00%	
10.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	5.00			$ 1,037,439.40	$ -	$ 5,187,197.02	0.00%	0.00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			$ 721,070.81	$ -	$ 1,442,141.63	0.00%	0.00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	8.00			$ 377,707.97	$ -	$ 3,021,663.74	0.00%	0.00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00			$ 38,396.20	$ -	$ 153,584.81	0.00%	0.00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	8.00			$ 31,338.62	$ -	$ 250,708.95	0.00%	0.00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	17.04			$ 923,559.19	$ -	$ 15,737,448.63	0.00%	0.00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2.16			$ 1,036,355.99	$ -	$ 2,238,528.94	0.00%	0.00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	46.55	46.55	46.55	$ 38,464.50	$ 1,790,368.73	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	14.25			$ 29,897.64	$ -	$ 426,049.14	0.00%	0.00%	
12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	14.07			$ 18,044.38	$ -	$ 253,830.30	0.00%	0.00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	2.21			$ 185,164.49	$ -	$ 408,843.19	0.00%	0.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	416.78	205.30	205.30	$ 4,352.40	$ 893,547.72	$ 920,460.35	49.26%	49.26%	

ITEM	CPF	714	IED	Pablo de Tarso		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	151.50	151.50	151.50	$ 4,435.43	$ 671,967.71	$ -	100.00%	100.00%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	15.30	15.30	15.30	$ 29,040.55	$ 444,320.45	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	37.88	37.88		$ 28,054.90	$ 1,062,719.64	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	156.26	156.26		$ 34,307.63	$ 5,360,909.58	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4.00	4.00		$ 6,973.21	$ 27,892.86	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	8.00	8.00		$ 8,364.64	$ 66,917.15	$ -	100.00%	100.00%	
2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	24.21			$ 62,164.32	$ -	$ 1,504,811.81	0.00%	0.00%	
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	21.65			$ 633,678.64	$ -	$ 13,722,209.28	0.00%	0.00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	1,160.00	28.00	28.00	$ 6,772.33	$ 189,625.36	$ 7,666,282.54	2.41%	2.41%	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	3,465.36	1062.50	1062.50	$ 24,136.40	$ 25,644,926.70	$ 57,996,384.29	30.66%	30.66%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	170.00	28.00	28.00	$ 9,730.63	$ 272,457.56	$ 1,381,749.06	16.47%	16.47%	
4.1.2	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=200 MM (INCLUYE RELLENO)	M	13.50			$ 177,125.27	$ -	$ 2,391,191.15	0.00%	0.00%	
4.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	7.50			$ 148,465.05	$ -	$ 1,113,487.88	0.00%	0.00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	8.00			$ 85,501.22	$ -	$ 684,009.79	0.00%	0.00%	
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	5.00			$ 42,689.68	$ -	$ 213,448.39	0.00%	0.00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	3.00			$ 47,726.41	$ -	$ 143,179.23	0.00%	0.00%	
4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	UN	1.00			$ 20,568.77	$ -	$ 20,568.77	0.00%	0.00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.80			$ 13,991.96	$ -	$ 95,145.34	0.00%	0.00%	
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	5.00			$ 5,234.93	$ -	$ 26,174.66	0.00%	0.00%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00			$ 188,899.52	$ -	$ 755,598.07	0.00%	0.00%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA INCLUYE :	UN	4.00			$ 185,401.53	$ -	$ 741,606.11	0.00%	0.00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	108.54	108.54	108.54	$ 22,625.78	$ 2,455,802.60	$ (113.13)	100.00%	100.00%	
13.1.4	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL 6 MM UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN ÁREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA HASTA 60 CM)	M	37.88	37.88	37.88	$ 84,841.00	$ 3,213,777.02	$ 0.00	100.00%	100.00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	17.70	17.70	17.70	$ 111,316.98	$ 1,970,310.59	$ 0.00	100.00%	100.00%	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	156.26	26.80	26.80	$ 247,166.77	$ 6,624,069.43	$ 31,998,209.99	17.15%	17.15%	
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	35.00			$ 202,701.31	$ -	$ 7,094,545.92	0.00%	0.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	59.66	26.50	26.50	$ 4,352.40	$ 115,338.60	$ 144,325.58	44.42%	44.42%	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	1,038.08	1038.08	1038.08	$ 3,520.76	$ 3,654,827.22	$ 14.08	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	836	IED	Jairo Aníbal Niño		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	3.80	3.80	3.80	$ 29,040.55	$ 110,354.10	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	207.43	207.43		$ 30,426.62	$ 6,311,394.62	$ 12.17	100.00%	100.00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6.84	6.84		$ 20,817.86	$ 142,394.19	$ (0.00)	100.00%	100.00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	168.45	168.45		$ 10,621.20	$ 1,789,140.33	$ 32.29	100.00%	100.00%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	168.45	110.50		$ 28,815.57	$ 3,184,120.09	$ 1,669,949.67	65.60%	65.60%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	168.45	168.45		$ 11,807.73	$ 1,989,011.51	$ 35.90	100.00%	100.00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	20.00	20.00		$ 19,332.69	$ 386,653.82	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	25.17	20.20		$ 30,969.00	$ 625,573.80	$ 154,021.22	80.24%	80.24%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.04			$ 27,437.53	$ -	$ 83,341.50	0.00%	0.00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	40.00	40.00	40.00	$ 25,467.57	$ 1,018,702.66	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12.25	12.25	12.25	$ 8,364.64	$ 102,466.88	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	31.00	31.00	31.00	$ 13,694.66	$ 424,534.44	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	121.96	50.80	50.80	$ 20,392.00	$ 1,035,913.52	$ 1,451,094.61	41.65%	41.65%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	20.40			$ 85,501.22	$ -	$ 1,744,224.97	0.00%	0.00%	
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	8.00	8.00	8.00	$ 19,766.59	$ 158,132.74	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	4.25	4.25	4.25	$ 13,991.96	$ 59,465.84	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	13.00	13.00	13.00	$ 59,307.81	$ 771,001.55	$ -	100.00%	100.00%	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	5.00	5.00	5.00	$ 64,414.18	$ 322,070.90	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00			$ 118,468.31	$ -	$ 592,341.55	0.00%	0.00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	207.43	207.43	207.43	$ 39,814.42	$ 8,258,704.31	$ 15.93	100.00%	100.00%	
7.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	207.43	207.43	207.43	$ 241,797.92	$ 50,156,141.88	$ 96.72	100.00%	100.00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLÁSTICO)	M	118.39	60.28	60.28	$ 76,716.07	$ 4,624,444.82	$ 4,457,970.94	50.92%	50.92%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	53.42	25.60	25.60	$ 67,713.97	$ 1,733,477.62	$ 1,883,694.29	47.92%	47.92%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	191.29	180.60	180.60	$ 108,436.36	$ 19,583,607.19	$ 1,159,347.38	94.41%	94.41%	
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	9.02	4.80	4.80	$ 660,241.67	$ 3,169,160.02	$ 2,784,899.37	53.23%	53.23%	

9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	3.04			$ 448,682.89	$ -	$ 1,362,874.28	0.00%	0.00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	8.17			$ 1,181,573.48	$ -	$ 9,655,818.49	0.00%	0.00%	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	6.00	6.00	6.00	$ 815,394.69	$ 4,892,368.12	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	10.00			$ 1,037,439.40	$ -	$ 10,374,394.03	0.00%	0.00%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	5.00			$ 575,810.47	$ -	$ 2,879,052.34	0.00%	0.00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00			$ 721,070.81	$ -	$ 2,163,212.44	0.00%	0.00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	16.00			$ 377,707.97	$ -	$ 6,043,327.49	0.00%	0.00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	10.00			$ 38,396.20	$ -	$ 383,962.03	0.00%	0.00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	7.00			$ 31,338.62	$ -	$ 219,370.33	0.00%	0.00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	15.64	3.66	3.66	$ 923,559.19	$ 3,380,226.64	$ 11,067,933.36	23.40%	23.40%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2.70			$ 1,036,355.99	$ -	$ 2,798,161.17	0.00%	0.00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	191.29	180.50	180.50	$ 38,464.50	$ 6,942,842.68	$ 415,089.68	94.36%	94.36%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	21.19			$ 11,682.56	$ -	$ 247,718.47	0.00%	0.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	72.64			$ 29,897.64	$ -	$ 2,171,863.23	0.00%	0.00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	10.22			$ 185,164.49	$ -	$ 1,893,121.73	0.00%	0.00%	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM), INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	23.00			$ 320,035.32	$ -	$ 7,360,812.36	0.00%	0.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	60.77	25.60	25.60	$ 4,352.40	$ 111,421.44	$ 153,077.54	42.13%	42.13%	

ITEM	CPF	713	ICO	Luis Lopez de Mesa	SEMANA				

Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance finandero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	7.80	7.80	7.80	$ 29,040.55	$ 226,516.31	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	764.30	701.99		$ 30,062.36	$ 21,103,506.08	$ 1,873,096.77	91.85%	91.85%	
1.2.10	DEMOLICION DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10.98			$ 20,817.86	$ -	$ 228,580.15	0.00%	0.00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56.41	56.41	56.41	$ 10,621.20	$ 599,105.51	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	23.18	23.18	23.18	$ 28,815.57	$ 667,944.83	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56.41	56.41	56.41	$ 11,807.73	$ 666,033.70	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	6.00	6.00	6.00	$ 19,332.69	$ 115,996.15	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1.60			$ 27,437.53	$ -	$ 43,916.51	0.00%	0.00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	12.00	12.00	12.00	$ 25,467.57	$ 305,610.80	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	764.30	140.40	140.40	$ 16,844.46	$ 2,364,931.39	$ 10,509,253.86	18.37%	18.37%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	14.80	14.80	14.80	$ 8,364.64	$ 123,796.72	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	8.00	8.00	8.00	$ 13,694.66	$ 109,557.27	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	74.56	14.91	14.91	$ 20,392.00	$ 304,085.48	$ 1,216,341.92	20.00%	20.00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	3.00	1.50	1.50	$ 47,726.41	$ 71,589.61	$ 71,589.61	50.00%	50.00%	
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	1.60	1.60	1.60	$ 21,103.11	$ 33,764.98	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	18.66	18.66	18.66	$ 13,991.96	$ 261,090.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	10.00	8.00	8.00	$ 59,307.81	$ 474,462.49	$ 118,615.62	80.00%	80.00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	6.00	5.00	5.00	$ 59,307.81	$ 296,539.06	$ 59,307.81	83.33%	83.33%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	2.00	2.00	2.00	$ 90,824.54	$ 181,649.09	$ -	100.00%	100.00%	
4.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN	1.00	1.00	1.00	$ 121,077.07	$ 121,077.07	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	56.00			$ 5,829.54	$ -	$ 326,454.11	0.00%	0.00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00			$ 118,468.31	$ -	$ 118,468.31	0.00%	0.00%	
5.1.45	REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS EXISTENTES	UN	4.00			$ 31,405.58	$ -	$ 125,622.32	0.00%	0.00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	1.35			$ 42,278.54	$ -	$ 57,076.03	0.00%	0.00%	
7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	745.63	91.26	91.26	$ 65,046.28	$ 5,936,047.36	$ 42,563,762.32	12.24%	12.24%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	291.42	34.13	34.13	$ 26,316.62	$ 898,125.69	$ 6,771,063.48	11.71%	11.71%	
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	0.95			$ 70,333.44	$ -	$ 66,816.77	0.00%	0.00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	64.95	50.09	50.09	$ 14,350.87	$ 718,834.94	$ 213,253.89	77.12%	77.12%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	46.90			$ 76,716.07	$ -	$ 3,597,983.78	0.00%	0.00%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	23.66			$ 67,713.97	$ -	$ 1,602,112.52	0.00%	0.00%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	25.28	47.61	47.61	$ 108,436.36	$ 5,162,449.22	$ (2,421,177.96)	188.32%	188.32%	
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	2.32			$ 489,874.00	$ -	$ 1,136,752.62	0.00%	0.00%	
9.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	1.60			$ 698,853.48	$ -	$ 1,118,584.89	0.00%	0.00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	4.79			$ 1,181,573.48	$ -	$ 5,663,754.33	0.00%	0.00%	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	6.00			$ 815,394.69	$ -	$ 4,892,368.12	0.00%	0.00%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			$ 575,810.47	$ -	$ 1,151,620.93	0.00%	0.00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			$ 377,707.97	$ -	$ 1,888,539.84	0.00%	0.00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	1.00			$ 38,396.20	$ -	$ 38,396.20	0.00%	0.00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2.00			$ 31,338.62	$ -	$ 62,677.24	0.00%	0.00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	8.51			$ 923,559.19	$ -	$ 7,861,335.84	0.00%	0.00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.44			$ 1,036,355.99	$ -	$ 1,492,352.63	0.00%	0.00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	58.14	58.14	58.14	$ 38,464.50	$ 2,236,172.31	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	25.11			$ 29,897.64	$ -	$ 750,819.43	0.00%	0.00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	0.55			$ 185,164.49	$ -	$ 101,840.47	0.00%	0.00%	
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	764.30	91.26	91.26	$ 86,678.38	$ 7,910,167.17	$ 58,337,945.92	11.94%	11.94%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	25.11	25.11	25.11	$ 4,352.40	$ 109,301.82	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR DE PASAJEROS MEDIA CABINA USO PARA PERSONAS CON DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD Y PASAJEROS, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 500 KG CARGA VIVA Y TOTAL CON CABINA 890 KG APROX, 2 PARADAS, FOSO CON MEDIDAS 1.60M DE ANCHO X 1.60M DE FONDO APROX.; POSO CON MEDIDAS 1.60M DE ANCHO X 1.60M DE FONDO X 1.00M DE ALTURA APROX., MEDIDAS DE CABINA: 1.50 M DE ANCHO X 1.20M DE FONDO X 1.60M DE ALTURA, PARA EL COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA	UN	1.27			$ 76,917,022.98	$ -	$ 97,684,619.18	0.00%	0.00%	

ITEM	CPF	834	IED	Eduardo Umaña Luna			SEMANA				
Item	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	21.76	21.76	21.76	$ 4,435.43	$ 96,514.97	$ (0.00)	100.00%	100.00%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	6.40	6.40	6.40	$ 29,040.55	$ 185,859.53	$ (0.00)	100.00%	100.00%	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.21	3.21	3.21	$ 30,062.36	$ 96,500.18	$ 144.30	99.85%	99.85%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1.89	1.89	1.89	$ 20,817.86	$ 39,345.76	$ 0.00	100.00%	100.00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	66.41	66.41	66.41	$ 10,621.20	$ 705,353.57	$ (53.11)	100.01%	100.01%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20.97	20.97	20.97	$ 28,815.57	$ 604,262.43	$ 0.00	100.00%	100.00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	69.88	69.88	69.88	$ 11,807.73	$ 825,123.92	$ 23.62	100.00%	100.00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5.00	5.00	5.00	$ 19,332.69	$ 96,663.46	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6.80	6.80	6.80	$ 30,969.00	$ 210,589.20	$ 0.00	100.00%	100.00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11.00	11.00	11.00	$ 25,467.57	$ 280,143.23	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.21	3.21	3.21	$ 21,107.13	$ 67,753.89	$ 101.31	99.85%	99.85%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	10.50	10.50	10.50	$ 8,364.64	$ 87,828.75	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	5.00	5.00	5.00	$ 13,694.66	$ 68,473.30	$ -	100.00%	100.00%	
1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2	549.44	549.44	549.44	$ 50,276.25	$ 27,623,780.82	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	46.09	46.09	46.09	$ 20,392.00	$ 939,867.21	$ (0.00)	100.00%	100.00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	7.00	7.00	7.00	$ 36,375.35	$ 254,627.45	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINCH CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	0.95	0.95	0.95	$ 101,698.85	$ 96,613.91	$ -	100.00%	100.00%	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	3.74	3.74	3.74	$ 68,498.74	$ 256,185.29	$ 205.50	99.92%	99.92%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	1.00			$ 85,501.22	$ -	$ 85,501.22	0.00%	0.00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	2.00	2.00	2.00	$ 47,726.41	$ 95,452.82	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	48.00	48.00	48.00	$ 13,991.96	$ 671,614.16	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7.00	7.00	7.00	$ 59,307.81	$ 415,154.68	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	5.00	5.00	5.00	$ 59,307.81	$ 296,539.06	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	1.00			$ 169,748.96	$ -	$ 169,748.96	0.00%	0.00%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	2.00	2.00	2.00	$ 90,824.54	$ 181,649.09	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	3.00	3.00	3.00	$ 170,346.24	$ 511,038.72	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	44.00			$ 5,829.54	$ -	$ 256,499.65	0.00%	0.00%	
4.9.13	SUSPENSION DE SALIDA SANITARIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1.00			$ 30,698.48	$ -	$ 30,698.48	0.00%	0.00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00			$ 118,468.31	$ -	$ 118,468.31	0.00%	0.00%	
5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00			$ 211,513.25	$ -	$ 211,513.25	0.00%	0.00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	3.21	3.21	3.21	$ 42,278.54	$ 135,714.13	$ 202.94	99.85%	99.85%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	3.21			$ 196,536.97	$ -	$ 631,827.07	0.00%	0.00%	
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	1.80			$ 70,333.44	$ -	$ 126,600.20	0.00%	0.00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	24.70	24.70	24.70	$ 14,350.87	$ 354,466.42	$ (0.00)	100.00%	100.00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	37.48			$ 76,716.07	$ -	$ 2,875,318.38	0.00%	0.00%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	24.15			$ 67,713.97	$ -	$ 1,635,387.17	0.00%	0.00%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	72.77	72.77	72.77	$ 108,436.36	$ 7,890,914.15	$ 0.00	100.00%	100.00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.73			$ 1,181,573.48	$ -	$ 3,225,695.60	0.00%	0.00%	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	5.00			$ 815,394.69	$ -	$ 4,076,973.43	0.00%	0.00%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			$ 575,810.47	$ -	$ 1,151,620.93	0.00%	0.00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			$ 377,707.97	$ -	$ 1,888,539.84	0.00%	0.00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			$ 38,396.20	$ -	$ 76,792.41	0.00%	0.00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2.00			$ 31,338.62	$ -	$ 62,677.24	0.00%	0.00%	
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	1.00	1.00	1.00	$ 948,374.57	$ 948,374.57	$ -	100.00%	100.00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	6.80			$ 923,559.19	$ -	$ 6,280,202.51	0.00%	0.00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	69.35	69.35	69.35	$ 38,464.50	$ 2,667,513.24	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	38.54	20.95	20.95	$ 29,897.64	$ 626,355.56	$ 525,890.52	54.36%	54.36%	
12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	3.90	3.50	3.50	$ 18,044.38	$ 63,155.33	$ 7,217.75	89.74%	89.74%	
12.3.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	12.00	12.00	12.00	$ 29,063.32	$ 348,759.82	$ -	100.00%	100.00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	2.82			$ 185,164.49	$ -	$ 521,830.56	0.00%	0.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	368.76	300.54	300.54	$ 4,362.40	$ 1,308,070.30	$ 296,920.73	81.50%	81.50%	

ITEM	CPF	833	IED	Dario Echandia			SEMANA				
Item	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de pulpa)	M2	123.63	123.63	123.63	$ 3,404.25	$ 420,873.79	$ -	100.00%	100.00%	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoria para cubrimiento de areas de intervención)	M2	15.60	15.60	15.60	$ 2,407.88	$ 37,562.95	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.80	12.80	12.80	$ 20,817.86	$ 266,468.66	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCORZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	224.64	224.64	224.64	$ 28,054.90	$ 6,302,252.92	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	686.67	686.67	686.67	$ 34,307.63	$ 23,557,934.93	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	57.00	57.00	57.00	$ 11,171.61	$ 636,781.56	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	57.00	57.00	57.00	$ 6,973.21	$ 397,473.22	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	253.30	253.30	253.30	$ 4,099.29	$ 1,038,350.46	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	23.00	23.00	23.00	$ 8,364.64	$ 192,386.79	$ -	100.00%	100.00%	
1.3.3	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN)	UN	11.00			$ 177,967.63	$ -	$ 1,957,643.90	0.00%	0.00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	26.00	26.00	26.00	$ 36,375.35	$ 945,759.11	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.16	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	0.85	0.85	0.85	$ 1,307,170.35	$ 1,111,094.80	$ 2,614.34	99.77%	99.77%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	83.52	83.52	83.52	$ 6,772.33	$ 565,625.37	$ 24.38	100.00%	100.00%	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	16,349.35	16349.35	16349.35	$ 24,136.40	$ 394,614,477.50	$ 84.48	100.00%	100.00%	
3.1.13	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2	69.18	48.30	48.30	$ 12,825.52	$ 619,472.54	$ 267,832.99	69.82%	69.82%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	108.00	108.00	108.00	$ 9,730.63	$ 1,050,907.74	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	23.00	23.00	23.00	$ 27,619.66	$ 635,252.20	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	27.00	27.00	27.00	$ 197,624.40	$ 5,335,858.93	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	126.65	126.65	126.65	$ 24,422.99	$ 3,093,171.73	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	50.00	50.00	50.00	$ 46,585.41	$ 2,329,270.56	$ -	100.00%	100.00%	

5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	62.00	62.00	62.00	$ 188,899.52	$ 11,711,770.04	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	49.00	49.00	49.00	$ 185,401.53	$ 9,084,674.79	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	1,161.22	458.96	458.96	$ 29,762.38	$ 13,659,742.29	$ 20,900,893.83	39.52%	39.52%	
13.1.4	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL 6 MM LINA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN ÁREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA HASTA 60 CM)	M	449.28			$ 84,841.00	$ -	$ 38,117,363.76	0.00%	0.00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	17.00	17.00	17.00	$ 111,316.98	$ 1,892,388.70	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA.	M	40.00	28.60	28.60	$ 24,947.96	$ 713,511.56	$ 284,406.71	71.50%	71.50%	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	716.95	716.95	716.95	$ 247,166.77	$ 177,205,350.38	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	6.20	6.20	6.20	$ 134,793.16	$ 835,717.58	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	716.95	300.50	300.50	$ 4,352.40	$ 1,307,896.20	$ 1,812,541.75	41.91%	41.91%	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	12,474.87	12474.87	12474.87	$ 3,520.76	$ 43,920,983.38	$ (3.17)	100.00%	100.00%	
ITEM	**CPF**	**748**	**IED**			**Alfonso Reyes Echandia**	**SEMANA**				
Ítem	**Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribucion de cada colegio pero en caso de reemplazo de canaletas asfalticas y placas de cancha se debe aplicar)	m2	73.41			$ 6,575.47	$ -	$ 482,716.28	0.00%	0.00%	**$ 2,230.40**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	m2	73.41			$ 29,040.55	$ -	$ 2,131,914.99	0.00%	0.00%	**$ 9,850.56**
1.2.16	DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	176.00			$ 113,509.25	$ -	$ 19,977,628.49	0.00%	0.00%	**$ 38,502.34**
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	2.00			$ 22,734.26	$ -	$ 45,468.52	0.00%	0.00%	**$ 7,711.46**
2.2.11	MUROS DE CONTENCIÓN 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	6.00			$ 1,429,703.14	$ -	$ 8,578,218.82	0.00%	0.00%	**$ 484,955.30**
2.3.3	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	64.00			$ 172,618.86	$ -	$ 11,047,607.19	0.00%	0.00%	**$ 58,552.32**
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	480.00			$ 6,772.33	$ -	$ 3,250,720.51	0.00%	0.00%	**$ 2,297.18**
4.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	73.41			$ 93,453.39	$ -	$ 6,860,568.29	0.00%	0.00%	**$ 31,699.39**
4.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	73.41			$ 12,287.16	$ -	$ 902,020.75	0.00%	0.00%	**$ 4,167.80**
9.3.4	CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 M.	M	73.41			$ 1,122,317.90	$ -	$ 82,391,214.44	0.00%	0.00%	**$ 380,090.23**
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	73.41			$ 4,352.40	$ -	$ 319,516.89	0.00%	0.00%	**$ 1,476.33**
ITEM	**CPF**	**747**	**IED**			**Orlando Higuita**	**SEMANA**				
Ítem	**Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	153.00	153.00	153.00	$ 30,062.36	$ 4,599,541.32	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	144.84	144.84	144.84	$ 10,621.20	$ 1,538,352.21	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	144.84	144.84	144.84	$ 11,807.73	$ 1,710,206.97	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4.00	4.00	4.00	$ 6,973.21	$ 27,892.86	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	152.28	152.28	152.28	$ 16,844.46	$ 2,565,038.63	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	153.00	153.00	153.00	$ 42,278.54	$ 6,468,617.23	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	150.00	150.00	150.00	$ 26,316.62	$ 3,947,492.88	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	144.84	144.84	144.84	$ 22,625.78	$ 3,277,072.33	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	144.84	144.84	144.84	$ 29,897.64	$ 4,330,313.10	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.4	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	152.28	152.28	152.28	$ 86,678.38	$ 13,199,201.80	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	152.52	152.52	152.52	$ 4,352.40	$ 663,819.16	$ -	100.00%	100.00%	
ITEM	**CPF**	**830**	**IED**			**Isabel II**	**SEMANA**				
Ítem	**Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	39.52	39.52	39.52	$ 4,352.40	$ 172,006.85	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1.00	1.00	1.00	$ 1,954,513.13	$ 1,954,513.13	$ -	100.00%	100.00%	
ITEM	**CPF**	**850**	**IED**			**Jhon F Kennedy**	**SEMANA**				
Ítem	**Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	97.20	97.20	97.20	$ 4,352.40	$ 423,053.28	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1.00	1.00	1.00	$ 1,954,514.13	$ 1,954,514.13	$ -	100.00%	100.00%	
ITEM	**CPF**	**817**	**IED**			**Marsella**	**SEMANA**				
Ítem	**Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	198.90	198.90	198.90	$ 4,352.40	$ 865,692.36	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1.00	1.00	1.00	$ 1,954,513.90	$ 1,954,513.90	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.6	PODA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	4.00	4.00	4.00	$ 976,870.07	$ 3,907,480.26	$ -	100.00%	100.00%	
ITEM	**CPF**	**890**	**IED**			**Nelson Mandela**	**SEMANA**				
Ítem	**Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2.00	2.00	2.00	$ 122,747.05	$ 245,494.11	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.60	7.60	7.60	$ 20,817.86	$ 158,111.68	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	2.40	2.40	2.40	$ 16,375.74	$ 39,301.77	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	0.18	0.18	0.18	$ 633,678.64	$ 114,062.15	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.17	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2	1.20	1.20	1.20	$ 128,771.23	$ 154,525.48	$ -	100.00%	100.00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	13.32	13.32	13.32	$ 6,772.33	$ 90,174.99	$ -	100.00%	100.00%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	7.60	7.60	7.60	$ 136,417.61	$ 1,036,091.73	$ -	100.00%	100.00%	
3.1.11	RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	M2	15.19	15.19	15.19	$ 137,324.25	$ 2,085,955.30	$ -	100.00%	100.00%	
ITEM	**CPF**	**763**	**IED**			**Bicentenario**	**SEMANA**				
Ítem	**Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	15.00			$ 6,772.33	$ -	$ 101,585.02	0.00%	0.00%	
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA\	M2	25.20			$ 195,409.37	$ -	$ 4,924,316.07	0.00%	0.00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	50.40			$ 22,625.78	$ -	$ 1,140,339.51	0.00%	0.00%	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	36.60			$ 18,025.63	$ -	$ 659,738.13	0.00%	0.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	36.60			$ 4,352.40	$ -	$ 159,297.84	0.00%	0.00%	

FECHA:	27/02/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**74**	
CORTE DEL INFORME:	***28/02/2026***	

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	16	**DEL**	22-feb-26	**AL**	28-feb-26

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.8169111	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.8154784
Fecha de Iniciación	14/10/2025	**Fecha de Iniciación**	14/10/2025
Fecha de Terminación	13/05/2026	**Fecha de Terminación**	13/05/2026
Plazo Inicial	7 MESES	**Plazo Inicial**	7 MESES
Valor inicial	$ 880,146,577.00	**Valor inicial**	$ 2,975,834,553.00
Adiciones	$ 83,867,649.00	**Adiciones**	$ 523,987,595.00
Prorroga	N.A.	**Prorroga**	N.A.
Suspensión	N.A.	**Suspensión**	N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES
No.	**FRENTE**	PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	PROGRAMADO ACUM	EJECUTADO ACUM	DESVIACIÓN	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**
1	PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	55.00%	72.83%	60.00%	72.83%	12.83%	BAÑO: Instalacion de enchape, media cañas y instalación de tubería e instalación de piso en vinisol
2	PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	20.00%	20.64%	21.00%	20.64%	-0.36%	Cocina: Instalacion de piso, cambio de tuberias
3	EL PORVENIR	42.00%	46.16%	45.00%	51.88%	6.88%	BAÑO: instalacion de enchape, media cañas y instalación manto en cubierta
4	VILLAS DEL PROGRESO	53.50%	63.39%	58.00%	63.39%	5.39%	BAÑO Y CANCHA: Instalación de enchape, Fundicion de placa
5	PABLO DE TARSO	27.92%	28.85%	30.10%	33.94%	3.84%	Desmonte e instalación de cubierta
6	JAIRO ANIBAL NIÑO	40.10%	58.37%	47.15%	58.37%	11.22%	BAÑO Y SALONS DE PREESCOLAR: Instalación de enchape, media caña y piso
7	LUIS LOPEZ DE MESA	13.32%	16.84%	15.62%	17.37%	1.75%	BAÑO: Instalacion de manto de aluminio sobre cubierta y enchape
8	EDUARDO UMAÑA LUNA	37.14%	64.83%	43.47%	68.27%	24.80%	BAÑO: Instalacion de enchape
9	DARIO ECHANDIA	60.60%	88.03%	65.14%	90.24%	25.10%	CUBIERTA: Instalación de cubierta
10	LLANO ORIENTAL - ALFONSO REYES ECHANDIA						0
TOTALES		**38.84%**	**51.10%**	**42.83%**	**52.99%**	**10.16%**	

3. RESUMEN FINANCIERO

PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 259,947,350	$ 189,321,651	**$ 70,625,699**		0.00%	72.83%

PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 85,000,000	$ 17,546,978	**$ 67,453,022**		0.00%	20.64%

EL PORVENIR

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 99,553,816	$ 51,647,970	**$ 47,905,846**		5.70%	51.88%

VILLAS DEL PROGRESO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 171,376,301	$ 108,628,512	**$ 62,747,788**		0.00%	63.39%

PABLO DE TARSO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 179,468,691	$ 60,905,014	**$ 118,563,677**		5.09%	33.94%

JAIRO ANIBAL NIÑO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 207,779,941	$ 121,283,326	**$ 86,496,616**		0.00%	58.37%

LUIS LOPEZ DE MESA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 302,922,429	$ 52,632,407	**$ 250,290,021**		0.50%	17.37%

EDUARDO UMAÑA LUNA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 75,659,453	$ 51,655,792	**$ 24,003,661**		3.40%	68.27%

DARIO ECHANDIA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 799,164,222	$ 721,181,978	**$ 77,982,244**		2.20%	90.24%

FECHA:	27/02/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**74**	
CORTE DEL INFORME:	***28/02/2026***	

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	16	**DEL**	22-feb-26	**AL**	28-feb-26

EMERGENCIAS

BALANCE EMERGENCIAS	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 68,564,814	$ 57,655,046	**$ 10,909,768**		0.00%	84.09%

4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

OBSERVACIONES: N/A

RECOMENDACIONES:
- Mantener orden y aseo en la obras, así como la señalización
- Continuar con el uso correcto de EPP
- Apertura de más frentes de obra

CONCLUSIONES:
- Se avanzó en tres frentes de trabajo con actividades de cerramiento, demoliciones, desmontes, pañete, e Instalación de pisos, cubiertas, enchape.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

1. Se continua con avances en los frentes de obra en los siguientes colegios: Alfonso Lopez Michelsen, El Porvenir, Villas del progreso, Jairo Anibal Niño, Eduardo Umaña Luna , Luis Lopez de Mesa y Dario Echandia.

2. Se continua con avance en los frentes de obra en las emergencias en los siguientes colegios: Orlando Higuita.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente semana no se remitió documentación correspondiente al ingreso de nuevos trabajadores a los frentes de obra, en consecuencia, no se registraron solicitudes de aprobación de personal por parte del contratista durante el periodo evaluado. Se evidenció la ejecución de actividades en los colegios, Luis López de Mesa, Alfonso López Michelsen, Villas del Progreso, El Porvenir, Jairo Aníbal Niño, Darío Echandía, Orlando Higuita, Dario Echandia Sede B, Colegio Eduardo Uñama Luna, Colegio Pablo de Tarso.
Con respecto a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, esta interventoría realizó la verificación del acompañamiento del inspector SST en cada uno de los frentes de obra activos. En dichos recorridos se evidenció la realización de charlas de seguridad, el diligenciamiento de los permisos de trabajo y de los ATS, así como la reposición oportuna de EPP cuando fue requerido.
No obstante, se recomienda al contratista implementar jornadas periódicas de orden y aseo en los colegios Darío Echandía y Luis López de Mesa, incluyendo el retiro oportuno de escombros y residuos de construcción, con el fin de prevenir incidentes, mejorar las condiciones locativas y garantizar entornos de trabajo seguros y organizados dentro de las instituciones educativas.
Durante el presente periodo, el contratista remitió el Informe Mensual SST No. 4 para su respectiva revisión por parte de la interventoría. Una vez verificado su contenido, el informe fue devuelto con observaciones mediante el oficio UNIOBRAS-LOTE 3-258, en el cual se consignaron las precisiones y ajustes requeridos, con el fin de que el contratista realice las correcciones correspondientes. trabajadas: 44

REPORTE PERSONAL

Total de horas capacitación: 20 minutos
Número de accidentes de trabajo: 0
Número de días de incapacidad por AT:0

DIRECTOR OBRA: 1 INSPECTORES SST: 1
RESIDENTE OBRA: 1 PERSONAL OPERATIVO: 49

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

IED Cultura Alfonso López Michelsen: Se realizo recorrido en el frente, no se evidencian residuos en el frente, se recomienda realizar jornada de aseo periódicamente y implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).
IED Villas del progreso: Se realizo recorrido en el frente, se hace entrega parcial de la cancha, no se evidencia el cerramiento, se encuentran pocas lonas de residuos en los baños, se recomienda al terminar disponer estos residuos y realizar jornadas de aseo periódicamente.
IED El Porvenir: Se realizo recorrido en el frente, presenta señalización en el frente de obra. No se evidencia residuos, en los baños se recomienda garantizar una jornada de aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Jairo Aníbal Niño: Se realizo recorrido en el frente, se reporta un volumen medio respecto a los RCD en la parte del parqueadero de bicicletas, al igual se recomendó disponerlo adecuadamente, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Darío Echandía: Se realizo recorrido en el frente, se presenta el cerramiento adecuado, se evidencia materiales debidamente acopiados al igual que se presenta residuos en el frente, las luminarias se encuentran en el aula 108, por lo que se recomienda realizar la disposición total de los residuos, mantener orden en el frente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Orlando Higuita: Se realizo recorrido en el frente, se realizó el retiro de las láminas de PVC y tablones de madera anteriormente, se genera residuos de láminas de PVC por lo se recomendó al contratista disponer adecuadamente todo el material al finalizar las actividades, garantizar jornada de aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Eduardo Umaña Luna: Se realizo recorrido en el frente, se encuentra el cerramiento adecuado, se evidencia material de obra y residuos de construcción y demolición debidamente acopiados, la zona se encuentra limpia, al igual se recomendó realizar la disposición adecuada e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Pablo de torso: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia acopio de materiales de RCD adecuado por lo que se recomienda hacer la disposición adecuada de todos los residuos ante los gestores autorizados, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Luis López de mesa: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción en la entrada del baño, generando interferencia en la circulación en el área, se evidencia residuos acopiados adecuadamente (volumen medio- alto) en el bicicletero y los baños por lo que se recomienda al contratista organizar un punto de acopio, posteriormente realizar la debida disposición adecuadamente y garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente.

OTROS

ING JHONER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING HARRY ARANGO
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA:	27/02/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**74**	
CORTE DEL INFORME:	***28/02/2026***	

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA

Alfonso Lopez Michelsen



Pintura



Pintura



Pintura



Pintura

Alfonso Lopez Michelsen Cocina



Arreglo piso



Arreglo piso



Instalacion Tapa para pozo



Instalacion Tapa para pozo

El Porvenir




Instalacion de enchape



Instalacion de enchape

	
Instalacion de media Caña	Instalacion de media Caña

Villas del Progreso

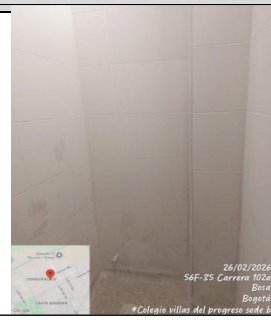	
Instalacion de media CañaInstalacion de media Caña	Instalacion de media Caña
	
Instalacion de media CañaInstalacion de media Caña	Instalacion de media Caña

Jairo Anibal Niño

	
Instalacion de sanitarios	Instalacion de sanitarios



Instalacion de sanitarios



Instalacion de sanitarios

Eduardo Umaña Luna



Pintura



Pintura



Instalacion de enchape



Instalacion de sanitario

Orlando Higuita



Manto para cubierta



Manto para cubierta

	
Manto para cubierta	Manto para cubierta

Dario Echandia

	
Montaje de estructura	Montaje de estructura
	
Montaje de estructura	Montaje de estructura

Luis Lopez De Mesa



Manto para cubierta



Instalacion de enchape



Instalacion de enchape



Manto para cubierta

Pablo de Tarso



Instalacion de estructura



Pintura de fachada








Instalacion de estructura



Pintura de fachada

FECHA:	27/02/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	74 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA				
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				GRUPO 7
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154784	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDU 2025		
28/2/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169111	INTERVENTOR:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE		ESTADO ACTUAL O FINAL
16 ###						
Alfonso Lopez Michelsen	Mejoramiento de baterias sanitarias y salones de preescolar	BAÑO: Instalacion de enchape, media cañas y instalación de tuberia e instalación de piso en vinisol				
Alfonso Lopez Michelsen Cocina	Mejoramiento de cocina	Cocina: Instalacion de piso, cambio de tuberias				
El Porvenir	Mejoramiento de cubierta y baterias sanitarias	BAÑO: instalacion de enchape, media cañas y instalación manto en cubierta				
Villas del Progreso	Mejoramiento de baterias y canchas sanitarias	BAÑO Y CANCHA: Instalación de enchape, Fundicion de placa				
Pablo de Tarso	Desmonte e instalación de cubierta	Desmonte e instalación de cubierta				
Jairo Anibal Niño	Mejoramiento de baterias sanitarias y pisos preescolar	BAÑO Y SALONS DE PREESCOLAR: Instalación de enchape, media caña y piso				
Luis Lopez de Mesa	Mejoramiento de baterias sanitarias	BAÑO: Instalacion de manto de aluminio sobre cubierta y enchape				
Eduardo Umaña	Mejoramiento de baterias sanitarias y cerramiento	BAÑO: Instalacion de enchape				
Dario Echandia	Desmonte e instalación de cubierta	CUBIERTA: Instalación de cubierta				

EMERGENCIA No. 1 Colegio Orlando Higuita	**Mejoramiento Cocina**	**COCINAS: Instalacion de media cañas**				
EMERGENCIA No. 2 San Bernardino						
EMERGENCIA No. 3 Isabel II						
EMERGENCIA No. 4 Jhon F Kennedy						

EMERGENCIA No. 5 Marsella						
EMERGENCIA No. 6 Nelson Mandela						
EMERGENCIA No. 7 Bicentenario						
EMERGENCIA No. 8 San Jose						
EMERGENCIA No. 9 Nicolas Esguerra						

FECHA:	27/02/2026	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	74 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA	GRUPO 7
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDU 2025	
28 de febrero de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S	

DATOS:	FECHAS INTERVENTORIA	FECHAS OBRA	ETAPA:	PLAZOS EN DIAS INTERVENTORIA	PLAZOS EN DIAS OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169111	CO1.PCCNTR.8154784	INICIAL	211	211
INICIO	14 de octubre de 2025	14 de octubre de 2025	SUSPENSIONES		
TERMINACION INICIAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	PRORROGAS		
TERMINACION FINAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	TOTAL	211	211

VALOR CONTRATO	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	$ 796,278,928	$ 2,451,846,958
ADICIÓNES	$ 83,867,649.00	$ 523,987,595.00
TOTAL	$ 880,146,577.00	$ 2,975,834,553.00

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	05/12/2025	$ 83,867,649.00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	05/12/2025	$ 523,987,595.00		
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMENTO DESDE	CUMPLIMENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400-47	5 9 2025	5 10 2026	5 4 2026	5 4 2031	5 9 2025	5 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMENTO DESDE	CUMPLIMENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
895-47	14 10 2025	15 1 2027	14 10 2025	15 5 2027	14 10 2025	15 1 2027	895-74	5 4 2026	15 5 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (31082024)	PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	dic-2025	ene-2026	feb-2026	mar-2026	abr-2026	may-2026	jun-2026	jul-2026	ago-2026	sep-2026	oct-2026	nov-2026	dic-2026	ene-2027	feb-2027	mar-2027
751	PORTAL DEL SOL -	Bosa	A	Portal del Sol Alfonso Lopez Michelsen	72.83%	72.83%	60.00%		$ 259,947,350.30	$ 189,321,651	14/10/2025	30/03/2026																			
751	PORTAL DEL SOL -	Bosa	A	Portal del Sol Alfonso Lopez Michelsen	20.64%	20.64%	21.00%		$ 85,000,000.00	$ 17,546,978	14/10/2025	30/03/2026																			
742	EL PORVENIR	Bosa	B	El Recuerdo Santa Fe	46.18%	51.88%	48.00%		$ 89,553,815.81	$ 51,647,978	14/10/2025	30/03/2026																			
764	VILLAS DEL PROGRESO	Bosa	B	Enrique Dussel	63.39%	63.39%	58.00%		$ 171,376,300.91	$ 108,629,512	14/10/2025	13/05/2026																			
714	PABLO DE TARSO	Bosa	A	Pablo de Tarso	28.88%	33.94%	30.10%		$ 179,463,691.28	$ 69,905,614	14/10/2025	13/05/2026																			
836	JAIRO ANIBAL NIÑO	Kennedy	A	Patio Bonito I	58.37%	58.37%	47.16%		$ 207,779,941.37	$ 121,283,326	14/10/2025	02/03/2026																			
712	LUIS LOPEZ DE MESA	Bosa	A	Luis Lopez de Mesa	16.84%	17.37%	15.62%		$ 392,922,428.82	$ 52,632,407	14/10/2025	11/03/2026																			
814	EDUARDO UMAÑA LUNA	Kennedy	A	Dindalito	64.83%	68.27%	49.47%		$ 75,655,462.87	$ 51,655,792	14/10/2025	02/02/2026																			
833	DARIO ECHANDIA	Kennedy	B	Los Patios	88.03%	90.24%	66.14%		$ 799,164,221.64	$ 721,181,978	14/10/2025	13/09/2026																			
748	LLANO ORIENTAL -	Bosa	A	San José de Maryland San Pedro -					$ 135,987,695.00	$ -	14/10/2025	13/05/2026																			
TOTAL FRENTES DE OBRA					52.99%	42.83%			$ 2,316,859,798	$ 1,374,803,629																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
747	LA LIBERTAD - ORLANDO	Bosa	A	Orlando Higuita - Holanda la Libertad	100.00%	100.00%			$ -	$ 42,499,555	19/11/2025	15/01/2026																			
729	SAN BERNARDINO	Bosa	A	San Bernardino	0.00%	0.00%			$ 3,923,717	$ -	24/11/2025	31/12/2025																			
838	ISABEL II	Kennedy	B	Pio XII	100.00%	100.00%			$ 2,126,526	$ 2,126,526	29/11/2025	19/12/2025																			
850	JOHN F. KENNEDY	Kennedy	A	John F. kennedy	100.00%	100.00%			$ 2,377,567	$ 2,377,567	29/11/2025	12/12/2025																			
817	MARSELLA	Kennedy	A	Bas-Med. Marsella.	100.00%	100.00%			$ 6,727,687	$ 6,727,687	28/11/2025	18/12/2025																			
890	NELSON MANDELA	Kennedy	A	Comuneiro Tintal	100.00%	100.00%			$ 3,923,717	$ 3,923,717	28/11/2025	16/01/2026																			
763	BICENTENARIO	Bosa	A	San José de Maryland	0.00%	0.00%			$ 6,986,050	$ -	27/11/2025	16/01/2026																			
821	SAN JOSE	Kennedy	B	El Descanso																										
859	NACIONAL NICOLAS	Kennedy	A	Nicolas Esguerra																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
TOTAL FRENTES DE OBRA					71.43%	#¡DIV/0!	######		$ 68,564,814	$ 57,655,046																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	9	0	9	$ 1,374,803,629
ACUMULADO EMERGENCIAS				
5	0	2	7	$ 57,655,046
TOTAL				
5	9	2	16	$ 1,432,458,675
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

AVANCE	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
	52.99%	0.00%	64.93%
PROGRAMADO	42.83%		
ATRASO	10.16%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			









OBSERVACIONES:

BALANCE SEMANAL POR CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS

		CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2026
GRUPOS	ITEM	CPF	751	IED	Alfonso Lopez Michelsen		SEMANA				
	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si es su defecto la SED no lo puede aportar).	M2	30.69	30.69		$ 4,435.43	$ 136,101.63	$ -	100.00%	100.00%	
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	3.79	3.79		$ 29,040.55	$ 110,063.69	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.01	40.01		$ 30,062.36	$ 1,202,753.00	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	455.72	450.72		$ 30,426.62	$ 13,713,897.10	$ 152,133.12	98.90%	98.90%	
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	113.46	113.46		$ 10,621.20	$ 1,205,071.78	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	76.42	76.42		$ 28,815.57	$ 2,202,085.58	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	123.57	123.57		$ 11,807.73	$ 1,459,112.04	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11.00	11.00		$ 19,332.69	$ 212,659.60	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10.80	6.80		$ 30,969.00	$ 210,589.20	$ 123,950.33	62.95%	62.95%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	18.00	18.00		$ 25,467.57	$ 458,416.20	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.01	40.01		$ 21,107.13	$ 844,496.32	$ (29.55)	100.00%	100.00%	
	1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	1.60	1.60		$ 8,364.64	$ 13,383.43	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	18.00	18.00		$ 13,694.66	$ 246,503.87	$ -	100.00%	100.00%	
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	84.44	84.44		$ 20,392.00	$ 1,721,900.34	$ -	100.00%	100.00%	
	4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	27.38	27.38		$ 13,991.96	$ 383,099.91	$ -	100.00%	100.00%	
	4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	13.00	13.00		$ 59,307.81	$ 771,001.55	$ -	100.00%	100.00%	
	4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	11.00	11.00		$ 59,307.81	$ 652,385.92	$ -	100.00%	100.00%	
	4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/2"	UN	2.00	2.00		$ 201,917.88	$ 403,835.76	$ -	100.00%	100.00%	
	4.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN	2.00	2.00		$ 85,229.37	$ 170,458.73	$ -	100.00%	100.00%	
1	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00			$ 118,468.31	$ -	$ 236,936.62	0.00%	0.00%	
	7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	455.72	450.72		$ 39,814.42	$ 17,945,153.58	$ 199,084.02	98.90%	98.90%	
	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	40.01	40.01		$ 42,278.54	$ 1,691,564.55	$ (59.19)	100.00%	100.00%	
	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	40.01	40.01		$ 196,536.97	$ 7,863,444.35	$ (275.15)	100.00%	100.00%	
	7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	12.00	12.00		$ 70,333.44	$ 844,001.34	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	455.72	450.72		$ 241,797.92	$ 108,983,157.06	$ 1,209,062.12	98.90%	98.90%	
	7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	116.40	116.40		$ 14,350.87	$ 1,670,440.94	$ (57.40)	100.00%	100.00%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	63.34	63.34		$ 76,716.07	$ 4,859,196.00	$ (0.00)	100.00%	100.00%	
	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	112.85	112.85		$ 108,436.36	$ 12,237,043.59	$ 59.64	100.00%	100.00%	
	9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO).	M2	4.59			$ 489,874.00	$ -	$ 2,249,697.37	0.00%	0.00%	
	9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ANGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	7.92			$ 1,181,573.48	$ -	$ 9,358,061.97	0.00%	0.00%	
	10.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	9.00			$ 1,037,439.40	$ -	$ 9,336,954.63	0.00%	0.00%	
	10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	4.00			$ 721,070.81	$ -	$ 2,884,283.25	0.00%	0.00%	
	10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	11.00			$ 377,707.97	$ -	$ 4,154,787.65	0.00%	0.00%	
	10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00			$ 38,396.20	$ -	$ 153,584.81	0.00%	0.00%	
	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20,	M2	33.87			$ 923,559.19	$ -	$ 31,283,720.51	0.00%	0.00%	
	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80			$ 1,036,355.99	$ -	$ 1,865,440.78	0.00%	0.00%	
	12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	112.53	112.53		$ 38,464.50	$ 4,328,410.46	$ (63.47)	100.00%	100.00%	
	12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	45.20	45.20		$ 29,897.64	$ 1,351,373.33	$ 62.79	100.00%	100.00%	
	12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	48.40	48.20		$ 26,897.83	$ 1,296,475.50	$ 5,379.57	99.59%	99.59%	
	14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	7.92			$ 185,164.49	$ -	$ 1,466,502.74	0.00%	0.00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	30.69	30.69		$ 4,352.40	$ 133,575.16	$ (21.33)	100.02%	100.02%	
GRUPOS	ITEM	CPF	751	IED	Alfonso Lopez Michelsen Cocina		SEMANA				
	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.93	3.93		$ 30,062.36	$ 118,145.08	$ 72.15	99.94%	99.94%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.93	3.93		$ 30,426.62	$ 119,576.63	$ 73.02	99.94%	99.94%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2.00	2.00		$ 25,467.57	$ 50,935.13	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13.09	13.09		$ 21,107.13	$ 276,292.35	$ -	100.00%	100.00%	
	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	7.35	7.35		$ 85,501.22	$ 628,434.00	$ -	100.00%	100.00%	
	4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2.00	2.00		$ 71,024.47	$ 142,048.94	$ -	100.00%	100.00%	
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	4.00	4.00		$ 5,829.54	$ 23,318.15	$ -	100.00%	100.00%	
	5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	5.00			$ 534,497.49	$ -	$ 2,672,487.43	0.00%	0.00%	
	5.1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	127.73			$ 53,182.31	$ -	$ 6,792,908.92	0.00%	0.00%	
	5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°8 (T) AWG THHN	M	150.20			$ 83,551.35	$ -	$ 12,549,412.59	0.00%	0.00%	
	5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	30.00			$ 185,401.53	$ -	$ 5,562,045.79	0.00%	0.00%	
1	5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	2.00			$ 819,132.39	$ -	$ 1,638,264.79	0.00%	0.00%	
	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	13.09	13.09		$ 42,278.54	$ 553,426.14	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	12.60	12.60		$ 196,536.97	$ 2,476,365.88	$ (0.00)	100.00%	100.00%	
	7.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	90.50	90.50		$ 19,490.72	$ 1,763,909.87	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	22.42	22.42		$ 76,716.07	$ 1,719,974.33	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	131.64	131.64		$ 67,713.97	$ 8,913,587.98	$ -	100.00%	100.00%	
	10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	6.00	6.00		$ 31,338.62	$ 188,031.72	$ -	100.00%	100.00%	
	11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EYECTORA BARNES IC0027 VOLTAJE 220 TRIFASICA (390 GPM DESCARGA 3" 3HP)	UN	3.00			$ 6,591,038.86	$ -	$ 19,773,116.58	0.00%	0.00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	131.64	131.64		$ 4,352.40	$ 572,932.00	$ -	100.00%	100.00%	
	19.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMATICO CON 2 BOMBAS DE 2HP 110/220 TANQUE HIDRONEUMATICO POR MEMBRANA DE 200LTS, MARCA PEARL, TABLERO DE CONTROL CON NORMA RETIE (INCLUYE 2 BOMBAS ALTA PRESIÓN CAUDAL 2.33LP/S H.MAQ 50MT 1 TANQUE HIDROACUMULADOR MEMBRANA 200LTS VERTICAL CON MANOMETRO ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN ENTRE BOMBAS Y TANQUE EN HIERRO GALVANIZADO (HG), 1 FLAUTA DE DESCARGA EN 3" INCLUYE COPA DE DESCARGA 3 A 2, 2 REGISTROS EN BRONCE TIPO COMPUERTA, 2 VÁLVULAS CHEQUE HIDRONEUMATICO EN BRONCE, 1 TABLERO DE CONTROL EN COFRE METÁLICO CON NORMA RETIE 2- PRESOSTATOS RANGO 40/60, 1 SENSOR DE NIVEL (FLOTADOR), 1 MANOMETRO EN GLICERINA CON CARATULA DE 2" (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	UN	1.00			$ 18,464,640.51	$ -	$ 18,464,640.51	0.00%	0.00%	
	ITEM	CPF	742	IED	El Porvenir		SEMANA				

	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	7.75	7.75		$ 29,040.55	$ 225,064.28	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	58.31	58.31		$ 30,426.62	$ 1,774,298.15	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2.97	2.97		$ 20,817.86	$ 61,795.75	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	107.83	106.35		$ 10,621.20	$ 1,129,606.59	$ 15,676.88	98.63%	98.63%	
	1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	63.15	63.15		$ 28,815.57	$ 1,819,703.02	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	116.21	106.35		$ 11,807.73	$ 1,255,798.93	$ 116,381.67	91.52%	91.52%	
	1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	10.00	10.00		$ 19,332.69	$ 193,326.91	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.75	8.97		$ 30,969.00	$ 277,791.93	$ 117,155.73	70.34%	70.34%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	24.00	24.00		$ 25,467.57	$ 611,221.59	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	24.00	24.00		$ 13,694.66	$ 328,671.82	$ -	100.00%	100.00%	
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	96.03	96.03		$ 20,392.00	$ 1,958,182.43	$ -	100.00%	100.00%	
	2.3.7	PERFORACIÓN NÚCLEO 3" E= 0.10 M	UN	2.00	2.00		$ 162,040.52	$ 324,081.04	$ -	100.00%	100.00%	
	3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	2.44	2.44		$ 68,498.74	$ 167,383.52	$ -	100.00%	100.00%	
	2.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	5.50	5.50		$ 85,501.22	$ 470,256.73	$ -	100.00%	100.00%	
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	100.00	100.00		$ 5,829.54	$ 582,953.76	$ -	100.00%	100.00%	
	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00			$ 118,468.31	$ -	$ 236,936.62	0.00%	0.00%	
2	5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00			$ 211,513.25	$ -	$ 846,052.99	0.00%	0.00%	
	7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	57.35	57.35		$ 65,046.28	$ 3,730,404.34	$ -	100.00%	100.00%	
	7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	30.30	30.30		$ 26,316.62	$ 797,393.56	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	57.40	52.48		$ 14,350.87	$ 753,133.51	$ 70,606.27	91.43%	91.43%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	72.85	72.85		$ 76,716.07	$ 5,588,535.70	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	44.37	44.37		$ 67,713.97	$ 3,004,360.49	$ -	100.00%	100.00%	
	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	106.35	106.35		$ 108,436.36	$ 11,532,640.97	$ (433.75)	100.00%	100.00%	
	9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ANGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	5.09			$ 1,181,573.48	$ -	$ 6,011,845.87	0.00%	0.00%	
	10.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	10.00			$ 1,037,439.40	$ -	$ 10,374,394.03	0.00%	0.00%	
	10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	4.00			$ 721,070.81	$ -	$ 2,884,283.25	0.00%	0.00%	
	10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	10.00			$ 377,707.97	$ -	$ 3,777,079.68	0.00%	0.00%	
	10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	5.00			$ 38,396.20	$ -	$ 191,981.02	0.00%	0.00%	
	10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	6.00	6.00	6.00	$ 948,374.57	$ 5,690,247.41	$ -	100.00%	100.00%	
	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIACIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	9.00			$ 923,559.19	$ -	$ 8,312,032.73	0.00%	0.00%	
	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2.70			$ 1,036,355.99	$ -	$ 2,798,161.17	0.00%	0.00%	
	12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	106.35	106.35		$ 38,464.50	$ 4,090,853.69	$ -	100.00%	100.00%	
	12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	68.62			$ 29,897.64	$ -	$ 2,051,683.69	0.00%	0.00%	
	14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	4.68			$ 185,164.49	$ -	$ 866,569.80	0.00%	0.00%	
	16.1.4	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	58.00	58.00		$ 86,678.38	$ 5,027,346.09	$ -	100.00%	100.00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	100.64	58.11		$ 4,352.40	$ 252,917.96	$ 185,107.57	57.74%	57.74%	

ITEM	CPF	764	IED	Villas del Progreso		SEMANA				

	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	43.80	43.80		$ 29,040.55	$ 1,271,976.18	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	15.11	13.80		$ 30,426.62	$ 419,887.41	$ 39,816.28	91.34%	91.34%	
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	53.05	63.53		$ 10,621.20	$ 674,764.53	$ (111,352.61)	119.76%	119.76%	
	1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	35.20	27.20		$ 28,815.57	$ 783,783.41	$ 230,524.53	77.27%	77.27%	
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	53.05	63.53		$ 11,807.73	$ 750,144.86	$ (123,792.20)	119.76%	119.76%	
	1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8.00	8.00		$ 19,332.69	$ 154,661.53	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6.86	7.68		$ 30,969.00	$ 237,841.92	$ (25,354.32)	111.93%	111.93%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5.00	5.00		$ 25,467.57	$ 127,337.83	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	20.00	20.00		$ 19,332.69	$ 386,653.82	$ -	100.00%	100.00%	
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	8.00	8.00		$ 13,694.66	$ 109,557.27	$ -	100.00%	100.00%	
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS. TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	29.10	29.10		$ 20,392.00	$ 593,407.15	$ -	100.00%	100.00%	
	1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	60.00	60.00		$ 17,444.42	$ 1,046,665.15	$ -	100.00%	100.00%	
	1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	21.00	21.00		$ 36,375.35	$ 763,882.36	$ -	100.00%	100.00%	
	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	14.40	44.69		$ 96,359.46	$ 4,306,304.16	$ (2,918,727.97)	310.35%	310.35%	
	2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM. DE 0.15 X 0.15 M	KG	834.68	834.68		$ 7,440.60	$ 6,210,517.75	$ -	100.00%	100.00%	
	4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	60.00			$ 134,053.92	$ -	$ 8,043,235.20	0.00%	0.00%	
	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	30.00	30.00		$ 85,501.22	$ 2,565,036.72	$ -	100.00%	100.00%	
	4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	22.00			$ 73,492.62	$ -	$ 1,616,837.59	0.00%	0.00%	
	4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	10.00	10.00		$ 47,726.41	$ 477,264.10	$ -	100.00%	100.00%	
	4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	11.00	11.00		$ 121,102.52	$ 1,332,127.68	$ -	100.00%	100.00%	
	4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	18.60	18.60		$ 13,991.96	$ 260,250.49	$ -	100.00%	100.00%	
	4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7.00	7.00		$ 59,307.81	$ 415,154.68	$ -	100.00%	100.00%	
	4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	8.00	8.00		$ 59,307.81	$ 474,462.48	$ -	100.00%	100.00%	
	4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	2.00	6.00		$ 169,749.96	$ 1,018,493.74	$ (678,995.83)	300.00%	300.00%	
	4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	2.00	2.00		$ 90,824.54	$ 181,649.09	$ -	100.00%	100.00%	
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	60.00	60.00		$ 5,829.54	$ 349,772.26	$ -	100.00%	100.00%	
	4.9.13	SUSPENSION DE SALIDA SANITARIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8.00	8.00		$ 30,698.48	$ 245,587.85	$ -	100.00%	100.00%	
3	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00			$ 118,468.31	$ -	$ 236,936.62	0.00%	0.00%	
	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	15.11	13.80		$ 42,278.54	$ 583,443.91	$ 55,325.70	91.34%	91.34%	
	7.1.8	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALLANADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) E= 10 CM	M2	401.67	401.60		$ 143,272.97	$ 57,538,425.88	$ 10,716.82	99.98%	99.98%	
	7.1.9	JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	M	107.16	107.16		$ 36,001.71	$ 3,857,943.63	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	14.12	14.12		$ 196,536.97	$ 2,775,102.08	$ 904.07	99.97%	99.97%	
	7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	4.92	4.92		$ 70,333.44	$ 346,040.55	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	30.58	30.20		$ 14,350.87	$ 433,396.19	$ 5,453.33	98.76%	98.76%	
	7.2.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	178.50			$ 72,430.63	$ -	$ 12,928,867.81	0.00%	0.00%	
	7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	303.20	303.20		$ 19,237.61	$ 5,832,842.75	$ -	100.00%	100.00%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	46.15	32.67		$ 76,716.07	$ 2,506,314.07	$ 1,034,132.65	70.79%	70.79%	
	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	73.58	63.76		$ 108,436.36	$ 6,913,902.52	$ 1,065,278.83	86.65%	86.65%	

9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	4.18			$ 853,515.01	$ -	$ 3,564,278.70	0.00%	0.00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	1.18			$ 1,181,573.48	$ -	$ 1,391,420.93	0.00%	0.00%	
10.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	5.00			$ 1,037,439.40	$ -	$ 5,187,197.02	0.00%	0.00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			$ 721,070.81	$ -	$ 1,442,141.63	0.00%	0.00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	8.00			$ 377,707.97	$ -	$ 3,021,663.74	0.00%	0.00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00			$ 38,396.20	$ -	$ 153,584.81	0.00%	0.00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	8.00			$ 31,338.62	$ -	$ 250,708.95	0.00%	0.00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	17.04			$ 923,559.19	$ -	$ 15,737,448.63	0.00%	0.00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2.16			$ 1,036,355.99	$ -	$ 2,238,528.94	0.00%	0.00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	46.55	46.55		$ 38,464.50	$ 1,790,368.73	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	14.25			$ 29,897.64	$ -	$ 426,049.14	0.00%	0.00%	
12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	14.07			$ 18,044.38	$ -	$ 253,830.30	0.00%	0.00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	2.21			$ 185,164.49	$ -	$ 408,843.19	0.00%	0.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	416.78	205.30		$ 4,352.40	$ 893,547.72	$ 920,460.35	49.26%	49.26%	

ITEM	CPF	714	IED		Pablo de Tarso		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	151.50	151.50		$ 4,435.43	$ 671,967.71	$ -	100.00%	100.00%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	15.30	15.30		$ 29,040.55	$ 444,320.45	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	37.88	37.88		$ 28,054.90	$ 1,062,719.64	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	156.26	156.26		$ 34,307.63	$ 5,360,909.58	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4.00	4.00		$ 6,973.21	$ 27,892.86	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	8.00	8.00		$ 8,364.64	$ 66,917.15	$ -	100.00%	100.00%	
2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	24.21			$ 62,164.32	$ -	$ 1,504,811.81	0.00%	0.00%	
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	21.65			$ 633,678.64	$ -	$ 13,722,209.28	0.00%	0.00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	1,160.00	28.00		$ 6,772.33	$ 189,625.36	$ 7,666,282.54	2.41%	2.41%	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	3,465.36	1062.50		$ 24,136.40	$ 25,644,926.70	$ 57,996,384.29	30.66%	30.66%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	170.00	28.00		$ 9,730.63	$ 272,457.56	$ 1,381,749.06	16.47%	16.47%	
4.1.2	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=200 MM (INCLUYE RELLENO)	M	13.50			$ 177,125.27	$ -	$ 2,391,191.15	0.00%	0.00%	
4.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	7.50			$ 148,465.05	$ -	$ 1,113,487.88	0.00%	0.00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	8.00			$ 85,501.22	$ -	$ 684,009.79	0.00%	0.00%	
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	5.00			$ 42,689.68	$ -	$ 213,448.39	0.00%	0.00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	3.00			$ 47,726.41	$ -	$ 143,179.23	0.00%	0.00%	
4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	UN	1.00			$ 20,568.77	$ -	$ 20,568.77	0.00%	0.00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.80	6.80	6.80	$ 13,991.96	$ 95,145.34	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	5.00	5.00	5.00	$ 5,234.93	$ 26,174.66	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00			$ 188,899.52	$ -	$ 755,598.07	0.00%	0.00%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE :	UN	4.00	4.00	4.00	$ 185,401.53	$ 741,606.11	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	108.54	108.54		$ 22,625.78	$ 2,455,802.60	$ (113.13)	100.00%	100.00%	
13.1.4	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL 6 MM UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN ÁREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA HASTA 60 CM)	M	37.88	37.88		$ 84,841.00	$ 3,213,777.02	$ 0.00	100.00%	100.00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	17.70	17.70		$ 111,316.98	$ 1,970,310.59	$ 0.00	100.00%	100.00%	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PREPINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	156.26	59.66	32.86	$ 247,166.77	$ 14,745,969.47	$ 23,876,309.94	38.18%	38.18%	
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	35.00			$ 202,701.31	$ -	$ 7,094,545.92	0.00%	0.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	59.66	59.66	33.16	$ 4,352.40	$ 259,664.18	$ 0.00	100.00%	100.00%	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	1,038.08	1038.08		$ 3,520.76	$ 3,654,827.22	$ 14.08	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	836	IED		Jairo Anibal Niño		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	3.80	3.80		$ 29,040.55	$ 110,354.10	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	207.43	207.43		$ 30,426.62	$ 6,311,394.62	$ 12.17	100.00%	100.00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6.84	6.84		$ 20,817.86	$ 142,394.19	$ (0.00)	100.00%	100.00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	168.45	168.45		$ 10,621.20	$ 1,789,140.33	$ 32.29	100.00%	100.00%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	168.45	110.50		$ 28,815.57	$ 3,184,120.09	$ 1,669,949.67	65.60%	65.60%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	168.45	168.45		$ 11,807.73	$ 1,989,011.51	$ 35.90	100.00%	100.00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	20.00	20.00		$ 19,332.69	$ 386,653.82	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	25.17	20.20		$ 30,969.00	$ 625,573.80	$ 154,021.22	80.24%	80.24%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.04			$ 27,437.53	$ -	$ 83,341.50	0.00%	0.00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	40.00	40.00		$ 25,467.57	$ 1,018,702.66	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12.25	12.25		$ 8,364.64	$ 102,466.88	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	31.00	31.00		$ 13,694.66	$ 424,534.44	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	121.96	50.80		$ 20,392.00	$ 1,035,913.52	$ 1,451,094.61	41.65%	41.65%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	20.40			$ 85,501.22	$ -	$ 1,744,224.97	0.00%	0.00%	
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	8.00	8.00		$ 19,766.59	$ 158,132.74	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	4.25	4.25		$ 13,991.96	$ 59,465.84	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	13.00	13.00		$ 59,307.81	$ 771,001.55	$ -	100.00%	100.00%	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	5.00	5.00		$ 64,414.18	$ 322,070.90	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00			$ 118,468.31	$ -	$ 592,341.55	0.00%	0.00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	207.43	207.43		$ 39,814.42	$ 8,258,704.31	$ 15.93	100.00%	100.00%	
7.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	207.43	207.43		$ 241,797.92	$ 50,156,141.88	$ 96.72	100.00%	100.00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLÁSTICO)	M	118.39	60.28		$ 76,716.07	$ 4,624,444.82	$ 4,457,970.94	50.92%	50.92%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES.	M2	53.42	25.60		$ 67,713.97	$ 1,733,477.62	$ 1,883,694.29	47.92%	47.92%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	191.29	180.60		$ 108,436.36	$ 19,583,607.19	$ 1,159,347.38	94.41%	94.41%	
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	9.02	4.80		$ 660,241.67	$ 3,169,160.02	$ 2,784,899.37	53.23%	53.23%	

9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	3.04			$ 448,682.89	$ -	$ 1,362,874.28	0.00%	0.00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	8.17			$ 1,181,573.48	$ -	$ 9,655,818.49	0.00%	0.00%	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	6.00	6.00		$ 815,394.69	$ 4,892,368.12	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	10.00			$ 1,037,439.40	$ -	$ 10,374,394.03	0.00%	0.00%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	5.00			$ 575,810.47	$ -	$ 2,879,052.34	0.00%	0.00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00			$ 721,070.81	$ -	$ 2,163,212.44	0.00%	0.00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	16.00			$ 377,707.97	$ -	$ 6,043,327.49	0.00%	0.00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	10.00			$ 38,396.20	$ -	$ 383,962.03	0.00%	0.00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	7.00			$ 31,338.62	$ -	$ 219,370.33	0.00%	0.00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	15.64	3.66		$ 923,559.19	$ 3,380,226.64	$ 11,067,933.36	23.40%	23.40%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2.70			$ 1,036,355.99	$ -	$ 2,798,161.17	0.00%	0.00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	191.29	180.50		$ 38,464.50	$ 6,942,842.68	$ 415,089.68	94.36%	94.36%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	21.19			$ 11,692.56	$ -	$ 247,718.47	0.00%	0.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	72.64			$ 29,897.64	$ -	$ 2,171,863.23	0.00%	0.00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	10.22			$ 185,164.49	$ -	$ 1,893,121.73	0.00%	0.00%	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM), INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	23.00			$ 320,035.32	$ -	$ 7,360,812.36	0.00%	0.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	60.77	25.60		$ 4,352.40	$ 111,421.44	$ 153,077.54	42.13%	42.13%	

ITEM	CPF	712	TEO	Luis Lopez de Mesa	SEMANA					

Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	7.80	7.80		$ 29,040.55	$ 226,516.31	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	764.30	701.99		$ 30,062.36	$ 21,103,506.08	$ 1,873,096.77	91.85%	91.85%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10.98			$ 20,817.86	$ -	$ 228,580.15	0.00%	0.00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56.41	56.41		$ 10,621.20	$ 599,105.51	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	23.18	23.18		$ 28,815.57	$ 667,944.83	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56.41	56.41		$ 11,807.73	$ 666,033.70	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	6.00	6.00		$ 19,332.69	$ 115,996.15	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1.60			$ 27,437.53	$ -	$ 43,916.51	0.00%	0.00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	12.00	12.00		$ 25,467.57	$ 305,610.80	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	764.30	140.40		$ 16,844.46	$ 2,364,931.39	$ 10,509,253.86	18.37%	18.37%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERIAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	14.80	14.80		$ 8,364.64	$ 123,796.72	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	8.00	8.00		$ 13,694.66	$ 109,557.27	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	74.56	14.91		$ 20,392.00	$ 304,085.48	$ 1,216,341.92	20.00%	20.00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	3.00	1.50		$ 47,726.41	$ 71,589.61	$ 71,589.61	50.00%	50.00%	
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	1.60	1.60		$ 21,103.11	$ 33,764.98	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	18.66	18.66		$ 13,991.96	$ 261,090.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	10.00	8.00		$ 59,307.81	$ 474,462.49	$ 118,615.62	80.00%	80.00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	6.00	5.00		$ 59,307.81	$ 296,539.06	$ 59,307.81	83.33%	83.33%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO	UN	2.00	2.00		$ 90,824.54	$ 181,649.09	$ -	100.00%	100.00%	
4.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN	1.00	1.00		$ 121,077.07	$ 121,077.07	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	56.00			$ 5,829.54	$ -	$ 326,454.11	0.00%	0.00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00			$ 118,468.31	$ -	$ 118,468.31	0.00%	0.00%	
5.1.45	REINSTALACION DE LÁMPARAS EXISTENTES	UN	4.00			$ 31,405.58	$ -	$ 125,622.32	0.00%	0.00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	1.35			$ 42,278.54	$ -	$ 57,076.03	0.00%	0.00%	
7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	745.62	91.26		$ 65,046.28	$ 5,936,047.36	$ 42,563,762.32	12.24%	12.24%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	291.42	34.13		$ 26,316.62	$ 898,125.69	$ 6,771,063.48	11.71%	11.71%	
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	0.95			$ 70,333.44	$ -	$ 66,816.77	0.00%	0.00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	64.95	50.09		$ 14,350.87	$ 718,834.94	$ 213,253.89	77.12%	77.12%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	46.90	21.30	21.30	$ 76,716.07	$ 1,634,052.33	$ 1,963,931.44	45.42%	45.42%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES.	M2	23.66			$ 67,713.97	$ -	$ 1,602,112.52	0.00%	0.00%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	25.28	47.61		$ 108,436.36	$ 5,162,449.22	$ (2,421,177.96)	188.32%	188.32%	
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELICULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	2.32			$ 489,874.00	$ -	$ 1,136,752.62	0.00%	0.00%	
9.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	1.60			$ 698,853.48	$ -	$ 1,118,584.89	0.00%	0.00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	4.79			$ 1,181,573.48	$ -	$ 5,663,754.33	0.00%	0.00%	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	6.00			$ 815,394.69	$ -	$ 4,892,368.12	0.00%	0.00%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			$ 575,810.47	$ -	$ 1,151,620.93	0.00%	0.00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			$ 377,707.97	$ -	$ 1,888,539.84	0.00%	0.00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	1.00			$ 38,396.20	$ -	$ 38,396.20	0.00%	0.00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2.00			$ 31,338.62	$ -	$ 62,677.24	0.00%	0.00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	8.51			$ 923,559.19	$ -	$ 7,861,335.84	0.00%	0.00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.44			$ 1,036,355.99	$ -	$ 1,492,352.63	0.00%	0.00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	58.14	58.14		$ 38,464.50	$ 2,236,172.31	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	25.11			$ 29,897.64	$ -	$ 750,819.43	0.00%	0.00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	0.55			$ 185,164.49	$ -	$ 101,840.47	0.00%	0.00%	
16.1.4	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	764.30	91.26		$ 86,678.38	$ 7,910,167.17	$ 58,337,945.92	11.94%	11.94%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	25.11	25.11		$ 4,352.40	$ 109,301.82	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR DE PASAJEROS MEDIA CABINA USO PARA PERSONAS CON DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD Y PASAJEROS, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 500 KG CARGA VIVA Y TOTAL CON CABINA 890 KG APROX, 2 PARADAS, FOSO CON MEDIDAS 1.60M DE ANCHO X 1.60M DE FONDO APROX., POSO CON MEDIDAS 1.60M DE ANCHO X 1.60M DE FONDO X 1.00M DE ALTURA APROX., MEDIDAS DE CABINA: 1.50 M DE ANCHO X 1.20M DE FONDO X 1.60M DE ALTURA, PARA EL COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA	UN	1.27			$ 76,917,022.98	$ -	$ 97,684,619.18	0.00%	0.00%	

ITEM	CPF	814	IED	Eduardo Umaña Luna			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	21.76	21.76		$ 4,435.43	$ 96,514.97	$ (0.00)	100.00%	100.00%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	6.40	6.40		$ 29,040.55	$ 185,859.53	$ (0.00)	100.00%	100.00%	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.21	3.21		$ 30,062.36	$ 96,500.18	$ 144.30	99.85%	99.85%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1.89	1.89		$ 20,817.86	$ 39,345.76	$ 0.00	100.00%	100.00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	66.41	66.41		$ 10,621.20	$ 705,353.57	$ (53.11)	100.01%	100.01%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20.97	20.97		$ 28,815.57	$ 604,262.43	$ 0.00	100.00%	100.00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	69.88	69.88		$ 11,807.73	$ 825,123.92	$ 23.62	100.00%	100.00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5.00	5.00		$ 19,332.69	$ 96,663.46	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6.80	6.80		$ 30,969.00	$ 210,589.20	$ 0.00	100.00%	100.00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11.00	11.00		$ 25,467.57	$ 280,143.23	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.21	3.21		$ 21,107.13	$ 67,753.89	$ 101.31	99.85%	99.85%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	10.50	10.50		$ 8,364.64	$ 87,828.75	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	5.00	5.00		$ 13,694.66	$ 68,473.30	$ -	100.00%	100.00%	
1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2	549.44	549.44		$ 50,276.25	$ 27,623,780.82	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	46.09	46.09		$ 20,392.00	$ 939,867.21	$ (0.00)	100.00%	100.00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	7.00	7.00		$ 36,375.35	$ 254,627.45	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	0.95	0.95		$ 101,698.85	$ 96,613.91	$ -	100.00%	100.00%	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	3.74	3.74		$ 68,498.74	$ 256,185.29	$ 205.50	99.92%	99.92%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	1.00	1.00	1.00	$ 85,501.22	$ 85,501.22	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	2.00	2.00		$ 47,726.41	$ 95,452.82	$ -	100.00%	100.00%	
7 4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	48.00	48.00		$ 13,991.96	$ 671,614.16	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7.00	7.00		$ 59,307.81	$ 415,154.68	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	5.00	5.00		$ 59,307.81	$ 296,539.06	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	1.00	1.00	1.00	$ 169,748.96	$ 169,748.96	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	2.00	2.00		$ 90,824.54	$ 181,649.09	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	3.00	3.00		$ 170,346.24	$ 511,038.72	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	44.00			$ 5,829.54	$ -	$ 256,499.65	0.00%	0.00%	
4.9.13	SUSPENSION DE SALIDA SANITARIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1.00			$ 30,698.48	$ -	$ 30,698.48	0.00%	0.00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00			$ 118,468.31	$ -	$ 118,468.31	0.00%	0.00%	
5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00			$ 211,513.25	$ -	$ 211,513.25	0.00%	0.00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	3.21	3.21		$ 42,278.54	$ 135,714.13	$ 202.94	99.85%	99.85%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	3.21			$ 196,536.97	$ -	$ 631,827.07	0.00%	0.00%	
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	1.80	0.90	0.90	$ 70,333.44	$ 63,300.10	$ 63,300.10	50.00%	50.00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	24.70	24.70		$ 14,350.87	$ 354,466.42	$ (0.00)	100.00%	100.00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	37.48	18.74	18.74	$ 76,716.07	$ 1,437,659.19	$ 1,437,659.19	50.00%	50.00%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	24.15	12.08	12.08	$ 67,713.97	$ 817,984.75	$ 817,402.41	50.02%	50.02%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	72.77	72.77		$ 108,436.36	$ 7,890,914.15	$ 0.00	100.00%	100.00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.73			$ 1,181,573.48	$ -	$ 3,225,695.60	0.00%	0.00%	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	5.00			$ 815,394.69	$ -	$ 4,076,973.43	0.00%	0.00%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			$ 575,810.47	$ -	$ 1,151,620.93	0.00%	0.00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			$ 377,707.97	$ -	$ 1,888,539.84	0.00%	0.00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			$ 38,396.20	$ -	$ 76,792.41	0.00%	0.00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON CODO DE 4" A 3"	UN	2.00	1.00	1.00	$ 31,338.62	$ 31,338.62	$ 31,338.62	50.00%	50.00%	
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	1.00	1.00		$ 948,374.57	$ 948,374.57	$ -	100.00%	100.00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	6.80			$ 923,559.19	$ -	$ 6,280,202.51	0.00%	0.00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	69.35	69.35		$ 38,464.50	$ 2,667,513.24	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	38.54	20.95		$ 29,897.64	$ 626,355.56	$ 525,890.52	54.36%	54.36%	
12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	3.90	3.50		$ 18,044.38	$ 63,155.33	$ 7,217.75	89.74%	89.74%	
12.3.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	12.00	12.00		$ 29,063.32	$ 348,759.82	$ -	100.00%	100.00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	2.82			$ 185,164.49	$ -	$ 521,830.56	0.00%	0.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	368.76	300.54		$ 4,352.40	$ 1,308,070.30	$ 296,920.73	81.50%	81.50%	

ITEM	CPF	833	IED	Dario Echandia			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de pulas)	M2	123.63	123.63		$ 3,404.25	$ 420,873.79	$ -	100.00%	100.00%	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	15.60	15.60		$ 2,407.88	$ 37,562.95	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.80	12.80		$ 20,817.86	$ 266,468.66	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	224.64	224.64		$ 28,054.90	$ 6,302,252.92	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	686.67	686.67		$ 34,307.63	$ 23,557,934.93	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	57.00	57.00		$ 11,171.61	$ 636,781.56	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	57.00	57.00		$ 6,973.21	$ 397,473.22	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	253.30	253.30		$ 4,099.29	$ 1,038,350.46	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	23.00	23.00		$ 8,364.64	$ 192,386.79	$ -	100.00%	100.00%	
1.3.3	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN)	UN	11.00			$ 177,967.63	$ -	$ 1,957,643.90	0.00%	0.00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	26.00	26.00		$ 36,375.35	$ 945,759.11	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.16	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	0.85	0.85		$ 1,307,170.35	$ 1,111,094.80	$ 2,614.34	99.77%	99.77%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	83.52	83.52		$ 6,772.33	$ 565,625.37	$ 24.38	100.00%	100.00%	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE EJAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	16,349.35	16806.93	457.58	$ 24,136.40	$ 405,658,812.14	$ (11,044,250.17)	102.80%	102.80%	
3.1.13	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2	69.18	50.30	2.00	$ 12,825.52	$ 645,123.58	$ 242,181.96	72.71%	72.71%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	108.00	108.00		$ 9,730.63	$ 1,050,907.74	$ -	100.00%	100.00%	
9 4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	23.00	23.00		$ 27,619.66	$ 635,252.20	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4". HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	27.00	27.00		$ 197,624.40	$ 5,335,858.93	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	126.65	126.65		$ 24,422.99	$ 3,093,171.73	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	50.00	50.00		$ 46,585.41	$ 2,329,270.56	$ -	100.00%	100.00%	

5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	62.00	62.00		$ 188,899.52	$ 11,711,770.04	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	49.00	49.00		$ 185,401.53	$ 9,084,674.79	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	1,161.22	525.60	66.64	$ 29,762.38	$ 15,643,107.35	$ 18,917,528.77	45.26%	45.26%	
13.1.4	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL 6 MM UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN ÁREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA HASTA 60 CM)	M	449.28	25.30	25.30	$ 84,841.00	$ 2,146,477.26	$ 35,970,886.50	5.63%	5.63%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	17.00	17.00		$ 111,316.98	$ 1,892,388.70	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	40.00	28.60		$ 24,947.96	$ 713,511.56	$ 284,406.71	71.50%	71.50%	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	716.95	716.95		$ 247,166.77	$ 177,205,350.38	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	6.20	6.20		$ 134,793.16	$ 835,717.58	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	716.95	300.50		$ 4,352.40	$ 1,307,896.20	$ 1,812,541.75	41.91%	41.91%	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	12,474.87	13184.70	709.83	$ 3,520.76	$ 46,420,122.18	$ (2,499,141.97)	105.69%	105.69%	

ITEM	CPF	748	IED			Alfonso Reyes Echandia	SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de canastas asfalticas y vigas de cancha se debe aclicar)	m2	73.41			$ 6,575.47	$ -	$ 482,716.28	0.00%	0.00%	$ 2,230.40
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	m2	73.41			$ 29,040.55	$ -	$ 2,131,914.99	0.00%	0.00%	$ 9,850.56
1.2.16	DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	176.00			$ 113,509.25	$ -	$ 19,977,628.49	0.00%	0.00%	$ 38,502.34
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	2.00			$ 22,734.26	$ -	$ 45,468.52	0.00%	0.00%	$ 7,711.46
2.2.11	MUROS DE CONTENCIÓN 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	6.00			$ 1,429,703.14	$ -	$ 8,578,218.82	0.00%	0.00%	$ 484,955.30
2.3.3	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	64.00			$ 172,618.86	$ -	$ 11,047,607.19	0.00%	0.00%	$ 88,552.32
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	480.00			$ 6,772.33	$ -	$ 3,250,720.51	0.00%	0.00%	$ 2,297.18
4.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	73.41			$ 93,453.39	$ -	$ 6,860,568.29	0.00%	0.00%	$ 31,699.39
4.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	73.41			$ 12,287.16	$ -	$ 902,020.75	0.00%	0.00%	$ 4,167.80
9.3.4	CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 M	M	73.41			$ 1,122,317.90	$ -	$ 82,391,214.44	0.00%	0.00%	$ 380,690.23
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	73.41			$ 4,352.40	$ -	$ 319,516.89	0.00%	0.00%	$ 1,476.33

ITEM	CPF	747	IED			Orlando Higuita	SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	153.00	153.00		$ 30,062.36	$ 4,599,541.32	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	144.84	144.84		$ 10,621.20	$ 1,538,352.21	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	144.84	144.84		$ 11,807.73	$ 1,710,206.97	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4.00	4.00		$ 6,973.21	$ 27,892.86	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	152.28	152.28		$ 16,844.46	$ 2,565,038.63	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.2	AJUSTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	153.00	153.00		$ 42,278.54	$ 6,468,617.23	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	150.00	150.00		$ 26,316.62	$ 3,947,492.88	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	144.84	144.84		$ 22,625.78	$ 3,277,072.33	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	144.84	144.84		$ 29,897.64	$ 4,330,313.10	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.4	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	152.28	152.28		$ 86,678.38	$ 13,199,201.80	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	152.52	152.52		$ 4,352.40	$ 663,819.16	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	839	IED			Isabel II	SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	39.52	39.52		$ 4,352.40	$ 172,006.85	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1.00	1.00		$ 1,954,513.13	$ 1,954,513.13	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	850	IED			Jhon F Kennedy	SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	97.20	97.20		$ 4,352.40	$ 423,053.28	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1.00	1.00		$ 1,954,514.13	$ 1,954,514.13	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	817	IED			Marsella	SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	198.90	198.90		$ 4,352.40	$ 865,892.36	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1.00	1.00		$ 1,954,513.90	$ 1,954,513.90	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.6	PODA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	4.00	4.00		$ 976,870.07	$ 3,907,480.26	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	890	IED			Nelson Mandela	SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2.00	2.00		$ 122,747.05	$ 245,494.11	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.60	7.60		$ 20,817.86	$ 158,111.68	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	2.40	2.40		$ 16,375.74	$ 39,301.77	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	0.18	0.18		$ 633,678.64	$ 114,062.15	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.17	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2	1.20	1.20		$ 128,771.23	$ 154,525.48	$ -	100.00%	100.00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	13.32	13.32		$ 6,772.33	$ 90,174.99	$ -	100.00%	100.00%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	7.60	7.60		$ 136,417.61	$ 1,036,091.73	$ -	100.00%	100.00%	
3.1.11	RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	M2	15.19	15.19		$ 137,324.25	$ 2,085,955.30	$ -	100.00%	100.00%	

ITEM	CPF	763	IED			Bicentenario	SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	15.00			$ 6,772.33	$ -	$ 101,585.02	0.00%	0.00%	
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2	25.20			$ 195,409.37	$ -	$ 4,924,316.07	0.00%	0.00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	50.40			$ 22,625.78	$ -	$ 1,140,339.51	0.00%	0.00%	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	36.60			$ 18,025.63	$ -	$ 659,738.13	0.00%	0.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	36.60			$ 4,352.40	$ -	$ 159,297.84	0.00%	0.00%	

FECHA:	7/03/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**67**	
CORTE DEL INFORME:	***7/03/2026***	

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA Nº	17	**DEL**	1-mar-26	**AL**	7-mar-26

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.8169111	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.8154784
Fecha de Iniciación	14/10/2025	**Fecha de Iniciación**	14/10/2025
Fecha de Terminación	13/05/2026	**Fecha de Terminación**	13/05/2026
Plazo Inicial	7 MESES	**Plazo Inicial**	7 MESES
Valor inicial	$ 880.146.577,00	**Valor inicial**	$ 2.975.834.553,00
Adiciones	$ 83.867.649,00	**Adiciones**	$ 523.987.595,00
Prorroga	N.A.	**Prorroga**	N.A.
Suspensión	N.A.	**Suspensión**	N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES
No.	**FRENTE**	PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	PROGRAMADO ACUM	EJECUTADO ACUM	DESVIACIÓN	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**
1	PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	60,00%	72,83%	62,00%	72,83%	10,83%	BAÑO: Instalacion de enchape, media cañas y instalación de tubería e instalación de piso en vinisol y pintura
2	PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	21,00%	20,64%	23,00%	20,64%	-2,36%	Cocina: Instalacion de piso, cambio de tuberias
3	EL PORVENIR	45,00%	51,88%	47,00%	60,80%	13,80%	BAÑO: instalacion de enchape, media cañas y instalación manto en cubierta
4	VILLAS DEL PROGRESO	58,00%	63,39%	59,00%	70,34%	11,34%	BAÑO Y CANCHA: Instalación de enchape, Fundicion de placa
5	PABLO DE TARSO	30,10%	33,94%	37,00%	33,94%	-3,06%	Desmonte e instalación de cubierta
6	JAIRO ANIBAL NIÑO	47,15%	58,37%	48,00%	59,07%	11,07%	BAÑO Y SALONS DE PREESCOLAR: Instalación de enchape, media caña y piso
7	LUIS LOPEZ DE MESA	15,62%	17,37%	16,00%	17,94%	1,94%	BAÑO: Instalacion de manto de aluminio sobre cubierta y enchape
8	EDUARDO UMAÑA LUNA	43,57%	68,27%	60,00%	69,11%	9,11%	BAÑO: Instalacion de enchape
9	DARIO ECHANDIA	65,14%	90,24%	70,00%	91,07%	21,07%	CUBIERTA: Instalación de cubierta
10	LLANO ORIENTAL - ALFONSO REYES ECHANDIA						0
	TOTALES	**42,84%**	**52,99%**	**46,89%**	**55,08%**	**8,19%**	

3. RESUMEN FINANCIERO

PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 259.947.350	$ 189.321.651	**$ 70.625.699**		0,00%	72,83%

PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 85.000.000	$ 17.546.978	**$ 67.453.022**		0,00%	20,64%

EL PORVENIR

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 99.553.816	$ 60.528.210	**$ 39.025.606**		8,90%	60,80%

VILLAS DEL PROGRESO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 171.376.301	$ 120.548.627	**$ 50.827.674**		7,00%	70,34%

PABLO DE TARSO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 179.468.691	$ 60.905.014	**$ 118.563.677**		0,00%	33,94%

JAIRO ANIBAL NIÑO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 207.779.941	$ 122.734.420	**$ 85.045.521**		0,70%	59,07%

LUIS LOPEZ DE MESA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 302.922.429	$ 54.343.986	**$ 248.578.443**		0,60%	17,94%

EDUARDO UMAÑA LUNA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 75.659.453	$ 52.287.619	**$ 23.371.834**		0,80%	69,11%

DARIO ECHANDIA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 799.164.222	$ 727.812.650	**$ 71.351.571**		0,80%	91,07%

FECHA:	7/03/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**67**	
CORTE DEL INFORME:	***7/03/2026***	

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	17	**DEL**	1-mar-26	**AL**	7-mar-26

EMERGENCIAS

BALANCE EMERGENCIAS	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 68.564.814	$ 57.655.046	**$ 10.909.768**		0,00%	84,09%

4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

OBSERVACIONES: N/A

RECOMENDACIONES:
- Mantener orden y aseo en la obras, así como la señalización
- Continuar con el uso correcto de EPP
- Apertura de más frentes de obra

CONCLUSIONES:
- Se avanzó en tres frentes de trabajo con actividades de cerramiento, demoliciones, desmontes, pañete, e Instalación de pisos, cubiertas, enchape.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

1. Se continua con avances en los frentes de obra en los siguientes colegios: Alfonso Lopez Michelsen, El Porvenir, Villas del progreso, Jairo Anibal Niño, Eduardo Umaña Luna , Luis Lopez de Mesa y Dario Echandia.

2. Se continua con avance en los frentes de obra en las emergencias en los siguientes colegios: Orlando Higuita.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente semana no se remitió documentación correspondiente al ingreso de nuevos trabajadores a los frentes de obra; en consecuencia, no se registraron solicitudes de aprobación de personal por parte del contratista durante el periodo evaluado. Se evidenció la ejecución de actividades en los colegios, Luis López de Mesa, Alfonso López Michelsen, Villas del Progreso, El Porvenir, Jairo Aníbal Niño, Darío Echandía, Orlando Higuita, Dario Echandia Sede B, Colegio Eduardo Uñama Luna, Colegio Pablo de Tarso.
Con respecto a las actividades ejecutadas durante el periodo, se recomienda al contratista implementar jornadas de orden y aseo en los colegios Darío Echandía Sede B, Villas del Progreso Sede B y Orlando Higuita, con el fin de establecer un único punto de acopio temporal de residuos, permitiendo mantener las áreas de trabajo organizadas y reducir riesgos asociados a la presencia de materiales dispersos en los frentes de obra.

Así mismo, se realizó la verificación del personal presente en obra, constatando que el mismo se encuentra debidamente autorizado para el desarrollo de las actividades. Durante los recorridos de supervisión también se evidenció el uso adecuado y permanente de los EPP por parte de los trabajadores. De igual manera, se validó que el cerramiento de los diferentes frentes de obra cumple con las condiciones técnicas recomendadas y cuenta con señalización preventiva adecuada, garantizando la delimitación de las áreas intervenidas y la prevención de riesgos para trabajadores y terceros.

En relación con el cerramiento perimetral del colegio Villas del Progreso Sede B, específicamente en el área de la cancha, se evidenció que este fue ajustado por el contratista, cumpliendo actualmente con las condiciones de seguridad requeridas para el control de acceso, delimitación del frente de obra y prevención de riesgos a terceros.

Por otra parte, se aprueba el Informe Mensual SST No. 4 mediante el oficio UNIOBRAS-LOTE 3-309, dado que el documento incorpora la información solicitada por esta interventoría.

Total, de horas hombres trabajadas: 42
Total, de horas capacitación: 20 minutos
Número de accidentes de trabajo: 0
Número de días de incapacidad por AT:0
Número de días de incapacidad por enfermedad común: 0
REPORTE PERSONAL
DIRECTOR OBRA: 1 INSPECTORES SST: 1
RESIDENTE OBRA: 1 PERSONAL OPERATIVO: 49

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

IED Cultura Alfonso López Michelsen: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia residuos en el frente, por lo que se recomienda disponerlo adecuadamente, realizar jornadas de aseo periódicamente y implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).
IED Villas del progreso: Se realizo recorrido en el frente, se hace entrega parcial de la cancha, no se evidencia el cerramiento, no se evidencian residuos en el frente y se recomienda realizar jornadas de aseo periódicamente.
IED El Porvenir: Se realizo recorrido en el frente, presenta señalización en el frente de obra. Se evidencia pocos residuos, en los baños se recomienda garantizar una jornada de aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Jairo Aníbal Niño: Se realizo recorrido en el frente, se reporta un volumen medio respecto a los RCD en la parte del parqueadero de bicicletas, al igual se recomendó disponerlo adecuadamente, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Darío Echandía: Se realizo recorrido en el frente, se presenta el cerramiento adecuado, se evidencia materiales debidamente acopiados al igual que se presenta residuos en el frente, por lo que se recomienda realizar la disposición total de los residuos, mantener orden en el frente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Orlando Higuita: Se realizo recorrido en el frente, anteriormente se dispuso anteriormente los residuos y esta en espera del acta de entrega en esta institución
IED Eduardo Umaña Luna: Se realizo recorrido en el frente, se encuentra el cerramiento adecuado, se evidencia material de obra y residuos de construcción y demolición debidamente acopiados (Volumen medio), al igual se recomendó realizar la disposición adecuada, jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Pablo de torso: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia acopio de materiales de RCD adecuado por lo que se recomienda hacer la disposición adecuada de todos los residuos ante los gestores autorizados, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Luis López de mesa: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción acopiado, se evidencia residuos acopiados adecuadamente (volumen medio- alto) en el bicicletero y los baños por lo que se recomienda al contratista organizar un punto de acopio, posteriormente realizar la debida disposición adecuadamente y garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente.

OTROS

ING JHONER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING HARRY ARANGO
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA:	7/03/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**67**	
CORTE DEL INFORME:	***7/03/2026***	

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA

Alfonso Lopez Michelsen



Pintura



Pintura



Caja de inspeccion



Caja de inspeccion

Alfonso Lopez Michelsen Cocina



Caja de inspeccion



Caja de inspeccion



Caja de inspeccion



Caja de inspeccion

El Porvenir



Pintura



Pintura

	
Pintura	Pintura

Villas del Progreso

	
Pintura	Pintura
	
Pintura	Pintura

Jairo Anibal Niño


0	0,00
Instalacion de sanitarios	Instalacion de sanitarios

0	0,00
Instalacion de sanitarios	Instalacion de sanitarios

Eduardo Umaña Luna

	
Pintura	Pintura
	
Instalacion de piso	Instalacion de piso

Orlando Higuita

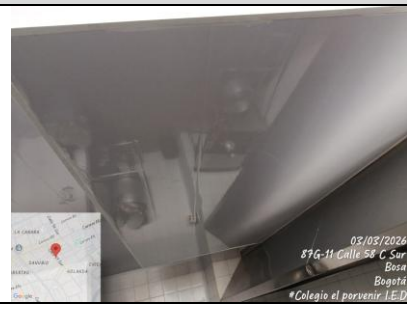	
Sellado de espacios	Sellado de espacios



Sellado de espacios



Sellado de espacios

Dario Echandia



Cierre con superboard



Cierre con superboard



Cierre con superboard



Cierre con superboard

Luis Lopez De Mesa


0	0,00
Manto para cubierta	Instalacion de enchape
0	0,00
Instalacion de enchape	Manto para cubierta

Pablo de Tarso

0	0,00
Instalacion de estructura	Pintura de fachada
0	0,00
Instalacion de estructura	Pintura de fachada

FECHA:	6/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME	
DIAS RESTANTES	67 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				APOYO A LA SUPERVISION	
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARÍA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO	7
CORTE DEL INFORME		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS					
7/3/26	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154784	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDU 2025			
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169111	INTERVENTOR:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S			

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE		ESTADO ACTUAL O FINAL
17 ###						
Alfonso Lopez Michelsen	Mejoramiento de baterias sanitarias y salones de preescolar	BAÑO: Instalacion de enchape, media cañas y instalación de tuberia e instalación de piso en vinisol y pintura				
Alfonso Lopez Michelsen Cocina	Mejoramiento de cocina	Cocina: Instalacion de piso, cambio de tuberias				
El Porvenir	Mejoramiento de cubierta y baterias sanitarias	BAÑO: Instalacion de enchape, media cañas y instalación manto en cubierta				
Villas del Progreso	Mejoramiento de baterias y canchas sanitarias	BAÑO Y CANCHA: Instalación de enchape, Fundicion de placa				
Pablo de Tarso	Desmonte e instalación de cubierta	Desmonte e instalación de cubierta				
Jairo Anibal Niño	Mejoramiento de baterias sanitarias y pisos preescolar	BAÑO Y SALONS DE PREESCOLAR: Instalación de enchape, media caña y piso				
Luis Lopez de Mesa	Mejoramiento de baterias sanitarias	BAÑO: Instalacion de manto de aluminio sobre cubierta y enchape				
Eduardo Umaña	Mejoramiento de baterias sanitarias y cerramiento	BAÑO: Instalacion de enchape				
Dario Echandia	Desmonte e instalación de cubierta	CUBIERTA: Instalación de cubierta				

EMERGENCIA No. 1 Colegio Orlando Higuita	**Mejoramiento Cocina**	**COCINAS: Instalacion de media cañas**				
EMERGENCIA No. 2 San Bernardino						
EMERGENCIA No. 3 Isabel II						
EMERGENCIA No. 4 Jhon F Kennedy						

EMERGENCIA No. 5 Marsella						
EMERGENCIA No. 6 Nelson Mandela						
EMERGENCIA No. 7 Bicentenario						
EMERGENCIA No. 8 San Jose						
EMERGENCIA No. 9 Nicolas Esguerra						

FECHA: 6/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 67 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA		GRUPO 7
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDU 2025	
7 de marzo de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169111	CO1.PCCNTR.8154764	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.276.928	$ 2.451.846.958
INICIO	14 de octubre de 2025	14 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES	$ 83.867.649,00	$ 523.987.595,00
TERMINACION INICIAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	PRORROGAS					
TERMINACION FINAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	TOTAL	211	211	TOTAL	$ 880.146.577,00	$ 2.975.834.553,00

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	5/12/2025	$ 83.867.649,00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	5/12/2025	$ 523.987.595,00		
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — **GARANTE:** — **SEGUROS DEL ESTADO**

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400-47	5 9 2025	5 10 2026	5 4 2026	5 4 2031	5 9 2025	5 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — **SEGUROS DEL ESTADO**

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
895-47	14 10 2025	15 1 2027	14 10 2025	15 5 2027	14 10 2025	15 1 2027	895-74	5 4 2026	15 5 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (31082024)	PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA
751	PORTAL DEL SOL -	Bosa	A	Portal del Sol Alfonso Lopez	72,83%	72,83%	62,00%		$ 259.947.350,30	$ 189.321.651	12/11/2025	9/04/2026
751	PORTAL DEL SOL -	Bosa	A	Portal del Sol Alfonso Lopez	20,64%	20,64%	23,00%		$ 85.000.000,00	$ 17.546.978	11/01/2026	13/05/2026
742	EL PORVENIR	Bosa	B	El Recuerdo Santa Fe	51,88%	60,80%	47,00%		$ 99.553.815,81	$ 60.528.210	19/11/2025	30/03/2026
764	VILLAS DEL PROGRESO	Bosa	B	Enrique Ducaal	63,39%	70,34%	59,00%		$ 171.376.300,91	$ 120.540.627	12/11/2025	9/04/2026
714	PABLO DE TARSO	Bosa	A	Pablo de Tarso	33,94%	33,94%	37,00%		$ 179.468.691,28	$ 60.905.014	19/11/2025	19/03/2026
836	JAIRO ANIBAL NIÑO	Kennedy	A	Patio Bonito I	58,37%	59,07%	48,00%		$ 207.779.941,37	$ 122.734.420	20/11/2025	19/03/2026
712	LUIS LOPEZ DE MESA	Bosa	A	Luis Lopez de Mesa	17,37%	17,94%	16,00%		$ 302.922.428,82	$ 54.343.986	11/12/2025	9/04/2026
814	EDUARDO UMAÑA LUNA	Kennedy	A	Dindalito	68,27%	69,11%	60,00%		$ 75.669.452,87	$ 52.287.619	19/11/2025	2/02/2026
833	DARIO ECHANDIA	Kennedy	B	Los Patios	90,24%	91,07%	70,00%		$ 799.164.221,64	$ 727.812.650	12/11/2025	26/03/2026
748	LLANO ORIENTAL -	Bosa	A	San José de Maryland San Pedro -					$ 135.987.595,05	$ -	14/10/2025	13/05/2026
	TOTAL FRENTES DE OBRA				55,08%	46,89%			$ 2.316.859.798	$ 1.406.029.156		
	EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO											
747	LA LIBERTAD -	Bosa	A	Orlando Higuita - Holanda la Libertad	100,00%	100,00%			$ 42.499.555	$ 42.499.555	19/11/2025	15/01/2026
729	SAN BERNARDINO	Bosa	A	San Bernardino	0,00%	0,00%			$ 3.923.717	$ -	24/11/2025	31/12/2025
838	ISABEL II	Kennedy	B	Pio XII	100,00%	100,00%			$ 2.126.520	$ 2.126.520	29/11/2025	19/12/2025
850	JOHN F. KENNEDY	Kennedy	A	John F. kennedy	100,00%	100,00%			$ 2.377.567	$ 2.377.567	29/11/2025	12/12/2025
817	MARSELLA	Kennedy	A	Bas-Mod. Marsella	100,00%	100,00%			$ 6.727.687	$ 6.727.687	29/11/2025	18/12/2025
890	NELSON MANDELA	Kennedy	A	Compartir Tintal	100,00%	100,00%			$ 3.923.717	$ 3.923.717	25/11/2025	10/01/2026
763	BICENTENARIO	Bosa	A	San José de Maryland	0,00%	0,00%			$ 6.986.950	$ -	27/11/2025	16/01/2026
821	SAN JOSE	Kennedy	B	El Descanso								
869	NACIONAL NICOLAS	Kennedy	A	Nicolas Esquerra								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								
	TOTAL FRENTES DE OBRA				71,43%	#¡DIV/0!	#####		$ 68.564.814	$ 57.655.046		

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	9	0	9	$ 1.408.029.156
ACUMULADO EMERGENCIAS				
5	0	2	7	$ 57.655.046
TOTAL				
5	9	2	16	$ 1.463.684.203
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$		11		22		33		$	


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	55,08%	0,00%	68,25%
PROGRAMADO	46,89%		
ATRASO	8,19%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			









OBSERVACIONES:

BALANCE SEMANAL POR CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS

		CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2026
GRUPOS	ITEM	CPF	751	IED		Alfonso Lopez Michelsen		SEMANA			
	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo suede asortar)	M2	30,69	30,69		$ 4.435,43	$ 136.101,63	$ -	100,00%	100,00%	
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	3,79	3,79		$ 29.040,55	$ 110.063,69	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,01	40,01		$ 30.062,36	$ 1.202.753,00	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	455,72	450,72		$ 30.426,62	$ 13.713.897,10	$ 152.133,12	98,90%	98,90%	
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	113,46	113,46		$ 10.621,20	$ 1.205.071,78	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	76,42	76,42		$ 28.815,57	$ 2.202.085,58	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	123,57	123,57		$ 11.807,73	$ 1.459.112,04	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11,00	11,00		$ 19.332,69	$ 212.659,60	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10,80	6,80		$ 30.969,00	$ 210.589,20	$ 123.950,33	62,95%	62,95%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	18,00	18,00		$ 25.467,57	$ 458.416,20	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,01	40,01		$ 21.107,13	$ 844.496,32	$ (29,55)	100,00%	100,00%	
	1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	1,60	1,60		$ 8.364,64	$ 13.383,43	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	18,00	18,00		$ 13.694,66	$ 246.503,87	$ -	100,00%	100,00%	
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	84,44	84,44		$ 20.392,00	$ 1.721.900,34	$ -	100,00%	100,00%	
	4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	27,38	27,38		$ 13.991,96	$ 383.099,91	$ -	100,00%	100,00%	
	4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	13,00	13,00		$ 59.307,81	$ 771.001,55	$ -	100,00%	100,00%	
	4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	11,00	11,00		$ 59.307,81	$ 652.385,92	$ -	100,00%	100,00%	
	4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/2"	UN	2,00	2,00		$ 201.917,88	$ 403.835,76	$ -	100,00%	100,00%	
	4.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN	2,00	2,00		$ 85.229,37	$ 170.458,73	$ -	100,00%	100,00%	
1	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00			$ 118.468,31	$ -	$ 236.936,62	0,00%	0,00%	
	7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	455,72	450,72		$ 39.814,42	$ 17.945.153,58	$ 199.084,02	98,90%	98,90%	
	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	40,01	40,01		$ 42.278,54	$ 1.691.564,55	$ (59,19)	100,00%	100,00%	
	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	40,01	40,01		$ 196.536,97	$ 7.863.444,35	$ (275,15)	100,00%	100,00%	
	7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	12,00	12,00		$ 70.333,44	$ 844.001,34	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	455,72	450,72		$ 241.797,92	$ 108.983.157,06	$ 1.209.062,12	98,90%	98,90%	
	7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	116,40	116,40		$ 14.350,87	$ 1.670.440,94	$ (57,40)	100,00%	100,00%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	63,34	63,34		$ 76.716,07	$ 4.859.196,00	$ (0,00)	100,00%	100,00%	
	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	112,85	112,85		$ 108.436,36	$ 12.237.043,59	$ 59,64	100,00%	100,00%	
	9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	4,59			$ 489.874,00	$ -	$ 2.249.697,37	0,00%	0,00%	
	9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	7,92			$ 1.181.573,48	$ -	$ 9.358.061,97	0,00%	0,00%	
	10.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO FLUXOMETRICA ORIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	9,00			$ 1.037.439,40	$ -	$ 9.336.954,63	0,00%	0,00%	
	10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	4,00			$ 721.070,81	$ -	$ 2.884.283,25	0,00%	0,00%	
	10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	11,00			$ 377.707,97	$ -	$ 4.154.787,65	0,00%	0,00%	
	10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4,00			$ 38.396,20	$ -	$ 153.584,81	0,00%	0,00%	
	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ACABADO SATIN	M2	33,87			$ 923.559,19	$ -	$ 31.283.720,51	0,00%	0,00%	
	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1,80			$ 1.036.355,99	$ -	$ 1.865.440,78	0,00%	0,00%	
	12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	112,53	112,53		$ 38.464,50	$ 4.328.410,46	$ (63,47)	100,00%	100,00%	
	12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	45,20	45,20		$ 29.897,64	$ 1.351.373,33	$ 62,79	100,00%	100,00%	
	12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	48,40	48,20		$ 26.897,83	$ 1.296.475,50	$ 5.379,57	99,59%	99,59%	
	14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	7,92			$ 185.164,49	$ -	$ 1.466.502,74	0,00%	0,00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	30,69	30,69		$ 4.352,40	$ 133.575,16	$ (21,33)	100,02%	100,02%	
GRUPOS	ITEM	CPF	751	IED		Alfonso Lopez Michelsen Cocina		SEMANA				
	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,93	3,93		$ 30.062,36	$ 118.145,08	$ 72,15	99,94%	99,94%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,93	3,93		$ 30.426,62	$ 119.576,63	$ 73,02	99,94%	99,94%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	2,00		$ 25.467,57	$ 50.935,13	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13,09	13,09		$ 21.107,13	$ 276.292,35	$ -	100,00%	100,00%	
	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	7,35	7,35		$ 85.501,22	$ 628.434,00	$ -	100,00%	100,00%	
	4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	2,00		$ 71.024,47	$ 142.048,94	$ -	100,00%	100,00%	
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	4,00	4,00		$ 5.829,54	$ 23.318,15	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	5,00			$ 534.497,49	$ -	$ 2.672.487,43	0,00%	0,00%	
	5.1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	127,73			$ 53.182,31	$ -	$ 6.792.908,92	0,00%	0,00%	
	5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG THHN	M	150,20			$ 83.551,35	$ -	$ 12.549.412,59	0,00%	0,00%	
	5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	30,00			$ 185.401,53	$ -	$ 5.562.045,79	0,00%	0,00%	
1	5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	2,00			$ 819.132,39	$ -	$ 1.638.264,79	0,00%	0,00%	
	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	13,09	13,09		$ 42.278,54	$ 553.426,14	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	12,60	12,60		$ 196.536,97	$ 2.476.365,88	$ (0,00)	100,00%	100,00%	
	7.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	90,50	90,50		$ 19.490,72	$ 1.763.909,87	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	22,42	22,42		$ 76.716,07	$ 1.719.974,33	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	131,64	131,64		$ 67.713,97	$ 8.913.587,98	$ -	100,00%	100,00%	
	10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	6,00	6,00		$ 31.338,62	$ 188.031,72	$ -	100,00%	100,00%	
	11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EYECTORA BARNES IC0027 VOLTAJE 220 TRIFASICA (390 GPM DESCARGA 3" 3HP)	UN	3,00			$ 6.591.038,86	$ -	$ 19.773.116,58	0,00%	0,00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	131,64	131,64		$ 4.352,40	$ 572.932,00	$ -	100,00%	100,00%	
	19.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMATICO CON 2 BOMBAS DE 2HP 110/220 TANQUE HIDRONEUMATICO POR MEMBRANA DE 200LTS, MARCA PEARL, TABLERO DE CONTROL CON NORMA RETIE (INCLUYE 2 BOMBAS ALTA PRESIÓN CAUDAL 2.33LP/S H.MAQ 50MT 1 TANQUE HIDROACUMULADOR MEMBRANA 200LTS VERTICAL CON MANOMETRO ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN ENTRE BOMBAS Y TANQUE EN HIERRO GALVANIZADO (HG), 1 FLAUTA DE DESCARGA EN 3" INCLUYE COPA DE DESCARGA 3 A 2, 2 REGISTROS EN BRONCE TIPO COMPUERTA, 2 VÁLVULAS CHEQUE HIDRONEUMATICO EN BRONCE, 1 TABLERO DE CONTROL EN COFRE METÁLICO CON NORMA RETIE 2- PRESOSTATOS RANGO 40/60, 1 SENSOR DE NIVEL (FLOTADOR), 1 MANOMETRO EN GLICERINA CON CARATULA DE 2" (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	UN	1,00			$ 18.464.640,51	$ -	$ 18.464.640,51	0,00%	0,00%	
	ITEM	CPF	742	IED		El Porvenir		SEMANA				

	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	7,75	7,75		$ 29.040,55	$ 225.064,28	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	58,31	58,31		$ 30.426,62	$ 1.774.298,15	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,97	2,97		$ 20.817,86	$ 61.795,75	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	107,83	106,35		$ 10.621,20	$ 1.129.606,59	$ 15.676,88	98,63%	98,63%	
	1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	63,15	63,15		$ 28.815,57	$ 1.819.703,02	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	116,21	106,35		$ 11.807,73	$ 1.255.798,93	$ 116.381,67	91,52%	91,52%	
	1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	10,00	10,00		$ 19.332,69	$ 193.326,91	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12,75	8,97		$ 30.969,00	$ 277.791,93	$ 117.155,73	70,34%	70,34%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	24,00	24,00		$ 25.467,57	$ 611.221,59	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	24,00	24,00		$ 13.694,66	$ 328.671,82	$ -	100,00%	100,00%	
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	96,03	96,03		$ 20.392,00	$ 1.958.182,43	$ -	100,00%	100,00%	
	2.3.7	PERFORACIÓN NÚCLEO 3" E= 0.10 M	UN	2,00	2,00		$ 162.040,52	$ 324.081,04	$ -	100,00%	100,00%	
	3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	2,44	2,44		$ 68.498,74	$ 167.383,52	$ -	100,00%	100,00%	
	2.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	5,50	5,50		$ 85.501,22	$ 470.256,73	$ -	100,00%	100,00%	
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	100,00	100,00		$ 5.829,54	$ 582.953,76	$ -	100,00%	100,00%	
2	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	2,00	2,00	$ 118.468,31	$ 236.936,62	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	4,00	4,00	$ 211.513,25	$ 846.052,99	$ -	100,00%	100,00%	
	7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	57,35	57,35		$ 65.046,28	$ 3.730.404,34	$ -	100,00%	100,00%	
	7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	30,30	30,30		$ 26.316,62	$ 797.393,56	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	57,40	52,48		$ 14.350,87	$ 753.133,51	$ 70.606,27	91,43%	91,43%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	72,85	72,85		$ 76.716,07	$ 5.588.535,70	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	44,37	44,37		$ 67.713,97	$ 3.004.360,49	$ -	100,00%	100,00%	
	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	106,35	106,35		$ 108.436,36	$ 11.532.640,97	$ (433,75)	100,00%	100,00%	
	9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	5,09			$ 1.181.573,48	$ -	$ 6.011.845,87	0,00%	0,00%	
	10.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	10,00			$ 1.037.439,40	$ -	$ 10.374.394,03	0,00%	0,00%	
	10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH)	UN	4,00			$ 721.070,81	$ -	$ 2.884.283,25	0,00%	0,00%	
	10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	10,00			$ 377.707,97	$ -	$ 3.777.079,68	0,00%	0,00%	
	10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	5,00			$ 38.396,20	$ -	$ 191.981,02	0,00%	0,00%	
	10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	6,00	12,00	6,00	$ 948.374,57	$ 11.380.494,82	$ (5.690.247,41)	200,00%	200,00%	
	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	9,00			$ 923.559,19	$ -	$ 8.312.032,73	0,00%	0,00%	
	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2,70			$ 1.036.355,99	$ -	$ 2.798.161,17	0,00%	0,00%	
	12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	106,35	106,35		$ 38.464,50	$ 4.090.853,69	$ -	100,00%	100,00%	
	12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	68,62	68,62	68,62	$ 29.897,64	$ 2.051.683,69	$ -	100,00%	100,00%	
	14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	4,68			$ 185.164,49	$ -	$ 866.569,80	0,00%	0,00%	
	16.1.4	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	58,00	58,00		$ 86.678,38	$ 5.027.346,09	$ -	100,00%	100,00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	100,64	70,82	12,71	$ 4.352,40	$ 308.236,97	$ 129.788,57	70,37%	70,37%	

ITEM	CPF	764	IED	Villas del Progreso			SEMANA			

	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	43,80	43,80		$ 29.040,55	$ 1.271.976,18	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	15,11	13,80		$ 30.426,62	$ 419.887,41	$ 39.816,28	91,34%	91,34%	
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	53,05	63,53		$ 10.621,20	$ 674.764,53	$ (111.352,61)	119,76%	119,76%	
	1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	35,20	27,20		$ 28.815,57	$ 783.783,41	$ 230.524,53	77,27%	77,27%	
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	53,05	63,53		$ 11.807,73	$ 750.144,86	$ (123.792,20)	119,76%	119,76%	
	1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8,00	8,00		$ 19.332,69	$ 154.661,53	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,86	7,68		$ 30.969,00	$ 237.841,92	$ (25.354,32)	111,93%	111,93%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5,00	5,00		$ 25.467,57	$ 127.337,83	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	20,00	20,00		$ 19.332,69	$ 386.653,82	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	8,00	8,00		$ 13.694,66	$ 109.557,27	$ -	100,00%	100,00%	
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	29,10	29,10		$ 20.392,00	$ 593.407,15	$ -	100,00%	100,00%	
	1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	60,00	60,00		$ 17.444,42	$ 1.046.665,15	$ -	100,00%	100,00%	
	1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	21,00	21,00		$ 36.375,35	$ 763.882,36	$ -	100,00%	100,00%	
	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	14,40	44,69		$ 96.359,46	$ 4.306.304,16	$ (2.918.727,97)	310,35%	310,35%	
	2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	834,68	834,68		$ 7.440,60	$ 6.210.517,75	$ -	100,00%	100,00%	
	4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	60,00			$ 134.053,92	$ -	$ 8.043.235,20	0,00%	0,00%	
	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	30,00	30,00		$ 85.501,22	$ 2.565.036,72	$ -	100,00%	100,00%	
	4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	22,00			$ 73.492,62	$ -	$ 1.616.837,59	0,00%	0,00%	
	4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	10,00	10,00		$ 47.726,41	$ 477.264,10	$ -	100,00%	100,00%	
	4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3", INCLUYE ACCESORIOS	UN	11,00	11,00		$ 121.102,52	$ 1.332.127,68	$ -	100,00%	100,00%	
	4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	18,60	18,60		$ 13.991,96	$ 260.250,49	$ -	100,00%	100,00%	
	4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7,00	7,00		$ 59.307,81	$ 415.154,68	$ -	100,00%	100,00%	
	4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	8,00	8,00		$ 59.307,81	$ 474.462,49	$ -	100,00%	100,00%	
	4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	2,00	6,00		$ 169.746,96	$ 1.018.493,74	$ (678.995,83)	300,00%	300,00%	
	4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	2,00	2,00		$ 90.824,54	$ 181.649,09	$ -	100,00%	100,00%	
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	60,00	60,00		$ 5.829,54	$ 349.772,26	$ -	100,00%	100,00%	
	4.9.13	SUSPENSION DE SALIDA SANITARIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	UN	8,00	8,00		$ 30.698,48	$ 245.587,85	$ -	100,00%	100,00%	
3	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00			$ 118.468,31	$ -	$ 236.936,62	0,00%	0,00%	
	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	15,11	13,80		$ 42.278,54	$ 583.443,91	$ 55.325,70	91,34%	91,34%	
	7.1.8	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALLANADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) E= 10 CM	M2	401,67	401,60		$ 143.272,97	$ 57.538.425,88	$ 10.716,82	99,98%	99,98%	
	7.1.9	JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	107,16	365,00	257,84	$ 36.001,71	$ 13.140.625,46	$ (9.282.681,83)	340,61%	340,61%	
	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	14,12	14,12		$ 196.536,97	$ 2.775.102,08	$ 904,07	99,97%	99,97%	
	7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	4,92	4,92		$ 70.333,44	$ 346.040,55	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	30,58	30,20		$ 14.350,87	$ 433.396,19	$ 5.453,33	98,76%	98,76%	
	7.2.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	178,50			$ 72.430,63	$ -	$ 12.928.867,81	0,00%	0,00%	
	7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	303,20	387,00	83,80	$ 19.237,61	$ 7.444.954,30	$ (1.612.111,55)	127,64%	127,64%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	46,15	32,67		$ 76.716,07	$ 2.506.314,07	$ 1.034.132,65	70,79%	70,79%	
	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	73,58	63,76		$ 108.436,36	$ 6.913.902,52	$ 1.065.278,83	86,65%	86,65%	

9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELICULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	4,18			$ 853.515,01	$ -	$ 3.564.278,70	0,00%	0,00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ANGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	1,18			$ 1.181.573,48	$ -	$ 1.391.420,93	0,00%	0,00%	
10.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	5,00			$ 1.037.439,40	$ -	$ 5.187.197,02	0,00%	0,00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2,00			$ 721.070,81	$ -	$ 1.442.141,63	0,00%	0,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	8,00			$ 377.707,97	$ -	$ 3.021.663,74	0,00%	0,00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4,00			$ 38.396,20	$ -	$ 153.584,81	0,00%	0,00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	8,00			$ 31.338,62	$ -	$ 250.708,95	0,00%	0,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	17,04			$ 923.559,19	$ -	$ 15.737.448,63	0,00%	0,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2,16			$ 1.036.355,99	$ -	$ 2.238.528,94	0,00%	0,00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	46,55	46,55		$ 38.464,50	$ 1.790.368,73	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	14,25	14,25	14,25	$ 29.897,64	$ 426.049,14	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	14,07	10,20	10,20	$ 18.044,38	$ 184.052,68	$ 69.777,62	72,51%	72,51%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	2,21			$ 185.164,49	$ -	$ 408.843,19	0,00%	0,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	416,78	300,70	95,40	$ 4.352,40	$ 1.308.766,68	$ 505.241,39	72,15%	72,15%	

ITEM	CPF	714	IED	Pablo de Tarso			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	151,50	151,50		$ 4.435,43	$ 671.967,71	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	15,30	15,30		$ 29.040,55	$ 444.320,45	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCORozADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	37,88	37,88		$ 28.054,90	$ 1.062.719,64	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	156,26	156,26		$ 34.307,63	$ 5.360.909,58	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS ((INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4,00	4,00		$ 6.973,21	$ 27.892,86	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	8,00	8,00		$ 8.364,64	$ 66.917,15	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	24,21			$ 62.164,32	$ -	$ 1.504.811,81	0,00%	0,00%	
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	21,65			$ 633.678,64	$ -	$ 13.722.209,28	0,00%	0,00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	1.160,00	28,00		$ 6.772,33	$ 189.625,36	$ 7.666.282,54	2,41%	2,41%	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	3.465,36	1062,50		$ 24.136,40	$ 25.644.926,70	$ 57.996.384,29	30,66%	30,66%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0,25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	170,00	28,00		$ 9.730,63	$ 272.457,56	$ 1.381.749,06	16,47%	16,47%	
4.1.2	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=200 MM (INCLUYE RELLENO)	M	13,50			$ 177.125,27	$ -	$ 2.391.191,15	0,00%	0,00%	
4.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	7,50			$ 148.465,05	$ -	$ 1.113.487,88	0,00%	0,00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	8,00			$ 85.501,22	$ -	$ 684.009,79	0,00%	0,00%	
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	5,00			$ 42.689,68	$ -	$ 213.448,39	0,00%	0,00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	3,00			$ 47.726,41	$ -	$ 143.179,23	0,00%	0,00%	
4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	UN	1,00			$ 20.568,77	$ -	$ 20.568,77	0,00%	0,00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	6,80	6,80		$ 13.991,96	$ 95.145,34	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	5,00	5,00		$ 5.234,93	$ 26.174,66	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00			$ 188.899,52	$ -	$ 755.598,07	0,00%	0,00%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X1W - HERMÉTICA. INCLUYE :	UN	4,00	4,00		$ 185.401,53	$ 741.606,11	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	108,54	108,54		$ 22.625,78	$ 2.455.802,60	$ (113,13)	100,00%	100,00%	
13.1.4	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL 6 MM UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN ÁREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA HASTA 6G.CM)	M	37,88	37,88		$ 84.841,00	$ 3.213.777,02	$ 0,00	100,00%	100,00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	17,70	17,70		$ 111.316,98	$ 1.970.310,59	$ 0,00	100,00%	100,00%	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES. - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	156,26	59,66		$ 247.166,77	$ 14.745.969,47	$ 23.876.309,94	38,18%	38,18%	
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67.5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR. TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	35,00			$ 202.701,31	$ -	$ 7.094.545,92	0,00%	0,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	59,66	59,66		$ 4.352,40	$ 259.664,18	$ 0,00	100,00%	100,00%	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETLENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	1.038,08	1038,08		$ 3.520,76	$ 3.654.827,22	$ 14,08	100,00%	100,00%	

ITEM	CPF	836	IED	Jairo Aníbal Niño			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	3,80	3,80		$ 29.040,55	$ 110.354,10	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	207,43	207,43		$ 30.426,62	$ 6.311.394,62	$ 12,17	100,00%	100,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,84	6,84		$ 20.817,86	$ 142.394,19	$ (0,00)	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	168,45	168,45		$ 10.621,20	$ 1.789.140,33	$ 32,29	100,00%	100,00%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	168,45	110,50		$ 28.815,57	$ 3.184.120,09	$ 1.669.949,67	65,60%	65,60%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	168,45	168,45		$ 11.807,73	$ 1.989.011,51	$ 35,90	100,00%	100,00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, MAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	20,00	20,00		$ 19.332,69	$ 386.653,82	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	25,17	20,20		$ 30.969,00	$ 625.573,80	$ 154.021,22	80,24%	80,24%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,04			$ 27.437,53	$ -	$ 83.341,50	0,00%	0,00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	40,00	40,00		$ 25.467,57	$ 1.018.702,66	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12,25	12,25		$ 8.364,64	$ 102.466,88	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	31,00	31,00		$ 13.694,66	$ 424.534,44	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	121,96	121,96	71,16	$ 20.392,00	$ 2.487.008,12	$ 0,00	100,00%	100,00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	20,40			$ 85.501,22	$ -	$ 1.744.224,97	0,00%	0,00%	
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	8,00	8,00		$ 19.766,59	$ 158.132,74	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	4,25	4,25		$ 13.991,96	$ 59.465,84	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	13,00	13,00		$ 59.307,81	$ 771.001,55	$ -	100,00%	100,00%	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	5,00	5,00		$ 64.414,18	$ 322.070,90	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5,00			$ 118.468,31	$ -	$ 592.341,55	0,00%	0,00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	207,43	207,43		$ 39.814,42	$ 8.258.704,31	$ 15,93	100,00%	100,00%	
7.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	207,43	207,43		$ 241.797,92	$ 50.156.141,88	$ 96,72	100,00%	100,00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	118,39	60,28		$ 76.716,07	$ 4.624.444,82	$ 4.457.970,94	50,92%	50,92%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	53,42	25,60		$ 67.713,97	$ 1.733.477,62	$ 1.883.694,29	47,92%	47,92%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	191,29	180,60		$ 108.436,36	$ 19.583.607,19	$ 1.159.347,38	94,41%	94,41%	
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	9,02	4,80		$ 660.241,67	$ 3.169.160,02	$ 2.784.899,37	53,23%	53,23%	

9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	3,04			$ 448.682,89	$ -	$ 1.362.874,28	0,00%	0,00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	8,17			$ 1.181.573,48	$ -	$ 9.655.818,49	0,00%	0,00%	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	6,00	6,00		$ 815.394,69	$ 4.892.368,12	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	10,00			$ 1.037.439,40	$ -	$ 10.374.394,03	0,00%	0,00%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	5,00			$ 575.810,47	$ -	$ 2.879.052,34	0,00%	0,00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3,00			$ 721.070,81	$ -	$ 2.163.212,44	0,00%	0,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	16,00			$ 377.707,97	$ -	$ 6.043.327,49	0,00%	0,00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	10,00			$ 38.396,20	$ -	$ 383.962,03	0,00%	0,00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	7,00			$ 31.338,62	$ -	$ 219.370,33	0,00%	0,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	15,64	3,66		$ 923.559,19	$ 3.380.226,64	$ 11.067.933,36	23,40%	23,40%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2,70			$ 1.036.355,99	$ -	$ 2.798.161,17	0,00%	0,00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	191,29	180,50		$ 38.464,50	$ 6.942.842,68	$ 415.089,68	94,36%	94,36%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	21,19			$ 11.692,56	$ -	$ 247.718,47	0,00%	0,00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	72,64			$ 29.897,64	$ -	$ 2.171.863,23	0,00%	0,00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	10,22			$ 185.164,49	$ -	$ 1.893.121,73	0,00%	0,00%	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	23,00			$ 320.035,32	$ -	$ 7.360.812,36	0,00%	0,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	60,77	25,60		$ 4.352,40	$ 111.421,44	$ 153.077,54	42,13%	42,13%	

ITEM	CPF	712	IED		Luis Lopez de Mesa		SEMANA			
Ítem	**Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	7,80	7,80		$ 29.040,55	$ 226.516,31	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	764,30	701,99		$ 30.062,36	$ 21.103.506,08	$ 1.873.096,77	91,85%	91,85%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10,98			$ 20.817,86	$ -	$ 228.580,15	0,00%	0,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS ((INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56,41	56,41		$ 10.621,20	$ 599.105,51	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMINAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	23,18	23,18		$ 28.815,57	$ 667.944,83	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56,41	56,41		$ 11.807,73	$ 666.033,70	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	6,00	6,00		$ 19.332,69	$ 115.996,15	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,60			$ 27.437,53	$ -	$ 43.916,51	0,00%	0,00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	12,00	12,00		$ 25.467,57	$ 305.610,80	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	764,30	140,40		$ 16.844,46	$ 2.364.931,39	$ 10.509.253,86	18,37%	18,37%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	14,80	14,80		$ 8.364,64	$ 123.796,72	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	8,00	8,00		$ 13.694,66	$ 109.557,27	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	74,56	60,58	45,67	$ 20.392,00	$ 1.235.388,05	$ 285.039,35	81,25%	81,25%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	3,00	1,50		$ 47.726,41	$ 71.589,61	$ 71.589,61	50,00%	50,00%	
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	1,60	1,60		$ 21.103,11	$ 33.764,98	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	18,66	18,66		$ 13.991,96	$ 261.090,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	10,00	8,00		$ 59.307,81	$ 474.462,49	$ 118.615,62	80,00%	80,00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	6,00	5,00		$ 59.307,81	$ 296.539,06	$ 59.307,81	83,33%	83,33%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	2,00	2,00		$ 90.824,54	$ 181.649,09	$ -	100,00%	100,00%	
4.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN	1,00	1,00		$ 121.077,07	$ 121.077,07	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	56,00			$ 5.829,54	$ -	$ 326.454,11	0,00%	0,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00			$ 118.468,31	$ -	$ 118.468,31	0,00%	0,00%	
5.1.45	REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS EXISTENTES	UN	4,00			$ 31.405,58	$ -	$ 125.622,32	0,00%	0,00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	1,35			$ 42.278,54	$ -	$ 57.076,03	0,00%	0,00%	
7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 3 A 5 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	745,62	91,26		$ 65.046,28	$ 5.936.047,36	$ 42.563.762,32	12,24%	12,24%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	291,42	34,13		$ 26.316,62	$ 898.125,69	$ 6.771.063,48	11,71%	11,71%	
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	0,95	0,95	0,95	$ 70.333,44	$ 66.816,77	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	64,95	50,09		$ 14.350,87	$ 718.834,94	$ 213.253,89	77,12%	77,12%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	46,90	30,60	9,30	$ 76.716,07	$ 2.347.511,80	$ 1.250.471,97	65,25%	65,25%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	23,66			$ 67.713,97	$ -	$ 1.602.112,52	0,00%	0,00%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	25,28	47,61		$ 108.436,36	$ 5.162.449,22	$ (2.421.177,96)	188,32%	188,32%	
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	2,32			$ 489.874,00	$ -	$ 1.136.752,62	0,00%	0,00%	
9.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	1,60			$ 698.853,48	$ -	$ 1.118.584,89	0,00%	0,00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	4,79			$ 1.181.573,48	$ -	$ 5.663.754,33	0,00%	0,00%	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	6,00			$ 815.394,69	$ -	$ 4.892.368,12	0,00%	0,00%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2,00			$ 575.810,47	$ -	$ 1.151.620,93	0,00%	0,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5,00			$ 377.707,97	$ -	$ 1.888.539,84	0,00%	0,00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	1,00			$ 38.396,20	$ -	$ 38.396,20	0,00%	0,00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2,00			$ 31.338,62	$ -	$ 62.677,24	0,00%	0,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	8,51			$ 923.559,19	$ -	$ 7.861.335,84	0,00%	0,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1,44			$ 1.036.355,99	$ -	$ 1.492.352,63	0,00%	0,00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	58,14	58,14		$ 38.464,50	$ 2.236.172,31	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	25,11			$ 29.897,64	$ -	$ 750.819,43	0,00%	0,00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	0,55			$ 185.164,49	$ -	$ 101.840,47	0,00%	0,00%	
16.1.4	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	764,30	91,26		$ 86.678,38	$ 7.910.167,17	$ 58.337.945,92	11,94%	11,94%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	25,11	25,11		$ 4.352,40	$ 109.301,82	$ -	100,00%	100,00%	
19.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR DE PASAJEROS MEDIA CABINA USO PARA PERSONAS CON DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD Y PASAJEROS, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 500 KG CARGA VIVA Y TOTAL CON CABINA 890 KG APROX, 2 PARADAS, FOSO CON MEDIDAS 1.60M DE ANCHO X 1.60M DE FONDO APROX.; POSO CON MEDIDAS 1.60M DE ANCHO X 1.60M DE FONDO X 1.00M DE ALTURA APROX., MEDIDAS DE CABINA: 1.50 M DE ANCHO X 1.20M DE FONDO X 1.60M DE ALTURA, PARA EL COLEGIO LUIS LÓPEZ DE MESA	UN	1,27			$ 76.917.022,98	$ -	$ 97.684.619,18	0,00%	0,00%	

ITEM	CPF	814	IED	Eduardo Umaña Luna			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas. si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	21,76	21,76		$ 4.435,43	$ 96.514,97	$ (0,00)	100,00%	100,00%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	6,40	6,40		$ 29.040,55	$ 185.859,53	$ (0,00)	100,00%	100,00%	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,21	3,21		$ 30.062,36	$ 96.500,18	$ 144,30	99,85%	99,85%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,89	1,89		$ 20.817,86	$ 39.345,76	$ 0,00	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	66,41	66,41		$ 10.621,20	$ 705.353,57	$ (53,11)	100,01%	100,01%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20,97	20,97		$ 28.815,57	$ 604.262,43	$ 0,00	100,00%	100,00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	69,88	69,88		$ 11.807,73	$ 825.123,92	$ 23,62	100,00%	100,00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5,00	5,00		$ 19.332,69	$ 96.663,46	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,80	6,80		$ 30.969,00	$ 210.589,20	$ 0,00	100,00%	100,00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11,00	11,00		$ 25.467,57	$ 280.143,23	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,21	3,21		$ 21.107,13	$ 67.753,89	$ 101,31	99,85%	99,85%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	10,50	10,50		$ 8.364,64	$ 87.828,75	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	5,00	5,00		$ 13.694,66	$ 68.473,30	$ -	100,00%	100,00%	
1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2	549,44	549,44		$ 50.276,25	$ 27.623.780,82	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	46,09	46,09		$ 20.392,00	$ 939.867,21	$ (0,00)	100,00%	100,00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	7,00	7,00		$ 36.375,35	$ 254.627,45	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	0,95	0,95		$ 101.698,85	$ 96.613,91	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	3,74	3,74		$ 68.498,74	$ 256.185,29	$ 205,50	99,92%	99,92%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	1,00	1,00		$ 85.501,22	$ 85.501,22	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	2,00	2,00		$ 47.726,41	$ 95.452,82	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	48,00	48,00		$ 13.991,96	$ 671.614,16	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7,00	7,00		$ 59.307,81	$ 415.154,68	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	5,00	5,00		$ 59.307,81	$ 296.539,06	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	1,00	1,00		$ 169.748,96	$ 169.748,96	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	2,00	2,00		$ 90.824,54	$ 181.649,09	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	3,00	3,00		$ 170.346,24	$ 511.038,72	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	44,00			$ 5.829,54	$ -	$ 256.499,65	0,00%	0,00%	
4.9.13	SUSPENSION DE SALIDA SANITARIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1,00			$ 30.698,48	$ -	$ 30.698,48	0,00%	0,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00			$ 118.468,31	$ -	$ 118.468,31	0,00%	0,00%	
5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00			$ 211.513,25	$ -	$ 211.513,25	0,00%	0,00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	3,21	3,21		$ 42.278,54	$ 135.714,13	$ 202,94	99,85%	99,85%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	3,21	3,21	3,21	$ 196.536,97	$ 631.827,07	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	1,80	0,90		$ 70.333,44	$ 63.300,10	$ 63.300,10	50,00%	50,00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	24,70	24,70		$ 14.350,87	$ 354.466,42	$ (0,00)	100,00%	100,00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	37,48	18,74		$ 76.716,07	$ 1.437.659,19	$ 1.437.659,19	50,00%	50,00%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	24,15	12,08		$ 67.713,97	$ 817.984,75	$ 817.402,41	50,02%	50,02%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX.	M2	72,77	72,77		$ 108.436,36	$ 7.890.914,15	$ 0,00	100,00%	100,00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2,73			$ 1.181.573,48	$ -	$ 3.225.695,60	0,00%	0,00%	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	5,00			$ 815.394,69	$ -	$ 4.076.973,43	0,00%	0,00%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2,00			$ 575.810,47	$ -	$ 1.151.620,93	0,00%	0,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5,00			$ 377.707,97	$ -	$ 1.888.539,84	0,00%	0,00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2,00			$ 38.396,20	$ -	$ 76.792,41	0,00%	0,00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2,00	1,00		$ 31.338,62	$ 31.338,62	$ 31.338,62	50,00%	50,00%	
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	1,00	1,00		$ 948.374,57	$ 948.374,57	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	6,80			$ 923.559,19	$ -	$ 6.280.202,51	0,00%	0,00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	69,35	69,35		$ 38.464,50	$ 2.667.513,24	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	38,54	20,95		$ 29.897,64	$ 626.355,56	$ 525.890,52	54,36%	54,36%	
12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	3,90	3,50		$ 18.044,38	$ 63.155,33	$ 7.217,75	89,74%	89,74%	
12.3.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	12,00	12,00		$ 29.063,32	$ 348.759,82	$ -	100,00%	100,00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	2,82			$ 185.164,49	$ -	$ 521.830,56	0,00%	0,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	368,76	300,54		$ 4.352,40	$ 1.308.070,30	$ 296.920,73	81,50%	81,50%	

ITEM	CPF	833	IED	Dario Echandia			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	123,63	123,63		$ 3.404,25	$ 420.873,79	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	15,60	15,60		$ 2.407,88	$ 37.562,95	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12,80	12,80		$ 20.817,86	$ 266.468,66	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCORZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	224,64	224,64		$ 28.054,90	$ 6.302.252,92	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	686,67	686,67		$ 34.307,63	$ 23.557.934,93	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	57,00	57,00		$ 11.171,61	$ 636.781,56	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	57,00	57,00		$ 6.973,21	$ 397.473,22	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	253,30	253,30		$ 4.099,29	$ 1.038.350,46	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	23,00	23,00		$ 8.364,64	$ 192.386,79	$ -	100,00%	100,00%	
1.3.3	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN)	UN	11,00			$ 177.967,63	$ -	$ 1.957.643,90	0,00%	0,00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	26,00	26,00		$ 36.375,35	$ 945.759,11	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.16	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3	0,85	0,85		$ 1.307.170,35	$ 1.111.094,80	$ 2.614,34	99,77%	99,77%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	83,52	83,52		$ 6.772,33	$ 565.625,37	$ 24,38	100,00%	100,00%	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	16.349,35	16806,93		$ 24.136,40	$ 405.658.812,14	$ (11.044.250,17)	102,80%	102,80%	
3.1.13	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2	69,18	69,18	18,88	$ 12.825,52	$ 887.269,36	$ 36,17	100,00%	100,00%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0,25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	108,00	108,00		$ 9.730,63	$ 1.050.907,74	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	23,00	23,00		$ 27.619,66	$ 635.252,20	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	27,00	27,00		$ 197.624,40	$ 5.335.858,93	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	126,65	126,65		$ 24.422,99	$ 3.093.171,73	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	50,00	50,00		$ 46.585,41	$ 2.329.270,56	$ -	100,00%	100,00%	

5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	62,00	62,00		$ 188.899,52	$ 11.711.770,04	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	49,00	49,00		$ 185.401,53	$ 9.084.674,79	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	1.161,22	525,60		$ 29.762,38	$ 15.643.107,35	$ 18.917.528,77	45,26%	45,26%	
13.1.4	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL 6 MM UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN ÁREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA HASTA 60 CM)	M	449,28	100,60	75,30	$ 84.841,00	$ 8.535.004,44	$ 29.582.359,32	22,39%	22,39%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	17,00	17,00		$ 111.316,98	$ 1.892.388,70	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA.	M	40,00	28,60		$ 24.947,96	$ 713.511,56	$ 284.406,71	71,50%	71,50%	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	716,95	716,95		$ 247.166,77	$ 177.205.350,38	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	6,20	6,20		$ 134.793,16	$ 835.717,58	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	716,95	300,50		$ 4.352,40	$ 1.307.896,20	$ 1.812.541,75	41,91%	41,91%	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	12.474,87	13184,70		$ 3.520,76	$ 46.420.122,18	$ (2.499.141,97)	105,69%	105,69%	

ITEM	CPF	748	IED		Alfonso Reyes Echandia		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de carpetas asfalticas y placas de cancha se debe aplicar)	m2	73,41			$ 6.575,47	$ -	$ 482.716,28	0,00%	0,00%	$ 2.230,40
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	m2	73,41			$ 29.040,55	$ -	$ 2.131.914,99	0,00%	0,00%	$ 9.850,56
1.2.16	DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	176,00			$ 113.509,25	$ -	$ 19.977.628,49	0,00%	0,00%	$ 38.502,34
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	2,00			$ 22.734,26	$ -	$ 45.468,52	0,00%	0,00%	$ 7.711,46
2.2.11	MUROS DE CONTENCIÓN 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	6,00			$ 1.429.703,14	$ -	$ 8.578.218,82	0,00%	0,00%	$ 484.955,30
2.3.3	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	64,00			$ 172.618,86	$ -	$ 11.047.607,19	0,00%	0,00%	$ 58.552,32
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	480,00			$ 6.772,33	$ -	$ 3.250.720,51	0,00%	0,00%	$ 2.297,18
4.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	73,41			$ 93.453,39	$ -	$ 6.860.568,29	0,00%	0,00%	$ 31.699,39
4.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	73,41			$ 12.287,16	$ -	$ 902.020,75	0,00%	0,00%	$ 4.167,80
9.3.4	CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 M	M	73,41			$ 1.122.317,90	$ -	$ 82.391.214,44	0,00%	0,00%	$ 380.690,23
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	73,41			$ 4.352,40	$ -	$ 319.516,89	0,00%	0,00%	$ 1.476,33

ITEM	CPF	747	IED		Orlando Higuita		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	153,00	153,00		$ 30.062,36	$ 4.599.541,32	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	144,84	144,84		$ 10.621,20	$ 1.538.352,21	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	144,84	144,84		$ 11.807,73	$ 1.710.206,97	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4,00	4,00		$ 6.973,21	$ 27.892,86	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	152,28	152,28		$ 16.844,46	$ 2.565.038,63	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	153,00	153,00		$ 42.278,54	$ 6.468.617,23	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	150,00	150,00		$ 26.316,62	$ 3.947.492,88	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	144,84	144,84		$ 22.625,78	$ 3.277.072,33	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	144,84	144,84		$ 29.897,64	$ 4.330.313,10	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.4	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	152,28	152,28		$ 86.678,38	$ 13.199.201,80	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	152,52	152,52		$ 4.352,40	$ 663.819,16	$ -	100,00%	100,00%	

ITEM	CPF	839	IED		Isabel II		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	39,52	39,52		$ 4.352,40	$ 172.006,85	$ -	100,00%	100,00%	
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1,00	1,00		$ 1.954.513,13	$ 1.954.513,13	$ -	100,00%	100,00%	

ITEM	CPF	850	IED		Jhon F Kennedy		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	97,20	97,20		$ 4.352,40	$ 423.053,28	$ -	100,00%	100,00%	
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1,00	1,00		$ 1.954.514,13	$ 1.954.514,13	$ -	100,00%	100,00%	

ITEM	CPF	817	IED		Marsella		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	198,90	198,90		$ 4.352,40	$ 865.692,36	$ -	100,00%	100,00%	
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1,00	1,00		$ 1.954.513,90	$ 1.954.513,90	$ -	100,00%	100,00%	
19.1.6	PODA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	4,00	4,00		$ 976.870,07	$ 3.907.480,26	$ -	100,00%	100,00%	

ITEM	CPF	890	IED		Nelson Mandela		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2,00	2,00		$ 122.747,05	$ 245.494,11	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0,13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,60	7,60		$ 20.817,86	$ 158.111,68	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	2,40	2,40		$ 16.375,74	$ 39.301,77	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	0,18	0,18		$ 633.678,64	$ 114.062,15	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.17	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2	1,20	1,20		$ 128.771,23	$ 154.525,48	$ -	100,00%	100,00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	13,32	13,32		$ 6.772,33	$ 90.174,99	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	7,60	7,60		$ 136.417,61	$ 1.036.091,73	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.11	RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	M2	15,19	15,19		$ 137.324,25	$ 2.085.955,30	$ -	100,00%	100,00%	

ITEM	CPF	763	IED		Bicentenario		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	15,00			$ 6.772,33	$ -	$ 101.585,02	0,00%	0,00%	
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2	25,20			$ 195.409,37	$ -	$ 4.924.316,07	0,00%	0,00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	50,40			$ 22.625,78	$ -	$ 1.140.339,51	0,00%	0,00%	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	36,60			$ 18.025,63	$ -	$ 659.738,13	0,00%	0,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	36,60			$ 4.352,40	$ -	$ 159.297,84	0,00%	0,00%	

FECHA:	14/03/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**60**	
CORTE DEL INFORME:	***14/03/2026***	

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	18	**DEL**	08-mar-26	**AL**	14-mar-26

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.8169111	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.8154784
Fecha de Iniciación	14/10/2025	**Fecha de Iniciación**	14/10/2025
Fecha de Terminación	13/05/2026	**Fecha de Terminación**	13/05/2026
Plazo Inicial	7 MESES	**Plazo Inicial**	7 MESES
Valor inicial	$ 880,146,577.00	**Valor inicial**	$ 2,975,834,553.00
Adiciones	$ 83,867,649.00	**Adiciones**	$ 523,987,595.00
Prorroga	N.A.	**Prorroga**	N.A.
Suspensión	N.A.	**Suspensión**	N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES
No.	**FRENTE**	PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	PROGRAMADO ACUM	EJECUTADO ACUM	DESVIACIÓN	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**
1	PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	62.00%	72.83%	65.00%	72.83%	7.83%	BAÑO: Instalacion de enchape, media cañas y instalación de tubería e instalación de piso en vinisol y pintura
2	PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	23.00%	20.64%	24.00%	20.64%	-3.36%	Cocina: Instalacion de piso, cambio de tuberias
3	EL PORVENIR	47.00%	60.80%	53.31%	61.11%	7.80%	BAÑO: instalacion de enchape, media cañas y instalación manto en cubierta
4	VILLAS DEL PROGRESO	59.00%	70.34%	62.80%	71.51%	8.71%	BAÑO Y CANCHA: Instalación de enchape, Fundicion de placa
5	PABLO DE TARSO	37.00%	33.94%	38.37%	37.30%	-1.07%	Desmonte e instalación de cubierta
6	JAIRO ANIBAL NIÑO	48.00%	59.07%	53.20%	63.21%	10.01%	BAÑO Y SALONS DE PREESCOLAR: Instalación de enchape, media caña y piso
7	LUIS LOPEZ DE MESA	16.00%	17.94%	18.90%	29.82%	10.92%	BAÑO: Instalacion de manto de aluminio sobre cubierta y enchape
8	EDUARDO UMAÑA LUNA	60.00%	69.11%	64.30%	71.01%	6.71%	BAÑO: Instalacion de enchape
9	DARIO ECHANDIA	70.00%	91.07%	77.43%	92.62%	15.19%	CUBIERTA: Instalación de cubierta
10	LLANO ORIENTAL - ALFONSO REYES ECHANDIA						0
TOTALES		**46.89%**	**55.08%**	**50.81%**	**57.78%**	**6.97%**	

3. RESUMEN FINANCIERO

PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 259,947,350	$ 189,321,651	**$ 70,625,699**		0.00%	72.83%

PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 85,000,000	$ 17,546,978	**$ 67,453,022**		0.00%	20.64%

EL PORVENIR

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 99,553,816	$ 60,836,447	**$ 38,717,369**		0.30%	61.11%

VILLAS DEL PROGRESO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 171,376,301	$ 122,546,012	**$ 48,830,289**		1.20%	71.51%

PABLO DE TARSO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 179,468,691	$ 66,939,115	**$ 112,529,577**		3.36%	37.30%

JAIRO ANIBAL NIÑO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 207,779,941	$ 131,330,683	**$ 76,449,259**		4.10%	63.21%

LUIS LOPEZ DE MESA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 302,922,429	$ 90,328,999	**$ 212,593,430**		11.90%	29.82%

EDUARDO UMAÑA LUNA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 75,659,453	$ 53,723,703	**$ 21,935,750**		1.90%	71.01%

DARIO ECHANDIA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 799,164,222	$ 740,153,654	**$ 59,010,568**		1.50%	92.62%

FECHA:	14/03/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**60**	
CORTE DEL INFORME:	***14/03/2026***	

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	18	**DEL**	08-mar-26	**AL**	14-mar-26

EMERGENCIAS

BALANCE EMERGENCIAS	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 68,564,814	$ 57,655,046	**$ 10,909,768**		0.00%	84.09%

4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

OBSERVACIONES: N/A

RECOMENDACIONES:
- Mantener orden y aseo en la obras, así como la señalización
- Continuar con el uso correcto de EPP
- Apertura de más frentes de obra

CONCLUSIONES:
- Se avanzó en tres frentes de trabajo con actividades de cerramiento, demoliciones, desmontes, pañete, e Instalación de pisos, cubiertas, enchape.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

1. Se continua con avances en los frentes de obra en los siguientes colegios: Alfonso Lopez Michelsen, El Porvenir, Villas del progreso, Jairo Anibal Niño, Eduardo Umaña Luna , Luis Lopez de Mesa y Dario Echandia.

2. Se continua con avance en los frentes de obra en las emergencias en los siguientes colegios: Orlando Higuita.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente semana se aprobó la documentación inicial del personal que va a realizar la instalación de los mesones en el frente Jairo Anibal Niño. Se evidenció la ejecución de actividades en los colegios, Luis López de Mesa, Alfonso López Michelsen, Villas del Progreso, El Porvenir, Jairo Aníbal Niño, Darío Echandía, Dario Echandia Sede B, Colegio Eduardo Uñama Luna, Colegio Pablo de Tarso.
Durante el periodo reportado se recomienda que todo el personal realice el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), en especial en las actividades de cubierta. En el colegio San Bernardino, se tiene programada la instalación de cerramiento metálico en la parte frontal de la viga ubicada en el exterior, con el fin de restringir el acceso y mitigar riesgos para la comunidad educativa mientras se ejecutan las intervenciones.
En el colegio Darío Echandía Sede B, se valida que el personal realiza el uso adecuado de EPP y cuenta con dotación completa durante las actividades de aplicación de estuco en la fachada, además de verificar que los andamios utilizados están certificados y en condiciones seguras.

En el colegio Jairo Aníbal Niño y en el colegio Michelsen, se constata el mantenimiento de las USP, y los sitios de trabajo se encuentran en condiciones adecuadas de orden y aseo, con los residuos correctamente embalados y acopiados. Con respecto al colegio Villas del Progreso, se recomienda ajustar el cerramiento perimetral para que la comunidad educativa no tenga acceso a la zona de intervención, garantizando así la seguridad durante las labores. Finalmente, en el colegio Pablo de Tarso, se evidencia que el área de intervención cuenta con la señalización correspondiente, asegurando el control y delimitación del área de trabajo. En general, se observa cumplimiento con las medidas de SST, incluyendo el uso de EPP, orden y limpieza, señalización y control de áreas de trabajo, con recomendaciones puntuales para reforzar la seguridad y minimizar riesgos para la comunidad educativa y el personal de obra. trabajadas: 44

REPORTE PERSONAL

Total de horas capacitación: 20 minutos
Número de accidentes de trabajo: 0
Número de días de incapacidad por AT:0
Número de días de incapacidad por enfermedad común: 0

DIRECTOR OBRA: 1 INSPECTORES SST: 1
RESIDENTE OBRA: 1 PERSONAL OPERATIVO: 49

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

IED Cultura Alfonso López Michelsen: Se realizo recorrido en el frente, se acopio los residuos de demolición adecuadamente, pero se recomienda realizar el retiro total de los RCD y implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).
IED Villas del progreso: Se realizo recorrido en el frente, se encuentran residuos de demolición acopiados adecuadamente, se recomendó al contratista disponer el material, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente
IED El Porvenir: Se realizo recorrido en el frente, presenta señalización en el frente de obra. Se acopio los residuos adecuadamente, al igual se recomienda realizar la disposición e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Jairo Aníbal Niño: Se realizo recorrido en el frente, se reporta un volumen medio respecto a los RCD en la parte del parqueadero de bicicletas, al igual se recomendó disponerlo adecuadamente, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Darío Echandía: Se realizo recorrido en el frente, se presenta el cerramiento adecuado, se evidencia materiales debidamente acopiados, por lo que se recomienda realizar la disposición total de los residuos, mantener orden en el frente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Eduardo Umaña Luna: Se realizo recorrido en el frente, se encuentra el cerramiento adecuado, el material de construcción y los RCD se encuentran acopiados adecuadamente, pero se recomienda disponerlo al igual que implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Pablo de torso: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia un volumen bajo de residuos, se recomendó disponerlos, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Luis López de mesa: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia residuos y material acopiados adecuadamente, por lo que se recomienda al contratista realizar la debida disposición adecuada ya que cuenta con la cantidad mínima para su recolección y garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente.

OTROS

ING JHONER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING HARRY ARANGO
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA:	14/03/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**60**	
CORTE DEL INFORME:	***14/03/2026***	

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA

Alfonso Lopez Michelsen



Pintura



Pintura



Pintura



Pintura

Alfonso Lopez Michelsen Cocina



Instalacion de piso



Instalacion de piso
