CPF		609	IED	EMERGENCIA DILE TUNJUELITO			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	25,00	0	0	$ 30.066,00	$ -	$ 751.650,00	0,00%	0,00%	
	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0_10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	20,00	0,8	0	$ 72.193,00	$ 57.754,40	$ 1.386.105,60	4,00%	4,00%	
	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	20,00	5	0	$ 20.015,00	$ 100.075,00	$ 300.225,00	25,00%	25,00%	
	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	3,00	3	0	$ 9.069,00	$ 27.207,00	$ -	100,00%	100,00%	
	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	5,00	0	0	$ 18.061,00	$ -	$ 90.305,00	0,00%	0,00%	
	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12,00	12	0	$ 16.333,00	$ 195.996,00	$ -	100,00%	100,00%	
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,88	0,88	0	$ 96.108,00	$ 84.575,04	$ (480,54)	100,57%	100,57%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0,25	0	0	$ 183.945,00	$ -	$ 45.986,25	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	5,00	2,55	0	$ 334.957,00	$ 854.140,35	$ 820.644,65	51,00%	51,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	2,00	0	0	$ 7.012,00	$ -	$ 14.024,00	0,00%	0,00%	
	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2	90,00	80	0	$ 14.353,00	$ 1.148.240,00	$ 143.530,00	88,89%	88,89%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO). DESMONTABLE PARA LIMPIEZA. INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	30,10	0	0	$ 66.398,00	$ -	$ 1.998.579,80	0,00%	0,00%	
	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	90,00	20	0	$ 20.875,00	$ 417.500,00	$ 1.461.250,00	22,22%	22,22%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	3,00	3	0	$ 319.199,00	$ 957.597,00	$ -	100,00%	100,00%	
	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20,00	5	0	$ 68.873,00	$ 344.365,00	$ 1.033.095,00	25,00%	25,00%	
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	120,00	4	0	$ 40.429,00	$ 161.716,00	$ 4.689.764,00	3,33%	3,33%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	150,00	20	0	$ 4.508,00	$ 90.160,00	$ 586.040,00	13,33%	13,33%	

CPF		609	IED	EMERGENCIA HERNANDO DURAN DUSSAN			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	10,00	0	0	$ 30.066,00	$ -	$ 300.660,00	0,00%	0,00%	
	DEMOLICIÓN DE AJUSTADO DE PISO E= 0.01 A 0.05 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	49,00	0	0	$ 6.953,00	$ -	$ 340.697,00	0,00%	0,00%	
	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	49,00	60	0	$ 18.852,00	$ 1.131.120,00	$ (207.372,00)	122,45%	122,45%	
	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2	49,00	0	0	$ 127.792,00	$ -	$ 6.261.808,00	0,00%	0,00%	
	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	50,00	0	0	$ 5.814,00	$ -	$ 290.700,00	0,00%	0,00%	
	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO). INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	49,00	0	0	$ 72.800,00	$ -	$ 3.567.200,00	0,00%	0,00%	
	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	35,00	0	0	$ 26.248,00	$ -	$ 918.680,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	35,00	0	0	$ 25.180,00	$ -	$ 888.300,00	0,00%	0,00%	
	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	8,75	0	0	$ 39.822,00	$ -	$ 348.442,50	0,00%	0,00%	
	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	49,00	60	0	$ 97.011,00	$ 5.820.660,00	$ (1.067.121,00)	122,45%	122,45%	
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	15,00	15	0	$ 40.429,00	$ 606.435,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	49,00	0	0	$ 4.508,00	$ -	$ 220.892,00	0,00%	0,00%	

CPF		609	IED	EMERGENCIA COLEGIO CASTILLA			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	57,00	0	0	$ 3.395,00	$ -	$ 193.515,00	0,00%	0,00%	
	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,00	1	0	$ 21.553,00	$ 21.553,00	$ 21.553,00	50,00%	50,00%	
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	57,00	60	0	$ 35.518,00	$ 2.131.080,00	$ (106.554,00)	105,26%	105,26%	
	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1,00	0	0	$ 11.566,00	$ -	$ 11.566,00	0,00%	0,00%	
	DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M	24,09	0	0	$ 4.147,00	$ -	$ 103.633,53	0,00%	0,00%	
	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	2,01	1	0	$ 141.229,00	$ 141.229,00	$ 142.641,29	49,75%	49,75%	
	EMBOQUILLADO DE LADRILLO A LA VISTA EN ALTURA MENOR A 1.50 M CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	2,01	1	0	$ 25.645,00	$ 25.645,00	$ 25.901,45	49,75%	49,75%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM	450,00	0	0	$ 1.676,00	$ -	$ 754.200,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	47,32	53,82	0	$ 8.860,00	$ 476.845,20	$ (57.590,00)	113,74%	113,74%	
	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	33,60	15	0	$ 102.700,00	$ 1.540.500,00	$ 1.910.220,00	44,64%	44,64%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLÚCIDO BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	57,00	60	0	$ 224.940,00	$ 13.496.400,00	$ (674.820,00)	105,26%	105,26%	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	24,99	0	0	$ 24.883,00	$ -	$ 621.826,17	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	28,50	36,33	6,33	$ 240.910,00	$ 8.752.260,30	$ (1.886.325,30)	127,47%	127,47%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	57,00	60	0	$ 4.508,00	$ 270.480,00	$ (13.524,00)	105,26%	105,26%	
	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	10,00	60	0	$ 7.491,00	$ 449.460,00	$ (374.550,00)	600,00%	600,00%	

FECHA:	6/03/2026	**INFORME SEMANAL**	
DIAS RESTANTES	**67**		
CORTE DEL INFORME:	***7/03/2026***		

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SEMANA N°	17	**DEL**	1-mar-26	**AL**	7-mar-26

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.8169111	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.8155154
Fecha de Iniciación	14/10/2025	**Fecha de Iniciación**	14/10/2025
Fecha de Terminación	13/05/2026	**Fecha de Terminación**	13/05/2026
Plazo Inicial	7 MESES	**Plazo Inicial**	7 MESES
Valor inicial	$ 796.278.928,00	**Valor inicial**	$ 2.497.896.864,00
Adiciones	0	**Adiciones**	0
Prorroga	N.A.	**Prorroga**	N.A.
Suspensión	N.A.	**Suspensión**	N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES
No.	**FRENTE**	PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	PROGRAMADO ACUM	EJECUTADO ACUM	DESVIACIÓN	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**
1	RAFAEL URIBE URIBE	18,21%	45,26%	46,39%	45,81%	-0,58%	Actividades pintura interior y exterior, carcamo , compactacion material.
2	LA FLORESTA SUR	11,30%	15,25%	17,73%	15,41%	-2,32%	N.A
3	CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA	52,38%	56,95%	63,34%	58,62%	-4,73%	Actividades de enchape y, destronque de pisos, media caña,Instalacion orinales, mantenimiento en ventanas y fachada, pintura fachada .
4	CARLOS ARTURO TORRES	12,47%	14,42%	15,18%	14,54%	-0,64%	Actividades de instalacion de enchapes, cielo raso,unidades sanitarias, orinales.
5	CARLOS ARTURO TORRES	32,11%	62,04%	63,73%	63,20%	-0,52%	Actividades fundida de placa, demarcación de cancha e instalacion de canal,bajante y cielo raso.
6	FRANCISCO DE MIRANDA	11,62%	11,51%	14,93%	14,67%	-0,26%	Actividades de levantamiento muro y pañete, mortero en piso, enchape muros .
7	RUFINO JOSE CUERVO	26,40%	55,43%	61,93%	60,35%	-1,58%	Actividades de Pulido de placa y rejilla en carcamo.Instalaciòn piso chip.
8	JOSE ANTONIO RICAURTE - SAN CARLOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	N.A
TOTALES		**20,56%**	**32,61%**	**35,40%**	**34,08%**		

3. RESUMEN FINANCIERO

RAFAEL URIBE URIBE

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 217.411.471	$ 99.594.077	**$ 117.817.394**		0,55%	45,81%

LA FLORESTA SUR

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 90.944.464	$ 14.015.390	**$ 76.929.073**		0,17%	15,41%

CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 409.504.402	$ 240.033.978	**$ 169.470.424**		2,62%	58,62%

CARLOS ARTURO TORRES

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 336.209.416	$ 48.895.601	**$ 287.313.815**		14,54%	14,54%

CARLOS ARTURO TORRES

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 192.596.790	$ 121.725.565	**$ 70.871.226**		1,17%	63,20%

FRANCISCO DE MIRANDA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 159.596.212	$ 23.414.894	**$ 136.181.319**		14,67%	14,67%

RUFINO JOSE CUERVO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 127.099.273	$ 76.706.225	**$ 50.393.048**		4,92%	60,35%

JOSE ANTONIO RICAURTE - SAN CARLOS

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 166.113.099	$ -	**$ 166.113.099**		0,00%	0,00%

EMERGENCIAS


	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE EMERGENCIAS	**$ 108.306.048**	$ 60.461.341	**$ 47.844.707**		177,78%	55,82%

FECHA:	6/03/2026	**INFORME SEMANAL**	
DIAS RESTANTES	**67**		
CORTE DEL INFORME:	***7/03/2026***		

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SEMANA N°	17	**DEL**	1-mar-26	**AL**	7-mar-26

4. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

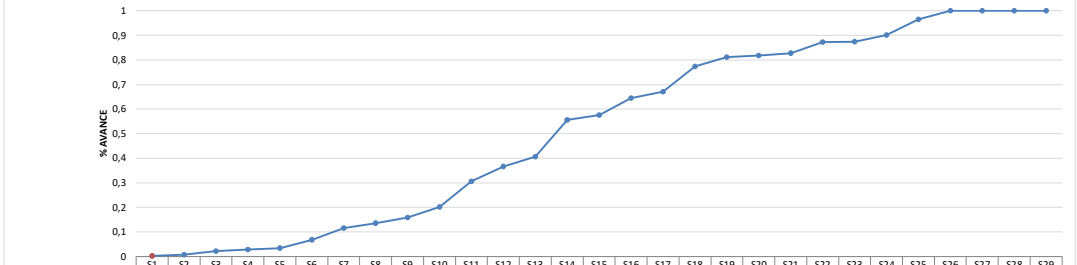

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29
PROGRAMADO	0,002	0,008	0,021	0,029	0,034	0,068	0,115	0,136	0,159	0,202	0,306	0,367	0,406	0,555	0,575	0,644	0,671	0,774	0,811	0,818	0,827	0,872	0,874	0,901	0,965	1	1	1	1
EJECUTADO	0,002																												

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

OBSERVACIONES: N.A

RECOMENDACIONES:
• Mantener orden y aseo en la obras, así como la señalización
• Continuar con el uso correcto de EPP
• Apertura de más frentes de obra

CONCLUSIONES:
• JOSE MARIA CORDOBA :Actividades de enchape y, destronque de pisos, media caña,Instalacion orinales, mantenimiento en ventanas y fachada, pintura fachada .
RAFAEL URIBE URIBE : Actividades pintura interior y exterior, carcamo , compactacion material.
CARLOS ARTURO TORRES SEDE B: Actividades fundida de placa, demarcación de cancha e instalacion de canal,bajante y cielo raso.
RUFIJO JOSE CUERVO:Actividades de Pulido de placa y rejilla en carcamo.Instalación piso chip.
CARLOS ARTURO TORRES SEDE A:Actividades de instalacion de enchapes, cielo raso,unidades sanitarias, orinales.
FRANCISCO MIRANDA:Actividades de levantamiento muro y pañete, mortero en piso, enchape muros .

EMERGENCIA OEA:Actividades de mortero Reparacion.
EMERGENCIA DILE TUNJUELITO:Actividades de resanes muros , instalacion canal ,pintura interior.
EMERGENCIA HERNANDO DURAN DUSSAN: impermeabilizacion en cubierta
EMERGENCIA COLEGIO CASTILLA:Reforzamiento de estructura metalica y pintura.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

1. Se realiza revision de actividades en colegios : Jose maria cordoba, Rafael uribe uribe, Carlos arturo torres sede B, Rufino jose cuervo,Carlos arturo torres sede A,Fancisco Miranda, La floresta
2.se realiza revision cantidades
3.se realiza revision de correspondecia
4.se realizan observaciones a requerimientos tecnicos del contratista
5.se realiza informe semanal
6.se realiza revision acta de corte y memorias

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente semana se aprobó el ingreso de 3 trabajadores operativos para los diferentes frentes de obra. De igual manera, se realizó la respectiva aprobación para la nueva residente de obra. Así mismo, se efectuó la aprobación del personal encargado de realizar la toma de medidas en la cancha del colegio Carlos Arturo Torres sede B, así como del personal responsable de la verificación de medidas para los trabajos correspondientes al mantenimiento de la red contraincendios, estas aprobaciones se realizaron conforme a los procedimientos establecidos para el control de ingreso y validación de personal en el proyecto.
Así mismo, esta interventoría realizó recorridos de verificación y seguimiento a las actividades adelantadas en las instituciones educativas Carlos Arturo Torres Sede B, José María Córdoba, Rafael Uribe Uribe, Rufino José Cuervo, José María Miranda, Carlos Arturo Torres Sede A y Hernando Durán Dussán. Durante la ejecución de las labores se contó con acompañamiento permanente del área de SST, efectuando seguimiento en campo a las condiciones locativas y operativas, identificación y valoración de peligros.
Durante el periodo evaluado se evidenció el diligenciamiento de ATS, permisos de trabajo e inspecciones correspondientes a las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra.
Se recomienda al contratista reforzar el uso adecuado del casco de seguridad por parte de los trabajadores que se encuentran ejecutando labores en los colegios Rafael Uribe Uribe y DILE. De igual manera, se verificó el cerramiento perimetral en cada uno de los frentes de obra, evidenciando que se encuentra en condiciones adecuadas.
Así mismo, en el colegio José María Córdoba se validó que el personal realiza sus actividades con el uso adecuado de los EPP. Finalmente, se recomienda al contratista implementar jornadas de orden y aseo, con el fin de establecer un único punto de acopio de residuos y mantener condiciones adecuadas de seguridad y organización en el área de trabajo.
Por otra parte, se aprueba el Informe Mensual SST No. 4 mediante el oficio UNIOBRAS-LOTE 3-306, dado que el documento incorpora la información solicitada por esta interventoría.
Total de horas hombres trabajadas: 42
Total de horas capacitación: 20 minutos
Número de accidentes de trabajo: 0
Número de días de incapacidad por AT:0
Número de días de incapacidad por enfermedad común: 0

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

IED José María Córdoba: Se evidencia material de construcción y RCD en zona verde, el contratista anteriormente realizo la protección adecuada de los individuos arbóreos cerca al parqueadero, por lo que todavía se evidencia acopio en esta zona por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área al igual se recomendó al contratista presentar solo una zona de acopio, disponer adecuadamente ya que llevan varias semanas y cumplen con la cantidad mínima para el retiro, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).
IED Carlos Arturo Torres Sede A: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento adecuado en los baños, se reporta ingreso de material acopiado adecuadamente asimismo los residuos (volumen medio), pero se encuentran en zona verde, por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, se recomienda disponer adecuadamente ya que llevan varias semanas y cumplen con la cantidad mínima para el retiro e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Carlos Arturo Torres Sede B: Se realizo recorrido en el frente, se encuentra material de construcción y residuos en el salón 105, se recomendó una jornada de orden y aseo, la disposición adecuada de los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Rafael Uribe Uribe: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento adecuado, cuentan con los acopios de los materiales que ingresaron y los RCDs generados adecuadamente, se espera la disposición correspondiente de los residuos, se evidencia lonas en la zona verdes, por lo que se recomienda organizar una zona de acopios, despejar la zona verde, una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Ruffino Jose Cuervo Sede C: Se realizo recorrido en el frente, anteriormente se dispuso adecuadamente los residuos, se mantiene el orden en el frente y implementa todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Francisco Miranda: Se realizo recorrido en el frente, se realiza en batea metálica la mezcla de cemento, se reporta un acopio adecuado (señalizado) de residuos y de material de construcción, por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente y disponer adecuadamente todos los residuos.

OTROS

MILLER MARÍN CASTELLANOS
RESIDÉNTE DE INTERVENTORIA

HARRY ARNAGO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA:	6/03/2026	**INFORME SEMANAL**	
DIAS RESTANTES	**201**		
CORTE DEL INFORME:	***7/03/2026***		

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA

Colegio Jose Maria Cordoba



pintura fachada



pintura fachada




Instalacion de vidrio en ventaneria



Demarcacion de cancha



Instalación de divisiones

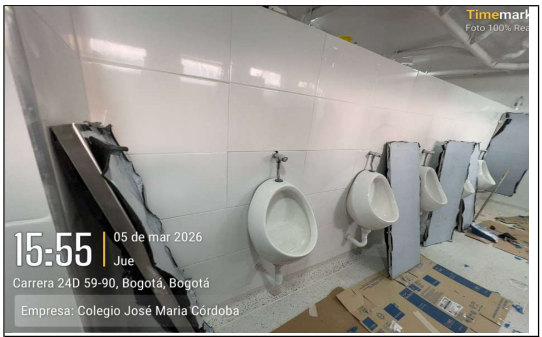


Instalación de divisiones

Colegio Rafael Uribe Uribe



Cancha

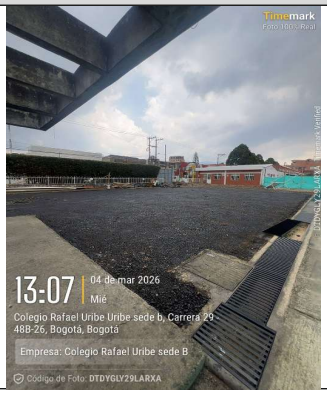

Cancha



Demolición de placa existente



Demolición de placa existente




Instalación de malla en carcamo



Instalación de malla en carcamo

Colegio Carlos arturo torres sede B

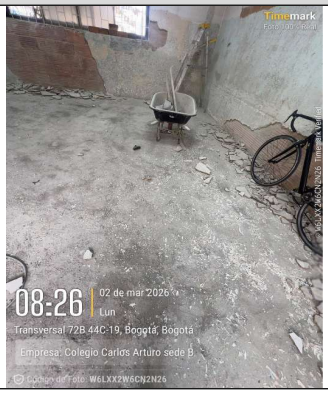

Demolicion de piso existente




Demolicion de piso existente




Rayado superficial de muro



Rayado superficial de muro

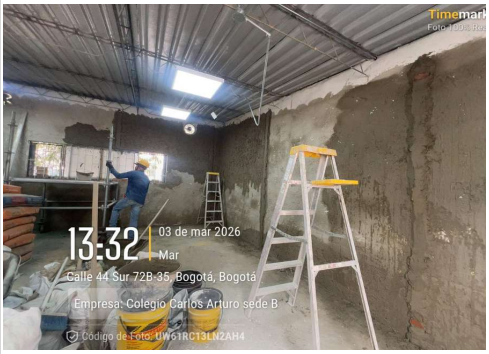


Zafarreo en muros

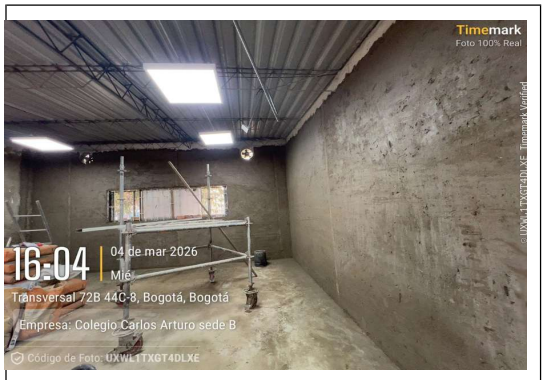


Pañete en muros


Colegio Rufino Jose Cuervo

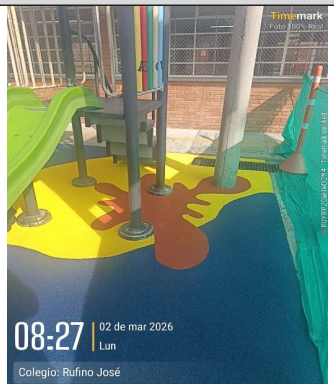

Instalaciòn Piso Chip

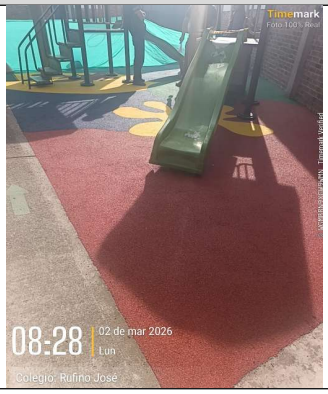


Instalaciòn Piso Chip

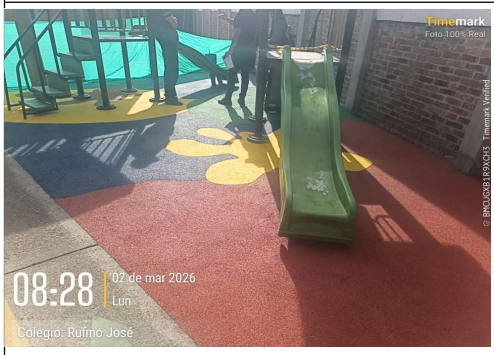


Instalaciòn Piso Chip



Instalaciòn Piso Chip

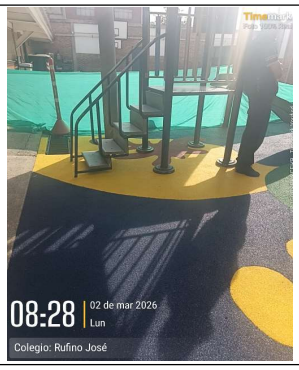

Instalaciòn Piso Chip

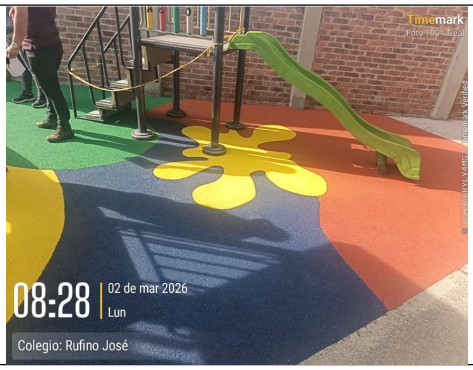


Instalaciòn Piso Chip

Colegio Carlos arturo torres sede A



Filos en entrada de baños

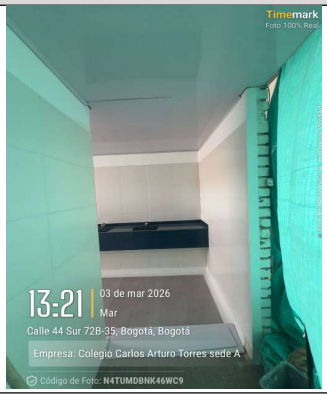

Pintura media cañas



Cerramiento en polisombra



Cerramiento en polisombra




Excavacion de zapata




Armado de acero


Colegio Fracisco miranda

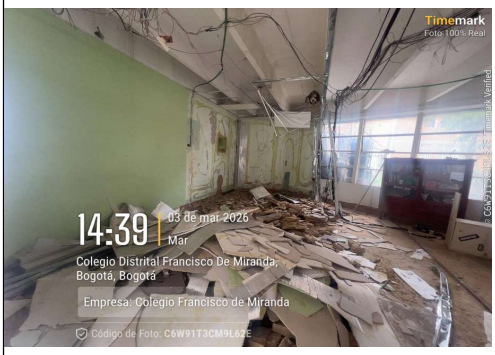

Desmonte de muros

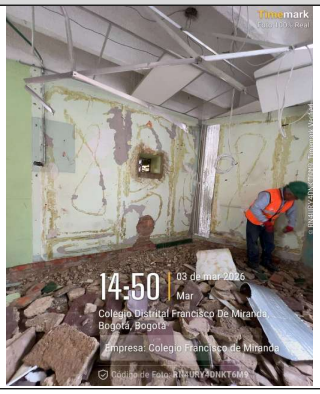

Desmonte de muros

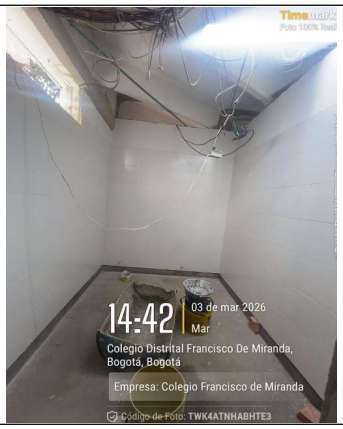


Enchape en paredes



Enchape en paredes



Demolicion piso existente

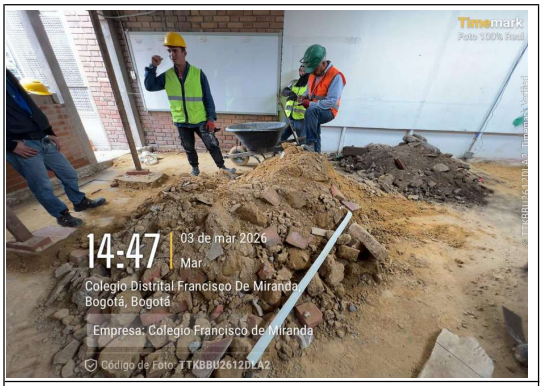

Demolicion piso existente


Emergencia Colegio OEA



Mortero reparacion



Mortero reparacion

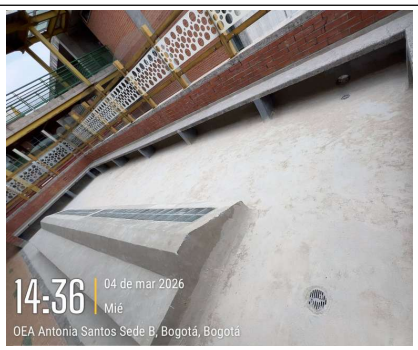


Mortero reparacion



Mortero reparacion

Emergencia Dile tunjuelito

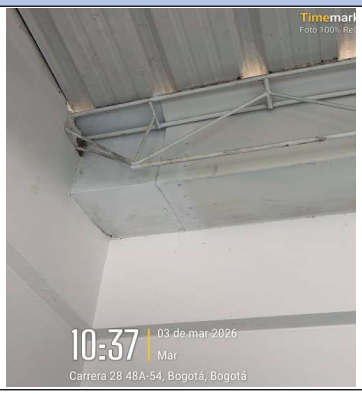

Estuco impermeabilizado



Estuco impermeabilizado



Estuco impermeabilizado



Estuco impermeabilizado

Emergencia Colegio Hernando Duran Dussan



Impermeabiliacion en cubierta



Impermeabiliacion en cubierta



Impermeabiliacion en cubierta



Impermeabiliacion en cubierta

Emergencia Colegio Castilla



Resane de techo



Resane de techo



Aseo



Aseo

FECHA:	6/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	67 Dias		GRUPO 8
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			

CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA	
7 de marzo de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169111	CO1.PCCNTR.8155154	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.497.896.864
INICIO	14 de octubre de 2025	14 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ -	$ -
TERMINACION INICIAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	PRÓRROGAS			TOTAL	$ 796.278.928,00	$ 2.497.896.864,00
TERMINACION FINAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	TOTAL	211	211			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA		OTRO ASPECTO
1					
2					
3					
4					

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE			CUMPLIMIENTO HASTA			CALIDAD DEL SERVICIO DESDE			CALIDAD DEL SERVICIO HASTA			SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE			SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA		
400-47	5	9	2025	5	10	2026	5	4	2026	5	4	2031	5	9	2025	5	4	2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE			CUMPLIMIENTO HASTA			SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE			SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA		
14-44-101244200	14	10	2025	13	1	2027	14	10	2025	14	5	2029	14	5	2025	14	5	2027

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL

POLIZA	DESDE			HASTA		
14-40-101075759	14	10	2025	14	5	20206

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (31082024)		PROGR ACOMU %	EJECUTADO VS PROG	VlrFRENTE APROBADO	VlrFRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	dic-2025	ene-2026	feb-2026	mar-2026	abr-2026	may-2026	jun-2026	jul-2026	ago-2026	sep-2026	oct-2026	nov-2026	dic-2026	ene-2027	feb-2027	mar-2027
612	RAFAEL URIBE URIBE	Tunjuelito	B	Nuestra Señora del Carmen	45,26%	45,81%	↑	46,39%	↓	$ 217.411.470,68	$ 99.594.077	3/12/2025	4/04/2026																		
829	LA FLORESTA SUR	Kennedy	A	La Floresta Sur	15,25%	15,41%	↑	17,73%	↓	$ 90.944.463,70	$ 14.015.390	3/12/2025	4/05/2026																		
601	CENTRO INTEGRAL	Tunjuelito	A	José Maria Cordoba	56,95%	58,62%	↑	63,34%	↓	$ 409.504.402,28	$ 240.033.978	4/11/2025	4/03/2026																		
849	CARLOS ARTURO	Kennedy	A	Carlos Arturo Torres y Rep de	14,42%	14,54%	↑	15,18%	↓	$ 336.209.415,91	$ 48.895.601	13/01/2026	13/04/2026																		
803	CARLOS ARTURO	Kennedy	B	Rep.de Finlandia	62,04%	63,20%	↑	63,73%	↓	$ 192.596.790,19	$ 121.725.565	4/11/2025	4/04/2026																		
816	FRANCISCO DE MIRANDA	Kennedy	A	Bas-Med. Francisco de Miranda	11,51%	14,67%	↑	14,93%	↓	$ 159.596.212,37	$ 23.414.894	13/01/2026	13/05/2026																		
617	RUFINO JOSE CUERVO	Tunjuelito	C	Nuevo Tunjuelito	55,43%	60,35%	↑	61,93%	↓	$ 127.099.272,82	$ 76.706.225	13/01/2026	13/04/2026																		
609	JOSE ANTONIO	Tunjuelito	B	San Carlos	0,00%	0,00%	→	0,00%	✓	$ 166.113.098,67		16/12/2025	15/04/2026																		
TOTAL FRENTES DE OBRA						34,08%	↑	35,40%	↓	$ 1.699.475.127	$ 624.385.729																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
878	HERNANDO DURAN	Kennedy	A	Tintalito (Hernado Duran Dusan)	38,92%	38,92%	↓	39,95%	↓	$ 19.421.103	$ 7.558.215	5/12/2025	23/12/2025																		
807	O.E.A	Kennedy	B	Antonia Santos I	42,11%	45,63%	↑	45,82%	↓	$ 40.447.661	$ 18.458.254	5/12/2025	21/12/2025																		
863	KENNEDY	Kennedy	D	Rosa María Gordillo	0,00%	0,00%	→	0,00%	✓																						
851	PROSPERO PINZON	Kennedy	A	Próspero Pinzón	0,00%	0,00%	→	0,00%	✓																						
627	D.I.L.E TUNJUELITO	Tunjuelito	A	Direccion Local De Tunjuelito	25,00%	25,00%	↓	26,13%	↓	$ 17.760.045	$ 4.439.326	12/12/20205	30/12/2025																		
826	JACKELINE	Kennedy	A	Jackeline	100,00%	100,00%	↑	100%	↓	$ 2.700.094	$ 2.700.094	9/12/20255	12/12/2025																		
818	CASTILLA	Kennedy	A	Nueva Castilla	92,15%	97,60%	↑	93%	↑	$ 27.977.146	$ 27.305.453	6/02/2026	13/02/2026																		
TOTAL FRENTES DE OBRA						43,88%	↑	43,54%	↑	$ 108.306.048	$ 60.461.341																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	7	1	8	$ 624.385.729
ACUMULADO EMERGENCIAS				
0	5	2	7	$ 60.461.341
TOTAL				
0	12	3	15	$ 684.847.070
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

AVANCE	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
	34,08%	0,00%	68,25%
PROGRAMADO	35,40%		
ATRASO	-1,33%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			

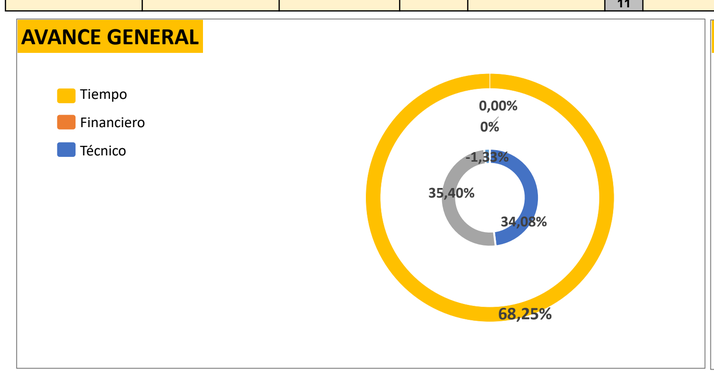







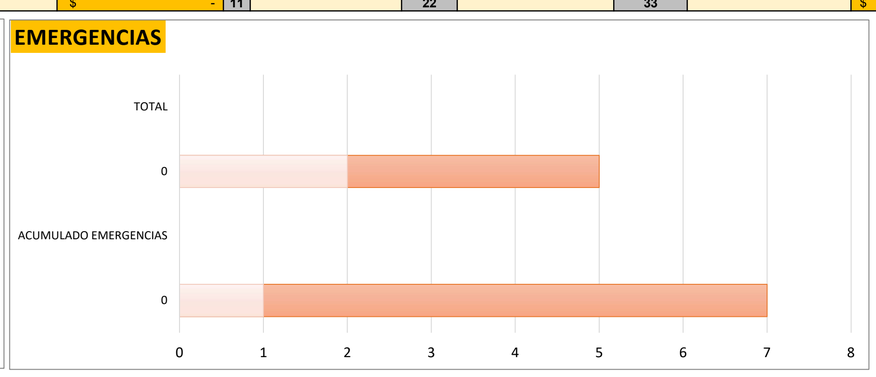




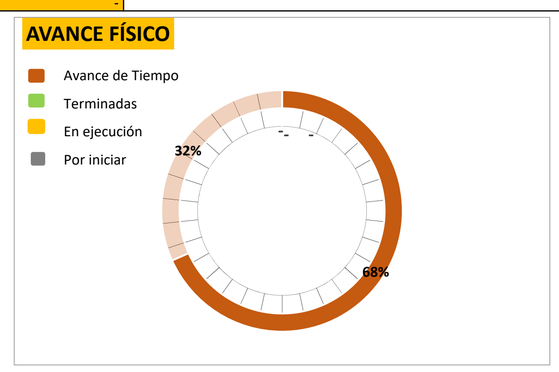


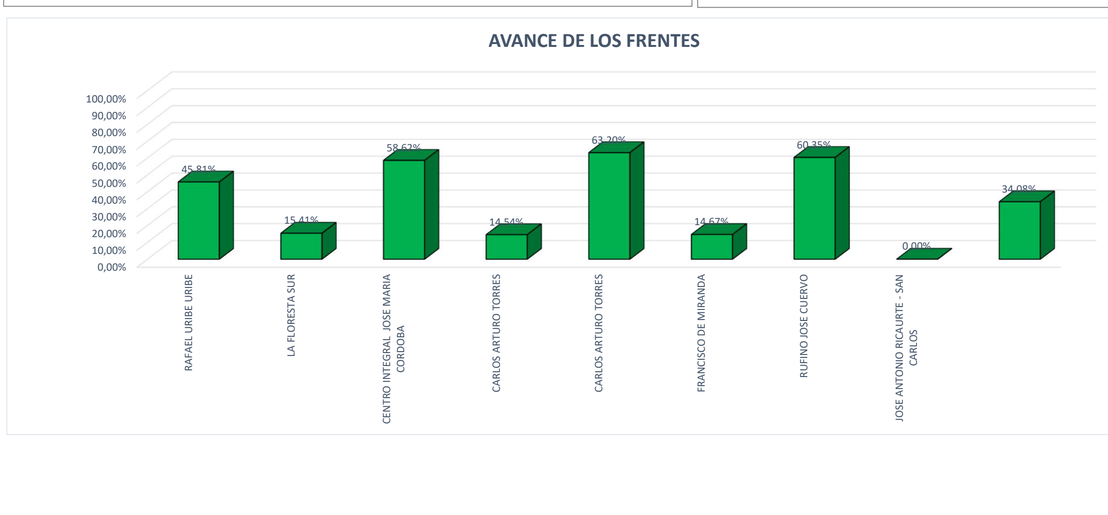

OBSERVACIONES:

FECHA: 6/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 0 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 8 0
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155154	CONTRATISTA:	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA	
7/3/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169111	INTERVENTOR:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE		ESTADO ACTUAL O FINAL
Colegio Jose Maria Cordoba	BAÑO SEGUNDO NIVEL Y FACHADA	Actividades de enchape y, destronque de pisos, media caña,Instalacion orinales, mantenimiento en ventanas y fachada, pintura fachada .				
Colegio Rafael Uribe Uribe	CANCHA	Actividades pintura interior y exterior, carcamo , compactacion material.				
Colegio Carlos Arturo Torres sede B	CANCHA	Actividades fundida de placa, demarcación de cancha e instalacion de canal,bajante y cielo raso.				
Colegio Rufino Jose Cuervo	PLACA PATIO	Actividades de Pulido de placa y rejilla en carcamo. Instalación piso chip.				
Colegio Carlos Arturo Torres sede A	BAÑOS	Actividades de instalacion de enchapes, cielo raso,unidades sanitarias, orinales.				
Colegio Francisco Miranda	BAÑOS Y CUARTO INCLUSION	Actividades de levantamiento muro y pañete, mortero en piso, enchape muros .				

Emergencia OEA	TERRAZA	Actividaes de mortero Reparacion.				
Emergencia Dile Tunjuelito	CUBIERTA	Actividades de resanes muros , instalacion canal ,pintura interior.				
Emergencia Hernando Duran Dussan	CUBIERTA	Impermeabilizacion en cubierta				
Emergencia Colegio Castilla	CUBIERTA	Reforzamiento de estructura metalica y pintura.				

BALANCE SEMANAL POR CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS

		CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			VIGENCIA	2025.00	
GRUPOS	ITEM	CPF	612	IED	RAFAEL URIBE URIBE		SEMANA				
		Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL	M	53,60	53,6		$ 30.066,00	$ 1.611.537,60	$ -	100,00%	100,00%	
	1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de intervenntorias para cubrimiento de pisos y ventanas en	M2	88,96	88,96		$ 3.395,00	$ 302.019,20	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS	M3	0,18	0,18		$ 286.958,00	$ 51.652,44	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	11,64	11,64		$ 79.342,00	$ 923.540,88	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	90,00	36,74	16,65	$ 72.193,00	$ 2.652.370,82	$ 3.844.999,18	40,82%	40,82%	
	1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A	M2	15,01	15,01		$ 21.553,00	$ 323.530,53	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.14	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	30,82	30,82		$ 155.716,00	$ 4.799.167,12	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS	M2	119,16	119,16		$ 35.518,00	$ 4.232.324,88	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS	UN	20,00	11		$ 11.566,00	$ 127.226,00	$ 104.094,00	55,00%	55,00%	
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	14,00	8		$ 7.219,00	$ 57.752,00	$ 43.314,00	57,14%	57,14%	
	1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	125,00	125		$ 4.244,00	$ 530.500,00	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.34	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	2,00	2		$ 385.556,00	$ 771.112,00	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11,48	11,48		$ 18.852,00	$ 216.420,96	$ -	100,00%	100,00%	
	1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON FLUIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	138,28	43,12		$ 16.333,00	$ 704.278,96	$ 1.554.248,28	31,18%	31,18%	
	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	4,66	4,66		$ 96.108,00	$ 447.863,28	$ -	100,00%	100,00%	
	2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	40,23	40,23		$ 183.945,00	$ 7.400.107,35	$ -	100,00%	100,00%	
	2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	22,96	22,96		$ 101.433,00	$ 2.328.901,68	$ -	100,00%	100,00%	
	2.2.10	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0,15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A	M2	13,00	0		$ 202.686,00	$ -	$ 2.634.918,00	0,00%	0,00%	
	2.3.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM. ANTICORROSIVO	M	21,56	21,56		$ 334.957,00	$ 7.221.672,92	$ -	100,00%	100,00%	
	2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM. DE 0.15 X 0.15 M	KG	286,55	50,75		$ 7.421,00	$ 376.615,75	$ 1.749.871,80	17,71%	17,71%	
	3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA. INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA	CM	312,00	312		$ 1.676,00	$ 522.912,00	$ -	100,00%	100,00%	
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	60,00	60		$ 5.814,00	$ 348.840,00	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE	UN	2,00	2		$ 163.229,00	$ 326.458,00	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE	UN	9,00	1		$ 204.593,00	$ 204.593,00	$ 1.636.744,00	11,11%	11,11%	
	5.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1-1/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y	M	96,00	96		$ 20.737,00	$ 1.990.752,00	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	M	27,10	27,1		$ 15.899,00	$ 430.862,90	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	20,00	20		$ 16.790,00	$ 335.800,00	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y	UN	8,00	8		$ 174.276,00	$ 1.394.208,00	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED D.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	UN	8,00	8		$ 241.381,00	$ 1.931.048,00	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.49	ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y ASLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS	M	96,00	96		$ 60.364,00	$ 5.794.944,00	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E= 0.10 M ESCOBEADO, INCLUYE DILATACIÓN EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	90,00	0		$ 131.783,00	$ -	$ 11.860.470,00	0,00%	0,00%	
	7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE	M2	308,00	0		$ 63.550,00	$ -	$ 19.573.400,00	0,00%	0,00%	
	7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MULTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	350,00	0		$ 19.187,00	$ -	$ 6.715.450,00	0,00%	0,00%	
	9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	10,78	10,78		$ 66.398,00	$ 715.770,44	$ -	100,00%	100,00%	
	12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	181,76	181,76		$ 34.979,00	$ 6.357.783,04	$ -	100,00%	100,00%	
	12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	39,13	39,13		$ 39.822,00	$ 1.558.234,86	$ -	100,00%	100,00%	
	12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	34,71	34,71		$ 23.852,00	$ 827.902,92	$ -	100,00%	100,00%	
	12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	186,52	186,52		$ 20.875,00	$ 3.893.605,00	$ -	100,00%	100,00%	
	12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	58,78	33,78		$ 28.786,00	$ 972.391,08	$ 719.650,00	57,47%	57,47%	
	12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	34,71	34,71		$ 20.749,00	$ 720.197,79	$ -	100,00%	100,00%	
	12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA	M	33,19	33,19		$ 8.860,00	$ 294.063,40	$ -	100,00%	100,00%	
	15.1.9	CANCHA MÚLTIPLE PARA NIÑOS PEQUEÑOS- BALONCESTO - MICROFUTBOL - INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL -	UN	1,00	0		$ 7.220.104,00	$ -	$ 7.220.104,00	0,00%	0,00%	
	16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO. ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	M2	119,16	119,16		$ 129.084,00	$ 15.381.649,44	$ -	100,00%	100,00%	
	16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO. ANTICORROSIVO Y	M2	85,15	85,15		$ 240.910,00	$ 20.513.486,50	$ -	100,00%	100,00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	408,44	0		$ 4.508,00	$ -	$ 1.841.247,52	0,00%	0,00%	
	19.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN MD-10	M3	28,00	0		$ 1.480.308,00	$ -	$ 41.448.624,00	0,00%	0,00%	
	NP5	ESCARIFICACIÓN MECÁNICA SOBRE LADRILLO O CUALQUIER SUPERFICIE EXISTENTE PARA GENERAR RUGOSIDAD Y MEJORAR LA ADHERENCIA DE MATERIALES	M2	134,58			$ 31.942,00	$ -	$ 4.298.754,36	0,00%	0,00%	PT APROBAR
	NP5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALES. CON APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO. CONFORME	M2	26,40			$ 113.512,00	$ -	$ 2.996.716,80	0,00%	0,00%	PT APROBAR
	NP9	ESCARIFICACIÓN DE LA BASE EXISTENTE AFECTADA HASTA UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE DIEZ (10) CENTÍMETROS, INCLUYENDO EL CORTE, REMOCIÓN Y	M2	321,00			$ 29.828,00	$ -	$ 9.574.788,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR

	CPF	829	IED	LA FLORESTA SUR		SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	120,00	5	5	$ 30.066,00	$ 150.330,00	$ 3.457.590,00	4,17%	4,17%	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	20,00	0	0	$ 2.402,00	$ -	$ 48.040,00	0,00%	0,00%	
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,96			$ 72.193,00	$ -	$ 141.498,28	0,00%	0,00%	
1.2.7	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	18,94			$ 112.077,00	$ -	$ 2.122.738,38	0,00%	0,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,32			$ 21.553,00	$ -	$ 6.896,96	0,00%	0,00%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	21,53			$ 28.405,00	$ -	$ 611.559,65	0,00%	0,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	9,00			$ 11.566,00	$ -	$ 104.094,00	0,00%	0,00%	
1.3.3	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN)	UN	12,38			$ 177.503,00	$ -	$ 2.197.487,14	0,00%	0,00%	
1.3.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)	M	130,00			$ 11.033,00	$ -	$ 1.434.290,00	0,00%	0,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	3,00			$ 21.111,00	$ -	$ 63.333,00	0,00%	0,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON FLUIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	72,80			$ 16.333,00	$ -	$ 1.189.042,40	0,00%	0,00%	
1.4.7	DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,40			$ 12.288,00	$ -	$ 4.915,20	0,00%	0,00%	
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	4,65			$ 130.850,00	$ -	$ 608.452,50	0,00%	0,00%	
2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJA MANUALES PARA INSTALACIONES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	7,27			$ 64.356,00	$ -	$ 467.868,12	0,00%	0,00%	
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	7,27			$ 174.968,00	$ -	$ 1.272.017,36	0,00%	0,00%	
2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	0,70			$ 1.069.032,00	$ -	$ 748.322,40	0,00%	0,00%	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	6,10			$ 101.433,00	$ -	$ 618.741,30	0,00%	0,00%	
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	7,50			$ 57.073,00	$ -	$ 428.047,50	0,00%	0,00%	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	12,50			$ 160.361,00	$ -	$ 2.004.512,50	0,00%	0,00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	44,35			$ 7.012,00	$ -	$ 310.982,20	0,00%	0,00%	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	150,00			$ 22.268,00	$ -	$ 3.340.200,00	0,00%	0,00%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	3,66			$ 141.229,00	$ -	$ 516.898,14	0,00%	0,00%	
3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	76,35			$ 9.398,00	$ -	$ 717.537,30	0,00%	0,00%	
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	76,35			$ 27.238,00	$ -	$ 2.079.621,30	0,00%	0,00%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	600,00			$ 9.705,00	$ -	$ 5.823.000,00	0,00%	0,00%	
4.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	30,50			$ 148.077,00	$ -	$ 4.516.348,50	0,00%	0,00%	
4.7.5	CAJA DE INSPECCIÓN 0.70 M X 0.70 M EN CONCRETO REFORZADO HASTA 1.50 M DE ALTURA CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M (INCLUYE ACERO)	UN	1,00			$ 2.089.737,00	$ -	$ 2.089.737,00	0,00%	0,00%	
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1,00			$ 73.531,00	$ -	$ 73.531,00	0,00%	0,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	105,00			$ 5.814,00	$ -	$ 610.470,00	0,00%	0,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	9,00			$ 122.646,00	$ -	$ 1.103.814,00	0,00%	0,00%	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	9,00			$ 204.593,00	$ -	$ 1.841.337,00	0,00%	0,00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	5,21			$ 43.769,00	$ -	$ 228.036,49	0,00%	0,00%	
7.2.20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M	3,00			$ 28.998,00	$ -	$ 86.994,00	0,00%	0,00%	
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE ISQUAS.	M2	9,50			$ 761.157,00	$ -	$ 7.230.991,50	0,00%	0,00%	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	21,53			$ 464.504,00	$ -	$ 10.000.771,12	0,00%	0,00%	
15.1.5	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO < 60 CM	M	89,77			$ 62.428,00	$ -	$ 5.604.161,56	0,00%	0,00%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, INCLUYE Y CUBRE LOS HUECOS DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	40,00			$ 8.860,00	$ -	$ 354.400,00	0,00%	0,00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE. ANDAMIO CERTIFICADO. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	14,08			$ 129.084,00	$ -	$ 1.817.502,72	0,00%	0,00%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	14,08			$ 240.910,00	$ -	$ 3.392.012,80	0,00%	0,00%	
16.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 2"x1/8" SOBRE CORREAS PARA FIJACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA	M	9,20			$ 18.402,00	$ -	$ 169.298,40	0,00%	0,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	165,49			$ 4.508,00	$ -	$ 746.028,92	0,00%	0,00%	
NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA SIMILAR A LA EXISTENTE,CONTRAMARCO EN PLATINA DE 2"1/2 X 1/4 REJILLA METÁLICA EN PLATINA DE 1,1/2 X 3/16 CON SEPARACIONES DE 3.5 CM ENTRE PLATINAS (SEPARACIONES EN REJILLA EXISTENTEY UN REFUERZO EN EL CENTRO X 40.7 M EN ÁNGULO DE 1" X 1/8,PINTURA ANTICORROSIVA ANCHO 45 CM	M	42,70	42,7	0	$ 324.708,67	$ 13.865.060,21	$ -	100,00%	100,00%	PT APROBAR
NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA REFORZADA SECCION PARQUEADERO; CONTRAMARCO EN PLATINA DE 2,1/2" X 1/4, REJILLA METÁLICA EN ÁNGULO DE 1,1/2 X 1/4 CON UNA SEPARACIÓN DE 3.5CM ENTRE ÁNGULOS,(SEPARACIONES EN REJILLA EXISTENTE),PINTURA ANTICORROSIVA. ANCHO 50CM	M	15,00			$ 449.730,19	$ -	$ 6.745.952,85	0,00%	0,00%	PT APROBAR

	CPF	601	IED	Jose María Cordoba			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	40,11	40,11		$ 30.066,00	$ 1.205.947,26	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	0,54	0,54		$ 286.958,00	$ 154.957,32	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	374,43	40,27		$ 31.500,00	$ 1.268.505,00	$ 10.526.040,00	10,76%	10,76%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E> 0.13 HASTA E< 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,85	2,85		$ 21.553,00	$ 61.426,05	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	283,41	163,41		$ 10.995,00	$ 1.796.692,95	$ 1.319.400,00	57,66%	57,66%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	40,00	0,00		$ 26.585,00	$ -	$ 1.063.400,00	0,00%	0,00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	108,04	108,04		$ 12.224,00	$ 1.320.680,96	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,55	6,55		$ 32.061,00	$ 209.999,55	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28,00	28		$ 26.367,00	$ 738.276,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,70	2,7		$ 31.476,00	$ 84.985,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERIAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	7,00	7		$ 11.566,00	$ 80.962,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	6,00	6,00		$ 7.219,00	$ 43.314,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	16,10	16,1		$ 4.244,00	$ 68.328,40	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.34	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	0		$ 385.556,00	$ -	$ 771.112,00	0,00%	0,00%	
1.2.35	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,18	0,18		$ 23.790,00	$ 4.282,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRAULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	19,50	19,5		$ 8.659,00	$ 168.850,50	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	18,00	18		$ 14.178,00	$ 255.204,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.3.2	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS. SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2	141,12	64,77	0	$ 147.193,00	$ 9.533.690,61	$ 11.238.185,55	45,90%	45,90%	
1.3.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)	M	30,00	0		$ 11.033,00	$ -	$ 330.990,00	0,00%	0,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	33,45	33,45		$ 21.111,00	$ 706.162,95	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	7,00	7		$ 36.280,00	$ 253.960,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	3,00	3		$ 16.333,00	$ 48.999,00	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0,76	0,76		$ 70.230,00	$ 53.374,80	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.9	LAVADO CON HIDROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1037,04	529,54		$ 9.398,00	$ 4.976.616,92	$ 4.769.485,00	51,06%	51,06%	
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	529,54	529,54		$ 27.238,00	$ 14.423.610,52	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	1,00	1		$ 25.481,00	$ 25.481,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	6,00	6		$ 14.486,00	$ 86.916,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	6,00	6		$ 61.400,00	$ 368.400,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	18,00	18		$ 61.400,00	$ 1.105.200,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6" (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	61,96	61,96		$ 13.297,00	$ 823.882,12	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	405,00	405		$ 5.814,00	$ 2.354.670,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	1		$ 122.646,00	$ 122.646,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	0,00	0		$ 195.138,00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	17,30	17,3		$ 22.533,00	$ 389.820,90	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	0,00	0		$ 16.790,00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø1/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCALICHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	6		$ 174.276,00	$ 1.045.656,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	6,00	6		$ 62.384,00	$ 374.304,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	374,46	40,27		$ 41.218,00	$ 1.659.848,86	$ 13.774.643,42	10,75%	10,75%	
7.1.3	ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:3	M	41,27	3,09		$ 14.910,00	$ 46.071,90	$ 569.263,80	7,49%	7,49%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO. INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	37,88	37,88		$ 203.467,00	$ 7.707.329,96	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	40,80	40,8		$ 14.858,00	$ 606.206,40	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	21,54	15,77	5	$ 63.550,00	$ 1.002.183,50	$ 366.683,50	73,21%	73,21%	
7.2.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN TABLETA ROJA 7X25 CM	M2	334,19	3,09		$ 83.679,00	$ 258.568,11	$ 27.706.116,90	0,92%	0,92%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	670,38	335,19		$ 19.187,00	$ 6.431.290,53	$ 6.431.290,53	50,00%	50,00%	
7.2.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA	M	336,19	8,08		$ 27.504,00	$ 222.232,32	$ 9.024.337,44	2,40%	2,40%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	55,34	55,34		$ 85.861,00	$ 4.751.547,74	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	102,64	102,64		$ 94.926,00	$ 9.743.204,64	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1,28	1,28	1,28	$ 451.950,00	$ 578.496,00	$ 0,00	100,00%	100,00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED. ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED).	M2	6,32	6,32		$ 1.090.099,00	$ 6.889.425,68	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	6,00	6		$ 746.496,00	$ 4.478.976,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH. ACOPLE Y SIFÓN)	UN	12,00	12		$ 391.028,00	$ 4.692.336,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	3,00	3	0	$ 32.443,00	$ 97.329,00	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20. ENTAMBORADO DE 1"	M2	5,31	5,02	5,02	$ 956.124,00	$ 4.799.742,48	$ 277.275,96	94,54%	94,54%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	3,60	2,63	2,63	$ 1.033.647,00	$ 2.718.491,61	$ 1.002.637,59	73,06%	73,06%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1020,96	728,55		$ 39.822,00	$ 29.012.318,10	$ 11.644.351,02	71,36%	71,36%	
12.1.3	PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	37,88	37,88		$ 40.967,00	$ 1.551.829,96	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	38,88	14,22		$ 12.106,00	$ 172.147,32	$ 298.533,96	36,57%	36,57%	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0.60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	959,10	959,3		$ 23.852,00	$ 22.881.223,60	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.12	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	32,94	0		$ 12.568,00	$ -	$ 413.989,92	0,00%	0,00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	37,88	37,88		$ 20.875,00	$ 790.745,00	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	33,72	33,72		$ 33.461,00	$ 1.128.304,92	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1335,28	1363,43	13,97	$ 28.786,00	$ 39.247.695,98	($10.325,90)	102,11%	102,11%	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A + 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1295,91	1295,91	92,75	$ 20.749,00	$ 26.888.836,59	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	32,94	32,94		$ 26.828,00	$ 883.714,32	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	1247,97	701,35	0	$ 23.550,00	$ 16.516.792,50	$ 12.872.901,00	56,20%	56,20%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	705,00	0		$ 8.860,00	$ -	$ 6.246.300,00	0,00%	0,00%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	7,34	0		$ 128.780,00	$ -	$ 945.245,20	0,00%	0,00%	
15.1.8	CANCHA MULTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL. - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA. - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	2,00	0		$ 12.418.656,00	$ -	$ 24.837.312,00	0,00%	0,00%	
16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	3,00	3		$ 40.429,00	$ 121.287,00	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	359,00	0		$ 4.508,00	$ -	$ 1.618.372,00	0,00%	0,00%	
NP1	DESMONTE DE ESPEJOS Y/O VIDRIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,30			$ 22.388,00	$ -	$ 118.656,40	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP3	ESCARIFICACIÓN MECÁNICA SOBRE LADRILLO O CUALQUIER SUPERFICIE EXISTENTE PARA GENERAR RUGOSIDAD Y MEJORAR LA ADHERENCIA DE MATERIALES POSTERIORES. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SUELTO.	M2	471,78			$ 31.942,00	$ -	$ 15.069.596,76	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UND	6,00			$ 1.174.105,00	$ -	$ 7.044.630,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR

	CPF	849	IED	CARLOS ARTURO TORRES SEDE A			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoria autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	57,00	0		$ 4.093,00	$ -	$ 233.301,00	0,00%	0,00%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" enclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	54,00	19,15	6	$ 30.066,00	$ 575.763,90	$ 1.047.800,10	35,46%	35,46%	
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	1,03	1,03		$ 286.958,00	$ 295.566,74	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.2	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	8,00			$ 244.462,00	$ -	$ 1.955.696,00	0,00%	0,00%	
1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	11,00			$ 113.245,00	$ -	$ 1.245.695,00	0,00%	0,00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	29,72	7,04	0	$ 31.500,00	$ 221.760,00	$ 714.420,00	23,69%	23,69%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	85,00	6,1		$ 21.553,00	$ 131.473,30	$ 1.700.531,70	7,18%	7,18%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	65,00	53,05		$ 10.995,00	$ 583.284,75	$ 131.390,25	81,62%	81,62%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	10,00			$ 26.585,00	$ -	$ 265.850,00	0,00%	0,00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	53,05	53,05		$ 12.224,00	$ 648.483,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.16	DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	14,70	0		$ 113.213,00	$ -	$ 1.664.231,10	0,00%	0,00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	38,13	7,2		$ 32.061,00	$ 230.839,20	$ 991.646,73	18,88%	18,88%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	14,00	14		$ 26.367,00	$ 369.138,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.22	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	4,00			$ 161.707,00	$ -	$ 646.828,00	0,00%	0,00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	23,70			$ 35.518,00	$ -	$ 841.776,60	0,00%	0,00%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTROS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	31,49	31,49		$ 31.476,00	$ 991.179,24	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4,00	4		$ 7.219,00	$ 28.876,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	20,00			$ 4.244,00	$ -	$ 84.880,00	0,00%	0,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERIAS HIDRAULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	65,00	17,6		$ 8.659,00	$ 152.398,40	$ 410.436,60	27,08%	27,08%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	8,00	8		$ 14.178,00	$ 113.424,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.43	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.15 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	23,70	0		$ 45.204,00	$ -	$ 1.071.334,80	0,00%	0,00%	
1.4.2	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,86	9,86	0	$ 30.684,00	$ 302.544,24	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.6	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	42,93	32,93		$ 18.061,00	$ 594.748,73	$ 180.610,00	76,71%	76,71%	
2.1.4	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	27,20	0		$ 16.333,00	$ -	$ 444.257,60	0,00%	0,00%	
2.1.7	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	5,25	0		$ 64.356,00	$ -	$ 337.869,00	0,00%	0,00%	
2.2.2	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	4,20	0		$ 174.968,00	$ -	$ 734.865,60	0,00%	0,00%	
2.2.3	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3	2,00	0,92	0,6	$ 1.069.032,00	$ 983.509,44	$ 1.154.554,56	46,00%	46,00%	
2.2.3	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3	14,00	0,42		$ 1.012.858,00	$ 425.400,36	$ 13.754.611,64	3,00%	3,00%	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	90,40	0		$ 101.433,00	$ -	$ 9.169.543,20	0,00%	0,00%	
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	52,00	0,0888		$ 57.073,00	$ 5.068,08	$ 2.962.727,92	0,17%	0,17%	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	93,70	0		$ 160.161,00	$ -	$ 15.025.825,70	0,00%	0,00%	
2.2.15	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI DE 15 CM SOBRE LAMINA COLABORANTE 2"	M2	8,30	0		$ 241.182,00	$ -	$ 2.001.810,60	0,00%	0,00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	822,31	77.304	20	$ 7.012,00	$ 542.055,65	$ 5.223.982,07	9,40%	9,40%	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM. DE 0.15 X 0.15 M	KG	544,00	0		$ 7.421,00	$ -	$ 4.037.024,00	0,00%	0,00%	
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	45,35			$ 70.230,00	$ -	$ 3.184.930,50	0,00%	0,00%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	17,35			$ 141.229,00	$ -	$ 2.450.323,15	0,00%	0,00%	
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	32,93	32,93		$ 25.481,00	$ 839.089,33	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	116,40	0		$ 19.470,00	$ -	$ 2.266.308,00	0,00%	0,00%	
4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1"	UN	63,00	3		$ 9.479,00	$ 28.437,00	$ 568.740,00	4,76%	4,76%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	6,00	6		$ 63.400,00	$ 388.400,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	9,00	9		$ 61.400,00	$ 552.600,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	2,00	2		$ 66.686,00	$ 133.372,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 1"	UN	4,00	0		$ 200.497,00	$ -	$ 801.988,00	0,00%	0,00%	
4.6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADOR MECANICO 1/2"	UN	4,00	0		$ 206.980,00	$ -	$ 827.956,00	0,00%	0,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	120,00	0		$ 5.814,00	$ -	$ 697.680,00	0,00%	0,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	0		$ 122.646,00	$ -	$ 490.584,00	0,00%	0,00%	
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	2,00			$ 28.341,00	$ -	$ 56.682,00	0,00%	0,00%	
5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	35,00			$ 9.743,00	$ -	$ 341.005,00	0,00%	0,00%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	15,00	0		$ 22.533,00	$ -	$ 337.995,00	0,00%	0,00%	
5.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	38,00	0		$ 21.721,00	$ -	$ 825.398,00	0,00%	0,00%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC, VOLTAJE 100-240V. 30.000 HORAS. TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	6,00	0		$ 62.384,00	$ -	$ 374.304,00	0,00%	0,00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0,04	M2	29,72	29,72		$ 41.218,00	$ 1.224.998,96	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.4	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0,05 M	M2	122,00			$ 39.550,00	$ -	$ 4.825.100,00	0,00%	0,00%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	49,41	32,4	32,4	$ 26.248,00	$ 850.435,20	$ 447.003,44	65,55%	65,55%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	41,08	41,08		$ 14.858,00	$ 610.366,64	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	23,09	23,09		$ 132.061,00	$ 3.049.288,49	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GIRANTO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	60,00			$ 85.861,00	$ -	$ 5.151.660,00	0,00%	0,00%	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	92,41	92,41		$ 94.926,00	$ 8.772.111,66	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA. - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	44,20	0		$ 761.157,00	$ -	$ 33.643.139,40	0,00%	0,00%	
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA. - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	48,13	0		$ 965.200,00	$ -	$ 46.455.076,00	0,00%	0,00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM. CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	4,80	4,8	0	$ 1.090.099,00	$ 5.232.475,20	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	6,00	3	0	$ 746.496,00	$ 2.239.488,00	$ 2.239.488,00	50,00%	50,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	12,00	9	0	$ 391.028,00	$ 3.519.252,00	$ 1.173.084,00	75,00%	75,00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLASTICA	UN	2,00	2	0	$ 39.750,00	$ 79.500,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	3,00	2	0	$ 32.443,00	$ 64.886,00	$ 32.443,00	66,67%	66,67%	
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTATIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	15,00	6	0	$ 945.896,00	$ 5.675.376,00	$ 8.513.064,00	40,00%	40,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20. ENTAMBORADO DE 1"	M2	5,80	0		$ 956.124,00	$ -	$ 5.545.519,20	0,00%	0,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	3,15	0		$ 1.033.647,00	$ -	$ 3.255.988,05	0,00%	0,00%	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	599,18	42,58		$ 34.979,00	$ 1.489.405,82	$ 19.460.311,40	7,11%	7,11%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	38,88			$ 12.106,00	$ -	$ 470.681,28	0,00%	0,00%	
12.1.8	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	45,00	49,61		$ 36.386,00	$ 1.805.109,46	$ (167.739,46)	110,24%	110,24%	
12.1.12	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	45,00	29,37		$ 12.568,00	$ 369.122,16	$ 196.437,84	65,27%	65,27%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	32,94	0		$ 33.461,00	$ -	$ 1.102.205,34	0,00%	0,00%	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	235,00	0		$ 28.786,00	$ -	$ 6.764.710,00	0,00%	0,00%	
12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0.61 M HASTA 1.3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	45,00	32,94		$ 26.828,00	$ 883.714,32	$ 323.545,68	73,20%	73,20%	
12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	235,00	0		$ 23.550,00	$ -	$ 5.534.250,00	0,00%	0,00%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	120,00	0		$ 8.860,00	$ -	$ 1.063.200,00	0,00%	0,00%	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR I7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35,35	31,06	0	$ 125.971,00	$ 3.912.659,26	$ 540.415,59	87,86%	87,86%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	8,25	0		$ 128.780,00	$ -	$ 1.062.435,00	0,00%	0,00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20. DESARROLLO 80 CM. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	12,20	0		$ 207.700,00	$ -	$ 1.252.940,00	0,00%	0,00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	50,00	0		$ 129.084,00	$ -	$ 6.454.200,00	0,00%	0,00%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	50,50	0		$ 240.910,00	$ -	$ 12.165.955,00	0,00%	0,00%	
16.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 2"x1/8" SOBRE CORREAS PARA FIJACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA	M	27,00	0		$ 18.402,00	$ -	$ 496.854,00	0,00%	0,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	144,00	0		$ 4.508,00	$ -	$ 649.152,00	0,00%	0,00%	
19.1.4	PODA DE ARBOLES CLASE I (H<5M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1,00	0		$ 222.701,00	$ -	$ 222.701,00	0,00%	0,00%	
19.1.5	PODA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<15M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1,00	0		$ 445.403,00	$ -	$ 445.403,00	0,00%	0,00%	
19.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMATICO CON 2 BOMBAS DE 2HP 110/220 TANQUE HIDRONEUMATICO POR MEMBRANA DE 200LTS, MARCA PEARL, TABLERO DE CONTROL CON NORMA RETIE (INCLUYE 2 BOMBAS ALTA PRESIÓN CAUDAL 2.33L9/S H.MAQ 50MT 1 TANQUE HIDROACUMULADOR MEMBRANA 200LTS VERTICAL CON MANOMETRO ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN ENTRE BOMBAS Y TANQUE EN HIERRO GALVANIZADO (HG), 1 FLAUTA DE DESCARGA EN 3" INCLUYE COPA DE DESCARGA 3 A 2, 2 REGISTROS EN BRONCE TIPO COMPUERTA, 2 VÁLVULAS CHEQUE HIDRONEUMATICO EN BRONCE, 1 TABLERO DE CONTROL EN COPRE METÁLICO CON NORMA RETIE 2- PRESOSTATOS RANGO 40/60, 1 SENSOR DE NIVEL (FLOTADOR), 1 MANOMETRO EN GLICERINA CON CARATULA DE 2" (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	UN	1,00	0		$ 18.416.383,00	$ -	$ 18.416.383,00	0,00%	0,00%	
NP1	DESMONTE DE ESPEJOS Y/O VIDRIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,00			$ 22.388,00	$ -	$ 22.388,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP2	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTENEDOR DE BASURA (INCLUYE TRANSPORTE. MONTAJE EN SITIO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO)	UND	1,00			$ 3.645.673,00	$ -	$ 3.645.673,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCERTINA SENCILLA DIÁMETRO 18" EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE O FIJACIÓN	ML	45,00			$ 116.687,00	$ -	$ 5.250.915,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UND	8,00			$ 1.174.105,00	$ -	$ 9.392.840,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR

	CPF	803	IED	CARLOS ARTURO TORRES SEDE B			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M) NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico	M	21,00	21		$ 30.066,00	$ 631.386,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorias para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	114,72	114,72		$ 3.395,00	$ 389.474,40	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,30	0		$ 72.193,00	$ -	$ 21.657,90	0,00%	0,00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	57,38	49,14	21	$ 31.500,00	$ 1.547.910,00	$ 259.560,00	85,64%	85,64%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	72,02	21,24	5	$ 10.995,00	$ 233.533,80	$ 558.326,10	29,49%	29,49%	
1.2.14	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	19,32	19,32		$ 155.716,00	$ 3.008.433,12	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,00	0		$ 32.061,00	$ -	$ 96.183,00	0,00%	0,00%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,39	2,56		$ 28.405,00	$ 72.716,80	$ 80.386,15	47,50%	47,50%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	133,62	118,83		$ 35.518,00	$ 4.220.603,94	$ 525.311,22	88,93%	88,93%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,60	86,76		$ 31.476,00	$ 2.730.857,76	$ (1.452.932,16)	213,69%	213,69%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	41,00	41		$ 11.566,00	$ 474.206,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	32,00	32		$ 7.219,00	$ 231.008,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	86,70	86,7		$ 4.244,00	$ 367.954,80	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	76,91	76,91		$ 16.333,00	$ 1.256.171,03	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	1,25	1,25		$ 64.356,00	$ 80.445,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0,00	0		$ 183.945,00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA-CONSUN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	0,35	0,16		$ 632.023,00	$ 101.123,68	$ 120.084,37	45,71%	45,71%	
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM	600,00	600		$ 1.676,00	$ 1.005.600,00	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	1,20			$ 141.229,00	$ -	$ 169.474,80	0,00%	0,00%	
3.1.8	ENCHAPE EN MAMPOSTERIA LADRILLO A LA VISTA PRENSADO LIVIANO M-02	M2	8,00	7,09		$ 78.665,00	$ 557.734,85	$ 71.585,15	88,63%	88,63%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	7,00	7		$ 122.646,00	$ 858.522,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	3		$ 163.229,00	$ 489.687,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	2		$ 147.178,00	$ 294.356,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8,00	8,00		$ 204.593,00	$ 1.636.744,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	74,40	74,4		$ 15.899,00	$ 1.182.885,60	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	59,00	4		$ 16.790,00	$ 67.160,00	$ 923.450,00	6,78%	6,78%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) +1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	26,00	26		$ 174.276,00	$ 4.531.176,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	25,00	25		$ 241.381,00	$ 6.034.525,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC, VOLTAJE 100-240V. 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	3,00	3		$ 62.384,00	$ 187.152,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0,04	M2	56,00			$ 41.218,00	$ -	$ 2.308.208,00	0,00%	0,00%	
7.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN GRAVILLA LAVADA MONA. INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M2	1.68	1.68		$ 120.329,00	$ 202.152,72	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	280,00	0		$ 63.550,00	$ -	$ 17.794.000,00	0,00%	0,00%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRAFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX+0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	219,00	0		$ 19.187,00	$ -	$ 4.201.953,00	0,00%	0,00%	
7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45.845. INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	56,00			$ 121.598,00	$ -	$ 6.811.328,00	0,00%	0,00%	
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	76,91	76,91		$ 25.380,00	$ 1.951.975,80	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO. PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	3,00	0		$ 738.943,00	$ -	$ 2.216.829,00	0,00%	0,00%	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	2,57	0		$ 464.504,00	$ -	$ 1.193.775,28	0,00%	0,00%	
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 1/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2	2,57	0		$ 332.771,00	$ -	$ 855.221,47	0,00%	0,00%	
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO). DESMONTABLE PARA LIMPIEZA. INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	10,69	5,4		$ 66.398,00	$ 358.549,20	$ 351.245,42	50,51%	50,51%	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1-6. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	65,00	43,77	41,77	$ 34.979,00	$ 1.531.030,83	$ 742.604,17	67,34%	67,34%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1-4 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	107,94	40,6		$ 39.822,00	$ 1.616.773,20	$ 2.681.613,48	37,61%	37,61%	
12.1.4	PAÑETE LISO 1-4 CON ESTUCO PLASTICO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0,90	0,9		$ 43.242,00	$ 38.917,80	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	65,00	0		$ 12.106,00	$ -	$ 786.890,00	0,00%	0,00%	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1-4 HASTA 0.60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	54,50	4,5		$ 23.852,00	$ 107.334,00	$ 1.192.600,00	8,26%	8,26%	
12.1.13	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1-4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	4,50	4,5		$ 7.804,00	$ 35.118,00	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	65,00	0		$ 20.875,00	$ -	$ 1.356.875,00	0,00%	0,00%	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	4,50	4,5		$ 16.631,00	$ 74.839,50	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	159,04	39,04		$ 28.786,00	$ 1.123.805,44	$ 3.454.320,00	24,55%	24,55%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	88,85	0		$ 8.860,00	$ -	$ 787.211,00	0,00%	0,00%	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 CS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	90,00	86,76		$ 125.971,00	$ 10.929.243,96	$ 408.146,04	96,40%	96,40%	
15.1.8	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACION)	UN	1,00	0		$ 12.418.656,00	$ -	$ 12.418.656,00	0,00%	0,00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	86,00	76,91		$ 102.700,00	$ 7.898.657,00	$ 933.543,00	89,43%	89,43%	
16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	15,85	15,85		$ 68.873,00	$ 1.091.637,05	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE. ANDAMIO CERTIFICADO. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	133,62	118,83		$ 129.084,00	$ 15.339.051,72	$ 1.909.152,36	88,93%	88,93%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	86,08	71,3		$ 240.910,00	$ 17.176.883,00	$ 3.560.649,80	82,83%	82,83%	
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	7,80	7,8		$ 187.010,00	$ 1.458.678,00	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	310,00	0		$ 4.508,00	$ -	$ 1.397.480,00	0,00%	0,00%	
19.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN MD-10	M3	19,32	19,32		$ 1.480.308,00	$ 28.599.550,56	$ -	100,00%	100,00%	
NP3	ESCARIFICACIÓN MECÁNICA SOBRE LADRILLO O CUALQUIER SUPERFICIE EXISTENTE PARA GENERAR RUGOSIDAD Y MEJORAR LA ADHERENCIA DE MATERIALES POSTERIORES. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SUELTO.	M2	66,24			$ 31.942,00	$ -	$ 2.115.838,08	0,00%	0,00%	PT APROBAR

	CPF	816	IED	FRANCISCO DE MIRANDA			SEMANA				
	Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	55,00	11,6		$ 30.066,00	$ 348.765,60	$ 1.304.864,40	21,09%	21,09%	
1.2.7	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.09	0		$ 112.077.00	$ -	$ 1.242.933.93	0.00%	0.00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67,01	64	0	$ 31.500,00	$ 2.016.000,00	$ 94.815,00	95,51%	95,51%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	70,99	70,99		$ 21.553,00	$ 1.530.047,47	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	70,62	0		$ 10.995,00	$ -	$ 776.466,90	0,00%	0,00%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20,95	0		$ 26.585,00	$ -	$ 556.955,75	0,00%	0,00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	47,06	43,57		$ 12.224,00	$ 532.599,68	$ 42.661,76	92,58%	92,58%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12,98	5,81		$ 32.061,00	$ 186.274,41	$ 229.877,37	44,76%	44,76%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	24,87	1,44		$ 28.405,00	$ 40.903,20	$ 665.529,15	5,79%	5,79%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	6,00	6		$ 26.367,00	$ 158.202,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	2,50	0		$ 20.015,00	$ -	$ 50.037,50	0,00%	0,00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	43,34	0		$ 35.518,00	$ -	$ 1.539.350,12	0,00%	0,00%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	61,88	56,88	5,88	$ 31.476,00	$ 1.790.354,88	$ 157.380,00	91,92%	91,92%	
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	30,73	30,73	0	$ 24.868,00	$ 764.193,64	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.26	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	11,25	0		$ 22.452,00	$ -	$ 252.585,00	0,00%	0,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11,00	11	6	$ 11.566,00	$ 127.226,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	4.15	0		$ 9.069.00	$ -	$ 37.636.35	0.00%	0.00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	13.00	9	4	$ 7.219.00	$ 64.971.00	$ 28.876.00	69.23%	69.23%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	33.00	0		$ 4.244.00	$ -	$ 140.052.00	0.00%	0.00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	9,00	0		$ 8.659,00	$ -	$ 77.931,00	0,00%	0,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	4,00	4		$ 14.178,00	$ 56.712,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	22,00	0		$ 21.111,00	$ -	$ 464.442,00	0,00%	0,00%	
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	15,00	0		$ 18.061,00	$ -	$ 270.915,00	0,00%	0,00%	
1.4.3	DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M	13,40	0		$ 4.147,00	$ -	$ 55.569,80	0,00%	0,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	45,40	0		$ 16.333,00	$ -	$ 741.518,20	0,00%	0,00%	
2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	14,13	0		$ 64.356,00	$ -	$ 909.350,28	0,00%	0,00%	
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	14,13	0		$ 174.968,00	$ -	$ 2.472.297,84	0,00%	0,00%	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	10,15	4,25		$ 101.433,00	$ 431.090,25	$ 598.454,70	41,87%	41,87%	
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	43.40	8.72		$ 57.073.00	$ 497.676.56	$ 1.979.291.64	20.09%	20.09%	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	28.09	0		$ 160.361.00	$ -	$ 4.504.540.49	0.00%	0.00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	130.56	107.93		$ 7.012.00	$ 756.805.16	$ 158.681.56	82.67%	82.67%	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	30.48	30.48		$ 63.196.00	$ 1.926.214.08	$ -	100.00%	100.00%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	14.22	4.9		$ 141.229.00	$ 692.022.10	$ 1.316.254.28	34.46%	34.46%	
3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	38.44	0		$ 9.398.00	$ -	$ 361.259.12	0.00%	0.00%	
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	38,44	0		$ 27.238,00	$ -	$ 1.047.028,72	0,00%	0,00%	
3.2.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	M	1.20	1.2		$ 40.794.00	$ 48.952.80	$ -	100.00%	100.00%	
4.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	30.00	0		$ 148.077.00	$ -	$ 4.442.310.00	0.00%	0.00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	15.00	9.64		$ 88.516.00	$ 853.294.24	$ 474.445.76	64.27%	64.27%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	10,00	3,46		$ 49.410,00	$ 170.958,60	$ 323.141,40	34,60%	34,60%	
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	4,00	0		$ 135.539,00	$ -	$ 542.156,00	0,00%	0,00%	
4.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4'' INCLUYE ACCESORIOS	M	50,00	0		$ 14.332,00	$ -	$ 716.600,00	0,00%	0,00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	5,00	0		$ 61.400,00	$ -	$ 307.000,00	0,00%	0,00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	4,00	0		$ 61.400,00	$ -	$ 245.600,00	0,00%	0,00%	
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	4,00	4		$ 175.735,00	$ 702.940,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	3.00	3		$ 94.029,00	$ 282.087,00	$ -	100.00%	100.00%	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	2.00	0		$ 66.686.00	$ -	$ 133.372.00	0.00%	0.00%	
4.7.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00	1		$ 846.541.00	$ 846.541.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1.00	0		$ 73.531.00	$ -	$ 73.531.00	0.00%	0.00%	
4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	1.00	0		$ 176.353.00	$ -	$ 176.353.00	0.00%	0.00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	30.00	0		$ 5.814.00	$ -	$ 174.420.00	0.00%	0.00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	0		$ 122.646,00	$ -	$ 490.584,00	0,00%	0,00%	
5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	0		$ 195.138,00	$ -	$ 585.414,00	0,00%	0,00%	
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1-1/2" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	15,00	0		$ 23.281,00	$ -	$ 349.215,00	0,00%	0,00%	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	15.00	0		$ 16.790.00	$ -	$ 251.850.00	0.00%	0.00%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	0		$ 174.276,00	$ -	$ 1.045.656,00	0,00%	0,00%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V. 30.000 HORAS. TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	6,00	0		$ 62.384,00	$ -	$ 374.304,00	0,00%	0,00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	64.00	60.00	20	$ 41.218.00	$ 2.473.080.00	$ 164.872.00	93.75%	93.75%	
7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	77,16	0		$ 121.988,00	$ -	$ 9.412.594,08	0,00%	0,00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	20,00	0		$ 14.858,00	$ -	$ 297.160,00	0,00%	0,00%	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	18,60	49,7	39,7	$ 94.926,00	$ 4.717.822,20	$ (2.952.198,60)	267,20%	267,20%	
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	3,90	0		$ 761.157,00	$ -	$ 2.968.512,30	0,00%	0,00%	
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	2,52	0		$ 801.420,00	$ -	$ 2.019.578,40	0,00%	0,00%	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS. ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	6,00	0		$ 464.504,00	$ -	$ 2.787.024,00	0,00%	0,00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM. CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	5,00	0		$ 1.090.099,00	$ -	$ 5.450.495,00	0,00%	0,00%	
10.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)	UN	1,00	0		$ 762.932,00	$ -	$ 762.932,00	0,00%	0,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	4,00	0		$ 391.028,00	$ -	$ 1.564.112,00	0,00%	0,00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2,00	0		$ 746.496,00	$ -	$ 1.492.992,00	0,00%	0,00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2,00	0		$ 39.750,00	$ -	$ 79.500,00	0,00%	0,00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2,00	0		$ 32.443,00	$ -	$ 64.886,00	0,00%	0,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	23,25	0		$ 956.124,00	$ -	$ 22.229.883,00	0,00%	0,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1,44	0		$ 1.033.647,00	$ -	$ 1.488.451,68	0,00%	0,00%	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	192.92	40	5	$ 34.979.00	$ 1.399.160.00	$ 5.348.988.68	20.73%	20.73%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	192.20	0		$ 12.106.00	$ -	$ 2.326.773.20	0.00%	0.00%	
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A .60 CM	M	30.95	0		$ 9.831.00	$ -	$ 304.269.45	0.00%	0.00%	
12.1.8	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	36,95	0		$ 36.386,00	$ -	$ 1.344.462,70	0,00%	0,00%	
12.1.10	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	225,67	0		$ 12.606,00	$ -	$ 2.844.796,02	0,00%	0,00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	212,92	0		$ 20.875,00	$ -	$ 4.444.705,00	0,00%	0,00%	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	36,95	0		$ 16.631,00	$ -	$ 614.515,45	0,00%	0,00%	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	72,56	0		$ 125.971,00	$ -	$ 9.140.455,76	0,00%	0,00%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	4,32	0		$ 128.780,00	$ -	$ 556.329,60	0,00%	0,00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	13,40	0		$ 102.700,00	$ -	$ 1.376.180,00	0,00%	0,00%	
16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2.50	0		$ 68.873.00	$ -	$ 172.182.50	0.00%	0.00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE. ANDAMIO CERTIFICADO. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	89,34	0		$ 129.084,00	$ -	$ 11.532.364,56	0,00%	0,00%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	41,67	0		$ 240.910,00	$ -	$ 10.038.719,70	0,00%	0,00%	
16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	12,00	0		$ 40.429,00	$ -	$ 485.148,00	0,00%	0,00%	
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	4,30	0		$ 187.010,00	$ -	$ 804.143,00	0,00%	0,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	145,50	0		$ 4.508,00	$ -	$ 655.914,00	0,00%	0,00%	
NP1	DESMONTE DE ESPEJOS Y/O VIDRIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,5			$ 22.388,00	$ -	$ 55.970,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UND	5			$ 1.174.105,00	$ -	$ 5.870.525,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR

	CPF	617	IED	RUFINO JOSE CUERVO SEDE C			SEMANA				
	Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	8,40	8,4		$ 30.066,00	$ 252.554,40	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	160,53	160,53		$ 3.395,00	$ 544.999,35	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	171,54	160,53		$ 79.342,00	$ 12.736.771,26	$ 873.555,42	93,58%	93,58%	
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0.08 A 0.10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1.96	0		$ 72.193.00	$ -	$ 141.498.28	0.00%	0.00%	
1.3.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)	M	1,50	1,5		$ 11.033,00	$ 16.549,50	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	150.00	135		$ 16.333.00	$ 2.204.955.00	$ 244.995.00	90.00%	90.00%	
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	68.77	64.21		$ 130.850.00	$ 8.401.878.50	$ 596.676.00	93.37%	93.37%	
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO. EXTENDIDO. NIVELACIÓN. HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	64.21	64.21		$ 174.968.00	$ 11.234.695.28	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	0,70	0		$ 1.069.032,00	$ -	$ 748.322,40	0,00%	0,00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	10,00	0		$ 7.012,00	$ -	$ 70.120,00	0,00%	0,00%	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	431,81	431,81		$ 7.421,00	$ 3.204.462,01	$ -	100,00%	100,00%	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	150,00	0		$ 22.268,00	$ -	$ 3.340.200,00	0,00%	0,00%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	600,00	0		$ 9.705,00	$ -	$ 5.823.000,00	0,00%	0,00%	
4.7.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00	1		$ 1.137.300,00	$ 1.137.300,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	63.60	3.6		$ 43.769.00	$ 157.568.40	$ 2.626.140.00	5.66%	5.66%	
7.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI. E= 0.10 M ESCOBEADO. INCLUYE DILATACIÓN EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	160.53	160.53		$ 131.783.00	$ 21.155.124.99	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	24,56	24,56	12,56	$ 498.089,00	$ 12.233.065,84	$ (0,00)	100,00%	100,00%	SE SUBIO LA CANTIDAD CONTRATADA
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	220,53	0		$ 63.550,00	$ -	$ 14.014.681,50	0,00%	0,00%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	495.19	0		$ 19.187.00	$ -	$ 9.501.210.53	0.00%	0.00%	
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	150.00	135		$ 25.380.00	$ 3.426.300.00	$ 380.700.00	90.00%	90.00%	
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5". TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE	M2	8.20	0		$ 761.157.00	$ -	$ 6.241.487.40	0.00%	0.00%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	40,00	0		$ 8.860,00	$ -	$ 354.400,00	0,00%	0,00%	
15.1.3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	8.20	0		$ 126.933.00	$ -	$ 1.040.850.60	0.00%	0.00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE. ANDAMIO CERTIFICADO. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	9,68	0		$ 129.084,00	$ -	$ 1.249.533,12	0,00%	0,00%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	9,68	0		$ 240.910,00	$ -	$ 2.332.008,80	0,00%	0,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	160,53	0		$ 4.508,00	$ -	$ 723.669,24	0,00%	0,00%	

	CPF	609	IED	JOSE ANTONIO SAN CARLOS SEDE B			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	150,00			$ 30.066,00	$ -	$ 4.509.900,00	0,00%	0,00%	
1.2.7	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	35,00			$ 112.077,00	$ -	$ 3.922.695,00	0,00%	0,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	18,00			$ 21.553,00	$ -	$ 387.954,00	0,00%	0,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8,00			$ 11.566,00	$ -	$ 92.528,00	0,00%	0,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	30,00			$ 4.244,00	$ -	$ 127.320,00	0,00%	0,00%	
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	20,00			$ 18.061,00	$ -	$ 361.220,00	0,00%	0,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	70,00			$ 16.333,00	$ -	$ 1.143.310,00	0,00%	0,00%	
2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12,25			$ 64.356,00	$ -	$ 788.361,00	0,00%	0,00%	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	17,50			$ 160.161,00	$ -	$ 2.806.317,50	0,00%	0,00%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	17,53			$ 141.229,00	$ -	$ 2.475.744,37	0,00%	0,00%	
3.1.9	LAVADO CON HIDROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17,53			$ 9.398,00	$ -	$ 164.746,94	0,00%	0,00%	
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	17,53			$ 27.238,00	$ -	$ 477.482,14	0,00%	0,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8,00			$ 122.646,00	$ -	$ 981.168,00	0,00%	0,00%	
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A.C SCH-40 DE 3"	M	170,00			$ 197.464,00	$ -	$ 33.568.880,00	0,00%	0,00%	
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACESORIO RANURADO DE 3"	UN	4,00			$ 134.072,00	$ -	$ 536.288,00	0,00%	0,00%	
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING FLEXIBLE 3"	UN	4,00			$ 36.400,00	$ -	$ 145.600,00	0,00%	0,00%	
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON 2" RANURADO	UN	2,00			$ 23.876,00	$ -	$ 47.752,00	0,00%	0,00%	
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC - C900 DE 4"	M	165,00			$ 286.069,00	$ -	$ 47.201.385,00	0,00%	0,00%	
6.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTOR DE MOVIMIENTO TUBERIA Y ACCESORIO 4"	UN	25,00			$ 481.464,00	$ -	$ 12.036.600,00	0,00%	0,00%	
6.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN PVC-C900-ACERO CARBON DE 4"	UN	2,00			$ 977.178,00	$ -	$ 1.954.356,00	0,00%	0,00%	
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III	UN	1,00			$ 1.393.926,00	$ -	$ 1.393.926,00	0,00%	0,00%	
6.1.9	ACCESORIOS SCH40 4" RANURADOS 300 PSI SUMINISTROS E INSTALACIÓN	UN	10,00			$ 143.998,00	$ -	$ 1.439.980,00	0,00%	0,00%	
6.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN 3"	UN	3,00			$ 2.923.921,00	$ -	$ 8.771.763,00	0,00%	0,00%	
6.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE TRANSICIÓN C-900 4" ACERO - PVC	UN	3,00			$ 1.234.058,00	$ -	$ 3.702.174,00	0,00%	0,00%	
6.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC - C900 DE 4"	UN	16,00			$ 954.952,00	$ -	$ 15.279.232,00	0,00%	0,00%	
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC - C900 DE 4"	UN	4,00			$ 1.011.027,00	$ -	$ 4.044.108,00	0,00%	0,00%	
6.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SCH 10 ROJA DE 2"RANURADA	M	80,00			$ 117.592,00	$ -	$ 14.207.360,00	0,00%	0,00%	
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	3,60			$ 787.438,00	$ -	$ 2.834.776,80	0,00%	0,00%	
10.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	300,00			$ 4.508,00	$ -	$ 1.352.400,00	0,00%	0,00%	

	CPF	609	IED	EMERGENCIA JACKELIN			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	10,00	10	10	$ 30.066,00	$ 300.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	100,00	100	100	$ 4.508,00	$ 450.800,00	$ -	100,00%	100,00%	
	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1,00	1	1	$ 1.948.634,00	$ 1.948.634,00	$ -	100,00%	100,00%	

	CPF	609	IED	EMERGENCIA OEA			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	10,00	10	0	$ 30.066,00	$ 300.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	31,59	30	0	$ 31.500,00	$ 945.000,00	$ 50.085,00	94,97%	94,97%	
	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16,41	18,45	0	$ 10.995,00	$ 202.857,75	$ (22.429,80)	112,43%	112,43%	
	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2	31,59	0	0	$ 127.792,00	$ -	$ 4.036.949,28	0,00%	0,00%	
	RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	M2	16,41	0	0	$ 136.965,00	$ -	$ 2.247.595,65	0,00%	0,00%	
	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	10,00	10	0	$ 5.814,00	$ 58.140,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	31,59	32,68	0	$ 43.769,00	$ 1.430.370,92	$ (47.708,21)	103,45%	103,45%	
	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	31,59	0	0	$ 72.800,00	$ -	$ 2.299.752,00	0,00%	0,00%	
	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	16,00	29,34	0	$ 26.248,00	$ 770.116,32	$ (150.148,32)	183,38%	183,38%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	31,59	40	0	$ 74.985,00	$ 2.999.400,00	$ (630.623,85)	126,62%	126,62%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	50,90	10	0	$ 25.380,00	$ 253.800,00	$ 1.038.042,00	19,65%	19,65%	
	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	16,41	10	0	$ 36.386,00	$ 363.860,00	$ 233.234,26	60,94%	60,94%	
	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	54,00	10	0	$ 28.786,00	$ 287.860,00	$ 1.266.584,00	18,52%	18,52%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD ESPESOR 10 MM CON SANBLASTING TIPO PERSIANA	M2	0,80	0	0	$ 262.754,00	$ -	$ 210.203,20	0,00%	0,00%	
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	40,00	32	0	$ 40.429,00	$ 1.293.728,00	$ 323.432,00	80,00%	80,00%	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	14,56	5	0	$ 24.883,00	$ 124.415,00	$ 237.881,48	34,34%	34,34%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	31,59	0	0	$ 4.508,00	$ -	$ 142.407,72	0,00%	0,00%	
				0	0						
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	10,00	0	0	$ 30.066,00	$ -	$ 300.660,00	0,00%	0,00%	
	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,88	0	0	$ 21.852,00	$ -	$ 215.897,76	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	9,88	0	0	$ 203.467,00	$ -	$ 2.009.256,97	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO H=10 CM, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	93,07	0	0	$ 83.512,00	$ -	$ 7.772.461,84	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIA CAÑA EN FIBRA DE VIDRIO	M	95,50	0	0	$ 22.997,00	$ -	$ 2.196.213,50	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC. ANCHO 10 CM	M	93,07	110	0	$ 23.735,00	$ 3.085.550,00	$ (876.533,55)	139,68%	139,68%	
	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	27,42	75,11	0	$ 67.537,00	$ 5.072.704,07	$ (3.220.731,47)	273,91%	273,91%	
	PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	37,30	6	0	$ 40.967,00	$ 245.802,00	$ 1.282.131,91	16,09%	16,09%	ESTUCO
	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	37,30	6	0	$ 20.875,00	$ 125.250,00	$ 653.318,61	16,09%	16,09%	EPOXICA
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	30,00	20	0	$ 40.429,00	$ 808.580,00	$ 404.290,00	66,67%	66,67%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	68,02	20	0	$ 4.508,00	$ 90.160,00	$ 216.467,96	29,40%	29,40%	

	CPF	609	IED	EMERGENCIA DILE TUNJUELITO			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	25,00	0	0	$ 30.066,00	$ -	$ 751.650,00	0,00%	0,00%	
	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	20,00	0,8	0	$ 72.193,00	$ 57.754,40	$ 1.386.105,60	4,00%	4,00%	
	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	20,00	5	0	$ 20.015,00	$ 100.075,00	$ 300.225,00	25,00%	25,00%	
	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	3,00	3	0	$ 9.069,00	$ 27.207,00	$ -	100,00%	100,00%	
	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	5,00	0	0	$ 18.061,00	$ -	$ 90.305,00	0,00%	0,00%	
	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12,00	12	0	$ 16.333,00	$ 195.996,00	$ -	100,00%	100,00%	
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,88	0,88	0	$ 96.108,00	$ 84.575,04	$ (480,54)	100,57%	100,57%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0,25	0	0	$ 183.945,00	$ -	$ 45.986,25	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	5,00	2,55	0	$ 334.957,00	$ 854.140,35	$ 820.644,65	51,00%	51,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	2,00	0	0	$ 7.012,00	$ -	$ 14.024,00	0,00%	0,00%	
	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2	90,00	80	0	$ 14.353,00	$ 1.148.240,00	$ 143.530,00	88,89%	88,89%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO). DESMONTABLE PARA LIMPIEZA. INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	30,10	0	0	$ 66.398,00	$ -	$ 1.998.579,80	0,00%	0,00%	
	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	90,00	20	0	$ 20.875,00	$ 417.500,00	$ 1.461.250,00	22,22%	22,22%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	3,00	3	0	$ 319.199,00	$ 957.597,00	$ -	100,00%	100,00%	
	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20,00	5	0	$ 68.873,00	$ 344.365,00	$ 1.033.095,00	25,00%	25,00%	
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	120,00	4	0	$ 40.429,00	$ 161.716,00	$ 4.689.764,00	3,33%	3,33%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	150,00	20	0	$ 4.508,00	$ 90.160,00	$ 586.040,00	13,33%	13,33%	

	CPF	609	IED	EMERGENCIA HERNANDO DURAN DUSSAN			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	10,00	0	0	$ 30.066,00	$ -	$ 300.660,00	0,00%	0,00%	
	DEMOLICIÓN DE AJUSTADO DE PISO E= 0.01 A 0.05 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	49,00	0	0	$ 6.953,00	$ -	$ 340.697,00	0,00%	0,00%	
	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	49,00	60	0	$ 18.852,00	$ 1.131.120,00	$ (207.372,00)	122,45%	122,45%	
	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2	49,00	0	0	$ 127.792,00	$ -	$ 6.261.808,00	0,00%	0,00%	
	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	50,00	0	0	$ 5.814,00	$ -	$ 290.700,00	0,00%	0,00%	
	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO). INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	49,00	0	0	$ 72.800,00	$ -	$ 3.567.200,00	0,00%	0,00%	
	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	35,00	0	0	$ 26.248,00	$ -	$ 918.680,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	35,00	0	0	$ 25.180,00	$ -	$ 888.300,00	0,00%	0,00%	
	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	8,75	0	0	$ 39.822,00	$ -	$ 348.442,50	0,00%	0,00%	
	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	49,00	60	0	$ 97.011,00	$ 5.820.660,00	$ (1.067.121,00)	122,45%	122,45%	
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	15,00	15	0	$ 40.429,00	$ 606.435,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	49,00	0	0	$ 4.508,00	$ -	$ 220.892,00	0,00%	0,00%	

	CPF	609	IED	EMERGENCIA COLEGIO CASTILLA			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	57,00	0	0	$ 3.395,00	$ -	$ 193.515,00	0,00%	0,00%	
	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,00	1	0	$ 21.553,00	$ 21.553,00	$ 21.553,00	50,00%	50,00%	
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	57,00	60	0	$ 35.518,00	$ 2.131.080,00	$ (106.554,00)	105,26%	105,26%	
	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1,00	0	0	$ 11.566,00	$ -	$ 11.566,00	0,00%	0,00%	
	DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M	24,09	0	0	$ 4.147,00	$ -	$ 103.633,53	0,00%	0,00%	
	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	2,01	1	0	$ 141.229,00	$ 141.229,00	$ 142.641,29	49,75%	49,75%	
	EMBOQUILLADO DE LADRILLO A LA VISTA EN ALTURA MENOR A 1.50 M CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	2,01	1	0	$ 25.645,00	$ 25.645,00	$ 25.901,45	49,75%	49,75%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM	450,00	0	0	$ 1.676,00	$ -	$ 754.200,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	47,32	53,82	0	$ 8.860,00	$ 476.845,20	$ (57.590,00)	113,74%	113,74%	
	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	33,60	15	0	$ 102.700,00	$ 1.540.500,00	$ 1.910.220,00	44,64%	44,64%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLÚCIDO BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	57,00	60	0	$ 224.940,00	$ 13.496.400,00	$ (674.820,00)	105,26%	105,26%	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	24,99	0	0	$ 24.883,00	$ -	$ 621.826,17	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	28,50	36,33	0	$ 240.910,00	$ 8.752.260,30	$ (1.886.325,30)	127,47%	127,47%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	57,00	60	0	$ 4.508,00	$ 270.480,00	$ (13.524,00)	105,26%	105,26%	
	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	10,00	60	0	$ 7.491,00	$ 449.460,00	$ (374.550,00)	600,00%	600,00%	

FECHA:	13/03/2026	**INFORME SEMANAL**	
DIAS RESTANTES	**60**		
CORTE DEL INFORME:	***14/03/2026***		

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SEMANA N°	18	**DEL**	8-mar-26	**AL**	14-mar-26

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.8169111	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.8155154
Fecha de Iniciación	14/10/2025	**Fecha de Iniciación**	14/10/2025
Fecha de Terminación	13/05/2026	**Fecha de Terminación**	13/05/2026
Plazo Inicial	7 MESES	**Plazo Inicial**	7 MESES
Valor inicial	$ 796.278.928,00	**Valor inicial**	$ 2.497.896.864,00
Adiciones	0	**Adiciones**	0
Prorroga	N.A.	**Prorroga**	N.A.
Suspensión	N.A.	**Suspensión**	N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES
No.	**FRENTE**	PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	PROGRAMADO ACUM	EJECUTADO ACUM	DESVIACIÓN	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**
1	RAFAEL URIBE URIBE	46,39%	45,81%	48,06%	47,98%	-0,08%	Actividades de placa de placa , retiro manual de area carcamo.
2	LA FLORESTA SUR	17,73%	15,41%	17,61%	16,69%	-0,92%	Actividades de instalacion de rejilla carcamo y limpieza de cancha.
3	CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA	63,34%	58,62%	59,11%	58,98%	-0,13%	Actividades de piintura de fachada, delineacion cancha, desmonte tableta piso tarima .
4	CARLOS ARTURO TORRES	15,18%	14,54%	15,28%	15,15%	-0,14%	Actividades de zapatas, armado de refuerzo .
5	CARLOS ARTURO TORRES	63,73%	63,20%	64,76%	64,59%	-0,17%	Actividades de pañetes muros, cielo raso pvc, estuco y pintura.
6	FRANCISCO DE MIRANDA	14,93%	14,67%	15,92%	15,63%	-0,29%	Actividades de levantamiento muro y pañete, enchape muros .
7	RUFINO JOSE CUERVO	61,93%	60,35%	61,14%	60,65%	-0,49%	Actividades Instalaciòn piso chip, sellado juntas de dilatacion en piso.
8	JOSE ANTONIO RICAURTE - SAN CARLOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	N.A
TOTALES		**35,40%**	**34,08%**	**35,24%**	**34,96%**		

3. RESUMEN FINANCIERO

RAFAEL URIBE URIBE

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 217.411.471	$ 104.316.422	**$ 113.095.048**		2,17%	47,98%

LA FLORESTA SUR

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 90.944.464	$ 15.176.650	**$ 75.767.813**		1,28%	16,69%

CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 409.504.402	$ 241.526.522	**$ 167.977.880**		0,36%	58,98%

CARLOS ARTURO TORRES

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 336.209.416	$ 50.922.939	**$ 285.286.477**		15,15%	15,15%

CARLOS ARTURO TORRES

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 192.596.790	$ 124.401.108	**$ 68.195.683**		1,39%	64,59%

FRANCISCO DE MIRANDA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 159.596.212	$ 24.949.203	**$ 134.647.009**		15,63%	15,63%

RUFINO JOSE CUERVO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 127.099.273	$ 77.086.925	**$ 50.012.348**		0,30%	60,65%

JOSE ANTONIO RICAURTE - SAN CARLOS

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 166.113.099	$ -	**$ 166.113.099**		0,00%	0,00%

EMERGENCIAS


	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE EMERGENCIAS	**$ 107.634.355**	$ 60.461.341	**$ 47.173.014**		170,37%	56,17%

FECHA:	13/03/2026	**INFORME SEMANAL**	
DIAS RESTANTES	**60**		
CORTE DEL INFORME:	***14/03/2026***		

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SEMANA N°	18	**DEL**	8-mar-26	**AL**	14-mar-26

4. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

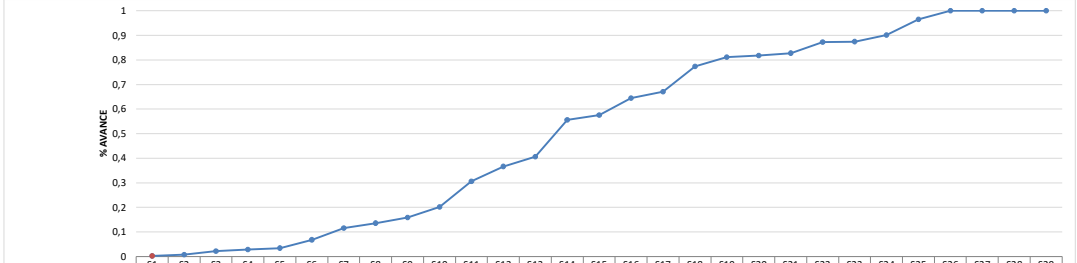

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29
PROGRAMADO	0,002	0,008	0,021	0,029	0,034	0,068	0,115	0,136	0,159	0,202	0,306	0,367	0,406	0,555	0,575	0,644	0,671	0,774	0,811	0,818	0,827	0,872	0,874	0,901	0,965	1	1	1	1
EJECUTADO	0,002																												

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

OBSERVACIONES: N.A

RECOMENDACIONES:
- Mantener orden y aseo en la obras, así como la señalización
- Continuar con el uso correcto de EPP
- Apertura de más frentes de obra

CONCLUSIONES:
- JOSE MARIA CORDOBA :Actividades de piintura de fachada, delineacion cancha, desmonte tableta piso tarima .
- RAFAEL URIBE URIBE : Actividades de placa de placa , retiro manual de area carcamo.
- CARLOS ARTURO TORRES SEDE B: Actividades de pañetes muros, cielo raso pvc, estuco y pintura.
- RUFUO JOSE CUERVO:Actividades Instalación piso chip, sellado juntas de dilatacion en piso.
- CARLOS ARTURO TORRES SEDE A:Actividades de zapatas, armado de refuerzo .
- FRANCISCO MIRANDA:Actividades de levantamiento muro y pañete, enchape muros .
- LA FLORESTA SUR:Actividades de instalacion de rejilla carcamo y limpieza de cancha.

EMERGENCIA OEA:Actividaes de mortero Reparacion.
EMERGENCIA DILE TUNJUELITO:Actividades de resanes muros , instalacion canal ,pintura interior.
EMERGENCIA HERNANDO DURAN DUSSAN: impermeabilizacion en cubierta
EMERGENCIA COLEGIO CASTILLA:Finalizada

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

1. Se realiza revision de actividades en colegios : Jose maria cordoba, Rafael uribe uribe, Carlos arturo torres sede B, Rufino jose cuervo,Carlos arturo torres sede A,Fancisco Miranda, La floresta
2.se realiza revision cantidades
3.se realiza revision de correspondecia
4.se realizan observaciones a requerimientos tecnicos del contratista
5.se realiza informe semanal
6.se realiza revision acta de corte y memorias

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

09 de Marzo al 15 de Marzo del 2026
Durante la presente semana el contratista no remitió personal para su debida aprobación. Por lo tanto, se continúa con el mismo personal previamente aprobado para la ejecución de actividades en los diferentes frentes de obra. Así mismo, esta interventoría realizó recorridos de verificación y seguimiento a las actividades adelantadas en las instituciones educativas Carlos Arturo Torres Sede B, José María Córdoba, Rafael Uribe Uribe, Rufino José Cuervo, José María Miranda, Carlos Arturo Torres Sede A y Hernando Durán Dussán. Durante la ejecución de las labores se contó con acompañamiento permanente del área de SST, efectuando seguimiento en campo a las condiciones locativas y operativas, identificación y valoración de peligros.
Durante este periodo se valida que todo el personal de los colegios Carlos Arturo Torres Sede B, José María Córdoba, Rafael Uribe Uribe, Rufino José Cuervo y Carlos Arturo Torres Sede A cumple con el uso adecuado de los EPP, cuenta con dotación completa y porta chalecos identificativos, lo que permite la correcta identificación del personal. De igual manera, se recomienda al contratista mejorar el cerramiento perimetral del colegio Francisco Miranda, con el fin de controlar el acceso de personas no autorizadas y proteger a la comunidad educativa, garantizando así la seguridad de estudiantes y personal mientras se ejecutan las actividades. Además, se enfatiza la necesidad de verificar constantemente el uso correcto de los EPP por parte de los trabajadores y demás elementos sean utilizados adecuadamente según los riesgos identificados en cada actividad.
Adicionalmente, se sugiere mejorar la señalización de excavaciones y cajas de desagüe, aplicando medidas preventivas como delimitación de zonas con cintas de seguridad o conos, avisos visibles. Esto permite prevenir caídas, tropiezos o accidentes reduciendo la exposición a riesgos para los trabajadores.
En general, se evidencia cumplimiento con los protocolos básicos de SST, incluyendo orden y limpieza, uso de EPP, identificación del personal y control de áreas de intervención. No obstante, las recomendaciones señaladas buscan reforzar las medidas preventivas, garantizando condiciones seguras en todos los frentes de obra activos y minimizando la posibilidad de incidentes durante el desarrollo de las actividades.

Durante el periodo evaluado se evidenció
Total de horas hombres trabajadas: 42
Total de horas capacitación: 20 minutos
Número de accidentes de trabajo: 0
Número de días de incapacidad por AT:0
Número de días de incapacidad por enfermedad común: 0
REPORTE PERSONAL
DIRECTOR OBRA: 1 INSPECTORES SST: 1
RESIDENTE OBRA: 1 PERSONAL OPERATIVO: 44

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

IED José María Córdoba: Se evidencia material de construcción y RCD (volumen medio) en zona verde, el contratista anteriormente realizo la protección adecuada de los individuos arbóreos cerca al parqueadero, por lo que todavía se evidencia acopio en esta zona por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área al igual se recomendó al contratista presentar solo una zona de acopio, disponer adecuadamente ya que llevan varias semanas y cumplen con la cantidad mínima para el retiro, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).
IED Carlos Arturo Torres Sede A: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento adecuado en los baños, se reporta ingreso de material acopiado adecuadamente asimismo los residuos (volumen alto), pero se encuentran en zona verde, por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, por lo que se recomienda disponer adecuadamente ya que llevan varias semanas y cumplen con la cantidad mínima para el retiro e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Carlos Arturo Torres Sede B: Se realizo recorrido en el frente, se encuentra material de construcción en el salón 105, se recomendó una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Rafael Uribe Uribe: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento adecuado, cuentan con los acopios de los materiales que ingresaron y los RCDs generados adecuadamente, se espera la disposición correspondiente de los residuos, una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Ruffino Jose Cuervo Sede C: Se realizo recorrido en el frente, anteriormente se dispuso adecuadamente los residuos, se mantiene el orden en el frente y implementa todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Francisco Miranda: Se realizo recorrido en el frente, no se cuenta con el cerramiento y la señalización adecuada, se realiza en batea metálica la mezcla de cemento, se reporta un acopio adecuado (señalizado) de residuos y de material de construcción, por lo que se recomienda contar con el cerramiento y la señalización, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente y disponer adecuadamente todos los residuos.

OTROS

MILLER MARÍN CASTELLANOS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

HARRY ARNAGO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA:	13/03/2026	**INFORME SEMANAL**	
DIAS RESTANTES	**201**		
CORTE DEL INFORME:	***14/03/2026***		

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA


Colegio Jose Maria Cordoba




pintura fachada




pintura fachada

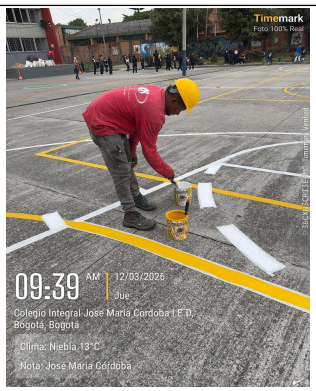


Demarcacion de cancha

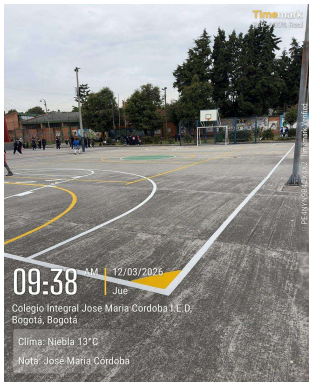

Demarcacion de cancha

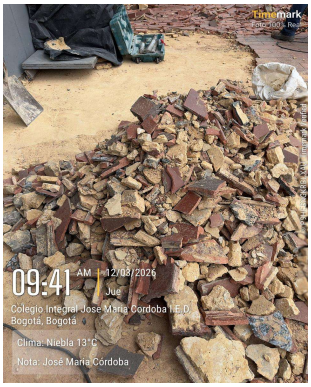


Demolicion de piso existente

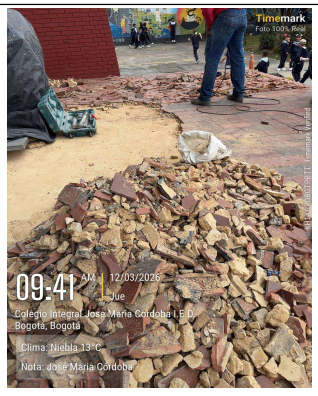

Demolicion de piso existente


Colegio Rafael Uribe Uribe

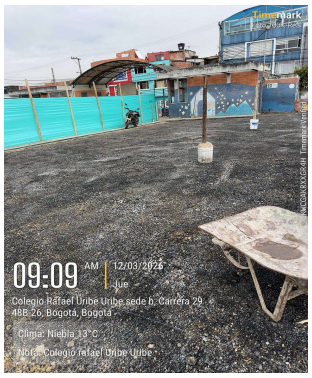

Cancha




Cancha

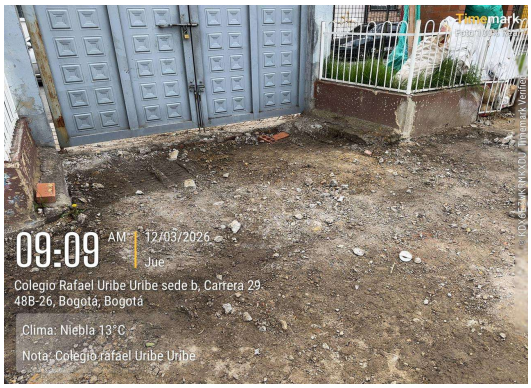


Cancha



Cancha

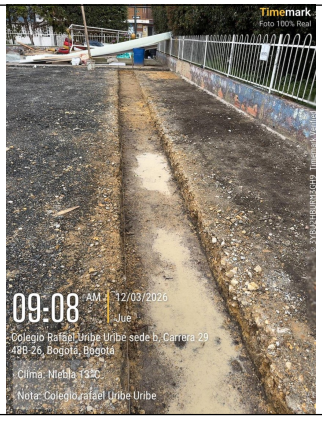


Carcamo Cancha

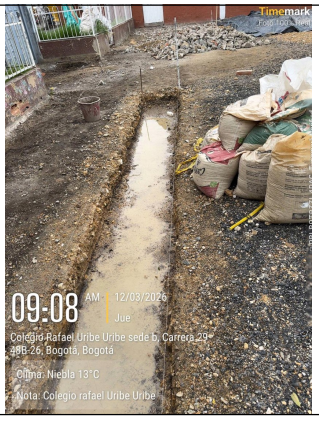


Carcamo Cancha


Colegio Carlos arturo torres sede B

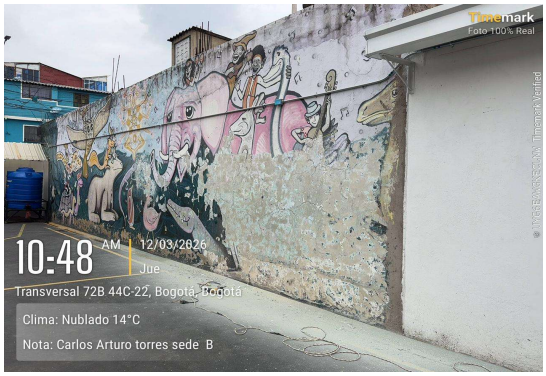


Resanes muros cancha

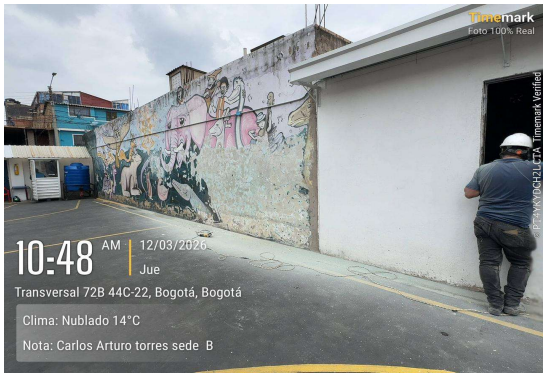


Resanes muros cancha

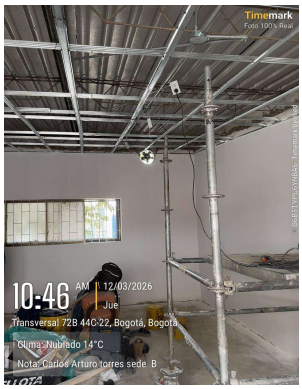


Resanes muros aula

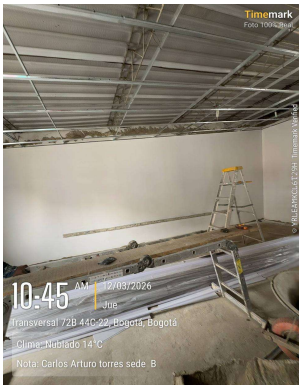

Resanes muros aula

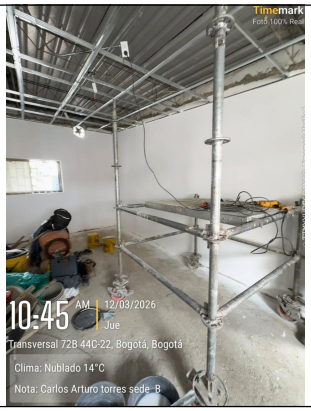


Cielo raso pvc

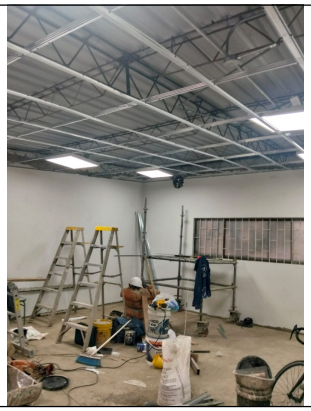


Cielo raso pvc


Colegio Rufino Jose Cuervo

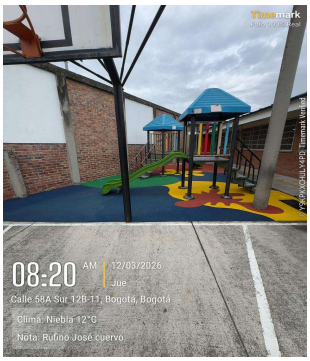


Instalaciòn Piso Chip

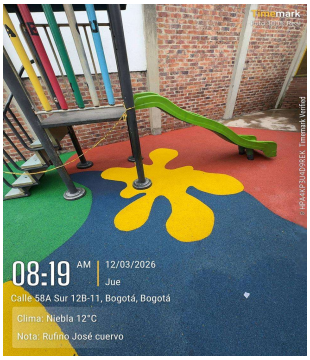


Instalaciòn Piso Chip

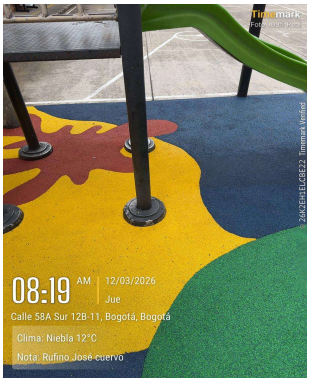


Instalaciòn Piso Chip

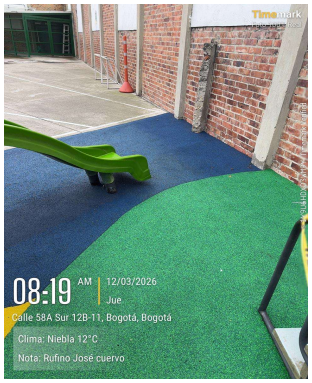

Instalaciòn Piso Chip

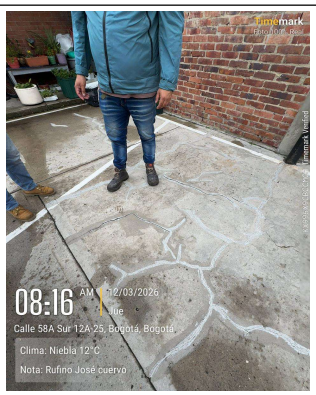


Resane placa cancha

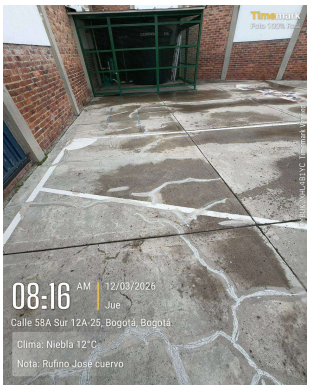


Resane placa cancha


Colegio Carlos arturo torres sede A

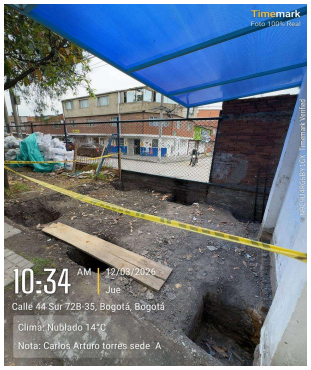


Excavacion cimentacion equipios

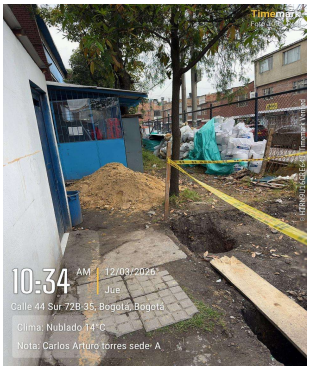

Excavacion cimentacion equipios

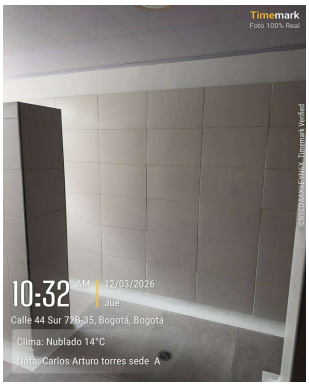

Baños segundo piso

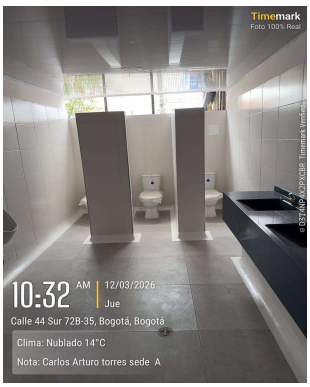

Baños segundo piso




Armado de acero




Armado de acero

Colegio Fracisco miranda

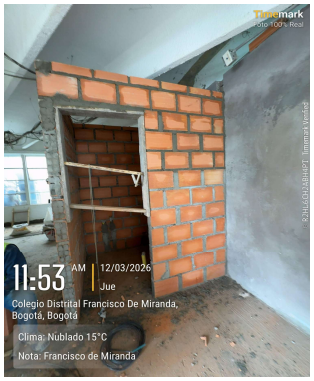


Mamposteria

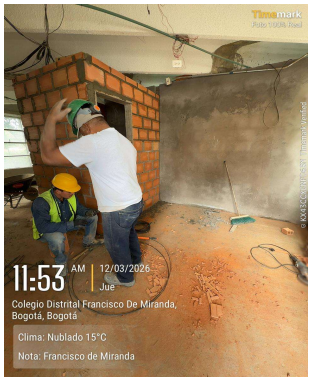


Mamposteria



Mamposteria

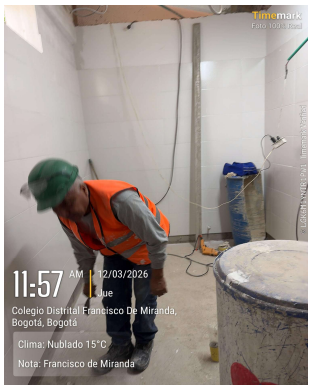

Enchape en paredes

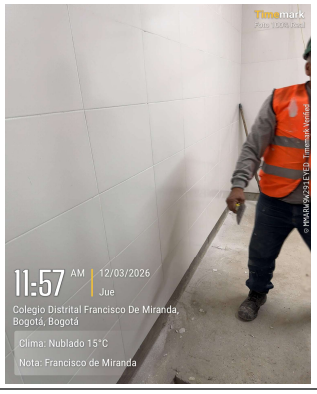

Enchape en paredes



Enchape en paredes

Colegio La Florestas sur sede A




Aseo



Aseo



Demarcacion cancha

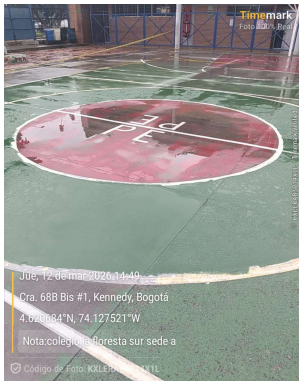

Demarcacion cancha



Demarcacion cancha




Demarcacion cancha


Emergencia Colegio OEA



Mortero reparacion

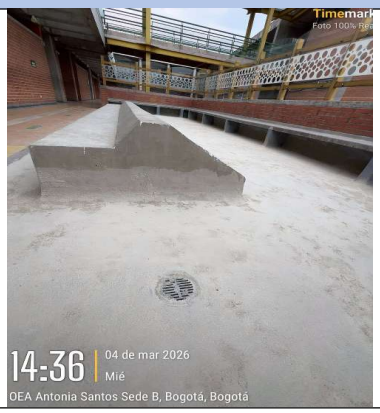

Mortero reparacion

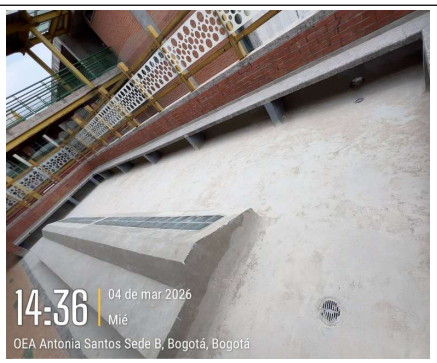

Mortero reparacion




Mortero reparacion


Emergencia Dile tunjuelito




Estuco impermeabilizado

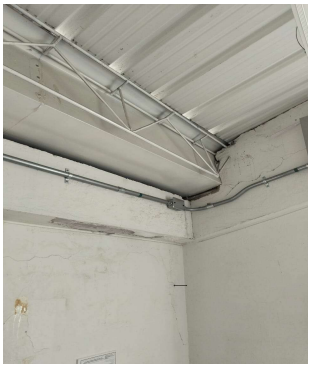

Estuco impermeabilizado

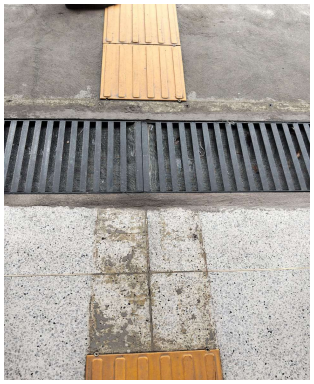

Estuco impermeabilizado

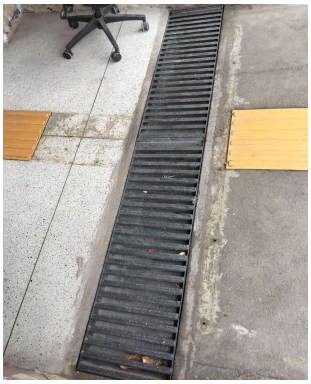

Estuco impermeabilizado

Emergencia Colegio Hernando Duran Dussan



Impermeabiliacion en cubierta



Impermeabiliacion en cubierta



Impermeabiliacion en cubierta



Impermeabiliacion en cubierta

FECHA:	13/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	60 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA	GRUPO 8
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA	
14 de marzo de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169111	CO1.PCCNTR.8155154	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.497.896.864
INICIO	14 de octubre de 2025	14 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ -	$ -
TERMINACION INICIAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	PRÓRROGAS			TOTAL	$ 796.278.928,00	$ 2.497.896.864,00
TERMINACION FINAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	TOTAL	211	211			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA		OTRO ASPECTO
1					
2					
3					
4					

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400-47	5 9 2025	5 10 2026	5 4 2026	5 4 2031	5 9 2025	5 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
14-44-101244200	14 10 2025	13 1 2027	14 10 2025	14 5 2029	14 5 2025	14 5 2027	14-40-101075759	14 10 2025	14 5 20206

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (31082024)	PROGR ACOMU %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	dic-2025	ene-2026	feb-2026	mar-2026	abr-2026	may-2026	jun-2026	jul-2026	ago-2026	sep-2026	oct-2026	nov-2026	dic-2026	ene-2027	feb-2027	mar-2027
612	RAFAEL URIBE URIBE	Tunjuelito	B	Nuestra Señora del Carmen	45,81%	47,08%	48,06%		$ 217.411.470,68	$ 104.316.422	3/12/2025	4/04/2026																			
829	LA FLORESTA SUR	Kennedy	A	La Floresta Sur	15,41%	16,69%	17,61%		$ 90.944.463,70	$ 15.176.650	3/12/2025	4/05/2026																			
601	CENTRO INTEGRAL	Tunjuelito	A	José María Cordoba	58,62%	58,96%	59,11%		$ 409.504.402,28	$ 241.526.522	4/11/2025	4/03/2026																			
849	CARLOS ARTURO	Kennedy	A	Carlos Arturo Torres y Rep de	14,64%	15,15%	15,28%		$ 336.209.415,91	$ 50.922.939	13/01/2026	13/04/2026																			
803	CARLOS ARTURO	Kennedy	B	Rep.de Finlandia	63,20%	64,59%	64,76%		$ 192.596.790,19	$ 124.401.108	4/11/2025	4/04/2026																			
816	FRANCISCO DE	Kennedy	A	Bas-Med. Francisco de Miranda	14,67%	15,63%	15,92%		$ 159.596.212,37	$ 24.949.203	13/01/2026	13/05/2026																			
617	RUFINO JOSE CUERVO	Tunjuelito	C	Nuevo Tunjuelito	60,35%	60,65%	61,14%		$ 127.099.272,82	$ 77.086.925	13/01/2026	13/04/2026																			
609	JOSE ANTONIO	Tunjuelito	B	San Carlos	0,00%	0,00%	0,00%		$ 166.113.098,67		16/12/2025	15/04/2026																			
TOTAL FRENTES DE OBRA						34,96%	35,24%		$ 1.699.475.127	$ 638.379.769																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
878	HERNANDO DURAN	Kennedy	A	Tintalito (Hernado Duran Dusan)	38,92%	38,92%	39,95%		$ 19.421.103	$ 7.558.215	5/12/2025	23/12/2025																			
807	O.E.A	Kennedy	B	Antonia Santos I	45,63%	45,63%	49,34%		$ 40.447.661	$ 18.458.254	5/12/2025	21/12/2025																			
863	KENNEDY	Kennedy	D	Rosa María Gordillo	0,00%	0,00%	0,00%																							
851	PROSPERO PINZON	Kennedy	A	Próspero Pinzón	0,00%	0,00%	0,00%																							
627	D.I.L.E TUNJUELITO	Tunjuelito	A	Direccion Local De Tunjuelito	25,00%	25,00%	26,13%		$ 17.760.045	$ 4.439.326	12/12/20205	30/12/2025																			
826	JACKELINE	Kennedy	A	Jackeline	100,00%	100,00%	100%		$ 2.700.094	$ 2.700.094	9/12/20255	12/12/2025																			
818	CASTILLA	Kennedy	A	Nueva Castilla	100,00%	100,00%	100%		$ 27.305.453	$ 27.305.453	6/02/2026	13/02/2026																			
TOTAL FRENTES DE OBRA						44,22%	45,06%		$ 107.634.355	$ 60.461.341																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	7	1	8	$ 638.379.769
ACUMULADO EMERGENCIAS				
0	5	2	7	$ 60.461.341
TOTAL				
0	12	3	15	$ 698.841.110
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	34,96%	0,00%	71,56%
PROGRAMADO	35,24%		
ATRASO	-0,28%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			




















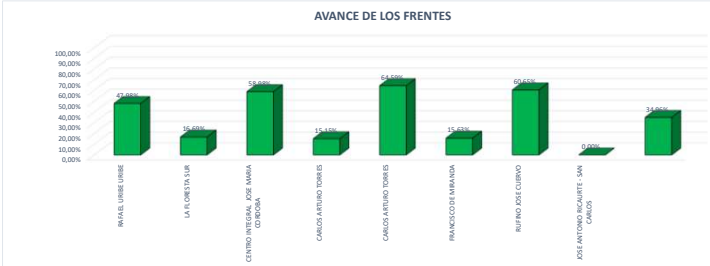

OBSERVACIONES:

FECHA: 13/03/2026		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME	
DIAS RESTANTES 0 Dias		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			APOYO A LA SUPERVISION	
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 8	0
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155154	CONTRATISTA:	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA		
14/3/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169111	INTERVENTOR:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE		ESTADO ACTUAL O FINAL
Colegio Jose Maria Cordoba	BAÑO SEGUNDO NIVEL Y FACHADA	Actividades de pintura de fachada, delineacion cancha, desmonte tableta piso tarima .				
Colegio Rafael Uribe Uribe	CANCHA	Actividades de placa de placa , retiro manual de area carcamo.				
Colegio Carlos Arturo Torres sede B	CANCHA	Actividades de pañetes muros, cielo raso pvc, estuco y pintura.				
Colegio Rufino Jose Cuervo	PLACA PATIO	Actividades Instalaciòn piso chip, sellado juntas de dilatacion en piso.				
Colegio Carlos Arturo Torres sede A	BAÑOS	Actividades de zapatas, armado de refuerzo .				
Colegio Francisco Miranda	BAÑOS Y CUARTO INCLUSION	Actividades de levantamiento muro y pañete, enchape muros .				
Colegio La floresta	CANCHA	Actividades de instalacion de rejilla carcamo y limpieza de cancha.				

Emergencia OEA	TERRAZA	Actividaes de mortero Reparacion.				
Emergencia Dile Tunjuelito	CUBIERTA	Actividades de resanes muros , instalacion canal ,pintura interior.				
Emergencia Hernando Duran Dussan	CUBIERTA	impermeabilizacion en cubierta				

BALANCE SEMANAL POR CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS

		CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA					VIGENCIA	2025.00
GRUPOS	ITEM	CPF	612	IED	RAFAEL URIBE URIBE			SEMANA					
		Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL	M	53,60	53,6		$ 30.066,00	$ 1.611.537,60	$ -	100,00%	100,00%	
	1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorias para cubrimiento de pisos y ventanas	M2	88,96	88,96		$ 3.395,00	$ 302.019,20	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS	M3	0,18	0,18		$ 286.958,00	$ 51.652,44	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	11,64	21,64	10	$ 79.342,00	$ 1.716.960,88	$ (793.420,00)	185,91%	185,91%	
	1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	90,00	88,5	51,76	$ 72.193,00	$ 6.389.080,50	$ 108.289,50	98,33%	98,33%	
	1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A	M2	15,01	15,01		$ 21.553,00	$ 323.510,53	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.14	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	30,82	30,82		$ 155.716,00	$ 4.799.167,12	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA. LOS	M2	119,16	119,16		$ 35.518,00	$ 4.232.324,88	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS	UN	20,00	11		$ 11.566,00	$ 127.226,00	$ 104.094,00	55,00%	55,00%	
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	14,00	8		$ 7.219,00	$ 57.752,00	$ 43.314,00	57,14%	57,14%	
	1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	125,00	125		$ 4.244,00	$ 530.500,00	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.34	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	2,00	2		$ 385.556,00	$ 771.112,00	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11,48	11,48		$ 18.852,00	$ 216.420,96	$ -	100,00%	100,00%	
	1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	138,28	43,12		$ 16.333,00	$ 704.278,96	$ 1.554.248,28	31,18%	31,18%	
	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	4,66	6,66	2	$ 96.108,00	$ 640.079,28	$ (192.216,00)	142,92%	142,92%	
	2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	40,23	40,23		$ 183.945,00	$ 7.400.107,35	$ -	100,00%	100,00%	
	2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	22,96	22,96		$ 101.433,00	$ 2.328.901,68	$ -	100,00%	100,00%	
	2.2.10	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A	M2	13,00	0		$ 202.686,00	$ -	$ 2.634.918,00	0,00%	0,00%	
	2.3.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM,	M	21,56	21,56		$ 334.957,00	$ 7.221.672,92	$ -	100,00%	100,00%	
	2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM. DE 0.15 X 0.15 M	KG	286,55	50,75		$ 7.421,00	$ 376.615,75	$ 1.749.871,80	17,71%	17,71%	
	3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN. PUENTE DE ADHERENCIA. INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA	CM	312,00	312		$ 1.676,00	$ 522.912,00	$ -	100,00%	100,00%	
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	60,00	60		$ 5.814,00	$ 348.840,00	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE	UN	2,00	2		$ 163.229,00	$ 326.458,00	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE	UN	9,00	1		$ 204.593,00	$ 204.593,00	$ 1.636.744,00	11,11%	11,11%	
	5.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1-1/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y	M	96,00	96		$ 20.737,00	$ 1.990.752,00	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	M	27,10	27,1		$ 15.899,00	$ 430.862,90	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	20,00	20		$ 16.790,00	$ 335.800,00	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	UN	8,00	8		$ 174.276,00	$ 1.394.208,00	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED D 60 X 0.60 M - HERMETICA. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	UN	8,00	8		$ 241.381,00	$ 1.931.048,00	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.49	ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE	M	96,00	96		$ 60.364,00	$ 5.794.944,00	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E= 0.10 M ESCOBEADO, INCLUYE DILATACIÓN EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	90,00	0		$ 131.783,00	$ -	$ 11.860.470,00	0,00%	0,00%	
	7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE	M2	308,00	0		$ 63.550,00	$ -	$ 19.573.400,00	0,00%	0,00%	
	7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX+0.10 M ICOLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	350,00	0		$ 19.187,00	$ -	$ 6.715.450,00	0,00%	0,00%	
	9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO). DESMONTABLE PARA LIMPIEZA. INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	10,78	10,78		$ 66.398,00	$ 715.770,44	$ -	100,00%	100,00%	
	12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	181,76	181,76		$ 34.979,00	$ 6.357.783,04	$ -	100,00%	100,00%	
	12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	39,13	39,13		$ 39.822,00	$ 1.558.234,86	$ -	100,00%	100,00%	
	12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CUATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	34,71	34,71		$ 23.852,00	$ 827.902,92	$ -	100,00%	100,00%	
	12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	186,52	186,52		$ 20.875,00	$ 3.893.605,00	$ -	100,00%	100,00%	
	12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	58,78	33,78		$ 28.786,00	$ 972.391,08	$ 719.650,00	57,47%	57,47%	
	12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A – 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	34,71	34,71		$ 20.749,00	$ 720.197,79	$ -	100,00%	100,00%	
	12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA	M	33,19	33,19		$ 8.860,00	$ 294.063,40	$ -	100,00%	100,00%	
	15.1.9	CANCHA MÚLTIPLE PARA NIÑOS PEQUEÑOS: BALONCESTO - MICROFUTBOL - (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL	UN	1,00	0		$ 7.220.104,00	$ -	$ 7.220.104,00	0,00%	0,00%	
	16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN,	M2	119,16	119,16		$ 129.084,00	$ 15.381.649,44	$ -	100,00%	100,00%	
	16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y	M2	85,15	85,15		$ 240.910,00	$ 20.513.486,50	$ -	100,00%	100,00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	408,44	0		$ 4.508,00	$ -	$ 1.841.247,52	0,00%	0,00%	
	19.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN MD-10	M3	28,00	0		$ 1.480.308,00	$ -	$ 41.448.624,00	0,00%	0,00%	
	NP3	ESCARIFICACIÓN MECÁNICA SOBRE LADRILLO O CUALQUIER SUPERFICIE EXISTENTE PARA GENERAR RUGOSIDAD Y MEJORAR LA ADHERENCIA DE MATERIALES	M2	134,58			$ 31.942,00	$ -	$ 4.298.754,36	0,00%	0,00%	PT APROBAR
	NP5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALES, CON APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO,	M2	26,40			$ 113.512,00	$ -	$ 2.996.716,80	0,00%	0,00%	PT APROBAR
	NP9	ESCARIFICACIÓN DE LA BASE EXISTENTE AFECTADA HASTA UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE DIEZ (10) CENTÍMETROS, INCLUYENDO EL CORTE, REMOCIÓN Y	M2	321,00			$ 29.828,00	$ -	$ 9.574.788,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR

	CPF	829	IED	LA FLORESTA SUR			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	120,00	5	0	$ 30.066,00	$ 150.330,00	$ 3.457.590,00	4,17%	4,17%	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoria para cubrimiento de areas de intervención)	M2	20,00	0	0	$ 2.402,00	$ -	$ 48.040,00	0,00%	0,00%	
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0.10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,96			$ 72.193,00	$ -	$ 141.498,28	0,00%	0,00%	
1.2.7	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	18,94			$ 112.077,00	$ -	$ 2.122.738,38	0,00%	0,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,32			$ 21.553,00	$ -	$ 6.896,96	0,00%	0,00%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	21,53			$ 28.405,00	$ -	$ 611.559,65	0,00%	0,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	9,00			$ 11.566,00	$ -	$ 104.094,00	0,00%	0,00%	
1.3.3	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN)	UN	12,38			$ 177.503,00	$ -	$ 2.197.487,14	0,00%	0,00%	
1.3.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)	M	130,00			$ 11.033,00	$ -	$ 1.434.290,00	0,00%	0,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	3,00			$ 21.111,00	$ -	$ 63.333,00	0,00%	0,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	72,80			$ 16.333,00	$ -	$ 1.189.042,40	0,00%	0,00%	
1.4.7	DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,40			$ 12.288,00	$ -	$ 4.915,20	0,00%	0,00%	
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	4,65			$ 130.850,00	$ -	$ 608.452,50	0,00%	0,00%	
2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	7,27			$ 64.356,00	$ -	$ 467.868,12	0,00%	0,00%	
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO IN VIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	7,27			$ 174.968,00	$ -	$ 1.272.017,36	0,00%	0,00%	
2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	0,70			$ 1.069.032,00	$ -	$ 748.322,40	0,00%	0,00%	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	6,10			$ 101.433,00	$ -	$ 618.741,30	0,00%	0,00%	
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 20 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	7,50			$ 57.072,00	$ -	$ 428.047,50	0,00%	0,00%	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	12,50			$ 160.361,00	$ -	$ 2.004.512,50	0,00%	0,00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	44,35			$ 7.012,00	$ -	$ 310.982,20	0,00%	0,00%	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	150,00			$ 22.268,00	$ -	$ 3.340.200,00	0,00%	0,00%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	3,66			$ 141.229,00	$ -	$ 516.898,14	0,00%	0,00%	
3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	76,35			$ 9.398,00	$ -	$ 717.537,30	0,00%	0,00%	
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: RESTAROQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	76,35			$ 27.238,00	$ -	$ 2.079.621,30	0,00%	0,00%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	600,00			$ 9.705,00	$ -	$ 5.823.000,00	0,00%	0,00%	
4.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	30,50			$ 148.077,00	$ -	$ 4.516.348,50	0,00%	0,00%	
4.7.5	CAJA DE INSPECCIÓN 0.70 M X 0.70 M EN CONCRETO REFORZADO HASTA 1.50 M DE ALTURA CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M (INCLUYE ACERO)	UN	1,00			$ 2.089.737,00	$ -	$ 2.089.737,00	0,00%	0,00%	
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1,00			$ 73.531,00	$ -	$ 73.531,00	0,00%	0,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	105,00			$ 5.814,00	$ -	$ 610.470,00	0,00%	0,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	9,00			$ 122.646,00	$ -	$ 1.103.814,00	0,00%	0,00%	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	9,00			$ 204.593,00	$ -	$ 1.841.337,00	0,00%	0,00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	5,21			$ 43.769,00	$ -	$ 228.036,49	0,00%	0,00%	
7.2.20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M	3,00			$ 28.998,00	$ -	$ 86.994,00	0,00%	0,00%	
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	9,50			$ 761.157,00	$ -	$ 7.230.991,50	0,00%	0,00%	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	21,53	2,5	2,5	$ 464.504,00	$ 1.161.260,00	$ 8.839.511,12	11,61%	11,61%	
15.1.5	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO < 60 CM	M	89,77			$ 62.428,00	$ -	$ 5.604.161,56	0,00%	0,00%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	40,00			$ 8.860,00	$ -	$ 354.400,00	0,00%	0,00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	14,08			$ 129.084,00	$ -	$ 1.817.502,72	0,00%	0,00%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	14,08			$ 240.910,00	$ -	$ 3.392.012,80	0,00%	0,00%	
16.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 2"x1/8" SOBRE CORREAS PARA FIJACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA	M	9,20			$ 18.402,00	$ -	$ 169.298,40	0,00%	0,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	165,49			$ 4.508,00	$ -	$ 746.028,92	0,00%	0,00%	
NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA SIMILAR A LA EXISTENTE,CONTRAMARCO EN PLATINA DE 2"1/2 X 1/4 REJILLA METÁLICA EN PLATINA DE 1,1/2 X 3/16 CON SEPARACIONES DE 3.5 CM ENTRE PLATINAS (SEPARACIONES EN REJILLA EXISTENTE)Y UN REFUERZO EN EL CENTRO X 40.7 M EN ÁNGULO DE 1´X 1/8,PINTURA ANTICORROSIVA ANCHO 45 CM	M	42,70	42,7	0	$ 324.708,67	$ 13.865.060,21	$ -	100,00%	100,00%	PT APROBAR
NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA REFORZADA SECCION PARQUEADERO; CONTRAMARCO EN PLATINA DE 2,1/2" X 1/4, REJILLA METÁLICA EN ÁNGULO DE 1,1/2 X 1/4 CON UNA SEPARACIÓN DE 3.5CM ENTRE ÁNGULOS,(SEPARACIONES EN REJILLA EXISTENTE),PINTURA ANTICORROSIVA. ANCHO 50CM	M	15,00			$ 449.730,19	$ -	$ 6.745.952,85	0,00%	0,00%	PT APROBAR

	CPF	601	IED	Jose Maria Cordoba			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	40,11	40,11		$ 30.066,00	$ 1.205.947,26	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	0,54	0,54		$ 286.958,00	$ 154.957,32	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	374,43	50,27	10	$ 31.500,00	$ 1.583.505,00	$ 10.211.040,00	13,43%	13,43%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,85	2,85		$ 21.553,00	$ 61.426,05	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	283,41	163,41		$ 10.995,00	$ 1.796.692,95	$ 1.319.400,00	57,66%	57,66%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	40,00	0,00		$ 26.585,00	$ -	$ 1.063.400,00	0,00%	0,00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	108,04	108,04		$ 12.224,00	$ 1.320.680,96	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,55	6,55		$ 32.061,00	$ 209.999,55	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28,00	28		$ 26.367,00	$ 738.276,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,70	2,7		$ 31.476,00	$ 84.985,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	7,00	7		$ 11.566,00	$ 80.962,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	6,00	6,00		$ 7.219,00	$ 43.314,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	16,10	16,1		$ 4.244,00	$ 68.328,40	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.34	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	0		$ 385.556,00	$ -	$ 771.112,00	0,00%	0,00%	
1.2.35	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,18	0,18		$ 23.790,00	$ 4.282,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	19,50	19,5		$ 8.659,00	$ 168.850,50	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	18,00	18		$ 14.178,00	$ 255.204,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.3.2	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2	141,12	72,77	8	$ 147.193,00	$ 10.711.234,61	$ 10.060.641,55	51,57%	51,57%	
1.3.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)	M	30,00	0		$ 11.033,00	$ -	$ 330.990,00	0,00%	0,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	33,45	33,45		$ 21.111,00	$ 706.162,95	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	7,00	7		$ 36.280,00	$ 253.960,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	3,00	3		$ 16.333,00	$ 48.999,00	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0,76	0,76		$ 70.230,00	$ 53.374,80	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1037,04	529,54		$ 9.398,00	$ 4.976.616,92	$ 4.769.485,00	51,06%	51,06%	
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	529,54	529,54		$ 27.238,00	$ 14.423.610,52	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4'' INCLUYE ACCESORIOS	M	1,00	1		$ 25.481,00	$ 25.481,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2'' INCLUYE ACCESORIOS	M	6,00	6		$ 14.486,00	$ 86.916,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	6,00	6		$ 61.400,00	$ 368.400,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	18,00	18		$ 61.400,00	$ 1.105.200,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6" (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	61,96	61,96		$ 13.297,00	$ 823.882,12	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	405,00	405		$ 5.814,00	$ 2.354.670,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	1		$ 122.646,00	$ 122.646,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	0,00	0		$ 195.138,00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	17,30	17,3		$ 22.533,00	$ 389.820,90	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	0,00	0		$ 16.790,00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	6		$ 174.276,00	$ 1.045.656,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	6,00	6		$ 62.384,00	$ 374.304,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	374,46	40,27		$ 41.218,00	$ 1.659.848,86	$ 13.774.643,42	10,75%	10,75%	
7.1.3	ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:3	M	41,27	3,09		$ 14.910,00	$ 46.071,90	$ 569.263,80	7,49%	7,49%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	37,88	37,88		$ 203.467,00	$ 7.707.329,96	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	40,80	40,8		$ 14.858,00	$ 606.206,40	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	21,54	15,77	0	$ 63.550,00	$ 1.002.183,50	$ 366.683,50	73,21%	73,21%	
7.2.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN TABLETA ROJA 7X25 CM	M2	334,19	3,09		$ 83.679,00	$ 258.568,11	$ 27.706.116,90	0,92%	0,92%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	670,38	335,19		$ 19.187,00	$ 6.431.290,53	$ 6.431.290,53	50,00%	50,00%	
7.2.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA	M	336,19	8,08		$ 27.504,00	$ 222.232,32	$ 9.024.337,44	2,40%	2,40%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	55,34	55,34		$ 85.861,00	$ 4.751.547,74	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	102,64	102,64		$ 94.926,00	$ 9.743.204,64	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1,28	1,28	0	$ 451.950,00	$ 578.496,00	$ 0,00	100,00%	100,00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	6,32	6,32		$ 1.090.099,00	$ 6.889.425,68	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	6,00	6		$ 746.496,00	$ 4.478.976,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	12,00	12		$ 391.028,00	$ 4.692.336,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	3,00	3	0	$ 32.443,00	$ 97.329,00	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	5,31	5,02	0	$ 956.124,00	$ 4.799.742,48	$ 277.275,96	94,54%	94,54%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	3,60	2,63	0	$ 1.033.647,00	$ 2.718.491,61	$ 1.002.637,59	73,06%	73,06%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1020,96	728,55		$ 39.822,00	$ 29.012.318,10	$ 11.644.351,02	71,36%	71,36%	
12.1.3	PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	37,88	37,88		$ 40.967,00	$ 1.551.829,96	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	38,88	14,22		$ 12.106,00	$ 172.147,32	$ 298.533,96	36,57%	36,57%	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	959,30	959,3		$ 23.852,00	$ 22.881.223,60	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.12	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	32,94	0		$ 12.568,00	$ -	$ 413.989,92	0,00%	0,00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	37,88	37,88		$ 20.875,00	$ 790.745,00	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	33,72	33,72		$ 33.461,00	$ 1.128.304,92	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1335,28	1363,43	0	$ 28.786,00	$ 39.247.695,98	$ (810.325,90)	102,11%	102,11%	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1295,91	1295,91	0	$ 20.749,00	$ 26.888.836,59	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	32,94	32,94		$ 26.828,00	$ 883.714,32	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	1247,97	701,35	0	$ 23.550,00	$ 16.516.792,50	$ 12.872.901,00	56,20%	56,20%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	705,00	0		$ 8.860,00	$ -	$ 6.246.300,00	0,00%	0,00%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	7,34	0		$ 128.780,00	$ -	$ 945.245,20	0,00%	0,00%	
15.1.8	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	2,00	0		$ 12.418.656,00	$ -	$ 24.837.312,00	0,00%	0,00%	
16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	3,00	3		$ 40.429,00	$ 121.287,00	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	359,00	0		$ 4.508,00	$ -	$ 1.618.372,00	0,00%	0,00%	
NP1	DESMONTE DE ESPEJOS Y/O VIDRIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,30			$ 22.388,00	$ -	$ 118.656,40	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP3	ESCARIFICACIÓN MECÁNICA SOBRE LADRILLO O CUALQUIER SUPERFICIE EXISTENTE PARA GENERAR RUGOSIDAD Y MEJORAR LA ADHERENCIA DE MATERIALES POSTERIORES. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SUELTO.	M2	471,78			$ 31.942,00	$ -	$ 15.069.596,76	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UND	6,00			$ 1.174.105,00	$ -	$ 7.044.630,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR

	CPF	849	IED	CARLOS ARTURO TORRES SEDE A			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	57,00	0		$ 4.093,00	$ -	$ 233.301,00	0,00%	0,00%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	54,00	19,15	0	$ 30.066,00	$ 575.763,90	$ 1.047.800,10	35,46%	35,46%	
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	1,03	1,03		$ 286.958,00	$ 295.566,74	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.2	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	8,00			$ 244.462,00	$ -	$ 1.955.696,00	0,00%	0,00%	
1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	11,00			$ 113.245,00	$ -	$ 1.245.695,00	0,00%	0,00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	29,72	7,04	0	$ 31.500,00	$ 221.760,00	$ 714.420,00	23,69%	23,69%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	85,00	6,1		$ 21.553,00	$ 131.473,30	$ 1.700.531,70	7,18%	7,18%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	65,00	53,05		$ 10.995,00	$ 583.284,75	$ 131.390,25	81,62%	81,62%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	10,00			$ 26.585,00	$ -	$ 265.850,00	0,00%	0,00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	53,05	53,05		$ 12.224,00	$ 648.483,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.16	DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	14,70	0		$ 113.213,00	$ -	$ 1.664.231,10	0,00%	0,00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	38,13	7,2		$ 32.061,00	$ 230.839,20	$ 991.646,73	18,88%	18,88%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	14,00	14		$ 26.367,00	$ 369.138,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.22	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	4,00			$ 161.707,00	$ -	$ 646.828,00	0,00%	0,00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	23,70			$ 35.518,00	$ -	$ 841.776,60	0,00%	0,00%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	31,49	31,49		$ 31.476,00	$ 991.179,24	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4,00	4		$ 7.219,00	$ 28.876,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	20,00			$ 4.244,00	$ -	$ 84.880,00	0,00%	0,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	65,00	17,6		$ 8.659,00	$ 152.398,40	$ 410.436,60	27,08%	27,08%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	8,00	8		$ 14.178,00	$ 113.424,00	$ -	100,00%	100,00%	

1.2.43	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.15 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	23,70	0		$ 45.204,00	$ -	$ 1.071.334,80	0,00%	0,00%	
1.2.48	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,86	9,86	0	$ 30.684,00	$ 302.544,24	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	42,93	32,93		$ 18.061,00	$ 594.748,73	$ 180.610,00	76,71%	76,71%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	27,20	0		$ 16.333,00	$ -	$ 444.257,60	0,00%	0,00%	
2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	5,25	0		$ 64.356,00	$ -	$ 337.869,00	0,00%	0,00%	
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	4,20	1,5	1,5	$ 174.968,00	$ 262.452,00	$ 472.413,60	35,71%	35,71%	
2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	2,00	0,92	0	$ 1.069.032,00	$ 983.509,44	$ 1.154.554,56	46,00%	46,00%	
2.2.3	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3	14,00	0,42		$ 1.012.858,00	$ 425.400,36	$ 13.754.611,64	3,00%	3,00%	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	90,40	0		$ 101.433,00	$ -	$ 9.169.543,20	0,00%	0,00%	
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	52,00	0,0888		$ 57.073,00	$ 5.068,08	$ 2.962.727,92	0,17%	0,17%	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	93,70	10	10	$ 160.361,00	$ 1.603.610,00	$ 13.422.215,70	10,67%	10,67%	
2.2.15	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI DE 15 CM SOBRE LAMINA COLABORANTE 2"	M2	8,30	0	0	$ 241.182,00	$ -	$ 2.001.810,60	0,00%	0,00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	822,31	100,304	23	$ 7.012,00	$ 703.331,65	$ 5.062.706,07	12,20%	12,20%	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	544,00	0		$ 7.421,00	$ -	$ 4.037.024,00	0,00%	0,00%	
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	45,35			$ 70.230,00	$ -	$ 3.184.930,50	0,00%	0,00%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	17,35			$ 141.229,00	$ -	$ 2.450.323,15	0,00%	0,00%	
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	32,93	32,93		$ 25.481,00	$ 839.089,33	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1 " INCLUYE ACCESORIOS	M	116,40	0		$ 19.470,00	$ -	$ 2.266.308,00	0,00%	0,00%	
4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1"	UN	63,00	3		$ 9.479,00	$ 28.437,00	$ 568.740,00	4,76%	4,76%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	6,00	6		$ 61.400,00	$ 368.400,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	9,00	9		$ 61.400,00	$ 552.600,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	2,00	2		$ 66.686,00	$ 133.372,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 1"	UN	4,00	0		$ 200.497,00	$ -	$ 801.988,00	0,00%	0,00%	
4.6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADOR MECANICO 1/2"	UN	4,00	0		$ 206.989,00	$ -	$ 827.956,00	0,00%	0,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M	120,00	0		$ 5.814,00	$ -	$ 697.680,00	0,00%	0,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	0		$ 122.646,00	$ -	$ 490.584,00	0,00%	0,00%	
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA .	UN	2,00			$ 28.341,00	$ -	$ 56.682,00	0,00%	0,00%	
5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	35,00			$ 9.743,00	$ -	$ 341.005,00	0,00%	0,00%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	15,00	0		$ 22.533,00	$ -	$ 337.995,00	0,00%	0,00%	
5.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	38,00	0		$ 21.721,00	$ -	$ 825.398,00	0,00%	0,00%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20%+40%C, VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	6,00	0		$ 62.384,00	$ -	$ 374.304,00	0,00%	0,00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	29,72	29,72		$ 41.218,00	$ 1.224.998,96	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.4	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2	122,00			$ 39.550,00	$ -	$ 4.825.100,00	0,00%	0,00%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	49,43	32,4	0	$ 26.248,00	$ 850.435,20	$ 447.003,44	65,55%	65,55%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	41,08	41,08		$ 14.858,00	$ 610.366,64	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	23,09	23,09		$ 132.061,00	$ 3.049.288,49	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PUUIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	60,00			$ 85.861,00	$ -	$ 5.151.660,00	0,00%	0,00%	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	92,41	92,41		$ 94.926,00	$ 8.772.111,66	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"XS", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	44,20	0		$ 761.157,00	$ -	$ 33.643.139,40	0,00%	0,00%	
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	48,13	0		$ 965.200,00	$ -	$ 46.455.076,00	0,00%	0,00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	4,80	4,8	0	$ 1.090.099,00	$ 5.232.475,20	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LINEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	6,00	3	0	$ 746.496,00	$ 2.239.488,00	$ 2.239.488,00	50,00%	50,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	12,00	9	0	$ 391.028,00	$ 3.519.252,00	$ 1.173.084,00	75,00%	75,00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2,00	2	0	$ 39.750,00	$ 79.500,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	3,00	2	0	$ 32.443,00	$ 64.886,00	$ 32.443,00	66,67%	66,67%	
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	15,00	6	0	$ 945.896,00	$ 5.675.376,00	$ 8.513.064,00	40,00%	40,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	5,80	0		$ 956.124,00	$ -	$ 5.545.519,20	0,00%	0,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	3,15	0		$ 1.033.647,00	$ -	$ 3.255.988,05	0,00%	0,00%	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	599,18	42,58		$ 34.979,00	$ 1.489.405,82	$ 19.469.311,40	7,11%	7,11%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	38,88			$ 12.106,00	$ -	$ 470.681,28	0,00%	0,00%	
12.1.8	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	45,00	49,61		$ 36.386,00	$ 1.805.109,46	$ (167.739,46)	110,24%	110,24%	
12.1.12	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	45,00	29,37		$ 12.568,00	$ 369.122,16	$ 196.437,84	65,27%	65,27%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	32,94	0		$ 33.461,00	$ -	$ 1.102.205,34	0,00%	0,00%	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	235,00	0		$ 28.786,00	$ -	$ 6.764.710,00	0,00%	0,00%	
12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	45,00	32,94		$ 26.828,00	$ 883.714,32	$ 323.545,68	73,20%	73,20%	
12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	235,00	0		$ 23.550,00	$ -	$ 5.534.250,00	0,00%	0,00%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	120,00	0		$ 8.860,00	$ -	$ 1.063.200,00	0,00%	0,00%	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35,35	31,06	0	$ 125.971,00	$ 3.912.659,26	$ 540.415,59	87,86%	87,86%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	8,25	0		$ 128.780,00	$ -	$ 1.062.435,00	0,00%	0,00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	12,20	0		$ 102.700,00	$ -	$ 1.252.940,00	0,00%	0,00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	50,00	0		$ 129.084,00	$ -	$ 6.454.200,00	0,00%	0,00%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2 .	M2	50,50	0		$ 240.910,00	$ -	$ 12.165.955,00	0,00%	0,00%	
16.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 2"x3/8" SOBRE CORREAS PARA FIJACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA	M	27,00	0		$ 18.402,00	$ -	$ 496.854,00	0,00%	0,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	144,00	0		$ 4.508,00	$ -	$ 649.152,00	0,00%	0,00%	
19.1.4	PODA DE ARBOLES CLASE I (H<5M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1,00	0		$ 222.701,00	$ -	$ 222.701,00	0,00%	0,00%	
19.1.5	PODA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<15M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1,00	0		$ 445.403,00	$ -	$ 445.403,00	0,00%	0,00%	
19.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMATICO CON 2 BOMBAS DE 2HP 110/220 TANQUE HIDRONEUMATICO POR MEMBRANA DE 200LTS, MARCA PEARL, TABLERO DE CONTROL CON NORMA RETIE (INCLUYE 2 BOMBAS ALTA PRESIÓN CAUDAL 2.33l/S H.MAQ 50MT 1 TANQUE HIDROACUMULADOR MEMBRANA 200LTS VERTICAL CON MANOMETRO ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN ENTRE BOMBAS Y TANQUE EN HIERRO GALVANIZADO (HG), 1 FLAUTA DE DESCARGA EN 3" INCLUYE COPA DE DESCARGA 3 A 2, 2 REGISTROS EN BRONCE TIPO COMPUERTA, 2 VÁLVULAS CHEQUE HIDRONEUMATICO EN BRONCE, 1 TABLERO DE CONTROL EN COFRE METÁLICO CON NORMA RETIE 2- PRESOSTATOS RANGO 40/60, 1 SENSOR DE NIVEL (FLOTADOR), 1 MANOMETRO EN GLICERINA CON CARATULA DE 2" (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	UN	1,00	0		$ 18.416.383,00	$ -	$ 18.416.383,00	0,00%	0,00%	
NP1	DESMONTE DE ESPEJOS Y/O VIDRIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,00			$ 22.388,00	$ -	$ 22.388,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP2	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTENEDOR DE BASURA (INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE EN SITIO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO)	UND	1,00			$ 3.645.673,00	$ -	$ 3.645.673,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCERTINA SENCILLA DIÁMETRO 18" EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE O FIJACIÓN	ML	45,00			$ 116.687,00	$ -	$ 5.250.915,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UND	8,00			$ 1.174.105,00	$ -	$ 9.392.840,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR

	CPF	803	IED	CARLOS ARTURO TORRES SEDE B			SEMANA				
	Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	21,00	21		$ 30.066,00	$ 631.386,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	114,72	114,72		$ 3.395,00	$ 389.474,40	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,30	0		$ 72.193,00	$ -	$ 21.657,90	0,00%	0,00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	57,38	49,14	0	$ 31.500,00	$ 1.547.910,00	$ 259.560,00	85,64%	85,64%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	72,02	31,24	10	$ 10.995,00	$ 343.483,80	$ 448.376,10	43,38%	43,38%	
1.2.14	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	19,32	19,32		$ 155.716,00	$ 3.008.433,12	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,00	0		$ 32.061,00	$ -	$ 96.183,00	0,00%	0,00%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,39	2,56		$ 28.405,00	$ 72.716,80	$ 80.386,15	47,50%	47,50%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	133,62	118,83		$ 35.518,00	$ 4.220.603,94	$ 525.311,22	88,93%	88,93%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,60	86,76		$ 31.476,00	$ 2.730.857,76	$ (1.452.932,16)	213,69%	213,69%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	41,00	41		$ 11.566,00	$ 474.206,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	32,00	32		$ 7.219,00	$ 231.008,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	86,70	86,7		$ 4.244,00	$ 367.954,80	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	76,91	76,91		$ 16.333,00	$ 1.256.171,03	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	1,25	1,25		$ 64.356,00	$ 80.445,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0,00	0		$ 183.945,00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	0,35	0,16		$ 632.023,00	$ 101.123,68	$ 120.084,37	45,71%	45,71%	
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM	600,00	600		$ 1.676,00	$ 1.005.600,00	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	1,20			$ 141.229,00	$ -	$ 169.474,80	0,00%	0,00%	
3.1.8	ENCHAPE EN MAMPOSTERIA LADRILLO A LA VISTA PRENSADO LIVIANO M-02	M2	8,00	7,09		$ 78.665,00	$ 557.734,85	$ 71.585,15	88,63%	88,63%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	7,00	7		$ 122.646,00	$ 858.522,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	3		$ 163.229,00	$ 489.687,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	2		$ 147.178,00	$ 294.356,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8,00	8,00		$ 204.593,00	$ 1.636.744,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	74,40	74,4		$ 15.899,00	$ 1.182.885,60	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	59,00	4		$ 16.790,00	$ 67.160,00	$ 923.450,00	6,78%	6,78%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	26,00	26		$ 174.276,00	$ 4.531.176,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	25,00	25		$ 241.381,00	$ 6.034.525,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	3,00	3		$ 62.384,00	$ 187.152,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	56,00			$ 41.218,00	$ -	$ 2.308.208,00	0,00%	0,00%	
7.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN GRAVILLA LAVADA MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M2	1,68	1,68		$ 120.329,00	$ 202.152,72	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	280,00	0		$ 63.550,00	$ -	$ 17.794.000,00	0,00%	0,00%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	219,00	0		$ 19.187,00	$ -	$ 4.201.953,00	0,00%	0,00%	
7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	56,00			$ 121.988,00	$ -	$ 6.831.328,00	0,00%	0,00%	
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	76,91	76,91		$ 25.380,00	$ 1.951.975,80	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	3,00	0		$ 738.943,00	$ -	$ 2.216.829,00	0,00%	0,00%	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	2,57	0		$ 464.504,00	$ -	$ 1.193.775,28	0,00%	0,00%	
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2	2,57	0		$ 332.771,00	$ -	$ 855.221,47	0,00%	0,00%	
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	10,69	5,4		$ 66.398,00	$ 358.549,20	$ 351.245,42	50,51%	50,51%	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	65,00	62,77	19	$ 34.979,00	$ 2.195.631,83	$ 78.003,17	96,57%	96,57%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	107,94	40,6		$ 39.822,00	$ 1.616.773,20	$ 2.681.613,48	37,61%	37,61%	
12.1.4	PAÑETE LISO 1:4 CON ESTUCO PLÁSTICO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0,90	0,9		$ 43.242,00	$ 38.917,80	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	65,00	50	50	$ 12.106,00	$ 605.300,00	$ 181.590,00	76,92%	76,92%	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	54,50	4,5		$ 23.852,00	$ 107.334,00	$ 1.192.600,00	8,26%	8,26%	
12.1.13	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	4,50	4,5		$ 7.804,00	$ 35.118,00	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	65,00	50	50	$ 20.875,00	$ 1.043.750,00	$ 313.125,00	76,92%	76,92%	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	4,50	4,5		$ 16.631,00	$ 74.839,50	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	159,04	39,04		$ 28.786,00	$ 1.123.805,44	$ 3.454.320,00	24,55%	24,55%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	88,85	0		$ 8.860,00	$ -	$ 787.211,00	0,00%	0,00%	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	90,00	88,76	2	$ 125.971,00	$ 11.181.185,96	$ 156.204,04	98,62%	98,62%	
15.1.8	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	1,00	0		$ 12.418.656,00	$ -	$ 12.418.656,00	0,00%	0,00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	86,00	76,91		$ 102.700,00	$ 7.898.657,00	$ 933.543,00	89,43%	89,43%	
16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	15,85	15,85		$ 68.873,00	$ 1.091.637,05	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	133,62	118,83		$ 129.084,00	$ 15.339.051,72	$ 1.909.152,36	88,93%	88,93%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	86,08	71,3		$ 240.910,00	$ 17.176.883,00	$ 3.560.649,80	82,83%	82,83%	
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	7,80	7,8		$ 187.010,00	$ 1.458.678,00	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	310,00	0		$ 4.508,00	$ -	$ 1.397.480,00	0,00%	0,00%	
19.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN MD-10	M3	19,32	19,32		$ 1.480.308,00	$ 28.599.550,56	$ -	100,00%	100,00%	
NP3	ESCARIFICACIÓN MECÁNICA SOBRE LADRILLO O CUALQUIER SUPERFICIE EXISTENTE PARA GENERAR RUGOSIDAD Y MEJORAR LA ADHERENCIA DE MATERIALES POSTERIORES. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SUELTO.	M2	66,24			$ 31.942,00	$ -	$ 2.115.838,08	0,00%	0,00%	PT APROBAR

	CPF	816	IED	FRANCISCO DE MIRANDA			SEMANA				
	Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	55,00	11,6		$ 30.066,00	$ 348.765,60	$ 1.304.864,40	21,09%	21,09%	
1.2.7	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11,09	0		$ 112.077,00	$ -	$ 1.242.933,93	0,00%	0,00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67,01	64	0	$ 31.500,00	$ 2.016.000,00	$ 94.815,00	95,51%	95,51%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	70,99	70,99		$ 21.553,00	$ 1.530.047,47	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	70,62	0		$ 10.995,00	$ -	$ 776.466,90	0,00%	0,00%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20,95	0		$ 26.585,00	$ -	$ 556.955,75	0,00%	0,00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	47,06	43,57		$ 12.224,00	$ 532.599,68	$ 42.661,76	92,58%	92,58%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12,98	5,81		$ 32.061,00	$ 186.274,41	$ 229.877,37	44,76%	44,76%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	24,87	1,44		$ 28.405,00	$ 40.903,20	$ 665.529,15	5,79%	5,79%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	6,00	6		$ 26.367,00	$ 158.202,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	2,50	0		$ 20.015,00	$ -	$ 50.037,50	0,00%	0,00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	43,34	0		$ 35.518,00	$ -	$ 1.539.350,12	0,00%	0,00%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	61,88	56,58	0	$ 31.476,00	$ 1.780.912,08	$ 166.822,80	91,44%	91,44%	
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	30,73	30,73	0	$ 24.868,00	$ 764.193,64	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.26	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	11,25	0		$ 22.452,00	$ -	$ 252.585,00	0,00%	0,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11,00	11	0	$ 11.566,00	$ 127.226,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	4,15	0		$ 9.069,00	$ -	$ 37.636,35	0,00%	0,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	13,00	9	0	$ 7.219,00	$ 64.971,00	$ 28.876,00	69,23%	69,23%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	33,00	0		$ 4.244,00	$ -	$ 140.052,00	0,00%	0,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	9,00	0		$ 8.659,00	$ -	$ 77.931,00	0,00%	0,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	4,00	4		$ 14.178,00	$ 56.712,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	22,00	0		$ 21.111,00	$ -	$ 464.442,00	0,00%	0,00%	
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	15,00	0		$ 18.061,00	$ -	$ 270.915,00	0,00%	0,00%	
1.4.3	DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M	13,40	0		$ 4.147,00	$ -	$ 55.569,80	0,00%	0,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	45,40	0		$ 16.333,00	$ -	$ 741.518,20	0,00%	0,00%	
2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	14,13	0		$ 64.356,00	$ -	$ 909.350,28	0,00%	0,00%	
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	14,13	0		$ 174.968,00	$ -	$ 2.472.297,84	0,00%	0,00%	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	10,15	4,25		$ 101.433,00	$ 431.090,25	$ 598.454,70	41,87%	41,87%	
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	43,40	8,72		$ 57.073,00	$ 497.676,56	$ 1.979.291,64	20,09%	20,09%	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	28,09	0		$ 160.361,00	$ -	$ 4.504.540,49	0,00%	0,00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	130,56	107,93		$ 7.012,00	$ 756.805,16	$ 158.681,56	82,67%	82,67%	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	30,48	50,48	20	$ 63.196,00	$ 3.190.134,08	$ (1.263.920,00)	165,62%	165,62%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	14,22	4,9		$ 141.229,00	$ 692.022,10	$ 1.316.254,28	34,46%	34,46%	
3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	38,44	0		$ 9.398,00	$ -	$ 361.259,12	0,00%	0,00%	
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	38,44	0		$ 27.238,00	$ -	$ 1.047.028,72	0,00%	0,00%	
3.2.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	M	1,20	1,2		$ 40.794,00	$ 48.952,80	$ -	100,00%	100,00%	
4.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	30,00	0		$ 148.077,00	$ -	$ 4.442.310,00	0,00%	0,00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	15,00	9,64		$ 88.516,00	$ 853.294,24	$ 474.445,76	64,27%	64,27%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	10,00	3,46		$ 49.410,00	$ 170.958,60	$ 323.141,40	34,60%	34,60%	

4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	4,00	0		$ 135.539,00	$ -	$ 542.156,00	0,00%	0,00%	
4.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	50,00	0		$ 14.332,00	$ -	$ 716.600,00	0,00%	0,00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	5,00	0		$ 61.400,00	$ -	$ 307.000,00	0,00%	0,00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	4,00	0		$ 61.400,00	$ -	$ 245.600,00	0,00%	0,00%	
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	4,00	4		$ 175.735,00	$ 702.940,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	3,00	3		$ 94.029,00	$ 282.087,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	2,00	0		$ 66.686,00	$ -	$ 133.372,00	0,00%	0,00%	
4.7.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00	1		$ 846.541,00	$ 846.541,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1,00	0		$ 73.531,00	$ -	$ 73.531,00	0,00%	0,00%	
4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	1,00	0		$ 176.353,00	$ -	$ 176.353,00	0,00%	0,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	30,00	0		$ 5.814,00	$ -	$ 174.420,00	0,00%	0,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	0		$ 122.646,00	$ -	$ 490.584,00	0,00%	0,00%	
5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	0		$ 195.138,00	$ -	$ 585.414,00	0,00%	0,00%	
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1-1/2" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	15,00	0		$ 23.281,00	$ -	$ 349.215,00	0,00%	0,00%	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	15,00	0		$ 16.790,00	$ -	$ 251.850,00	0,00%	0,00%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	0		$ 174.276,00	$ -	$ 1.045.656,00	0,00%	0,00%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20Hi+40ºC VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	6,00	0		$ 62.384,00	$ -	$ 374.304,00	0,00%	0,00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0,04	M2	64,00	60,00	0	$ 41.218,00	$ 2.473.080,00	$ 164.872,00	93,75%	93,75%	
7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45. INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	77,16	0		$ 121.988,00	$ -	$ 9.412.594,08	0,00%	0,00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	20,00	0		$ 14.858,00	$ -	$ 297.160,00	0,00%	0,00%	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	18,60	49,7	0	$ 94.926,00	$ 4.717.822,20	$ (2.952.198,60)	267,20%	267,20%	
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	3,90	0		$ 761.157,00	$ -	$ 2.968.512,30	0,00%	0,00%	
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	2,52	0		$ 801.420,00	$ -	$ 2.019.578,40	0,00%	0,00%	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	6,00	0		$ 464.504,00	$ -	$ 2.787.024,00	0,00%	0,00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	5,00	0		$ 1.090.099,00	$ -	$ 5.450.495,00	0,00%	0,00%	
10.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)	UN	1,00	0		$ 762.932,00	$ -	$ 762.932,00	0,00%	0,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	4,00	0		$ 391.028,00	$ -	$ 1.564.112,00	0,00%	0,00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2,00	0		$ 746.496,00	$ -	$ 1.492.992,00	0,00%	0,00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2,00	0		$ 39.750,00	$ -	$ 79.500,00	0,00%	0,00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2,00	0		$ 32.443,00	$ -	$ 64.886,00	0,00%	0,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	23,25	0		$ 956.124,00	$ -	$ 22.229.883,00	0,00%	0,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1,44	0		$ 1.033.647,00	$ -	$ 1.488.451,68	0,00%	0,00%	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	192,92	48	8	$ 34.979,00	$ 1.678.992,00	$ 5.069.156,68	24,88%	24,88%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	192,20	0		$ 12.106,00	$ -	$ 2.326.773,20	0,00%	0,00%	
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	30,95	0		$ 9.831,00	$ -	$ 304.269,45	0,00%	0,00%	
12.1.8	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	36,95	0		$ 36.386,00	$ -	$ 1.344.462,70	0,00%	0,00%	
12.1.10	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	225,67	0		$ 12.606,00	$ -	$ 2.844.796,02	0,00%	0,00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	212,92	0		$ 20.875,00	$ -	$ 4.444.705,00	0,00%	0,00%	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	36,95	0		$ 16.631,00	$ -	$ 614.515,45	0,00%	0,00%	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	72,56	0		$ 125.971,00	$ -	$ 9.140.455,76	0,00%	0,00%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	4,32	0		$ 128.780,00	$ -	$ 556.329,60	0,00%	0,00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	13,40	0		$ 102.700,00	$ -	$ 1.376.180,00	0,00%	0,00%	
16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2,50	0		$ 68.873,00	$ -	$ 172.182,50	0,00%	0,00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	89,34	0		$ 129.084,00	$ -	$ 11.532.364,56	0,00%	0,00%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	41,67	0		$ 240.910,00	$ -	$ 10.038.719,70	0,00%	0,00%	
16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	12,00	0		$ 40.429,00	$ -	$ 485.148,00	0,00%	0,00%	
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	4,30	0		$ 187.010,00	$ -	$ 804.143,00	0,00%	0,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	145,50	0		$ 4.508,00	$ -	$ 655.914,00	0,00%	0,00%	
NP1	DESMONTE DE ESPEJOS Y/O VIDRIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,5			$ 22.388,00	$ -	$ 55.970,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UND	5			$ 1.174.105,00	$ -	$ 5.870.525,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR

	CPF	617	IED	RUFINO JOSE CUERVO SEDE C			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (Incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	8,40	8,4		$ 30.066,00	$ 252.554,40	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de Interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	160,53	160,53		$ 3.395,00	$ 544.999,35	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	171,54	160,53		$ 79.342,00	$ 12.736.771,26	$ 873.555,42	93,58%	93,58%	
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,96	0		$ 72.193,00	$ -	$ 141.498,28	0,00%	0,00%	
1.3.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)	M	1,50	1,5		$ 11.033,00	$ 16.549,50	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	150,00	135		$ 16.333,00	$ 2.204.955,00	$ 244.995,00	90,00%	90,00%	
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	68,77	64,21		$ 130.850,00	$ 8.401.878,50	$ 596.676,00	93,37%	93,37%	
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	64,21	64,21		$ 174.968,00	$ 11.234.695,28	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	0,70	0		$ 1.069.032,00	$ -	$ 748.322,40	0,00%	0,00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	10,00	0		$ 7.012,00	$ -	$ 70.120,00	0,00%	0,00%	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	431,81	431,81		$ 7.421,00	$ 3.204.462,01	$ -	100,00%	100,00%	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	150,00	0		$ 22.268,00	$ -	$ 3.340.200,00	0,00%	0,00%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	600,00	0		$ 9.705,00	$ -	$ 5.823.000,00	0,00%	0,00%	
4.7.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00	1		$ 1.137.300,00	$ 1.137.300,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	63,60	3,6		$ 43.769,00	$ 157.568,40	$ 2.626.140,00	5,66%	5,66%	
7.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E= 0.10 M ESCOBEADO, INCLUYE DILATACIÓN EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	160,53	160,53		$ 131.783,00	$ 21.155.124,99	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	24,56	24,56	0	$ 498.089,00	$ 12.233.065,84	$ -	100,00%	100,00%	SE SUBIO LA CANTIDAD CONTRATADA
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	220,53	0		$ 63.550,00	$ -	$ 14.014.681,50	0,00%	0,00%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX<0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	495,19	0		$ 19.187,00	$ -	$ 9.501.210,53	0,00%	0,00%	
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	150,00	150	15	$ 25.380,00	$ 3.807.000,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"XS", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE	M2	8,20	0		$ 761.157,00	$ -	$ 6.241.487,40	0,00%	0,00%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	40,00	0		$ 8.860,00	$ -	$ 354.400,00	0,00%	0,00%	
15.1.3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	8,20	0		$ 126.933,00	$ -	$ 1.040.850,60	0,00%	0,00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	9,68	0		$ 129.084,00	$ -	$ 1.249.533,12	0,00%	0,00%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	9,68	0		$ 240.910,00	$ -	$ 2.332.008,80	0,00%	0,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	160,53	0		$ 4.508,00	$ -	$ 723.669,24	0,00%	0,00%	

	CPF	609	IED	JOSE ANTONIO SAN CARLOS SEDE B			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (Incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	150,00			$ 30.066,00	$ -	$ 4.509.900,00	0,00%	0,00%	
1.2.7	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	35,00			$ 112.077,00	$ -	$ 3.922.695,00	0,00%	0,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	18,00			$ 21.553,00	$ -	$ 387.954,00	0,00%	0,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8,00			$ 11.566,00	$ -	$ 92.528,00	0,00%	0,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	30,00			$ 4.244,00	$ -	$ 127.320,00	0,00%	0,00%	
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	20,00			$ 18.061,00	$ -	$ 361.220,00	0,00%	0,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	70,00			$ 16.333,00	$ -	$ 1.143.310,00	0,00%	0,00%	
2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12,25			$ 64.356,00	$ -	$ 788.361,00	0,00%	0,00%	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	17,50			$ 160.361,00	$ -	$ 2.806.317,50	0,00%	0,00%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	17,53			$ 141.229,00	$ -	$ 2.475.744,37	0,00%	0,00%	
3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17,53			$ 9.398,00	$ -	$ 164.746,94	0,00%	0,00%	
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	17,53			$ 27.238,00	$ -	$ 477.482,14	0,00%	0,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8,00			$ 122.646,00	$ -	$ 981.168,00	0,00%	0,00%	
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A.C SCH 40 DE 3"	M	170,00			$ 197.464,00	$ -	$ 33.568.880,00	0,00%	0,00%	
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACESORIO RANURADO DE 3"	UN	4,00			$ 134.072,00	$ -	$ 536.288,00	0,00%	0,00%	
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING FLEXIBLE 3"	UN	4,00			$ 36.400,00	$ -	$ 145.600,00	0,00%	0,00%	
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON 2" RANURADO	UN	2,00			$ 23.876,00	$ -	$ 47.752,00	0,00%	0,00%	
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC - C900 DE 4"	M	165,00			$ 286.069,00	$ -	$ 47.201.385,00	0,00%	0,00%	
6.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTOR DE MOVIMIENTO TUBERIA Y ACCESORIO 4"	UN	25,00			$ 481.464,00	$ -	$ 12.036.600,00	0,00%	0,00%	
6.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN PVC-C900-ACERO CARBON DE 4"	UN	2,00			$ 977.178,00	$ -	$ 1.954.356,00	0,00%	0,00%	
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II	UN	1,00			$ 1.393.926,00	$ -	$ 1.393.926,00	0,00%	0,00%	
6.1.9	ACCESORIOS SCH40 4" RANURADOS 300 PSI SUMINISTROS E INSTALACIÓN	UN	10,00			$ 143.998,00	$ -	$ 1.439.980,00	0,00%	0,00%	
6.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN 3"	UN	3,00			$ 2.923.921,00	$ -	$ 8.771.763,00	0,00%	0,00%	
6.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT DE TRANSICIÓN C-900 4" ACERO - PVC	UN	3,00			$ 1.234.058,00	$ -	$ 3.702.174,00	0,00%	0,00%	
6.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC - C900 DE 4"	UN	16,00			$ 954.952,00	$ -	$ 15.279.232,00	0,00%	0,00%	
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC - C900 DE 4"	UN	4,00			$ 1.011.027,00	$ -	$ 4.044.108,00	0,00%	0,00%	
6.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SCH 10 ROJA DE 2"RANURADA	M	80,00			$ 177.592,00	$ -	$ 14.207.360,00	0,00%	0,00%	
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS	M2	3,60			$ 787.438,00	$ -	$ 2.834.776,80	0,00%	0,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	300,00			$ 4.508,00	$ -	$ 1.352.400,00	0,00%	0,00%	

CPF		609	IED	EMERGENCIA JACKELIN			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (Incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	10,00	10	10	$ 30.066,00	$ 300.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	100,00	100	100	$ 4.508,00	$ 450.800,00	$ -	100,00%	100,00%	
	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1,00	1	1	$ 1.948.634,00	$ 1.948.634,00	$ -	100,00%	100,00%	

CPF		609	IED	EMERGENCIA OEA			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (Incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	10,00	10	0	$ 30.066,00	$ 300.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y AUSTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	31,59	30	0	$ 31.500,00	$ 945.000,00	$ 50.085,00	94,97%	94,97%	
	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16,41	18,45	0	$ 10.995,00	$ 202.857,75	$ (22.429,80)	112,43%	112,43%	
	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2	31,59	0	0	$ 127.792,00	$ -	$ 4.036.949,28	0,00%	0,00%	
	RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	M2	16,41	0	0	$ 136.965,00	$ -	$ 2.247.595,65	0,00%	0,00%	
	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	10,00	10	0	$ 5.814,00	$ 58.140,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	31,59	32,68	0	$ 43.769,00	$ 1.430.370,92	$ (47.708,21)	103,45%	103,45%	
	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	31,59	0	0	$ 72.800,00	$ -	$ 2.299.752,00	0,00%	0,00%	
	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	16,00	29,34	0	$ 26.248,00	$ 770.116,32	$ (350.148,32)	183,38%	183,38%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	31,59	40	0	$ 74.985,00	$ 2.999.400,00	$ (630.623,85)	126,62%	126,62%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	50,90	10	0	$ 25.380,00	$ 253.800,00	$ 1.038.042,00	19,65%	19,65%	
	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	16,41	10	0	$ 36.386,00	$ 363.860,00	$ 233.234,26	60,94%	60,94%	
	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	54,00	10	0	$ 28.786,00	$ 287.860,00	$ 1.266.584,00	18,52%	18,52%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD ESPESOR 10 MM CON SANBLASTING TIPO PERSIANA	M2	0,80	0	0	$ 262.754,00	$ -	$ 210.203,20	0,00%	0,00%	
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	40,00	32	0	$ 40.429,00	$ 1.293.728,00	$ 323.432,00	80,00%	80,00%	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	14,56	5	0	$ 24.883,00	$ 124.415,00	$ 237.881,48	34,34%	34,34%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	31.59	0	0	$ 4.508.00	$ -	$ 142.407.72	0.00%	0.00%	
				0	0						
	CERRAMIENTO EN LONA (Incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	10,00	0	0	$ 30.066,00	$ -	$ 300.660,00	0,00%	0,00%	
	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,88	0	0	$ 21.852,00	$ -	$ 215.897,76	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO. INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	9.88	0	0	$ 203.467,00	$ -	$ 2.009.256,97	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO H=10 CM. INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	93,07	0	0	$ 83.512,00	$ -	$ 7.772.461,84	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIA CAÑA EN FIBRA DE VIDRIO	M	95,50	0	0	$ 22.997,00	$ -	$ 2.196.213,50	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	93,07	130	0	$ 23.735,00	$ 3.085.550,00	$ (876.533,55)	139,68%	139,68%	
	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	27,42	75,11	0	$ 67.537,00	$ 5.072.704,07	$ (3.220.731,47)	273,91%	273,91%	
	PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	37,30	6	0	$ 40.967,00	$ 245.802,00	$ 1.282.131,91	16,09%	16,09%	ESTUCO
	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	37,30	6	0	$ 20.875,00	$ 125.250,00	$ 653.318,61	16,09%	16,09%	EPOXICA
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	30,00	20	0	$ 40.429,00	$ 808.580,00	$ 404.290,00	66,67%	66,67%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	68,02	20	0	$ 4.508,00	$ 90.160,00	$ 216.467,96	29,40%	29,40%	

CPF		609	IED	EMERGENCIA DILE TUNJUELITO			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (Incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	25,00	0	0	$ 30.066,00	$ -	$ 751.650,00	0,00%	0,00%	
	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0.08 A 0.10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	20,00	0,8	0	$ 72.193,00	$ 57.754,40	$ 1.386.105,60	4,00%	4,00%	
	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	20,00	5	0	$ 20.015,00	$ 100.075,00	$ 300.225,00	25,00%	25,00%	
	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	3,00	3	0	$ 9.069,00	$ 27.207,00	$ -	100,00%	100,00%	
	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	5,00	0	0	$ 18.061,00	$ -	$ 90.305,00	0,00%	0,00%	
	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12,00	12	0	$ 16.333,00	$ 195.996,00	$ -	100,00%	100,00%	
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0.88	0.88	0	$ 96.108,00	$ 84.575,04	$ (480,54)	100,57%	100,57%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0,25	0	0	$ 183.945,00	$ -	$ 45.986,25	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	5,00	2,55	0	$ 334.957,00	$ 854.140,35	$ 820.644,65	51,00%	51,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	2.00	0	0	$ 7.012,00	$ -	$ 14.024,00	0,00%	0,00%	
	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2	90,00	80	0	$ 14.353,00	$ 1.148.240,00	$ 143.530,00	88,89%	88,89%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO) DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	30,10	0	0	$ 66.398,00	$ -	$ 1.998.579,80	0,00%	0,00%	
	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	90,00	20	0	$ 20.875,00	$ 417.500,00	$ 1.461.250,00	22,22%	22,22%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM) . INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	3,00	3	0	$ 319.199,00	$ 957.597,00	$ -	100,00%	100,00%	
	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20,00	5	0	$ 68.873,00	$ 344.365,00	$ 1.033.095,00	25,00%	25,00%	
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	120,00	4	0	$ 40.429,00	$ 161.716,00	$ 4.689.764,00	3,33%	3,33%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	150.00	20	0	$ 4.508.00	$ 90.160.00	$ 586.040.00	13.33%	13.33%	

CPF		609	IED	EMERGENCIA HERNANDO DURAN DUSSAN			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (Incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	10,00	0	0	$ 30.066,00	$ -	$ 300.660,00	0,00%	0,00%	
	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.01 A 0.05 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	49,00	0	0	$ 6.953,00	$ -	$ 340.697,00	0,00%	0,00%	
	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	49,00	60	0	$ 18.852,00	$ 1.131.120,00	$ (207.372,00)	122,45%	122,45%	
	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2	49,00	0	0	$ 127.792,00	$ -	$ 6.261.808,00	0,00%	0,00%	
	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	50,00	0	0	$ 5.814,00	$ -	$ 290.700,00	0,00%	0,00%	
	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	49,00	0	0	$ 72.800,00	$ -	$ 3.567.200,00	0,00%	0,00%	
	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	35,00	0	0	$ 26.248,00	$ -	$ 918.680,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	35,00	0	0	$ 25.380,00	$ -	$ 888.300,00	0,00%	0,00%	
	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	8,75	0	0	$ 39.822,00	$ -	$ 348.442,50	0,00%	0,00%	
	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	49,00	60	0	$ 97.011,00	$ 5.820.660,00	$ (1.067.121,00)	122,45%	122,45%	
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	15,00	15	0	$ 40.429,00	$ 606.435,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	49,00	0	0	$ 4.508,00	$ -	$ 220.892,00	0,00%	0,00%	

CPF		609	IED	EMERGENCIA COLEGIO CASTILLA			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	0,00	0	0	$ 3.395,00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,00	1	0	$ 21.553,00	$ 21.553,00	$ 21.553,00	50,00%	50,00%	
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	57,00	60	0	$ 35.518,00	$ 2.131.080,00	$ (106.554,00)	105,26%	105,26%	
	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	0,00	0	0	$ 11.566,00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M	24,99	0	0	$ 4.147,00	$ -	$ 103.633,53	0,00%	0,00%	
	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	2.01	1	0	$ 141.229,00	$ 141.229,00	$ 142.641,29	49.75%	49.75%	
	EMBOQUILLADO DE LADRILLO A LA VISTA EN ALTURA MENOR A 1.50 M CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	2.01	1	0	$ 25.645,00	$ 25.645,00	$ 25.901,45	49.75%	49.75%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM	0,00	0	0	$ 1.676,00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	47,32	53,82	0	$ 8.860,00	$ 476.845,20	$ (57.590,00)	113,74%	113,74%	
	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	33,60	15	0	$ 102.700,00	$ 1.540.500,00	$ 1.910.220,00	44,64%	44,64%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLÚCIDO BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	57,00	60	0	$ 224.940,00	$ 13.496.400,00	$ (674.820,00)	105,26%	105,26%	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	0,00	0	0	$ 24.883,00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	28,50	36,33	0	$ 240.910,00	$ 8.752.260,30	$ (1.886.325,30)	127,47%	127,47%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	57,00	60	0	$ 4.508,00	$ 270.480,00	$ (13.524,00)	105,26%	105,26%	
	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	10,00	60	0	$ 7.491,00	$ 449.460,00	$ (374.550,00)	600,00%	600,00%	

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

RECEPCIÓN DETALLADA PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

SED-LP-OP-DCCEE-012-2025		**OBJETO**	OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA			al del Contrato (SIGLA UNIDAD DEL
			Fecha de Acta Inicio:
CONSORCIO CORAL INGENIERIA			Valor Adición:
			Valor total presente formato:
			Fecha presente formato:
ANGELICA MARIA ESTRADA AVELLA			Corte de mantenimiento:
MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR			odo Ejecución corte de mantenimie

CFP-601 INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA

CONSECUTIVO NECESIDAD :

ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD: **FACHADAS Y BAÑOS**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	40,11	$ 30.066,00	$ 1.205.947,26
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	0,54	$ 286.958,00	$ 154.957,32
1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	0,6	$ 113.245,00	$ 67.947,00
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	32,72	$ 29.984,00	$ 981.076,48
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,27	$ 31.500,00	$ 1.268.505,00
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,85	$ 21.553,00	$ 61.426,05
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	163,4	$ 10.995,00	$ 1.796.583,00
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	40	$ 26.585,00	$ 1.063.400,00
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	108,04	$ 12.224,00	$ 1.320.680,96
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,55	$ 32.061,00	$ 209.999,55
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28	$ 26.367,00	$ 738.276,00
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,7	$ 31.476,00	$ 84.985,20
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	9	$ 11.566,00	$ 104.094,00
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	6	$ 7.219,00	$ 43.314,00
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	20	$ 4.244,00	$ 84.880,00
1.2.34	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2	$ 385.556,00	$ 771.112,00
1.2.35	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,35	$ 23.790,00	$ 8.326,50
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	19,5	$ 8.659,00	$ 168.850,50
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	18	$ 14.178,00	$ 255.204,00
1.3.2	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2	141,12	$ 147.193,00	$ 20.771.876,16
1.3.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)	M	30	$ 11.033,00	$ 330.990,00

1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	33,45	$ 21.111,00	$ 706.162,95
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	7	$ 36.280,00	$ 253.960,00
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	33	$ 16.333,00	$ 538.989,00
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0,76	$ 70.230,00	$ 53.374,80
3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1037,04	$ 9.398,00	$ 9.746.101,92
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	529,58	$ 27.238,00	$ 14.424.700,04
INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	1,00	$ 25.481,00	$ 25.481,00
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	6,00	$ 14.486,00	$ 86.916,00
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	6,00	$ 61.400,00	$ 368.400,00
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	18,00	$ 61.400,00	$ 1.105.200,00
4.9.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6" (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	61,96	$ 13.297,00	$ 823.882,12
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	405,00	$ 5.814,00	$ 2.354.670,00
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	$ 122.646,00	$ 735.876,00
5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 195.138,00	$ 780.552,00
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	17,30	$ 22.533,00	$ 389.820,90
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	15,00	$ 16.790,00	$ 251.850,00
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	$ 174.276,00	$ 1.045.656,00
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	6,00	$ 62.384,00	$ 374.304,00

PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	78,27	$ 41.218,00	$ 3.226.132,86
7.1.3	ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:3	M	48,36	$ 14.910,00	$ 721.047,60
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	67,47	$ 203.467,00	$ 13.727.918,49
7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO H=10 CM, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	57,80	$ 83.512,00	$ 4.826.993,60
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	57,80	$ 14.858,00	$ 858.792,40
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	21,52	$ 63.550,00	$ 1.367.596,00
7.2.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN TABLETA ROJA 7X25 CM	M2	0,00	$ 83.679,00	$ -
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	670,38	$ 19.187,00	$ 12.862.581,06
7.2.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA	M	0,00	$ 27.504,00	$ -
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	0,00	$ 85.861,00	$ -
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	102,64	$ 94.926,00	$ 9.743.204,64
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1,28	$ 451.950,00	$ 578.496,00
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	6,32	$ 1.090.099,00	$ 6.889.425,68
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
10.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	0,00	$ 1.074.021,00	$ -
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	6,00	$ 746.496,00	$ 4.478.976,00
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	12,00	$ 391.028,00	$ 4.692.336,00
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	3,00	$ 32.443,00	$ 97.329,00
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	5,07	$ 956.124,00	$ 4.847.548,68
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2,63	$ 1.033.647,00	$ 2.718.491,61

PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	13,65	$ 34.979,00	$ 477.463,35
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	798,70	$ 39.822,00	$ 31.805.831,40
12.1.3	PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	37,88	$ 40.967,00	$ 1.551.829,96
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	14,22	$ 12.106,00	$ 172.147,32
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	945,65	$ 23.852,00	$ 22.555.643,80
12.1.10	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	15,57	$ 12.606,00	$ 196.275,42
12.1.12	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	32,94	$ 12.568,00	$ 413.989,92
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	37,88	$ 20.875,00	$ 790.745,00
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	49,64	$ 33.461,00	$ 1.661.004,04
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1333,43	$ 28.786,00	$ 38.384.115,98
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1295,91	$ 20.749,00	$ 26.888.836,59
12.2.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	32,94	$ 17.148,00	$ 564.855,12
12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	1247,97	$ 23.550,00	$ 29.389.693,50
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	0,00	$ 8.860,00	$ -
VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	5,19	$ 128.780,00	$ 668.368,20
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
15.1.8	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	0,00	$ 12.418.656,00	$ -
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	30,00	$ 40.429,00	$ 1.212.870,00
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	359,00	$ 4.508,00	$ 1.618.372,00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP1	DESMONTE DE ESPEJOS Y/O VIDRIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,30	$ 22.388,00	$ 118.656,40
NP3	ESCARIFICACIÓN MECÁNICA SOBRE LADRILLO O CUALQUIER SUPERFICIE EXISTENTE PARA GENERAR RUGOSIDAD Y MEJORAR LA ADHERENCIA DE MATERIALES POSTERIORES. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SUELTO.	M2	728,55	$ 31.942,00	$ 23.271.344,10
NP6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UND	6,00	$ 1.174.105,00	$ 7.044.630,00
				VALOR TOTAL + AIU	**$ 325.981.869,43**

COSTO DIRECTO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA			**$ 244.053.207,63**
AIU	ADMINISTRACIÓN	27,57%	$ 67.285.469,34
	IMPREVISTOS	1,00%	$ 2.440.532,08
	UTILIDAD	5,00%	$ 12.202.660,38
TOTAL AIU		**33,57%**	**$ 81.928.661,80**
TOTAL			**$ 325.981.869,43**

Código: 1LF-FR-0208	OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
Fecha: 22/12/2024	
Versión: 1	RECEPCIÓN DETALLADA PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

CONTRATO:	SED-LP-OP-DCCEE-012-2025	OBJETO	OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
UNIDAD:	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
ORDENADOR DEL GASTO:			al del Contrato (SIGLA UNIDAD DE
			Fecha de Acta Inicio:
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORAL INGENIERIA		Valor Adición:
SUPERVISOR TÉCNICO:			Valor total presente formato:
COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACIÓN DEL GASTO:			Fecha presente formato:
RESIDENTE DE OBRA:	ANGELICA MARIA ESTRADA AVELLA		Corte de mantenimiento:
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR		do Ejecución corte de mantenimie

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	CFP-849 INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS ARTURO SEDE A
CONSECUTIVO NECESIDAD :	
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	BAÑOS/ZONA EXTERIOR/MURO EXTERIOR

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
	1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	57,00	$ 4.093,00	$ 233.301,00
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	90,00	$ 30.066,00	$ 2.705.940,00
	1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	10,00	$ 2.402,00	$ 24.020,00
	1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	1,03	$ 286.958,00	$ 295.566,74
	1.2.2	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	8	$ 244.462,00	$ 1.955.696,00
	1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	11	$ 113.245,00	$ 1.245.695,00
	1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,03	$ 72.193,00	$ 74.358,79
	1.2.7	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,03	$ 112.077,00	$ 115.439,31
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	29,73	$ 31.500,00	$ 936.495,00
	1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	85	$ 21.553,00	$ 1.832.005,00
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	65	$ 10.995,00	$ 714.675,00
	1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	10	$ 26.585,00	$ 265.850,00
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	53,05	$ 12.224,00	$ 648.483,20
	1.2.16	DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	14,7	$ 113.213,00	$ 1.664.231,10
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	45,4	$ 32.061,00	$ 1.455.569,40
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	16	$ 26.367,00	$ 421.872,00
	1.2.22	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	4	$ 161.707,00	$ 646.828,00
	1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	23,7	$ 35.518,00	$ 841.776,60
	1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	31,49	$ 31.476,00	$ 991.179,24
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4	$ 7.219,00	$ 28.876,00
	1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	20	$ 4.244,00	$ 84.880,00
	1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	65	$ 8.659,00	$ 562.835,00
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	8	$ 14.178,00	$ 113.424,00
	1.2.43	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.15 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	23,7	$ 45.204,00	$ 1.071.334,80
	1.2.48	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,8	$ 30.684,00	$ 55.231,20
	1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	42,93	$ 18.061,00	$ 775.358,73
	1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	27,2	$ 16.333,00	$ 444.257,60
	1.4.7	DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	27,2	$ 12.288,00	$ 334.233,60

2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	5,25	$ 96.108,00	$ 504.567,00
	2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	5,25	$ 64.356,00	$ 337.869,00
	2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	4,2	$ 174.968,00	$ 734.865,60
	2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	2	$ 1.069.032,00	$ 2.138.064,00
	2.2.3	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3	14	$ 1.012.858,00	$ 14.180.012,00
	2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	110,6	$ 101.433,00	$ 11.218.489,80
	2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	84	$ 57.073,00	$ 4.794.132,00
	2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	93,7	$ 160.361,00	$ 15.025.825,70
	2.2.15	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI DE 15 CM SOBRE LAMINA COLABORANTE 2"	M2	8,3	$ 241.182,00	$ 2.001.810,60
	2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	822,31	$ 7.012,00	$ 5.766.037,72
	2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	544	$ 7.421,00	$ 4.037.024,00
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
	3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	45,35	$ 70.230,00	$ 3.184.930,50
	3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	17,35	$ 141.229,00	$ 2.450.323,15
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	9,00	$ 88.516,00	$ 796.644,00
	4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	9,00	$ 76.084,00	$ 684.756,00
	4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	9,00	$ 49.410,00	$ 444.690,00
	4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	9,00	$ 135.539,00	$ 1.219.851,00
	4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	32,93	$ 25.481,00	$ 839.089,33
	4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	116,40	$ 19.470,00	$ 2.266.308,00
	4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1"	UN	63,00	$ 9.479,00	$ 597.177,00
	4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	61,00	$ 61.400,00	$ 3.745.400,00
	4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	9,00	$ 61.400,00	$ 552.600,00
	4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	9,00	$ 175.735,00	$ 1.581.615,00
	4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	9,00	$ 94.029,00	$ 846.261,00
	4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	2,00		
	4.6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 1"	UN	4,00	$ 200.497,00	$ 801.988,00
	4.6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"	UN	4,00	$ 206.989,00	$ 827.956,00
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	120,00	$ 5.814,00	$ 697.680,00
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 122.646,00	$ 490.584,00
	5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	2,00	$ 28.341,00	$ 56.682,00
	5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	35,00	$ 9.743,00	$ 341.005,00
	5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	15,00	$ 22.533,00	$ 337.995,00
	5.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	38,00	$ 21.721,00	$ 825.398,00
	5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	6,00	$ 62.384,00	$ 374.304,00
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
	7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	29,72	$ 41.218,00	$ 1.224.998,96
	7.1.4	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2	122,00	$ 39.550,00	$ 4.825.100,00
	7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	123,00	$ 26.248,00	$ 3.228.504,00
	7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	80,00	$ 498.089,00	$ 39.847.120,00
	7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	41,08	$ 14.858,00	$ 610.366,64
	7.2.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	23,09	$ 132.061,00	$ 3.049.288,49
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	60,00	$ 85.861,00	$ 5.151.660,00
	7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	120,00	$ 94.926,00	$ 11.391.120,00
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
	9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	44,20	$ 761.157,00	$ 33.643.139,40
	9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	7,27	$ 738.943,00	$ 5.372.115,61
	9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	48,13	$ 965.200,00	$ 46.455.076,00

	9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	4,80	$ 1.090.099,00	$ 5.232.475,20
10	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
	10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	6,00	$ 746.496,00	$ 4.478.976,00
	10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	12,00	$ 391.028,00	$ 4.692.336,00
	10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2,00	$ 39.750,00	$ 79.500,00
	10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	3,00	$ 32.443,00	$ 97.329,00
	10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	7,60	$ 945.896,00	$ 7.188.809,60
11	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	5,80	$ 956.124,00	$ 5.545.519,20
	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	3,15	$ 1.033.647,00	$ 3.255.988,05
12	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
	12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	42,58	$ 34.979,00	$ 1.489.405,82
	12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	38,88	$ 12.106,00	$ 470.681,28
	12.1.8	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	49,61	$ 36.386,00	$ 1.805.109,46
	12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	45,00	$ 23.852,00	$ 1.073.340,00
	12.1.12	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	45,00	$ 12.568,00	$ 565.560,00
	12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	32,94	$ 33.461,00	$ 1.102.205,34
	12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	235,00	$ 28.786,00	$ 6.764.710,00
	12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	45,00	$ 26.828,00	$ 1.207.260,00
	12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	235,00	$ 23.550,00	$ 5.534.250,00
	12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	120,00	$ 8.860,00	$ 1.063.200,00
13	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
	13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	29,35	$ 125.971,00	$ 3.697.248,85
14	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
	14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	8,25	$ 128.780,00	$ 1.062.435,00
16	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
	16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	12,20	$ 102.700,00	$ 1.252.940,00
	16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	50,00	$ 129.084,00	$ 6.454.200,00
	16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	50,50	$ 240.910,00	$ 12.165.955,00
	16.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 2"x1/8" SOBRE CORREAS PARA FIJACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA	M	27,00	$ 18.402,00	$ 496.854,00
18	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	144,00	$ 4.508,00	$ 649.152,00
19	MANTENIIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
	19.1.4	PODA DE ARBOLES CLASE I (H<5M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	0,00	$ 222.701,00	$ -
	19.1.5	PODA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<15M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	0,00	$ 445.403,00	$ -
	19.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMATICO CON 2 BOMBAS DE 2HP 110/220 TANQUE HIDRONEUMATICO POR MEMBRANA DE 200LTS, MARCA PEARL, TABLERO DE CONTROL CON NORMA RETIE (INCLUYE 2 BOMBAS ALTA PRESIÓN CAUDAL 2.33LP/S H.MAQ 50MT 1 TANQUE HIDROACUMULADOR MEMBRANA 200LTS VERTICAL CON MANOMETRO ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN ENTRE BOMBAS Y TANQUE EN HIERRO GALVANIZADO (HG), 1 FLAUTA DE DESCARGA EN 3" INCLUYE COPA DE DESCARGA 3 A 2, 2 REGISTROS EN BRONCE TIPO COMPUERTA, 2 VÁLVULAS CHEQUE HIDRONEUMATICO EN BRONCE, 1 TABLERO DE CONTROL EN COFRE METÁLICO CON NORMA RETIE 2- PRESOSTATOS RANGO 40/60, 1 SENSOR DE NIVEL (FLOTADOR), 1 MANOMETRO EN GLICERINA CON CARATULA DE 2" (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	UN	1,00	$ 18.416.383,00	$ 18.416.383,00
NP	ITEMS NO PREVISTOS					
	NP1	DESMONTE DE ESPEJOS Y/O VIDRIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,00	$ 22.388,00	$ 22.388,00
	NP2	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTENEDOR DE BASURA (INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE EN SITIO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO)	UND	1,00	$ 3.645.673,00	$ 3.645.673,00
	NP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCERTINA SENCILLA DIÁMETRO 18" EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE O FIJACIÓN	ML	45,00	$ 116.687,00	$ 5.250.915,00
	NP6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UND	8,00	$ 1.174.105,00	$ 9.392.840,00
					VALOR TOTAL + AIU	$ 374.193.474,61

COSTO DIRECTO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA			$ 280.147.843,54
AIU	ADMINISTRACIÓN	27,57%	$ 77.236.760,46
	IMPREVISTOS	1,00%	$ 2.801.478,44
	UTILIDAD	5,00%	$ 14.007.392,18
TOTAL AIU		33,57%	$ 94.045.631,07
TOTAL			$ 374.193.474,61

Código: 1LF-FR-0208	OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
Fecha: 22/12/2024	
Versión: 1	RECEPCIÓN DETALLADA PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

CONTRATO:	SED-LP-OP-DCCEE-012-2025	OBJETO	OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
UNIDAD:	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
ORDENADOR DEL GASTO:			al del Contrato (SIGLA UNIDAD DEL
			Fecha de Acta Inicio:
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORAL INGENIERIA		Valor Adición:
SUPERVISOR TÉCNICO:			Valor total presente formato:
COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACIÓN DEL GASTO:			Fecha presente formato:
RESIDENTE DE OBRA:	ANGELICA MARIA ESTRADA AVELLA		Corte de mantenimiento:
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR		odo Ejecución corte de mantenimie

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	CPF 601 - CARLOS ARTURO TORRES SEDE B
CONSECUTIVO NECESIDAD :	
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	CANCHA/AULAS

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	21,00	$ 30.066,00	$ 631.386,00
	1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	0	$ 3.395,00	$ -
	1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,7	$ 79.342,00	$ 55.539,40
	1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,3	$ 72.193,00	$ 21.657,90
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	42,98	$ 31.500,00	$ 1.353.870,00
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	72,11	$ 10.995,00	$ 792.849,45
	1.2.14	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	19,32	$ 155.716,00	$ 3.008.433,12
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	8,23	$ 32.061,00	$ 263.862,03
	1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,39	$ 28.405,00	$ 153.102,95
	1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	133,62	$ 35.518,00	$ 4.745.915,16
	1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	64,53	$ 31.476,00	$ 2.031.146,28
	1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	41	$ 11.566,00	$ 474.206,00
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	19	$ 7.219,00	$ 137.161,00
	1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	87,7	$ 4.244,00	$ 372.198,80
	1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	76,91	$ 16.333,00	$ 1.256.171,03
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
	2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	1,25	$ 64.356,00	$ 80.445,00
	2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	2,5	$ 183.945,00	$ 459.862,50
	2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	43,14	$ 632.023,00	$ 27.265.472,22
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
	3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM	0,00	$ 1.676,00	$ -
	3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	2,13	$ 141.229,00	$ 300.817,77
	3.1.8	ENCHAPE EN MAMPOSTERIA LADRILLO A LA VISTA PRENSADO LIVIANO M-02	M2	8,00	$ 78.665,00	$ 629.320,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	7	$ 122.646,00	$ 858.522,00
	5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8	$ 163.229,00	$ 1.305.832,00
	5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2	$ 147.178,00	$ 294.356,00
	5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	9	$ 204.593,00	$ 1.841.337,00
	5.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	79	$ 15.899,00	$ 1.256.021,00
	5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	59	$ 16.790,00	$ 990.610,00
