CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°2
PERIODO: MARZO DEL 2026

PROVINCIA: SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA SOACHA
MUNICIPIO DE SOACHA

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Soacha:

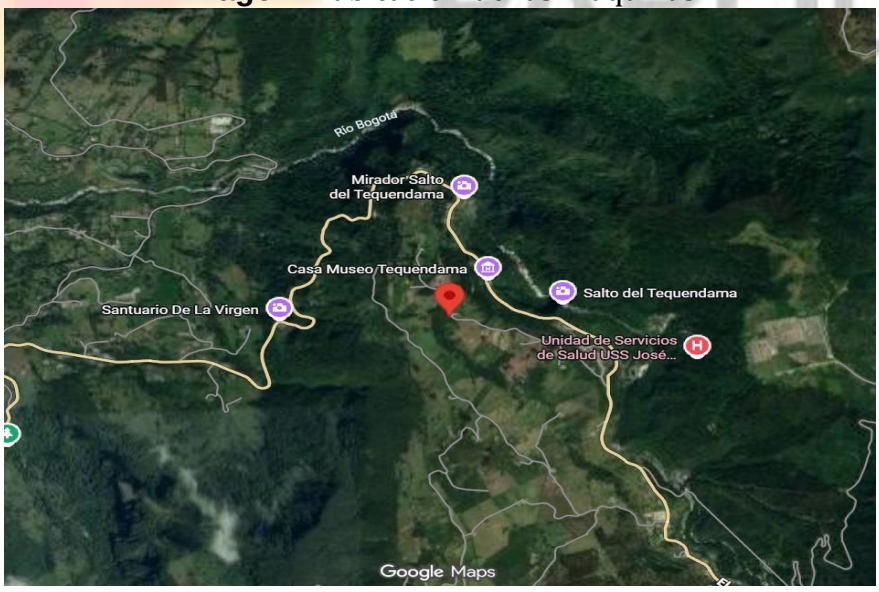
Facatativa:

1. Motoniveladora CAT0120KHSZN01634
2. Retroexcavadora JJGN58SREJC754103
3. Vibrocompactador 2742548

Ubicación:

Soacha – coordenadas 4°34'27.4"N 74°17'54.4"W

Imagen 1 ubicación de las maquinas



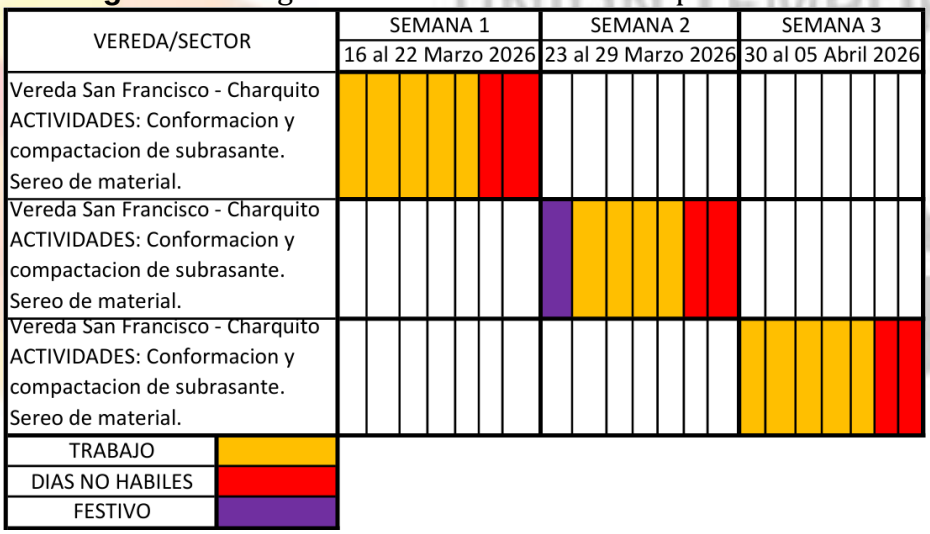
Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	EMILIO STEVENS MORENO
INSPECTOR DE OBRA ICCU	LEONARDO GUERRA
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103	MANUEL ARVEY NIETO
OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR 2742548	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ
OPERADOR DE MOTONIVELADORA CAT0120KHSZN01634	EDGAR ORLEY AMORTEGUI

3. PLAN DE TRABAJO

Imagen 2 cronograma de actividades municipio de Soacha.



Fuente: Alcaldía de Soacha

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

Se desarrollan actividades de mantenimiento y rehabilitación en diferentes tramos de la vereda San francisco - Charquito. Se establece un plan de trabajo con el objetivo de conformar, compactar y perfilar la superficie de subrasante. Dicho trabajo incorpora el apoyo de una motoniveladora, un vibrocompactador y una retroexcavadora. Se registra un avance del 90% de las actividades programadas.

FECHA	ACTIVIDADES
16/03/2026	**ACTIVIDADES:** 📍 Vereda/Sector: Charquitos 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Se traslada maquinaria en horas de la mañana del municipio de Facatativá al municipio de Soacha. Se inician actividades de conformación y compactación de subrasante. Se dificultan actividades debido a terreno saturado por fuertes lluvias. 📏 Avance (km): 0.3 🔻 *RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SREJC754103 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MANUEL NIETO ⏱ H. inicial – H. final: 6789.7 – 6792.7 ⚠ Novedades mecánicas: - Requiere arandelas de ajuste - Presenta corto en el sistema de luces - Aire acondicionado no funciona - Cambio llantas traseras - Equipo a 30 horas de requerir el mantenimiento preventivo. 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0120KHSZN01634 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: HUGO ADRIAN ROMERO ⏱ H. inicial – H. final: 2220.4 – 2224.2

	⚠ Novedades mecánicas: - Seguro de la dirección en mal estado - Presenta fuga de aceite hidráulico - Aire acondicionado no funciona - Freno de parqueo no funciona - Escalón de escalera de ingreso rota - Cambio de stop y luces en general - Cambio de plumillas - Presenta pérdida de fuerza - Requiere botiquín y extintor 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742548 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAVIER RAMIREZ ⏱ H. inicial – H. final: 3406.7 – 3409.5 ⚠ Novedades mecánicas: - Requiere mantenimiento preventivo - 1 galon de refrigerante - Grasa e inyector 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
17/03/2026	**ACTIVIDADES:** 📍 Vereda/Sector: Charquitos 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Se realiza conformacion y compactacion de subrasante. Se dificultan actividades debido a terreno saturado por fuertes lluvias. 📏 Avance (km): 0.6 🔻 *RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SREJC754103 (OPERATIVA)*

	🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MANUEL NIETO ⏱ H. inicial – H. final: 6792.7 – 6797.8 ⚠ Novedades mecánicas: - Requiere arandelas de ajuste - Presenta corto en el sistema de luces - Aire acondicionado no funciona - Cambio llantas traseras - Equipo a 30 horas de requerir el mantenimiento preventivo. 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0120KHSZN01634 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: ORLEY AMORTEGUI ⏱ H. inicial – H. final: 2224.2 – 2228.2 ⚠ Novedades mecánicas: - Seguro de la dirección en mal estado - Presenta fuga de aceite hidráulico - Aire acondicionado no funciona - Freno de parqueo no funciona - Escalón de escalera de ingreso rota - Cambio de stop y luces en general - Cambio de plumillas - Presenta pérdida de fuerza - Requiere botiquín y extintor 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742548 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU

	👷 Operador: JAVIER RAMIREZ ⏱ H. inicial – H. final: 3409.5 – 3412.1 ⚠ Novedades mecánicas: - Requiere mantenimiento preventivo - 1 galon de refrigerante - Grasa e inyector 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA • 📝 Observaciones: NA
18/03/2026	**ACTIVIDADES:** 📍 Vereda/Sector: Charquitos 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: No se realizan actividades por fuertes lluvias en el sector. 🔷 *RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SREJC754103 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MANUEL NIETO ⏱ H. inicial – H. final: 6797.8 – 6797.8 ⚠ Novedades mecánicas: - Requiere arandelas de ajuste - Presenta corto en el sistema de luces - Aire acondicionado no funciona - Cambio llantas traseras - Equipo a 30 horas de requerir el mantenimiento preventivo. 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔷 *MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0120KHSZN01634 (OPERATIVA)*

	🏢 Propiedad: ICCU ⛑️ Operador: ORLEY AMORTEGUI ⏱️ H. inicial – H. final: 2228.2 – 2228.2 ⚠️ Novedades mecánicas: - Seguro de la dirección en mal estado - Presenta fuga de aceite hidráulico - Aire acondicionado no funciona - Freno de parqueo no funciona - Escalón de escalera de ingreso rota - Cambio de stop y luces en general - Cambio de plumillas - Presenta pérdida de fuerza - Requiere botiquín y extintor 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742548 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU ⛑️ Operador: JAVIER RAMIREZ ⏱️ H. inicial – H. final: 3412.1 – 3412.1 ⚠️ Novedades mecánicas: - Requiere mantenimiento preventivo - 1 galon de refrigerante - Grasa e inyector 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA • 📝 Observaciones: NA
19/03/2026	**ACTIVIDADES:** 📍 Vereda/Sector: Charquitos 🌦️ Condición climática: Soleado

	🛠️ Actividad: Se realiza conformación y compactación de subrasante. Extendido de material granular (5 viajes). Se apoya con el retiro de camión debido al terreno saturado. 📏 Avance (km): 0.3 de instalación de material en punto crítico. 🔻 *RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SREJC754103 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MANUEL NIETO ⏱️ H. inicial – H. final: 6797.8 – 6802.5 ⛽ ACPM (gl): 20 | Km tanqueo: 6801.6 ⚠️ Novedades mecánicas: - Requiere arandelas de ajuste - Presenta corto en el sistema de luces - Aire acondicionado no funciona - Cambio llantas traseras - Equipo a 30 horas de requerir el mantenimiento preventivo. 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0120KHSZN01634 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: ORLEY AMORTEGUI ⏱️ H. inicial – H. final: 2228.2 – 2232.8 ⛽ ACPM (gl): 60 | Km tanqueo: 2232 ⚠️ Novedades mecánicas: - Seguro de la dirección en mal estado - Presenta fuga de aceite hidráulico - Aire acondicionado no funciona - Freno de parqueo no funciona - Escalón de escalera de ingreso rota - Cambio de stop y luces en general - Cambio de

	plumillas - Presenta pérdida de fuerza - Requiere botiquín y extintor 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742548 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAVIER RAMIREZ ⏱️ H. inicial – H. final: 3412.1 – 3415.3 ⛽ ACPM (gl): 40 | Km tanqueo: 3412.5 ⚠️ Novedades mecánicas: - Requiere mantenimiento preventivo - 1 galon de refrigerante - Grasa e inyector 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA • 📝 Observaciones: NA
20/03/2026	**ACTIVIDADES:** 📍 Vereda/Sector: San Francisco 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Se realiza conformación y compactación de subrasante. Extendido de material granular (5 viajes). 📏 Avance (km): 0.2 y 0.2 de instalación de material en punto crítico. 🔻 *RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SREJC754103 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU

	👷 Operador: MANUEL NIETO ⏱ H. inicial – H. final: 6802.5 – 6808.1 ⚠ Novedades mecánicas: - Requiere arandelas de ajuste - Presenta corto en el sistema de luces - Aire acondicionado no funciona - Cambio llantas traseras - Equipo a 30 horas de requerir el mantenimiento preventivo. 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0120KHSZN01634 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: ORLEY AMORTEGUI ⏱ H. inicial – H. final: 2232.8 – 2234.9 ⚠ Novedades mecánicas: - Seguro de la dirección en mal estado - Presenta fuga de aceite hidráulico - Aire acondicionado no funciona - Freno de parqueo no funciona - Escalón de escalera de ingreso rota - Cambio de stop y luces en general - Cambio de plumillas - Presenta pérdida de fuerza - Requiere botiquín y extintor 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742548 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAVIER RAMIREZ

	⏱ H. inicial – H. final: 3415.3 – 3419.3 ⚠ Novedades mecánicas: - Requiere mantenimiento preventivo - 1 galon de refrigerante - Grasa e inyector 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA • 📝 Observaciones: NA
21/03/2026	**SABADO**
22/03/2026	**DOMINGO**
23/03/2026	**LUNES FESTIVO**
24/03/2026	**ACTIVIDADES:** 📍 Vereda/Sector: San Francisco 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Se realiza conformación y compactación de subrasante. 📏 Avance (km): 0.6 🚜 *RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SREJC754103 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MANUEL NIETO ⏱ H. inicial – H. final: 6808.1 – 6811.4 ⚠ Novedades mecánicas: - Requiere arandelas de ajuste - Presenta corto en el sistema de luces - Aire acondicionado no funciona - Cambio llantas traseras - Mantenimiento preventivo. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

	, 🔻 *MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0120KHSZN01634 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: ORLEY AMORTEGUI ⏱ H. inicial – H. final: 2234.9 – 2238 ⚠ Novedades mecánicas: - Seguro de la dirección en mal estado - Presenta fuga de aceite hidráulico - Aire acondicionado no funciona - Freno de parqueo no funciona - Escalón de escalera de ingreso rota - Cambio de stop y luces en general - Cambio de plumillas - Presenta pérdida de fuerza - Requiere botiquín y extintor - Mantenimiento preventivo. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742548 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAVIER RAMIREZ ⏱ H. inicial – H. final: 3419.3 – 3422.4 ⚠ Novedades mecánicas: - Requiere mantenimiento preventivo - 1 galón de refrigerante - Grasa e inyector 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA • 📝 Observaciones: NA
25/03/2026	**ACTIVIDADES:** 📍 Vereda/Sector: San Francisco 🌦 Condición climática: Lluvias

	🛠️ Actividad: No se realizan actividades por fuertes lluvias en la zona de trabajo y terreno saturado. Retroexcavadora apoya con limpieza de cunetas. 🔻 *RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SREJC754103 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MANUEL NIETO ⏱️ H. inicial – H. final: 6811.4 – 6815.6 ⚠️ Novedades mecánicas: - Requiere arandelas de ajuste - Presenta corto en el sistema de luces - Aire acondicionado no funciona - Cambio llantas traseras - Mantenimiento preventivo. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0120KHSZN01634 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: ORLEY AMORTEGUI ⏱️ H. inicial – H. final: 2238 – 2238 ⚠️ Novedades mecánicas: - Seguro de la dirección en mal estado - Presenta fuga de aceite hidráulico - Aire acondicionado no funciona - Freno de parqueo no funciona - Escalón de escalera de ingreso rota - Cambio de stop y luces en general - Cambio de plumillas - Presenta pérdida de fuerza - Requiere botiquín y extintor - Mantenimiento preventivo. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA

	, 🔻 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742548 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAVIER RAMIREZ ⏱ H. inicial – H. final: 3422.4 – 3422.4 ⚠ Novedades mecánicas: - Requiere mantenimiento preventivo - 1 galón de refrigerante - Grasa e inyector 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA • 📝 Observaciones: NA
26/03/2026	**ACTIVIDADES:** 📍 Vereda/Sector: San Francisco 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza conformación y compactación de subrasante. En horas de la mañana se realiza mantenimiento preventivo de la maquinaria. 📏 Avance (km): 0.3 🔻 *RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SREJC754103 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MANUEL NIETO ⏱ H. inicial – H. final: 6815.6 – 6818 ⚠ Novedades mecánicas: - Requiere arandelas de ajuste - Presenta corto en el sistema de luces - Aire acondicionado no funciona - Cambio llantas traseras.

	🛠️ Intervención mecánica/Repuesto: SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 📝 Observaciones: NA , 🔻 *MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0120KHSZN01634 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: ORLEY AMORTEGUI ⏱️ H. inicial – H. final: 2238 – 2241 ⚠️ Novedades mecánicas: - Seguro de la dirección en mal estado - Presenta fuga de aceite hidráulico - Aire acondicionado no funciona - Freno de parqueo no funciona - Escalón de escalera de ingreso rota - Cambio de stop y luces en general - Cambio de plumillas - Presenta pérdida de fuerza - Requiere botiquín y extintor. 🛠️ Intervención mecánica/Repuesto: SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742548 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAVIER RAMIREZ ⏱️ H. inicial – H. final: 3422.4 – 3424.9 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🛠️ Intervención mecánica/Repuesto: SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

	• 📝 Observaciones: NA
27/03/2026	**ACTIVIDADES:** 📍 Vereda/Sector: San Francisco 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Se realiza conformación y compactación de subrasante. Se extienden 5 viajes de material granular. 📏 Avance (km): 0.3 de instalación de material en punto crítico. 🔻 *RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SREJC754103 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MANUEL NIETO ⏱ H. inicial – H. final: 6818 – 6822.2 ⚠ Novedades mecánicas: - Requiere arandelas de ajuste - Presenta corto en el sistema de luces - Aire acondicionado no funciona - Cambio llantas traseras. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0120KHSZN01634 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: ORLEY AMORTEGUI ⏱ H. inicial – H. final: 2241 – 2246 ⚠ Novedades mecánicas: - Seguro de la dirección en mal estado - Presenta fuga de aceite hidráulico - Aire acondicionado no funciona - Freno de parqueo no funciona - Escalón de escalera de

	ingreso rota - Cambio de stop y luces en general - Cambio de plumillas - Presenta pérdida de fuerza - Requiere botiquín y extintor. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742548 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAVIER RAMIREZ ⏱️ H. inicial – H. final: 3424.9 – 3426.4 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA • 📝 Observaciones: NA
28/03/2026	**SABADO**
29/03/2026	**DOMINGO**
30/03/2026	**ACTIVIDADES:** 📍 Vereda/Sector: San Francisco 🛠️ Actividad: No se realizan actividades por fuertes lluvias en la zona de trabajo, impidiendo la realización de labores por terreno saturado. 🔻 *RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SREJC754103 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MANUEL NIETO

	🕹 H. inicial – H. final: 6822.2 – 6822.2 ⛽ ACPM (gl): 15 | Km tanqueo: 6822.2 ⚠ Novedades mecánicas: - Requiere arandelas de ajuste - Presenta corto en el sistema de luces - Aire acondicionado no funciona - Cambio llantas traseras. 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0120KHSZN01634 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: ORLEY AMORTEGUI 🕹 H. inicial – H. final: 2241 – 2246 ⚠ Novedades mecánicas: - Seguro de la dirección en mal estado - Presenta fuga de aceite hidráulico - Aire acondicionado no funciona - Freno de parqueo no funciona - Escalón de escalera de ingreso rota - Cambio de stop y luces en general - Cambio de plumillas - Presenta pérdida de fuerza - Requiere botiquín y extintor. 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA , 🔻 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742548 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAVIER RAMIREZ 🕹 H. inicial – H. final: 3424.9 – 3426.4 ⚠ Novedades mecánicas: NA

	🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA
31/03/2026	**ACTIVIDADES:** 📍 Vereda/Sector: San Francisco 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Se realiza conformación y compactación de subrasante. Se intervienen puntos críticos y extiende un viaje de material tipo rajón. 📏 Avance (km): 0.1 de instalación de material en punto crítico. 🔻 *RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SREJC754103 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MANUEL NIETO ⏱ H. inicial – H. final: 6822.2 – 6828.2 ⚠ Novedades mecánicas: - Requiere arandelas de ajuste - Presenta corto en el sistema de luces - Aire acondicionado no funciona - Cambio llantas traseras. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0120KHSZN01634 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: ORLEY AMORTEGUI ⏱ H. inicial – H. final: 2246 – 2250 ⚠ Novedades mecánicas: - Seguro de la dirección en mal estado - Presenta fuga de aceite hidráulico - Aire acondicionado no

	funciona - Freno de parqueo no funciona - Escalón de escalera de ingreso rota - Cambio de stop y luces en general - Cambio de plumillas - Presenta pérdida de fuerza - Requiere botiquín y extintor. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742548 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAVIER RAMIREZ ⏱ H. inicial – H. final: 3426.4 – 3432.3 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES			
FECHA	MATERIAL	N° DE VIAJES	DESCRIPCIÓN
1/03/2026	----	----	----
2/03/2026	----	----	----
3/03/2026	----	----	----
4/03/2026	----	----	----
5/03/2026	----	----	----
6/03/2026	----	----	----
7/03/2026	----	----	----
8/03/2026	----	----	----
9/03/2026	----	----	----
10/03/2026	----	----	----
11/03/2026	----	----	----
12/03/2026	----	----	----
13/03/2026	----	----	----
14/03/2026	----	----	----
15/03/2026	----	----	----
16/03/2026	0	0	0
17/03/2026	0	0	0
18/03/2026	0	0	0
19/03/2026	RECEBO	5	TIPO B200
20/03/2026	RECEBO	5	TIPO B200
21/03/2026	0	0	0
22/03/2026	0	0	0
23/03/2026	0	0	0
24/03/2026	0	0	0
25/03/2026	0	0	0
26/03/2026	0	0	0
27/03/2026	RECEBO	5	TIPO B200
28/03/2026	0	0	0
29/03/2026	0	0	0
30/03/2026	0	0	0
31/03/2026	RECEBO	1	TIPO RAJON
TOTAL		16	

6. AVANCE EN CAMPO (M)

AVANCE DE OBRA SOACHA				
FECHA	LONGITUD (M)	AVANCE (M)	REPETICIÓN (M)	DESCRIPCIÓN
1/03/2026	DOMINGO			
2/03/2026	---	---	---	---
3/03/2026	---	---	---	---
4/03/2026	---	---	---	---
5/03/2026	---	---	---	---
6/03/2026	---	---	---	---
7/03/2026	SABADO			
8/03/2026	DOMINGO			
9/03/2026	---	---	---	---
10/03/2026	---	---	---	---
11/03/2026	---	---	---	---
12/03/2026	---	---	---	---
13/03/2026	---	---	---	---
14/03/2026	---	---	---	---
15/03/2026	DOMINGO			
16/03/2026	300	300	0	INICIO DE ACTIVIDADES
17/03/2026	600	900	0	Lluvias en la zona de trabajo
18/03/2026	0	900	0	Sin actividades por lluvias en la zona de trabajo
19/03/2026	0	900	300	Soleado (Se realiza instalacion de material)
20/03/2026	200	1100	200	Soleado (Se realiza instalacion de material)
21/03/2026	SABADO			
22/03/2026	DOMINGO			
23/03/2026	0	1100	0	Lunes festivo
24/03/2026	600	1700	0	Lluvias en la zona de trabajo
25/03/2026	0	1700	0	Sin actividades por lluvias en la zona de trabajo
26/03/2026	300	2000	0	Soleado
27/03/2026	0	2000	300	Lluvias en la zona de trabajo (Se realiza instalacion de material)
28/03/2026	SABADO			
29/03/2026	DOMINGO			
30/03/2026	0	2000	0	Sin actividades por lluvias en la zona de trabajo
31/03/2026	0	2000	100	Lluvias en la zona de trabajo (Se realiza instalacion de material)
TOTAL		2000	900	

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS				
FECHA	HORAS DE LLUVIA	HORAS DE INOPERATIVIDAD	HORAS EFECTIVAS	DESCRIPCIÓN
1/03/2026	DOMINGO			
2/03/2026	---	---	---	---
3/03/2026	---	---	---	---
4/03/2026	---	---	---	---
5/03/2026	---	---	---	---
6/03/2026	---	---	---	---
7/03/2026	SABADO			
8/03/2026	DOMINGO			
9/03/2026	---	---	---	---
10/03/2026	---	---	---	---
11/03/2026	---	---	---	---
12/03/2026	---	---	---	---
13/03/2026	---	---	---	---
14/03/2026	---	---	---	---
15/03/2026	DOMINGO			
16/03/2026	0	0	0	INICIO DE ACTIVIDADES
17/03/2026	3	0	5	Lluvias en la zona de trabajo
18/03/2026	5	0	0	Sin actividades por lluvias en la zona de trabajo
19/03/2026	0	0	8	Soleado
20/03/2026	0	0	8	Soleado
21/03/2026	SABADO			
22/03/2026	DOMINGO			
23/03/2026	0	0	0	Lunes festivo
24/03/2026	2	0	8	Lluvias en la zona de trabajo
25/03/2026	5	0	0	Sin actividades por lluvias en la zona de trabajo
26/03/2026	0	0	8	Soleado
27/03/2026	2	0	5	Lluvias en la zona de trabajo
28/03/2026	SABADO			
29/03/2026	DOMINGO			
30/03/2026	5	0	0	Sin actividades por lluvias en la zona de trabajo
31/03/2026	2	0	6	Lluvias en la zona de trabajo
TOTAL	24	0	48	

8. MOVILIZACIONES

No se realizaron movilizaciones en este mes

9. MANTENIMIENTOS

MANTENIMIENTOS			
FECHA	**EQUIPO**	**SERIAL**	**DESCRIPCIÓN**
26/03/2026	MOTONIVELADORA	CAT0120KHSZN01634	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
26/03/2026	VIBROCOMPACTADOR	2742548	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
26/03/2026	RETROEXCAVADORA	JJGN58SREJC754103	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS												ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".												
PERIODO:	MARZO												
MUNICIPIO:	SOACHA						PROVINCIA:	SOACHA					
MAQUINA:	MOTONIVELADORA CATERPILLAR						SERIE	CAT0120KHSZN01634					
CONTROL HORARIO				ACPM				UREA					
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	OBSERVACIÓN	
1/03/2026	----------	----------	0,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	
2/03/2026	----------	----------	0,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	
3/03/2026	----------	----------	0,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	
4/03/2026	----------	----------	0,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	
5/03/2026	----------	----------	0,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	
6/03/2026	----------	----------	0,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	
7/03/2026	----------	----------	0,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	
8/03/2026	----------	----------	0,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	
9/03/2026	----------	----------	0,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	
10/03/2026	----------	----------	0,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	
11/03/2026	----------	----------	0,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	
12/03/2026	----------	----------	0,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	
13/03/2026	----------	----------	0,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	
14/03/2026	----------	----------	0,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	
15/03/2026	----------	----------	0,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	
16/03/2026	2220,4	2224,2	3,8	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	INICIO DE ACTIVIDADES	
17/03/2026	2224,2	2228,2	4,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	LLUVIAS EN ZONA DE TRABAJO	
18/03/2026	2228,2	2228,2	0,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	SIN ACTIVIDADES POR FUERTES LLUVIAS EN ZONA DE TRABAJO	
19/03/2026	2228,2	2232,8	4,6	60,000	2232,0	----------	10152	----------	----------	----------	----------	SOLEADO	
20/03/2026	2232,8	2234,9	2,1	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	SOLEADO	
21/03/2026	2234,9	2234,9	0,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	SABADO	
22/03/2026	2234,9	2234,9	0,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	DOMINGO	
23/03/2026	2234,9	2234,9	0,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	LUNES (FESTIVO)	
24/03/2026	2234,9	2238,0	3,1	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	LLUVIAS EN ZONA DE TRABAJO	
25/03/2026	2238,0	2238,0	0,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	SIN ACTIVIDADES POR FUERTES LLUVIAS EN ZONA DE TRABAJO	
26/03/2026	2238,0	2241,0	3,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	SOLEADO	
27/03/2026	2241,0	2246,0	5,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	LLUVIAS EN ZONA DE TRABAJO	
28/03/2026	2246,0	2246,0	0,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	SABADO	
29/03/2026	2246,0	2246,0	0,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	DOMINGO	
30/03/2026	2246,0	2246,0	0,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	SIN ACTIVIDADES POR FUERTES LLUVIAS EN ZONA DE TRABAJO	
31/03/2026	2246,0	2250,0	4,0	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	LLUVIAS EN ZONA DE TRABAJO	
TOTAL MES			29,60	60,00		0,00		0,00		0,00			

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS							ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".							
PERIODO:	MARZO							
MUNICIPIO:	SOACHA			PROVINCIA:		SOACHA		
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA CASE			SERIE		JJGN58SREJC754103		
CONTROL HORARIO				ACPM				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
1/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
2/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
3/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
4/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
5/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
6/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
7/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
8/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
9/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
10/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
11/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
12/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
13/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
14/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
15/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
16/03/2026	6789,7	6792,7	3,0	------	------	------	------	INICIO DE ACTIVIDADES
17/03/2026	6792,7	6797,8	5,1	------	------	------	------	LLUVIAS EN ZONA DE TRABAJO
18/03/2026	6797,8	6797,8	0,0	------	------	------	------	SIN ACTIVIDADES POR FUERTES LLUVIAS EN ZONA DE TRABAJO
19/03/2026	6797,8	6802,5	4,7	20,000	6801,6	------	4321	SOLEADO
20/03/2026	6802,5	6808,1	5,6	------	------	------	------	SOLEADO
21/03/2026	6808,1	6808,1	0,0	------	------	------	------	SABADO
22/03/2026	6808,1	6808,1	0,0	------	------	------	------	DOMINGO
23/03/2026	6808,1	6808,1	0,0	------	------	------	------	LUNES (FESTIVO)
24/03/2026	6808,1	6811,4	3,3	------	------	------	------	LLUVIAS EN ZONA DE TRABAJO
25/03/2026	6811,4	6815,6	4,2	------	------	------	------	SIN ACTIVIDADES POR FUERTES LLUVIAS EN ZONA DE TRABAJO
26/03/2026	6815,6	6818,0	2,4	------	------	------	------	SOLEADO
27/03/2026	6818,0	6822,2	4,2	------	------	------	------	LLUVIAS EN ZONA DE TRABAJO
28/03/2026	6822,2	6822,2	0,0	------	------	------	------	SABADO
29/03/2026	6822,2	6822,2	0,0	------	------	------	------	DOMINGO
30/03/2026	6822,2	6822,2	0,0	15,000	6822,2	0,73	152468	SIN ACTIVIDADES POR FUERTES LLUVIAS EN ZONA DE TRABAJO
31/03/2026	6822,2	6828,2	6,0	------	------	------	------	LLUVIAS EN ZONA DE TRABAJO
TOTAL MES			38,50	35,00		0,73		

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS												ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".												
PERIODO:	MARZO												
MUNICIPIO:	SOACHA						PROVINCIA:	SOACHA					
MAQUINA:	VIBROCOMPACTADOR AMMANN						SERIE	2742548					
CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				OBSERVACIÓN	
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA		
1/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------	------	------	------	------	
2/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------	------	------	------	------	
3/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------	------	------	------	------	
4/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------	------	------	------	------	
5/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------	------	------	------	------	
6/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------	------	------	------	------	
7/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------	------	------	------	------	
8/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------	------	------	------	------	
9/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------	------	------	------	------	
10/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------	------	------	------	------	
11/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------	------	------	------	------	
12/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------	------	------	------	------	
13/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------	------	------	------	------	
14/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------	------	------	------	------	
15/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------	------	------	------	------	
16/03/2026	3406,7	3409,5	2,8	------	------	------	------	------	------	------	------	INICIO DE ACTIVIDADES	
17/03/2026	3409,5	3412,1	2,6	------	------	------	------	------	------	------	------	LLUVIAS EN ZONA DE TRABAJO	
18/03/2026	3412,1	3412,1	0,0	------	------	------	------	------	------	------	------	SIN ACTIVIDADES POR FUERTES LLUVIAS EN ZONA DE TRABAJO	
19/03/2026	3412,1	3415,3	3,2	40,000	3412,5	------	4321	------	------	------	------	SOLEADO	
20/03/2026	3415,3	3419,3	4,0	------	------	------	------	------	------	------	------	SOLEADO	
21/03/2026	3419,3	3419,3	0,0	------	------	------	------	------	------	------	------	SABADO	
22/03/2026	3419,3	3419,3	0,0	------	------	------	------	------	------	------	------	DOMINGO	
23/03/2026	3419,3	3419,3	0,0	------	------	------	------	------	------	------	------	LUNES (FESTIVO)	
24/03/2026	3419,3	3422,4	3,1	------	------	------	------	------	------	------	------	LLUVIAS EN ZONA DE TRABAJO	
25/03/2026	3422,4	3422,4	0,0	------	------	------	------	------	------	------	------	SIN ACTIVIDADES POR FUERTES LLUVIAS EN ZONA DE TRABAJO	
26/03/2026	3422,4	3424,9	2,5	------	------	------	------	------	------	------	------	SOLEADO	
27/03/2026	3424,9	3426,4	1,5	------	------	------	------	------	------	------	------	LLUVIAS EN ZONA DE TRABAJO	
28/03/2026	3426,4	3426,4	0,0	------	------	------	------	------	------	------	------	SABADO	
29/03/2026	3426,4	3426,4	0,0	------	------	------	------	------	------	------	------	DOMINGO	
30/03/2026	3426,4	3426,4	0,0	------	------	------	------	------	------	------	------	SIN ACTIVIDADES POR FUERTES LLUVIAS EN ZONA DE TRABAJO	
31/03/2026	3426,4	3432,3	5,9	------	------	------	------	------	------	------	------	LLUVIAS EN ZONA DE TRABAJO	
TOTAL MES			25,60	40,00		0,00		0,00		0,00			

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Durante el mes de Marzo de 2026, se ejecutaron actividades de mantenimiento y rehabilitación vial en la Provincia Soacha, específicamente en el municipio de Soacha, interviniendo la vereda San Francisco.

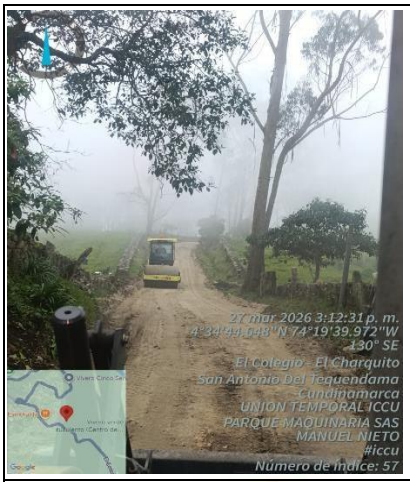
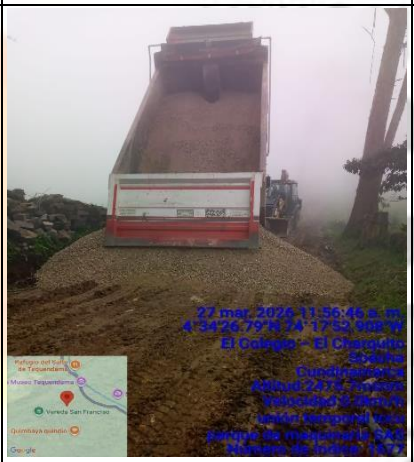
Se alcanzó un avance total de 2,0 km y 0,9 km de instalación de material en puntos criticos, cumpliendo con el objetivo de conformación, compactación y mejoramiento de la subrasante, así como el perfilado de cunetas. Estos trabajos contribuyen de manera significativa al mejoramiento de la transitabilidad y condiciones de seguridad de la red vial rural del municipio.

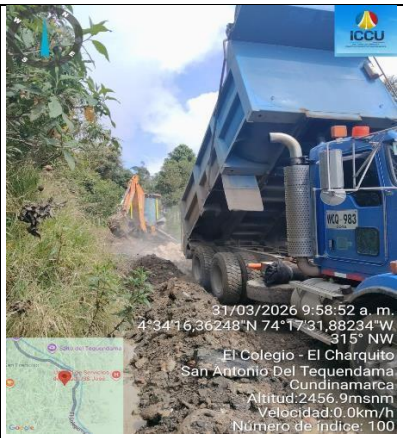
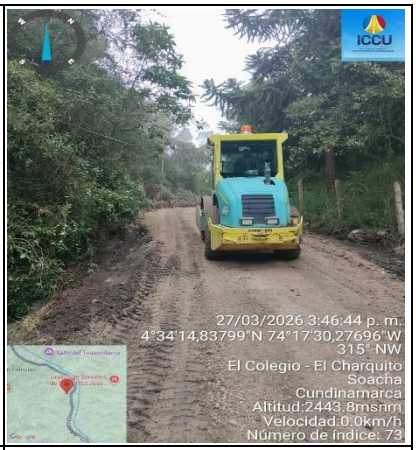
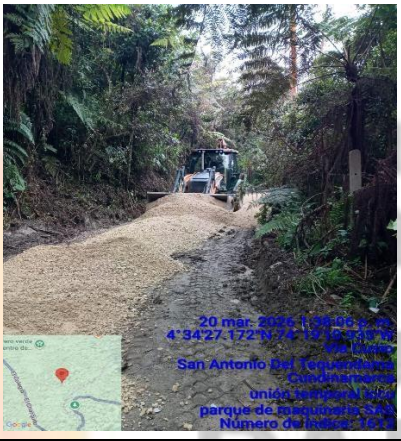
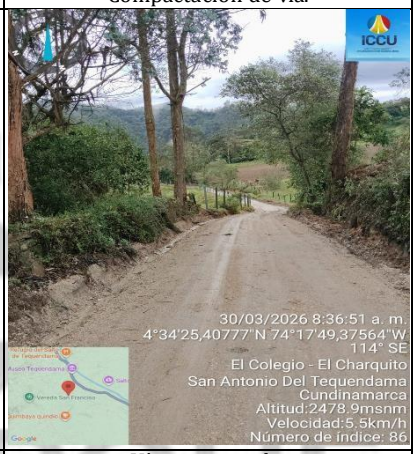
Es importante resaltar que durante el periodo se presentaron factores que afectaron parcialmente la ejecución normal de las actividades, tales como 24 horas de lluvia.

En conclusión, el balance del periodo es positivo, evidenciando compromiso operativo, y cumplimiento progresivo de las metas establecidas, garantizando el mejoramiento continuo de la vía rural en el municipio de Soacha.

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Compactación de vía.	Mantenimiento preventivo motoniveladora.	Conformación y perfilacion de cunetas.
		
Mantenimiento preventivo Retroexcavadora.	Extendido de material granular.	Mantenimiento preventivo vibrocompactador.
		
Suministro acpm.	Limpieza de Cunetas.	Extendido de material granular.

		
Limpieza de Cunetas.	Extendido de material granular.	Compactación de vía.
		
Conformación y perfilacion de cunetas.	Extendido de material granular.	Vía compactada.

LEONARDO GUERRA
INSPECTOR ICCU

EMILIO STEVSNS MORENO
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025
