CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°3
PERIODO: ABRIL DEL 2026

PROVINCIA: TEQUENDAMA
MUNICIPIO: ANAPOIMA

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA TEQUENDAMA
MUNICIPIO DE ANAPOIMA

OBJETO: “ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Tequendama:

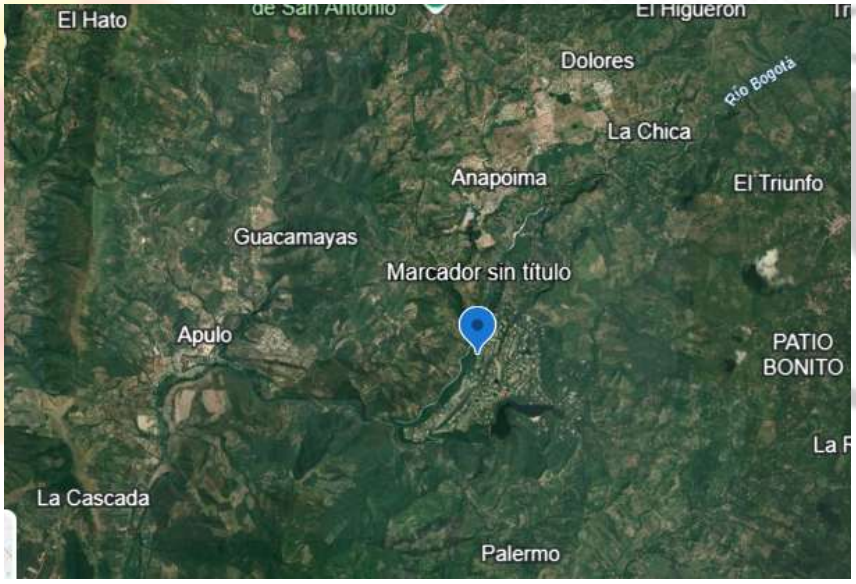
Anapoima:

1. VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 3003607
2. MOTONIVELADORA CAT CAT0120KPJAP07183
3. VOLQUETA ALQUILADA FORD SBJ118

Ubicación:

Anapoima - Golconda sector ramal San Antonio, Puerto López, Samano, El rubí, Guacarí, Berlín, coordenadas 4°34'16.29"N 74°25'13.11"W

Imagen 1 ubicación de las maquinas



Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	Carlos Iván Chaves Prieto
INSPECTOR DE OBRA ICCU	José Luis Trujillo
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR 3003607	Brayan Sánchez
OPERADOR MOTONIVELADORA CAT0120KPJAP07183	Jhon Moreno
OPERADOR VOLQUETA ALQ SBJ118	Jean Carlos

3. PLAN DE TRABAJO

Imagen 2 cronograma de actividades municipio de Anapoima

MUNICIPIO DE ANAPOIMA	CRONOGRAMA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA ICCU		
	MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR Y VOLQUETA		
Actividades / Semanas	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
Conformacion en la vereda golconda sector ramal "San Antonio".			
Reparcheo con fresado y emulsión asfáltica en vía secundaria que conecta el sector Puerto López con la vereda Golconda.			
Conformación del ramal "Sámano" de la vereda Golconda.			
Conformación del ramal "El Rubí" de la vereda La Esmeralda.			
Conformación del ramal "Guacarí" de la vereda Golconda.			
Conformación del ramal "Berlín" de la vereda Golconda.			

Fuente: Alcaldía de Anapoima

Actualmente se cuenta con un 70% de avance con respecto al cronograma establecido, se ha logrado intervenir diversas zonas rurales de Anapoima, sin embargo, por factores climáticos, y material de recebo lejos de el acopio se ha visto afectado el avance inicialmente programado.

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

ACTIVIDADES	
FECHA	**DESCRIPCION**
1/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la Volqueta alquilada realiza el transporte de 2 viajes de recebo y 2 viajes de fresado en la vía Anapoima Viota, la Motoniveladora y el vibró compactador realizan la conformación extendido y compactacion de recebo y fresado AVANCE KM: 0.300 VEREDA/SECTOR: Golconda CONDICION CLIMATICA: Soleado EQUIPO: Maquina MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0120KPJAP07183 OPERATIVA: SI OPERADOR: JHON MORENO HORAS: Inicio 7257.8 Fin 7261.8 H. TRABAJADAS: EQUIPO: Maquina VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003607 OPERATIVA: SI OPERADOR: BRAYAN SANCHEZ HORAS: Inicio 2762.4 Fin 2767.5 H. TRABAJADAS: 5.1 EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - Sbj118 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 40.4 Fin 44.2 H. TRABAJADAS: 3.8
2/04/2026	FESTIVO
3/04/2026	FESTIVO
4/04/2026	FESTIVO
5/04/2026	FESTIVO
6/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la Volqueta alquilada realiza el transporte de 5 viajes de recebo hacia la vía Viota-Anapoima, la Motoniveladora y el vibró compactador realizan la conformación extendido y compactacion de recebo en la vereda Golconda AVANCE KM: 0.500 VEREDA/SECTOR: Golconda CONDICION CLIMATICA: SoleadoEQUIPO: Maquina MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0120KPJAP07183 OPERATIVA: SI OPERADOR: JHON MORENO HORAS: Inicio 7261.8 Fin 7268 H. TRABAJADAS: 6.2 EQUIPO: Maquina VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003607 OPERATIVA: SI OPERADOR: BRAYAN SANCHEZ HORAS: Inicio 2767.5 Fin 2771.9 H. TRABAJADAS: 4.4 EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - Sbj118 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 54.9 Fin 62.1 H. TRABAJADAS: 7.2 VIAJES:B400: 5

7/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la Volqueta alquilada realiza el transporte de 2 viajes de recebo hacia la vía Viota-Anapoima, la Motoniveladora amanece pinchada por lo cual se realiza la intervención mecánica quedando operativa en horas de la tarde, y el vibró compactador disponible en la vereda Golconda AVANCE KM: 0.000 VEREDA/SECTOR: Golconda CONDICION CLIMATICA: SoleadoEQUIPO: Maquina MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0120KPJAP07183 OPERATIVA: SI OPERADOR: JHON MORENO HORAS: Inicio 7268 Fin 7270.1 H. TRABAJADAS: 2.1 NOVEDADES MECÁNICAS: Se pincha llanta trasera, se realiza intervención mecánica quedando operativa en la tarde COMBUSTIBLE ACPM/GL: 55 HR O KM TANQUEO: 7269.6 EQUIPO: Maquina VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003607 OPERATIVA: SI OPERADOR: BRAYAN SANCHEZ HORAS: Inicio 2767.5 Fin 2767.5 H. TRABAJADAS: 0 EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - Sbj118 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 62.1 Fin 66 H. TRABAJADAS: 3.9 VIAJES:B400: 2
8/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la Volqueta alquilada se encuentra disponible sin actividades asignadas por restricción vehicular, la Motoniveladora y el vibró compactador compactador disponibles en horas de la mañana por restricción vehicular , y en la tarde se realiza el replanteo y compactacion de vía en la vereda calichana AVANCE KM: 0.500 VEREDA/SECTOR: Golconda EQUIPO: Maquina MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0120KPJAP07183 OPERATIVA: SI OPERADOR: JHON MORENO HORAS: Inicio 7268 Fin 7270.1 H. TRABAJADAS: 2.1 NOVEDADES MECÁNICAS: Se pincha llanta trasera, se realiza intervención mecánica quedando operativa en la tarde EQUIPO: Maquina VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003607 OPERATIVA: SI OPERADOR: BRAYAN SANCHEZ HORAS: Inicio 2771.9 Fin 2777.7 H. TRABAJADAS: 5.8 COMBUSTIBLE ACPM/GL: 35 HR O KM TANQUEO: 2777.7 EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - Sbj118 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 68.7 Fin 68.7 H. TRABAJADAS: 0
9/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la Volqueta alquilada realiza el transporte de 4 viajes de recebo hacia la vereda calichana, la Motoniveladora y el vibró compactador

	realizan el replanteo, conformación y compactacion de vía en la vereda calichana AVANCE KM: 1.200 VEREDA/SECTOR: Golconda EQUIPO: Maquina MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0120KPJAP07183 OPERATIVA: SI OPERADOR: JHON MORENO HORAS: Inicio 7277.2 Fin 7284 H. TRABAJADAS: 6.8 NOVEDADES MECÁNICAS: Se pincha llanta trasera, se realiza intervención mecánica quedando operativa en la tarde EQUIPO: Maquina VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003607 OPERATIVA: SI OPERADOR: BRAYAN SANCHEZ HORAS: Inicio 2777.9 Fin 2784.5 H. TRABAJADAS: 6.6 EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - Sbj118 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 68.7 Fin 76.4 H. TRABAJADAS: 7.7 VIAJES:B400: 4
10/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la Volqueta alquilada realiza el transporte de 6 viajes de recebo hacia la vereda calichana, la Motoniveladora y el vibró compactador realizan el replanteo, conformación y compactacion de vía en la vereda calichana AVANCE KM: 0.500 VEREDA/SECTOR: Golconda EQUIPO: Maquina MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0120KPJAP07183 OPERATIVA: SI OPERADOR: JHON MORENO HORAS: Inicio 7284 Fin 7286.3 H. TRABAJADAS: 2.3 NOVEDADES MECÁNICAS: Se pincha llanta trasera, se realiza intervención mecánica quedando operativa en la tarde COMBUSTIBLE ACPM/GL: 55 HR O KM TANQUEO: 7284.1 EQUIPO: Maquina VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003607 OPERATIVA: SI OPERADOR: BRAYAN SANCHEZ HORAS: Inicio 2784.5 Fin 2787.9 H. TRABAJADAS: 3.4 EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - Sbj118 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 76.4 Fin 84.3 H. TRABAJADAS: 7.9 VIAJES:B400: 6
11/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la Volqueta alquilada realiza el transporte de 2 viajes de recebo hacia la vereda calichana, la Motoniveladora y el vibró compactador realizan el replanteo, conformación y compactacion de vía en la vereda calichana AVANCE KM: 0.300 VEREDA/SECTOR: Golconda EQUIPO: Maquina MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0120KPJAP07183 OPERATIVA: SI OPERADOR: JHON MORENO HORAS: Inicio 7284 Fin 7286.3 H. TRABAJADAS: 2.3 NOVEDADES MECÁNICAS: Se pincha llanta trasera, se realiza intervención mecánica quedando operativa en la tarde EQUIPO: Maquina VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003607 OPERATIVA: SI

	OPERADOR: BRAYAN SANCHEZ HORAS: Inicio 2787.9 Fin 2790 H. TRABAJADAS: 2.1 EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - Sbj118 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 84.3 Fin 87.1 H. TRABAJADAS: 2.8 VIAJES:B400: 2
12/04/2026	DOMINGO
13/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la Volqueta alquilada realiza el transporte de 6 viajes de recebo hacia la vereda calichana, la Motoniveladora y el vibró compactador realizan el replanteo, conformación y compactacion de vía en la vereda calichana AVANCE KM: 1.000 VEREDA/SECTOR: Golconda EQUIPO: Maquina MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0120KPJAP07183 OPERATIVA: SI OPERADOR: JHON MORENO HORAS: Inicio 7286.3 Fin 7293.8 H. TRABAJADAS: 7.5 NOVEDADES MECÁNICAS: Se pincha llanta trasera, se realiza intervención mecánica quedando operativa en la tarde EQUIPO: Maquina VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003607 OPERATIVA: SI OPERADOR: BRAYAN SANCHEZ HORAS: Inicio 2790 Fin 2794.9 H. TRABAJADAS: 4.9 EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - Sbj118 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 87.1 Fin 94.2 H. TRABAJADAS: 7.1 VIAJES:B400: 6
14/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la Volqueta alquilada presenta falla mecánica, , la Motoniveladora realiza el replanteo, conformación de vía en la vereda calichana, y el vibró compactador es intervenido mecánicamente AVANCE KM: 1.200 VEREDA/SECTOR: Golconda EQUIPO: Maquina MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0120KPJAP07183 OPERATIVA: SI OPERADOR: JHON MORENO HORAS: Inicio 7293.8 Fin 7300.2 H. TRABAJADAS: 6.4 NOVEDADES MECÁNICAS: Se pincha llanta trasera, se realiza intervención mecánica quedando operativa en la tarde EQUIPO: Maquina VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003607 OPERATIVA: SI OPERADOR: BRAYAN SANCHEZ HORAS: Inicio 2794.9 Fin 2794.9 H. TRABAJADAS: 0 INTERVENCIÓN MECÁNICA: Se realizó mantenimiento por parte de la cuadrilla de mecánicos, los cuales desmontaron la viga de el cilindro frontal para sacar tornillos rotos, limpieza de sistema de inyección y filtros de combustible COMBUSTIBLE ACPM/GL: 20 HR O KM TANQUEO: 2794.9 EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - Sbj118 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 94.2 Fin 94.2 H. TRABAJADAS: 0

	NOVEDADES MECÁNICAS: Presenta falla mecánica y queda Inoperativa
15/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy se presentan lluvias en la zona de trabajo por tal motivo los equipos estuvieron disponibles sin actividades AVANCE KM: 0.000 VEREDA/SECTOR: Golconda CONDICION CLIMATICA: LluviasEQUIPO: Maquina MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0120KPJAP07183 OPERATIVA: SI OPERADOR: JHON MORENO HORAS: Inicio 7300.2 Fin 7300.2 H. TRABAJADAS: 0 EQUIPO: Maquina VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003607 OPERATIVA: SI OPERADOR: BRAYAN SANCHEZ HORAS: Inicio 2794.9 Fin 2794.9 H. TRABAJADAS: 0 INTERVENCIÓN MECÁNICA: Se realizó mantenimiento por parte de la cuadrilla de mecánicos, los cuales desmontaron la viga de el cilindro frontal para sacar tornillos rotos, limpieza de sistema de inyección y filtros de combustible EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - Sbj118 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 94.2 Fin 94.2 H. TRABAJADAS: 0 NOVEDADES MECÁNICAS: Presenta falla mecánica y queda Inoperativa
16/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la Volqueta alquilada realiza el transporte de 4 viajes de recebo hacia la vía Golconda, la Motoniveladora y el vibró compactador en la mañana realizan la conformación y compactacion de un tramo de vía, luego llega la cuadrilla de mecánicos le realiza intervención mecánica a la Motoniveladora, sin embargo el equipo es trasladado hacia el frente de Fusagasugá AVANCE KM: 0.200 VEREDA/SECTOR: Golconda CONDICION CLIMATICA: SoleadoEQUIPO: Maquina MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0120KPJAP07183 OPERATIVA: SI OPERADOR: JHON MORENO HORAS: Inicio 7300.2 Fin 7303.3 H. TRABAJADAS: 3.1 INTERVENCIÓN MECÁNICA: Se realizó a intervención mecánica pero solo se dejan algunos repuestos porque la maquinaria es trasladado a el frente de Fusagasugá EQUIPO: Maquina VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003607 OPERATIVA: SI OPERADOR: BRAYAN SANCHEZ HORAS: Inicio 2794.9 Fin 2802.5 H. TRABAJADAS: 7.6 INTERVENCIÓN MECÁNICA: Se realizó mantenimiento por parte de la cuadrilla de mecánicos, los cuales desmontaron la viga de el cilindro frontal para sacar tornillos rotos, limpieza de sistema de inyección y filtros de combustible EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - Sbj118 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 94.2 Fin 101.3 H. TRABAJADAS: 7.1 NOVEDADES MECÁNICAS: Presenta falla mecánica y queda Inoperativa

	VIAJES:B400: 4
17/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la Volqueta alquilada realiza el transporte de 7 viajes de recebo hacia la vía de Golconda AVANCE KM: 0.000 VEREDA/SECTOR: Golconda EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - Sbj118 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 101.3 Fin 108.3 H. TRABAJADAS: 7 NOVEDADES MECÁNICAS: Presenta falla mecánica y queda Inoperativa VIAJES:B400: 7
18/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la Volqueta alquilada realiza el transporte de 2 viajes de recebo hacia la vía de Golconda AVANCE KM: 0.000 VEREDA/SECTOR: Golconda EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - Sbj118 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 108.3 Fin 112.7 H. TRABAJADAS: 4.4 VIAJES:B400:
19/04/2026	DOMINGO
20/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la Volqueta alquilada no realizó actividades por que el conductor se encontraba en una cita medica AVANCE KM: 0.000 VEREDA/SECTOR: Golconda CONDICION CLIMATICA: SoleadoEQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - Sbj118 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 112.7 Fin 112.7 H. TRABAJADAS: 0
21/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la Volqueta alquilada realiza el transporte de 3 viajes de recebo, 1 de Apulo y los otros dos del acopio a la vereda calichana AVANCE KM: 0.000 VEREDA/SECTOR: Golconda EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - Sbj118 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 112.7 Fin 119.7 H. TRABAJADAS: 7 VIAJES:B400: 3
22/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la Volqueta alquilada realizó los siguientes transportes : 1Viaje de tierra de anapoima a patio bonito via Honduras 1 Viaje de recebo patio a via Honduras 2 Viajes de recebo patio via golconda AVANCE KM: 0.000 VEREDA/SECTOR: Golconda - Honduras - Patio Bonito CONDICION CLIMATICA: SoleadoEQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - Sbj118 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 119.7 Fin 127.3 H. TRABAJADAS: 7.6

	VIAJES:B400: 3SOBRANTE: 1
23/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la Volqueta alquilada realiza el transporte de 1 Viaje de tierra de anapoima a patio bonito via Honduras 2 Viajes de recebo patio a via Honduras 2 Viajes de recebo patio a via calichana AVANCE KM: 0.000 VEREDA/SECTOR: Golconda - Honduras - Patio Bonito CONDICION CLIMATICA: SoleadoEQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - Sbj118 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 127.3 Fin 134.8 H. TRABAJADAS: 7.5 VIAJES:B400: 4SOBRANTE: 1
24/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la Volqueta alquilada realiza el transporte de 3 Viajes de recebo a la via de la vereda la Chica luego realizo 3 Viajes de recebo a la vereda Igeron AVANCE KM: 0.000 VEREDA/SECTOR: Golconda - Honduras - Patio Bonito EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - Sbj118 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 134.8 Fin 142 H. TRABAJADAS: 7.2 VIAJES:B400: 6
25/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la Volqueta alquilada realiza el transporte de 1 viaje de recebo desde la cantera de Apulo a el acopio de Patio bonito AVANCE KM: 0.000 VEREDA/SECTOR: Golconda - Honduras - Patio Bonito EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - Sbj118 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 142 Fin 144.1 H. TRABAJADAS: 2.1 VIAJES:B400: 1
26/04/2026	DOMINGO
27/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la volqueta alquila no realizó actividades debido a falla mecánica AVANCE KM: 0.000 VEREDA/SECTOR: Golconda - Honduras - Patio Bonito CONDICION CLIMATICA: SoleadoEQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - Sbj118 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 142 Fin 144.1 H. TRABAJADAS: 2.1
28/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la volqueta alquilada realizó el transporte de 2 viajes de recebo desde la cantera de Apulo al punto de acopio de la vereda Golconda AVANCE KM: 0.000 VEREDA/SECTOR: Golconda - Honduras - Patio Bonito EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - Sbj118 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 144.1 Fin 150 H. TRABAJADAS: 5.9 VIAJES:B400: 2

29/04/2026	ACTIVIDAD: En horas de la mañana se presentan lluvias intermitentes, luego la volqueta alquilada realizó el transporte de 1 viaje de recebo desde la cantera de Apulo al punto de acopio de la vereda Golconda AVANCE KM: 0.000 VEREDA/SECTOR: Golconda - Honduras - Patio Bonito CONDICION CLIMATICA: LluviasEQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - Sbj118 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 150 Fin 153.4 H. TRABAJADAS: 3.4 VIAJES:B400: 1
30/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la Volqueta alquilada realiza el transporte de 1 viaje de recebo de la cantera de Apulo a la vereda Lutaima, luego realiza el transporte de 1 viaje de recebo de el acopio a Lutaima a AVANCE KM: 0.000 VEREDA/SECTOR: Golconda - Honduras - Patio Bonito EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - Sbj118 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 153.4 Fin 161.6 H. TRABAJADAS: 8.2 VIAJES:B400: 2

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES			
FECHA	MATERIAL	N° DE VIAJES	DESCRIPCIÓN
1/04/2026	RECEBO	5	
2/04/2026			FESTIVO
3/04/2026			FESTIVO
4/04/2026			FESTIVO
5/04/2026			DOMINGO
6/04/2026	RECEBO	5	
7/04/2026	RECEBO	2	
8/04/2026		0	RETRICCION VEHICULAR
9/04/2026	RECEBO	4	
10/04/2026	RECEBO	6	
11/04/2026	RECEBO	2	
12/04/2026			DOMINGO
13/04/2026	RECEBO	6	
14/04/2026		0	VOLQUETA INOPERATIVA
15/04/2026		0	LLUVIAS
16/04/2026	RECEBO	4	
17/04/2026	RECEBO	7	
18/04/2026	RECEBO	2	
19/04/2026			DOMINGO
20/04/2026		0	CITA MEDICA
21/04/2026	RECEBO	3	
22/04/2026	RECEBO	4	
23/04/2026	RECEBO	5	
24/04/2026	RECEBO	6	
25/04/2026	RECEBO	1	
26/04/2026			DOMINGO
27/04/2026		0	FALLA MECANICA
28/04/2026	RECEBO	2	
29/04/2026	RECEBO	1	LLUVIAS
30/04/2026	RECEBO	1	
TOTAL		66	

6. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA ANAPOIMA				
FECHA	LONGITUD (KM)	AVANCE (KM)	REPETICIÓN (KM)	DESCRIPCIÓN
1/04/2026	0,3	0,3		
2/04/2026	0	0,3		FESTIVO
3/04/2026	0	0,3		FESTIVO
4/04/2026	0	0,3		FESTIVO
5/04/2026	0	0,3		DOMINGO
6/04/2026	0,5	0,8		
7/04/2026	0	0,8		MOTONIVELADORA PINCHADA
8/04/2026		0,8		RETRICCION VEHICULAR
9/04/2026	1,2	2		
10/04/2026	0,5	2,5		
11/04/2026	0,3	2,8		
12/04/2026		2,8		DOMINGO
13/04/2026	1	3,8		
14/04/2026	1,2	5		VOLQUETA INOPERATIVA
15/04/2026	0	5		LLUVIAS
16/04/2026	0,2	5,2		TRASLADO DE MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADOR
17/04/2026	0	5,2		
18/04/2026	0	5,2		
19/04/2026	0	5,2		DOMINGO
20/04/2026	0	5,2		CITA MEDICA
21/04/2026	0	5,2		
22/04/2026	0	5,2		
23/04/2026	0	5,2		
24/04/2026	0	5,2		
25/04/2026	0	5,2		
26/04/2026	0	5,2		DOMINGO
27/04/2026	0	5,2		FALLA MECANICA
28/04/2026	0	5,2		
29/04/2026	0	5,2		LLUVIAS
30/04/2026	0	5,2		
TOTAL		**5,2**		

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**HORAS DE LLUVIA**	**HORAS DE INOPERATIVIDAD**	**HORAS EFECTIVAS**	**DESCRIPCIÓN**
1/04/2026			8	SOLEADO
2/04/2026			0	FESTIVO
3/04/2026			0	FESTIVO
4/04/2026			0	FESTIVO
5/04/2026			0	DOMINGO
6/04/2026			8	SOLEADO
7/04/2026		8		MOTONIVELADORA PINCHADA
8/04/2026			5	RETRICCION VEHICULAR
9/04/2026			8	
10/04/2026			8	
11/04/2026			5	
12/04/2026				DOMINGO
13/04/2026			8	
14/04/2026			8	VOLQUETA INOPERATIVA
15/04/2026	5		3	LLUVIAS
16/04/2026			3	TRASLADO DE MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADOR
17/04/2026			8	
18/04/2026			8	
19/04/2026				DOMINGO
20/04/2026			0	CITA MEDICA
21/04/2026			8	
22/04/2026			8	
23/04/2026			8	
24/04/2026			8	
25/04/2026			8	
26/04/2026			0	DOMINGO
27/04/2026		8		FALLA MECANICA
28/04/2026			8	
29/04/2026	5		3	LLUVIAS
30/04/2026			8	
TOTAL	**10**	**0**	**139**	

8. MOVILIZACIONES


MOVILIZACIONES ANAPOIMA					
FECHA	**EQUIPO**	**SERIAL**	**OPERADOR**	**ORIGEN**	**DESTINO**
16/04/2026	VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70	3003607	Brayan Sanchez	ANAPOIMA	FUSAGASUGA
16/04/2026	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K	CAT0120KPJAP07183	Jhon Moreno	ANAPOIMA	FUSAGASUGA

9. MANTENIMIENTOS



MANTENIMIENTOS			
FECHA	**EQUIPO**	**SERIAL**	**DESCRIPCION**
14/04/2026	VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70	3003607	Se realiza ajuste en la viga de el rodillo del vibrocompactador
7/04/2026	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K	CAT0120KPJAP07183	Se realiza despinche de llanta trasera
16/04/2026	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K	CAT0120KPJAP07183	Suministro de grasa, inyector, pito, semáforos, cornetas, pito delantero

10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA


CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BÁSICOS												
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS PARA LA ATENCIÓN DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.											
MUNICIPIO:	Anapoima		**PROVINCIA:**	Tequendama				**PERIODO:**	01/04/2026 – 30/04/2026		
MÁQUINA:	MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0120KPJAP07183							**SERIE:**	CAT0120KPJAP07183		
CONTROL HORARIO				**ACPM**				**UREA**				**OBSERVACIÓN**
FECHA	**H. INICIAL**	**H. FINAL**	**HORAS**	**ACPM (GLS)**	**HORÓMETRO/KM TANQUEO**	**RENDIMIENTO**	**No. TIRILLA**	**UREA**	**HOROMETRO TRANQUEO**	**RENDIMIENTO**	**No. TIRILLA**	
01/04/2026	7,257.80	7,261.80	4.00			0.00				0.00		
06/04/2026	7,261.80	7,268.00	6.20			0.00				0.00		
07/04/2026	7,268.00	7,270.10	2.10	55.000	7,269.6	1.55	11022			0.00		EDS PRIMAX ANAPOIMA
08/04/2026	7,268.00	7,270.10	2.10									
09/04/2026	7,277.20	7,284.00	6.80			0.00				0.00		
10/04/2026	7,284.00	7,286.30	2.30	55.000	7,284.1	3.69	18950			0.00		E D S P R I M A X A
11/04/2026	7,284.00	7,286.30	2.30									
13/04/2026	7,286.30	7,293.80	7.50			0.00				0.00		
14/04/2026	7,293.80	7,300.20	6.40			0.00				0.00		
15/04/2026	7,300.20	7,300.20	0.00			0.00				0.00		
16/04/2026	7,300.20	7,303.30	3.10			0.00				0.00		
TOTAL MES			42.8	110.000		2.62		0				

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	JHON MORENO	NOMBRE	CARLOS IVAN CHAVEZ	NOMBRE	JOSE LUIS TRUJILLO
OPERADOR		INSPECTOR/RESIDENTE CONTRATISTA		INSPECTOR ICCU	

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BÁSICOS												
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS PARA LA ATENCIÓN DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.											
MUNICIPIO:	Anapoima		**PROVINCIA:**	Tequendama				**PERIODO:**	01/04/2026 – 30/04/2026		
MÁQUINA:	VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003607							**SERIE:**	3003607		
CONTROL HORARIO				**ACPM**				**UREA**				**OBSERVACIÓN**
FECHA	**H. INICIAL**	**H. FINAL**	**HORAS**	**ACPM (GLS)**	**HORÓMETRO/KM TANQUEO**	**RENDIMIENTO**	**No. TIRILLA**	**UREA**	**HOROMETRO TRANQUEO**	**RENDIMIENTO**	**No. TIRILLA**	
01/04/2026	2,762.40	2,767.50	5.10			0.00				0.00		
06/04/2026	2,767.50	2,771.90	4.40			0.00				0.00		
07/04/2026	2,767.50	2,767.50	0.00			0.00				0.00		
08/04/2026	2,771.90	2,777.70	5.80	35.000	2,777.7	0.84	10601			0.00		Se tanquean 35 gl que habian en stock
09/04/2026	2,777.90	2,784.50	6.60			0.00				0.00		
10/04/2026	2,784.50	2,787.90	3.40			0.00				0.00		
11/04/2026	2,787.90	2,790.00	2.10			0.00				0.00		
13/04/2026	2,790.00	2,794.90	4.90			0.00				0.00		
14/04/2026	2,794.90	2,794.90	0.00	20.000	2,794.9	1.16	11175			0.00		EDS PRIMAX ANAPOIMA
15/04/2026	2,794.90	2,794.90	0.00			0.00				0.00		
16/04/2026	2,794.90	2,802.50	7.60			0.00				0.00		
TOTAL MES			39.9	55.000		1.00		0				

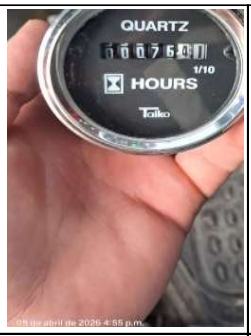
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	BRAYAN SANCHEZ	NOMBRE	CARLOS IVAN CHAVEZ	NOMBRE	JOSE LUIS TRUJILLO
OPERADOR		INSPECTOR/RESIDENTE CONTRATISTA		INSPECTOR ICCU	

VOLQUETA ALQ SBJ118




UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	ABRIL						
MUNICIPIO:	ANAPOIMA						
MAQUINA:	VOLQUETA					SERIE	SBJ118
FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	DIAS TRABAJADOS	STAND BY	OBSERVACIÓN
1/04/2026			40.4	44.2	1		
2/04/2026			44.2	44.2			FESTIVO
3/04/2026			44.2	44.2			FESTIVO
4/04/2026			44.2	44.2			FESTIVO

5/04/2026			44.2	44.2			DOMINGO
6/04/2026			54.9	62.1	1		
7/04/2026			62.1	66	1		
8/04/2026			68.7	68.7		1	Restriccion vehicular
9/04/2026			68.7	76.4	1		


UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

10/04/2026			76.4	84.3	1		
11/04/2026			84.3	87.1	1		
12/04/2026			87.1	87.1			Domingo
13/04/2026			87.1	94.2	1		
14/04/2026			94,2	94,2	0		EQUIPO INOPERATIVO

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

15/04/2026			94,2	94,2		1	TERRENO SATURADO
16/04/2026			94,2	101.3	1		
17/04/2026			101.3	108.3	1		
18/04/2026			108.3	111.7	1		
19/04/2026			111.7	111.7			DOMINGO

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

20/04/2026			111.7	111.7	0		OPERADOR CITA MEDICA
21/04/2026			111.7	119.7	1		
22/04/2026			119.7	127.3	1		
23/04/2026			127.3	134.8	1		
24/04/2026			134.8	142	1		

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

25/04/2026			142	144.1	1		
26/04/2026			144.1	144.1			DOMINGO
27/04/2026			144.1	144.1	0		No trabajo
28/04/2026			144.1	150	1		
29/04/2026			150	153.4	1		

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

30/04/2026			153.4	161.6	1		
SUBTOTAL MES					**18**	**2**	
TOTAL MES					**20**		
Firma			**Firma**				
Nombre:	**Carlos Ivan Chaves Prieto**		**Nombre:**		**JOSE LUIS TRUJILLO**		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			**INSPECTOR ICCU**				

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL
1/04/2026		
2/04/2026		
3/04/2026		

4/04/2026		
5/04/2026		
6/04/2026		

7/04/2026		
8/04/2026		
9/04/2026		

10/04/2026		
11/04/2026		
12/04/2026		

13/04/2026		
14/04/2026		
15/04/2026		

16/04/2026		
17/04/2026		
18/04/2026		

19/04/2026		
20/04/2026		
21/04/2026		

22/04/2026		
23/04/2026		
24/04/2026		

25/04/2026		
26/04/2026		
27/04/2026		

28/04/2026		
29/04/2026		
30/04/2026		

1. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Las actividades ejecutadas en el frente de trabajo de Anapoima permitieron atender de manera oportuna las afectaciones generadas por la temporada de lluvias, garantizando la movilidad y seguridad de las comunidades rurales. La intervención, centrada en el mantenimiento y rehabilitación de vías terciarias, logró la habilitación de pasos críticos afectados, abarcando un avance total de 5.2 kilómetros intervenidos y la disposición de 66 viajes de recebo. Estas labores se desarrollaron durante un periodo operativo de 139 horas efectivas de trabajo y 10 horas condicionadas por lluvias, evidenciando la capacidad de respuesta ante condiciones adversas. Las acciones realizadas en las veredas Golconda y San Antonio contribuyeron significativamente a restablecer la conectividad vial, mejorar las condiciones de tránsito y mitigar riesgos para la población. En general, el balance de la intervención es positivo, destacándose la eficiencia en la ejecución y el impacto favorable en la comunidad benefici

UNIÓN TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Conformación de cunetas	Conformación de vía
	
Descargue de recebo	Descargue de material
	
Compactación de recebo	Compactación de vía

	
Movilización de equipos	Compactación de vía
	
Conformación de canales	Cargue de material
	
Descargue de recebo	Compactación de vía

	
Conformación de vía	Descargue de fresado
	
Limpieza de cunetas	Compactación de vía

José Luis Trujillo
INSPECTOR ICCU

Carlos Iván Chaves Prieto
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°3
PERIODO: ANOLAIMA DEL 2026

PROVINCIA: TEQUENDAMA

MUNICIPIO: ANOLAIMA

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA TEQUENDAMA
MUNICIPIO DE ANOLAIMA

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Tequendama:

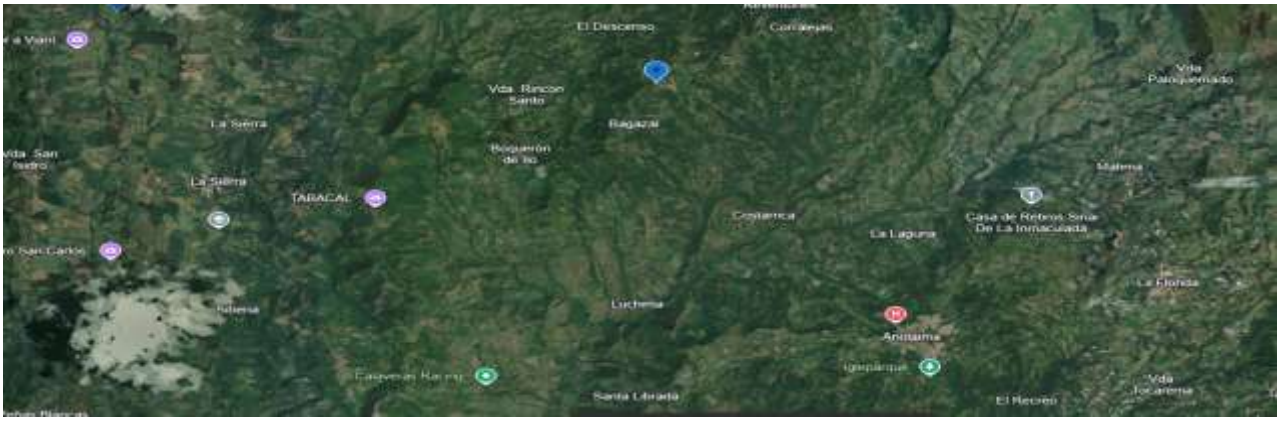
Anolaima:

1. MOTONIVELADORA CARTERPILLAR
2. RETROEXCAVADORA CARTERPILLAR
3. RETROEXCAVADORA CASE
4. VIBRO COMPATADOR AMMAN
5. VOLQUETA INTERNATIONAL ODT 392
6. VOLQUETA INTERNATIONAL GZM 757
7. VOLQUETA INTERNATIONAL GZM 760
8. VOLQUETA NISSAN ALQUILADA OAH 997

Ubicación:

ANOLAIMA- mantenimiento vial en el sector Alto del Trigo – Corralejas 4°49'52.22"N 74°23'43.02"W

Imagen 1 ubicación de las maquinas



Fuente: Google earth.

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	JEISSON ABEL MARTINEZ MENDEZ
INSPECTOR DE OBRA ICCU	JHOHAN DAMIAN CESPEDES
OPERADOR MOTONIVELADORA CARTERPILLAR	ALEX AGUILAR BUSTOS
OPERADOR RETROEXCAVADORA CARTERPILLAR	MANUEL NIETO
OPERADOR RETROEXCAVADORA CASE	PEDRO JOSE BELTRAN PARDO
OPERADOR VIBRO COMPATADOR AMMAN	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ
OPERADOR VOLQUETA INTERNATIONAL ODT 392	FIDELO GUTIERREZ
OPERADOR VOLQUETA INTERNATIONAL GZM 757	OMAR ESPINEL
OPERADOR VOLQUETA INTERNATIONAL GZM 760	YEISON VNOY
OPERADOR VOLQUETA NISSAN ALQUILADA OAH 997	AUGUSTO SANCHEZ

3. PLAN DE TRABAJO

ha sido intervenida en múltiples ocasiones mediante labores de conformación, mejoramiento, manejo de drenajes y atención de puntos críticos. En este sentido, el avance del cronograma se estima entre un **20% y 25%**, considerando que las actividades restantes corresponden principalmente a ajustes finales, mantenimiento puntual y estabilización definitiva de sectores críticos. Asimismo, factores como las condiciones climáticas y las intervenciones por emergencia han incidido en la dinámica de ejecución, sin impedir el cumplimiento progresivo de los objetivos del proyecto.

Imagen 2 cronograma de actividades municipio de Quipile



Fuente: Alcaldía de Anolaima.

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

FECHA	ACTIVIDADES
4/04/2026	**Actividades: Se traslada la motoniveladora desde el sector La Sierra hasta el punto de emergencia en el Alto del Trigo, con el fin de realizar trabajos de habilitación de la vía. Se ejecutan nueve (9) viajes de material de recebo, logrando restablecer el tránsito en el tramo intervenido.** **Longitud: 200 m** **Lluvias: 0 horas aprox** **Combustible: se suministra acpm a motoniveladora de 44,092 gal horómetro de tanqueo 7963,4** **Novedades:** **Km inicio-fin** **MOTONIVELADORA 7125: 7963,3 – 7969,0** **MOTONIVELADORA 7125** *** cambio de filtros de aire acondicionado** **MOTONIVELADORA CAT0120KVJAP07125 OPERATIVA.**
6/04/2026	**Actividades: Se ejecutaron actividades de conformación y ampliación de la plataforma vial, así como la limpieza y adecuación de cunetas y bordes de pavimento, mediante el uso de retroexcavadora, con el fin de optimizar la sección hidráulica, mejorar el drenaje superficial y garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad vial. En cuanto a la logística de maquinaria, la retroexcavadora fue movilizada inicialmente desde el sector Las Mercedes hacia San Cayetano, y posteriormente transportada mediante cama baja hasta el municipio de Quipile, asegurando su disponibilidad para la ejecución de las actividades programadas.** **Zona: alto del trigo corralejas** **Longitud: 1500 m** **Km inicio-fin** **MOTONIVELADORA 7125: 7969,0 – 7975,5** **RETROEXCAVADORA 8159: 10088,6 – 10091,1**

	MOTONIVELADORA 7125 *** cambio de filtros de aire acondicionado** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159** **se requiere aceite de motor se encuentra bajo de nivel** **MOTONIVELADORA CAT0120KVJAP07125 OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159 OPERATIVA.**
7/04/2026	**Actividades: Motoniveladora para conformar paso critico porque se corre la bancada del piso, Retroexcavadora 8159 Se trasladó la máquina del sector d corralejas a el sector alto del trigo quedando junto con la motoniveladora Retroexcavadora 4103 se trasladó Vereda san francisco de Soacha, alto del trigo y vibro compactador se hace traslado Vereda san francisco de Soacha, alto del trigo sin que llegue los equipos al lugar de descarga se quedan en Alban y mañana continúan con el traslado.** **Zona: alto del trigo corralejas** **Longitud: 100 m** **Lluvias: 0 horas aprox** **Combustible:** **Novedades:** **Km inicio-fin** **MOTONIVELADORA 7125: 7975,5 – 7976,5** **RETROEXCAVADORA 8159: 10091,1 – 10091,5** **RETROEXCAVADORA 4103: 6830,9 – 6832,7** **VIBRO COMPACTADOR 2548: 3435,9 -3435,9** **MOTONIVELADORA 7125** *** cambio de filtros de aire acondicionado** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159** **se requiere aceite de motor se encuentra bajo de nivel** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103** *** AIRE ACONDICIONADO**

	*** SE SOLICITAN 48 ARANDELAS DE AJUSTE** *** SOLICITO LLANTA TRACERAS Y DELANTEARAS** *** RIN DELANTERO MAL ESTADO** **MOTONIVELADORA CAT0120KVJAP07125** **OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159 OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103 OPERATIVA.** **VIBRO COMPACTADOR 2742548 OPERATIVO.**
8/04/2026	**Actividades: Se dispuso la motoniveladora para realizar acompañamiento técnico en campo al ingeniero Damián, con el fin de efectuar la inspección de la fuente de material (recebera) y la identificación y priorización de los puntos críticos a lo largo del tramo hasta el sector La Sierra. De igual manera, la retroexcavadora 8159 participó en el acompañamiento técnico para la verificación de los tramos a intervenir, permitiendo la evaluación de las condiciones de estabilidad, drenaje y geometría de la vía. Por su parte, la retroexcavadora 4103 y el vibro compactador continuaron en proceso de movilización hacia el sector Alto del Trigo; sin embargo, debido a restricciones logísticas, los equipos no alcanzaron el punto de descarga y permanecieron en el sector de Albán, desde donde reanudarán su traslado al día siguiente para su incorporación a las actividades programadas.** **Zona: alto del trigo corralejas** **Longitud: 100 m** **Lluvias: 0 horas aprox** **Combustible: se suministra acpm a retroexcavadora 8159 de 29 gal horómetro de tanqueo 10091,7 y retroexcavadora 4103 de 29 gal horómetro de tanqueo 6832,9** **Novedades:** **Km inicio-fin** **MOTONIVELADORA 7125: 7976,5 – 7977,2** **RETROEXCAVADORA 8159: 10091,5 – 10091,7** **RETROEXCAVADORA 4103: 6832,7 – 6832,9**

	VIBRO COMPACTADOR 2548: 3435,9 – 3436,2 **MOTONIVELADORA 7125** *** cambio de filtros de aire acondicionado** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159** **se requiere aceite de motor se encuentra bajo de nivel** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103** *** AIRE ACONDICIONADO** *** SE SOLICITAN 48 ARANDELAS DE AJUSTE** *** SOLICITO LLANTA TRACERAS Y DELANTEARAS** *** RIN DELANTERO MAL ESTADO** **MOTONIVELADORA CAT0120KVJAP07125** **OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159** **OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103** **OPERATIVA.** **VIBRO COMPACTADOR 2742548** **OPERATIVO.**
9/04/2026	**Actividades: Se dispuso la motoniveladora para la ejecución de actividades de limpieza y descolmatación de cunetas revestidas y bordillos en pavimento, con el fin de restituir la capacidad hidráulica del sistema de drenaje superficial. Posteriormente, el equipo apoyó las labores de control de tránsito mediante señalización manual (paleteros), mientras se implementaban acciones provisionales para el desvío de escorrentías en el punto donde se presentó la falla por pérdida de banca.** **La retroexcavadora identificada con 8159 realizó la adecuación y reconformación de cunetas en un paso crítico del sector Alto del Trigo, mejorando el encauzamiento de aguas superficiales. Por su parte, la retroexcavadora 4103 ejecutó obras de canalización de flujos hídricos que**

	estaban generando socavación y desniveles en la estructura de la vía, contribuyendo a la estabilización del tramo intervenido. **Finalmente, se empleó el vibro compactador para la compactación del material dispuesto en el paso crítico de la vereda Alto del Trigo, en el municipio de Guayabal de Síquima, con el objetivo de incrementar la densidad del material, mejorar la capacidad portante y garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad.** **Zona: alto del trigo corralejas** **Longitud: 300 m** **Lluvias: 0 horas aprox** **Combustible:** **Novedades:** **Km inicio-fin** **MOTONIVELADORA 7125: 7977,2 – 7981,8** **RETROEXCAVADORA 8159: 10091,7 – 10093,8** **RETROEXCAVADORA 4103: 6832,9 – 6836,4** **VIBRO COMPACTADOR 2548: 3436,2 – 3438,5** **MOTONIVELADORA 7125** *** cambio de filtros de aire acondicionado** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159** **se requiere aceite de motor se encuentra bajo de nivel** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103** *** AIRE ACONDICIONADO** *** SE SOLICITAN 48 ARANDELAS DE AJUSTE** *** SOLICITO LLANTA TRACERAS Y DELANTEARAS**

	*** RIN DELANTERO MAL ESTADO** **MOTONIVELADORA CAT0120KVJAP07125** **OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159** **OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103** **OPERATIVA.** **VIBRO COMPACTADOR 2742548** **OPERATIVO.**
10/04/2026	**Actividades: Se empleó la motoniveladora para la limpieza y descolmatación de cunetas revestidas, bordillos y la intervención de puntos críticos, con el fin de restablecer la capacidad hidráulica y mejorar las condiciones de transitabilidad de la vía. La retroexcavadora identificada con código 8159 brindó apoyo a la motoniveladora mediante el destape y adecuación de cunetas, así como en las labores de cargue, manejo y extendido de material para la reconformación de la superficie de rodadura. Por su parte, la retroexcavadora 4103 ejecutó la adecuación de un paso crítico, incluyendo la intervención del sistema de filtración existente filtro, con el propósito de mejorar la evacuación de aguas y mitigar procesos de socavación en el tramo afectado. Finalmente, se utilizó el vibro compactador para la compactación de aproximadamente 1 km de vía en la vereda Alto del Trigo, incrementando la densidad del material granular, mejorando la capacidad portante de la estructura vial y garantizando condiciones adecuadas de servicio. Zona: alto del trigo corralejas** **Longitud: 1000 m** **Lluvias: 0 horas aprox** **Combustible:** **Novedades:** **Km inicio-fin** **MOTONIVELADORA 7125: 7981,8 – 7987,9** **RETROEXCAVADORA 8159: 10093,8 – 10098,2** **RETROEXCAVADORA 4103: 6836,4 – 6841,0**

	VIBRO COMPACTADOR 2548: 3438,5 – 3444,6 **MOTONIVELADORA 7125** *** cambio de filtros de aire acondicionado** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159** **se requiere aceite de motor se encuentra bajo de nivel** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103** *** AIRE ACONDICIONADO** *** SE SOLICITAN 48 ARANDELAS DE AJUSTE** *** SOLICITO LLANTA TRACERAS Y DELANTEARAS** *** RIN DELANTERO MAL ESTADO** **MOTONIVELADORA CAT0120KVJAP07125** **OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159** **OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103** **OPERATIVA.** **VIBRO COMPACTADOR 2742548** **OPERATIVO.**
11/04/2026	**Actividades: Se dispuso la motoniveladora 7125 para la conformación y adecuación de la calzada, con el fin de habilitar el acceso y permitir la maniobra de extracción de una volqueta volcada en el sector intervenido. La retroexcavadora 8159 ejecutó labores de limpieza y remoción de material producto de un derrumbe, realizando la evacuación de dos (2) viajes de material, y brindó apoyo operativo en las actividades de recuperación y estabilización del área afectada, incluyendo la asistencia en la maniobra de izaje y retiro del vehículo volcado. De igual forma, la retroexcavadora 4103 participó como apoyo en las labores de recuperación de la volqueta volcada, facilitando las operaciones de control del terreno y despeje de la zona. El vibro compactador 2548 también prestó apoyo operativo durante las actividades de atención de la emergencia, contribuyendo a la estabilización superficial del área intervenida una vez finalizadas las maniobras de extracción del vehículo.**

	Zona: alto del trigo corralejas **Longitud: 0 m** **Lluvias: 0 horas aprox** **Combustible: vibro compactado se suministró 30 gal horómetro de tanqueo 3444,7 y motoniveladora 30 gal horómetro de tanqueo 7987,9** **Novedades:** **Km inicio-fin** **MOTONIVELADORA 7125: 7987,9 – 7990,3** **RETROEXCAVADORA 8159: 10098,2 – 10104,9** **RETROEXCAVADORA 4103: 6841,0 – 6845,5** **VIBRO COMPACTADOR 2548: 3444,6 – 3444,7** **MOTONIVELADORA 7125** *** cambio de filtros de aire acondicionado** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159** **se requiere aceite de motor se encuentra bajo de nivel** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103** *** AIRE ACONDICIONADO** *** SE SOLICITAN 48 ARANDELAS DE AJUSTE** *** SOLICITO LLANTA TRACERAS Y DELANTEARAS** *** RIN DELANTERO MAL ESTADO** **MOTONIVELADORA CAT0120KVJAP07125** **OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159** **OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103 OPERATIVA.** **VIBRO COMPACTADOR 2742548** **OPERATIVO.**

12/04/2026	DESCANSO.
13/04/2026	Actividades: Se empleó la motoniveladora 7125 para la limpieza y descolmatación de cunetas revestidas y bordillos del pavimento, así como la remoción de derrumbes, en un tramo aproximado de 2 km, con el objetivo de restablecer la capacidad hidráulica superficial y mejorar las condiciones de transitabilidad del corredor vial. La retroexcavadora 8159 ejecutó labores de limpieza de cunetas, incluyendo la excavación, cargue, transporte y disposición del material proveniente de la intervención, contribuyendo al mantenimiento de la sección hidráulica y la estabilidad de los márgenes de la vía. Por su parte, la retroexcavadora 4103 realizó actividades de limpieza de cunetas y se efectuó el cambio de llantas del equipo, garantizando su operatividad y continuidad en la ejecución de las labores programadas. Finalmente, el vibro compactador 2548 ejecutó la compactación de aproximadamente 50 m de vía en la vereda Alto del Trigo, incrementando la densidad del material granular, mejorando la capacidad portante de la estructura vial y asegurando condiciones adecuadas de servicio en el tramo intervenido. Zona: alto del trigo corralejas Longitud: 2000 m Lluvias: 0 horas aprox Combustible: Novedades: se hace cambio de las 4 llantas de la retroexcavadora 4103 Km inicio-fin MOTONIVELADORA 7125: 7990,3 – 7997,6 RETROEXCAVADORA 8159: 10104,9 – 10110,2 RETROEXCAVADORA 4103: 6845,5 – 6851,1 VIBRO COMPACTADOR 2548: 3444,7 – 3448,6 MOTONIVELADORA 7125 * cambio de filtros de aire acondicionado RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159 se requiere aceite de motor se encuentra bajo de nivel RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103

	*** AIRE ACONDICIONADO** *** SE SOLICITAN 48 ARANDELAS DE AJUSTE** *** SOLICITO LLANTA TRACERAS Y DELANTEARAS** *** RIN DELANTERO MAL ESTADO** **MOTONIVELADORA CAT0120KVJAP07125 OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159 OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103 OPERATIVA.** **VIBRO COMPACTADOR 2742548 OPERATIVO.**
14/04/2026	**Actividades: Se empleó la motoniveladora 7125 para la limpieza y descolmatación de cunetas revestidas y bordillos del pavimento, así como la remoción de derrumbes, en un tramo aproximado de 1.500 m, con el fin de restablecer la capacidad hidráulica superficial y mejorar las condiciones de transitabilidad del corredor vial. La retroexcavadora 8159 ejecutó actividades de limpieza de cunetas, incluyendo la excavación, cargue, transporte y disposición del material producto de la intervención, contribuyendo a la recuperación de la sección hidráulica y al mantenimiento de las condiciones de estabilidad en los márgenes de la vía. Por su parte, la retroexcavadora 4103 realizó labores de limpieza de cunetas, optimizando el encauzamiento de aguas superficiales y mejorando las condiciones de drenaje longitudinal del tramo intervenido. Finalmente, el vibro compactador 2548 ejecutó la compactación de aproximadamente 100 m de vía en la vereda Alto del Trigo, incrementando la densidad del material granular, mejorando la capacidad portante de la estructura vial y garantizando condiciones adecuadas de servicio en el tramo intervenido.** **Zona: alto del trigo corralejas** **Longitud: 1500 mts.** **Lluvias: 4 horas aprox** **Combustible: se suministra acpm a retroexcavadora 4103 de acpm 30 gal horómetro de tanque 6851,6 y retroexcavadora 8159 de acpm de 30 gal horómetro de tanqueo 10110,2** **Novedades:** **Km inicio-fin** **MOTONIVELADORA 7125: 7997,6 – 8002,8**

	RETROEXCAVADORA 8159: 10110,2 – 10115,4 **RETROEXCAVADORA 4103: 6851,1 – 6856,6** **VIBRO COMPACTADOR 2548: 3448,6 – 3453,2** **MOTONIVELADORA 7125** *** cambio de filtros de aire acondicionado** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159** **se requiere aceite de motor se encuentra bajo de nivel** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103** *** AIRE ACONDICIONADO** *** SE SOLICITAN 48 ARANDELAS DE AJUSTE** *** RIN DELANTERO MAL ESTADO** **MOTONIVELADORA CAT0120KVJAP07125 OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159 OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103 OPERATIVA.** **VIBRO COMPACTADOR 2742548 OPERATIVO.**
15/04/2026	**Actividades: No fue posible ejecutar las actividades programadas debido a condiciones climáticas adversas, específicamente la presencia de precipitaciones en el sector intervenido, lo cual generó limitaciones de accesibilidad, disminución de la estabilidad del terreno y condiciones no aptas para la operación de maquinaria y personal en obra.** **Zona: alto del trigo corralejas** **Longitud: 0 mts.** **Lluvias: 8 horas aprox** **Combustible:** **Novedades:** **Km inicio-fin** **MOTONIVELADORA 7125: 8002,8** **RETROEXCAVADORA 8159: 10115,4**

	RETROEXCAVADORA 4103: 6856,6 **VIBRO COMPACTADOR 2548: 3453,2** **MOTONIVELADORA 7125** *** cambio de filtros de aire acondicionado** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159** **se requiere aceite de motor se encuentra bajo de nivel** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103** *** AIRE ACONDICIONADO** *** SE SOLICITAN 48 ARANDELAS DE AJUSTE** *** SOLICITO LLANTA TRACERAS Y DELANTEARAS** *** RIN DELANTERO MAL ESTADO** **MOTONIVELADORA CAT0120KVJAP07125 OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159 OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103 OPERATIVA.** **VIBRO COMPACTADOR 2742548 OPERATIVO.**
16/04/2026	**Actividades: Se informa que la motoniveladora 7125 no pudo ejecutar actividades debido a la ocurrencia constante de precipitaciones en el sector, las cuales generaron condiciones de humedad excesiva e inestabilidad del terreno, impidiendo la operación segura de la maquinaria.** **La retroexcavadora 8159 realizó apoyo operativo en el paso crítico, contribuyendo a labores puntuales de atención y mantenimiento del punto intervenido, en la medida que las condiciones climáticas lo permitieron.** **La retroexcavadora 4103 y el vibro compactador 2548 no pudieron ejecutar actividades programadas debido a la persistencia de lluvias en la zona, lo cual generó condiciones no aptas para la operación de equipos y desarrollo de actividades de movimiento de tierras y compactación.** **Zona: alto del trigo corralejas** **Longitud: 10 mts.** **Lluvias: 6 horas aprox**

	Combustible: **Novedades:** **Km inicio-fin** **MOTONIVELADORA 7125: 8002,8 – 8003,0** **RETROEXCAVADORA 8159: 10115,4 – 10116,4** **RETROEXCAVADORA 4103: 6856,6 – 6856,6** **VIBRO COMPACTADOR 2548: 3453,2 – 3453,9** **MOTONIVELADORA 7125** *** cambio de filtros de aire acondicionado** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159** **se requiere aceite de motor se encuentra bajo de nivel** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103** *** AIRE ACONDICIONADO** *** SE SOLICITAN 48 ARANDELAS DE AJUSTE** *** SOLICITO LLANTA TRACERAS Y DELANTEARAS** *** RIN DELANTERO MAL ESTADO** **MOTONIVELADORA CAT0120KVJAP07125 OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159 OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103 OPERATIVA.** **VIBRO COMPACTADOR 2742548 OPERATIVO.**
17/04/2026	**Actividades: La motoniveladora 7125 realizó acompañamiento de las retros, en acompañamiento a las retroexcavadoras. La retroexcavadora 8159 ejecutó el cargue de cuatro (4) viajes de material de recebo desde la recebera Garita. Por su parte, la retroexcavadora 4103 llevó a cabo la extensión del material en un paso crítico. Posteriormente, el vibro compactador 2548 efectuó el sellado y la compactación de aproximadamente 50 metros en dicho tramo.** **Adicionalmente, la volqueta GZM 757 y la volqueta GZM 760 realizaron cuatro (4) viajes cada una de material de recebo. se lleva acpm a motoniveladora 60 gal vibro compactador 40, retro 8159 - 30 gal y retro 4103- 30 gal para tanquiar el día de mañana.**

	Zona: alto del trigo corralejas **Longitud: 400 mts.** **Lluvias: 4 horas aprox** **Combustible: se suministró acpm a volqueta GZM 760 de 21 gal horómetro de tanqueo 53403, hora 4508 y volqueta GZM 757 de 33 gal horómetro de tanqueo 52630, hora 3935, se lleva acpm a motoniveladora 60 gal vibro compactador 40, retro 8159 30 gal y retro 4103 30 gal para tanquiar el día de mañana** **Novedades:** **Km inicio-fin** **MOTONIVELADORA 7125: 8003,0 – 8003,0** **RETROEXCAVADORA 8159: 10116,4 – 10120,8** **RETROEXCAVADORA 4103: 6856,6 – 6861,1** **VIBRO COMPACTADOR 2548: 3453,9 – 3455,0** **VOLQUETA GZM 760 :53195 -53403** **VOLQUETA GZM 757:52441 - 52651** **HORA INICIAL – FINAL** **VOLQUETA GZM 760: 4498 - 4508** **VOLQUETA GZM 757 :3926 - 3936** **MOTONIVELADORA 7125** *** cambio de filtros de aire acondicionado** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159** **se requiere aceite de motor se encuentra bajo de nivel** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103** *** AIRE ACONDICIONADO** *** SE SOLICITAN 48 ARANDELAS DE AJUSTE** *** SOLICITO LLANTA TRACERAS Y DELANTEARAS** *** RIN DELANTERO MAL ESTADO**

18/04/2026	**Actividades: La motoniveladora 7125 realizó labores de conformación y nivelación de la vía, en acompañamiento a las retroexcavadoras durante las actividades de movimiento de material. La retroexcavadora 8159 ejecutó el cargue de cuatro (4) viajes de material de recebo desde la recebera Garita. A su vez, la retroexcavadora 4103 llevó a cabo la extensión del material en un paso crítico ubicado en el sector Alto del Trigo, Posteriormente, el vibro compactador 2548 realizó la compactación del material dispuesto, correspondiente a cuatro (4) viajes de recebo, garantizando la densificación en el tramo intervenido, En cuanto al transporte, la volqueta GZM 757 y la volqueta GZM 760 efectuaron dos (2) viajes cada una de material de recebo, contribuyendo al abastecimiento del frente de trabajo. Zona: alto del trigo corralejas** **Longitud: 500 mts.** **Lluvias: 0 horas aprox** **Combustible: se suministró acpm a motoniveladora de 60 gal horómetro de tanqueo 8003** **Novedades:** **Km inicio-fin** **MOTONIVELADORA 7125: 8003,0 – 8005,5** **RETROEXCAVADORA 8159: 10120,8 – 10124,2** **RETROEXCAVADORA 4103: 6861,1 – 6863,5** **VIBRO COMPACTADOR 2548: 3455,0 – 3456,9** **VOLQUETA GZM 760: 53403 - 53419** **VOLQUETA GZM 757: 52651 – 52667** **HORA INICIAL – FINAL** **VOLQUETA GZM 760: 4508 - 4510** **VOLQUETA GZM 757: 3936 - 3938** **MOTONIVELADORA 7125** *** cambio de filtros de aire acondicionado** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159** **se requiere aceite de motor se encuentra bajo de nivel** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103**

	*** AIRE ACONDICIONADO** *** SE SOLICITAN 48 ARANDELAS DE AJUSTE** *** SOLICITO LLANTA TRACERAS Y DELANTEARAS** *** RIN DELANTERO MAL ESTADO** **MOTONIVELADORA CAT0120KVJAP07125 OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159 OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103 OPERATIVA.** **VIBRO COMPACTADOR 2742548 OPERATIVO.**
19/04/2026	**DESCANSO.**
20/04/2026	**Actividades: La motoniveladora 7125 ejecutó actividades de conformación, incluyendo la construcción de un tramo de filtro de aproximadamente 2 metros, para lo cual se dispusieron ocho (8) viajes de material pétreo. Adicionalmente, se realizó la excavación y retiro de material, con un total de diez (10) viajes de tierra. La retroexcavadora 8159 efectuó el cargue de seis (6) viajes de material de recebo desde la recebera Garita. Por su parte, la retroexcavadora 4103 realizó el cajeo de un área aproximada de 5 x 3 metros, con el fin de preparar la base para la instalación de material pétreo en un paso crítico, Posteriormente, el vibro compactador 2548 llevó a cabo la compactación de seis (6) viajes de material de recebo en el sector Alto del Trigo, garantizando la adecuada densificación del tramo intervenido. En cuanto al transporte, la volqueta GZM 757 realizó diez (10) viajes de material sobrante producto de la excavación, mientras que la volqueta GZM 760 ejecutó cinco (5) viajes de material de recebo para el suministro del frente de trabajo.** **Zona: alto del trigo corralejas** **Longitud: 200 mts.** **Lluvias: 0 horas aprox** **Combustible:** **Novedades: motoniveladora 7125 se necesita piñón de ataque, pulidor para la tornamesa** **Km inicio-fin** **MOTONIVELADORA 7125: 8005,5 – 8005,6**

	RETROEXCAVADORA 8159: 10124,2 - 10130 **RETROEXCAVADORA 4103: 6863,5 - 6871,4** **VIBRO COMPACTADOR 2548:** **VOLQUETA ODT 392:** **HORA INICIAL – FINAL** **VOLQUETA ODT 392:** **MOTONIVELADORA 7125** *** cambio de filtros de aire acondicionado** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159** **se requiere aceite de motor se encuentra bajo de nivel** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103** *** AIRE ACONDICIONADO** *** SE SOLICITAN 48 ARANDELAS DE AJUSTE** *** RIN DELANTERO MAL ESTADO** ***TABLERO DE INSTRUMENTOS SE SOLICITA ESCANEARMOTONIVELADORA CAT0120KVJAP07125 OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159 OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103 OPERATIVA.** **VIBRO COMPACTADOR 2742548 OPERATIVO.** **VOLQUETA ODT 392 OPERATIVA.**
21/04/2026	**Vereda/Sector: emergencia en el Alto del Trigo Condición climática: Lluvias Actividad: La motoniveladora No. 7125 ejecutó el corte y retiro de material superficial de la subrasante con el fin de restablecer la transitabilidad del tramo, afectado por desplazamiento lateral y pérdida de soporte de la bancada. La retroexcavadora No. 8159 realizó el traslado del equipo desde el sector Reserva Garita hacia El Trigo, así como las maniobras de cargue para su movilización a un nuevo frente de obra. Por su parte, la retroexcavadora No. 4103 llevó a cabo el cajeo en un área aproximada de 5 × 3 m, con el objetivo de**

	preparar la subbase para la posterior colocación de material en un punto crítico de la vía. Posteriormente, el vibro compactador No. 2548 efectuó la compactación de dos (2) viajes de material de recebo en el sector Alto del Trigo, garantizando niveles adecuados de densificación y estabilidad del tramo intervenido. Finalmente, la volqueta ODT 392 inició su desplazamiento hacia el frente de obra; sin embargo, realizó una parada técnica previa en taller para la ejecución de mantenimiento preventivo, incluyendo revisión general y ajuste del sistema de frenos. Novedades: motoniveladora 7125 se necesita piñón de ataque, pulidor para la tornamesa **Avance (km): 0.1** **MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0120KVJAP07125 (OPERATIVA)** **Propiedad: ICCU Operador: ALEX YEIRSIÑO AGUILAR BUSTOS H. inicial – H. final: 8005.6 – 8008.7** **Novedades mecánicas: cambio de filtros de aire acondicionado** **RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0416EEMFG08159 (OPERATIVA)Propiedad: ICCU Operador: PEDRO JOSE BELTRAN** **H. inicial – H. final: 10130 – 10130.9** **ACPM (gl): 30 | Km tanqueo: 10130.9 Novedades mecánicas: se requiere aceite de motor se encuentra bajo de nivel** **RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SREJC754103 (OPERATIVA) Propiedad: ICCU Operador: MANUEL NIETO H. inicial – H. final: 6871.4 – 6873.4 Novedades mecánicas: * AIRE ACONDICIONADO * SE SOLICITAN 48 ARANDELAS DE AJUSTE * RIN DELANTERO MAL ESTADO *TABLERO DE INSTRUMENTOS SE SOLICITA ESCANEAR VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742548 (OPERATIVA) Propiedad: ICCU Operador: JAVIER RAMIREZ H. inicial – H. final: 3462.4 – 3465. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)** **Propiedad: ICCU Operador: FIDOLO GUTIERREZ** **H. inicial – H. final: 7120 – 7121** **Kilometraje inicial - final: 93735 – 93743**
22/04/2026	**Vereda/Sector: emergencia en el Alto del Trigo Condición climática: Lluvias Actividad: La motoniveladora No. 7125 se encuentra fuera de operación debido a la presencia de lluvias en el sector, lo que ha generado acumulación y escurrimiento de agua en el área de trabajo. Por su parte, la retroexcavadora No. 4103 permanece en condiciones de operación condicionada por clima**

	nublado con precipitaciones intermitentes y limitación de disponibilidad de volquetas para el acarreo de material. Posteriormente, el vibro compactador No. 2548 registra suspensión de actividades debido a condiciones climáticas adversas (lluvia). Finalmente, la volqueta ODT 392 se encuentra en proceso de mantenimiento en taller. **MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0120KVJAP07125 (OPERATIVA)** **Propiedad: ICCU Operador: ALEX YEIRSIÑO AGUILAR BUSTOS** **H. inicial – H. final: 8008.7 – 8008.8** **Novedades mecánicas: cambio de filtros de aire acondicionado, se necesita piñón de ataque, pulidor para la tornamesa** **RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SREJC754103 (OPERATIVA)** **Propiedad: ICCU** **Operador: MANUEL NIETO** **H. inicial – H. final: 6873.4 – 6873.5** **Novedades mecánicas: * AIRE ACONDICIONADO * SE SOLICITAN 48 ARANDELAS DE AJUSTE * RIN DELANTERO MAL ESTADO *TABLERO DE INSTRUMENTOS SE SOLICITA ESCANEAR** **VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 2742548 (OPERATIVA)** **Propiedad: ICCU Operador: JAVIER RAMIREZ** **H. inicial – H. final: 3465.7 – 3465.8** **VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - ODT392 (OPERATIVA)** **Propiedad: ICCU Operador: FIDOLO GUTIERREZ** **H. inicial – H. final: 7121 – 7121** **Kilometraje inicial - final: 93743 – 93743**
23/04/2026	**Actividades: La motoniveladora No. 7125 ejecuta la remoción de material blando o suelo acolchonado, conformación de la subrasante e instalación de capa de piedra, así como la extensión de material tipo recebo en el punto crítico de la vía. La retroexcavadora No. 4103 realiza actividades de cargue de material. El vibro compactador No. 2548 efectúa la compactación de aproximadamente 50 m de vía intervenida, con el apoyo de dos (2) viajes de material de piedra rajón en el sector crítico. La volqueta ODT 392 se encuentra**

	en proceso de mantenimiento en taller. Adicionalmente, la volqueta alquilada realiza el transporte de material orgánico con un total de diez (10) viajes y dos (2) viajes de material tipo recebo **Zona: alto del trigo corralejas** **Longitud: 200 mts.** **Lluvias: 2 horas aprox** **Combustible: se suministra acpm a retroexcavadora de 30 gal horómetro de tanqueo 6873,5** **Novedades: motoniveladora 7125 se necesita piñón de ataque, pulidor para la tornamesa** **Km inicio-fin** **MOTONIVELADORA 7125: 8008,8 – 8011,0** **RETROEXCAVADORA 4103: 6873,5 – 6882,3** **VIBRO COMPACTADOR 2548: 3465,8 – 3468,1** **VOLQUETA ODT 392: 93743 - 93743** **VOLQUETA ALQUILADA OAH 997: 0,11 - 0,77** **HORA INICIAL – FINAL** **VOLQUETA ODT 392: 7121 – 7122** **MOTONIVELADORA 7125** *** cambio de filtros de aire acondicionado** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159** **se requiere aceite de motor se encuentra bajo de nivel** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103** *** AIRE ACONDICIONADO** *** SE SOLICITAN 48 ARANDELAS DE AJUSTE** *** RIN DELANTERO MAL ESTADO** ***TABLERO DE INSTRUMENTOS SE SOLICITA ESCANEAR** **MOTONIVELADORA CAT0120KVJAP07125**

	OPERATIVA. **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103 OPERATIVA.** **VIBRO COMPACTADOR 2742548 OPERATIVO.** **VOLQUETA ODT 392 OPERATIVA.** **VOLQUETA ALQUILADA OAH 997 OPERATIVA.**
24/04/2026	**Actividades: La motoniveladora No. 7125 ejecuta la remoción de material inadecuado o suelo blando (terreno acolchonado), conformación de la subrasante, colocación de capa de material pétreo y extensión de material tipo recebo en el punto crítico de la vía. La retroexcavadora No. 4103 realiza el cargue y manejo de material para disposición final. El vibro compactador No. 2548 efectúa la compactación de material granular en el sector crítico, con apoyo de tres (3) viajes de piedra rajón. La volqueta ODT 392 se encuentra en proceso de mantenimiento en taller y posteriormente se reincorpora al frente de trabajo. Adicionalmente, la volqueta alquilada OAH 997 realiza el transporte de material orgánico con tres (3) viajes y un (1) viaje de material tipo recebo** **Zona: alto del trigo corralejas** **Longitud: 200 mts.** **Lluvias: 2 horas aprox** **Combustible: vibro compactado se suministra acpm de 40 gal horómetro de tanqueo 3468,1** **Novedades: motoniveladora 7125 se necesita piñón de ataque, pulidor para la tornamesa** **Km inicio-fin** **MOTONIVELADORA 7125: 8011,0 – 8013,0** **RETROEXCAVADORA 4103: 6882,3 – 6887,6** **VIBRO COMPACTADOR 2548: 3468,1 – 3469,6** **VOLQUETA ODT 392: 93743 - 93843** **VOLQUETA ALQUILADA OAH 997: 0,77 - 012,6** **HORA INICIAL – FINAL** **VOLQUETA ODT 392: 7122 - 7127**

	MOTONIVELADORA 7125 *** cambio de filtros de aire acondicionado** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159** **se requiere aceite de motor se encuentra bajo de nivel** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103** *** AIRE ACONDICIONADO** *** SE SOLICITAN 48 ARANDELAS DE AJUSTE** *** RIN DELANTERO MAL ESTADO** ***TABLERO DE INSTRUMENTOS SE SOLICITA ESCANEAR** **MOTONIVELADORA CAT0120KVJAP07125 OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103 OPERATIVA.** **VIBRO COMPACTADOR 2742548 OPERATIVO.** **VOLQUETA ODT 392 OPERATIVA.** **VOLQUETA ALQUILADA OAH 997 OPERATIVA.**
25/04/2026	**Actividades: Se dispone de la volqueta alquilada de placas OAH 997 para el transporte de un (1) viaje de material tipo orgánico. De manera complementaria, la retroexcavadora identificada con código 4103 ejecuta labores de reconformación (remplateo) en un tramo en mal estado en el sector Alto del Trigo.** **Zona: alto del trigo corralejas** **Longitud: 100 mts.** **Lluvias: 2 horas aprox** **Combustible:** **Novedades: motoniveladora 7125 se necesita piñón de ataque, pulidor para la tornamesa** **Km inicio-fin** **MOTONIVELADORA 7125: 8013,0** **RETROEXCAVADORA 4103: 6887,6 – 6891,5**

	VIBRO COMPACTADOR 2548: 3469,6 **VOLQUETA ODT 392: 93843** **VOLQUETA ALQUILADA OAH 997: 012,6 – 14,6** **HORA INICIAL – FINAL** **VOLQUETA ODT 392: 7127** **MOTONIVELADORA 7125** *** cambio de filtros de aire acondicionado** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159** **se requiere aceite de motor se encuentra bajo de nivel** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103** *** AIRE ACONDICIONADO** *** SE SOLICITAN 48 ARANDELAS DE AJUSTE** *** RIN DELANTERO MAL ESTADO** ***TABLERO DE INSTRUMENTOS SE SOLICITA ESCANEAR** **MOTONIVELADORA CAT0120KVJAP07125 OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103 OPERATIVA.** **VIBRO COMPACTADOR 2742548 OPERATIVO.** **VOLQUETA ODT 392 OPERATIVA.** **VOLQUETA ALQUILADA OAH 997 OPERATIVA.**
26/04/2026	**Actividades: Se dispone de la volqueta en condición de alquiler, identificada con placas OAH 997, para la ejecución del transporte de un (1) viaje de material de tipo orgánico.** **Zona: alto del trigo corralejas** **Longitud: 50 mts.** **Lluvias: 2 horas aprox** **Combustible:**

	Novedades: motoniveladora 7125 se necesita piñón de ataque, pulidor para la tornamesa **Km inicio-fin** **MOTONIVELADORA 7125: 8013,0** **RETROEXCAVADORA 4103: 6891,5** **VIBRO COMPACTADOR 2548: 3469,6** **VOLQUETA ODT 392: 93843** **VOLQUETA ALQUILADA OAH 997: 16,6 – 17,7** **HORA INICIAL – FINAL** **VOLQUETA ODT 392: 7127** **MOTONIVELADORA 7125** *** cambio de filtros de aire acondicionado** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159** **se requiere aceite de motor se encuentra bajo de nivel** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103** *** AIRE ACONDICIONADO** *** SE SOLICITAN 48 ARANDELAS DE AJUSTE** *** RIN DELANTERO MAL ESTADO** ***TABLERO DE INSTRUMENTOS SE SOLICITA ESCANEAR** **MOTONIVELADORA CAT0120KVJAP07125 OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103 OPERATIVA.** **VIBRO COMPACTADOR 2742548 OPERATIVO.** **VOLQUETA ODT 392 OPERATIVA.** **VOLQUETA ALQUILADA OAH 997 OPERATIVA.**
27/04/2026	**Actividades: La motoniveladora No. 7125 el operador ayuda para el descargue de las volquetas y a parar el tráfico en la vía, La retroexcavadora No. 4103 fue utilizada en labores de replanteo y distribución del material. Por su parte, el vibro compactador No. 2548 ejecutó la compactación en el tramo crítico correspondiente al sector Alto del Trigo, específicamente en un segmento de 10**

	metros de longitud sobre la vía. En cuanto al transporte de material, la volqueta ODT 392 realizó dos (2) viajes de material tipo recebo desde la Cantera Garita hacia el punto crítico en Alto del Trigo. Adicionalmente, la volqueta alquilada OAH 997 efectuó cinco (5) viajes del mismo material y origen, con destino al mencionado tramo para su respectiva conformación y mejoramiento., se lleva acpm en canecas para motoniveladora de 59,816 y 18 gal, retroexcavadora de 60,004 gal y para vibro compactador 55 gal **Zona: alto del trigo corralejas** **Longitud: 200 mts.** **Lluvias: 2 horas aprox** **Combustible: se suministra acpm a volqueta ODT 392 de 28 gal horómetro de tanqueo 93882 y hora de volqueta 7129 igualmente se suministra acpm a retroexcavadora de 30 gal horómetro de tanqueo 6892,9** **Novedades: motoniveladora 7125 se necesita piñón de ataque, pulidor para la tornamesa, se lleva acpm en canecas para motoniveladora de 59,816 y 18 gal, retroexcavadora de 60,004 gal y para vibro compactador 55 gal** **Km inicio-fin** **MOTONIVELADORA 7125: 8013,0 – 8013,0** **RETROEXCAVADORA 4103: 6891,5 – 6896,6** **VIBRO COMPACTADOR 2548: 3469,6 – 3472,0** **VOLQUETA ODT 392: 93843 - 93928** **VOLQUETA ALQUILADA OAH 997: 19,0 – 27,0** **HORA INICIAL – FINAL** **VOLQUETA ODT 392: 7127 - 7134** **MOTONIVELADORA 7125** *** cambio de filtros de aire acondicionado** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159** **se requiere aceite de motor se encuentra bajo de nivel** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103** *** AIRE ACONDICIONADO**

	*** SE SOLICITAN 48 ARANDELAS DE AJUSTE** *** RIN DELANTERO MAL ESTADO** ***TABLERO DE INSTRUMENTOS SE SOLICITA ESCANEAR** **MOTONIVELADORA CAT0120KVJAP07125 OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103 OPERATIVA.** **VIBRO COMPACTADOR 2742548 OPERATIVO.** **VOLQUETA ODT 392 OPERATIVA.** **VOLQUETA ALQUILADA OAH 997 OPERATIVA.**
28/04/2026	**Actividades: La motoniveladora No. 7125 ejecutó la extensión y conformación de material pétreo en el tramo crítico, con un total de ocho (8) viajes descargados. La retroexcavadora No. 4103 se empleó en labores de replanteo y distribución del material en el área intervenida. El vibro compactador No. 2548 realizó la compactación en el sector Alto del Trigo, cubriendo un tramo de 20 metros lineales de vía, conforme a las especificaciones técnicas. En cuanto al suministro de material, la volqueta ODT 392 efectuó cuatro (4) viajes de material tipo recebo desde la Cantera Garita hasta el punto crítico en Alto del Trigo. De igual manera, la volqueta alquilada OAH 997 realizó cuatro (4) viajes adicionales del mismo material y procedencia, destinados a la conformación y mejoramiento del tramo intervenido.** **Zona: alto del trigo corralejas** **Longitud: 300 mts.** **Lluvias: 2 horas aprox** **Combustible:** **Novedades: motoniveladora 7125 se necesita piñón de ataque, pulidor para la tornamesa.** **Volqueta ODT 392 se ajusta espárragos.** **Km inicio-fin** **MOTONIVELADORA 7125: 8013,0 – 8018,9** **RETROEXCAVADORA 4103: 6896,6 – 6901,5** **VIBRO COMPACTADOR 2548: 3472,0 -3476,9**

	VOLQUETA ODT 392: 93928 - 94015 **VOLQUETA ALQUILADA OAH 997: 27,0 – 34,0** **HORA INICIAL – FINAL** **VOLQUETA ODT 392: 7134 - 7142** **MOTONIVELADORA 7125** *** cambio de filtros de aire acondicionado** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159** **se requiere aceite de motor se encuentra bajo de nivel** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103** *** AIRE ACONDICIONADO** *** SE SOLICITAN 48 ARANDELAS DE AJUSTE** *** RIN DELANTERO MAL ESTADO** ***TABLERO DE INSTRUMENTOS SE SOLICITA ESCANEAR** **MOTONIVELADORA CAT0120KVJAP07125 OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103 OPERATIVA.** **VIBRO COMPACTADOR 2742548OPERATIVO.** **VOLQUETA ODT 392 OPERATIVA.** **VOLQUETA ALQUILADA OAH 997 OPERATIVA.**
29/04/2026	**Actividades: La motoniveladora No. 7125 se extiende material de piedra en paso critico 9 viajes, La retroexcavadora No. 4103 replanteo de material. El vibro compactador No. 2548 compactar paso crítico alto del trigo 100 metros de la vía, La Volqueta ODT 392 realiza el transporte de material tipo de recebo (4) viajes de Cantera garita Para paso alto del trigo paso crítico, la volqueta alquilada OAH 997 realiza el transporte de material tipo de recebo (4) viajes de Cantera garita Para paso alto del trigo paso crítico** **Zona: alto del trigo corralejas** **Longitud: 400 mts.** **Lluvias: 0 horas aprox** **Combustible:**

	Novedades: motoniveladora 7125 se necesita piñón de ataque, pulidor para la tornamesa. **Km inicio-fin** **MOTONIVELADORA 7125: 8018,9 – 8025,8** **RETROEXCAVADORA 4103: 6901,5 – 6908,0** **VIBRO COMPACTADOR 2548: 3476,9 – 3483,8** **VOLQUETA ODT 392: 94015 - 94093** **VOLQUETA ALQUILADA OAH 997: 34,0 - 42** **HORA INICIAL – FINAL** **VOLQUETA ODT 392: 7142 - 7150** **MOTONIVELADORA 7125** *** cambio de filtros de aire acondicionado** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159** **se requiere aceite de motor se encuentra bajo de nivel** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103** *** AIRE ACONDICIONADO** *** SE SOLICITAN 48 ARANDELAS DE AJUSTE** *** RIN DELANTERO MAL ESTADO** ***TABLERO DE INSTRUMENTOS SE SOLICITA ESCANEAR** **MOTONIVELADORA CAT0120KVJAP07125 OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103 OPERATIVA.** **VIBRO COMPACTADOR 2742548 OPERATIVO.** **VOLQUETA ODT 392 OPERATIVA.** **VOLQUETA ALQUILADA OAH 997 OPERATIVA.**

30/04/2026	**Actividades: La motoniveladora No. 7125 el operador ayuda con las volquetas a detener el tráfico mientras cargaban las volquetas, El vibro compactador No. 2548 compactar paso crítico alto del trigo 100 metros de la vía, La Volqueta ODT 392 realiza el transporte de material tipo de recebo (1) viajes de Cantera garita Para paso alto del trigo paso crítico, la volqueta alquilada OAH 997 realiza el transporte de material tipo de recebo (1) viajes de Cantera garita Para paso alto del trigo paso crítico y se cargó material orgánico (2) Viajes.** **Zona: alto del trigo corralejas** **Longitud: 100 mts.** **Lluvias: 0 horas aprox** **Combustible: Se suministra acpm a retroexcavadora de 30 gal horómetro de tanqueo 6910,7** **Novedades: Motoniveladora 7125 se necesita piñón de ataque, pulidor para la tornamesa.** **Km inicio-fin** **MOTONIVELADORA 7125: 8025,8 – 8025,9** **RETROEXCAVADORA 4103: 6908,0 - 6911,0** **VIBRO COMPACTADOR 2548: 3483,8 – 3484,3** **VOLQUETA ODT 392: 94093 - 94125** **VOLQUETA ALQUILADA OAH 997: 42 - 44** **HORA INICIAL – FINAL** **VOLQUETA ODT 392: 7150 - 7154** **MOTONIVELADORA 7125** *** cambio de filtros de aire acondicionado** **RETROEXCAVADORA CAT0416EEMFG08159** **se requiere aceite de motor se encuentra bajo de nivel** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103** *** AIRE ACONDICIONADO** *** SE SOLICITAN 48 ARANDELAS DE AJUSTE**

	*** RIN DELANTERO MAL ESTADO** ***TABLERO DE INSTRUMENTOS SE SOLICITA ESCANEAR** **MOTONIVELADORA CAT0120KVJAP07125 OPERATIVA.** **RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103 OPERATIVA.** **VIBRO COMPACTADOR 2742548 OPERATIVO.** **VOLQUETA ODT 392 OPERATIVA.** **VOLQUETA ALQUILADA OAH 997 OPERATIVA.**

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES			
FECHA	**MATERIAL**	**N° DE VIAJES**	**DESCRIPCIÓN**
23/04/2026	**RECEBO**	**10**	
24/04/2026	**RECEBO**	**10**	
25/04/2026	**RECEBO**	**12**	
26/04/2026	**RECEBO**	**1**	
27/04/2026	**RECEBO**	**5**	
28/04/2026	**RECEBO**	**8**	
29/04/2026	**RECEBO**	**20**	
30/04/2026	**RECEBO**	**15**	
TOTAL		**81**	

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

6. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA				
FECHA	**LONGITUD (KM)**	**AVANCE (KM)**	**REPETICIÓN (KM)**	**DESCRIPCIÓN**
4/04/2026	**0,20**	**0,20**		Estado del clima lluvia.
5/04/2026	DOMINGO			
6/04/2026	**1,50**	**1,70**		Estado del clima soleado.
7/04/2026	**0,10**	**1,80**		Estado del clima soleado.
8/04/2026	**0,10**	**1,90**		Estado del clima soleado.
9/04/2026	**0,30**	**2,20**		Estado del clima soleado.
10/04/2026	**1,00**	**3,20**		Estado del clima soleado.
11/04/2026	**0,10**	**3,30**		Estado del clima soleado.
12/04/2026	DOMINGO			
13/04/2026	**2,00**	**5,30**		Estado del clima soleado.
14/04/2026	**1,50**	**6,80**		Estado del clima lluvia.
15/04/2026	**0,00**	**6,80**		Estado del clima lluvia.
16/04/2026	**0,01**	**6,81**		Estado del clima lluvia.
17/04/2026	**0,40**	**7,21**		Estado del clima soleado
18/04/2026	**0,50**	**7,71**		Estado del clima soleado
19/04/2026	DOMINGO			
20/04/2026	**0,20**	**7,91**		Estado del clima soleado
21/04/2026	**0,10**	**8,01**		Estado del clima lluvia.
22/04/2026	**0,00**	**8,01**		Estado del clima lluvia.
23/04/2026	**0,20**	**8,21**		Estado del clima lluvia.
24/04/2026	**0,20**	**8,41**		Estado del clima lluvia.
25/04/2026	**0,10**	**8,51**		Estado del clima lluvia.
26/04/2026	**0,05**	**8,56**		Estado del clima lluvia.
27/04/2026	**0,20**	**8,76**		Estado del clima lluvia.
28/04/2026	**0,30**	**9,06**		Estado del clima lluvia.
29/04/2026	**0,40**	**9,46**		Estado del clima lluvia.
30/04/2026	**0,10**	**9,56**		Estado del clima soleado
TOTAL		**9,56**		

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	HORAS DE LLUVIA	HORAS DE INOPERATIVIDAD	HORAS EFECTIVAS	DESCRIPCIÓN
4/04/2026	2	0	5	Estado del clima lluvia.
5/04/2026	DOMINGO			
6/04/2026	0	0	8	Estado del clima soleado.
7/04/2026	0	0	8	Estado del clima soleado.
8/04/2026	0	0	8	Estado del clima soleado.
9/04/2026	0	0	8	Estado del clima soleado.
10/04/2026	0	0	8	Estado del clima soleado.
11/04/2026	0	0	4	Estado del clima soleado.
12/04/2026	DOMINGO			
13/04/2026	0	0	8	Estado del clima soleado.
14/04/2026	3	0	5	Estado del clima lluvia.
15/04/2026	8	0	0	Estado del clima lluvia.
16/04/2026	5	0	3	Estado del clima lluvia.
17/04/2026	0	0	8	Estado del clima soleado
18/04/2026	0	0	4	Estado del clima soleado
19/04/2026	DOMINGO			
20/04/2026	0	0	8	Estado del clima soleado
21/04/2026	3	0	5	Estado del clima lluvia.
22/04/2026	8	0	0	Estado del clima lluvia.
23/04/2026	4	0	4	Estado del clima lluvia.
24/04/2026	2	0	2	Estado del clima lluvia.
25/04/2026	2	0	2	Estado del clima lluvia.
26/04/2026	2	0	2	Estado del clima lluvia.
27/04/2026	3	0	5	Estado del clima lluvia.
28/04/2026	4	0	4	Estado del clima lluvia.
29/04/2026	3	0	5	Estado del clima lluvia.
30/04/2026	0	0	8	Estado del clima soleado
TOTAL	**51**	**0**	**122**	

8. MOVILIZACIONES

Se realizaron movilizaciones.







	
Se realizaron movilización de RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0416EEMFG08159 Del Municipio de San cayetano al municipio de Anolaima – (vía los Alpes - alto del trigo – La Sierra)	**RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SREJC754103 y VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU – 2742548 De Soacha a Anolaima (vía los Alpes - alto del trigo – La Sierra)**

9. MANTENIMIENTOS

MANTENIMIENTOS			
FECHA	**EQUIPO**	**SERIAL**	**DESCRIPCIÓN**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

Tabla 1 control de horas maquinas en alquiler.

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	ABRIL						
MUNICIPIO:	ANOLAIMA			PROVINCIA		TEQUENDAMA	
MAQUINA:	VOLQUETA NISSAN					SERIE	OAH997
FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	DIAS TRABAJADOS	OBSERVACIÓN
23/04/2026			0,1	0,77	0,67	1	
24/04/2026			8,4	12,6	4,2	1	
25/04/2026			12,6	14,6	2	1	
26/04/2026			16,6	17,7	1,1	1	
27/04/2026			19	27	8	1	
28/04/2026			27	34	7	1	
29/04/2026			34	42	8	1	
30/04/2026			42	44	2	1	Quedo la foto borrosa
SUBTOTAL MES					32,97	8	
TOTAL DIAS TRABAJADOS DEL MES					8		
Firma	JEISSON MARTÍNEZ		Firma				
Nombre:	JEISSON ABEL MARTINEZ MENDEZ		Nombre:		JHOHAN DAMIAN CESPEDES		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			INSPECTOR ICCU				

FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL
23/04/2026		
24/04/2026		
25/04/2026		

26/04/2026		
27/04/2026		
28/04/2026		

29/04/2026		
30/04/2026		
TOTAL, JORNADA DIAS	**8**	

Tabla 2 control de Maquinaria propia.

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS												
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".											
PERIODO:	ABRIL											
MUNICIPIO:	ANOLAIMA						PROVINCIA:	CENTRO MAGDALENA				
MAQUINA:	MOTONIVELADORA CATERPILLAR						SERIE	CAT0120KVJAP07125				
CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
4/04/2026	7963,3	7969	5,7	44,092	7963,4		10088					CAJA MENOR EDS SIERRA
5/04/2026	7969	7969	0									
6/04/2026	7969	7975,5	6,5									
7/04/2026	7975,5	7976,5	1									
8/04/2026	7976,5	7977,2	0,7									
9/04/2026	7977,2	7981,8	4,6									
10/04/2026	7981,8	7987,9	6,1									
11/04/2026	7987,9	7990,3	2,4	30	7987,9	1,80	3					EDS VIANI
12/04/2026	7990,3	7990,3	0									
13/04/2026	7990,3	7997,6	7,3									
14/04/2026	7997,6	8002,8	5,2									
15/04/2026	8002,8	8002,8	0									
16/04/2026	8002,8	8003	0,2									
17/04/2026	8003	8003	0									
18/04/2026	8003	8005,5	2,5	60	8003	1,99	9					EDS QUIPILE
19/04/2026	8005,5	8005,5	0									
20/04/2026	8005,5	8005,6	0,1									
21/04/2026	8005,6	8008,7	3,1									
22/04/2026	8008,7	8008,8	0,1									
23/04/2026	8008,8	8011	2,2									
24/04/2026	8011	8013	2									
25/04/2026	8013	8013	0									
26/04/2026	8013	8013	0									
27/04/2026	8013	8013	0									
28/04/2026	8013	8018,9	5,9									
29/04/2026	8018,9	8025,8	6,9									
30/04/2026	8025,8	8025,9	0,1									
TOTAL MES			62,60			1,89						
Firma	Alex Aguilar Bustos			Firma	JEISSON MARTINEZ			Firma	Damian Céspedes			
Nombre:	ALEX AGUILAR BUSTOS			Nombre:	JEISSON ABEL MARTINEZ MENDEZ			Nombre:	JHOHAN DAMIAN CESPEDES			
OPERADOR				INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025				INSPECTOR ICCU				

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS	ICCU

OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".		
PERIODO:	ABRIL		
MUNICIPIO:	ANOLAIMA	PROVINCIA:	TEQUENDAMA
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA CASE	SERIE	JJGN58SREJC754103

CONTROL HORARIO				ACPM				
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	OBSERVACIÓN
7/04/2026	6830,9	6832,7	1,8					
8/04/2026	6832,7	6832,9	0,2	29	6832,9		2	EDS QUIPILE
9/04/2026	6832,9	6836,4	3,5					
10/04/2026	6836,4	6841	4,6					
11/04/2026	6841	6845,5	4,5					
12/04/2026	6845,5	6845,5	0					
13/04/2026	6845,5	6851,1	5,6					
14/04/2026	6851,1	6856,6	5,5	30	6851,6	1,55	6	EDS VIANI
15/04/2026	6856,6	6856,6	0					
16/04/2026	6856,6	6856,6	0					
17/04/2026	6856,6	6861,1	4,5					
18/04/2026	6861,1	6863,5	2,4					
19/04/2026	6863,5	6863,5	0					
20/04/2026	6863,5	6871,4	7,9					
21/04/2026	6871,4	6873,4	2					
22/04/2026	6873,4	6873,5	0,1					
23/04/2026	6873,5	6882,3	8,8	30	6873,5	1,37	11	EDS QUIPILE
24/04/2026	6882,3	6887,6	5,3					
25/04/2026	6887,6	6887,6	0					
26/04/2026	6887,6	6891,5	3,9					
27/04/2026	6891,5	6896,6	5,1	30,004	6892,9	1,55	6741	EDS ALBAN O SIERRA
28/04/2026	6896,6	6901,5	4,9					
29/04/2026	6901,5	6908	6,5					
30/04/2026	6908	6911	3	30	6910,7	1,69	6741	EDS ALBAN O SIERRA
TOTAL MES			80,10	149,00		1,54		

Firma	Manuel Nieto	Firma	JEISSON MARTÍNEZ	Firma	Damian Céspedes
Nombre:	MANUEL NIETO	Nombre:	JEISSSON ABEL MARTINEZ	Nombre:	JHOHAN DAMIAN CESPEDES
OPERADOR		INSPECTOR UT PARQUE 2025		INSPECTOR ICCU	

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS	ICCU

OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".		
PERIODO:	ABRIL		
MUNICIPIO:	ANOLAIMA	PROVINCIA:	TEQUENDAMA
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	SERIE	CAT0416EEMFG08159

CONTROL HORARIO				ACPM				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
6/04/2026	10088,6	10091,1	2,5					
7/04/2026	10091,1	10091,5	0,4					
8/04/2026	10091,5	10091,7	0,2	29	10091,7		1	EDS QUIPILE
9/04/2026	10091,7	10093,8	2,1					
10/04/2026	10093,8	10098,2	4,4					
11/04/2026	10098,2	10104,9	6,7					
12/04/2026	10104,9	10104,9	0					
13/04/2026	10104,9	10110,2	5,3					
14/04/2026	10110,2	10115,4	5,2	30	10110,2	1,57	5	EDS VIANI
15/04/2026	10115,4	10115,4	0					
16/04/2026	10115,4	10116,4	1					
17/04/2026	10116,4	10120,8	4,4					
18/04/2026	10120,8	10124,2	3,4					
19/04/2026	10124,2	10124,2	0					
20/04/2026	10124,2	10130	5,8	30	10130	1,52	10	EDS QUIPILE
TOTAL MES			41,40	89,00		3,08		

Firma		Firma	 JEISSON MARTÍNEZ	Firma	 Damian Céspedes
Nombre:	PEDRO JOSE BELTRAN PARDO	Nombre:	JEISSON ABEL MARTINEZ	Nombre:	JHOHAN DAMIAN CESPEDES
OPERADOR		INSPECTOR UT PARQUE 2025		INSPECTOR ICCU	

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS	ICCU

OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".		
PERIODO:	ABRIL		
MUNICIPIO:	ANOLAIMA	PROVINCIA:	TEQUENDAMA
MAQUINA:	VIBRO COMPACTADOR AMMAN	SERIE	2742548

CONTROL HORARIO				ACPM				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
7/04/2026	3435,9	3435,9	0					
8/04/2026	3435,9	3436,2	0,3					
9/04/2026	3436,2	3438,5	2,3					
10/04/2026	3438,5	3444,6	6,1					
11/04/2026	3444,6	3444,7	0,1	30	3444,7		4	EDS VIANI
12/04/2026	3444,7	3444,7	0					
13/04/2026	3444,7	3448,6	3,9					
14/04/2026	3448,6	3453,2	4,6					
15/04/2026	3453,2	3453,2	0					
16/04/2026	3453,2	3453,9	0,7					
17/04/2026	3453,9	3455	1,1					
18/04/2026	3455	3456,9	1,9					
19/04/2026	3456,9	3456,9	0					
20/04/2026	3456,9	3462,4	5,5					
21/04/2026	3462,4	3465,7	3,3					
22/04/2026	3465,7	3465,8	0,1					
23/04/2026	3465,8	3468,1	2,3					
24/04/2026	3468,1	3469,6	1,5	40	3468,1	1,28	12	EDS QUIPILE
25/04/2026	3469,6	3469,6	0					
26/04/2026	3469,6	3469,6	0					
27/04/2026	3469,6	3472	2,4					
28/04/2026	3472	3476,9	4,9					
29/04/2026	3476,9	3483,8	6,9					
30/04/2026	3483,8	3484,3	0,5					
TOTAL MES			48,40	70,00		1,28		

Firma		Firma	JEISSON MARTÍNEZ	Firma	Damian Céspedes
Nombre:	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	Nombre:	JEISSON MARTINEZ MENDEZ	Nombre:	JHOHAN DAMIAN CESPEDES
OPERADOR		INSPECTOR UT PARQUE 2025		INSPECTOR ICCU	

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS	ICCU

OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".		
PERIODO:	ABRIL		
MUNICIPIO:	ANOLAIMA	PROVINCIA:	TEQUENDAMA
MAQUINA:	VOLQUETA INTERNATIONAL	SERIE	ODT 392

CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	OBSERVACIÓN
21/04/2026	7120	7121	1									
22/04/2026	7121	7121	0									
23/04/2026	7121	7122	1									
24/04/2026	7122	7127	5									
25/04/2026	7127	7127	0									
26/04/2026	7127	7127	0									
27/04/2026	7127	7134	7	28	93882		6745					EDS ALBAN O SIERRA
28/04/2026	7134	7142	8									
29/04/2026	7142	7150	8									
30/04/2026	7150	7154	4									
TOTAL MES			34,00	28,00		0,00		0,00		0,00		

Firma		Firma	JEISSON MARTINEZ	Firma	Damian Céspedes
Nombre:	FEDELO GUTIERREZ	Nombre:	JEISSON ABEL MARTINEZ MENDEZ	Nombre:	JHOHAN DAMIAN CESPEDES
OPERADOR		INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025		INSPECTOR ICCU	

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS	
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".	
PERIODO:	ABRIL	
MUNICIPIO:	ANOLAIMA	PROVINCIA: TEQUENDAMA
MAQUINA:	VOLQUETA INTERNATIONAL	SERIE GZM 757

CONTROL HORARIO				ACPM (GLS)				UREA				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
17/04/2026	3926	3936	10	33	52630		8					EDS QUIPILE
18/04/2026	3936	3938	2									
19/04/2026	3938	3938	0									
20/04/2026	3938	3945	7									
TOTAL MES			19,00	33,00		0,00		0,00		0,00		

Firma	Omar Espinel Rojas.	Firma	JEISSON MARTÍNEZ	Firma	Damian Céspedes
Nombre:	OMAR ESPINEL	Nombre:	JISSON ABEL MARTINEZ MENDEZ	Nombre:	JHOHAN DAMIAN CESPEDES
OPERADOR		INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025		INSPECTOR ICCU	

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS											
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".											
PERIODO:	ABRIL											
MUNICIPIO:	ANOLAIMA						PROVINCIA:	TEQUENDAMA				
MAQUINA:	VOLQUETA INTERNATIONAL						SERIE	GZM 60				
CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
17/04/2026	4498	4508	10	21	53403		7					EDS QUIPILE
18/04/2026	4508	4510	2									
19/04/2026	4510	4510	0									
20/04/2026	4510	4521	11									
TOTAL MES			23,00	21,00		0,00		0,00		0,00		
Firma	Yeison Vanoy O.			Firma	JEISSON MARTÍNEZ			Firma	Damian Céspedes			
Nombre:	YEISON VANOY O.			Nombre:	JEISSON ABEL MARTINEZ MENDEZ			Nombre:	JHOHAN DAMIAN CESPEDES			
OPERADOR				INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025				INSPECTOR ICCU				

11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido entre el 4 y el 30 de abril de 2026, se ejecutaron de manera continua actividades de atención, rehabilitación y mantenimiento vial en el sector Alto del Trigo – Corralejas, enfocadas principalmente en la recuperación de la transitabilidad y la estabilización de puntos críticos afectados por fallas de banca, escorrentía superficial y condiciones geotécnicas adversas.

Las labores incluyeron conformación de la calzada, limpieza y adecuación de cunetas, reconformación de la subrasante, instalación de material granular (recebo y piedra), compactación mecánica y manejo de aguas superficiales, logrando avances progresivos en la mejora de la capacidad portante y las condiciones de servicio de la vía. Asimismo, se evidenció una adecuada articulación entre los diferentes equipos (motoniveladora, retroexcavadoras, vibro compactador y volquetas), permitiendo optimizar el rendimiento operativo en los frentes de trabajo un avance de **9,56 km**.

No obstante, el desarrollo de las actividades se vio afectado en varios momentos por condiciones climáticas adversas, especialmente lluvias, que limitaron la operación de maquinaria y generaron retrasos en la ejecución. Adicionalmente, se identificaron novedades mecánicas recurrentes en algunos equipos, como requerimientos de mantenimiento y reposición de piezas, que deben ser atendidas oportunamente para evitar afectaciones en la productividad.

En términos generales, se logró avanzar significativamente en la intervención de tramos críticos y en la habilitación de la vía, garantizando condiciones básicas de movilidad. Sin embargo, se recomienda continuar con las labores de mantenimiento, fortalecer la gestión de drenaje y asegurar el adecuado estado mecánico de los equipos para consolidar la estabilidad y durabilidad de las intervenciones realizadas.

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Cargue de material, Conformación, ampliación y limpieza de vía.	Conformación, ampliación y limpieza de vía.
	
Conformación, ampliación y limpieza de vía.	Recuperación, Conformación, ampliación y limpieza de vía.

	
Conformación, ampliación y limpieza de vía.	Conformación, ampliación y limpieza de vía.
	
Zanja.	Conformación, ampliación y limpieza de vía.

	
Conformación, ampliación y limpieza de vía.	Sello y conformación.
	
Conformación, ampliación y limpieza de vía.	Cargue de material orgánico.

	
Cargue de material.	Descargue de material.
	
Conformación, ampliación y limpieza de vía.	Conformación, ampliación y limpieza de vía.

	
Cargue de material orgánico.	Cargue de material.
	
Conformación, ampliación y limpieza de vía.	Conformación, ampliación y limpieza de vía.

	
Limpieza de descoles y encoles.	Conformación, ampliación y limpieza de vía.
	
Mecánico.	Conformación, ampliación y limpieza de vía.

	
Sello y compactación de vía.	Cargue de material.
	
Cargue de material orgánico.	Conformación, ampliación y limpieza de vía.

	
Cargue de material orgánico.	Conformación, ampliación y limpieza de vía
	
Conformación, ampliación y limpieza de vía	Conformación, ampliación y limpieza de vía

JHOHAN DAMIAN CESPEDES
INSPECTOR ICCU

JEISSON ABEL MARTINEZ MENDEZ
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°3
PERIODO: ABRIL DEL 2026

PROVINCIA: TEQUENDAMA
MUNICIPIO: ANOLAIMA
EMERGENCIA

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA TEQUENDAMA
MUNICIPIO DE ANOLAIMA

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Tequendama:

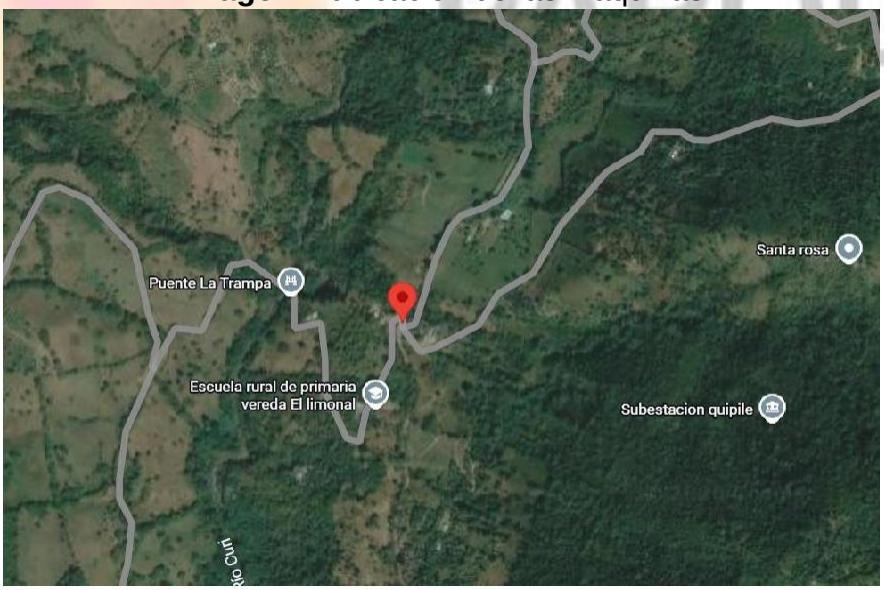
Facatativa:

1. ORUGA LBX21016NLHEX1239

Ubicación:

Anolaima – Vereda Liminal - coordenadas 4°44'51.6"N 74°30'35.0"W

Imagen 1 ubicación de las maquinas



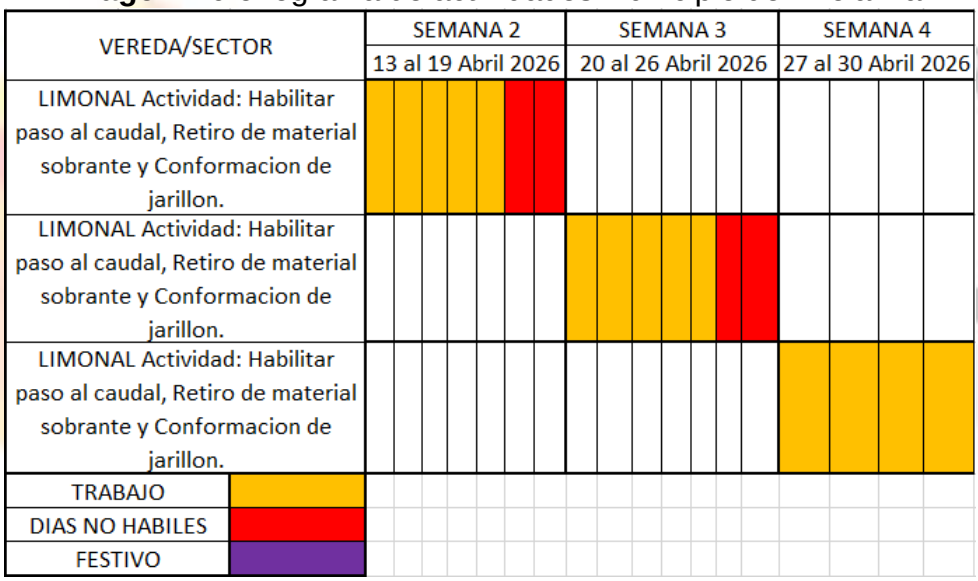
Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	EMILIO STEVENS MORENO
INSPECTOR DE OBRA ICCU	WILLIAM LEONARDO GUERRA
OPERADOR DE ORUGA LBX21016NLHEX1239	MIGUEL ANGEL ROJAS LOPEZ

3. PLAN DE TRABAJO

Imagen 2 cronograma de actividades municipio de Anolaima



Fuente: Alcaldía de Anolaima

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

Se desarrollan actividades de rehabilitación al paso del caudal del rio Curí, realizando el retiro de material sobrante por derrumbe en el tramo de la vereda el Limonal. Dicho trabajo incorpora el apoyo de una Retroexcavadora de oruga. Se registra un avance del 100% de las actividades programadas.

FECHA	ACTIVIDADES
13/04/2026	Municipio de *Anolaima*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: Limonal. 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: En horas de la mañana se traslada el equipo del casco urbano a la vereda Limonal. Se inicia con la extracción de material vegetal, habilitando el paso al caudal mitigando el riesgo en la zona. 🔻 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX21016NLHEX1239 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MIGUEL ROJAS ⏱ H. inicial – H. final: 7305.8 – 7315.1 ⚠ Novedades mecánicas: Requiere refuerzo y trabajo de soldadura en el balde por fisuras. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
14/04/2026	Municipio de *Anolaima*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: Limonal. 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se continúa con la extracción de material sobrante (derrumbe), habilitando el paso al caudal mitigando el riesgo en la zona. 🔻 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX21016NLHEX1239 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MIGUEL ROJAS ⏱ H. inicial – H. final: 7315.1 – 7320.9 ⛽ ACPM (gl): 60 | Km tanqueo: 7315.2 ⚠ Novedades mecánicas: Requiere refuerzo y trabajo de soldadura en el balde por fisuras. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
15/04/2026	Municipio de *Anolaima*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: Limonal. 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Se realiza extracción de material sobrante (derrumbe), habilitando el paso al caudal mitigando el riesgo en la zona. En horas de mañana sin actividades por fuertes lluvias en la zona de

	trabajo. 🔻 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX21016NLHEX1239 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MIGUEL ROJAS ⏱️ H. inicial – H. final: 7320.9 – 7326.1 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere refuerzo y trabajo de soldadura en el balde por fisuras. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
16/04/2026	Municipio de *Anolaima*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: Limonal. 🛠️ Actividad: Se realiza extracción de material sobrante, habilitando el paso al caudal mitigando el riesgo en la zona. 🔻 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX21016NLHEX1239 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MIGUEL ROJAS ⏱️ H. inicial – H. final: 7326.1 – 7333 ⛽ ACPM (gl): 60 | Km tanqueo: 7329.5 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere refuerzo y trabajo de soldadura en el balde por fisuras. 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
17/04/2026	Municipio de *Anolaima*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: Limonal. 🛠️ Actividad: Se continúa con la extracción de material sobrante, habilitando el paso al caudal mitigando el riesgo en la zona. 🔻 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX21016NLHEX1239 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MIGUEL ROJAS ⏱️ H. inicial – H. final: 7333 – 7340.5 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere refuerzo y trabajo de soldadura en el balde por fisuras. 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
18/04/2026	**SABADO SIN ACTIVIDADES PROGRAMADAS**

19/04/2026	DOMINGO
20/04/2026	Municipio de *Anolaima*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: Limonal. 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Se continúa con la extracción de material sobrante, habilitando el paso al caudal mitigando el riesgo en la zona. 🔻 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX21016NLHEX1239 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MIGUEL ROJAS ⏱ H. inicial – H. final: 7340.5 – 7348.4 ⛽ ACPM (gl): 60 | Km tanqueo: 7341.5 ⚠ Novedades mecánicas: Requiere refuerzo y trabajo de soldadura en el balde por fisuras. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
21/04/2026	Municipio de *Anolaima*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: Limonal. 🛠 Actividad: Se continúa con la extracción de material sobrante, habilitando el paso al caudal mitigando el riesgo en la zona. 🔻 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX21016NLHEX1239 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MIGUEL ROJAS ⏱ H. inicial – H. final: 7340.5 – 7348.4 ⚠ Novedades mecánicas: Requiere refuerzo y trabajo de soldadura en el balde por fisuras. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA
22/04/2026	Municipio de *Anolaima*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: Limonal. 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se continúa con la extracción de material sobrante, habilitando el paso al caudal, mitigando el riesgo en la zona. En horas de la tarde equipo queda inoperativo por daño en manguera del hidráulico. 🔻 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX21016NLHEX1239 (OPERATIVA)*

	🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MIGUEL ROJAS ⏱️ H. inicial – H. final: 7356.8 – 7364.3 ⛽ ACPM (gl): 90 | Km tanqueo: 7360.2 ⚠ Novedades mecánicas: Requiere refuerzo y trabajo de soldadura en el balde por fisuras. Presenta perdida de potencia en sistema de inyección. La pluma requiere trabajo de soldadura. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: EQUIPO INOPERATIVO POR DAÑO EN MANGUERA DEL HIDRAULICO.
23/04/2026	Municipio de *Anolaima*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: Limonal. 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Sin actividades por daño en manguera del hidráulico. Se retira manguera y se consigue repuesto en horas de la tarde para ser instalado al siguiente día. 🔻 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX21016NLHEX1239 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MIGUEL ROJAS ⏱️ H. inicial – H. final: 7364.3 – 7364.3 ⚠ Novedades mecánicas: Requiere refuerzo y trabajo de soldadura en el balde por fisuras. Presenta perdida de potencia en sistema de inyección. La pluma requiere trabajo de soldadura. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
24/04/2026	Municipio de *Anolaima*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: Limonal. 🌦️ Condición climática: Lluvias 🛠️ Actividad: En horas de la mañana se realiza cambio de manguera del hidráulico dejando operativo el equipo. Se retoman actividades de extracción de material sobrante, habilitando el paso al caudal. 🔻 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX21016NLHEX1239 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MIGUEL ROJAS ⏱️ H. inicial – H. final: 7364.3 – 7371.5 ⛽ ACPM (gl): 30 | Km tanqueo: 7371.5 ⚠ Novedades mecánicas: Requiere refuerzo y trabajo de soldadura

	en el balde por fisuras. Presenta perdida de potencia en sistema de inyección. La pluma requiere trabajo de soldadura. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
25/04/2026	**SABADO SIN ACTIVIDADES PROGRAMADAS**
26/04/2026	**DOMINGO**
27/04/2026	Municipio de *Anolaima*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: Limonal. 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se culmina extracción de material sobrante, conformación de jarillon y habilitar paso al caudal. 🔻 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX21016NLHEX1239 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MIGUEL ROJAS ⏱ H. inicial – H. final: 7371.5 – 7371.5 ⚠ Novedades mecánicas: Requiere refuerzo y trabajo de soldadura en el balde por fisuras. Presenta perdida de potencia en sistema de inyección. La pluma requiere trabajo de soldadura. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
28/04/2026	Municipio de *Anolaima*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: Limonal. 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se interviene paso crítico en la vía de la vereda limonal. Al culminar se traslada equipo al sector punta de la mesita para cargue en cama baja y descargue en la emergencia Mosquera - La mesa. 🔻 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX21016NLHEX1239 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MIGUEL ROJAS ⏱ H. inicial – H. final: 7377.5 – 7385.8 ⛽ ACPM (gl): 60 | Km tanqueo: 7385.8 ⚠ Novedades mecánicas: Requiere trabajo de soldadura y refuerzo en el balde por fisuras. Presenta perdida de potencia en sistema de inyección. La pluma requiere trabajo de soldadura. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA

5. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**HORAS DE LLUVIA**	**HORAS DE INOPERATIVIDAD**	**HORAS EFECTIVAS**	**DESCRIPCIÓN**
12/04/2026	DOMINGO			
13/04/2026	**0**	**0**	**8**	Soleado
14/04/2026	**0**	**0**	**8**	Soleado
15/04/2026	**2**	**0**	**8**	Soleado
16/04/2026	**0**	**0**	**8**	Soleado
17/04/2026	**0**	**0**	**8**	Soleado
18/04/2026	**SABADO SIN ACTIVIDADES**			
19/04/2026	DOMINGO			
20/04/2026	**1**	**0**	**8**	Soleado
21/04/2026	**0**	**0**	**8**	Soleado
22/04/2026	**0**	**0**	**8**	Lluvias en la zona de trabajo
23/04/2026	**0**	**8**	**0**	Equipo inoperativo por daño en manguera del hidraulico.
24/04/2026	**1**	**0**	**8**	Soleado
25/04/2026	**SABADO SIN ACTIVIDADES**			
26/04/2026	DOMINGO			
27/04/2026	**0**	**0**	**8**	Soleado
28/04/2026	**0**	**0**	**8**	Soleado
TOTAL	**4**	**8**	**88**	

6. MOVILIZACIONES

MOVILIZACIONES FACATATIVA					
FECHA	**EQUIPO**	**SERIAL**	**OPERADOR**	**ORIGEN**	**DESTINO**
12/04/2026	ORUGA	LBX21016NLHEX1239	MIGUEL ROJAS	FACATATIVA	ANOLAIMA
28/04/2026	ORUGA	LBX21016NLHEX1239	MIGUEL ROJAS	ANOLAIMA	MOSQUERA-LA MESA

7. MANTENIMIENTOS

MANTENIMIENTOS			
FECHA	**EQUIPO**	**SERIAL**	**DESCRIPCIÓN**
24/04/2026	ORUGA	LBX21016NLHEX1239	SE REALIZA CAMBIO DE MANGUERA DEL HIDRAULICO.

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

8. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS							ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".							
PERIODO:	ABRIL							
MUNICIPIO:	ANOLAIMA			PROVINCIA:	TEQUENDAMA			
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA ORUGA LINK BELT			SERIE	LBX21016NLHEX1239			
CONTROL HORARIO				ACPM				
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	OBSERVACIÓN
1/04/2026	-------	-------	0,0	-------	-------	-------	-------	-------
2/04/2026	-------	-------	0,0	-------	-------	-------	-------	-------
3/04/2026	-------	-------	0,0	-------	-------	-------	-------	-------
4/04/2026	-------	-------	0,0	-------	-------	-------	-------	-------
5/04/2026	-------	-------	0,0	-------	-------	-------	-------	-------
6/04/2026	-------	-------	0,0	-------	-------	-------	-------	-------
7/04/2026	-------	-------	0,0	-------	-------	-------	-------	-------
8/04/2026	-------	-------	0,0	-------	-------	-------	-------	-------
9/04/2026	-------	-------	0,0	-------	-------	-------	-------	-------
10/04/2026	-------	-------	0,0	-------	-------	-------	-------	-------
11/04/2026	-------	-------	0,0	-------	-------	-------	-------	-------
12/04/2026	-------	-------	0,0	-------	-------	-------	-------	-------
13/04/2026	7305,8	7315,1	9,3	-------	-------	-------	-------	INICIO DE ACTIVIDADES
14/04/2026	7315,1	7320,9	5,8	60,000	7315,2	-------	No. 8941	SOLEADO
15/04/2026	7320,9	7326,1	5,2	-------	-------	-------	-------	LLUVIAS EN LA ZONA DE TRABAJO
16/04/2026	7326,1	7333,0	6,9	60,000	7329,5	4,2	No. 8951	SOLEADO
17/04/2026	7333,0	7340,5	7,5					SOLEADO
18/04/2026	7340,5	7340,5	0,0					SABADO SIN ACTIVIDADES
19/04/2026	7340,5	7340,5	0,0					DOMINGO
20/04/2026	7340,5	7348,4	7,9	60,000	7341,5	5,0	No. 8953	LLUVIAS EN LA ZONA DE TRABAJO
21/04/2026	7348,4	7356,8	8,4					SOLEADO
22/04/2026	7356,8	7364,3	7,5	90,000	7360,2	4,8	No. 8954	DE LOS 120 GL, SE SUMINISTRAN 90 GL Y QUEDAN EN RESERVA 30 GL
23/04/2026	7364,3	7364,3	0,0					SIN ACTIVIDADES POR DAÑO EN MANGUERA DEL HIDRAULICO
24/04/2026	7364,3	7371,5	7,2	30,000	7371,5	2,7	No. 8954	SE SUMINISTRAN 30 GL QUE SE ENCONTRABAN EN RESERVA DE LA TIRILLA 8954
25/04/2026	7371,5	7371,5	0,0	-------	-------	-------	-------	SABADO SIN ACTIVIDADES
26/04/2026	7371,5	7371,5	0,0	-------	-------	-------	-------	DOMINGO
27/04/2026	7371,5	7377,5	6,0	-------	-------	-------	-------	SOLEADO
28/04/2026	7377,5	7385,8	8,3	60,000	7385,8	4,2	No. 8955	SE CULMINAN ACTIVIDADES Y SE TRASLADA A LA GRAN VIA - LA MESA PARA POYAR CON LA EMERGENCIA
29/04/2026	-------	-------	0,0	-------	-------	-------	-------	-------
30/04/2026	-------	-------	0,0	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL MES			80,00	360,00		20,86		

9. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Durante el mes de abril de 2026 se ejecutaron satisfactoriamente las actividades de atención de la emergencia presentada en la vereda Limonal, municipio de Anolaima, enfocadas en la rehabilitación del cauce del río Curí mediante el retiro de material vegetal y material sobrante producto del derrumbe, así como la conformación de jarillones para mitigar el riesgo y restablecer las condiciones de seguridad en la zona intervenida. Las labores desarrolladas con apoyo de la excavadora de oruga permitieron habilitar el paso del caudal y atender puntos críticos afectados por el movimiento en masa, dando cumplimiento al 100% de las actividades programadas. A pesar de las condiciones climáticas adversas y de algunas novedades mecánicas presentadas en el equipo, se realizaron las acciones correctivas necesarias que permitieron continuar con la ejecución de los trabajos de manera oportuna y eficiente. Resaltando un aumento en el consumo de acpm debido a las actividades desarrolladas con la apertura del caudal, las cuales requieren una mayor exigencia operacional del equipo. Destacando la articulación institucional entre la Alcaldía Municipal, el ICCU, la CAR y los organismos de gestión del riesgo, garantizando una respuesta coordinada frente a la emergencia y priorizando la protección de las comunidades ubicadas aguas abajo del río Curí. En términos generales, el balance del periodo es positivo, evidenciando eficiencia operativa, compromiso del personal en campo y una adecuada atención de la emergencia presentada en el municipio de Anolaima.

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Retiro de material sobrante.	Se interviene punto crítico en la vía.	Se habilita paso al caudal.
		
Conformación de jarillon.	Se habilita paso al caudal.	Conformación de jarillon.
		
Suministro acpm.	Cambio de manguera del hidráulico.	Conformación de jarillon.

		
Retiro de material sobrante.	Extracción de material vegetal y material colmatado de rio.	Retiro de material sobrante.
		
Extracción de material vegetal y material colmatado de rio.	Se habilita paso al caudal.	Retiro de material sobrante.

WILLIAN LEONARDO GUERRA
INSPECTOR ICCU

EMILIO STEVSNS MORENO
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

Anexo
Permiso autorizado
Rio Curí – Vereda Limonal

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2026: INVITACIÓN REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE - CMGRD ACTA 03 SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA: Anolaima Cundinamarca, abril 12 de 2026

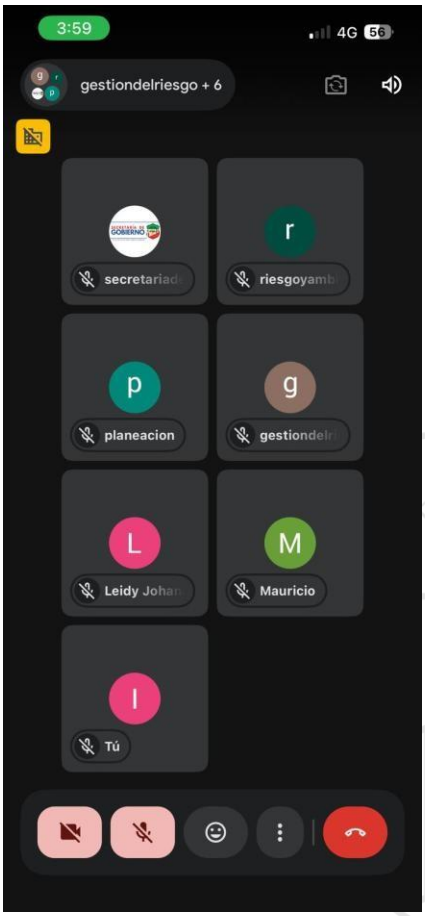
HORA INICIO: 4:00 pm
HORA FIN: 5:00 pm
LUGAR: "Reunión virtual"

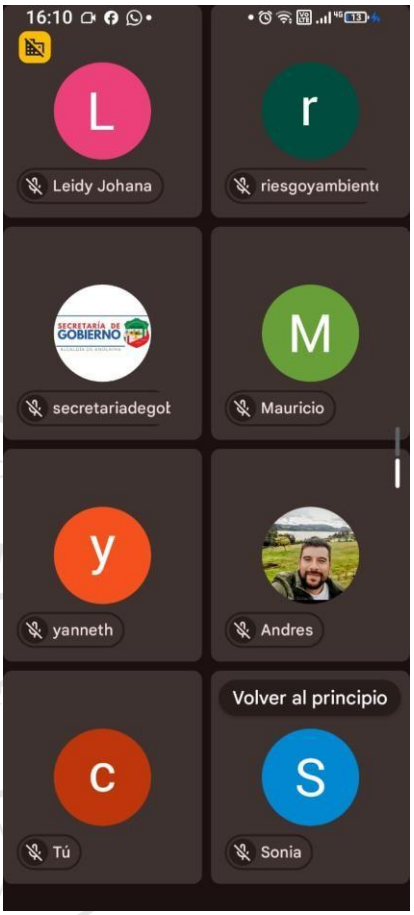
ASISTENTES:

Alcalde municipal - CARLOS ALEXYS GONZÁLEZ CHACÓN
Secretario de Gobierno - CESAR AUGUSTO ROBLES FERRER
Secretario de Desarrollo social - LUZ YANNET RODRÍGUEZ
Secretaria Desarrollo económico - LUCY LECTY SALAMANCA DIAZ
Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos - OSCAR RODRIGO BARRETO
Secretaria de Hacienda - LUZ YANNET RODRÍGUEZ
Delegado Dependencia Gestión del Riesgo – CARLOS ANDRES HERRERA B
Comandante de Bomberos – ANDRÉS ZAMORANO
Comandante Estación de Policía Casco Urbano
Comandante Estación de Policía Centro poblado la Florida
Delegado CAR – Andrés Muñoz
Delegado CDGRD (TEQUENDAMA) – Mauricio Barreto
Delegado CMGRD Anapoima
Delegado CMGRD Quipile
Delegado CMGRD La Mesa
Delegado CMGRD Cachipay
Delegado CMGRD Apulo

Se registra la asistencia de manera virtual mediante pantallazos de los integrantes de la reunión que se mostraran a continuación:

Scanned with CamScanner

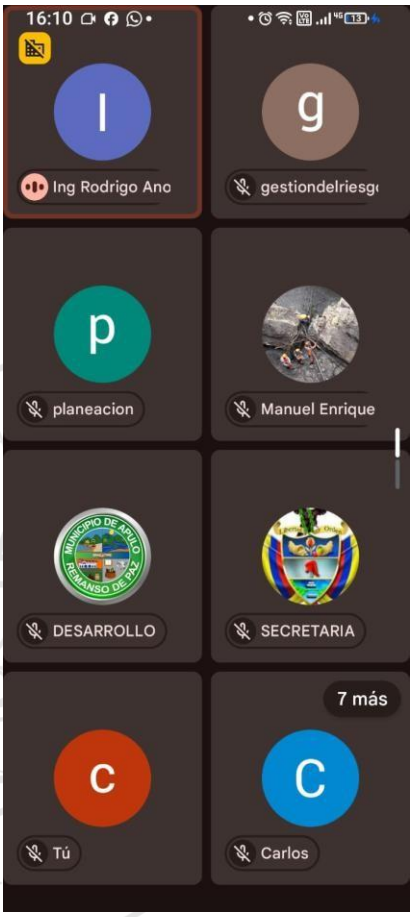




Alcaldía de ANOLAIMA

Scanned with CamScanner





Orden del día

1. Saludo por parte del secretario técnico.
2. Verificación de quórum.
3. Intervención y Saludo del señor alcalde.
4. Proposiciones y Varios.
5. Marcha final.

Scanned with CamScanner

DESARROLLO:

1. ***Saludo por parte del secretario técnico.***

El secretario técnico del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Anolaima, da la bienvenida a los asistentes y agradece su participación en la sesión, señalando que esta corresponde a una emergencia presentada en la cuenca del rio curí vereda Limonal del municipio de Anolaima en el cual se presenta un represamiento de agua por obstrucción sobre el cause por movimiento de masa de la montaña alto grande activando el sistema de alertas tempranas y visitas por parte del enlace de gestión del riesgo del municipio.

2. Verificación del quórum

Se hace el llamado a lista para verificar la asistencia.

Cantidad de asistentes a la reunión: Diecisiete (17)

¿Hay quórum?

SI __X__ NO _____

3. Saludo por parte del señor alcalde.

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo le da la bienvenida a esta sesión extraordinaria, convocada con ocasión de la emergencia generada por la actual temporada de lluvias y el taponamiento del cauce del rio curí en la vereda Limonal parte baja del municipio la cual puede genera afectaciones sobre los acueductos veredales y población que habita cerca de la ronda del rio aguas abajo.

4.Proposiciones y varios.

En el desarrollo de la Sesión Extraordinaria No. 003 del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, y una vez analizada de manera integral la situación de emergencia presentada en la cuenca del río Curí, vereda Limonal del municipio de Anolaima, se formularon las siguientes proposiciones y determinaciones, orientadas a la atención inmediata, mitigación del riesgo y protección de la población potencialmente afectada.

En primera instancia, se resalta la intervención del señor alcalde Municipal, quien manifestó su compromiso institucional para liderar de manera prioritaria las gestiones necesarias ante instancias departamentales y entidades competentes, con el fin de obtener el apoyo en maquinaria amarilla especializada, particularmente retroexcavadora sobre orugas o draga. Lo anterior, con el propósito de ejecutar la remoción controlada del material depositado en el cauce, recuperar la sección

Scanned with CamScanner

hidráulica del río Curí y reducir el riesgo asociado al represamiento generado por el movimiento en masa.

En este sentido, se indicó que dichas gestiones se adelantarán ante la Gobernación de Cundinamarca, en articulación con la Corporación Autónoma Regional (CAR), la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres y el ICCU, priorizando la atención de la emergencia bajo criterios técnicos, de oportunidad y de protección a la vida. De igual manera, se propuso mantener un monitoreo permanente, sistemático y técnico de las condiciones del represamiento, mediante el uso de herramientas como sobrevuelos con dron, inspecciones en campo y seguimiento a variables hidrometeorológicas, con el fin de evaluar la estabilidad del taponamiento y anticipar posibles escenarios de falla que puedan derivar en una creciente súbita.

Así mismo, se estableció la necesidad de fortalecer y mantener activo el Sistema de Alerta Temprana (SAT), en articulación con el Cuerpo de Bomberos y demás organismos de socorro, garantizando una comunicación oportuna, clara y efectiva hacia las comunidades ubicadas aguas abajo del punto crítico, en jurisdicción de los municipios de Quipile, Cachipay, Anapoima, La Mesa y Apulo, teniendo en cuenta el riesgo latente de una avenida torrencial.

Dentro de las proposiciones, se enfatizó en la implementación de una estrategia integral de comunicación del riesgo, orientada a mantener informada de manera continua a la comunidad y a las autoridades competentes sobre el estado de la emergencia, las acciones adelantadas y las recomendaciones preventivas. Para ello, se acordó el uso de los canales institucionales de la Alcaldía Municipal, así como los medios oficiales del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y las redes de coordinación interinstitucional. Adicionalmente, se determinó la importancia de mantener informado de manera permanente a este Consejo Municipal, garantizando la trazabilidad de las acciones ejecutadas, el seguimiento a la gestión de recursos, así como el avance de las intervenciones aprobadas, permitiendo una toma de decisiones oportuna y basada en información actualizada.

De igual forma, se dejó constancia de la necesidad de dar continuidad a la articulación interinstitucional entre los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de asegurar una respuesta coordinada, eficiente y acorde con la magnitud de la emergencia, así como la implementación de medidas de reducción del riesgo a mediano y largo plazo en la zona afectada.

El enlace de gestión del riesgo de la Car Andrés Muñoz reitera en la sesión dice que durante la ejecución que se realizara con maquinaria es de tipo correctivo de tal manera que no se generara ninguna obra si no que el propósito de esta es retirar el material que esta obstaculizando el cauce del rio curí, por este motivo, se reitera que todas las acciones deberán ejecutarse, no con permiso de intervención del cauce mediante estudios y diseños, sino, a través del comité de gestión del riesgo para que se avale la ejecución de esta obra de mitigación con maquinaria amarilla en concordancia con la intervención por la emergencia presentada y en la cual se deja constancia de lo

Scanned with CamScanner

pactado y los asistentes a esta sesión extraordinaria numero 03 del 12 de abril 2026 a las 4:00 pm para la intervención del rio curí como acción preventiva y mitigable del riesgo la cual fue aprobada por unanimidad en el marco de la presente reunión, garantizando su desarrollo bajo criterios técnicos, ambientales y de seguridad, y orientadas a la mitigación efectiva del riesgo identificado en la cuenca del río Curí.

8.Marcha final.

Se de la finalización a la reunión agradeciendo a todos los participantes.

Se anexa Fotografías del movimiento en masa registrado en la vereda Limonal del municipio de Anolaima Cundinamarca



Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner



Se anexa firma de asistencia a la reunión del funcionario Enlace Gestión del riesgo CAR encargado de la zona del Tequendama como constancia de lo pactado en esta acta

ANDRES MUÑOZ
Enlace Gestión del riesgo CAR

Scanned with CamScanner

COORDENADAS

Coordenadas	
Lat Long	4.7617441,-74.5064693
UTM	554729.997E 526347.514N 18N
MGRS	18NWL 54730 26348
EPSG:4326	-74.5064693 4.7617441
Elevación	1073.5 m
Elev. (msl)	1054.63 m asl.
Exactitud	3.0 m
Azimut	0.0° Declinación: -8.37°
Velocidad	0.25 km/h
P/H/V DOP	1.12/0.78/0.81

Copiar Compartir Guardar

Cordialmente

CARLOS ALEXYS GONZÁLEZ CHACÓN
Alcalde municipal Anolaima Cundinamarca

Ing. OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA
Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos

ELABORO	REVISO
CARLOS ANDRES HERRERA BOHORQUEZ INGENIERO PLANEACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA SECRETARIO PLANEACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Scanned with CamScanner

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°3
PERIODO: ABRIL DEL 2026

PROVINCIA: TEQUENDAMA
MUNICIPIO: SAN ANTONIO

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA TEQUENDAMA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO

OBJETO: “ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Tequendama:

San Antonio:

1. Excavadora de orugas Alquilada HCM1SC00H00074256
2. Volqueta sencilla alquilada PAB538

Ubicación:

Vereda Chicaque coordenadas 4°37'24.96"N 74°20'56.97"W

Imagen 1 ubicación de la maquina



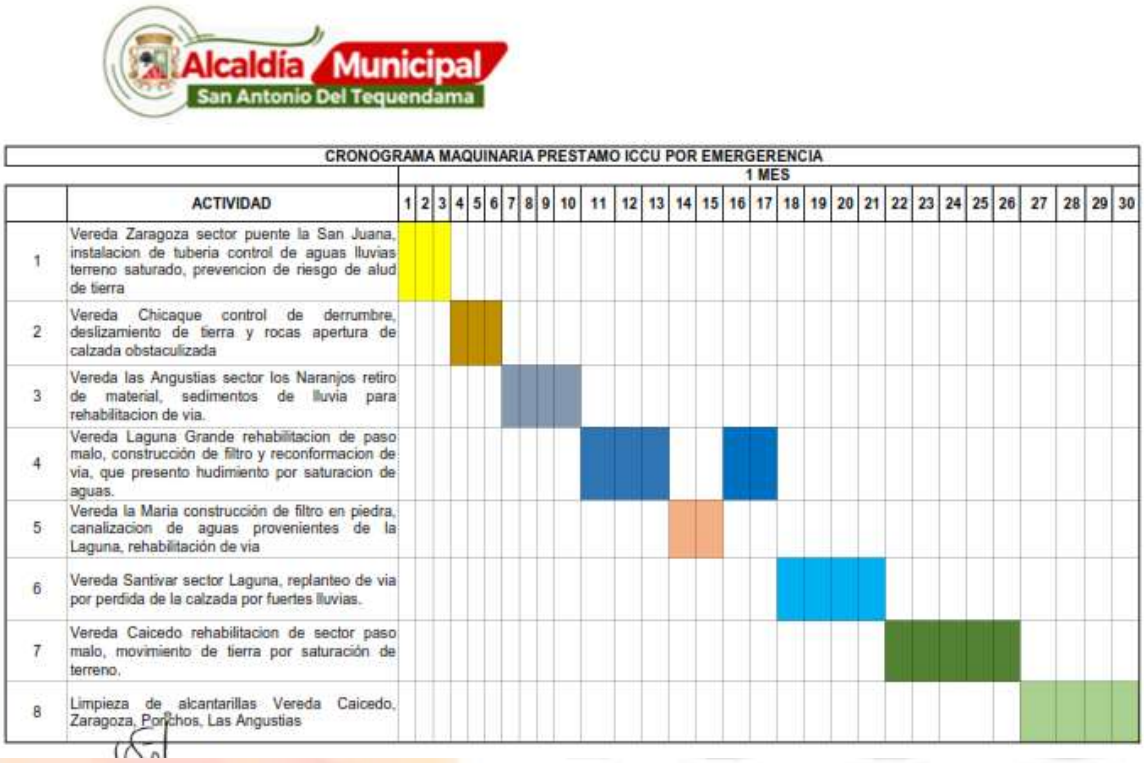
Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	Carlos Iván Chaves Prieto
INSPECTOR DE OBRA ICCU	Leonardo Guerra
OPERADOR RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS HCM1SC00H00074256	Jhon Fernel Catañeda
OPERADOR VOLQUETA SENCILLA PAB538	Fabio Varela Zamora

3. PLAN DE TRABAJO

Imagen 2 cronograma de actividades municipio de San Antonio



Fuente: Alcaldía de San Antonio

Actualmente se cuenta con un 70% de avance con respecto al cronograma establecido, esto debido a que el material de deslizamiento de la quebrada en el sector la playa – Chicaque ha generado un gran impacto, y se debe intervenir un talud colindante que está generando riesgo para la comunidad de el sector.

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

ACTIVIDADES	
FECHA	**DESCRIPCION**
24/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy llego la Excavadora de Orugas alquilada, se realiza socializacion con la comunidad por parte del personal de la alcaldía, luego se inicia a realizar intervención en la vereda chicaque donde se realiza conformación de jarillon en la quebrada y despeje de material en la vía por creciente súbita de la quebrada AVANCE KM: 0.050 VEREDA/SECTOR: Chicaque CONDICION CLIMATICA: Lluvias EQUIPO: Maquina EXCAVADORA_DE_ORUGAS - Hitachi - Alquiler - HCM1SC00H00074256 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 17169 Fin 17172.8 H. TRABAJADAS: 3.8
25/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la Excavadora realizar intervención en la vereda chicaque donde realiza conformación de jarillon en la quebrada, despeje de material y cargue de 14 viajes de material AVANCE KM: 0.050 VEREDA/SECTOR: Chicaque EQUIPO: Maquina EXCAVADORA_DE_ORUGAS - Hitachi - Alquiler - HCM1SC00H00074256 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 17173 Fin 17178 H. TRABAJADAS: 5 EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - Ford - Alquiler - PAB538 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 0 Fin 0 H. TRABAJADAS: 0 VIAJES:SOBRANTE: 14
26/04/2026	Domingo
27/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la Excavadora realizar intervención en la vereda chicaque donde realiza conformación de jarillon en la quebrada, despeje de material y cargue de 28 viajes de material sobrante con la volqueta alquilada OSJ276 y la Volqueta PAB 538 AVANCE KM: 0.050 VEREDA/SECTOR: Chicaque CONDICION CLIMATICA: Soleado EQUIPO: Maquina EXCAVADORA_DE_ORUGAS - Hitachi - Alquiler - HCM1SC00H00074256 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 17178 Fin 17185.7 H. TRABAJADAS: 7.7 EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - Ford - Alquiler - OSJ276 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 0 Fin 0 H. TRABAJADAS: 0

	VIAJES:SOBRANTE: 14 EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - Ford - Alquiler - PAB538 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 0 Fin 0 H. TRABAJADAS: 0 VIAJES:SOBRANTE: 14
28/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la Excavadora realizar intervención en la vereda chicaque donde realiza conformación de jarillon en la quebrada, despeje de material y cargue de 20 viajes de material sobrante con la volqueta alquilada OSJ276 y la Volqueta PAB 538 AVANCE KM: 0.050 VEREDA/SECTOR: Chicaque EQUIPO: Maquina EXCAVADORA_DE_ORUGAS - Hitachi - Alquiler - HCM1SC00H00074256 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 17185.7 Fin 17194.7 H. TRABAJADAS: 9 EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - Ford - Alquiler - PAB538 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 0 Fin 0 H. TRABAJADAS: 0 VIAJES:SOBRANTE: 11
29/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la Excavadora realizar intervención en la vereda chicaque donde realiza conformación de jarillon en la quebrada, despeje de material y cargue de 18 viajes de material sobrante con la volqueta alquilada Volqueta PAB 538 AVANCE KM: 0.050 VEREDA/SECTOR: Chicaque CONDICION CLIMATICA: Soleado EQUIPO: Maquina EXCAVADORA_DE_ORUGAS - Hitachi - Alquiler - HCM1SC00H00074256 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 17194.7 Fin 17202.9 H. TRABAJADAS: 8.2 EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - Ford - Alquiler - OSJ276 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 0 Fin 0 H. TRABAJADAS: 0 EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - Ford - Alquiler - PAB538 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 0 Fin 0 H. TRABAJADAS: 0 VIAJES:SOBRANTE: 18
30/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la Excavadora realizar intervención en la vereda chicaque donde realiza conformación de jarillon en la quebrada, despeje de material y cargue de 18 viajes de material sobrante con la volqueta alquilada Volqueta PAB 538 AVANCE KM: 0.050 VEREDA/SECTOR: Chicaque CONDICION CLIMATICA: Soleado

	EQUIPO: Maquina EXCAVADORA_DE_ORUGAS - Hitachi - Alquiler - HCM1SC00H00074256 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 17202.9 Fin 17211.1 H. TRABAJADAS: 8.2 EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - Ford - Alquiler - OSJ276 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 0 Fin 0 H. TRABAJADAS: 0 VIAJES:SOBRANTE: 15 EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - Ford - Alquiler - PAB538 OPERATIVA: SI HORAS: Inicio 0 Fin 0 H. TRABAJADAS: 0 VIAJES:SOBRANTE: 19

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES			
FECHA	**MATERIAL**	**N° DE VIAJES**	**DESCRIPCIÓN**
24/04/2026		0	
25/04/2026	Otros	14	
26/04/2026	-	-	Domingo
27/04/2026	Otros	28	14 Viajes los realizo la volqueta OSJ276 de la Troncal del Tequendama
28/04/2026	Otros	20	
29/04/2026	Otros	18	
30/04/2026	Otros	34	15 Viajes los realizo la volqueta OSJ276 de la Troncal del Tequendama
TOTAL		**114**	

6. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA FOSCA				
FECHA	**LONGITUD (KM)**	**AVANCE (KM)**	**REPETICIÓN (KM)**	**DESCRIPCIÓN**
24/04/2026	0,05	0,05		
25/04/2026	0,05	0,10		
26/04/2026	-	-	-	Domingo
27/04/2026	0,05	0,15		
28/04/2026	0,05	0,20		
29/04/2026	0,05	0,25		
30/04/2026	0,05	0,30		
TOTAL	**0,30**	**0,30**		

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**HORAS DE LLUVIA**	**HORAS DE INOPERATIVIDAD**	**HORAS EFECTIVAS**	**DESCRIPCIÓN**
24/04/2026	2	0	6	Lluvias
25/04/2026	0	0	8	Soleado
26/04/2026	-	-	-	Domingo
27/04/2026	0	0	8	Soleado
28/04/2026	0	0	8	Soleado
29/04/2026	0	0	8	Soleado
30/04/2026	0	0	8	Soleado
TOTAL	**2**	**0**	**46**	

8. MOVILIZACIONES

No se realizaron movilizaciones en este mes

9. MANTENIMIENTOS

No se realizaron mantenimientos en este mes

10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA	ICCU

OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	ABRIL						
MUNICIPIO:	SAN ANTONIO						
MAQUINA:	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS ALQUILADA					**SERIE**	**HCM1SC00H00074256**
FECHA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL**	**HOROMETRO INICIAL**	**HOROMETRO FINAL**	**HORAS TRABAJADAS**	**STAND BY**	**OBSERVACIONES**
24/04/2026			17169	17172,8	3,8	1,2	LLUVIAS
25/04/2026			17173	17178	5		

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

26/04/2026			17178	17178	0		
27/04/2026			17178	17185,7	7,7		
28/04/2026			17185,7	17194,7	9		

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

29/04/2026			17194,7	17202,9	8,2		
30/04/2026			17202,9	17211,1	8,2		
TOTAL HORAS TRABAJADAS					**41,9**	**1,2**	
TOTAL HORAS					**43,1**		
Firma			**Firma**				
Nombre:	**Carlos Ivan Chaves**		**Nombre:**	**Leonardo Guerra**			
INSPECTOR UT PARQUE 2025			**INSPECTOR ICCU**				

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL
24/04/2026		
25/04/2026		

27/04/2026		
28/04/2026		

29/04/2026		
30/04/2026		

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA

OBJETO	**"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".**						
PERIODO:	**ABRIL**						
MUNICIPIO:	**SAN ANTONIO**						
MAQUINA:	**VOLQUETA SENCILLA**					**SERIE**	**PAB538**
FECHA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL**	**HOROMETRO INICIAL**	**HOROMETRO FINAL**	**DIAS TRABAJADOS**	**STAND BY**	**OBSERVACIONES**
25/04/2026			7:30	17:10	1		LLUVIAS
26/04/2026							
27/04/2026			8:00	17:17	1		

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

28/04/2026			7:30	16:06	1		
29/04/2026			7:00	16:00	1		

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

30/04/2026			7:30	16:30	1		
TOTAL DIAS TRABAJADOS					**5**	**0**	
TOTAL DIAS					**5**		
Firma			**Firma**				
Nombre:	**Carlos Ivan Chaves**		**Nombre:**		**Leonardo Guerra**		
INSPECTOR UT PARQUE 2025			**INSPECTOR ICCU**				

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL
25/04/2026		
26/04/2026		
27/04/2026		

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

28/04/2026		
29/04/2026		
30/04/2026		

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

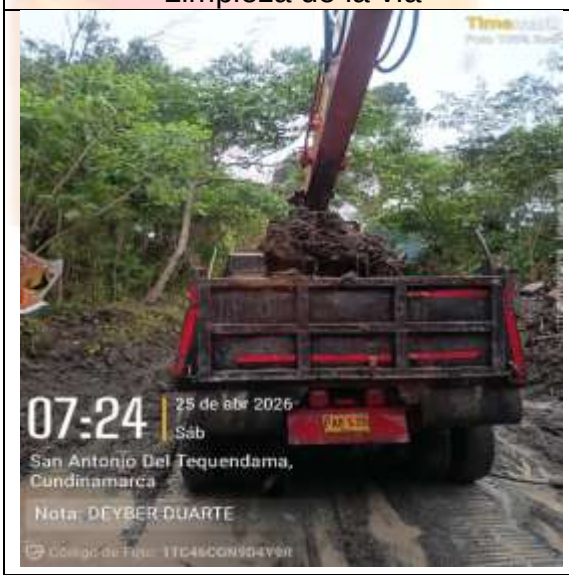
11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Durante el periodo evaluado se ejecutaron actividades de atención y mantenimiento en la vereda Chicaque, enfocadas en la conformación de jarillón sobre la quebrada, despeje de material producto de creciente súbita y cargue de material sobrante. Las labores se desarrollaron bajo condiciones climáticas variables, alcanzando un avance total de 0.300 km y un acumulado de 43.10 horas de trabajo, garantizando la recuperación de la transpirabilidad en el sector intervenido en el tiempo presente del mes de abril se logro retirar un total de 114 viajes de material de derrumbe.

Se concluye que se dio cumplimiento a las actividades programadas, logrando mitigar los efectos generados por la creciente de la quebrada mediante la estabilización del jarillón y la remoción del material sobre la vía. Con la intervención realizada, se mejora la seguridad y movilidad en la vereda Chicaque, dejando el tramo en condiciones adecuadas para su uso.

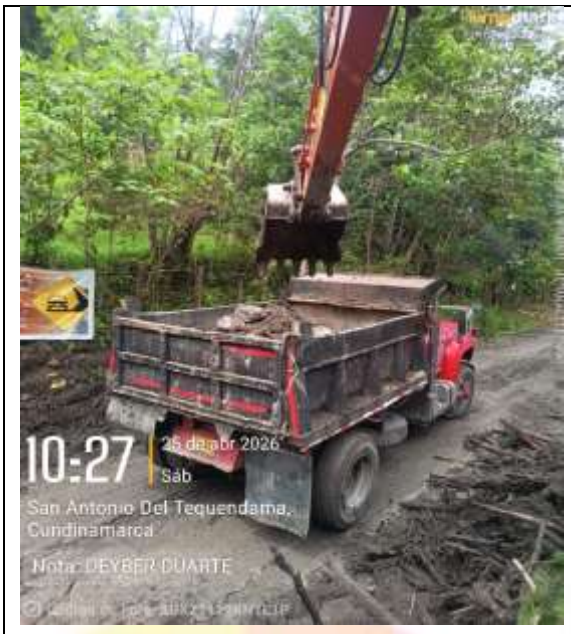
UNIÓN TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Limpieza de la vía	Conformación de jarillon
	
Limpieza de la vía	Limpieza de la vía

	
Conformación de jarillon	Limpieza de la vía
	
Retiro de derrumbe	Retiro de derrumbe

	
Limpieza de canales	Limpieza de la vía
	
Conformación de jarillon	Retiro de derrumbe

	
Limpieza de la vía	Limpieza de canales
	
Limpieza de canales	Limpieza de via

Leonardo Guerra
INSPECTOR ICCU

Carlos Iván Chaves Prieto
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

DECRETO No. 024 de 2026

(DEL 17 DE ABRIL)

"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EVENTOS NATURALES - LLUVIAS TORENCIALES CON OCASIÓN A LA OLA INVERNAL QUE SE VIENE PRESENTADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA CUNDINAMARCA"

El Alcalde del Municipio de SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en Articulo 315 de la Constitución Política de Colombia -, la Ley 1523 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios,

y

CONSIDERANDO

Que conforme a las pre\visiones del art. 315 de la Constitución Política, que indica son "Fines Esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la Vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la con\vivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".

"Que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su Vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".

Que de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política, "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones".

Que los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su Vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano

Que es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, reconocer, facilitar y promover la organización y participación de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, vecinales, benéficas, de voluntariado y de utilidad común. Es deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestión del riesgo en su comunidad.

Que las autoridades municipales mantendrán debidamente informadas a todas las personas naturales y jurídicas sobre: Posibilidades de riesgo, gestión de desastres, acciones de rehabilitación y construcción, así como también sobre las donaciones recibidas, las donaciones administradas y las donaciones entregadas.

Que el alcalde como Jefe de la administración local representa al Sistema Nacional en el Municipio. El alcalde como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.

Que la ley 1523 en su capítulo VI declaratorias de desastres, calamidad pública y normalidad, reza en el artículo 57" Declaratoria de situación de calamidad pública. Los

gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, podrán declarar la situación de calamidad pública en su respectiva jurisdicción. Las declaratorias de situación de calamidad pública se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las de la declaratoria de la situación de desastre"

Que en el artículo 58 de la ley 1523 se entiende la calamidad pública como. "..el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, /os la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios a los recursos causa daños o económicas o ambientales, generando una alteración grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al distrito, municipio, departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción..."

Que el artículo 59° de la ley 1523 de 2012 establece los Criterios para la Declaratoria de Desastre y Calamidad Pública.

1. *Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes jurídicos protegidos se cuentan la Vida, la integridad personal, la subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos fundamentales económicos y sociales de has personas.*
2. *Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes jurídicos a si protegidos se cuentan el orden público material, social, económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y administrativas, la prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la infraestructura básica.*
3. *El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar nuevos riesgos y desastres.*
4. *La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros territorios y poblaciones o a perpetuarse.*
5. *La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las condiciones de la emergencia.*
6. *El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta.*
7. *La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico.*

Que por medio del ***Decreto No. 041 DEL 03 de septiembre del 2012*** *por el cual se "conforma y organiza el Consejo municipal de Gestión del Riesgo desastres del Municipio de SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA Cundinamarca, los comités municipales y se dictaron otras disposiciones".*

Que una de las funciones del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo es emitir concepto previo para la declaratoria de situación de calamidad pública y retorno a la normalidad.

Que en reunión extraordinaria del 17 de abril de 2026, del CMGRD se reportaron afectaciones en el municipio de SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA por las fuertes Lluvias que se vienen presentado en el país y especialmente en la Jurisdicción de Municipio de SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, como son afectaciones los diferentes vías por desbordamiento de fuentes hídricas puntualmente: 1. EMERGENCIA AVALANCHA SECTOR LA PLAYA- CHICAQUE, Se presentó una precipitación torrencial que generó creciente súbita y posible represamiento en la parte alta de la fuente hídrica. Se evidenció arrastre de material de gran tamaño (rocas), afectando la estructura del puente, las barandas del puente colapsaron, la placa del puente aparentemente sufrió afectaciones, pero no es posible determinar su estado real debido a la acumulación de

material rocoso, fincas inundadas, por donde transitan aproximadamente mil sesenta (1.060) personas. 2. AFECTACIÓN A LA VÍA DE SEGUNDO ORDEN QUE COMUNICA A SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA CON SANTANDERCITO en el sector conocido como "*Paso Malo*" vía de acceso principal al municipio e interconexión con los municipios de Mesitas del Colegio y Soacha. 3. AFECTACIÓN SECTOR LA ANTENA VEREDA EL CAJÓN vial cierre por derrumbes. 4. DESBORDAMIENTO DE LA QUEBRADA EL ENCANTO en el sector de María Isabel, perdida de la calzada pasó restringido, 5. PERDIDA DE LA BANCADA DE LA VÍA en la vereda Caicedo a Sebastopol. 6. AFECTACIÓN EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE y bocatomas, de Laguna Grande y Caicedo; 7. AFECTACIÓN EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO de Institución Educativa Simón Bolívar, donde se reporta el rebosamiento del pozo séptico, generando afectaciones sanitarias que requieren atención prioritaria, especialmente por tratarse de una institución educativa. Rebose de pozo ubicado en la Calle Panamá (sector Santandercito parte baja), el cual ya había sido intervenido recientemente; sin embargo, se evidenció que nuevamente se encuentra obstruido, presentando rebose y generando afectaciones sanitarias para la comunidad del sector; 8. También se presentó afectación a las vías de ingreso al Municipio por el sector de Puerto Araujo y Santandercito; *Sector la Cadena, Vereda el Cajón; Sector María Isabel Vereda Quintas Colombia; fenómenos de remoción en masa en los sectores de Sebastopol, Caicedo, el Cajón, Sector la Sauza, Vereda Laguna, Puente Bicentenario Vereda las Angustias, sector la escuela Vereda las Angustias; Sector el Reten vereda Zaragoza; perdidas de bancadas en vías terciarias, entre otras.*

Que con la afectaciones del puente en la Vereda el Chicaque, de la vía San Antonio a Santandercito, Sector denominado Paso Malo, vía Caicedo Sebastopol, las inundaciones en Santandercito, cierre de via el Cajos sector la Cadena, afectaciones en la red vial del municipio que se afecta la movilidad de los habitantes del sector ocasionando un gran perjuicio en razón a que no pueden acceder a los servicios de salud, a las instituciones educativas y no pueden sacar los productos agrícolas para su respectiva comercialización, ni la movilización de semovientes, factores fundamentales para la economía del municipio y la comunidad.

Que la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial reporto los diferentes daños que se han presentado y es por ello por lo que realizó inventario con el fin de poder intervenir y de esta manera prevenir el riesgo para los habitantes del municipio.

Que una vez expuestos los incidentes en esta emergencia por solicitud de Coordinadora del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD, se dio concepto favorable para que el señor alcalde DECLARE LA CALAMIDAD PÚBLICA, en el municipio de San Antonio del Tequendama Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto el Alcalde del municipio de San Antonio del Tequendama Cundinamarca

D E C R E T A

***ARTÍCULO PRIMERO**: Declaratoria. - Declarar la Situación de Calamidad Pública en el Municipio de San Antonio del Tequendama Cundinamarca, de conformidad con la parte considerativa de este Decreto.*

***Parágrafo:** Conforme al artículo 64 de la Ley 1523 de 2012, el Alcalde Municipal, cumplido el término de Seis (6) meses, decretará el retorno a la normalidad o en su defecto prorrogará por el mismo término, la situación de calamidad, previo concepto favorable del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.*

***ARTÍCULO SEGUNDO**: Plan Específico de Acción. - El Plan de Acción Específico será elaborado y coordinado en su ejecución por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo con la información suministrada por las entidades municipales y estará coordinado por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y su seguimiento y evaluación estará a cargo de*

la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial, quien remitirá los resultados de este seguimiento y evaluación a la Unidad Nacional y Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres.

***ARTÍCULO TERCERO**: Aprobación del Plan – Una vez aprobado el Plan de Acción Especifico por parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo será ejecutado por todos sus miembros, junto con las demás dependencias del orden Departamental, Municipal o Nacional, así como por las entidades del sector privado que se vinculen y a quienes se les fijaran las tareas respectivas en el documento.*

***Parágrafo:** Termino. - El termino para la elaboración y aprobación del Plan Específico de Acción no podrá exceder de (15) quince días a partir de la sanción del presente decreto.*

***ARTÍCULO CUARTO**: Régimen Contractual-La actividad contractual se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en Capítulo VII Régimen Especial para Situaciones de Desastre y Calamidad Pública de la Ley 1523 de 2012. Las actividades contractuales se ajustarán a lo que se disponga en los planes de inversión que se aprueben con ET Plan de Acción Específico, en caso de que se requieran.*

***ARTÍCULO QUINTO**: El coordinador del CMGRD deberá informar una vez se expida el presente Decreto sobre la situación de calamidad y sus acciones para efectos de trasparencia a los entes de control Contraloría Departamental y Procuraduría General de la Republica.*

***Parágrafo**. El coordinador una vez expedido este decreto deberá enviar copia de este a la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca - UAEGRD y a la Unidad a Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD -*

***ARTICULO SEXTO**: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.*

PUBLÍQUESE COMUNÍQUESE Y COMPLACE

Dado en el Municipio de San Antonio del Tequendama Cundinamarca a los, diecisiete, días del mes abril del 2026.

JOSE ANIBAL MANRIQUE AREVALO
Alcalde Municipal

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°3
PERIODO: ABRIL DEL 2026

PROVINCIA: TEQUENDAMA
MUNICIPIO: TROCAL DEL TEQUENDAMA

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA TEQUENDAMA
MUNICIPIO TRONCAL DEL TEQUENDAMA

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Tequendama:

Troncal del Tequendama:

1. Minicargador CAT0236DAR4D00853
2. Retroexcavadora CAT CAT0416EEMFG08159
3. Volqueta alquilada FAI794
4. Volqueta alquilada OSJ794

Ubicación:

Troncal del Tequendama – coordenadas 4°35'25.70"N 74°21'18.70"W

Imagen 1 ubicación de la maquina



Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	Carlos Iván Chaves Prieto
INSPECTOR DE OBRA ICCU	José Luis Trujillo
OPERADOR Minicargador CAT0236DAR4D00853	Fredy López
OPERADOR RETROEXCAVADORA	Ricardo Jiménez
CONDUCTOR VOLQUETA FAI794	Fredy Chaves
CONDUCTOR VOLQUETA OSJ276	Urson Torres Cubillos

3. PLAN DE TRABAJO

El cronograma de intervención ha sido ejecutado de manera dinámica y ajustada a las condiciones reales de la Troncal del Tequendama, priorizando la atención inmediata de las emergencias derivadas de derrumbes y caída de material. En este sentido, las actividades no han seguido una programación rígida, sino que se han desarrollado conforme a la ocurrencia y magnitud de los eventos, garantizando una respuesta oportuna y eficiente. Cabe destacar que dichas intervenciones han sido orientadas y coordinadas en conjunto con el Cuerpo de Bomberos de la Troncal, quienes, en su calidad de primera respuesta, han definido los lineamientos técnicos y de seguridad para la atención de cada punto crítico, permitiendo optimizar los recursos disponibles, reducir riesgos para el personal operativo y restablecer la transitabilidad en el menor tiempo posible.

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

ACTIVIDADES	
FECHA	**DESCRIPCION**
1/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy el minicargador se encuentra disponible sin actividades asignadas por la troncal del TequendamaAVANCE KM: 0.000 VEREDA/SECTOR: Bella Vista EQUIPO: Maquina MINICARGADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0236DAR4D00853OPERATIVA: SIOPERADOR: FREDY LOPEZHORAS: Inicio 468 Fin 468 H. TRABAJADAS: 0
2/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy el minicargador se desplaza para retirar el derrumbe en el km 9 con ayuda de el personal de bomberosAVANCE KM: 0.030 VEREDA/SECTOR: Bella Vista EQUIPO: Maquina MINICARGADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0236DAR4D00853 OPERATIVA: SIOPERADOR: FREDY LOPEZHORAS: Inicio 468 Fin 474 H. TRABAJADAS: 6
3/04/2026	FESTIVO
4/04/2026	FESTIVO
5/04/2026	DOMINGO
6/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy el minicargador estuvo disponible sin actividades asignadas por la troncal del TequendamaAVANCE KM: 0.000 VEREDA/SECTOR: Bella Vista CONDICION CLIMATICA: SoleadoEQUIPO: Maquina MINICARGADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0236DAR4D00853 OPERATIVA: SIOPERADOR: FREDY LOPEZHORAS: Inicio 474 Fin 474 H. TRABAJADAS: 0
7/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy el minicargador estuvo disponible sin actividades asignadas por la troncal del TequendamaAVANCE KM: 0.000 VEREDA/SECTOR: Bella Vista EQUIPO: Maquina MINICARGADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0236DAR4D00853 OPERATIVA: SIOPERADOR: FREDY LOPEZHORAS: Inicio 474 Fin 474 H. TRABAJADAS: 0

8/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy el minicargador estuvo disponible sin actividades asignadas por la troncal del TequendamaAVANCE KM: 0.000 VEREDA/SECTOR: Bella Vista EQUIPO: Maquina MINICARGADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0236DAR4D00853 OPERATIVA: SIOPERADOR: FREDY LOPEZHORAS: Inicio 474 Fin 474 H. TRABAJADAS: 0
9/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy el minicargador estuvo disponible sin actividades asignadas por la troncal del TequendamaAVANCE KM: 0.000 VEREDA/SECTOR: Bella Vista EQUIPO: Maquina MINICARGADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0236DAR4D00853 OPERATIVA: SIOPERADOR: FREDY LOPEZHORAS: Inicio 474 Fin 474 H. TRABAJADAS: 0
10/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy el minicargador estuvo disponible sin actividades asignadas por la troncal del TequendamaAVANCE KM: 0.000 VEREDA/SECTOR: Bella Vista CONDICION CLIMATICA: SoleadoEQUIPO: Maquina MINICARGADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0236DAR4D00853 OPERATIVA: SIOPERADOR: FREDY LOPEZHORAS: Inicio 474 Fin 474.1 H. TRABAJADAS: 0.1COMBUSTIBLE ACPM/GL: 13.112 HR O KM TANQUEO: 474.1
11/04/2026	SABADO
12/04/2026	DOMINGO
13/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy el minicargador estuvo disponible sin actividades asignadas por la troncal del TequendamaAVANCE KM: 0.000 VEREDA/SECTOR: Bella Vista EQUIPO: Maquina MINICARGADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0236DAR4D00853 OPERATIVA: SIOPERADOR: FREDY LOPEZHORAS: Inicio 474.1 Fin 474.1 H. TRABAJADAS: 0
14/04/2026	ACTIVIDAD: En horas de la mañana se realizó limpieza a el minicargador, luego estuvo disponible sin actividades asignadas por la troncal del TequendamaAVANCE KM: 0.000 VEREDA/SECTOR: Bella Vista EQUIPO: Maquina MINICARGADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0236DAR4D00853 OPERATIVA: SIOPERADOR: FREDY LOPEZHORAS: Inicio 474.1 Fin 474.1 H. TRABAJADAS: 0
15/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy el minicargador realizo limpieza de derrumbe en el km 6AVANCE KM: 0.030 VEREDA/SECTOR: Bella Vista CONDICION CLIMATICA: SoleadoEQUIPO: Maquina MINICARGADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0236DAR4D00853 OPERATIVA: SIOPERADOR: FREDY LOPEZHORAS: Inicio 474.1 Fin 476 H. TRABAJADAS: 1.9
16/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy el minicargador se desplaza para retirar el derrumbe en el km 6 en el día y en la nocheAVANCE KM: 0.200 VEREDA/SECTOR: Bella Vista EQUIPO: Maquina MINICARGADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0236DAR4D00853 OPERATIVA: SIOPERADOR: FREDY LOPEZHORAS: Inicio 476 Fin 480 H. TRABAJADAS: 4
17/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy el minicargador se desplaza para retirar el derrumbe en el km 8 en horas de la mañana, y en horas de la tarde realiza remisión de derrumbe y Lugo se desplaza hacia el pr7 donde en conjunto de una Volqueta realiza el retiro de un derrumbe de gran

	magnitudAVANCE KM: 0.050 VEREDA/SECTOR: Bella Vista EQUIPO: Maquina MINICARGADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0236DAR4D00853 OPERATIVA: SIOPERADOR: FREDY LOPEZHORAS: Inicio 480 Fin 484.2 H. TRABAJADAS: 4.2
18/04/2026	SABADO
19/04/2026	DOMINGO
20/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy el minicargador se desplaza para retirar el derrumbe en el km 7 en horas de la mañana, y en horas de la tarde realiza remosión de derrumbe y Luego se desplaza hacia el km7 donde realiza remisión de masaAVANCE KM: 0.050 VEREDA/SECTOR: Bella Vista EQUIPO: Maquina MINICARGADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0236DAR4D00853 OPERATIVA: SIOPERADOR: FREDY LOPEZHORAS: Inicio 484.2 Fin 486.9 H. TRABAJADAS: 2.7
21/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy el minicargador realizo el retiro de derrumbe en el km 8 y en km 13AVANCE KM: 0.050 VEREDA/SECTOR: Bella Vista EQUIPO: Maquina MINICARGADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0236DAR4D00853 OPERATIVA: SIOPERADOR: FREDY LOPEZHORAS: Inicio 486.9 Fin 491.6 H. TRABAJADAS: 4.7COMBUSTIBLE ACPM/GL: 11.366 HR O KM TANQUEO: 486.9
22/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy llega la retroexcavadora CAT8159, y una Volqueta alquilada, en conjunto con el minicargador realizan el retiro de material sobrante en el km 7 frente a el salto del TequendamaAVANCE KM: 0.050 VEREDA/SECTOR: Km 7 CONDICION CLIMATICA: SoleadoEQUIPO: Maquina MINICARGADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0236DAR4D00853 OPERATIVA: SIOPERADOR: FREDY LOPEZHORAS: Inicio 491.6 Fin 498.7 H. TRABAJADAS: 7.1 EQUIPO: Maquina RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0416EEMFG08159 OPERATIVA: SIOPERADOR: PEDRO JOSE BELTRANHORAS: Inicio 10130.5 Fin 10137.2 H. TRABAJADAS: 6.7 EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - Ford - Alquiler - FAI794OPERATIVA: SIHORAS: Inicio 0 Fin 0 H. TRABAJADAS: 0VIAJES:SOBRANTE: 6
23/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy llega la retroexcavadora CAT8159, y una Volqueta alquilada, en conjunto con el minicargador realizan el retiro de material sobrante en el km 7 frente a el salto del TequendamaAVANCE KM: 0.050 VEREDA/SECTOR: Km 7 CONDICION CLIMATICA: LluviasEQUIPO: Maquina MINICARGADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0236DAR4D00853 OPERATIVA: SIOPERADOR: FREDY LOPEZHORAS: Inicio 498.7 Fin 502.4 H. TRABAJADAS: 3.7 EQUIPO: Maquina RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0416EEMFG08159 OPERATIVA: SIOPERADOR: PEDRO JOSE BELTRANHORAS: Inicio 10137.2 Fin 10140.5 H. TRABAJADAS: 3.3 EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - Ford - Alquiler - OSJ276OPERATIVA: SIHORAS: Inicio 0 Fin 0 H. TRABAJADAS: 0VIAJES:SOBRANTE: 5

24/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la retroexcavadora CAT8159, y una Volqueta alquilada, en conjunto con el minicargador realizan el retiro de material sobrante en el km 7 frente a el salto del Tequendama, en horas de la mañana la retroexcavadora se le rompe un tubo hidráulico quedando Inoperativa, luego el minicargador se traslada a él km 2 vía santandercito a retirar material de derrumbeAVANCE KM: 0.050 VEREDA/SECTOR: Km 7 EQUIPO: Maquina MINICARGADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0236DAR4D00853OPERATIVA: SIOPERADOR: FREDY LOPEZHORAS: Inicio 502.4 Fin 506.2 H. TRABAJADAS: 3.8 EQUIPO: Maquina RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0416EEMFG08159 OPERATIVA: SIOPERADOR: PEDRO JOSE BELTRANHORAS: Inicio 10140.5 Fin 10145.1 H. TRABAJADAS: 4.6 EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - Ford - Alquiler - OSJ276OPERATIVA: SIHORAS: Inicio 0 Fin 0 H. TRABAJADAS: 0VIAJES:SOBRANTE: 4
25/04/2026	SABADO
26/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy el mini cargador realizo retiro de material en el km 7 de la vía el pin - la victoriaAVANCE KM: 0.050 VEREDA/SECTOR: Km 7 CONDICION CLIMATICA: SoleadoEQUIPO: Maquina MINICARGADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0236DAR4D00853 OPERATIVA: SIOPERADOR: FREDY LOPEZHORAS: Inicio 506.2 Fin 508 H. TRABAJADAS: 1.8 EQUIPO: Maquina RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0416EEMFG08159OPERATIVA: SIOPERADOR: PEDRO JOSE BELTRANHORAS: Inicio 10145.1 Fin 10145.1 H. TRABAJADAS: 0 EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - Ford - Alquiler - OSJ276OPERATIVA: SIHORAS: Inicio 0 Fin 0 H. TRABAJADAS: 0
27/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy el mini cargador realizo retiro de material en el km 22 + 600 de la vía Soacha - El Colegio, luego realizó desplazamiento hacia la vía Mosquera - La Mesa para apoyar la emergencia, la retroexcavadora CAT disponible porque el operador se encontraba en una cita médica, la Volqueta alquilada se desplazo a el frente se San AntonioAVANCE KM: 0.050 VEREDA/SECTOR: Km 7 CONDICION CLIMATICA: SoleadoEQUIPO: Maquina MINICARGADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0236DAR4D00853OPERATIVA: SIOPERADOR: FREDY LOPEZHORAS: Inicio 508 Fin 513.3 H. TRABAJADAS: 5.3 EQUIPO: Maquina RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0416EEMFG08159 OPERATIVA: SIOPERADOR: PEDRO JOSE BELTRANHORAS: Inicio 10145.1 Fin 10145.1 H. TRABAJADAS: 0 EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - Ford - Alquiler - OSJ276OPERATIVA: SIHORAS: Inicio 0 Fin 0 H. TRABAJADAS: 0VIAJES:SOBRANTE: 2
28/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la retroexcavadora CAT 8159 presenta falla en la manguera de el gato hidráulico izquierdo, se procede a llevarlapata realizar el cambio, la Volqueta alquilada no relizo actividadesAVANCE KM: 0.000 VEREDA/SECTOR: Km 7 EQUIPO: Maquina RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0416EEMFG08159 OPERATIVA: SIOPERADOR:

	PEDRO JOSE BELTRANHORAS: Inicio 10145.1 Fin 10148.6 H. TRABAJADAS: 3.5NOVEDADES MECÁNICAS: Se rompe manguera hidráulica del gato hidráulicoINTERVENCIÓN MECÁNICA: Se realiza cambio de manguera hidráulica del gato izquierdo COMBUSTIBLE ACPM/GL: 11.626 HR O KM TANQUEO: 10145.9 EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - Ford - Alquiler - OSJ276OPERATIVA: SIHORAS: Inicio 0 Fin 0 H. TRABAJADAS: 0
29/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la retroexcavadora CAT 8159 junto a la volqueta alquilada OSJ276 realizan el cargue y retiro de 3 viajes de material de derrumbe en el km 7 vía Soacha el colegioAVANCE KM: 0.050 VEREDA/SECTOR: Km 7 EQUIPO: Maquina RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0416EEMFG08159 OPERATIVA: SIOPERADOR: PEDRO JOSE BELTRANHORAS: Inicio 10148.6 Fin 10152.8 H. TRABAJADAS: 4.2INTERVENCIÓN MECÁNICA: Se realiza suministro de aceite hidráulico, se procede a agregar 5 galones EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - Ford - Alquiler - OSJ276OPERATIVA: SIHORAS: Inicio 0 Fin 0 H. TRABAJADAS: 0VIAJES:SOBRANTE: 3
30/04/2026	ACTIVIDAD: El día de hoy la retroexcavadora CAT 8159 junto a la volqueta alquilada OSJ276 realizan el cargue y retiro de 3 viajes de material de derrumbe en el km 7 vía Soacha el colegioAVANCE KM: 0.050 VEREDA/SECTOR: Km 7 EQUIPO: Maquina RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0416EEMFG08159 OPERATIVA: SIOPERADOR: PEDRO JOSE BELTRANHORAS: Inicio 10152.8 Fin 10158.3 H. TRABAJADAS: 5.5COMBUSTIBLE ACPM/GL: 11.846 HR O KM TANQUEO: 10152.8 EQUIPO: Volqueta VOLQUETA_SENCILLA - Ford - Alquiler - OSJ276OPERATIVA: SIHORAS: Inicio 0 Fin 0 H. TRABAJADAS: 0VIAJES:SOBRANTE: 3

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES			
FECHA	**MATERIAL**	**N° DE VIAJES**	**DESCRIPCIÓN**
22/04/2026	TIERRA	6	
23/04/2026	TIERRA	5	
24/04/2026	TIERRA	6	
25/04/2026		0	SABADO
26/04/2026		0	DOMINGO
27/04/2026		2	
28/04/2026		0	VOLQUETA NO TRABAJA
29/04/2026	TIERRA	3	
30/04/2026	TIERRA	3	

TOTAL	25	

6. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA TRONCAL DEL TEQUENDAMA				
FECHA	LONGITUD (KM)	AVANCE (M)	REPETICIÓN (M)	DESCRIPCIÓN
1/04/2026	0	0		
2/04/2026	0,03	0,03		Km 9
3/04/2026	0	0,03		FESTIVO
4/04/2026	0	0,03		FESTIVO
5/04/2026	0	0,03		DOMINGO
6/04/2026	0	0,03		
7/04/2026	0	0,03		
8/04/2026	0	0,03		
9/04/2026	0	0,03		
10/04/2026	0	0,03		
11/04/2026	0	0,03		SABADO
12/04/2026	0	0,03		DOMINGO
13/04/2026	0	0,03		
14/04/2026	0	0,03		
15/04/2026	0,03	0,06		Km 6
16/04/2026	0,2	0,26		Km 6
17/04/2026	0,05	0,31		Km 7- Pr 8
18/04/2026	0	0,31		SABADO
19/04/2026	0	0,31		DOMINGO
20/04/2026	0,05	0,36		Km 7
21/04/2026	0,05	0,41		Km 8 Km 13
22/04/2026	0,05	0,46		Km 7
23/04/2026	0,05	0,51		Km 7
24/04/2026	0,05	0,56		Km 7
25/04/2026	0,05	0,61		SABADO
26/04/2026	0,05	0,66		Km 7
27/04/2026	0,05	0,71		Km 22 + 600
28/04/2026	0	0,71		
29/04/2026	0,05	0,76		Km 7
30/04/2026	0,05	0,81		Km 7
TOTAL		**0,81**		

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**HORAS DE LLUVIA**	**HORAS DE INOPERATIVIDAD**	**HORAS EFECTIVAS**	**DESCRIPCIÓN**
1/04/2026			8	
2/04/2026			4	
3/04/2026			0	FESTIVO
4/04/2026			0	Sabado
5/04/2026			0	Domingo
6/04/2026			8	
7/04/2026			8	
8/04/2026			8	
9/04/2026			8	
10/04/2026			8	
11/04/2026			0	Sabado
12/04/2026			0	Domingo
13/04/2026			8	
14/04/2026			8	
15/04/2026			8	
16/04/2026			8	
17/04/2026			8	
18/04/2026			0	Sabado
19/04/2026			0	Domingo
20/04/2026			8	
21/04/2026			8	
22/04/2026			8	
23/04/2026			8	
24/04/2026			8	
25/04/2026			8	Sabado
26/04/2026			4	
27/04/2026			8	
28/04/2026			8	
29/04/2026			8	
30/04/2026			8	
TOTAL	**0**	**0**	**176**	

8. MOVILIZACIONES

MOVILIZACIONES				
FECHA	**EQUIPO**	**SERIAL**	**ORIGEN**	**DESTINO**
22/04/2026	RETROEXCAVADORA CAT	CAT0416EEMFG08159	Quipile	Troncal del Tequendama

9. MANTENIMIENTOS

MANTENIMIENTOS			
FECHA	**EQUIPO**	**SERIAL**	**DESCRIPCION**
24/04/2026	RETROEXCAVADORA CAT	CAT0416EEMFG08159	Se realiza arreglo con soldadura a tubo hidráulico del gato izquierdo
28/04/2026	RETROEXCAVADORA CAT	CAT0416EEMFG08159	se realiza suministro de tubo metálico hidráulico del gato izquierdo

10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BÁSICOS												
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS PARA LA ATENCIÓN DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.											
MUNICIPIO:	Troncal del Tequendama		**PROVINCIA:**					**PERIODO:**		01/04/2026 – 30/04/2026		
MÁQUINA:	MINICARGADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0236DAR4D00853							**SERIE:**		CAT0236DAR4D00853		
CONTROL HORARIO				**ACPM**				**UREA**				**OBSERVACIÓN**
FECHA	**H. INICIAL**	**H. FINAL**	**HORAS**	**ACPM (GLS)**	**HORÓMETRO/KM TANQUEO**	**RENDIMIENTO**	**No. TIRILLA**	**UREA**	**HOROMETRO TRANQUEO**	**RENDIMIENTO**	**No. TIRILLA**	
01/04/2026	468.00	468.00	0.00			0.00				0.00		
02/04/2026	468.00	474.00	6.00			0.00				0.00		
06/04/2026	474.00	474.00	0.00			0.00				0.00		
07/04/2026	474.00	474.00	0.00			0.00				0.00		
08/04/2026	474.00	474.00	0.00			0.00				0.00		
09/04/2026	474.00	474.00	0.00			0.00				0.00		
10/04/2026	474.00	474.10	0.10	13.112	474.1	0.67	154957			0.00		
13/04/2026	474.10	474.10	0.00			0.00				0.00		
14/04/2026	474.10	474.10	0.00			0.00				0.00		
15/04/2026	474.10	476.00	1.90			0.00				0.00		
16/04/2026	476.00	480.00	4.00			0.00				0.00		
17/04/2026	480.00	484.20	4.20			0.00				0.00		
20/04/2026	484.20	486.90	2.70			0.00				0.00		
21/04/2026	486.90	491.60	4.70	11.366	486.9	0.89	156983			0.00		
22/04/2026	491.60	498.70	7.10			0.00				0.00		
23/04/2026	498.70	502.40	3.70			0.00				0.00		
24/04/2026	502.40	506.20	3.80	16,620	506,2	0.86	157592			0.00		
26/04/2026	506.20	508.00	1.80			0.00				0.00		
27/04/2026	508.00	513.30	5.30			0.00				0.00		
TOTAL MES			45.3	39.426		0. [illegible]		0				

FIRMA	FREDY LOPEZ PEREZ	FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	FREDY LOPEZ	NOMBRE	CARLOS IVAN CHAVEZ	NOMBRE	JOSE LUIS TRUJILLO
OPERADOR		INSPECTOR/RESIDENTE CONTRATISTA		INSPECTOR ICCU	

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BÁSICOS

OBJETO:	ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS PARA LA ATENCIÓN DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
MUNICIPIO:	Troncal del Tequendama	**PROVINCIA:**		**PERIODO:**	01/04/2026 – 30/04/2026
MÁQUINA:	RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0416EEMFG08159			**SERIE:**	CAT0416EEMFG08159

CONTROL HORARIO				**ACPM**				**UREA**				**OBSERVACIÓN**
FECHA	**H. INICIAL**	**H. FINAL**	**HORAS**	**ACPM (GLS)**	**HORÓMETRO/KM TANQUEO**	**RENDIMIENTO**	**No. TIRILLA**	**UREA**	**HOROMETRO TRANQUEO**	**RENDIMIENTO**	**No. TIRILLA**	
22/04/2026	10,130.50	10,137.20	6.70			0.00				0.00		
23/04/2026	10,137.20	10,140.50	3.30			0.00				0.00		
24/04/2026	10,140.50	10,145.10	4.60			0.00				0.00		
26/04/2026	10,145.10	10,145.10	0.00			0.00				0.00		
27/04/2026	10,145.10	10,145.10	0.00			0.00				0.00		
28/04/2026	10,145.10	10,148.60	3.50	11.626	10,145.9	0.00	158134			0.00		
29/04/2026	10,148.60	10,152.80	4.20			0.00				0.00		
30/04/2026	10,152.80	10,158.30	5.50	11.846	10,152.8	1.72	158737			0.00		
TOTAL MES			27.8	23.472		1.72		0				

FIRMA	Ricardo J.	FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	RICARDO JIMENEZ	NOMBRE	CARLOS IVAN CHAVEZ	NOMBRE	JOSE LUIS TRUJILLO
OPERADOR		INSPECTOR/RESIDENTE CONTRATISTA		INSPECTOR ICCU	

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						ICCU
OBJETO	**"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".**						
PERIODO:	**ABRIL**						
MUNICIPIO:	**TRONCAL DEL TEQUENDAMA**						
MAQUINA:	**VOLQUETA**					**SERIE**	**FAI794**
FECHA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL**	**HOROMETRO INICIAL**	**HOROMETRO FINAL**	**DIAS TRABAJADOS**	**STAND BY**	**OBSERVACIÓN**
22/04/2026			SIN HR	SIN HR	1		
SUBTOTAL MES					**1**	**0**	
TOTAL MES					**1**		
Nombre:	**Carlos Ivan Chaves**		**Nombre:**		**Jose Luis Trujillo**		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			**INSPECTOR ICCU**				

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL
22/04/2026		

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA	ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".	
PERIODO:	ABRIL	
MUNICIPIO:	TRONCAL DEL TEQUENDAMA	
MAQUINA:	VOLQUETA	SERIE: OSJ276

FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	DIAS TRABAJADOS	STAND BY	OBSERVACIÓN
23/04/2026			SIN HR	SIN HR	1		
24/04/2026			SIN HR	SIN HR	1		RETRO VARADA - LLUVIA
25/04/2026							SABADO
26/04/2026							DOMINGO

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

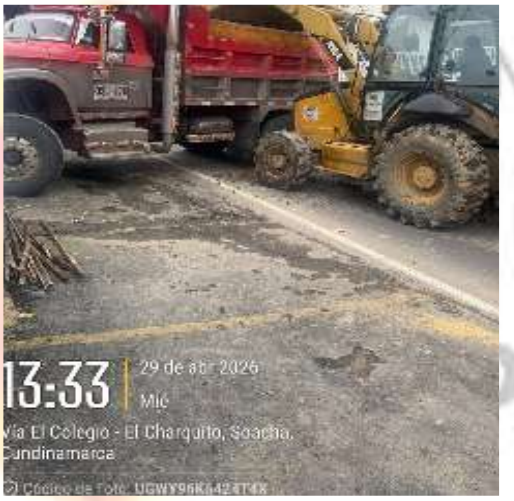
UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

27/04/2026			SIN HR	SIN HR	1		REALIZA ACTIVIDADES EN SAN ANTONIO
28/04/2026			SIN HR	SIN HR	0		NO REALIZO ACTIVIDADES
29/04/2026			SIN HR	SIN HR	1		
30/04/2026			SIN HR	SIN HR	1		REALIZA ACTIVIDADES EN SAN ANTONIO
SUBTOTAL MES					**5**	**0**	
TOTAL MES					**5**		
Nombre:	**Carlos Ivan Chaves**		**Nombre:**		**Jose Luis Trujillo**		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			**INSPECTOR ICCU**				

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

VOLQUETA OSJ276

FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL
23/04/2026		
24/04/2026		

27/04/2026		
29/04/2026		
30/04/2026		

10. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Las actividades ejecutadas en el frente de trabajo de la Troncal del Tequendama permitieron atender de manera oportuna las afectaciones generadas por la temporada de lluvias, garantizando la movilidad y seguridad en la zona intervenida. La intervención, centrada en el mantenimiento y rehabilitación, se desarrolló en algunos puntos críticos de la Troncal del Tequendama y en la estación de bomberos, logrando la habilitación de sectores afectados. Se intervino un total de 0.81 km, con un registro de 26 viajes de tierra removidos con la ayuda de la retroexcavadora y las volquetas alquiladas por la gobernación, Estas labores se ejecutaron durante un periodo operativo que incluyó 162 horas efectivas de trabajo y 176 horas condicionadas por lluvias, evidenciando la capacidad de respuesta frente a condiciones climáticas adversas. En general, el balance de la intervención es positivo, destacándose la eficiencia en la ejecución y el impacto favorable en la funcionalidad de la vía y la atención de emergencias.

UNIÓN TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Derrumbe en vía	Cargue de derrumbe
	
Apoyo a Bomberos	Derrumbe en vía

	
Cargue de material	Derrumbe en vía
	
Limpieza de derrumbe	Derrumbe en la vía

	
Retiro de material vegetal	Retiro de lodos
	
Limpieza de via	Limpieza de equipos

UNIÓN TEMPORAL

José Luis Trujillo
INSPECTOR ICCU

Carlos Iván Chaves Prieto
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°3
PERIODO: ABRIL DEL 2026

PROVINCIA: TEQUENDAMA
MUNICIPIO: VIOTA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA TEQUENDAMA
MUNICIPIO DE VIOTA

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Tequendama:

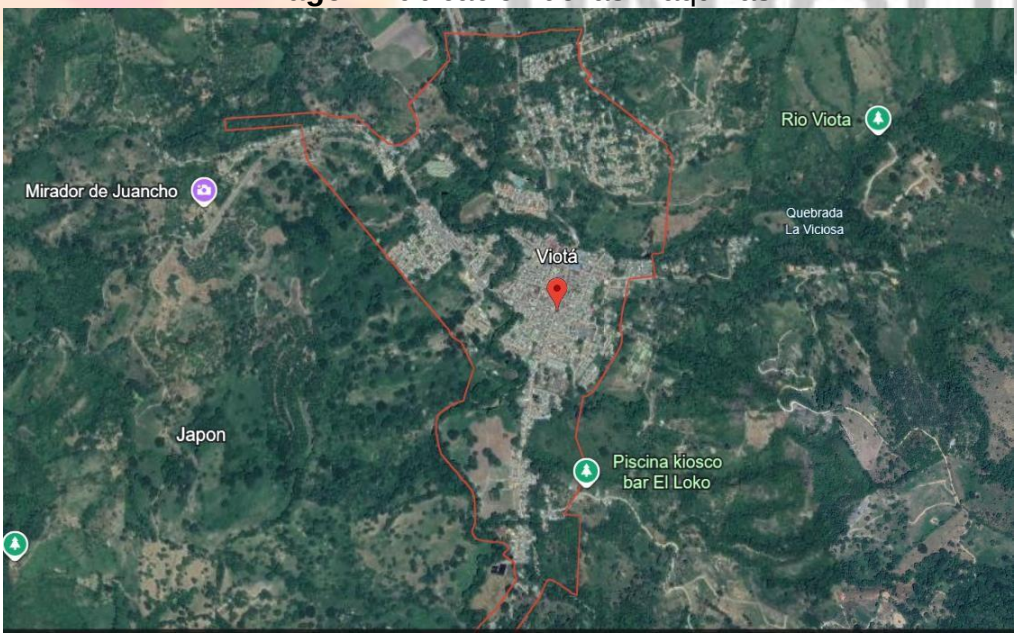
Viota:

1. Retroexcavadora CAT0420ETPRA00579
2. Volqueta UPT265
3. Volqueta APA136
4. Volqueta JRF033

Ubicación:

Viota –coordenadas 4°26'21.68"N 74°31'14.32"W

Imagen 1 ubicación de las maquinas



Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	EMILIO STEVENS MORENO
INSPECTOR DE OBRA ICCU	JHAN HANNER HERNANDEZ
OPERADOR RETROEXCAVADORA CAT0420ETPRA00579 (ALQUILER)	GERARDO ALARCON CONEJO
OPERADOR RETROEXCAVADORA T0310GX931253 (ALQUILER)	JAIDER ROJAS
OPERADOR VOLQUETA UPT265 (ALQUILER)	FERNEY JHON CASTAÑEDA
OPERADOR VOLQUETA JRF033 (ALQUILER)	MANUEL MALAVER
OPERADOR VOLQUETA APA136 (ALQUILER)	EDGAR MARTINEZ

3. PLAN DE TRABAJO

Imagen 2 cronograma de actividades municipio de Viota



Alcaldía Municipal de
VIOTÁ
Cundinamarca

realizaran no representan ningún tipo de riesgo ambiental y/o social, asegurando que contamos con los permisos necesarios para llevar a cabo la ejecución de estas. Adicionalmente estamos dispuestos a colaborar, en caso de ser necesario, con el transporte necesario para el suministro de combustible al frente de trabajo en el municipio.

VEREDA/SECTOR	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
	6 al 12 Abril 2026	13 al 19 Abril 2026	20 al 26 Abril 2026	27 Abril al 3 Mayo 2026
Vereda Java (sector puente Entre Ríos, Jaramillo, escuela Java)				
Vereda Alto Argentina (sector polideportivo a Bajo Argentina)				
Vereda Bajo Argentina (sector Puerto Guerra a San Gabriel)				

TRABAJO | FESTIVOS
DIAS NO HABILES | TRASLADO

Agradecemos de antemano su colaboración y quedamos atentos a su pronto respuesta.

Cordialmente,

OSCAR HERNAN QUIROGA GARCIA
Alcalde Municipal

Fuente: Alcaldía de Viota

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

Se desarrollan actividades de mantenimiento y rehabilitación en diferentes tramos de las veredas, San Gabriel y La Victoria. Se establece un plan de trabajo con el objetivo de cargue y descargue de material granular. Dicho trabajo incorpora el apoyo de un Retro cargador y tres volquetas sencillas (Alquiler). Se registra un avance del 84% de las actividades programadas.

Todos los sectores representados en el cronograma pertenecen a la vereda San Gabriel

FECHA	ACTIVIDADES
01/04/2026	**SIN ACTIVIDADES PROGRAMADAS**
02/04/2026	**SIN ACTIVIDADES (DIA FESTIVO)**
03/04/2026	**SIN ACTIVIDADES (DIA FESTIVO)**
04/04/2026	**SABADO SIN ACTIVIDADES PROGRAMADAS**
05/04/2026	**DOMINGO**
06/04/2026	Actividades realizadas en el municipio de *Viotá*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: San Gabriel 🛠️ Actividad: Se realiza extracción, cargue y traslado de material granular. En horas de la mañana inician actividades las volquetas APA136 y JRF033. 📏 Avance (km): 0.2 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - International - Alquiler - UPT265 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes recebo B400: 2 ⏱️ H. inicial – H. final: 3350 – 3357 📍 Kilometraje inicial - final: 223920 – 224012 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT0420ETPRA00579 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱️ H. inicial – H. final: 15726 – 15733.5 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA

	, 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - APA136 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes recebo B400: 2 ⏱️ H. inicial – H. final: 1075.2 – 1084.2 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - JRF033 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes recebo B400: 2 ⏱️ H. inicial – H. final: 621.6 – 630.7 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
07/04/2026	Actividades realizadas en el municipio de *Viotá*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: San Gabriel 🌦️ Condición climática: Lluvias 🛠️ Actividad: Se realiza extracción, cargue y traslado de material granular. Se dificultan actividades por terreno saturado debido a lluvias en la zona de trabajo. 📏 Avance (km): 0.1 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - International - Alquiler - UPT265 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes recebo B400: 1 ⏱️ H. inicial – H. final: 3357 – 3362 📍 Kilometraje inicial - final: 224012 – 224098 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT0420ETPRA00579 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱️ H. inicial – H. final: 15733.5 – 15743 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - APA136

	(OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes recebo B400: 1 ⏱️ H. inicial – H. final: 1084.2 – 1092.8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - JRF033 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes recebo B400: 1 ⏱️ H. inicial – H. final: 633.7 – 642.5 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
08/04/2026	Actividades realizadas en el municipio de *Viotá*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: San Gabriel 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza extracción, cargue y extendido de material granular. 📏 Avance (km): 0.45 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - International - Alquiler - UPT265 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes recebo B400: 5 ⏱️ H. inicial – H. final: 3362 – 3370 📍 Kilometraje inicial - final: 224098 – 224213 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *RETROEXCAVADORA - JOHN DEERE - Alquiler - T0310GX931253 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱️ H. inicial – H. final: 2600.8 – 2608.6 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - APA136 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes recebo B400: 5

	⏱ H. inicial – H. final: 1092.9 – 1101.1 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - JRF033 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes recebo B400: 5 ⏱ H. inicial – H. final: 644.9 – 654.1 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
09/04/2026	Actividades realizadas en el municipio de *Viotá*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: San Gabriel 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Se realiza extracción, cargue y extendido de material granular. En horas de la tarde se culminan actividades por fuertes lluvias en la zona de trabajo. 📏 Avance (km): 0.18 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - International - Alquiler - UPT265 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 3370 – 3370 📍 Kilometraje inicial - final: 224213 – 224213 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: SIN ACTIVIDADES POR INOPERATIVIDAD DEL EQUIPO. , 🔻 *RETROEXCAVADORA - JOHN DEERE - Alquiler - T0310GX931253 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 2608.6 – 2615.4 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - APA136 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes recebo B400: 3 ⏱ H. inicial – H. final: 1101.1 – 1109.9

	⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - JRF033 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes recebo B400: 3 ⏱ H. inicial – H. final: 656.3 – 665.6 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
10/04/2026	Actividades realizadas en el municipio de *Viotá*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: San Gabriel 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Retroexcavadora realiza extracción y extendido de material granular en punto crítico. Volquetas sin actividades por terreno saturado en la entrada al punto de cargue de material granular, impidiendo el acceso de la maquinaria. Finaliza actividades la volqueta APA136 📏 Avance (km): 0.03 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - International - Alquiler - UPT265 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 3383 – 3387 📍 Kilometraje inicial - final: 224596 – 224680 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *RETROEXCAVADORA - JOHN DEERE - Alquiler - T0310GX931253 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 2615.4 – 2624.5 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - APA136 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 1111 – 1120.3 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA

	📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - JRF033 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱️ H. inicial – H. final: 666.7 – 676.1 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
11/04/2026	**SABADO SIN ACTIVIDADES PROGRAMADAS**
12/04/2026	**DOMINGO**
13/04/2026	Actividades realizadas en el municipio de *Viotá*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: San Gabriel 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Se realiza extracción, cargue y extendido de material granular. Se arregla entrada al punto de cargue por dificultad al ingresar debido a terreno saturado. Finaliza actividades la volqueta UPT265 📏 Avance (km): 0.24 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - International - Alquiler - UPT265 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes recebo B400: 3 ⏱️ H. inicial – H. final: 3396 – 3404 📍 Kilometraje inicial - final: 224906 – 225062 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *RETROEXCAVADORA - JOHN DEERE - Alquiler - T0310GX931253 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱️ H. inicial – H. final: 2626 – 2635.1 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - JRF033 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes recebo B400: 4 ⏱️ H. inicial – H. final: 678.1 – 687 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA

	📝 Observaciones: NA
14/04/2026	Actividades realizadas en el municipio de *Viotá*, provincia de *Tequendama*. 🎤 Vereda/Sector: San Gabriel 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Se realiza extracción, cargue y extendido de material granular. Se arregla entrada al punto de cargue por dificultad al ingresar debido a terreno saturado. Se culminan actividades en horas de la tarde por fuertes lluvias en la zona de trabajo. 📏 Avance (km): 0.09 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - JRF033 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes recebo B400: 2 ⏱ H. inicial – H. final: 687.7 – 697 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *RETROEXCAVADORA - JOHN DEERE - Alquiler - T0310GX931253 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 2635.1 – 2644.2 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
15/04/2026	Actividades realizadas en el municipio de *Viotá*, provincia de *Tequendama*. 🎤 Vereda/Sector: San Gabriel 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: No se realizan actividades por fuertes lluvias en la zona de trabajo. 🔻 *RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT0420ETPRA00579 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 2644.2 – 2644.2 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - JRF033 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler

	⏱ H. inicial – H. final: 697 – 704.2 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
16/04/2026	Actividades realizadas en el municipio de *Viotá*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: San Gabriel - Viota 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Retrocargador0579 apoya con el arreglo de la entrada al punto de cargue debido al terreno saturado. Volqueta JRF033 apoya con el retiro de material sobrante que bloqueaba alcantarilla. 📏 Avance (km): 0.06 🔻 *RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT0420ETPRA00579 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 2645 – 2654 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - JRF033 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4 ⏱ H. inicial – H. final: 704.8 – 715.9 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
17/04/2026	Actividades realizadas en el municipio de *Viotá*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: Viota 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: No se realizan actividades por fuertes lluvias en la zona de trabajo. 🔻 *RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT0420ETPRA00579 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 2654 – 2654 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - JRF033

	(OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱️ H. inicial – H. final: 715.9 – 715.9 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
18/04/2026	**SABADO SIN ACTIVIDADES PROGRAMADAS**
19/04/2026	**DOMINGO**
20/04/2026	Actividades realizadas en el municipio de *Viotá*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: San Gabriel 🌦️ Condición climática: Lluvias 🛠️ Actividad: Retroexcavadora0579 apoya con el arreglo de la entrada al punto de cargue, debido al terreno saturado por lluvias. Volqueta JRF033 sin actividades por terreno saturado, impidiendo el acceso al punto de cargue. 📏 Avance (km): 0.03 🔻 *RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT0420ETPRA00579 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱️ H. inicial – H. final: 2654 – 2663 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - JRF033 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱️ H. inicial – H. final: 726.5 – 735.7 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
21/04/2026	Actividades realizadas en el municipio de *Viotá*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: San Gabriel 🌦️ Condición climática: Lluvias 🛠️ Actividad: Retroexcavadora0579 continua con el arreglo de la entrada al punto de cargue. Volqueta JRF033 sin actividades por terreno saturado, impidiendo el acceso al punto de cargue. Se culminan actividades en horas de la tarde por fuertes lluvias en la zona de trabajo. 📏 Avance (km): 0.03

	🔻 *RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT0420ETPRA00579 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱️ H. inicial – H. final: 2663 – 2668 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - JRF033 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱️ H. inicial – H. final: 737.1 – 744.9 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
22/04/2026	Actividades realizadas en el municipio de *Viotá*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: San Gabriel 🌦️ Condición climática: Lluvias 🛠️ Actividad: Retroexcavadora0579 continua con el arreglo de la entrada al punto de cargue. Volqueta JRF033 sin actividades por terreno saturado, impidiendo el acceso al punto de cargue. Se culminan actividades en horas de la tarde por fuertes lluvias en la zona de trabajo. 📏 Avance (km): 0.03 🔻 *RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT0420ETPRA00579 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱️ H. inicial – H. final: 2668 – 2676 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - JRF033 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱️ H. inicial – H. final: 745.3 – 754.4 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
23/04/2026	Actividades realizadas en el municipio de *Viotá*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: San Gabriel - Viota 🌦️ Condición climática: Soleado

	🛠 Actividad: Se realiza cargue, traslado y extendido de material granular. Acopio de material granular. 📏 Avance (km): 0.06 🔻 *RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT0420ETPRA00579 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 2676 – 2686.2 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - JRF033 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 745.3 – 754.4 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA
24/04/2026	Actividades realizadas en el municipio de *Viotá*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: San Gabriel - La Victoria. 🛠 Actividad: Se realiza cargue, traslado y extendido de material granular. Acopio de material granular. 📏 Avance (km): 0.06 🔻 *RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT0420ETPRA00579 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 2686.2 – 2694.5 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - JRF033 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes recebo B400: 2 ⏱ H. inicial – H. final: 767 – 776.1 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
25/04/2026	**SABADO SIN ACTIVIDADES PROGRAMADAS**
26/04/2026	**DOMINGO**
27/04/2026	Actividades realizadas en el municipio de *Viotá*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: San Gabriel - La Victoria.

	🛠 Actividad: Se realiza cargue, traslado y extendido de material granular. Acopio de material granular. En horas de la tarde se traslada volqueta JFR033 a la gran vía - la mesa para apoyar con la emergencia. 📏 Avance (km): 0.06 🔻 *RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT0420ETPRA00579 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 2694.5 – 2703.6 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - JRF033 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes recebo B400: 2 ⏱ H. inicial – H. final: 776.2 – 785.7 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
28/04/2026	Actividades realizadas en el municipio de *Viotá*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: San Gabriel. 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Se realiza traslado y extendido de material granular. Conformación de subrasante. Acopio de material granular. 📏 Avance (km): 0.1 🔻 *RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT0420ETPRA00579 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 2703.6 – 2711.7 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
29/04/2026	Actividades realizadas en el municipio de *Viotá*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: San Gabriel. 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza acopio de material granular. Extendido de material en la entrada del punto de cargue por terreno saturado. 📏 Avance (km): 0.03

	🔻 *RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT0420ETPRA00579 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱️ H. inicial – H. final: 2711.7 – 2719.9 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
30/04/2026	Actividades realizadas en el municipio de *Viotá*, provincia de *Tequendama*. 📍 Vereda/Sector: San Gabriel. 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Se realiza retiro de material sobrante. Limpieza de cunetas y zanjas. 📏 Avance (km): 0.1 🔻 *RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT0420ETPRA00579 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱️ H. inicial – H. final: 2719.9 – 2728.2 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES			
FECHA	**MATERIAL**	**N° DE VIAJES**	**DESCRIPCIÓN**
1/04/2026	0	0	Sin actividades programadas
2/04/2026	0	0	Sin actividades (Día festivo)
3/04/2026	0	0	Sin actividades (Día festivo)
4/04/2026	0	0	Sábado sin actividades
5/04/2026	0	0	Domingo
6/04/2026	RECEBO	6	Soleado
7/04/2026	RECEBO	3	Lluvias en la zona de trabajo
8/04/2026	RECEBO	15	Soleado
9/04/2026	RECEBO	6	Lluvias en la zona de trabajo
10/04/2026	0	0	Lluvias en la zona de trabajo
11/04/2026	0	0	Sábado sin actividades
12/04/2026	0	0	Domingo
13/04/2026	RECEBO	7	Soleado
14/04/2026	RECEBO	2	Lluvias en la zona de trabajo
15/04/2026	0	0	Sin actividades por fuertes lluvias en la zona de trabajo
16/04/2026	SOBRANTE	4	Soleado
17/04/2026	0	0	Sin actividades por fuertes lluvias en la zona de trabajo
18/04/2026	0	0	Sábado sin actividades
19/04/2026	0	0	Domingo
20/04/2026	0	0	Lluvias en la zona de trabajo
21/04/2026	0	0	Lluvias en la zona de trabajo
22/04/2026	0	0	Lluvias en la zona de trabajo
23/04/2026	RECEBO	2	Soleado
24/04/2026	RECEBO	2	Lluvias en la zona de trabajo
25/04/2026	0	0	Sábado sin actividades
26/04/2026	0	0	Domingo
27/04/2026	RECEBO	2	Soleado
28/04/2026	0	0	Lluvias en la zona de trabajo
29/04/2026	0	0	Soleado
30/04/2026	0	0	Soleado
TOTAL		**49**	

6. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA SUBACHOQUE					
FECHA	SECTOR	LONGITUD (KM)	AVANCE (KM)	REPETICIÓN (KM)	DESCRIPCIÓN
1/04/2026	Sin actividades programadas				
2/04/2026	Dia festivo				
3/04/2026	Dia festivo				
4/04/2026	Sabado sin actividades				
5/04/2026	DOMINGO				
6/04/2026	SAN GABRIEL	0,2	0,2	0	Soleado
7/04/2026	SAN GABRIEL	0,1	0,3	0	Lluvias en la zona de trabajo
8/04/2026	SAN GABRIEL	0,45	0,75	0	Soleado
9/04/2026	SAN GABRIEL	0,18	0,93	0	Lluvias en la zona de trabajo
10/04/2026	SAN GABRIEL	0,03	0,96	0	Lluvias en la zona de trabajo
11/04/2026	Sabado sin actividades				
12/04/2026	DOMINGO				
13/04/2026	SAN GABRIEL	0,24	1,2	0	Soleado
14/04/2026	SAN GABRIEL	0,09	1,29	0	Lluvias en la zona de trabajo
15/04/2026	SAN GABRIEL	0	1,29	0	Sin actividades por fuertes lluvias en la zona de trabajo
16/04/2026	SAN GABRIEL - VIOTA	0,06	1,35	0	Soleado
17/04/2026	VIOTA	0	1,35	0	Sin actividades por fuertes lluvias en la zona de trabajo
18/04/2026	Sabado sin actividades				
19/04/2026	DOMINGO				
20/04/2026	SAN GABRIEL	0,03	1,38	0	Lluvias en la zona de trabajo
21/04/2026	SAN GABRIEL	0,03	1,41	0	Lluvias en la zona de trabajo
22/04/2026	SAN GABRIEL	0,03	1,44	0	Lluvias en la zona de trabajo
23/04/2026	SAN GABRIEL - VIOTA	0,06	1,5	0	Soleado
24/04/2026	SAN GABRIEL - LA VICTORIA	0,06	1,56	0	Lluvias en la zona de trabajo
25/04/2026	Sabado sin actividades				
26/04/2026	DOMINGO				
27/04/2026	SAN GABRIEL - LA VICTORIA	0,06	1,62	0	Soleado
28/04/2026	SAN GABRIEL	0,1	1,72	0	Lluvias en la zona de trabajo
29/04/2026	SAN GABRIEL	0,03	1,75	0	Soleado
30/04/2026	SAN GABRIEL	0,1	1,85	0	Soleado
TOTAL			1,85	0	

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	HORAS DE LLUVIA	HORAS DE INOPERATIVIDAD	HORAS EFECTIVAS	DESCRIPCIÓN
1/04/2026				
2/04/2026				
3/04/2026				
4/04/2026				
5/04/2026				
6/04/2026	0	0	7,5	Soleado
7/04/2026	2	0	9,5	Lluvias en la zona de trabajo
8/04/2026	0	0	7,8	Soleado
9/04/2026	3	0	6,8	Lluvias en la zona de trabajo
10/04/2026	2	0	9,1	Lluvias en la zona de trabajo
11/04/2026				
12/04/2026				
13/04/2026	0	0	9,1	Soleado
14/04/2026	2	0	9,1	Lluvias en la zona de trabajo
15/04/2026	6	0	0	Sin actividades por fuertes lluvias en la zona de trabajo
16/04/2026	0	0	9	Soleado
17/04/2026	6	0	0	Sin actividades por fuertes lluvias en la zona de trabajo
18/04/2026				
19/04/2026				
20/04/2026	2	0	9	Lluvias en la zona de trabajo
21/04/2026	3	0	5	Lluvias en la zona de trabajo
22/04/2026	2	0	8	Lluvias en la zona de trabajo
23/04/2026	0	0	10,2	Soleado
24/04/2026	2	0	8,3	Lluvias en la zona de trabajo
25/04/2026				
26/04/2026				
27/04/2026	0	0	9,1	Soleado
28/04/2026	2	0	8,1	Lluvias en la zona de trabajo
29/04/2026	0	0	8,2	Soleado
30/04/2026	0	0	8,3	Soleado
TOTAL	32	0	142,1	

8. MOVILIZACIONES

MOVILIZACIONES VIOTA					
FECHA	**EQUIPO**	**SERIAL**	**OPERADOR**	**ORIGEN**	**DESTINO**
27/04/2026	VOLQUETA	JFR033	MANUEL MALAVER	VIOTA	LA MESA

9. MANTENIMIENTOS





























“No se realizaron mantenimientos en este mes”.


UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025











10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA				ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
PERIODO:	ABRIL				
MUNICIPIO:	VIOTA				
MAQUINA:	VOLQUETA			SERIE	APA136
FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL	VIAJES	DIAS	OBSERVACIÓN
1/04/2026	---	---			
2/04/2026	---	---			
3/04/2026	---	---			
4/04/2026	---	---			
5/04/2026	---	---			
6/04/2026			2	1	INICIO DE ACTIVIDADES
7/04/2026			1	1	LLUVIAS EN LA ZONA DE TRABAJO
8/04/2026			5	1	SOLEADO
9/04/2026			3	1	LLUVIAS EN LA ZONA DE TRABAJO
10/04/2026			0	1	FIN DE ACTIVIDADES
SUBTOTAL MES			11,0	5,0	
TOTAL MES			5		
Firma					
Nombre:	EMILIO STEVENS MORENO		JHAN HANNER HERNANDEZ		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			INSPECTOR ICCU		

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA				ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
PERIODO:	ABRIL				
MUNICIPIO:	VIOTA				
MAQUINA:	VOLQUETA			SERIE	UPT265
FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRAFICO HORÓMETRO FINAL	VIAJES	DIAS	OBSERVACIÓN
6/04/2026			2	1	INICIO DE ACTIVIDADES
7/04/2026			1	1	LLUVIAS EN LA ZONA DE TRABAJO
8/04/2026			5	1	SOLEADO
9/04/2026			0	0	SIN ACTIVIDADES POR INOPERATIVIDAD DEL EQUIPO.
10/04/2026			0	1	LLUVIAS EN LA ZONA DE TRABAJO
11/04/2026			0	0	SIN ACTIVIDADES
12/04/2026			0	0	DOMINGO
13/04/2026			3	1	FIN DE ACTIVIDADES
SUBTOTAL MES			11	5	
TOTAL MES			5		
Firma					
Nombre:	EMILIO STEVENS MORENO		JHAN HANNER HERNANDEZ		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			INSPECTOR ICCU		

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA				ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
OBJETO	**“ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”.**				
PERIODO:	**ABRIL**				
MUNICIPIO:	**VIOTA**				
MAQUINA:	**VOLQUETA**			**SERIE**	**JRF033**
FECHA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL**	**VIAJES**	**DIAS**	**OBSERVACIÓN**
1/04/2026	---	---			---
2/04/2026	---	---			---
3/04/2026	---	---			---
4/04/2026	---	---			---
5/04/2026	---	---			---
6/04/2026			2	1	INICIO DE ACTIVIDADES
7/04/2026			1	1	LLUVIAS EN LA ZONA DE TRABAJO
8/04/2026			5	1	SOLEADO
9/04/2026			3	1	LLUVIAS EN LA ZONA DE TRABAJO
10/04/2026			0	1	SIN ACTIVIDADES POR LLUVIAS
11/04/2026			0	0	SIN ACTIVIDADES POR LLUVIAS
12/04/2026			0	0	DOMINGO
13/04/2026			4	1	SOLEADO
14/04/2026			2	1	LLUVIAS EN LA ZONA DE TRABAJO
15/04/2026			0	1	SIN ACTIVIDADES POR LLUVIAS
16/04/2026			4	1	SOLEADO
17/04/2026			0	1	SIN ACTIVIDADES POR LLUVIAS
18/04/2026			0	1	SIN ACTIVIDADES POR PARTE DE LA ALCALDIA
19/04/2026			0	0	DOMINGO
20/04/2026			0	1	SIN ACTIVIDADES POR TERRENO SATURADO
21/04/2026			0	1	SIN ACTIVIDADES POR TERRENO SATURADO
22/04/2026			0	1	SIN ACTIVIDADES POR TERRENO SATURADO
23/04/2026			2	1	SOLEADO
24/04/2026			2	1	LLUVIAS EN LA ZONA DE TRABAJO
25/04/2026			0	1	SIN ACTIVIDADES POR PARTE DE LA ALCALDIA
26/04/2026			0	0	DOMINGO
27/04/2026			2	1	EN HORASA DE LA TARDE SE TRASLADA A LA GRAN VIA - LA MESA PARA APOYAR CON LA EMERGENCIA
28/04/2026	---	---			---
29/04/2026	---	---			---
30/04/2026	---	---			---
SUBTOTAL MES			**27,0**	**18,0**	
TOTAL MES			**18**		
Firma					
Nombre:	**EMILIO STEVENS MORENO**		**JHAN HANNER HERNANDEZ**		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			**INSPECTOR ICCU**		

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	ABRIL						
MUNICIPIO:	VIOTA						
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA					SERIE	CAT0420ETPRA00579
FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRAFICO HORÓMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	STAND BY	OBSERVACIÓN
1/04/2026			15726	15726	0		NO SE REALIZAN ACTIVIDADES
2/04/2026			15726	15726	0		NO SE REALIZAN ACTIVIDADES (DIA FESTIVO)
3/04/2026			15726	15726	0		NO SE REALIZAN ACTIVIDADES (DIA FESTIVO)
4/04/2026			15726	15726	0		SABADO SIN ACTIVIDADES
5/04/2026			15726	15726	0		DOMINGO
6/04/2026			15726	15733.5	7,5		SOLEADO
7/04/2026			15733.5	15743	9,5		FIN DE ACTIVIDADES
SUBTOTAL MES					17		
TOTAL MES					17		
Firma			Firma				
Nombre:	EMILIO STEVENS MORENO		Nombre:	JHAN HANNER HERNANDEZ			
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			INSPECTOR ICCU				

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA					ICCU
OBJETO	**“ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”.**					
PERIODO:	**ABRIL**					
MUNICIPIO:	**VIOTA**					
MAQUINA:	**RETROEXCAVADORA**				**SERIE**	**T0310GX931253**
FECHA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL**	**HOROMETRO INICIAL**	**HOROMETRO FINAL**	**HORAS**	**STAND BY**	**OBSERVACIÓN**
8/04/2026			2600.8	2608.6	7,8		**INICIO DE ACTIVIDADES**
9/04/2026			2608.6	2615.4	6,8		**LLUVIAS EN LA ZONA DE TRABAJO**
10/04/2026			2615.4	2624.5	9,1		**LLUVIAS EN LA ZONA DE TRABAJO**
11/04/2026			2624.5	2624.5	0		**SABADO SIN ACTIVIDADES**
12/04/2026			2624.5	2624.5	0		**DOMINGO**
13/04/2026			2626	2635.1	9,1		**SOLEADO**
14/04/2026			2635.1	2644.2	9,1		**LLUVIAS EN LA ZONA DE TRABAJO**
15/04/2026			2644.2	2644.2	0		**SIN ACTIVIDADES POR LLUVIAS**
16/04/2026			2645.0	2654.0	9		**SOLEADO**
17/04/2026			2654.0	2654.0	0		**SIN ACTIVIDADES POR LLUVIAS**
18/04/2026			2654.0	2654.0	0		**SIN ACTIVIDADES POR PARTE DE LA ALCALDIA**
19/04/2026			2654.0	2654.0	0		**DOMINGO**
20/04/2026			2654.0	2663.0	9		**LLUVIAS EN LA ZONA DE TRABAJO**
21/04/2026			2663.0	2668.0	5		**LLUVIAS EN LA ZONA DE TRABAJO**
22/04/2026			2668.0	2676.0	8		**LLUVIAS EN LA ZONA DE TRABAJO**
23/04/2026			2676.0	2686.2	10,2		**(2,6 HORAS DE MAS) SOLICITADO POR PARTE DE LA ALCALDIA**
24/04/2026			2686.2	2694.5	8,3		**LLUVIAS EN LA ZONA DE TRABAJO**
25/04/2026			2694.5	2694.5	0		**SIN ACTIVIDADES POR PARTE DE LA ALCALDIA**
26/04/2026			2694.5	2694.5	0		**DOMINGO**
27/04/2026			2694.5	2703.6	9,1		**SOLEADO**
28/04/2026			2703.6	2711.7	8,1		**LLUVIAS EN LA ZONA DE TRABAJO**
29/04/2026			2711.7	2719.9	8,2		**SOLEADO**
30/04/2026			2719.9	2728.2	8,3		**SOLEADO**
SUBTOTAL MES					**125,1**	**7,9**	**HORAS STAND BY**
TOTAL MES					**133**		
Firma			**Firma**				
Nombre:	**EMILIO STEVENS MORENO**		**Nombre:**		**JHAN HANNER HERNANDEZ**		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			**INSPECTOR ICCU**				

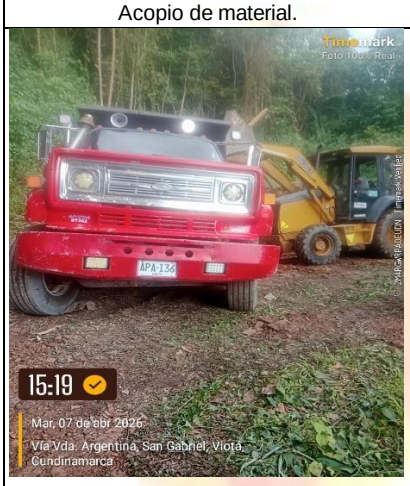
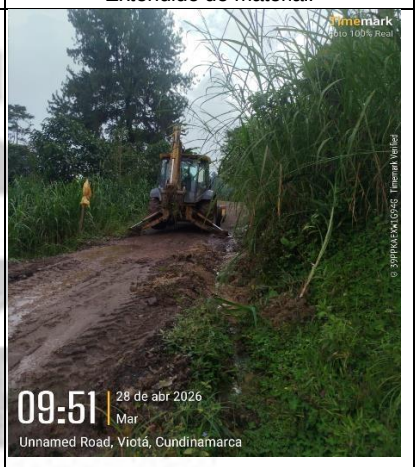
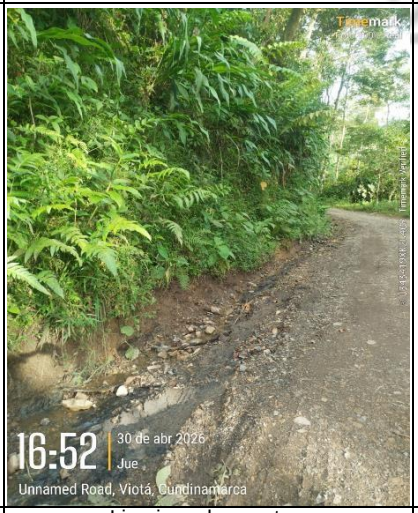
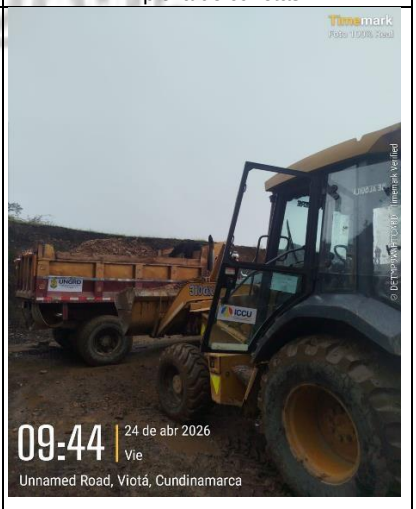
11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Durante el periodo correspondiente a abril, en el municipio de Viotá se ejecutaron actividades de mantenimiento y rehabilitación vial enfocadas principalmente en la selección, cargue, transporte y extendido de material granular, así como en la limpieza de cunetas, zanjas y retiro de material sobrante en sectores críticos de las veredas San Gabriel y La Victoria. Estas intervenciones contribuyeron al mejoramiento progresivo de las condiciones de transitabilidad en la red vial rural.

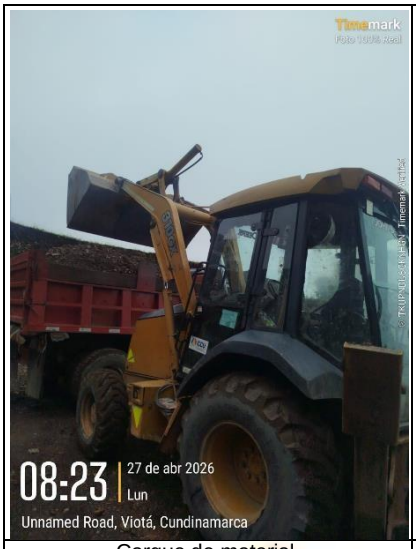
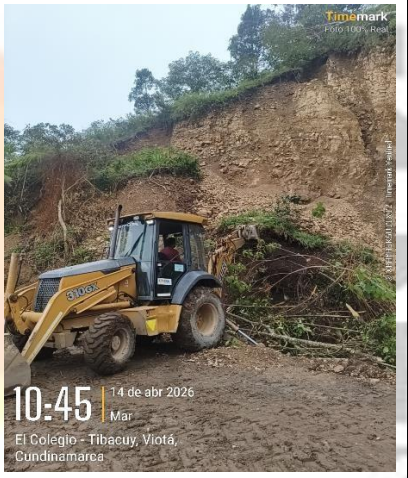
El desarrollo de las actividades estuvo condicionado en gran medida por factores climáticos adversos, especialmente las lluvias constantes que generaron saturación del terreno, limitando el acceso de la maquinaria y reduciendo la operatividad en varios días del mes. A pesar de estas dificultades, se logró un avance aproximado del 84% de las actividades programadas, con un avance de 1,85 Km intervenidos y un total de 49 viajes de material registrado, incluyendo transporte de recebo junto a retiro de material sobrante.

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

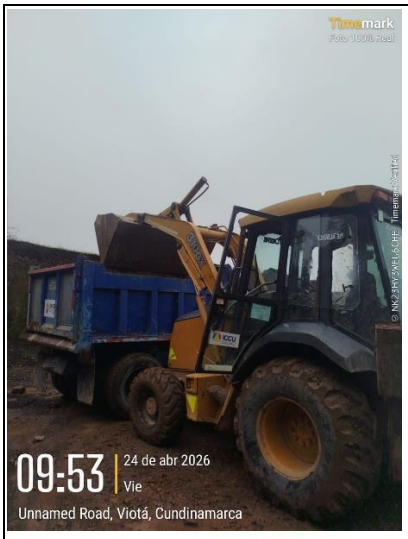
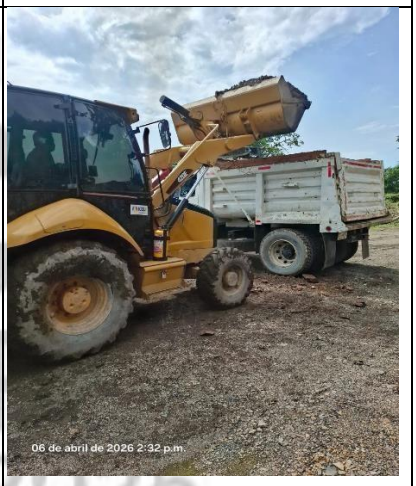
12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Acopio de material.	Extendido de material.	Extendido de material.
		
Cargue de material.	Extendido de material.	Limpieza de cunetas.
		
Extendido de material.	Limpieza de cunetas.	Cargue de material.

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

		
Cargue de material.	Extendido de material.	Retiro de material sobrante.
		
Extendido de material.	Retiro de material sobrante.	Cargue de material.
		
Limpieza de vía.	Cargue de material.	Extendido de material.

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

		
Cargue de material.	Extendido de material.	Retiro de material sobrante.
		
Extendido de material.	Retiro de material sobrante.	Cargue de material.
		
Limpieza de vía.	Cargue de material.	Cargue de material.

		
Cargue de material.	Extendido de material.	Retiro de material sobrante.

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

JHAN HANNER HERNANDEZ
INSPECTOR ICCU

EMILIO STEVENS MORENO
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025
