CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N° 3
PERIODO: ABRIL DEL 2026

PROVINCIA: MEDINA
MUNICIPIO: MEDINA

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA MEDINA
MUNICIPIO DE MEDINA

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia MEDINA:

Municipio: MEDINA:

1. EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT- LBX21005NHHEX2507
2. VOLQUETA SENCILLA INTERNATIONAL - GZM759
3. RETROCARGADOR SOBRE LLANTA JCB - S0R3CXTTAM2936946
4. VIBROCOMPACTADOR INGERSOLL RAND – 146283

Ubicación:

Excavadora sobre orugas – Sector Botadero 4°26'34.95"N 73°18'58.66"W

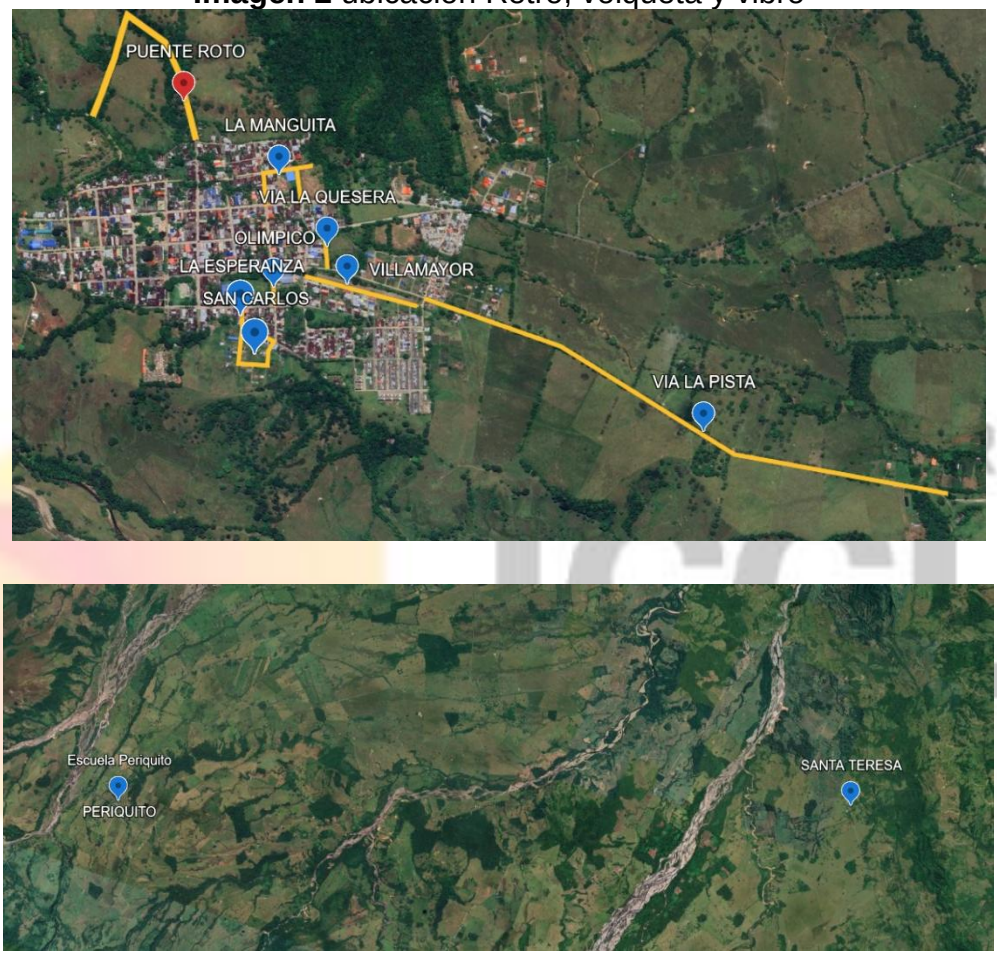
Imagen 1 ubicación Intervención Excavadora sobre Orugas



Fuente: Google earth

Retroexcavadora, Volqueta y Vibrocompactador – Casco Urbano Medina 4°30'24.65"N 73°21'02.15"W / Periquito 4°29'37.72"N 73°24'13.21"W / Santa Teresa 4°23'17.85"N 73°22'01.92"W

Imagen 2 ubicación Retro, volqueta y vibro



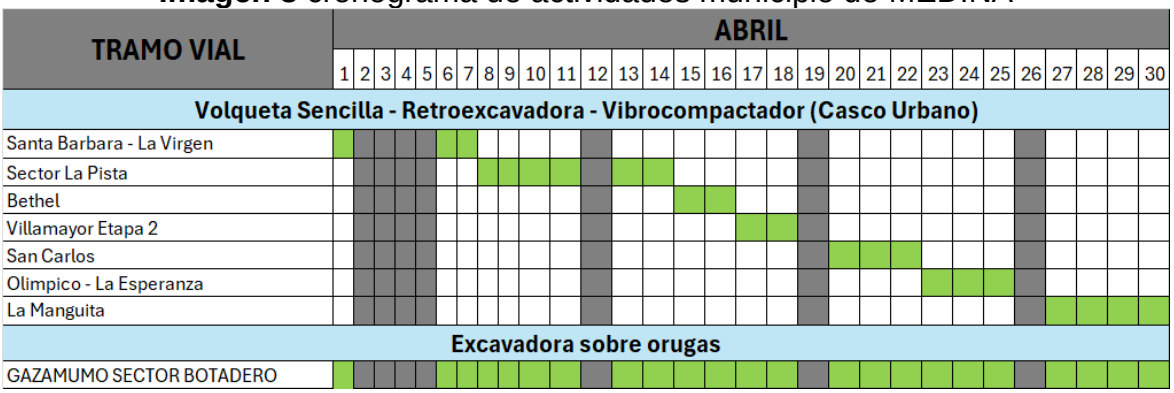
Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	ANDRES MENDEZ
INSPECTOR DE OBRA ICCU	RODRIGO TAVERA
OPERADOR EXCAVADORA 2507	WILMAR URREA
OPERADOR VOLQUETA GZM759	NELSON MORALES
OPERADOR RETROEXCAVADORA 6946	JAIRO TOLOZA
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR 6283	FERNANDO JIMENEZ

3. PLAN DE TRABAJO

Imagen 3 cronograma de actividades municipio de MEDINA



Fuente: Alcaldía de MEDINA

Se cumplió a cabalidad con el 100% del cronograma propuesto por la alcaldía para el mes de abril. Debido a las fuertes lluvias que incrementaron durante este periodo, se tuvo que suspender la intervención dentro del casco urbano y desplazar los equipos a diferentes puntos para realizar remoción de derrumbes sobre la vía departamental hacia San Pedro de Jagua y hacia el Cruce. También se tuvo que apoyar el mantenimiento en sectores como el Periquito y Santa Teresa donde, por lluvias se inhabilitaba el paso dentro de los respectivos caseríos. Por su parte las actividades realizadas por la Excavadora sobre Orugas se centraron únicamente en la construcción de un Jarillón de protección para salvaguardar la integridad de la banca de la vía en el sector El Botadero, avanzando en un 90% de la actividad propuesta y no pudo ser terminada por mantenimiento correctivo al balde y tensora de oruga izquierda.

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

01/04/2026	📍 Vereda/Sector: Sector el Botadero - Casco Urbano 🌦️ Condición climática: Lluvias 🛠️ Actividad: Se realiza actividad de remoción de derrumbes en la vía Puente roto - La virgen. Posterior a ello extiende material cargado por volquetas del municipio e ICCU. Esta última carga 3 viajes. Este trabajo es compactado por el vibro alquilado, Excavadora sobre orugas continúa encausando el río, que por época de invierno se presenta riesgo de socavación banca de vía departamental. Al finalizar la jornada se traslada la retroexcavadora para realizar remoción de derrumbes sobre la vía departamental entre El Cruce y el casco urbano. 📏 Avance (km): 0.8 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936946 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU

	👷 Operador: JAIRO TOLOZA ⏱ H. inicial – H. final: 4110.4 – 4119.5 ⛽ ACPM (gl): 19 | Km tanqueo: 4115.6 ⚠️ Novedades mecánicas: - No le funciona el aire acondicionado - Pendiente arandelas de ajuste equipo trasero - Vidrio inferior puerta operador roto. - Amortiguador de puerta roto. - Guaya del acelerar del equipo trasero reventada, inoperativo balde. - Se requiere cambio de dientes balde 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM759 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NELSON MORALES ⏱ H. inicial – H. final: 4605 – 4616 📍 Kilometraje inicial - final: 58455 – 58609 ⛽ ACPM (gl): 17.777 | Km tanqueo: 58482 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere engrase general del equipo. 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2507 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: WILMAR LOPEZ ⏱ H. inicial – H. final: 7235.6 – 7242.6 ⛽ ACPM (gl): 30 | Km tanqueo: 7235.6 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere base para extintor - Revisar tensora 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - INGERSOLL RAND - Alquiler - 146283 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 11.8 – 16.9
02/04/2026	**JUEVES SANTO NO LABORAL**
03/04/2026	**VIERNES SANTO NO LABORAL**
04/04/2026	**SABADO SANTO NO LABORAL**
05/04/2026	**DOMINGO NO LABORAL**
06/04/2026	📍 Vereda/Sector: Sector el Botadero - Vda El Tablón 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Retroexcavadora continúo realizando actividades de remoción de derrumbes sobre la vía departamental. Mientras tanto volqueta realizó cargue de material para la vereda El Tablón hacia la Pista donde el vibro se encontraba compactando intervenciones de días pasados, avanzando aproximadamente 750 ml.

	Se reparan ganchos del volco que presentaron avería en el transcurso del día. No se contó con ACPM para la excavadora el día de hoy. 📏 Avance (km): 0.75 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936946 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAIRO TOLOZA □ H. inicial – H. final: 4119.5 – 4125.8 ⚠️ Novedades mecánicas: - No le funciona el aire acondicionado - Pendiente arandelas de ajuste equipo trasero - Vidrio inferior puerta operador roto. - Amortiguador de puerta roto. - Guaya del acelerar del equipo trasero reventada, inoperativo balde. - Se requiere cambio de dientes balde , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM759 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NELSON MORALES 🚚 Número de viajes recebo B400: 3 □ H. inicial – H. final: 4616 – 4621 📍 Kilometraje inicial - final: 58609 – 58654 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere engrase general del equipo. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: Se soldaron ganchos de apertura volco , 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2507 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: WILMAR LOPEZ □ H. inicial – H. final: 7242.6 – 7242.6 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere base para extintor - Revisar tensora , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - INGERSOLL RAND - Alquiler - 146283 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler □ H. inicial – H. final: 18.5 – 23.7
07/04/2026	📍 Vereda/Sector: Sector el Botadero - Vda El Tablón - Vía departamental 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Retroexcavadora continúo realizando actividades de remoción de derrumbes sobre la vía departamental, posteriormente realizó conformación vía de

	acceso a sector Gazamumo. Volqueta realizó cargue de combustible y apoyó el acceso en el sector gazamumo. Vibrocompactador continuó actividades en la vereda Tablón avanzando 600 ml. Excavadora sobre orugas continuó con actividad de jarillón y repaleo para desviar río de la banca de vía departamental. 📏 Avance (km): 0.6 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936946 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAIRO TOLOZA ⏱ H. inicial – H. final: 4125.8 – 4132.2 ⛽ ACPM (gl): 40 | Km tanqueo: 4126.5 ⚠️ Novedades mecánicas: - No le funciona el aire acondicionado - Pendiente arandelas de ajuste equipo trasero - Vidrio inferior puerta operador roto. - Amortiguador de puerta roto. - Guaya del acelerar del equipo trasero reventada, inoperativo balde. - Se requiere cambio de dientes balde , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM759 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NELSON MORALES 🚚 Número de viajes recebo B400: 1 ⏱ H. inicial – H. final: 4621 – 4627.9 📍 Kilometraje inicial - final: 58654 – 58764 ⛽ ACPM (gl): 20 | Km tanqueo: 58681 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere engrase general del equipo. , 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2507 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: WILMAR LOPEZ ⏱ H. inicial – H. final: 7242.6 – 7247.8 ⛽ ACPM (gl): 80 | Km tanqueo: 7243.5 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere base para extintor - Revisar tensora , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - INGERSOLL RAND - Alquiler - 146283 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 23.7 – 28.5
08/04/2026	📍 Vereda/Sector: Sector el Botadero - Vda El Tablón - Vía departamental 🛠 Actividad: Se realizó visita por parte de inspector UT, se evidenció actividades de remoción de derrumbe en vía Puente Roto - La Virgen, posteriormente se realizó

	visita al sector La pista, donde se encontró la operación del vibrocompactador avanzando aproximadamente 750 metros. Por su parte volqueta se encontraba cargando material para placahuella en sector Puente Roto. Excavadora continuó actividades de construcción de jarillon en el sector botadero. 📏 Avance (km): 0.75 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936946 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAIRO TOLOZA ⏱ H. inicial – H. final: 4132.2 – 4139.5 ⚠️ Novedades mecánicas: - No le funciona el aire acondicionado - Pendiente arandelas de ajuste equipo trasero - Vidrio inferior puerta operador roto. - Amortiguador de puerta roto. - Guaya del acelerar del equipo trasero reventada, inoperativo balde. - Se requiere cambio de dientes balde , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM759 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NELSON MORALES 🚚 Número de viajes recebo B400: 6 ⏱ H. inicial – H. final: 4627.9 – 4635 📍 Kilometraje inicial - final: 58764 – 58891 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere engrase general del equipo. , 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2507 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: WILMAR LOPEZ ⏱ H. inicial – H. final: 7247.8 – 7255.7 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere base para extintor - Revisar tensora , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - INGERSOLL RAND - Alquiler - 146283 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 29 – 34.2
09/04/2026	📍 Vereda/Sector: Sector el Botadero - Vda El Tablón - Vía departamental 🌦 Condición climática: Lluvias

	🛠️ Actividad: Se presentan fuertes lluvias en la zona. Retroexcavadora realizó retiro de derrumbes sobre la vía departamental desde Medina hacia Gazaduje. Volqueta realiza cargue de material para la Vda Mesa Negra y Vda El Tablón. Vibrocompactador continua compactación en el sector La Pista, Vereda El Tablón y también llevó combustible a la Oruga. Por su parte la Excavadora continua en la construcción de jarillón para encausar el río ya que por fuertes lluvias ha realizado afectación en las actividades adelantadas. 📏 Avance (km): 0.55 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936946 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAIRO TOLOZA ⏱ H. inicial – H. final: 4139.5 – 4145.6 ⚠️ Novedades mecánicas: - No le funciona el aire acondicionado - Pendiente arandelas de ajuste equipo trasero - Vidrio inferior puerta operador roto. - Amortiguador de puerta roto. - Guaya del acelerar del equipo trasero reventada, inoperativo balde. - Se requiere cambio de dientes balde , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM759 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NELSON MORALES 🚚 Número de viajes recebo B400: 3 ⏱ H. inicial – H. final: 4635 – 4641 📍 Kilometraje inicial - final: 58891 – 58961 ⛽ ACPM (gl): 15 | Km tanqueo: 58931 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere engrase general del equipo. , 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2507 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: WILMAR LOPEZ ⏱ H. inicial – H. final: 7255.7 – 7261.4 ⛽ ACPM (gl): 55 | Km tanqueo: 7258.7 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere base para extintor - Revisar tensora , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - INGERSOLL RAND - Alquiler - 146283 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 34.2 – 39.9

10/04/2026	📍 Vereda/Sector: Sector el Botadero - Vda El Tablón - Vía departamental 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Retroexcavadora continuó retirando derrumbes sobre la vía departamental hacia Gazaduje. Se realizó Mantenimiento preventivo de Volqueta GZM759, engrase general dejando al día el equipo y posteriormente cargó un viaje para el casco urbano. Vibrocompactador continuó intervención en la vereda El Tablón sector La Pista y posteriormente se trasladó hacia el sector La Virgen, A partir de la 1pm no se pudo realizar actividades ya que se presentaron fuertes lluvias en el sector. Excavadora continuó reconstruyendo jarillón para protección en el sector El Botadero. 📏 Avance (km): 0.35 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936946 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAIRO TOLOZA ⏱ H. inicial – H. final: 4145.6 – 4152 ⛽ ACPM (gl): 15 | Km tanqueo: 4145.7 ⚠️ Novedades mecánicas: - No le funciona el aire acondicionado - Pendiente arandelas de ajuste equipo trasero - Vidrio inferior puerta operador roto. - Amortiguador de puerta roto. - Guaya del acelerar del equipo trasero reventada, inoperativo balde. - Se requiere cambio de dientes balde , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM759 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NELSON MORALES 🚚 Número de viajes recebo B400: 1 ⏱ H. inicial – H. final: 4641 – 4645 📍 Kilometraje inicial - final: 58961 – 59065 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: Se realizó mantenimiento preventivo y engrase general. 📝 Observaciones: Mantenimiento Preventivo OK , 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2507 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: WILMAR LOPEZ ⏱ H. inicial – H. final: 7261.4 – 7269.5

	⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere base para extintor - Revisar tensora - Cambio de dientes y reparación de balde, fisuras en todo el balde. , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - INGERSOLL RAND - Alquiler - 146283 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler □ H. inicial – H. final: 40 – 44.5 📝 Observaciones: Lluvias fuertes
11/04/2026	📍 Vereda/Sector: Sector Puente Roto 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se inició la jornada, esperando el cargue por parte del municipio para la volqueta. Mientras tanto Retroexcavadora realizó retiro de rocas que obstaculizaban el flujo de agua a una fuente hídrica lo que desviaba el agua sobre la vía. Se realizó conformación del tramo afectado. Oruga no trabajo por falta de ACPM. 📏 Avance (km): 0.3 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936946 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAIRO TOLOZA □ H. inicial – H. final: 4152 – 4159.9 ⚠️ Novedades mecánicas: - No le funciona el aire acondicionado - Pendiente arandelas de ajuste equipo trasero - Vidrio inferior puerta operador roto. - Amortiguador de puerta roto. - Guaya del acelerar del equipo trasero reventada, inoperativo balde. - Se requiere cambio de dientes balde , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM759 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NELSON MORALES 🚚 Número de viajes recebo B400: 1 □ H. inicial – H. final: 4645 – 4647 📍 Kilometraje inicial - final: 59065 – 59095 ⚠️ Novedades mecánicas: Se sale llanta de pacha trasera. El lunes se realiza la montura nuevamente.

	, 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2507 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: WILMAR LOPEZ □ H. inicial – H. final: 7269.5 – 7269.5 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere base para extintor - Revisar tensora - Cambio de dientes y reparación de balde, fisuras en todo el balde.
12/04/2026	**DOMINGO NO LABORAL**
13/04/2026	📍 Vereda/Sector: Sector el Botadero - Vda El Tablón - Vía departamental 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Volqueta amaneció con llanta salida del rin, se procedió con desmontar y corregir con parche, posteriormente se dirigió a recoger ACPM y cargó un viaje de material para el acopio municipal. Mientras tanto Retroexcavadora realizó conformación de material en vereda El Tablón, sector La Pista, junto con el vibrocompactador que realiza la compactación de 500 ml. Excavadora sobre orugas realiza trabajos sobre el rio Gazamumo para protección de banca de vía departamental. 📏 Avance (km): 0.5 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936946 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAIRO TOLOZA □ H. inicial – H. final: 4159.9 – 4164.5 ⛽ ACPM (gl): 10 | Km tanqueo: 4162.9 ⚠️ Novedades mecánicas: - No le funciona el aire acondicionado - Pendiente arandelas de ajuste equipo trasero - Vidrio inferior puerta operador roto. - Amortiguador de puerta roto. - Guaya del acelerar del equipo trasero reventada, inoperativo balde. - Se requiere cambio de dientes balde , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM759 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NELSON MORALES 🚚 Número de viajes recebo B400: 1 □ H. inicial – H. final: 4647 – 4651 📍 Kilometraje inicial - final: 59095 – 59163 ⛽ ACPM (gl): 25 | Km tanqueo: 59097 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere llanta de dirección. Se está usando la de repuesto

	🔧 Intervención mecánica/Repuesto: Se desmonta y repara pinchazo en llanta. , 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2507 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: WILMAR LOPEZ □ H. inicial – H. final: 7269.5 – 7271.9 ⛽ ACPM (gl): 60 | Km tanqueo: 7270.2 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere base para extintor - Revisar tensora - Cambio de dientes y reparación de balde, fisuras en todo el balde. , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - INGERSOLL RAND - Alquiler - 146283 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler □ H. inicial – H. final: 44.5 – 50.6
14/04/2026	📍 Vereda/Sector: Sector el Botadero - Vda El Tablón 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Retroexcavadora inicia cargue de material desde acopio del casco urbano para el sector La Pista, y posteriormente se trasladaron a la pista para realizar retiro de material sobrante de cunetas. Vibrocompactador avanza 700ml en el sector la pista. Excavadora continuó actividades sobre Jarillón en rio Gazamumo. 📏 Avance (km): 0.7 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936946 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAIRO TOLOZA □ H. inicial – H. final: 4164.5 – 4171.4 ⛽ ACPM (gl): 21.001 | Km tanqueo: 4164.5 ⚠️ Novedades mecánicas: - No le funciona el aire acondicionado - Pendiente arandelas de ajuste equipo trasero - Vidrio inferior puerta operador roto. - Amortiguador de puerta roto. - Guaya del acelerar del equipo trasero reventada, inoperativo balde. - Se requiere cambio de dientes balde , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM759 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NELSON MORALES 🚚 Número de viajes recebo B400: 2

	🚚 Número de viajes material sobrante: 8 ⏱ H. inicial – H. final: 4651 – 4658 📍 Kilometraje inicial - final: 59163 – 59199 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere llanta de dirección. Se está usando la de repuesto , 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2507 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: WILMAR LOPEZ ⏱ H. inicial – H. final: 7271.9 – 7279.6 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere base para extintor - Revisar tensora - Cambio de dientes y reparación de balde, fisuras en todo el balde. , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - INGERSOLL RAND - Alquiler - 146283 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 50.6 – 55.8
15/04/2026	📍 Vereda/Sector: Sector el Botadero - Vda El Tablón - Puente Roto - Santa Teresa 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Vibrocompactador realiza intervención del sector La Pista avanzando 850ml aproximadamente. Por su parte volqueta realizó cargue de 3 viajes de material del acopio para La Pista y posteriormente llevar material desde el Sector Gazamumo para la Vereda Santa Teresa 4 viajes y para finalizar la jornada se dirigió a cargar combustible para los equipos. Retroexcavadora realizó conformación en el sector Puente Roto, a su vez la Excavadora sobre Orugas continuó la intervención en el rio Gazamumo para encausar rio Gazamumo y proteger la vía departamental. 📏 Avance (km): 0.99 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936946 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAIRO TOLOZA ⏱ H. inicial – H. final: 4171.4 – 4178.7 ⚠️ Novedades mecánicas: - No le funciona el aire acondicionado - Pendiente arandelas de ajuste equipo trasero - Vidrio inferior puerta operador roto. -

	Amortiguador de puerta roto. - Guaya del acelerar del equipo trasero reventada, inoperativo balde. - Se requiere cambio de dientes balde , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM759 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NELSON MORALES 🚚 Número de viajes recebo B400: 7 □ H. inicial – H. final: 4658 – 4668 📍 Kilometraje inicial - final: 59199 – 59329 ⛽ ACPM (gl): 20 | Km tanqueo: 59301 💧 Urea (Lt): 18.34 | Km tanqueo: 59301 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere llanta de dirección. Se está usando la de repuesto , 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2507 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: WILMAR LOPEZ □ H. inicial – H. final: 7279.6 – 7284.5 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere base para extintor - Revisar tensora - Cambio de dientes y reparación de balde, fisuras en todo el balde. , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - INGERSOLL RAND - Alquiler - 146283 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler □ H. inicial – H. final: 55.8 – 63
16/04/2026	📍 Vereda/Sector: Sector el Botadero - Vda El Tablón - Puente Roto - Santa Teresa 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Volqueta llevó combustible para oruga, se regresó al casco urbano cargado con un viaje de material para el acopio del municipio y luego de ello, realizó el traslado de tubería para la vereda Santa Teresa, a su regreso realizó el cargue de 2 viajes de material tipo recebo para el sector Puente Roto. Por su parte Retroexcavadora cargó las volquetas con material para Santa Teresa y se trasladó al Barrio La Cruz para encausar quebrada que estaba afectando las vías urbanas y viviendas del sector en fuertes lluvias. El Vibrocompactador trabajó en el sector de la quesera compactando vía aperturada para su transitabilidad. Oruga continuó las actividades en el rio Gazamumo. Se presentan lluvias intensas al finalizar la jornada.

	📏 Avance (km): 0.305 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936946 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAIRO TOLOZA □ H. inicial – H. final: 4178.7 – 4185.7 ⛽ ACPM (gl): 25 | Km tanqueo: 4182 ⚠️ Novedades mecánicas: - No le funciona el aire acondicionado - Pendiente arandelas de ajuste equipo trasero - Vidrio inferior puerta operador roto. - Amortiguador de puerta roto. - Guaya del acelerar del equipo trasero reventada, inoperativo balde. - Se requiere cambio de dientes balde , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM759 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NELSON MORALES 🚚 Número de viajes recebo B400: 3 □ H. inicial – H. final: 4668 – 4676 🎈 Kilometraje inicial - final: 59329 – 59436 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere llanta de dirección. Se está usando la de repuesto - Se rompe hoja 5 muelle izquierdo. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: Se lleva llanta por garantía ya que se sale aire por el parche puesto. , 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2507 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: WILMAR LOPEZ □ H. inicial – H. final: 7284.5 – 7291.5 ⛽ ACPM (gl): 40 | Km tanqueo: 7284.5 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere base para extintor - Revisar tensora - Cambio de dientes y reparación de balde, fisuras en todo el balde. , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - INGERSOLL RAND - Alquiler - 146283 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler □ H. inicial – H. final: 63 – 65.5

	📝 Observaciones: Inició 2:30 pm
17/04/2026	📍 Vereda/Sector: Sector el Botadero - Casco Urbano 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Vibrocompactador interviene barrio Villa Yoli, avanzando 150 ml. Oruga carga volquetas para acopio de Medina, retroexcavadora realiza conformación de vías urbanas, la volqueta realiza 3 viajes de material al acopio del casco urbano. Por fuertes y constantes lluvias se realiza cese de actividades en todos los frentes. 📏 Avance (km): 0.255 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936946 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAIRO TOLOZA ⏱ H. inicial – H. final: 4185.7 – 4189.6 ⚠️ Novedades mecánicas: - No le funciona el aire acondicionado - Pendiente arandelas de ajuste equipo trasero - Vidrio inferior puerta operador roto. - Amortiguador de puerta roto. - Guaya del acelerar del equipo trasero reventada, inoperativo balde. - Se requiere cambio de dientes balde , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM759 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NELSON MORALES 🚚 Número de viajes recebo B400: 3 ⏱ H. inicial – H. final: 4676 – 4682 📍 Kilometraje inicial - final: 59436 – 59512 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere llanta de dirección. Se está usando la de repuesto - Se rompe hoja 5 muelle izquierdo. , 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2507 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: WILMAR LOPEZ ⏱ H. inicial – H. final: 7291.5 – 7293.7 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere base para extintor - Revisar tensora - Cambio de dientes y reparación de balde, fisuras en todo el balde.

	, 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - INGERSOLL RAND - Alquiler - 146283 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler □ H. inicial – H. final: 65.5 – 68.7 ⛽ ACPM (gl): 1.8 | Km tanqueo: - 📝 Observaciones: Lluvias fuertes.
18/04/2026	📍 Vereda/Sector: Sector Puente Roto - Alto de la Virgen 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Excavadora presentó perdida de potencia y tablero alertó problema eléctrico por lo que el operador procedió a ubicar y reparar la falla por lo que no se pudo tener actividad durante el día. Retroexcavadora procedió a realizar actividades de remoción de material producto de desprendimiento de banca de vía sobre la vía Puente Roto - Alto de la Virgen. Por su parte operador re volqueta se encuentra en cita médica. Este tiempo se repuso en el transcurso de la semana. 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936946 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAIRO TOLOZA □ H. inicial – H. final: 4189.6 – 4193.2 ⚠️ Novedades mecánicas: - No le funciona el aire acondicionado - Pendiente arandelas de ajuste equipo trasero - Vidrio inferior puerta operador roto. - Amortiguador de puerta roto. - Guaya del acelerar del equipo trasero reventada, inoperativo balde. - Se requiere cambio de dientes balde , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM759 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NELSON MORALES □ H. inicial – H. final: 4682 – 4682 📍 Kilometraje inicial - final: 59512 – 59512 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere llanta de dirección. Se está usando la de repuesto - Se rompe hoja 5 muelle izquierdo. , 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2507 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU

	👷 Operador: WILMAR LOPEZ ⏱ H. inicial – H. final: 7293.7 – 7293.8 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere base para extintor - Revisar tensora - Cambio de dientes y reparación de balde, fisuras en todo el balde. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: Se presenta falla eléctrica. Se repara y queda operativo el equipo , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - INGERSOLL RAND - Alquiler - 146283 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 68.7 – 68.7 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: sábado no laboral
19/04/2026	**DOMINGO NO LABORAL**
20/04/2026	📍 Vereda/Sector: Casco Urbano - Botadero 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Volqueta realizó cargue de ACPM en la EDS, posteriormente se realizó despinche de dos llantas que presentaban perdida de aire y una vez reparadas se procedió a trasladarse para cargar ACPM de Excavadora y cargó un viaje de material para el casco urbano. Por su parte la excavadora sobre orugas continuó conformación de jarillón sobre el río gazamumo para proteger la banca de vía departamental. Vibrocompactador realizó intervención en barrio Villa Yoli avanzando un aproximado de 400ml. Retroexcavadora realizó cargue de volquetas del municipio desde el acopio en el matadero para el casco urbano. 📏 Avance (km): 0.4 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936946 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAIRO TOLOZA ⏱ H. inicial – H. final: 4193.2 – 4199 ⚠️ Novedades mecánicas: - No le funciona el aire acondicionado - Pendiente arandelas de ajuste equipo trasero - Vidrio inferior puerta operador roto. - Amortiguador de puerta roto. - Guaya del acelerar del equipo trasero reventada, inoperativo balde. - Se requiere cambio de dientes balde , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM759 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU

	👷 Operador: NELSON MORALES 🕒 H. inicial – H. final: 4682 – 4685 📍 Kilometraje inicial - final: 59512 – 59578 ⛽ ACPM (gl): 10 | Km tanqueo: 59539 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere llanta de dirección. Se está usando la de repuesto - Se rompe hoja 5 muelle izquierdo. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: Despinchado de dos llantas de tracción, sellado de poros. , 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2507 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: WILMAR LOPEZ 🕒 H. inicial – H. final: 7293.8 – 7296.6 ⛽ ACPM (gl): 35 | Km tanqueo: 7293.8 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere base para extintor - Revisar tensora - Cambio de dientes y reparación de balde, fisuras en todo el balde. , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - INGERSOLL RAND - Alquiler - 146283 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🕒 H. inicial – H. final: 68.7 – 72.9 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: Inicio 10:20 am
21/04/2026	📍 Vereda/Sector: Casco Urbano - Botadero - Pasarela 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Se inicia intervención del Barrio Villa Yoli y Barrio San Carlos con Retroexcavadora, volqueta y vibrocompactador realizando un avance de 450 metros, volqueta lleva un viaje para La Pasarela. Para la excavadora sobre orugas se presenta ruptura de manguera de retorno de motor de traslación, al no tener presión se ajusta de manera provisional y mantienen su operación para construcción de jarillón en rio gazamumo. Al finalizar la jornada se realiza desmonte de balde y tensora para su respectivo traslado a Bogotá en volqueta sencilla. 📏 Avance (km): 0.485 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936946 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAIRO TOLOZA

	□ H. inicial – H. final: 4199 – 4205.7 ⛽ ACPM (gl): 5 | Km tanqueo: 4200.3 ⚠️ Novedades mecánicas: - No le funciona el aire acondicionado - Pendiente arandelas de ajuste equipo trasero - Vidrio inferior puerta operador roto. - Amortiguador de puerta roto. - Guaya del acelerar del equipo trasero reventada, inoperativo balde. - Se requiere cambio de dientes balde , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM759 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NELSON MORALES 🚚 Número de viajes recebo B400: 3 □ H. inicial – H. final: 4685 – 4693 📍 Kilometraje inicial - final: 59578 – 59720 ⛽ ACPM (gl): 40 | Km tanqueo: 59688 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere llanta de dirección. Se está usando la de repuesto - Se rompe hoja 5 muelle izquierdo. , 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2507 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: WILMAR LOPEZ □ H. inicial – H. final: 7296.6 – 7303.3 ⛽ ACPM (gl): 10 | Km tanqueo: 7300 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere base para extintor - Revisar tensora - Cambio de dientes y reparación de balde, fisuras en todo el balde. 📝 Observaciones: Se desmonta balde y tensora para reparación pertinente. , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - INGERSOLL RAND - Alquiler - 146283 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler □ H. inicial – H. final: 72.9 – 79.4
22/04/2026	📍 Vereda/Sector: Casco Urbano - Botadero - Pasarela 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Volqueta realiza traslado a Bogotá para descargar balde y tensora. También realiza recogida de insumos y repuestos para los frentes de trabajo. Por su parte retroexcavadora y vibrocompactador realizan mantenimiento en conjunto con la alcaldía para el barrio San Carlos y La Esperanza con un avance de 850 metros. Se

	realiza visita al frente por inspector UT y verifica actividades. Operador de excavadora desmonta manguera de retorno y lleva a su reparación en Villavicencio. 📏 Avance (km): 0.85 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936946 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAIRO TOLOZA ⏱ H. inicial – H. final: 4205.7 – 4211.9 ⛽ ACPM (gl): 40 | Km tanqueo: 4206.6 ⚠️ Novedades mecánicas: - No le funciona el aire acondicionado - Pendiente arandelas de ajuste equipo trasero - Vidrio inferior puerta operador roto. - Amortiguador de puerta roto. - Guaya del acelerar del equipo trasero reventada, inoperativo balde. - Se requiere cambio de dientes balde , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM759 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NELSON MORALES ⏱ H. inicial – H. final: 4693 – 4707 🎈 Kilometraje inicial - final: 59720 – 60150 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere llanta de dirección. Se está usando la de repuesto - Se rompe hoja 5 muelle izquierdo. 📝 Observaciones: Equipo viaja a Bogotá , 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2507 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: WILMAR LOPEZ ⏱ H. inicial – H. final: 7303.3 – 7303.3 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere base para extintor - Revisar tensora - Cambio de dientes y reparación de balde, fisuras en todo el balde. 📝 Observaciones: Se desmonta manguera de retorno para reparación. , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - INGERSOLL RAND - Alquiler - 146283 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler

	□ H. inicial – H. final: 79.4 – 86
23/04/2026	📍 Vereda/Sector: Casco Urbano - Botadero 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza intervención sobre vías del casco urbano en los barrios La Esperanza, Olímpico, villa mayor etapa 2. Retroexcavadora realiza manejo de drenajes en la Pista. 📏 Avance (km): 0.85 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936946 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAIRO TOLOZA □ H. inicial – H. final: 4211.9 – 4219.3 ⚠️ Novedades mecánicas: - No le funciona el aire acondicionado - Pendiente arandelas de ajuste equipo trasero - Vidrio inferior puerta operador roto. - Amortiguador de puerta roto. - Guaya del acelerar del equipo trasero reventada, inoperativo balde. - Se requiere cambio de dientes balde , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM759 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NELSON MORALES 🚚 Número de viajes recebo B400: 16 □ H. inicial – H. final: 4707 – 4711 📍 Kilometraje inicial - final: 60150 – 60161 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere llanta de dirección. Se está usando la de repuesto - Se rompe hoja 5 muelle izquierdo. , 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2507 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: WILMAR LOPEZ □ H. inicial – H. final: 7303.3 – 7303.3 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere base para extintor - Revisar tensora - Cambio de dientes y reparación de balde, fisuras en todo el balde.

	, 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - INGERSOLL RAND - Alquiler - 146283 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler □ H. inicial – H. final: 86 – 93.7
24/04/2026	📍 Vereda/Sector: Casco Urbano - Santa Teresa 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Se realizó intervención en las vías urbanas del municipio, compactando las intervenciones realizadas en los barrios San Carlos, Olímpico, Villamayor Etapa 2 y la esperanza. Por su parte la volqueta y Retroexcavadora se dirigieron a la vereda Santa Teresa para realizar labores de mantenimiento dentro del caserío, sobre las 4pm se presentaron lluvias. Excavadora continua inoperativa por mantenimiento en el balde y tensora. 📏 Avance (km): 0.85 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936946 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAIRO TOLOZA □ H. inicial – H. final: 4219.3 – 4227.7 ⚠️ Novedades mecánicas: - No le funciona el aire acondicionado - Pendiente arandelas de ajuste equipo trasero - Vidrio inferior puerta operador roto. - Amortiguador de puerta roto. - Guaya del acelerar del equipo trasero reventada, inoperativo balde. - Se requiere cambio de dientes balde , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM759 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NELSON MORALES 🚚 Número de viajes recebo B400: 7 □ H. inicial – H. final: 4711 – 4720 📍 Kilometraje inicial - final: 60161 – 60283 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere llanta de dirección. Se está usando la de repuesto - Se rompe hoja 5 muelle izquierdo. , 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2507 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: WILMAR LOPEZ

	□ H. inicial – H. final: 7303.3 – 7303.3 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere base para extintor - Revisar tensora - Cambio de dientes y reparación de balde, fisuras en todo el balde. , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - INGERSOLL RAND - Alquiler - 146283 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler □ H. inicial – H. final: 93.7 – 98.5
25/04/2026	📍 Vereda/Sector: Casco Urbano 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: No se realizaron actividades, se presentaron lluvias durante toda la noche por lo que se encontraba saturado los sectores a intervenir. La alcaldía no programó actividades. 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936946 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAIRO TOLOZA □ H. inicial – H. final: 4227.7 – 4227.7 ⚠️ Novedades mecánicas: - No le funciona el aire acondicionado - Pendiente arandelas de ajuste equipo trasero - Vidrio inferior puerta operador roto. - Amortiguador de puerta roto. - Guaya del acelerar del equipo trasero reventada, inoperativo balde. - Se requiere cambio de dientes balde , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM759 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NELSON MORALES □ H. inicial – H. final: 4720 – 4720 📍 Kilometraje inicial - final: 60283 – 60283 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere llanta de dirección. Se está usando la de repuesto - Se rompe hoja 5 muelle izquierdo. , 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2507 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: WILMAR LOPEZ

	□ H. inicial – H. final: 7303.3 – 7303.3 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere base para extintor - Revisar tensora - Cambio de dientes y reparación de balde, fisuras en todo el balde. , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - INGERSOLL RAND - Alquiler - 146283 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler □ H. inicial – H. final: 98.5 – 98.5 📝 Observaciones: sábado no laboral
26/04/2026	**DOMINGO NO LABORAL**
27/04/2026	📍 Vereda/Sector: Casco Urbano 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realizó mantenimiento en las vías urbanas del barrio La Manguita. Se realizó recuperación del ancho de vía y aplicación de material tipo fresado. Excavadora continúa inoperativa por mantenimiento en balde y tensora. 📏 Avance (km): 0.45 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936946 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAIRO TOLOZA □ H. inicial – H. final: 4227.7 – 4232.6 ⚠️ Novedades mecánicas: - No le funciona el aire acondicionado - Pendiente arandelas de ajuste equipo trasero - Vidrio inferior puerta operador roto. - Amortiguador de puerta roto. - Guaya del acelerar del equipo trasero reventada, inoperativo balde. - Se requiere cambio de dientes balde , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM759 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NELSON MORALES 🚚 Número de viajes recebo B400: 7 🚚 Número de viajes material sobrante: 1 □ H. inicial – H. final: 4720 – 4724 📍 Kilometraje inicial - final: 60283 – 60294

	⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere llanta de dirección. Se está usando la de repuesto - Se rompe hoja 5 muelle izquierdo. , 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2507 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: WILMAR LOPEZ □ H. inicial – H. final: 7303.3 – 7303.3 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere base para extintor - Revisar tensora - Cambio de dientes y reparación de balde, fisuras en todo el balde. , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - INGERSOLL RAND - Alquiler - 146283 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler □ H. inicial – H. final: 98.5 – 103.6
28/04/2026	📍 Vereda/Sector: Casco Urbano 🛠️ Actividad: Volqueta se desplaza a realizar cambio de llantas pacha izquierda y llanta direccional, hoja No. 5 del muelle izquierdo y topemuelles. Retroexcavadora realiza cargue a volquetas de alcaldía en el acopio del casco urbano y posteriormente realizar cargue desde el sector gazamumo. Vibrocompactador repasó 350 metros sobre las vías del barrio La Manguita. Excavadora continúa inoperativa. 📏 Avance (km): 0.35 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936946 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAIRO TOLOZA □ H. inicial – H. final: 4232.6 – 4240.3 ⚠️ Novedades mecánicas: - No le funciona el aire acondicionado - Pendiente arandelas de ajuste equipo trasero - Vidrio inferior puerta operador roto. - Amortiguador de puerta roto. - Guaya del acelerar del equipo trasero reventada, inoperativo balde. - Se requiere cambio de dientes balde , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM759 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NELSON MORALES □ H. inicial – H. final: 4724 – 4727

	📍 Kilometraje inicial - final: 60294 – 60352 ⛽ ACPM (gl): 39 | Km tanqueo: 60325 ⚠️ Novedades mecánicas: Se requieren baterías 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: Se realiza cambio de llantas, topemuelles y hoja 5. , 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2507 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: WILMAR LOPEZ ⏱ H. inicial – H. final: 7303.3 – 7303.3 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere base para extintor - Revisar tensora - Cambio de dientes y reparación de balde, fisuras en todo el balde. , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - INGERSOLL RAND - Alquiler - 146283 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 103.6 – 107.2 📝 Observaciones: Sin actividades programadas.
29/04/2026	📍 Vereda/Sector: Casco Urbano 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Se presentan fuertes lluvias durante la mañana. Se realiza desplazamiento de Retroexcavadora para realizar mantenimiento y cambio de dientes del balde, durante el recorrido se retiran derrumbes sobre la vía departamental. Volqueta realiza acompañamiento y escolta a la retro. Vibrocompactador inicia actividades sobre las 2:00 pm una vez paró lluvias y oreo el terreno. Oruga continúa inoperativa. 📏 Avance (km): 0.35 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936946 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAIRO TOLOZA ⏱ H. inicial – H. final: 4240.3 – 4244.4 ⛽ ACPM (gl): 31.009 | Km tanqueo: 4244.4 ⚠️ Novedades mecánicas: - No le funciona el aire acondicionado - Pendiente arandelas de ajuste equipo trasero - Vidrio inferior puerta operador roto. -

	Amortiguador de puerta roto. - Guaya del acelerar del equipo trasero reventada, inoperativo balde. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: Cambio de cuchilla balde frontal. Cambio de dientes del balde trasero. Revisión y nivelación de fluidos. , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM759 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NELSON MORALES ⏱ H. inicial – H. final: 4727 – 4730 📍 Kilometraje inicial - final: 60352 – 60415 ⚠️ Novedades mecánicas: Se requieren baterías , 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2507 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: WILMAR LOPEZ ⏱ H. inicial – H. final: 7303.3 – 7303.3 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere base para extintor - Revisar tensora - Cambio de dientes y reparación de balde, fisuras en todo el balde. , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - INGERSOLL RAND - Alquiler - 146283 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 107.3 – 109.9 📝 Observaciones: Lluvias fuertes en la mañana
30/04/2026	📍 Vereda/Sector: Casco Urbano - Vda Periquito 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Retroexcavadora realiza cargue desde el sector Gazamumo, posteriormente se dirige al casco urbano a realizar intervención sobre el sector la pista, avanzando 100m. Por otro lado, vibrocompactador continua actividades en conjunto con la motoniveladora en el barrio La Manguita avanzando 350 metros. Volqueta se dirige a la vereda Periquito para realizar actividades de mantenimiento, cargando 7 viajes. 📏 Avance (km): 0.695

	🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936946 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: JAIRO TOLOZA □ H. inicial – H. final: 4244.4 – 4252.9 ⚠️ Novedades mecánicas: - No le funciona el aire acondicionado - Pendiente arandelas de ajuste equipo trasero - Vidrio inferior puerta operador roto. - Amortiguador de puerta roto. - Guaya del acelerar del equipo trasero reventada, inoperativo balde. , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM759 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NELSON MORALES 🚚 Número de viajes recebo B400: 7 □ H. inicial – H. final: 4730 – 4740 🎈 Kilometraje inicial - final: 60415 – 60552 ⚠️ Novedades mecánicas: Se requieren baterías , 🔹 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2507 (NO OPERATIVA) * 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: WILMAR LOPEZ □ H. inicial – H. final: 7303.3 – 7303.3 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requiere base para extintor - Revisar tensora - Cambio de dientes y reparación de balde, fisuras en todo el balde. , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - INGERSOLL RAND - Alquiler - 146283 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler □ H. inicial – H. final: 110 – 115.6

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

En la siguiente tabla se relacionan los viajes cargados por nuestros equipos y transportados por volquetas propias, del municipio y alquiladas por la comunidad.

RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES			
FECHA	**MATERIAL**	**N° DE VIAJES**	**DESCRIPCIÓN**

1/04/2026	Recebo	3	Sector Puente roto - La Virgen
2/04/2026	JUEVES FESTIVO		
3/04/2026	VIERNES FESTIVO		
4/04/2026	SABADO		
5/04/2026	DOMINGO		
6/04/2026	Recebo	2	Sector La Pista
7/04/2026	Recebo	1	Cargue para acopio casco urbano
8/04/2026	Recebo	6	Cargue a placahuellas y muros
9/04/2026	Recebo	3	La Pista y Mesa Negra
10/04/2026	Recebo	1	Cargue para acopio casco urbano
11/04/2026	Recebo	1	Se carga de Gazamumo para La Pista
12/04/2026	DOMINGO		
13/04/2026	Recebo	1	Cargue del botadero a acopio. Cargue ACPM
14/04/2026	Recebo	2	Cague del acopio a sector La Pista
14/04/2026	Material sobrante	8	Cargue de La Pista a complejo ganadero
15/04/2026	Recebo y Arena	7	3 La Pista - 4 Arena Santa Teresa
16/04/2026	Recebo	3	1 Acopio La Pista - 2 Placa huella Puente Roto
17/04/2026	Recebo	3	1 Gazamumo a acopio y 2 Choapal a acopio
18/04/2026	SABADO		
19/04/2026	DOMINGO		
20/04/2026	Recebo	1	Gazamumo al casco urbano.
21/04/2026	Recebo	3	1 pasarela y 2 Casco urbano.
22/04/2026		0	Viaje a Bogotá por parte de la volqueta
23/04/2026	Recebo	16	Cargue para el casco urbano
24/04/2026	Recebo	7	Santa Teresa
25/04/2026	SABADO		
26/04/2026	DOMINGO		
27/04/2026	Recebo	7	Barrio La Manguita
27/04/2026	Material sobrante	1	Recuperación calzada
28/04/2026		0	Mantenimiento del equipo
29/04/2026		0	Escolta Retroexcavadora
30/04/2026	Recebo	7	Sector Periquito
TOTAL		**83**	

6. AVANCE EN CAMPO (M)

El avance en campo se vio poco afectado por lluvias e inoperatividad de equipos.

AVANCE DE OBRA				
FECHA	**LONGITUD (M)**	**AVANCE (M)**	**REPETICIÓN (M)**	**DESCRIPCIÓN**
1/04/2026	**800**	**800**	**0**	Sector La Virgen - Lluvias fuertes
2/04/2026	JUEVES FESTIVO			
3/04/2026	VIERNES FESTIVO			
4/04/2026	SABADO			
5/04/2026	DOMINGO			
6/04/2026	**750**	**1.550**	**0**	Sector La Pista - Lluvias intermitentes
7/04/2026	**600**	**2.150**	**0**	Sector La Pista
8/04/2026	**750**	**2.900**	**0**	Sector La Pista
9/04/2026	**550**	**3.450**	**0**	Sector La Pista
10/04/2026	**350**	**3.800**	**0**	Sector La Pista
11/04/2026	**300**	**4.100**	**0**	Sector La Virgen
12/04/2026	DOMINGO			
13/04/2026	**500**	**4.600**	**0**	Sector La Pista
14/04/2026	**700**	**5.300**	**0**	Sector La Pista
15/04/2026	**990**	**6.290**	**0**	Sector La Pista - Santa Teresa
16/04/2026	**305**	**6.595**	**0**	Vía La Quesera - Puente Roto
17/04/2026	**255**	**6.850**	**0**	Barrio Villa Yoli
18/04/2026	**-**	**6.850**	**0**	Remoción derrumbe
19/04/2026	DOMINGO			
20/04/2026	**400**	**7.250**	**0**	Barrio Villa Yoli
21/04/2026	**485**	**7.735**	**0**	Barrio San Carlos
22/04/2026	**850**	**8.585**	**0**	Barrio Olímpico y La Esperanza
23/04/2026	**850**	**9.435**	**0**	Barrio olímpico, La Esperanza y Villa mayor
24/04/2026	**850**	**10.285**	**0**	Casco Urbano y Santa Teresa
25/04/2026	**-**	**10.285**	**0**	Terrenos saturados
26/04/2026	DOMINGO			
27/04/2026	**450**	**10.735**	**0**	Barrio La Manguita
28/04/2026	**350**	**11.085**	**0**	Barrio La Manguita
29/04/2026	**350**	**11.435**	**0**	Barrio La Manguita
30/04/2026	**695**	**12.130**	**0**	Barrio La Manguita - Vda Periquito - La Pista
TOTAL	**12.130**	**12.130**	**0**	

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

Para la siguiente tabla se tuvo en cuenta las horas lluvias que impidieron ejecutar actividades. Se presentaron lluvias intensas durante y fuera de la jornada de trabajo que impedían la continua ejecución de actividades. Las lluvias aumentaron con respecto al periodo anterior.

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**HORAS DE LLUVIA**	**HORAS DE INOPERATIVIDAD**	**HORAS EFECTIVAS**	**DESCRIPCIÓN**
1/04/2026	**2**	**-**	**7**	Lluvias fuertes
2/04/2026	JUEVES FESTIVO			
3/04/2026	VIERNES FESTIVO			
4/04/2026	SABADO			
5/04/2026	DOMINGO			
6/04/2026	**-**	**-**	**8**	Lluvias fuertes
7/04/2026	**-**	**-**	**8**	Terreno saturado - Nublado
8/04/2026	**-**	**-**	**8**	Terreno saturado - Soleado
9/04/2026	**3**	**-**	**5**	Lluvias fuertes
10/04/2026	**4**	**-**	**4**	Lluvias fuertes
11/04/2026	**-**		**4**	Nublado
12/04/2026	DOMINGO			
13/04/2026	**-**	**-**	**8**	Soleado
14/04/2026	**-**	**-**	**8**	Soleado
15/04/2026	**-**	**-**	**8**	Soleado
16/04/2026	**-**	**-**	**8**	Nublado
17/04/2026	**2**	**-**	**6**	Lluvias
18/04/2026	**-**		**4**	Soleado
19/04/2026	DOMINGO			
20/04/2026	**-**	**-**	**8**	Soleado
21/04/2026	**-**	**-**	**8**	Soleado
22/04/2026	**1**	**-**	**7**	Soleado
23/04/2026	**2**	**-**	**6**	Soleado
24/04/2026	**1**	**-**	**7**	Lluvias fuertes
25/04/2026	**-**	**-**	**4**	Nublado
26/04/2026	DOMINGO			

27/04/2026	-	-	9	Soleado
28/04/2026	-	-	9	Soleado
29/04/2026	4	-	5	Lluvias fuertes
30/04/2026	-	-	9	Soleado
TOTAL	**19**	**0**	**158**	

8. MOVILIZACIONES

Se realizó movilización a la ciudad de Bogotá de Volqueta y su respectivo retorno.

MOVILIZACIONES					
FECHA	**EQUIPO**	**SERIAL**	**OPERADOR**	**ORIGEN**	**DESTINO**
22/04/2026	VOLQUETA SENCILLA	GZM759	NELSON MORALES	MEDINA	BOGOTÁ - RETORNO

9. MANTENIMIENTOS

Se presentaron diferentes novedades en el frente de trabajo, sin embargo, se resalta la oportuna atención que no superó 2 días un equipo inoperativo, exceptuando el mantenimiento correctivo del balde de excavadora sobre oruga que se encuentra en ejecución. A su vez, los mantenimientos preventivos se realizaron de manera oportuna.

MANTENIMIENTOS			
FECHA	**EQUIPO**	**SERIAL**	**DESCRIPCIÓN**
6/04/2026	Volqueta	GZM759	Soldadura de ganchos de volco
10/04/2026	Volqueta	GZM759	Mantenimiento Preventivo - Engrase General
13/04/2026	Volqueta	GZM759	Despinche llanta
16/04/2026	Volqueta	GZM759	Garantía - despinche llanta
18/04/2026	Excavadora sobre orugas	LBX21005NHHEX2507	Solución de problema eléctrico en equipo
20/04/2026	Volqueta	GZM759	Despinche llantas de tracción. Reparación poros llantas
22/04/2026	Excavadora sobre orugas	LBX21005NHHEX2507	Fabricación manguera de retorno motor de traslación
28/04/2026	Volqueta	GZM759	Cambio de pacha izquierda y llanta de dirección por nuevas. Cambio de hoja 5 rota y cambio de topemuelles

29/04/2026	Retroexcavadora	S0R3CXTTAM2936946	Cambio de cuchilla, dientes y revisión y nivelación de fluidos

10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

En las siguientes tablas se relaciona equipo a equipo su actividad mensual y consumos presentados durante este periodo.

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BÁSICOS					
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS PARA LA ATENCIÓN DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
MUNICIPIO:	Medina	**PROVINCIA:**	Medina	**PERIODO:**	01/04/2026 – 30/04/2026
MÁQUINA:	RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936946			**SERIE:**	2936946

CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				OPERATIVA	OBSERVACIONES
FECHA	**H. INICIAL**	**H. FINAL**	**HORAS**	**ACPM (GLS)**	**HORÓMETRO/ KM TANQUEO**	**RENDIMIENTO**	**No. TIRILLA**	**UREA (Litros)**	**HOROMETRO TRANQUEO**	**RENDIMIENTO**	**No. TIRILLA**		
01/04/2026	4,110.40	4,119.50	9.10	19.000	4,115.6	1.90	INV1376			0.00		SI	
06/04/2026	4,119.50	4,125.80	6.30			0.00				0.00		SI	
07/04/2026	4,125.80	4,132.20	6.40	40.000	4,126.5	3.67	INV146			0.00		SI	
08/04/2026	4,132.20	4,139.50	7.30			0.00				0.00		SI	
09/04/2026	4,139.50	4,145.60	6.10			0.00				0.00		SI	
10/04/2026	4,145.60	4,152.00	6.40	15.000	4,145.7	0.78	INV1044			0.00		SI	
11/04/2026	4,152.00	4,159.90	7.90			0.00				0.00		SI	
13/04/2026	4,159.90	4,164.50	4.60	10.000	4,162.9	0.58	INV1045			0.00		SI	
14/04/2026	4,164.50	4,171.40	6.90	21.001	4,164.5	13.13	INV395			0.00		SI	
15/04/2026	4,171.40	4,178.70	7.30			0.00				0.00		SI	
16/04/2026	4,178.70	4,185.70	7.00	25.000	4,182.0	1.43	INV536			0.00		SI	
17/04/2026	4,185.70	4,189.60	3.90			0.00				0.00		SI	
18/04/2026	4,189.60	4,193.20	3.60			0.00				0.00		SI	
20/04/2026	4,193.20	4,199.00	5.80			0.00				0.00		SI	
21/04/2026	4,199.00	4,205.70	6.70	5.000	4,200.3	0.27	ASUME ALCALDIA			0.00		SI	
22/04/2026	4,205.70	4,211.90	6.20	40.000	4,206.6	6.35	INV755			0.00		SI	
23/04/2026	4,211.90	4,219.30	7.40			0.00				0.00		SI	
24/04/2026	4,219.30	4,227.70	8.40			0.00				0.00		SI	
25/04/2026	4,227.70	4,227.70	0.00			0.00				0.00		SI	
27/04/2026	4,227.70	4,232.60	4.90			0.00				0.00		SI	
28/04/2026	4,232.60	4,240.30	7.70			0.00				0.00		SI	
29/04/2026	4,240.30	4,244.40	4.10	31.009	4,244.4	0.82	INV1097			0.00		SI	Cambio de cuchilla balde frontal. Cambio de dientes del balde trasero. Revisión y nivelación de fluidos.
30/04/2026	4,244.40	4,252.90	8.50									SI	
TOTAL MES			**142.5**	**206.010**		**1.45**		**0**					

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BÁSICOS													
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS PARA LA ATENCIÓN DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.												
MUNICIPIO:	Medina			**PROVINCIA:**	Medina				**PERIODO:**	01/04/2026 – 30/04/2026			
MÁQUINA:	VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM759								**SERIE:**	GZM759			


CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				OPERATIVA	OBSERVACIONES
FECHA	H. INICIAL	H. FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HORÓMETRO/ KM TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA (Litros)	HOROMETRO TRANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA		
01/04/2026	4,605.00	4,616.00	11.00	17.777	58,482.0	6.30	INV1377			0.00		SI	
06/04/2026	4,616.00	4,621.00	5.00			0.00				0.00		SI	Soldadura en ganchos de apertura volco
07/04/2026	4,621.00	4,627.90	6.90	20.000	58,681.0	9.95	INV147			0.00		SI	
08/04/2026	4,627.90	4,635.00	7.10			0.00				0.00		SI	
09/04/2026	4,635.00	4,641.00	6.00	15.000	58,931.0	16.67	INV1042			0.00		SI	
10/04/2026	4,641.00	4,645.00	4.00			0.00				0.00		SI	Mantenimiento Preventivo OK
11/04/2026	4,645.00	4,647.00	2.00			0.00				0.00		SI	
13/04/2026	4,647.00	4,651.00	4.00	25.000	59,097.0	6.64	INV397 - INV1043			0.00		SI	Se pincha llanta, se repara y queda operativa.
14/04/2026	4,651.00	4,658.00	7.00			0.00				0.00		SI	
15/04/2026	4,658.00	4,668.00	10.00	20.000	59,301.0	10.20	INV537	18.340	59,301.0	1.45	INV530	SI	
16/04/2026	4,668.00	4,676.00	8.00			0.00				0.00		SI	
17/04/2026	4,676.00	4,682.00	6.00			0.00				0.00		SI	
18/04/2026	4,682.00	4,682.00	0.00			0.00				0.00		SI	
20/04/2026	4,682.00	4,685.00	3.00	10.000	59,539.0	23.80	INV705			0.00		SI	Despinchado de dos llantas de tracción, sellado de poros.
21/04/2026	4,685.00	4,693.00	8.00	40.000	59,688.0	3.73	INV757			0.00		SI	
22/04/2026	4,693.00	4,707.00	14.00			0.00				0.00		SI	Equipo viaja a Bogotá
23/04/2026	4,707.00	4,711.00	4.00			0.00				0.00		SI	
24/04/2026	4,711.00	4,720.00	9.00			0.00				0.00		SI	
25/04/2026	4,720.00	4,720.00	0.00			0.00				0.00		SI	
27/04/2026	4,720.00	4,724.00	4.00			0.00				0.00		SI	
28/04/2026	4,724.00	4,727.00	3.00	39.000	60,325.0	16.33	INV1049			0.00		SI	Se realiza cambio de llantas, topemuelles y hoja 5.
29/04/2026	4,727.00	4,730.00	3.00			0.00				0.00		SI	
30/04/2026	4,730.00	4,740.00	10.00									SI	
TOTAL MES			**135**	**186.777**		**10.91**		**18.34**					

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM





UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BÁSICOS													
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS PARA LA ATENCIÓN DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.												
MUNICIPIO:	Medina			**PROVINCIA:**	Medina					**PERIODO:**	01/04/2026 – 30/04/2026		
MÁQUINA:	EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LINK BELT - ICCU - LBX210Q5NHHEX2507									**SERIE:**	LBX210Q5NHHEX2507		
CONTROL HORARIO				**ACPM**				**UREA**				**OPERATIVA**	**OBSERVACIONES**
FECHA	**H. INICIAL**	**H. FINAL**	**HORAS**	**ACPM (GLS)**	**HORÓMETRO/ KM TANQUEO**	**RENDIMIENTO**	**No. TIRILLA**	**UREA (Litros)**	**HOROMETRO TRANQUEO**	**RENDIMIENTO**	**No. TIRILLA**		
01/04/2026	7,235.60	7,242.60	7.00	30.000	7,235.6	2.54	INV1375			0.00		SI	
06/04/2026	7,242.60	7,242.60	0.00			0.00				0.00		SI	Sin ACPM para laborar
07/04/2026	7,242.60	7,247.80	5.20	80.000	7,243.5	10.13	INV145			0.00		SI	
08/04/2026	7,247.80	7,255.70	7.90			0.00				0.00		SI	
09/04/2026	7,255.70	7,261.40	5.70	55.000	7,258.7	3.62	INV1048			0.00		SI	
10/04/2026	7,261.40	7,269.50	8.10			0.00				0.00		SI	
11/04/2026	7,269.50	7,269.50	0.00			0.00				0.00		SI	Sin ACPM para laborar
13/04/2026	7,269.50	7,271.90	2.40	60.000	7,270.2	5.22	INV394			0.00		SI	
14/04/2026	7,271.90	7,279.60	7.70			0.00				0.00		SI	
15/04/2026	7,279.60	7,284.50	4.90			0.00				0.00		SI	
16/04/2026	7,284.50	7,291.50	7.00	40.000	7,284.5	2.80	INV534			0.00		SI	
17/04/2026	7,291.50	7,293.70	2.20			0.00				0.00		SI	
18/04/2026	7,293.70	7,293.80	0.10			0.00				0.00		SI	Falla eléctrica. Se solucionó y quedó operativo.
20/04/2026	7,293.80	7,296.60	2.80	35.000	7,293.8	3.76	INV704			0.00		SI	
21/04/2026	7,296.60	7,303.30	6.70	10.000	7,300.0	1.61	ASUME ALCALDIA			0.00		SI	Se desmonta balde y tensora para reparación pertinente.
22/04/2026	7,303.30	7,303.30	0.00			0.00				0.00		NO	Se desmonta manguera de retorno para reparación.
23/04/2026	7,303.30	7,303.30	0.00			0.00				0.00		NO	
24/04/2026	7,303.30	7,303.30	0.00			0.00				0.00		NO	
25/04/2026	7,303.30	7,303.30	0.00			0.00				0.00		NO	
27/04/2026	7,303.30	7,303.30	0.00			0.00				0.00		NO	
28/04/2026	7,303.30	7,303.30	0.00									NO	
29/04/2026	7,303.30	7,303.30	0.00			0.00				0.00		NO	
30/04/2026	7,303.30	7,303.30	0.00									NO	
TOTAL MES			**67.7**	**310.000**		**4.35**		**0**					

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
OBJETO	**"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".**						
PERIODO:	**ABRIL**						
MUNICIPIO:	**MEDINA CUNDINAMARCA**						
MAQUINA:	**VIBROCOMPACTADOR - INGERSOLL RAND**					**SERIE**	**146283**
FECHA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL**	**HOROMETRO INICIAL**	**HOROMETRO FINAL**	**HORAS**	**STAND BY**	**OBSERVACIÓN**
1/04/2026			11,80	16,90	5,1	-	Sector Puente Roto
2/04/2026	JUEVES SANTO NO LABORAL		16,90	16,90	-	-	
3/04/2026	VIERNES SANTO NO LABORAL		16,90	16,90	-	-	
4/04/2026	SABADO SANTO NO LABORAL		16,90	16,90	-	-	
5/04/2026	DOMINGO NO LABORAL		16,90	16,90	-	-	
6/04/2026			18,50	23,70	5,2	-	Sector La Pista




UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

7/04/2026			23,70	28,50	4,8	-	Sector Puente Roto
8/04/2026			29,00	34,20	5,2	-	Sector La Pista
9/04/2026			34,20	39,90	5,7	-	Sector La Pista
10/04/2026			40,00	44,50	4,5	0,50	Lluvias fuertes. Sector La Pista
11/04/2026	SABADO NO LABORAL		44,50	44,50	-	-	
12/04/2026	DOMINGO NO LABORAL		44,50	44,50	-	-	
13/04/2026			44,50	50,60	6,1	-	Sector La Pista
14/04/2026			50,60	55,80	5,2	-	Sector La Pista

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025



CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3




15/04/2026			55,80	63,00	7,2	-	Sector La Pista
16/04/2026			63,00	65,50	2,5	-	Inició 2:30 pm
17/04/2026			65,50	68,70	3,2	1,80	Lluvias fuertes. Br Villa Yoli
18/04/2026	SABADO NO LABORAL		68,70	68,70	-	-	
19/04/2026	DOMINGO NO LABORAL		68,70	68,70	-	-	
20/04/2026			68,70	72,90	4,2	-	Inicio 10:20 am

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

21/04/2026			72,90	79,40	6,5	-	
22/04/2026			79,40	86,00	6,6	-	
23/04/2026			86,00	93,70	7,7	-	
24/04/2026			93,70	98,50	4,8		Olímpico, Villa Mayor 2, San Carlos
25/04/2026	SABADO NO LABORAL		98,50	98,50	-		
26/04/2026	DOMINGO NO LABORAL		98,50	98,50	-		

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

27/04/2026			98,50	103,60	5,1	-	La Manguita
28/04/2026			103,60	107,20	3,6	1,40	Sin actividades programadas. La Manguita
29/04/2026			107,30	109,90	2,6	2,40	Lluvias fuertes en la mañana
30/04/2026			110,00	115,60	5,6	-	
SUBTOTAL MES					**101,4**	**6,1**	
TOTAL MES					**107,5**		

11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Una vez presentada la información del frente de trabajo para el periodo en cuestión, me permito concluir que;

1. Durante el período reportado se intervinieron 12.13 km de vías en el municipio, principalmente en dentro del casco urbano donde se atendieron las vías del sector La Pista, Santa Barbara – La Virgen, Olímpico, La Manguita, La Esperanza, San Carlos. También se prestó apoyo a las veredas Periquito y Santa Teresa.

2. La maquinaria asignada al frente de trabajo se mantuvo operativa para el desarrollo de las actividades programadas, donde se resalta que la inoperatividad de los equipos no superó 2 días. Se excluye la Excavadora sobre orugas que se mantiene operativa desde el 22 de abril ya que el balde presenta una serie de afectaciones que no pudieron ser reparadas de manera local por lo que fue necesario llevar hasta proveedor en Bogotá.

3. Hubo incremento de lluvias durante la jornada laboral que imposibilitaban la continua operación. Adicionalmente durante algunas noches se presentaban lluvias intensas que, en la mañana retrasaba el inicio de actividades por presentarse saturación del terreno.

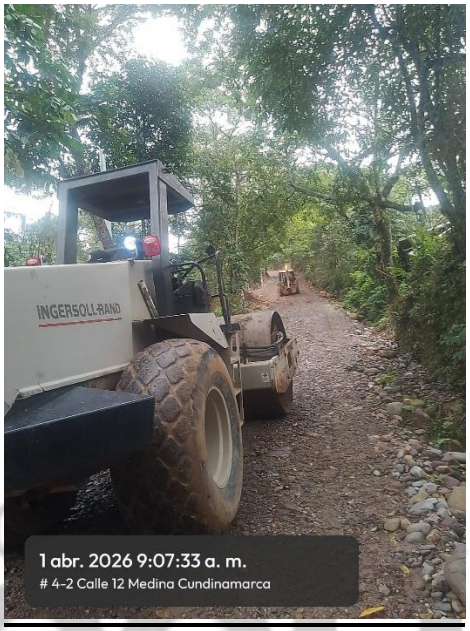
4. El consumo de combustible registrado se encuentra dentro de los rangos óptimos de operación para cada equipo de acuerdo a las condiciones del terreno, indicando así un correcto uso de los recursos del contrato.

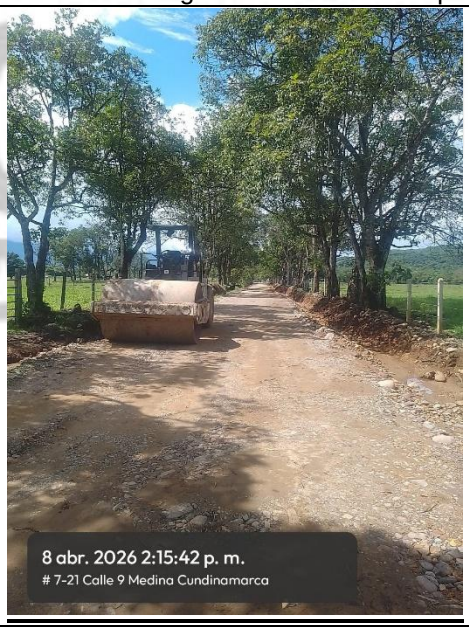
5. Las intervenciones realizadas permitieron mejorar la transitabilidad y atender puntos críticos de la red vial intervenida, beneficiando la conectividad entre el casco urbano y sectores rurales como Choapal, La Pista, La Bocatoma y San Pedro de Jagua.

6. Se resalta el trabajo articulado entre la administración municipal, la comunidad y el contratista a pesar de las fallas mecánicas de la maquinaria de las partes.

7. Se identificaron requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivos en algunos equipos, necesarios para garantizar la continuidad operativa. Por lo cual se dará seguimiento a los mismos.

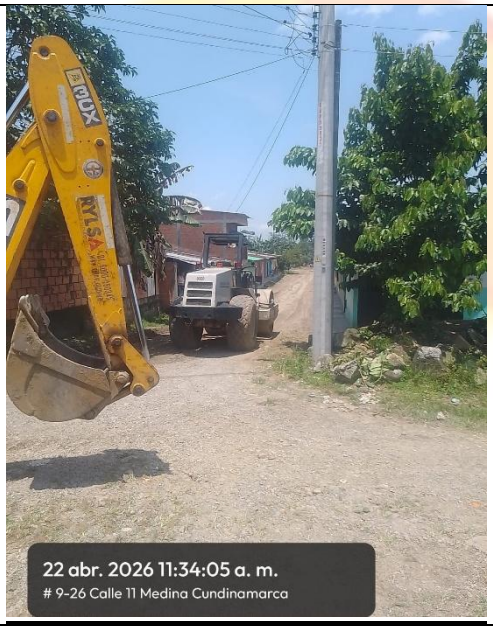
12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Remoción derrumbes sector Santa Barbara – La Virgen	Compactación material sector Santa Barbara – La Virgen
	
Descargue material para mantenimiento de vía sector Santa Barbara – La Virgen	Conformación de Jarillón de protección a la banca de vía departamental

	
Descargue material para mantenimiento vía Sector La Pista.	Mantenimiento a ganchos de volcó volqueta
	
Suministro combustible en campo	Compactación material sector La Pista.

	
Lluvias en la zona que impiden continuidad en las labores	Remoción de derrumbes sobre vía departamental.
	
Mantenimiento preventivo a volqueta dentro de los tiempos.	Remoción de derrumbes sobre vía departamental hacia San Pedro de Jagua

	
Lluvias en el sector, aumenta deslizamientos sobre vía departamental	Cargue material sobrante producto de descoles y drenajes
	
Construcción de Jarillón de protección para banca de vía departamental.	Inicio actividades de compactación vibrocompactador alquilado en barrio Villa Yoli.

	
Reparación de pinchada llanta pacha izquierda	Retiro de balde y tensora para mantenimiento correctivo en Bogotá.
	
Intervención barrio Olímpico Y San Carlos	Cargue material de acopio municipal para intervención de vías casco urbano.

RODRIGO TAVERA
INSPECTOR ICCU

ANDRES MENDEZ
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°3
PERIODO: ABRIL DEL 2026

PROVINCIA: MEDINA
MUNICIPIO: PARATEBUENO

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA MEDINA
MUNICIPIO DE PARATEBUENO

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia MEDINA:

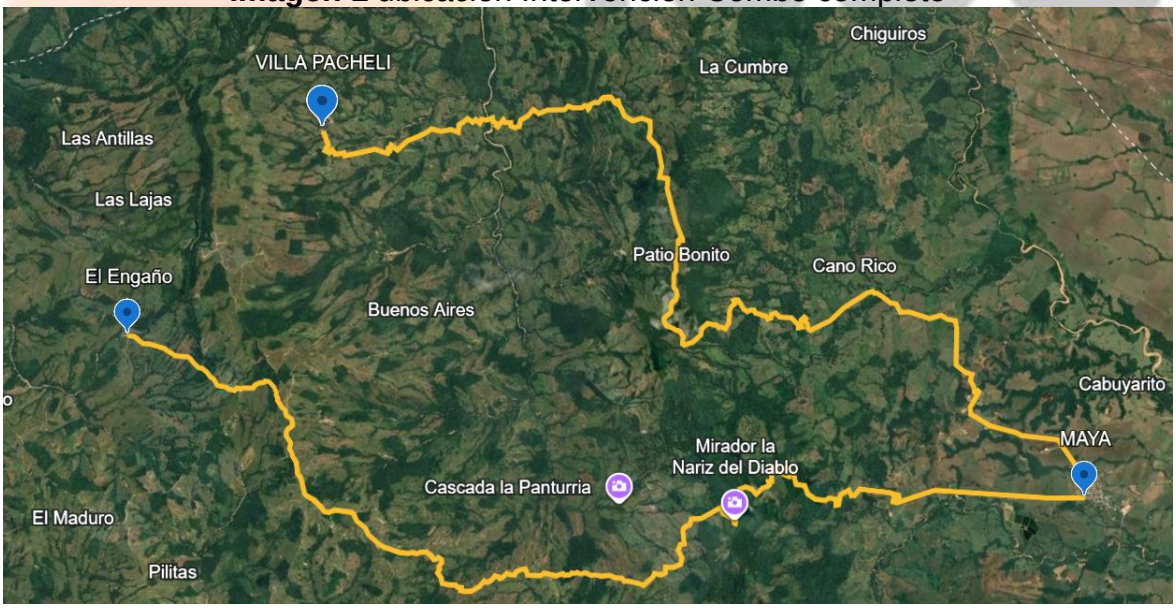
Municipio: PARATEBUENO:

1. VOLQUETA DOBLETROQUE INTERNATIONAL – NGQ552
2. RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA JCB - S0R3CXTTAM2936941
3. MOTONIVELADORA HYUNDAI - LCL717HVOL2000334
4. VIBROCOMPACTADOR AMMANN – 3003608

Ubicación:

Combo Completo Maya – El Engaño 4°37'48.86"N 73°13'17.61"W/ Maya – Villa Pachelly 4°29'31.44"N 73°08'06.58"W

Imagen 1 ubicación Intervención Combo completo



Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	ANDRES MENDEZ
INSPECTOR DE OBRA ICCU	RODRIGO TAVERA
OPERADOR VOLQUETA NGQ552	FABIAN HERNANDEZ
OPERADOR RETROEXCAVADORA 6941	NICOLAS HERNANDEZ
OPERADOR MOTONIVELADORA 0334	ADRIAN ROMERO
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR 3608	LUIS ALIRIO HERNANDEZ

3. PLAN DE TRABAJO

Imagen 2 cronograma de actividades municipio de MEDINA

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO VÍAS PARATEBUENO 2026

Nº	TRAMOS A INTERVENIR	MES	FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO			
		SEM	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	MAYA - EL ENGAÑO																													
2	MAYA - VILLA PACHELLY																													
3	PIÑALITO - AGUAS CALIENTES - VÍA NACIONAL																													
4	VÍA NACIONAL - PALOMAS MARARABE																													

Fuente: Alcaldía de Paratebueno

Para el tramo de vía Maya – El Engaño se finalizó la intervención impactando un 100% el corredor vial en apoyo con maquinaria del sector de Ubalá Zona B; Esta intervención se retrasó por las fuertes lluvias durante el mes reportado. Posterior a ello se inició el dia 24/04/2026 con la intervención del tramo Maya – Villa Pachelly donde se ha realizado un avance del 2.8 Km correspondiente al 10% de dicha intervención. Aun se presenta inoperatividad del vibrocompactador. Se han presentado lluvias dentro y fuera de la jornada de trabajo que han impedido una correcta y continua ejecución de las labores al igual que las fallas mecánicas que, aunque no superan los 2 días de inoperatividad, retrasan la actividad del cronograma.

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

01/04/2026	📍 Vereda/Sector: Maya - El Engaño 🌦 Condición climática: Soleado

	🛠️ Actividad: Se recibe visita cuadrilla mecánica, realiza inspección del vibrocompactador buscando falla de marcha, sin embargo luego de revisar no es posible poner operativo por lo que se requiere escaner en campo. Para inicio de actividades se requiere esperar que se oree en terreno, se encuentra muy saturado por lluvias del día anterior. Motoniveladora realiza intervención sobre la vía con un avance de conformación y cuneteo en 600 ML. Volqueta carga viaje de acopio desde acopio alcaldía al tramo de vía. Retroexcavadora disponible y sin actividad de balde frontal. 📏 Avance (km): 0.6 🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ552 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: FABIAN HERRERA 🚚 Número de viajes recebo B400: 1 ⏱ H. inicial – H. final: 1007 – 1009 📍 Kilometraje inicial - final: 13906 – 13952 ⛽ ACPM (gl): 34.46 | Km tanqueo: 13924 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere instalación de exploradoras. , 🔹 *MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0VL2000334 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: HUGO ADRIAN ROMERO ⏱ H. inicial – H. final: 5084.8 – 5088.2 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se debe cambiar varilla qué da inclinación a la vertedera, hoja de la pala se partió y fue resoldada - No funciona aire acondicionado - Revisión eléctrica para direccionales. - Bocina de retroceso no sirve. - Luces de carretera se dañaron - Se requieren espejos laterales - Cambiar plumilla limpiabrisas frontal se dañó , 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTAM2936941 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NICOLAS HERRERA ⏱ H. inicial – H. final: 5472.1 – 5472.1 ⚠️ Novedades mecánicas: - Salida de humo negro al forzar el equipo. - Cambio de terminal de dirección izquierda - Cambio de crucetas de transmisión 4×4, ruido

	excesivo - Cambio de graseras - Limpieza de radiador (se está recalentando) - Revisar frenos y revisar la transmisión. - Pendiente botellas estabilizadoras , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003608 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: LUIS ALIRIO HERNANDEZ □ H. inicial – H. final: 3661.4 – 3661.6 ⚠️ Novedades mecánicas: o da marcha ni vibra. - Aire acondicionado no funciona. - Solo tiene una farola de alumbrado (pendientes 3) 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se revisó equipo con cuadrilla mecánica, No fue posible detectar falla. 📝 Observaciones: Se requiere escaneo en campo.
02/04/2026	**JUEVES SANTO NO LABORAL**
03/04/2026	**VIERNES SANTO NO LABORAL**
04/04/2026	**SABADO SANTO NO LABORAL**
05/04/2026	**DOMINGO NO LABORAL**
06/04/2026	📍 Vereda/Sector: Maya - El Engaño 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Se presentan lluvias en la mañana, impiden inicio de actividades. Volqueta carga viaje desde el acopio de alcaldía hasta el corte, luego de que el terreno secara, se inicia actividades de conformación y cuneteo, avanzando 600 ML. 📏 Avance (km): 0.6 🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ552 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: FABIAN HERRERA 🚚 Número de viajes recebo B400: 1 □ H. inicial – H. final: 1009 – 1015 📍 Kilometraje inicial - final: 13952 – 14022 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere instalación de exploradoras. , 🔹 *MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0VL2000334 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: HUGO ADRIAN ROMERO

	□ H. inicial – H. final: 5088.2 – 5092 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se debe cambiar varilla qué da inclinación a la vertedera, hoja de la pala se partió y fue resoldada - No funciona aire acondicionado - Revisión eléctrica para direccionales. - Bocina de retroceso no sirve. - Luces de carretera se dañaron - Se requieren espejos laterales - Cambiar plumilla limpiabrisas frontal se dañó 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se fractura pin fusible, se instaló un repuesto. , 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTAM2936941 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NICOLAS HERRERA □ H. inicial – H. final: 5472.1 – 5472.1 ⚠️ Novedades mecánicas: - Salida de humo negro al forzar el equipo. - Cambio de terminal de dirección izquierda - Cambio de crucetas de transmisión 4×4, ruido excesivo - Cambio de graseras - Limpieza de radiador (se está recalentando) - Revisar frenos y revisar la transmisión. - Pendiente botellas estabilizadoras , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003608 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: LUIS ALIRIO HERNANDEZ □ H. inicial – H. final: 3661.6 – 3661.6 ⚠️ Novedades mecánicas: o da marcha ni vibra. - Aire acondicionado no funciona. - Solo tiene una farola de alumbrado (pendientes 3)
07/04/2026	📍 Vereda/Sector: Maya - El Engaño 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Por lluvias de la noche anterior, terreno saturado. Se inician actividades sobre las 10am, conformando, ampliando y cuneteando con un avance de 800 ML, Retroexcavadora carga un viaje desde el acopio de Maya en volqueta doble troque. Vibrocompactador a la espera de electromecánico. 📏 Avance (km): 0.8 🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ552 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: FABIAN HERRERA 🚚 Número de viajes recebo B400: 1

	□ H. inicial – H. final: 1015 – 1023 📍 Kilometraje inicial - final: 14022 – 14087 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere instalación de exploradoras. Manguera de aire y calibrador para combo. , 🔹 *MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0VL2000334 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: HUGO ADRIAN ROMERO □ H. inicial – H. final: 5092 – 5099.2 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se debe cambiar varilla qué da inclinación a la vertedera, hoja de la pala se partió y fue resoldada - No funciona aire acondicionado - Revisión eléctrica para direccionales. - Bocina de retroceso no sirve. - Luces de carretera se dañaron - Se requieren espejos laterales - Cambiar plumilla limpiabrisas frontal se dañó , 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTAM2936941 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NICOLAS HERRERA □ H. inicial – H. final: 5472.1 – 5475.5 ⛽ ACPM (gl): 18.797 | Km tanqueo: 5472.1 ⚠️ Novedades mecánicas: - Salida de humo negro al forzar el equipo. - Cambio de terminal de dirección izquierda - Cambio de crucetas de transmisión 4×4, ruido excesivo - Cambio de graseras - Limpieza de radiador (se está recalentando) - Revisar frenos y revisar la transmisión. - Pendiente botellas estabilizadoras , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003608 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: LUIS ALIRIO HERNANDEZ □ H. inicial – H. final: 3661.6 – 3661.6 ⚠️ Novedades mecánicas: o da marcha ni vibra. - Aire acondicionado no funciona. - Solo tiene una farola de alumbrado (pendientes 3)
08/04/2026	📍 Vereda/Sector: Maya - El Engaño 🌦️ Condición climática: Soleado

	🛠️ Actividad: Se iniciaron actividades de mantenimiento, pasadas 2 horas se estalla manguera hidráulica de dirección dejando inoperativa la motoniveladora, se desmonta y se envía con la comunidad a Villanueva, sin embargo el vehiculo en el que iban se varó y quedó disponible para mañana hacer esa reparación a primera hora. Volqueta subió 1 viaje al corte de trabajo. Retroexcavadora cargó volqueta doble troque y se dirigió a Paratebueno para realizar reparaciones pendientes en el cardan y terminal de la diferencial. Vibrocompactador a la espera de Electromecanico. 📏 Avance (km): 0.3 🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ552 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: FABIAN HERRERA 🚚 Número de viajes recebo B400: 1 ⏱️ H. inicial – H. final: 1023 – 1032 📍 Kilometraje inicial - final: 14087 – 14158 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere instalación de exploradoras. - Manguera de aire y calibrador para combo. - Manguera para combustible para combo , 🔹 *MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0VL2000334 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: HUGO ADRIAN ROMERO ⏱️ H. inicial – H. final: 5099.2 – 5101.8 ⛽ ACPM (gl): 59.127 | Km tanqueo: 5101.8 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se debe cambiar varilla qué da inclinación a la vertedera, hoja de la pala se partió y fue resoldada - No funciona aire acondicionado - Revisión eléctrica para direccionales. - Bocina de retroceso no sirve. - Luces de carretera se dañaron - Se requieren espejos laterales - Cambiar plumilla limpiabrisas frontal se dañó 📝 Observaciones: Se estalla manguera hidraulica de dirección, se demontó y a la espera de reparación el día de mañana. , 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTAM2936941 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NICOLAS HERRERA ⏱️ H. inicial – H. final: 5475.5 – 5480.3

	⚠️ Novedades mecánicas: - Salida de humo negro al forzar el equipo. - Cambio de terminal de dirección izquierda - Cambio de graseras - Limpieza de radiador (se está recalentando) - Revisar frenos y revisar la transmisión. - Pendiente botellas estabilizadoras 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza cambio de crucetas de transmisión 4X4 , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003608 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: LUIS ALIRIO HERNANDEZ □ H. inicial – H. final: 3661.6 – 3661.6 ⚠️ Novedades mecánicas: o da marcha ni vibra. - Aire acondicionado no funciona. - Solo tiene una farola de alumbrado (pendientes 3)
09/04/2026	📍 Vereda/Sector: Maya - El Engaño 🛠️ Actividad: Volqueta se desplaza hacia Villanueva para realizar fabricación de manguera motoniveladora. Retroexcavadora continua intervención mecánica para montura de estabilizadoras, cambio de terminales de dirección y carter 4X4. Vibrocompactador es atendido. Luego de montar la manguera se continua el trabajo con motoniveladora avanzando un total de 400 ml en sector San Jesus. 📏 Avance (km): 0.4 🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ552 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: FABIAN HERRERA □ H. inicial – H. final: 1032 – 1036 📍 Kilometraje inicial - final: 14158 – 14256 ⛽ ACPM (gl): 48 | Km tanqueo: 14176 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere instalación de exploradoras. - Manguera de aire y calibrador para combo. - Manguera para combustible para combo , 🔹 *MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0VL2000334 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: HUGO ADRIAN ROMERO □ H. inicial – H. final: 5101.8 – 5105.5

	⚠️ Novedades mecánicas: - Se debe cambiar varilla qué da inclinación a la vertedera, hoja de la pala se partió y fue resoldada - No funciona aire acondicionado - Revisión eléctrica para direccionales. - Bocina de retroceso no sirve. - Luces de carretera se dañaron - Se requieren espejos laterales - Cambiar plumilla limpiabrisas frontal se dañó 📝 Observaciones: Se instaló manguera hidraulica y queda operativa nuevamente , 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTAM2936941 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NICOLAS HERRERA □ H. inicial – H. final: 5480.3 – 5482.7 ⚠️ Novedades mecánicas: - Salida de humo negro al forzar el equipo. - Cambio de graseras 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se montan botellas estabilizadoras y terminales de dirección. , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003608 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: LUIS ALIRIO HERNANDEZ □ H. inicial – H. final: 3661.6 – 3661.6 ⚠️ Novedades mecánicas: o da marcha ni vibra. - Aire acondicionado no funciona. - Solo tiene una farola de alumbrado (pendientes 3)
10/04/2026	📍 Vereda/Sector: Maya - El Engaño 🌦️ Condición climática: Lluvias 🛠️ Actividad: Se realiza cambio de graseras y engrase general a Retroexcavadora, al igual a volqueta dobletroque se realiza cambio de ubicación de placas, instalación soporte de extintor y escaleras internas de volco. Posteriormente trasladan llantas de motoniveladora de patio de alcaldía a taller y luego de esto inicia traslado al frente de trabajo, se presentaron desde la 1:00 pm por lo que impidió que pudiera subir el equipo sino hasta las 5pm que apoyó la bajada de la bomba del vibrocompactador. Por su parte Motoniveladora realizando actividades de mantenimiento, queda inoperativa por falla general en una de sus llantas, por lo que se procede a desmontar las 4 llantas y realizar el cambio. Al vibrocompactador se le baja bomba hidráulica para traslado a Bogotá y revisión general. 📏 Avance (km): 0.3

	🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ552 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: FABIAN HERRERA ⏱ H. inicial – H. final: 1036 – 1041 📍 Kilometraje inicial - final: 14256 – 14303 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere instalación de exploradoras. - Manguera de aire y calibrador para combo. - Manguera para combustible para combo 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se cambia ubicación de placas, instalación de soporte extintor y escaleras internas volco , 🔹 *MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0VL2000334 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: HUGO ADRIAN ROMERO ⏱ H. inicial – H. final: 5105.5 – 5108.7 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se debe cambiar varilla qué da inclinación a la vertedera, hoja de la pala se partió y fue resoldada - No funciona aire acondicionado - Revisión eléctrica para direccionales. - Bocina de retroceso no sirve. - Luces de carretera se dañaron - Se requieren espejos laterales - Cambiar plumilla limpiabrisas frontal se dañó 📝 Observaciones: Se bajan las 4 llantas de tracción para cambio , 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTAM2936941 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NICOLAS HERRERA ⏱ H. inicial – H. final: 5482.7 – 5489.4 ⚠️ Novedades mecánicas: - Salida de humo negro al forzar el equipo 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se cambian graseras y se realiza engrase general. , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003608 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: LUIS ALIRIO HERNANDEZ

	□ H. inicial – H. final: 3661.6 – 3662.1 ⚠️ Novedades mecánicas: o da marcha ni vibra. - Aire acondicionado no funciona. - Solo tiene una farola de alumbrado (pendientes 3)
11/04/2026	📍 Vereda/Sector: Maya - El Engaño 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Debido a que no se contó con un equipo para subir las llantas a volqueta fue necesario el apoyo de todos los operadores junto con personal del taller. Se realizó traslado de llantas hasta el punto de intervención en la vía Maya - El Engaño. Debido a que el terreno se encontró saturado no se subió volqueta dobletroque al frente de trabajo. 🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ552 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: FABIAN HERRERA □ H. inicial – H. final: 1041 – 1041 📍 Kilometraje inicial - final: 14303 – 14303 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere instalación de exploradoras. - Manguera de aire y calibrador para combo. - Manguera para combustible para combo 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se cambia ubicación de placas, instalación de soporte extintor y escaleras internas volco , 🔹 *MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0VL2000334 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: HUGO ADRIAN ROMERO □ H. inicial – H. final: 5108.7 – 5108.7 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se debe cambiar varilla qué da inclinación a la vertedera, hoja de la pala se partió y fue resoldada - No funciona aire acondicionado - Revisión eléctrica para direccionales. - Bocina de retroceso no sirve. - Luces de carretera se dañaron - Se requieren espejos laterales - Cambiar plumilla limpiabrisas frontal se dañó , 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTAM2936941 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NICOLAS HERRERA

	□ H. inicial – H. final: 5489.4 – 5489.4 ⚠️ Novedades mecánicas: - Salida de humo negro al forzar el equipo 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se cambian graseras y se realiza engrase general. , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003608 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: LUIS ALIRIO HERNANDEZ □ H. inicial – H. final: 3662.1 – 3662.1 ⚠️ Novedades mecánicas: o da marcha ni vibra. - Aire acondicionado no funciona. - Solo tiene una farola de alumbrado (pendientes 3)
12/04/2026	**DOMINGO NO LABORAL**
13/04/2026	📍 Vereda/Sector: Maya - El Engaño 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Se instalaron las llantas de la motoniveladora quedando nuevamente operativa, se inició el cargue de material desde nuevo punto indicado por la comunidad. Se avanzó 700 metros en conformación y perfilado de cunetas. Se realiza el cargue de 4 viajes para la vía. 📏 Avance (km): 0.7 🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ552 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: FABIAN HERRERA 🚚 Número de viajes recebo B400: 4 □ H. inicial – H. final: 1041 – 1050 📍 Kilometraje inicial - final: 14303 – 14359 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere instalación de exploradoras. - Manguera de aire y calibrador para combo. - Manguera para combustible para combo , 🔹 *MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0VL2000334 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: HUGO ADRIAN ROMERO □ H. inicial – H. final: 5108.7 – 5115

	⚠️ Novedades mecánicas: - Se requieren pines fusible de respaldo. - Se debe cambiar varilla qué da inclinación a la vertedera, hoja de la pala se partió y fue resoldada - No funciona aire acondicionado - Revisión eléctrica para direccionales. - Bocina de retroceso no sirve. - Luces de carretera se dañaron - Se requieren espejos laterales - Cambiar plumilla limpiabrisas frontal se dañó , 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTAM2936941 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NICOLAS HERRERA □ H. inicial – H. final: 5489.4 – 5495 ⚠️ Novedades mecánicas: - Salida de humo negro al forzar el equipo , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003608 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: LUIS ALIRIO HERNANDEZ □ H. inicial – H. final: 3662.1 – 3662.1 ⚠️ Novedades mecánicas: o da marcha ni vibra. - Aire acondicionado no funciona. - Solo tiene una farola de alumbrado (pendientes 3)
14/04/2026	📍 Vereda/Sector: Maya - El Engaño 🌦️ Condición climática: Lluvias 🛠️ Actividad: Debido a las fuertes lluvias presentadas en la noche anterior, se presenta el terreno saturado impidiendo el inicio de actividades a la hora de ingreso. Se inicia cargue de material sobre las 9:00 am tanto de la volqueta dobletroque como de las volquetas del combo de Ubala. Se conforma y cunetea 800 ml y extienden 12 viajes realizados por volqueta dobletroque. 📏 Avance (km): 0.8 🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ552 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: FABIAN HERRERA 🚚 Número de viajes recebo B400: 12 □ H. inicial – H. final: 1050 – 1058 📍 Kilometraje inicial - final: 14359 – 14385

	⚠️ Novedades mecánicas: Requiere instalación de exploradoras. - Manguera de aire y calibrador para combo. - Manguera para combustible para combo , 🔹 *MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0VL2000334 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: HUGO ADRIAN ROMERO □ H. inicial – H. final: 5115 – 5122.5 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requieren pines fusible de respaldo. - Se debe cambiar varilla qué da inclinación a la vertedera, hoja de la pala se partió y fue resoldada - No funciona aire acondicionado - Revisión eléctrica para direccionales. - Bocina de retroceso no sirve. - Luces de carretera se dañaron - Se requieren espejos laterales - Cambiar plumilla limpiabrisas frontal se dañó , 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTAM2936941 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NICOLAS HERRERA □ H. inicial – H. final: 5495 – 5501 ⛽ ACPM (gl): 10 | Km tanqueo: 5495.4 ⚠️ Novedades mecánicas: - Salida de humo negro al forzar el equipo , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003608 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: LUIS ALIRIO HERNANDEZ □ H. inicial – H. final: 3662.1 – 3662.1 ⚠️ Novedades mecánicas: o da marcha ni vibra. - Aire acondicionado no funciona. - Solo tiene una farola de alumbrado (pendientes 3)
15/04/2026	📍 Vereda/Sector: Maya - El Engaño 🌦️ Condición climática: Lluvias 🛠️ Actividad: Volqueta se dirigió a recoger combustible, sin embargo, se encontró un árbol caído por las lluvias del día anterior en la vía dificultando el paso del equipo. Una vez abastecido de ACPM se continuó el cargue de material realizando únicamente 1 viaje. Retroexcavadora realizó descoles y actividades para manejo de aguas lluvias, la motoniveladora conformó cuneta en un avance de 700 ml. 📏 Avance (km): 0.7

	🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ552 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: FABIAN HERRERA 🚚 Número de viajes recebo B400: 1 ⏱ H. inicial – H. final: 1058 – 1067 🎈 Kilometraje inicial - final: 14385 – 14461 ⛽ ACPM (gl): 40 | Km tanqueo: 14436 💧 Urea (Lt): 16 | Km tanqueo: 14436 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere instalación de exploradoras. - Manguera de aire y calibrador para combo. - Manguera para combustible para combo , 🔹 *MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0VL2000334 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: HUGO ADRIAN ROMERO ⏱ H. inicial – H. final: 5122.5 – 5131.8 ⛽ ACPM (gl): 30 | Km tanqueo: 5128.3 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requieren pines fusible de respaldo. - Se debe cambiar varilla qué da inclinación a la vertedera, hoja de la pala se partió y fue resoldada - No funciona aire acondicionado - Revisión eléctrica para direccionales. - Bocina de retroceso no sirve. - Luces de carretera se dañaron - Se requieren espejos laterales - Cambiar plumilla limpiabrisas frontal se dañó , 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTAM2936941 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NICOLAS HERRERA ⏱ H. inicial – H. final: 5501 – 5504.4 ⛽ ACPM (gl): 30 | Km tanqueo: 5501.2 ⚠️ Novedades mecánicas: - Salida de humo negro al forzar el equipo , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003608 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: LUIS ALIRIO HERNANDEZ ⏱ H. inicial – H. final: 3662.1 – 3662.1

	⚠️ Novedades mecánicas: o da marcha ni vibra. - Aire acondicionado no funciona. - Solo tiene una farola de alumbrado (pendientes 3)
16/04/2026	📍 Vereda/Sector: Maya - El Engaño 🌦️ Condición climática: Lluvias 🛠️ Actividad: Terreno amanece saturado por fuertes lluvias del día anterior, comunidad no permitió retirar mas material del punto de carga. Por lo que la retroexcavadora realizó drenajes y descoles de alcantarilla, se cargó un viaje de material sobrante. Se avanzó en 500 ml de conformación de cunetas y sobre las 1:20 pm el vibrocompactador presentó deslizamiento lateral en el borde de la vía por condiciones de humedad, quedando parcialmente inclinado. Se dispusieron equipos para evaluar su recuperación. A partir de las 2pm se presentaron lluvias fuertes en la zona. 📏 Avance (km): 0.5 🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ552 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: FABIAN HERRERA 🚚 Número de viajes material sobrante: 1 ⏱ H. inicial – H. final: 1067 – 1072 📍 Kilometraje inicial - final: 14461 – 14472 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere instalación de exploradoras. - Manguera de aire y calibrador para combo. - Manguera para combustible para combo , 🔹 *MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0VL2000334 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: HUGO ADRIAN ROMERO ⏱ H. inicial – H. final: 5131.8 – 5136.1 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requieren pines fusible de respaldo. - Se debe cambiar varilla qué da inclinación a la vertedera, hoja de la pala se partió y fue resoldada - No funciona aire acondicionado - Revisión eléctrica para direccionales. - Bocina de retroceso no sirve. - Luces de carretera se dañaron - Se requieren espejos laterales - Cambiar plumilla limpiabrisas frontal se dañó , 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTAM2936941 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU

	👷 Operador: NICOLAS HERRERA ⏱ H. inicial – H. final: 5504.4 – 5508.2 ⚠️ Novedades mecánicas: - Salida de humo negro al forzar el equipo. - Se requiere tendido de llantas , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003608 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: LUIS ALIRIO HERNANDEZ ⏱ H. inicial – H. final: 3662.1 – 3662.1 ⚠️ Novedades mecánicas: o da marcha ni vibra. - Aire acondicionado no funciona. - Solo tiene una farola de alumbrado (pendientes 3)
17/04/2026	📍 Vereda/Sector: Maya - El Engaño 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Terreno amanece saturado por fuertes lluvias del día anterior. Se realizó el rescate de vibrocompactador del combo Ubala con ayuda de retroexcavadoras que llegaron al frente. No se realizaron actividades por fuertes lluvias durante todo el día. 🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ552 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: FABIAN HERRERA ⏱ H. inicial – H. final: 1072 – 1072 📍 Kilometraje inicial - final: 14472 – 14472 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere instalación de exploradoras. - Manguera de aire y calibrador para combo. - Manguera para combustible para combo , 🔹 *MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0VL2000334 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: HUGO ADRIAN ROMERO ⏱ H. inicial – H. final: 5136.1 – 5136.1 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requieren pines fusible de respaldo. - Se debe cambiar varilla qué da inclinación a la vertedera, hoja de la pala se partió y fue resoldada - No funciona aire acondicionado - Revisión eléctrica para direccionales. -

	Bocina de retroceso no sirve. - Luces de carretera se dañaron - Se requieren espejos laterales - Cambiar plumilla limpiabrisas frontal se dañó , 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTAM2936941 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NICOLAS HERRERA □ H. inicial – H. final: 5508.2 – 5509.6 ⚠️ Novedades mecánicas: Salida de humo negro al forzar el equipo. - Se requiere tendido de llantas , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003608 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: LUIS ALIRIO HERNANDEZ □ H. inicial – H. final: 3662.1 – 3662.1 ⚠️ Novedades mecánicas: Bomba hidráulica dañada - Aire acondicionado no funciona. - Solo tiene una farola de alumbrado (pendientes 3)
18/04/2026	📍 Vereda/Sector: Maya - El Engaño 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Terreno amanece saturado por fuertes lluvias del día anterior, impide realizar mantenimiento. Retroexcavadora realiza limpieza de drenajes 🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ552 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: FABIAN HERRERA □ H. inicial – H. final: 1072 – 1075 📍 Kilometraje inicial - final: 14472 – 14509 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere instalación de exploradoras. - Manguera de aire y calibrador para combo. - Manguera para combustible para combo , 🔹 *MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0VL2000334 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: HUGO ADRIAN ROMERO

	□ H. inicial – H. final: 5136.1 – 5136.8 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requieren pines fusible de respaldo. - Se debe cambiar varilla qué da inclinación a la vertedera, hoja de la pala se partió y fue resoldada - No funciona aire acondicionado - Revisión eléctrica para direccionales. - Bocina de retroceso no sirve. - Luces de carretera se dañaron - Se requieren espejos laterales - Cambiar plumilla limpiabrisas frontal se dañó , 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTAM2936941 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NICOLAS HERRERA □ H. inicial – H. final: 5509.6 – 5510.5 ⚠️ Novedades mecánicas: Salida de humo negro al forzar el equipo. - Se requiere tendido de llantas , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003608 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: LUIS ALIRIO HERNANDEZ □ H. inicial – H. final: 3662.1 – 3662.1 ⚠️ Novedades mecánicas: Bomba hidráulica dañada - Aire acondicionado no funciona. - Solo tiene una farola de alumbrado (pendientes 3)
19/04/2026	**DOMINGO NO LABORAL**
20/04/2026	📍 Vereda/Sector: Maya - El Engaño 🌦️ Condición climática: Lluvias 🛠️ Actividad: Volqueta se dirige a recoger combustible para Retroexcavadora y realiza acompañamiento al combo en las actividades. Retroexcavadora realiza drenajes y recoge material acordonado por motoniveladora, mientras tanto se cunetea y conforma via avanzando 600 metros aproximadamente. Se presentan lluvias en la zona, terreno muy saturado 📏 Avance (km): 0.6 🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ552 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: FABIAN HERRERA □ H. inicial – H. final: 1075 – 1081 📍 Kilometraje inicial - final: 14509 – 14552

	⛽ ACPM (gl): 35.001	Km tanqueo: 14526 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere instalación de exploradoras. - Manguera de aire y calibrador para combo. - Manguera para combustible para combo , 🔹 *MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0VL2000334 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: HUGO ADRIAN ROMERO ⏱ H. inicial – H. final: 5136.8 – 5141.8 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requieren pines fusible de respaldo. - Se debe cambiar varilla qué da inclinación a la vertedera, hoja de la pala se partió y fue resoldada - No funciona aire acondicionado - Revisión eléctrica para direccionales. - Bocina de retroceso no sirve. - Luces de carretera se dañaron - Se requieren espejos laterales - Cambiar plumilla limpiabrisas frontal se dañó , 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTAM2936941 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NICOLAS HERRERA ⏱ H. inicial – H. final: 5510.5 – 5516.3 ⛽ ACPM (gl): 40	Km tanqueo: 5512 ⚠️ Novedades mecánicas: Salida de humo negro al forzar el equipo. - Se requiere tendido de llantas , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003608 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: LUIS ALIRIO HERNANDEZ ⏱ H. inicial – H. final: 3662.1 – 3662.1 ⚠️ Novedades mecánicas: Bomba hidráulica dañada - Aire acondicionado no funciona. - Solo tiene una farola de alumbrado (pendientes 3)
21/04/2026	📍 Vereda/Sector: Maya - El Engaño 🛠️ Actividad: Se avanza en el mantenimiento de la vía Maya - El Engaño. Terreno bastante saturado, no se tiene pudo de cargue de material, retroexcavadora realiza manejo de aguas y drenajes y motoniveladora realiza conformación de calzada. Se avanza 600ml. Retroexcavadora presenta fallas electricas, por lo que se requiere reiniciar el equipo con la volqueta. 📏 Avance (km): 0.6

	🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ552 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: FABIAN HERRERA ⏱ H. inicial – H. final: 1081 – 1083 📍 Kilometraje inicial - final: 14552 – 14552 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere instalación de exploradoras. - Manguera de aire y calibrador para combo. - Manguera para combustible para combo , 🔹 *MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0VL2000334 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: HUGO ADRIAN ROMERO ⏱ H. inicial – H. final: 5141.8 – 5147.6 ⚠️ Novedades mecánicas: - Se requieren pines fusible de respaldo. - Se debe cambiar varilla qué da inclinación a la vertedera, hoja de la pala se partió y fue resoldada - No funciona aire acondicionado - Revisión eléctrica para direccionales. - Bocina de retroceso no sirve. - Luces de carretera se dañaron - Se requieren espejos laterales - Cambiar plumilla limpiabrisas frontal se dañó , 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTAM2936941 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NICOLAS HERRERA ⏱ H. inicial – H. final: 5516.3 – 5521.8 ⚠️ Novedades mecánicas: Salida de humo negro al forzar el equipo. - Se requiere tendido de llantas. - Se presenta falla eléctrica. , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003608 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: LUIS ALIRIO HERNANDEZ ⏱ H. inicial – H. final: 3662.1 – 3662.1 ⚠️ Novedades mecánicas: Bomba hidráulica dañada - Aire acondicionado no funciona. - Solo tiene una farola de alumbrado (pendientes 3)

22/04/2026	📍 Vereda/Sector: Maya - El Engaño 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Motoniveladora pierde potencia por lo que operador realiza limpieza de filtro mejorando el problema. Se realiza mantenimiento de la vía en conformación y cuneteo avanzando 500 ml. Debido a la falta de material para aplicar, volqueta se dirige al casco urbano para recoger combustible a combo Ubala y a la espera de pines fusible para motoniveladora. Retroexcavadora realiza trabajos de drenaje, se usa batería de vibrocompactador para validar si mejora la falla, sin embargo se vuelve a descartar confirmando una falla en el sistema eléctrico. 📏 Avance (km): 0.5 🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ552 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: FABIAN HERRERA □ H. inicial – H. final: 1083 – 1089 📍 Kilometraje inicial - final: 14552 – 14593 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere instalación de exploradoras. - Manguera de aire y calibrador para combo. - Manguera para combustible para combo , 🔹 *MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0VL2000334 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: HUGO ADRIAN ROMERO □ H. inicial – H. final: 5147.6 – 5152.2 ⛽ ACPM (gl): 40 | Km tanqueo: 5148.2 ⚠️ Novedades mecánicas: - ARREGLO DE FRENO DE PARQUEO - DIENTES PARA DESCARIFICADOR - AJUSTE DE TORNAMESA. - Se requieren pines fusible de respaldo. - Se debe cambiar varilla qué da inclinación a la vertedera, hoja de la pala se partió y fue resoldada - No funciona aire acondicionado - Revisión eléctrica para direccionales. - Bocina de retroceso no sirve. - Luces de carretera se dañaron - Se requieren espejos laterales - Cambiar plumilla limpiabrisas frontal se dañó. 📝 Observaciones: Se realiza limpieza de filtros del equipo. , 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTAM2936941 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NICOLAS HERRERA □ H. inicial – H. final: 5521.8 – 5527.8

	⚠️ Novedades mecánicas: - SE REQUIERE CAMBIO DE DIENTES BALDE - Salida de humo negro al forzar el equipo. - Se requiere tendido de llantas. - Se presenta falla eléctrica. , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003608 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: LUIS ALIRIO HERNANDEZ □ H. inicial – H. final: 3662.1 – 3662.1 ⚠️ Novedades mecánicas: Bomba hidráulica dañada - Aire acondicionado no funciona. - Solo tiene una farola de alumbrado (pendientes 3)
23/04/2026	📍 Vereda/Sector: Maya - El Engaño 🛠️ Actividad: Se continua la conformación de vía Maya - El Engaño avanzando 300 metros. Se da por finalizada la intervención en el tramo y se traslada maquinaria para Maya para iniciar intervención en la vía Maya - Villa Pacely. Volqueta se dirige a llevar combustible para combo Ubala, entrega de pines fusible a motoniveladora y dar reinicio a sistema electrico de la retroexcavadora. Por su parte se traslada la retroexcavadora a Maya para ser atendida por Electromecanico diagnosticando falla en el alternador, equipo queda inoperativo al finalizar la jornada. 📏 Avance (km): 0.3 🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ552 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: FABIAN HERRERA □ H. inicial – H. final: 1089 – 1095 📍 Kilometraje inicial - final: 14593 – 14662 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere instalación de exploradoras. - Manguera de aire y calibrador para combo. - Manguera para combustible para combo , 🔹 *MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0VL2000334 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: HUGO ADRIAN ROMERO □ H. inicial – H. final: 5152.2 – 5156.4

	⚠️ Novedades mecánicas: - ARREGLO DE FRENO DE PARQUEO - DIENTES PARA DESCARIFICADOR - AJUSTE DE TORNAMESA. - Se requieren pines fusible de respaldo. - Se debe cambiar varilla qué da inclinación a la vertedera, hoja de la pala se partió y fue resoldada - No funciona aire acondicionado - Revisión eléctrica para direccionales. - Bocina de retroceso no sirve. - Luces de carretera se dañaron - Se requieren espejos laterales - Cambiar plumilla limpiabrisas frontal se dañó. , 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTAM2936941 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NICOLAS HERRERA □ H. inicial – H. final: 5527.8 – 5527.9 ⚠️ Novedades mecánicas: - SE REQUIERE CAMBIO DE DIENTES BALDE - Salida de humo negro al forzar el equipo. - Se requiere tendido de llantas. - Se presenta falla eléctrica. 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza revisión electrica. Se identifica fallas en el alternador, en diagnostico. 📝 Observaciones: Falla eléctrica, equipo inoperativo , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003608 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: LUIS ALIRIO HERNANDEZ □ H. inicial – H. final: 3662.1 – 3662.1 ⚠️ Novedades mecánicas: Bomba hidráulica dañada - Aire acondicionado no funciona. - Solo tiene una farola de alumbrado (pendientes 3)
24/04/2026	📍 Vereda/Sector: Maya - Villa Pachely 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Se inicia intervención en el nuevo tramo Maya - Villa Pachely. Se interviene con manejo de aguas a través de conformación de cunetas avanzando 700 ml. Volqueta presta apoyo a la alcaldía de Paratebueno en el sector Candilejas cargando un viaje de material. Electromecanico continuó las actividades de mantenimiento del alternador, reparó y montó en el equipo dejando nuevamente operativo. Vibrocompactador continúa inoperativo. 📏 Avance (km): 0.7 🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ552 (OPERATIVA)*

	🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: FABIAN HERRERA 🚚 Número de viajes recebo B400: 1 □ H. inicial – H. final: 1095 – 1102 🎈 Kilometraje inicial - final: 14662 – 14765 ⛽ ACPM (gl): 35.536 | Km tanqueo: 14686 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere instalación de exploradoras. - Manguera de aire y calibrador para combo. - Manguera para combustible para combo , 🔹 *MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0VL2000334 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: HUGO ADRIAN ROMERO □ H. inicial – H. final: 5156.4 – 5161.8 ⚠️ Novedades mecánicas: - ARREGLO DE FRENO DE PARQUEO - DIENTES PARA DESCARIFICADOR - AJUSTE DE TORNAMESA. - Se requieren pines fusible de respaldo. - Se debe cambiar varilla qué da inclinación a la vertedera, hoja de la pala se partió y fue resoldada - No funciona aire acondicionado - Revisión eléctrica para direccionales. - Bocina de retroceso no sirve. - Luces de carretera se dañaron - Se requieren espejos laterales - Cambiar plumilla limpiabrisas frontal se dañó. , 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTAM2936941 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NICOLAS HERRERA □ H. inicial – H. final: 5527.9 – 5530.7 ⚠️ Novedades mecánicas: - SE REQUIERE CAMBIO DE DIENTES BALDE - Salida de humo negro al forzar el equipo. - Se requiere tendido de llantas. 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se repara alternador y se instala para quedar nuevamente operativo. 📝 Observaciones: Equipo Operativo , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003608 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: LUIS ALIRIO HERNANDEZ □ H. inicial – H. final: 3662.1 – 3662.1

	⚠️ Novedades mecánicas: Bomba hidráulica dañada - Aire acondicionado no funciona. - Solo tiene una farola de alumbrado (pendientes 3)
25/04/2026	📍 Vereda/Sector: Maya - Villa Pachely 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Se presentan lluvias intensas durante la jornada laboral. No se permite iniciar actividades. 🔹 *MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0VL2000334 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: HUGO ADRIAN ROMERO ⏱ H. inicial – H. final: 5161.8 – 5161.8 ⚠️ Novedades mecánicas: - ARREGLO DE FRENO DE PARQUEO - DIENTES PARA DESCARIFICADOR - AJUSTE DE TORNAMESA. - Se requieren pines fusible de respaldo. - Se debe cambiar varilla qué da inclinación a la vertedera, hoja de la pala se partió y fue resoldada - No funciona aire acondicionado - Revisión eléctrica para direccionales. - Bocina de retroceso no sirve. - Luces de carretera se dañaron - Se requieren espejos laterales - Cambiar plumilla limpiabrisas frontal se dañó. , 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTAM2936941 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NICOLAS HERRERA ⏱ H. inicial – H. final: 5530.7 – 5530.8 ⚠️ Novedades mecánicas: - SE REQUIERE CAMBIO DE DIENTES BALDE - Salida de humo negro al forzar el equipo. - Se requiere tendido de llantas. , 🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ552 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: FABIAN HERRERA ⏱ H. inicial – H. final: 1102 – 1104 📍 Kilometraje inicial - final: 14765 – 14809 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere instalación de exploradoras. - Manguera de aire y calibrador para combo. - Manguera para combustible para combo

	, 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003608 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: LUIS ALIRIO HERNANDEZ ⏱ H. inicial – H. final: 3662.1 – 3662.1 ⚠️ Novedades mecánicas: Bomba hidráulica dañada - Aire acondicionado no funciona. - Solo tiene una farola de alumbrado (pendientes 3)
26/04/2026	**DOMINGO NO LABORAL**
27/04/2026	📍 Vereda/Sector: Maya - Villa Pachely 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Se presentan lluvias intensas durante la mañana, se inician actividades sobre las 11am. Se continua intervención sobre cunetas con motoniveladora avanzando 600 ml. Retroexcavadora realiza limpieza de drenajes y descoles, posteriormente se recibe instrucción de traslado a Santa Cecilia por lo que volqueta realiza escolta, sin embargo se cancela el movimiento y se retorna al frente de trabajo. Vibrocompactador continúa inoperativo. 📏 Avance (km): 0.6 🔹 *MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0VL2000334 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: HUGO ADRIAN ROMERO ⏱ H. inicial – H. final: 5161.8 – 5167.3 ⚠️ Novedades mecánicas: - Presenta perdida de potencia. - ARREGLO DE FRENO DE PARQUEO - DIENTES PARA DESCARIFICADOR - AJUSTE DE TORNAMESA. - Se requieren pines fusible de respaldo. - Se debe cambiar varilla qué da inclinación a la vertedera, hoja de la pala se partió y fue resoldada - No funciona aire acondicionado - Revisión eléctrica para direccionales. - Bocina de retroceso no sirve. - Luces de carretera se dañaron - Se requieren espejos laterales - Cambiar plumilla limpiabrisas frontal se dañó. 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza lavado de filtros. , 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTAM2936941 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NICOLAS HERRERA ⏱ H. inicial – H. final: 5530.8 – 5537 ⛽ ACPM (gl): 50	Km tanqueo: 5533.9

	⚠️ Novedades mecánicas: - SE REQUIERE CAMBIO DE DIENTES BALDE - Salida de humo negro al forzar el equipo. - Se requiere tendido de llantas. , 🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ552 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: FABIAN HERRERA ⏱ H. inicial – H. final: 1104 – 1110 📍 Kilometraje inicial - final: 14809 – 14872 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere instalación de exploradoras. - Manguera de aire y calibrador para combo. - Manguera para combustible para combo , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003608 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: LUIS ALIRIO HERNANDEZ ⏱ H. inicial – H. final: 3662.1 – 3662.1 ⚠️ Novedades mecánicas: Bomba hidráulica dañada - Aire acondicionado no funciona. - Solo tiene una farola de alumbrado (pendientes 3)
28/04/2026	📍 Vereda/Sector: Maya - Villa Pachely 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se presenta falla de encendido de motoniveladora por lo que aprovechando la visita de cuadrilla mecánica se realiza revisión de filtros, se purga el sistema y se deja operativa, por lo que se avanza 300 metros en conformación de cuneta. Se revisa freno de parqueo, inclusión de base y dientes del descarificador y se deja stock de pines fusible. Retroexcavadora recibe atención de cuadrilla mecánica instalando dientes del balde. Volqueta disponible mientras realizan mantenimiento a equipos. 📏 Avance (km): 0.3 🔹 *MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0VL2000334 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: HUGO ADRIAN ROMERO ⏱ H. inicial – H. final: 5167.3 – 5170.2 ⛽ ACPM (gl): 49.467 | Km tanqueo: 5167.7

	⚠️ Novedades mecánicas: - Cambio filtros de combustible - Freno de parqueo (guayas y mordazas) - Bases y dientes descarificador - Ajuste de tornamesa - Se debe cambiar varilla qué da inclinación a la vertedera, hoja de la pala se partió y fue resoldada - No funciona aire acondicionado - Revisión eléctrica para direccionales. - Bocina de retroceso no sirve. - Luces de carretera se dañaron - Se requieren espejos laterales - Cambiar plumilla limpiabrisas frontal se dañó. 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Mantenimiento a filtros de combustible. Cambio pin fusible, se revisa freno de parqueo y pito de reversa. , 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTAM2936941 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NICOLAS HERRERA □ H. inicial – H. final: 5537 – 5540.4 ⚠️ Novedades mecánicas: - Salida de humo negro al forzar el equipo. - Se requiere tendido de llantas. 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Cambio de dientes balde trasero. , 🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ552 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: FABIAN HERRERA □ H. inicial – H. final: 1110 – 1116 📍 Kilometraje inicial - final: 14872 – 14925 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere instalación de exploradoras. - Manguera de aire y calibrador para combo. - Manguera para combustible para combo , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003608 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: LUIS ALIRIO HERNANDEZ □ H. inicial – H. final: 3662.1 – 3662.1 ⚠️ Novedades mecánicas: Bomba hidráulica dañada - Aire acondicionado no funciona. - Solo tiene una farola de alumbrado (pendientes 3)
29/04/2026	📍 Vereda/Sector: Maya - Villa Pachely 🌦️ Condición climática: Lluvias

	🛠️ Actividad: Se presentan fuertes lluvias durante la mañana por lo que se procede a trasladar pajarita a Paratebueno para realizar cambio de llantas y cambio de fluidos del equipo. Volqueta realiza la escolta del equipo. Motoniveladora puede iniciar actividades sobre las 2 de la tarde con la conformación de cunetas avanzando 500 metros. 📏 Avance (km): 0.5 🔹 *MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0VL2000334 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: HUGO ADRIAN ROMERO ⏱ H. inicial – H. final: 5170.2 – 5174.5 ⚠️ Novedades mecánicas: - Cambio filtros de combustible - Freno de parqueo (guayas y mordazas) - Bases y dientes descarificador - Ajuste de tornamesa - Se debe cambiar varilla qué da inclinación a la vertedera, hoja de la pala se partió y fue resoldada - No funciona aire acondicionado - Revisión eléctrica para direccionales. - Bocina de retroceso no sirve. - Luces de carretera se dañaron - Se requieren espejos laterales - Cambiar plumilla limpiabrisas frontal se dañó. , 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTAM2936941 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NICOLAS HERRERA ⏱ H. inicial – H. final: 5540.4 – 5542.3 ⚠️ Novedades mecánicas: - Salida de humo negro al forzar el equipo. - Pendiente Llantas traseras 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza cambio de llantas delanteras y cambio de fluidos del sistema diferencial. , 🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ552 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: FABIAN HERRERA ⏱ H. inicial – H. final: 1116 – 1119 📍 Kilometraje inicial - final: 14925 – 14964 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere instalación de exploradoras. - Manguera de aire y calibrador para combo. - Manguera para combustible para combo

	, 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003608 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: LUIS ALIRIO HERNANDEZ □ H. inicial – H. final: 3662.1 – 3662.1 ⚠️ Novedades mecánicas: Bomba hidráulica dañada - Aire acondicionado no funciona. - Solo tiene una farola de alumbrado (pendientes 3)
30/04/2026	📍 Vereda/Sector: Maya - Villa Pachely 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Clima favorable para realizar actividades, se avanza 700 metros en conformación de calzada y cuneteo. Se cargan 10 viajes de material para la vía. 📏 Avance (km): 0.7 🔹 *MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0VL2000334 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: HUGO ADRIAN ROMERO □ H. inicial – H. final: 5174.5 – 5182.4 ⚠️ Novedades mecánicas: - Cambio filtros de combustible - Freno de parqueo (guayas y mordazas) - Bases y dientes descarificador - Ajuste de tornamesa - Se debe cambiar varilla qué da inclinación a la vertedera, hoja de la pala se partió y fue resoldada - No funciona aire acondicionado - Revisión eléctrica para direccionales. - Bocina de retroceso no sirve. - Luces de carretera se dañaron - Se requieren espejos laterales - Cambiar plumilla limpiabrisas frontal se dañó. , 🔹 *RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTAM2936941 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: NICOLAS HERRERA □ H. inicial – H. final: 5542.3 – 5550.5 ⚠️ Novedades mecánicas: - Salida de humo negro al forzar el equipo. - Pendiente Llantas traseras , 🔹 *VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ552 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: FABIAN HERRERA 🚚 Número de viajes recebo B400: 10 □ H. inicial – H. final: 1119 – 1128

	📍 Kilometraje inicial - final: 14964 – 15023 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere instalación de exploradoras. - Manguera de aire y calibrador para combo. - Manguera para combustible para combo , 🔹 *VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003608 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: LUIS ALIRIO HERNANDEZ □ H. inicial – H. final: 3662.1 – 3662.1 ⚠️ Novedades mecánicas: Bomba hidráulica dañada - Aire acondicionado no funciona. - Solo tiene una farola de alumbrado (pendientes 3)

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

En la siguiente tabla se relacionan los viajes cargados por nuestros equipos y transportados por volquetas propias y del municipio. Se aclara que se tuvo una disminución significativa en la cantidad de viajes transportados toda vez que las condiciones climáticas saturaban el terreno y el paso de volquetas perjudicaban el trabajo de mantenimiento realizado.

RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES			
FECHA	**MATERIAL**	**N° DE VIAJES**	**DESCRIPCIÓN**
1/04/2026	Recebo	1	Cargue acopio alcaldia a Maya - El Engaño
2/04/2026	JUEVES SANTO NO LABORAL		
3/04/2026	VIERNES SANTO NO LABORAL		
4/04/2026	SABADO SANTO NO LABORAL		
5/04/2026	DOMINGO NO LABORAL		
6/04/2026	Recebo	1	Cargue acopio alcaldia a Maya - El Engaño
7/04/2026	Recebo	1	Cargue acopio Maya a corte de obra
8/04/2026	Recebo	1	Cargue acopio Maya a corte de obra
9/04/2026		0	Sin equipo de cargue
10/04/2026		0	Sin equipo de cargue
11/04/2026		0	Terreno saturado para subir equipo

RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES			
FECHA	**MATERIAL**	**N° DE VIAJES**	**DESCRIPCIÓN**
12/04/2026	DOMINGO		
13/04/2026	Recebo	4	1 acopio y 3 nuevo cargue
14/04/2026	Recebo	12	Cargue de nuevo punto
15/04/2026	Recebo	1	Cargue de nuevo punto
16/04/2026	Material sobrante	1	Cargue de cunetas
17/04/2026		0	Terreno saturado para cargar material
18/04/2026		0	Terreno saturado para cargar material
19/04/2026	DOMINGO		
20/04/2026		0	Terreno saturado para cargar material
21/04/2026		0	Terreno saturado para cargar material
22/04/2026		0	No se tiene punto de cargue.
23/04/2026		0	No se tiene punto de cargue. Se lleva ACPM
24/04/2026	Recebo	1	Apoyo Alcaldía, Candilejas. (Inicio Villa Pachelly)
25/04/2026		0	Lluvias intensas. No se puede laborar
26/04/2026	DOMINGO		
27/04/2026		0	No se tiene punto de cargue.
28/04/2026		0	Mantenimiento a equipos del frente
29/04/2026		0	Lluvias intensas. Escolta Paratebueno
30/04/2026	Recebo	10	Cargue acopio
TOTAL		**33**	

6. AVANCE EN CAMPO (M)

El avance en campo se vio bastante afectado por lluvias.

AVANCE DE OBRA				
FECHA	**LONGITUD (M)**	**AVANCE (M)**	**REPETICIÓN (M)**	**DESCRIPCIÓN**
1/04/2026	**600**	**600**	**0**	Maya - El Engaño
2/04/2026	JUEVES FESTIVO			
3/04/2026	VIERNES FESTIVO			
4/04/2026	SABADO			
5/04/2026	DOMINGO			
6/04/2026	**600**	**1.200**	**0**	Maya - El Engaño. / Lluvias fuertes
7/04/2026	**800**	**2.000**	**0**	Maya - El Engaño. / Terreno saturado.
8/04/2026	**300**	**2.300**	**0**	Maya - El Engaño. / Motoniveladora inoperativa - Manguera
9/04/2026	**400**	**2.700**	**0**	Maya - El Engaño. / Nublado.
10/04/2026	**300**	**3.000**	**0**	Maya - El Engaño. / Motoniveladora inoperativa - Llantas
11/04/2026	**-**	**3.000**	**0**	Maya - El Engaño. / Motoniveladora inoperativa - Llantas
12/04/2026	DOMINGO			
13/04/2026	**700**	**3.700**	**0**	Maya - El Engaño. / Soleado
14/04/2026	**800**	**4.500**	**0**	Maya - El Engaño. / Soleado
15/04/2026	**700**	**5.200**	**0**	Maya - El Engaño. / Nublado.
16/04/2026	**500**	**5.700**	**0**	Maya - El Engaño. / Lluvias fuertes al medio dia
17/04/2026	**-**	**5.700**	**0**	Maya - El Engaño. / Terreno saturado. Fuertes lluvias
18/04/2026	**-**	**5.700**	**0**	Maya - El Engaño. / Terreno saturado.
19/04/2026	DOMINGO			
20/04/2026	**600**	**6.300**	**0**	Maya - El Engaño. / Lluvias en la zona
21/04/2026	**600**	**6.900**	**0**	Maya - El Engaño. / Terreno saturado
22/04/2026	**500**	**7.400**	**0**	Maya - El Engaño. / Soleado
23/04/2026	**300**	**7.700**	**0**	Maya - El Engaño. / Soleado
24/04/2026	**700**	**8.400**	**0**	Inicio Maya - Villa Pachelly
25/04/2026	**-**	**8.400**		Lluvias intensas

AVANCE DE OBRA				
FECHA	**LONGITUD (M)**	**AVANCE (M)**	**REPETICIÓN (M)**	**DESCRIPCIÓN**
26/04/2026	DOMINGO			
27/04/2026	**600**	**9.000**	**0**	Lluvias intensas - Villa Pachelly
28/04/2026	**300**	**9.300**	**0**	Maya - Villa Pachely
29/04/2026	**500**	**9.800**	**0**	Maya - Villa Pachely / Lluvias fuertes
30/04/2026	**700**	**10.500**	**0**	Maya - Villa Pachely / Soleado
TOTAL	**10.500**	**10.500**	**0**	

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

Para la siguiente tabla se tuvo en cuenta las horas lluvias que impidieron ejecutar actividades. Se presentó un incrementó de 31 horas lluvia, con respecto al periodo inmediatamente anterior, lo cual respalda el bajo rendimiento y bajo cargue de material.

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**HORAS DE LLUVIA**	**HORAS DE INOPERATIVIDAD**	**HORAS EFECTIVAS**	**DESCRIPCIÓN**
1/04/2026	**-**	**-**	**9**	Soleado
2/04/2026	JUEVES FESTIVO			
3/04/2026	VIERNES FESTIVO			
4/04/2026	SABADO			
5/04/2026	DOMINGO			
6/04/2026	**4**	**-**	**4**	Lluvias fuertes
7/04/2026	**3**	**-**	**5**	Terreno saturado - Lluvias
8/04/2026	**1**	**-**	**7**	Terreno saturado - Lluvias leves
9/04/2026	**-**	**-**	**8**	Nublado
10/04/2026	**3**	**-**	**5**	Lluvias fuertes
11/04/2026	**-**	**-**	**4**	
12/04/2026	DOMINGO			
13/04/2026	**1**	**-**	**7**	Terreno saturado - Soleado
14/04/2026	**1**	**-**	**7**	Terreno saturado - Soleado
15/04/2026	**2**	**-**	**6**	Lluvias fuertes - Nublado
16/04/2026	**4**	**-**	**4**	Lluvias fuertes - Nublado

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**HORAS DE LLUVIA**	**HORAS DE INOPERATIVIDAD**	**HORAS EFECTIVAS**	**DESCRIPCIÓN**
17/04/2026	**8**	**-**	**-**	Lluvias fuertes
18/04/2026	**4**	**-**	**-**	Terreno saturado
19/04/2026	DOMINGO			
20/04/2026	**2**	**-**	**6**	Terreno saturado - Lluvias
21/04/2026	**2**	**-**	**6**	Terreno saturado - Soleado
22/04/2026	**-**	**-**	**8**	Soleado
23/04/2026	**-**	**-**	**8**	Soleado
24/04/2026	**-**	**-**	**8**	Soleado
25/04/2026	**4**	**-**	**-**	Lluvias intensas. Terreno saturado
26/04/2026	DOMINGO			
27/04/2026	**3**	**-**	**6**	Lluvias fuertes
28/04/2026	**-**	**-**	**9**	Soleado
29/04/2026	**5**	**-**	**4**	Lluvias fuertes
30/04/2026	**-**	**-**	**9**	Soleado
TOTAL	**47**	**0**	**130**	

8. MOVILIZACIONES

Para el presente periodo no se reportan movilizaciones que requieran camabaja.

9. MANTENIMIENTOS

Se presentaron diferentes novedades mecánicas que dejaban fuera de operación los equipos, sin embargo, se resalta la oportuna atención de las cuadrillas mecánicas y a su vez la atención de los operadores para que dichas inoperatividades de los equipos no superaran los 2 días.

MANTENIMIENTOS			
FECHA	**EQUIPO**	**SERIAL**	**DESCRIPCIÓN**
6/04/2026	Motoniveladora	LCL717HVOL2000334	Se instala pin fusible
8/04/2026	Retroexcavadora	S0R3CXTTAM2936941	Cambio de crucetas cardan 4X4
9/04/2026	Motoniveladora	LCL717HVOL2000334	Fabricación Manguera de hidráulico dirección.
9/04/2026	Retroexcavadora	S0R3CXTTAM2936941	Montura botellas estabilizadras

MANTENIMIENTOS			
FECHA	**EQUIPO**	**SERIAL**	**DESCRIPCIÓN**
10/04/2026	Volqueta Dobletroque	NGQ552	Cambio ubicación placas, montura base extintor, escaleras volco
10/04/2026	Motoniveladora	LCL717HVOL2000334	Cambio 4 llantas de tracción.
10/04/2026	Retroexcavadora	S0R3CXTTAM2936941	Cambio graseras y engrase general
22/04/2026	Motoniveladora	LCL717HVOL2000334	Lavado de filtros del equipo
24/04/2026	Retroexcavadora	S0R3CXTTAM2936941	Se realiza revisión del sistema electrico, falla en alternador
28/04/2026	Motoniveladora	LCL717HVOL2000334	Purga sistema de inyección, base y dientes descarificador, stock pines fusible. Revisión freno de parqueo.
28/04/2026	Retroexcavadora	S0R3CXTTAM2936942	Cambio dientes balde trasero
29/04/2026	Retroexcavadora	S0R3CXTTAM2936942	Cambio aceite de sistema diferencial. Cambio llantas delanteras

10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

En las siguientes tablas se relaciona equipo a equipo su actividad mensual y consumos presentados durante este periodo. No se relaciona el vibrocompactador toda vez que se mantuvo inoperativo durante todo el periodo reportado.

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BÁSICOS													
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS PARA LA ATENCIÓN DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.												
MUNICIPIO:	Paratebueno		**PROVINCIA:**	Medina				**PERIODO:**	01/04/2026 – 30/04/2026				
MÁQUINA:	MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0VL2000334							**SERIE:**	LCL717H0VL2000334				
CONTROL HORARIO				**ACPM**				**UREA**				**OPERATIVA**	**OBSERVACIONES**
FECHA	**H. INICIAL**	**H. FINAL**	**HORAS**	**ACPM (GLS)**	**HORÓMETRO/ KM TANQUEO**	**RENDIMIENTO**	**No. TIRILLA**	**UREA (Litros)**	**HOROMETRO TRANQUEO**	**RENDIMIENTO**	**No. TIRILLA**		
01/04/2026	5,084.80	5,088.20	3.40			0.00				0.00		SI	
06/04/2026	5,088.20	5,092.00	3.80			0.00				0.00		SI	Se fractura pin fusible, se instaló un repuesto.
07/04/2026	5,092.00	5,099.20	7.20			0.00				0.00		SI	
08/04/2026	5,099.20	5,101.80	2.60	59.127	5,101.8	2.42	41226153			0.00		NO	Se estalla manguera hidraulica de dirección, se demontó y a la espera de reparación el día de mañana.
09/04/2026	5,101.80	5,105.50	3.70			0.00				0.00		SI	Se instaló manguera hidraulica y queda operativa nuevamente
10/04/2026	5,105.50	5,108.70	3.20			0.00				0.00		NO	Se bajan las 4 llantas de tracción para cambio
11/04/2026	5,108.70	5,108.70	0.00			0.00				0.00		NO	
13/04/2026	5,108.70	5,115.00	6.30			0.00				0.00		SI	
14/04/2026	5,115.00	5,122.50	7.50			0.00				0.00		SI	
15/04/2026	5,122.50	5,131.80	9.30	30.000	5,128.3	1.13	41226329			0.00		SI	
16/04/2026	5,131.80	5,136.10	4.30			0.00				0.00		SI	
17/04/2026	5,136.10	5,136.10	0.00			0.00				0.00		SI	
18/04/2026	5,136.10	5,136.80	0.70			0.00				0.00		SI	
20/04/2026	5,136.80	5,141.80	5.00			0.00				0.00		SI	
21/04/2026	5,141.80	5,147.60	5.80			0.00				0.00		SI	
22/04/2026	5,147.60	5,152.20	4.60	40.000	5,148.2	2.01	41226361			0.00		SI	Se realiza limpieza de filtros del equipo.
23/04/2026	5,152.20	5,156.40	4.20			0.00				0.00		SI	
24/04/2026	5,156.40	5,161.80	5.40			0.00				0.00		SI	
25/04/2026	5,161.80	5,161.80	0.00			0.00				0.00		SI	
27/04/2026	5,161.80	5,167.30	5.50			0.00				0.00		SI	
28/04/2026	5,167.30	5,170.20	2.90	49.467	5,167.7	2.54	25347			0.00		SI	Mantenimiento a filtros de combustible. Cambio pin fusible, se revisa freno de parqueo y pito de reversa.
29/04/2026	5,170.20	5,174.50	4.30			0.00				0.00		SI	
30/04/2026	5,174.50	5,182.40	7.90			0.00				0.00		SI	
TOTAL MES			**97.6**	**178.594**		**1.81**		**0**					

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BÁSICOS													
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS PARA LA ATENCIÓN DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.												
MUNICIPIO:	Paratebueno		**PROVINCIA:**	Medina				**PERIODO:**	01/04/2026 – 30/04/2026				
MÁQUINA:	RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - S0R3CXTTAM2936941							**SERIE:**	S0R3CXTTAM2936941				
CONTROL HORARIO				**ACPM**				**UREA**				**OPERATIVA**	**OBSERVACIONES**
FECHA	**H. INICIAL**	**H. FINAL**	**HORAS**	**ACPM (GLS)**	**HORÓMETRO/ KM TANQUEO**	**RENDIMIENTO**	**No. TIRILLA**	**UREA (Litros)**	**HOROMETRO TRANQUEO**	**RENDIMIENTO**	**No. TIRILLA**		
01/04/2026	5,472.10	5,472.10	0.00			0.00				0.00		SI	
06/04/2026	5,472.10	5,472.10	0.00			0.00				0.00		SI	
07/04/2026	5,472.10	5,475.50	3.40	18.797	5,472.1	1.40	41226121			0.00		SI	
08/04/2026	5,475.50	5,480.30	4.80			0.00				0.00		SI	En mantenimiento. Se realiza cambio de crucetas de transmisión 4X4
09/04/2026	5,480.30	5,482.70	2.40			0.00				0.00		SI	Mantenimiento. Se montan botellas estabilizadoras y terminales de dirección.
10/04/2026	5,482.70	5,489.40	6.70			0.00				0.00		SI	Se cambian graseras y se realiza engrase general.
11/04/2026	5,489.40	5,489.40	0.00			0.00				0.00		SI	
13/04/2026	5,489.40	5,495.00	5.60			0.00				0.00		SI	
14/04/2026	5,495.00	5,501.00	6.00	10.000	5,495.4	0.43	25487			0.00		SI	
15/04/2026	5,501.00	5,504.40	3.40	30.000	5,501.2	5.17	41226328			0.00		SI	
16/04/2026	5,504.40	5,508.20	3.80			0.00				0.00		SI	
17/04/2026	5,508.20	5,509.60	1.40			0.00				0.00		SI	
18/04/2026	5,509.60	5,510.50	0.90			0.00				0.00		SI	
20/04/2026	5,510.50	5,516.30	5.80	40.000	5,512.0	3.70	41226362			0.00		SI	
21/04/2026	5,516.30	5,521.80	5.50			0.00				0.00		SI	
22/04/2026	5,521.80	5,527.80	6.00			0.00				0.00		SI	
23/04/2026	5,527.80	5,527.90	0.10			0.00				0.00		NO	Falla eléctrica, equipo inoperativo
24/04/2026	5,527.90	5,530.70	2.80			0.00				0.00		SI	Se repara alternador y se instala para quedar nuevamente operativo.
25/04/2026	5,530.70	5,530.80	0.10			0.00				0.00		SI	
27/04/2026	5,530.80	5,537.00	6.20	50.000	5,533.9	2.28	25336			0.00		SI	
28/04/2026	5,537.00	5,540.40	3.40			0.00				0.00		SI	Cambio de dientes balde trasero.
29/04/2026	5,540.40	5,542.30	1.90			0.00				0.00		SI	Se realiza cambio de llantas delanteras y cambio de fluidos del sistema diferencial.
30/04/2026	5,542.30	5,550.50	8.20			0.00				0.00		SI	
TOTAL MES			**78.4**	**148.797**		**2.10**		**0**					

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BÁSICOS													
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS PARA LA ATENCIÓN DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.												
MUNICIPIO:	Paratebueno		**PROVINCIA:**	Medina				**PERIODO:**	01/04/2026 – 30/04/2026				
MÁQUINA:	VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - INTERNATIONAL - ICCU - NGQ552							**SERIE:**	NGQ552				
CONTROL HORARIO				**ACPM**				**UREA**				**OPERATIVA**	**OBSERVACIONES**
FECHA	**H. INICIAL**	**H. FINAL**	**HORAS**	**ACPM (GLS)**	**HORÓMETRO/ KM TANQUEO**	**RENDIMIENTO**	**No. TIRILLA**	**UREA (Litros)**	**HOROMETRO TRANQUEO**	**RENDIMIENTO**	**No. TIRILLA**		
01/04/2026	1,007.00	1,009.00	2.00	34.460	13,924.0	4.18	41226033			0.00		SI	
06/04/2026	1,009.00	1,015.00	6.00			0.00				0.00		SI	
07/04/2026	1,015.00	1,023.00	8.00			0.00				0.00		SI	
08/04/2026	1,023.00	1,032.00	9.00			0.00				0.00		SI	
09/04/2026	1,032.00	1,036.00	4.00	48.000	14,176.0	5.25	41226172			0.00		SI	
10/04/2026	1,036.00	1,041.00	5.00			0.00				0.00		SI	Se cambia ubicación de placas, instalación de soporte extintor y escaleras internas volco
11/04/2026	1,041.00	1,041.00	0.00			0.00				0.00		SI	
13/04/2026	1,041.00	1,050.00	9.00			0.00				0.00		SI	
14/04/2026	1,050.00	1,058.00	8.00			0.00				0.00		SI	
15/04/2026	1,058.00	1,067.00	9.00	40.000	14,436.0	6.50	41226327	16.000	14,436.0	1.15	41226330	SI	
16/04/2026	1,067.00	1,072.00	5.00			0.00				0.00		SI	
17/04/2026	1,072.00	1,072.00	0.00			0.00				0.00		SI	
18/04/2026	1,072.00	1,075.00	3.00			0.00				0.00		SI	
20/04/2026	1,075.00	1,081.00	6.00	35.001	14,526.0	2.57	25132			0.00		SI	
21/04/2026	1,081.00	1,083.00	2.00			0.00				0.00		SI	
22/04/2026	1,083.00	1,089.00	6.00			0.00				0.00		SI	
23/04/2026	1,089.00	1,095.00	6.00			0.00				0.00		SI	
24/04/2026	1,095.00	1,102.00	7.00	35.536	14,686.0	4.50	25256			0.00		SI	
25/04/2026	1,102.00	1,104.00	2.00			0.00				0.00		SI	
27/04/2026	1,104.00	1,110.00	6.00			0.00				0.00		SI	
28/04/2026	1,110.00	1,116.00	6.00			0.00				0.00		SI	
29/04/2026	1,116.00	1,119.00	3.00			0.00				0.00		SI	
30/04/2026	1,119.00	1,128.00	9.00			0.00				0.00		SI	
TOTAL MES			**121**	**192.997**		**4.81**		**16**					

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Una vez presentada la información del frente de trabajo para el periodo en cuestión, me permito concluir que;

1. Durante el período reportado se finalizó el tramo Maya – El Engaño, realizando la atención al 100% de este corredor y se inició la intervención del tramo Maya – Villa Pachely, atendiendo el tramo propuesto en el cronograma de la alcaldía para el presente periodo.

2. El rendimiento e impacto en el corredor vial Maya – El Engaño se vio afectado en gran medida por las condiciones climaticas. A la fecha, el vibrocompactador aún no ha podido ser puesto en marcha toda vez que se presenta un daño importante en la bomba hidráulica; actualmente se está a la espera de autorización para la respectiva reparación ya que su costo es significativo.

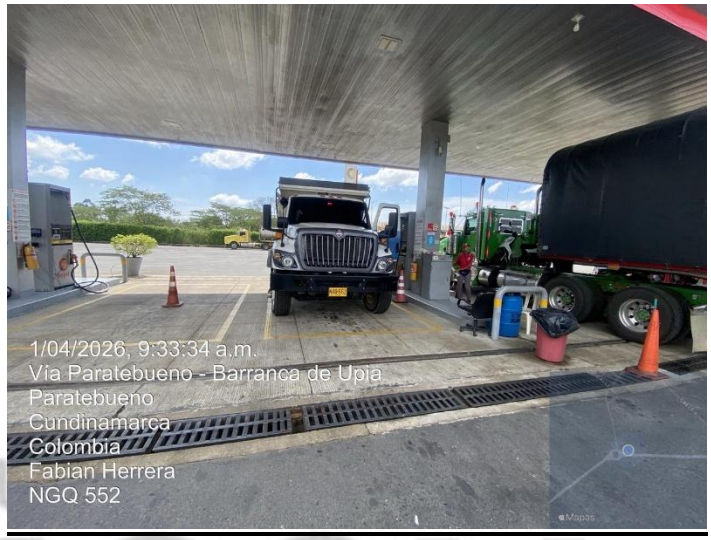
3. Se presentó disminución significativa en la cantidad de viajes transportados toda vez que las condiciones climáticas saturaban el terreno y el paso de volquetas perjudicaban el trabajo de mantenimiento realizado por lo que en días de lluvia o saturación del terreno se suspendió el cargue de material.

4. El consumo de combustible registrado se encuentra dentro de los rangos óptimos de operación para cada equipo de acuerdo a las condiciones del terreno, indicando así un correcto uso de los recursos del contrato.

5. Las intervenciones realizadas han permitido mejorar la transitabilidad y atender puntos críticos de la red vial intervenida, contribuyendo activamente en las metas del Plan de desarrollo departamental y municipal.

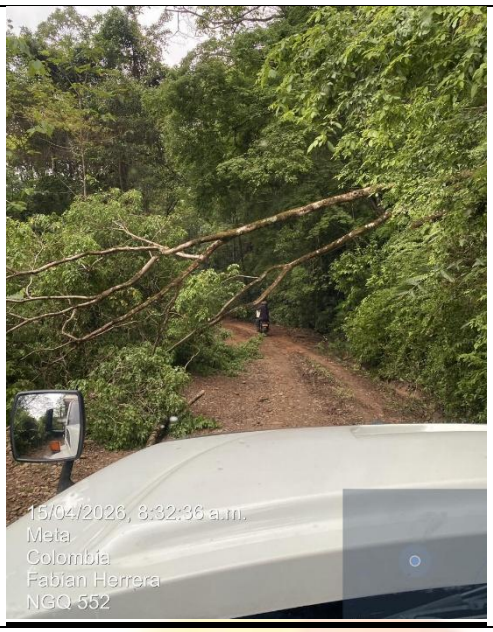
6. Se identificaron requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivos en algunos equipos, necesarios para garantizar la continuidad operativa. Por lo cual se dará seguimiento a los mismos.

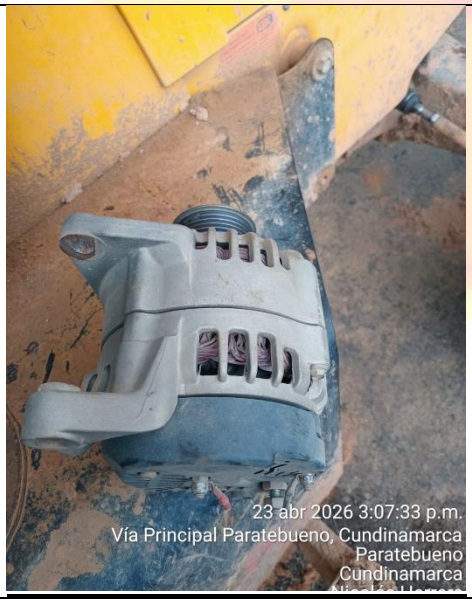
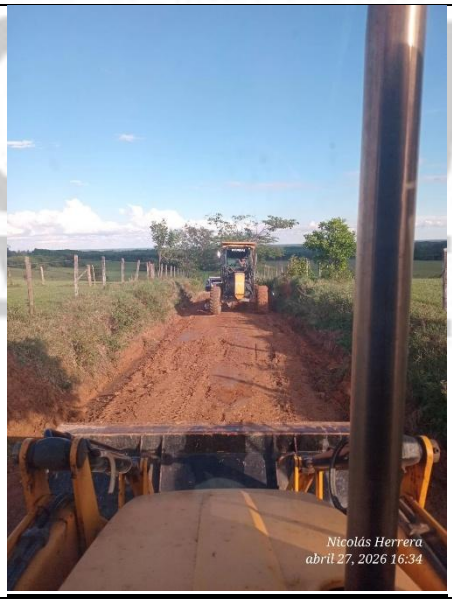
12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Acopio de Material desde Asohumea	Suministro combustible equipos en EDS
	
Revisión mecánica de vibrocompactador para detectar falla de marcha	Cargue desde acopio hacia puntos críticos de la vía.

	
Trabajos cuneteo en la vía Maya – El Engaño	Falla en manguera hidráulica de dirección. Se desmonta, fabrica y monta para dejar equipo operativo.
	
Cambio de crucetas diferencial.	Fuertes lluvias en el sector de trabajo. Saturación del terreno

	
Descarga de material sobre puntos críticos.	Cambio de tendido de llantas de tracción Motoniveladora.
	
Tanqueo de maquinaria en sitio de trabajo	Extensión de material tipo recebo con motoniveladora.

	
Retiro de árbol caido por fuertes lluvias de la noche anterior.	Condiciones climáticas desfavorables para el mantenimiento de la vía.
	
Terreno saturado por fuertes lluvias en la zona	Manejo de drenajes para evacuar el agua represada sobre la vía.

	
Manejo de drenajes con excavación mecánica.	Atención simultanea de calzada y cuneta con apoyo de combo Ubalá
	
Revisión falla eléctrica en Retroexcavadora. Se repara alternador.	Intervención Maya – Villa Pachely. Nuevo tramo propuesto en cronograma

RODRIGO TAVERA
INSPECTOR ICCU

ANDRES MENDEZ
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025
