28 Abril 2026
clima = Nublado - Lluvioso
1 Oficial
Se inicia con la pintura de los jardineras y con la instalación de piso chip.

R.I

July Cartaña
Res Obra

29 Abril 2026.
clima = Lluvioso
1 Oficiales.
Se continua con la aplicación de la pintura en muros de jardineras, por los fuertes lluvias no se puede instalar piso chip.

R.I

July Cartañeda
Res Obra

30 Abril 2026.
Clima = Nublado.
2 Oficiales
Se continua con la aplicación de pintura en los muros de jardineras y se continua con la instalación de piso chip.

R.I

July Cartañeda
Res Obra.

02 Mayo 2026.
clima = Soleado.
1 Ayudante.
Limpieza de carcamos y retiro de angeo de las rejillas del carcamo

R.I

July Cartañeda
Res Obra

04 Mayo 2026
Clima = Nublado - Lluvioso
1 Oficiales:
Se realiza retoques de pintura en rejillas de carcamo se continua con la instalación de piso chip.
R.I Ing. July Castañeda.

05 Mayo 2026.
Clima = Lluvioso.
1° Oficial
Se continua con la aplicación de pintura en rejillas de carcamo, no se puede continuar con instalación de piso chip. por fuerte lluvias.
R.I Ing. July Castañeda.
Res Obra.

06 Mayo 2026.
Clima = Nublado.
1 Oficial + 1 Ayudante.
Se inicia con la instalación de marcos de rejillas de carcamo, se inicia con el. desmonte e instalación de porton y se continua con la instalación de piso chip.
R.I Ing. July Castañeda
Res. Obra.

07 Mayo 2026
Clima = Nublado
Se inicia con demarcación de zona de parqueadero.
R.I Ing. July Castañeda
Res Obra

08 - Mayo 2026
Clima = Nublado
(1 Oficial) 1 Oficial.
Se finalizo instalación de piso Chip.
R.I
July Castañeda
Res Obra.

09. Mayo 2026
Sin personal
Sin Actividades.
R.I
July Castañeda
Res Obra.

11 Mayo 2026
Se finalizo en demarcación de zona de parqueaderos.
1 Oficial. Clima - Nublado
R.I
July Castañeda
Res-Obra.

12. Mayo 2026.
1 Oficial. 1 Ayudante.
Clima = Nublado
Remates y acabados finales, recolección de materiales y organización en general.
R.I
July Castañeda
Res Obra.

13 Mayo 2026.
1 Oficial 1 Ayudante.
Clima = Nublado
Remates en placa de concreto y observaciones de inventario.
R.I
July Castañeda.
Res Obra.

Powered by CamScanner

14 Mayo del 2016.
Clima = Nublado
1 Oficial - 1 Ayudante.
Institución de tapa de caja inspección, rel. de cerramiento y reparar de cerramiento.

R.I.

Jefe Cultura
Res. Obra.

FRENTE DE OBRA: COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES, SEDE A.

CONTRATO DE OBA N° CO1 PCCNTR 8155154

OBJETO. "Adelantar obras de Adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas Físicas de la Secretaria de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de Emergencias y de necesidades físicas prontarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distntales y las sedes administrativas"

CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DUTRITO.

CONTRATISTA: CONSORCIO CORAL INGENIERIA.

INTERVENTORIA: UNIOBRAS.

Powered by CamScanner

11 Abril 2026
Clima = Nublado.
Personal = 1 Ayudante - 1 Oficial.
Se continua con la figuración de acero para columnas y vigas muro perimetral.

K.I

July Cartañeda.
Res Obra

13. Abril. 2026.
Clima = Nublado
Personal = 2 Oficiales - 1 Ayudante.
Se continua con el encofrado y fundida de columnas de muro perimetral y se realiza aseo de baños y detalles en techo.

K.I

July Cartañeda
Res Obra.

14. Abril 2026.
Clima = Nublado.
Personal = 2 Oficiales - 1 Ayudante.
Se funden columnas del muro perimetral y se continua con remates de baños.

K.I

July Cartañeda
Res Obra.

15. Abril 2026
Clima = Lluvioso.
Personal = 2 Oficiales - 2 Ayudantes
Fundida de columnas de muro perimetral, instalación de acero y encofrado de viga muro perimetral y terminación de detalles en baños.

K.I

July Cartañeda
Res. Obra.

Powered by CamScanner

16 Abril 2026.
Personal = 2 Oficiales - 2 Ayudantes.
Clima. = Lluvioso.
Encofrado de viga del muro perimetral.
R.I Jully Cartañeda.
Res. Obra.

17 Abril 2026
Personal = 2 Oficiales - 2 Ayudantes.
clima = Lluvioso.
Se continua con encofrado de viga perimetral y encofrado de columnas placa de equipos hidroneumaticos.
R.I Jully Cartañeda
Res-Obra.

18. Abril 2026.
Personal. = 3. Oficiales - 3 Ayudantes.
Clima. = Nublado.
Se funde viga perimetral del muro. y se inicia con la desinstalación de e instalación de portones de ingreso y puertas del baño.
R.I Jully Cartañeda.
Res. Obra.

20 Abril 2026.
Personal = 2 Oficiales - 2 Ayudantes.
clima = Nublado.
Terminación de fundida de (placa) viga perimetral y continuación de encofrado de columnas : placa equipos hidroneumaticos.
R.I Jully Cartañeda
Res-Obra.

Powered by CamScanner

21 Abril 2026.
Personal. = 2 Oficiales - 1 Ayudante.
Clima. = Nublado.
Terminación de fundida de viga de amarre de muro perimetral y amarre de acero para viguetas placas de equipos hidroneumáticos.
R.I [signature] July Castañeda
Res. Obra.

22. Abril 2026.
Personal = 2 Oficiales - 2 Ayudantes.
Clima = Soleado.
Desencofrado de viga perimetral de muro, afinado y resanes, encofrado de vigueta y columnas placa de equipos hidroneumáticos.
R.I [signature] July Castañeda
Res. Obra.

23. Abril 2026.
Personal = 2 Oficiales - 2 Ayudantes.
Clima = Lluvioso.
Terminación de encofrado de vigueta y columnas de placa de equipos hidroneumáticos.
R.I [signature] July Castañeda
Res Obra.

24 Abril 2026.
Personal. = 2 Oficial - 1 Ayudante
Clima. = Lluvioso.
Fundida de vigueta y columnas placa de equipos hidroneumáticos y detalle de piso de cerramiento de muro perimetral.
R.I [signature] July Castañeda
Res Obra.

Powered by CamScanner

25 Abril 2026.
Personal = 2 oficiales - 1 Ayudante.
Clima = Nublado.
Se desencofra la viga y columnas del muro perimetral.

R.I

July Castañeda
Res Obra.

27 Abril 2026
Personal = 1 Oficial - 1 Ayudante.
Clima = Nublado. - Lluvioso
Encofrado de columnas de placa de equipos hidroneumaticos y se inicia la pintura de muro perimetral.

R.I

July Castañeda.
Res-Obra.

28 Abril 2026.
Personal - 1 Oficial - 1 Ayudante.
Clima = Lluvioso.
Se continua con la pintura de muro perimetral y resanes en marcos de puertas.

R.I

July Castañeda
Res Obra

29 · Abril 2026.
Personal = 1 Oficial - 1 Ayudant.
Clima = Lluvioso
Se continua con la pintura de muro perimetral y resanes en marcos de portones.

R.I

July Castañeda
Res Obra.

Powered by CamScanner

30 Abril 2026.
Personal = 1 Oficial - 1 Ayudante.
Clima = Nublado
Continuan con pintura de muro perimetral.
R.I. July Cortañeda
Res Obra.

02 Mayo 2026.
Personal = 1 Oficial - 1 Ayudante.
Clima = Nublado.
Continuan con la pintura de muro perimetral y resanes en marcos de portones.
R.I. July Cortañeda
Res Obra.

04 Mayo 2026.
Personal = 1 Ayudante.
Clima = Nublado.
Se continua con resanes en marcos de portones y pintura de mallas laterales de portones.
R.I. July Cortañeda
Res Obra

05 Mayo 2026.
Personal = 1 Ayudante.
Clima = Lluvioso.
Se continua con resanes en marcos de portones y pintura de mallas laterales de portones.
R.I. July Cortañeda
Res Obra.

Powered by CamScanner

06 Mayo 2026.
Personal = 1 Ayudante.
Clima Lluvioso.
Continua con resaner en marcos de los portones.

R.I. Jully Castaneda.
Res Obra.

07 Mayo 2026
Personal = 1 Oficial - 2 Ayudantes
Clima = Nublado.
Se inicia con el desmonte de la estructura de la cubierta de la bodega.

R.I. Jully Castaneda
Res Obra.

08 Mayo 2026.
Personal = 1 Oficial - 2 Ayudante.
Clima = Nublado
Se continua con el desmonte de estructura de cubierta, se inicia la pintura de la estructura nueva y se inicia el montaje.

R.I. Jully Castaneda
Res Obra.

09 Mayo 2026
Personal = 1 Oficial - 2 Ayudantes.
Se continua con el montaje de la estructura de la cubierta de la bodega.

R.I. Jully Castaneda
Res Obra.

Powered by CamScanner

11 Mayo del 2026.
Personal = 1 Oficial
Se inicio con la organización de bodega para mantenimiento de la estructura.

R/ [signature] Jdy Cartañeda
Per Obra.

12 Mayo del 2026.
Personal = 1 Oficial.
Se realiza orden y aseo en toda la área de la placa hidroneumatica y bodega.

R/ [signature] Jdy Cartañeda
Per Obra.

13. Mayo del 2026.
Personal = 2 Oficiales - 1 Ayudante.
Se inicia con el montaje de cubierta en la bodega.

R/ [signature] Jdy Cartañeda.
Per Obra.

14 Mayo del 2026.
Personal. = 1 Oficial.
Se inicia con la pintura de mantenimiento de la estructura de la bodega.

R/ [signature] Jdy Cartañeda
Per Obra.

Powered by CamScanner

FECHA:	17/04/2026	**INFORME SEMANAL**	
DIAS RESTANTES	**25**		
CORTE DEL INFORME:	***18/04/2026***		

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SEMANA N°	23	**DEL**	12-abr-26	**AL**	18-abr-26

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.8169111	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.8155154
Fecha de Iniciación	14/10/2025	**Fecha de Iniciación**	14/10/2025
Fecha de Terminación	13/05/2026	**Fecha de Terminación**	13/05/2026
Plazo Inicial	7 MESES	**Plazo Inicial**	7 MESES
Valor inicial	$ 796.278.928,00	**Valor inicial**	$ 2.497.896.864,00
Adiciones	0	**Adiciones**	0
Prorroga	N.A.	**Prorroga**	N.A.
Suspensión	N.A.	**Suspensión**	N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES
No.	**FRENTE**	PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	PROGRAMADO ACUM	EJECUTADO ACUM	DESVIACIÓN	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**
1	RAFAEL URIBE URIBE	61,65%	63,54%	72,23%	71,76%	-0,47%	Actividades de placa . Construccion carcamo, cimentacion cancha, instalacion geotextil, subbase, fundida de placa
2	LA FLORESTA SUR	62,13%	59,93%	61,53%	60,21%	-1,32%	Actividades limpieza de cancha, pintura de cancha.
3	CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADA
4	CARLOS ARTURO TORRES	30,23%	36,61%	53,83%	52,70%	-1,12%	Actividades de zapatas, armado de refuerzo, divisiones, fundida de columnas
5	CARLOS ARTURO TORRES	72,93%	71,13%	87,05%	85,28%	-1,77%	Actividades de pañetes muros, estuco y pintura. Instalacion de ventanas.
6	FRANCISCO DE MIRANDA	24,66%	27,71%	31,58%	29,49%	-2,09%	Actividades instalacion de pisos, enchape muros, estuco, pintura, estructura cielo raso, muros en super board.
7	RUFINO JOSE CUERVO	80,22%	80,52%	81,96%	80,97%	-0,98%	Actividades, sellado juntas de dilatacion en piso. Pintura pisos
8	JOSE ANTONIO RICAURTE - SAN CARLOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	N.A
TOTALES		**53,98%**	**54,93%**	**61,02%**	**60,05%**		

3. RESUMEN FINANCIERO

RAFAEL URIBE URIBE

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 345.288.300	$ 247.787.685	**$ 97.500.615**		21,13%	71,76%

LA FLORESTA SUR

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 125.256.968	$ 75.412.485	**$ 49.844.483**		13,14%	60,21%

CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 345.179.356	$ 345.179.356	$ -		0,00%	100,00%

CARLOS ARTURO TORRES

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 261.379.900	$ 137.751.630	**$ 123.628.270**		52,70%	52,70%

CARLOS ARTURO TORRES

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 219.914.224	$ 187.543.307	**$ 32.370.917**		0,00%	85,28%

FRANCISCO DE MIRANDA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 232.311.676	$ 68.515.691	**$ 163.795.985**		29,49%	29,49%

RUFINO JOSE CUERVO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 139.179.052	$ 112.696.354	**$ 26.482.699**		2,59%	80,97%

JOSE ANTONIO RICAURTE - SAN CARLOS

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 248.315.879	$ -	**$ 248.315.879**		0,00%	0,00%

EMERGENCIAS


	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE EMERGENCIAS	**$ 205.063.881**	$ 202.309.659	**$ 2.754.223**		3538,59%	98,66%

FECHA:	17/04/2026	**INFORME SEMANAL**	
DIAS RESTANTES	**25**		
CORTE DEL INFORME:	***18/04/2026***		

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SEMANA N°	23	**DEL**	12-abr-26	**AL**	18-abr-26

4. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

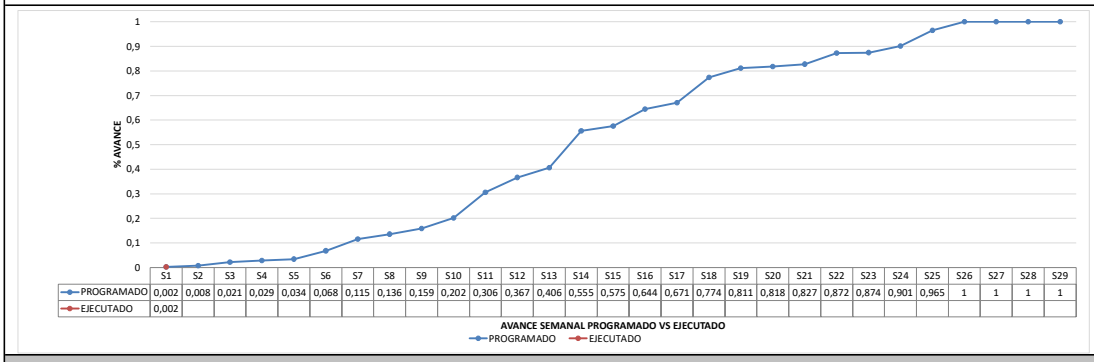

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29
PROGRAMADO	0,002	0,008	0,021	0,029	0,034	0,068	0,115	0,136	0,159	0,202	0,306	0,367	0,406	0,555	0,575	0,644	0,671	0,774	0,811	0,818	0,827	0,872	0,874	0,901	0,965	1	1	1	1
EJECUTADO	0,002																												

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

OBSERVACIONES: N.A

RECOMENDACIONES:
• Mantener orden y aseo en la obras, así como la señalización
• Continuar con el uso correcto de EPP
• Apertura de más frentes de obra

CONCLUSIONES:
• JOSE MARIA CORDOBA :Actividades de mantenimiento de ventanas de fachada, instalacion tableta piso tarima, aseo.
RAFAEL URIBE URIBE : Actividades de placa . Construccion carcamo, cimentacion cancha, instalacion geotextil, subbase, fundida de placa
CARLOS ARTURO TORRES SEDE B: Actividades de pañetes muros, estuco y pintura. Instalacion de ventanas.
RUFIJO JOSE CUERVO:Actividades, Actividades, sellado juntas de dilatacion en piso. Pintura pisos
CARLOS ARTURO TORRES SEDE A:Actividades de zapatas, armado de refuerzo, divisiones, fundida de columnas
FRANCISCO MIRANDA:Actividades instalacion de pisos, enchape muros, estuco, pintura, estructura cielo raso, muros en super board.
LA FLORESTA SUR:Actividades limpieza de cancha, pintura de cancha.

EMERGENCIA OEA:Actividaes de pintura terraza.
EMERGENCIA DILE TUNJUELITO:Finalizada
EMERGENCIA HERNANDO DURAN DUSSAN: finalizada
EMERGENCIA COLEGIO CASTILLA:Finalizada
EMERGENCIA CODEMA: finzalizada
EMERGENCIA ROSA MARIA GORDILLO:finalizada

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

1. Se realiza revision de actividades en colegios : Jose maria cordoba, Rafael uribe uribe, Carlos arturo torres sede B, Rufino jose cuervo,Carlos arturo torres sede A,Fancisco Miranda, La floresta
2.se realiza revision cantidades
3.se realiza revision de correspondecia
4.se realizan observaciones a requerimientos tecnicos del contratista
5.se realiza informe semanal
6.se realiza revision acta de corte y memorias

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

13 de Abril al 19 de Abril del 2026
Durante la presente semana, se mantiene el personal previamente aprobado para el ingreso y ejecución de actividades, asegurando que todo el personal cumpla con los requisitos establecidos por la interventoría. Así mismo, esta interventoría realizó recorridos de verificación y seguimiento a las actividades adelantadas en las instituciones educativas Carlos Arturo Torres Sede B, José María Córdoba, Rafael Uribe Uribe, Rufino José Cuervo, José María Miranda, Carlos Arturo Torres Sede A y Hernando Durán Dussán. Durante la ejecución de las labores se contó con acompañamiento permanente del área de SST, efectuando control en campo sobre condiciones locativas, operativas, identificación de peligros, valoración de riesgos y cumplimiento de medidas preventivas.
Durante el periodo evaluado se evidencian jornadas de orden, aseo y retiro de escombros en el Colegio Rafael Uribe Uribe, actividades que aportan a la prevención de accidentes, mejorando las condiciones de seguridad y movilidad dentro de las áreas intervenidas. Así mismo, en las labores de fundida de placa de la cancha se observó al personal haciendo uso adecuado de los elementos de protección personal requeridos para la actividad, evidenciando cumplimiento de las medidas básicas de SST.
Con relación a las actividades ejecutadas en el Colegio Carlos Arturo Torres Sede B, se recomienda al contratista reforzar con el personal el uso permanente y adecuado de los elementos de protección personal, especialmente el casco de seguridad, teniendo en cuenta los riesgos presentes en obra. De igual manera, se valida el uso adecuado de escalera para las actividades de pintura, observándose condiciones seguras para su utilización.
En términos generales, es importante que el contratista continúe fortaleciendo las inspecciones planeadas de SST, las charlas preoperacionales, el autocuidado del personal y el seguimiento al cumplimiento de los protocolos establecidos, con el fin de prevenir incidentes y garantizar ambientes de trabajo seguros durante la ejecución de las actividades.

Total de horas hombres trabajadas: 42
Total de horas capacitación: 20 minutos
Número de accidentes de trabajo: 0
Número de días de incapacidad por AT:0
Número de días de incapacidad por enfermedad común: 0
REPORTE PERSONAL
DIRECTOR OBRA: 1 INSPECTORES SST: 1
RESIDENTE OBRA: 1 PERSONAL OPERATIVO: 36

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

IED José María Córdoba: Se evidencia material de construcción y RCD (volumen medio) en zona verde, el contratista anteriormente realizo la protección adecuada de los individuos arbóreos cerca al parqueadero, por lo que todavía se evidencia acopio en esta zona por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área al igual se recomendó al contratista presentar solo una zona de acopio, disponer adecuadamente ya que llevan varias semanas y cumplen con la cantidad mínima para el retiro, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).
IED Carlos Arturo Torres Sede A: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento adecuado, se reporta material acopiado adecuadamente, pero se evidencian gran cantidad de residuos en zona verde, por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, se evidencia desorden, por lo que se recomienda organizar, señalizar el área de acopio, disponerlo adecuadamente ya que cumplen con la cantidad mínima para el retiro e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Carlos Arturo Torres Sede B: Se realizo recorrido en el frente, se recomendó una jornada de orden y aseo en el salón e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Rafael Uribe Uribe: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento adecuado, se realizó la recolección de chatarra de este frente, cuentan con acopio de materiales de construcción y los RCDs generados adecuadamente, por lo que se recomienda disponer o reutilizar los residuos, realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Ruffino Jose Cuervo Sede C: Se realizo recorrido en el frente, anteriormente se dispuso adecuadamente los residuos, se mantiene el orden en el frente y implementa todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Francisco Miranda: Se realizo recorrido en el frente, no se cuenta con el cerramiento y la señalización adecuada, se realiza en batea metálica la mezcla de cemento, se reporta un acopio de residuos y de material de construcción, se le hace llamado de atención al contratista, por lo que se recomienda disponer adecuadamente todos los residuos, contar con el cerramiento y la señalización, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente.

OTROS

MILLER MARÍN CASTELLANOS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

HARRY ARNAGO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


FECHA:	17/04/2026	**INFORME SEMANAL**	
DIAS RESTANTES	**201**		
CORTE DEL INFORME:	***18/04/2026***		

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA

Colegio Jose Maria Cordoba



limpieza carcamo

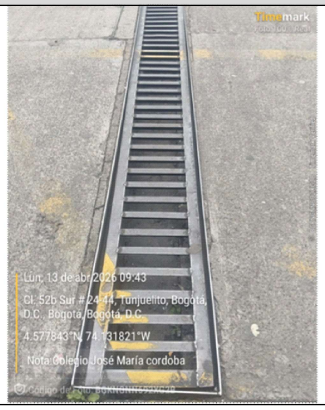

limpieza carcamo



mantenimiento ventanas



mantenimiento ventanas



mantenimiento ventanas



pulida de pisos

Colegio Rafael Uribe Uribe



construccion carcamo



construccion carcamo



construccion carcamo



instalacion malla



fundida de placa



fundida de placa

Colegio Carlos arturo torres sede B



Pintura muros



Pintura muros



Pintura muros



Pintura muros



Pintura muros




Pintura muros


Colegio Rufino Jose Cuervo



Pintura cancha

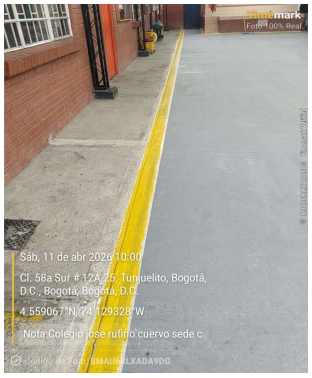


aseo plazoleta

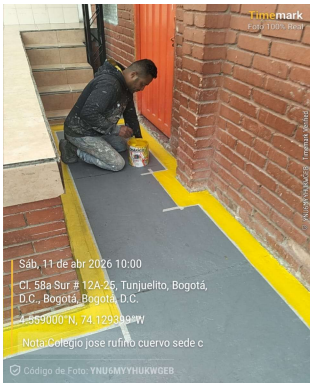

pintura plazoleta



pintura plazoleta

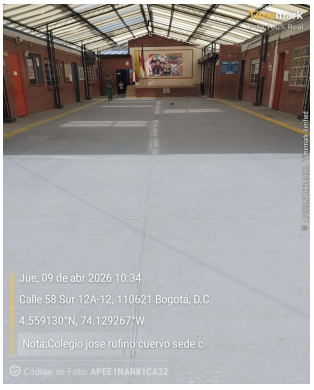

pintura plazoleta




rejilla


Colegio Carlos arturo torres sede A




columnas

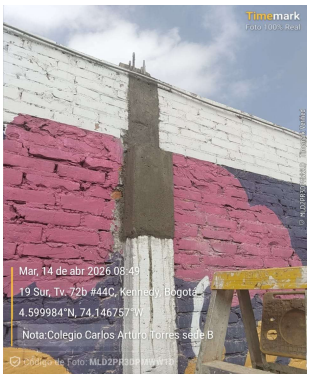


columnas

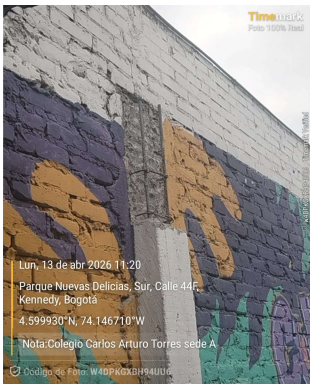


columnas

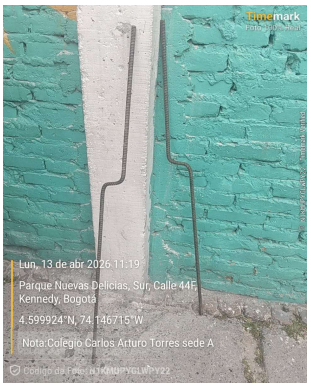

figurada de hierro

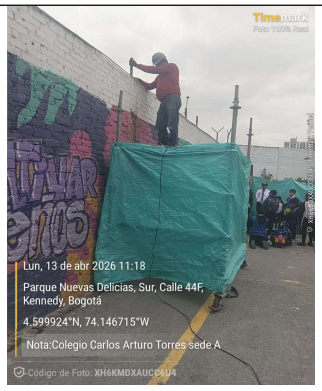

fundida de columnas

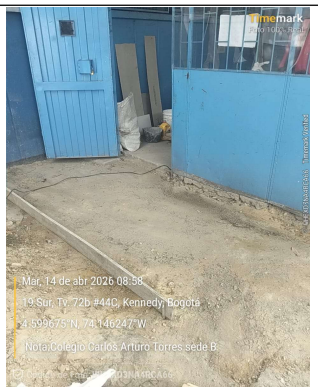

cuarto de almacenamiento placa

Colegio Fracisco de Miranda



instalaciones pisos



muros super board



muros super board



instalaciones estructura cielo raso



muros super board



muros super board

Colegio La Florestas sur sede A



Aseo



Aseo




Demarcacion cancha



Demarcacion cancha




Demarcacion cancha

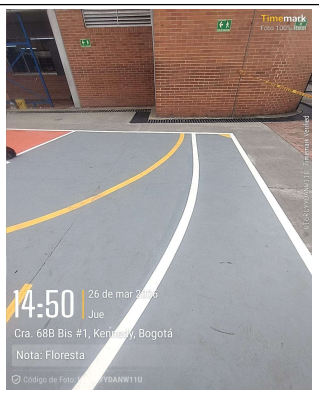

Demarcacion cancha

Emergencia Colegio OEA

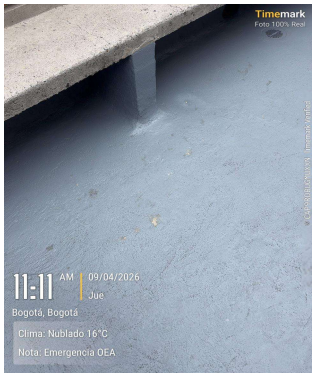


reparacion terraza



Mortero reparacion



cocina

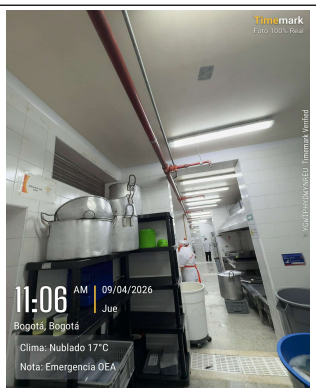

Mortero reparacion


Emergencia Dile tunjuelito




angeo carcamo



rejilla carcamo



resanes y pintura

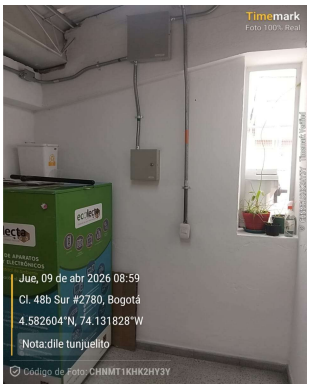

resanes y pintura

Emergencia Colegio Hernando Duran Dussan




equipos







cocina




extractor

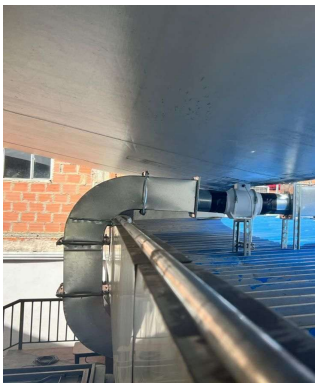


extractor

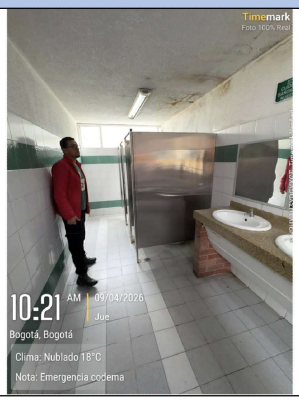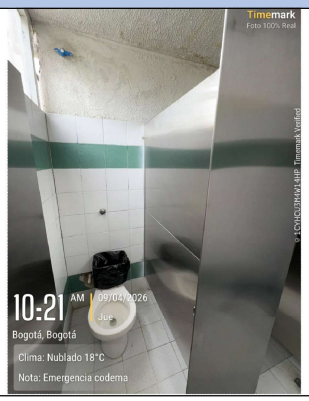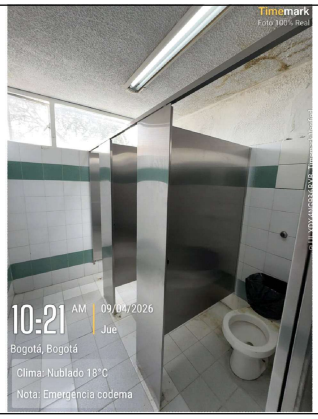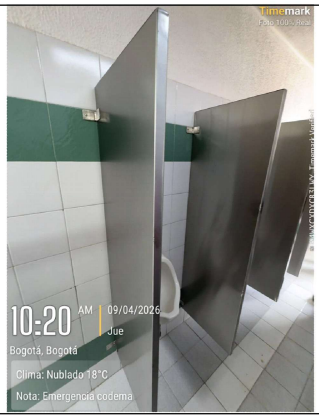Emergencia Codema	
	
Divisiones de baño	Divisiones de baño
	
Divisiones de baño	Divisiones de baño


Emergencia Colegio Castilla

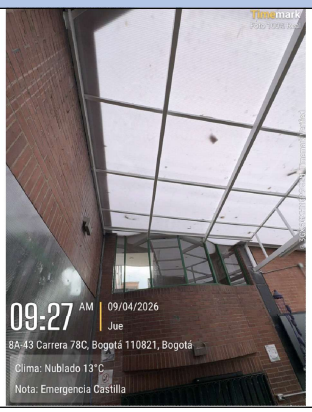


Cambio de cubierta

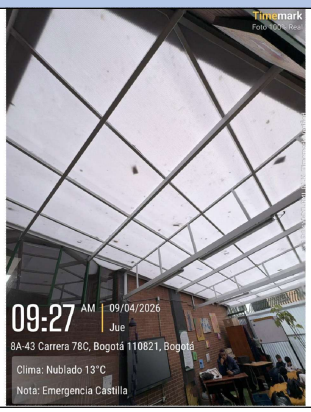

Cambio de cubierta

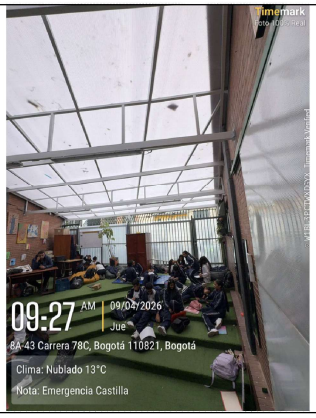

Cambio de cubierta

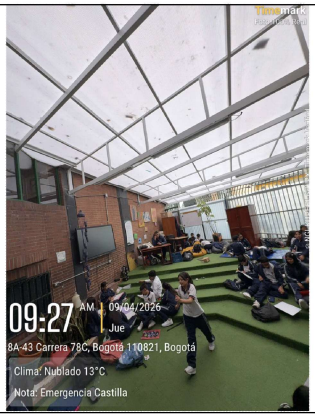

Cambio de cubierta

FECHA: 17/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 25 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA		GRUPO 8
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		

CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA
18 de abril de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169111	CO1.PCCNTR.8155154	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.497.896.864
INICIO	14 de octubre de 2025	14 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ -	$ -
TERMINACION INICIAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	PRÓRROGAS					
TERMINACION FINAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	TOTAL	211	211	TOTAL	$ 796.278.928,00	$ 2.497.896.864,00

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA		OTRO ASPECTO
1					
2					
3					
4					

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400-47	5 9 2025	5 10 2026	5 4 2026	5 4 2031	5 9 2025	5 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
14-44-101244200	14 10 2025	13 1 2027	14 10 2025	14 5 2029	14 5 2025	14 5 2027	14-40-101075759	14 10 2025	14 5 20206

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (31082024)	PROGR ACOMU %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	dic-2025	ene-2026	feb-2026	mar-2026	abr-2026	may-2026	jun-2026	jul-2026	ago-2026	sep-2026	oct-2026	nov-2026	dic-2026	ene-2027	feb-2027	mar-2027
612	RAFAEL URIBE URIBE	Tunjuelito	B	Nuestra Señora del Carmen	63,54%	71,76%	72,23%		$ 345.288.300,31	$ 247.787.685	3/12/2025	4/04/2026																			
829	LA FLORESTA SUR	Kennedy	A	La Floresta Sur	59,93%	60,21%	61,53%		$ 128.256.968,13	$ 75.412.485	3/12/2025	4/05/2026																			
601	CENTRO INTEGRAL	Tunjuelito	A	José María Cordoba	100,00%	100,00%	100,00%		$ 345.179.356,92	$ 345.179.356	4/11/2025	4/03/2026																			
849	CARLOS ARTURO	Kennedy	A	Carlos Arturo Torres y Rep de	36,61%	52,70%	53,83%		$ 261.379.899,96	$ 137.751.630	13/01/2026	13/04/2026																			
803	CARLOS ARTURO	Kennedy	B	Rep.de Finlandia	71,13%	85,26%	87,05%		$ 219.914.224,02	$ 187.543.307	4/11/2025	4/04/2026																			
816	FRANCISCO DE	Kennedy	A	Bas-Med. Francisco de Miranda	27,71%	29,49%	31,58%		$ 232.311.675,65	$ 68.515.691	13/01/2026	13/05/2026																			
617	RUFINO JOSE CUERVO	Tunjuelito	C	Nuevo Tunjuelito	80,52%	80,97%	81,96%		$ 139.179.052,48	$ 112.696.354	13/01/2026	13/04/2026																			
609	JOSE ANTONIO	Tunjuelito	B	San Carlos	0,00%	0,00%	0,00%		$ 248.315.879,08		16/12/2025	15/04/2026																			
TOTAL FRENTES DE OBRA						60,05%	61,02%		$ 1.916.825.356	$ 1.174.886.507																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
878	HERNANDO DURAN	Kennedy	A	Tintalito (Hernado Duran Dusan)	100,00%	100,00%	100,00%		$ 66.518.828	$ 66.518.828	5/12/2025	23/12/2025																			
807	O.E.A	Kennedy	B	Antonia Santos I	93,19%	93,19%	95,66%		$ 40.447.661	$ 37.693.438	5/12/2025	21/12/2025																			
863	KENNEDY	Kennedy	D	Rosa María Gordillo	100,00%	100,00%	100,00%		$ 4.409.209	$ 4.409.209																					
884	CODEMA	Kennedy	A	Dario Echandia - CODEMA	100,00%	100,00%	100,00%		$ 45.922.593	$ 45.922.593	18/03/2026	30/12/2026																			
627	D.I.L.E TUNJUELITO	Tunjuelito	A	Direccion Local De Tunjuelito	100,00%	100,00%	100,00%		$ 17.760.045	$ 17.760.045	12/12/20205	30/12/2025																			
826	JACKELINE	Kennedy	A	Jackeline	100,00%	100,00%	100%		$ 2.700.094	$ 2.700.094	9/12/20255	12/12/2025																			
818	CASTILLA	Kennedy	A	Nueva Castilla	100,00%	100,00%	100%		$ 27.305.453	$ 27.305.453	6/02/2026	13/02/2026																			
TOTAL FRENTES DE OBRA						99,03%	99,38%		$ 205.063.881	$ 202.309.659																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
1	6	1	8	$ 1.174.886.507
ACUMULADO EMERGENCIAS				
3	4	0	7	$ 202.309.659
TOTAL				
4	10	1	15	$ 1.377.196.166
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	60,05%	0,00%	88,15%
PROGRAMADO	61,02%		
ATRASO	-0,97%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			














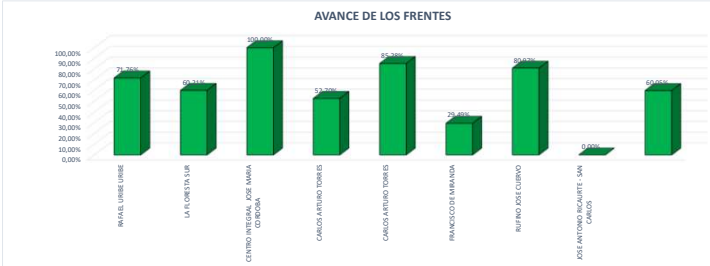

OBSERVACIONES:

FECHA:	17/04/2026		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	0	Dias				
REGISTRO FOTOGRAFICO					GRUPO 8	0
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155154	CONTRATISTA:	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA		
18/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169111	INTERVENTOR:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE		ESTADO ACTUAL O FINAL
Colegio Jose Maria Cordoba	BAÑO SEGUNDO NIVEL Y FACHADA	FINALIZADA				
Colegio Rafael Uribe Uribe	CANCHA	Actividades de placa . Construccion carcamo, cimentacion cancha, instalacion geotextil, subbase, fundida de placa				
Colegio Carlos Arturo Torres sede B	CANCHA	Actividades de pañetes muros, estuco y pintura. Instalacion de ventanas.				
Colegio Rufino Jose Cuervo	PLACA PATIO	Actividades, sellado juntas de dilatacion en piso. Pintura pisos				
Colegio Carlos Arturo Torres sede A	BAÑOS	Actividades de zapatas, armado de refuerzo, divisiones, fundida de columnas				
Colegio Francisco Miranda	BAÑOS Y CUARTO INCLUSION	Actividades instalacion de pisos, enchape muros, estuco, pintura, estructura cielo raso, muros en super board.				
Colegio La floresta	CANCHA	Actividades limpieza de cancha, pintura de cancha.				

Emergencia OEA	TERRAZA	pintura epoxica color gris				
Emergencia Dile Tunjuelito	CUBIERTA	Actividades de resanes muros , instalacion rejilla, instalacion de angeo.				
Emergencia Hernando Duran Dussan	CUBIERTA	campana				
Emergencia Codema	BAÑOS	Actividades de instalacion de divisiones de baño.				
Emergencia Castilla	CUBIERTA	Actividades de cambio de cubierta.				

BALANCE SEMANAL POR CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS

		CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA					VIGENCIA	2025.00
GRUPOS	ITEM	CPF	612	IED	RAFAEL URIBE URIBE			SEMANA					
		Item / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones	
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (Incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL	M	53,60	53,6		$ 30.066,00	$ 1.611.537,60	$ -	100,00%	100,00%		
	1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorias para cubrimiento de pisos y ventanas	M2	436,08	88,96		$ 3.395,00	$ 302.019,20	$ 1.178.472,40	20,40%	20,40%		
	1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS	M3	0,18	0,18		$ 286.958,00	$ 51.652,44	$ -	100,00%	100,00%		
	1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	86,75	86,75		$ 79.342,00	$ 6.882.918,50	$ -	100,00%	100,00%		
	1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	66,60	66,6		$ 72.193,00	$ 4.808.053,80	$ -	100,00%	100,00%		
	1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A	M2	15,01	15,01		$ 21.553,00	$ 323.510,53	$ -	100,00%	100,00%		
	1.2.14	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	30,82	30,82		$ 155.716,00	$ 4.799.167,12	$ -	100,00%	100,00%		
	1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA. LOS	M2	119,16	119,16		$ 35.518,00	$ 4.232.324,88	$ -	100,00%	100,00%		
	1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS	UN	3,00	3		$ 11.566,00	$ 34.698,00	$ -	100,00%	100,00%		
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8,00	8		$ 7.219,00	$ 57.752,00	$ -	100,00%	100,00%		
	1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	96,00	96		$ 4.244,00	$ 407.424,00	$ -	100,00%	100,00%		
	1.2.34	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	2,00	2		$ 385.556,00	$ 771.112,00	$ -	100,00%	100,00%		
	1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	23,09	23,09		$ 18.852,00	$ 435.292,68	$ -	100,00%	100,00%		
	1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	61,59	61,59		$ 21.852,00	$ 1.345.864,68	$ -	100,00%	100,00%		
	1.2.48	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	8,38	14		$ 30.684,00	$ 429.576,00	$ (172.327,48)	166,99%	166,99%		
	1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	43,12	43,12		$ 16.333,00	$ 704.278,96	$ -	100,00%	100,00%		
	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	8,91	8,91		$ 96.108,00	$ 856.322,28	$ -	100,00%	100,00%		
	2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	4,92	4,92		$ 130.850,00	$ 643.782,00	$ -	100,00%	100,00%		
	2.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	250,38	250,38		$ 83.544,00	$ 20.917.746,72	$ -	100,00%	100,00%		
	2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	4,92	4,92		$ 22.675,00	$ 111.561,00	$ -	100,00%	100,00%		
	2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	2,33	2,33		$ 174.968,00	$ 407.675,44	$ -	100,00%	100,00%		
	2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	106,19	106,19		$ 183.945,00	$ 19.533.119,55	$ -	100,00%	100,00%		
	2.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	M3	121,46	121,46		$ 173.913,00	$ 21.123.472,98	$ -	100,00%	100,00%		
	2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	22,96	22,96		$ 101.433,00	$ 2.328.901,68	$ -	100,00%	100,00%		
	2.2.10	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A	M2	5,38	5,38	5,38	$ 202.686,00	$ 1.090.450,68	$ -	100,00%	100,00%		
	2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	31,20	31,20	31,20	$ 111.395,00	$ 3.475.524,00	$ -	100,00%	100,00%		
	2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	142,91	142,91	142,91	$ 160.361,00	$ 22.917.190,51	$ -	100,00%	100,00%		
	2.3.9	MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	22,96	22,96		$ 28.402,00	$ 652.109,92	$ -	100,00%	100,00%		
	2.3.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM,	M	21,56	21,56		$ 334.957,00	$ 7.221.672,92	$ -	100,00%	100,00%		
	2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	1958,73	21,56		$ 7.012,00	$ 151.178,72	$ 13.583.436,04	1,10%	1,10%		
	2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	1440,00	50,75		$ 7.421,00	$ 376.615,75	$ 10.309.624,25	3,52%	3,52%		
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	60,00	60		$ 5.814,00	$ 348.840,00	$ -	100,00%	100,00%		
	5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	2		$ 163.229,00	$ 326.458,00	$ -	100,00%	100,00%		
	5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE	UN	1,00	1		$ 204.593,00	$ 204.593,00	$ -	100,00%	100,00%		
	5.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1-1/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y	M	96,00	96		$ 20.737,00	$ 1.990.752,00	$ -	100,00%	100,00%		
	5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	M	27,10	27,1		$ 22.533,00	$ 610.644,30	$ -	100,00%	100,00%		
	5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	UN	8,00	8		$ 174.276,00	$ 1.394.208,00	$ -	100,00%	100,00%		
	5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8,00	8		$ 241.381,00	$ 1.931.048,00	$ -	100,00%	100,00%		
	5.1.49	ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE	M	96,00	96		$ 60.364,00	$ 5.794.944,00	$ -	100,00%	100,00%		
	7.1.8	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS,	M2	255,89	255,89	255,89	$ 142.899,00	$ 36.566.425,11	$ -	100,00%	100,00%		
	7.1.9	JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES	M	350,95	0,00	0,00	$ 35.908,00	$ -	$ 12.601.912,60	0,00%	0,00%		
	7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	107,00	0		$ 498.089,00	$ -	$ 53.295.523,00	0,00%	0,00%		
	7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	350,95	350,95	350,95	$ 25.380,00	$ 8.907.111,00		100,00%	100,00%		
	9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	8,38	8,3838		$ 965.200,00	$ 8.092.043,76	$ -	100,00%	100,00%		
	9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	10,78	10,78		$ 66.398,00	$ 715.770,44	$ -	100,00%	100,00%		
	12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	181,76	181,76		$ 34.979,00	$ 6.357.783,04	$ -	100,00%	100,00%		
	12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	73,81	73,81		$ 39.822,00	$ 2.939.261,82	$ -	100,00%	100,00%		
	12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	70,88	34,71		$ 23.852,00	$ 827.902,92	$ 862.726,84	48,97%	48,97%		
	12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	186,52	186,52		$ 20.875,00	$ 3.893.605,00	$ -	100,00%	100,00%		
	12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	33,78	33,78		$ 28.786,00	$ 972.391,08	$ -	100,00%	100,00%		
	12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 MI (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	34,71	34,71		$ 20.749,00	$ 720.197,79	$ -	100,00%	100,00%		
	12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS. VIGAS. COLUMNAS Y ESTRUCTURA	M	33,19	33,19		$ 8.860,00	$ 294.063,40	$ -	100,00%	100,00%		
	16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN,	M2	119,16	119,16		$ 129.084,00	$ 15.381.649,44	$ -	100,00%	100,00%		
	16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y	M2	85,15	85,15		$ 240.910,00	$ 20.513.486,50	$ -	100,00%	100,00%		
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	408,44	0		$ 4.508,00	$ -	$ 1.841.247,52	0,00%	0,00%		

		CPF	829	IED	LA FLORESTA SUR			SEMANA					
		Item / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones	
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (Incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	120,00	120	120	$ 30.066,00	$ 3.607.920,00	$ -	100,00%	100,00%		
	1.2.19	DEMOLICIÓN DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	21,53	21,53	21,53	$ 28.405,00	$ 611.559,65	$ -	100,00%	100,00%		
	NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA SIMILAR A LA EXISTENTE,CONTRAMARCO EN PLATINA DE 2"1/2 X 1/4 REJILLA METÁLICA EN PLATINA DE 1,1/2 X 3/16 CON SEPARACIONES DE 3.5 CM ENTRE PLATINAS (SEPARACIONES EN REJILLA EXISTENTE)Y UN REFUERZO EN EL CENTRO X 40.7 M EN ÁNGULO DE 1 ' X 1/8,PINTURA ANTICORROSIVA ANCHO 45 CM	M	42,70	40,3		$ 324.708,67	$ 13.085.759,40	$ 779.300,81	94,38%	94,38%		
	NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA REFORZADA SECCION PARQUEADERO; CONTRAMARCO EN PLATINA DE 2,1/2" X 1/4, REJILLA METÁLICA EN ÁNGULO DE 1,1/2 X 1/4 CON UNA SEPARACIÓN DE 3.5CM ENTRE ÁNGULOS,(SEPARACIONES EN REJILLA EXISTENTE),PINTURA ANTICORROSIVA. ANCHO 50CM	M	15,00	0		$ 449.730,19	$ -	$ 6.745.952,85	0,00%	0,00%		
	3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN. EPOXICO Y ACERO)	CM	960,00	0		$ 9.705,00	$ -	$ 9.316.800,00	0,00%	0,00%		
	7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	655,00	655		$ 63.550,00	$ 41.625.250,00	$ -	100,00%	100,00%		
	7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	220,94	220,94		$ 19.187,00	$ 4.239.175,78	$ -	100,00%	100,00%		
	9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	23,52	0		$ 761.157,00	$ -	$ 17.902.412,64	0,00%	0,00%		
	9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	21,53	20,00	20,00	$ 464.504,00	$ 9.290.080,00	$ 710.691,12	92,89%	92,89%		
	9.3.6	PUERTA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	4,20	0		$ 945.575,00	$ -	$ 3.971.415,00	0,00%	0,00%		
	16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	10,47	0		$ 129.084,00	$ -	$ 1.351.509,48	0,00%	0,00%		
	16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	10,14	0		$ 240.910,00	$ -	$ 2.442.827,40	0,00%	0,00%		
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	655,00	655,00	655,00	$ 4.508,00	$ 2.952.740,00	$ -	100,00%	100,00%		
	NP 004	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTENEDOR DE BASURA PLASTICO DE RUEDAS CON TAPA CON CAPACIDAD 1100 L (INCLUYE MONTAJE EN SITIO DE TRABAJO)	UND	2,00	0		$ 3.311.787,00	$ -	$ 6.623.574,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR	

	CPF	601	IED	Jose Maria Cordoba			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	40,11	40,11		$ 30.066,00	$ 1.205.947,26	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	0,54	0,54		$ 286.958,00	$ 154.957,32	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	32,72	32,72		$ 29.984,00	$ 981.076,48	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,27	40,27		$ 31.500,00	$ 1.268.505,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,85	2,85		$ 21.553,00	$ 61.426,05	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	163.40	163.40		$ 10.995,00	$ 1.796.583,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	108.04	108.04		$ 12.224,00	$ 1.320.680,96	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,55	6,55		$ 32.061,00	$ 209.999,55	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28,00	28		$ 26.367,00	$ 738.276,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,70	2,7		$ 31.476,00	$ 84.985,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	7,00	7		$ 11.566,00	$ 80.962,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	6,00	6,00		$ 7.219,00	$ 43.314,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	16,10	16,1		$ 4.244,00	$ 68.328,40	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.34	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	4,00	4		$ 385.556,00	$ 1.542.224,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.35	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,18	0,18		$ 23.790,00	$ 4.282,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	19,50	19,5		$ 8.659,00	$ 168.850,50	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	18,00	18		$ 14.178,00	$ 255.204,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.3.2	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2	423,36	423,36		$ 147.193,00	$ 62.315.628,48	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	33,45	33,45		$ 21.111,00	$ 706.162,95	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	7,00	7		$ 36.280,00	$ 253.960,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	22,58	22,58		$ 16.333,00	$ 368.799,14	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5.	M2	0,76	0,76		$ 70.230,00	$ 53.374,80	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.9	LAVADO CON HIDROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	529,54	529,54		$ 9.398,00	$ 4.976.616,92	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	529,58	529,58		$ 27.238,00	$ 14.424.700,04	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	1,00	1		$ 25.481,00	$ 25.481,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	6,00	6		$ 14.486,00	$ 86.916,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	6,00	6		$ 61.400,00	$ 368.400,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	18,00	18		$ 61.400,00	$ 1.105.200,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6" (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	61,96	61,96		$ 13.297,00	$ 823.882,12	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	UN	1,00	1		$ 61.772,00	$ 61.772,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	405,00	405		$ 5.814,00	$ 2.354.670,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	1		$ 122.646,00	$ 122.646,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	17,30	17,3		$ 22.533,00	$ 389.820,90	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCALICHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	6		$ 174.276,00	$ 1.045.656,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20Hs+40hC. VOLTAJE 100-240V. 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	6,00	6		$ 62.384,00	$ 374.304,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	72,45	72,45		$ 41.218,00	$ 2.986.244,10	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	61,65	61,65		$ 203.467,00	$ 12.543.740,55	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO H=10 CM, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	55,34	55,34		$ 83.512,00	$ 4.621.554,08	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	40,8	40,8		$ 14.858,00	$ 606.206,40	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	21,52	21,52		$ 63.550,00	$ 1.367.596,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX+0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	670,38	670,38		$ 19.187,00	$ 12.862.581,06	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	26,75	26,75		$ 85.861,00	$ 2.296.781,75	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	102,64	102,64		$ 94.926,00	$ 9.743.204,64	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA CÁRCAMO DE 30 CM DE ANCHO EN ÁNGULO DE 2"X3/16 Y CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE 1-1/2" X 3/16" CON 20 MM DE DILATACIÓN	M2	24,00	24		$ 347.190,00	$ 8.332.560,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1,28	1,28		$ 451.950,00	$ 578.496,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	6,32	6,32		$ 1.090.099,00	$ 6.889.425,68	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LINEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	6,00	6		$ 746.496,00	$ 4.478.976,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	12,00	12		$ 391.028,00	$ 4.692.336,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	3,00	3		$ 32.443,00	$ 97.329,00	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	5,07	5,07		$ 956.124,00	$ 4.847.548,68	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2,63	2,63		$ 1.033.647,00	$ 2.718.491,61	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	13,65	13,65		$ 34.979,00	$ 477.463,35	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	798,70	798,7		$ 39.822,00	$ 31.805.831,40	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.3	PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	37,88	37,88		$ 40.967,00	$ 1.551.829,96	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	14,22	14,22		$ 12.106,00	$ 172.147,32	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	959,30	959,3		$ 23.852,00	$ 22.881.223,60	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.10	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	15,57	15,57		$ 12.606,00	$ 196.275,42	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.12	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	32,94	32,94		$ 12.568,00	$ 413.989,92	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	37,88	37,88		$ 20.875,00	$ 790.745,00	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	49,64	49,64		$ 33.461,00	$ 1.661.004,04	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1354,68	1354,68		$ 28.786,00	$ 38.995.818,48	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1295,91	1295,91		$ 20.749,00	$ 26.888.836,59	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	32,94	32,94		$ 17.148,00	$ 564.855,12	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	1247,97	1247,97		$ 23.550,00	$ 29.389.693,50	$ -	100,00%	100,00%	
12.3.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	2,20	2,2		$ 28.987,00	$ 63.771,40	$ -	100,00%	100,00%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	35,94	35,94		$ 8.860,00	$ 318.428,40	$ -	100,00%	100,00%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	5,19	5,19		$ 128.780,00	$ 668.368,20	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	3,00	3		$ 40.429,00	$ 121.287,00	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	359,00	359		$ 4.508,00	$ 1.618.372,00	$ -	100,00%	100,00%	
NP1	DESMONTE DE ESPEJOS Y/O VIDRIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,24	5,24		$ 18.685,00	$ 97.909,40	$ -	100,00%	100,00%	PT APROBAR
NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UND	6,00	6		$ 1.165.807,00	$ 6.994.842,00	$ -	100,00%	100,00%	PT APROBAR

	CPF	649	IED	CARLOS ARTURO TORRES SEDE A			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	57,00	0		$ 4.093,00	$ -	$ 233.301,00	0,00%	0,00%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	3,15	3,15		$ 30.066,00	$ 94.707,90	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	24,70	24,7		$ 2.402,00	$ 59.329,40	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	1,03	1,03		$ 286.958,00	$ 295.566,74	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.2	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	0,59	0		$ 244.462,00	$ -	$ 143.743,66	0,00%	0,00%	
1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	8,00	0		$ 113.245,00	$ -	$ 905.960,00	0,00%	0,00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	29,73	29,73		$ 31.500,00	$ 936.495,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,14	7,14		$ 21.553,00	$ 153.888,42	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	53,05	53,05		$ 10.995,00	$ 583.284,75	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.13	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	53,05	53,05		$ 12.224,00	$ 648.483,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.16	DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	39,46	0		$ 113.213,00	$ -	$ 4.467.668,01	0,00%	0,00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	37,71	30,51		$ 32.061,00	$ 978.181,11	$ 230.839,20	80,91%	80,91%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	14,00	14		$ 26.367,00	$ 369.138,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.22	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	4,00	4		$ 161.707,00	$ 646.828,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	35,22	0		$ 35.518,00	$ -	$ 1.250.943,96	0,00%	0,00%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	31,49	31,49		$ 31.476,00	$ 991.179,24	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4,00	4		$ 7.219,00	$ 28.876,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	20,00	0		$ 4.244,00	$ -	$ 84.880,00	0,00%	0,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	65,00	17,6		$ 8.659,00	$ 152.398,40	$ 410.436,60	27,08%	27,08%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	8,00	8		$ 14.178,00	$ 113.424,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.43	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.15 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	4,00	4		$ 45.204,00	$ 180.816,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.48	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTR

2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	0,43	0,430625		$ 1.069.032,00	$ 460.351,91	$ (668,15)	100,15%	100,15%	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	110,60	0		$ 101.433,00	$ -	$ 11.218.489,80	0,00%	0,00%	
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	5,70	3,25		$ 57.073,00	$ 185.487,25	$ 139.828,85	57,02%	57,02%	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11,60	0		$ 160.361,00	$ -	$ 1.860.187,60	0,00%	0,00%	
2.2.15	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI DE 15 CM SOBRE LAMINA COLABORANTE 2"	M2	11,60	0		$ 241.182,00	$ -	$ 2.797.711,20	0,00%	0,00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	822,31	5,9248		$ 7.012,00	$ 41.544,70	$ 5.724.493,02	0,72%	0,72%	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	48,49	24,24		$ 7.421,00	$ 179.885,04	$ 179.944,41	49,99%	49,99%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	116,00	58		$ 141.229,00	$ 8.191.282,00	$ 8.191.282,00	50,00%	50,00%	
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	32,93	32,93		$ 25.481,00	$ 839.089,33	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	116,40	0		$ 19.470,00	$ -	$ 2.266.308,00	0,00%	0,00%	
4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1"	UN	63,00	0		$ 9.479,00	$ -	$ 597.177,00	0,00%	0,00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7,00	7		$ 61.400,00	$ 429.800,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	9,00	9		$ 61.400,00	$ 552.600,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	2,00	2		$ 66.686,00	$ 133.372,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 1"	UN	1,00	0		$ 200.497,00	$ -	$ 200.497,00	0,00%	0,00%	
4.6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"	UN	1,00	0		$ 206.989,00	$ -	$ 206.989,00	0,00%	0,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	120,00	0		$ 5.814,00	$ -	$ 697.680,00	0,00%	0,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	2		$ 122.646,00	$ 245.292,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20%A+40?C. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	5,00	5		$ 62.384,00	$ 311.920,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	29,72	29,72		$ 41.218,00	$ 1.224.998,96	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.4	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2	1,42	1,4175		$ 39.550,00	$ 56.062,13	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	49,43	49,43		$ 26.248,00	$ 1.297.438,64	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	80,00	80		$ 498.089,00	$ 39.847.120,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	41,08	41,08		$ 14.858,00	$ 610.366,64	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	23,09	23,09		$ 132.061,00	$ 3.049.288,49	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	92,41	92,41		$ 94.926,00	$ 8.772.111,66	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	40,30	0		$ 761.157,00	$ -	$ 30.676.910,57	0,00%	0,00%	
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	23,31	16,0355		$ 965.200,00	$ 15.477.464,60	$ 7.017.004,00	68,81%	68,81%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	4,80	4,8		$ 1.090.099,00	$ 5.232.475,20	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3,00	3		$ 746.496,00	$ 2.239.488,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	9,00	9		$ 391.028,00	$ 3.519.252,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2,00	2		$ 39.750,00	$ 79.500,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	3,00	3		$ 32.443,00	$ 97.329,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	13,60	13,6		$ 945.896,00	$ 12.864.185,60	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	5,98	5,98		$ 956.124,00	$ 5.717.621,52	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2,16	2,16		$ 1.033.647,00	$ 2.232.677,52	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	42,58	42,58		$ 34.979,00	$ 1.489.405,82	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.8	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	49,61	49,61		$ 36.386,00	$ 1.805.109,46	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	105,00	0		$ 23.852,00	$ -	$ 2.504.460,00	0,00%	0,00%	
12.1.12	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	29,37	29,37		$ 12.568,00	$ 369.122,16	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	32,94	32,94		$ 26.828,00	$ 883.714,32	$ -	100,00%	100,00%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20,00	0		$ 8.860,00	$ -	$ 177.200,00	0,00%	0,00%	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	31,06	31,06		$ 125.971,00	$ 3.912.659,26	$ -	100,00%	100,00%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	6,13	0		$ 128.780,00	$ -	$ 788.777,50	0,00%	0,00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	15,81	0		$ 102.700,00	$ -	$ 1.623.687,00	0,00%	0,00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	51,74	0		$ 129.084,00	$ -	$ 6.678.806,16	0,00%	0,00%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	51,74	0		$ 240.910,00	$ -	$ 12.464.683,40	0,00%	0,00%	
16.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 2"x1/8" SOBRE CORREAS PARA FIJACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA	M	27,00	0		$ 18.402,00	$ -	$ 496.854,00	0,00%	0,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	144,00	0		$ 4.508,00	$ -	$ 649.152,00	0,00%	0,00%	
19.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMATICO CON 2 BOMBAS DE 2HP 110/220 TANQUE HIDRONEUMATICO POR MEMBRANA DE 200LTS, MARCA PEARL, TABLERO DE CONTROL CON NORMA RETIE (INCLUYE 2 BOMBAS ALTA PRESIÓN CAUDAL 2.33LP/S H.MAQ 50MT 1 TANQUE HIDROACUMULADOR MEMBRANA 200LTS VERTICAL CON MANOMETRO ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN ENTRE BOMBAS Y TANQUE EN HIERRO GALVANIZADO (HG), 1 FLAUTA DE DESCARGA EN 3" INCLUYE COPA DE DESCARGA 3 A 2, 2 REGISTROS EN BRONCE TIPO COMPUERTA, 2 VÁLVULAS CHEQUE HIDRONEUMATICO EN BRONCE, 1 TABLERO DE CONTROL EN COFRE METÁLICO CON NORMA RETIE 2- PRESOSTATOS RANGO 40/60, 1 SENSOR DE NIVEL (FLOTADOR), 1 MANOMETRO EN GLICERINA CON CARATULA DE 2" (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	UN	1,00	0		$ 18.416.383,00	$ -	$ 18.416.383,00	0,00%	0,00%	
NP1	DESMONTE DE ESPEJOS Y/O VIDRIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,84	3,84		$ 18.685,00	$ 71.750,40	$ -	100,00%	100,00%	PT APROBAR
NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UND	7,00	7		$ 1.165.807,00	$ 8.160.649,00	$ -	100,00%	100,00%	PT APROBAR

8
