
Colegio Carlos arturo torres sede A




Vigas




Vigas

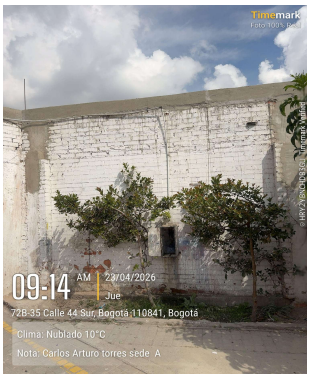


Vigas

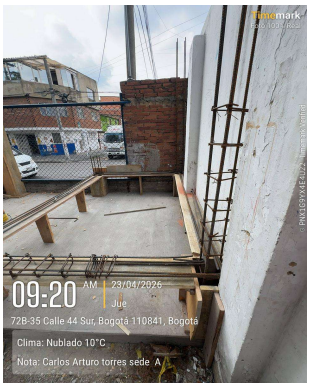

Vigas

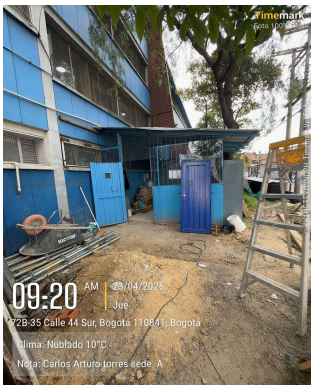


descapote

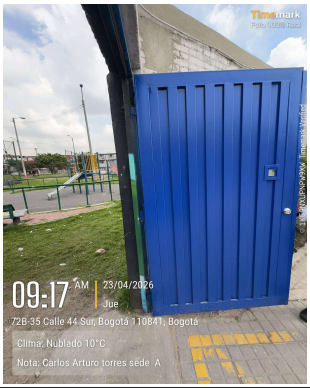

instalacion de puertas


Colegio Fracisco de Miranda

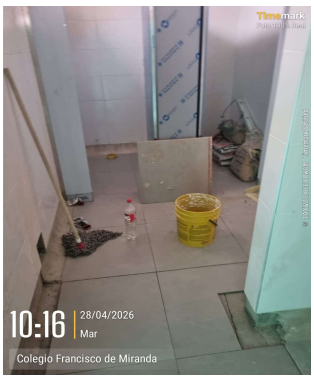

instalaciones pisos



divisiones en acero

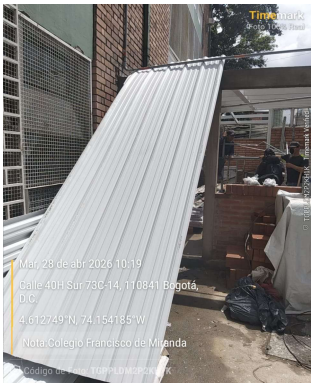

instalacion de cubierta



instalaciones estructura cubierta




muros super board



Instalaciones eectricas


Colegio La Florestas sur sede A

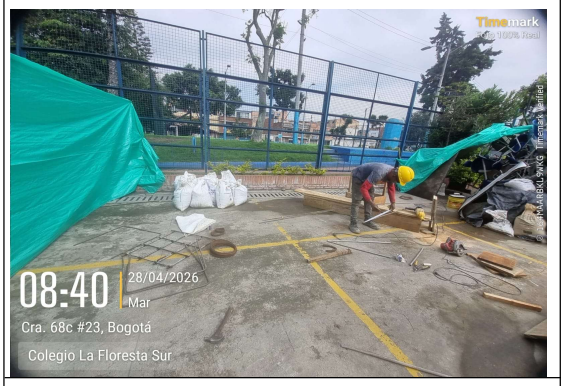


excavacion manual



excavacion manual

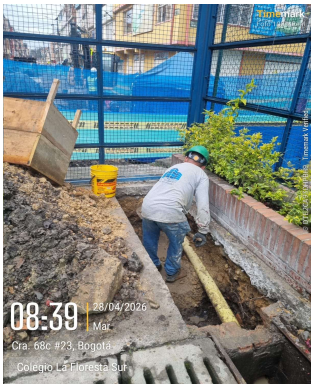

excavacion manual

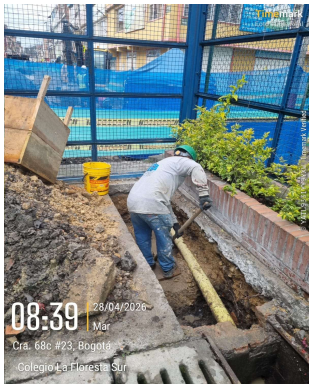

excavacion manual




excavacion manual



excavacion manual

Emergencia Colegio OEA

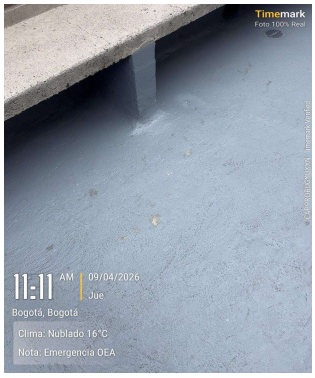


reparacion terraza



Mortero reparacion



cocina

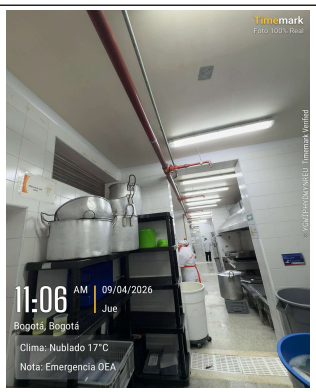

Mortero reparacion

FECHA: 30/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 11 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA		GRUPO 8
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		

CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA
2 de mayo de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169111	CO1.PCCNTR.8155154	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.497.896.864
INICIO	14 de octubre de 2025	14 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ -	$ -
TERMINACION INICIAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	PRÓRROGAS					
TERMINACION FINAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	TOTAL	211	211	TOTAL	$ 796.278.928,00	$ 2.497.896.864,00

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA		OTRO ASPECTO
1					
2					
3					
4					

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400-47	5 9 2025	5 10 2026	5 4 2026	5 4 2031	5 9 2025	5 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
14-44-101244200	14 10 2025	13 1 2027	14 10 2025	14 5 2029	14 5 2025	14 5 2027	14-40-101075759	14 10 2025	14 5 20206

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (31082024)	PROGR ACOMU %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	dic-2025	ene-2026	feb-2026	mar-2026	abr-2026	may-2026	jun-2026	jul-2026	ago-2026	sep-2026	oct-2026	nov-2026	dic-2026	ene-2027	feb-2027	mar-2027
612	RAFAEL URIBE URIBE	Tunjuelito	B	Nuestra Señora del Carmen	76,04%	78,99%	80,09%		$ 345.288.300,31	$ 272.736.468	3/12/2025	4/04/2026																			
829	LA FLORESTA SUR	Kennedy	A	La Floresta Sur	61,99%	63,20%	64,39%		$ 125.256.968,13	$ 79.167.804	3/12/2025	4/05/2026																			
601	CENTRO INTEGRAL	Tunjuelito	A	José María Cordoba	100,00%	100,00%	100,00%		$ 345.179.355,92	$ 345.179.356	4/11/2025	4/03/2026																			
849	CARLOS ARTURO	Kennedy	A	Carlos Arturo Torres y Rep de	58,95%	60,02%	51,25%		$ 261.379.899,96	$ 156.869.953	13/01/2026	13/04/2026																			
803	CARLOS ARTURO	Kennedy	B	Rep.de Finlandia	88,05%	88,68%	89,41%		$ 219.914.224,02	$ 195.022.288	4/11/2025	4/04/2026																			
816	FRANCISCO DE	Kennedy	A	Bas-Med. Francisco de Miranda	41,18%	48,88%	49,79%		$ 232.311.675,65	$ 113.557.948	13/01/2026	13/05/2026																			
617	RUFINO JOSE CUERVO	Tunjuelito	C	Nuevo Tunjuelito	81,87%	87,12%	88,34%		$ 139.179.052,48	$ 121.252.014	13/01/2026	13/04/2026																			
609	JOSE ANTONIO	Tunjuelito	B	San Carlos	0,00%	0,00%	0,00%		$ 248.315.879,08		16/12/2025	15/04/2026																			
TOTAL FRENTES DE OBRA						65,86%	66,66%		$ 1.916.825.356	$ 1.283.785.830																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
878	HERNANDO DURAN	Kennedy	A	Tintalito (Hernado Duran Dusan)	100,00%	100,00%	100,00%		$ 66.518.828	$ 66.518.828	5/12/2025	23/12/2025																			
807	O.E.A	Kennedy	B	Antonia Santos I	93,19%	98,62%	100,00%		$ 40.447.661	$ 39.889.652	5/12/2025	21/12/2025																			
863	KENNEDY	Kennedy	D	Rosa María Gordillo	100,00%	100,00%	100,00%		$ 4.409.209	$ 4.409.209																					
884	CODEMA	Kennedy	A	Darío Echandía - CODEMA	100,00%	100,00%	100,00%		$ 45.922.593	$ 45.922.593	18/03/2026	30/12/2026																			
627	D.I.L.E TUNJUELITO	Tunjuelito	A	Direccion Local De Tunjuelito	100,00%	100,00%	100,00%		$ 17.760.045	$ 17.760.045	12/12/20205	30/12/2025																			
826	JACKELINE	Kennedy	A	Jackeline	100,00%	100,00%	100%		$ 2.700.094	$ 2.700.094	9/12/20255	12/12/2025																			
818	CASTILLA	Kennedy	A	Nueva Castilla	100,00%	100,00%	100%		$ 27.305.453	$ 27.305.453	6/02/2026	13/02/2026																			
TOTAL FRENTES DE OBRA						99,80%	100,00%		$ 205.063.881	$ 204.505.872																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
1	6	1	8	$ 1.283.785.830
ACUMULADO EMERGENCIAS				
3	4	0	7	$ 204.505.872
TOTAL				
4	10	1	15	$ 1.488.291.703
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	65,86%	0,00%	94,79%
PROGRAMADO	66,66%		
ATRASO	-0,80%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			
















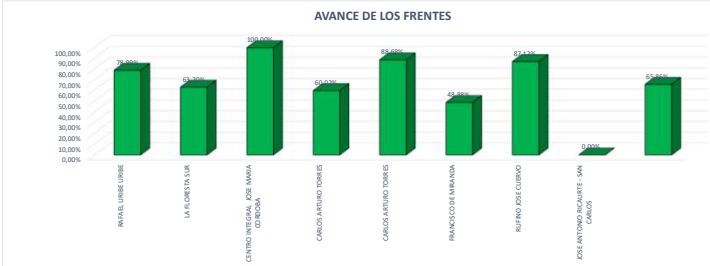

OBSERVACIONES:

FECHA: 30/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME	
DIAS RESTANTES 0 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			APOYO A LA SUPERVISION	
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 8	0
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155154	CONTRATISTA:	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA	
2/5/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169111	INTERVENTOR:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE		ESTADO ACTUAL O FINAL
Colegio Jose Maria Cordoba	BAÑO SEGUNDO NIVEL Y FACHADA	Finalizada				
Colegio Rafael Uribe Uribe	CANCHA	Actividades de placa ,elaboracion carcamo, cimentacion				
Colegio Carlos Arturo Torres sede B	CANCHA	Actividades de pañetes muros, estuco y pintura.				
Colegio Rufino Jose Cuervo	PLACA PATIO	Actividades, sellado juntas de dilatacion en piso. Pintura pisos				
Colegio Carlos Arturo Torres sede A	BAÑOS	Actividades de zapatas, armado de refuerzo, divisiones, fundida de columnas, instalacion de puertas.				
Colegio Francisco Miranda	BAÑOS Y CUARTO INCLUSION	Actividades instalacion de pisos, enchape muros, estuco, pintura, estructura cielo raso, muros en super board.				
Colegio La floresta	CANCHA	Actividades excavacion manual				

Emergencia OEA	TERRAZA	pintura epoxica color gris				

BALANCE SEMANAL POR CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS

		CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA					VIGENCIA	2025.00
GRUPOS	ITEM	CPF	612	IED	RAFAEL URIBE URIBE			SEMANA					
		Item / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones	
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (Incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL	M	53,60	53,6		$ 30.066,00	$ 1.611.537,60	$ -	100,00%	100,00%		
	1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorias para cubrimiento de pisos y ventanas	M2	436,08	436,08	0	$ 3.395,00	$ 1.480.491,60	$ 0,00	100,00%	100,00%		
	1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS	M3	0,18	0,18		$ 286.958,00	$ 51.652,44	$ -	100,00%	100,00%		
	1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	86,75	86,75		$ 79.342,00	$ 6.882.918,50	$ -	100,00%	100,00%		
	1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	66,60	66,6		$ 72.193,00	$ 4.808.053,80	$ -	100,00%	100,00%		
	1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A	M2	15,01	15,01		$ 21.553,00	$ 323.510,53	$ -	100,00%	100,00%		
	1.2.14	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	30,82	30,82		$ 155.716,00	$ 4.799.167,12	$ -	100,00%	100,00%		
	1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA. LOS	M2	119,16	119,16		$ 35.518,00	$ 4.232.324,88	$ -	100,00%	100,00%		
	1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS	UN	3,00	3		$ 11.566,00	$ 34.698,00	$ -	100,00%	100,00%		
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8,00	8		$ 7.219,00	$ 57.752,00	$ -	100,00%	100,00%		
	1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	96,00	96		$ 4.244,00	$ 407.424,00	$ -	100,00%	100,00%		
	1.2.34	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	2,00	2		$ 385.556,00	$ 771.112,00	$ -	100,00%	100,00%		
	1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	23,09	23,09		$ 18.852,00	$ 435.292,68	$ -	100,00%	100,00%		
	1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	61,59	61,59		$ 21.852,00	$ 1.345.864,68	$ -	100,00%	100,00%		
	1.2.48	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	8,38	14		$ 30.684,00	$ 429.576,00	$ (172.327,48)	166,99%	166,99%		
	1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	43,12	43,12		$ 16.333,00	$ 704.278,96	$ -	100,00%	100,00%		
	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	8,91	8,91		$ 96.108,00	$ 856.322,28	$ -	100,00%	100,00%		
	2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	4,92	4,92		$ 130.850,00	$ 643.782,00	$ -	100,00%	100,00%		
	2.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	250,38	250,38		$ 83.544,00	$ 20.917.746,72	$ -	100,00%	100,00%		
	2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	4,92	4,92		$ 22.675,00	$ 111.561,00	$ -	100,00%	100,00%		
	2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	2,33	2,33		$ 174.968,00	$ 407.675,44	$ -	100,00%	100,00%		
	2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	106,19	161,57	55,38	$ 183.945,00	$ 29.719.993,65	$ (10.186.874,10)	152,15%	152,15%		
	2.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	M3	121,46	121,46		$ 173.913,00	$ 21.123.472,98	$ -	100,00%	100,00%		
	2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	22,96	22,96		$ 101.433,00	$ 2.328.901,68	$ -	100,00%	100,00%		
	2.2.10	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A	M2	5,38	5,38	0,00	$ 202.686,00	$ 1.090.450,68	$ -	100,00%	100,00%		
	2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	31,20	31,20	0,00	$ 111.395,00	$ 3.475.524,00	$ -	100,00%	100,00%		
	2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	142,91	142,91	0,00	$ 160.361,00	$ 22.917.190,51	$ -	100,00%	100,00%		
	2.3.9	MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	22,96	22,96		$ 28.402,00	$ 652.109,92	$ -	100,00%	100,00%		
	2.3.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM;	M	21,56	21,56	0	$ 334.957,00	$ 7.221.672,92	$ -	100,00%	100,00%		
	2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	1958,73	1958,73	0	$ 7.012,00	$ 13.734.614,76	$ -	100,00%	100,00%		
	2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	1440,00	50,75		$ 7.421,00	$ 376.615,75	$ 10.309.624,25	3,52%	3,52%		
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	60,00	60		$ 5.814,00	$ 348.840,00	$ -	100,00%	100,00%		
	5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	2		$ 163.229,00	$ 326.458,00	$ -	100,00%	100,00%		
	5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE	UN	1,00	1		$ 204.593,00	$ 204.593,00	$ -	100,00%	100,00%		
	5.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1-1/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y	M	96,00	96		$ 20.737,00	$ 1.990.752,00	$ -	100,00%	100,00%		
	5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	M	27,10	27,1		$ 22.533,00	$ 610.644,30	$ -	100,00%	100,00%		
	5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	UN	8,00	8		$ 174.276,00	$ 1.394.208,00	$ -	100,00%	100,00%		
	5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8,00	8		$ 241.381,00	$ 1.931.048,00	$ -	100,00%	100,00%		
	5.1.49	ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE	M	96,00	96		$ 60.364,00	$ 5.794.944,00	$ -	100,00%	100,00%		
	7.1.8	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS,	M2	255,89	255,89	0,00	$ 142.899,00	$ 36.566.425,11	$ -	100,00%	100,00%		
	7.1.9	JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES	M	350,95	0,00	0,00	$ 35.908,00	$ -	$ 12.601.912,60	0,00%	0,00%		
	7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	107,00	0		$ 498.089,00	$ -	$ 53.295.523,00	0,00%	0,00%		
	7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	350,95	350,95	0,00	$ 25.380,00	$ 8.907.111,00	$ -	100,00%	100,00%		
	9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	8,38	8,3838		$ 965.200,00	$ 8.092.043,76	$ -	100,00%	100,00%		
	9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	10,78	10,78		$ 66.398,00	$ 715.770,44	$ -	100,00%	100,00%		
	12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	181,76	181,76		$ 34.979,00	$ 6.357.783,04	$ -	100,00%	100,00%		
	12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	73,81	73,81		$ 39.822,00	$ 2.939.261,82	$ -	100,00%	100,00%		
	12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	70,88	34,71		$ 23.852,00	$ 827.902,92	$ 862.726,84	48,97%	48,97%		
	12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	186,52	186,52		$ 20.875,00	$ 3.893.605,00	$ -	100,00%	100,00%		
	12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	33,78	33,78		$ 28.786,00	$ 972.391,08	$ -	100,00%	100,00%		
	12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 MI (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	34,71	34,71		$ 20.749,00	$ 720.197,79	$ -	100,00%	100,00%		
	12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS. VIGAS. COLUMNAS Y ESTRUCTURA	M	33,19	33,19		$ 8.860,00	$ 294.063,40	$ -	100,00%	100,00%		
	16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN,	M2	119,16	119,16		$ 129.084,00	$ 15.381.649,44	$ -	100,00%	100,00%		
	16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y	M2	85,15	85,15		$ 240.910,00	$ 20.513.486,50	$ -	100,00%	100,00%		
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	408,44	0		$ 4.508,00	$ -	$ 1.841.247,52	0,00%	0,00%		

	CPF	829	IED	LA FLORESTA SUR			SEMANA					
	Item / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (Incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	120,00	120	0	$ 30.066,00	$ 3.607.920,00	$ -	100,00%	100,00%		
1.2.19	DEMOLICIÓN DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	21,53	21,53	0,00	$ 28.405,00	$ 611.559,65	$ -	100,00%	100,00%		
NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA SIMILAR A LA EXISTENTE,CONTRAMARCO EN PLATINA DE 2"1/2 X 1/4 REJILLA METÁLICA EN PLATINA DE 1,1/2 X 3/16 CON SEPARACIONES DE 3.5 CM ENTRE PLATINAS (SEPARACIONES EN REJILLA EXISTENTE)Y UN REFUERZO EN EL CENTRO X 40.7 M EN ÁNGULO DE 1 ' X 1/8,PINTURA ANTICORROSIVA ANCHO 45 CM	M	42,70	40,3		$ 324.708,67	$ 13.085.759,40	$ 779.300,81	94,38%	94,38%		
NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA REFORZADA SECCION PARQUEADERO; CONTRAMARCO EN PLATINA DE 2,1/2" X 1/4, REJILLA METÁLICA EN ÁNGULO DE 1,1/2 X 1/4 CON UNA SEPARACIÓN DE 3.5CM ENTRE ÁNGULOS,(SEPARACIONES EN REJILLA EXISTENTE),PINTURA ANTICORROSIVA. ANCHO 50CM	M	15,00	0		$ 449.730,19	$ -	$ 6.745.952,85	0,00%	0,00%		
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN. EPOXICO Y ACERO)	CM	960,00	0		$ 9.705,00	$ -	$ 9.316.800,00	0,00%	0,00%		
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	655,00	655		$ 63.550,00	$ 41.625.250,00	$ -	100,00%	100,00%		
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	220,94	220,94		$ 19.187,00	$ 4.239.175,78	$ -	100,00%	100,00%		
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	23,52	4	2	$ 761.157,00	$ 3.044.628,00	$ 14.857.784,64	17,01%	17,01%		
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	21,53	21,53	0,00	$ 464.504,00	$ 10.000.771,12	$ -	100,00%	100,00%		
9.3.6	PUERTA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	4,20	0		$ 945.575,00	$ -	$ 3.971.415,00	0,00%	0,00%		
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	10,47	0		$ 129.084,00	$ -	$ 1.351.509,48	0,00%	0,00%		
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	10,14	0		$ 240.910,00	$ -	$ 2.442.827,40	0,00%	0,00%		
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	655,00	655,00	0,00	$ 4.508,00	$ 2.952.740,00	$ -	100,00%	100,00%		
NP 004	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTENEDOR DE BASURA PLASTICO DE RUEDAS CON TAPA CON CAPACIDAD 1100 L (INCLUYE MONTAJE EN SITIO DE TRABAJO)	UND	2,00	0		$ 3.311.787,00	$ -	$ 6.623.574,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR	

	CPF	601	IED	Jose Maria Cordoba				SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)		Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye paraleles de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	40,11	40,11		$	30.066,00	$ 1.205.947,26	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	0,54	0,54		$	286.958,00	$ 154.957,32	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	32,72	32,72		$	29.984,00	$ 981.076,48	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,27	40,27		$	31.500,00	$ 1.268.505,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,85	2,85		$	21.553,00	$ 61.426,05	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	163,40	163,40		$	10.995,00	$ 1.796.583,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	108,04	108,04		$	12.224,00	$ 1.320.680,96	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,55	6,55		$	32.061,00	$ 209.999,55	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28,00	28		$	26.367,00	$ 738.276,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,70	2,7		$	31.476,00	$ 84.985,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	7,00	7		$	11.566,00	$ 80.962,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	6,00	6,00		$	7.219,00	$ 43.314,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	16,10	16,1		$	4.244,00	$ 68.328,40	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.34	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	4,00	4		$	385.556,00	$ 1.542.224,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.35	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,18	0,18		$	23.790,00	$ 4.282,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	19,50	19,5		$	8.659,00	$ 168.850,50	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	18,00	18		$	14.178,00	$ 255.204,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.3.2	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2	423,36	423,36		$	147.193,00	$ 62.315.628,48	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	33,45	33,45		$	21.111,00	$ 706.162,95	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	7,00	7		$	36.280,00	$ 253.960,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	22,58	22,58		$	16.333,00	$ 368.799,14	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0,76	0,76		$	70.230,00	$ 53.374,80	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	529,54	529,54		$	9.398,00	$ 4.976.616,92	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	529,58	529,58		$	27.238,00	$ 14.424.700,04	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4'' INCLUYE ACCESORIOS	M	1,00	1		$	25.481,00	$ 25.481,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2'' INCLUYE ACCESORIOS	M	6,00	6		$	14.486,00	$ 86.916,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	6,00	6		$	61.400,00	$ 368.400,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	18,00	18		$	61.400,00	$ 1.105.200,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6" (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	61,96	61,96		$	13.297,00	$ 823.882,12	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	UN	1,00	1		$	61.772,00	$ 61.772,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	405,00	405		$	5.814,00	$ 2.354.670,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	1		$	122.646,00	$ 122.646,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	17,30	17,3		$	22.533,00	$ 389.820,90	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	6		$	174.276,00	$ 1.045.656,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	6,00	6		$	62.384,00	$ 374.304,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	72,45	72,45		$	41.218,00	$ 2.986.244,10	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	61,65	61,65		$	203.467,00	$ 12.543.740,55	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO H=10 CM, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	55,34	55,34		$	83.512,00	$ 4.621.554,08	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	40,8	40,8		$	14.858,00	$ 606.206,40	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	21,52	21,52		$	63.550,00	$ 1.367.596,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	670,38	670,38		$	19.187,00	$ 12.862.581,06	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	26,75	26,75		$	85.861,00	$ 2.296.781,75	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	102,64	102,64		$	94.926,00	$ 9.743.204,64	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA CÁRCAMO DE 30 CM DE ANCHO EN ÁNGULO DE 2"X3/16 Y CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE 1-1/2" X 3/16" CON 20 MM DE DILATACIÓN	M2	24,00	24		$	347.190,00	$ 8.332.560,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1,28	1,28		$	451.950,00	$ 578.496,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	6,32	6,32		$	1.090.099,00	$ 6.889.425,68	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	6,00	6		$	746.496,00	$ 4.478.976,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	12,00	12		$	391.028,00	$ 4.692.336,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	3,00	3		$	32.443,00	$ 97.329,00	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	5,07	5,07		$	956.124,00	$ 4.847.548,68	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2,63	2,63		$	1.033.647,00	$ 2.718.491,61	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	13,65	13,65		$	34.979,00	$ 477.463,35	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	798,70	798,7		$	39.822,00	$ 31.805.831,40	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.3	PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	37,88	37,88		$	40.967,00	$ 1.551.829,96	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	14,22	14,22		$	12.106,00	$ 172.147,32	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	959,30	959,3		$	23.852,00	$ 22.881.223,60	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.10	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	15,57	15,57		$	12.606,00	$ 196.275,42	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.12	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	32,94	32,94		$	12.568,00	$ 413.989,92	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	37,88	37,88		$	20.875,00	$ 790.745,00	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	49,64	49,64		$	33.461,00	$ 1.661.004,04	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1354,68	1354,68		$	28.786,00	$ 38.995.818,48	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1295,91	1295,91		$	20.749,00	$ 26.888.836,59	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	32,94	32,94		$	17.148,00	$ 564.855,12	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	1247,97	1247,97		$	23.550,00	$ 29.389.693,50	$ -	100,00%	100,00%	
12.3.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	2,20	2,2		$	28.987,00	$ 63.771,40	$ -	100,00%	100,00%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	35,94	35,94		$	8.860,00	$ 318.428,40	$ -	100,00%	100,00%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	5,19	5,19		$	128.780,00	$ 668.368,20	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	3,00	3		$	40.429,00	$ 121.287,00	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	359,00	359		$	4.508,00	$ 1.618.372,00	$ -	100,00%	100,00%	
NP1	DESMONTE DE ESPEJOS Y/O VIDRIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,24	5,24		$	18.685,00	$ 97.909,40	$ -	100,00%	100,00%	PT APROBAR
NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UND	6,00	6		$	1.165.807,00	$ 6.994.842,00	$ -	100,00%	100,00%	PT APROBAR

	CPF	849	IED	CARLOS ARTURO TORRES SEDE A				SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)		Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	57,00	0		$	4.093,00	$ -	$ 233.301,00	0,00%	0,00%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye paraleles de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	3,15	3,15		$	30.066,00	$ 94.707,90	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	24,70	24,7		$	2.402,00	$ 59.329,40	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	1,03	1,03		$	286.958,00	$ 295.566,74	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.2	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	0,59	0,59	0,59	$	244.462,00	$ 143.743,66	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	8,00	8,00	8,00	$	113.245,00	$ 905.960,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	29,73	29,73		$	31.500,00	$ 936.495,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,14	7,14		$	21.553,00	$ 153.888,42	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	53,05	53,05		$	10.995,00	$ 583.284,75	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.13	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	53,05	53,05		$	12.224,00	$ 648.483,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.16	DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	39,46	8	8	$	113.213,00	$ 905.704,00	$ 3.561.964,01	20,27%	20,27%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	37,71	30,51		$	32.061,00	$ 978.181,11	$ 230.839,20	80,91%	80,91%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	14,00	14		$	26.367,00	$ 369.138,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.22	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	4,00	4		$	161.707,00	$ 646.828,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	35,22	4	4	$	35.518,00	$ 142.072,00	$ 1.108.871,96	11,36%	11,36%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	31,49	31,49		$	31.476,00	$ 991.179,24	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4,00	4		$	7.219,00	$ 28.876,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	20,00	0,00	0,00	$	4.244,00	$ -	$ 84.880,00	0,00%	0,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	65,00	17,6		$	8.659,00	$ 152.398,40	$ 410.436,60	27,08%	27,08%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	8,00	8		$	14.178,00	$ 113.424,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.43	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.15 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	4,00	4		$	45.204,00	$ 180.816,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.48	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,86	9,86		$	30.684,00	$ 302.544,24	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	32,93	32,93		$	18.061,00	$ 594.748,73	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	20,00	20,00	0,00	$	16.333,00	$ 326.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,43	0,43		$	96.108,00	$ 41.326,44	$ -	100,00%	100,00%	

2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	0,43	0,430625		$ 1.069.032,00	$ 460.351,91	$ (668,15)	100,15%	100,15%	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	110,60	110,6	0	$ 101.433,00	$ 11.218.489,80	$ 0,00	100,00%	100,00%	
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	5,70	5,7	0	$ 57.073,00	$ 325.316,10	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11,60	11,60	0,00	$ 160.361,00	$ 1.860.187,60	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.15	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI DE 15 CM SOBRE LAMINA COLABORANTE 2"	M2	11,60	11,60	0,00	$ 241.182,00	$ 2.797.711,20	$ -	100,00%	100,00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	822,31	5.9248		$ 7.012,00	$ 41.544,70	$ 5.724.493,02	0,72%	0,72%	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	48,49	24,24		$ 7.421,00	$ 179.885,04	$ 179.944,41	49,99%	49,99%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	116,00	58		$ 141.229,00	$ 8.191.282,00	$ 8.191.282,00	50,00%	50,00%	
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	32,93	32,93		$ 25.481,00	$ 839.089,33	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	116,40	0		$ 19.470,00	$ -	$ 2.266.308,00	0,00%	0,00%	
4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1"	UN	63,00	0		$ 9.479,00	$ -	$ 597.177,00	0,00%	0,00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7,00	7		$ 61.400,00	$ 429.800,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	9,00	9		$ 61.400,00	$ 552.600,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	2,00	2		$ 66.686,00	$ 133.372,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 1"	UN	1,00	1	1	$ 200.497,00	$ 200.497,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"	UN	1,00	1	1	$ 206.989,00	$ 206.989,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	120,00	0		$ 5.814,00	$ -	$ 697.680,00	0,00%	0,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	2		$ 122.646,00	$ 245.292,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20%A+40?C. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	5,00	5		$ 62.384,00	$ 311.920,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	29,72	29,72		$ 41.218,00	$ 1.224.998,96	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.4	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2	1,42	1,4175		$ 39.550,00	$ 56.062,13	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	49,43	49,43		$ 26.248,00	$ 1.297.438,64	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	80,00	80		$ 498.089,00	$ 39.847.120,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	41,08	41,08		$ 14.858,00	$ 610.366,64	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	23,09	23,09		$ 132.061,00	$ 3.049.288,49	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	92,41	92,41		$ 94.926,00	$ 8.772.111,66	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	40,30	0		$ 761.157,00	$ -	$ 30.676.910,57	0,00%	0,00%	
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	23,31	16,0355		$ 965.200,00	$ 15.477.464,60	$ 7.017.004,00	68,81%	68,81%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	4,80	4,8		$ 1.090.099,00	$ 5.232.475,20	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3,00	3		$ 746.496,00	$ 2.239.488,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	9,00	9		$ 391.028,00	$ 3.519.252,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2,00	2		$ 39.750,00	$ 79.500,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	3,00	3		$ 32.443,00	$ 97.329,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	13,60	13,6		$ 945.896,00	$ 12.864.185,60	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	5,98	5,98		$ 956.124,00	$ 5.717.621,52	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2,16	2,16		$ 1.033.647,00	$ 2.232.677,52	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	42,58	42,58		$ 34.979,00	$ 1.489.405,82	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.8	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	49,61	49,61		$ 36.386,00	$ 1.805.109,46	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	105,00	0		$ 23.852,00	$ -	$ 2.504.460,00	0,00%	0,00%	
12.1.12	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	29,37	29,37		$ 12.568,00	$ 369.122,16	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	32,94	32,94		$ 26.828,00	$ 883.714,32	$ -	100,00%	100,00%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20,00	0		$ 8.860,00	$ -	$ 177.200,00	0,00%	0,00%	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	31,06	31,06		$ 125.971,00	$ 3.912.659,26	$ -	100,00%	100,00%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	6,13	0		$ 128.780,00	$ -	$ 788.777,50	0,00%	0,00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	15,81	0		$ 102.700,00	$ -	$ 1.623.687,00	0,00%	0,00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	51,74	0		$ 129.084,00	$ -	$ 6.678.806,16	0,00%	0,00%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	51,74	0		$ 240.910,00	$ -	$ 12.464.683,40	0,00%	0,00%	
16.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 2"x1/8" SOBRE CORREAS PARA FIJACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA	M	27,00	0		$ 18.402,00	$ -	$ 496.854,00	0,00%	0,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	144,00	60	60	$ 4.508,00	$ 270.480,00	$ 378.672,00	41,67%	41,67%	
19.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMATICO CON 2 BOMBAS DE 2HP 110/220 TANQUE HIDRONEUMATICO POR MEMBRANA DE 200LTS, MARCA PEARL, TABLERO DE CONTROL CON NORMA RETIE (INCLUYE 2 BOMBAS ALTA PRESIÓN CAUDAL 2.33LP/S H.MAQ 50MT 1 TANQUE HIDROACUMULADOR MEMBRANA 200LTS VERTICAL CON MANOMETRO ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN ENTRE BOMBAS Y TANQUE EN HIERRO GALVANIZADO (HG), 1 FLAUTA DE DESCARGA EN 3" INCLUYE COPA DE DESCARGA 3 A 2, 2 REGISTROS EN BRONCE TIPO COMPUERTA, 2 VÁLVULAS CHEQUE HIDRONEUMATICO EN BRONCE, 1 TABLERO DE CONTROL EN COFRE METÁLICO CON NORMA RETIE 2- PRESOSTATOS RANGO 40/60, 1 SENSOR DE NIVEL (FLOTADOR), 1 MANOMETRO EN GLICERINA CON CARATULA DE 2" (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	UN	1,00	0		$ 18.416.383,00	$ -	$ 18.416.383,00	0,00%	0,00%	
NP1	DESMONTE DE ESPEJOS Y/O VIDRIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,84	3,84		$ 18.685,00	$ 71.750,40	$ -	100,00%	100,00%	PT APROBAR
NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UND	7,00	7		$ 1.165.807,00	$ 8.160.649,00	$ -	100,00%	100,00%	PT APROBAR

8

	CPF	803	IED	CARLOS ARTURO TORRES SEDE B			SEMANA				
	Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	21,00	21		$ 30.066,00	$ 631.386,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	49,14	49,14		$ 31.500,00	$ 1.547.910,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	88,35	88,35		$ 10.995,00	$ 971.408,25	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.14	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	19,32	19,32		$ 155.716,00	$ 3.008.433,12	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	8,23	2,04		$ 32.061,00	$ 65.404,44	$ 198.457,59	24,79%	24,79%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,39	5,39		$ 28.405,00	$ 153.102,95	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	133,62	133,62		$ 35.518,00	$ 4.745.915,16	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,60	40,6		$ 31.476,00	$ 1.277.925,60	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	19,00	19		$ 11.566,00	$ 219.754,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	34,00	34		$ 7.219,00	$ 245.446,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	39,00	39		$ 4.244,00	$ 165.516,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	76,91	76,91		$ 16.333,00	$ 1.256.171,03	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	1,25	1,25		$ 64.356,00	$ 80.445,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	49,30	49,3		$ 632.023,00	$ 31.158.733,90	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	2,13	2,13		$ 141.229,00	$ 300.817,77	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	7,00	7		$ 122.646,00	$ 858.522,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	3		$ 163.229,00	$ 489.687,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	2		$ 147.178,00	$ 294.356,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	9,00	9		$ 204.593,00	$ 1.841.337,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	78,40	78,4		$ 15.899,00	$ 1.246.481,60	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25,00	25		$ 174.276,00	$ 4.356.900,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	33,00	33		$ 241.381,00	$ 7.965.573,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN GRAVILLA LAVADA MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M2	1,68	1,68		$ 120.329,00	$ 202.152,72	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	241,50	0,00		$ 74.985,00	$ -	$ 18.108.877,50	0,00%	0,00%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	219,00	0		$ 19.187,00	$ -	$ 4.201.953,00	0,00%	0,00%	
7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	42,98	42,98		$ 121.988,00	$ 5.243.044,24	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	76,91	76,91		$ 25.380,00	$ 1.951.975,80	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	8,23	8,23	0	$ 738.943,00	$ 6.081.500,89	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 3+3 MM INCOLORO Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS T DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	5,39	5,39		$ 560.257,00	$ 3.019.785,23	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	5,63	5,63		$ 66.398,00	$ 373.820,74	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	202,78	202,78		$ 34.979,00	$ 7.093.041,62	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	96,38	96,38		$ 39.822,00	$ 3.838.044,36	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	72,11	72,11		$ 12.106,00	$ 872.963,66	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	54,74	54,74		$ 23.852,00	$ 1.305.658,48	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.13	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	4,80	4,8		$ 7.804,00	$ 37.459,20	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	4,80	4,8		$ 16.631,00	$ 79.828,80	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	121,62	121,62		$ 28.786,00	$ 3.500.953,32	$ -	100,00%	100,00%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	73,00	73		$ 8.860,00	$ 646.780,00	$ -	100,00%	100,00%	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	129,74	129,74		$ 125.971,00	$ 16.343.477,54	$ -	100,00%	100,00%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	0,53	0		$ 128.780,00	$ -	$ 67.995,84	0,00%	0,00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	79,48	79,48		$ 102.700,00	$ 8.162.596,00	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20,25	18,71		$ 68.873,00	$ 1.288.613,83	$ 106.064,42	92,40%	92,40%	
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	64,00	64		$ 97.011,00	$ 6.208.704,00	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	133,62	133,62		$ 129.084,00	$ 17.248.204,08	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	71,30	71,3		$ 240.910,00	$ 17.176.883,00	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	19,61	7,8		$ 187.010,00	$ 1.458.678,00	$ 2.208.588,10	39,78%	39,78%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	310,00	310,00	310,00	$ 4.508,00	$ 1.397.480,00	$ -	100,00%	100,00%	
19.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN MD-10	M3	19,32	19,32		$ 1.480.308,00	$ 28.599.550,56	$ -	100,00%	100,00%	
NP1	DESMONTE DE ESPEJOS Y/O VIDRIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,53	0,528		$ 18.685,00	$ 9.865,68	$ -	100,00%	100,00%	PT APROBAR

	CPF	816	IED	FRANCISCO DE MIRANDA			SEMANA				
	Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	23,20	23,2		$ 30.066,00	$ 697.531,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	106,23	106,23		$ 31.500,00	$ 3.346.245,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	63,20	63,2		$ 21.553,00	$ 1.362.149,60	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36,52	36,52		$ 12.224,00	$ 446.420,48	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	14,59	14,59		$ 32.061,00	$ 467.769,99	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,57	7,57		$ 28.405,00	$ 215.025,85	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	6,00	6		$ 26.367,00	$ 158.202,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	2,50	2,5		$ 20.015,00	$ 50.037,50	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	32,48	32,48		$ 35.518,00	$ 1.153.624,64	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	73,75	73,75		$ 31.476,00	$ 2.321.355,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	51,25	51,25		$ 24.868,00	$ 1.274.485,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	13,00	13		$ 11.566,00	$ 150.358,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	13,00	13		$ 7.219,00	$ 93.847,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	33,00	0		$ 4.244,00	$ -	$ 140.052,00	0,00%	0,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	9,00	9		$ 8.659,00	$ 77.931,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	4,00	4		$ 14.178,00	$ 56.712,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	3,00	3		$ 21.111,00	$ 63.333,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.4	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	21,91	21,91		$ 55.590,00	$ 1.217.976,90	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	24,26	24,26		$ 101.433,00	$ 2.460.764,58	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	16,82	16,82		$ 57.073,00	$ 959.967,86	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	106,23	106,23		$ 111.395,00	$ 11.833.490,85	$ -	100,00%	100,00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	281,89	281,89		$ 7.012,00	$ 1.976.612,68	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	51,62	51,62		$ 63.196,00	$ 3.262.177,52	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	4,90	4,9		$ 141.229,00	$ 692.022,10	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	28,44	0		$ 9.398,00	$ -	$ 267.279,12	0,00%	0,00%	
3.2.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	M	1,20	1,2		$ 40.794,00	$ 48.952,80	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	12,39	12,39		$ 88.516,00	$ 1.096.713,24	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	4,26	4,26		$ 49.410,00	$ 210.486,60	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	4,00	0		$ 135.539,00	$ -	$ 542.156,00	0,00%	0,00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2'' INCLUYE ACCESORIOS	M	12,75	12,75		$ 14.486,00	$ 184.696,50	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	10,00	10		$ 4.830,00	$ 48.300,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	5,00	5		$ 175.735,00	$ 878.675,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	7,00	7		$ 94.029,00	$ 658.203,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	2,00	2		$ 66.686,00	$ 133.372,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.7.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00	1		$ 846.541,00	$ 846.541,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	10,00	0		$ 73.531,00	$ -	$ 735.310,00	0,00%	0,00%	
4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	1,00	0		$ 176.353,00	$ -	$ 176.353,00	0,00%	0,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	30,00	0		$ 5.814,00	$ -	$ 174.420,00	0,00%	0,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	9,00	9	0	$ 122.646,00	$ 1.103.814,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	2	0	$ 195.138,00	$ 390.276,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.7	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	3	0	$ 245.203,00	$ 735.609,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	1	0	$ 598.211,00	$ 598.211,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1-1/2" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	4,00	0		$ 23.281,00	$ -	$ 93.124,00	0,00%	0,00%	
5.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	105,00	0		$ 15.899,00	$ -	$ 1.669.395,00	0,00%	0,00%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	27,00	0		$ 22.533,00	$ -	$ 608.391,00	0,00%	0,00%	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	180,00	0		$ 16.790,00	$ -	$ 3.022.200,00	0,00%	0,00%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	12,00	12	0	$ 174.276,00	$ 2.091.312,00	$ -	100,00%	100,00%	

5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20HA+40ºC. VOLTAJE 100-240V , 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	12,00	0		$ 62.384,00	$ -	$ 748.608,00	0,00%	0,00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	102,28	0		$ 43.769,00	$ -	$ 4.476.693,32	0,00%	0,00%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	25,99	25,99		$ 26.248,00	$ 682.185,52	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	40,00	0		$ 498.089,00	$ -	$ 19.923.560,00	0,00%	0,00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	8,60	8,6		$ 14.858,00	$ 127.778,80	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	824,00	0		$ 63.550,00	$ -	$ 52.365.200,00	0,00%	0,00%	
7.2.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	101,22	68,74		$ 132.061,00	$ 9.077.873,14	$ 4.289.341,28	67,91%	67,91%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	163,00	0		$ 19.187,00	$ -	$ 3.127.481,00	0,00%	0,00%	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	57,98	57,98		$ 94.926,00	$ 5.503.809,48	$ -	100,00%	100,00%	
8.1.5	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2	47,25	47,25	0,00	$ 166.287,00	$ 7.857.060,75	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	2,52	0		$ 801.420,00	$ -	$ 2.019.578,40	0,00%	0,00%	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	6,00	0		$ 464.504,00	$ -	$ 2.787.024,00	0,00%	0,00%	
10.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)	UN	3,00	0		$ 762.932,00	$ -	$ 2.288.796,00	0,00%	0,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	3,00	0		$ 391.028,00	$ -	$ 1.173.084,00	0,00%	0,00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2,00	0		$ 39.750,00	$ -	$ 79.500,00	0,00%	0,00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	4,00	0		$ 32.443,00	$ -	$ 129.772,00	0,00%	0,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	23,25	23,25	0,00	$ 956.124,00	$ 22.229.883,00	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	89,34	89,34		$ 34.979,00	$ 3.125.023,86	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	68,97	68,97		$ 12.106,00	$ 834.950,82	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A .60 CM	M	30,95	0		$ 9.831,00	$ -	$ 304.269,45	0,00%	0,00%	
12.1.8	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	36,95	0		$ 36.386,00	$ -	$ 1.344.462,70	0,00%	0,00%	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	33,63	33,63		$ 23.852,00	$ 802.142,76	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	260,17	0		$ 20.875,00	$ -	$ 5.431.048,75	0,00%	0,00%	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	36,95	0		$ 16.631,00	$ -	$ 614.515,45	0,00%	0,00%	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	68,24	16,36		$ 125.971,00	$ 2.060.885,56	$ 6.535.375,48	23,97%	23,97%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	1,50	0		$ 128.780,00	$ -	$ 193.170,00	0,00%	0,00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	13,40	0		$ 102.700,00	$ -	$ 1.376.180,00	0,00%	0,00%	
16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2,50	0		$ 68.873,00	$ -	$ 172.182,50	0,00%	0,00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	32,48	32,48	32,48	$ 129.084,00	$ 4.192.648,32	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	32,48	32,48	32,48	$ 240.910,00	$ 7.824.756,80	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	12,00	0		$ 40.429,00	$ -	$ 485.148,00	0,00%	0,00%	
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	4,30	0		$ 187.010,00	$ -	$ 804.143,00	0,00%	0,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	145.50	0		$ 4.508,00	$ -	$ 655.914,00	0,00%	0,00%	
NP1	DESMONTE DE ESPEJOS Y/O VIDRIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,5	2,5	2,5	$ 18.685,00	$ 46.712,50	$ -	100,00%	100,00%	PT APROBAR
NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UND	5	5	5	$ 1.165.807,00	$ 5.829.035,00	$ -	100,00%	100,00%	PT APROBAR

	CPF	617	IED	RUFINO JOSE CUERVO SEDE C			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	160,53	160,53		$ 3.395,00	$ 544.999,35	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	161,53	160,53		$ 79.342,00	$ 12.736.771,26	$ 79.342,00	99,38%	99,38%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	3,00	2	0	$ 21.111,00	$ 42.222,00	$ 21.111,00	66,67%	66,67%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	161,70	161,7		$ 16.333,00	$ 2.641.046,10	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	64,21	64,21		$ 130.850,00	$ 8.401.878,50	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	64,21	64,21		$ 174.968,00	$ 11.234.695,28	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	1,00			$ 160.361,00	$ -	$ 160.361,00	0,00%	0,00%	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	431,81	431,81		$ 7.421,00	$ 3.204.462,01	$ -	100,00%	100,00%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0,25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	640,00	0		$ 9.705,00	$ -	$ 6.211.200,00	0,00%	0,00%	
4.7.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00	1		$ 1.137.300,00	$ 1.137.300,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	76,93	76,93		$ 498.089,00	$ 38.317.986,77	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	288,69	288,69		$ 63.550,00	$ 18.346.249,50	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	330,22	330,22		$ 19.187,00	$ 6.335.931,14	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	243,77	243,77		$ 25.380,00	$ 6.186.882,60	$ (0,00)	100,00%	100,00%	
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	3,82	1	0	$ 761.157,00	$ 761.157,00	$ 2.146.462,74	26,18%	26,18%	
9.3.6	PUERTA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	3,60	1	0	$ 945.575,00	$ 945.575,00	$ 2.458.495,00	27,78%	27,78%	
16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	4,22	7,20	2,98	$ 68.873,00	$ 495.885,60	$ (205.241,54)	170,62%	170,62%	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	28,35	28,25	22,25	$ 319.199,00	$ 9.017.371,75	$ 31.919,90	99,65%	99,65%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	288,69	200	0	$ 4.508,00	$ 901.600,00	$ 399.814,52	69,28%	69,28%	
NP 004	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTENEDOR DE BASURA PLASTICO DE RUEDAS CON TAPA CON CAPACIDAD 1100 L (INCLUYE MONTAJE EN SITIO DE TRABAJO)	UND	2,00	0		$ 3.311.787,00	$ -	$ 6.623.574,00	0,00%	0,00%	

	CPF	609	IED	JOSE ANTONIO SAN CARLOS SEDE B			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	150,00			$ 30.066,00	$ -	$ 4.509.900,00	0,00%	0,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8,00			$ 11.566,00	$ -	$ 92.528,00	0,00%	0,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	30,00			$ 4.244,00	$ -	$ 127.320,00	0,00%	0,00%	
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	20,00			$ 18.061,00	$ -	$ 361.220,00	0,00%	0,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	70,00			$ 16.333,00	$ -	$ 1.143.310,00	0,00%	0,00%	
3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17,53			$ 9.398,00	$ -	$ 164.746,94	0,00%	0,00%	
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	17,53			$ 27.238,00	$ -	$ 477.482,14	0,00%	0,00%	
4.6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 3"	UN	1,00			$ 894.074,00	$ -	$ 894.074,00	0,00%	0,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8,00			$ 122.646,00	$ -	$ 981.168,00	0,00%	0,00%	
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACESORIO RANURADO DE 3"	UN	8,00			$ 134.072,00	$ -	$ 1.072.576,00	0,00%	0,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	300,00			$ 4.508,00	$ -	$ 1.352.400,00	0,00%	0,00%	
NP 006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA PRINCIPAL TIPO CENTRIFUGA ALTA PRESIÓN IMPULSOR CERRADO EN FUNDICIÓN, POTENCIA 30 HP, TENSIÓN 220 VOLTIOS TRIFASICO (CALCULADA PARA OPERACIÓN SIMULTANEA DE DOS GABINETES)	UND	1,00			$ 37.324.920,00	$ -	$ 37.324.920,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA JOCKEY TIPO VERTICAL MULTIEMPATADA, IMPULSOR CERRADO, POTENCIA DE 10 HP, TENSIÓN 220 VOLTIO TRIFASICO.	UND	1,00			$ 20.895.349,00	$ -	$ 20.895.349,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 008	SUMINISTRO E INSTLACIÓN VALVULAS DE PIE 3"	UND	1,00			$ 1.299.086,00	$ -	$ 1.299.086,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA 2"	UND	1,00			$ 603.695,00	$ -	$ 603.695,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 010	Suministro e instalacion Valvula de Compuerta HD 3" Vastago Ascendente Sello Metálico Gaer icbl075	UND	1,00			$ 1.560.469,00	$ -	$ 1.560.469,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 011	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELÉCTRICO CON COFRE METALICO NEMA 4, INCLUYE BREAKER PRINCIPAL, ARRANCADOR ESTRELLA TRIANGULO, 230 VOLTIOS ARRANQUE DIRECTO.	UND	1,00			$ 20.438.942,00	$ -	$ 20.438.942,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 012	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 4" SCH 40 RANURADA	ML	95,00			$ 872.101,00	$ -	$ 82.849.595,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA 1 1/2" SCH 40 RANURADA	ML	140,00			$ 296.070,00	$ -	$ 41.449.800,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION VITAULIC DE 4"	UND	20,00			$ 145.952,00	$ -	$ 2.919.040,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION VITAULIC DE 3"	UND	6,00			$ 126.838,00	$ -	$ 761.028,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION VITAULIC DE 1 1/2"	UND	90,00			$ 96.905,00	$ -	$ 8.721.450,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 1 1/2" RANURADO	UND	70,00			$ 87.355,00	$ -	$ 6.114.850,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMICODO RANURADO DE 1 1/2"	UND	6,00			$ 84.884,00	$ -	$ 509.304,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 4"	UND	70,00			$ 50.345,00	$ -	$ 3.524.150,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTES TIPO PERA DE 1 1/2"	UND	100,00			$ 44.487,00	$ -	$ 4.448.700,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA EYECTORA DE 0,5 HP 120 V DESCARGA DE 3"	UND	1,00			$ 3.718.776,00	$ -	$ 3.718.776,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR

	CPF	609	IED	EMERGENCIA JACKELIN			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (Incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	10,00	10	10	$ 30.066,00	$ 300.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	100,00	100	100	$ 4.508,00	$ 450.800,00	$ -	100,00%	100,00%	
	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1,00	1	1	$ 1.948.634,00	$ 1.948.634,00	$ -	100,00%	100,00%	
	CPF	609	IED	EMERGENCIA OEA			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (Incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	10,00	10		$ 30.066,00	$ 300.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y AUSTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	31,59	30		$ 31.500,00	$ 945.000,00	$ 50.085,00	94,97%	94,97%	
	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16,41	18,45		$ 10.995,00	$ 202.857,75	$ (22.429,80)	112,43%	112,43%	
	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2	31,59	31,59		$ 127.792,00	$ 4.036.949,28	$ -	100,00%	100,00%	
	RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	M2	16,41	16,41		$ 136.965,00	$ 2.247.595,65	$ -	100,00%	100,00%	
	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	10,00	10		$ 5.814,00	$ 58.140,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	31,59	32,68		$ 43.769,00	$ 1.430.370,92	$ (47.708,21)	103,45%	103,45%	
	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	31,59	31,59		$ 72.800,00	$ 2.299.752,00	$ -	100,00%	100,00%	
	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	16,00	29,34		$ 26.248,00	$ 770.116,32	$ (350.148,32)	183,38%	183,38%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	31,59	40		$ 74.985,00	$ 2.999.400,00	$ (630.623,85)	126,62%	126,62%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	50,90	10		$ 25.380,00	$ 253.800,00	$ 1.038.042,00	19,65%	19,65%	
	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	16,41	10		$ 36.386,00	$ 363.860,00	$ 233.234,26	60,94%	60,94%	
	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	54,00	10		$ 28.786,00	$ 287.860,00	$ 1.266.584,00	18,52%	18,52%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD ESPESOR 10 MM CON SANBLASTING TIPO PERSIANA	M2	0,80	0,80		$ 262.754,00	$ 210.203,20	$ -	100,00%	100,00%	
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	40,00	32		$ 40.429,00	$ 1.293.728,00	$ 323.432,00	80,00%	80,00%	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	14,56	5		$ 24.883,00	$ 124.415,00	$ 237.881,48	34,34%	34,34%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	31,59	31,59		$ 4.508,00	$ 142.407,72	$ -	100,00%	100,00%	
	CERRAMIENTO EN LONA (Incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	10,00	10,00		$ 30.066,00	$ 300.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,88	9,88		$ 21.852,00	$ 215.897,76	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO. INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	9,88	9,88		$ 203.467,00	$ 2.009.256,97	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO H=10 CM. INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	93,07	93,07		$ 83.512,00	$ 7.772.461,84	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIA CAÑA EN FIBRA DE VIDRIO	M	95,50	95,50	95,50	$ 22.997,00	$ 2.196.213,50	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	93,07	130		$ 23.735,00	$ 3.085.550,00	$ (876.533,55)	139,68%	139,68%	
	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	27,42	75,11		$ 67.537,00	$ 5.072.704,07	$ (3.220.731,47)	273,91%	273,91%	
	PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	37,30	6		$ 40.967,00	$ 245.802,00	$ 1.282.131,91	16,09%	16,09%	ESTUCO
	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	37,30	6		$ 20.875,00	$ 125.250,00	$ 653.318,61	16,09%	16,09%	EPOXICA
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	30,00	20		$ 40.429,00	$ 808.580,00	$ 404.290,00	66,67%	66,67%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	68,02	20		$ 4.508,00	$ 90.160,00	$ 216.467,96	29,40%	29,40%	
	CPF	609	IED	EMERGENCIA DILE TUNJUELITO			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (Incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	25,00	25,00		$ 30.066,00	$ 751.650,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0.08 A 0.10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	20,00	20,00		$ 72.193,00	$ 1.443.860,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	20,00	20,00		$ 20.015,00	$ 400.300,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	3,00	3,00		$ 9.069,00	$ 27.207,00	$ -	100,00%	100,00%	
	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	5,00	5,00		$ 18.061,00	$ 90.305,00	$ -	100,00%	100,00%	
	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12,00	12,00		$ 16.333,00	$ 195.996,00	$ -	100,00%	100,00%	
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,88	0,88		$ 96.108,00	$ 84.094,50	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO JDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0,25	0,25		$ 183.945,00	$ 45.986,25	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR	M	5,00	5,00		$ 334.957,00	$ 1.674.785,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	2,00	2,00		$ 7.012,00	$ 14.024,00	$ -	100,00%	100,00%	
	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2	90,00	90,00		$ 14.353,00	$ 1.291.770,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGECO) DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	30,10	30,10		$ 66.398,00	$ 1.998.579,80	$ -	100,00%	100,00%	
	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	90,00	90,00		$ 20.875,00	$ 1.878.750,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM) . INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	3,00	3,00		$ 319.199,00	$ 957.597,00	$ -	100,00%	100,00%	
	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20,00	20,00		$ 68.873,00	$ 1.377.460,00	$ -	100,00%	100,00%	
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	120,00	120,00		$ 40.429,00	$ 4.851.480,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	150,00	150,00		$ 4.508,00	$ 676.200,00	$ -	100,00%	100,00%	
	CPF	609	IED	EMERGENCIA HERNANDO DURAN DUSSAN			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (Incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	10,00	10,00		$ 30.066,00	$ 300.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.01 A 0.05 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	49,00	49,00		$ 6.953,00	$ 340.697,00	$ -	100,00%	100,00%	
	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	49,00	49,00		$ 18.852,00	$ 923.748,00	$ -	100,00%	100,00%	
	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2	49,00	49,00		$ 127.792,00	$ 6.261.808,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	50,00	50,00		$ 5.814,00	$ 290.700,00	$ -	100,00%	100,00%	
	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	49,00	49,00		$ 72.800,00	$ 3.567.200,00	$ -	100,00%	100,00%	
	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	35,00	35,00		$ 26.248,00	$ 918.680,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	35,00	35,00		$ 25.380,00	$ 888.300,00	$ -	100,00%	100,00%	
	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	8,75	8,75		$ 39.822,00	$ 348.442,50	$ -	100,00%	100,00%	
	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	49,00	49,00		$ 97.011,00	$ 4.753.539,00	$ -	100,00%	100,00%	
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	15,00	15,00		$ 40.429,00	$ 606.435,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	49,00	49,00		$ 4.508,00	$ 220.892,00	$ -	100,00%	100,00%	
							$ -				
NP 003	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN MECÁNICA PARA COCINA – ZONA DE LAVADO Y ALMACÉN, COMPUESTO POR CAMPANA TIPO HONGO 220V/3PH, EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO, VENTILADOR AXIAL, RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA, REJILLAS DE EXTRACCIÓN Y RETORNO, ACCESORIOS, CONEXIONES ELÉCTRICAS, APERTURAS Y PASOS EN MURO O PLACA, INCLUYE MONTAJE, SOPORTERÍA, SELLADOS, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS MINI SPLIT EXISTENTES EN COCINA DEL COLEGIO HERNAN DURAN DUSSAN LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C	UN	1,00	1,00		$ 47.097.726,00	$ 47.097.726,00	$ -	100,00%	100,00%	
	CPF	863	IED	EMERGENCIA COLEGIO ROSA MARIA GORDILLO			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.5	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0.15M A 0.20 M EXISTENTE EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	M2	1,90	1,90	0,00	$ 108.449,00	$ 206.053,10	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS	M	8,60	8,60	0,00	$ 18.061,00	$ 155.324,60	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,76	0,76	0,00	$ 96.108,00	$ 73.042,08	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.3	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	3,80	3,80	0,00	$ 159.256,00	$ 605.172,80	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM,	M	3,80	3,80	0,00	$ 374.837,00	$ 1.424.380,60	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO	M	3,80	3,80	0,00	$ 164.023,00	$ 623.287,40	$ -	100,00%	100,00%	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	28,57	28,57	0,00	$ 7.421,00	$ 212.017,97	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	0,80	0,80	0,00	$ 88.516,00	$ 70.812,80	$ -	100,00%	100,00%	
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	3,00	3,00	0,00	$ 73.531,00	$ 220.593,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	8,60	8,60	0,00	$ 26.248,00	$ 225.732,80	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	1,52	1,52	0,00	$ 377.538,00	$ 573.857,76	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	4,20	4,20	0,00	$ 4.508,00	$ 18.933,60	$ -	100,00%	100,00%	

	CPF	609	IED	EMERGENCIA COLEGIO CASTILLA			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	0,00	0	0	$ 3.395,00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,00	1	0	$ 21.553,00	$ 21.553,00	$ 21.553,00	50,00%	50,00%	
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	57,00	60	0	$ 35.518,00	$ 2.131.080,00	$ (106.554,00)	105,26%	105,26%	
	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	0,00	0	0	$ 11.566,00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M	24,99	0	0	$ 4.147,00	$ -	$ 103.633,53	0,00%	0,00%	
	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	2,01	1	0	$ 141.229,00	$ 141.229,00	$ 142.641,29	49,75%	49,75%	
	EMBOQUILLADO DE LADRILLO A LA VISTA EN ALTURA MENOR A 1.50 M CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	2,01	1	0	$ 25.645,00	$ 25.645,00	$ 25.901,45	49,75%	49,75%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM	0,00	0	0	$ 1.676,00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	47,32	53,82	0	$ 8.860,00	$ 476.845,20	$ (57.590,00)	113,74%	113,74%	
	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	33,60	15	0	$ 102.700,00	$ 1.540.500,00	$ 1.910.220,00	44,64%	44,64%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLÚCIDO BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	57,00	60	0	$ 224.940,00	$ 13.496.400,00	$ (674.820,00)	105,26%	105,26%	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	0,00	0	0	$ 24.883,00	$ -	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	28,50	36,33	0	$ 240.910,00	$ 8.752.260,30	$ (1.886.325,30)	127,47%	127,47%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	57,00	60	0	$ 4.508,00	$ 270.480,00	$ (13.524,00)	105,26%	105,26%	
	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	10,00	60	0	$ 7.491,00	$ 449.460,00	$ (374.550,00)	600,00%	600,00%	

	CPF	884	IED	EMERGENCIA COLEGIO CODEMA			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	28,60	28,60	28,60	$ 24.868,00	$ 711.224,80	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.48	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17,40	17,40	17,40	$ 30.684,00	$ 533.901,60	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	39,70	39,70	39,70	$ 956.124,00	$ 37.958.122,80	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	6,30	6,30	6,30	$ 1.033.647,00	$ 6.511.976,10	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	46,00	46,00	46,00	$ 4.508,00	$ 207.368,00	$ -	100,00%	100,00%	

FECHA:	8/05/2026	**INFORME SEMANAL**	
DIAS RESTANTES	4		
CORTE DEL INFORME:	*9/05/2026*		

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SEMANA N°	26	**DEL**	3-may-26	**AL**	9-may-26

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.8169111	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.8155154
Fecha de Iniciación	14/10/2025	**Fecha de Iniciación**	14/10/2025
Fecha de Terminación	13/05/2026	**Fecha de Terminación**	13/05/2026
Plazo Inicial	7 MESES	**Plazo Inicial**	7 MESES
Valor inicial	$ 796.278.928,00	**Valor inicial**	$ 2.497.896.864,00
Adiciones	0	**Adiciones**	0
Prorroga	N.A.	**Prorroga**	N.A.
Suspensión	N.A.	**Suspensión**	N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES
No.	**FRENTE**	PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	PROGRAMADO ACUM	EJECUTADO ACUM	DESVIACIÓN	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**
1	RAFAEL URIBE URIBE	80,09%	78,99%	99,51%	99,48%	-0,04%	Actividades de placa ,elaboracion carcamo, cimentacion
2	LA FLORESTA SUR	64,39%	63,20%	92,94%	90,78%	-2,15%	Actividades excavacion manual
3	CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Finalizada
4	CARLOS ARTURO TORRES	61,25%	60,02%	92,50%	79,33%	-13,16%	Actividades de zapatas, armado de refuerzo, divisiones, fundida de columnas, instalacion de puertas.
5	CARLOS ARTURO TORRES	89,41%	88,68%	91,40%	88,30%	-3,10%	Actividades de pañetes muros, estuco y pintura.
6	FRANCISCO DE MIRANDA	49,79%	48,88%	92,86%	90,54%	-2,33%	Actividades instalacion de pisos, enchape muros, estuco, pintura, estructura cielo raso, muros en super board.
7	RUFINO JOSE CUERVO	88,34%	87,12%	96,23%	95,73%	-0,50%	Actividades, sellado juntas de dilatacion en piso. Pintura pisos
8	JOSE ANTONIO RICAURTE - SAN CARLOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	N.A
TOTALES		**66,66%**	**65,86%**	**83,18%**	**80,52%**		

3. RESUMEN FINANCIERO

RAFAEL URIBE URIBE

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 351.783.320	$ 349.942.073	**$ 1.841.248**		0,00%	99,48%

LA FLORESTA SUR

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 114.342.420	$ 103.802.130	**$ 10.540.290**		0,00%	90,78%

CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 353.607.262	$ 353.607.262	$ -		0,00%	100,00%

CARLOS ARTURO TORRES

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 277.106.807	$ 219.839.534	**$ 57.267.273**		79,33%	79,33%

CARLOS ARTURO TORRES

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 220.305.772	$ 194.535.151	**$ 25.770.621**		0,00%	88,30%

FRANCISCO DE MIRANDA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 272.831.624	$ 247.008.327	**$ 25.823.297**		90,54%	90,54%

RUFINO JOSE CUERVO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 153.725.546	$ 147.159.211	**$ 6.566.335**		0,00%	95,73%

JOSE ANTONIO RICAURTE - SAN CARLOS

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 248.315.879	$ -	**$ 248.315.879**		0,00%	0,00%

EMERGENCIAS


	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE EMERGENCIAS	**$ 205.063.881**	$ 205.063.164	**$ 717**		#¡REF!	100,00%

FECHA:	8/05/2026	**INFORME SEMANAL**	
DIAS RESTANTES	4		
CORTE DEL INFORME:	*9/05/2026*		

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SEMANA N°	26	**DEL**	3-may-26	**AL**	9-may-26

4. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

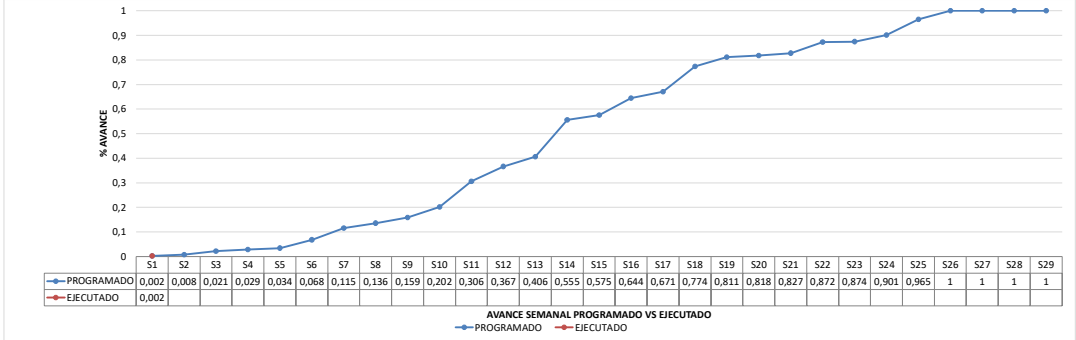

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29
PROGRAMADO	0,002	0,008	0,021	0,029	0,034	0,068	0,115	0,136	0,159	0,202	0,306	0,367	0,406	0,555	0,575	0,644	0,671	0,774	0,811	0,818	0,827	0,872	0,874	0,901	0,965	1	1	1	1
EJECUTADO	0,002																												

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

OBSERVACIONES: N.A

RECOMENDACIONES:
• Mantener orden y aseo en la obras, así como la señalización
• Continuar con el uso correcto de EPP
• Apertura de más frentes de obra

CONCLUSIONES:
• JOSE MARIA CORDOBA :Finalizada
RAFAEL URIBE URIBE : Actividades de placa ,elaboracion carcamo, cimentacion
CARLOS ARTURO TORRES SEDE B: Actividades de pañetes muros, estuco y pintura.
RUFIJO JOSE CUERVO:Actividades, sellado juntas de dilatacion en piso. Pintura pisos
CARLOS ARTURO TORRES SEDE A:Actividades de zapatas, armado de refuerzo, divisiones, fundida de columnas, instalacion de puertas.
FRANCISCO MIRANDA:Actividades instalacion de pisos, enchape muros, estuco, pintura, estructura cielo raso, muros en super board.
LA FLORESTA SUR:Actividades excavacion manual

EMERGENCIA OEA:Finalizada.
EMERGENCIA DILE TUNJUELITO:Finalizada
EMERGENCIA HERNANDO DURAN DUSSAN: finalizada
EMERGENCIA COLEGIO CASTILLA:Finalizada
EMERGENCIA CODEMA: finzalizada
EMERGENCIA ROSA MARIA GORDILLO:finalizada

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

1. Se realiza revision de actividades en colegios : Jose maria cordoba, Rafael uribe uribe, Carlos arturo torres sede B, Rufino jose cuervo,Carlos arturo torres sede A,Fancisco Miranda, La floresta
2.se realiza revision cantidades
3.se realiza revision de correspondecia
4.se realizan observaciones a requerimientos tecnicos del contratista
5.se realiza informe semanal
6.se realiza revision acta de corte y memorias

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente semana, se mantiene el personal previamente aprobado para el ingreso y ejecución de actividades, asegurando que todo el personal cumpla con los requisitos establecidos por la interventoría. Así mismo, esta interventoría realizó recorridos de verificación y seguimiento a las actividades adelantadas en las instituciones educativas Carlos Arturo Torres Sede B, José María Córdoba, Rafael Uribe Uribe, Rufino José Cuervo, José María Miranda, Carlos Arturo Torres Sede A. Durante la ejecución de las labores se contó con acompañamiento permanente del área de SST, efectuando control en campo sobre condiciones locativas, operativas, identificación de peligros, valoración de riesgos y cumplimiento de medidas preventivas.
Durante el periodo evaluado se realizó llamado de atención al contratista, debido a que en algunos frentes de obra activos no se evidenciaba el uso adecuado de EPP por parte del personal durante la ejecución de las actividades, generando condiciones inseguras en obra.
Así mismo, se reiteró al contratista la obligación de garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas en SST especialmente en aquellas actividades que involucren trabajos en alturas o labores en cubierta, donde el personal deberá contar con los EPCC y permisos de trabajo correspondientes, inspección previa de equipos y herramientas.
De igual manera, se verificaron jornadas de orden y aseo en el Colegio La Floresta Sur, evidenciando condiciones adecuadas en el frente de trabajo. Así mismo, se continúa recomendando fortalecer e implementar permanentemente jornadas de orden y aseo en el Colegio José María Miranda, con el fin de minimizar actos y condiciones inseguras derivadas de la acumulación de materiales y residuos de obra.
Adicionalmente, se recomienda al contratista realizar charlas de sensibilización y capacitaciones periódicas dirigidas al personal operativo, enfocadas en el uso adecuado de los EPP según la actividad ejecutada, identificación de peligros, control de riesgos, prevención de caídas, autocuidado y cumplimiento de los procedimientos seguros de trabajo.
Finalmente, se recomienda reforzar las inspecciones SST en los diferentes frentes de obra, garantizando seguimiento permanente al cumplimiento de las medidas preventivas, con el fin de evitar incidentes, accidentes laborales y actos inseguros durante la ejecución de las actividades.
Total de horas hombres trabajadas: 42
Total de horas capacitación: 20 minutos
Número de accidentes de trabajo: 0
Número de días de incapacidad por AT:0
Número de días de incapacidad por enfermedad común: 0
REPORTE PERSONAL
DIRECTOR OBRA: 1 INSPECTORES SST: 1
RESIDENTE OBRA: 1 PERSONAL OPERATIVO: 36

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

IED José María Córdoba: Se reporta el retiro de material de construcción en zona verde, al igual si se evidencia algún daño se debe recuperar esta área, al igual se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).
IED Carlos Arturo Torres Sede A: Se realizo recorrido en el frente, no cuenta con cerramiento perimetral, se reporta material y residuos acopiado adecuadamente, pero se evidencian en zona verde, por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, se evidencia desorden, por lo que se recomienda organizar, señalizar el área de acopio, retirar todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Carlos Arturo Torres Sede B: Se realizo recorrido en el frente, se recomendó una jornada de orden y aseo en el salón e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Rafael Uribe Uribe: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento adecuado, cuentan con acopio de materiales de construcción y residuos adecuadamente, por lo que se recomienda disponer todo, realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Ruffino Jose Cuervo Sede C: Se realizo recorrido en el frente, anteriormente se dispuso adecuadamente los residuos, se mantiene el orden en el frente y implementa todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
IED Francisco Miranda: Se realizo recorrido en el frente, no se cuenta con el cerramiento y la señalización adecuada, se realiza en batea metálica la mezcla de cemento, se reporta un acopio de residuos (bajo volumen) y de material de construcción, por lo que se recomienda disponer adecuadamente todos los residuos, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

OTROS

MILLER MARIN CASTELLANOS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

HARRY ARNAGO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA:	8/05/2026	**INFORME SEMANAL**	
DIAS RESTANTES	**201**		
CORTE DEL INFORME:	***9/05/2026***		

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA

Colegio Jose Maria Cordoba



mantenimiento ventanas




mantenimiento ventanas




mantenimiento ventanas



mantenimiento ventanas

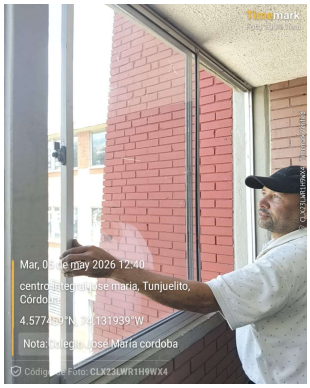

mantenimiento ventanas

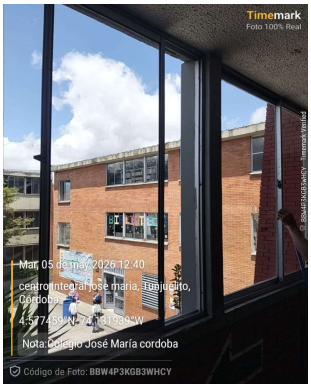


mantenimiento ventanas

Colegio Rafael Uribe Uribe



construccion tapa caja

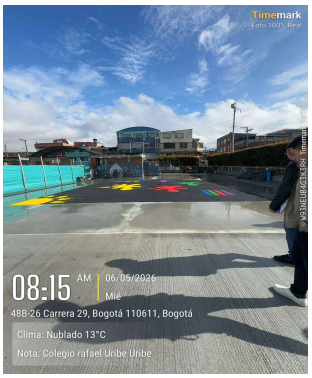

instalacion pis chips




rejilla carcamo



instalacion pis chips




rejilla carcamo

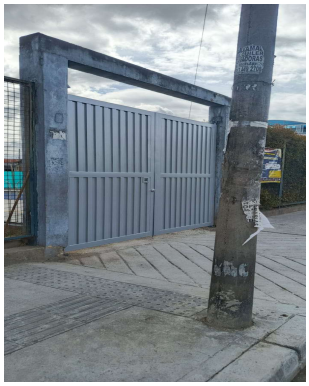


Instalacion de puertas


Colegio Carlos arturo torres sede B

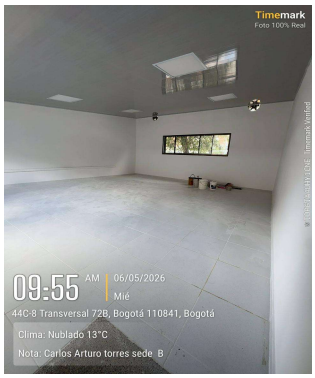


remates cielo raso

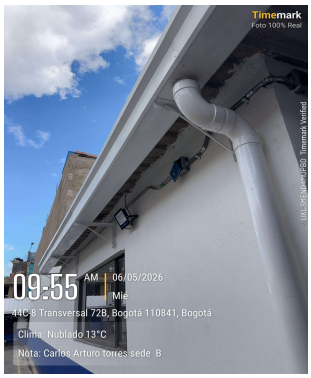


Pintura muros

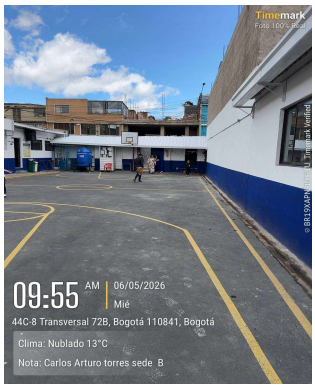

Pintura muros

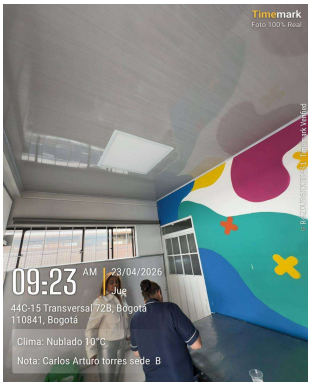

Pintura muros

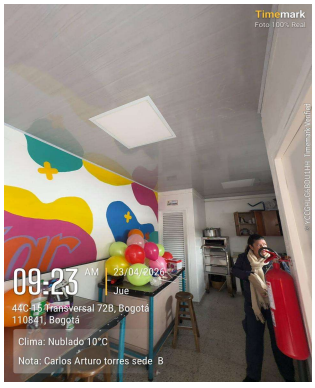


remates generales



remates generales


Colegio Rufino Jose Cuervo

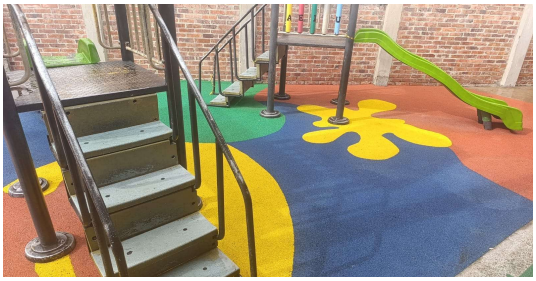


remates piso chips




remates piso chips

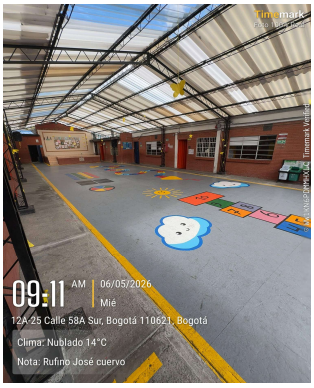


pintura plazoleta

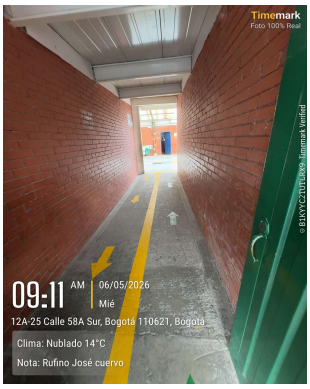

pintura corredores

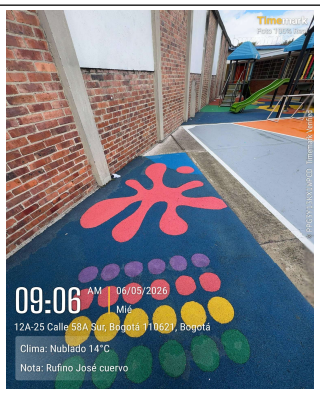


remates piso chips

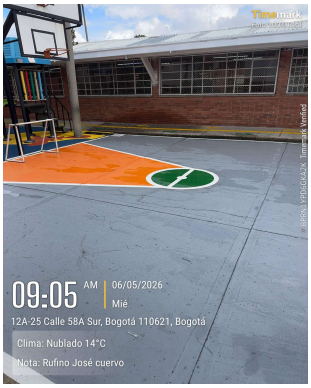

remates piso chips

Colegio Carlos arturo torres sede A

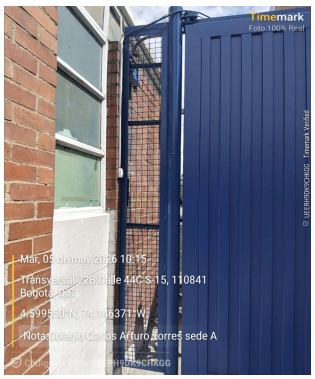

remates pinturas portones




remates pinturas portones



remates pinturas portones



retiro de cubierta

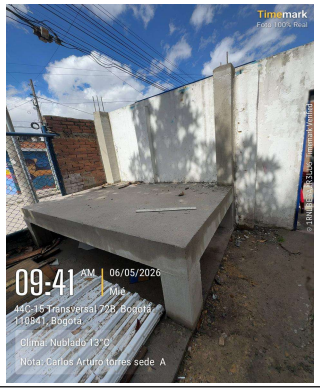

placa para cuarto de bombas




estructura cubierta


Colegio Fracisco de Miranda




divisiones en acero

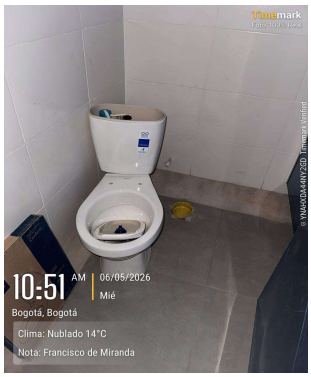


instalacion de sanitarios

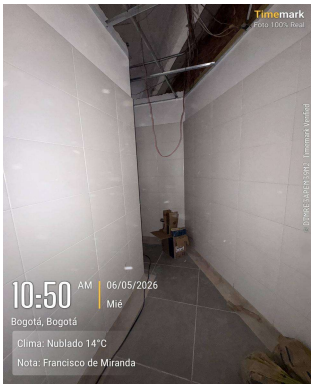

Instalaciones cielo raso

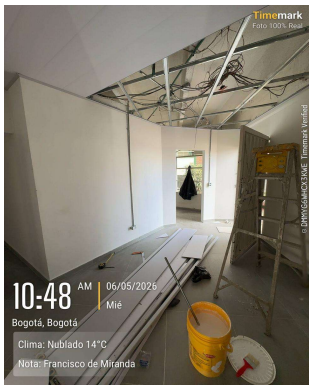

Instalaciones cielo raso

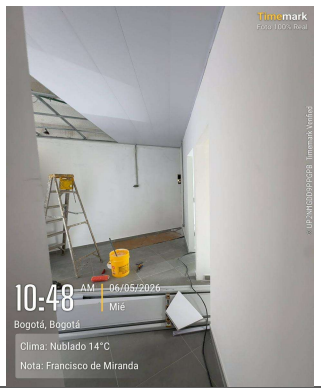

Instalaciones cielo raso




Instalaciones cielo raso


Colegio La Florestas sur sede A




construccion cajas

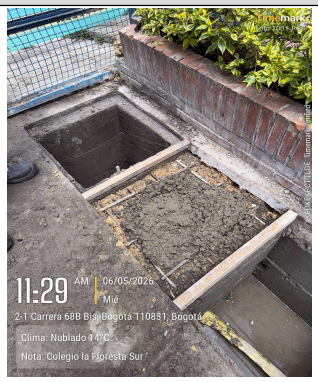

construccion cajas

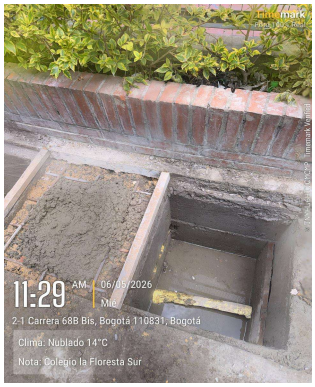

construccion cajas

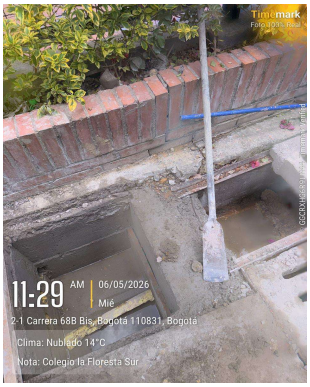

construccion cajas




retiro de escombros



cajas de inspeccion

Emergencia Colegio Tom Adams

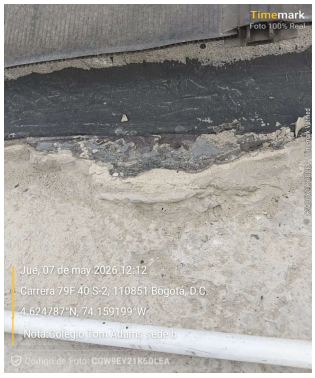


Demolicion de alistado de piso



Demolicion de alistado de piso



Demolicion de alistado de piso

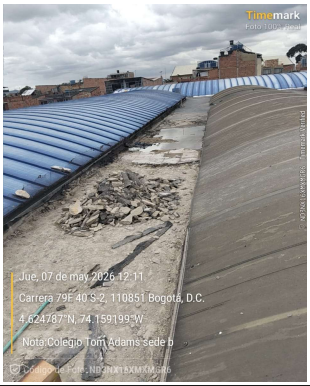

Demolicion de alistado de piso

FECHA: 8/05/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 4 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA		GRUPO 8
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		
CORTE DEL INFORME: 9 de mayo de 2026	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA	
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169111	CO1.PCCNTR.8155154	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.497.896.864
INICIO	14 de octubre de 2025	14 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ -	$ -
TERMINACION INICIAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	PRÓRROGAS			TOTAL	$ 796.278.928,00	$ 2.497.896.864,00
TERMINACION FINAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	TOTAL	211	211			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA		OTRO ASPECTO
1					
2					
3					
4					

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400-47	5 9 2025	5 10 2026	5 4 2026	5 4 2031	5 9 2025	5 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
14-44-101244200	14 10 2025	13 1 2027	14 10 2025	14 5 2029	14 5 2025	14 5 2027	14-40-101075759	14 10 2025	14 5 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (31082024)	PROGR ACOMU %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	dic-2025	ene-2026	feb-2026	mar-2026	abr-2026	may-2026	jun-2026	jul-2026	ago-2026	sep-2026	oct-2026	nov-2026	dic-2026	ene-2027	feb-2027	mar-2027
612	RAFAEL URIBE URIBE	Tunjuelito	B	Nuestra Señora del Carmen	78,99%	99,45%	99,51%		$ 351.783.320,20	$ 349.942.073	3/12/2025	4/04/2026																		
829	LA FLORESTA SUR	Kennedy	A	La Floresta Sur	63,20%	90,78%	92,94%		$ 114.342.419,78	$ 103.802.130	3/12/2025	4/05/2026																		
601	CENTRO INTEGRAL	Tunjuelito	A	José María Cordoba	100,00%	100,00%	100,00%		$ 353.607.262,42	$ 353.607.262	4/11/2025	4/03/2026																		
849	CARLOS ARTURO	Kennedy	A	Carlos Arturo Torres y Rep de	60,02%	79,35%	92,50%		$ 277.106.807,00	$ 219.839.534	13/01/2026	13/04/2026																		
803	CARLOS ARTURO	Kennedy	B	Rep.de Finlandia	88,68%	88,80%	91,40%		$ 220.305.772,01	$ 194.535.151	4/11/2025	4/04/2026																		
816	FRANCISCO DE	Kennedy	A	Bas-Med. Francisco de Miranda	48,88%	90,54%	92,86%		$ 272.831.623,66	$ 247.008.327	13/01/2026	13/05/2026																		
617	RUFINO JOSE CUERVO	Tunjuelito	C	Nuevo Tunjuelito	87,12%	95,73%	96,23%		$ 153.725.546,14	$ 147.159.211	13/01/2026	13/04/2026																		
609	JOSE ANTONIO	Tunjuelito	B	San Carlos	0,00%	0,00%	0,00%		$ 248.315.879,08		16/12/2025	15/04/2026																		
TOTAL FRENTES DE OBRA						80,52%	83,18%		$ 1.992.018.630	$ 1.615.893.688																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
878	HERNANDO DURAN	Kennedy	A	Tintalito (Hernado Duran Dusan)	100,00%	100,00%	100,00%		$ 66.518.828	$ 66.518.828	5/12/2025	23/12/2025																		
807	O.E.A	Kennedy	B	Antonia Santos I	98,62%	100,00%	100,00%		$ 40.447.661	$ 40.446.944	5/12/2025	21/12/2025																		
863	KENNEDY	Kennedy	D	Rosa María Gordillo	100,00%	100,00%	100,00%		$ 4.409.209	$ 4.409.209																				
884	CODEMA	Kennedy	A	Darío Echandía - CODEMA	100,00%	100,00%	100,00%		$ 45.922.593	$ 45.922.593	18/03/2026	30/12/2026																		
627	D.I.L.E TUNJUELITO	Tunjuelito	A	Direccion Local De Tunjuelito	100,00%	100,00%	100,00%		$ 17.760.045	$ 17.760.045	12/12/20205	30/12/2025																		
826	JACKELINE	Kennedy	A	Jackeline	100,00%	100,00%	100%		$ 2.700.094	$ 2.700.094	9/12/20255	12/12/2025																		
818	CASTILLA	Kennedy	A	Nueva Castilla	100,00%	100,00%	100%		$ 27.305.453	$ 27.305.453	6/02/2026	13/02/2026																		
TOTAL FRENTES DE OBRA						100,00%	100,00%		$ 205.063.881	$ 205.063.164																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
1	6	1	8	$ 1.615.893.688
ACUMULADO EMERGENCIAS				
3	4	0	7	$ 205.063.164
TOTAL				
4	10	1	15	$ 1.820.956.852
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	80,52%	0,00%	98,10%
PROGRAMADO	83,18%		
ATRASO	-2,66%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			
















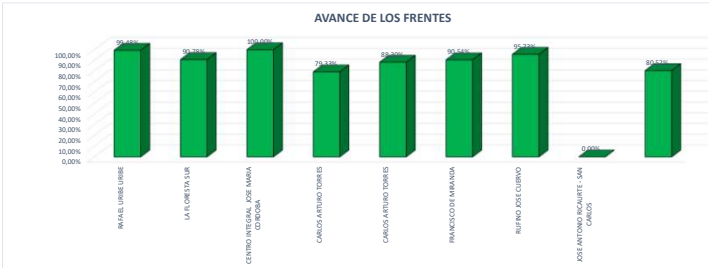

OBSERVACIONES:

FECHA: 8/05/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 0 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 8 — 0
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155154	CONTRATISTA:	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA	
9/5/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169111	INTERVENTOR:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE		ESTADO ACTUAL O FINAL
Colegio Jose Maria Cordoba	BAÑO SEGUNDO NIVEL Y FACHADA	Finalizada				
Colegio Rafael Uribe Uribe	CANCHA	Actividades de placa ,elaboracion carcamo, cimentacion				
Colegio Carlos Arturo Torres sede B	CANCHA	Actividades de pañetes muros, estuco y pintura.				
Colegio Rufino Jose Cuervo	PLACA PATIO	Actividades, sellado juntas de dilatacion en piso. Pintura pisos				
Colegio Carlos Arturo Torres sede A	BAÑOS	Actividades de zapatas, armado de refuerzo, divisiones, fundida de columnas, instalacion de puertas.				
Colegio Francisco Miranda	BAÑOS Y CUARTO INCLUSION	Actividades instalacion de pisos, enchape muros, estuco, pintura, estructura cielo raso, muros en super board.				
Colegio La floresta	CANCHA	Actividades excavacion manual				

Emergencia Tom Adams	TERRAZA	retiro de alistado de piso				

BALANCE SEMANAL POR CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS

GRUPOS	ITEM	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
		CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA			VIGENCIA	2025,00	
GRUPOS	ITEM	CPF	612	IED	RAFAEL URIBE URIBE			SEMANA				
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL	M	53,60	53,6		$ 30.066,00	$ 1.611.537,60	$ -	100,00%	100,00%	
	1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y	M2	436,08	436,08		$ 3.395,00	$ 1.480.491,60	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS	M3	0,18	0,18		$ 286.958,00	$ 51.652,44	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE AJUSTADO Y ACABADO EXISTENTE. CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	98,39	98,39		$ 79.342,00	$ 7.806.459,38	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0.08 A 0.10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	66,60	66,6		$ 72.193,00	$ 4.808.053,80	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN	M2	15,01	15,01		$ 21.553,00	$ 323.510,53	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.14	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	30,82	30,82		$ 155.716,00	$ 4.799.167,12	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS	M2	119,16	119,16		$ 35.518,00	$ 4.232.324,88	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE	UN	3,00	3		$ 11.566,00	$ 34.698,00	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8,00	8		$ 7.219,00	$ 57.752,00	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	96,00	96		$ 4.244,00	$ 407.424,00	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.34	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	2,00	2		$ 385.556,00	$ 771.112,00	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	23,09	23,09		$ 18.852,00	$ 435.292,68	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	61,59	61,59		$ 21.852,00	$ 1.345.864,68	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.48	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	8,38	8,3838		$ 30.684,00	$ 257.248,52	$ -	100,00%	100,00%	
	1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	43,12	43,12		$ 16.333,00	$ 704.278,96	$ -	100,00%	100,00%	
	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	8,91	8,91		$ 96.108,00	$ 856.322,28	$ -	100,00%	100,00%	
	2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	4,92	4,92		$ 130.850,00	$ 643.782,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	250,38	250,38		$ 83.544,00	$ 20.917.746,72	$ -	100,00%	100,00%	
	2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	4,92	4,92		$ 22.675,00	$ 111.561,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	2,33	2,33		$ 174.968,00	$ 407.675,44	$ -	100,00%	100,00%	
	2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	121,46	121,464		$ 183.945,00	$ 22.342.695,48	$ -	100,00%	100,00%	
	2.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	M3	121,46	121,46		$ 173.913,00	$ 21.123.472,98	$ -	100,00%	100,00%	
	2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	22,96	22,96		$ 101.433,00	$ 2.328.901,68	$ -	100,00%	100,00%	
	2.2.10	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A	M2	5,38	5,38		$ 202.686,00	$ 1.090.450,68	$ -	100,00%	100,00%	
	2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN	M2	31,20	31,20		$ 111.395,00	$ 3.475.524,00	$ -	100,00%	100,00%	
	2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	148,99	148,99		$ 160.361,00	$ 23.892.185,39	$ -	100,00%	100,00%	
	2.3.9	MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	22,96	22,96		$ 28.402,00	$ 652.109,92	$ -	100,00%	100,00%	
	2.3.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM.	M	43,12	43,12		$ 334.957,00	$ 14.443.345,84	$ -	100,00%	100,00%	
	2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	2169,77	2169,77		$ 7.012,00	$ 15.214.427,24	$ -	100,00%	100,00%	
	2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM. DE 0.15 X 0.15 M	KG	1435,45	1435,45		$ 7.421,00	$ 10.652.474,45	$ -	100,00%	100,00%	
	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	15,00	15		$ 88.516,00	$ 1.327.740,00	$ -	100,00%	100,00%	
	4.7.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00	1		$ 846.541,00	$ 846.541,00	$ -	100,00%	100,00%	
	4.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	404,88	404,88		$ 12.255,00	$ 4.961.804,40	$ -	100,00%	100,00%	
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	60,00	60		$ 5.814,00	$ 348.840,00	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE	UN	2,00	2		$ 163.229,00	$ 326.458,00	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	UN	1,00	1		$ 204.593,00	$ 204.593,00	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1-1/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN	M	96,00	96		$ 20.737,00	$ 1.990.752,00	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	M	27,10	27,1		$ 22.533,00	$ 610.644,30	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG	UN	8,00	8,00		$ 174.276,00	$ 1.394.208,00	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	UN	8,00	8,00		$ 241.381,00	$ 1.931.048,00	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC, VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN	UN	8,00	8		$ 62.384,00	$ 499.072,00	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.49	ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS, INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE	M	96,00	96,00		$ 60.364,00	$ 5.794.944,00	$ -	100,00%	100,00%	
	7.1.8	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALLANADORA. ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) E= 10 CM	M2	255,89	255,89		$ 142.899,00	$ 36.566.425,11	$ -	100,00%	100,00%	
	7.1.9	JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO. ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	M	244,25	244,25		$ 35.908,00	$ 8.770.529,00	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	107,00	107		$ 498.089,00	$ 53.295.523,00	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	78,53	78,53		$ 19.187,00	$ 1.506.755,11	$ -	100,00%	100,00%	
	9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	8,38	8,3838		$ 965.200,00	$ 8.092.043,76	$ -	100,00%	100,00%	
	9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	21,56	21,56		$ 66.398,00	$ 1.431.540,88	$ -	100,00%	100,00%	
	12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	181,76	181,76		$ 34.979,00	$ 6.357.783,04	$ -	100,00%	100,00%	
	12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	73,81	73,81		$ 39.822,00	$ 2.939.261,82	$ -	100,00%	100,00%	
	12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0.60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	70,88	70,88		$ 23.852,00	$ 1.690.629,76	$ -	100,00%	100,00%	
	12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	186,52	186,52		$ 20.875,00	$ 3.893.605,00	$ -	100,00%	100,00%	
	12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	33,78	33,78		$ 28.786,00	$ 972.391,08	$ -	100,00%	100,00%	
	12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	34,71	34,71		$ 20.749,00	$ 720.197,79	$ -	100,00%	100,00%	
	12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	33,19	33,19		$ 8.860,00	$ 294.063,40	$ -	100,00%	100,00%	
	16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	119,16	119,16		$ 129.084,00	$ 15.381.649,44	$ -	100,00%	100,00%	
	16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	85,15	85,15		$ 240.910,00	$ 20.513.486,50	$ -	100,00%	100,00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	408,44	0		$ 4.508,00	$ -	$ 1.841.247,52	0,00%	0,00%	

ITEM	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CPF	829	IED	LA FLORESTA SUR			SEMANA				
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico	M	120,00	120,00		$ 30.066,00	$ 3.607.920,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0.08 A 0.10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1.30	1.30		$ 72.193,00	$ 93.562.13	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	21,53	21,53		$ 28.405,00	$ 611.559,65	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7.50	7.50		$ 16.333.00	$ 122.497.50	$ -	100.00%	100.00%	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3.24	3.24		$ 96.108.00	$ 311.389.92	$ -	100.00%	100.00%	
2.1.5	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	7.00	7.00		$ 55.969.00	$ 391.783.00	$ -	100.00%	100.00%	
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	0.26	0.26		$ 22.675.00	$ 5.877.36	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	1.30	1.30		$ 160.361.00	$ 207.827.86	$ -	100.00%	100.00%	
2.3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M	42,70	42,70		$ 164.023,00	$ 7.003.782,10	$ -	100,00%	100,00%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	960.00	960.00		$ 9.705.00	$ 9.316.800.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	2.00	2.00		$ 150.033.00	$ 300.066.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.7.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00	1.00		$ 1.137.300.00	$ 1.137.300.00	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	655,00	655,00		$ 63.550,00	$ 41.625.250,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	220.94	220.94		$ 19.187.00	$ 4.239.175.78	$ -	100.00%	100.00%	
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	23,52	23,52		$ 761.157,00	$ 17.902.412,64	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	21,53	21,53		$ 464.504,00	$ 10.000.771,12	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.6	PUERTA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	4.20	4.20		$ 945.575.00	$ 3.971.415.00	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	10,47	0		$ 129.084,00	$ -	$ 1.351.509,48	0,00%	0,00%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	10,14	0,00		$ 240.910,00	$ -	$ 2.442.827,40	0,00%	0,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	655.00	655.00		$ 4.508,00	$ 2.952.740,00	$ -	100,00%	100,00%	
NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA REFORZADA SECCION PARQUEADERO; CONTRAMARCO EN PLATINA DE 2,1/2" X 1/4, REJILLA METÁLICA EN ÁNGULO DE 1,1/2 X 1/4 CON UNA SEPARACIÓN DE 3.5CM ENTRE ÁNGULOS,(SEPARACIONES EN REJILLA EXISTENTE),PINTURA ANTICORROSIVA. ANCHO 50CM	M	15,00	0		$ 449.730,19	$ -	$ 6.745.952,85	0,00%	0,00%	PT APROBAR

ITEM	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CPF	601	IED	Jose Maria Cordoba			SEMANA				
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico	M	40,11	40,11		$ 30.066,00	$ 1.205.947,26	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	0,54	0,54		$ 286.958,00	$ 154.957,32	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	32.72	32.72		$ 29.984.00	$ 981.076.48	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,27	40,27		$ 31.500,00	$ 1.268.505,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,85	2,85		$ 21.553,00	$ 61.426,05	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	163.40	163.40		$ 10.995.00	$ 1.796.583.00	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	108.04	108.04		$ 12.224.00	$ 1.320.680.96	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,55	6,55		$ 32.061,00	$ 209.999,55	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28,00	28,00		$ 26.367,00	$ 738.276,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,70	2,70		$ 31.476,00	$ 84.985,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	7,00	7,00		$ 11.566,00	$ 80.962,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	6.00	6.00		$ 7.219.00	$ 43.314.00	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	16.10	16.10		$ 4.244.00	$ 68.328.40	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.34	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	4,00	4,00		$ 385.556,00	$ 1.542.224,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.35	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,18	0,18		$ 23.790,00	$ 4.282,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	19,50	19,50		$ 8.659,00	$ 168.850,50	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	18.00	18.00		$ 14.178.00	$ 255.204.00	$ -	100.00%	100.00%	
1.3.2	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS	M2	423,36	423,36		$ 147.193,00	$ 62.315.628,48	$ -	100,00%	100,00%	
1.3.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)	M	30,00	30,00		$ 11.033,00	$ 330.990,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	33,45	33,45		$ 21.111,00	$ 706.162,95	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	7.00	7.00		$ 36.280.00	$ 253.960.00	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	22.58	22.58		$ 16.333.00	$ 368.799.14	$ -	100.00%	100.00%	
2.3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M	71,30	71,30		$ 164.023,00	$ 11.694.839,90	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.76	0.76		$ 70.230.00	$ 53.374.80	$ -	100.00%	100.00%	
3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	529.54	529.54		$ 9.398.00	$ 4.976.616.92	$ -	100.00%	100.00%	
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	529,58	529,58		$ 27.238,00	$ 14.424.700,04	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4'' INCLUYE ACCESORIOS	M	1.00	1.00		$ 25.481.00	$ 25.481.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2'' INCLUYE ACCESORIOS	M	6.00	6.00		$ 14.486.00	$ 86.916.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	6.00	6.00		$ 61.400.00	$ 368.400.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	18.00	18.00		$ 61.400.00	$ 1.105.200.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6" (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	61.96	61.96		$ 13.297.00	$ 823.882.12	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	UN	1.00	1.00		$ 61.772.00	$ 61.772.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	405.00	405.00		$ 5.814.00	$ 2.354.670.00	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	1,00		$ 122.646,00	$ 122.646,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	17,30	17,30		$ 22.533,00	$ 389.820,90	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	6,00	6,00		$ 174.276,00	$ 1.045.656,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC, VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN	UN	6,00	6,00		$ 62.384,00	$ 374.304,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	72.45	72.45		$ 41.218.00	$ 2.986.244.10	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO. INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	61.65	61.65		$ 203.467.00	$ 12.543.740.55	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO H=10 CM. INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	55.34	55.34		$ 83.512.00	$ 4.621.554.08	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	40.80	40.80		$ 14.858.00	$ 606.206.40	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	21,52	21,52		$ 63.550,00	$ 1.367.596,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	670.38	670.38		$ 19.187.00	$ 12.862.581.06	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	26.75	26.75		$ 85.861.00	$ 2.296.781.75	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	102.64	102.64		$ 94.926.00	$ 9.743.204.64	$ -	100.00%	100.00%	
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1,28	1,28		$ 451.950,00	$ 578.496,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	6,32	6,32		$ 1.090.099,00	$ 6.889.425,68	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	6.00	6.00		$ 746.496.00	$ 4.478.976.00	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	12.00	12.00		$ 391.028.00	$ 4.692.336.00	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	3.00	3.00		$ 32.443.00	$ 97.329.00	$ -	100.00%	100.00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	5,07	5,07		$ 956.124,00	$ 4.847.548,68	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2.63	2.63		$ 1.033.647.00	$ 2.718.491.61	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	13.65	13.65		$ 34.979.00	$ 477.463.35	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	798.7	798.7		$ 39.822.00	$ 31.805.831.40	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.3	PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	37.88	37.88		$ 40.967.00	$ 1.551.829.96	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	46.92	46.92		$ 12.106.00	$ 568.013.52	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0.60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	959.3	959.3		$ 23.852.00	$ 22.881.223.60	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.10	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	15,57	15,57		$ 12.606,00	$ 196.275,42	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.12	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	32,94	32,94		$ 12.568,00	$ 413.989,92	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	46.92	46.92		$ 20.875.00	$ 979.455.00	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	49.64	49.64		$ 33.461.00	$ 1.661.004.04	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1458.79	1458.79		$ 28.786.00	$ 41.992.728.94	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1301.37	1301.37		$ 20.749.00	$ 27.002.126.13	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M. (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	99,29	99,29		$ 17.148,00	$ 1.702.624,92	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	1247,97	1247,97		$ 23.550,00	$ 29.389.693,50	$ -	100,00%	100,00%	
12.3.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	2.20	2.20		$ 28.987.00	$ 63.771.40	$ -	100.00%	100.00%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	35,94	35,94		$ 8.860,00	$ 318.428,40	$ -	100,00%	100,00%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	5.19	5.19		$ 128.780.00	$ 668.368.20	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	3,00	3,00		$ 40.429,00	$ 121.287,00	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	359.00	359.00		$ 4.508.00	$ 1.618.372.00	$ -	100.00%	100.00%	
NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS	UND	6,00	6		$ 1.165.807,00	$ 6.994.842,00	$ -	100,00%	100,00%	PT APROBAR

CPE		849	IED	CARLOS ARTURO TORRES SEDE A			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	57,00	57,00		$ 4.093,00	$ 233.301,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye paralés de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico	M	27,85	27,85		$ 30.066,00	$ 837.338,10	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	24.70	24.7		$ 2.402.00	$ 59.329.40	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	1,03	1,03		$ 286.958,00	$ 295.566,74	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.2	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	0,59	0,59		$ 244.462,00	$ 143.743,66	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	8,00	8,00		$ 113.245,00	$ 905.960,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	29,73	29,73		$ 31.500,00	$ 936.495,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,14	7,14		$ 21.553,00	$ 153.888,42	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	53.05	53.05		$ 10.995.00	$ 583.284.75	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.13	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	53.05	53.05		$ 12.224.00	$ 648.483.20	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	37,71	37,71		$ 32.061,00	$ 1.209.020,31	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	14,00	14		$ 26.367,00	$ 369.138,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.22	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	4,00	4		$ 161.707,00	$ 646.828,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	35,22	35,22		$ 35.518,00	$ 1.250.943,96	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	31,49	31,49		$ 31.476,00	$ 991.179,24	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4.00	4		$ 7.219.00	$ 28.876.00	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	20.00	20.00		$ 4.244.00	$ 84.880.00	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	65,00	65,00		$ 8.659,00	$ 562.835,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	9.00	9		$ 14.178.00	$ 127.602.00	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.43	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.15 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	4,00	4		$ 45.204,00	$ 180.816,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.48	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,86	9,86		$ 30.684,00	$ 302.544,24	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	32,93	32,93		$ 18.061,00	$ 594.748,73	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	20.00	20		$ 16.333.00	$ 326.660.00	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.7	DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	18.33	18.33		$ 12.288.00	$ 225.239.04	$ -	100.00%	100.00%	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0.60	0.6		$ 96.108.00	$ 57.664.80	$ -	100.00%	100.00%	
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	1.14	1.14		$ 174.968.00	$ 199.463.52	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3	0.43	0.43		$ 1.069.032.00	$ 459.683.76	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE REFUERZO	M	110.60	110.60		$ 101.433.00	$ 11.218.489.80	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM. (NO INCLUYE ACERO)	M	5.70	5.70		$ 57.073.00	$ 325.316.10	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11.60	11.60		$ 160.361.00	$ 1.860.187.60	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.15	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI DE 15 CM SOBRE LAMINA COLABORANTE 2"	M2	5.18	5.18		$ 241.182.00	$ 1.250.287.49	$ -	100.00%	100.00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	822.31	822.31		$ 7.012.00	$ 5.766.037.72	$ -	100.00%	100.00%	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM. DE 0.15 X 0.15 M	KG	35.08	35.07856		$ 7.421.00	$ 260.317.99	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	5.67	5.67		$ 76.084.00	$ 431.396.28	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	12.08	12.08		$ 49.410.00	$ 596.872.80	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3". INCLUYE ACCESORIOS	UN	3.00	3		$ 135.539.00	$ 406.617.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	32.93	32.93		$ 25.481.00	$ 839.089.33	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	116.40	116.4		$ 19.470.00	$ 2.266.308.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1"	UN	63.00	63		$ 9.479.00	$ 597.177.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	11.00	11		$ 61.400.00	$ 675.400.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	9.00	9		$ 61.400.00	$ 552.600.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	12.00	12		$ 94.029.00	$ 1.128.348.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	2.00	2		$ 66.686.00	$ 133.372.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 1"	UN	1.00	1.00		$ 200.497.00	$ 200.497.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"	UN	1.00	1.00		$ 206.989.00	$ 206.989.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	120.00	120.00		$ 5.814.00	$ 697.680.00	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	4		$ 122.646,00	$ 490.584,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V. 30.000 HORAS. TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	7,00	7		$ 62.384,00	$ 436.688,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	29.72	29.72		$ 41.218.00	$ 1.224.998.96	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.4	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2	1.42	1.4175		$ 39.550.00	$ 56.062.13	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	49.43	49.43		$ 26.248.00	$ 1.297.438.64	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	80.00	80		$ 498.089.00	$ 39.847.120.00	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	45.67	45.67		$ 14.858.00	$ 678.564.86	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	23.09	23.09		$ 132.061.00	$ 3.049.288.49	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	103.03	103.03		$ 94.926.00	$ 9.780.225.78	$ -	100.00%	100.00%	
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	19,80	19,80		$ 761.157,00	$ 15.073.192,07	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	23,31	23,3055		$ 965.200,00	$ 22.494.468,60	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.6	PUERTA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	4.80	4.8		$ 945.575.00	$ 4.538.760.00	$ -	100.00%	100.00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	4,80	4,8		$ 1.090.099,00	$ 5.232.475,20	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00	3		$ 746.496.00	$ 2.239.488.00	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	9.00	9		$ 391.028.00	$ 3.519.252.00	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00	2		$ 39.750.00	$ 79.500.00	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	3.00	3		$ 32.443.00	$ 97.329.00	$ -	100.00%	100.00%	
8 10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES. INCLUYE 8 ASEOS	MES	13,60	13,6		$ 945.896,00	$ 12.864.185,60	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	5,98	5,98		$ 956.124,00	$ 5.717.621,52	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2.52	2.52		$ 1.033.647.00	$ 2.604.790.44	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	107.00	107		$ 34.979.00	$ 3.742.753.00	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.8	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	61,31	61,31		$ 36.386,00	$ 2.230.825,66	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0.60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	105.00	105.00		$ 23.852.00	$ 2.504.460.00	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.12	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	29,37	29,37		$ 12.568,00	$ 369.122,16	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0.61 M HASTA 1.3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	107,70	107,7		$ 26.828,00	$ 2.889.375,60	$ -	100,00%	100,00%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20,00	20,00		$ 8.860,00	$ 177.200,00	$ -	100,00%	100,00%	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	31,06	31,06		$ 125.971,00	$ 3.912.659,26	$ -	100,00%	100,00%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	6.13	6.125		$ 128.780.00	$ 788.777.50	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20 - DESARROLLO 80 CM. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	15.81	15.81		$ 102.700.00	$ 1.623.687.00	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	51,74	51,74		$ 129.084,00	$ 6.678.806,16	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	51,74	51,74		$ 240.910,00	$ 12.464.683,40	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 2"x1/8" SOBRE CORREAS PARA FIJACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA	M	27.00	27.00		$ 18.402.00	$ 496.854.00	$ -	100.00%	100.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	144.00	144.00		$ 4.508.00	$ 649.152.00	$ -	100.00%	100.00%	
19.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMATICO CAPACIDAD DEL SISTEMA 200 GPM, PRESIÓN DE TRABAJO 71-91 PSI, INCLUYE BOMBAS, DEPOSITO, TABLERO, MANOMETROS, PRESOSTATOS, VÁLVULAS DE PASO, VÁLVULAS DE CHEQUE, FLOTADOR, TUBERIA DE INTERCONEXIÓN ENTRE BOMBAS Y DEPOSITO, FLAUTA DE DESCARGA EN 4" DE DIAMETRO, TUBERIA DE SUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE DE 2" Y VALVULA DE PIE DE 2"	UN	1,00	0		$ 57.267.273,00	$ -	$ 57.267.273,00	0,00%	0,00%	
NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS	UND	7,00	7		$ 1.165.807,00	$ 8.160.649,00	$ -	100,00%	100,00%	PT APROBAR

CPE		803	IED	CARLOS ARTURO TORRES SEDE B			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye paralés de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico	M	21,00	21		$ 30.066,00	$ 631.386,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	114,72	114,72		$ 3.395,00	$ 389.474,40	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	49,14	49,14		$ 31.500,00	$ 1.547.910,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	89.33	89.33		$ 10.995.00	$ 982.183.35	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.14	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	19.32	19.32		$ 155.716.00	$ 3.008.433.12	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	8,23	2,04		$ 32.061,00	$ 65.404,44	$ 198.457,59	24,79%	24,79%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,39	5,39		$ 28.405,00	$ 153.102,95	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	133,62	133,62		$ 35.518,00	$ 4.745.915,16	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,60	40,6		$ 31.476,00	$ 1.277.925,60	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	19,00	19		$ 11.566,00	$ 219.754,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	34.00	34		$ 7.219.00	$ 245.446.00	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	39.00	39		$ 4.244.00	$ 165.516.00	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	76.91	76.91		$ 16.333.00	$ 1.256.171.03	$ -	100.00%	100.00%	
2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	1.25	1.25		$ 64.356.00	$ 80.445.00	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	49.30	49.3		$ 632.023.00	$ 31.158.733.90	$ -	100.00%	100.00%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	2.13	2.13		$ 141.229.00	$ 300.817.77	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	7,00	7		$ 122.646,00	$ 858.522,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	3		$ 163.229,00	$ 489.687,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	2		$ 147.178,00	$ 294.356,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	9,00	9		$ 204.593,00	$ 1.841.337,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	78,40	78,4		$ 15.899,00	$ 1.246.481,60	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	25,00	25		$ 174.276,00	$ 4.356.900,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	33,00	33		$ 241.381,00	$ 7.965.573,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN GRAVILLA LAVADA MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M2	1.68	1.68		$ 120.329.00	$ 202.152.72	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	241,50	0,00		$ 74.985,00	$ -	$ 18.108.877,50	0,00%	0,00%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	219.00	0		$ 19.187.00	$ -	$ 4.201.953.00	0.00%	0.00%	
7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	42.98	42.98		$ 121.988.00	$ 5.243.044.24	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	76.91	76.91		$ 25.380.00	$ 1.951.975.80	$ -	100.00%	100.00%	
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	8,23	8,23		$ 738.943,00	$ 6.081.500,89	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 3+3 MM INCOLORO Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS T DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	5,39	5,39		$ 560.257,00	$ 3.019.785,23	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO). DESMONTABLE PARA LIMPIEZA. INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	5.63	5.63		$ 66.398.00	$ 373.820.74	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	202.78	202.78		$ 34.979.00	$ 7.093.041.62	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	96.38	96.38		$ 39.822.00	$ 3.838.044.36	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	72.11	72.11		$ 12.106.00	$ 872.963.66	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0.60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	54.74	54.74		$ 23.852.00	$ 1.305.658.48	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.13	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	4,80	4,8		$ 7.804,00	$ 37.459,20	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	4.87	4.87		$ 16.631.00	$ 80.992.97	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	121.62	121.62		$ 28.786.00	$ 3.500.953.32	$ -	100.00%	100.00%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	73,00	73		$ 8.860,00	$ 646.780,00	$ -	100,00%	100,00%	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	129,74	129,74		$ 125.971,00	$ 16.343.477,54	$ -	100,00%	100,00%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	0.53	0.53		$ 128.780.00	$ 67.995.84	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20 - DESARROLLO 80 CM. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	79.48	79.48		$ 102.700.00	$ 8.162.596.00	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20.25	18.71		$ 68.873.00	$ 1.288.613.83	$ 106.064.42	92.40%	92.40%	
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	64.00	64		$ 97.011.00	$ 6.208.704.00	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	133,62	133,62		$ 129.084,00	$ 17.248.204,08	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	71,30	71,3		$ 240.910,00	$ 17.176.883,00	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	19,61	7,8		$ 187.010,00	$ 1.458.678,00	$ 2.208.588,10	39,78%	39,78%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	310.00	100.00		$ 4.508.00	$ 450.800.00	$ 946.680.00	32.26%	32.26%	
19.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN MD-10	M3	19.32	19.32		$ 1.480.308.00	$ 28.599.550.56	$ -	100.00%	100.00%	

	CPF	816	IED	FRANCISCO DE MIRANDA			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico	M	33,20	23,2		$ 30.066,00	$ 697.531,20	$ 300.660,00	69,88%	69,88%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	106,23	106,23		$ 31.500,00	$ 3.346.245,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	64,40	64,4		$ 21.553,00	$ 1.388.013,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.52	36.52		$ 12.224.00	$ 446.420.48	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	14,59	14,59		$ 32.061,00	$ 467.769,99	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,57	7,57		$ 28.405,00	$ 215.025,85	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	6,00	6		$ 26.367,00	$ 158.202,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	2,50	2,5		$ 20.015,00	$ 50.037,50	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	32,48	32,48		$ 35.518,00	$ 1.153.624,64	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	73,75	73,75		$ 31.476,00	$ 2.321.355,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	51,25	51,25		$ 24.868,00	$ 1.274.485,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	13,00	13		$ 11.566,00	$ 150.358,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	13.00	13		$ 7.219.00	$ 93.847.00	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	33.00	33		$ 4.244.00	$ 140.052.00	$ -	100.00%	100.00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	9,00	9		$ 8.659,00	$ 77.931,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	4.00	4		$ 14.178.00	$ 56.712.00	$ -	100.00%	100.00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	3,00	3		$ 21.111,00	$ 63.333,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.4	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMALETA. VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M	21.91	21.91		$ 55.590.00	$ 1.217.976.90	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	24.32	24.32		$ 101.433.00	$ 2.466.850.56	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM. (NO INCLUYE ACERO)	M	16.82	16.82		$ 57.073.00	$ 959.967.86	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN	M2	106.23	106.23		$ 111.395.00	$ 11.833.490.85	$ -	100.00%	100.00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	281.89	281.89		$ 7.012.00	$ 1.976.612.68	$ -	100.00%	100.00%	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	51.62	51.62		$ 63.196.00	$ 3.262.177.52	$ -	100.00%	100.00%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	4.90	4.9		$ 141.229.00	$ 692.022.10	$ -	100.00%	100.00%	
3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	28.44	28.44		$ 9.398.00	$ 267.279.12	$ -	100.00%	100.00%	
3.2.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	M	1.20	1.2		$ 40.794.00	$ 48.952.80	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	12.39	12.39		$ 88.516.00	$ 1.096.713.24	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	4.26	4.26		$ 49.410.00	$ 210.486.60	$ -	100.00%	100.00%	
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	4.00	4		$ 135.539.00	$ 542.156.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2'' INCLUYE ACCESORIOS	M	14.93	14.93		$ 14.486.00	$ 216.275.98	$ -	100.00%	100.00%	
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	10.00	10		$ 4.830.00	$ 48.300.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	5.00	5		$ 61.400.00	$ 307.000.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	3.00	3		$ 61.400.00	$ 184.200.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	5.00	5		$ 175.735.00	$ 878.675.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	7.00	7		$ 94.029.00	$ 658.203.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	2.00	2		$ 66.686.00	$ 133.372.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.7.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00	1		$ 846.541.00	$ 846.541.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	10.00	0		$ 73.531.00	$ -	$ 735.310.00	0.00%	0.00%	
4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	1.00	1.00		$ 176.353.00	$ 176.353.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	30.00	30.00		$ 5.814.00	$ 174.420.00	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	10,00	10		$ 122.646,00	$ 1.226.460,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	21,00	21		$ 204.593,00	$ 4.296.453,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	2,00	2		$ 598.211,00	$ 1.196.422,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	5.00	5		$ 28.341.00	$ 141.705.00	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA	UN	1.00	1		$ 32.478.00	$ 32.478.00	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	25,00	25		$ 22.533,00	$ 563.325,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	19,00	19		$ 35.210,00	$ 668.990,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	34.00	34		$ 16.790.00	$ 570.860.00	$ -	100.00%	100.00%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	21,00	21		$ 174.276,00	$ 3.659.796,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	5,00	5		$ 241.381,00	$ 1.206.905,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC, VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN	UN	16,00	16,00		$ 62.384,00	$ 998.144,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.49	ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN	M	21,00	21,00		$ 60.364,00	$ 1.267.644,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	102.28	102.28		$ 43.769.00	$ 4.476.693.32	$ -	100.00%	100.00%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	25.99	25.99		$ 26.248.00	$ 682.185.52	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	61.00	61.00		$ 498.089.00	$ 30.383.429.00	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	8.60	8.6		$ 14.858.00	$ 127.778.80	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	924,00	924,00		$ 63.550,00	$ 58.720.200,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	101.22	68.74		$ 132.061.00	$ 9.077.873.14	$ 4.289.341.28	67.91%	67.91%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	363.00	363.00		$ 19.187.00	$ 6.964.881.00	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	84.87	84.87		$ 94.926.00	$ 8.056.369.62	$ -	100.00%	100.00%	
8.1.5	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA. VISTO DOS CARAS. E= 12 CM	M2	47.25	47.25		$ 166.287.00	$ 7.857.060.75	$ -	100.00%	100.00%	
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	14,93	14,93		$ 801.420,00	$ 11.965.200,60	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	6,00	6,00		$ 464.504,00	$ 2.787.024,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)	UN	3,00	3,00		$ 762.932,00	$ 2.288.796,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	3.00	3.00		$ 391.028.00	$ 1.173.084.00	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00	2.00		$ 39.750.00	$ 79.500.00	$ -	100.00%	100.00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	4.00	4.00		$ 32.443.00	$ 129.772.00	$ -	100.00%	100.00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	23,25	23,25		$ 956.124,00	$ 22.229.883,00	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	112.35	112.35		$ 34.979.00	$ 3.929.890.65	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	68.97	68.97		$ 12.106.00	$ 834.950.82	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A 60 CM	M	30.95	30.95		$ 9.831.00	$ 304.269.45	$ -	100.00%	100.00%	
12.1.8	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	36,95	36,95		$ 36.386,00	$ 1.344.462,70	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0.60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	75.04	75.04		$ 23.852.00	$ 1.789.854.08	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	260.17	260.17		$ 20.875.00	$ 5.431.048.75	$ -	100.00%	100.00%	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	36.95	36.95		$ 16.631.00	$ 614.515.45	$ -	100.00%	100.00%	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	68,24	16,36		$ 125.971,00	$ 2.060.885,56	$ 6.535.375,48	23,97%	23,97%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	1.50	1.50		$ 128.780.00	$ 193.170.00	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20 - DESARROLLO 80 CM. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	13.40	13.40		$ 102.700.00	$ 1.376.180.00	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2.50	2.50		$ 68.873.00	$ 172.182.50	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	32,48	0		$ 129.084,00	$ -	$ 4.192.648,32	0,00%	0,00%	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	32,48	0		$ 240.910,00	$ -	$ 7.824.756,80	0,00%	0,00%	
16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	12,00	0		$ 40.429,00	$ -	$ 485.148,00	0,00%	0,00%	
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	4,30	0		$ 187.010,00	$ -	$ 804.143,00	0,00%	0,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	145.50	0.00		$ 4.508.00	$ -	$ 655.914.00	0.00%	0.00%	
NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UND	5	5		$ 1.165.807,00	$ 5.829.035,00	$ -	100,00%	100,00%	PT APROBAR

	CPF	617	IED	RUFINO JOSE CUERVO SEDE C			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	160,53	160,53		$ 3.395,00	$ 544.999,35	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	161,53	160,53		$ 79.342,00	$ 12.736.771,26	$ 79.342,00	99,38%	99,38%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	3,00	3,00		$ 21.111,00	$ 63.333,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	161.70	161.7		$ 16.333.00	$ 2.641.046.10	$ -	100.00%	100.00%	
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	64.21	64.21		$ 130.850.00	$ 8.401.878.50	$ -	100.00%	100.00%	
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO. EXTENDIDO. NIVELACIÓN. HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	64.21	64.21		$ 174.968.00	$ 11.234.695.28	$ -	100.00%	100.00%	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	1.00			$ 160.361.00	$ -	$ 160.361.00	0.00%	0.00%	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM. DE 0.15 X 0.15 M	KG	431.81	431.81		$ 7.421.00	$ 3.204.462.01	$ -	100.00%	100.00%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN. EPOXICO Y ACERO)	CM	640.00	640.00		$ 9.705.00	$ 6.211.200.00	$ -	100.00%	100.00%	
4.7.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00	1		$ 1.137.300.00	$ 1.137.300.00	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI. E= 0.10 M ESCOBEADO. INCLUYE DILATACIÓN EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	160.53	160.53		$ 131.783.00	$ 21.155.124.99	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	76.96	76.93		$ 498.089.00	$ 38.317.986.77	$ 14.942.67	99.96%	99.96%	
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	288,69	288,69		$ 63.550,00	$ 18.346.249,50	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	330.22	330.22		$ 19.187.00	$ 6.335.931.14	$ -	100.00%	100.00%	
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	243.77	243.77		$ 25.380.00	$ 6.186.882.60	$ (0.00)	100.00%	100.00%	
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	3,82	0		$ 761.157,00	$ -	$ 2.907.619,74	0,00%	0,00%	
9.3.6	PUERTA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	3.60	0		$ 945.575.00	$ -	$ 3.404.070.00	0.00%	0.00%	
16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	4.22	4.22		$ 68.873.00	$ 290.644.06	$ -	100.00%	100.00%	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE	M	28,35	28,35		$ 319.199,00	$ 9.049.291,65	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	288.69	288.69		$ 4.508.00	$ 1.301.414.52	$ -	100.00%	100.00%	

	CPF	609	IED	JOSE ANTONIO SAN CARLOS SEDE B			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico	M	150,00			$ 30.066,00	$ -	$ 4.509.900,00	0,00%	0,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8,00			$ 11.566,00	$ -	$ 92.528,00	0,00%	0,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	30.00			$ 4.244.00	$ -	$ 127.320.00	0.00%	0.00%	
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	20,00			$ 18.061,00	$ -	$ 361.220,00	0,00%	0,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	70.00			$ 16.333.00	$ -	$ 1.143.310.00	0.00%	0.00%	
3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17.53			$ 9.398.00	$ -	$ 164.746.94	0.00%	0.00%	
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	17,53			$ 27.238,00	$ -	$ 477.482,14	0,00%	0,00%	
4.6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 3"	UN	1.00			$ 894.074.00	$ -	$ 894.074.00	0.00%	0.00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8,00			$ 122.646,00	$ -	$ 981.168,00	0,00%	0,00%	
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACESORIO RANURADO DE 3"	UN	8.00			$ 134.072.00	$ -	$ 1.072.576.00	0.00%	0.00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	300.00			$ 4.508.00	$ -	$ 1.352.400.00	0.00%	0.00%	
NP 006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA PRINCIPAL TIPO CENTRIFUGA ALTA PRESIÓN IMPULSOR CERRADO EN FUNDICIÓN, POTENCIA 30 HP, TENSIÓN 220 VOLTIOS TRIFASICO (CALCULADA PARA OPERACIÓN SIMULTANEA DE DOS GABINETES)	UND	1,00			$ 37.324.920,00	$ -	$ 37.324.920,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA JOCKEY TIPO VERTICAL MULTIEMPATADA, IMPULSOR CERRADO, POTENCIA DE 10 HP, TENSIÓN 220 VOLTIO TRIFASICO.	UND	1,00			$ 20.895.349,00	$ -	$ 20.895.349,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 008	SUMINISTRO E INSTLACIÓN VALVULAS DE PIE 3"	UND	1.00			$ 1.299.086.00	$ -	$ 1.299.086.00	0.00%	0.00%	PT APROBAR
NP 009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA 2"	UND	1.00			$ 603.695.00	$ -	$ 603.695.00	0.00%	0.00%	PT APROBAR
NP 010	Suministro e instalacion Valvula de Compuerta HD 3" Vastago Ascendente Sello Metálico Gaer Icbk075	UND	1.00			$ 1.560.469.00	$ -	$ 1.560.469.00	0.00%	0.00%	PT APROBAR
NP 011	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELÉCTRICO CON COFRE METALICO NEMA 4, INCLUYE BREAKER PRINCIPAL, ARRANCADOR ESTRELLA TRIANGULO, 230 VOLTIOS ARRANQUE DIRECTO	UND	1,00			$ 20.438.942,00	$ -	$ 20.438.942,00	0,00%	0,00%	PT APROBAR
NP 012	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 4" SCH 40 RANURADA	ML	95.00			$ 872.101.00	$ -	$ 82.849.595.00	0.00%	0.00%	PT APROBAR
NP 013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA 1 1/2" SCH 40 RANURADA	ML	140.00			$ 296.070.00	$ -	$ 41.449.800.00	0.00%	0.00%	PT APROBAR
NP 014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION VITAULIC DE 4"	UND	20.00			$ 145.952.00	$ -	$ 2.919.040.00	0.00%	0.00%	PT APROBAR
NP 015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION VITAULIC DE 3"	UND	6.00			$ 126.838.00	$ -	$ 761.028.00	0.00%	0.00%	PT APROBAR
NP 016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION VITAULIC DE 1 1/2"	UND	90.00			$ 96.905.00	$ -	$ 8.721.450.00	0.00%	0.00%	PT APROBAR
NP 017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 1 1/2" RANURADO	UND	70.00			$ 87.355.00	$ -	$ 6.114.850.00	0.00%	0.00%	PT APROBAR
NP 018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMICODO RANURADO DE 1 1/2"	UND	6.00			$ 84.884.00	$ -	$ 509.304.00	0.00%	0.00%	PT APROBAR
NP 019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 4"	UND	70.00			$ 50.345.00	$ -	$ 3.524.150.00	0.00%	0.00%	PT APROBAR
NP 020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTES TIPO PERA DE 1 1/2"	UND	100.00			$ 44.487.00	$ -	$ 4.448.700.00	0.00%	0.00%	PT APROBAR
NP 021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA EYECTORA DE 0.5 HP 120 V DESCARGA DE 3"	UND	1.00			$ 3.718.776.00	$ -	$ 3.718.776.00	0.00%	0.00%	PT APROBAR

	CPF	UDD	IED	EMERGENCIA JACKELIN			SEMANA				
	Item / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M.) NOTA: el item incluye revisión periódica de su estado físico.	M	10,00	10	10	$ 30.066,00	$ 300.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	100,00	100	100	$ 4.508,00	$ 450.800,00	$ -	100,00%	100,00%	
	TALA DE ARBOLES CLASE III (154M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1,00	1	1	$ 1.948.634,00	$ 1.948.634,00	$ -	100,00%	100,00%	

	CPF	UDD	IED	EMERGENCIA OEA			SEMANA				
	Item / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M.)	M	10,00	10,00		$ 30.066,00	$ 300.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y AJUSTADO DE PISO E=0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	31,59	31,59		$ 31.500,00	$ 995.085,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16,41	16,41		$ 10.995,00	$ 180.427,95	$ -	100,00%	100,00%	
	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2	31,59	31,59		$ 127.792,00	$ 4.036.949,28	$ -	100,00%	100,00%	
	RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	M2	16,41	16,41		$ 136.965,00	$ 2.247.595,65	$ -	100,00%	100,00%	
	SONDEO Y DIVISIÓN DE DESAGUES	M	10,00	10,00		$ 5.814,00	$ 58.140,00	$ -	100,00%	100,00%	
	AJUSTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	31,59	31,59		$ 43.768,00	$ 1.382.662,71	$ -	100,00%	100,00%	
	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO). INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	31,59	31,59		$ 72.800,00	$ 2.299.752,00	$ -	100,00%	100,00%	
	MENSCHAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	16,00	16,00		$ 26.248,00	$ 419.968,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEIBOL)	M2	31,59	31,59		$ 74.985,00	$ 2.368.774,15	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	50,90	50,90		$ 25.180,00	$ 1.281.842,00	$ -	100,00%	100,00%	
	PAÑETE CANTERAS MUROS, CUSTAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DOSIS 0,01 M HASTA 1,2 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	16,41	16,41		$ 36.286,00	$ 597.094,26	$ -	100,00%	100,00%	
	PINTURA PARA INTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADO)	M2	54,00	54,00		$ 28.766,00	$ 1.554.444,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD ESPESOR 10 MM CON SANBLASTING TIPO PERSIANA	M2	0,80	0,80		$ 262.754,00	$ 210.203,20	$ -	100,00%	100,00%	
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE	M	40,00	40,00		$ 40.429,00	$ 1.617.160,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON OCURRENCIA DE AGUA	M	14,56	14,56		$ 24.881,00	$ 362.396,48	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	31,59	31,59		$ 4.508,00	$ 142.407,72	$ -	100,00%	100,00%	
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M.) NOTA: el item incluye revisión periódica de su estado físico.	M	10,00	10,00		$ 30.066,00	$ 300.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRAND MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,88	9,88		$ 21.852,00	$ 215.897,76	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 FLUIDO. INCLUYE FLUIDO Y BRILLADO	M2	9,88	9,88		$ 203.467,00	$ 2.009.256,07	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO FLUIDO BLANCO H:10 CM. INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	93,07	93,07		$ 83.512,00	$ 7.772.661,84	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIA CAÑA EN FIBRA DE VIDRIO	M	95,50	95,50		$ 22.997,00	$ 2.196.213,50	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	93,07	93,07		$ 23.726,00	$ 2.208.016,45	$ -	100,00%	100,00%	
	DISTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	27,42	27,42		$ 67.537,00	$ 1.851.972,60	$ -	100,00%	100,00%	
	PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	37,30	37,30		$ 40.967,00	$ 1.527.919,91	$ -	100,00%	100,00%	ESTUCO
	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADO)	M2	37,30	37,30		$ 20.873,00	$ 778.568,41	$ -	100,00%	100,00%	EPÓXICA
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	30,00	30,00		$ 40.429,00	$ 1.212.870,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	68,02	68,02		$ 4.508,00	$ 306.627,96	$ -	100,00%	100,00%	

	CPF	UDD	IED	EMERGENCIA DILE TUNJUELITO			SEMANA				
	Item / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M.) NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	25,00	25,00		$ 30.066,00	$ 751.650,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0.08 A 0.10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	20,00	20,00		$ 72.193,00	$ 1.443.860,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DESMONTE RETIRO DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	20,00	20,00		$ 20.015,00	$ 400.300,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	3,00	3,00		$ 9.069,00	$ 27.207,00	$ -	100,00%	100,00%	
	CORTE Y RESATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	5,00	5,00		$ 18.061,00	$ 90.305,00	$ -	100,00%	100,00%	
	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12,00	12,00		$ 16.333,00	$ 195.996,00	$ -	100,00%	100,00%	
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,88	0,88		$ 96.108,00	$ 84.094,50	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO SSU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMIDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0,25	0,25		$ 183.945,00	$ 45.986,25	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO EN CONCRETO (2S X 4D CM) CON REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR	M	5,00	5,00		$ 334.957,00	$ 1.674.785,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	2,00	2,00		$ 7.012,00	$ 14.024,00	$ -	100,00%	100,00%	
	RESANE DE FISURAS EN MUROS INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	90,00	90,00		$ 14.353,00	$ 1.291.770,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ANGGCEI. DEMONTABLE PARA LIMPIEZA. INCLUYE ANGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERIA	M2	10,10	10,10		$ 66.398,00	$ 1.098.579,80	$ -	100,00%	100,00%	
	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADO)	M2	90,00	90,00		$ 20.875,00	$ 1.878.750,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA CAMARA ANTIMPACTO Y SOPORTES EN CHANTE	M	3,00	3,00		$ 319.199,00	$ 957.597,00	$ -	100,00%	100,00%	
	PAÑETE DE PAT EN MUROS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADO)	M	50,00	50,00		$ 68.873,00	$ 3.377.468,65	$ -	100,00%	100,00%	
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	120,00	120,00		$ 40.429,00	$ 4.851.480,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	150,00	150,00		$ 4.508,00	$ 676.200,00	$ -	100,00%	100,00%	

	CPF	UDD	IED	EMERGENCIA HERNANDO DURAN DUSSAN			SEMANA				
	Item / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M.) NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	10,00	10,00		$ 30.066,00	$ 300.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.01 A 0.05 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	49,00	49,00		$ 6.953,00	$ 340.697,00	$ -	100,00%	100,00%	
	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	49,00	49,00		$ 18.852,00	$ 923.748,00	$ -	100,00%	100,00%	
	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2	49,00	49,00		$ 127.792,00	$ 6.261.808,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SONDEO Y DIVISIÓN DE DESAGUES	M	50,00	50,00		$ 5.814,00	$ 290.700,00	$ -	100,00%	100,00%	
	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO). INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	49,00	49,00		$ 72.800,00	$ 3.567.200,00	$ -	100,00%	100,00%	
	MENSCHAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	35,00	35,00		$ 26.248,00	$ 918.680,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	35,00	35,00		$ 25.180,00	$ 888.300,00	$ -	100,00%	100,00%	
	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE FIJOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	8,75	8,75		$ 39.822,00	$ 348.442,50	$ -	100,00%	100,00%	
	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	49,00	49,00		$ 97.011,00	$ 4.753.539,00	$ -	100,00%	100,00%	
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	15,00	15,00		$ 40.429,00	$ 606.435,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	49,00	49,00		$ 4.508,00	$ 220.892,00	$ -	100,00%	100,00%	
NP 003	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN MECANICA PARA COCINA – ZONA DE LAVADO Y ALMACÉN, COMPUESTO POR CAMPANA TIPO HONGO 220V/3PH, EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO, VENTILADOR AXIAL, REDUCTORES EN LAMINA GALVANIZADA, REJILLAS DE EXTRACCIÓN Y RETORNO, ACCESORIOS, CONDICIONES ELÉCTRICAS, APERTURAS Y PASOS EN MURO O PLACA, INCLUYE MONTAJE, SOPORTERÍA, SELLADOS, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS MINI SPLIT EXISTENTES EN COCINA DEL COLEGIO HERNAN DURAN DUSSAN LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTA D.C	UN	1,00	1,00		$ 47.097.726,00	$ 47.097.726,00	$ -	100,00%	100,00%	

	CPF	UDD	IED	EMERGENCIA COLEGIO ROSA MARIA GORDILLO			SEMANA				
	Item / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.5	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0.15M A 0.20 M EXISTENTE EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	M2	1,90	1,90	0,00	$ 108.449,00	$ 206.053,10	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.2	CORTE Y RESATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE	M	8,60	8,60	0,00	$ 18.061,00	$ 155.324,60	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,76	0,76	0,00	$ 96.108,00	$ 73.042,08	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.3	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	3,80	3,80	0,00	$ 159.256,00	$ 605.172,80	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (0.5 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM,	M	3,80	3,80	0,00	$ 374.817,00	$ 1.424.340,60	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM. ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO	M	3,80	3,80	0,00	$ 164.023,00	$ 623.287,40	$ -	100,00%	100,00%	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M,	M2	28,57	28,57	0,00	$ 7.421,00	$ 212.017,97	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	0,80	0,80	0,00	$ 88.516,00	$ 70.812,80	$ -	100,00%	100,00%	
6.7.7	LIMPIEZA DE CANALES INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	3,00	3,00	0,00	$ 73.531,00	$ 220.593,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.6	MENSCHAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	8,60	8,60	0,00	$ 26.248,00	$ 225.732,80	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	1,52	1,52	0,00	$ 377.538,00	$ 573.857,76	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	6,20	6,20	0,00	$ 4.508,00	$ 18.933,60	$ -	100,00%	100,00%	

	CPF	UDD	IED	EMERGENCIA COLEGIO CASTILLA			SEMANA				
	Item / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de intervenciones para subrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	0,00	0	0	$ 3.395,00	$ -	$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,00	1	0	$ 21.553,00	$ 21.553,00	$ 21.553,00	50,00%	50,00%	
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS, ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	57,00	60	0	$ 35.518,00	$ 2.131.080,00	$ (106.554,00)	105,26%	105,26%	
	DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	0,00	0	0	$ 11.566,00	$ -	$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
	DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M	24,98	0	0	$ 4.167,00	$ -	$ 103.633,53	0,00%	0,00%	
	MURO LADRILLO PRENSADO M ACIDO	M2	2,01	1	0	$ 141.229,00	$ 141.229,00	$ 142.641,29	49,75%	49,75%	
	EMBOQUILLADO DE LADRILLO A LA VISTA EN ALTURA MENOR A 1.50 M CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	2,01	1	0	$ 43.445,00	$ 43.445,00	$ 20.901,45	49,75%	49,75%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y ADECUADA SEPARACIÓN, MEDIDAS ACTAS DE ACUERDO	CM	0,00	0	0	$ 1.676,00	$ -	$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CAIDAS, AMSTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	47,32	53,82	0	$ 8.860,00	$ 476.845,20	$ (57.590,00)	113,74%	113,74%	
	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	13,60	15	0	$ 102.700,00	$ 1.540.500,00	$ 1.910.220,00	44,64%	44,64%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLUCIDO BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	57,00	60	0	$ 224.940,00	$ 13.496.400,00	$ (674.820,00)	105,26%	105,26%	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON OCURRENCIA DE AGUA	M	0,00	0	0	$ 24.881,00	$ -	$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN DOS CUANTOS DE SU ACABO	M2	28,50	36,33	0	$ 240.910,00	$ 8.752.260,30	$ (1.886.325,30)	127,47%	127,47%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	57,00	60	0	$ 4.508,00	$ 270.480,00	$ (13.524,00)	105,26%	105,26%	
	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	10,00	60	0	$ 7.491,00	$ 449.460,00	$ (374.550,00)	600,00%	600,00%	

	CPF	UDD	IED	EMERGENCIA COLEGIO COEDMA			SEMANA				
	Item / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	28,60	28,60	28,60	$ 24.868,00	$ 711.224,80	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.48	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17,40	17,40	17,40	$ 30.684,00	$ 533.901,60	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20. ENTAMBORADO DE 1"	M2	39,70	39,70	39,70	$ 956.124,00	$ 37.958.122,80	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	6,30	6,30	6,30	$ 1.033.647,00	$ 6.511.976,10	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	46,00	46,00	46,00	$ 4.508,00	$ 207.368,00	$ -	100,00%	100,00%	

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

RECEPCIÓN DETALLADA PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

SED-LP-OP-DCCEE-012-2025	**OBJETO**	OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		Valor total del Contrato (SIGLA UNIDAD DEL RUBRO):	$ 2.218.080.668,00
		Fecha de Acta Inicio:	14/10/2025
CONSORCIO CORAL INGENIERIA		Valor Adición:	$ -
		Valor total presente formato:	$ -
		Fecha presente formato:	28/10/2025
ANGELICA MARIA ESTRADA AVELLA		Corte de mantenimiento:	
MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR		Periodo Ejecución corte de mantenimiento:	Del 03/12/25 al 04/04/2026

	CFP-601 INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA
CONSECUTIVO NECESIDAD :	
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	FACHADAS Y BAÑOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR PARCIAL POR EJECUTAR	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	40,11	$ 30.066,00	$ 1.205.947,26	40,11	$ 1.205.947,26	0,00	$ -	
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	0,54	$ 286.958,00	$ 154.957,32	0,54	$ 154.957,32	0,00	$ -	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	32,72	$ 29.984,00	$ 981.076,48	32,72	$ 981.076,48	0,00	$ -	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,27	$ 31.500,00	$ 1.268.505,00	40,27	$ 1.268.505,00	0,00	$ -	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,85	$ 21.553,00	$ 61.426,05	2,85	$ 61.426,05	0,00	$ -	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	163,4	$ 10.995,00	$ 1.796.583,00	163,40	$ 1.796.583,00	0,00	$ -	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	108,04	$ 12.224,00	$ 1.320.680,96	108,04	$ 1.320.680,96	0,00	$ -	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,55	$ 32.061,00	$ 209.999,55	6,55	$ 209.999,55	0,00	$ -	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28	$ 26.367,00	$ 738.276,00	28,00	$ 738.276,00	0,00	$ -	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,7	$ 31.476,00	$ 84.985,20	2,70	$ 84.985,20	0,00	$ -	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	7	$ 11.566,00	$ 80.962,00	7,00	$ 80.962,00	0,00	$ -	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	6	$ 7.219,00	$ 43.314,00	6,00	$ 43.314,00	0,00	$ -	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	16,1	$ 4.244,00	$ 68.328,40	16,10	$ 68.328,40	0,00	$ -	
1.2.34	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	4	$ 385.556,00	$ 1.542.224,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.542.224,00	
1.2.35	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,18	$ 23.790,00	$ 4.282,20	0,18	$ 4.282,20	0,00	$ -	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	19,5	$ 8.659,00	$ 168.850,50	19,50	$ 168.850,50	0,00	$ -	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	18	$ 14.178,00	$ 255.204,00	18,00	$ 255.204,00	0,00	$ -	
1.3.2	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2	423,36	$ 147.193,00	$ 62.315.628,48	141,12	$ 20.771.876,16	282,24	$ 41.543.752,32	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	33,45	$ 21.111,00	$ 706.162,95	33,45	$ 706.162,95	0,00	$ -	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	7	$ 36.280,00	$ 253.960,00	7,00	$ 253.960,00	0,00	$ -	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	22,58	$ 16.333,00	$ 368.799,14	22,58	$ 368.799,14	0,00	$ -	

MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0,76	$ 70.230,00	$ 53.374,80	0,76	$ 53.374,80	0,00	$ -	
3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	529,54	$ 9.398,00	$ 4.976.616,92	529,54	$ 4.976.616,92	0,00	$ -	
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	529,58	$ 27.238,00	$ 14.424.700,04	529,58	$ 14.424.700,04	0,00	$ -	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	1,00	$ 25.481,00	$ 25.481,00	1,00	$ 25.481,00	0,00	$ -	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	6,00	$ 14.486,00	$ 86.916,00	6,00	$ 86.916,00	0,00	$ -	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	6,00	$ 61.400,00	$ 368.400,00	6,00	$ 368.400,00	0,00	$ -	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	18,00	$ 61.400,00	$ 1.105.200,00	18,00	$ 1.105.200,00	0,00	$ -	
4.9.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6" (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	61,96	$ 13.297,00	$ 823.882,12	61,96	$ 823.882,12	0,00	$ -	
4.9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	UN	1,00	$ 61.772,00	$ 61.772,00	1,00	$ 61.772,00	0,00	$ -	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	405,00	$ 5.814,00	$ 2.354.670,00	405,00	$ 2.354.670,00	0,00	$ -	
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 122.646,00	$ 122.646,00	1,00	$ 122.646,00	0,00	$ -	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	17,30	$ 22.533,00	$ 389.820,90	17,30	$ 389.820,90	0,00	$ -	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	$ 174.276,00	$ 1.045.656,00	6,00	$ 1.045.656,00	0,00	$ -	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	6,00	$ 62.384,00	$ 374.304,00	6,00	$ 374.304,00	0,00	$ -	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	72,45	$ 41.218,00	$ 2.986.244,10	72,45	$ 2.986.244,10	0,00	$ -	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	61,65	$ 203.467,00	$ 12.543.740,55	61,65	$ 12.543.740,55	0,00	$ -	
7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO H=10 CM, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	55,34	$ 83.512,00	$ 4.621.554,08	55,34	$ 4.621.554,08	0,00	$ -	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	40,80	$ 14.858,00	$ 606.206,40	40,80	$ 606.206,40	0,00	$ -	
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	21,52	$ 63.550,00	$ 1.367.596,00	21,52	$ 1.367.596,00	0,00	$ -	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	670,38	$ 19.187,00	$ 12.862.581,06	670,38	$ 12.862.581,06	0,00	$ -	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	26,75	$ 85.861,00	$ 2.296.781,75	26,75	$ 2.296.781,75	0,00	$ -	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	102,64	$ 94.926,00	$ 9.743.204,64	102,64	$ 9.743.204,64	0,00	$ -	
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
9.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA CÁRCAMO DE 30 CM DE ANCHO EN ÁNGULO DE 2"X3/16 Y CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE 1-1/2" X 3/16" CON 20 MM DE DILATACIÓN	M2	24,00	$ 347.190,00	$ 8.332.560,00	0,00	$ -	24,00	$ 8.332.560,00	
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1,28	$ 451.950,00	$ 578.496,00	1,28	$ 578.496,00	0,00	$ -	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	6,32	$ 1.090.099,00	$ 6.889.425,68	6,32	$ 6.889.425,68	0,00	$ -	

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	6,00	$ 746.496,00	$ 4.478.976,00	6,00	$ 4.478.976,00	0,00	$ -	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	12,00	$ 391.028,00	$ 4.692.336,00	12,00	$ 4.692.336,00	0,00	$ -	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	3,00	$ 32.443,00	$ 97.329,00	3,00	$ 97.329,00	0,00	$ -	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	5,07	$ 956.124,00	$ 4.847.548,68	5,07	$ 4.847.548,68	0,00	$ -	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2,63	$ 1.033.647,00	$ 2.718.491,61	2,63	$ 2.718.491,61	0,00	$ -	
PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	13,65	$ 34.979,00	$ 477.463,35	13,65	$ 477.463,35	0,00	$ -	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	798,70	$ 39.822,00	$ 31.805.831,40	798,70	$ 31.805.831,40	0,00	$ -	
12.1.3	PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	37,88	$ 40.967,00	$ 1.551.829,96	37,88	$ 1.551.829,96	0,00	$ -	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	14,22	$ 12.106,00	$ 172.147,32	14,22	$ 172.147,32	0,00	$ -	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	959,30	$ 23.852,00	$ 22.881.223,60	959,30	$ 22.881.223,60	0,00	$ -	
12.1.10	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	15,57	$ 12.606,00	$ 196.275,42	15,57	$ 196.275,42	0,00	$ -	
12.1.12	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	32,94	$ 12.568,00	$ 413.989,92	32,94	$ 413.989,92	0,00	$ -	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	37,88	$ 20.875,00	$ 790.745,00	37,88	$ 790.745,00	0,00	$ -	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	49,64	$ 33.461,00	$ 1.661.004,04	49,64	$ 1.661.004,04	0,00	$ -	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1354,68	$ 28.786,00	$ 38.995.818,48	1354,68	$ 38.995.818,48	0,00	$ -	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1295,91	$ 20.749,00	$ 26.888.836,59	1295,91	$ 26.888.836,59	0,00	$ -	
12.2.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	32,94	$ 17.148,00	$ 564.855,12	32,94	$ 564.855,12	0,00	$ -	
12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	1247,97	$ 23.550,00	$ 29.389.693,50	1247,97	$ 29.389.693,50	0,00	$ -	
12.3.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	2,20	$ 28.987,00	$ 63.771,40	0,00	$ -	2,20	$ 63.771,40	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	35,94	$ 8.860,00	$ 318.428,40	0,00	$ -	35,94	$ 318.428,40	
VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	5,19	$ 128.780,00	$ 668.368,20	5,19	$ 668.368,20	0,00	$ -	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	3,00	$ 40.429,00	$ 121.287,00	3,00	$ 121.287,00	0,00	$ -	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	359,00	$ 4.508,00	$ 1.618.372,00	0,00	$ -	359,00	$ 1.618.372,00	
ITEMS NO PREVISTOS										
NP1	DESMONTE DE ESPEJOS Y/O VIDRIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,24	$ 18.685,00	$ 97.909,40	5,24	$ 97.909,40	0,00	$ -	
NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UND	6,00	$ 1.165.807,00	$ 6.994.842,00	6,00	$ 6.994.842,00	0,00	$ -	
				VALOR TOTAL + AIU	**$ 345.179.355,92**		**$ 291.760.247,80**		**$ 53.419.108,12**	

NOTAS

Código: 1LF-FR-0208 **Fecha: 20/12/2024**	**OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.**
Versión: 1	**RECEPCIÓN DETALLADA PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.**

CONTRATO:	SED-LP-OP-DCCIE-012-2025	**OBJETO**	**OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES**		
UNIDAD: **ORDENADOR DEL GASTO:**	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		Valor total del Contrato ISIGLA UNIDAD DEL RUBRO:		$ 2.218.080.668,00
			Fecha de Acta Inicio:		14/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORAL INGENIERIA		Valor Adición:		$ -
SUPERVISOR TÉCNICO:			Valor total ejecutado formato:		$ -
COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACIÓN DEL GASTO:			Fecha presente formato:		28/10/2025
RESIDENTE DE OBRA:	ANGELICA MARIA ESTRADA AVELLA		Corte de mantenimiento:		-
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR		Periodo Ejecución corte de mantenimiento:		Del 03/12/25 al 04/04/2026

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		**CFP-848 INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS ARTURO SEDE A**
CONSECUTIVO NECESIDAD :		
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:		**BAÑOS/ZONA EXTERIOR/MURO EXTERIOR**

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR PARCIAL POR EJECUTAR	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	57,00	$ 4.093,00	$ 233.301,00	0,00	$ -	57,00	$ 233.301,00	
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	3,15	$ 30.066,00	$ 94.707,90	3,15	$ 94.707,90	0,00	$ -	
	1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	24,70	$ 2.402,00	$ 59.329,40	24,70	$ 59.329,40	0,00	$ -	
	1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	1,03	$ 286.958,00	$ 295.566,74	1,03	$ 295.566,74	0,00	$ -	
	1.2.2	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	0,588	$ 244.462,00	$ 143.743,66	0,00	$ -	0,59	$ 143.743,66	
	1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	8	$ 113.245,00	$ 905.960,00	0,00	$ -	8,00	$ 905.960,00	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	29,73	$ 31.500,00	$ 936.495,00	29,73	$ 936.495,00	0,00	$ -	
	1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,14	$ 21.553,00	$ 153.888,42	7,14	$ 153.888,42	0,00	$ -	
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	53,05	$ 10.995,00	$ 583.284,75	53,05	$ 583.284,75	0,00	$ -	
	1.2.13	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	53,05	$ 12.224,00	$ 648.483,20	53,05	$ 648.483,20	0,00	$ -	
	1.2.16	DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	39,46	$ 113.213,00	$ 4.467.668,01	0,00	$ -	39,46	$ 4.467.668,01	
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	37,71	$ 32.061,00	$ 1.209.020,31	30,51	$ 978.181,11	7,20	$ 230.839,20	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	14	$ 26.367,00	$ 369.138,00	14,00	$ 369.138,00	0,00	$ -	
	1.2.22	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	4	$ 161.707,00	$ 646.828,00	4,00	$ 646.828,00	0,00	$ -	
	1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	35,22	$ 35.518,00	$ 1.250.943,96	0,00	$ -	35,22	$ 1.250.943,96	
	1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	31,49	$ 31.476,00	$ 991.179,24	31,49	$ 991.179,24	0,00	$ -	
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4	$ 7.219,00	$ 28.876,00	4,00	$ 28.876,00	0,00	$ -	
	1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	20	$ 4.244,00	$ 84.880,00	0,00	$ -	20,00	$ 84.880,00	
	1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	65	$ 8.659,00	$ 562.835,00	17,60	$ 152.398,40	47,40	$ 410.436,60	
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	8	$ 14.178,00	$ 113.424,00	8,00	$ 113.424,00	0,00	$ -	
	1.2.43	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.15 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	4	$ 45.204,00	$ 180.816,00	4,00	$ 180.816,00	0,00	$ -	
	1.2.48	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,86	$ 30.684,00	$ 302.544,24	9,86	$ 302.544,24	0,00	$ -	
	1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	32,93	$ 18.061,00	$ 594.748,73	32,93	$ 594.748,73	0,00	$ -	
	1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	20	$ 16.333,00	$ 326.660,00	0,00	$ -	20,00	$ 326.660,00	

2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,43	$ 96.108,00	$ 41.326,44	0,43	$ 41.326,44	0,00	$ -	
	2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	0,43	$ 1.069.032,00	$ 459.683,76	0,43	$ 460.351,91	0,00	-$ 668,15	
	2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	110,6	$ 101.433,00	$ 11.218.489,80	0,00	$ -	110,60	$ 11.218.489,80	
	2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	5,7	$ 57.073,00	$ 325.316,10	3,25	$ 185.487,25	2,45	$ 139.828,85	
	2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11,6	$ 160.361,00	$ 1.860.187,60	0,00	$ -	11,60	$ 1.860.187,60	
	2.2.15	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI DE 15 CM SOBRE LAMINA COLABORANTE 2"	M2	11,6	$ 241.182,00	$ 2.797.711,20	0,00	$ -	11,60	$ 2.797.711,20	
	2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	822,31	$ 7.012,00	$ 5.766.037,72	5,92	$ 41.544,70	816,39	$ 5.724.493,02	
	2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM. DE 0.15 X 0.15 M	KG	48,49	$ 7.421,00	$ 359.829,45	24,24	$ 179.885,04	24,25	$ 179.944,41	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
	3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	116,00	$ 141.229,00	$ 16.382.564,00	58,00	$ 8.191.282,00	58,00	$ 8.191.282,00	
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
	4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	32,93	$ 25.481,00	$ 839.089,33	32,93	$ 839.089,33	0,00	$ -	
	4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	116,40	$ 19.470,00	$ 2.266.308,00	0,00	$ -	116,40	$ 2.266.308,00	
	4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1"	UN	63,00	$ 9.479,00	$ 597.177,00	0,00	$ -	63,00	$ 597.177,00	
	4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7,00	$ 61.400,00	$ 429.800,00	7,00	$ 429.800,00	0,00	$ -	
	4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	9,00	$ 61.400,00	$ 552.600,00	9,00	$ 552.600,00	0,00	$ -	
	4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	2,00	$ 66.686,00	$ 133.372,00	2,00	$ 133.372,00	0,00	$ -	
	4.6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 1"	UN	1,00	$ 200.497,00	$ 200.497,00	0,00	$ -	1,00	$ 200.497,00	
	4.6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"	UN	1,00	$ 206.989,00	$ 206.989,00	0,00	$ -	1,00	$ 206.989,00	
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	120,00	$ 5.814,00	$ 697.680,00	0,00	$ -	120,00	$ 697.680,00	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACION.	UN	2,00	$ 122.646,00	$ 245.292,00	2,00	$ 245.292,00	0,00	$ -	
	5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20°A+40°C. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	5,00	$ 62.384,00	$ 311.920,00	5,00	$ 311.920,00	0,00	$ -	

7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	29,72	$ 41.218,00	$ 1.224.998,96	29,72	$ 1.224.998,96	0,00	$ -	
	7.1.4	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2	1,42	$ 39.550,00	$ 56.062,13	1,42	$ 56.062,13	0,00	$ -	
	7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	49,43	$ 26.248,00	$ 1.297.438,64	49,43	$ 1.297.438,64	0,00	$ -	
	7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	80,00	$ 498.089,00	$ 39.847.120,00	80,00	$ 39.847.120,00	0,00	$ -	
	7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	41,08	$ 14.858,00	$ 610.366,64	41,08	$ 610.366,64	0,00	$ -	
	7.2.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	23,09	$ 132.061,00	$ 3.049.288,49	23,09	$ 3.049.288,49	0,00	$ -	
	7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	92,41	$ 94.926,00	$ 8.772.111,66	92,41	$ 8.772.111,66	0,00	$ -	
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HIRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4". RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO. INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA. - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	40,30	$ 761.157,00	$ 30.676.910,57	0,00	$ -	40,30	$ 30.676.910,57	
	9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA SIN MARCO EN LAMINA COLDROLLED USA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELICULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS.	M2	23,31	$ 965.200,00	$ 22.494.468,60	16,04	$ 15.477.464,60	7,27	$ 7.017.004,00	
	9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ANGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACION, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	4,80	$ 1.090.099,00	$ 5.232.475,20	4,80	$ 5.232.475,20	0,00	$ -	
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3,00	$ 746.496,00	$ 2.239.488,00	3,00	$ 2.239.488,00	0,00	$ -	
	10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	9,00	$ 391.028,00	$ 3.519.252,00	9,00	$ 3.519.252,00	0,00	$ -	
	10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2,00	$ 39.750,00	$ 79.500,00	2,00	$ 79.500,00	0,00	$ -	
	10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	3,00	$ 32.443,00	$ 97.329,00	3,00	$ 97.329,00	0,00	$ -	
	10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	13,60	$ 945.896,00	$ 12.864.185,60	13,60	$ 12.864.185,60	0,00	$ -	
11	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	5,98	$ 956.124,00	$ 5.717.621,52	5,98	$ 5.717.621,52	0,00	$ -	
	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2,16	$ 1.033.647,00	$ 2.232.677,52	2,16	$ 2.232.677,52	0,00	$ -	
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	42,58	$ 34.979,00	$ 1.489.405,82	42,58	$ 1.489.405,82	0,00	$ -	
	12.1.8	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	49,61	$ 36.386,00	$ 1.805.109,46	49,61	$ 1.805.109,46	0,00	$ -	
	12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	105,00	$ 23.852,00	$ 2.504.460,00	0,00	$ -	105,00	$ 2.504.460,00	
	12.1.12	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	29,37	$ 12.568,00	$ 369.122,16	29,37	$ 369.122,16	0,00	$ -	
	12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	32,94	$ 26.828,00	$ 883.714,32	32,94	$ 883.714,32	0,00	$ -	
	12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20,00	$ 8.860,00	$ 177.200,00	0,00	$ -	20,00	$ 177.200,00	

13	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	31,06	$ 125.971,00	$ 3.912.659,26	31,06	$ 3.912.659,26	0,00	$ -	
14	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	6,13	$ 128.780,00	$ 788.777,50	0,00	$ -	6,13	$ 788.777,50	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	15,81	$ 102.700,00	$ 1.623.687,00	0,00	$ -	15,81	$ 1.623.687,00	
	16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACION, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	51,74	$ 129.084,00	$ 6.678.806,16	0,00	$ -	51,74	$ 6.678.806,16	
	16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	51,74	$ 240.910,00	$ 12.464.683,40	0,00	$ -	51,74	$ 12.464.683,40	
	16.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 2"x1/8" SOBRE CORREAS PARA FIJACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA	M	27,00	$ 18.402,00	$ 496.854,00	0,00	$ -	27,00	$ 496.854,00	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	144,00	$ 4.508,00	$ 649.152,00	0,00	$ -	144,00	$ 649.152,00	
19	**MANTENIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	19.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON 2 BOMBAS DE 2HP 110/220 T.ANQUE HIDRONEUMATICO POR MEMBRANA DE 200LTS, MARCA PEARL, TABLERO DE CONTROL CON NORMA RETIE (INCLUYE 2 BOMBAS ALTA PRESIÓN CAUDAL 2.32LPS H.MQ 50MT 1 TANQUE HIDROACUMULADOR MEMBRANA 200LTS VERTICAL CON MANOMETRO ,ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN ENTRE BOMBAS Y TANQUE EN HIERRO GALVANIZADO (HG), 1 FLAUTA DE DESCARGA EN 3" INCLUYE CODA DE DESCARGA 3 A 2, 2 REGISTROS EN BRONCE TIPO COMPUERTA, 2 VÁLVULAS CHEQUE HIDRONEUMATICO EN BRONCE, 1 TABLERO DE CONTROL EN CORE METÁLICO CON NORMA RETIE 2- PRESOSTATOS RANGO 40/60, 1 SENSOR DE NIVEL (FLOTADOR), 1 MANOMETRO EN GLICERINA CON CARATULA DE 2" (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	UN	1,00	$ 18.416.383,00	$ 18.416.383,00	0,00	$ -	1,00	$ 18.416.383,00	
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**										
	NP1	DESMONTE DE ESPEJOS Y/O VIDRIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,84	$ 18.685,00	$ 71.750,40	3,84	$ 71.750,40	0,00	$ -	
	NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA, CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UND	7,00	$ 1.165.807,00	$ 8.160.649,00	7,00	$ 8.160.649,00	0,00	$ -	
					VALOR TOTAL + AIU	**$ 261.379.899,96**		**$ 137.751.630,17**		**$ 123.628.269,79**	

Código: 1LF-FR-0208 Fecha: 20/12/2024	OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	BOGOTÁ
Versión: 1	RECEPCIÓN DETALLADA PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

CONTRATO:	SED-LP-OP-DCCEE-012-2025	**OBJETO**	OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA		
UNIDAD ORDENADOR DEL GASTO:	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		Valor total del Contrato (SIGLA UNIDAD DEL RUBRO):	$	2.218.080.668,00
			Fecha de Acta Inicio:		14/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORAL INGENIERIA		Valor Adición:	$	-
SUPERVISOR TÉCNICO:			Valor total presente Formato:	$	-
COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACIÓN DEL GASTO:			Fecha presente formato:		28/10/2025
RESIDENTE DE OBRA:	ANGELICA MARIA ESTRADA AVELLA		Fecha de mantenimiento:		
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR		Periodo Ejecución corte de mantenimiento:		Del 03/12/25 al 04/04/2026

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	**CPF 601 - CARLOS ARTURO TORRES SEDE B**
CONSECUTIVO NECESIDAD :	
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	**CANCHA/AULAS**

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR PARCIAL POR EJECUTAR	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar casos de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 - ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	21,00	$ 30.086,00	$ 631.386,00	21,00	$ 631.386,00	0,00	$ -	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	49,14	$ 31.500,00	$ 1.547.910,00	49,14	$ 1.547.910,00	0,00	$ -	
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	88,35	$ 10.995,00	$ 971.408,25	88,35	$ 971.408,25	0,00	$ -	
	1.2.14	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	19,32	$ 155.716,00	$ 3.008.433,12	19,32	$ 3.008.433,12	0,00	$ -	
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	8,23	$ 32.061,00	$ 263.862,03	2,04	$ 65.404,44	6,19	$ 198.457,59	
	1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,39	$ 28.405,00	$ 153.102,95	5,39	$ 153.102,95	0,00	$ -	
	1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	133,62	$ 35.518,00	$ 4.745.915,16	133,62	$ 4.745.915,16	0,00	$ -	
	1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,6	$ 31.476,00	$ 1.277.925,60	40,60	$ 1.277.925,60	0,00	$ -	
	1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	19	$ 11.586,00	$ 219.754,00	19,00	$ 219.754,00	0,00	$ -	
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	34	$ 7.219,00	$ 245.446,00	34,00	$ 245.446,00	0,00	$ -	
	1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	39	$ 4.244,00	$ 165.516,00	39,00	$ 165.516,00	0,00	$ -	
	1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	76,91	$ 16.333,00	$ 1.256.171,03	76,91	$ 1.256.171,03	0,00	$ -	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIEXOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	1,25	$ 64.356,00	$ 80.445,00	1,25	$ 80.445,00	0,00	$ -	
	2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	49,3	$ 632.023,00	$ 31.158.733,90	49,30	$ 31.158.733,90	0,00	$ -	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	2,13	$ 141.229,00	$ 300.817,77	2,13	$ 300.817,77	0,00	$ -	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	7	$ 122.646,00	$ 858.522,00	7,00	$ 858.522,00	0,00	$ -	
	5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3	$ 163.229,00	$ 489.687,00	3,00	$ 489.687,00	0,00	$ -	
	5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2	$ 147.178,00	$ 294.356,00	2,00	$ 294.356,00	0,00	$ -	
	5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	9	$ 204.593,00	$ 1.841.337,00	9,00	$ 1.841.337,00	0,00	$ -	
	5.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	78,4	$ 15.899,00	$ 1.246.481,60	78,40	$ 1.246.481,60	0,00	$ -	
	5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25	$ 174.276,00	$ 4.356.900,00	25,00	$ 4.356.900,00	0,00	$ -	
	5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	33	$ 241.381,00	$ 7.965.573,00	33,00	$ 7.965.573,00	0,00	$ -	

7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
	7.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN GRAVILLA LAVADA MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M2	1,68	$ 120.329,00	$ 202.152,72	1,68	$ 202.152,72	0,00	$ -
	7.2.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	241,50	$ 74.985,00	$ 18.108.877,50	0,00	$ -	241,50	$ 18.108.877,50
	7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DET.ALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	219,00	$ 19.187,00	$ 4.201.953,00	0,00	$ -	219,00	$ 4.201.953,00
	7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	42,98	$ 121.988,00	$ 5.243.044,24	42,98	$ 5.243.044,24	0,00	$ -
	7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	76,91	$ 25.380,00	$ 1.951.975,80	76,91	$ 1.951.975,80	0,00	$ -
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
	9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	8,23	$ 738.943,00	$ 6.081.500,89	0,00	$ -	8,23	$ 6.081.500,89
	9.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 3+3 MM INCOLORO Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS T DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	5,39	$ 560.257,00	$ 3.019.785,23	5,39	$ 3.019.785,23	0,00	$ -
	9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	5,63	$ 66.398,00	$ 373.820,74	5,63	$ 373.820,74	0,00	$ -
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
	12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	202,78	$ 34.979,00	$ 7.093.041,62	202,78	$ 7.093.041,62	0,00	$ -
	12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	96,38	$ 39.822,00	$ 3.838.044,36	96,38	$ 3.838.044,36	0,00	$ -
	12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	72,11	$ 12.106,00	$ 872.963,66	72,11	$ 872.963,66	0,00	$ -
	12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	54,74	$ 23.852,00	$ 1.305.658,48	54,74	$ 1.305.658,48	0,00	$ -
	12.1.13	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	4,80	$ 7.804,00	$ 37.459,20	4,80	$ 37.459,20	0,00	$ -
	12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	4,80	$ 16.631,00	$ 79.828,80	4,80	$ 79.828,80	0,00	$ -
	12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	121,62	$ 28.786,00	$ 3.500.953,32	121,62	$ 3.500.953,32	0,00	$ -
	12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	73,00	$ 8.860,00	$ 646.780,00	73,00	$ 646.780,00	0,00	$ -
13	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
	13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	129,74	$ 125.971,00	$ 16.343.477,54	129,74	$ 16.343.477,54	0,00	$ -
14	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
	14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	0,53	$ 128.780,00	$ 67.995,84	0,00	$ -	0,53	$ 67.995,84
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
	16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	79,48	$ 102.700,00	$ 8.162.596,00	79,48	$ 8.162.596,00	0,00	$ -
	16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20,25	$ 68.873,00	$ 1.394.678,25	18,71	$ 1.288.613,83	1,54	$ 106.064,42
	16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	64,00	$ 97.011,00	$ 6.208.704,00	64,00	$ 6.208.704,00	0,00	$ -
	16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	133,62	$ 129.084,00	$ 17.248.204,08	133,62	$ 17.248.204,08	0,00	$ -
	16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTÍA DE 11 KG/M2	M2	71,30	$ 240.910,00	$ 17.176.883,00	71,30	$ 17.176.883,00	0,00	$ -
	16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	19,61	$ 187.010,00	$ 3.667.266,10	7,80	$ 1.458.678,00	11,81	$ 2.208.588,10
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	310,00	$ 4.508,00	$ 1.397.480,00	0,00	$ -	310,00	$ 1.397.480,00
19	**MANTENIMIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
	19.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN MD-10	M3	19,32	$ 1.480.308,00	$ 28.599.550,56	19,32	$ 28.599.550,56	0,00	$ -
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**											
	NP1	DESMONTE DE ESPEJOS Y/O VIDRIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,53	$ 18.685,00	$ 9.865,68	0,53	$ 9.865,68	0,00	$ -
					VALOR TOTAL + AIU	**$ 219.914.224,02**		**$ 187.543.306,68**		**$ 32.370.917,34**

Código: 1LF-FR-0208 Fecha: 20/12/2024	OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
Versión: 1	RECEPCIÓN DETALLADA PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

CONTRATO:	SED-LP-OP-CCCEE-012-2025	**OBJETO**	OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA		
UNIDAD ORDENADOR DEL GASTO:	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA			Valor total del Contrato (SIGLA UNIDAD DEL RUBRO):	$ 2.218.080.668,00
				Fecha de Acta Inicio:	14/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORAL INGENIERIA			Valor Adición:	$ -
SUPERVISOR TÉCNICO:				Valor total anexado formato:	$ -
COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACIÓN DEL GASTO:				Fecha anexante formato:	28/10/2025
RESIDENTE DE OBRA:	ANGELICA MARIA ESTRADA AVELLA			Fecha de mantenimiento:	
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR			Periodo Ejecución corte de mantenimiento:	Del 03/12/25 al 04/04/2026

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		CPF 617 - RUFINO JOSE CUERVO
CONSECUTIVO NECESIDAD :		
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:		PATIOS

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR PARCIAL POR EJECUTAR	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	160,53	$ 3.395,00	$ 544.999,35	160,53	$ 544.999,35	0,00	$ -	
	1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	161,53	$ 79.342,00	$ 12.816.113,26	160,53	$ 12.736.771,26	1,00	$ 79.342,00	
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	3	$ 21.111,00	$ 63.333,00		$ -	3,00	$ 63.333,00	
	1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	161,7	$ 16.333,00	$ 2.641.046,10	161,70	$ 2.641.046,10	0,00	$ -	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	64,21	$ 130.850,00	$ 8.401.878,50	64,21	$ 8.401.878,50	0,00	$ -	
	2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	64,21	$ 174.968,00	$ 11.234.695,28	64,21	$ 11.234.695,28	0,00	$ -	
	2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	1	$ 160.361,00	$ 160.361,00		$ -	1,00	$ 160.361,00	
	2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	431,81	$ 7.421,00	$ 3.204.462,01	431,81	$ 3.204.462,01	0,00	$ -	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	640	$ 9.705,00	$ 6.211.200,00	0,00	$ -	640,00	$ 6.211.200,00	
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	4.7.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1	$ 1.137.300,00	$ 1.137.300,00	1,00	$ 1.137.300,00	0,00	$ -	
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	76,93	$ 498.089,00	$ 38.317.986,77	76,93	$ 38.317.986,77	0,00	$ -	
	7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	288,69	$ 63.550,00	$ 18.346.249,50	288,69	$ 18.346.249,50	0,00	$ -	
	7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	330,22	$ 19.187,00	$ 6.335.931,14	330,22	$ 6.335.931,14	0,00	$ -	
	7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	243,77	$ 25.380,00	$ 6.186.882,60	243,77	$ 6.186.882,60	0,00	$ -	
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	3,82	$ 761.157,00	$ 2.907.619,74	0,00	$ -	3,82	$ 2.907.619,74	
	9.3.6	PUERTA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	3,60	$ 945.575,00	$ 3.404.070,00	0,00	$ -	3,60	$ 3.404.070,00	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	4,22	$ 68.873,00	$ 290.644,06	0,00	$ -	4,22	$ 290.644,06	
	16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	28,35	$ 319.199,00	$ 9.049.291,65	0,00	$ -	28,35	$ 9.049.291,65	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	288,69	$ 4.508,00	$ 1.301.414,52	0,00	$ -	288,69	$ 1.301.414,52	
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**										
	NP 004	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTENEDOR DE BASURA PLASTICO DE RUEDAS CON TAPA CON CAPACIDAD 1100 L (INCLUYE MONTAJE EN SITIO DE TRABAJO)	UND	2,00	$ 3.311.787,00	$ 6.623.574,00	0,00	$ -	2,00	$ 6.623.574,00	
					VALOR TOTAL + AIU	**$ 139.179.052,48**		**$ 109.088.202,51**		**$ 30.090.849,97**	

Código: 3-F-FR-0208 Fecha: 20/12/2016	OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN ATENDER LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
Versión: 1	RECEPCIÓN DETALLADA PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

CONTRATO:	SED-LP-OP-DCCEE-013-2025	OBJETO	OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE		
LUGAR:	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ		Valor total del contrato Inicial antes de Adición:	$	2.358.980.644,00
ORDENADOR DEL GASTO:			Fecha de acta inicio:		13/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESTRUCTURAS INGENIERÍA		Valor Adición:	$	-
Subdirectora Técnica			Valor total antes de Terrazo:	$	-
COORDINADOR UNIDAD (CON SIN) DELEGACIÓN DEL GASTO:			Fecha antes de Terrazo:		29/10/2025
RESIDENTE DE OBRA:	ANGELICA MARIA ESTRADA AGELLA		Corte de mantenimiento:		
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR		Periodo ejecución corte de mantenimiento:		Del 03/11/25 al 04/04/2026
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		CPF 612 - RAFAEL URIBE URIBE - SEDE B			
CONSECUTIVO NECESIDAD :					
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:		PATIO/CUBIERTA/FACHADA			

N°	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR PARCIAL POR EJECUTAR	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M) NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	53,60	$ 30.066,00	$ 1.611.537,60	53,60	$ 1.611.537,60	0,00	$ -	
	1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	436,08	$ 3.995,00	$ 1.680.491,60	68,96	$ 302.009,20	347,12	$ 1.178.472,40	
	1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	0,18	$ 286.958,00	$ 51.652,44	0,18	$ 51.652,44	0,00	$ -	
	1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	86,75	$ 79.342,00	$ 6.882.918,50	86,75	$ 6.882.918,50	0,00	$ -	
	1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MEZZANA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	66,6	$ 72.193,00	$ 4.808.053,80	66,60	$ 4.808.053,80	0,00	$ -	
	1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	15,01	$ 21.553,00	$ 323.543,53	15,01	$ 323.543,53	0,00	$ -	
	1.2.14	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	30,82	$ 155.716,00	$ 4.799.167,12	30,82	$ 4.799.167,12	0,00	$ -	
	1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS ANCLAJES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	119,14	$ 35.518,00	$ 4.232.324,68	119,14	$ 4.232.324,68	0,00	$ -	
	1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 MDE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	3	$ 11.566,00	$ 34.698,00	3,00	$ 34.698,00	0,00	$ -	
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8	$ 7.219,00	$ 57.752,00	8,00	$ 57.752,00	0,00	$ -	
	1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	96	$ 4.244,00	$ 407.424,00	96,00	$ 407.424,00	0,00	$ -	
	1.2.34	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2	$ 385.556,00	$ 771.112,00	2,00	$ 771.112,00	0,00	$ -	
	1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	23,09	$ 18.852,00	$ 435.292,68	23,09	$ 435.292,68	0,00	$ -	
	1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MÁRMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	61,59	$ 21.852,00	$ 1.345.864,68	61,59	$ 1.345.864,68	0,00	$ -	
	1.2.40	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	8,3038	$ 30.884,00	$ 257.249,52	14	$ 429.576,00	-5,62	$ 172.327,48	
	1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON FULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	43,12	$ 16.333,00	$ 704.279,96	43,12	$ 704.279,96	0,00	$ -	
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	8,91	$ 96.108,00	$ 856.322,28	8,91	$ 856.322,28	0,00	$ -	
	2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	4,92	$ 130.850,00	$ 643.782,00	4,92	$ 643.782,00	0,00	$ -	
	2.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	250,38	$ 83.544,00	$ 20.917.749,72	250,38	$ 20.917.749,72	0,00	$ -	
	2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	4,92	$ 22.675,00	$ 111.561,00	4,92	$ 111.561,00	0,00	$ -	
	2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	2,33	$ 174.968,00	$ 407.675,44	2,33	$ 407.675,44	0,00	$ -	
	2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	106,19	$ 183.945,00	$ 19.533.119,55	106,19	$ 19.533.119,55	0,00	$ -	
	2.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAZÓN DE PIEDRA	M3	121,46	$ 173.913,00	$ 21.123.472,98	121,46	$ 21.123.472,98	0,00	$ -	
	2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	22,96	$ 101.433,00	$ 2.328.901,68	22,96	$ 2.328.901,68	0,00	$ -	
	2.2.10	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INCLUYE REFUERZO).	M2	5,38	$ 202.666,00	$ 1.090.460,66	0,00	$ -	5,38	$ 1.090.460,66	
	2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	31,2	$ 111.395,00	$ 3.475.524,00	0,00	$ -	31,20	$ 3.475.524,00	
	2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	143,91	$ 160.361,00	$ 22.917.190,51	0,00	$ -	143,91	$ 22.917.190,51	
	2.3.9	MEZCACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	22,96	$ 28.402,00	$ 652.109,92	22,96	$ 652.109,92	0,00	$ -	
	2.3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO (3S X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	21,56	$ 334.867,00	$ 7.221.672,92	21,56	$ 7.221.672,92	0,00	$ -	
	2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	1858,73	$ 7.012,00	$ 13.734.614,76	21,56	$ 151.178,72	1837,17	$ 13.583.436,04	
	2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	1460	$ 7.421,00	$ 10.836.240,00	50,75	$ 376.615,75	1386,25	$ 10.309.624,25	

4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M	60	$ 5.814,00	$ 348.840,00	60,00	$ 348.840,00	0,00	$ -	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
	5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°2.5 (F) + N°2.5 (N) + N°2.5 (T) AWG THW Y TUBERIA EMT Ø3/4" HASTA 6M, INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2	$ 163.229,00	$ 326.458,00	2,00	$ 326.458,00	0,00	$ -	
	5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERIA EMT Ø3/4" HASTA 6M, INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	$ 204.583,00	$ 204.583,00	1,00	$ 204.583,00	0,00	$ -	
	5.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1-1/2" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERIA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	96	$ 20.727,00	$ 1.990.752,00	96,00	$ 1.990.752,00	0,00	$ -	
	5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	27,1	$ 22.533,00	$ 610.644,30	27,10	$ 610.644,30	0,00	$ -	
	5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THW Y TUBERIA EMT Ø3/4" HASTA 6M, INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8	$ 174.276,00	$ 1.394.208,00	8,00	$ 1.394.208,00	0,00	$ -	
	5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMÉTICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	UN	8	$ 241.381,00	$ 1.931.048,00	8,00	$ 1.931.048,00	0,00	$ -	
	5.1.48	ACOMETIDA TRIFÁSICA EN Ø60 + 1H10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE. INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN	M	96	$ 60.364,00	$ 5.794.944,00	96,00	$ 5.794.944,00	0,00	$ -	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
	7.1.8	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, TORVALETAS, ACABADO CON ALLANADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) E= 10 CM	M2	255,99	$ 142.899,00	$ 36.586.435,11	0,00	$ -	255,99	$ 36.586.435,11	
	7.1.9	JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO: ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	M	350,95	$ 35.906,00	$ 12.601.912,80	0,00	$ -	350,95	$ 12.601.912,80	
	7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	107,00	$ 498.089,00	$ 53.295.523,00	0,00	$ -	107,00	$ 53.295.523,00	
	7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	350,95	$ 25.360,00	$ 8.907.111,00	0,00	$ -	350,95	$ 8.907.111,00	
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
	9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA SIN MARCO EN LAMINA COLDROLLED USAQ CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON NUCLEO EN ESTERO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TECI LLAVE EXTERIOR Y MANIPOLA INTERNA, DOBLE NIMBA INTERIOR Y EXTERIOR Y MELLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELICULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	8,38	$ 966.200,00	$ 8.092.043,76	8,38	$ 8.092.043,76	0,00	$ -	
	9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERIA	M2	10,78	$ 66.366,00	$ 715.770,44	10,78	$ 715.770,44	0,00	$ -	
12	PARETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
	12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	181,76	$ 34.979,00	$ 6.357.763,04	181,76	$ 6.357.763,04	0,00	$ -	
	12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	73,81	$ 38.822,00	$ 2.939.261,82	73,81	$ 2.939.261,82	0,00	$ -	
	12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0.60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	70,68	$ 23.852,00	$ 1.690.629,76	34,71	$ 827.902,92	36,17	$ 862.726,84	
	12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	188,52	$ 20.675,00	$ 3.897.605,00	188,52	$ 3.897.605,00	0,00	$ -	
	12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	33,78	$ 28.766,00	$ 972.391,08	33,78	$ 972.391,08	0,00	$ -	
	12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	34,71	$ 20.749,00	$ 720.197,79	34,71	$ 720.197,79	0,00	$ -	
	12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1.0 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	33,19	$ 8.960,00	$ 294.063,40	33,19	$ 294.063,40	0,00	$ -	
16	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
	16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	119,16	$ 129.084,00	$ 15.381.649,44	119,16	$ 15.381.649,44	0,00	$ -	
	16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTÍA DE 11 KG/M2	M2	85,15	$ 240.810,00	$ 20.613.496,50	85,15	$ 20.613.496,50	0,00	$ -	
18	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	408,64	$ 4.508,00	$ 1.841.247,52	0,00	$ -	408,64	$ 1.841.247,52	
					VALOR TOTAL + AIU	$ 343.268.305,31		$ 174.835.983,84		$ 168.457.304,47	

Código: ILF-FR-5306 Fecha: 22/12/2024	OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
Versión: 1	RECEPCIÓN DETALLADA PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

CONTRATO:	SED-LP-OP-DCCEE-010-2026	OBJETO	OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE		
UNIDAD EJECUTORA:	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA			Valor total del Contrato (SEGÚN UNIDAD DEL RUBRO):	$ 2.218.080.608,00
ORDENADOR DEL GASTO:				Fecha de Acta Inicio:	14/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO LORAL INGENIERIA			Valor Adición:	$ -
SUPERVISOR TÉCNICO:				Valor total presente formato:	$ -
COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACIÓN DEL GASTO:				Fecha presente formato:	29/10/2026
RESPONSABLE DE OBRA:	ANGELICA MARIA ESTRADA AVELLA			Corte de mantenimiento:	
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR			Periodo Ejecución corte de mantenimiento:	Del 03/12/25 al 04/04/2026
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS		CPF 816 - FRANCISCO MIRANDA SEDE A			
CONSECUTIVO NECESIDAD :					
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:		BAÑOS PROFESORES/ENFERMERIA/SALON			

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR PARCIAL POR EJECUTAR	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (Incluye paales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	23,20	$ 30.066,00	$ 697.531,20	23,20	$ 697.531,20	0,00	$ -	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	106,23	$ 31.500,00	$ 3.346.245,00	106,23	$ 3.346.245,00	0,00	$ -	
	1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	63,20	$ 21.553,00	$ 1.362.149,60	63,20	$ 1.362.149,60	0,00	$ -	
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36,52	$ 12.224,00	$ 446.420,48	36,52	$ 446.420,48	0,00	$ -	
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	14,59	$ 32.061,00	$ 467.769,99	14,59	$ 467.769,99	0,00	$ -	
	1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,57	$ 28.405,00	$ 215.035,85	7,57	$ 215.035,85	0,00	$ -	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	6	$ 26.367,00	$ 158.202,00	6,00	$ 158.202,00	0,00	$ -	
	1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	2,5	$ 20.015,00	$ 50.037,50	2,50	$ 50.037,50	0,00	$ -	
	1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	32,48	$ 35.518,00	$ 1.153.624,64	32,48	$ 1.153.624,64	0,00	$ -	
	1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	73,75	$ 31.476,00	$ 2.321.355,00	73,75	$ 2.321.355,00	0,00	$ -	
	1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	51,25	$ 24.868,00	$ 1.274.485,00	51,25	$ 1.274.485,00	0,00	$ -	
	1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	13	$ 11.566,00	$ 150.358,00	13,00	$ 150.358,00	0,00	$ -	
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	13	$ 7.219,00	$ 93.847,00	13,00	$ 93.847,00	0,00	$ -	
	1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	33	$ 4.244,00	$ 140.052,00	0,00	$ -	33,00	$ 140.052,00	
	1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	9	$ 8.659,00	$ 77.931,00	9,00	$ 77.931,00	0,00	$ -	
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	4	$ 14.178,00	$ 56.712,00	4,00	$ 56.712,00	0,00	$ -	
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	3	$ 21.111,00	$ 63.333,00	3,00	$ 63.333,00	0,00	$ -	
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
	2.2.4	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	21,91	$ 55.590,00	$ 1.217.976,90	21,91	$ 1.217.976,90	0,00	$ -	
	2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	24,26	$ 101.433,00	$ 2.460.764,58	24,26	$ 2.460.764,58	0,00	$ -	
	2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	16,82	$ 57.073,00	$ 959.967,86	16,82	$ 959.967,86	0,00	$ -	
	2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	106,23	$ 111.395,00	$ 11.833.490,85	106,23	$ 11.833.490,85	0,00	$ -	
	2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	281,89	$ 7.012,00	$ 1.976.612,68	281,89	$ 1.976.612,68	0,00	$ -	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
	3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRADO No. 4	M2	51,62	$ 63.196,00	$ 3.262.177,52	51,62	$ 3.262.177,52	0,00	$ -	
	3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	4,9	$ 141.229,00	$ 692.032,10	4,90	$ 692.032,10	0,00	$ -	
	3.1.9	LAVADO CON HIDROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	28,44	$ 9.368,00	$ 267.279,12	0,00	$ -	28,44	$ 267.279,12	
	3.2.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	M	1,2	$ 40.794,00	$ 48.952,80	1,20	$ 48.952,80	0,00	$ -	

4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC'S 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	12,39	$ 88.516,00	$ 1.096.713,24	12,39	$ 1.096.713,24	0,00	$ -	
	4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC'S 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	4,26	$ 49.410,00	$ 210.486,60	4,26	$ 210.486,60	0,00	$ -	
	4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	4,00	$ 135.539,00	$ 542.156,00	0,00	$ -	4,00	$ 542.156,00	
	4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	12,75	$ 14.486,00	$ 184.696,50	12,75	$ 184.696,50	0,00	$ -	
	4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	10,00	$ 4.830,00	$ 48.300,00	10,00	$ 48.300,00	0,00	$ -	
	4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	5,00	$ 175.735,00	$ 878.675,00	5,00	$ 878.675,00	0,00	$ -	
	4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	7,00	$ 94.029,00	$ 658.203,00	7,00	$ 658.203,00	0,00	$ -	
	4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	2,00	$ 66.686,00	$ 133.372,00	2,00	$ 133.372,00	0,00	$ -	
	4.7.3	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00	$ 846.541,00	$ 846.541,00	1,00	$ 846.541,00	0,00	$ -	
	4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	10,00	$ 73.533,00	$ 735.330,00	0,00	$ -	10,00	$ 735.330,00	
	4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	1,00	$ 176.353,00	$ 176.353,00	0,00	$ -	1,00	$ 176.353,00	
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	30,00	$ 5.814,00	$ 174.420,00	0,00	$ -	30,00	$ 174.420,00	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THWN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	9,00	$ 122.646,00	$ 1.103.814,00	0,00	$ -	9,00	$ 1.103.814,00	
	5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERIA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 195.138,00	$ 390.276,00	0,00	$ -	2,00	$ 390.276,00	
	5.1.7	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERIA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 245.203,00	$ 735.609,00	0,00	$ -	3,00	$ 735.609,00	
	5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	$ 598.211,00	$ 598.211,00	0,00	$ -	1,00	$ 598.211,00	
	5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1-1/2" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	4,00	$ 23.281,00	$ 93.124,00	0,00	$ -	4,00	$ 93.124,00	
	5.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	105,00	$ 15.899,00	$ 1.669.395,00	0,00	$ -	105,00	$ 1.669.395,00	
	5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	27,00	$ 22.533,00	$ 608.391,00	0,00	$ -	27,00	$ 608.391,00	
	5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	180,00	$ 16.790,00	$ 3.022.200,00	0,00	$ -	180,00	$ 3.022.200,00	
	5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THWN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	12,00	$ 174.276,00	$ 2.091.312,00	0,00	$ -	12,00	$ 2.091.312,00	
	5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	12,00	$ 62.384,00	$ 748.608,00	0,00	$ -	12,00	$ 748.608,00	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	102,28	$ 43.769,00	$ 4.476.693,32	0,00	$ -	102,28	$ 4.476.693,32	
	7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	25,99	$ 26.248,00	$ 682.185,52	25,99	$ 682.185,52	0,00	$ -	
	7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	40,00	$ 498.089,00	$ 19.923.560,00	0,00	$ -	40,00	$ 19.923.560,00	
	7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	8,60	$ 14.858,00	$ 127.778,80	8,60	$ 127.778,80	0,00	$ -	
	7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	824,00	$ 63.550,00	$ 52.365.200,00	0,00	$ -	824,00	$ 52.365.200,00	
	7.2.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	101,22	$ 132.061,00	$ 13.367.214,42	68,74	$ 9.077.873,14	32,48	$ 4.289.341,28	
	7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A MAVI-0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	163,00	$ 19.187,00	$ 3.127.481,00	0,00	$ -	163,00	$ 3.127.481,00	
	7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	57,98	$ 94.926,00	$ 5.503.809,48	57,98	$ 5.503.809,48	0,00	$ -	
8	MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
	8.1.5	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2	47,25	$ 166.287,00	$ 7.857.060,75	0,00	$ -	47,25	$ 7.857.060,75	
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
	9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELICULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	2,52	$ 801.420,00	$ 2.019.578,40	0,00	$ -	2,52	$ 2.019.578,40	
	9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	6,00	$ 464.504,00	$ 2.787.024,00	0,00	$ -	6,00	$ 2.787.024,00	
10	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
	10.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)	UN	3,00	$ 762.937,00	$ 2.288.796,00	0,00	$ -	3,00	$ 2.288.796,00	
	10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	3,00	$ 391.028,00	$ 1.173.084,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.173.084,00	
	10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2,00	$ 39.750,00	$ 79.500,00	0,00	$ -	2,00	$ 79.500,00	
	10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	4,00	$ 32.443,00	$ 129.772,00	0,00	$ -	4,00	$ 129.772,00	

11	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	23,25	$ 956.124,60	$ 22.229.883,00	0,00	$ -	23,25	$ 22.229.883,00	
12	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
	12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	89,34	$ 34.979,00	$ 3.125.023,86	89,34	$ 3.125.023,86	0,00	$ -	
	12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	68,97	$ 12.106,00	$ 834.950,82	68,97	$ 834.950,82	0,00	$ -	
	12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A .60 CM	M	30,95	$ 9.833,00	$ 304.269,45	0,00	$ -	30,95	$ 304.269,45	
	12.1.8	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	36,95	$ 36.396,00	$ 1.344.462,70	0,00	$ -	36,95	$ 1.344.462,70	
	12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	33,63	$ 23.852,00	$ 802.142,76	33,63	$ 802.142,76	0,00	$ -	
	12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	260,17	$ 20.875,00	$ 5.431.048,75	0,00	$ -	260,17	$ 5.431.048,75	
	12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	36,95	$ 16.631,00	$ 614.515,45	0,00	$ -	36,95	$ 614.515,45	
13	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
	13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LAMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	68,24	$ 125.971,00	$ 8.596.261,04	16,36	$ 2.060.685,56	51,88	$ 6.535.375,48	
14	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
	14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	1,50	$ 128.780,00	$ 193.170,00	0,00	$ -	1,50	$ 193.170,00	
16	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
	16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	13,40	$ 102.700,00	$ 1.376.180,00	0,00	$ -	13,40	$ 1.376.180,00	
	16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2,50	$ 68.873,00	$ 172.182,50	0,00	$ -	2,50	$ 172.182,50	
	16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	32,48	$ 129.094,00	$ 4.192.648,32	0,00	$ -	32,48	$ 4.192.648,32	
	16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	32,48	$ 240.910,00	$ 7.824.756,80	0,00	$ -	32,48	$ 7.824.756,80	
	16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	12,00	$ 40.429,00	$ 485.148,00	0,00	$ -	12,00	$ 485.148,00	
	16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	4,30	$ 187.010,00	$ 804.143,00	0,00	$ -	4,30	$ 804.143,00	
18	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	145,50	$ 4.508,00	$ 655.914,00	0,00	$ -	145,50	$ 655.914,00	
NP	ITEMS NO PREVISTOS										
	NP1	DESMONTE DE ESPEJOS Y/O VIDRIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,50	$ 18.685,00	$ 46.712,50	0,00	$ -	2,50	$ 46.712,50	
	NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UND	5,00	$ 1.165.807,00	$ 5.829.035,00	0,00	$ -	5,00	$ 5.829.035,00	
					VALOR TOTAL + AIU	$ 232.311.671,65		$ 60.658.629,65		$ 171.653.040,83	

Código: 1LF-FR-0208 **Fecha: 20/12/2024**	**OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.**
Versión: 1	**RECEPCIÓN DETALLADA PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.**

CONTRATO:	SED-LP-OP-DCCEE-012-2025	**OBJETO**	**OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA**
UNIDAD ORDENADOR DEL GASTO:	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	Valor total del Contrato (SIGLA UNIDAD DEL RUBRO):	$ 2.218.080.668,00
		Fecha de Aria Inicio:	14/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORAL INGENIERIA	Valor Adición:	$ -
SUPERVISOR TÉCNICO:		Valor total anexente formato:	#¡REF!
COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACIÓN DEL GASTO:		Fecha anexente formato:	28/10/2025
RESIDENTE DE OBRA:	ANGELICA MARIA ESTRADA AVELLA	Corte de mantenimiento:	
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR	Periodo Ejecución corte de mantenimiento:	Del 03/12/25 al 04/04/2026
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		**CPF 816 - FLORESTA SUR**	
CONSECUTIVO NECESIDAD :			
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:		**CARCAMOS**	

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR PARCIAL POR EJECUTAR	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye paneles de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 - ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	126,00	$ 30.066,00	$ 3.607.920,00	0,00	0,00	120,00	$ 3.607.920,00	
	1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	21,53	$ 28.405,00	$ 611.559,65	0,00	0,00	21,53	$ 611.559,65	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA SIMILAR A LA EXISTENTE,CONTRAMARCO EN PLATINA DE 2'1/2 X 1/4 REJILLA METÁLICA EN PLATINA DE 1.1/2 X 3/16 CON SEPARACIONES DE 3.5 CM ENTRE PLATINAS (SEPARACIONES EN REJILLA EXISTENTE)Y UN REFUERZO EN EL CENTRO X 40.7 M EN ÁNGULO DE 1' X 1/8,PINTURA ANTICORROSIVA ANCHO 45 CM	M	42,7	$ 324.708,67	$ 13.865.060,21	40,30	$ 13.085.759,40	2,40	$ 779.300,81	
	NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA REFORZADA SECCION PARQUEADERO CONTRAMARCO EN PLATINA DE 2.1/2" X 1/4, REJILLA METÁLICA EN ÁNGULO DE 1.1/2' X 1/4 CON UNA SEPARACIÓN DE 3.5CM ENTRE ÁNGULOS,(SEPARACIONES EN REJILLA EXISTENTE),PINTURA ANTICORROSIVA. ANCHO 50CM	M	15	$ 449.730,19	$ 6.745.952,85	0,00	$ -	15,00	$ 6.745.952,85	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	960	$ 9.705,00	$ 9.316.800,00	0,00	$ -	960,00	$ 9.316.800,00	
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	655,00	$ 63.550,00	$ 41.625.250,00	655,00	$ 41.625.250,00	0,00	$ -	
	7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	220,94	$ 19.187,00	$ 4.239.175,78	220,94	$ 4.239.175,78	0,00	$ -	
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", INGENIADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	23,52	$ 761.157,00	$ 17.902.412,64	0,00	0,00	23,52	$ 17.902.412,64	
	9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	21,53	$ 464.504,00	$ 10.000.771,12	0,00	0,00	21,53	$ 10.000.771,12	
	9.3.6	PUERTA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	4,20	$ 945.575,00	$ 3.971.415,00	0,00	0,00	4,20	$ 3.971.415,00	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2.0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	10,47	$ 129.084,00	$ 1.351.509,48	0,00	0,00	10,47	$ 1.351.509,48	
	16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	10,14	$ 240.910,00	$ 2.442.827,40	0,00	0,00	10,14	$ 2.442.827,40	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	655,00	$ 4.508,00	$ 2.952.740,00	0,00	0,00	655,00	$ 2.952.740,00	
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**										
	NP 004	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTENEDOR DE BASURA PLASTICO DE RUEDAS CON TAPA CON CAPACIDAD 1100 L (INCLUYE MONTAJE EN SITIO DE TRABAJO)	UND	2,00	$ 3.311.787,00	$ 6.623.574,00	0,00	$ -	2,00	$ 6.623.574,00	
					VALOR TOTAL + AIU	**$ 125.256.969,13**		**$ 58.950.185,18**		**$ 66.306.782,95**	

Código: 1LF-FR-0208 Fecha: 20/12/2024	OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	BOGOTÁ ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
Versión: 1	RECEPCIÓN DETALLADA PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	

CONTRATO:	SED-LP-OP-OCCEE-012-2025	**OBJETO**	OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		
UNIDAD ORDENADOR DEL GASTO:	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		Valor total del Contrato (SIGLA UNIDAD DEL RUBRO):	$	2.218.080.668,00
			Fecha de Acta Inicio:		14/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORAL INGENIERIA		Valor Adición:	$	-
SUPERVISOR TÉCNICO:			Valor total presente formato:	$	2.218.080.668,00
COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACIÓN DEL GASTO:			Fecha presente formato:		28/10/2025
RESIDENTE DE OBRA:	ANGELICA MARIA ESTRADA AVELLA		Corte de mantenimiento:		
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR		Periodo Ejecución corte de mantenimiento:		Del 03/12/25 al 04/04/2026

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		CPF 609 - JOSE ANTONIO RICAURTE - SAN CARLOS

CONSECUTIVO NECESIDAD :	
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	RED CONTRA INCENDIOS/DILATACION PEGA MURO EN MAMPOSTERIA

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PRESUPUESTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR PARCIAL POR EJECUTAR	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o items extraordinarios, items no previstos, etc.
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 - ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M) NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	150,00	$ 30.066,00	$ 4.509.900,00	0,00	0,00	150,00	$ 4.509.900,00	
	1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8	$ 11.566,00	$ 92.528,00	0,00	0,00	8,00	$ 92.528,00	
	1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	30	$ 4.244,00	$ 127.320,00	0,00	0,00	30,00	$ 127.320,00	
	1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	20	$ 18.061,00	$ 361.220,00	0,00	0,00	20,00	$ 361.220,00	
	1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	70	$ 16.333,00	$ 1.143.310,00	0,00	0,00	70,00	$ 1.143.310,00	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17,53	$ 9.398,00	$ 164.746,94	0,00	0,00	17,53	$ 164.746,94	
	3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	17,53	$ 27.238,00	$ 477.482,14	0,00	0,00	17,53	$ 477.482,14	
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	4.6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 3"	UN	1	$ 894.074,00	$ 894.074,00	0,00	0,00	1,00	$ 894.074,00	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THWN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8,00	$ 122.646,00	$ 981.168,00	0,00	0,00	8,00	$ 981.168,00	
6	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACESORIO RANURADO DE 3"	UN	8,00	$ 134.072,00	$ 1.072.576,00	0,00	0,00	8,00	$ 1.072.576,00	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**										
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	300,00	$ 4.508,00	$ 1.352.400,00	0,00	0,00	300,00	$ 1.352.400,00	
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**										
	NP 006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA PRINCIPAL TIPO CENTRIFUGA ALTA PRESIÓN IMPULSOR CERRADO EN FUNDICIÓN, POTENCIA 30 HP, TENSIÓN 220 VOLTIOS TRIFASICO (CALCULADA PARA OPERACIÓN SIMULTANEA DE DOS GABINETES)	UND	1,00	$ 37.324.920,00	$ 37.324.920,00	0,00	0,00	1,00	$ 37.324.920,00	
	NP 007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA JOCKEY TIPO VERTICAL MULTIMPATADA, IMPULSOR CERRADO, POTENCIA DE 10 HP, TENSION 220 VOLTIO TRIFASICO.	UND	1,00	$ 20.895.349,00	$ 20.895.349,00	0,00	0,00	1,00	$ 20.895.349,00	
	NP 008	SUMINISTRO E INSTLACIÓN VALVULAS DE PIE 3"	UND	1,00	$ 1.299.086,00	$ 1.299.086,00	0,00	0,00	1,00	$ 1.299.086,00	
	NP 009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA 2"	UND	1,00	$ 603.695,00	$ 603.695,00	0,00	0,00	1,00	$ 603.695,00	
	NP 010	Suministro e instalacion Valvula de Compuerta HD 3" Vastago Ascendente Sello Metálico Gaer tch4075	UND	1,00	$ 1.560.469,00	$ 1.560.469,00	0,00	0,00	1,00	$ 1.560.469,00	
	NP 011	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELÉCTRICO CON COFRE METALICO NEMA 4, INCLUYE BREAKER PRINCIPAL, ARRANCADOR ESTRELLA TRIANGULO, 230 VOLTIOS ARRANQUE DIRECTO.	UND	1,00	$ 20.438.942,00	$ 20.438.942,00	0,00	0,00	1,00	$ 20.438.942,00	
	NP 012	SUMINSITRO E INSTALACIÓN TUBERIA 4" SCH 40 RANURADA	ML	95,00	$ 872.101,00	$ 82.849.595,00	0,00	0,00	95,00	$ 82.849.595,00	
	NP 013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA 1 1/2" SCH 40 RANURADA	ML	140,00	$ 296.070,00	$ 41.449.800,00	0,00	0,00	140,00	$ 41.449.800,00	
	NP 014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION VITAULIC DE 4"	UND	20,00	$ 145.952,00	$ 2.919.040,00	0,00	0,00	20,00	$ 2.919.040,00	
	NP 015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION VITAULIC DE 3"	UND	6,00	$ 126.838,00	$ 761.028,00	0,00	0,00	6,00	$ 761.028,00	
	NP 016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION VITAULIC DE 1 1/2"	UND	90,00	$ 96.905,00	$ 8.721.450,00	0,00	0,00	90,00	$ 8.721.450,00	
	NP 017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 1 1/2" RANURADO	UND	70,00	$ 87.355,00	$ 6.114.850,00	0,00	0,00	70,00	$ 6.114.850,00	
	NP 018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMICODO RANURADO DE 1 1/2"	UND	6,00	$ 84.884,00	$ 509.304,00	0,00	0,00	6,00	$ 509.304,00	
	NP 019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 4"	UND	70,00	$ 50.345,00	$ 3.524.150,00	0,00	0,00	70,00	$ 3.524.150,00	
	NP 020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTES TIPO PERA DE 1 1/2"	UND	100,00	$ 44.487,00	$ 4.448.700,00	0,00	0,00	100,00	$ 4.448.700,00	
	NP 021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA EYECTORA DE 0,5 HP 120 V DESCARGA DE 3"	UND	1,00	$ 3.718.776,00	$ 3.718.776,00	0,00	0,00	1,00	$ 3.718.776,00	
					VALOR TOTAL + AIU	**$ 248.315.879,08**		**$ -**		**$ 248.315.879,08**	

ACTIVIDADES PIEDEMONTE


Formula para sombrear fechas de tarea valiadas en formato condicional =Y(H$10>=$D12;H$10<=$E12)
Formula para calcualar dias de avance =(($E12-$D12+1)*$C12)+$D12-1)
Formula para sombrera avance en formato condicional =Y(H$10>=$D12;H$10<=(($E12-$D12+1)*$C12)+$D12-1))
Formula para resaltar dia de hoy en formato condicinal =H$10=HOY()
Cómo Crear un DIAGRAMA DE GANTT Interactivo y Dinámico en Excel

JOSE MARIA

Desplazamiento tiempo

25	27/2/2026
INICIO	2/2/2026

Actividades	RESPONSABLE	PROGRESO%	INICIO	FIN	DIAS
ACTIVIDAD					
BAÑOS					
Instalacion de lavamanos		100%	19/02/26, jue	20/02/26, vie	1
Instalacion griferia lavamanos	DIEGO LUGO	100%	20/02/26, vie	21/02/26, sáb	2
Instalacion Sanitarios	DIEGO LUGO	100%	21/02/26, sáb	21/02/26, sáb	1
ACTIVIDAD					
PINTURA FACHADA					
Pintura costado lateral y posterior	DIEGO LUGO	100%	16/02/26, lun	26/02/26, jue	10
Pintura frontal	DIEGO LUGO	100%	20/02/26, vie	26/02/26, jue	6
Resanes Generales	DIEGO LUGO	100%	19/03/26, jue	31/03/26, mar	12
ACTIVIDAD					
VENTANERIA					
mantenimiento ventanas posteriores	LENIN BERRIO	100%	13/02/26, vie	21/02/26, sáb	8
mantenimiento ventanas frontales	LENIN BERRIO	100%	12/03/26, jue	20/03/26, vie	8
Pintura y mantenimiento cortasoles	EXTERNO	100%	25/03/26, mié	14/04/26, mar	20
ACTIVIDAD					
PINTURA DE CANCHAS					
Demarcacion de cancha	DIEGO LUGO	100%	02/03/26, lun	07/03/26, sáb	5
Mantenimiento arcos	EXTERNO	0%	22/03/26, dom	31/03/26, mar	9
Cambio de tableros	EXTERNO	0%	02/04/26, jue	11/04/26, sáb	9
ACTIVIDAD					
ENCHAPE DE TARIMA					
Desmonte de enchape	DIEGO LUGO	100%	11/03/26, mié	12/03/26, jue	1
Elaboracion de filos con mortero	DIEGO LUGO	100%	14/03/26, sáb	16/03/26, lun	2
Instalacion de enchape	DIEGO LUGO	100%	17/03/26, mar	22/03/26, dom	5

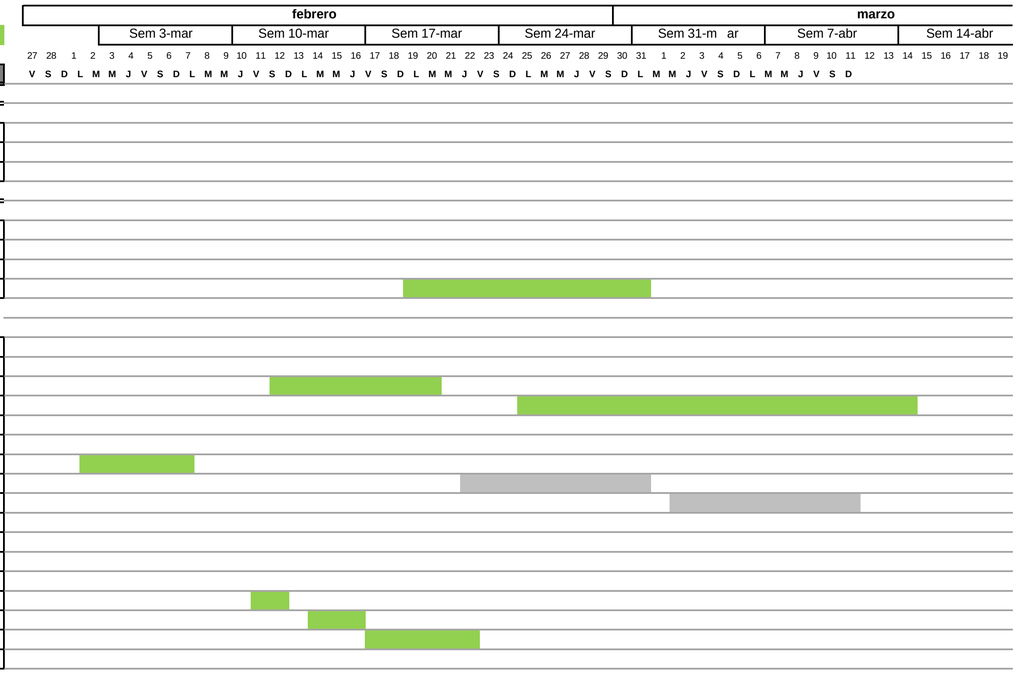


#000000 ECP-INFORMACION PUBLICA

CARLOS ARTURO A

		11	12/2/2026
	INICIO	1/2/2026	


Actividades	RESPONSABLE	PROGRESO%	INICIO	FIN	DIAS	Entregable
ACTIVIDAD						
BAÑOS						
Instalacion de lavamanos	FRANCISCO VARGAS	100%			1	
Instalacion griferia lavamanos	FRANCISCO VARGAS	100%			1	
Instalacion Sanitarios	FRANCISCO VARGAS	100%	16/02/26, lun	17/02/26, mar	2	
Instalacion Cielo raso PVC corredor	FRANCISCO VARGAS	100%	19/02/26, jue	19/02/26, jue	1	
Instalacion Division orinales	EXTERNO	100%	25/03/26, mié	26/03/26, jue	2	
Elaboracion Instalacion Puertas Sanitarios	EXTERNO	100%	26/03/26, jue	15/04/26, mié	20	
Elaboracion Instalacion Puertas acceso	EXTERNO	100%	15/04/26, mié	20/04/26, lun	5	
ACTIVIDAD						
BDDEGA						
Desmonte de cerramiento en lamina-incluye puertas vidrios	DIEGO LUGO	0%	18/04/26, sáb	21/04/26, mar	3	
Adecuación sobrepiso en concreto	DIEGO LUGO	0%	22/04/26, mié	24/04/26, vie	2	
Excavacion	DIEGO LUGO	0%	24/04/26, vie	26/04/26, dom	2	
Fundicion de viga cimentacion	DIEGO LUGO	0%	29/04/26, mié	01/05/26, vie	2	
Fundicion de Losa de sobrepiso	DIEGO LUGO	0%	01/05/26, vie	03/05/26, dom	2	
Instalacion de cerramiento en lamina-incluye peurtas y vidrios	DIEGO LUGO	0%	03/05/26, dom	06/05/26, mié	3	
Instalacion de cubierta	DIEGO LUGO	0%	07/05/26, jue	11/05/26, lun	4	
ACTIVIDAD						
TANQUES						
Desmonte de tanques y estructura	FRANCISCO VARGAS	100%	14/03/26, sáb	19/02/26, jue	3	
adecuacion de placa contrapiso	FRANCISCO VARGAS	100%	23/02/26, lun	26/02/26, jue	3	
Excavacion	FRANCISCO VARGAS	100%	25/02/26, mié	26/02/26, jue	1	
Elaboracion de zapatas en concreto	DIEGO LUGO	100%	12/03/26, jue	15/03/26, dom	3	
ELaboracion de columnetas en concreto	DIEGO LUGO	30%	22/04/26, mié	09/05/26, sáb	17	
Instalacion equipo hidroneumatico	DIEGO LUGO	0%	09/05/26, sáb	12/05/26, mar	3	
ACTIVIDAD						
MURO POSETERIOR						
Excavacion	DIEGO LUGO	100%	23/03/26, lun	25/03/26, mié	2	
Fundicion Zapata en concreto	DIEGO LUGO	100%	24/03/26, mar	26/03/26, jue	2	
Fundicion columneta	DIEGO LUGO	100%	26/03/26, jue	28/03/26, sáb	2	
Continuacion columnetas existentes	DIEGO LUGO	100%	01/04/26, mié	13/04/26, lun	12	
Armado y fundicion de vigueta de amarre	DIEGO LUGO	10%	16/04/26, jue	27/04/26, lun	11	
ACTIVIDAD						
PORTONES DE INGRESO						
Instalacion de portones (influye desmonte)	EXTERNO	100%	28/03/26, sáb	01/04/26, mié	4	
Instalacion de puertas (incluye desmonte)	EXTERNO	50%	28/03/26, sáb	01/04/26, mié	4	
ACTIVIDAD						
INSTALACION PISO CHIP						
Instalacion piso en caucho	EXTERNO	100%	28/03/26, sáb	01/04/26, mié	4	

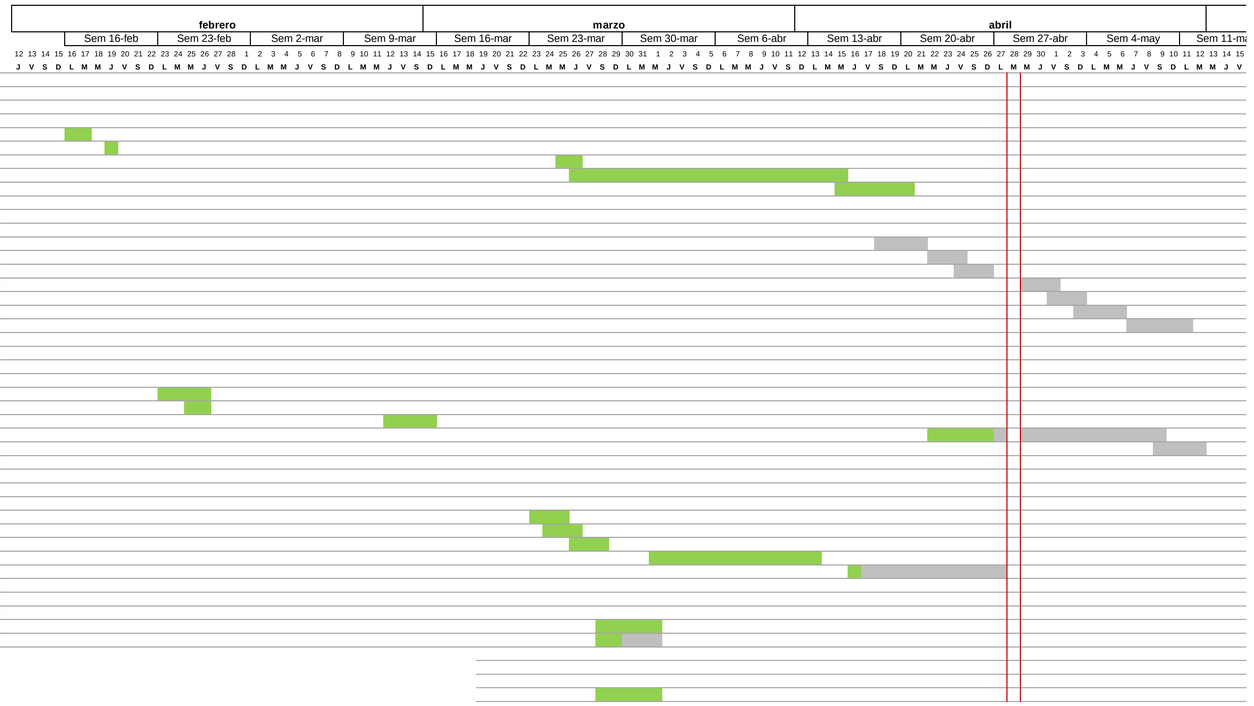

CARLOS ARTURO B

		25	26/2/2026
	INICIO	1/2/2026	

Actividades	RESPONSABLE	PROGRESO%	INICIO	FIN	DIAS	Entreg
ACTIVIDAD						
AULA 101						
Retiro de pañete interior	EXTERNO	100%	10/03/26, mar	12/03/26, jue	2	
Retiro de enchape	EXTERNO	100%	12/03/26, jue	21/03/26, sáb	9	
Aplicación de pañete para pared	EXTERNO	100%	21/03/26, sáb	23/03/26, lun	2	
Aplicación de masilla interior	EXTERNO	100%	23/03/26, lun	25/03/26, mié	2	
Aplicación de vinilo interior	EXTERNO	100%	25/03/26, mié	28/03/26, sáb	3	
Instalacion de cielo raso	EXTERNO	100%	28/03/26, sáb	03/04/26, vie	6	
Elaboracion e instalacion de ventanas en aluminio	EXTERNO	100%	03/04/26, vie	09/04/26, jue	6	
Elaboracion e instalaciond e puerta de acceso aula	EXTERNO	50%	09/04/26, jue	21/04/26, mar	12	
ACTIVIDAD						
PINTURA FACHADA						
Retiro pañete exterior	DIEGO LUGO	100%	06/04/26, lun	08/04/26, mié	2	
Aplicación pañete impermeabilizado	DIEGO LUGO	100%	08/04/26, mié	10/04/26, vie	2	
Aplicación Pintura para Exteriores	DIEGO LUGO	100%	10/04/26, vie	16/04/26, jue	6	
ACTIVIDAD						
CUBIERTA ACCESO						
Instalacion cubierta acceso	DIEGO LUGO	100%	17/03/26, mar	23/03/26, lun	6	
Instalacion canal en lamina	DIEGO LUGO	20%	14/03/26, sáb	15/03/26, dom	3	
Elaboracion muro en mamposteria	DIEGO LUGO	100%	30/03/26, lun	01/04/26, mié	2	
ACTIVIDAD						
CANCHA						
Arreglo cancha	EXTERNO	0%	13/04/26, lun	07/05/26, jue	24	
Pintura y demarcacion cancha	EXTERNO	0%	14/04/26, mar	07/05/26, jue	23	
Mantenimiento tableros	EXTERNO	0%	15/04/26, mié	07/05/26, jue	22	
ACTIVIDAD						
DESMONTE E INSTALACION DE PUERTAS						
desmonte de puertas	EXTERNO	0%	18/04/26, sáb	22/04/26, mié	4	
Instalacion de puertas	EXTERNO	0%	22/04/26, mié	26/04/26, dom	4	

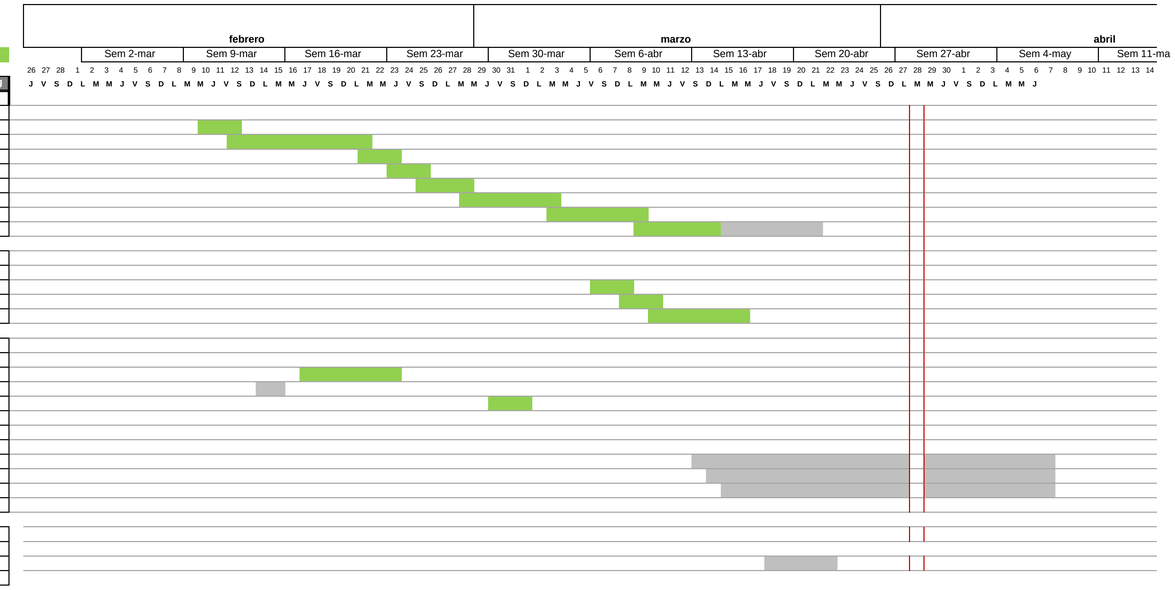


FRANCISCO MIRANDA

9 | 10/2/2026

INICIO | 1/2/2026

Actividades	RESPONSABLE	PROGRESO%	INICIO	FIN	DIAS	gabl
ACTIVIDAD						
BAÑOS/						
Pañete de pared	FRANCISCO VARGAS	100%	21/02/26, sáb	28/02/26, sáb	7	
Pañete de pisos	FRANCISCO VARGAS	100%	28/02/26, sáb	02/03/26, lun	2	
Instalacion de enchape de pared	DIEGO LUGO	90%	06/04/26, lun	14/04/26, mar	8	
Instalacion de enchape de piso	DIEGO LUGO	90%	14/04/26, mar	18/04/26, sáb	4	
Elaboracion e instalacion de lavamanos	DIEGO LUGO	50%	14/04/26, mar	28/04/26, mar	14	
Instalacion griferia lavamanos	DIEGO LUGO	50%	28/04/26, mar	04/05/26, lun	6	
Instalacion Sanitarios	DIEGO LUGO	50%	11/04/26, sáb	15/04/26, mié	4	
Instalacion aparatos electricos	DIEGO LUGO	0%	12/03/26, jue	17/03/26, mar	5	
Instalacion Cielo raso PVC	DIEGO LUGO	40%	18/04/26, sáb	04/05/26, lun	16	
Elaboracion Instalacion Puertas Sanitarios	EXTERNO	0%	14/04/26, mar	26/04/26, dom	12	
Elaboracion Instalacion Puertas acceso	EXTERNO	0%	15/04/26, mié	10/05/26, dom	25	
ACTIVIDAD						
OFICINAS/ENFERMERIA						
Demolicion de muros en Drywall oficinas	FRANCISCO VARGAS	100%	16/02/26, lun	26/02/26, jue	10	
Demolicion de enchape oficinas	FRANCISCO VARGAS	100%	21/02/26, sáb	01/03/26, dom	8	
Instalacion de enchape de piso	DIEGO LUGO	100%	01/04/2026	07/04/26, mar	6	
Elaboracion de muros en Drywall	DIEGO LUGO	90%	14/04/26, mar	01/05/26, vie	17	
Instalaciones electricas	DIEGO LUGO	20%	13/04/26, lun	05/05/26, mar	22	
Pintura de muros	DIEGO LUGO	73%	01/05/26, vie	12/05/26, mar	11	
Instalacion de Cielo raso en pvc	DIEGO LUGO	45%	27/03/26, vie	28/04/26, mar	32	
ACTIVIDAD						
AULA INCLUSION						
Desmonte de cubierta	FRANCISCO VARGAS	100%	09/03/26, lun	12/03/26, jue	3	
Demsmonte de piso existente	FRANCISCO VARGAS	90%	21/02/26, sáb	27/02/26, vie	6	
Demsmonte de instalaciones electricas	DIEGO LUGO	40%	02/03/26, lun	04/03/26, mié	2	
Instalacion de cubierta	DIEGO LUGO	0%	13/04/26, lun	24/04/26, vie	11	
Resanes de muros	DIEGO LUGO	0%	08/04/26, mié	16/04/26, jue	8	
Instalacion enchape de piso	DIEGO LUGO	0%	16/04/26, jue	30/04/26, jue	14	
Pintura interior	DIEGO LUGO	0%	13/04/26, lun	25/04/26, sáb	12	
instalaciones electricas.	DIEGO LUGO	0%	13/04/26, lun	05/05/26, mar	22	
Elaboracion e instalcion de Puerta	EXTERNO	0%	28/02/26, sáb	13/03/26, vie	13	
Elaboracion e isntalacion de ventana	EXTERNO	0%	14/04/26, mar	10/05/26, dom	26	
ACTIVIDAD						
LIMPIEZA CAJAS						
Sondeo y revision de desagues.	DIEGO LUGO	0%	27/04/26, lun	02/05/26, sáb	5	
Limpieza cajas de inspeccion	FRANCISCO VARGAS	0%	28/04/26, mar	02/05/26, sáb	4	

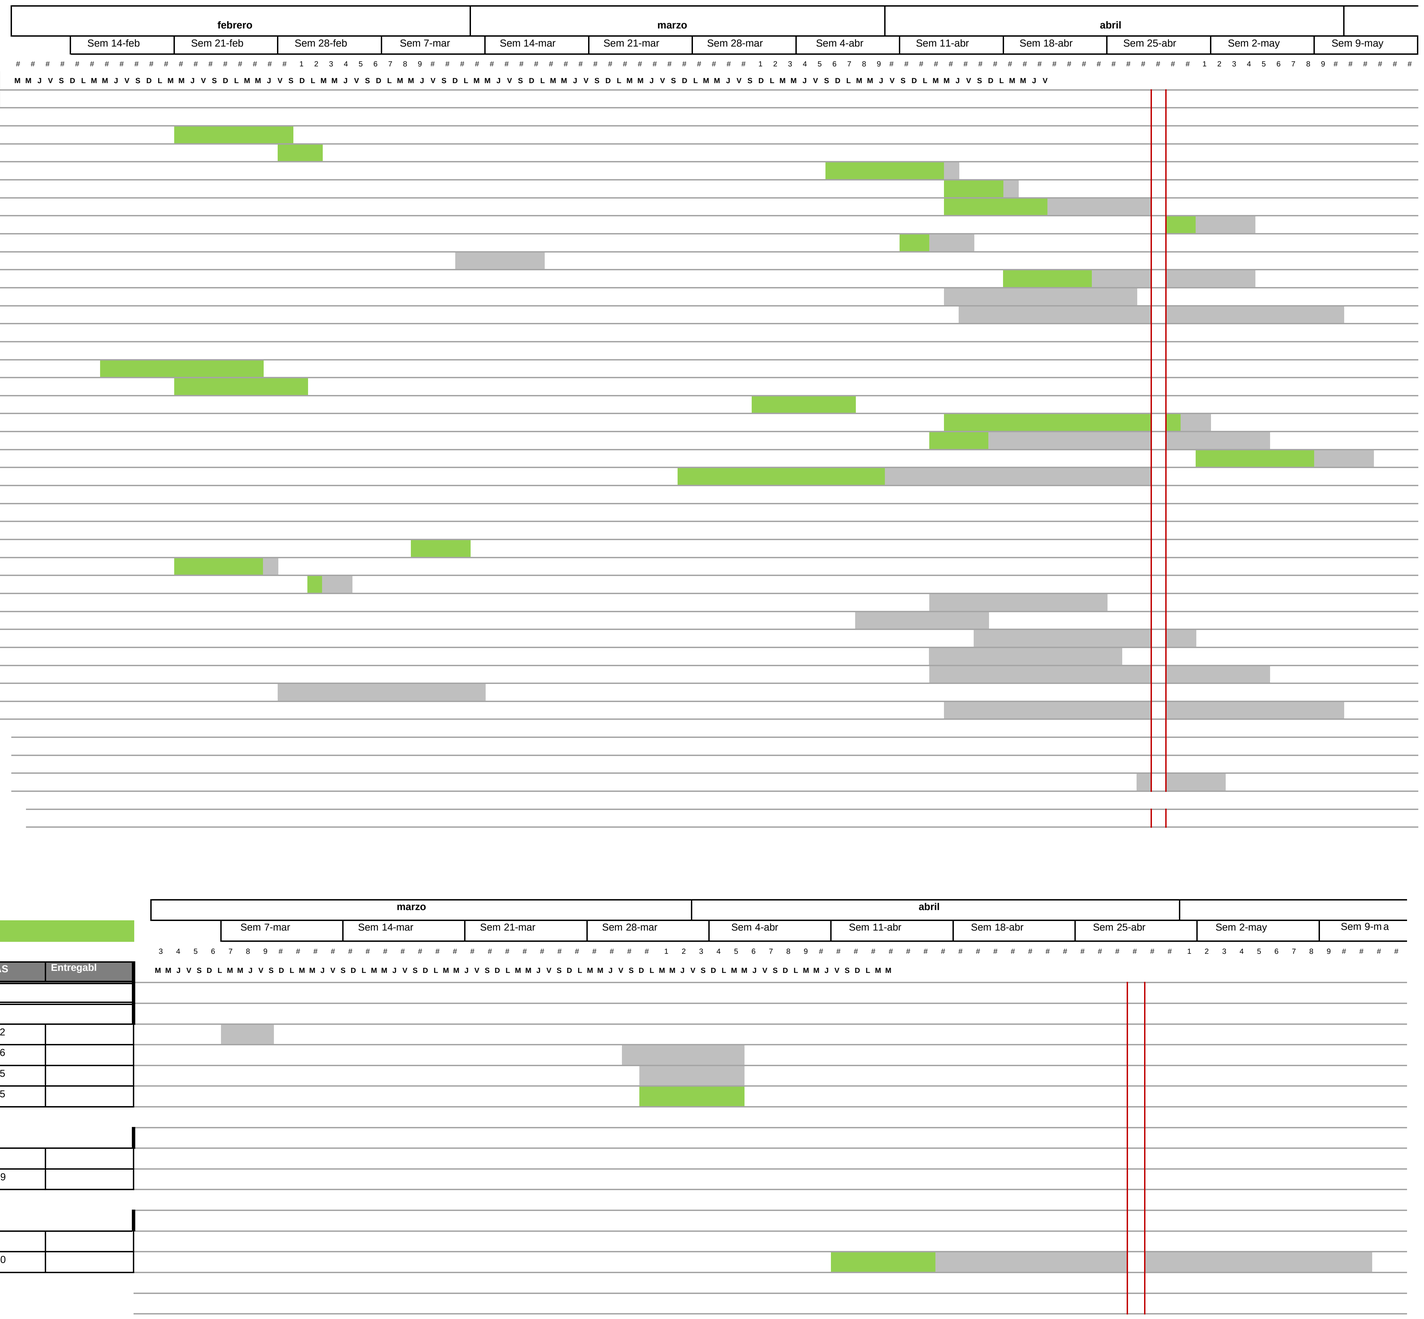

RUFINO JOSE CUERVO

30 | 3/3/2026

INICIO | 1/2/2026


Actividades	RESPONSABLE	PROGRESO	INICIO	FIN	DIAS	Entregabl
ACTIVIDAD						
PINTURA						
Mejoramiento andenes	DIEGO LUGO	0%	07/03/26, sáb	09/03/26, lun	2	
Pintura base para contrapiso en concreto	DIEGO LUGO	0%	30/03/26, lun	05/04/26, dom	6	
Pintura diseños juegos	DIEGO LUGO	0%	31/03/26, mar	05/04/26, dom	5	
Pintura cancha	DIEGO LUGO	100%	31/03/26, mar	05/04/26, dom	5	
ACTIVIDAD						
PISO EN CAUCHO						
Instalacion piso en caucho	EXTERNO	100%	26/02/2026	04/04/26, sáb	39	
ACTIVIDAD						
SHUT DE BASURAS						
Elaboracion e instalacion shut de basuras	EXTERNO	20%	11/04/26, sáb	11/05/26, lun	30	

FLORESTA

0 1/2/2026

INICIO 1/2/2026

Actividades	RESPONSABLE	PROGRESO%	INICIO	FIN	DIAS	Entregabl
ACTIVIDAD						
ACTIVIDAD						
CARCAMOS						
Elaboracion e Instalacion de carcamos peatonales		100%	21/02/26, sáb	21/02/26, sáb	0	
Elaboracion e Instalacion de carcamos vehiculares		100%	30/03/26, lun	31/03/26, mar	1	
ACTIVIDAD						
SHUT DE BASURAS						
Elaboracion e instalacion shut de basuras	EXTERNO	0%	16/04/26, jue	11/05/26, lun	25	
ACTIVIDAD						
VENTANAS						
Elaboracion de puertas y ventanas	EXTERNO	50%	23/03/26, lun	10/05/26, dom	48	
ACTIVIDAD						
PINTURA						
Pintura cancha	DIEGO LUGO	100%	11/03/26, mié	16/03/26, lun	5	O INTERVENTORIA

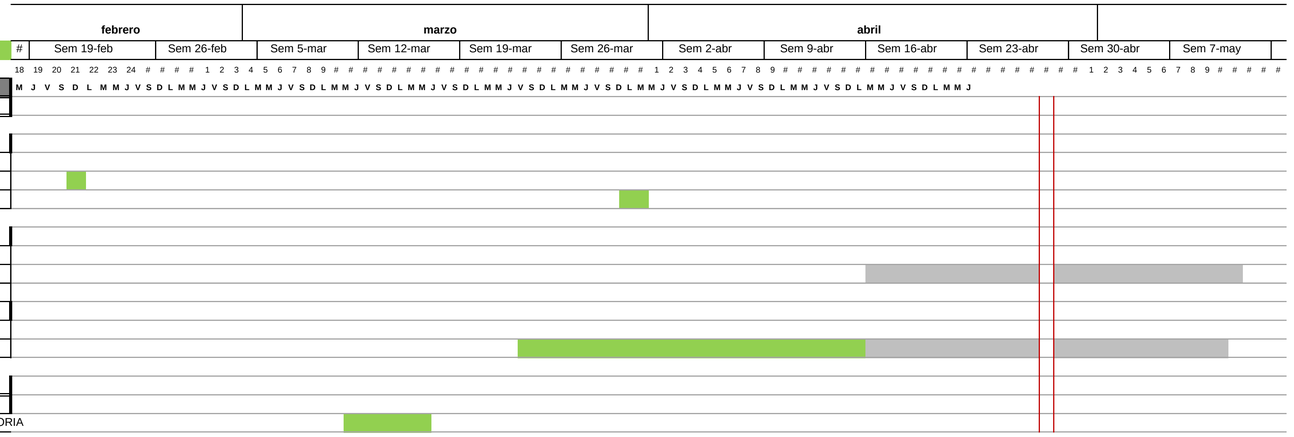


SAN CARLOS

0 1/3/2026

INICIO 1/3/2026

Actividades	RESPONSABLE	PROGRESO	INICIO	FIN	DIAS	Entre
ACTIVIDAD						
INSTALACION RCI						
Instalacion Red contra incendios	EXTERNO	0%				
ACTIVIDAD						
ARREGLLO MURO MAMPOSTERIA						
Reemboquillado ladrillo	DIEGO LUGO	0%	30/04/26, jue	06/05/26, mié	6	

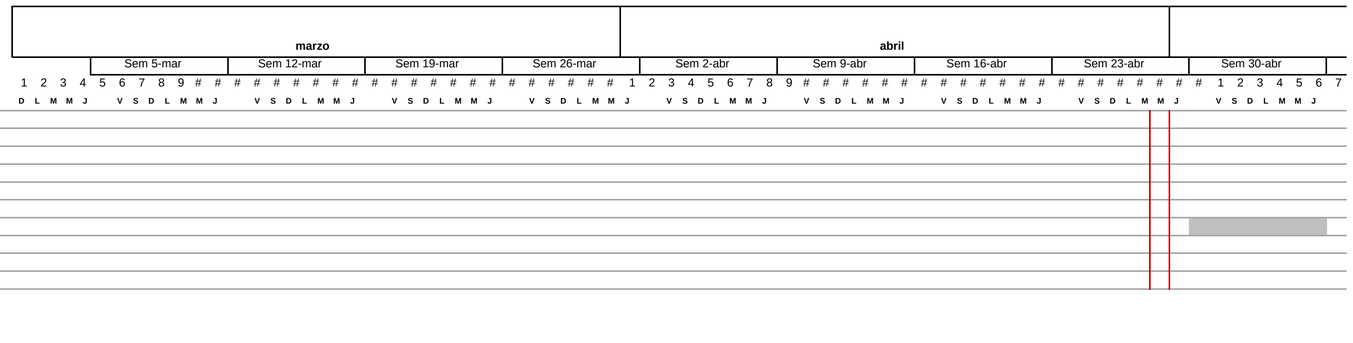

ACTIVIDADES PIEDEMONTE


Desplazamiento tiempo

RAFAEL URIBE

15 16/3/2026

INICIO 1/3/2026

Actividades	RESPONSABLE	PROGRESO	INICIO	FIN	DIAS	Ie
ACTIVIDAD						
PISO						
Elaboracion piso cancha	EXTERNO	70%	22/03/26, dom	26/04/26, dom	35	
Elaboracion piso en concreto parqueadero	EXTERNO	70%	23/03/26, lun	27/04/26, lun	35	
Elaboracion piso en caucho	EXTERNO	0%	29/04/26, mié	09/05/26, sáb	10	
ACTIVIDAD						
FACHADA						
Pintura de fachada	DIEGO LUGO	0%	29/04/26, mié	05/05/26, mar	6	



PLAN DE CALIDAD

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8155154 del 8 de septiembre de 2025

OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.".

CONTRATANTE:

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

CONTRATISTA:

CONSORCIO CORAL INGENIERIA

2025


CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
00	24/10/2025	Documento inicial V0
01	28/11/2025	Observaciones de la interventoría

CONTRATISTA

ELABORÓ: Firma: 	REVISÓ: Firma: 
Nombre: Karen Pino	Nombre: Yady Castillo
Cargo: Ingeniera Residente	Cargo: Director de Obra
Fecha: 28/11/2025	Fecha: 28/11/2025

INTERVENTOR:

REVISÓ: Firma: 	APROBÓ: Firma: 
Nombre: Miller Marín	Nombre: John Harry Arango
Cargo: Residente de Interventoría	Cargo: Director de Interventoría
Fecha:	Fecha:

CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES 5
1.1 Descripción del contrato 5
1.2 Alcance del contrato 5
1.3 Ubicación del proyecto 5
1.4 Elementos de entrada del plan de calidad 7
1.4.1 Requisitos del cliente y partes interesadas 7
1.4.2 Alcance y objetivos del proyecto 7
1.4.3 Requisitos legales, normativos y contractuales 8
1.4.4 Documentos de referencia 8
2. CONTROL DE CALIDAD 9
2.1 Objetivos de calidad 9
2.2 Control de calidad de los productos 10
3. COMUNICACIONES 13
3.1 Comunicación Externa 13
3.2 Comunicación Interna 13
4. CONTROL DE DOCUMENTOS 14
4.1 Control de correspondencia 14
5. RECURSOS 15
5.1 Recurso humano 15
5.1.1 Director de Proyecto 15
5.1.2 Residente de obra 15
5.1.3 Inspectores / Auxiliares de Calidad 15
5.1.4 Proveedores y Subcontratistas 16

5.2 Materiales 16
6. MAPA DE PROCESOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 18
7. PLANES COMPLEMENTARIOS 20
7.1 Plan de gestión social 20
7.2 Plan de seguridad y salud en el trabajo – SST 20
8. DOCUMENTOS POR ENTREGAR 21
8.1 Informes Mensuales 21
8.2 Informe final y liquidación del contrato 21
9. REQUISITOS LEGALES Y DE REFERENCIA 22
10. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD TÉCNICA DE LA OBRA 23

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Descripción del contrato

El Contrato de Obra CO1.PCCNTR.8155154 -2025, tiene por objeto "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas lote 8".

1.2 Alcance del contrato

Su alcance incluye la realización de obras menores y la atención oportuna de emergencias y necesidades prioritarias en la infraestructura, con el fin de garantizar la continuidad, seguridad y adecuada prestación del servicio educativo en los colegios distritales y sedes administrativas en las localidades de Kennedy y Tunjuelito en la ciudad de Bogotá – Grupo 8.

1.3 Ubicación del proyecto

El lugar de ejecución del Contrato comprende El lugar de ejecución del Contrato comprende las localidades de Kennedy y Tunjuelito en la ciudad de Bogotá.

Estos se encuentran localizados como se muestra a continuación:



Ilustración 1 *- Localización del proyecto Grupo 8. Fuente: Propia*

El contrato se desarrollará bajo las condiciones y alcances señalados en el mismo, así como en lo establecido en las especificaciones técnicas, descripción, localización y actividades identificadas en los estudios previos y en las condiciones y términos de la invitación cuando estas apliquen, que precedieron el presente contrato, documentos que forman parte integral del mismo.

Lote 8

CPF	Localidad	Colegio	Sede Educativa	Dirección	Zona
612	TUNJUELITO	RAFAEL URIBE URIBE	SEDE B – NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	CARRERA 29 No 48 B 36 SUR	SUR OCCIDENTE
829	KENEDY	LA FLORESTA SUR	SEDE A – LA FLORESTA SUR	CALLE 2 SUR No 68 b 82	SUR OCCIDENTE
601	TUNJUELITO	CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA	SEDE A - JOSE MARIA CORDOBA	DG 48 C SUR # 24 41	SUR OCCIDENTE
849	KENEDY	CARLOS ARTURO TORRES	SEDE A – CARLOS ARTURO TORRES Y REP DE FINLANDIA	TV 72 B # 44 C 19 SUR	SUR OCCIDENTE
803	KENEDY	CARLOS ARTURO TORRES	SEDE B – CENT. DEF. MENTAL REP DE FINLANDIA	TV 72 B # 44 C – 08 SUR	SUR OCCIDENTE
816	KENEDY	FRANCISCO MIRANDA	SEDE A- FRANSISCO DE MIRANDA	DG 41 SUR # 73 A – 80	SUR OCCIDENTE
617	TUNJUELITO	RUFINO JOSE CUERVO	SEDE C – NUEVO TUNJUELITO	CL 58 A SUR # 12 A – 25	SUR OCCIDENTE
609	TUNJUELITO	JOSE ANTONIO RICAUTE SAN CARLOS	SEDE B SAN CARLOS	KR 19 # 50 - 37 SUR	SUR OCCIDENTE

Tabla 1 *- Relación de colegios Grupo 8*

1.4 Elementos de entrada del plan de calidad

1.4.1 Requisitos del cliente y partes interesadas

- Lineamientos técnicos y administrativos de la Secretaría de Educación del Distrito.
- Requisitos de continuidad del servicio educativo.
- Necesidades de atención de emergencias y condiciones prioritarias de habitabilidad.

1.4.2 Alcance y objetivos del proyecto

- Intervención de sedes educativas y administrativas.
- Ejecución de obras menores y mantenimientos correctivos.
- Garantía de funcionalidad y seguridad de la infraestructura física.

1.4.3 Requisitos legales, normativos y contractuales

- Normatividad urbanística, técnica y de construcción aplicable.
- Normas de seguridad industrial, salud en el trabajo y ambientales vigentes.
- Condiciones contractuales, especificaciones técnicas y planos aprobados.

1.4.4 Documentos de referencia

- Especificaciones técnicas del proyecto.
- Estudios previos, diagnósticos y levantamientos.
- Planos, memorias y fichas técnicas existentes.
- Procedimientos internos y estándares de calidad del contratista.

2. CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad en el proyecto tiene como propósito asegurar que todas las actividades, materiales y entregables se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas, los requisitos contractuales y las normas vigentes. A través de, inspecciones planificadas y registros verificables, el control de calidad permite mantener la coherencia del proceso constructivo, prevenir no conformidades y garantizar la satisfacción del cliente y de las partes interesadas.

2.1 Objetivos de calidad

- Cumplir al 100% los requisitos técnicos, normativos y contractuales definidos para las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento, garantizando que todos los entregables cumplan con los criterios de aceptación establecidos.
- Garantizar la recepción y uso exclusivo de materiales y equipos conformes, logrando que el 100% de los materiales críticos cuenten con certificados de calidad, fichas técnicas y verificaciones previas a su instalación.
- Reducir al mínimo la ocurrencia de productos no conformes, asegurando que el 100% de las no conformidades identificadas sean tratadas, corregidas y cerradas dentro del plazo establecido por la Supervisión/Interventoría.
- Cumplir con el cronograma aprobado manteniendo un nivel de ejecución conforme superior al 90% mensual, evitando retrasos atribuibles a fallas de calidad.
- Proteger la operación escolar y administrativa, garantizando que el 100% de las actividades se ejecuten bajo condiciones seguras, ordenadas y sin afectar la prestación del servicio educativo en las sedes intervenidas.
- Mantener una comunicación eficaz con la Supervisión/Interventoría, asegurando el envío oportuno del 100% de los informes de calidad, actas, registros y soportes requeridos.

2.2 Control de calidad de los productos.

El control de calidad de los productos asegura que todos los materiales, insumos y elementos constructivos utilizados en el proyecto cumplan con los requisitos especificados y sean adecuados para su instalación y desempeño. Para ello, se verifica la conformidad mediante la revisión de certificados, fichas técnicas, ensayos y procesos de inspección durante la recepción, almacenamiento y uso en obra. Este control garantiza que únicamente productos aprobados y trazables ingresen al proceso constructivo, evitando fallas, retrabajos o riesgos que puedan afectar la funcionalidad, seguridad y durabilidad de las intervenciones realizadas.

2.3 Control de actividades.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MATERIAL A INSPECCIONAR	ENSAYOS O PRUEBAS	NORMA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	REGISTRO	FRECUENCIA
MAMPOSTERÍA	Levantamiento de muros con ladrillo o bloque.	Residente de obra y/o Maestro de obra / Interventor	Ladrillo, bloque, mortero	Compresión de unidades, adherencia mortero	NSR-10 / ASTM C67	Alineación ±1 cm/m, resistencia conforme	Bitácora de obra, registro tecnico visual	Por jornada o cada muro nuevo
PAÑETES, ESTUCO Y PINTURA	Aplicación de capas de mortero, estuco y pintura.	Residente de obra y/o Maestro de obra / Interventor	Mortero, estuco, pintura	Adherencia, corte en cruz, espesor	ASTM D3359 / NTC 6050	Superficie lisa, adherencia ≥ 3B, sin fisuras	Bitácora de obra, registro tecnico visual	Cada ambiente terminado
PISOS Y CERÁMICA	Instalación de baldosas o cerámica en pisos y muros.	Residente de obra y/o Maestro de obra / Interventor	Cerámica, adhesivo, lechada	Nivel, adherencia, absorción	NTC 4321 / ISO 13006	Nivelación ±3 mm/m, juntas alineadas	Bitácora de obra, registro tecnico visual,Registro fotográfico, Inspeccion visual	Cada ambiente ejecutado
CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA	Instalación de puertas, ventanas, muebles metálicos y en madera.	Residente de obra / Interventor	Perfiles metálicos, madera tratada, herrajes	Verificación de dimensiones, soldadura, funcionamiento	NTC 2290 / AWS D1.1	Funcionamiento adecuado, sin defectos visibles	Bitácora de obra, registro tecnico visual	Por elemento instalado
IMPERMEABILIZACIÓN	Aplicación de membranas líquidas o asfálticas.	Residente de obra y/o Maestro de obra / Interventor	Imprimante, membrana, sellos	Estanqueidad, adherencia, espesor	ASTM D5385 / NTC 4516	Sin filtraciones, buena adherencia	Prueba de estanqueidad	Cada área terminada
CUBIERTA Y CIELO RASO	Instalación de techos, estructuras y cielos rasos.	Residente de obra y/o Maestro de obra / Interventor	Láminas de cubierta, perfilería, placas de yeso	Prueba de pendiente, fijación, nivel	NSR-10 / NTC 1640	Pendiente mínima 3%, sin vibraciones	Bitácora técnica, planos conforme	Por módulo instalado
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	Tendido de redes hidráulicas y sanitarias.	Residente de obra y/o Maestro de obra / Interventor	Tubería PVC, accesorios, válvulas	Prueba hidráulica, estanqueidad	NTC 1500 / NSR-10	Sin fugas, presión según diseño	Pruebas hifraulicas	Por tramo de red ejecutado
ELÉCTRICO Y CONECTIVIDAD	Instalación de redes eléctricas y de datos.	Electricista certificado / Interventor	Cables, canaletas, tableros, tomas	Continuidad, polaridad, puesta a tierra	RETIE / NTC 2050	Resistencia de puesta a tierra < 25 ohm	Protocolos de pruebas eléctricas	Por circuito instalado
ELÉCTRICO Y CONECTIVIDAD (REVISIÓN CAMBIO DE LUMINARIAS)	Verificación general del montaje, estado físico y limpieza del área	Residente de obra / Interventor	Luminaria instalada, entorno	Inspección visual	RETIE / NTC 2050	Instalación firme, sin daños, sin residuos ni herramientas	Bitácora de obra, registro tecnico visual	Al finalizar cada frente o área
VIDRIO Y ACRÍLICO	Instalación de ventanería y divisiones en vidrio.	Residente de obra / Interventor	Vidrio templado, flotado o laminado	Alineación, impacto, adherencia de sellos	NTC 3535 / ASTM C1048	Alineación correcta, sin fisuras	Bitácora de obra, registro tecnico visual	Por frente o ventana
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	Intervenciones correctivas o preventivas.	Residente de obra / Interventor	Materiales de reparación (mortero, pintura, sellos)	Inspección visual, funcionalidad	Según tipo de intervención	Corrección del daño, funcionamiento recuperado	Bitácora de obra, registro tecnico visual	Cada solicitud o programación
ASEO Y LIMPIEZA GENERAL	Limpieza final de obra y retiro de escombros.	Residente de obra y/o Maestro de obra / Interventor	Detergentes, herramientas de limpieza	Inspección visual de limpieza	N/A	Superficies limpias, sin residuos	Lista de chequeo de entrega final	Al finalizar cada frente o área
NOTA: **El criterio de aceptación de cada actividad estará sujeto a la verificación y aprobación de la interventoría, conforme al pliego de condiciones del proyecto, las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las normas aplicables.**								
