PRORROGA No 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026

Las partes acuerdan las siguientes cláusulas que hacen parte del contrato establecido electrónicamente en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop/

CONTRATANTE:	**RED SALUD CASANARE E.S.E.** **NIT.** 844.004.197-2
CONTRATISTA:	**SSB DESARROLLO S.A.S** **NIT. No.** 901.782.753-0
OBJETO:	**LOTE 08.** INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SINAI, CASIRVA Y SABANALARGA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR:	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($49.331.254,00)** Moneda Legal Colombiana
FORMA DE PAGO:	**EL VALOR DEL CONTRATO SERÁ PAGADO POR RED SALUD CASANARE E.S.E. DE LA SIGUIENTE FORMA:** EL DE PAGO PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SE ESTABLECE BAJO UN ESQUEMA DE AVANCE FÍSICO COMPROBADO, ASEGURANDO LA INDIVIDUALIZACIÓN PRESUPUESTAL Y TÉCNICA DE CADA CAPS O PAPS QUE INTEGRA EL LOTE, DE LA SIGUIENTE MANERA: **PRIMER PAGO PARCIAL**: SE DESEMBOLSARÁ EL **TREINTA POR CIENTO (30%)** DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA UNA VEZ SE VERIFIQUE Y CERTIFIQUE QUE EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE LAS OBRAS DEL LOTE ALCANZA O SUPERA EL **TREINTA POR CIENTO (30%).** PARA ESTE EFECTO, EL INTERVENTOR DEBE PRESENTAR INFORMES TÉCNICOS INDEPENDIENTES POR CADA CAPS O PAPS QUE COMPONE EL LOTE DONDE SE VERIFIQUE DICHO AVANCE. CADA INFORME DEBE DOCUMENTAR Y SUSTENTAR EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO RESPECTIVO, SIN MEZCLAR INFORMACIÓN O PRESUPUESTOS, RECURSOS NI SOPORTES ENTRE LOS DIFERENTES PROYECTOS. SOLO SE CONSIDERARÁ CUMPLIDO EL AVANCE EXIGIDO CUANDO TODOS LOS INFORMES INDIVIDUALES EVIDENCIEN EL PORCENTAJE DE OBRA ALCANZADO Y SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA. **SEGUNDO PAGO PARCIAL:** SE PAGARÁ OTRO **TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**, SUJETO A LA PRESENTACIÓN DE NUEVOS INFORMES INDIVIDUALES Y DISCRIMINADOS POR CADA CAPS O PAPS, VALIDANDO QUE EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO EN CADA PROYECTO Y EL GLOBAL DEL LOTE ALCANCE O **SUPERE EL SESENTA POR CIENTO (60%).** LA APROBACIÓN ESTARÁ IGUALMENTE CONDICIONADA A LA VERIFICACIÓN DETALLADA Y LA VALIDACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL SUPERVISOR Y DICHO AVANCE SE ENCUENTRE CERTIFICADO POR LA INTERVENTORÍA GARANTIZANDO SIEMPRE LA SEGREGACIÓN PRESUPUESTAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONTRACTUALES Y LEGALES. **TERCER PAGO PARCIAL:** EL TERCER PAGO, CORRESPONDIENTE AL **TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR CONTRACTUAL**, SE EFECTÚA CUANDO EL AVANCE DE OBRA GLOBAL E INDIVIDUAL EN SUMATORIA DE CADA CAPS O PAPS POR PROYECTO **SUPERE EL NOVENTA POR CIENTO (90%).** EL INTERVENTOR DEBERÁ NUEVAMENTE APORTAR INFORMES TÉCNICOS INDEPENDIENTES PARA CADA CAPS O PAPS, RATIFICANDO EL PROGRESO FÍSICO Y FINANCIERO, Y ASEGURANDO LA PRESENTACIÓN ORDENADA DE LA INFORMACIÓN, LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RESPONSABLES Y EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LA NORMATIVA. **PAGO FINAL:** EL SALDO RESTANTE, CORRESPONDIENTE AL **DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR CONTRACTUAL**, SERÁ CANCELADO CONTRA LA FIRMA DEL **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, A CONDICIÓN DE QUE SE HAYA ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO INTEGRAL Y LA LIQUIDACIÓN INDIVIDUAL DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS QUE

CONFORMAN EL LOTE. PARA ESTE DESEMBOLSO, EL INTERVENTOR DEBERÁ ENTREGAR INFORMES FINALES POR CADA CAPS O PAPS Y ACREDITAR EL CIERRE EXITOSO Y DETALLADO DE LAS OBLIGACIONES, CONFORME A LO ESTIPULADO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE. EL PAGO FINAL A ENTREGA FINAL DE LA OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y LA SUPERVISIÓN DEL RESPECTIVO CONTRATO Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA Y ACREDITACIÓN DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – PENSIÓN – ARL Y PARAFISCALES (SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), ANEXANDO ADEMÁS EL PAZ Y SALVO DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES Y/O PROFESIONALES POR TODO CONCEPTO; PAZ Y SALVO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE CADA MUNICIPIO DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DE CAPS O PAPS Y DEMÁS QUE LA ADMINISTRACIÓN CREA CONVENIENTES.

PARAGRAFO PRIMERO: LAS FACTURAS O DOCUMENTOS EQUIVALENTES PARA PAGO DEBEN SER EXPEDIDAS DIRECTAMENTE POR LOS CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO Y NO POR CADA UNO O ALGUNO DE SUS INTEGRANTES.

PARAGRAFO SEGUNDO: PARA EL TRÁMITE DE PAGOS PARCIALES Y FINALES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE DE MANERA INDEPENDIENTE PARA CADA PAPS O CAPS (SEGÚN APLIQUE), CUMPLIENDO LOS SIGUIENTES REQUISITOS: **I)** TODA SOLICITUD DE PAGO DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DE ACTAS PARCIALES O FINALES QUE DISCRIMINEN DE FORMA CLARA Y DETALLADA LOS CAPÍTULOS Y COMPONENTES DE ENTREGABLES CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE EJECUTADAS EN CADA PUESTO DE SALUD. EN DICHAS ACTAS SE DEBERÁ REFLEJAR, EL AVANCE LOGRADO RESPECTO AL TOTAL CONTRATADO, ESPECIFICANDO LO EJECUTADO Y SALDOS PENDIENTES, SIN ALTERAR NI MODIFICAR LA ESTRUCTURA ESTABLECIDA EN LA OFERTA ECONÓMICA NI EN EL PRESUPUESTO APROBADO DEL RESPECTIVO PROYECTO; **II)** QUEDA PROHIBIDO CONSOLIDAR, MEZCLAR O TRANSFERIR VALORES SALDOS ENTRE LOS DIFERENTES PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD. CADA ACTA Y LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES (TABLAS, SÁBANAS DE CANTIDADES, INFORMES FOTOGRÁFICOS, DIARIOS DE OBRA, CERTIFICACIONES DE MATERIALES Y DEMÁS EVIDENCIA TÉCNICA Y/O LEGAL DE EJECUCIÓN) DEBERÁN SER ELABORADOS Y PRESENTADOS DE FORMA SEPARADA E IDENTIFICABLE POR CADA PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD. NO SE ACEPTARÁN SOPORTES GENÉRICOS, GLOBALES O QUE CONTENGAN INFORMACIÓN CRUZADA ENTRE DIFERENTES PROYECTOS, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA; **III).** CADA DOCUMENTO SOPORTE DEBE ESTAR PERFECTAMENTE IDENTIFICADO CON EL NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PUESTO DE SALUD RESPECTIVO, Y CONTENER LOS DATOS ESENCIALES DEL PROYECTO APROBADO, ASEGURANDO LA TRAZABILIDAD Y CORRESPONDENCIA EXACTA CON LO PACTADO CONTRACTUALMENTE. LOS COMPONENTES RECLAMADOS PARA PAGO DEBEN CORRESPONDER EXACTAMENTE A LO EJECUTADO, Y ESTAR SOPORTADAS EN, BITÁCORAS, FOTOGRAFÍAS GEORREFERENCIADAS Y CUALQUIER OTRA EVIDENCIA REQUERIDA, TODO ELLO DISCRIMINADO POR CAPÍTULO PARA EL RESPECTIVO PUESTO DE SALUD; **IV).** LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SERÁ LA ENCARGADA DE VERIFICAR, REVISAR Y APROBAR CADA UNO DE LOS SOPORTES PRESENTADOS PARA CADA PAGO. EL CONTRATISTA DEBERÁ ATENDER OPORTUNAMENTE CUALQUIER REQUERIMIENTO, OBSERVACIÓN O SUBSANACIÓN QUE LA SUPERVISIÓN ESTIME NECESARIA PARA GARANTIZAR LA VALIDEZ E INTEGRIDAD DE LOS SOPORTES DE PAGO; **V).** EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS, LA FALTA DE DISCRIMINACIÓN, LA MEZCLA DE PRESUPUESTO O RUBROS O LA AUSENCIA DE CLARIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS AVANCES POR PUESTO DE SALUD ORIGINARÁ LA DEVOLUCIÓN INMEDIATA DEL ACTA PARCIAL O FINAL.

PRORROGA No 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026

	PARÁGRAFO TERCERO: EN LO RELACIONADO CON LA FORMA DE PAGO DE LOS TRABAJOS, ASOCIADOS AL AVAL DEL COMPONENTE ELÉCTRICO SOLO UNA VEZ ESTE EN PODER DE LA ENTIDAD LA CERTIFICACIÓN RETIE Y ESTA SEA EVALUADA FAVORABLEMENTE POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, SE AUTORIZARÁ Y PROCEDERÁ EL PAGO ÍNTEGRO DEL PAGO, GARANTIZANDO ASÍ LA ENTREGA DE INSTALACIONES PLENAMENTE SEGURAS, FUNCIONALES Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES EXIGIDOS POR EL MARCO REGULATORIO COLOMBIANO APLICABLE A LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD.
PLAZO EJECUCIÓN:	**CUATRO (04) MESES**, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÒN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE EJECUCIÓN.
FECHA DE FIRMA:	23 DE ENERO DE 2026
FECHA DE ACTA DE INICIO:	26 DE FEBRERO DE 2026
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	25 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA No 01:	UNO (01) MES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO PRINCIPAL
FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA:	25 DE JULIO DE 2026

Entre los suscritos a saber por una parte **LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS**, mayor de edad, identificada con la cédula ciudadanía número 52.897.176 expedida en Bogotá, en la condición Gerente de **RED SALUD CASANARE E.S.E** Identificada con el Número de Identificación Tributaria -**NIT No. 844.004.197-2**, nombrada mediante Decreto 0089 del 01 de abril de 2024 emanado de la Gobernación de Casanare y Acta de posesión No. 0050 de fecha 01 de abril de 2024, autorizada para ordenar el gasto según lo establecido en el Acuerdo 001 del 07 de septiembre de 2004 y Acuerdo 006 del 2021 adoptado mediante la Resolución Nº 0588 del 14 de julio del 2022, quien para efectos del presente contrato se denominará **RED SALUD CASANARE E.S.E** y por la otra **SSB DESARROLLO S.A.S .,** Identificada con Número de Identificación Tributaria No **NIT. 901.782.753-0**, Representada Legalmente por **MELISA BARRAGAN AVILA,** mayor de edad, Identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No 1.118.559.937 expedida en Yopal, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar **PRORROGA No 01** al CONTRATO DE INTERVENTORIA **No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026**, de conformidad con las siguientes consideraciones:

1) Que, **SSB DESARROLLO S.A.S** Identificada bajo el Número de Identificación Tributaria No **NIT. 901.782.753-0.** Representada Legalmente por **MELISA BARRAGAN AVILA, No 1.118.559.937 expedida en Yopal**, a través de oficio con fecha del 17 de Junio de 2026, dirigido **A LA SUPERVISIÓN**, donde solicita la viabilidad y aceptación de **PRORROGA No 01** al **CONTRATO DE INTERVENTORIA No SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026.**, en los siguientes términos:

"(...)
SSB DESARROLLO S.A.S., identificada con Nit. 901.782.753-0, en calidad de contratista del Contrato de Interventoría No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026, cuyo objeto corresponde a la "LOTE 08. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SINAI, CASIRVA Y SABANALARGA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE", se permite solicitar la PRÓRROGA No. 01 al plazo de ejecución contractual por el término de treinta (30) días calendario.
La presente solicitud se realiza en consideración a que el CONTRATO DE.. OBRA No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 556-2026, objeto de seguimiento por parte de esta interventoría, requiere ampliación de su plazo contractual hasta el día veintiséis (26) de julio de 2026, con el propósito de garantizar la culminación integral de las actividades pendientes y la adecuada entrega funcional del proyecto.
En consecuencia, y teniendo en cuenta que las obligaciones de seguimiento, control, verificación y acompañamiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental de la interventoría deben mantenerse durante todo el periodo de ejecución del contrato de obra y hasta su terminación, por ende, se hace necesario ampliar el plazo del contrato de interventoría en iguales condiciones y por el mismo término solicitado para el contrato principal.

Así mismo, la presente solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar la continuidad del seguimiento integral al proyecto, el control permanente de las actividades pendientes, la verificación de calidad y el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales derivadas de la ejecución de la obra intervenida.
Por lo anteriormente expuesto, se solicita autorizar la PRÓRROGA No. 01 del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026 por el término de treinta (30) días calendario, estableciendo como nueva fecha de terminación contractual el día veintiséis (26) de julio de 2026. (...)"

2) Que la **SUPERVISIÓN** a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, Mercadeo y Sistemas, mediante oficio de fecha diecinueve (19) de junio de 2026, se dirigido a **EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**, donde **ACEPTA** las condiciones para suscribir **PRORROGA No 01** al **CONTRATO DE OBRA No SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026,** en los siguientes términos:

"(...)
En mi calidad de Supervisor Delegado del Contrato de Interventoria SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NÚMERO INTERNO 046-2026, me permito manifestar la aceptación y aprobación de la Prórroga No. 01 al citado contrato, con el propósito de modificar la Cláusula Octava – Plazo de Ejecución Contractual.

La presente solicitud se encuentra sustentada en la necesidad de garantizar la continuidad de las labores de seguimiento, control, vigilancia y verificación técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica que debe ejercer la Interventoría sobre el Contrato de Obra SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NÚMERO INTERNO 046-2026, teniendo en cuenta que la ejecución de ambos contratos debe mantenerse de manera paralela y coordinada hasta la culminación efectiva de las actividades contratadas.

Una vez revisados los argumentos expuestos por el contratista de interventoría, así como la documentación presentada y las condiciones actuales de ejecución del proyecto, esta Supervisión considera que la ampliación del plazo contractual resulta necesaria para garantizar el adecuado acompañamiento, control y seguimiento a la ejecución de las obras durante el término adicional otorgado al contrato de obra, permitiendo verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la calidad de las actividades ejecutadas y el cierre satisfactorio del proyecto.

Las circunstancias que sustentan la presente solicitud corresponden al desarrollo de la ejecución contractual y a la necesidad de mantener la vigilancia permanente de las actividades pendientes de ejecución dentro del contrato de obra, situación que no modifica el objeto contractual de la interventoría, sino que garantiza el cumplimiento integral de su finalidad, consistente en ejercer el control y seguimiento permanente al proyecto de adecuación menor de los puestos de salud.
En consecuencia, esta Supervisión considera procedente la ampliación del plazo contractual de la interventoría, toda vez que la permanencia de dicho contrato durante el término adicional otorgado a la obra constituye un requisito indispensable para garantizar la correcta ejecución, control y recibo de las actividades pendientes.
Así mismo, se requiere al Contratista de Interventoría para que, dentro del marco de sus obligaciones contractuales, gestione, solicite, revise, apruebe y efectúe seguimiento permanente al Plan de Acción y/o Plan de Contingencia que deberá implementar el contratista de obra, estableciendo de manera clara y detallada las estrategias, actividades, responsables, recursos, rendimientos esperados, controles y cronograma de ejecución necesarios para garantizar el cumplimiento total del objeto contractual dentro del término de la prórroga otorgada.

Dicho Plan de Acción deberá contener metas verificables, indicadores de cumplimiento y mecanismos efectivos de seguimiento que permitan evidenciar el avance real de las actividades programadas, así como las medidas correctivas y preventivas necesarias para evitar nuevos retrasos durante el plazo adicional concedido. La Interventoría será responsable de verificar su implementación, realizar seguimiento permanente a su cumplimiento, emitir las recomendaciones y requerimientos a que haya lugar y reportar oportunamente a la Supervisión cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento del cronograma establecido.

De igual manera, se deja constancia de que la presente prórroga se concede bajo el entendido de que la Interventoría ejercerá un control estricto sobre la programación, ejecución y avance de las actividades pendientes, adoptando las medidas de seguimiento y control necesarias para garantizar que el plazo adicional otorgado al contrato de obra permita la culminación efectiva de las actividades contratadas y el cumplimiento integral del objeto contractual, evitando la materialización de riesgos que puedan generar nuevas solicitudes de ampliación atribuibles a deficiencias en la gestión, seguimiento o control del proyecto.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que la ampliación del plazo resulta necesaria para garantizar la continuidad de las labores de interventoría y el adecuado control de la ejecución contractual hasta la culminación de las obras, esta Supervisión aprueba la Prórroga No. 01 al Contrato de Interventoría SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NÚMERO INTERNO 046-2026, por un término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de terminación inicialmente prevista en el contrato, quedando el contratista de interventoría obligado a ejercer las acciones de seguimiento, control, vigilancia y verificación necesarias para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante el término prorrogado.
(...)".

3) Que la **SUPERVISIÓN** a cargo del **LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, MERCADEO Y SISTEMAS**, mediante memorando de fecha diecinueve (19) de Junio de 2026, radicado el día 19 de Junio de 2026, ante el **JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE CONTROL DISCIPLINARIO,** con visto bueno de la Gerencia de RED SALUD CASANARE E.S.E., donde solicita realizar **PRORROGA No 01** al **CONTRATO DE OBRA**

PRORROGA No 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026

No CONTRATO DE OBRA No SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026, bajo el siguiente sustento:

"(...)
1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA
La solicitud de Prórroga No. 01 al Contrato de Interventoría por un término de treinta (30) días calendario encuentra su fundamento en la necesidad de garantizar la continuidad de las actividades de seguimiento, control, vigilancia y verificación integral sobre la ejecución del Contrato de Obra SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NÚMERO INTERNO 556-2026, cuya ampliación de plazo se sustenta en circunstancias técnicas, logísticas y operativas debidamente justificadas por el contratista de obra y avaladas por la interventoría.
Dentro de dichas circunstancias se encuentra la fuerte temporada invernal que afecta actualmente la región y que tuvo inicio durante el mes de abril del presente año, generando afectaciones significativas en la infraestructura vial del municipio y en las vías terciarias de acceso a las veredas donde se ejecutan las intervenciones. Esta situación ocasionó cierres parciales y temporales, pérdida de banca, deterioro de la carpeta de rodadura y dificultades de transitabilidad para el transporte de personal, equipos y materiales, impactando directamente el desarrollo de las actividades constructivas programadas.
De igual forma, las condiciones climáticas adversas ocasionaron interrupciones recurrentes en el servicio de energía eléctrica en diferentes sectores del municipio, afectando el rendimiento de actividades que requieren el uso permanente de equipos y herramientas eléctricas, generando retrasos en la ejecución de varias actividades contempladas dentro de la programación contractual.
Adicionalmente, se presentaron situaciones relacionadas con el orden público en corredores viales y zonas rurales de la región, las cuales ocasionaron restricciones temporales a la movilidad y afectaciones logísticas para el abastecimiento oportuno de materiales e insumos necesarios para la ejecución de las obras.

Así mismo, se evidenciaron retrasos en el suministro e instalación de la cubierta tipo sándwich contemplada dentro de las especificaciones técnicas del proyecto, situación derivada de circunstancias ajenas al contratista asociadas a la cadena de suministro, procesos de fabricación, transporte y entrega de materiales. Dicha circunstancia impactó de manera directa la ruta crítica del proyecto, toda vez que la ejecución de actividades posteriores como pañetes, estucos, enchapes, pinturas y demás acabados dependían de la culminación de este componente constructivo y de condiciones adecuadas de protección y secado de las áreas intervenidas.
Las circunstancias anteriormente descritas corresponden a hechos externos, sobrevinientes y ajenos al control de las partes, los cuales afectaron de manera directa la programación inicialmente prevista, generando la necesidad de extender el plazo del contrato de obra con el fin de garantizar la terminación integral de las actividades pendientes, sin comprometer la calidad técnica, funcionalidad y estabilidad de las obras ejecutadas.
En consecuencia, y considerando que la interventoría tiene como objeto contractual ejercer el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico durante toda la ejecución del contrato de obra, resulta indispensable que su plazo de ejecución se mantenga concurrente y armónico con el plazo otorgado al contrato objeto de vigilancia. La terminación anticipada de la interventoría respecto del contrato de obra generaría la ausencia de control y seguimiento sobre las actividades pendientes de ejecución, afectando los principios de planeación, responsabilidad, economía, transparencia y control que rigen la contratación estatal.
Desde el punto de vista técnico, la permanencia de la interventoría durante el término adicional solicitado garantiza la verificación permanente de la calidad de las obras, el seguimiento al cronograma de ejecución, la validación de cantidades ejecutadas, la revisión de especificaciones técnicas, el control de los recursos invertidos y el recibo final de las actividades pendientes. De igual manera, permite implementar mecanismos de seguimiento que aseguren el cumplimiento de las metas establecidas para la culminación del proyecto.
Desde el punto de vista jurídico y contractual, la ampliación del plazo de la interventoría constituye una consecuencia necesaria y directa de la ampliación otorgada al contrato de obra, toda vez que la finalidad de dicho contrato de consultoría solo puede cumplirse plenamente mientras subsista la ejecución de las actividades objeto de control. Por lo tanto, mantener vigente la interventoría durante el plazo adicional de obra resulta indispensable para garantizar el cumplimiento integral de sus obligaciones contractuales y la adecuada protección de los intereses de la entidad.
Por lo anterior, se considera técnica, jurídica y contractualmente procedente la Prórroga No. 01 al Contrato de Interventoría SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NÚMERO INTERNO 046-2026 por el mismo término otorgado al contrato de obra, garantizando así la continuidad del seguimiento y control requerido hasta la terminación, recibo y cierre efectivo del proyecto.
2. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

Modificar la Cláusula Octava del Contrato No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NÚMERO INTERNO 046-2026, el cual quedará así:

CLÁUSULA OCTAVA - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual El CONTRATISTA se compromete a prestar a entera satisfacción de RED SALUD CASANARE E.S.E, el servicio objeto del presente contrato, será de CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÒN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE EJECUCIÓN. Que para efectos del presente memorando de solicitud se PRORROGA en un término de un (01) mes mas al plazo pactado en el contrato No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NÚMERO INTERNO 046-2026 contado a partir del vencimiento del plazo contractual vigente. Las cláusulas del contrato que no hubieren sido expresamente modificadas por la presente prórroga se mantendrán incólumes. Por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, es decir, que el cumplimiento de las obligaciones se va sucediendo de manera escalonada en el tiempo, se verificará su cumplimiento total hasta el vencimiento del término previsto para su ejecución. Pero el

cumplimiento parcial de las obligaciones se verificará de acuerdo con los informes periódicos de cumplimiento presentados al Supervisor del contrato. La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, EL CONTRATISTA debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.
(...)"

4) Que las actuaciones se amparan en lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, que en materia contractual se regirá por el Derecho Privado, bajo este concepto RED SALUD CASANARE E.S.E., expidió el **Acuerdo No 015 del 30 de septiembre de 2024** *"Por medio del cual se modifica y actualiza el Estatuto de Contratación de la Empresa Social de RED SALUD CASANARE E.S.E.",*

5) Que de conformidad con el **Acuerdo No 015 del 30 de septiembre de 2024** *"Por medio del cual se modifica y actualiza el Estatuto de Contratación de la Empresa Social de RED SALUD CASANARE E.S.E.",* artículo 65 establece que las partes de común acuerdo podrán suscribir acta modificatoria, previo requerimiento del supervisor del contrato, expresando con claridad las razones que originaron tal modificación. y lo reglamentado en la **Resolución 692 de 2021** *"Por la cual se expide el Manual de Contratación de la entidad conforme al Estatuto de Contratación expedido por la Junta Directiva mediante el Acuerdo No 007 de 2021".* **Artículo 51. MODIFICACIÓN A LOS CONTRATOS ESTATALES U OTROSÍ** *"La modificación contractual o los cambios estipulados inicialmente en el clausulado dl contrato o bien sea porque RED SALUD CASANARE E.S.E., lo considere pertinente o a solicitud del contratista (...)"*

6) Que, en la Resolución 692 de 2021 *"Por la cual se expide el Manual de Contratación de la entidad conforme al Estatuto de Contratación expedido por la Junta Directiva mediante el Acuerdo No 007 de 2021".* en su **Artículo 52.2 AMPLIACION DEL PLAZO O PRORROGA**, hace referencia a una extensión o ampliación en el tiempo que inicialmente se había acordado para la ejecución del contrato, y finalmente el **Artículo 52.2.1. Numeral 1** dispone: *"La manifestación escrita del contratista en la que conste su solicitud justificada de prórroga. No obstante, lo anterior Red Salud Casanare E.S.E., podrá tener la iniciativa de prorrogar el contrato la cual debe ser plasmada en el formato de solicitud de modificación de contrato justificando la necesidad"*

7) Que una vez analizada la solicitud se considera pertinente la **PRORROGA No 01** al **CONTRATO DE OBRA No No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026**. En consecuencia, se procede a realizar el mencionado **PRORROGA No 01** en los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA — PRORROGA No. 01: El tiempo que se procede a prorrogar mediante el presente acuerdo será de **UNO (01) MES**, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución inicial del contrato principal.

CLÁUSULA SEGUNDA — VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad persiste.

CLAUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: Para la validez y perfeccionamiento del presente contrato se requiere: 1. Firma de las partes.. 2. Ampliación, presentación y aprobación de las garantías exigidas en el contrato.

CLAUSULA CUARTA — GARANTÍAS. El contratista se obliga a ampliar las vigencias de la póliza de cumplimiento constituida para amparar los riesgos en las mismas coberturas que al respecto consagro la garantía única

CLAUSULA QUINTA. — SUSCRIPCIÓN: Las actuaciones de los Usuarios en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II https://www.colombiacompra.qov.co/secop/ comprometen a la Entidad Compradora y al Proveedor. La autenticación en el SECOP II con el nombre de Usuario y la contraseña es una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que lo reglamentan, conforme se establece en los términos y condiciones de uso del SECOP II dispuesto en la dirección electrónica https://www.colombiacompra.qov.co/secop/terminos-y-condiciones

CLÁUSULA SEXTA — ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ELECTRÓNICO Con la aceptación de las partes en el portal transaccional del SECOP II, dispuesto en la dirección electrónica https://www.colombiacompra.qov.co/secop/ las partes declaran conocer y aceptar todas las condiciones del contrato electrónico y las cláusulas adicionales pactadas en este anexo al contrato electrónico.

FIRMADO A TRAVÉS DE SECOP II.

SSB DESARROLLO S.A.S.

Nit: 901782753-0

INTER-SSB-069-2026

RedSalud

Comunicaciones Recibidas
Número: R-2026-9703
Fecha: 17/jun/2026 04:45 PM
Dependencia: Oficina Asesora de Planeación, Mercadeo y Sistemas
Serie: Contratos de Obra
Anexos: SI 1CP
No. Folios:
"Las solicitudes que lleguen después del horario establecido se tramitarán al día siguiente hábil." (Art. 62 Ley 4 1913)(Art. 70 Cod. Civil)(Art. 54 Proc. Adm.)
siged

Sabanalarga, 17 de junio de 2026

Señores:

Red Salud Casanare E.S.E.
Calle 9 No 24-75
Yopal – Casanare

ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación, Mercadeo y Sistemas
En calidad de Supervisora

IVÁN DARIO HERRERA TRONCOSO
Profesional Contratado – Apoyo a la Supervisión
MANNING SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA N°1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026

SSB DESARROLLO S.A.S., identificada con Nit. 901.782.753-0, en calidad de contratista del Contrato de Interventoría No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026, cuyo objeto corresponde a la "LOTE 08. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SINAI, CASIRVA Y SABANALARGA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE", se permite solicitar la **PRÓRROGA No. 01 al plazo de ejecución contractual por el término de treinta (30) días calendario**.

La presente solicitud se realiza en consideración a que el CONTRATO DE OBRA No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 556-2026, objeto de seguimiento por parte de esta interventoría, requiere ampliación de su plazo contractual hasta el día veintiséis (26) de julio de 2026, con el propósito de garantizar la culminación integral de las actividades pendientes y la adecuada entrega funcional del proyecto.

SSB
DESARROLLO S.A.S.

Nit: 901782753-0

En consecuencia, y teniendo en cuenta que las obligaciones de seguimiento, control, verificación y acompañamiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental de la interventoría deben mantenerse durante todo el periodo de ejecución del contrato de obra y hasta su terminación, por ende, se hace necesario ampliar el plazo del contrato de interventoría en iguales condiciones y por el mismo término solicitado para el contrato principal.

Así mismo, la presente solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar la continuidad del seguimiento integral al proyecto, el control permanente de las actividades pendientes, la verificación de calidad y el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales derivadas de la ejecución de la obra intervenida.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita autorizar la PRÓRROGA No. 01 del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026 por el término de treinta (30) días calendario, estableciendo como nueva fecha de terminación contractual el día veintiséis (26) de julio de 2026.

SSB
DESARROLLO S.A.S.

Cordialmente,

LORENA ALEJANDRA TORRES HERRÁN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
SSB DESARROLLO S.A.S.

SSB DESARROLLO S.A.S.

Nit: 901782753-0

INTER-SSB-069-2026

RedSalud

Comunicaciones Recibidas
Número: R-2026-9703
Fecha: 17/jun/2026 04:45 PM
Dependencia: Oficina Asesora de Planeación, Mercadeo y Sistemas
Serie: Contratos de Obra
Anexos: SI 1CP
No. Folios:
"Las solicitudes que lleguen después del horario establecido se tramitarán al día siguiente hábil." (Art. 62 Ley 4 1913)(Art. 70 Cod. Civil)(Art. 54 Proc. Adm.)
siged

Sabanalarga, 17 de junio de 2026

Señores:

Red Salud Casanare E.S.E.
Calle 9 No 24-75
Yopal – Casanare

ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación, Mercadeo y Sistemas
En calidad de Supervisora

IVÁN DARIO HERRERA TRONCOSO
Profesional Contratado – Apoyo a la Supervisión
MANNING SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA N°1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026

SSB DESARROLLO S.A.S., identificada con Nit. 901.782.753-0, en calidad de contratista del Contrato de Interventoría No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026, cuyo objeto corresponde a la "LOTE 08. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SINAI, CASIRVA Y SABANALARGA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE", se permite solicitar la **PRÓRROGA No. 01 al plazo de ejecución contractual por el término de treinta (30) días calendario**.

La presente solicitud se realiza en consideración a que el CONTRATO DE OBRA No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 556-2026, objeto de seguimiento por parte de esta interventoría, requiere ampliación de su plazo contractual hasta el día veintiséis (26) de julio de 2026, con el propósito de garantizar la culminación integral de las actividades pendientes y la adecuada entrega funcional del proyecto.

SSB
DESARROLLO S.A.S.

Nit: 901782753-0

En consecuencia, y teniendo en cuenta que las obligaciones de seguimiento, control, verificación y acompañamiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental de la interventoría deben mantenerse durante todo el periodo de ejecución del contrato de obra y hasta su terminación, por ende, se hace necesario ampliar el plazo del contrato de interventoría en iguales condiciones y por el mismo término solicitado para el contrato principal.

Así mismo, la presente solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar la continuidad del seguimiento integral al proyecto, el control permanente de las actividades pendientes, la verificación de calidad y el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales derivadas de la ejecución de la obra intervenida.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita autorizar la PRÓRROGA No. 01 del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026 por el término de treinta (30) días calendario, estableciendo como nueva fecha de terminación contractual el día veintiséis (26) de julio de 2026.

SSB
DESARROLLO S.A.S.

Cordialmente,

LORENA ALEJANDRA TORRES HERRÁN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
SSB DESARROLLO S.A.S.

SSB
DESARROLLO S.A.S.

Nit: 901782753-0

INTER-SSB-068-2026

Sabanalarga, 17 de junio de 2026

Señores:

Red Salud Casanare E.S.E.
Calle 9 No 24-75
Yopal – Casanare

ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación, Mercadeo y Sistemas
En calidad de Supervisora

IVÁN DARIO HERRERA TRONCOSO
Profesional Contratado – Apoyo a la Supervisión
MANNING SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S.

ASUNTO: REMISIÓN CONCEPTO FAVORABLE Y SOLICITUD DE TRÁMITE DE PRÓRROGA N°1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 556-2026

SSB
DESARROLLO S.A.S.

Por medio del presente, y en atención a la solicitud presentada por el contratista UNIÓN TEMPORAL ADECUACIONES PAPS SÁCAMA, esta interventoría se permite remitir para su revisión y trámite correspondiente el concepto técnico, administrativo y jurídico mediante el cual se emite **AVAL FAVORABLE A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA NO. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 556-2026**, cuyo objeto corresponde a la "LOTE 08. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SINAI, CASIRVA Y SABANA LARGA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Se precisa que el plazo contractual vigente tiene como fecha de terminación el día veintiséis (26) de junio de 2026 y, conforme a la solicitud presentada y al análisis efectuado por esta interventoría, se considera procedente otorgar una prórroga por el término de treinta (30) días calendario, estableciendo

SSB
DESARROLLO S.A.S.

Nit: 901782753-0

como nueva fecha de terminación contractual el día veintiseis (26) de julio de 2026.

Lo anterior, teniendo en cuenta las circunstancias logísticas evidenciadas durante la ejecución contractual, siendo la principal, la escases del suministro de insumos, las cuales han incidido en el normal desarrollo de actividades críticas de obra.

En consecuencia, esta interventoría considera técnica y contractualmente procedente la ampliación del plazo solicitado, con el fin de garantizar la adecuada culminación de las actividades pendientes, preservar las condiciones de calidad y seguridad requeridas para este tipo de infraestructura y asegurar la correcta entrega funcional del proyecto.

En tal sentido, se remite adjunto el respectivo concepto de interventoría para los fines pertinentes y trámite correspondiente ante la entidad.

Cordialmente,

SSB
DESARROLLO S.A.S.

LORENA ALEJANDRA TORRES HERRÁN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
SSB DESARROLLO S.A.S.

SSB
DESARROLLO S.A.S.

Nit: 901782753-0

INTER-SSB-067-2026

Sabanalarga, 17 de junio de 2026

Señores:

Red Salud Casanare E.S.E.
Calle 9 No 24-75
Yopal – Casanare

ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación, Mercadeo y Sistemas
En calidad de Supervisora

IVÁN DARIO HERRERA TRONCOSO
Profesional Contratado – Apoyo a la Supervisión
MANNING SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S.

ASUNTO: CERTIFICACIÓN Y AVAL TÉCNICO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA N°1 AL CONTRATO DE OBRA No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 556-2026

SSB DESARROLLO S.A.S.

SSB DESARROLLO S.A.S, con Nit. 901.782.753-0, R/L MELISA BARRAGÁN ÁVILA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.118.559.937 de Yopal - Casanare CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026, cuyo objeto corresponde a la "LOTE 08. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SINAI, CASIRVA Y SABANALARGA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE", esta interventoría se permite emitir el siguiente:

La presente interventoría **CERTIFICA Y AVALA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA LA PRÓRROGA No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 556-2026**, cuyo objeto corresponde a: "LOTE 08. ADECUACIÓN MENOR DE LOS

SSB DESARROLLO S.A.S.

Nit: 901782753-0

PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SINAI, CASIRVA Y SABANA LARGA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Lo anterior, conforme al seguimiento, control y verificación efectuado por esta interventoría sobre la ejecución contractual, el avance físico de obra, la programación vigente y las condiciones técnicas y operativas del proyecto, en cumplimiento de las obligaciones y funciones asignadas contractualmente relacionadas con el control del cronograma de ejecución, análisis de ampliaciones de plazo y emisión de conceptos sobre modificaciones contractuales.

De conformidad con la revisión efectuada, esta interventoría verificó que la ampliación del plazo contractual resulta procedente para garantizar la correcta culminación de las actividades pendientes, preservar las condiciones de calidad y seguridad requeridas contractualmente y asegurar la adecuada entrega funcional de la infraestructura intervenida.

Así mismo, se verificó que la ejecución del contrato se desarrolla sobre infraestructura destinada a la prestación de servicios de salud en funcionamiento, razón por la cual las actividades de obra deben desarrollarse bajo condiciones controladas y coordinadas con la operación asistencial, evitando afectaciones al cumplimiento del objeto misional de la entidad.

El presente aval se emite en cumplimiento de las funciones contractuales asignadas a esta interventoría relacionadas con el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico del contrato de obra, así como con el análisis de solicitudes de ampliación de plazo y emisión de conceptos sobre modificaciones contractuales, conforme a lo establecido en el clausulado contractual de interventoría.

Así mismo, esta interventoría considera que la presente ampliación del plazo contractual se encuentra orientada a garantizar el cumplimiento integral del objeto contratado, la correcta terminación de las actividades pendientes y la preservación de las condiciones de calidad, seguridad y funcionalidad requeridas contractualmente, en concordancia con los principios de planeación, responsabilidad, economía y continuidad del servicio que rigen la contratación estatal.

En consecuencia, y una vez verificada la trazabilidad técnica, administrativa y contractual de la ejecución del proyecto, esta interventoría considera

SSB DESARROLLO S.A.S.

Nit: 901782753-0

procedente y viable la presente prórroga, toda vez que la misma no modifica el objeto contractual inicialmente pactado, sino que permite garantizar su adecuada culminación dentro de condiciones técnicas y operativas satisfactorias.

En consecuencia, esta interventoría **CERTIFICA Y AVALA LA PRÓRROGA No. 01** por el término de treinta (30) días calendario, precisando que la fecha de terminación inicialmente establecida corresponde al día veintiséis (26) de junio del 2026 y que, con la presente ampliación, la nueva fecha de terminación contractual corresponderá al día veintiséis (26) de julio de 2026.

Para constancia, se firma en Yopal – Casanare, a los diecisiete (17) días del mes de junio de 2026.

Cordialmente,

LORENA ALEJANDRA TORRES HERRÁN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
SSB DESARROLLO S.A.S.

SSB DESARROLLO S.A.S.

Anexo: Solicitud de prórroga presentada por el contratista de obra, junto con sus respectivos soportes y anexos técnicos.

SSB DESARROLLO S.A.S.

Nit: 901782753-0

INTER-SSB-066-2026

Sabanalarga, 17 de junio de 2026

Señores
UNIÓN TEMPORAL ADECUACIONES PAPS SÁCAMA
Representante Legal
JEISSON JAVIER BECERRA PEDRAZA
C.C. 1.052.394.117 de Duitama

ASUNTO: CONCEPTO FAVORABLE Y APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRORROGA No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 556-2026

En atención a la solicitud de prórroga presentada por el contratista UNION TEMPORAL ADECUACIONES PAPS SACAMA, mediante oficio de fecha 17 de junio de 2026, relacionada con el CONTRATO DE OBRA No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 556-2026, cuyo objeto corresponde a "LOTE 08. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SINAI, CASIRVA Y SABANA LARGA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE", esta interventoría se permite informar que la misma CUMPLE DOCUMENTALMENTE con los soportes técnicos y administrativos requeridos para su trámite y evaluación por parte de la entidad.

Lo anterior, conforme a la revisión efectuada sobre los documentos allegados, entre ellos el informe de soporte, los documentos expedidos por proveedores y la reprogramación de obra aportada como sustento de la presente solicitud.

En consecuencia, esta interventoría APRUEBA DOCUMENTALMENTE la solicitud de Prórroga No. 01 por el término de treinta (30) días calendario, precisando que la fecha de terminación inicialmente establecida corresponde al día veinticuatro (26) de junio del 2026 y que, con la presente ampliación, la nueva fecha de terminación contractual corresponderá al día veinticinco (25) de julio del 2026.

Cordialmente,

LORENA ALEJANDRA TORRES HERRÁN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
SSB DESARROLLO S.A.S.

UNIÓN TEMPORAL
ADECUACIONES
PAPS SACAMA

Sacama, Casanare 11 de junio de 2026

INGENIERA:
LORENA ALEJANDRA TORRES HERRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
SSB DESARROLLO S.A.S
Yopal – Casanare

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N° **SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 556-2026,** QUE TIENE POR OBJETO: LOTE 08. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SINAI, CASIRVA Y SABANA LARGA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Asunto: Solicitud de Prórroga No. 01 al Contrato de Obra Pública No. SECOP II RSC-CP-007-2025 – Interno 556-2026

En mi calidad de representante legal de la UNIÓN TEMPORAL ADECUACIONES PAPS SACAMA, contratista del Contrato de Obra Pública No. SECOP II RSC-CP-007-2025 – Interno 556-2026, cuyo objeto corresponde a la adecuación menor de los puestos de atención primaria en salud (paps) de las veredas sinai, casirva y sabana larga del municipio de sácama, departamento de Casanare, me permito solicitar formalmente una prórroga al plazo contractual por un término de treinta días (30) días calendario.

La presente Solicitud de la Prórroga N°1, tiene como finalidad exponer el estado actual de ejecución del proyecto, el avance físico alcanzado a la fecha y las circunstancias técnicas, operativas y externas que han incidido en el desarrollo de las actividades contratadas, justificando la necesidad de ampliar el plazo contractual inicialmente establecido. Lo anterior con el propósito de garantizar la culminación integral del objeto contractual, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los estándares de calidad exigidos y las obligaciones pactadas dentro del contrato.

Durante la ejecución contractual, hemos desarrollado las actividades programadas conforme a las condiciones vigentes del proyecto, interviniendo cada uno de los Puntos de Atención Primaria en Salud (PAPS) de las veredas, Sabana Larga, Casirva y Sinai, de acuerdo con la programación de obra aprobada por la interventoría. Asimismo, se han dispuesto los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para dar cumplimiento a las metas establecidas dentro del cronograma contractual.

No obstante, y pese a los esfuerzos operativos implementados para mantener el ritmo de ejecución previsto en cada uno de los frentes de trabajo, se nos han presentado situaciones ajenas al control afectando el rendimiento esperado de algunas actividades críticas del proyecto. Entre estas circunstancias se destaca principalmente la fuerte temporada invernal que afecta actualmente la región y que tuvo inicio durante el mes de abril del presente año. Las continuas precipitaciones han generado afectaciones significativas en la infraestructura vial del municipio y de las vías terciarias de acceso a las veredas objeto de intervención, presentándose cierres parciales y temporales, pérdida de banca, deterioro de la carpeta de rodadura y dificultades de transitabilidad para el transporte de personal, equipos y materiales requeridos para la ejecución de las obras.

De igual manera, las condiciones climáticas adversas han ocasionado fallas e interrupciones recurrentes en el servicio de energía eléctrica en diferentes sectores del municipio, situación que ha impactado el normal desarrollo de actividades constructivas que dependen del uso de equipos y herramientas eléctricas, disminuyendo los rendimientos programados y generando retrasos en la ejecución de algunas actividades contempladas dentro del cronograma contractual.

Las situaciones anteriormente descritas corresponden a circunstancias externas, imprevisibles y ajenas al control del contratista, las cuales han incidido de manera directa en el desarrollo normal de las actividades de obra y han requerido la reprogramación de diferentes frentes de trabajo para garantizar la correcta ejecución del proyecto.

Las constantes precipitaciones han generado condiciones ambientales desfavorables para el desarrollo normal de diversas actividades constructivas, impactando directamente los tiempos de ejecución inicialmente proyectados.

De igual manera, se presentaron situaciones relacionadas con el orden público en corredores viales y zonas rurales de la región, las cuales ocasionaron restricciones temporales en la movilidad, disminución de los horarios efectivos de trabajo y retrasos en las actividades logísticas asociadas al abastecimiento de materiales e insumos necesarios para la obra.

Adicionalmente, se presentó una situación relacionada con el suministro de materiales e insumos indispensables para la correcta ejecución de las obras, particularmente la cubierta tipo sándwich contemplada dentro de las especificaciones técnicas del proyecto para los Puntos de Atención Primaria en Salud (PAPS) objeto de intervención. Debido a circunstancias ajenas al contratista, asociadas a la cadena de suministro del fabricante y proveedor, dificultades logísticas de transporte derivadas de la temporada invernal, así como demoras en los procesos de fabricación e importación de algunos componentes requeridos para la producción del material, no fue posible efectuar la entrega dentro de los plazos inicialmente programados.

Las situaciones anteriormente descritas han afectado de manera directa el desarrollo de actividades posteriores y complementarias que dependen de condiciones específicas para su ejecución. Entre ellas se encuentran los trabajos de pañete, estuco, instalación de enchapes, aplicación de pinturas y demás actividades de acabado, las cuales requieren que las superficies y muros se encuentren completamente secos y libres de humedad para garantizar la calidad, adherencia y durabilidad de los materiales empleados. La persistencia de las lluvias ha dificultado alcanzar las condiciones óptimas de secado requeridas para la ejecución de estas actividades, limitando la posibilidad de intervenir simultáneamente los diferentes espacios programados. De igual manera, el retraso en la instalación de la cubierta tipo sándwich generó una afectación significativa sobre la ruta crítica del proyecto, toda vez que un porcentaje considerable de las actividades subsiguientes dependía directamente de la culminación de este ítem para poder ser ejecutadas en condiciones adecuadas.

Es importante resaltar que hemos implementado medidas de mitigación orientadas a minimizar los impactos ocasionados por las circunstancias descritas, incluyendo la reorganización de actividades, la optimización de recursos disponibles y la ejecución simultánea de labores que técnicamente permitieran mantener la continuidad del proyecto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los factores expuestos y al impacto acumulado que estos han generado sobre la programación de obra, dichas medidas no han sido suficientes para recuperar completamente los tiempos afectados sin comprometer la calidad técnica de los trabajos ejecutados.

En consecuencia, y considerando que las causas que han generado los retrasos corresponden a circunstancias externas y no imputables nuestra programación, Por lo tanto, se nos hace necesario solicitar una ampliación del plazo contractual mediante la presente Prórroga N.º 1, permitiendo así culminar la totalidad de las actividades pendientes, garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual y efectuar la entrega final de las obras en condiciones óptimas de calidad, funcionalidad y conformidad con las especificaciones técnicas establecidas.

1. IMPACTO EN LA PROGRAMACIÓN

Como consecuencia de las circunstancias anteriormente descritas, se ha generado una afectación objetiva y verificable sobre el cronograma de ejecución contractual aprobado. Dichas situaciones han incidido directamente en el desarrollo normal de las actividades programadas, ocasionando una

disminución en el rendimiento esperado y por consiguiente, un desfase en el avance físico del proyecto.

De acuerdo con la programación vigente, para la fecha de presentación de la presente solicitud se tenía previsto alcanzar un avance físico acumulado del 80,21%. No obstante, como resultado de los factores externos expuestos, el avance real ejecutado corresponde al 62,45%, evidenciándose una diferencia de 17,76 puntos porcentuales respecto de la meta programada.

Este desfase obedece principalmente a las afectaciones derivadas de la temporada invernal, transitabilidad, orden público y a los retrasos presentados en el suministro de materiales e instalación de la cubierta tipo sándwich, actividades que impactaron directamente la ruta crítica del proyecto y limitaron la ejecución oportuna de varios procesos constructivos subsecuentes. En consecuencia, se configura una afectación significativa sobre la programación contractual, la cual hace necesario ajustar el plazo de ejecución con el fin de garantizar la terminación total de las actividades pendientes, sin comprometer la calidad técnica de las obras ni el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

Para demostrar cada una de las situaciones que generaron el atraso de la programación en cada uno de los frentes informamos lo siguiente:

De acuerdo con los reportes emitidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, la primera temporada de lluvias del año 2026 se extendió hasta mediados del mes de junio, generando precipitaciones persistentes en la región de la Orinoquía, particularmente en los departamentos de Casanare y Meta, (IDEAM, 2026); Así mismo la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA, reporta que el 20% de la jurisdicción permanece en alerta naranja en municipios de Cundinamarca como Choachí, Ubaque, Chipaque, Une, Fosca, Quetame, Guayabetal y Gutiérrez; en Casanare, Tauramena, Monterrey, Sabanalarga, Maní, Recetor, Chámeza, Yopal, Nunchía, La Salina y Sácama; en Arauca, Tame, Puerto Rondón, Fortul, Saravena y Arauca; y en Boyacá, Pajarito, Paya, Pisba y Labranzagrande, (CORPORINOQUIA, 2026)

Derrumbe provoca cierre total de la Vía Belén – Sácama; autoridades trabajan para restablecer el paso.

Continúa el cierre total en la vía que conecta a los municipios de Belén y Sácama departamento de Casanare, debido a un derrumbe registrado en el kilómetro 120, sec Sácama

Socavación del río Casanare provoca pérdida de banca en vía de acceso al municipio Las fuertes lluvias y la creciente del río Casanare continúan generando afectaciones en el norte del departamento. La Oficina de Gestión del Riesgo de Sácama reportó la pérdida de banca sobre la Ruta Nacional Los Libertadores, en el PR 13+0840, sector de la vereda La Colorada. Según el reporte, la emergencia se presenta por procesos de socavación ocasionados por el río Casanare, situación que compromete la estabilidad de la vía y afecta uno de los principales corredores de acceso al municipio y de conexión con otros departamentos. Ante el riesgo que representa esta afectación para la movilidad y la seguridad de los usuarios, desde el municipio se hizo un llamado a las entidades competentes para brindar atención prioritaria a la emergencia y adelantar las acciones necesarias que permitan mitigar el impacto y garantizar la transitabilidad en este importante corredor vial.

Con el objetivo de darle cumplimiento hemos desplegado acciones encaminadas a optimizar recursos, reorganizar actividades y mantener frentes de trabajo activos; sin embargo, las circunstancias descritas han impedido recuperar totalmente el tiempo perdido.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente se estudie y apruebe una prórroga de treinta (30) días calendario al plazo contractual, sin modificación del valor del contrato, con el fin de culminar la totalidad de las actividades contratadas en condiciones técnicas adecuadas y garantizando la calidad de las obras.

UNIÓN TEMPORAL
ADECUACIONES
PAPS SACAMA

Como soporte de la presente solicitud se anexan:

- Registro fotográfico de las afectaciones por lluvias.
- Reportes meteorológicos y/o noticias relacionadas con las condiciones climáticas. Bitácoras de obra.
- Cronograma vigente y cronograma reprogramado.
- Comunicaciones y certificaciones de proveedores sobre demoras en la entrega de materiales.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información adicional requerida.
Cordialmente,

UNION TEMPORAL ADECUACIONES PAPS SACAMA
Representante Legal, Contratista de obra
JEISSON JAVIER BECERRA PEDRAZA
utadecuacionespapsacama@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL
ADECUACIONES
PAPS SACAMA

INFORME DE SOLICITUD DE PRORROGA N°1

CONTRATO: SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 556-2026

OBJETO:
LOTE 08. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SINAI, CASIRVA Y SABANALARGA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL ADECUACIONES PAPS SACAMA
NIT. 902.021.598-4

YOPAL, JUNIO 2026

UNIÓN TEMPORAL
ADECUACIONES
PAPS SACAMA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 3

2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 4

3 LOCALIZACION GENERAL 6

3.1 LOCALIZACION DE LOS FRENTES DE OBRA 6

4. ASPECTO LEGAL. 9

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA. 9

4.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA INTERVENTORIA 10

5. GARANTIAS 10

6. MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PRORROGA 12

1. INTRODUCCION

El presente Informe No. 1 corresponde a la solicitud de prorroga en el marco del [IH1.1]Contrato de obra No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 556-2026 cuyo objeto es "LOTE 08. INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SINAI, CASIRVA Y SABANALARGA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE", y comprende el período de ejecución entre el 26 de Febrero del 2026 y el 11 de junio de 2026[IH2.1].

El informe consolida el avance de los PAPS, incluyendo aspectos generales, administrativos, financieros, técnicos, de control contractual, seguridad y salud en el trabajo, y manejo ambiental. En el componente técnico se evidencia la necesidad de ampliar el plazo contractual, considerando que durante el periodo de ejecución se han desarrollado actividades fundamentales para la adecuada planeación y preparación del proyecto, tales como visitas de reconocimiento, levantamiento arquitectónico, verificación de cantidades de obra, organización de personal, socialización del proyecto, transporte de materiales y demás labores preliminares. En este sentido, la solicitud de prórroga permitirá culminar de manera satisfactoria las actividades programadas, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de las obras y el alcance integral del objeto contractual.

Así mismo, se presenta el análisis del avance de obra comparando lo programado frente a lo ejecutado, así como el control de programación y soporte mediante informes semanales.
Se incluyen las novedades del período, el registro fotográfico, control de calidad de materiales, equipos utilizados y la bitácora de obra.

En cuanto a seguridad industrial, salud ocupacional y manejo ambiental, se verifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con afiliaciones, uso de elementos de protección personal y manejo adecuado de residuos.

Finalmente, se consignan con los anexos documentales que respaldan la información presentada.

2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

2.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Durante la ejecución del contrato de Obra No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 556-2026 cuyo objeto es "LOTE 08. INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SINAI, CASIRVA Y SABANALARGA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE", se han adelantado las actividades contempladas dentro del alcance del proyecto, manteniendo continuidad en los frentes habilitados para intervención y desarrollando labores orientadas al mejoramiento de la infraestructura existente de cada PAPS.

De acuerdo con la programación vigente, para la fecha de presentación de la presente solicitud se tenía un avance físico acumulado del 62.45%, evidenciando el desarrollo y ejecución de actividades relevantes para la consecución del objeto contractual. Este avance corresponde al desarrollo de actividades relacionadas con desmontes, adecuaciones preliminares, instalación y adecuación de cubierta, estructura metálica, instalación de canales, aplicación de acabados arquitectónicos, actividades de pañetes internos y externos, adecuaciones complementarias y demás actividades contempladas dentro del alcance contractual.

No obstante, pese al avance alcanzado y al cumplimiento de las actividades ejecutadas en las áreas actualmente intervenidas, durante el período de ejecución contractual se presentaron dificultades asociadas al suministro oportuno de algunos insumos y materiales indispensables para el desarrollo de las obras, particularmente en lo relacionado con el suministro e instalación de la cubierta tipo sándwich en los tres (3) Puntos de Atención Primaria en Salud (PAPS) objeto del contrato, así como en la disponibilidad de materiales para actividades de acabados, entre ellos pintura epóxica, pintura acrílica y estuco.

Estas situaciones incidieron directamente en el desarrollo normal de la programación de obra, toda vez que las actividades mencionadas hacen parte de la ruta crítica del proyecto y constituyen requisitos previos para la ejecución de otros procesos constructivos subsecuentes. En consecuencia, los retrasos presentados generaron una afectación en cadena sobre las actividades dependientes, limitando la continuidad de los frentes de trabajo y ocasionando un desfase en los tiempos inicialmente previstos dentro del cronograma contractual.

Adicionalmente, la instalación de la cubierta tipo sándwich reviste especial importancia dentro de la secuencia constructiva, ya que su culminación permite generar las condiciones adecuadas para la ejecución de actividades de acabados interiores, tales como estucos, pinturas y demás labores que requieren superficies protegidas y libres de humedad. Por tal razón, los inconvenientes presentados en el suministro e instalación de este elemento impactaron significativamente la ejecución de actividades posteriores, afectando el rendimiento general del proyecto y el cumplimiento de la programación establecida.


Por lo anterior y con el propósito de garantizar la terminación integral del proyecto, el cumplimiento del objeto contractual y la adecuada entrega de las infraestructuras intervenidas, se presenta la presente solicitud de ampliación del plazo contractual por el término requerido para culminar satisfactoriamente las actividades pendientes y asegurar la correcta ejecución de las obras contempladas dentro del contrato.

3 LOCALIZACION GENERAL


El proyecto de adecuación del Puesto de Atención Primaria en Salud (PAPS) se encuentra ubicado en las veredas: Casirva, Sabana Larga y Sinai, jurisdicción del municipio de Sacama departamento de Casanare. El área de intervención corresponde a un equipamiento institucional de carácter rural destinado a la prestación de servicios básicos de salud a la población de la vereda y sectores aledaños.

3.1 LOCALIZACION DE LOS FRENTES DE OBRA


PAPS EL SABANA LARGA

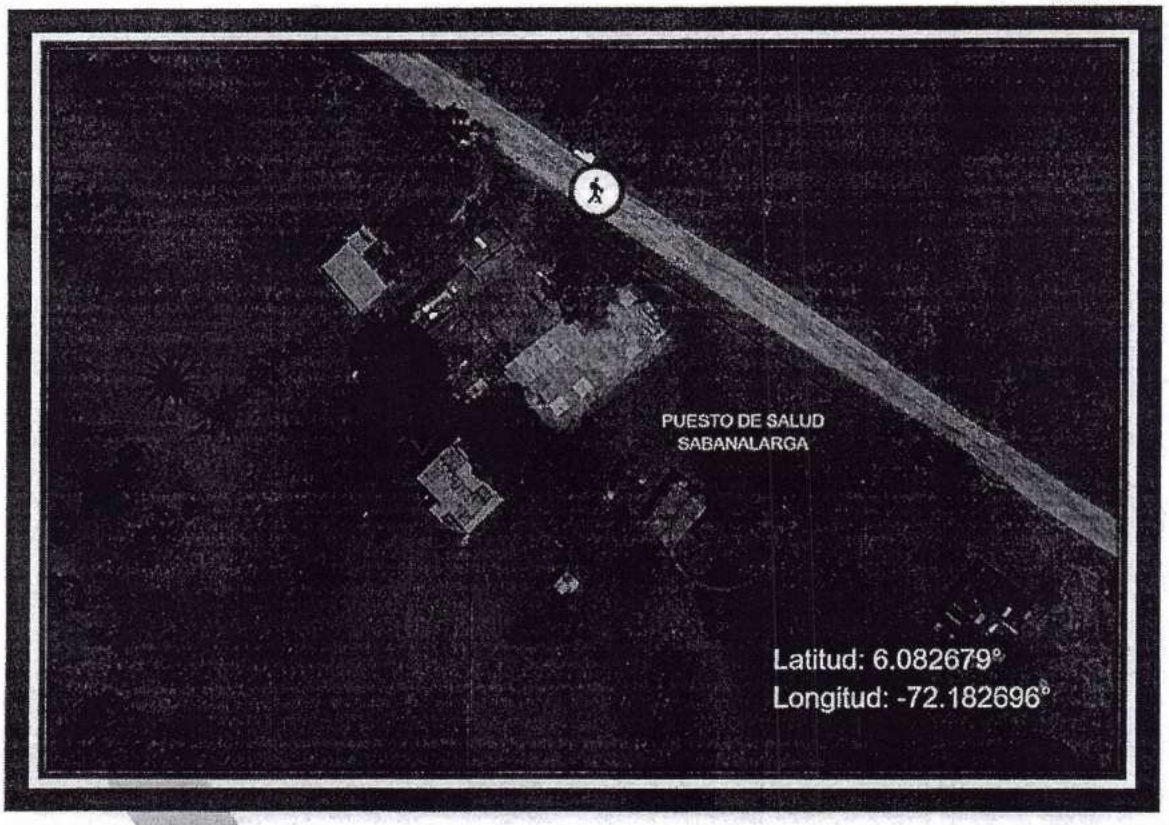

PAPS CASIRVA

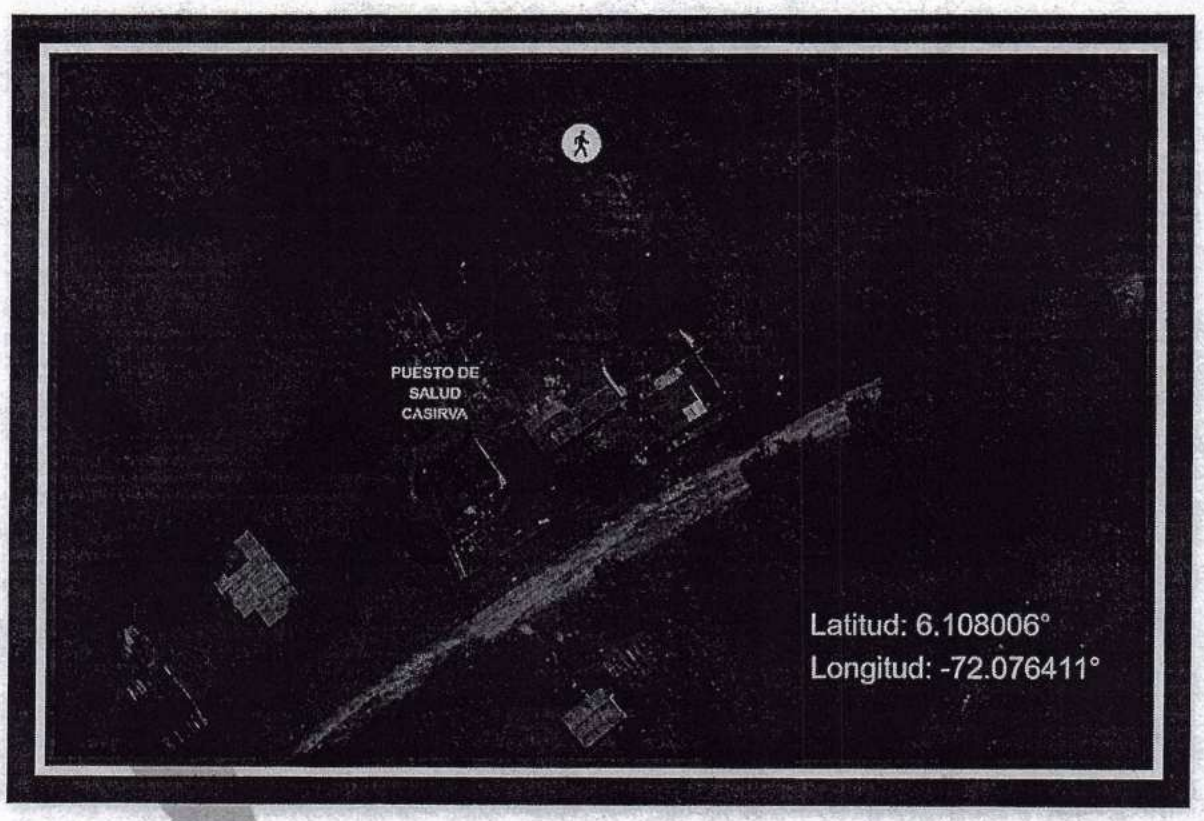
PUESTO DE
SALUD
CASIRVA
Latitud: 6.108006°
Longitud: -72.076411°

PAPS SINAI

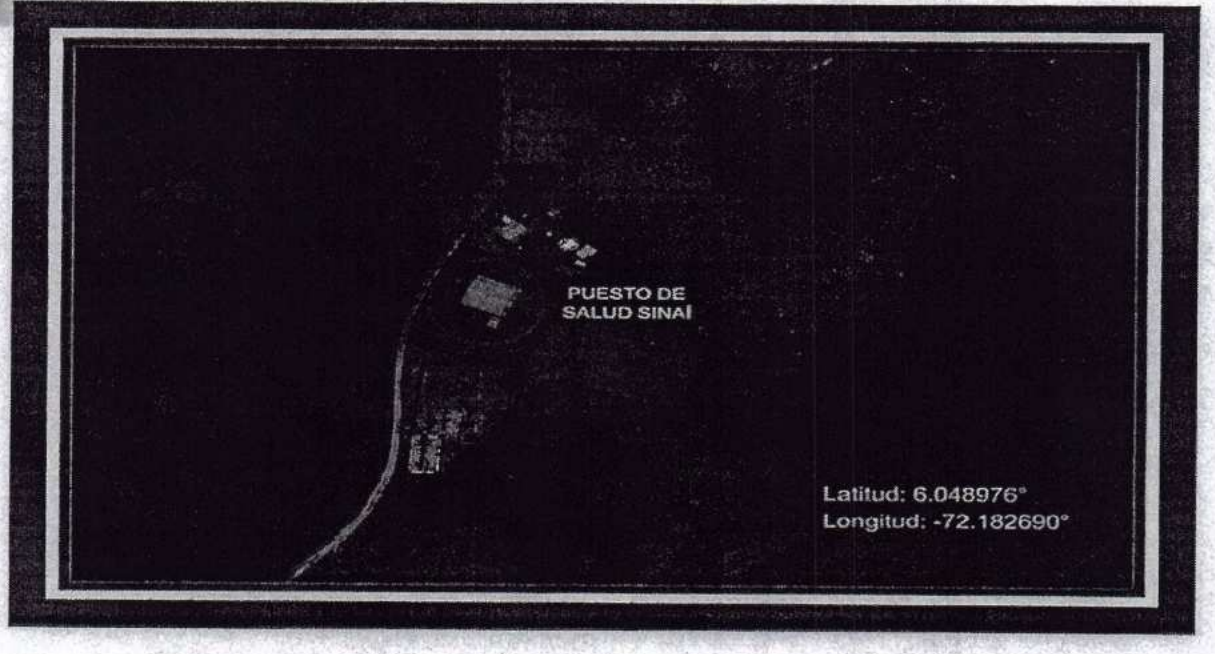
PUESTO DE
SALUD SINAÍ
Latitud: 6.048976°
Longitud: -72.182690°

4. ASPECTO LEGAL.

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO No:	SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 556-2026
OBJETO:	LOTE 08. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SINAI, CASIRVA Y SABANALARGA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR DEL PROYECTO:	SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($727.553.356,00).
VALOR CONTRATO PAPS VEREDA LA SABANA LARGA	$178.422.314.00
VALOR CONTRATO PAPS VEREDA EL CASIRVA	$256.405.863.00
VALOR CONTRATO PAPS VEREDA SINAI	$292.725.179.00
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ADECUACIONES PAPS SACAMA R./L JEISSON BECCERA PEDRAZA NIT. 902.021.598-4
CONTRATANTE	RED SALUD CASANARE E.S.E.
FECHA DE INICIO:	26 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	26 DE JUNIO DE 2026
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
INTERVENTORÍA:	SSB DESARROLLO S.A.S
SUPERVISIÓN	ANA DIONEIRA BUSTOS
APOYO A LA SUPERVISIÓN	MANNING SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S.
ESTADO DEL CONTRATO	ACTIVO

4.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA INTERVENTORIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE	RED SALUD CASANARE E.S.E.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 556-2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	SSB DESARROLLO S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	MELISSA BARRAGAN ÁVILA
C.C.	1.118.559.937 DE YOPAL
DIRECCIÓN	K5A 1-27 MZ D LO 30 – Brr paraíso Sabanalarga
TELÉFONO	3102499898
CORREO[IH3.1]	gerencia@ssanba.com
OBJETO:	LOTE 08. INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SINAI, CASIRVA Y SABANALARGA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($49.331.254,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÒN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE EJECUCIÓN.
ACTA DE INICIO	26 DE FEBRERO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE JUNIO DEL 2026
SUPERVISIÓN:	ANA DIONEIRA BUSTOS
APOYO A LA SUPERVISIÓN	MANNING SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S.
ESTADO DEL CONTRATO	ACTIVO

5. GARANTIAS

5.1 GARANTIAS DE OBRA

- CONTROL DE PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 561-2026

PÓLIZA DE GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO

PÓLIZA No.	ANEXO No.	RIESGO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
51-40-101011052	2	Cumplimiento del Contrato	26/02/2026	31/10/2026	$ 145,510,671.20
		Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Legales e Indemnizaciones Laborales	26/02/2026	30/06/2029	$ 145,510,671.20

PÓLIZA No.	ANEXO No.	RIESGO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
		Calidad del Servicio	26/02/2026	26/02/2031	$ 72,755,335.60
		Estabilidad de la obra	26/06/2026	26/06/2031	$ 145,510,671.20
		Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	26/02/2026	29/06/2027	$ 145,510,671.20

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

PÓLIZA No.	ANEXO No.	RIESGO	SUMA ASEGURADA
51-40-101011052	2	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 875.452.500,00
		RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$ 875.452.500,00
		BIENES BAJO CUIDADO TENDENCIA Y CONTROL	$ 875.452.500,00
		DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$ 875.452.500,00
		PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$ 875.452.500,00
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 875.452.500,00

5.2 GARANTIAS DE INTERVENTORIA

CONTROL DE PÓLIZAS SEGÚN MINUTA DE INTERVENTORÍA

POLIZAS PARA EL CONTRATO DE OBRA No SECOP II RSC-CP-005-2025					
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO					
COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	VIGENCIA		POLIZA No.	VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA		
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	23/01/2026	23/09/2026	COQ-100008298	$ 9.866.250,80
SEGUROS MUNDIAL	PRESTACIONES SOCIALES	23/01/2026	23/05/2029	COQ-100008298	$ 9.866.250,80
SEGUROS MUNDIAL	CALIDAD DEL SERVICIO	23/05/2026	23/05/2031	COQ-100008298	$ 4.933.125,40

PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO

POLIZAS PARA EL CONTRATO DE OBRA No SECOP II RSC-CP-005-2025					
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO					
COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	VIGENCIA		POLIZA No.	VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA		
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	26/02/2026	27/10/2026	COQ-100008298	$ 9.866.250,80

SEGUROS MUNDIAL	PRESTACIONES SOCIALES	26/02/2026	26/06/2029	COQ-100008298	$ 9.866.250,80
SEGUROS MUNDIAL	CALIDAD DEL SERVICIO	26/06/2026	26/06/2031	COQ-100008298	$ 4.933.125,40

6. MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PRORROGA

El presente informe tiene por finalidad exponer el estado actual del proyecto, el avance alcanzado a la fecha y las circunstancias que justifican la necesidad de ampliar el plazo inicialmente pactado, con el fin de garantizar la terminación integral del objeto contractual en condiciones adecuadas de calidad, oportunidad y cumplimiento.

Durante la ejecución contractual, como contratista hemos desarrollado las actividades programadas conforme a las condiciones vigentes del proyecto, interviniendo cada uno de los Puntos de Atención Primaria en Salud (PAPS) de acuerdo con la programación de obra aprobada por la interventoría. Asimismo, se han dispuesto los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para dar cumplimiento a las metas establecidas dentro del cronograma contractual.

Durante la ejecución contractual, hemos desarrollado las actividades programadas conforme a las condiciones vigentes del proyecto, interviniendo cada uno de los Puntos de Atención Primaria en Salud (PAPS) de las veredas, Sabana Larga, Casirva y Sinai, de acuerdo con la programación de obra aprobada por la interventoría. Asimismo, se han dispuesto los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para dar cumplimiento a las metas establecidas dentro del cronograma contractual.

No obstante, y pese a los esfuerzos operativos implementados para mantener el ritmo de ejecución previsto en cada uno de los frentes de trabajo, se nos han presentado situaciones ajenas al control afectando el rendimiento esperado de algunas actividades críticas del proyecto. Entre estas circunstancias se destaca principalmente la fuerte temporada invernal que afecta actualmente la región y que tuvo inicio durante el mes de abril del presente año. Las continuas precipitaciones han generado afectaciones significativas en la infraestructura vial del municipio y de las vías terciarias de acceso a las veredas objeto de intervención, presentándose cierres parciales y temporales, pérdida de banca, deterioro de la carpeta de rodadura y dificultades de transitabilidad para el transporte de personal, equipos y materiales requeridos para la ejecución de las obras.

De igual manera, las condiciones climáticas adversas han ocasionado fallas e interrupciones recurrentes en el servicio de energía eléctrica en diferentes sectores del municipio, situación que ha impactado el normal desarrollo de actividades constructivas que dependen del uso de equipos y herramientas eléctricas, disminuyendo los rendimientos programados y generando retrasos en la ejecución de algunas actividades contempladas dentro del cronograma contractual.

Las situaciones anteriormente descritas corresponden a circunstancias externas, imprevisibles y ajenas al control del contratista, las cuales han incidido de manera directa en el desarrollo normal de las actividades de obra y han requerido la reprogramación de diferentes frentes de trabajo para garantizar la correcta ejecución del proyecto.

Las constantes precipitaciones han generado condiciones ambientales desfavorables para el desarrollo normal de diversas actividades constructivas, impactando directamente los tiempos de ejecución inicialmente proyectados.

De igual manera, se presentaron situaciones relacionadas con el orden público en corredores viales y zonas rurales de la región, las cuales ocasionaron restricciones temporales en la movilidad, disminución de los horarios efectivos de trabajo y retrasos en las actividades logísticas asociadas al abastecimiento de materiales e insumos necesarios para la obra.

Adicionalmente, se presentó una situación relacionada con el suministro de materiales e insumos indispensables para la correcta ejecución de las obras, particularmente la cubierta tipo sándwich contemplada dentro de las especificaciones técnicas del proyecto para los Puntos de Atención Primaria en Salud (PAPS) objeto de intervención. Debido a circunstancias ajenas al contratista, asociadas a la cadena de suministro del fabricante y proveedor, dificultades logísticas de transporte derivadas de la temporada invernal, así como demoras en los procesos de fabricación e importación de algunos componentes requeridos para la producción del material, no fue posible efectuar la entrega dentro de los plazos inicialmente programados.

Las situaciones anteriormente descritas han afectado de manera directa el desarrollo de actividades posteriores y complementarias que dependen de condiciones específicas para su ejecución. Entre ellas se encuentran los trabajos de pañete, estuco, instalación de enchapes, aplicación de pinturas y demás actividades de acabado, las cuales requieren

que las superficies y muros se encuentren completamente secos y libres de humedad para garantizar la calidad, adherencia y durabilidad de los materiales empleados. La persistencia de las lluvias ha dificultado alcanzar las condiciones óptimas de secado requeridas para la ejecución de estas actividades, limitando la posibilidad de intervenir simultáneamente los diferentes espacios programados. De igual manera, el retraso en la instalación de la cubierta tipo sándwich generó una afectación significativa sobre la ruta crítica del proyecto, toda vez que un porcentaje considerable de las actividades subsiguientes dependía directamente de la culminación de este ítem para poder ser ejecutadas en condiciones adecuadas.

Es importante resaltar que hemos implementado medidas de mitigación orientadas a minimizar los impactos ocasionados por las circunstancias descritas, incluyendo la reorganización de actividades, la optimización de recursos disponibles y la ejecución simultánea de labores que técnicamente permitieran mantener la continuidad del proyecto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los factores expuestos y al impacto acumulado que estos han generado sobre la programación de obra, dichas medidas no han sido suficientes para recuperar completamente los tiempos afectados sin comprometer la calidad técnica de los trabajos ejecutados.

En consecuencia, y considerando que las causas que han generado los retrasos corresponden a circunstancias externas y no imputables nuestra programación, Por lo tanto, se nos hace necesario solicitar una ampliación del plazo contractual mediante la presente Prórroga N.° 1, permitiendo así culminar la totalidad de las actividades pendientes, garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual y efectuar la entrega final de las obras en condiciones óptimas de calidad, funcionalidad y conformidad con las especificaciones técnicas establecidas.

1. **IMPACTO EN LA PROGRAMACIÓN**

Como consecuencia de las circunstancias anteriormente descritas, se ha generado una afectación objetiva y verificable sobre el cronograma de ejecución contractual aprobado. Dichas situaciones han incidido directamente en el desarrollo normal de las actividades programadas, ocasionando una disminución en el rendimiento esperado y por consiguiente, un desfase en el avance físico del proyecto.

De acuerdo con la programación vigente, para la fecha de presentación de la presente solicitud se tenía previsto alcanzar un avance físico acumulado del 77,21%. No obstante, como resultado de los factores externos expuestos, el avance real ejecutado corresponde al 57,31%, evidenciándose una diferencia de 19,90 puntos porcentuales respecto de la meta programada.

Este desfase obedece principalmente a las afectaciones derivadas de la temporada invernal, transitabilidad, orden público y a los retrasos presentados en el suministro de materiales e instalación de la cubierta tipo sándwich, actividades que impactaron directamente la ruta crítica del proyecto y limitaron la ejecución oportuna de varios procesos constructivos subsecuentes. En consecuencia, se configura una afectación significativa sobre la programación contractual, la cual hace necesario ajustar el plazo de ejecución con el fin de garantizar la terminación total de las actividades pendientes, sin comprometer la calidad técnica de las obras ni el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

Para demostrar cada una de las situaciones que generaron el atraso de la programación en cada uno de los frentes informamos lo siguiente:

De acuerdo con los reportes emitidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, la primera temporada de lluvias del año 2026 se extendió hasta mediados del mes de junio, generando precipitaciones persistentes en la región de la Orinoquía, particularmente en los departamentos de Casanare y Meta, (IDEAM, 2026); Así mismo la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA, reporta que el 20% de la jurisdicción permanece en alerta naranja en municipios de Cundinamarca como Choachí, Ubaque, Chipaque, Une, Fosca, Quetame, Guayabetal y Gutiérrez; en Casanare, Tauramena, Monterrey, Sabanalarga, Maní, Recetor, Chámeza, Yopal, Nunchía, La Salina y Sácama; en Arauca, Tame, Puerto Rondón, Fortul, Saravena y Arauca; y en Boyacá, Pajarito, Paya, Pisba y Labranzagrande, (CORPORINOQUIA, 2026)

Derrumbe provoca cierre total de la Vía Belén – Sácama; autoridades trabajan para restablecer el paso.

Continúa el cierre total en la vía que conecta a los municipios de Belén y Sácama departamento de Casanare, debido a un derrumbe registrado en el kilómetro 120, sec Sácama

Socavación del río Casanare provoca pérdida de banca en vía de acceso al municipio

Las fuertes lluvias y la creciente del río Casanare continúan generando afectaciones en el norte del departamento. La Oficina de Gestión del Riesgo de Sácama reportó la pérdida de banca sobre la Ruta Nacional Los Libertadores, en el PR 13+0840, sector de la vereda La Colorada.
Según el reporte, la emergencia se presenta por procesos de socavación ocasionados por el río Casanare, situación que compromete la estabilidad de la vía y afecta uno de los principales corredores de acceso al municipio y de conexión con otros departamentos.
Ante el riesgo que representa esta afectación para la movilidad y la seguridad de los usuarios, desde el municipio se hizo un llamado a las entidades competentes para brindar atención prioritaria a la emergencia y adelantar las acciones necesarias que permitan mitigar el impacto y garantizar la transitabilidad en este importante corredor vial.

Con el objetivo de darle cumplimiento hemos desplegado acciones encaminadas a optimizar recursos, reorganizar actividades y mantener frentes de trabajo activos; sin embargo, las circunstancias descritas han impedido recuperar totalmente el tiempo perdido.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente se estudie y apruebe una prórroga de treinta (30) días calendario al plazo contractual, sin modificación del valor del contrato, con el fin de culminar la totalidad de las actividades contratadas en condiciones técnicas adecuadas y garantizando la calidad de las obras.

7. TIEMPO SOLICITADO

Con fundamento en las condiciones descritas anteriormente, se solicita aprobar una **PRORROGA por el termino de TREINTA (30) días calendario.**

CONCEPTO	FECHA
TERMINACION ACTUAL	26 DE JUNIO DE 2026
TIEMPO SOLICITADO	30 DIAS CALENDARIO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN[IH4.1]	25 DE JULIO DE 2026

8. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Dados los comunicados anexos de los proveedores, a los cuales hacemos referencia respecto al abastecimiento de los insumos descritos, se ha efectuado una nueva programación en función del tiempo estimado de entrega del material, sin que ello se traduzca en mayores retrasos para el proyecto. En consecuencia, y con el propósito de superar este inconveniente en la ejecución general de las obras, se han coordinado y ejecutado actividades pendientes que no se han visto afectadas por estas circunstancias, tales como: Instalación de cielo raso, pulida de pisos, instalación de enchapes de piso, raspado y resane correspondientes a un 7.85% de avance proyectado adicional en el periodo que corresponde del 11 de junio al 26 de junio. Dejando como actividades relacionadas con pinturas, ornamentaciones y otras propias de las actividades contractuales y así dar un 100% de ejecución del proyecto en el periodo del 26 de junio al 26 de julio del 2026.

9. COMPROMISOS

Con el fin de garantizar la continuidad del proyecto, optimizar el tiempo adicional y solicitado y asegurar la culminación satisfactoria de las actividades pendientes dentro del alcance contractual, se establecen los siguientes compromisos:

- Continuar con la ejecución de las actividades programadas dentro de las áreas actualmente habilitadas, manteniendo el ritmo de trabajo y garantizando el cumplimiento de los estándares técnicos establecidos.
- Presentar y ajustar el cronograma de obra conforme al plazo adicional solicitado, incluyendo la programación de las actividades pendientes.

- Disponer del personal técnico operativo y de los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento del nuevo plazo aprobado.
- Mantener actualizado el seguimiento físico y documental del proyecto mediante informes periódicos.
- Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, condiciones de seguridad y calidad durante la etapa restante de la ejecución.

10. CONCLUSIONES

Durante la ejecución del contrato se ha mantenido intervención constante en los diferentes PAPS de las veredas intervenidas, de acuerdo al plan de contingencia previamente informado a la entidad y anexo a la presente solicitud, sin embargo, se han presentado situaciones ajenas al normal desarrollo del proyecto, principalmente relacionados con la escasez de insumos y con las dificultades logísticas para su transporte y abastecimiento oportuno en el sitio de ejecución.

La falta de estos materiales generó un retraso puntual y significativo en la secuencia de actividades programadas, afectando la continuidad de las actividades de remates u obra blanca de acabados, esta situación incidió en la programación de obra, en el traslado de materiales, en la organización de los frentes de obra y en general en el rendimiento operativo previsto, impactando el avance integral del proyecto.

En consecuencia, desde el punto de vista técnico y administrativo, se considera procedente y necesaria la aprobación de una prórroga por el termino de treinta (30) días calendario, con el fin de culminar las actividades restantes, normalizar el cronograma y garantizar el cumplimiento total del objeto contractual.

Finalmente, la ampliación solicitada no implica modificación del alcance del contrato ni variación de las condiciones técnicas inicialmente establecidas

CARLOS IVAN ZAMBRANO
DIRECTOR DE OBRA





15 de mayo de 2026

Pronóstico de amenaza alta por deslizamientos de tierra en Sácama - Casanare

Localización: SÁCAMA - CASANARE

Descripción:

Pronóstico de amenaza alta por deslizamientos de tierra en Sácama - Casanare Esta alerta se emite con base en el monitoreo de condiciones meteorológicas (lluvias intensas o prolongadas) y la susceptibilidad del terreno a movimientos en masa; entendida la susceptibilidad como el grado de propensión que tiene el terreno para que ocurran los deslizamientos, con base en factores intrínsecos como son geología, geomorfología, cobertura de la tierra, pendiente del terreno, entre otros. Su objetivo es advertir a la población sobre pronóstico de la amenaza por deslizamientos de tierra.. Reportado por el IDEAM.

Otras Alertas

- Pronóstico De Amenaza Alta Por Deslizamientos De Tierra En San Luis De Gaceno - Boyacá
- Pronóstico De Amenaza Alta Por Incendios De La Cobertura Vegetal En Villapinzón - Cundinamarca
- Pronóstico De Amenaza Alta Por Deslizamientos De Tierra En Valledupar - Cesar
- Pronóstico De Amenaza Alta Por Incendios De La Cobertura Vegetal En Albania - La Guajira
- Pronóstico De Amenaza Alta Por Deslizamientos De Tierra En Lejanías - Meta

© 2014 Politicas de Privacidad y Condiciones de Uso

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres
Avenida Calle 26 No. 92-32
Edificio Gold - piso 2, Bogotá, Colombia
PBX: +571 5529696
Horario de Atención: lunes-viernes de 8 am a 5 pm
contactenos@gestiondelriesgo.gov.co
¿Cómo llegar?

Persisten los problemas por derrumbe en la vía Belén – Sácama: comun

NACIONAL

Persisten los problemas por de la vía Belén - Sácama: comunidad atención inmediata




Published 2 días ago on 13 junio, 2026
By **Juana Montoya**

Continúa el cierre total en la vía que conecta a los municipios de **Belén y Sácama** departamento de Casanare, debido a un derrumbe registrado en el kilómetro 120, sec Sácama. La emergencia también afecta el corredor vial que comunica con el municipi Salina, dificultando la movilidad de habitantes y transportadores de la región.

Tropicana

Persisten los problemas por derrumbe en la vía Belén – Sácama: comun

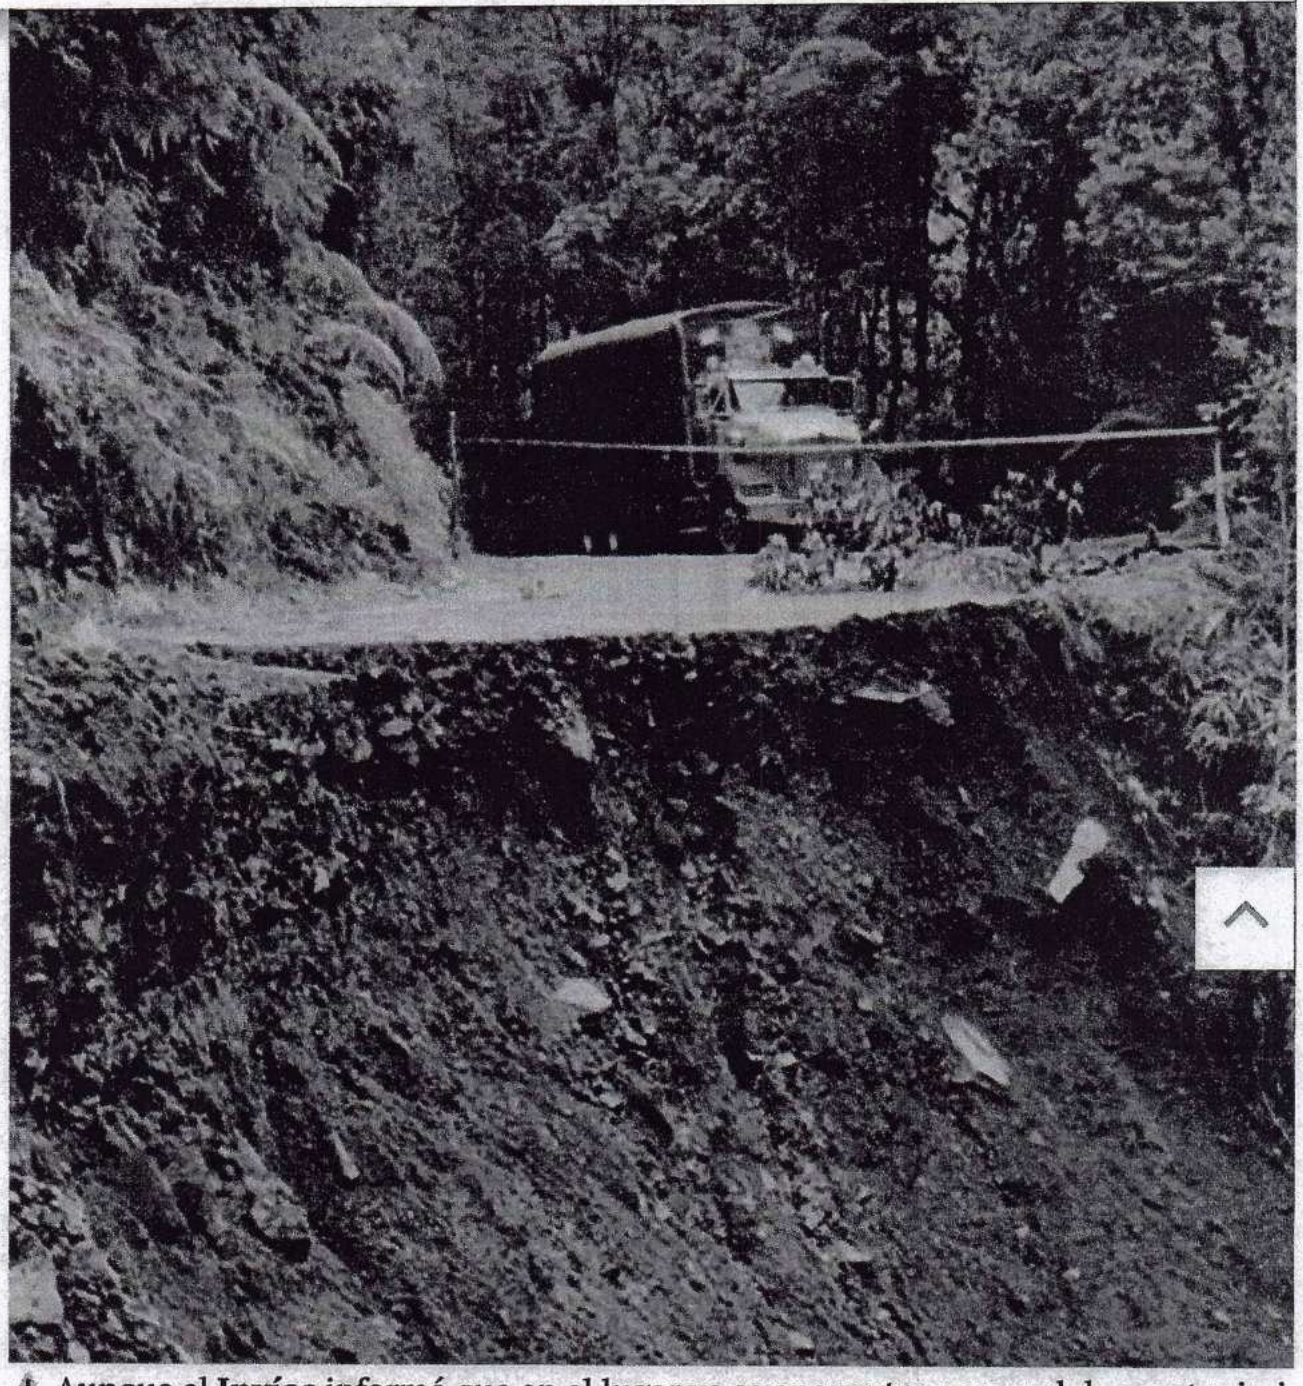

⚠️ Aunque el **Invías** informó que en el lugar ya se encuentra personal de mantenimie rutinario realizando trabajos manuales para retirar el material que bloquea la carrete alcalde de Sácama, **Fredy Avellaneda**, aseguró que la situación en el terreno es difer

🗣️ El mandatario local manifestó su preocupación y desmintió que se esté atendiend emergencia con los recursos necesarios, señalando que en la zona no se observa la pr

corredor para desplazarse y transportar productos.

Como medida temporal, el Invías habilitó la ruta alterna **Sogamoso – Aguazul – Paz de Ariporo – La Cabuya – Sácama.** Sin embargo, los ciudadanos han señalado que recorrido representa un trayecto mucho más extenso y costoso para poder llegar a la casanareña.

Mientras las comunidades esperan una intervención más contundente, aumenta la preocupación por el aislamiento que podría generar el cierre prolongado de esta impo vía del norte de Casanare.

RELATED TOPICS:

DON'T MISS

Un helado de $3.500 se convirtió en la pista clave para identificar a uno de los responsables del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

UP NEXT

Gobernador de Casanare viajará a Ar Saudita para buscar inversiones y fortalecer alianzas internacionales

YOU MAY LIKE


Persisten los problemas por derrumbe en la vía Belén – Sácama: comun

Sorprendente visita en Salento: cóndor andino fue captado alimentándose de truchas en una finca rural



Published 8 horas ago on 15 junio, 2026
By **Juana Montoya**

Un inusual avistamiento de un **cóndor andino** sorprendió a habitantes y turistas en ur zona rural de **Salento, Quindío**, luego de que el imponente animal descendiera hasta una truchera y fuera grabado mientras se alimentaba tranquilamente de varias truchas. Las imágenes rápidamente se hicieron virales en redes sociales por la cercanía del ave con las personas y la rareza del momento.



CONTINUE READING

NACIONAL

Cathy Juvinao criticó denuncias de Iván Cepeda contra De la Espriella y pidió

INICIO CASANARE JUDICIAL ENTRETENIMIENTO POLÍTICA ARAUCA BOYACA INTERNACIONALE

Tropicana

Persisten los problemas por derrumbe en la vía Belén – Sácama: comun

La representante a la Cámara **Cathy Juvinao** cuestionó las denuncias realizadas por el candidato presidencial **Iván Cepeda** en contra de **Abelardo de la Espriella**, en medio de tensión política que rodea la segunda vuelta presidencial en Colombia.





CONTINUE READING

JUDICIAL

Revelan nuevos detalles del presunto abuso infantil en Bogotá: extranjero implicado habría adoptado a los menor



Published 8 horas ago on 15 junio, 2026
By **Juana Montoya**

Continúan saliendo a la luz nuevos elementos del caso de presunto abuso sexual contra

Persisten los problemas por derrumbe en la vía Belén – Sácama: comun

CONTINUE READING

NOTICIAS POPULARES

JUDICIAL / 1 día ago

Rescatan a un menor tras denuncia de presunto abuso sexual en edificio residencial del norte de Bogotá

JUDICIAL / 3 días ago

Andrés Felipe Arias afirmó que De la Espriella tendría más del 90% de opciones de ganar la segunda vuelta, según simulaciones

CASANARE / 2 días ago

Gobernador de Casa Saudita para buscar fortalecer al

Persisten los problemas por derrumbe en la vía Belén – Sácama: comun



Persisten los problemas por derrumbe en la vía Belén – Sácama: comun

tropicana

Copyright © 2026 Tropicana Casanare

INICIO CASANARE ARAUCA META BOYACÁ NACIONALES

INTERNACIONAL

Derrumbe provoca cierre total de la Vía Belén – Sácama; autoridades trabajan para restablecer el paso

Por diariode — 13/06/2026 en Casanare, Municipios, Recientes, Yopal 0



993 Acciones vistas

Síguenos en Facebook Síguenos en X

de registrarse un derrumbe en el **PR 120+0900**, que afectó gravemente la movilidad en este importante corredor vial.

La emergencia, ocasionada por el desprendimiento de material sobre la calzada, obligó a restringir completamente el tránsito vehicular mientras se adelantan las labores de remoción y recuperación.

De acuerdo con la información suministrada, **maquinaria amarilla y personal operativo del Consorcio Vías Nacionales** trabajan intensamente en la zona para retirar el material que obstruye la carretera y restablecer las condiciones de seguridad para los usuarios. Estas labores se desarrollan en el marco del **Contrato de Obra 978 de 2021**, que contempla acciones de mantenimiento y atención de emergencias en este corredor vial que conecta varias poblaciones de Casanare y facilita la movilidad hacia departamentos vecinos.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para **evitar desplazamientos por el sector afectado** y atender las recomendaciones de los organismos encargados de la operación vial, mientras avanzan los trabajos de recuperación.

Como **alternativa temporal**, se encuentra habilitada la ruta **Sogamoso – Aguazul – Yopal – Paz de Ariporo – La Cabuya – Sácama**, corredor por el cual se recomienda movilizarse mientras se supera la emergencia.

Los organismos responsables continuarán monitoreando la situación y entregarán información actualizada sobre la reapertura de la vía una vez existan las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para el tránsito vehicular.

La situación genera preocupación entre **transportadores, comerciantes y habitantes de la región**, quienes dependen de esta carretera para el transporte de pasajeros, mercancías y productos agrícolas.

Etiquetas: #arauca #Belén #capital #casanare #colombia #comparte #EmergenciaVial
#GestiónDelRiesgo #gobernacióndecasanare #informacao #llanos
#Sácama #Transporte #VíasNacionales #yopal

las veces que sea necesario



diariode

Noticias de la Orinoquía Colombiana.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Comentario *

Nombre *

Correo electrónico * Web

☐ Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

Copyright © 2008 - 2026 /Siguenos en: @DiariodeCas - E-mail: contacto@diariodecasanare.com / Contacto: 310 284 1729 - Yopal - Casanare - Sur América.


ARAUCA DESTACADAS EMERGENCIA GENERALES NACIONAL ORINOQUIA PAZ DE ARIPORO

Desactivado artefacto explosivo colocado en la vía Tame – Sácama por hombres del ELN



Por **Oscar Manuel Mendez Garcia**

Feb 24, 2026

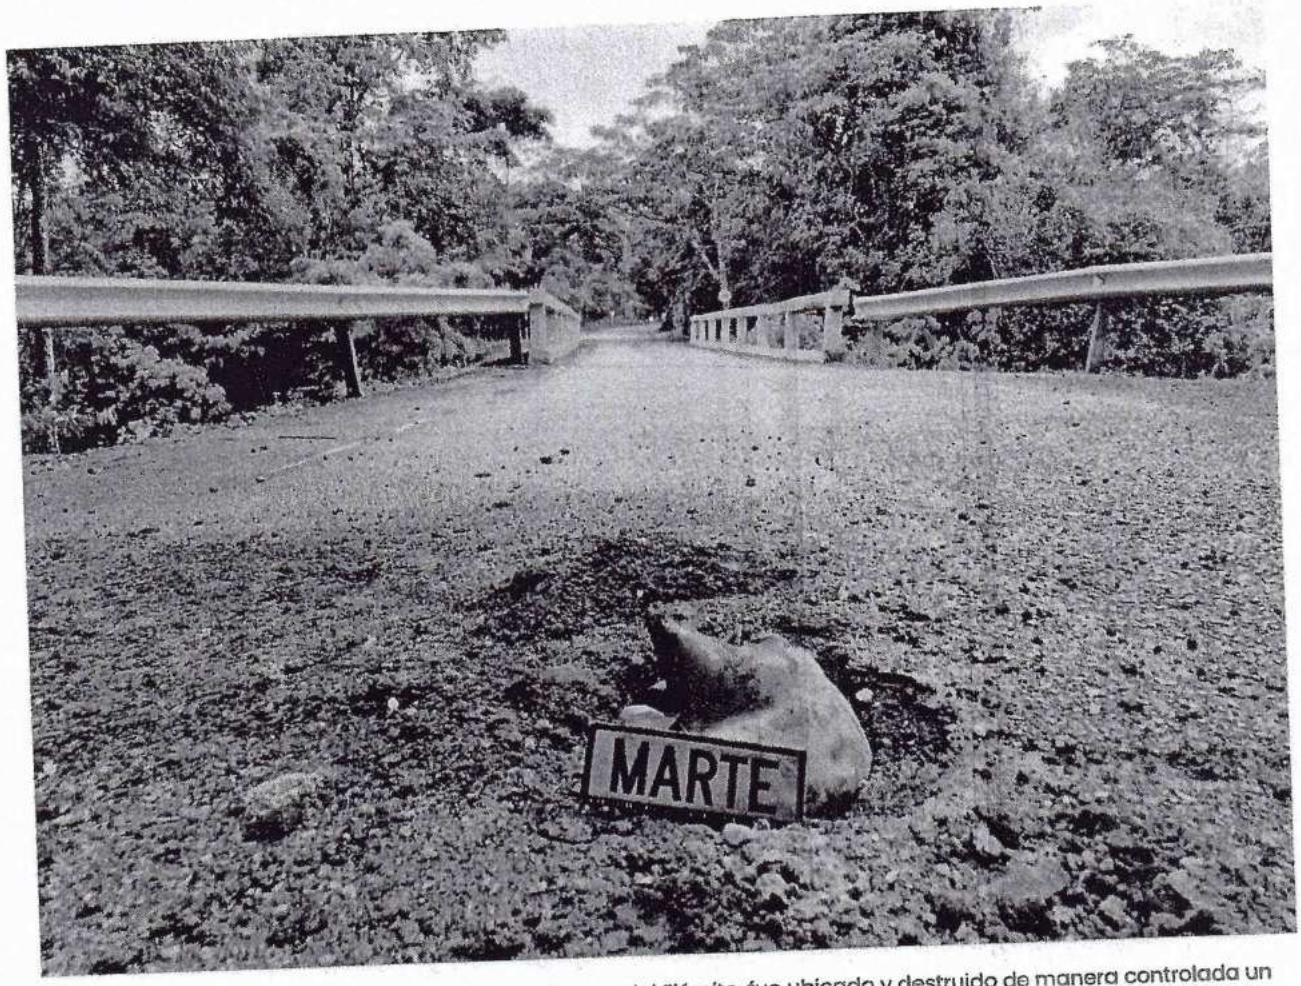

Gracias a la acción oportuna de las tropas de Tropas del Ejército, fue ubicado y destruido de manera controlada un artefacto explosivo que había sido instalado de forma indiscriminada por presuntos integrantes del ELN en la vía que comunica al municipio de Tame con Sácama, en el sector de Caño Zorro, en Arauca.

Este nuevo hallazgo confirma la reiteración de una práctica criminal por parte de este grupo armado organizado, que insiste en emplear artefactos explosivos sobre corredores viales estratégicos del departamento, exponiendo de manera permanente a la población civil y afectando la movilidad regional. No se trata de un hecho aislado, sino de una conducta sistemática orientada a generar temor.

La instalación de explosivos en una vía de tránsito frecuente constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, al poner en riesgo indiscriminado a campesinos, transportadores, familias y estudiantes que se movilizan diariamente por este eje vial.

Continuaremos fortaleciendo las operaciones militares y dispositivos de seguridad en la zona, con el propósito de proteger a la comunidad, preservar la movilidad y neutralizar cualquier acción criminal que atente contra la tranquilidad del territorio..

Fuente y Fotografía VIII División del Ejército

« Consejo de Juventudes y Administración Municipal definieron iniciativas prioritarias para las juventudes en Yopal

Organismos internacionales, voceros de partidos y veedores observaron prueba técnica de verificación de los bolígrafos que se utilizarán el 8 de marzo »



Por Oscar Manuel Mendez Garcia

Periodista Colombiano y Director del Portal Web www.radionoticiascasanare.com

Entrada relacionada

CASANARE DESTACADAS GENERALES POLITICA

Hugo Archila, coautor y ponente del proyecto de ley, ...

Jun 16, 2026 Oscar Manuel Mendez Garcia

BOYACA CASANARE DESTACADAS MOVILIDAD NOTICIAS CASANARE SEGURIDAD VIAL VIAS

Prueba piloto permitió reapertura parcial en la vía...

Jun 16, 2026 Oscar Manuel Mendez Garcia

CASANARE DESTACADAS NOTICIAS CASANARE ORIENTE SALUD YOPAL

91 niños fueron operados durante la jornada "Manos a ...

Jun 16, 2026 Oscar Manuel Mendez Garcia

Buscar Noticia

Buscar



Escucha nuestra Radio

ESCÚCHANOS ONLINE

Click aquí para escuchar en vivo

Síguenos en Facebook

Radio Noticias Casanare

Seguir página Compartir

VIVO

Radio Noticias Casanare
2 min

Radio Noticias Casanare
hace 2 minutos

Me gusta 1 Compartir

Radio Noticias Casanare
hace aproximadamente una hora

Te Puede Interesar

CASANARE DESTACADAS GENERALES POLÍTICA

Hugo Archila, coautor y ponente del proyecto de ley, y padrino de la comunidad TEA en Casanare, celebra un nuevo avance para las familias TEA

Jun 16, 2026 Oscar Manuel Mendez Garcia

BOYACA CASANARE DESTACADAS MOVILIDAD NOTICIAS CASANARE SEGURIDAD VIAL VÍAS

Prueba piloto permitió reapertura parcial en la vía San Luis de Gaceno – Santa María hacia Bogotá

Jun 16, 2026 Oscar Manuel Mendez Garcia

CASANARE DESTACADAS NOTICIAS CASANARE ORINOQUIA SALUD YOPAL

91 niños fueron operados durante la jornada "Manos a la Obra" realizada en el Hospital Regional de la Orinoquía

Jun 16, 2026 Oscar Manuel Mendez Garcia


CASANARE DESTACADAS JUDICIAL NOTICIAS CASANARE POLICÍA NACIONAL SEGURIDAD YOPAL

Incautan más de seis kilos de marihuana y cocaína en la vía Yopal–Paz de Ariporo

Jun 16, 2026 Oscar Manuel Mendez Garcia



Funciona gracias a WordPress | Tema: Newses por Themeansar.



radionoticiascasanare • Seguir

radionoticiascasanare #Sácama | Socavación del río Casanare provoca pérdida de banca en vía de acceso al municipio

Las fuertes lluvias y la creciente del río Casanare continúan generando afectaciones en el norte del departamento. La Oficina de Gestión del Riesgo de Sácama reportó la pérdida de banca sobre la Ruta Nacional Los Libertadores, en el PR 13+0840, sector de la vereda La Colorada.

Según el reporte, la emergencia se presenta por procesos de socavación ocasionados por el río Casanare, situación que compromete la estabilidad

4 Me gusta

5 de junio

Agrega un comentario... Publicar

ENERCA S.A E.S.P.

EL SUSCRITO LIDER DE ZONA NORTE DE LA EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.

Que revisados los registros técnicos del sistema de distribución local y los reportes del Centro de Control de la compañía, se constató la ausencia y afectación del servicio de energía eléctrica en las jurisdicciones urbanas y rurales de los municipios de **Sácama** y **La Salina**, departamento de Casanare, durante los periodos y bajo las condiciones técnico-ambientales que se detallan a continuación:

1. **Causa del Evento:** Una falla técnica originada por la ruptura del conductor de la Fase B en la línea de media tensión en el municipio de la salina sector el remanso que alimenta a las mencionadas municipalidades.
2. **Primer Periodo de Suspensión Total:** El servicio se interrumpió a partir del día **once (11) de junio de 2026**, desde las **11:40 a.m.**
3. **Restablecimiento Parcial:** Tras las maniobras iniciales, el servicio se normalizó de manera parcial el día **trece (13) de junio de 2026**, a partir de las **04:30 p.m.**
4. **Segundo Periodo de Suspensión:** El servicio debió suspenderse nuevamente el día **catorce (14) de junio de 2026**, desde las **06:00 a.m.** hasta las **07:32 p.m.** del mismo día, momento en el cual se logró la estabilización total del sistema.
5. **Justificación de la Demora en las Labores de Reparación:** El tiempo empleado por el personal técnico para la superación definitiva de la contingencia se derivó exclusivamente de factores externos de fuerza mayor, relacionados con:

    - La topografía altamente quebrada y de difícil geografía de la zona.
    - La gran altura de la vegetación y árboles que circundan el trazado de la línea de conducción en el municipio de la salina sector el remanso.
    - Las adversas condiciones climáticas propias de la zona de páramo.
    - Las severas restricciones de acceso terrestre hasta el punto exacto de la avería.

6. **Mitigación y Recursos:** Se deja constancia de que ENERCA S.A. E.S.P. dispuso y asignó de forma inmediata la totalidad de sus recursos humanos, operativos, técnicos y económicos disponibles con el fin de priorizar y agilizar el restablecimiento del servicio esencial en los municipios afectados.

La presente certificación se expide a solicitud del **Juzgado Municipal de Sácama**, en la fecha actual, con destino a los procesos legales y administrativos a los que haya lugar.

Dada en Paz de Ariporo, Casanare, a los dieciséis (16) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).

VICTOR MANUEL BAJICA LOPEZ
Lider de Zona Norte
Email: líder.zonanorte@enerca.com.co
Celular: 31103356409

UNIÓN TEMPORAL
ADECUACIONES
PAPS SACAMA

FLUJO DE CAJA

LOTE 08. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LA VEREDA SABANALARGA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

			JULIO			
		Valor	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21
1	ACTIVIDES PRELIMINARES					
1,1	Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte	$ 1,051,154.00	$ -	$ -		
1,2	Desmonte aparatos sanitarios	$ 73,695.00	$ -	$ -		
1,3	Desmonte de ventanas, con transporte	$ 171,644.00	$ -	$ -		
1,4	Desmonte marcos y puertas con transporte	$ 243,145.00	$ -	$ -		
1,5	Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias	$ 72,530.00	$ -	$ -		
1,6	Demolicion enchape muros con retiro	$ 251,752.00	$ -	$ -		
1,7	Desmonte de cielo raso con retiro	$ 830,182.00	$ -	$ -		
1,8	Desmonte correas	$ 404,985.00	$ -	$ -		
1,9	Demolicion a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro	$ 3,107,334.00	$ -	$ -		
1,10	Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4"	$ 102,664.00	$ -	$ -		
1,11	Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro	$ 60,131.00	$ -	$ -		
1,12	Demolicion manual de mesón en concreto A=0.60 m	$ 42,910.00	$ -	$ -		
1,13	Demolicion pañete muro, con retiro	$ 312,559.00	$ -	$ -		
1,14	Desmonte tableros electricos	$ 65,848.00	$ -	$ -		
2	PISOS Y ENCHAPES					
2,1	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	$ 1,852,683.00	$ 926,341.50	$ 926,341.50	$ -	$ -
2,2	Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye destronque, pulida y brillado a todo costo	$ 1,976,536.00	$ 1,976,536.00		$ -	$ -
2,3	Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.	$ 2,986,226.00	$ -	$ 1,493,113.00	$ 2,006,736.50	$ -
2,4	Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. Sumin e instal	$ 2,246,005.00	$ -	$ -	$ 2,246,005.00	$ -
2,5	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	$ 4,298,549.00	$ -	$ -	$ -	$ -
2,6	Guardaescoba en ceramica duropiso 33 x 7 cm. Suministro e instalacion	$ 1,142,564.00	$ -	$ -	$ 1,142,564.00	$ -
2,7	Mediacaña mortero imp 1:3 esmaltado 0.12*0.12m	$ 481,399.00	$ -	$ -	$ -	$ -
3	INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3,1	Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	$ 93,044.00	$ -	$ -	$ -	$ -
3,2	Tuberia presion PVC RDE 21 3/4". Suministro e instal.	$ 81,240.00	$ -	$ -	$ -	$ -
3,3	Punto agua fria PVC 1/2"	$ 801,152.00	$ -	$ -	$ -	$ -
3,4	Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 13 x 85 cm. Suministro e Instal.	$ 973,410.00		$ -	$ -	$ -

UNIÓN TEMPORAL ADECUACIONES PAPS SACAMA

FLUJO DE CAJA

LOTE 08. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LA VEREDA SABANALARGA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

			JULIO			
		Valor	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21
3,5	Espejo baño en plata 5 mm. Suministro e instal.	$ 234,677.00	$ -	$ -		$ -
3,6	Tanque elevado 1.000 lts con conexion y distribucion PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.	$ 1,351,065.00	$ -	$ -	$ -	$ -
3,7	Tuberia presion PVC RDE 21 1". Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	INSTALACIONES SANITARIAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4,1	Tuberia sanitaria PVC 2". Suministro e instal.	$ 170,870.00	$ -	$ -	$ -	$ -
4,2	Tuberia sanitaria PVC 3". Suministro e instal.	$ 475,457.00	$ -	$ -	$ -	$ -
4,3	Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	$ 660,735.00	$ -	$ -	$ -	$ -
4,4	Punto desagüe sanitario pvc 2" con sifon	$ 284,496.00	$ -	$ -	$ -	$ -
4,5	Punto desagüe sanitario pvc 3" con sifon	$ 1,268,830.00	$ -	$ -	$ -	$ -
4,6	Punto desagüe sanitario pvc 4" con sifon	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4,7	Excavacion manual en conglomerado	$ 147,744.00	$ -	$ -	$ -	$ -
4,8	Sistema septico Ovoide 2000 Lt (incluye:Tanque septico, Tanque anaerobico y Trampa de grasas)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	APARATOS SANITARIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5,1	Lavamanos de incrustar San Lorenzo blanco de corona con grifería de mesa tipo push	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5,2	Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e Instal.	$ 1,981,452.00	$ -	$ 1,981,452.00	$ -	$ -
5,3	Lavaplatos sencillo en acero inoxidable acabado satinado de 62x48 cm de empotrar + griferia Aluvia o similar, con acopl	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5.4	Meson en acero inoxidable basico con poceta 100 x 52 cm, griferia monocontrol, con desague. Suministro e Instal.	$ 350,565.00	$ -	$ -	$ -	$ -
5,4	Division para ducha en acrílico y aluminio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	MUROS Y ACABADOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6,1	Pañete impermeabilizado muros 1:3 espesor 2 cms, filos y dilataciones	$ 996,353.00	$ -	$ -	$ -	$ -
6,2	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	$ 3,483,331.00	$ -	$ -	$ -	$ -
6,3	Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6,4	Raspado superficie de muro pintado en vinilo	$ 867,897.00	$ -	$ -	$ -	$ -
6,5	Pintura acrilica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos	$ 1,923,059.00	$ -	$ -	$ -	$ -
6,6	Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	$ 1,498,265.00	$ -	$ -	$ -	$ -
6,7	Poyo en concreto 3000 psi 10x60 cm	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6.8	Mesones en concreto 3000 psi reforzado e=0.08 m A=0.60m acabado en granito pulido blanco	$ 609,510.00	$ -	$ -	$ -	$ -
7	CUBIERTA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

UNIÓN TEMPORAL ADECUACIONES PAPS SACAMA

FLUJO DE CAJA

LOTE 08. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LA VEREDA SABANALARGA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

			JULIO			
		Valor	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21
7,1	Correa metalica en perfil estructural rectangular 100 x 40 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7,2	Platina 0.10*0.10 m en lamina HR 1/8" con anclajes de 1/4". Suministro e instalacion	$ 1,808,896.00	$ -	$ -	$ -	$ -
7,3	Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 pintada a dos caras, poliuretano de e=38 mm. Suministro e instalación.	$ 26,944,755.00	$ -	$ -	$ -	$ -
7,4	Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m	$ 381,618.00	$ -	$ -	$ -	$ -
7,5	Cielo raso dry-wall plano con lámina gyplac RH antihumedad de 1/2" o 12.7mm o similar, pintado con 3 manos vinilo superlavable contra alto desgaste	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7,6	Canal en lamina galvanizada cal. 16 desarrollo 0.60 m pintado con wash primer y esmalte. Suministro e Instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7,7	Bajante A.LL. PVC 4"	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7,8	Viga cinta de 0.15 x 0.10 m en concreto de resistencia 3000 Psi	$ 5,940,735.00	$ -	$ -	$ -	$ -
8	ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8,1	Concreto ciclopeo de resistencia 2500 psi	$ 266,962.00	$ -	$ -	$ -	$ -
8,2	Acero de Refuerzo Grado 60	$ 2,649,417.00	$ -	$ -	$ -	$ -
8,3	Zapata en concreto impermeabilizado para cimentación resistencia de 3000 psi	$ 569,365.00	$ -	$ -	$ -	$ -
8,4	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	$ 301,043.00	$ -	$ -	$ -	$ -
8,5	Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.20 m.	$ 429,442.00	$ -	$ -	$ -	$ -
8,6	Alistado esmaltado impermeabilizado muros y placas e=3 mm	$ 83,547.00	$ -	$ -	$ -	$ -
9	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9,1	Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AWG concentrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion	$ 686,944.00	$ -	$ -	$ -	$ -
9,2	Suministro e instalación de medidor de energia, incluye: caja para medidor, medidor trifasico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

UNIÓN TEMPORAL ADECUACIONES PAPS SACAMA

FLUJO DE CAJA

LOTE 08. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LA VEREDA SABANALARGA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

			JULIO			
		Valor	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21
9,3	Suministro e instalación tablero trifásico de 12 circuitos, 220 V, Imáx de 150A, Isc 10 kA, con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios de montaje.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9,4	Interruptor Termomagnético Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador. Suministro e instalación	$ 343,574.00	$ -	$ -	$ -	$ -
9,5	Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalacion	$ 194,358.00	$ -	$ -	$ -	$ -
9,6	Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9,7	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijació	$ 2,212,098.00	$ -	$ -	$ -	$ -
9,8	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	$ 429,612.00	$ -	$ -	$ -	$ -
9,9	Modulo LED redondo 18W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijac	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9,10	Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 40W, 110 V. Incluye: Elementos de fijación, suministro e instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9,11	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica, terminales PVC y readecuación de muro.	$ 906,660.00	$ 906,660.00	$ -	$ -	$ -
9,12	Salida para interruptor Doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	$ 495,846.00	$ -	$ -	$ -	$ -
9,13	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metalica 5800 o 2400 incluye aparato	$ 3,502,100.00	$ 3,502,100.00	$ -	$ -	$ -
9,14	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9,15	Acometida en cable de cobre aislado {[3xN°8(F)]+ [1xN°8AWG(N)] + [1xN°10AWG(T)]} - THW 600 V 75°C. Suministro e instalación (TGD-1)	$ 394,801.00	$ -	$ 394,801.00	$ -	$ -

UNIÓN TEMPORAL ADECUACIONES PAPS SÁCAMA

FLUJO DE CAJA

LOTE 08. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LA VEREDA SABANALARGA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

			JULIO			
		Valor	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21
10	CARPINTERIA METALICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10,1	Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm instalada a todo costo	$ 3,120,000.00	$ -	$ -	$ 3,120,000.00	$ -
10,2	Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instal.	$ 7,497,687.00	$ -	$ -	$ 7,497,687.00	$ -
11	NO PREVISTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 01	Juego de barras de seguridad en L 24" x 35" para baño PMR. Suministro e Instal.	$ 771,544.00	$ -	$ -	$ -	$ 771,544.00
NP 02	Muro en bloque No. 5 arcilla tradicional de 0.12m (33x12x23)	$ 1,987,862.00	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 03	Rinconera en PVC media caña 0.09 m Sunministro e instal.	$ 461,446.00	$ 461,446.00	$ -	$ -	$ -
NP 04	Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	$ 466,451.00	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 05	Cerradura de doble seguridad de escudo pomo y cerrojo para entrada principal. Suministro e Instal.	$ 766,288.00	$ 766,288.00	$ -	$ -	$ -
NP 06	Columneta de 0.12 x 0.20 en concreto resistencia 3000 Psi sin refuerzo	$ 643,061.00	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 07	Correa metalica en perfil estructural rectangular 76 x 38 x 2.0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion	$ 5,889,924.00	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 08	Lavamanos blanco de colgar acuacer o similar con grifería monocontrol media cromada, incluye sifón flexible, desague, valvula reguladora y acople metalico. Instalacio	$ 1,177,347.00	$ 1,177,347.00	$ -	$ -	$ -
NP 09	Bajante acometida, zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 1-1/2", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit. Suministroe instalacion	$ 1,704,471.00	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 10	Excavacion manual en conglomerado	$ 71,820.00	$ 17,955.00	$ 17,955.00	$ -	$ -
NP 11	Canalizacion ducto conduit PVC 1 1/2", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de río	$ 266,226.00	$ -	$ 266,226.00	$ -	$ -
NP 12	Luminaria de emergencia tipo led 110V, 2.4W, autonomia minima 90 minutos. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	$ 519,936.00	$ -	$ 519,936.00	$ -	$ -


UNIÓN TEMPORAL ADECUACIONES PAPS SACAMA

FLUJO DE CAJA

LOTE 08. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LA VEREDA SABANALARGA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

			JULIO			
		Valor	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21
NP 13	Salida punto eléctrico para luminarias de sobreponer y/o incrustar sobre falso techo o placa, en tubo conduit EMT de 3/4", cableado libre de halógenos 1x12F + 1x12N + 1x12T, incluye: tubo EMT, caja metálica 5800 o 2400, terminales roscados, accesorios de	$ 8,532,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 14	Caja de inspeccion AP-280	$ 422,500.00	$ -		$ -	$ -
NP 15	Caja para medidor de energia, incluye: un medidor bifasico trifilar y breaker totalizador 2x20A, sistema de puesta a tierra. Suministr e Instalacio	$ 1,005,962.00	$ 1,005,962.00	$ -	$ -	$ -
NP 16	Luminaria tipo led hermética IP65, 2x18W, 3200 lm, Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	$ 412,254.00	$ -	$ 412,254.00	$ -	$ -
NP 17	Cortacircuito termomagnetico bipolar de 15-30A, 10kA, 120/240V. Suministro e instalacion	$ 70,200.00			$ -	$ -
NP 18	Cielo raso en lamina PVC 7 mm (incluye cornisa	$ 4,123,448.00	$ -	$ -	$ 4,123,448.00	$ -
NP 19	Pozo septico revestido en piedra 2 x 2 x 2, con losa en concreto 3000 psi	$ 3,425,180.00	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 20	Estuco plástico muros. Suministro e instal.	$ 1,496,753.00	$ 1,496,753.00			
TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 133,401,780.00	$ 12,237,389.00	$ 6,012,079.00	$ 20,136,441.00	$ 771,544.00
Administracion	23%	$ 30,682,409.40	$ 2,814,599.47	$ 1,382,778.17	$ 4,631,381.43	$ 177,455.12
Imprevisto	2%	$ 2,668,035.60	$ 244,747.78	$ 120,241.58	$ 402,728.82	$ 15,430.88
Utilidad	5%	$ 6,670,089.00	$ 611,869.45	$ 300,603.95	$ 1,006,822.05	$ 38,577.20
Total Obra		$ 173,422,314.00	$ 15,908,605.70	$ 7,815,702.70	$ 26,177,373.30	$ 1,003,007.20
Certificado Retie		$ 5,000,000.00	$ 227,272.73	$ 227,272.73	$ 227,272.73	$ 227,272.73
Costo Total Obra		$ 178,422,314.00	$ 16,135,878.43	$ 8,042,975.43	$ 26,404,646.03	$ 1,230,279.93
ACOMULADO SEMANAL%			**9.04%**	**4.51%**	**14.80%**	**0.69%**
ACOMULADO %			**80.00%**	**84.51%**	**99.31%**	**100.00%**


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**ACTIVIDES PRELIMINARES**	**0 días**	**sáb 27/06/2(**	**sáb 27/06/2(**	
2		Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte	0 días	sáb 27/06/2(	sáb 27/06/2(	
3		Desmonte aparatos sanitarios	0 días	sáb 27/06/2(	sáb 27/06/2(	
4		Desmonte de ventanas, con transporte	0 días	sáb 27/06/2(	sáb 27/06/2(	
5		Desmonte marcos y puertas con transporte	0 días	sáb 27/06/2(	sáb 27/06/2(	
6		Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias	0 días	sáb 27/06/2(	sáb 27/06/2(	
7		Demolicion enchape muros con retiro	0 días	sáb 27/06/2(	sáb 27/06/2(	
8		Desmonte de cielo raso con retiro	0 días	sáb 27/06/2(	sáb 27/06/2(	
9		Desmonte correas	0 días	sáb 27/06/2(	sáb 27/06/2(	
10		Demolicion a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro	0 días	sáb 27/06/2(	sáb 27/06/2(	
11		Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2,3,4	0 días	sáb 27/06/2(	sáb 27/06/2(	
12		Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2,3/4,1, 1 1/2 con retiro	0 días	sáb 27/06/2(	sáb 27/06/2(	
13		Demolicion manual de mesón en concreto A=0.60 m	0 días	sáb 27/06/2(	sáb 27/06/2(	
14		Demolicion pañete muro, con retiro	0 días	sáb 27/06/2(	sáb 27/06/2(	
15		Desmonte tableros electricos	0 días	sáb 27/06/2(	sáb 27/06/2(	
16		**PISOS Y ENCHAPES**	**10 días**	**sáb 27/06/2(**	**mié 08/07/2**	
17		Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	0 días	sáb 27/06/2(	sáb 27/06/2(	
18		Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye destronque, pulida y brillado a todo costo	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
19		Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.	10 días	sáb 27/06/2(	mié 08/07/2(	
20		Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco Plana de Corona o similar. Sumin e instal	5 días	vie 03/07/26	mié 08/07/26	19FC-5 días
21		Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 n	0 días	sáb 27/06/2(	sáb 27/06/2(	
22		Guardaescoba en ceramica duropiso 33 x 7 cm. Suministro e instalacion	0 días	sáb 27/06/2(	sáb 27/06/2(	

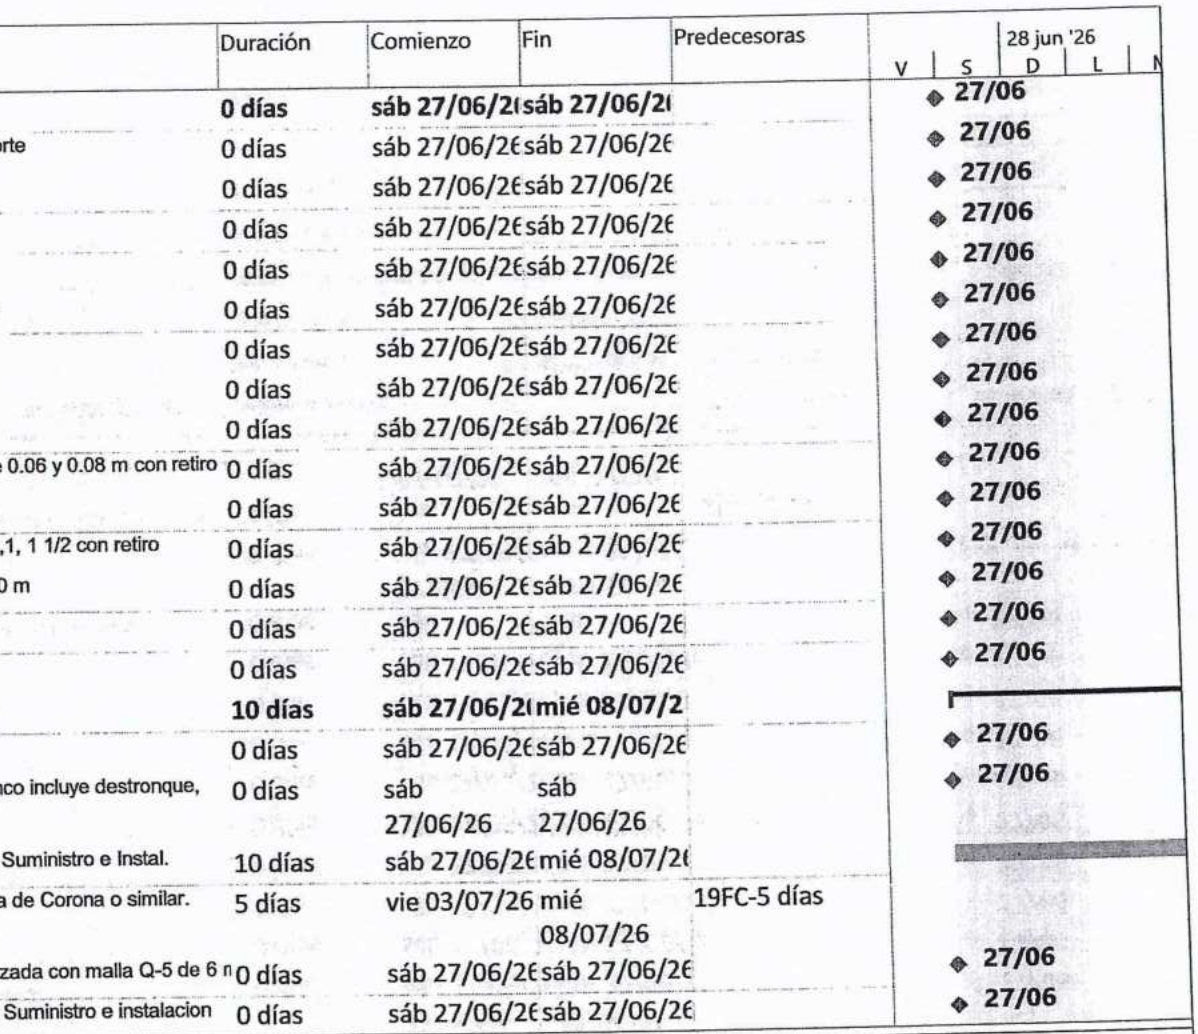

Proyecto: Diagrama sabanalarg
Fecha: mar 16/06/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
43		Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e Ins	1 día	mar 07/07/2	mié 08/07/2	20FC-2 días
44		Lavaplatos sencillo en acero inoxidable acabado satinado de 62x48 cm de empotrar + griferia Aluvia o similar, con acoples y desagüe. Suministro e Instal.	1 día	mar 07/07/26	mié 08/07/26	20FC-2 días
45		Meson en acero inoxidable basico con poceta 100 x 52 cm, griferia monocontrol, con desague. Suministro e Instal.	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
46		Division para ducha en acrílico y aluminio	0 días	sáb 27/06/2	sáb 27/06/2	
47		**MUROS Y ACABADOS**	**12 días**	**sáb 27/06/2**	**vie 10/07/26**	
48		Pañete impermeabilizado muros 1:3 espesor 2 cms, filos y dilataciones	5 días	mar 30/06/2	lun 06/07/26	51
49		Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	1 día	sáb 27/06/2	lun 29/06/26	
50		Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones	2 días	lun 06/07/26	mié 08/07/2	48
51		Raspado superficie de muro pintado en vinilo	2 días	sáb 27/06/2	mar 30/06/2	
52		Pintura acrilica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos	3 días	mié 08/07/2	vie 10/07/26	50
53		Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	3 días	sáb 27/06/2	mié 01/07/2	
54		Poyo en concreto 3000 psi 10x60 cm	0 días	sáb 27/06/2	sáb 27/06/2	
55		Mesones en concreto 3000 psi reforzado e=0.08 m A=0.60m acabado en granito pulido blanco	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
56		**CUBIERTA**	**2 días**	**sáb 27/06/2**	**mar 30/06/2**	
57		Correa metalica en perfil estructural rectangular 100 x 40 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
58		Platina 0.10*0.10 m en lamina HR 1/8 con anclajes de 1/4". Suministro e instalacion	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
59		Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 pintada a dos caras, poliuretano de e=38 mm. Suministro e instalación.	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	93
60		Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m	0 días	sáb 27/06/2	sáb 27/06/2	

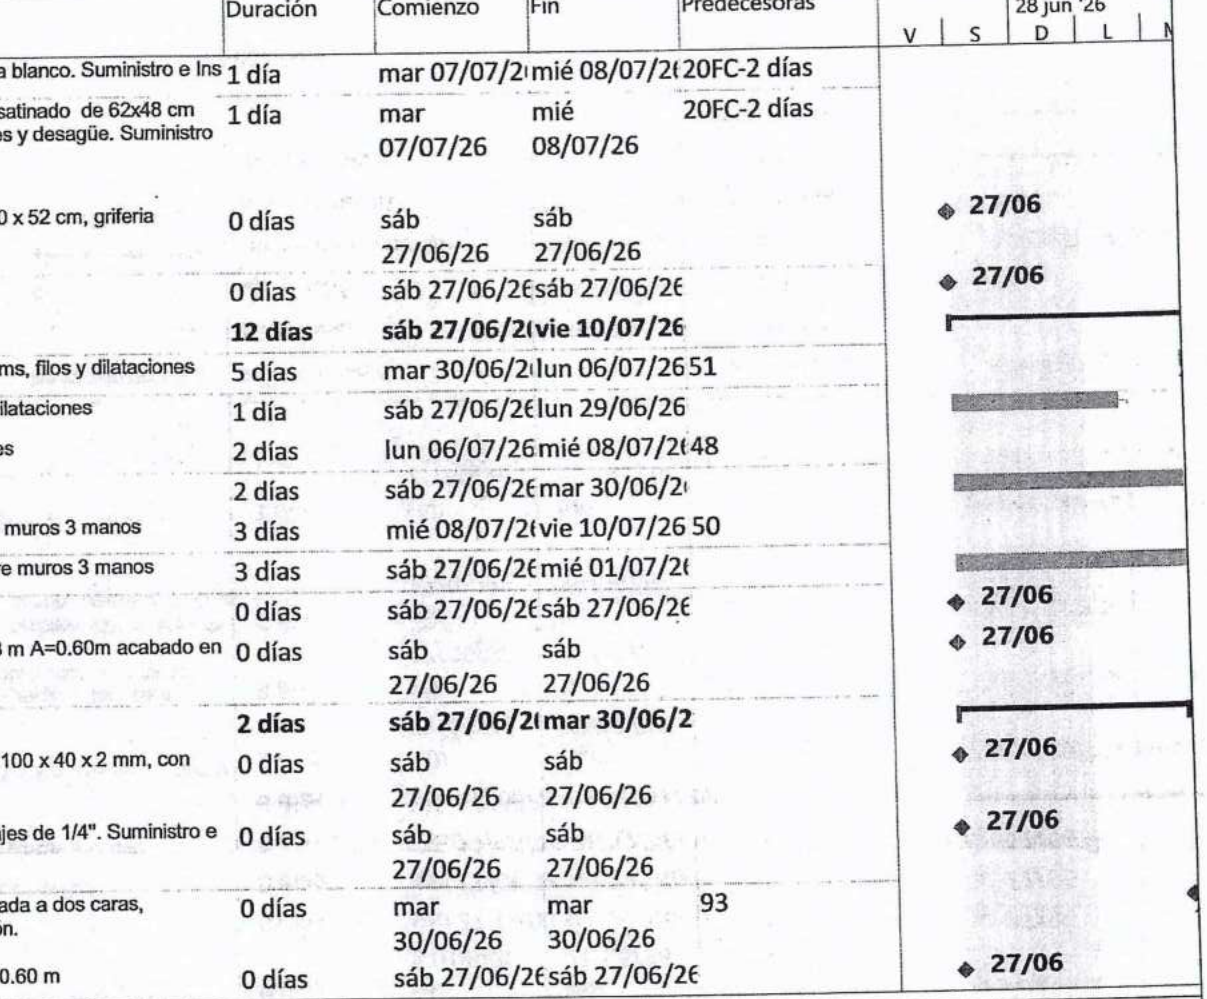

Proyecto: Diagrama sabanalarg
Fecha: mar 16/06/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
77		Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240V, 10kA, enchufable. Suministro e instalacion	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
78		Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia EMT 3/4, cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
79		Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
80		Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	3 días	mar 30/06/26	vie 03/07/26	73
81		Modulo LED redondo 18W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	4 días	mar 30/06/26	vie 03/07/26	73
82		Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 40W, 110 V. Incluye: Elementos de fijación, suministro e instalación	2 días	mar 30/06/26	jue 02/07/26	73
83		Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4, cable de cobre, caja metalica, terminales PVC y readecuación de muro.	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
84		Salida para interruptor Doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4, cable de cobre, caja metalica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
85		Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4, cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metalica 5800 o 2400 incluye aparato	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
86		Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4, cable de cobre	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
87		Acometida en cable de cobre aislado {[3xN°8(F)]+ [1xN°8AWG(N)] + [1xN°10AWG(T)]} - THW 600 V 75°C. Suministro e instalación (TGD-1)	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
88		**CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA**	**10 días**	**sáb 27/06/2**	**mié 08/07/2**	
89		Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm instalada a todo cos	4 días	lun 29/06/26	vie 03/07/26	49

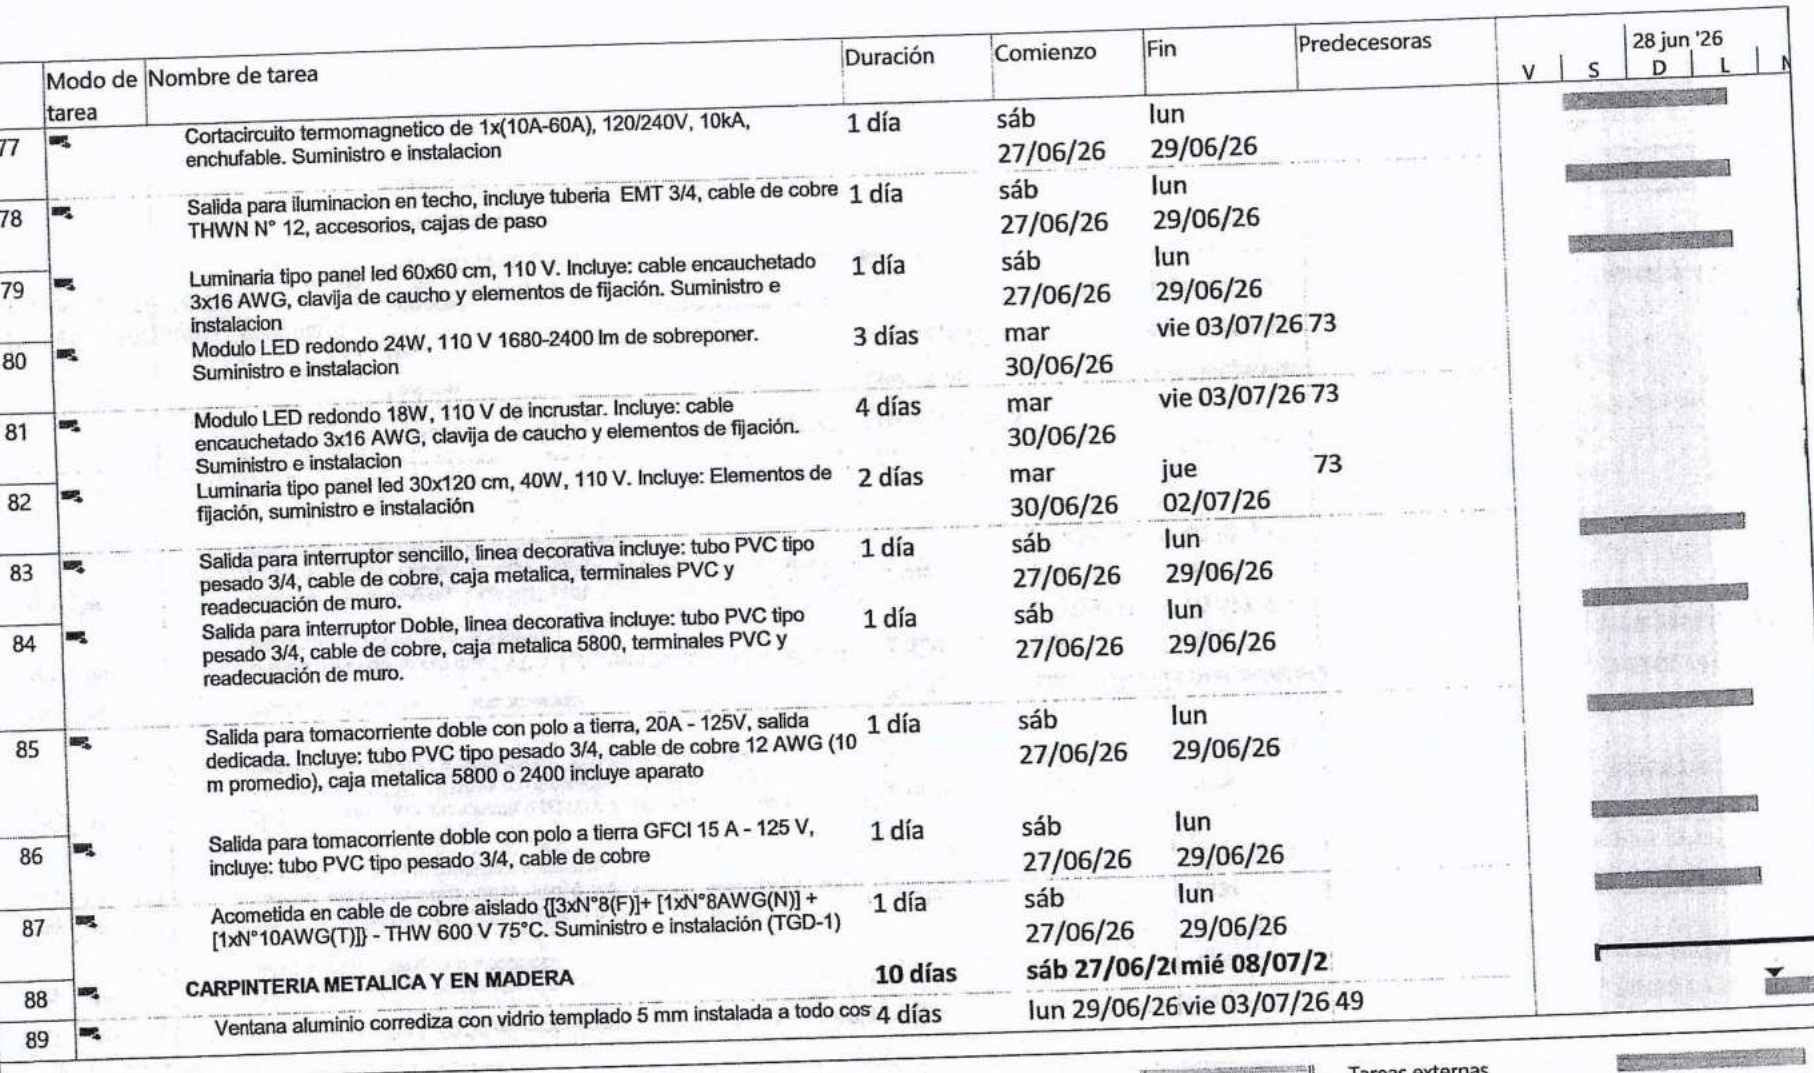

Proyecto: Diagrama sabanalarg
Fecha: mar 16/06/26


Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
104		Salida punto eléctrico para luminarias de sobreponer y/o incrustar sobre falso techo o placa, en tubo conduit EMT de 3/4", cableado libre de halógenos 1x12F + 1x12N + 1x12T, incluye: tubo EMT, caja metálica 5800 o 2400, terminales roscados, accesorios de	2 días	sáb 27/06/26	mar 30/06/26	
105		Caja de inspeccion AP-280	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
106		Caja para medidor de energia, incluye: un medidor bifasico trifilar ybreaker totalizador 2x20A, sistema de puesta a tierra. Suministr e Instalacio	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
107		Luminaria tipo led hermética IP65, 2x18W, 3200 lm, Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	2 días	sáb 27/06/26	mar 30/06/26	
108		Cortacircuito termomagnetico bipolar de 15-30A, 10kA, 120/240V. Suministro e instalacion	2 días	sáb 27/06/26	mar 30/06/26	
109		Cielo raso en lamina PVC 7 mm (incluye cornisa	3 días	sáb 27/06/26	mié 01/07/26	
110		Pozo septico revestido en piedra 2 x 2 x 2, con losa en concreto 3000 p	2 días	sáb 27/06/26	mar 30/06/26	




Proyecto: Diagrama sabanalarg
Fecha: mar 16/06/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

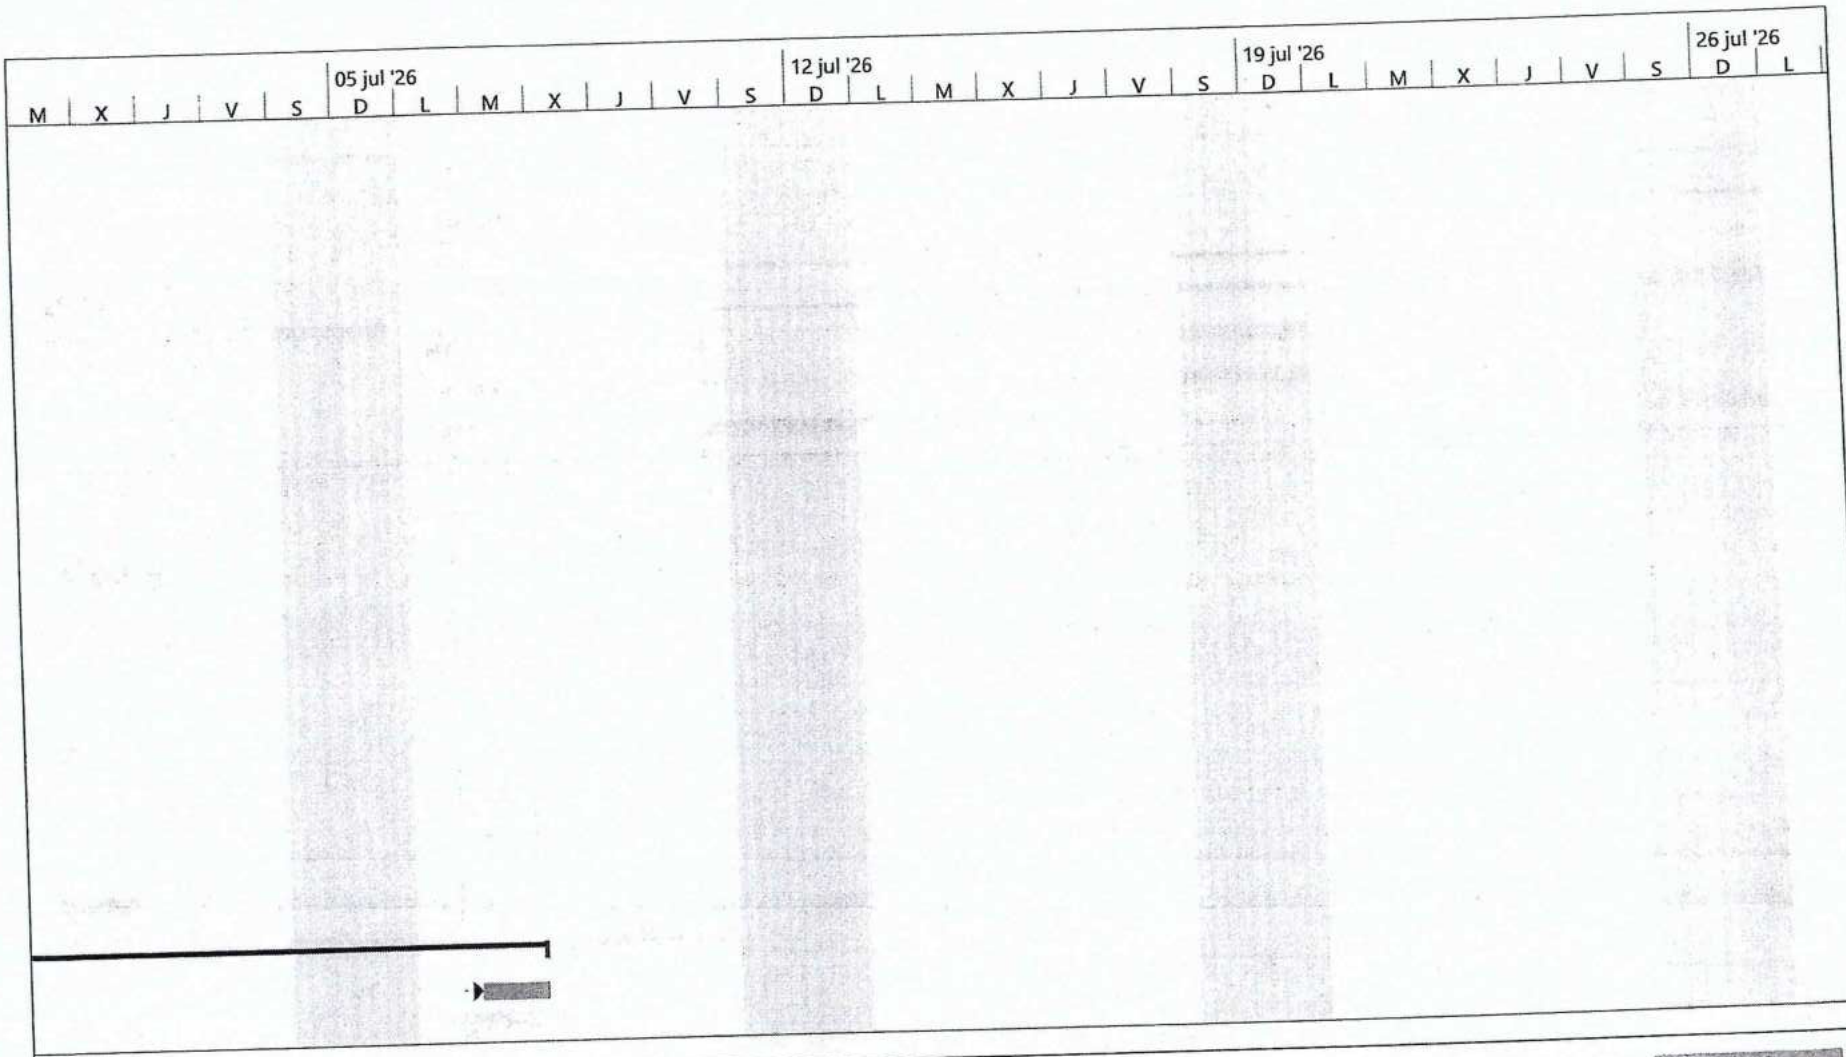


Proyecto: Diagrama sabanalarg
Fecha: mar 16/06/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

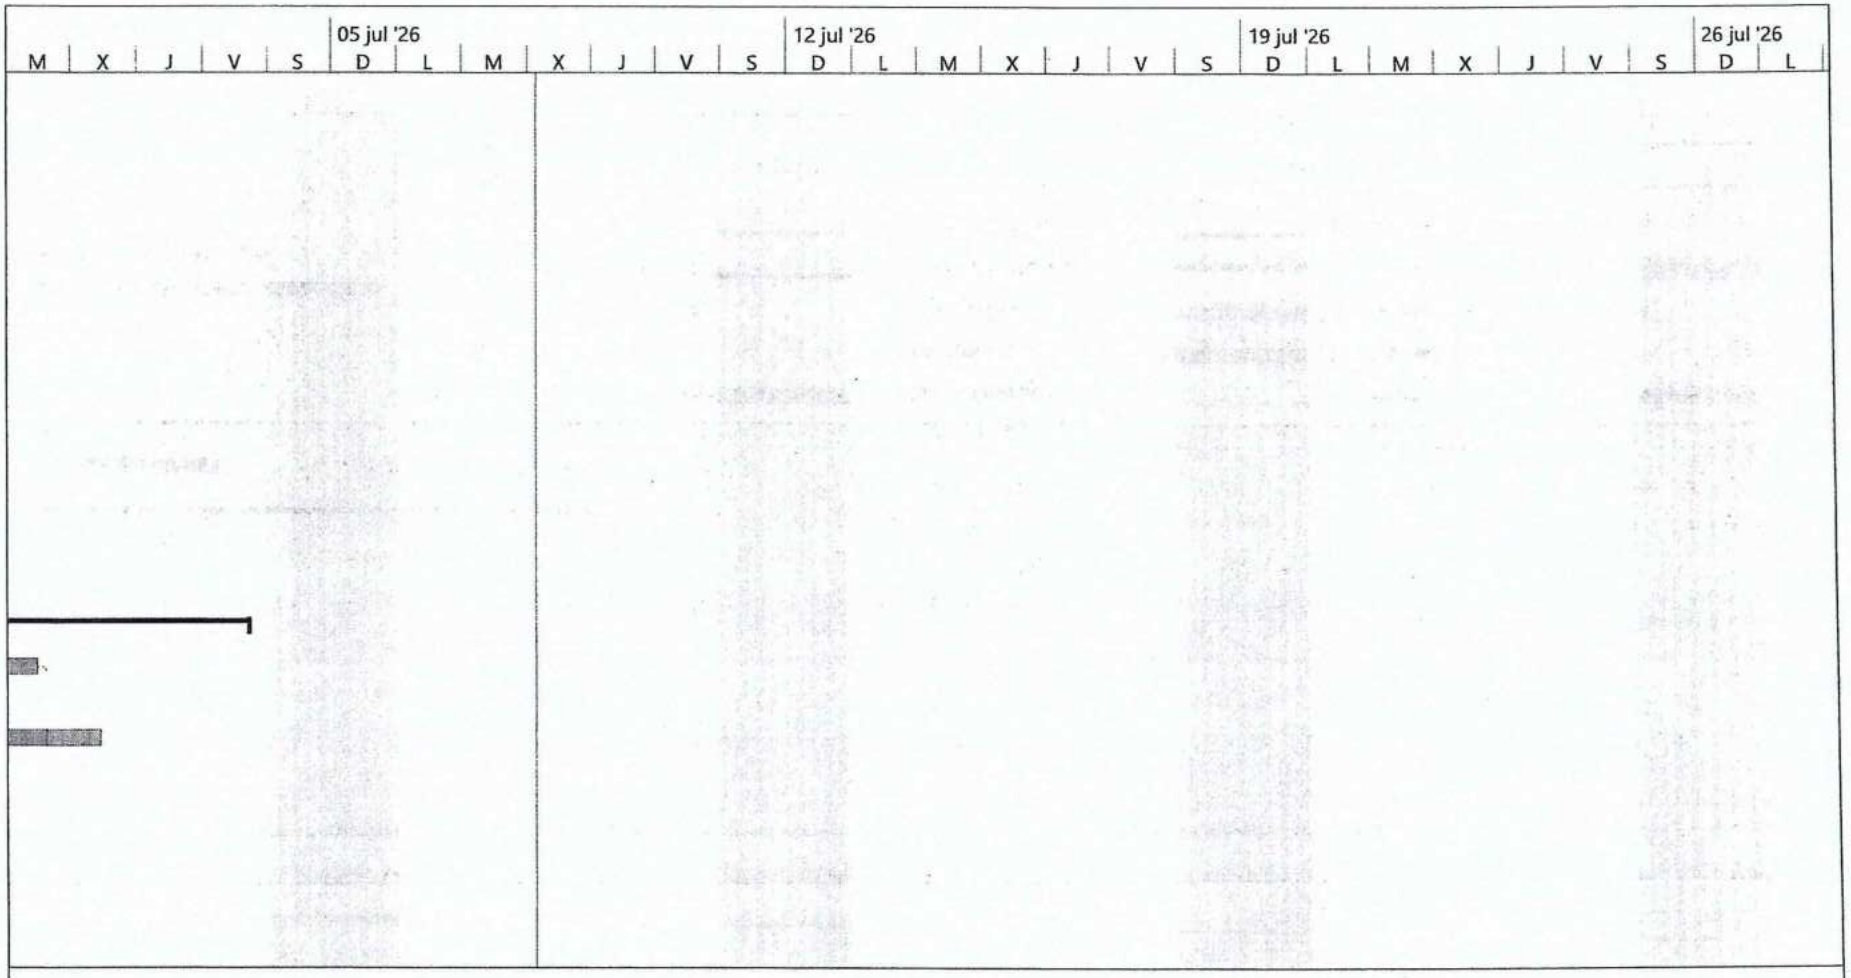

Proyecto: Diagrama sabanalarg
Fecha: mar 16/06/26


Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

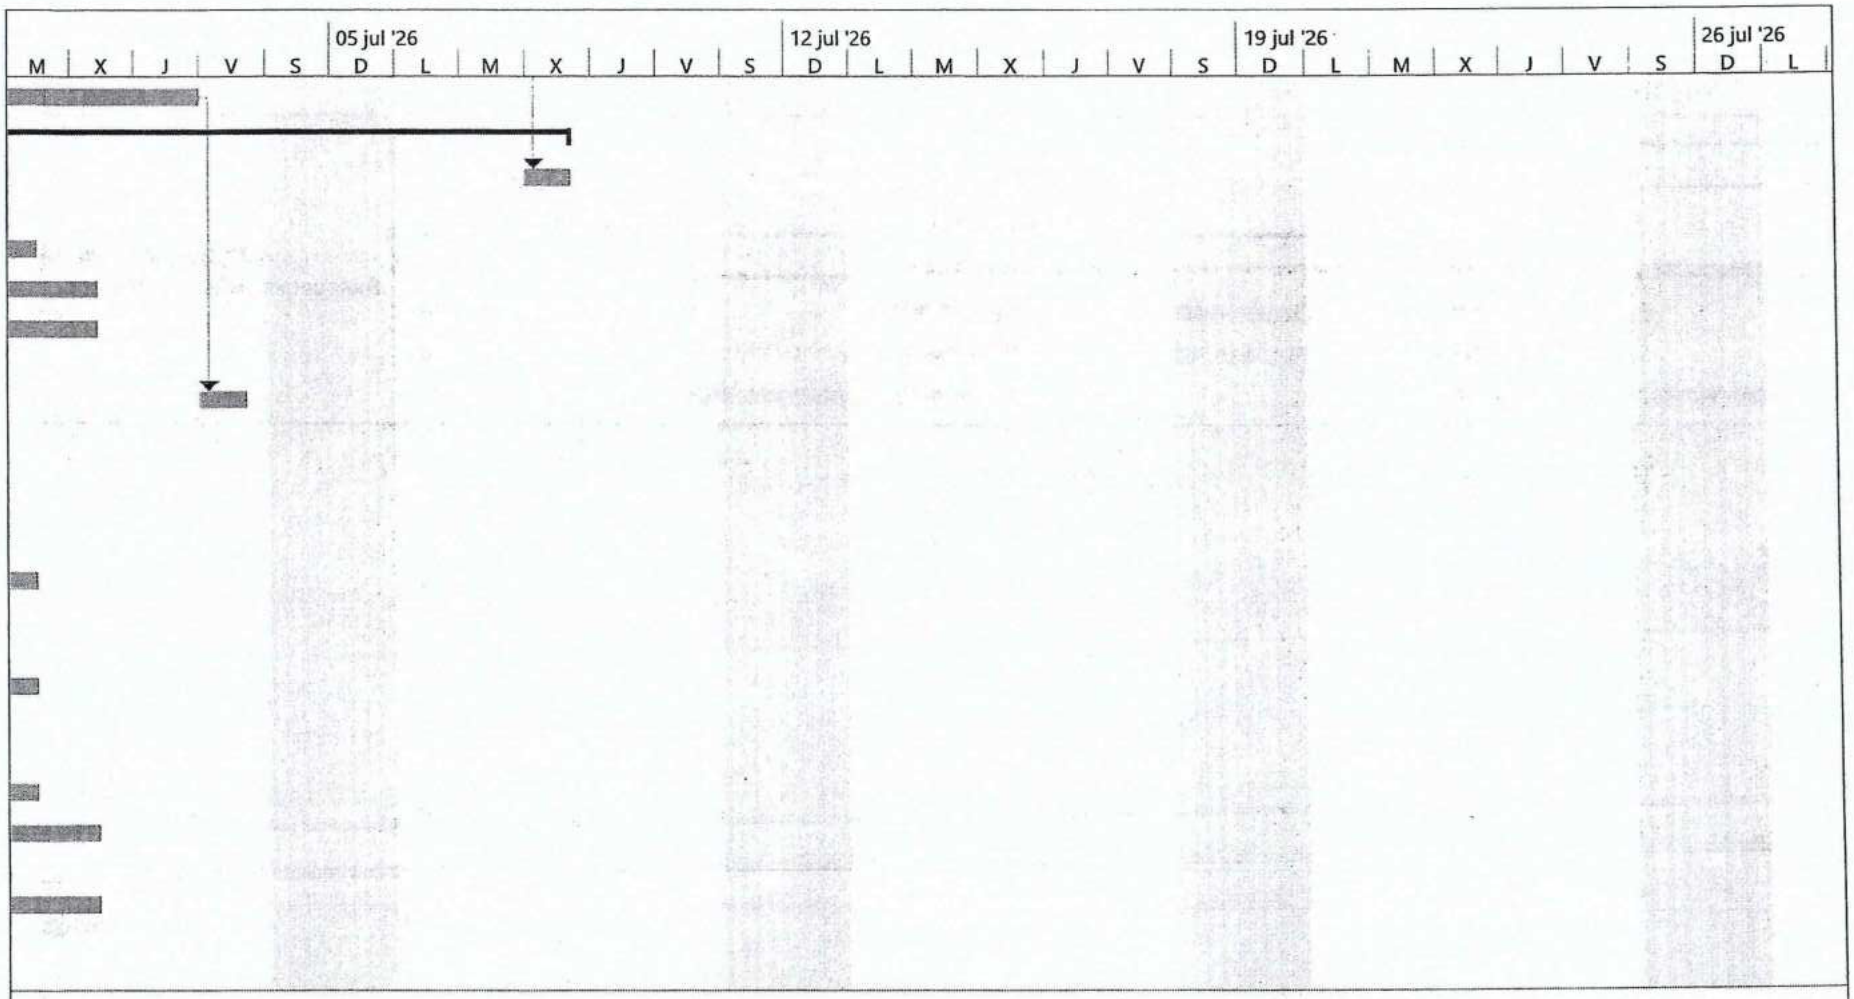

Proyecto: Diagrama sabanalarg
Fecha: mar 16/06/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**ACTIVIDES PRELIMINARES**	**0 días**	**sáb 27/06/26**	**sáb 27/06/26**	
2		Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
3		Desmonte aparatos sanitarios	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
4		Desmonte de ventanas, con transporte	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
5		Desmonte marcos y puertas con transporte	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
6		Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
7		Demolicion enchape muros con retiro	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
8		Desmonte de cielo raso con retiro	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
9		Desmonte correas	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
10		Demolicion a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
11		Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4"	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
12		Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
13		Demolicion manual de mesón en concreto A=0.60 m	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
14		Demolicion pañete muro, con retiro	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
15		Desmonte tableros electricos	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
16		**PISOS Y ENCHAPES**	**10 días**	**sáb 27/06/26**	**mié 08/07/26**	
17		Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:4	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
18		Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye destronque, pulida y brillado a todo costo	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
19		Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.	10 días	sáb 27/06/26	mié 08/07/26	

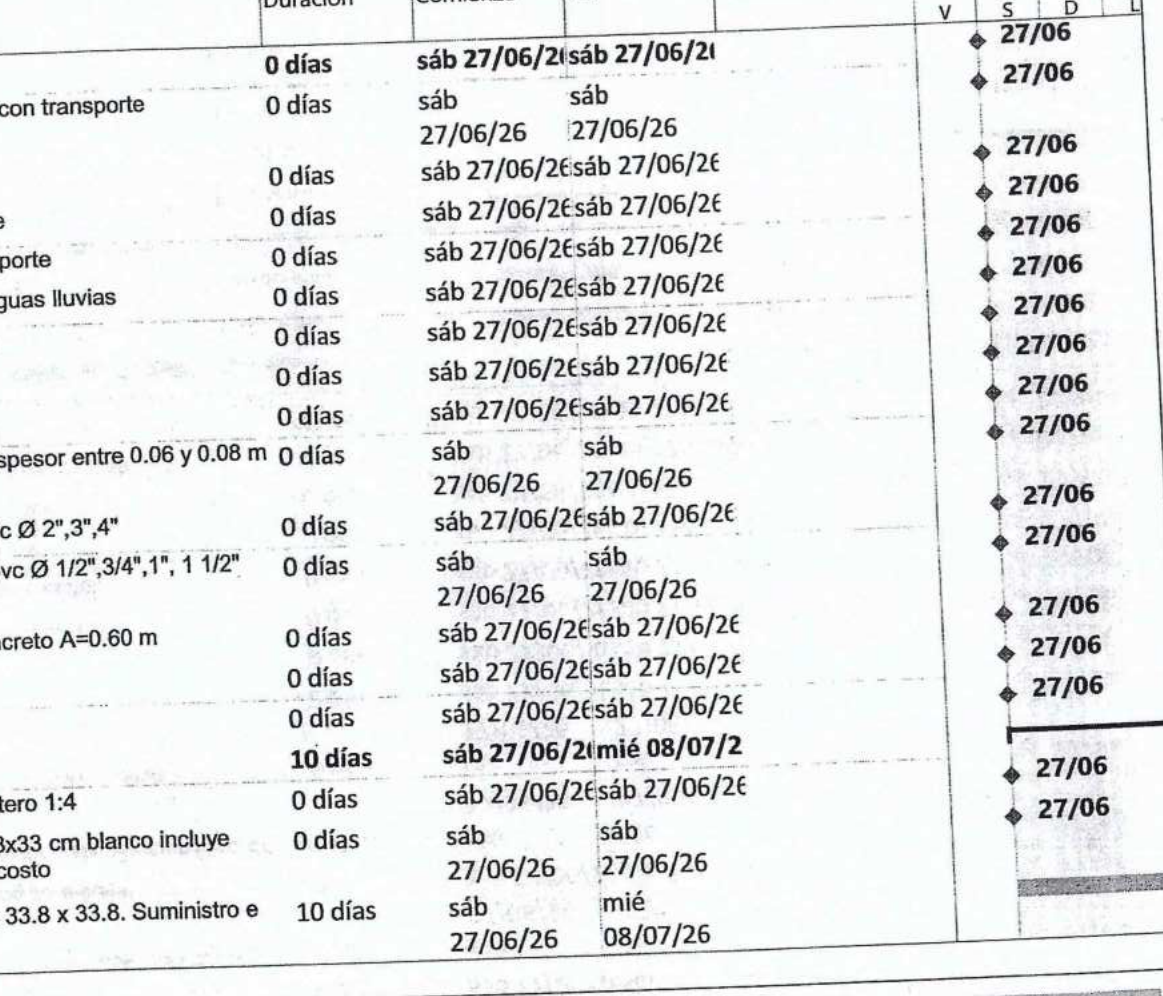

Proyecto: Prorroga N° 01 Sinai

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
39		Sistema septico Ovoide 2000 Lt (incluye:Tanque septico, Tanque	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
40		**APARATOS SANITARIOS**	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
41		Lavamanos de incrustar San Lorenzo blanco de corona con grifería	**9 días**	**sáb 27/06/26**	**mié 08/07/26**	
42		Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e Instal.	1 día	mar 07/07/26	mié 08/07/26	20FC-2 días
43		Lavaplatos sencillo en acero inoxidable acabado satinado de 62>	1 día	mar 07/07/26	mié 08/07/26	20FC-2 días
44		Division para ducha en acrílico y aluminio	1 día	mar 07/07/26	mié 08/07/26	20FC-2 días
45		**MUROS Y ACABADOS**	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
46		Pañete impermeabilizado muros 1:3 espesor 2 cms, filos y dilata	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
47		Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	**12 días**	**sáb 27/06/26**	**vie 10/07/26**	
48		Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones	5 días	mar 30/06/26	lun 06/07/26	51
49		Raspado superficie de muro pintado en vinilo	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
50		Pintura acrilica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos	2 días	lun 06/07/26	mié 08/07/26	48
51		Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manc	2 días	sáb 27/06/26	mar 30/06/26	
52		Poyo en concreto 3000 psi 10x60 cm	3 días	mié 08/07/26	vie 10/07/26	50
53		Mesones en concreto 3000 psi reforzado e=0.08 m A=0.60m aca	3 días	sáb 27/06/26	mié 01/07/26	
54		**CUBIERTA**	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
55		Correa metalica en perfil estructural PHR-C 120 x 60 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
56		Platina 0.10*0.10 m en lamina HR 1/8" con anclajes de 1/4". Sumini	**2 días**	**sáb 27/06/26**	**mar 30/06/26**	

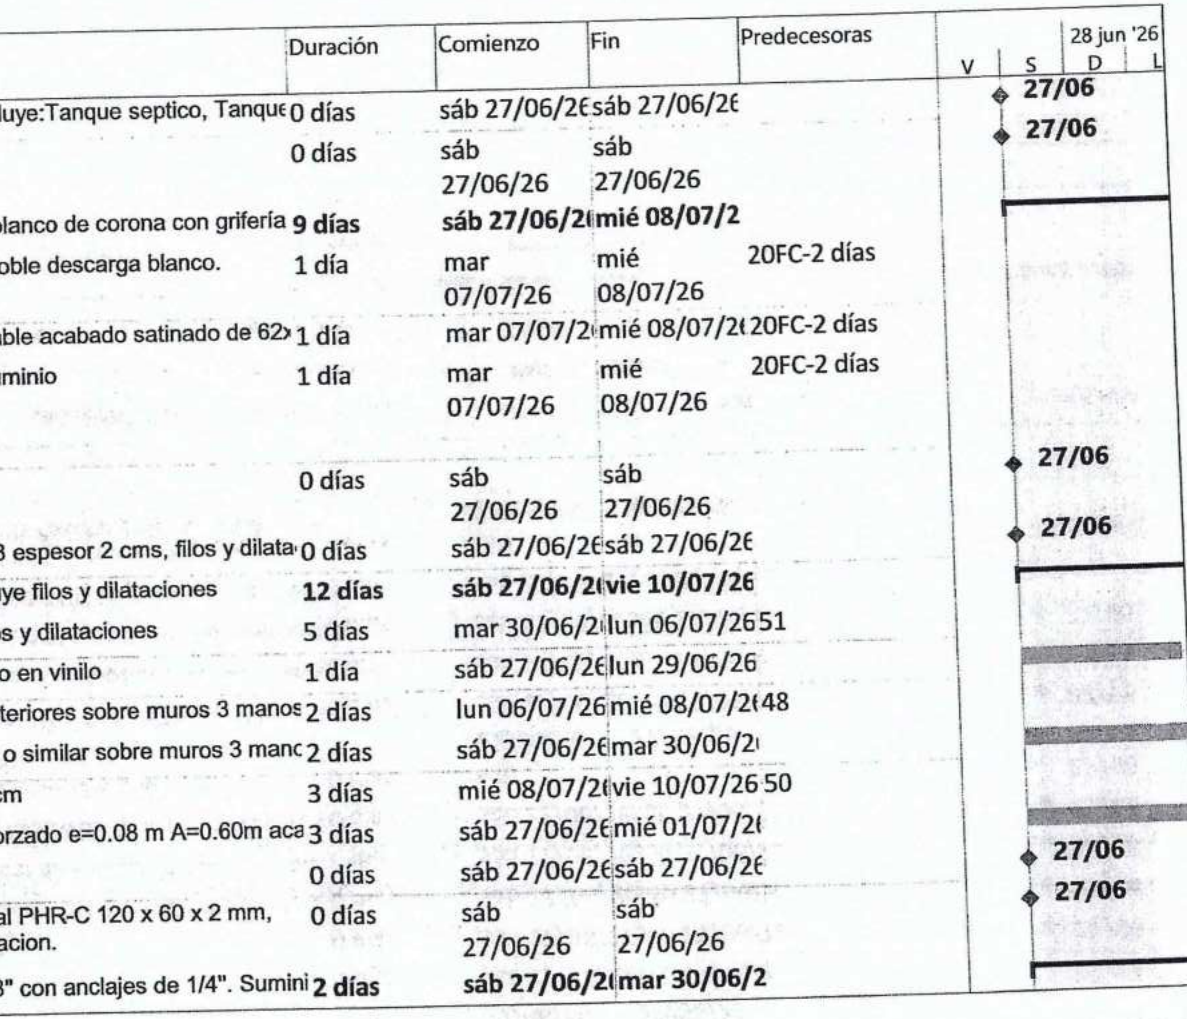

Proyecto: Prorroga N° 01 Sinai

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
74		Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 40W, 110 V. Incluye: Elementos de fijación, suministro e instalación	3 días	sáb 27/06/26	mié 01/07/26	
75		Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica, terminales PVC y readecuación de muro.	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
76		Salida para interruptor Doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
77		Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metalica 5800 o 2400	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
78		Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
79		**CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA**	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
80		Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm instalada a todo costo	3 días	mar 30/06/26	vie 03/07/26	73
81		Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instal.	4 días	mar 30/06/26	vie 03/07/26	73
82		Porton tubo 2" e=1.5 mm y malla eslabonada cal 10, ángulo de 1 1/4" x 1/8".	2 días	mar 30/06/26	jue 02/07/26	73
83		**NO PREVISTO**	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
84		Desmonte cubiertas en acrilico, fibra de vidrio, con retiro	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	

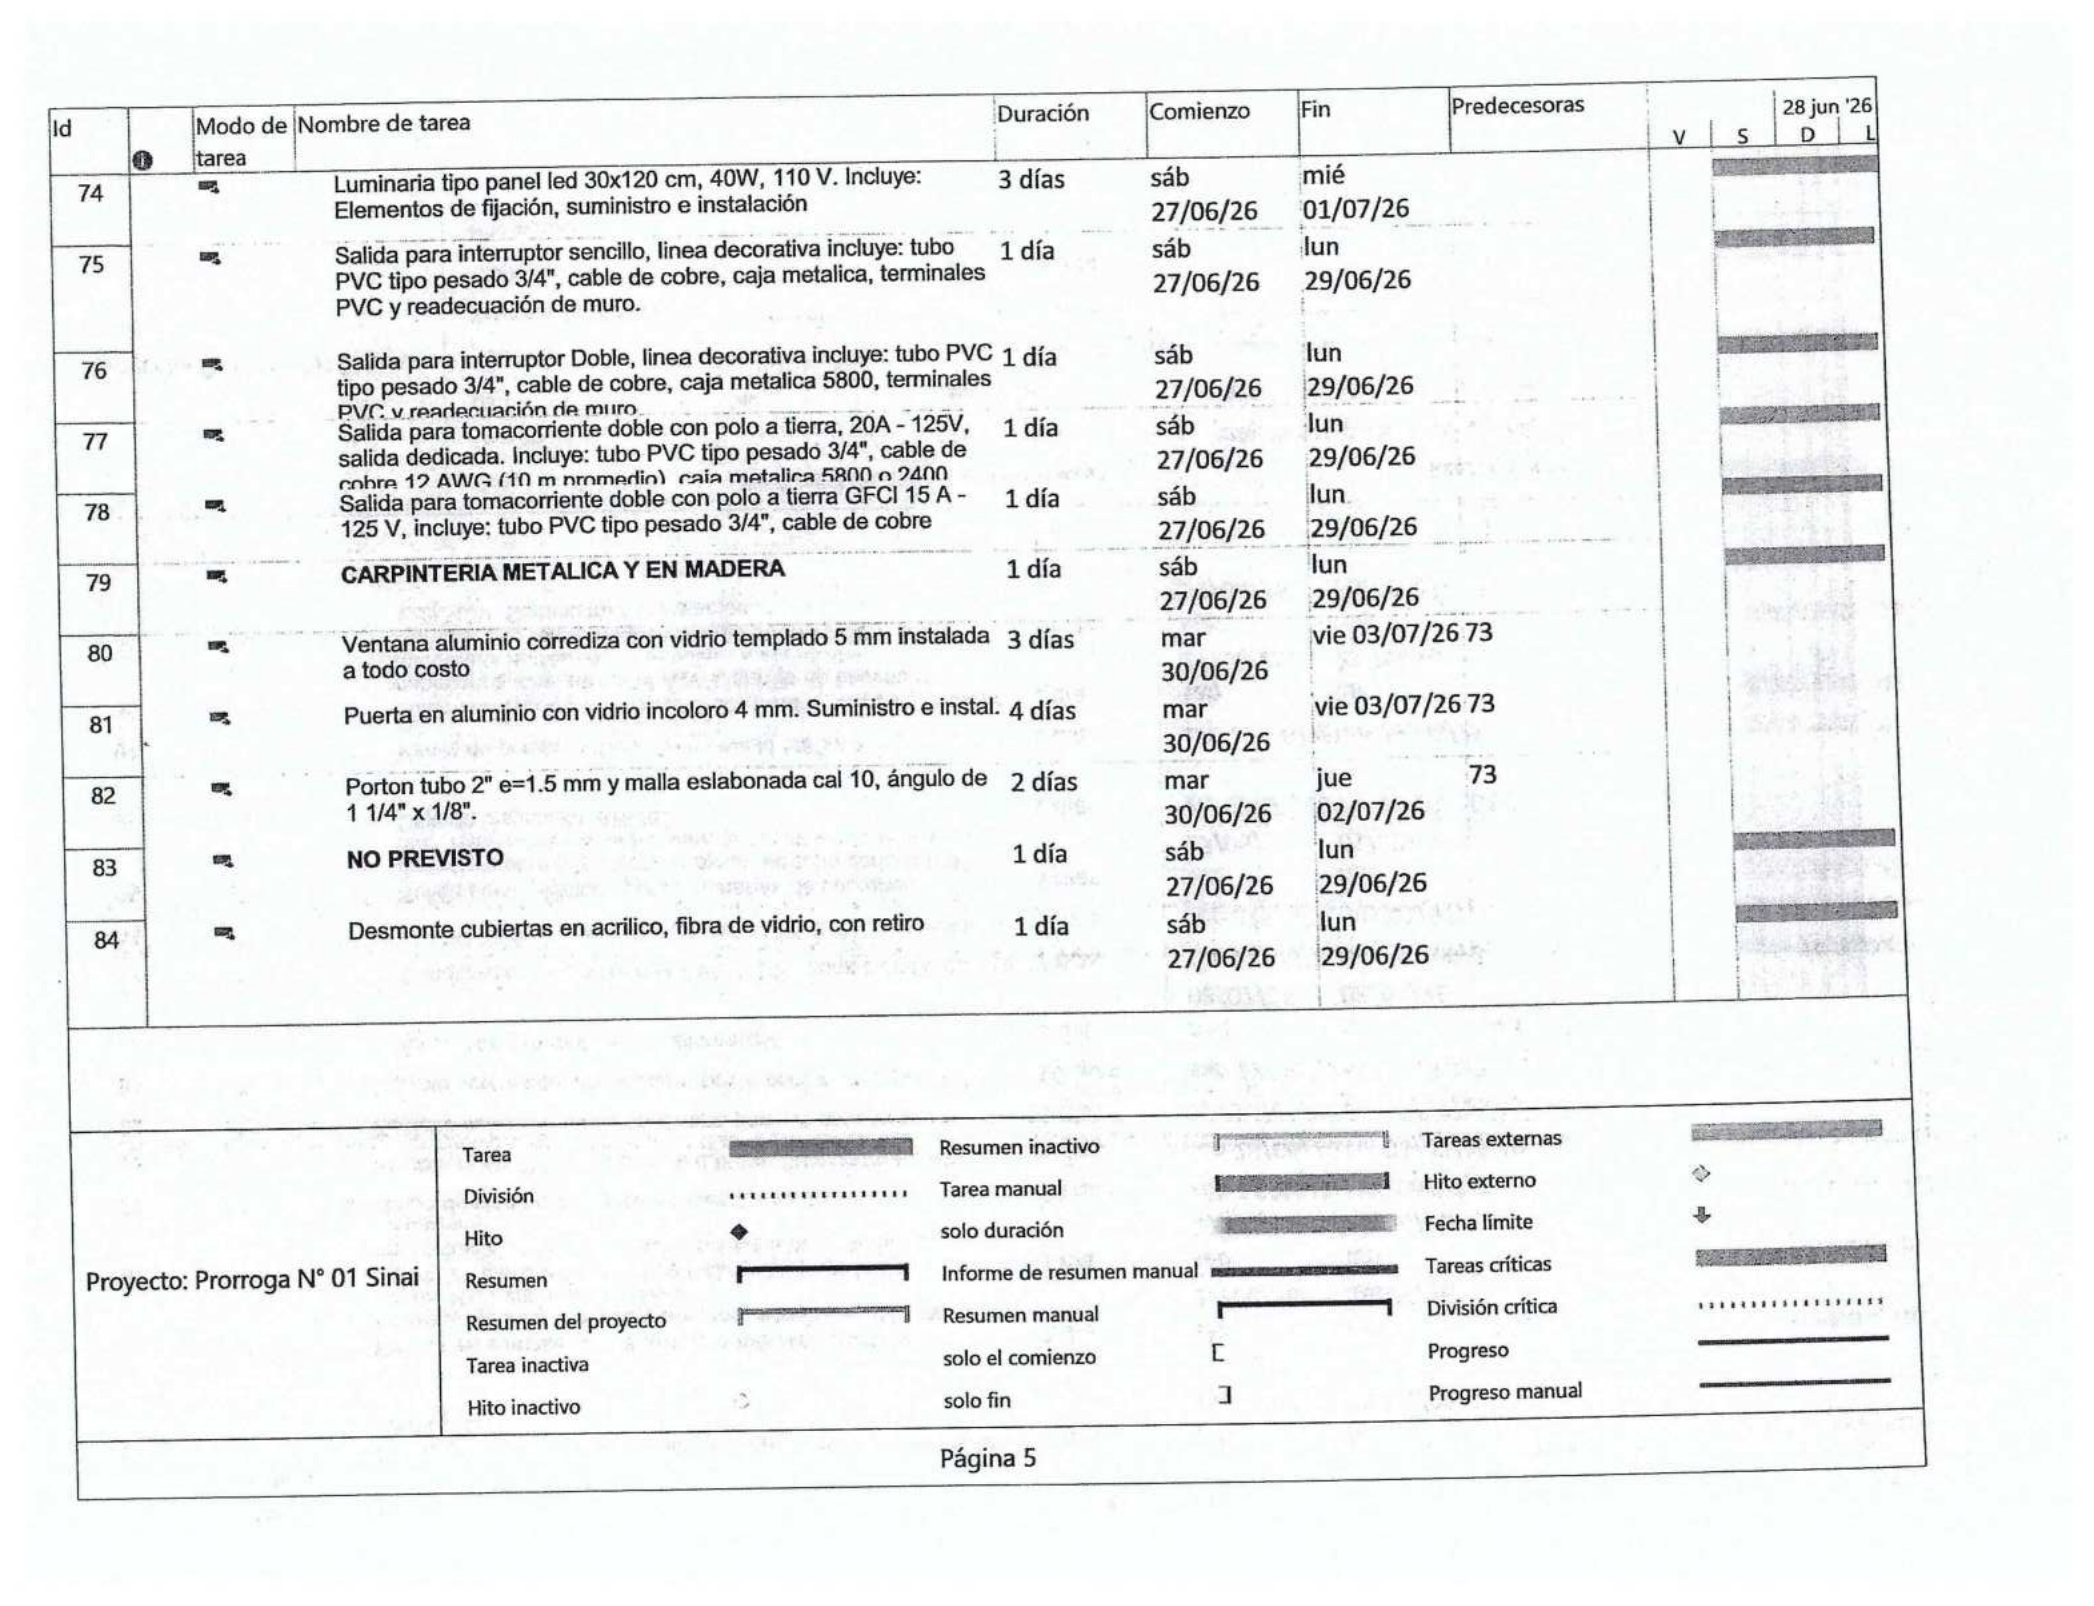

Proyecto: Prorroga N° 01 Sinai


Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
100		Tablero monofasico sin puerta de 12 circuitos. Suministro e instalacion	2 días	sáb 27/06/26	mar 30/06/26	
101		caja para medidor de energia.incluye medidor monofasico trifil	2 días	sáb 27/06/26	mar 30/06/2	
102		Cerradura tipo manija cilindrica reversible - alcobas. Suministro e Instal.	3 días	sáb 27/06/26	mié 01/07/26	
103		Cerradura de doble seguridad de escudo pomo + cerrojo para entrada principal. Suministro e Instal.	3 días	sáb 27/06/26	mié 01/07/26	
104		Caja de inspeccion 60 x 60	2 días	sáb 27/06/26	mar 30/06/26	
105		Correa metalica en perfil estructural rectangular 76 x 38 x 2.0	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
106		Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 1 1/2", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit. Suministro e instalacion	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
107		Excavacion manual en conglomerado	2 días	sáb 27/06/26	mar 30/06/26	
108		Canalizacion ducto conduit PVC 1 1/2", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de río	2 días	sáb 27/06/26	mar 30/06/26	
109		Luminaria de emergencia tipo led 110V, 2.4W, autonomia min	3 días	sáb 27/06/26	mié 01/07/26	
110		Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V,	2 días	sáb 27/06/26	mar 30/06/2	
111		Caja de inspeccion AP-280	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
112		Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8"x2.4 m para bajante	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
113		Luminaria tipo led hermética IP65, 2x18W, 3200 lm, Incluye: c	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	

28 jun '26 — V S D L


Proyecto: Prorroga N° 01 Sinai

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

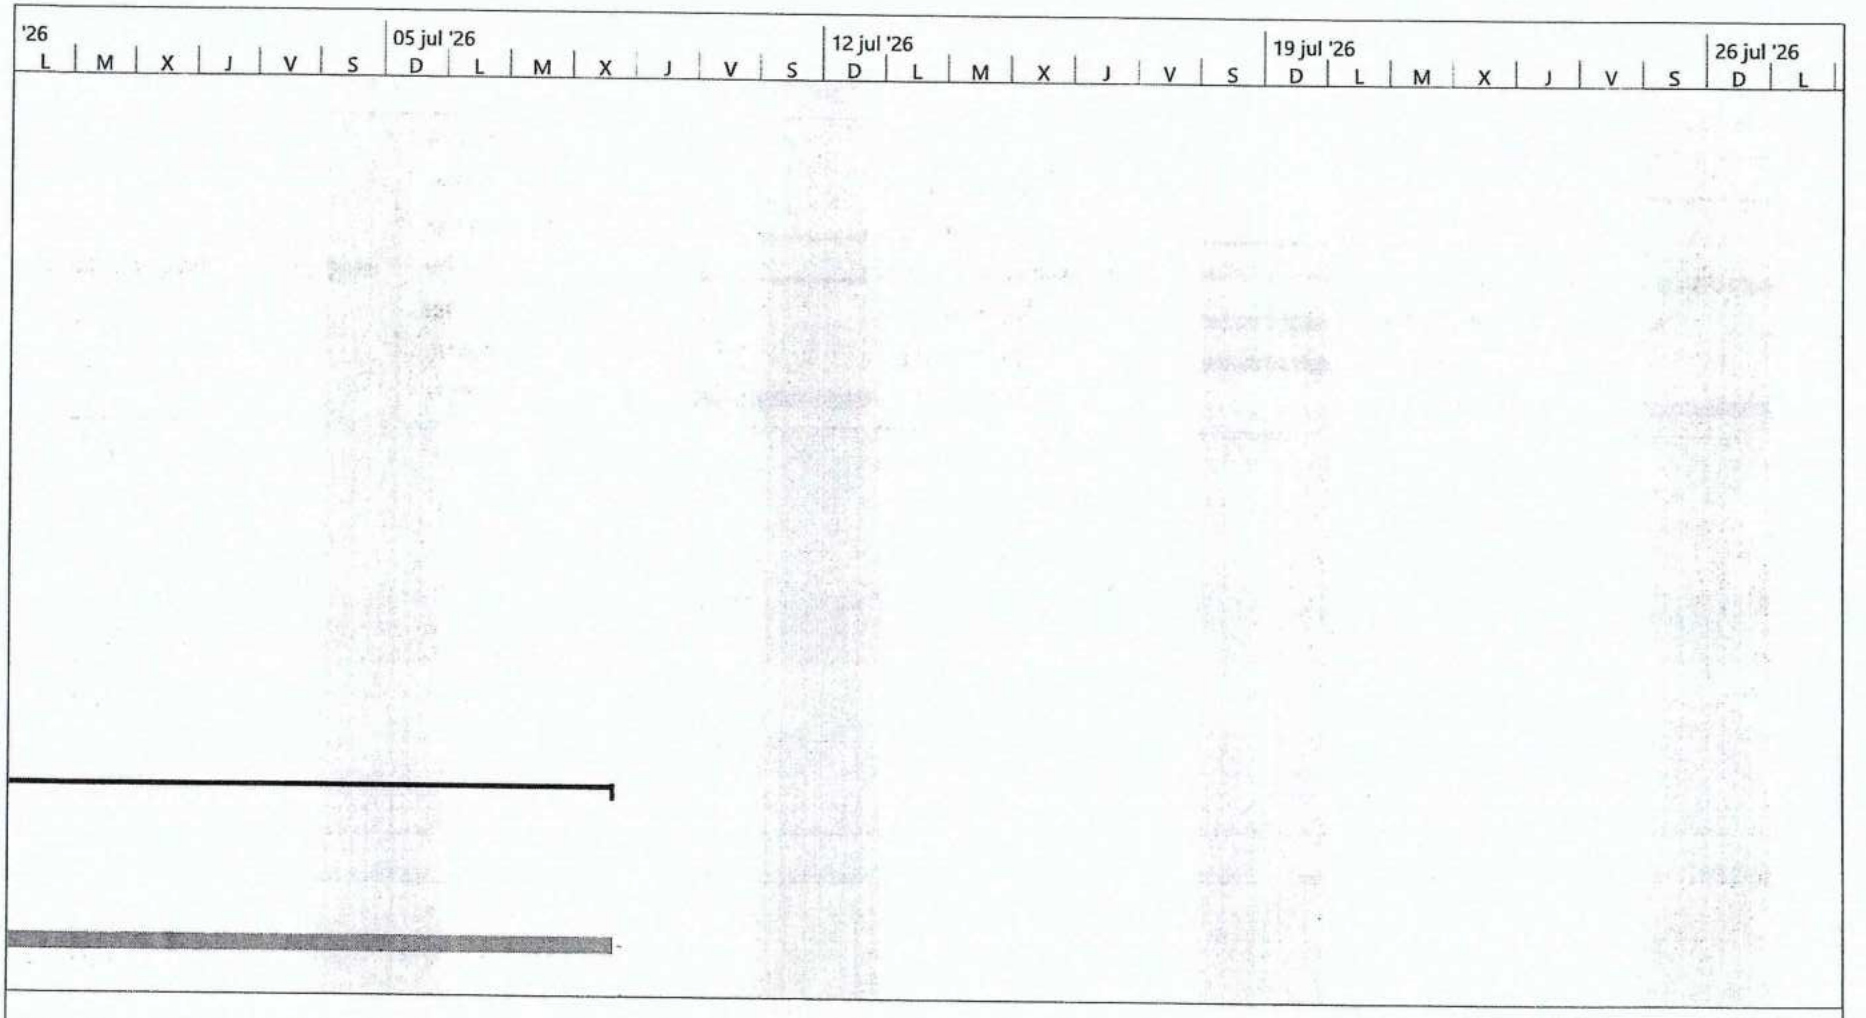


Proyecto: Prorroga N° 01 Sinai

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

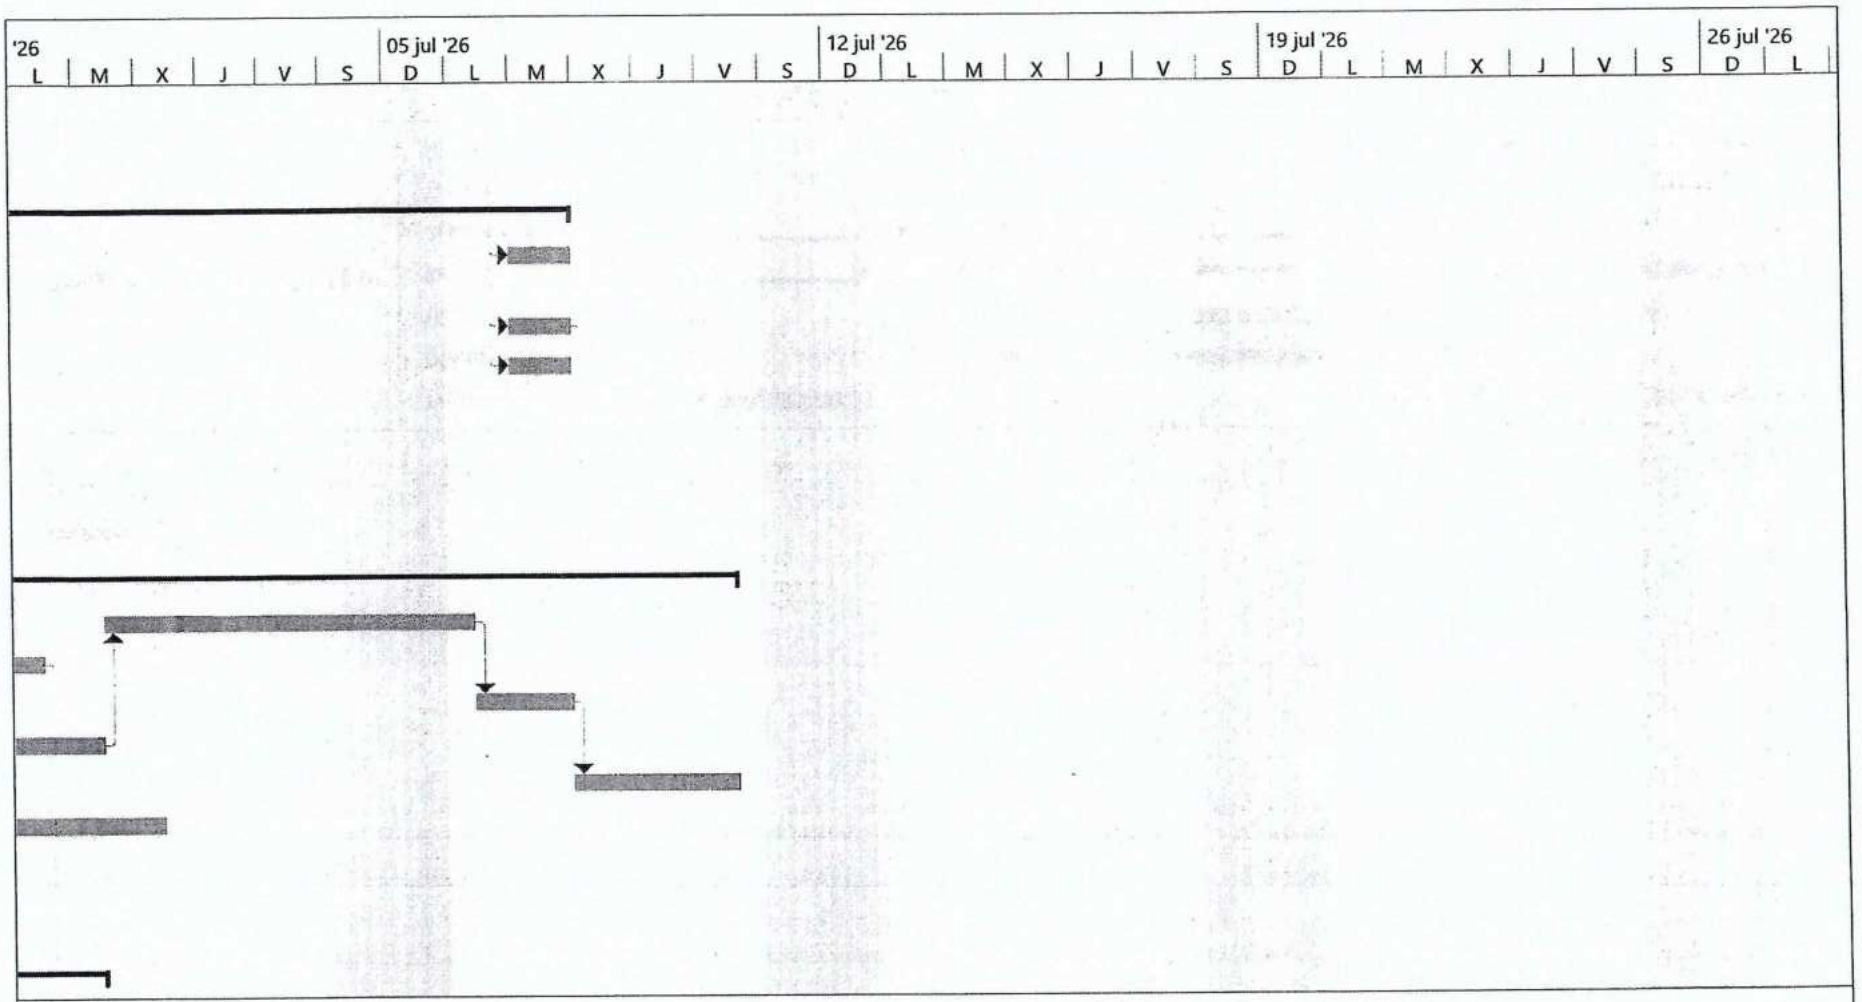


Proyecto: Prorroga N° 01 Sinai

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

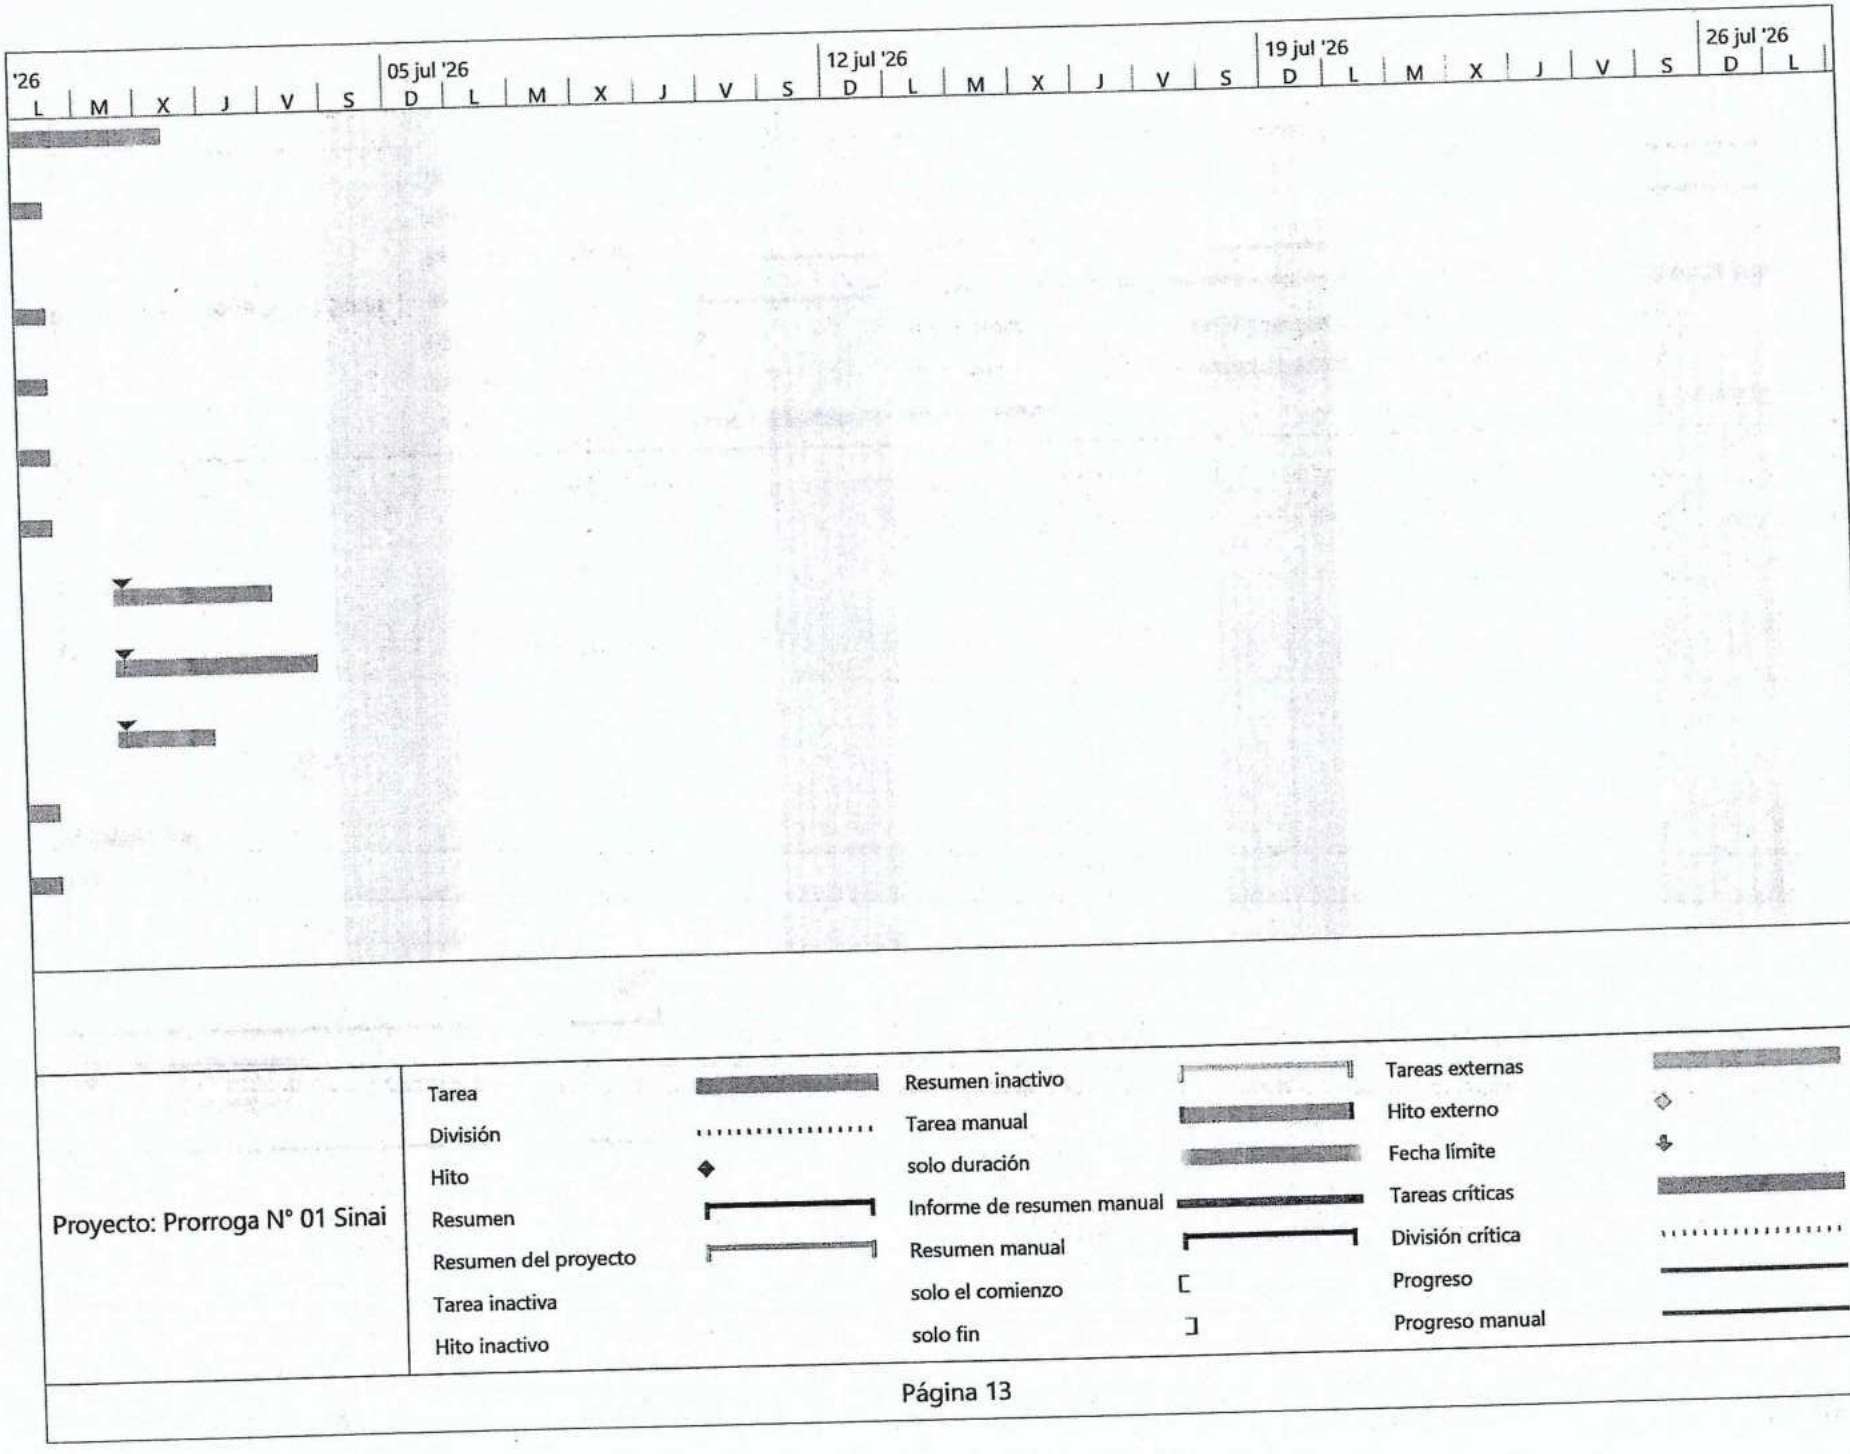

Proyecto: Prorroga N° 01 Sinai

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	

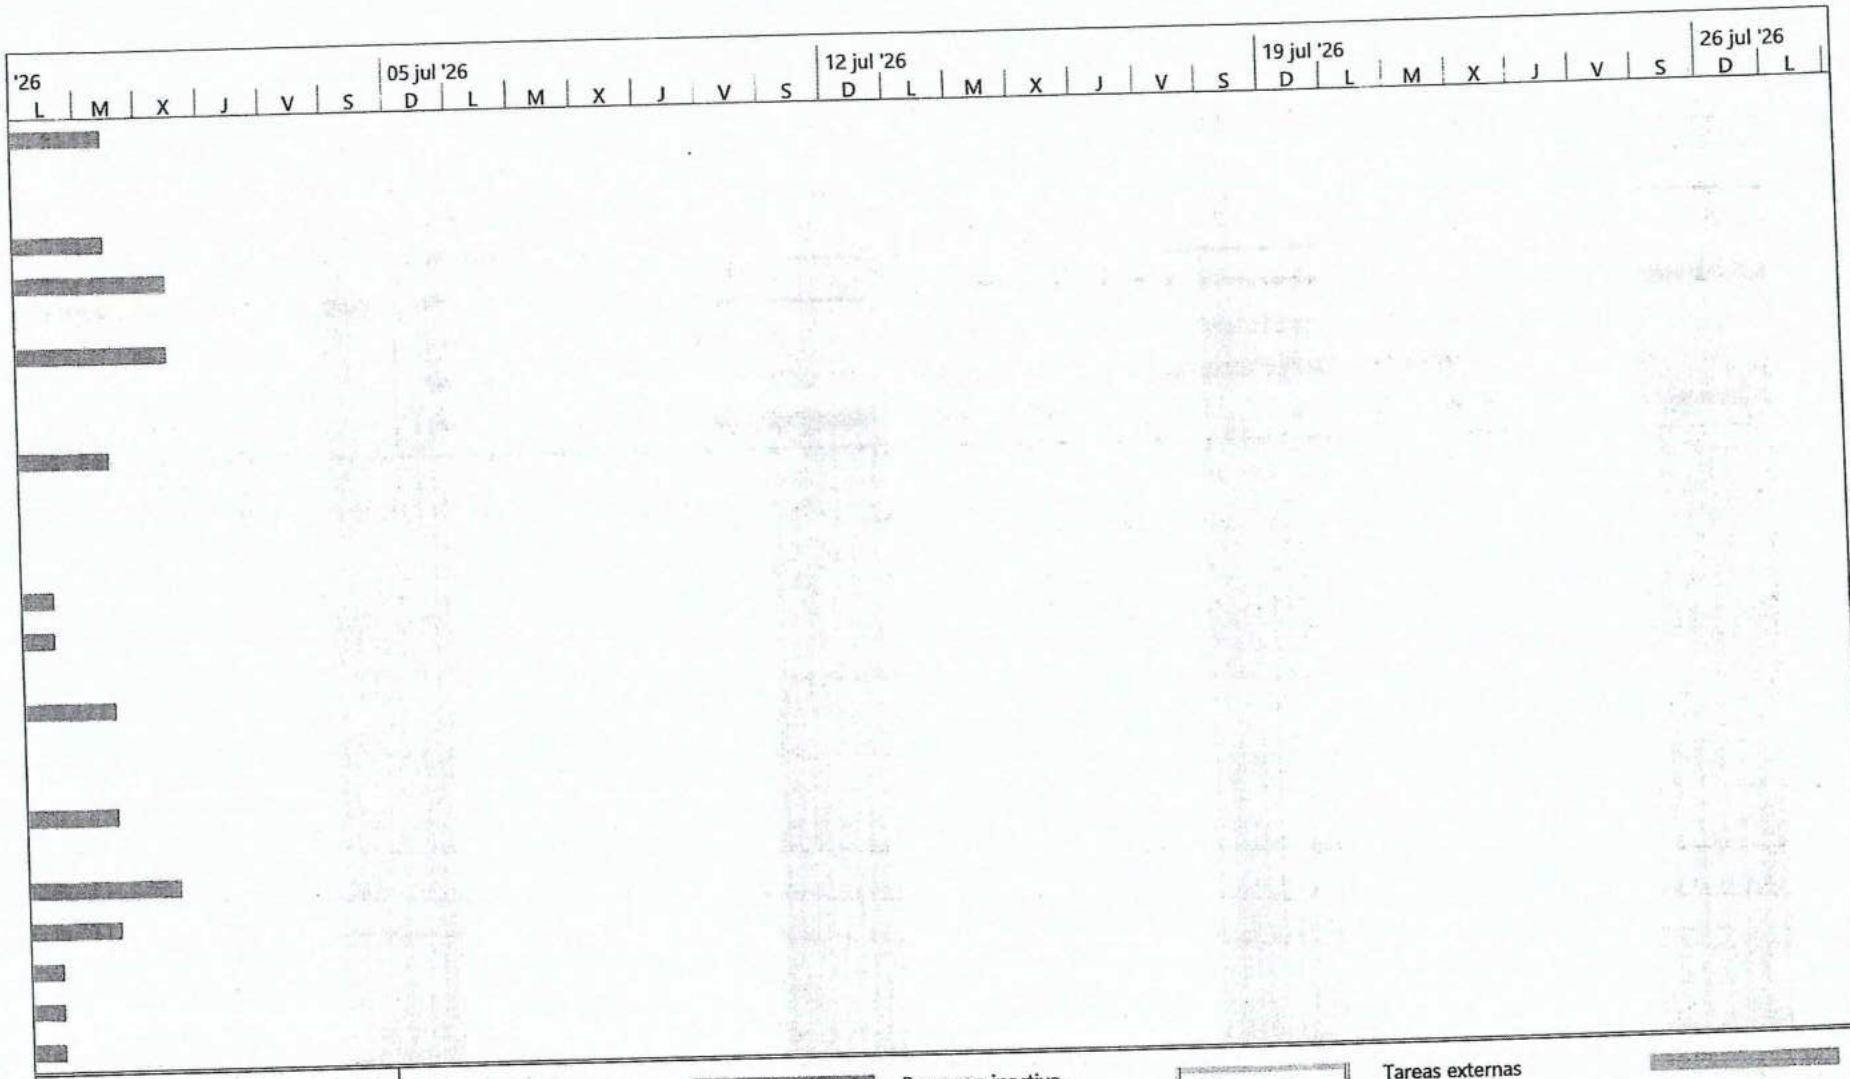

Proyecto: Prorroga N° 01 Sinai

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

UNIÓN TEMPORAL
ADECUACIONES
PAPS SACAMA

FLUJO DE CAJA

LOTE 08. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LA VEREDA SINIA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

			JULIO			
		Valor	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21
1	ACTIVIDES PRELIMINARES					
1,1	Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte	$ -	$ -	$ -		
1,2	Desmonte aparatos sanitarios	$ 88,434.00	$ -	$ -		
1,3	Desmonte de ventanas, con transporte	$ -	$ -	$ -		
1,4	Desmonte marcos y puertas con transporte	$ 735,513.26	$ -	$ -		
1,5	Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias	$ -	$ -	$ -		
1,6	Demolicion enchape muros con retiro	$ -	$ -	$ -		
1,7	Desmonte de cielo raso con retiro	$ 1,790,587.45	$ -	$ -		
1,8	Desmonte correas	$ -	$ -	$ -		
1,9	Demolicion a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro	$ -	$ -	$ -		
1,10	Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4"	$ -	$ -	$ -		
1,11	Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro	$ -	$ -	$ -		
1,12	Demolicion manual de mesón en concreto A=0.60 m	$ -	$ -	$ -		
1,13	Demolicion pañete muro, con retiro	$ -	$ -	$ -		
1,14	Desmonte tableros electricos	$ 131,696.00	$ -	$ -		
2	PISOS Y ENCHAPES					
2,1	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:4	$ 486,326.92				
2,2	Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye destronque, pulida y brillado a todo costo	$ -		$ -	$ -	$ -
2,3	Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.	$ -	$ -	$ -	$ 2,006,736.50	$ -
2,4	Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. Sumin e instal	$ 2,298,499.20	$ -	$ 766,166.40		$ -
2,5	Guardaescoba en ceramica duropiso 33 x 7 cm. Suministro e instalacion	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2,6	Mediacaña mortero imp 1:3 esmaltado 0.12*0.12m	$ -	$ -	$ -		$ -
3	INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3,1	Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	$ 79,752.00	$ -	$ -	$ -	$ -
3,2	Tuberia presion PVC RDE 21 3/4". Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3,3	Punto agua fria PVC 1/2"	$ 218,589.00	$ -	$ -	$ -	$ -
3,4	Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 13 x 85 cm. Suministro e Instal.	$ 973,410.00	$ -	$ -	$ -	$ -
3,5	Espejo baño en plata 5 mm. Suministro e instal.	$ 223,501.60		$ -	$ -	$ -

UNIÓN TEMPORAL ADECUACIONES PAPS SACAMA

FLUJO DE CAJA

LOTE 08. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LA VEREDA SINIA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

			JULIO			
		Valor	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21
7,2	Platina 0.10*0.10 m en lamina HR 1/8" con anclajes de 1/4". Suministro e instalacion	$ 1,017,504.00	$ -	$ -	$ -	$ -
7,3	Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 pintada a dos caras, poliuretano de e=38 mm. Suministro e instalación.	$ 76,366,527.00	$ 76,366,527.00	$ -	$ -	$ -
7,4	Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m	$ 665,711.40	$ -	$ -	$ -	$ -
7,5	Cielo raso dry-wall plano con lámina gyplac RH antihumedad de 1/2" o 12.7mm o similar, pintado con 3 manos vinilo superlavable contra alto desgaste	$ 14,717,052.00	$ -	$ 7,358,526.00	$ 7,358,526.00	$ -
7,6	Canal en lamina galvanizada cal. 16 desarrollo 0.60 m pintado con wash primer y esmalte. Suministro e Instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7,7	Bajante A.LL. PVC 4"	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7,8	Viga cinta de 0.15 x 0.10 m en concreto de resistencia 3000 Psi	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7,9	Acero de Refuerzo Grado 60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	INSTALACIONES ELECTRICAS		$ -	$ -	$ -	$ -
8,1	Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AWG concentrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion	$ 2,463,299.60	$ -	$ -	$ -	$ -
8,2	Suministro e instalación de medidor de energia, incluye: caja para medidor, medidor trifasico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8,3	Suministro e instalación tablero trifásico de 12 circuitos, 220 V, Imáx de 150A, Isc 10 kA, con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios de montaje.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8,4	Interruptor Termomagnético Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador. Suministro e instalación	$ 343,574.00	$ -	$ -	$ -	$ -
8,5	Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240V, 10kA, enchufable. Suministro e instalacion	$ 453,502.00	$ -	$ -	$ -	$ -
8,6	Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8,7	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	$ 6,636,294.00	$ -	$ -	$ -	$ -


UNIÓN TEMPORAL ADECUACIONES PAPS SACAMA

FLUJO DE CAJA

LOTE 08. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LA VEREDA SINIA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

			JULIO			
		Valor	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21
NP-04	Puerta en Lamina Cold Rolled Calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte epoxico,incluye marco, suministro e instalación.	$ 11,873,659.18	$ 11,873,659.18		$ -	$ -
NP-05	Enchape de piso en ceramica antideslizante 45 x 45	$ 983,157.79		$ -	$ -	$ -
NP-06	Rinconera en PVC media caña 0.09 m. Suministro e Instal	$ 915,232.78	$ -	$ -		$ -
NP-07	Esmalte sobre ventanas en lamina (incluye anticorrosivo)	$ 302,812.16	$ -	$ -		$ -
NP-08	Bajante acometida, zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 1-1/2", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit. Suministroe instalacion	$ 568,157.00	$ -	$ -	$ -	$ -
NP-09	Excavacion manual en conglomerado	$ 1,451,722.81				
NP-10	Canalizacion ducto conduit PVC 1 1/2", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de río.	$ 664,330.36			$ -	$ -
NP-11	Luminaria de emergencia tipo led 110V, 2.4W, autonomia minima 90 minutos. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	$ 519,936.00	$ -	$ -	$ -	$ -
NP-12	Salida punto eléctrico para luminarias de sobreponer y/o incrustar sobre falso techo o placa, en tubo conduit EMT de 3/4", cableado libre de halógenos 1x12F + 1x12N + 1x12T, incluye: tubo EMT, caja metálica 5800 o 2400, terminales roscados, accesorios de instalación y conexionado. Suministro e instalación	$ 15,484,490.00	$ -	$ -	$ -	$ -
NP-13	Caja de inspeccion AP-280	$ 422,500.00		$ -	$ -	$ -
NP-14	Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8"x2.4 m para bajantes del sistema de apantallamiento. Incluye: suelo artificial, soldadura exotérmica, cable de cobre desnudo AWG Nº 2. Suministro e instalacion	$ 679,775.00	$ -	$ -	$ -	$ -
NP-15	Luminaria tipo led hermética IP65, 2x18W, 3200 lm, Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	$ 549,672.00		$ -	$ -	$ -
NP-16	Cortacircuito termomagnetico bipolar de 15-30A, 10kA, 120/240V. Suministro e instalacion	$ 140,400.00			$ -	$ -
NP-17	Tablero monofasico sin puerta de 12 circuitos. Suministro e instalacion	$ 287,163.00		$ -	$ -	$ -


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**ACTIVIDES PRELIMINARES**	**0 días**	**sáb 27/06/2(**	**sáb 27/06/2(**	
2		Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
3		Desmonte aparatos sanitarios	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
4		Desmonte de ventanas, con transporte	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
5		Desmonte marcos y puertas con transporte	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
6		Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
7		Demolicion enchape muros con retiro	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
8		Desmonte de cielo raso con retiro	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
9		Desmonte correas	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
10		Demolicion a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
11		Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4"	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
12		Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
13		Demolicion manual de mesón en concreto A=0.60 m	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
14		Demolicion pañete muro, con retiro	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
15		Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
16		Desmonte tableros electricos	**10 días**	**sáb 27/06/2(**	**mié 08/07/2**	
17		**PISOS Y ENCHAPES**	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
18		Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
19		Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye destronque, pulida y brillado a todo costo	10 días	sáb 27/06/26	mié 08/07/26	
20		Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.	5 días	vie 03/07/26	mié 08/07/26	19FC-5 días

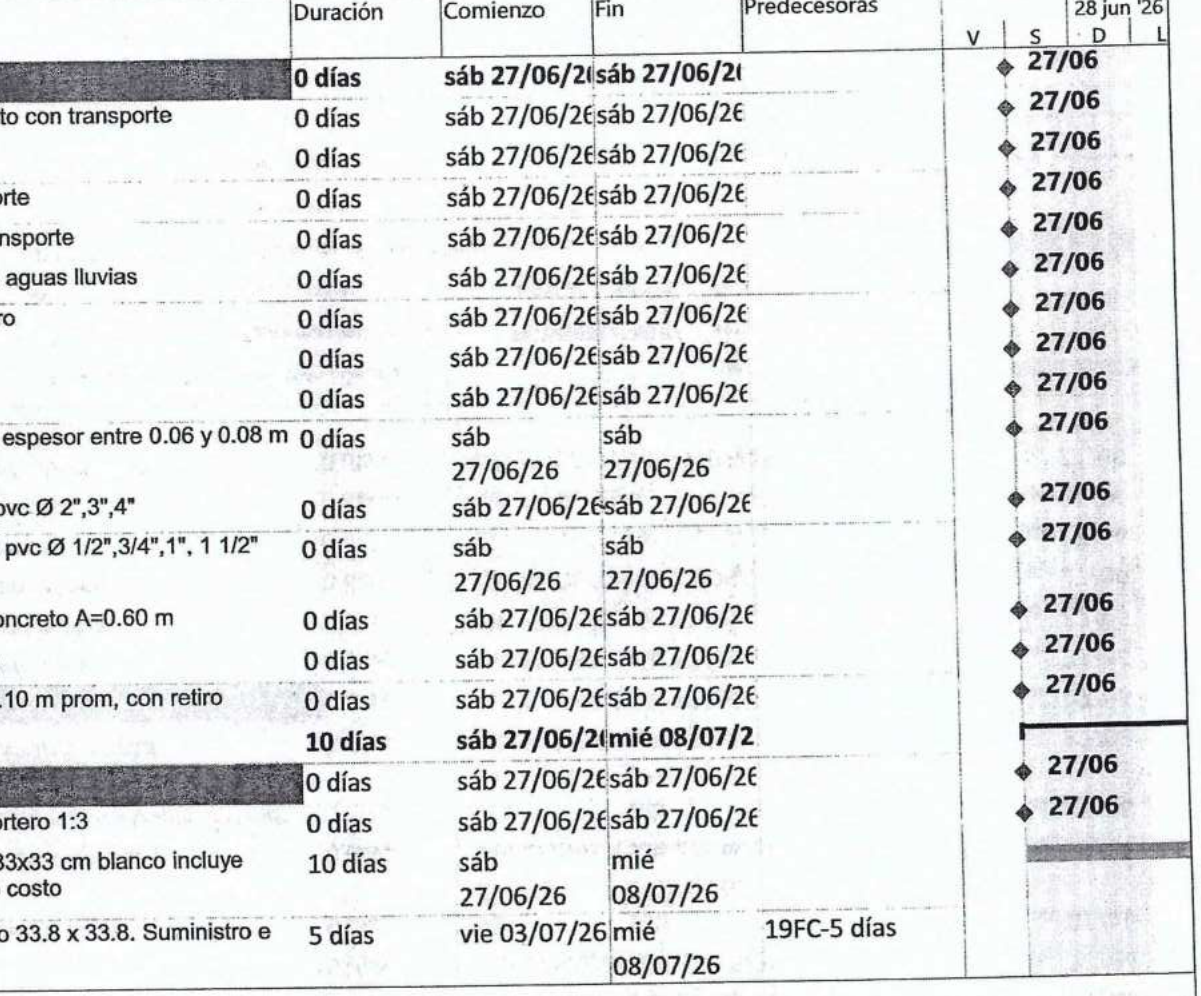

Proyecto: Prorroga N° 02 Casirv

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
40		Excavacion manual en conglomerado	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
41		Sistema septico Ovoide 2000 Lt (incluye:Tanque septico, Tanque ar	**9 días**	**sáb 27/06/2**	**mié 08/07/2**	
42		**APARATOS SANITARIOS**	1 día	mar 07/07/26	mié 08/07/26	20FC-2 días
43		Lavamanos de incrustar San Lorenzo blanco de corona con grife	1 día	mar 07/07/2	mié 08/07/2	20FC-2 días
44		Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e Instal.	1 día	mar 07/07/26	mié 08/07/26	20FC-2 días
45		Lavaplatos sencillo en acero inoxidable acabado satinado de 62x48 cm de empotrar + griferia Aluvia o similar, con acople	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
46		**MUROS Y ACABADOS**	0 días	sáb 27/06/2	sáb 27/06/2	
47		Pañete impermeabilizado muros 1:3 espesor 2 cms, filos y dilatacio	**12 días**	**sáb 27/06/2**	**vie 10/07/26**	
48		Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	5 días	mar 30/06/2	lun 06/07/26	51
49		Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones	1 día	sáb 27/06/2	lun 29/06/26	
50		Raspado superficie de muro pintado en vinilo	2 días	lun 06/07/26	mié 08/07/2	48
51		Pintura acrilica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos	2 días	sáb 27/06/2	mar 30/06/2	
52		Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manc	3 días	mié 08/07/2	vie 10/07/26	50
53		Poyo en concreto 3000 psi 10x60 cm	3 días	sáb 27/06/2	mié 01/07/2	
54		Mesones en concreto 3000 psi reforzado e=0.08 m A=0.60m aca	0 días	sáb 27/06/2	sáb 27/06/2	
55		**CUBIERTA**	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	
56		Correa metalica en perfil estructural rectangular 100 x 40 x 2 mm, c	**2 días**	**sáb 27/06/2**	**mar 30/06/2**	
57		Platina 0.10*0.10 m en lamina HR 1/8" con anclajes de 1/4". Suministro e instalacion	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	

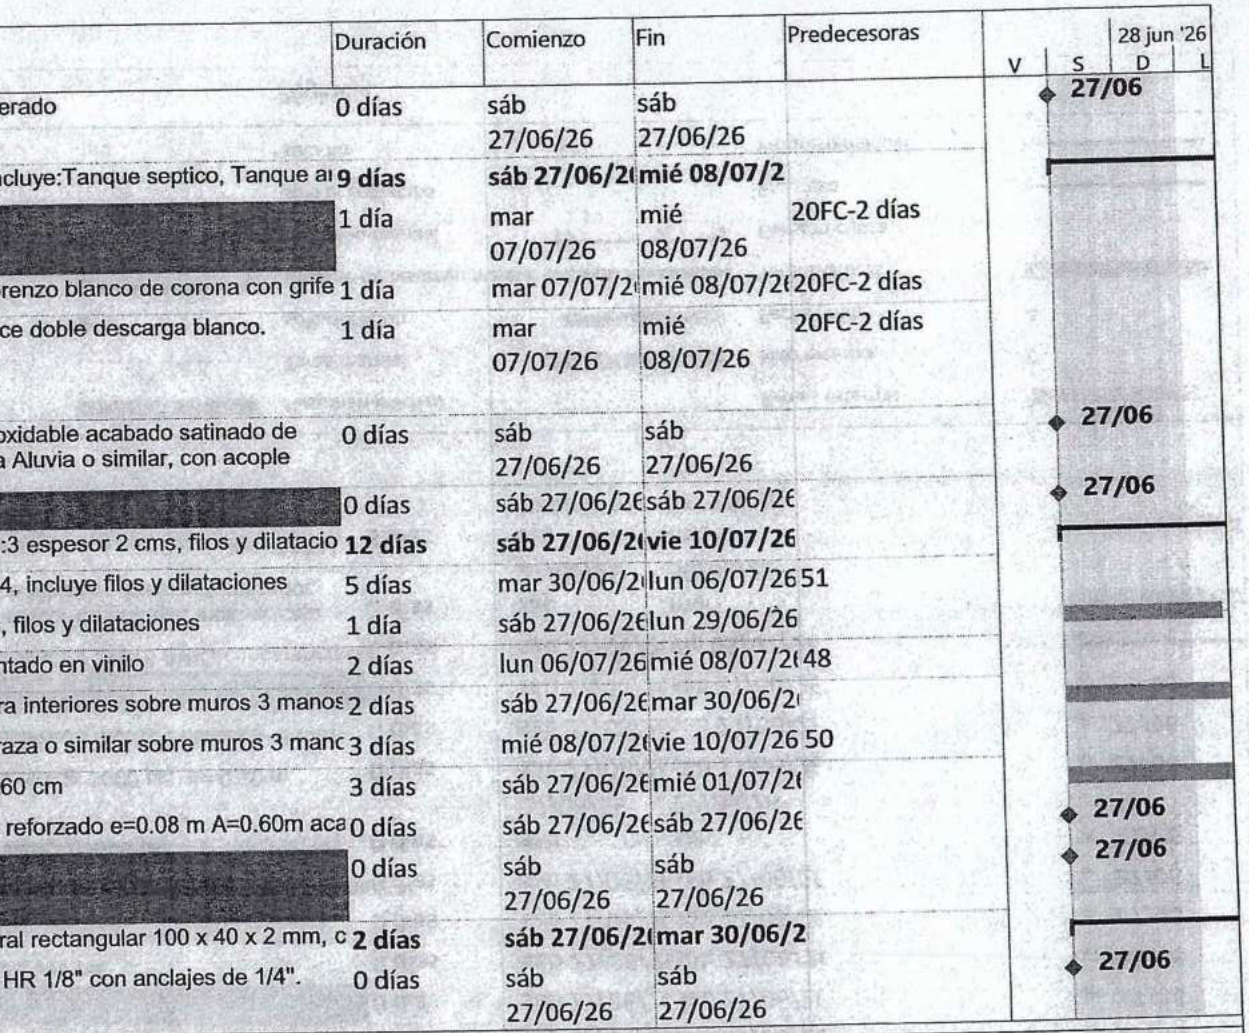

Proyecto: Prorroga N° 02 Casirv

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
75		Interruptor Termomagnético Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador. Suministro e instalación	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
76		Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalacion	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
77		Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
78		Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijació	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
79		Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
80		Modulo LED redondo 18W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijac	3 días	mar 30/06/26	vie 03/07/26	73
81		Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 40W, 110 V. Incluye: Elementos de fijación, suministro e instalación	4 días	mar 30/06/26	vie 03/07/26	73
82		Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica, terminales PVC y readecuación de muro	2 días	mar 30/06/26	jue 02/07/26	73
83		Salida para interruptor Doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica 5800, terminales PVC y readecuación de muro	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
84		Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metalica 5800 o 2400 incluye aparato	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
85		Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	



Proyecto: Prorroga N° 02 Casirv


Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
101		Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosi	2 días	sáb 27/06/26	mar 30/06/2	
102		Cerradura de doble seguridad de escudo pomo + cerrojo para entrada principal. Suministro e Instal.	3 días	sáb 27/06/26	mié 01/07/26	
103		Cerradura alcoba pomo madera/metalica. Suministro e instal.	3 días	sáb 27/06/26	mié 01/07/26	
104		Correa metalica en perfil estructural rectangular 76 x 38 x 2.0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion	2 días	sáb 27/06/26	mar 30/06/26	
105		Lavamanos blanco de colgar acuacer o similar con grifería mc	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
106		Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 1 1/2", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit. Suministro e instalacion	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
107		Excavacion manual en conglomerado	2 días	sáb 27/06/26	mar 30/06/26	
108		Canalizacion ducto conduit PVC 1 1/2", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de río	2 días	sáb 27/06/26	mar 30/06/26	
109		Luminaria de emergencia tipo led 110V, 2.4W, autonomia min	3 días	sáb 27/06/26	mié 01/07/2	
110		Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V,	2 días	sáb 27/06/26	mar 30/06/2	
111		Caja de inspeccion AP-280	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
112		Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8"x2.4 m para bajante:	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
113		Luminaria tipo led hermética IP65, 2x18W, 3200 lm, Incluye: c	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	
114		Cortacircuito termomagnetico bipolar de 15-30A, 10kA, 120/2	1 día	sáb 27/06/26	lun 29/06/26	

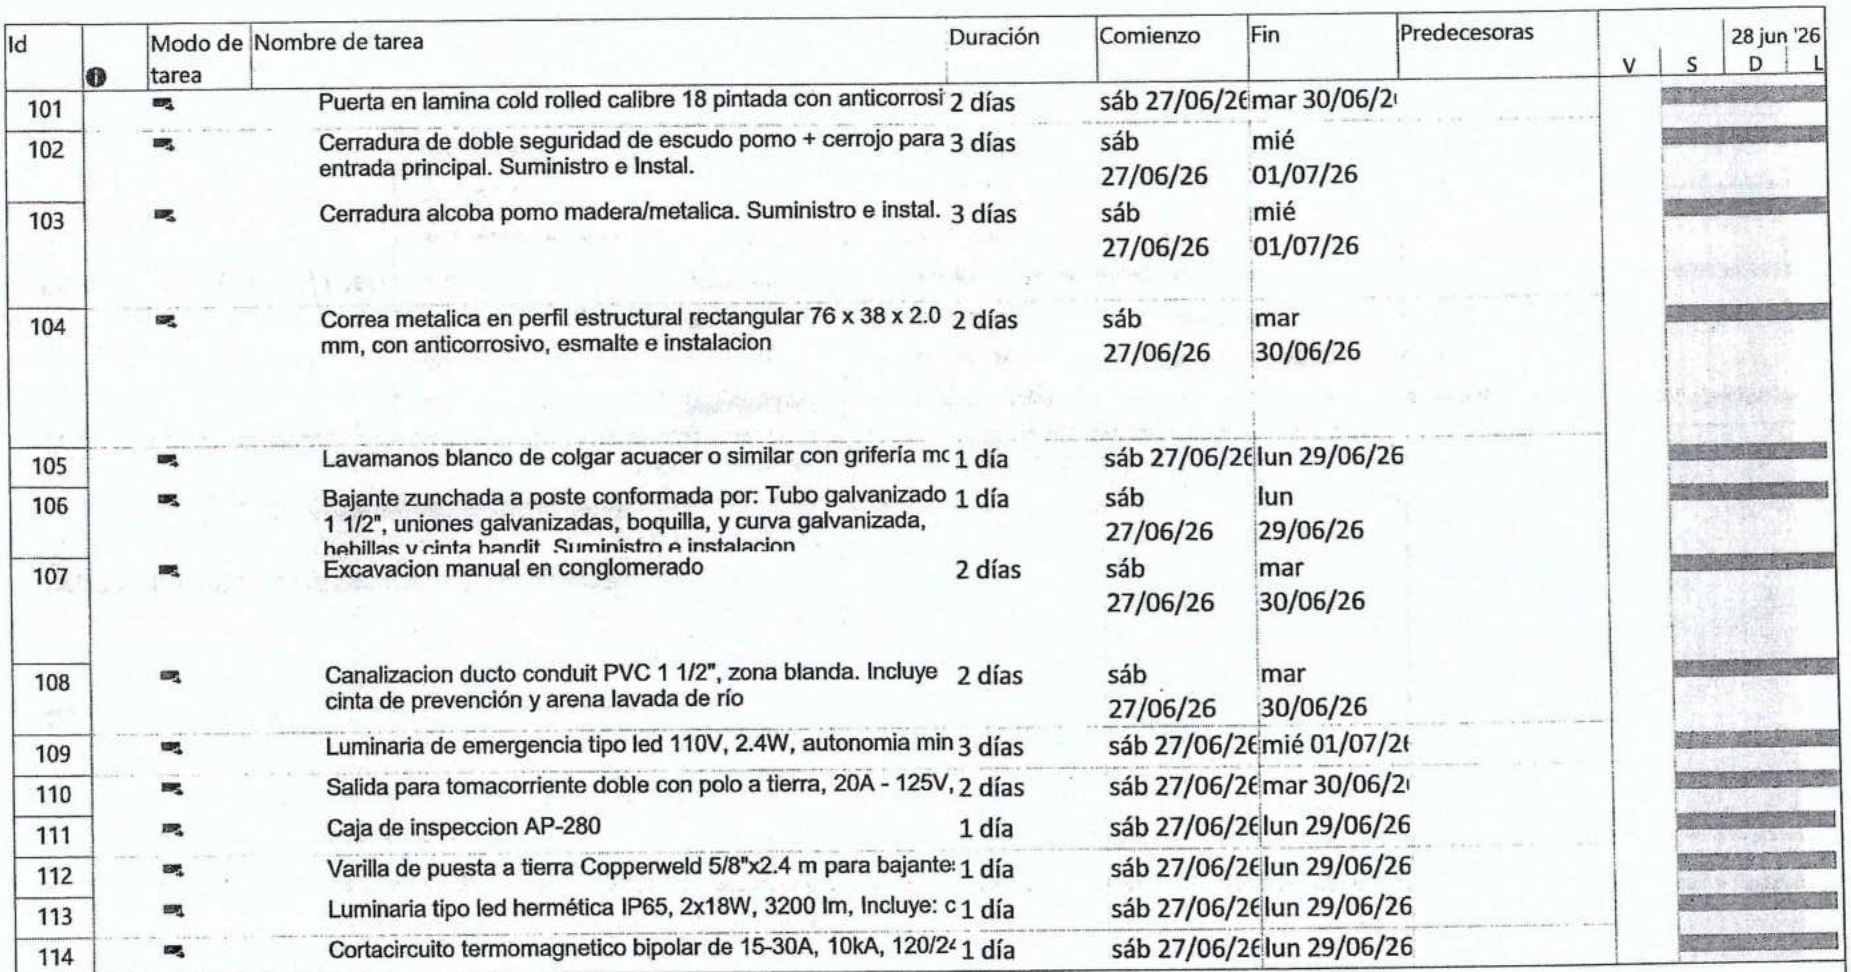


Proyecto: Prorroga N° 02 Casirv

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	

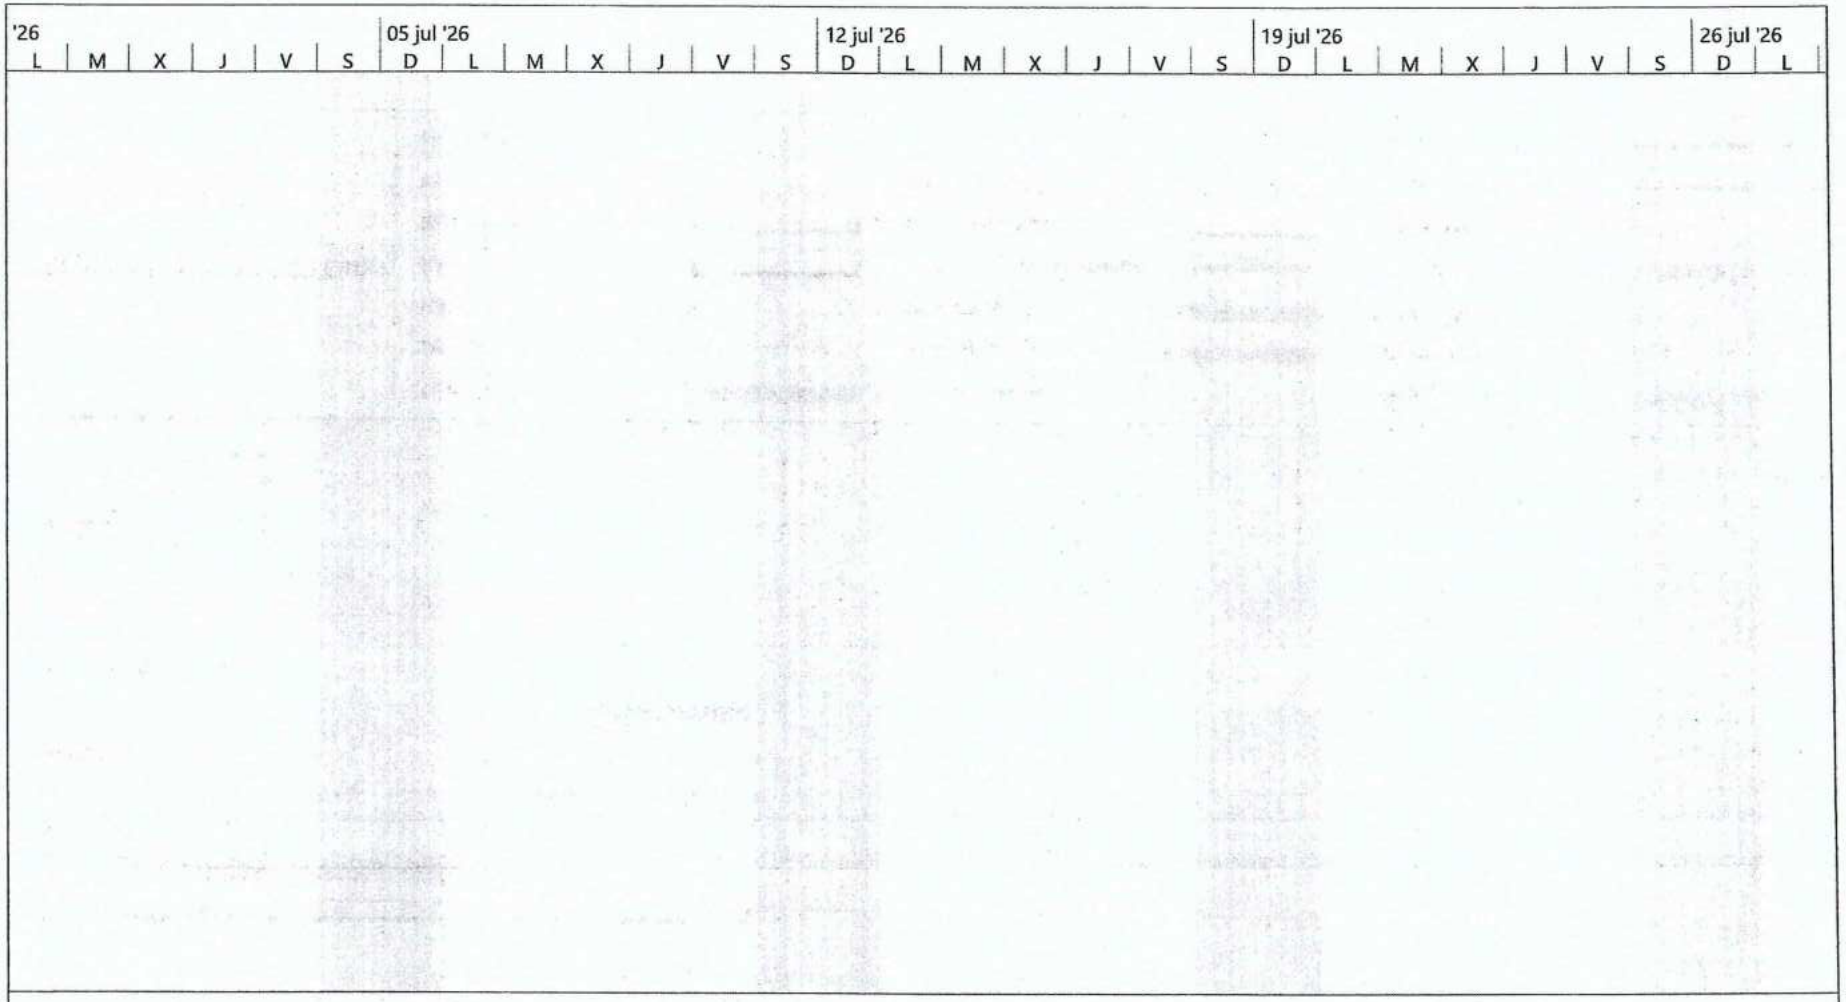


Proyecto: Prorroga N° 02 Casirv

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

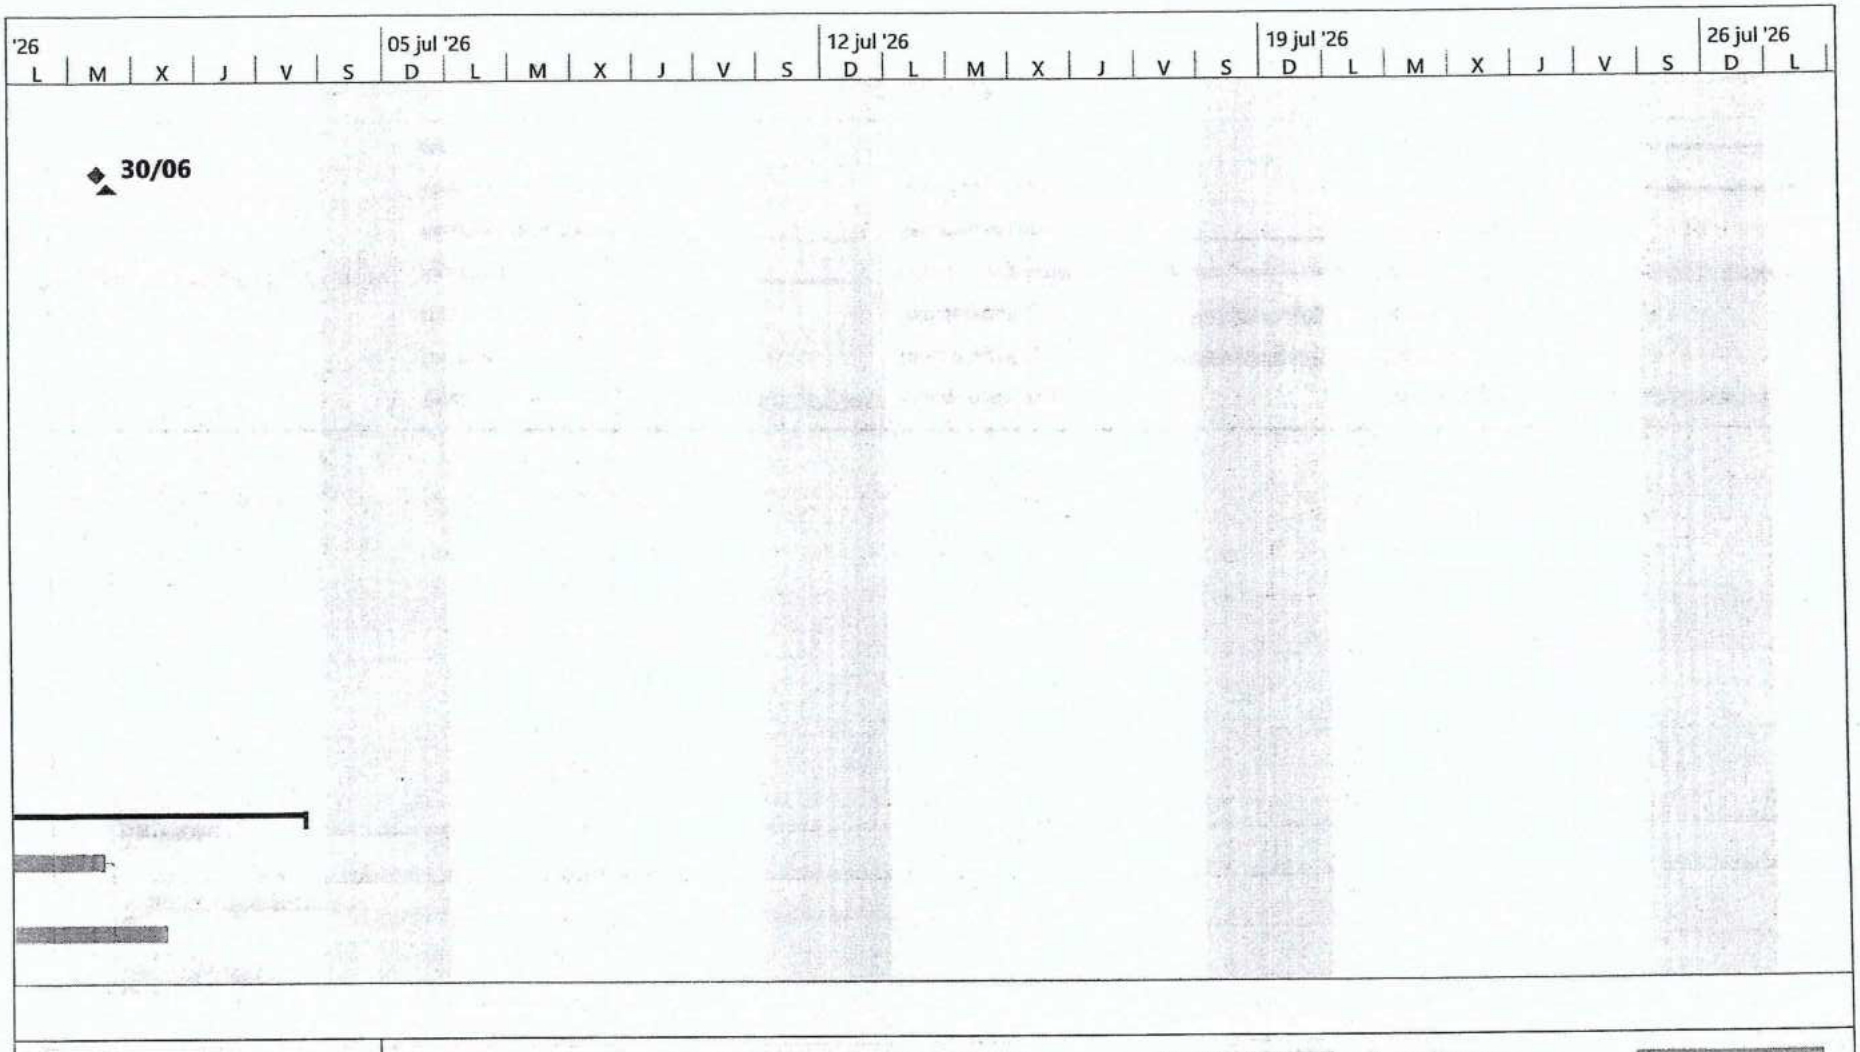

Proyecto: Prorroga N° 02 Casirv

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

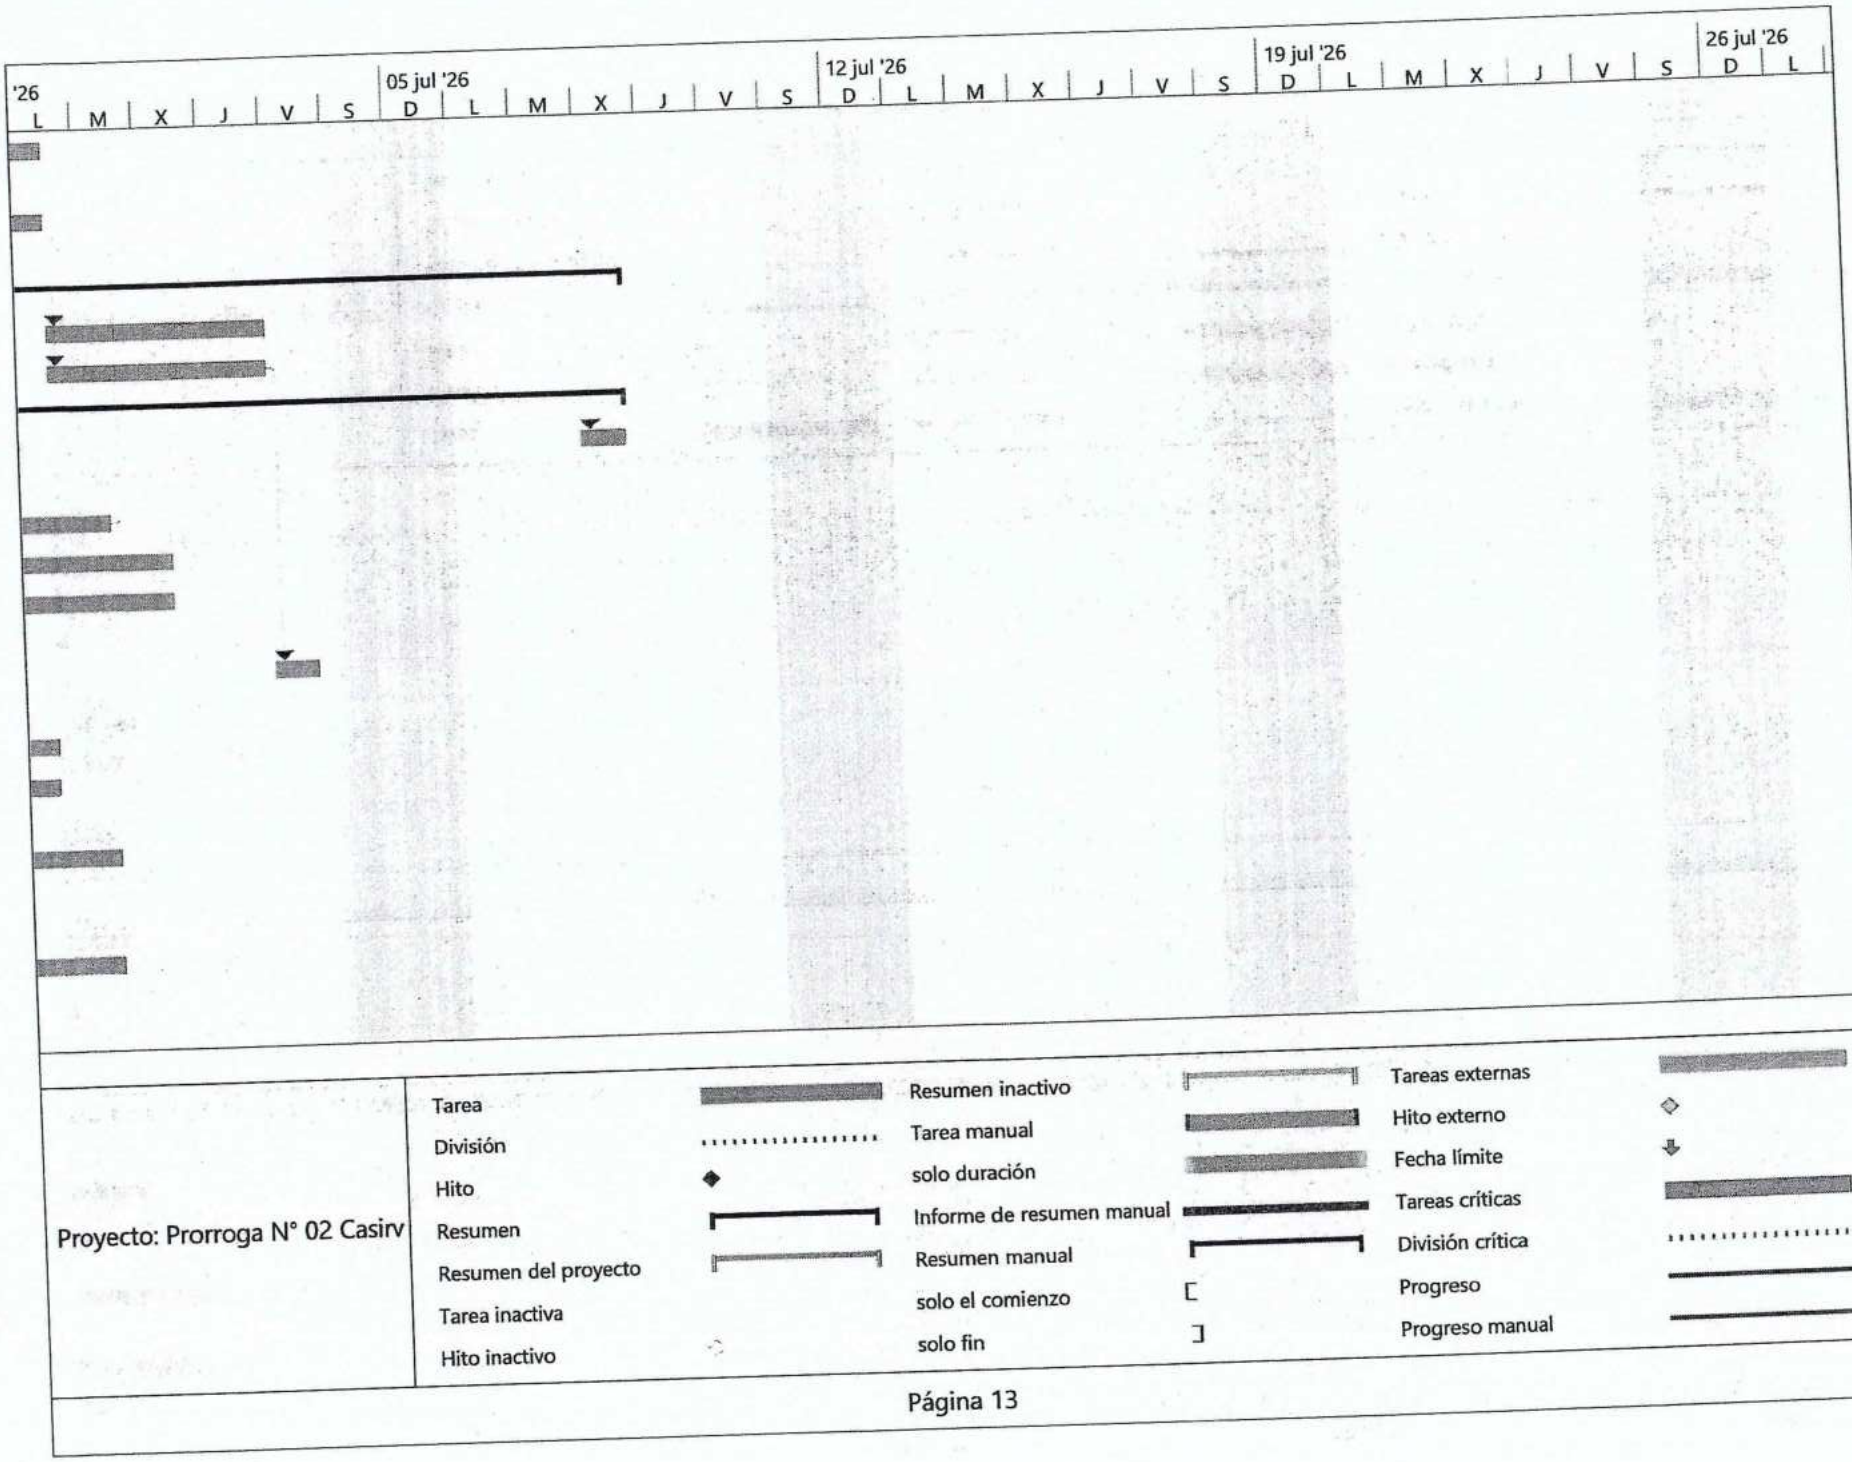
'26
L M X J V S
05 jul '26
D L M X J V S
12 jul '26
D L M X J V S
19 jul '26
D L M X J V S
26 jul '26
D L
Proyecto: Prorroga N° 02 Casirv
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

UNIÓN TEMPORAL ADECUACIONES PAPS SACAMA

FLUJO DE CAJA

LOTE 08. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LA VEREDA CASIRVA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

			JULIO			
		Valor	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21
1	ACTIVIDES PRELIMINARES					
1,1	Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte	$ 1,049,332.00	$ -	$ -		
1,2	Desmonte aparatos sanitarios	$ 73,695.00	$ -	$ -		
1,3	Desmonte de ventanas, con transporte	$ 186,155.00	$ -	$ -		
1,4	Desmonte marcos y puertas con transporte	$ 201,537.00	$ -	$ -		
1,5	Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias	$ 72,530.00	$ -	$ -		
1,6	Demolicion enchape muros con retiro	$ 234,754.00	$ -	$ -		
1,7	Desmonte de cielo raso con retiro	$ 762,024.00	$ -	$ -		
1,8	Desmonte correas	$ 395,388.00	$ -	$ -		
1,9	Demolicion a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro	$ 2,057,419.00	$ -	$ -		
1,10	Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4"	$ 183,181.00	$ -	$ -		
1,11	Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro	$ 79,167.00	$ -	$ -		
1,12	Demolicion manual de mesón en concreto A=0.60 m	$ 85,491.00	$ -	$ -		
1,13	Demolicion pañete muro, con retiro	$ 334,328.00	$ -	$ -		
1,14	Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	$ 2,013,271.00	$ -	$ -		
1,15	Desmonte tableros electricos	$ 65,853.00				
2	PISOS Y ENCHAPES					
2,1	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	$ 3,425,558.00		$ 3,425,558.00	$ -	$ -
2,2	Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye destronque, pulida y brillado a todo costo	$ 2,440,184.00	$ -	$ 1,220,092.00	$ 2,006,736.50	$ -
2,3	Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.	$ 3,185,538.00	$ -	$ -	$ 3,185,538.00	$ -
2,4	Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. Sumin e instal	$ 2,575,754.00	$ -	$ -	$ -	$ -
2,5	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	$ 9,711,927.00	$ 9,711,927.00	$ -		$ -
2,6	Guardaescoba en ceramica duropiso 33 x 7 cm. Suministro e instalacion	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2,7	Mediacaña mortero imp 1:3 esmaltado 0.12*0.12m	$ 2,735,314.00	$ -	$ -	$ -	$ -
3	INSTALACIONES HIDRAULICAS		$ -	$ -	$ -	$ -
3,1	Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	$ 81,281.00	$ -	$ -	$ -	$ -
3,2	Tuberia presion PVC RDE 21 3/4". Suministro e instal.	$ 195,382.00	$ -	$ -	$ -	$ -
3,3	Punto agua fria PVC 1/2"	$ 655,767.00		$ -	$ -	$ -

UNIÓN TEMPORAL ADECUACIONES PAPS SACAMA

FLUJO DE CAJA

LOTE 08. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LA VEREDA CASIRVA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

			JULIO			
		Valor	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21
7,1	Correa metalica en perfil estructural rectangular 100 x 40 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7,2	Platina 0.10*0.10 m en lamina HR 1/8" con anclajes de 1/4". Suministro e instalacion	$ 2,035,008.00	$ -	$ -	$ -	$ -
7,3	Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 pintada a dos caras, poliuretano de e=38 mm. Suministro e instalación.	$ 37,992,766.00	$ -	$ -	$ -	$ -
7,4	Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m	$ 432,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -
7,5	Cielo raso dry-wall plano con lámina gyplac RH antihumedad de 1/2" o 12.7mm o similar, pintado con 3 manos vinilo superlavable contra alto desgaste	$ 5,868,706.00	$ 2,934,353.00	$ 2,934,353.00	$ -	$ -
7,6	Canal en lamina galvanizada cal. 16 desarrollo 0.60 m pintado con wash primer y esmalte. Suministro e Instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7,7	Bajante A.LL. PVC 4"	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7,8	Viga cinta de 0.15 x 0.10 m en concreto de resistencia 3000 Psi	$ 6,314,294.00	$ -	$ -	$ -	$ -
8	ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO		$ -	$ -	$ -	$ -
8,1	Concreto ciclopeo de resistencia 2500 psi	$ 258,517.00	$ -	$ -	$ -	$ -
8,2	Acero de Refuerzo Grado 60	$ 3,397,071.00	$ -	$ -	$ -	$ -
8,3	Zapata en concreto impermeabilizado para cimentación resistencia de 3000 psi	$ 547,848.00	$ -	$ -	$ -	$ -
8,4	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	$ 290,844.00	$ -	$ -	$ -	$ -
8,5	Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.20 m.	$ 412,649.00	$ -	$ -	$ -	$ -
8,6	Alistado esmaltado impermeabilizado muros y placas e=3 mm	$ 107,418.00	$ -	$ -	$ -	$ -
9	INSTALACIONES ELECTRICAS		$ -	$ -	$ -	$ -
9,1	Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AWG concentrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion	$ 1,717,360.00	$ -	$ -	$ -	$ -
9,2	Suministro e instalación de medidor de energia, incluye: caja para medidor, medidor trifasico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

UNIÓN TEMPORAL ADECUACIONES PAPS SACAMA

FLUJO DE CAJA

LOTE 08. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LA VEREDA CASIRVA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

			JULIO			
		Valor	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21
10,2	Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instal.	$ 6,515,847.00	$ 6,515,847.00	$ -	$ -	$ -
10,3	Porton tubo 2" e=1.5 mm y malla eslabonada cal 10, ángulo de 1 1/4" x 1/8".	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11	CERRAMIENTO		$ -	$ -	$ -	$ -
11,1	Cerramiento, en ciclopeo, viga, columnetas, muro a la vista, tubo con brazo, platina, angulo, malla eslabonada y 3 hilos.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NP	NO PREVISTOS					
NP 01	Juego de barras de seguridad en L 24" x 35" para baño PMR. Suministro e Instal.	$ 2,314,632.00	$ 1,157,316.00	$ 1,157,316.00	$ -	$ -
NP 02	Muro en bloque No. 5 arcilla tradicional de 0.12m (33x12x23)	$ 1,622,470.00	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 03	Rinconera en PVC media caña 0.09 m Sunministro e instal.	$ 2,213,357.00	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 04 -Cod. 7156	Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	$ 4,458,483.00	$ 4,458,483.00	$ -	$ -	$ -
NP 05	Tablero monofasico de 6 circuitos con puerta. Suministro e instalacion	$ 219,445.00	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 06	Enchape de piso en ceramica antideslizante 45 x 45	$ 2,853,805.00	$ 2,853,805.00	$ -	$ -	$ -
NP 07	Imper mur Impermeabilizante muros con humedad (2 capas)	$ 10,757,074.00	$ 5,378,537.00	$ 5,378,537.00	$ -	$ -
NP 08	Columneta de 0.12 x 0.20 en concreto resistencia 3000 Psi sin refuerzo	$ 777,032.00	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 09	Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte, incluye marco. Suministro e instal	$ 3,171,920.00	$ 1,585,960.00	$ 1,585,960.00	$ -	$ -
NP 10	Cerradura de doble seguridad de escudo pomo + cerrojo para entrada principal. Suministro e Instal.	$ 986,172.00	$ -		$ -	$ -
NP 11	Cerradura alcoba pomo madera/metalica. Suministro e instal.	$ 496,711.00	$ -	$ 496,711.00	$ -	$ -
NP 12	Correa metalica en perfil estructural rectangular 76 x 38 x 2.0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion	$ 9,353,613.00	$ -	$ -	$ -	$ -
NP 13	Lavamanos blanco de colgar acuacer o similar con grifería monocontrol media cromada, incluye sifón flexible, desague, valvula reguladora y acople metalico.Instalacion	$ 1,177,347.00	$ -		$ -	$ -

Yopal, 19 de Junio de 2026

Señores:
SSB DESARROLLO S.A.S
Atn. R/L.MELISA BARRAGAN AVILA
Representante legal.
interventorias@ssanba.com

Ref. CONTRATO DE OBRA No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026

Objeto: LOTE 08. INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SINAI, CASIRVA Y SABANALARGA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Asunto: Aceptación y aprobación de solicitud de **PRORROGA N. 01 al CONTRATO DE OBRA No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026**

Cordial saludo,

En mi calidad de Supervisor Delegado del Contrato de Interventoría **SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NÚMERO INTERNO 046-2026**, me permito manifestar la aceptación y aprobación de la Prórroga No. 01 al citado contrato, con el propósito de modificar la Cláusula Octava – Plazo de Ejecución Contractual.

La presente solicitud se encuentra sustentada en la necesidad de garantizar la continuidad de las labores de seguimiento, control, vigilancia y verificación técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica que debe ejercer la Interventoría sobre el Contrato de Obra **SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NÚMERO INTERNO 046-2026**, teniendo en cuenta que la ejecución de ambos contratos debe mantenerse de manera paralela y coordinada hasta la culminación efectiva de las actividades contratadas.

Una vez revisados los argumentos expuestos por el contratista de interventoría, así como la documentación presentada y las condiciones actuales de ejecución del proyecto, esta Supervisión considera que la ampliación del plazo contractual resulta necesaria para garantizar el adecuado acompañamiento, control y seguimiento a la ejecución de las obras durante el término adicional otorgado al contrato de obra, permitiendo verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la calidad de las actividades ejecutadas y el cierre satisfactorio del proyecto.

Las circunstancias que sustentan la presente solicitud corresponden al desarrollo de la ejecución contractual y a la necesidad de mantener la vigilancia permanente de las actividades pendientes de ejecución dentro del contrato de obra, situación que no modifica el objeto contractual de la interventoría, sino que garantiza el cumplimiento integral de su finalidad, consistente en ejercer el control y seguimiento permanente al proyecto de adecuación menor de los puestos de salud.
En consecuencia, esta Supervisión considera procedente la ampliación del plazo contractual de la interventoría, toda vez que la permanencia de dicho contrato durante el término adicional otorgado a la obra constituye un requisito indispensable para garantizar la correcta ejecución, control y recibo de las actividades pendientes.

Así mismo, se requiere al Contratista de Interventoría para que, dentro del marco de sus obligaciones contractuales, gestione, solicite, revise, apruebe y efectúe seguimiento permanente al Plan de Acción y/o Plan de Contingencia que deberá implementar el contratista de obra, estableciendo de manera clara y detallada las estrategias, actividades, responsables, recursos, rendimientos esperados, controles y cronograma de ejecución necesarios para garantizar el cumplimiento total del objeto contractual dentro del término de la prórroga otorgada.

Dicho Plan de Acción deberá contener metas verificables, indicadores de cumplimiento y mecanismos efectivos de seguimiento que permitan evidenciar el avance real de las actividades programadas, así como las medidas correctivas y preventivas necesarias para evitar nuevos retrasos durante el plazo adicional concedido. La Interventoría será responsable de verificar su implementación, realizar seguimiento permanente a su cumplimiento, emitir las recomendaciones y requerimientos a que haya lugar y reportar oportunamente a la Supervisión cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento del cronograma establecido.

De igual manera, se deja constancia de que la presente prórroga se concede bajo el entendido de que la Interventoría ejercerá un control estricto sobre la programación, ejecución y avance de las actividades pendientes, adoptando las medidas de seguimiento y control necesarias para garantizar que el plazo adicional otorgado al contrato de obra permita la culminación efectiva de las actividades contratadas y el cumplimiento integral del objeto contractual, evitando la materialización de riesgos que puedan generar nuevas solicitudes de ampliación atribuibles a deficiencias en la gestión, seguimiento o control del proyecto.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que la ampliación del plazo resulta necesaria para garantizar la continuidad de las labores de interventoría y el adecuado control de la ejecución contractual hasta la culminación de las obras, esta Supervisión aprueba la Prórroga No. 01 al Contrato de Interventoría **SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NÚMERO INTERNO 046-2026**, por un término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de terminación inicialmente prevista en el contrato, quedando el contratista de interventoría obligado a ejercer las acciones de seguimiento, control, vigilancia y verificación necesarias para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante el término prorrogado.

Atentamente,

ANA DIONERIA BUSTOS CABALLERO
SUPERVISOR DELEGADO.

Proyecto:
Profesional contratado de apoyo a la supervisión-Manning S.A.S

Yopal, 19 de Junio de 2026

PARA: MARYURI LIZETH AVILA SANCHEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: ANA DIONERIA BUSTOS CABALLERO
Supervisor Delegado

Asunto: Solicitud de elaboración de Prorroga en tiempo No 01 para el CONTRATO DE OBRA No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026

Cordial Saludo,

En mi calidad de supervisor del contrato de interventoría asunto de la referencia, me permito aceptar y dar viabilidad para suscribir la **Prorroga No. 01**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones con el fin de ajustar la **CLÁUSULA OCTAVA - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**.

1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

La solicitud de Prórroga No. 01 al Contrato de Interventoría por un término de treinta (30) días calendario encuentra su fundamento en la necesidad de garantizar la continuidad de las actividades de seguimiento, control, vigilancia y verificación integral sobre la ejecución del Contrato de Obra **SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NÚMERO INTERNO 556-2026**, cuya ampliación de plazo se sustenta en circunstancias técnicas, logísticas y operativas debidamente justificadas por el contratista de obra y avaladas por la interventoría.

Dentro de dichas circunstancias se encuentra la fuerte temporada invernal que afecta actualmente la región y que tuvo inicio durante el mes de abril del presente año, generando afectaciones significativas en la infraestructura vial del municipio y en las vías terciarias de acceso a las veredas donde se ejecutan las intervenciones. Esta situación ocasionó cierres parciales y temporales, pérdida de banca, deterioro de la carpeta de rodadura y dificultades de transitabilidad para el transporte de personal, equipos y materiales, impactando directamente el desarrollo de las actividades constructivas programadas.

De igual forma, las condiciones climáticas adversas ocasionaron interrupciones recurrentes en el servicio de energía eléctrica en diferentes sectores del municipio, afectando el rendimiento de actividades que requieren el uso permanente de equipos y herramientas eléctricas, generando retrasos en la ejecución de varias actividades contempladas dentro de la programación contractual.

Adicionalmente, se presentaron situaciones relacionadas con el orden público en corredores viales y zonas rurales de la región, las cuales ocasionaron restricciones temporales a la movilidad y afectaciones logísticas para el abastecimiento oportuno de materiales e insumos necesarios para la ejecución de las obras.

Así mismo, se evidenciaron retrasos en el suministro e instalación de la cubierta tipo sándwich contemplada dentro de las especificaciones técnicas del proyecto, situación derivada de circunstancias ajenas al contratista asociadas a la cadena de suministro, procesos de fabricación, transporte y entrega de materiales. Dicha circunstancia impactó de manera directa la ruta crítica del proyecto, toda vez que la ejecución de actividades posteriores como pañetes, estucos, enchapes, pinturas y demás acabados dependían de la culminación de este componente constructivo y de condiciones adecuadas de protección y secado de las áreas intervenidas.

Las circunstancias anteriormente descritas corresponden a hechos externos, sobrevinientes y ajenos al control de las partes, los cuales afectaron de manera directa la programación inicialmente prevista, generando la necesidad de extender el plazo del contrato de obra con el fin de garantizar la terminación integral de las actividades pendientes, sin comprometer la calidad técnica, funcionalidad y estabilidad de las obras ejecutadas.

En consecuencia, y considerando que la interventoría tiene como objeto contractual ejercer el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico durante toda la ejecución del contrato de obra, resulta indispensable que su plazo de ejecución se mantenga concurrente y armónico con el plazo otorgado al contrato objeto de vigilancia. La terminación anticipada de la interventoría respecto del contrato de obra generaría la ausencia de control y seguimiento sobre las actividades pendientes de ejecución, afectando los principios de planeación, responsabilidad, economía, transparencia y control que rigen la contratación estatal.

Desde el punto de vista técnico, la permanencia de la interventoría durante el término adicional solicitado garantiza la verificación permanente de la calidad de las obras, el seguimiento al cronograma de ejecución, la validación de cantidades ejecutadas, la revisión de especificaciones técnicas, el control de los recursos invertidos y el recibo final de las actividades pendientes. De igual manera, permite implementar mecanismos de seguimiento que aseguren el cumplimiento de las metas establecidas para la culminación del proyecto.

Desde el punto de vista jurídico y contractual, la ampliación del plazo de la interventoría constituye una consecuencia necesaria y directa de la ampliación otorgada al contrato de obra, toda vez que la finalidad de dicho contrato de consultoría solo puede cumplirse plenamente mientras subsista la ejecución de las actividades objeto de control. Por lo tanto, mantener vigente la interventoría durante el plazo adicional de obra resulta indispensable para garantizar el cumplimiento integral de sus obligaciones contractuales y la adecuada protección de los intereses de la entidad.

Por lo anterior, se considera técnica, jurídica y contractualmente procedente la Prórroga No. 01 al Contrato de Interventoría **SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NÚMERO INTERNO 046-2026** por el mismo término otorgado al contrato de obra, garantizando así la continuidad del seguimiento y control requerido hasta la terminación, recibo y cierre efectivo del proyecto.

2. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

Modificar la Cláusula Octava del Contrato No. **SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NÚMERO INTERNO 046-2026**, el cual quedará así:

CLÁUSULA OCTAVA - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual **El CONTRATISTA** se compromete a prestar a entera satisfacción de **RED SALUD CASANARE E.S.E, el servicio objeto del presente contrato, será de CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÒN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE EJECUCIÓN.** Que para

efectos del presente memorando de solicitud se PRORROGA en un término de un (01) mes mas al plazo pactado en el contrato **No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NÚMERO INTERNO 046-2026** contado a partir del vencimiento del plazo contractual vigente. Las cláusulas del contrato que no hubieren sido expresamente modificadas por la presente prórroga se mantendrán incólumes. Por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, es decir, que el cumplimiento de las obligaciones se va sucediendo de manera escalonada en el tiempo, se verificará su cumplimiento total hasta el vencimiento del término previsto para su ejecución. Pero el cumplimiento parcial de las obligaciones se verificará de acuerdo con los informes periódicos de cumplimiento presentados al Supervisor del contrato. La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, **EL CONTRATISTA** debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.

3. SOPORTES ADJUNTOS

Para sustentar esta solicitud, anexo los siguientes documentos:

1. Copia de la solicitud del contratista.

Atentamente,

ANA DIONERIA BUSCOS CABALLERO
Supervisor Delegado

LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS
Gerente

Proyecto:
Profesional contratado de apoyo a la supervisión-Manning S.A.S
