
AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - MAY. 17 2026

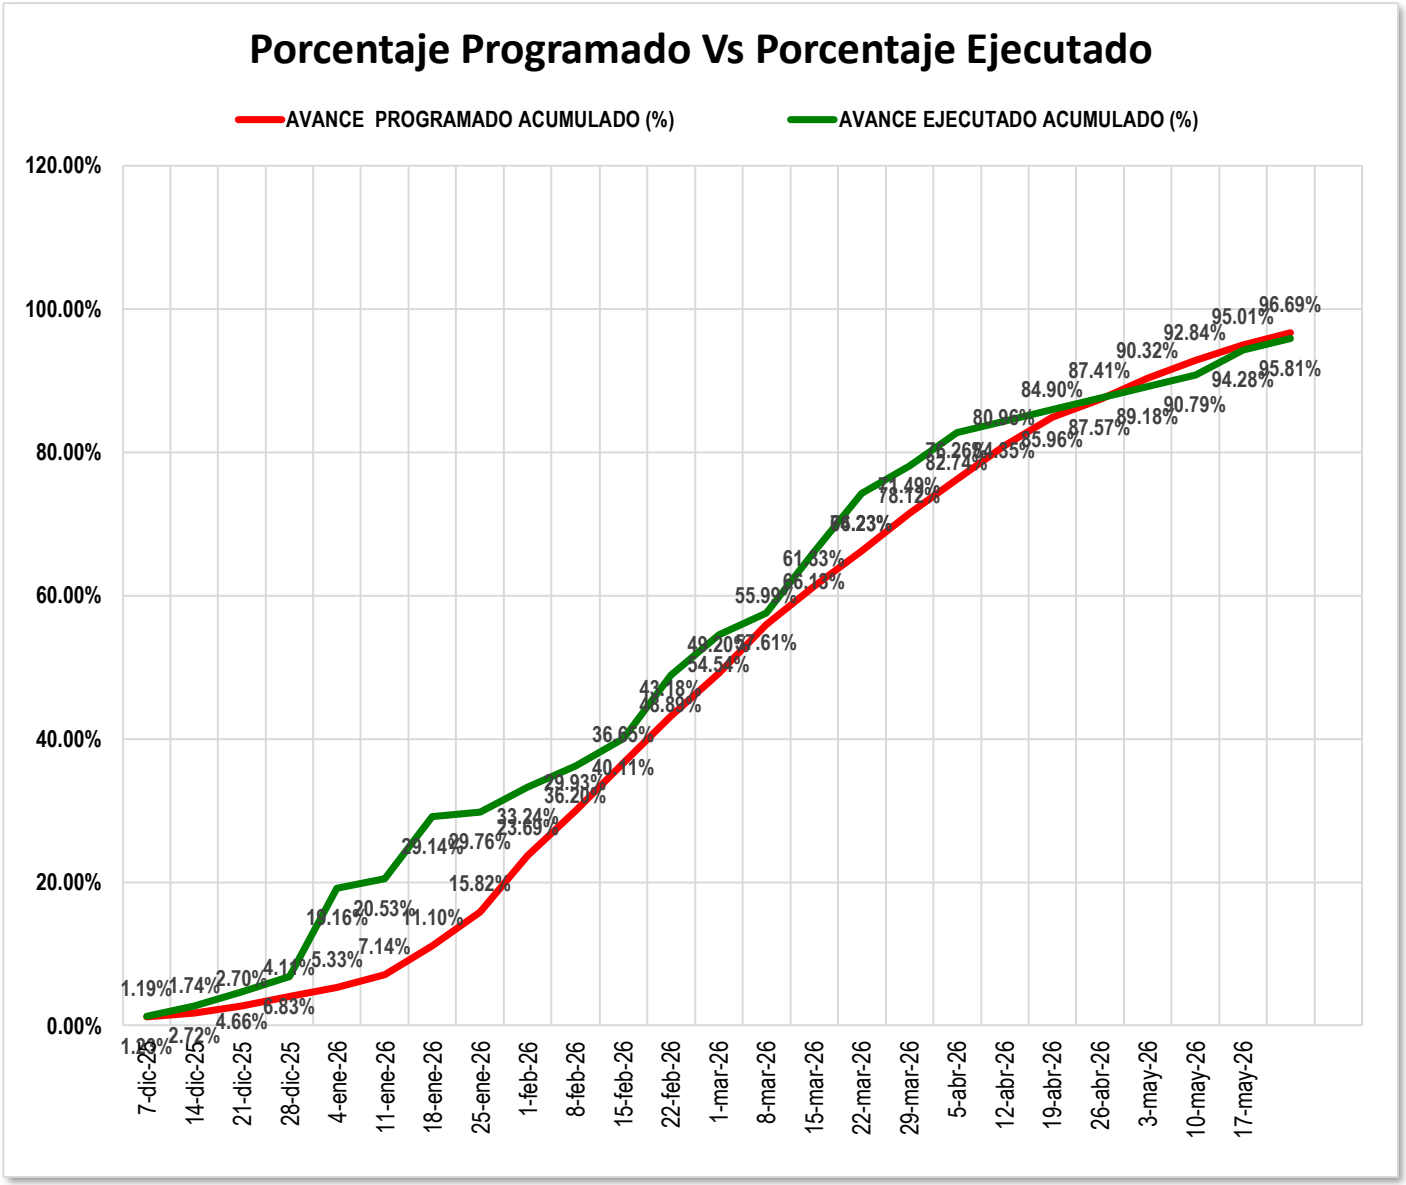

FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0,00%	0,00%
16-nov-25	0,11%	0,19%
23-nov-25	0,58%	0,70%
30-nov-25	1,19%	1,23%
7-dic-25	1,74%	2,72%
14-dic-25	2,70%	4,66%
21-dic-25	4,11%	6,83%
28-dic-25	5,33%	19,16%
4-ene-26	7,14%	20,53%
11-ene-26	11,10%	29,14%
18-ene-26	15,82%	29,76%
25-ene-26	23,69%	33,24%
1-feb-26	29,93%	36,20%
8-feb-26	36,65%	40,11%
15-feb-26	43,18%	48,89%
22-feb-26	49,20%	54,54%
1-mar-26	55,99%	57,61%
8-mar-26	61,33%	66,13%
15-mar-26	66,23%	74,23%
22-mar-26	71,49%	78,12%
29-mar-26	76,26%	82,74%
5-abr-26	80,96%	84,35%
12-abr-26	84,90%	85,96%
19-abr-26	87,41%	87,57%
26-abr-26	90,32%	89,18%
3-may-26	92,84%	90,79%
10-may-26	95,01%	94,28%
17-may-26	**96,69%**	**95,81%**
24-may-26	98,26%	
31-may-26	99,54%	
1-jun-26	100,00%	

FECHA: 24/05/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES 8 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			GRUPO	4
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA				
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:		consorcio adecuaciones ARSAF 2025		
24 de mayo de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:		consorcio SERINCO educativo		

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8155135	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131.00	$ 2,703,377,443.00
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ 128,425,720.00	$ 479,000,000.00
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRÓRROGAS	30	27	TOTAL	$ 924,609,851.00	$ 3,182,377,443.00
TERMINACION FINAL	4 de junio de 2026	1 de junio de 2026	TOTAL	241	238			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 128,425,720.00	30	
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	18-dic-25	$ 479,000,000.00	27	
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH – 100046043 – Anexo 0	4 9 2025	4 10 2026	4 4 2026	4 4 2031	4 9 2025	4 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
96098	4 9 2025	4 12 2026	4 9 2025	4 4 2029	4 4 2026	4 4 2028	27661	4 9 2025	4 4 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (24-05-2026)	PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026	abr-2026	abr-2026	may-2026	may-2026	jun-2026	jun-2026
1981-L	FANNY MICKEY (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Villas del Diamante	100.00%	100.00%	100.00%		$ 814,870,147	$ 814,870,147.30	10/11/2025	11/04/2026																		
1962	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	D	Estrella del Sur (4)	100.00%	100.00%	100.00%		$ 90,810,134	$ 90,810,133.53	2/02/2026	30/04/2026																		
1919	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	Estrella III Sede C	100.00%	100.00%	100.00%		$ 76,247,492	$ 76,247,492.45	15/01/2026	28/03/2026																		
1912	CONFEDERACION BRISAS DEL	CIUDAD BOLIVAR	A	Confederación Suiza	100.00%	100.00%	100.00%		$ 706,778,611	$ 706,778,611.33	18/11/2025	28/03/2026																		
1911	COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Compartir Lucero Alto	98.57%	98.57%	95.75%		$ 278,172,403	$ 274,194,834.12	24/11/2025	1/06/2026																		
576	DIEGO MONTAÑA CUELLAR (IED)	USME	A	El Uval - Nuevo	78.18%	89.39%	91.18%		$ 411,761,249	$ 368,085,121.69	1/12/2025	1/06/2026																		
573	OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)	USME	A	El Bosque Nuevo	96.41%	96.41%	100.00%		$ 242,305,285	$ 233,606,642.96	24/11/2025	7/05/2026																		
539	LOS TEJARES (IED)	USME	A	Los Tejares	92.84%	96.55%	99.29%		$ 242,176,869	$ 233,821,083.79	1/12/2025	1/06/2026																		
TOTAL FRENTES DE OBRA						97.74%	98.26%		$ 2,863,122,191	$ 2,798,414,067																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
527	FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)	USME	C	Maria Auxiliadora Sede C		100.00%	100.00%		$ 2,129,816	$ 2,129,816.00	23/11/2025	24/11/2025																		
577	CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)	USME	A	lote - Puerta Al llano valle 12		100.00%	100.00%		$ 5,810,951	$ 5,810,951.00	22/11/2025	24/11/2025																		
1928	EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Manuela Beltrán		100.00%	100.00%		$ 52,871,886	$ 52,871,886.00	4/12/2025	7/01/2026																		
1911	COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Compartir Lucero Alto		100.00%	100.00%		$ 10,017,779	$ 10,017,779.00																				
533	RURAL LA UNION USME (CED)	USME	A	La Unión Usme		100.00%	100.00%		$ 2,000,000	$ 2,000,000.00	15/05/2026	15/05/2026																		
533	RURAL LA UNION USME (CED)	USME	A	La Unión Usme																										
1981-I	FANNY MICKEY (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Villas del Diamante		100.00%	100.00%		$ 3,852,781	$ 3,852,781.00	23/03/2026	13/04/2026																		
1911	COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Compartir Lucero Alto					$ 6,000,000		18/05/2026	5/06/2026																		
1912	CONFEDERACION BRISAS DEL	CIUDAD BOLIVAR	A	Confederación Suiza					$ 56,134,766		28/04/2026	1/06/2026																		
1911	COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Compartir Lucero Alto		25.00%			$ 34,000,000		20/05/2026	18/06/2026																		

FECHA: 24/05/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 8 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				GRUPO 4
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155135	CONTRATISTA:	consorcio adecuaciones ARSAF 2025	
17/5/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	consorcio SERINCO educativo	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 100.00%	FANNY MICKEY	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y TERRAZAS	 		
		INTERVENCION BATERIAS SANITARIAS (Cambio de sanitarios, orinales, lavamanos y griferia).	 	 	
2A 100.00%	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	IMPERMEABILIZACION DE CUPULAS (CUBIERTA)		 	
3A 98.57%	COMPARTIR EL RECUERDO	Cerramiento en lona verde, replanteo, retiro de aparatos sanitarios, demolicion de enchape de pared y de piso		 	

FECHA:	24/05/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	8 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA		
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	GRUPO	4
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155135	CONTRATISTA:	consorcio adecuaciones ARSAF 2025
17/5/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	consorcio SERINCO educativo

4A 96.55%	LOS TEJARES	CAMBIO DE CUBIERTA EDIFICIO No.2, INCLUYE MEJORAMIENTO ELETRICO DE LOS ESPACIOS A INTERVENIR (2 AULAS Y 2 COORDINACIONES)				
5A 96.41%	OFELIA URIBE DE ACOSTA	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y TERRAZAS, MEJORAMIENTO DE CANALES Y BAJANTES, ADECUACION DE CARCAMOS,				
6A 89.39%	DIEGO MONTAÑA CUELLAR	ADECUACION BATERIA SANITARIA PARA MOVILIDAD REDUCIDA, ADECUACION RAMPA ACCESO AREA DE COMEDOR (AUDITORIO), MEJORAMIENTO DE CORNISAS				
7C 100.00%	ESTRELLA DEL SUR - C	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PORTONES PRINCIPALES CAMBIO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL				

FECHA:	24/05/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME
DIAS RESTANTES	8 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			APOYO A LA SUPERVISION
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			GRUPO 4
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155135	CONTRATISTA:	consorcio adecuaciones ARSAF 2025	
17/5/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	consorcio SERINCO educativo	

8C 100.00%	ESTRELLA DEL SUR - D	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PORTONES PRINCIPALES CAMBIO DE CUBIERTA				
9A 100.00%	FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME	TALA DE UN ARBOL Y PODA DE UN ARBOL				
10A 100.00%	CIUDAD DE VILLAVICENCIO	ADECUACION BATERIA SANITARIA PARA MOVILIDAD REDUCIDA, ADECUACION RAMPA ACCESO AREA DE COMEDOR (AUDITORIO), MEJORAMIENTO DE CORNISAS				
11A 100.00%	EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN	ADECUACION BATERIA SANITARIA PARA MOVILIDAD REDUCIDA, ADECUACION RAMPA ACCESO AREA DE COMEDOR (AUDITORIO), MEJORAMIENTO DE CORNISAS				

FECHA:	24/05/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	8 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA	
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	GRUPO 4
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155135	CONTRATISTA: consorcio adecuaciones ARSAF 2025
17/5/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR: consorcio SERINCO educativo

12A 100.00%	COMPARTIR EL RECUERDO (Emergencia 1)	RUPTURA DE TUBERÍA SOBRE BAÑO 2DO PISO Y EN PATIO PRINCIPAL, HUMEDAD SOBRE BAÑOS 2DO PISO				
13A 100.00%	FANNY MIKEY (Emergencia)	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION SOBRE COCINA DONDE SE ENCONTRABAN EQUIPOS DE COCINA				
14A 25.00%	COMPARTIR EL RECUERDO (Emergencia 2)	RETIRO DE PISO SALON DE DANZAS, INSTALACIÓN DE PISO NUEVO, RETIRO DE DIVISIONES METALICAS ENTRE SALONES, INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPERBOARD COMO REMPLAZO DE ESTAS				
15A 100.00%	RURAL LA UNION (Emergencia 1)	TALA DE UN (01) UN ELEMENTO ARBOREO				

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA					VIGENCIA		2025
CPF	1981-L	IED	FANNY MIKEY		SEMANA No. 28						
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	119.00	299.51		$ 30,319.00	$ 9,080,843.69	$ (5,472,882.69)			MAYOR	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS	M2	268.86	303.45	0	$ 17,585.00	$ 5,336,168.25	$ (608,265.15)			MAYOR	
DEMOLICION DE ACABADO DE PISO ÍTEM: 1.29	M2	0.00	725.46	0	$ 31,765.00	$ 23,044,236.90	$ (23,044,236.90)			MAYOR	
AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA) ÍTEM: 16.1.25	M2	0.00	725.46		$ 110,795.00	$ 80,377,340.70	$ (80,377,340.70)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5MM, DE 0.15X 0.15 M	KG	0.00	1573.68		$ 7,344.00	$ 11,557,105.92	$ (11,557,105.92)			MAYOR	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	0.00	386.00		$ 28,441.00	$ 10,978,226.00	$ (10,978,226.00)			MAYOR	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	0.00	333.88		$ 23,603.00	$ 7,880,569.64	$ (7,880,569.64)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	2142.18	1294.72		$ 352,164.00	$ 455,953,774.08	$ 298,444,903.44			MENOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	0.00	7.00		$ 851,255.00	$ 5,958,785.00	$ (5,958,785.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00	3.00		$ 601,133.00	$ 1,803,399.00	$ -			IGUAL	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	17.00	16.00		$ 800,038.00	$ 12,800,608.00	$ 800,038.00			MENOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA ADRIATICA, INCLUYE ASIENTO SANITARIO ENTRADA SUPERIOR PARA FLUXOMETRO DE CORONA O SIMILAR	UN	2.00	17.00		$ 1,487,960.00	$ 25,295,320.00	$ (22,319,400.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	24.00	27.00		$ 418,333.00	$ 11,294,991.00	$ (1,254,999.00)			MAYOR	
DILATACIÓNENCONCRETOCONPULIDORAESPESORDE3MMPROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M	0.00	314.60		$ 4,436.00	$ 1,395,565.60	$ (1,395,565.60)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	0.00	315.60		$ 25,116.00	$ 7,926,609.60	$ (7,926,609.60)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	3.00		$ 752,783.00	$ 2,258,349.00	$ (752,783.00)			MAYOR	
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TOP COAT O SIMILAR, PARA EXTERIORES EN COLORES PRIMARIOS, NO INCLUYE DISEÑO	M2	0.00	910.18		$ 41,171.00	$ 37,473,020.78	$ (37,473,020.78)			MAYOR	

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA TASA SANITARIO REF: CORONA O SIMILAR	UN	0.00	10.00		$ 713,949.00	$ 7,139,490.00	$ (7,139,490.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL LÍNEA INFANTIL	UN	0.00	4.00		$ 358,984.00	$ 1,435,936.00	$ (1,435,936.00)			MAYOR	
TRATAMIENTO DE PLACA EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: PULIDA DE SUPERFICIE, TRATAMIENTO DE JUNTAS, LAVADO PARA RETIRO DE SUCIEDAD, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN	M2	0.00	136.41		$ 46,488.00	$ 6,341,428.08	$ (6,341,428.08)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	0.00	8.50		$ 29,027.00	$ 246,729.50	$ (246,729.50)			MAYOR	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0,15M A 0,20 M EXISTENTE EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	283.56		$ 107,321.00	$ 30,431,942.76	$ (30,431,942.76)			MAYOR	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	0.00	283.56		$ 161,712.00	$ 45,855,054.72	$ (45,855,054.72)			MAYOR	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	854.75	1296.16		$ 4,822.00	$ 6,250,083.52	$ (2,128,479.02)			MAYOR	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	21.00	84.00		$ 26,588.00	$ 2,233,392.00	$ (1,675,044.00)			MAYOR	63.00
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) CERTIFICADOS)	M2	16.00	2.88		$ 12,327.00	$ 35,501.76	$ 161,730.24			MENOR	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	0.00	9.00		$ 8,731.00	$ 78,579.00	$ (78,579.00)			MAYOR	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE	M	0.00	9.00		$ 21,288.00	$ 191,592.00	$ (191,592.00)			MAYOR	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	0.00	8.00		$ 8,731.00	$ 69,848.00	$ (69,848.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4'' INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	7.76		$ 27,261.00	$ 211,545.36	$ (211,545.36)			MAYOR	7.76
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/4 ''	UN	0.00	40.00		$ 13,976.00	$ 559,040.00	$ (559,040.00)			MAYOR	40.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4'' INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	0.88		$ 15,333.00	$ 13,493.04	$ (13,493.04)			MAYOR	0.88
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 3/4'	UN	0.00	4.00		$ 6,383.00	$ 25,532.00	$ (25,532.00)			MAYOR	4.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN	0.00	1.00		$ 84,122.00	$ 84,122.00	$ (84,122.00)			MAYOR	1.00
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	0.00	109.84		$ 25,975.00	$ 2,853,094.00	$ (2,853,094.00)			MAYOR	109.84
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	0.00	2.88		$ 113,205.00	$ 326,030.40	$ (326,030.40)			MAYOR	2.88
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	0.00	1.00		$ 40,084.00	$ 40,084.00	$ (40,084.00)			MAYOR	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	0.00	1.00		$ 32,716.00	$ 32,716.00	$ (32,716.00)			MAYOR	1.00

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
					SUBTOTAL I.E.D. FANNY MIKEY	**$ 814,870,147.30**					
CPF	**1912**	**IED**	**CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE**			**SEMANA No. 27**					
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS	M2	1256.41	1543.97		$ 17,585.00	$ 27,150,712.45	$ (5,056,742.60)			MAYOR	
TRATAMIENTO DE PLACA EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: PULIDA DE SUPERFICIE, TRATAMIENTO DE JUNTAS, LAVADO PARA RETIRO DE SUCIEDAD, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN	M2	0.00	1545.23		$ 46,487.71	$ 71,834,197.94	$ (71,834,197.94)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	1256.41	1545.23		$ 352,164.00	$ 544,174,377.72	$ (101,712,006.48)			MAYOR	
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TOP COAT O SIMILAR, PARA EXTERIORES EN COLORES PRIMARIOS, NO INCLUYE DISEÑO	M2	0.00	1545.23		$ 41,171.43	$ 63,619,323.22	$ (63,619,323.22)			MAYOR	
			SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. BRISAS DEL DIAMANTE			**$ 706,778,611.33**					
CPF	**1911**	**IED**	**OFELIA URIBE**			**SEMANA No. 27**					
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS	M2	409.70	394.25		$ 17,585.00	$ 6,932,886.25	$ 271,688.25			MENOR	-15.45
DEMOLICION DE ACABADO DE PISO ÍTEM: 1.2.8	M2	0.00	370.28		$ 31,765.00	$ 11,761,944.20	$ (11,761,944.20)			MAYOR	370.28
AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE	M2	0.00	370.28		$ 110,795.00	$ 41,025,172.60	$ (41,025,172.60)			MAYOR	370.28
CERRAMIENTO EN LONA	M	30.00	105.46		$ 30,319.00	$ 3,197,441.74	$ (2,287,871.74)			MAYOR	75.46
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UN	0.00	256.65		$ 23,603.00	$ 6,057,709.95	$ (6,057,709.95)			MAYOR	256.65
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	409.70	370.28		$ 352,164.00	$ 130,399,285.92	$ 13,882,304.88			MENOR	-39.42
ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	172.35		$ 12,208.00	$ 2,104,048.80	$ (2,104,048.80)			MAYOR	172.35
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	47.17		$ 29,027.00	$ 1,369,203.59	$ (1,369,203.59)			MAYOR	47.17
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	32.00	16.00		$ 297,746.00	$ 4,763,936.00	$ 4,763,936.00			MENOR	-16.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	44.92		$ 89,260.00	$ 4,009,559.20	$ (4,009,559.20)			MAYOR	44.92
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	0.00	30.00		$ 205,343.00	$ 6,160,290.00	$ (6,160,290.00)			MAYOR	30.00
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	172.35		$ 11,088.00	$ 1,911,016.80	$ (1,911,016.80)			MAYOR	172.35
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	0.56		$ 14,297.00	$ 8,006.32	$ (8,006.32)			MAYOR	0.56

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y ...	M2	8.00	12.80		$ 35,817.00	$ 458,457.60	$ (171,921.60)			MAYOR	4.80
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	43.00	45.00		$ 7,280.00	$ 327,600.00	$ (14,560.00)			MAYOR	2.00
CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M2	0.00	0.15		$ 625,445.00	$ 93,816.75	$ (93,816.75)			MAYOR	0.15
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	0.00	15.00		$ 172,614.00	$ 2,589,210.00	$ (2,589,210.00)			MAYOR	15.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	0.00	15.00		$ 39,716.00	$ 595,740.00	$ (595,740.00)			MAYOR	15.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	1.10		$ 81,396.00	$ 89,535.60	$ (89,535.60)			MAYOR	1.10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	0.00	2.00		$ 29,271.00	$ 58,542.00	$ (58,542.00)			MAYOR	2.00
UMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	0.00	8.00		$ 14,830.00	$ 118,640.00	$ (118,640.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	0.00	8.00		$ 15,661.00	$ 125,288.00	$ (125,288.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100- 240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	16.00	15.00		$ 61,735.00	$ 926,025.00	$ 61,735.00			MENOR	-1.00
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	414.92		$ 20,542.00	$ 8,523,286.64	$ (8,523,286.64)			MAYOR	414.92
			SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. OFELIA URIBE			**$ 233,606,642.96**					
CPF	**573**	**IED**	**COMPARTIR EL RECUERDO**			**SEMANA No. 27**					
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M2	30.00	24.00		$ 30,319.00	$ 727,656.00	$ 181,914.00			MENOR	-6.00
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	19.60		$ 67,341.00	$ 1,319,883.60	$ (1,319,883.60)			MAYOR	19.60
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	13.48	0	$ 110,911.00	$ 1,495,080.28	$ (1,495,080.28)			MAYOR	13.48
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	55.18	55.60		$ 31,765.00	$ 1,766,134.00	$ (13,341.30)			MAYOR	0.42
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13.05	41.98		$ 21,734.00	$ 912,393.32	$ (628,764.62)			MAYOR	28.93

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	69.82	108.20		$ 12,327.00	$ 1,333,781.40	$ (473,110.26)			MAYOR	38.38
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	4.67	19.29		$ 24,459.07	$ 471,815.48	$ (357,591.62)			MAYOR	14.62
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0.00	7.10		$ 139,987.00	$ 993,907.70	$ (993,907.70)			MAYOR	7.10
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	30.00	30.00		$ 26,588.00	$ 797,640.00	$ -			IGUAL	0.00
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	70.00	48.84		$ 20,183.00	$ 985,737.72	$ 427,072.28			MENOR	-21.16
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0.00	173.91		$ 139,987.00	$ 24,345,139.17	$ (24,345,139.17)			MAYOR	173.91
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	134.23	225.60		$ 89,260.00	$ 20,137,056.00	$ (8,155,686.20)			MAYOR	91.37
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND	0.00	22.00		$ 7,280.00	$ 160,160.00	$ (160,160.00)			MAYOR	22.00
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	60.00	30.50		$ 8,731.00	$ 266,295.50	$ 257,564.50			MENOR	-29.50
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	0.00	8.00		$ 8,731.00	$ 69,848.00	$ (69,848.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	13.35		$ 89,260.00	$ 1,191,621.00	$ (1,191,621.00)			MAYOR	13.35
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	17.70		$ 49,826.00	$ 881,920.20	$ (881,920.20)			MAYOR	17.70
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UND	0.00	9.00		$ 94,820.00	$ 853,380.00	$ (853,380.00)			MAYOR	9.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UND	0.00	4.00		$ 134,128.00	$ 536,512.00	$ (536,512.00)			MAYOR	4.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UND	0.00	7.00		$ 61,917.00	$ 433,419.00	$ (433,419.00)			MAYOR	7.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UND	0.00	10.00		$ 65,687.00	$ 656,870.00	$ (656,870.00)			MAYOR	10.00

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	19.49		$ 14,607.00	$ 284,690.43	$ (284,690.43)			MAYOR	19.49
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UND	0.00	9.00		$ 188,006.00	$ 1,692,054.00	$ (1,692,054.00)			MAYOR	9.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UND	0.00	10.00		$ 94,820.00	$ 948,200.00	$ (948,200.00)			MAYOR	10.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UND	8.00	2.00		$ 67,247.00	$ 134,494.00	$ 403,482.00			MENOR	-6.00
CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UND	0.00	2.00		$ 674,511.00	$ 1,349,022.00	$ (1,349,022.00)			MAYOR	2.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15X 0.15 M	KG	0.00	71.18		$ 7,344.00	$ 522,745.92	$ (522,745.92)			MAYOR	71.18
PLACA CONTRAPISO DE 10CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	0.00	41.93		$ 119,173.00	$ 4,996,923.89	$ (4,996,923.89)			MAYOR	41.93
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	0.00	42.83		$ 23,603.00	$ 1,010,916.49	$ (1,010,916.49)			MAYOR	42.83
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	M3	0.00	20.49		$ 178,689.00	$ 3,661,337.61	$ (3,661,337.61)			MAYOR	20.49
PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0.00	37.33		$ 40,541.00	$ 1,513,395.53	$ (1,513,395.53)			MAYOR	37.33
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	0.00	130.00		$ 101,554.00	$ 13,202,020.00	$ (13,202,020.00)			MAYOR	130.00
ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	50.00		$ 12,208.00	$ 610,400.00	$ (610,400.00)			MAYOR	50.00
RELLENOSUBBASEGRANULARTIPOINVIAS(SUMINISTRO,EXTENDIDO , NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0.00	7.51		$ 187,185.00	$ 1,405,759.35	$ (1,405,759.35)			MAYOR	7.51
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	0.00	13.66		$ 161,712.00	$ 2,208,985.92	$ (2,208,985.92)			MAYOR	13.66
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	55.18	18.00		$ 44,137.00	$ 794,466.00	$ 1,641,013.66			MENOR	-37.18
SUMINISTROEINSTALACIÓNDEMEDIACAÑAENGRANITOPULIDOBLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M2	41.56	25.00		$ 80,091.00	$ 2,002,275.00	$ 1,326,306.96			MENOR	-16.56
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	0.00	5.00		$ 851,255.00	$ 4,256,275.00	$ (4,256,275.00)			MAYOR	5.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	0.00	2.00		$ 601,133.00	$ 1,202,266.00	$ (1,202,266.00)			MAYOR	2.00
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	189.08	53.57		$ 4,127.00	$ 221,083.39	$ 559,249.77			MENOR	-135.51
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	0.00	28.97		$ 3,360.00	$ 97,339.20	$ (97,339.20)			MAYOR	28.97
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	40.00	32.00		$ 11,663.00	$ 373,216.00	$ 93,304.00			MENOR	-8.00

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y / OCIELO RASO, ANCHO <=15 CM, PROFUNDIDAD<=10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	0.00	27.50		$ 21,288.00	$ 585,420.00	$ (585,420.00)			MAYOR	27.50
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20METROS	M3	0.00	8.00		$ 33,842.00	$ 270,736.00	$ (270,736.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	0.00	35.78		$ 7,070.00	$ 252,964.60	$ (252,964.60)			MAYOR	35.78
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	55.18	19.60		$ 44,137.00	$ 865,085.20	$ 1,570,394.46			MENOR	-35.58
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADODE 1"	M2	0.00	28.00		$ 1,022,891.00	$ 28,640,948.00	$ (28,640,948.00)			MAYOR	28.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO=300A400mm)CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30mm y 40mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2)CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES-FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA YL OS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	149.68	279.93		$ 258,037.00	$ 72,232,297.41	$ (33,609,319.25)			MAYOR	130.25
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	0.00	1900.00		$ 22,456.00	$ 42,666,400.00	$ (42,666,400.00)			MAYOR	1900.00
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	149.68	279.93		$ 35,817.00	$ 10,026,252.81	$ (4,665,164.25)			MAYOR	130.25
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA A UNA DESCARGA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UN	0.00	10.00		$ 1,055,407.00	$ 10,554,070.00	$ (10,554,070.00)			MAYOR	10.00

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑOS ED, ESPESOR DE 1 CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	4.80	4.80		$ 1,099,280.00	$ 5,276,544.00	$ -			IGUAL	0.00
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. COMPARTIR EL RECUERDO					**$ 274,194,834.12**					
CPF	**539**	**IED**	**LOS TEJARES**			**SEMANA No. 27**					
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	30.00	26.20		$ 30,319.00	$ 794,357.80	$ 115,212.20			MENOR	-3.80
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	0.00	42.01		$ 21,734.00	$ 913,045.34	$ (913,045.34)			MAYOR	42.01
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	149.68	248.29		$ 35,817.00	$ 8,893,002.93	$ (3,531,914.37)			MAYOR	98.61
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	42.00	60.95		$ 26,101.00	$ 1,590,855.95	$ (494,613.95)			MAYOR	18.95
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	16.00	24.00		$ 7,280.00	$ 174,720.00	$ (58,240.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	20.00	3930.43	400.00	$ 22,456.00	$ 88,261,736.08	$ (87,812,616.08)			MAYOR	3910.43
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO=300A400mm)CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30mm y 40mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2)CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES-FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA YL OS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	183.38	360.11		$ 258,037.00	$ 92,921,704.07	$ (45,602,879.01)			MAYOR	176.73
MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, MASILLA, CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E=12 CM	M2	0.00	24.32		$ 164,556.00	$ 4,002,001.92	$ (4,002,001.92)			MAYOR	24.32

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M2	30.00	43.00		$ 22,722.00	$ 977,046.00	$ (295,386.00)			MAYOR	13.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120X30CM, 40W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	16.00	12.00		$ 232,000.00	$ 2,784,000.00	$ 928,000.00			MENOR	-4.00
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	0.00	54.61		$ 16,770.00	$ 915,809.70	$ (915,809.70)			MAYOR	54.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	16.00	30.00		$ 175,743.00	$ 5,272,290.00	$ (2,460,402.00)			MAYOR	14.00
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	129.47	187.68		$ 21,050.00	$ 3,950,664.00	$ (1,225,320.50)			MAYOR	58.21
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A= 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	54.61		$ 20,533.00	$ 1,121,307.13	$ (1,121,307.13)			MAYOR	54.61
PLACA EN CONCRETO 3000 PSI DE 15CM SOBRE LAMINA COLABORANTE 2"	M2	0.00	9.00		$ 238,672.00	$ 2,148,048.00	$ (2,148,048.00)			MAYOR	9.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5MM, DE 0.15X 0.15 M	KG	0.00	18.70		$ 7,344.00	$ 137,332.80	$ (137,332.80)			MAYOR	18.70
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120X30CM, 40W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	16.00	12.00		$ 232,000.00	$ 2,784,000.00	$ 928,000.00			MENOR	-4.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	12.00	15.00		$ 29,027.00	$ 435,405.00	$ (87,081.00)			MAYOR	
DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	7.20		$ 25,077.00	$ 180,554.40	$ (180,554.40)			MAYOR	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	0.00	3.00		$ 11,663.00	$ 34,989.00	$ (34,989.00)			MAYOR	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.00	16.15		$ 69,499.00	$ 1,122,408.85	$ (1,122,408.85)			MAYOR	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	0.00	4.50		$ 151,090.00	$ 679,905.00	$ (679,905.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	0.00	11.00		$ 89,260.00	$ 981,860.00	$ (981,860.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	0.00	4.00	0	$ 39,716.00	$ 158,864.00	$ (158,864.00)			MAYOR	

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	0.00	9.00		$ 123,679.00	$ 1,113,111.00	$ (1,113,111.00)			MAYOR	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8.00	8.00		$ 206,316.00	$ 1,650,528.00	$ -			IGUAL	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	0.00	8.70	0	$ 238,656.00	$ 2,076,307.20	$ (2,076,307.20)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2	0.00	8.73	0	$ 192,870.00	$ 1,683,755.10	$ (1,683,755.10)			MAYOR	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0.00	22.15	0	$ 42,602.00	$ 943,634.30	$ (943,634.30)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD	M2	0.00	2.76	0	$ 161.49	$ 445.72	$ (445.72)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD	M2	0.00	12.50		$ 134,767.00	$ 1,684,587.50	$ (1,684,587.50)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE ,	UN	0.00	14.00	14	$ 205,343.00	$ 2,874,802.00	$ (2,874,802.00)			MAYOR	14.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UND	0.00	1.00	1.00	$ 558,005.00	$ 558,005.00	$ (558,005.00)			MAYOR	1.00
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. LOS TEJARES					**$ 233,821,083.79**					
CPF	**576**	**IED**	**DIEGO MONTAÑA CUELLAR**			**SEMANA No. 27**					
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	16.32	16.66	0	$ 4,127.00	$ 68,755.82	$ (1,403.18)			MAYOR	0.34
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M2	30.00	117.20		$ 30,319.00	$ 3,553,386.80	$ (2,643,816.80)			MAYOR	87.20
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.32	2.40		$ 67,341.00	$ 161,618.40	$ 196,635.72			MENOR	-2.92
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.32	16.66		$ 31,765.00	$ 529,204.90	$ (10,800.10)			MAYOR	0.34

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34.00	18.82	0	$ 21,734.00	$ 409,033.88	$ 329,922.12			MENOR	-15.18
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	41.18	31.05	0	$ 12,327.00	$ 382,753.35	$ 124,872.51			MENOR	-10.13
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	4.06	6.84	0	$ 32,330.00	$ 221,137.20	$ (89,877.40)			MAYOR	2.78
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	8.00	10.00	0	$ 26,588.00	$ 265,880.00	$ (53,176.00)			MAYOR	2.00
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0.00	57.96		$ 42,602.00	$ 2,469,211.92	$ (2,469,211.92)			MAYOR	57.96
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.00	7.26	0	$ 69,499.00	$ 504,562.74	$ (504,562.74)			MAYOR	7.26
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	16.32	15.75	0	$ 44,137.00	$ 695,157.75	$ 25,158.09			MENOR	-0.57
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	0.00	40.59		$ 44,137.00	$ 1,791,520.83	$ (1,791,520.83)			MAYOR	40.59
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	16.32	15.80		$ 44,137.00	$ 697,364.60	$ 22,951.24			MENOR	-0.52
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	0.45	0.44		$ 1,022,891.00	$ 450,072.04	$ 10,228.91			MENOR	-0.01
DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESTRUCTURA EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA FIBRO CEMENTO A UNA CARA DE 1/2" CON ESTRUCTURA . INCLUYE ARME Y DESARME DE ANDAMIOS, PARA ALTURAS MAXIMAS DE 10 METROS CON ANDAMIO CERTIFICADO, PARA ANCHOS DE HASTA 60 CM, INCLUYE ESTUCO Y PINTURA PARA EXTERIORES, PARA IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A - OCALIDAD DE USME	M	0.00	1500.00	210.84	$ 219,057.00	$ 328,585,500.00	$ (328,585,500.00)			MAYOR	1500.00
SUMINISTROEINSTALACIÓNDEMEDIACAÑAENGRANITOPULIDOBLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M2	20.60	22.41		$ 80,091.00	$ 1,794,839.31	$ (144,964.71)			MAYOR	1.81
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑOS ED, ESPESOR DE 1 CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.17	2.50		$ 1,099,280.00	$ 2,748,200.00	$ (362,762.40)			MAYOR	0.33
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	2.00	4.00		$ 418,333.00	$ 1,673,332.00	$ (836,666.00)			MAYOR	2.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	2.00		$ 752,783.00	$ 1,505,566.00	$ -			IGUAL	0.00

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADODE 1"	M2	8.28	6.34		$ 964,177.00	$ 6,112,882.18	$ 1,870,503.38			MENOR	-1.94
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5.00	5.00		$ 11,663.00	$ 58,315.00	$ -			IGUAL	0.00
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	3.00	5.00		$ 7,280.00	$ 36,400.00	$ (14,560.00)			MAYOR	2.00
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	ML	10.00	5.52		$ 57,553.00	$ 317,692.56	$ 257,837.44			MENOR	-4.48
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	40.00	21.82		$ 7,070.00	$ 154,267.40	$ 128,532.60			MENOR	-18.18
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	5.00	5.00		$ 65,687.00	$ 328,435.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	5.00	5.00		$ 61,917.00	$ 309,585.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	5.00	5.00		$ 94,820.00	$ 474,100.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	2.00		$ 123,679.00	$ 247,358.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE ,	UN	4.00	4.00		$ 205,343.00	$ 821,372.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE FLUXOMETRO, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	UN	1.00	2.00		$ 2,609,918.00	$ 5,219,836.00	$ (2,609,918.00)			MAYOR	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE MOVILIDAD REDUCIDA (NO INCLUYE ACCESORIOS)	UN	0.00	1.00		$ 1,019,900.00	$ 1,019,900.00	$ (1,019,900.00)			MAYOR	1.00
UMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN)	UN	1.00	1.00		$ 1,133,330.00	$ 1,133,330.00	$ -			IGUAL	0.00
UMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN)SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00	2.00		$ 40,084.00	$ 80,168.00	$ 80,168.00			MENOR	-2.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2.00	2.00		$ 32,716.00	$ 65,432.00	$ -			IGUAL	0.00
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	105.59	15.80		$ 29,027.00	$ 458,626.60	$ 2,606,334.33			MENOR	-89.79
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	0.00	19.50		$ 26,548.00	$ 517,686.00	$ (517,686.00)			MAYOR	19.50

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0.00	7.51		$ 187,185.00	$ 1,405,759.35	$ (1,405,759.35)			MAYOR	7.51
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	0.00	2.50		$ 7,413.00	$ 18,532.50	$ (18,532.50)			MAYOR	2.50
RAMPA EN CONCRETO	M2	0.00	5.28		$ 151,202.00	$ 798,346.56	$ (798,346.56)			MAYOR	5.28
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. DIEGO MONTAÑA CUELLAR					**$ 368,085,121.69**					
CPF	**1919**	**IED**	**ESTRELLA DEL SUR SEDE C**			**SEMANA No. 26**					
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	62.00	49.20		$ 30,319.00	$ 1,491,694.80	$ 388,083.20			MENOR	-12.80
DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	47.25	90.19		$ 112,034.00	$ 10,104,346.46	$ (4,810,739.96)			MAYOR	42.94
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.15	16.15		$ 32,330.00	$ 522,129.50	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	130.05	285.70		$ 32,330.00	$ 9,236,681.00	$ (5,032,164.50)			MAYOR	155.65
Suministro e instalación de portón metálico plegable con marco montante en lámina Cold rolled lisa calibre 18. Incluye bisagras, cerradura, pasador superior e inferior, doble manija interior - exterior, terminada con anticorrosivo, pintura esmalte - verificar en obra medidas, ángulos y numero de hoja, color gris o similar	M2	0.00	16.15		$ 1,078,457.00	$ 17,417,080.55	$ (17,417,080.55)			MAYOR	16.15
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS	M2	47.25	74.00		$ 393,484.64	$ 29,117,863.36	$ (10,525,714.12)			MAYOR	26.75
COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20X25 CM (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO), ESTE ITEM CORRESPONDE AL COLEGIO ESTRELLA DEL SUR SEDE C, PARA UNA CANTIDAD TOTAL DE 3 METROS	ML	0.00	5.80		$ 119,563.00	$ 693,465.40	$ (693,465.40)			MAYOR	5.80
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 20 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO, ESTE ITEM CORRESPONDE AL COLEGIO ESTRELLA DEL SUR SEDE C	ML	0.00	29.70		$ 107,977.00	$ 3,206,916.90	$ (3,206,916.90)			MAYOR	29.70
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0.00	19.92		$ 42,602.00	$ 848,631.84	$ (848,631.84)			MAYOR	19.92

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	0.00	64.56		$ 23,603.00	$ 1,523,809.68	$ (1,523,809.68)			MAYOR	64.56
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	0.00	99.20		$ 4,822.00	$ 478,342.40	$ (478,342.40)			MAYOR	99.20
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M2	0.00	15.12		$ 11,088.00	$ 167,650.56	$ (167,650.56)			MAYOR	15.12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM	0.00	920.00		$ 1,564.00	$ 1,438,880.00	$ (1,438,880.00)			MAYOR	920.00
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR SEDE C					**$ 76,247,492.45**					
CPF	**1962**		**ESTRELLA DEL SUR SEDE D**			**SEMANA No. 26**					
Suministro e instalación de portón metálico plegable con marco montante en lámina Cold rolled lisa calibre 18. Incluye bisagras, cerradura, pasador superior e inferior, doble manija interior - exterior, terminada con anticorrosivo, pintura esmalte - verificar en obra medidas, ángulos y numero de hoja, color gris o similar	M2		7.37		$ 1,078,457.00	$ 7,949,306.55	$ (7,949,306.55)				7.37
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	0.00	2038.11		$ 22,456.00	$ 45,767,805.33	$ (45,767,805.33)			MAYOR	2038.11
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	88.90	78.34		$ 35,817.00	$ 2,805,903.78	$ 378,227.52			MENOR	-10.56
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO=300A400mm)CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30mm y 40mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2)CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES-FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA YL OS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	88.23	100.51		$ 258,037.00	$ 25,935,298.87	$ (3,168,694.36)			MAYOR	12.28
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8.00	18.00		$ 175,743.00	$ 3,163,374.00	$ (1,757,430.00)			MAYOR	10.00


Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120X30CM,40W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00	18.00		$ 232,000.00	$ 4,176,000.00	$ (2,320,000.00)			MAYOR	10.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M2	45.00	20.00		$ 22,722.00	$ 454,440.00	$ 568,050.00			MENOR	-25.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UND	0.00	1.00		$ 558,005.00	$ 558,005.00	$ (558,005.00)			MAYOR	1.00
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR SEDE C					**$ 90,810,133.53**					


PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA		**97.74%**
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA	**$**	**2,798,414,067.16**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**2,863,122,191.27**

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Mayo 24 de 2026


SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
FANNY MICKEY	$ 814,870,147.30	100.00%	$ 814,870,147.30	100.00%	$ 814,870,147.30	ENTREGADO
OFELIA URIBE	$ 242,305,285.25	100.00%	$ 233,606,642.96	96.41%	$ 242,305,285.25	-3.59%
BRISAS DEL DIAMANTE	$ 706,778,611.33	100.00%	$ 706,778,611.33	100.00%	$ 706,778,611.33	0.00%
ESTRELLA DEL SUR - D	$ 90,810,133.53	100.00%	$ 90,810,133.53	100.00%	$ 90,810,133.53	ENTREGADO
LOS TEJARES - A	$ 240,454,777.37	99.29%	$ 233,821,083.79	96.55%	$ 242,176,869.00	-2.74%
COMPARTIR EL RDO - A	$ 266,351,799.08	95.75%	$ 274,194,834.12	98.57%	$ 278,172,403.41	2.82%
DIEGO MONTAÑA - A	$ 375,426,519.13	91.18%	$ 368,085,121.69	89.39%	$ 411,761,249.00	-1.78%
ESTRELLA DEL SUR - C	$ 76,247,492.45	100.00%	$ 76,247,492.45	100.00%	$ 76,247,492.45	ENTREGADO
TOTALES	**$ 2,813,244,765.44**	**98.26%**	**$ 2,798,414,067.16**	**97.74%**	**$ 2,863,122,191.27**	-0.52%

OBSERVACIONES: Como se informó la anterior semana, a la fecha encontramos que tres (3) de las ocho (8) entidades educativas han sido entregadas. La ***IED Ofelia Uribe de Acosta*** registra un atraso cercano al 4%, ***IED Los Tejares*** presenta atraso cercano al 3%, mientras que Diego Montaña presenta atraso cercanos al 2%. El contrato en general registra un atraso por debajo del 1.00%

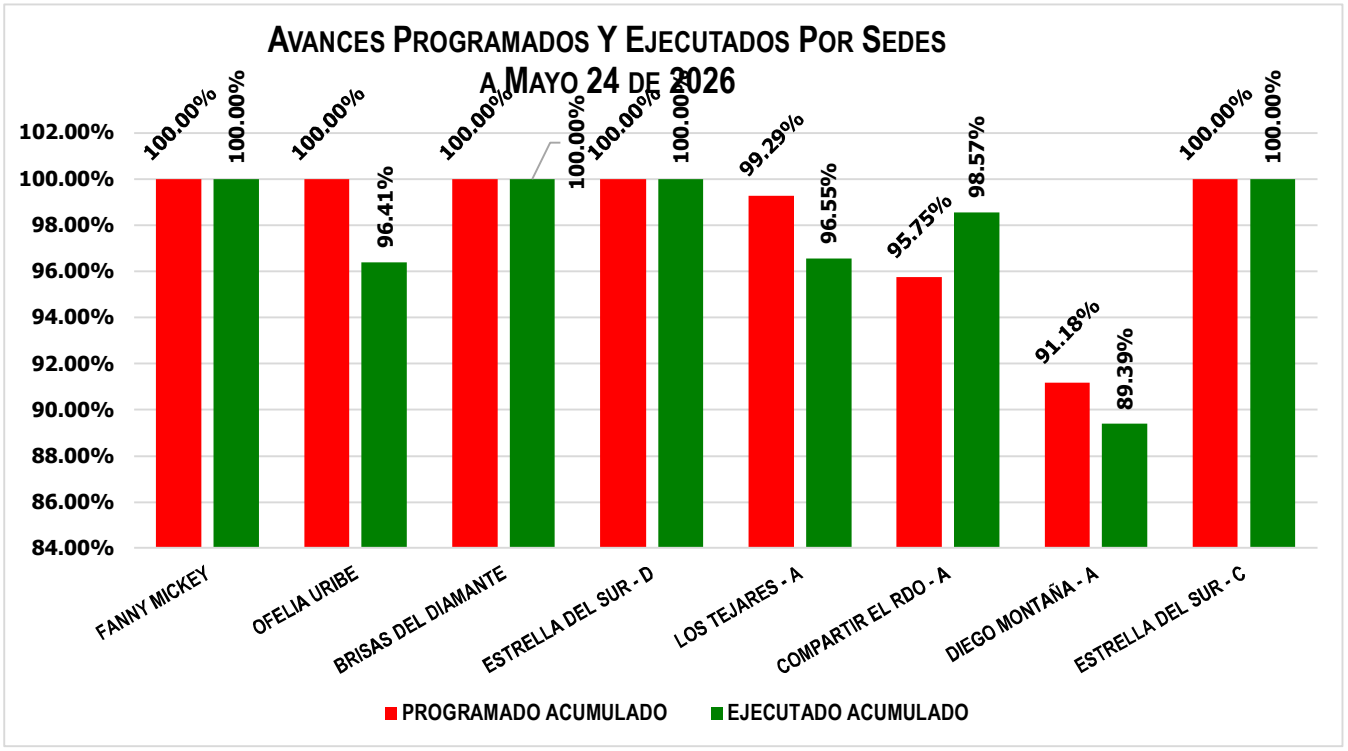

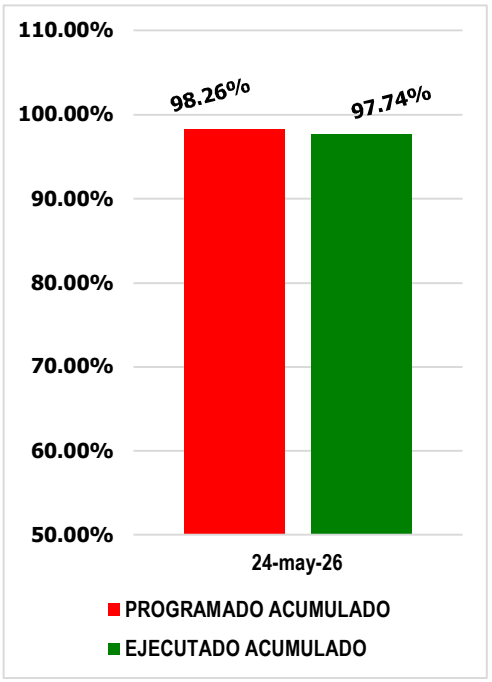

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - May. 24 2026

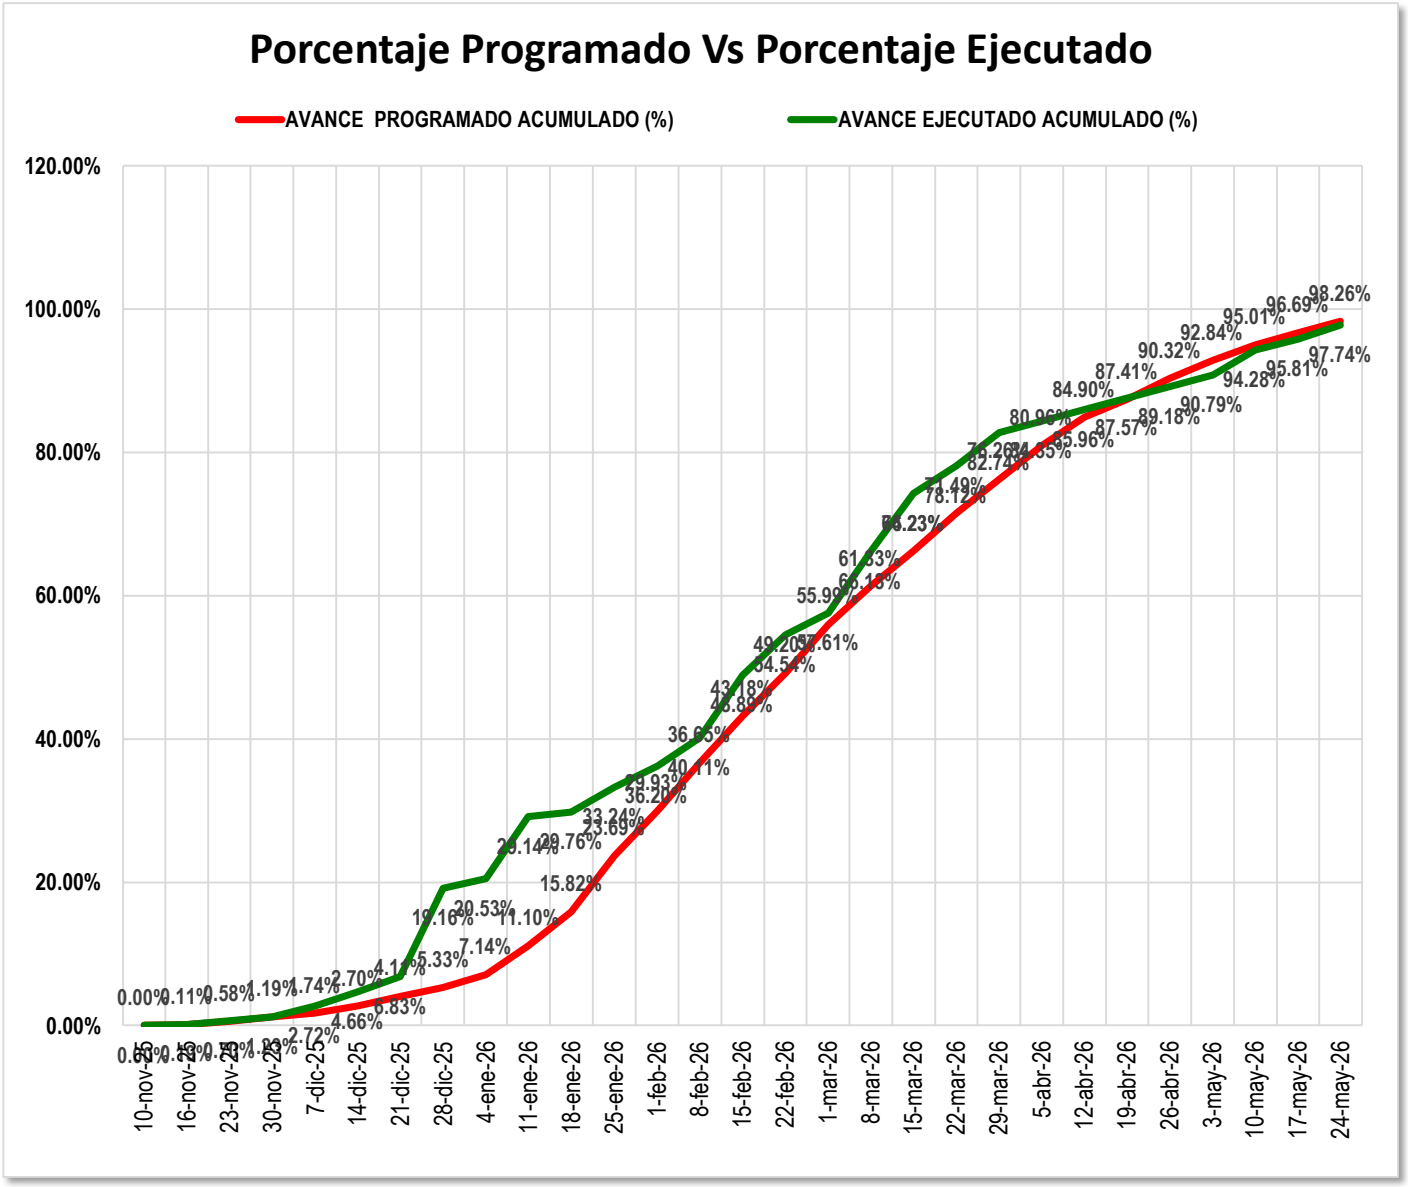

FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0,00%	0,00%
16-nov-25	0,11%	0,19%
23-nov-25	0,58%	0,70%
30-nov-25	1,19%	1,23%
7-dic-25	1,74%	2,72%
14-dic-25	2,70%	4,66%
21-dic-25	4,11%	6,83%
28-dic-25	5,33%	19,16%
4-ene-26	7,14%	20,53%
11-ene-26	11,10%	29,14%
18-ene-26	15,82%	29,76%
25-ene-26	23,69%	33,24%
1-feb-26	29,93%	36,20%
8-feb-26	36,65%	40,11%
15-feb-26	43,18%	48,89%
22-feb-26	49,20%	54,54%
1-mar-26	55,99%	57,61%
8-mar-26	61,33%	66,13%
15-mar-26	66,23%	74,23%
22-mar-26	71,49%	78,12%
29-mar-26	76,26%	82,74%
5-abr-26	80,96%	84,35%
12-abr-26	84,90%	85,96%
19-abr-26	87,41%	87,57%
26-abr-26	90,32%	89,18%
3-may-26	92,84%	90,79%
10-may-26	95,01%	94,28%
17-may-26	96,69%	95,81%
24-may-26	**98,26%**	**97,74%**
31-may-26	99,54%	
1-jun-26	100,00%	

FECHA:	2/06/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME	
DIAS RESTANTES	123 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		APOYO A LA SUPERVISION	
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA		GRUPO	4
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			

CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	consorcio adecuaciones ARSAF 2025
31 de mayo de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	consorcio SERINCO educativo

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8155135	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131.00	$ 2,703,337,443.00
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ 128,425,720.00	$ 1,342,467,488.00
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRÓRROGAS	30	149	TOTAL	$ 924,609,851.00	$ 4,045,804,931.00
TERMINACION FINAL	4 de junio de 2026	1 de octubre de 2026	TOTAL	241	360			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 128,425,720.00	30	
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	18-dic-25	$ 479,467,488.00	27	
2	27-may-26	$ 863,000,000.00	122	
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH – 100046043 – Anexo 0	4 9 2025	4 10 2026	4 4 2026	4 4 2031	4 9 2025	4 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
96098	4 9 2025	4 12 2026	4 9 2025	4 4 2029	4 4 2026	4 4 2028	27661	4 9 2025	4 4 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (31-05-2026)	PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA
1981-L	FANNY MICKEY (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Villas del Diamante	100.00%	100.00%	100.00%		$ 823,617,481.00	$ 823,617,480.93	10/11/2025	11/04/2026
1962	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	D	Estrella del Sur (4)	100.00%	100.00%	100.00%		$ 112,549,000.00	$ 112,549,000.00	2/02/2026	30/04/2026
1919	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	Estrella III Sede C	100.00%	100.00%	100.00%		$ 79,889,305.00	$ 79,889,305.00	15/01/2026	28/03/2026
1912	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Confederación Suiza	100.00%	94.49%	96.46%		$ 748,006,803.00	$ 706,778,611.33	18/11/2025	5/06/2026
1911	COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Compartir Lucero Alto	98.57%	60.66%	41.44%		$ 457,805,803.07	$ 277,709,694.12	24/11/2025	20/08/2026
576	DIEGO MONTAÑA CUELLAR (IED)	USME	A	El Uval - Nuevo	89.39%	93.19%	97.32%		$ 422,010,855.00	$ 393,276,676.69	1/12/2025	1/06/2026
573	OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)	USME	A	El Bosque Nuevo	96.41%	84.37%	100.00%		$ 276,898,268.00	$ 233,606,642.96	24/11/2025	7/05/2026
539	LOS TEJARES (IED)	USME	A	Los Tejares	96.55%	100.00%	99.75%		$ 226,256,621.00	$ 226,256,621.00	1/12/2025	1/06/2026
1940	ARBORIZADORA ALTA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Pradera Esperanza		0.00%	0.00%		$ 449,342,592.00	$ -	5/06/2026	1/10/2026
	TOTAL FRENTES DE OBRA					79.35%	78.98%		$ 3,596,376,728.07	$ 2,853,684,032.02		

EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (31-05-2026)	PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA
527	FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)	USME	C	Maria Auxiliadora Sede C		100.00%	100.00%		$ 2,129,817	$ 2,129,817.00	23/11/2025	24/11/2025
577	CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)	USME	A	Iote - Puerta Al llano valle 12		100.00%	100.00%		$ 5,810,951	$ 5,810,951.00	22/11/2025	24/11/2025
1928	EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Manuela Beltrán		100.00%	100.00%		$ 52,871,886	$ 52,871,886.00	4/12/2025	7/01/2026
1911	COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Compartir Lucero Alto		100.00%	100.00%		$ 3,852,781	$ 3,852,781.00	10/04/2026	16/04/2026
533	RURAL LA UNION USME (CED)	USME	A	La Unión Usme		100.00%	100.00%		$ 4,026,228	$ 4,026,228.00	15/05/2026	15/05/2026
533	RURAL LA UNION USME (CED)	USME	A	La Unión Usme					$ 55,077,630			
1981-I	FANNY MICKEY (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Villas del Diamante		100.00%	100.00%		$ 10,017,779	$ 3,852,781.00	23/03/2026	13/04/2026
1911	COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Compartir Lucero Alto					$ 6,000,000		18/05/2026	5/06/2026
1912	CONFEDERACION BRISAS DEL	CIUDAD BOLIVAR	A	Confederación Suiza					$ 55,134,766		28/04/2026	1/06/2026
1911	COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Compartir Lucero Alto		75.00%			$ 33,414,474	$ 25,060,855.50	20/05/2026	18/06/2026
1962	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	D	Estrella del Sur (4)					$ 35,000,000			
573	OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)	USME	A	El Bosque Nuevo							23/05/2026	24/05/2026
	TOTAL FRENTES DE OBRA					96.43%	100.00%		$ 263,336,312.00	$ 97,605,299.50		

ACUMULADO FRENTES DE OBRA

TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	8	1	9	$ 2,853,684,032
ACUMULADO EMERGENCIAS				
6	1	0	7	$ 97,605,300
TOTAL				
6	9	1	16	$ 2,951,289,332
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30			
9		20		9		20		31		TOTAL INTERVENTORIA	
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$	


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	79.35%	0.00%	65.83%
PROGRAMADO	78.98%		
ATRASO	0.37%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			


AVANCE GENERAL



EMERGENCIAS



AVANCE FÍSICO



AVANCE DE LOS FRENTES



OBSERVACIONES:

FECHA: 2/06/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 123 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				GRUPO 4
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155135	CONTRATISTA:	consorcio adecuaciones ARSAF 2025	
17/5/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	consorcio SERINCO educativo	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 100.00%	FANNY MICKEY	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y TERRAZAS	 		
		INTERVENCION BATERIAS SANITARIAS (Cambio de sanitarios, orinales, lavamanos y griferia).	 		 
2A 94.49%	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	IMPERMEABILIZACION DE CUPULAS (CUBIERTA)			 
3A 60.66%	COMPARTIR EL RECUERDO	Cerramiento en lona verde, replanteo, retiro de aparatos sanitarios, demolicion de enchape de pared y de piso			 

FECHA:	2/06/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	123 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA		
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	GRUPO	4
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155135	CONTRATISTA:	consorcio adecuaciones ARSAF 2025
17/5/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	consorcio SERINCO educativo

4A 100.00%	LOS TEJARES	CAMBIO DE CUBIERTA EDIFICIO No.2, INCLUYE MEJORAMIENTO ELETRICO DE LOS ESPACIOS A INTERVENIR (2 AULAS Y 2 COORDINACIONES)					
5A 84.37%	OFELIA URIBE DE ACOSTA	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y TERRAZAS, MEJORAMIENTO DE CANALES Y BAJANTES, ADECUACION DE CARCAMOS,					
6A 93.19%	DIEGO MONTAÑA CUELLAR	ADECUACION BATERIA SANITARIA PARA MOVILIDAD REDUCIDA, ADECUACION RAMPA ACCESO AREA DE COMEDOR (AUDITORIO), MEJORAMIENTO DE CORNISAS					
7C 100.00%	ESTRELLA DEL SUR - C	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PORTONES PRINCIPALES CAMBIO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL					

FECHA:	2/06/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	123 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA					
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				GRUPO	4
CORTE DEL INFORME		CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155135	CONTRATISTA:	consorcio adecuaciones ARSAF 2025		
17/5/26		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	consorcio SERINCO educativo		

8C 100.00%	ESTRELLA DEL SUR - D	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PORTONES PRINCIPALES CAMBIO DE CUBIERTA				
9A 100.00%	FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME	TALA DE UN ARBOL Y PODA DE UN ARBOL				
10A 100.00%	CIUDAD DE VILLAVICENCIO	ADECUACION BATERIA SANITARIA PARA MOVILIDAD REDUCIDA, ADECUACION RAMPA ACCESO AREA DE COMEDOR (AUDITORIO), MEJORAMIENTO DE CORNISAS				
11A 100.00%	EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN	ADECUACION BATERIA SANITARIA PARA MOVILIDAD REDUCIDA, ADECUACION RAMPA ACCESO AREA DE COMEDOR (AUDITORIO), MEJORAMIENTO DE CORNISAS				

FECHA:	2/06/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	123 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA	
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	GRUPO 4
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155135	CONTRATISTA: consorcio adecuaciones ARSAF 2025
17/5/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR: consorcio SERINCO educativo

12A 100.00%	COMPARTIR EL RECUERDO (Emergencia 1)	RUPTURA DE TUBERÍA SOBRE BAÑO 2DO PISO Y EN PATIO PRINCIPAL, HUMEDAD SOBRE BAÑOS 2DO PISO				
13A 100.00%	FANNY MIKEY (Emergencia)	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION SOBRE COCINA DONDE SE ENCONTRABAN EQUIPOS DE COCINA				
14A 25.00%	COMPARTIR EL RECUERDO (Emergencia 2)	RETIRO DE PISO SALON DE DANZAS, INSTALACIÓN DE PISO NUEVO, RETIRO DE DIVISIONES METALICAS ENTRE SALONES, INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPERBOARD COMO REMPLAZO DE ESTAS				
15A 100.00%	RURAL LA UNION (Emergencia 1)	TALA DE UN (01) UN ELEMENTO ARBOREO				

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA					VIGENCIA		2025
CPF	1981-L	IED	FANNY MIKEY		SEMANA No. 29						
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	119.00	299.51		$ 30,319.00	$ 9,080,843.69	$ (5,472,882.69)			MAYOR	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS	M2	268.86	303.45	0	$ 17,585.00	$ 5,336,168.25	$ (608,265.15)			MAYOR	
DEMOLICION DE ACABADO DE PISO ÍTEM: 1.29	M2	0.00	725.46	0	$ 31,765.00	$ 23,044,236.90	$ (23,044,236.90)			MAYOR	
AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA) ÍTEM: 16.1.25	M2	0.00	725.46		$ 110,795.00	$ 80,377,340.70	$ (80,377,340.70)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5MM, DE 0.15X 0.15 M	KG	0.00	1573.68		$ 7,344.00	$ 11,557,105.92	$ (11,557,105.92)			MAYOR	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	0.00	386.00		$ 28,441.00	$ 10,978,226.00	$ (10,978,226.00)			MAYOR	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	0.00	333.88		$ 23,603.00	$ 7,880,569.64	$ (7,880,569.64)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	2142.18	1294.72		$ 352,164.00	$ 455,953,774.08	$ 298,444,903.44			MENOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	0.00	7.00		$ 851,255.00	$ 5,958,785.00	$ (5,958,785.00)			MAYOR	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00	3.00		$ 601,133.00	$ 1,803,399.00	$ -			IGUAL	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	17.00	16.00		$ 800,038.00	$ 12,800,608.00	$ 800,038.00			MENOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA ADRIATICA, INCLUYE ASIENTO SANITARIO ENTRADA SUPERIOR PARA FLUXOMETRO DE CORONA O SIMILAR	UN	2.00	17.00		$ 1,487,960.00	$ 25,295,320.00	$ (22,319,400.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	24.00	27.00		$ 418,333.00	$ 11,294,991.00	$ (1,254,999.00)			MAYOR	
DILATACIÓNENCONCRETOCONPULIDORAESPESORDE3MMPROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M	0.00	314.60		$ 4,436.00	$ 1,395,565.60	$ (1,395,565.60)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	0.00	315.60		$ 25,116.00	$ 7,926,609.60	$ (7,926,609.60)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	3.00		$ 752,783.00	$ 2,258,349.00	$ (752,783.00)			MAYOR	
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TOP COAT O SIMILAR, PARA EXTERIORES EN COLORES PRIMARIOS, NO INCLUYE DISEÑO	M2	0.00	970.18		$ 41,171.00	$ 39,943,280.78	$ (39,943,280.78)			MAYOR	

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA TASA SANITARIO REF: CORONA O SIMILAR	UN	0.00	10.00		$ 713,949.00	$ 7,139,490.00	$ (7,139,490.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL LÍNEA INFANTIL	UN	0.00	4.00		$ 358,984.00	$ 1,435,936.00	$ (1,435,936.00)			MAYOR	
TRATAMIENTO DE PLACA EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: PULIDA DE SUPERFICIE, TRATAMIENTO DE JUNTAS, LAVADO PARA RETIRO DE SUCIEDAD, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN	M2	0.00	156.41		$ 46,488.00	$ 7,271,188.08	$ (7,271,188.08)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	0.00	8.50		$ 29,027.00	$ 246,729.50	$ (246,729.50)			MAYOR	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0,15M A 0,20 M EXISTENTE EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	303.56		$ 107,321.00	$ 32,578,362.76	$ (32,578,362.76)			MAYOR	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	0.00	301.75		$ 161,712.00	$ 48,796,198.35	$ (48,796,198.35)			MAYOR	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	854.75	1296.16		$ 4,822.00	$ 6,250,083.52	$ (2,128,479.02)			MAYOR	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	21.00	84.00		$ 26,588.00	$ 2,233,392.00	$ (1,675,044.00)			MAYOR	63.00
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) CERTIFICADOS)	M2	16.00	2.88		$ 12,327.00	$ 35,501.76	$ 161,730.24			MENOR	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	0.00	9.00		$ 8,731.00	$ 78,579.00	$ (78,579.00)			MAYOR	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE	M	0.00	9.00		$ 21,288.00	$ 191,592.00	$ (191,592.00)			MAYOR	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	0.00	8.00		$ 8,731.00	$ 69,848.00	$ (69,848.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4'' INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	7.76		$ 27,261.00	$ 211,545.36	$ (211,545.36)			MAYOR	7.76
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/4 ''	UN	0.00	40.00		$ 13,976.00	$ 559,040.00	$ (559,040.00)			MAYOR	40.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4'' INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	0.88		$ 15,333.00	$ 13,493.04	$ (13,493.04)			MAYOR	0.88
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 3/4'	UN	0.00	4.00		$ 6,383.00	$ 25,532.00	$ (25,532.00)			MAYOR	4.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN	0.00	1.00		$ 84,122.00	$ 84,122.00	$ (84,122.00)			MAYOR	1.00
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	0.00	119.84		$ 25,975.00	$ 3,112,844.00	$ (3,112,844.00)			MAYOR	119.84
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	0.00	2.88		$ 113,205.00	$ 326,030.40	$ (326,030.40)			MAYOR	2.88
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	0.00	1.00		$ 40,084.00	$ 40,084.00	$ (40,084.00)			MAYOR	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	0.00	1.00		$ 32,716.00	$ 32,716.00	$ (32,716.00)			MAYOR	1.00

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
					SUBTOTAL I.E.D. FANNY MIKEY	**$ 823,617,480.93**					
CPF	**1912**	**IED**	**CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE**			**SEMANA No. 29**					
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS	M2	1256.41	1543.97		$ 17,585.00	$ 27,150,712.45	$ (5,056,742.60)			MAYOR	
TRATAMIENTO DE PLACA EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: PULIDA DE SUPERFICIE, TRATAMIENTO DE JUNTAS, LAVADO PARA RETIRO DE SUCIEDAD, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN	M2	0.00	1545.23		$ 46,487.71	$ 71,834,197.94	$ (71,834,197.94)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	1256.41	1545.23		$ 352,164.00	$ 544,174,377.72	$ (101,712,006.48)			MAYOR	
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TOP COAT O SIMILAR, PARA EXTERIORES EN COLORES PRIMARIOS, NO INCLUYE DISEÑO	M2	0.00	1545.23		$ 41,171.43	$ 63,619,323.22	$ (63,619,323.22)			MAYOR	
			SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. BRISAS DEL DIAMANTE			**$ 706,778,611.33**					
CPF	**1911**	**IED**	**OFELIA URIBE**			**SEMANA No. 29**					
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS	M2	409.70	394.25		$ 17,585.00	$ 6,932,886.25	$ 271,688.25			MENOR	-15.45
DEMOLICION DE ACABADO DE PISO ÍTEM: 1.2.8	M2	0.00	370.28		$ 31,765.00	$ 11,761,944.20	$ (11,761,944.20)			MAYOR	370.28
AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE	M2	0.00	370.28		$ 110,795.00	$ 41,025,172.60	$ (41,025,172.60)			MAYOR	370.28
CERRAMIENTO EN LONA	M	30.00	105.46		$ 30,319.00	$ 3,197,441.74	$ (2,287,871.74)			MAYOR	75.46
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UN	0.00	256.65		$ 23,603.00	$ 6,057,709.95	$ (6,057,709.95)			MAYOR	256.65
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	409.70	370.28		$ 352,164.00	$ 130,399,285.92	$ 13,882,304.88			MENOR	-39.42
ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	172.35		$ 12,208.00	$ 2,104,048.80	$ (2,104,048.80)			MAYOR	172.35
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	47.17		$ 29,027.00	$ 1,369,203.59	$ (1,369,203.59)			MAYOR	47.17
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	32.00	16.00		$ 297,746.00	$ 4,763,936.00	$ 4,763,936.00			MENOR	-16.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	44.92		$ 89,260.00	$ 4,009,559.20	$ (4,009,559.20)			MAYOR	44.92
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	0.00	30.00		$ 205,343.00	$ 6,160,290.00	$ (6,160,290.00)			MAYOR	30.00
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	172.35		$ 11,088.00	$ 1,911,016.80	$ (1,911,016.80)			MAYOR	172.35
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	0.56		$ 14,297.00	$ 8,006.32	$ (8,006.32)			MAYOR	0.56

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y ...	M2	8.00	12.80		$ 35,817.00	$ 458,457.60	$ (171,921.60)			MAYOR	4.80
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	43.00	45.00		$ 7,280.00	$ 327,600.00	$ (14,560.00)			MAYOR	2.00
CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M2	0.00	0.15		$ 625,445.00	$ 93,816.75	$ (93,816.75)			MAYOR	0.15
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	0.00	15.00		$ 172,614.00	$ 2,589,210.00	$ (2,589,210.00)			MAYOR	15.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	0.00	15.00		$ 39,716.00	$ 595,740.00	$ (595,740.00)			MAYOR	15.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	1.10		$ 81,396.00	$ 89,535.60	$ (89,535.60)			MAYOR	1.10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	0.00	2.00		$ 29,271.00	$ 58,542.00	$ (58,542.00)			MAYOR	2.00
UMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	0.00	8.00		$ 14,830.00	$ 118,640.00	$ (118,640.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	0.00	8.00		$ 15,661.00	$ 125,288.00	$ (125,288.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100- 240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	16.00	15.00		$ 61,735.00	$ 926,025.00	$ 61,735.00			MENOR	-1.00
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	414.92		$ 20,542.00	$ 8,523,286.64	$ (8,523,286.64)			MAYOR	414.92
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. OFELIA URIBE					**$ 233,606,642.96**					
CPF	**573**	**IED**	**COMPARTIR EL RECUERDO**			**SEMANA No. 29**					
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M2	30.00	24.00		$ 30,319.00	$ 727,656.00	$ 181,914.00			MENOR	-6.00
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	19.60		$ 67,341.00	$ 1,319,883.60	$ (1,319,883.60)			MAYOR	19.60
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	13.48	0	$ 110,911.00	$ 1,495,080.28	$ (1,495,080.28)			MAYOR	13.48
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	55.18	55.60		$ 31,765.00	$ 1,766,134.00	$ (13,341.30)			MAYOR	0.42
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13.05	41.98		$ 21,734.00	$ 912,393.32	$ (628,764.62)			MAYOR	28.93

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	69.82	108.20		$ 12,327.00	$ 1,333,781.40	$ (473,110.26)			MAYOR	38.38
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	4.67	19.29		$ 24,459.07	$ 471,815.48	$ (357,591.62)			MAYOR	14.62
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0.00	7.10		$ 139,987.00	$ 993,907.70	$ (993,907.70)			MAYOR	7.10
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	30.00	30.00		$ 26,588.00	$ 797,640.00	$ -			IGUAL	0.00
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	70.00	48.84		$ 20,183.00	$ 985,737.72	$ 427,072.28			MENOR	-21.16
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0.00	173.91		$ 139,987.00	$ 24,345,139.17	$ (24,345,139.17)			MAYOR	173.91
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	134.23	225.60		$ 89,260.00	$ 20,137,056.00	$ (8,155,686.20)			MAYOR	91.37
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND	0.00	22.00		$ 7,280.00	$ 160,160.00	$ (160,160.00)			MAYOR	22.00
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	60.00	30.50		$ 8,731.00	$ 266,295.50	$ 257,564.50			MENOR	-29.50
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	0.00	8.00		$ 8,731.00	$ 69,848.00	$ (69,848.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	13.35		$ 89,260.00	$ 1,191,621.00	$ (1,191,621.00)			MAYOR	13.35
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	17.70		$ 49,826.00	$ 881,920.20	$ (881,920.20)			MAYOR	17.70
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UND	0.00	9.00		$ 94,820.00	$ 853,380.00	$ (853,380.00)			MAYOR	9.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UND	0.00	4.00		$ 134,128.00	$ 536,512.00	$ (536,512.00)			MAYOR	4.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UND	0.00	7.00		$ 61,917.00	$ 433,419.00	$ (433,419.00)			MAYOR	7.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UND	0.00	10.00		$ 65,687.00	$ 656,870.00	$ (656,870.00)			MAYOR	10.00

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	19.49		$ 14,607.00	$ 284,690.43	$ (284,690.43)			MAYOR	19.49
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UND	0.00	9.00		$ 188,006.00	$ 1,692,054.00	$ (1,692,054.00)			MAYOR	9.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UND	0.00	10.00		$ 94,820.00	$ 948,200.00	$ (948,200.00)			MAYOR	10.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UND	8.00	2.00		$ 67,247.00	$ 134,494.00	$ 403,482.00			MENOR	-6.00
CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UND	0.00	2.00		$ 674,511.00	$ 1,349,022.00	$ (1,349,022.00)			MAYOR	2.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15X 0.15 M	KG	0.00	71.18		$ 7,344.00	$ 522,745.92	$ (522,745.92)			MAYOR	71.18
PLACA CONTRAPISO DE 10CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	0.00	41.93		$ 119,173.00	$ 4,996,923.89	$ (4,996,923.89)			MAYOR	41.93
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	0.00	42.83		$ 23,603.00	$ 1,010,916.49	$ (1,010,916.49)			MAYOR	42.83
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	M3	0.00	20.49		$ 178,689.00	$ 3,661,337.61	$ (3,661,337.61)			MAYOR	20.49
PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0.00	37.33		$ 40,541.00	$ 1,513,395.53	$ (1,513,395.53)			MAYOR	37.33
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	0.00	130.00		$ 101,554.00	$ 13,202,020.00	$ (13,202,020.00)			MAYOR	130.00
ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	50.00		$ 12,208.00	$ 610,400.00	$ (610,400.00)			MAYOR	50.00
RELLENOSUBBASEGRANULARTIPOINVIAS(SUMINISTRO,EXTENDIDO , NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0.00	7.51		$ 187,185.00	$ 1,405,759.35	$ (1,405,759.35)			MAYOR	7.51
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	0.00	13.66		$ 161,712.00	$ 2,208,985.92	$ (2,208,985.92)			MAYOR	13.66
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	55.18	18.00		$ 44,137.00	$ 794,466.00	$ 1,641,013.66			MENOR	-37.18
SUMINISTROEINSTALACIÓNDEMEDIACAÑAENGRANITOPULIDOBLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M2	41.56	25.00		$ 80,091.00	$ 2,002,275.00	$ 1,326,306.96			MENOR	-16.56
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	0.00	5.00		$ 851,255.00	$ 4,256,275.00	$ (4,256,275.00)			MAYOR	5.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	0.00	2.00		$ 601,133.00	$ 1,202,266.00	$ (1,202,266.00)			MAYOR	2.00
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	189.08	53.57		$ 4,127.00	$ 221,083.39	$ 559,249.77			MENOR	-135.51
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	0.00	28.97		$ 3,360.00	$ 97,339.20	$ (97,339.20)			MAYOR	28.97
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	40.00	32.00		$ 11,663.00	$ 373,216.00	$ 93,304.00			MENOR	-8.00

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y / OCIELO RASO, ANCHO <=15 CM, PROFUNDIDAD<=10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	0.00	27.50		$ 21,288.00	$ 585,420.00	$ (585,420.00)			MAYOR	27.50
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20METROS	M3	0.00	8.00		$ 33,842.00	$ 270,736.00	$ (270,736.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	0.00	35.78		$ 7,070.00	$ 252,964.60	$ (252,964.60)			MAYOR	35.78
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	55.18	19.60		$ 44,137.00	$ 865,085.20	$ 1,570,394.46			MENOR	-35.58
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADODE 1"	M2	0.00	28.00		$ 1,022,891.00	$ 28,640,948.00	$ (28,640,948.00)			MAYOR	28.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO=300A400mm)CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30mm y 40mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2)CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES-FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA YL OS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	149.68	279.93		$ 258,037.00	$ 72,232,297.41	$ (33,609,319.25)			MAYOR	130.25
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	0.00	1900.00		$ 22,456.00	$ 42,666,400.00	$ (42,666,400.00)			MAYOR	1900.00
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	149.68	279.93		$ 35,817.00	$ 10,026,252.81	$ (4,665,164.25)			MAYOR	130.25
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA A UNA DESCARGA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UN	0.00	10.00		$ 1,055,407.00	$ 10,554,070.00	$ (10,554,070.00)			MAYOR	10.00

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑOS ED, ESPESOR DE 1 CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	4.80	4.80		$ 1,099,280.00	$ 5,276,544.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	0.00	20.00	20.00	$ 175,743.00	$ 3,514,860.00	$ (3,514,860.00)			MAYOR	20.00
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. COMPARTIR EL RECUERDO					**$ 277,709,694.12**					
CPF	**539**	**IED**	**LOS TEJARES**			**SEMANA No. 29**					
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	30.00	26.20		$ 30,319.00	$ 794,357.80	$ 115,212.20			MENOR	-3.80
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	0.00	42.01		$ 21,734.00	$ 913,045.34	$ (913,045.34)			MAYOR	42.01
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	149.68	248.29		$ 35,817.00	$ 8,893,002.93	$ (3,531,914.37)			MAYOR	98.61
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	42.00	60.95		$ 26,101.00	$ 1,590,855.95	$ (494,613.95)			MAYOR	18.95
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	16.00	24.00		$ 7,280.00	$ 174,720.00	$ (58,240.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	20.00	3630.35		$ 22,456.00	$ 81,523,076.55	$ (81,073,956.55)			MAYOR	3610.35

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO=300A400mm)CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30mm y 40mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2)CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES-FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA YL OS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	183.38	326.90		$ 258,037.00	$ 84,352,295.30	$ (37,033,470.24)			MAYOR	143.52
MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, MASILLA, CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E=12 CM	M2	0.00	24.32		$ 164,556.00	$ 4,001,837.36	$ (4,001,837.36)			MAYOR	24.32
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M2	30.00	43.00		$ 22,722.00	$ 977,046.00	$ (295,386.00)			MAYOR	13.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120X30CM, 40W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	16.00	12.00		$ 232,000.00	$ 2,784,000.00	$ 928,000.00			MENOR	-4.00
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	0.00	54.61		$ 16,770.00	$ 915,809.70	$ (915,809.70)			MAYOR	54.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	16.00	30.00		$ 175,743.00	$ 5,272,290.00	$ (2,460,402.00)			MAYOR	14.00
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	129.47	187.68		$ 21,050.00	$ 3,950,664.00	$ (1,225,320.50)			MAYOR	58.21
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A= 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	54.61		$ 20,533.00	$ 1,121,307.13	$ (1,121,307.13)			MAYOR	54.61
PLACA EN CONCRETO 3000 PSI DE 15CM SOBRE LAMINA COLABORANTE 2"	M2	0.00	9.00		$ 238,672.00	$ 2,148,048.00	$ (2,148,048.00)			MAYOR	9.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5MM, DE 0.15X 0.15 M	KG	0.00	18.70		$ 7,344.00	$ 137,332.80	$ (137,332.80)			MAYOR	18.70
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120X30CM, 40W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	16.00	12.00		$ 232,000.00	$ 2,784,000.00	$ 928,000.00			MENOR	-4.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	12.00	15.00		$ 29,027.00	$ 435,405.00	$ (87,081.00)			MAYOR	
DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	7.20		$ 25,077.00	$ 180,554.40	$ (180,554.40)			MAYOR	

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	0.00	3.00		$ 11,663.00	$ 34,989.00	$ (34,989.00)			MAYOR	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.00	16.15		$ 69,499.00	$ 1,122,408.85	$ (1,122,408.85)			MAYOR	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	0.00	4.50		$ 151,090.00	$ 679,905.00	$ (679,905.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	0.00	11.00		$ 89,260.00	$ 981,860.00	$ (981,860.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	0.00	4.00	0	$ 39,716.00	$ 158,864.00	$ (158,864.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	0.00	9.00		$ 123,679.00	$ 1,113,111.00	$ (1,113,111.00)			MAYOR	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8.00	8.00		$ 206,316.00	$ 1,650,528.00	$ -			IGUAL	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	0.00	8.70	0	$ 238,656.00	$ 2,076,307.20	$ (2,076,307.20)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2	0.00	8.73	0	$ 192,870.00	$ 1,683,755.10	$ (1,683,755.10)			MAYOR	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0.00	22.15	0	$ 42,602.00	$ 943,634.30	$ (943,634.30)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD	M2	0.00	2.76	0	$ 161.49	$ 445.72	$ (445.72)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD	M2	0.00	12.50		$ 134,767.00	$ 1,684,587.50	$ (1,684,587.50)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE ,	UN	0.00	14.00	14	$ 205,343.00	$ 2,874,802.00	$ (2,874,802.00)			MAYOR	14.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UND	0.00	1.00		$ 558,005.00	$ 558,005.00	$ (558,005.00)			MAYOR	1.00
EMBALAJEENPOLIETILENODEBAJADENSIDADYDISPOSICIÓNFINAL DE TEJA EN ASBESTO	kg	0.00	2363.79		$ 3,276.00	$ 7,743,770.06	$ (7,743,770.06)			MAYOR	2363.79
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. LOS TEJARES					**$ 226,256,621.00**					
CPF	**576**	**IED**	**DIEGO MONTAÑA CUELLAR**			**SEMANA No. 29**					
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	16.32	16.66	0	$ 4,127.00	$ 68,755.82	$ (1,403.18)			MAYOR	0.34

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M2	30.00	117.20		$ 30,319.00	$ 3,553,386.80	$ (2,643,816.80)			MAYOR	87.20
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.32	2.40		$ 67,341.00	$ 161,618.40	$ 196,635.72			MENOR	-2.92
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.32	16.66		$ 31,765.00	$ 529,204.90	$ (10,800.10)			MAYOR	0.34
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34.00	18.82	0	$ 21,734.00	$ 409,033.88	$ 329,922.12			MENOR	-15.18
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	41.18	31.05	0	$ 12,327.00	$ 382,753.35	$ 124,872.51			MENOR	-10.13
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	4.06	6.84	0	$ 32,330.00	$ 221,137.20	$ (89,877.40)			MAYOR	2.78
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	8.00	10.00	0	$ 26,588.00	$ 265,880.00	$ (53,176.00)			MAYOR	2.00
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0.00	57.96		$ 42,602.00	$ 2,469,211.92	$ (2,469,211.92)			MAYOR	57.96
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.00	7.26	0	$ 69,499.00	$ 504,562.74	$ (504,562.74)			MAYOR	7.26
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	16.32	15.75	0	$ 44,137.00	$ 695,157.75	$ 25,158.09			MENOR	-0.57
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	0.00	40.59		$ 44,137.00	$ 1,791,520.83	$ (1,791,520.83)			MAYOR	40.59
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	16.32	15.80		$ 44,137.00	$ 697,364.60	$ 22,951.24			MENOR	-0.52
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	0.45	0.44		$ 1,022,891.00	$ 450,072.04	$ 10,228.91			MENOR	-0.01
DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESTRUCTURA EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA FIBRO CEMENTO A UNA CARA DE 1/2" CON ESTRUCTURA . INCLUYE ARME Y DESARME DE ANDAMIOS, PARA ALTURAS MAXIMAS DE 10 METROS CON ANDAMIO CERTIFICADO, PARA ANCHOS DE HASTA 60 CM, INCLUYE ESTUCO Y PINTURA PARA EXTERIORES, PARA IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A - OCALIDAD DE USME	M	0.00	1615.00	115.00	$ 219,057.00	$ 353,777,055.00	$ (353,777,055.00)			MAYOR	1615.00
SUMINISTROEINSTALACIÓNDEMEDIACAÑAENGRANITOPULIDOBLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M2	20.60	22.41		$ 80,091.00	$ 1,794,839.31	$ (144,964.71)			MAYOR	1.81

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑOS ED, ESPESOR DE 1 CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.17	2.50		$ 1,099,280.00	$ 2,748,200.00	$ (362,762.40)			MAYOR	0.33
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	2.00	4.00		$ 418,333.00	$ 1,673,332.00	$ (836,666.00)			MAYOR	2.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	2.00		$ 752,783.00	$ 1,505,566.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADODE 1"	M2	8.28	6.34		$ 964,177.00	$ 6,112,882.18	$ 1,870,503.38			MENOR	-1.94
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5.00	5.00		$ 11,663.00	$ 58,315.00	$ -			IGUAL	0.00
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	3.00	5.00		$ 7,280.00	$ 36,400.00	$ (14,560.00)			MAYOR	2.00
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	ML	10.00	5.52		$ 57,553.00	$ 317,692.56	$ 257,837.44			MENOR	-4.48
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	40.00	21.82		$ 7,070.00	$ 154,267.40	$ 128,532.60			MENOR	-18.18
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	5.00	5.00		$ 65,687.00	$ 328,435.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	5.00	5.00		$ 61,917.00	$ 309,585.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	5.00	5.00		$ 94,820.00	$ 474,100.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	2.00		$ 123,679.00	$ 247,358.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE ,	UN	4.00	4.00		$ 205,343.00	$ 821,372.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE FLUXOMETRO, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	UN	1.00	2.00		$ 2,609,918.00	$ 5,219,836.00	$ (2,609,918.00)			MAYOR	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE MOVILIDAD REDUCIDA (NO INCLUYE ACCESORIOS)	UN	0.00	1.00		$ 1,019,900.00	$ 1,019,900.00	$ (1,019,900.00)			MAYOR	1.00
UMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN)	UN	1.00	1.00		$ 1,133,330.00	$ 1,133,330.00	$ -			IGUAL	0.00

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
UMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN)SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00	2.00		$ 40,084.00	$ 80,168.00	$ 80,168.00			MENOR	-2.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2.00	2.00		$ 32,716.00	$ 65,432.00	$ -			IGUAL	0.00
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	105.59	15.80		$ 29,027.00	$ 458,626.60	$ 2,606,334.33			MENOR	-89.79
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	0.00	19.50		$ 26,548.00	$ 517,686.00	$ (517,686.00)			MAYOR	19.50
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0.00	7.51		$ 187,185.00	$ 1,405,759.35	$ (1,405,759.35)			MAYOR	7.51
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	0.00	2.50		$ 7,413.00	$ 18,532.50	$ (18,532.50)			MAYOR	2.50
RAMPA EN CONCRETO	M2	0.00	5.28		$ 151,202.00	$ 798,346.56	$ (798,346.56)			MAYOR	5.28
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. DIEGO MONTAÑA CUELLAR					**$ 393,276,676.69**					
CPF	**1919**	**IED**	**ESTRELLA DEL SUR SEDE C**			**SEMANA No. 26**					
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	62.00	49.20		$ 30,319.00	$ 1,491,694.80	$ 388,083.20			MENOR	-12.80
DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	47.25	92.75		$ 112,034.00	$ 10,390,790.41	$ (5,097,183.91)			MAYOR	45.50
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.15	16.15		$ 32,330.00	$ 522,129.50	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	130.05	325.70		$ 32,330.00	$ 10,529,881.00	$ (6,325,364.50)			MAYOR	195.65
Suministro e instalación de portón metálico plegable con marco montante en lámina Cold rolled lisa calibre 18. Incluye bisagras, cerradura, pasador superior e inferior, doble manija interior - exterior, terminada con anticorrosivo, pintura esmalte - verificar en obra medidas, ángulos y numero de hoja, color gris o similar	M2	0.00	17.15		$ 1,078,457.00	$ 18,495,537.55	$ (18,495,537.55)			MAYOR	17.15

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS	M2	47.25	76.50		$ 393,484.64	$ 30,101,574.96	$ (11,509,425.72)			MAYOR	29.25
COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20X25 CM (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO), ESTE ITEM CORRESPONDE AL COLEGIO ESTRELLA DEL SUR SEDE C, PARA UNA CANTIDAD TOTAL DE 3 METROS	ML	0.00	5.80		$ 119,563.00	$ 693,465.40	$ (693,465.40)			MAYOR	5.80
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 20 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO, ESTE ITEM CORRESPONDE AL COLEGIO ESTRELLA DEL SUR SEDE C	ML	0.00	29.70		$ 107,977.00	$ 3,206,916.90	$ (3,206,916.90)			MAYOR	29.70
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0.00	19.92		$ 42,602.00	$ 848,631.84	$ (848,631.84)			MAYOR	19.92
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	0.00	64.56		$ 23,603.00	$ 1,523,809.68	$ (1,523,809.68)			MAYOR	64.56
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	0.00	99.20		$ 4,822.00	$ 478,342.40	$ (478,342.40)			MAYOR	99.20
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M2	0.00	15.12		$ 11,088.00	$ 167,650.56	$ (167,650.56)			MAYOR	15.12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM	0.00	920.00		$ 1,564.00	$ 1,438,880.00	$ (1,438,880.00)			MAYOR	920.00
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR SEDE C					**$ 79,889,305.00**					
CPF	**1962**		**ESTRELLA DEL SUR SEDE D**			**SEMANA No. 26**					
Suministro e instalación de portón metálico plegable con marco montante en lámina Cold rolled lisa calibre 18. Incluye bisagras, cerradura, pasador superior e inferior, doble manija interior - exterior, terminada con anticorrosivo, pintura esmalte - verificar en obra medidas, ángulos y numero de hoja, color gris o similar	M2		7.87		$ 1,078,457.00	$ 8,488,535.05	$ (8,488,535.05)				7.87
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	0.00	2538.11		$ 22,456.00	$ 56,995,805.33	$ (56,995,805.33)			MAYOR	2538.11
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	88.90	78.34		$ 35,817.00	$ 2,805,903.78	$ 378,227.52			MENOR	-10.56


Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO=300A400mm)CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30mm y 40mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2)CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES-FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA YL OS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	88.23	125.45		$ 258,037.00	$ 32,371,075.84	$ (9,604,471.33)			MAYOR	37.22
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8.00	25.00		$ 175,743.00	$ 4,393,575.00	$ (2,987,631.00)			MAYOR	17.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120X30CM,40W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00	25.00		$ 232,000.00	$ 5,800,000.00	$ (3,944,000.00)			MAYOR	17.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M2	45.00	50.00		$ 22,722.00	$ 1,136,100.00	$ (113,610.00)			MAYOR	5.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UND	0.00	1.00		$ 558,005.00	$ 558,005.00	$ (558,005.00)			MAYOR	1.00
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR SEDE D					**$ 112,549,000.00**					


PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA		**79.35%**
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA	**$**	**2,853,684,032.02**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**3,596,376,728.07**

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Mayo 31 de 2026


SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
FANNY MICKEY	$ 823,617,481.00	100.00%	$ 823,617,480.93	100.00%	$ 823,617,481.00	ENTREGADO
OFELIA URIBE	$ 276,898,268.00	100.00%	$ 233,606,642.96	84.37%	$ 276,898,268.00	-15.63%
BRISAS DEL DIAMANTE	$ 721,506,803.00	96.46%	$ 706,778,611.33	94.49%	$ 748,006,803.00	-1.97%
ESTRELLA DEL SUR - D	$ 112,549,000.00	100.00%	$ 112,549,000.00	100.00%	$ 112,549,000.00	ENTREGADO
LOS TEJARES - A	$ 225,684,838.56	99.75%	$ 226,256,621.00	100.00%	$ 226,256,621.00	ENTREGADO
COMPARTIR EL RDO - A	$ 189,692,310.54	41.44%	$ 277,709,694.12	60.66%	$ 457,805,803.07	19.23%
DIEGO MONTAÑA - A	$ 410,717,458.35	97.32%	$ 393,276,676.69	93.19%	$ 422,010,855.00	-4.13%
ESTRELLA DEL SUR - C	$ 79,889,305.00	100.00%	$ 79,889,305.00	100.00%	$ 79,889,305.00	ENTREGADO
ARBORIZADORA ALTA	$ -	0.00%		0.00%	$ 449,342,592.00	0.00%
TOTALES	**$ 2,840,555,464.46**	**78.98%**	**$ 2,853,684,032.02**	**79.35%**	**$ 3,596,376,728.07**	0.37%

OBSERVACIONES: Como hemos reseñado recientemente, a la fecha encontramos que cuatro (4) de las ocho (8) entidades educativas han sido entregadas. La ***IED Ofelia Uribe de Acosta*** se mantiene en un atraso superior al 15%, ***IED Diego Montaña Cuellar*** presenta atrasos superiores al 4% y ***Brisas del Diamante*** con atraso del 2%. El contrato en general registra un atraso por debajo del 1.0%

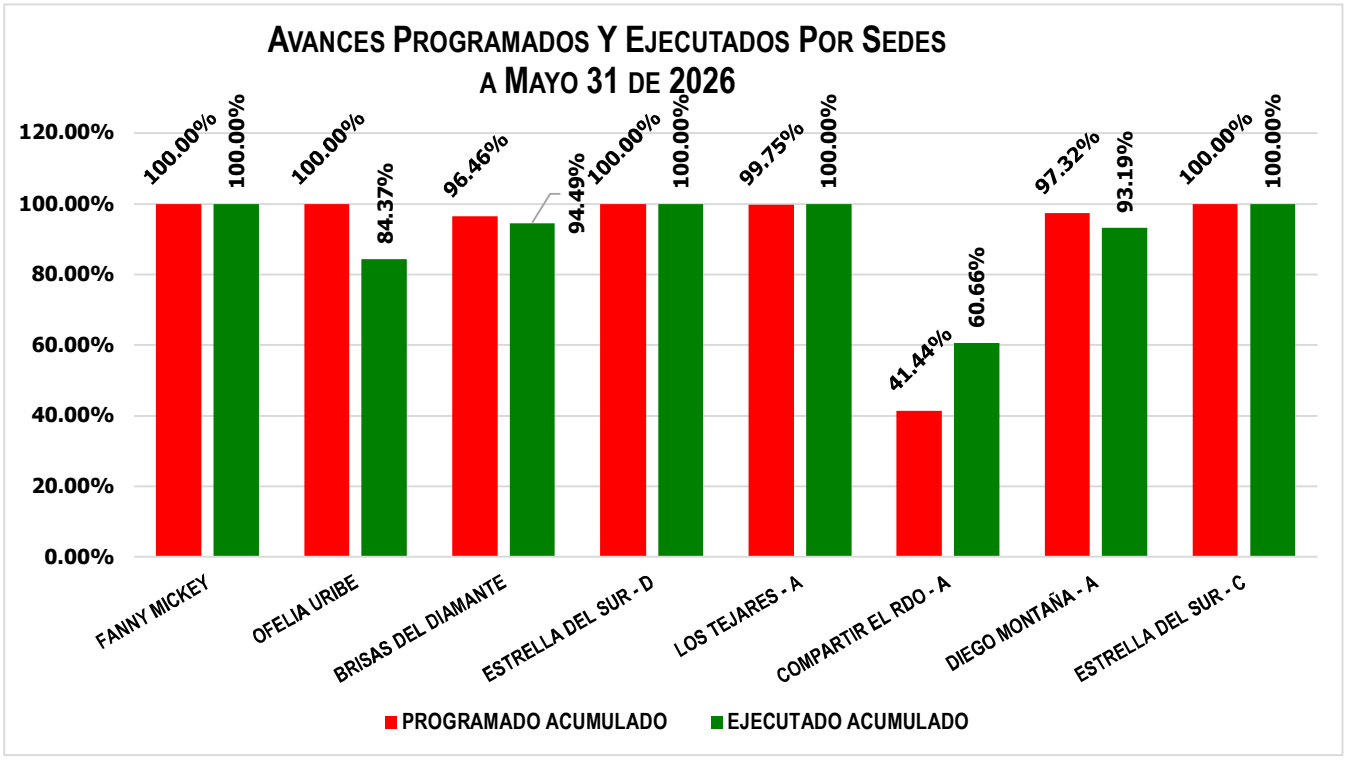

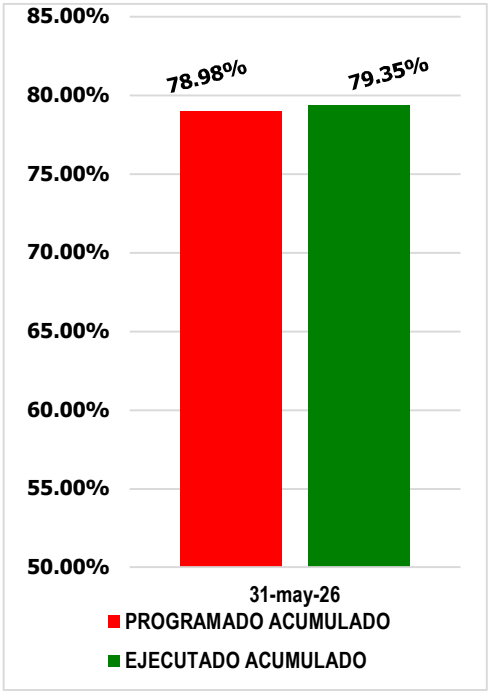

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - May. 31 2026

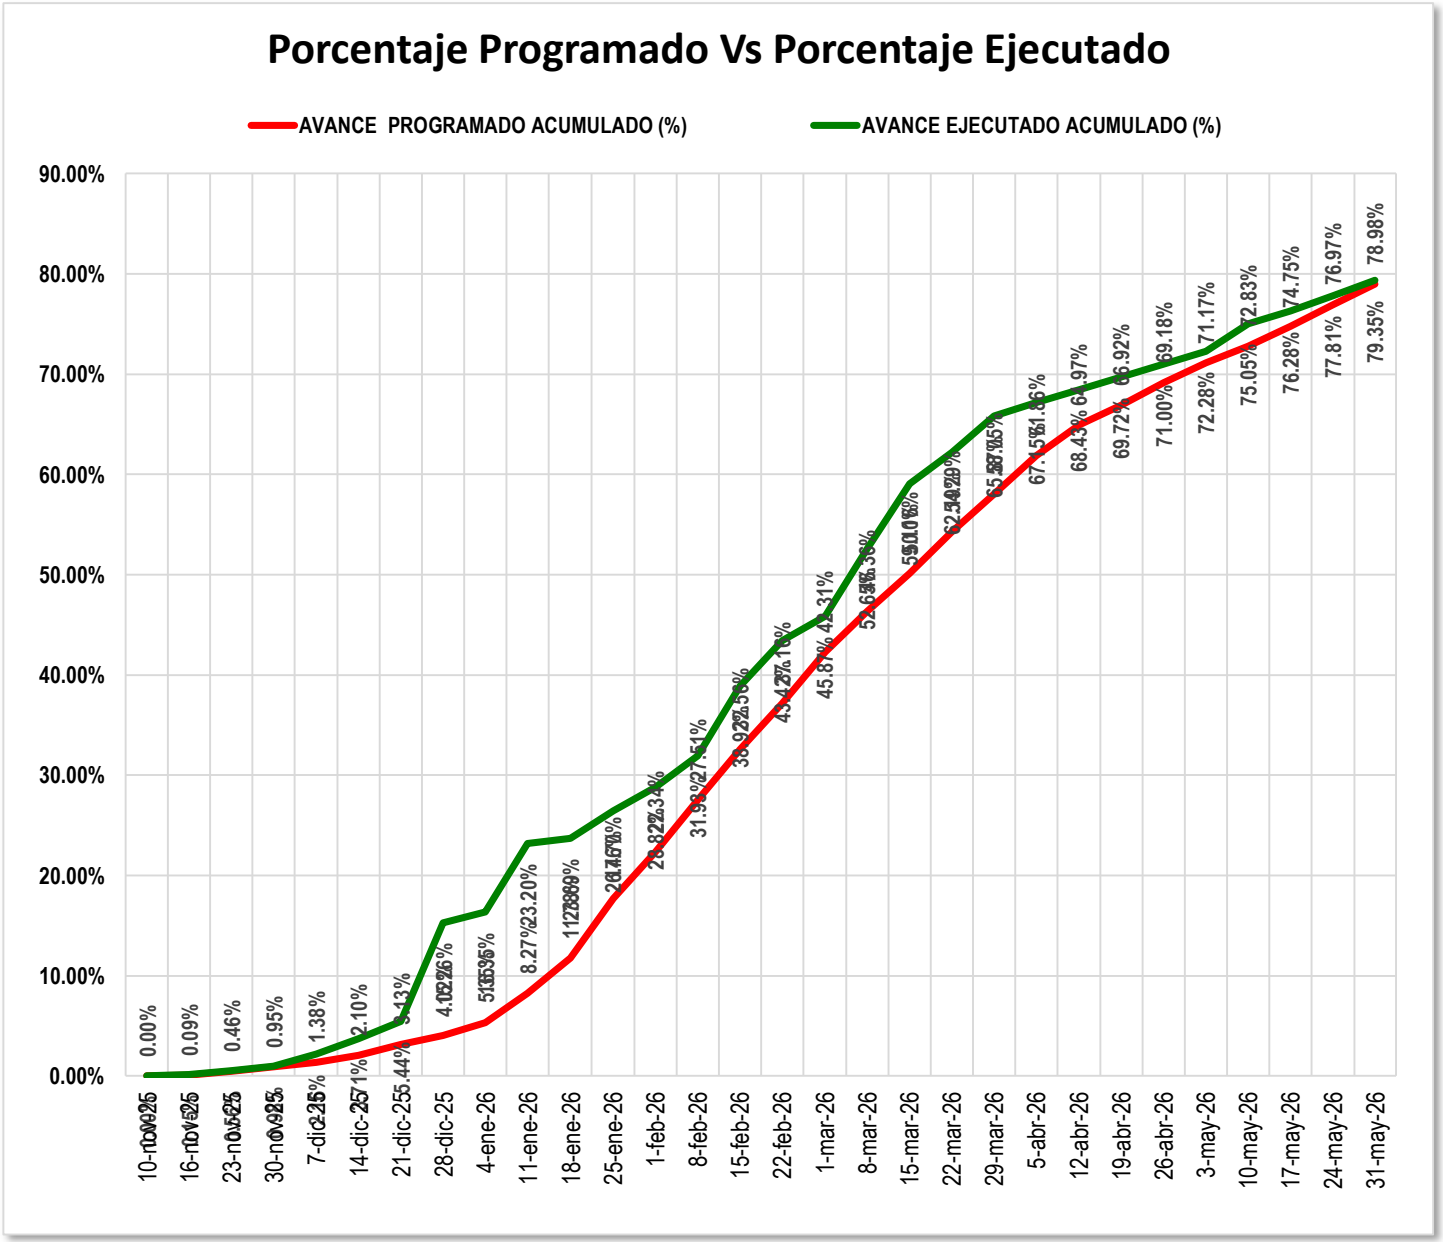

FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0.00%	0.00%
16-nov-25	0.09%	0.15%
23-nov-25	0.46%	0.56%
30-nov-25	0.95%	0.98%
7-dic-25	1.38%	2.16%
14-dic-25	2.10%	3.71%
21-dic-25	3.13%	5.44%
28-dic-25	4.02%	15.26%
4-ene-26	5.35%	16.35%
11-ene-26	8.27%	23.20%
18-ene-26	11.78%	23.69%
25-ene-26	17.70%	26.46%
1-feb-26	22.34%	28.82%
8-feb-26	27.51%	31.93%
15-feb-26	32.56%	38.92%
22-feb-26	37.16%	43.42%
1-mar-26	42.31%	45.87%
8-mar-26	46.36%	52.65%
15-mar-26	50.16%	59.10%
22-mar-26	54.29%	62.19%
29-mar-26	58.05%	65.87%
5-abr-26	61.86%	67.15%
12-abr-26	64.97%	68.43%
19-abr-26	66.92%	69.72%
26-abr-26	69.18%	71.00%
3-may-26	71.17%	72.28%
10-may-26	72.83%	75.05%
17-may-26	74.75%	76.28%
24-may-26	76.97%	77.81%
31-may-26	**78.98%**	**79.35%**
7-jun-26	81.18%	
14-jun-26	82.90%	
21-jun-26	84.61%	
28-jun-26	85.99%	

FECHA: 8/06/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 116 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		GRUPO 4
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA		
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	consorcio adecuaciones ARSAF 2025	
7 de junio de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	consorcio SERINCO educativo	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8155135	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131.00	$ 2,703,337,443.00
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES	$ 128,425,720.00	$ 1,342,467,488.00
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRÓRROGAS	30	149	TOTAL	$ 924,609,851.00	$ 4,045,804,931.00
TERMINACION FINAL	4 de junio de 2026	1 de octubre de 2026	TOTAL	241	360			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 128,425,720.00	30	
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	18-dic-25	$ 479,467,488.00	27	
2	27-may-26	$ 863,000,000.00	122	
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH – 100046043 – Anexo 0	4 9 2025	4 10 2026	4 4 2026	4 4 2031	4 9 2025	4 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
96098	4 9 2025	4 12 2026	4 9 2025	4 4 2029	4 4 2026	4 4 2028	27661	4 9 2025	4 4 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (07-06-2026)	PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA
1981-L	FANNY MICKEY (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Villas del Diamante	100.00%	100.00%	100.00%		$ 823,617,481.00	$ 823,617,480.93	10/11/2025	11/04/2026
1962	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	D	Estrella del Sur (4)	100.00%	100.00%	100.00%		$ 112,549,000.00	$ 112,549,000.00	2/02/2026	30/04/2026
1919	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	Estrella III Sede C	100.00%	100.00%	100.00%		$ 79,889,305.00	$ 79,889,305.00	15/01/2026	28/03/2026
1912	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Confederación Suiza	100.00%	100.00%	100.00%		$ 748,006,803.00	$ 748,006,803.00	18/11/2025	5/06/2026
1911	COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Compartir Lucero Alto	60.66%	61.99%	45.40%		$ 457,805,803.07	$ 283,774,209.12	24/11/2025	20/08/2026
576	DIEGO MONTAÑA CUELLAR (IED)	USME	A	El Uval - Nuevo	93.19%	98.38%	100.00%		$ 422,010,855.00	$ 415,182,376.69	1/12/2025	1/06/2026
573	OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)	USME	A	El Bosque Nuevo	84.37%	84.37%	100.00%		$ 276,898,268.00	$ 233,606,642.96	24/11/2025	7/05/2026
539	LOS TEJARES (IED)	USME	A	Los Tejares	100.00%	100.00%	100.00%		$ 226,256,621.00	$ 226,256,621.00	1/12/2025	1/06/2026
1940	ARBORIZADORA ALTA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Pradera Esperanza		0.00%	4.98%		$ 449,342,592.00	$ -	5/06/2026	1/10/2026
TOTAL FRENTES DE OBRA						81.27%	81.18%		$ 3,596,376,728.07	$ 2,922,882,438.69		

EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (07-06-2026)	PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA
527	FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)	USME	C	Maria Auxiliadora Sede C		100.00%	100.00%		$ 2,129,817	$ 2,129,817.00	23/11/2025	24/11/2025
577	CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)	USME	A	Iote - Puerta Al llano valle 12		100.00%	100.00%		$ 5,810,951	$ 5,810,951.00	22/11/2025	24/11/2025
1928	EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Manuela Beltrán		100.00%	100.00%		$ 52,871,886	$ 52,871,886.00	4/12/2025	7/01/2026
1911	COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Compartir Lucero Alto		100.00%	100.00%		$ 3,852,781	$ 3,852,781.00	10/04/2026	16/04/2026
533	RURAL LA UNION USME (CED)	USME	A	La Unión Usme		100.00%	100.00%		$ 4,026,228	$ 4,026,228.00	15/05/2026	15/05/2026
533	RURAL LA UNION USME (CED)	USME	A	La Unión Usme					$ 55,077,630			
1981-I	FANNY MICKEY (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Villas del Diamante		100.00%	100.00%		$ 10,017,779	$ 3,852,781.00	23/03/2026	13/04/2026
1911	COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Compartir Lucero Alto					$ 6,000,000		18/05/2026	5/06/2026
1912	CONFEDERACION BRISAS DEL	CIUDAD BOLIVAR	A	Confederación Suiza					$ 55,134,766		28/04/2026	1/06/2026
1911	COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Compartir Lucero Alto		75.00%			$ 33,414,474	$ 25,060,855.50	20/05/2026	18/06/2026
1962	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	D	Estrella del Sur (4)						$ 46,432,918.00	22/06/2026	10/07/2026
573	OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)	USME	A	El Bosque Nuevo		100.00%	100.00%		$ 7,209,060.00	$ 7,209,060.00	23/05/2026	24/05/2026
TOTAL FRENTES DE OBRA						96.88%	100.00%		$ 235,545,372.00	$ 151,247,277.50		

ACUMULADO FRENTES DE OBRA

TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
1	7	1	9	$ 2,922,882,439
ACUMULADO EMERGENCIAS				
7	1	0	8	$ 151,247,278
TOTAL				
8	8	1	17	$ 3,074,129,716
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$	


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	81.27%	0.00%	67.78%
PROGRAMADO	81.18%		
ATRASO	0.10%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			


AVANCE GENERAL




EMERGENCIAS



AVANCE FÍSICO



AVANCE DE LOS FRENTES

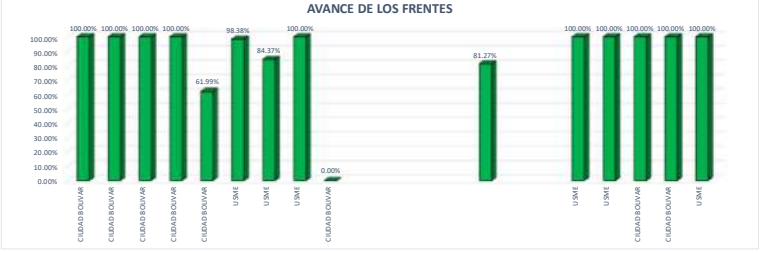

OBSERVACIONES:

FECHA: 8/06/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 116 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				GRUPO 4
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155135	CONTRATISTA:	consorcio adecuaciones ARSAF 2025	
17/5/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	consorcio SERINCO educativo	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 100.00%	FANNY MICKEY	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y TERRAZAS	 		
		INTERVENCION BATERIAS SANITARIAS (Cambio de sanitarios, orinales, lavamanos y griferia).	 		 
2A 100.00%	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	IMPERMEABILIZACION DE CUPULAS (CUBIERTA)			 
3A 61.99%	COMPARTIR EL RECUERDO	Cerramiento en lona verde, replanteo, retiro de aparatos sanitarios, demolicion de enchape de pared y de piso			 

FECHA:	8/06/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME
DIAS RESTANTES	116 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA	APOYO A LA SUPERVISION
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	GRUPO 4

CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155135	CONTRATISTA:	consorcio adecuaciones ARSAF 2025
17/5/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	consorcio SERINCO educativo

4A 100.00%	LOS TEJARES	CAMBIO DE CUBIERTA EDIFICIO No.2, INCLUYE MEJORAMIENTO ELETRICO DE LOS ESPACIOS A INTERVENIR (2 AULAS Y 2 COORDINACIONES)				
5A 84.37%	OFELIA URIBE DE ACOSTA	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y TERRAZAS, MEJORAMIENTO DE CANALES Y BAJANTES, ADECUACION DE CARCAMOS,				
6A 98.38%	DIEGO MONTAÑA CUELLAR	ADECUACION BATERIA SANITARIA PARA MOVILIDAD REDUCIDA, ADECUACION RAMPA ACCESO AREA DE COMEDOR (AUDITORIO), MEJORAMIENTO DE CORNISAS				
7C 100.00%	ESTRELLA DEL SUR - C	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PORTONES PRINCIPALES CAMBIO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL				

FECHA:	8/06/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	116 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				GRUPO 4
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155135	CONTRATISTA:	consorcio adecuaciones ARSAF 2025		
17/5/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	consorcio SERINCO educativo		

8C 100.00%	ESTRELLA DEL SUR - D	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PORTONES PRINCIPALES CAMBIO DE CUBIERTA				
9A 100.00%	FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME	TALA DE UN ARBOL Y PODA DE UN ARBOL				
10A 100.00%	CIUDAD DE VILLAVICENCIO	ADECUACION BATERIA SANITARIA PARA MOVILIDAD REDUCIDA, ADECUACION RAMPA ACCESO AREA DE COMEDOR (AUDITORIO), MEJORAMIENTO DE CORNISAS				
11A 100.00%	EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN	ADECUACION BATERIA SANITARIA PARA MOVILIDAD REDUCIDA, ADECUACION RAMPA ACCESO AREA DE COMEDOR (AUDITORIO), MEJORAMIENTO DE CORNISAS				

FECHA:	8/06/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	116 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA	
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	GRUPO 4
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155135	CONTRATISTA: consorcio adecuaciones ARSAF 2025
17/5/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR: consorcio SERINCO educativo

12A 100.00%	COMPARTIR EL RECUERDO (Emergencia 1)	RUPTURA DE TUBERÍA SOBRE BAÑO 2DO PISO Y EN PATIO PRINCIPAL, HUMEDAD SOBRE BAÑOS 2DO PISO				
13A 100.00%	FANNY MIKEY (Emergencia)	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION SOBRE COCINA DONDE SE ENCONTRABAN EQUIPOS DE COCINA				
14A 75.00%	COMPARTIR EL RECUERDO (Emergencia 2)	RETIRO DE PISO SALON DE DANZAS, INSTALACIÓN DE PISO NUEVO, RETIRO DE DIVISIONES METALICAS ENTRE SALONES, INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPERBOARD COMO REMPLAZO DE ESTAS				
15A 100.00%	RURAL LA UNION (Emergencia 1)	TALA DE UN (01) UN ELEMENTO ARBOREO				

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA					VIGENCIA		2025
CPF	1981-L	IED	FANNY MIKEY		SEMANA No. 30						
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	119.00	299.51		$ 30,319.00	$ 9,080,843.69	$ (5,472,882.69)			MAYOR	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS	M2	268.86	303.45	0	$ 17,585.00	$ 5,336,168.25	$ (608,265.15)			MAYOR	
DEMOLICION DE ACABADO DE PISO ÍTEM: 1.29	M2	0.00	725.46	0	$ 31,765.00	$ 23,044,236.90	$ (23,044,236.90)			MAYOR	
AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA) ÍTEM: 16.1.25	M2	0.00	725.46		$ 110,795.00	$ 80,377,340.70	$ (80,377,340.70)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5MM, DE 0.15X 0.15 M	KG	0.00	1573.68		$ 7,344.00	$ 11,557,105.92	$ (11,557,105.92)			MAYOR	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	0.00	386.00		$ 28,441.00	$ 10,978,226.00	$ (10,978,226.00)			MAYOR	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	0.00	333.88		$ 23,603.00	$ 7,880,569.64	$ (7,880,569.64)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	2142.18	1294.72		$ 352,164.00	$ 455,953,774.08	$ 298,444,903.44			MENOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	0.00	7.00		$ 851,255.00	$ 5,958,785.00	$ (5,958,785.00)			MAYOR	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00	3.00		$ 601,133.00	$ 1,803,399.00	$ -			IGUAL	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	17.00	16.00		$ 800,038.00	$ 12,800,608.00	$ 800,038.00			MENOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA ADRIATICA, INCLUYE ASIENTO SANITARIO ENTRADA SUPERIOR PARA FLUXOMETRO DE CORONA O SIMILAR	UN	2.00	17.00		$ 1,487,960.00	$ 25,295,320.00	$ (22,319,400.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	24.00	27.00		$ 418,333.00	$ 11,294,991.00	$ (1,254,999.00)			MAYOR	
DILATACIÓNENCONCRETOCONPULIDORAESPESORDE3MMPROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M	0.00	314.60		$ 4,436.00	$ 1,395,565.60	$ (1,395,565.60)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	0.00	315.60		$ 25,116.00	$ 7,926,609.60	$ (7,926,609.60)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	3.00		$ 752,783.00	$ 2,258,349.00	$ (752,783.00)			MAYOR	
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TOP COAT O SIMILAR, PARA EXTERIORES EN COLORES PRIMARIOS, NO INCLUYE DISEÑO	M2	0.00	970.18		$ 41,171.00	$ 39,943,280.78	$ (39,943,280.78)			MAYOR	

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA TASA SANITARIO REF: CORONA O SIMILAR	UN	0.00	10.00		$ 713,949.00	$ 7,139,490.00	$ (7,139,490.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL LÍNEA INFANTIL	UN	0.00	4.00		$ 358,984.00	$ 1,435,936.00	$ (1,435,936.00)			MAYOR	
TRATAMIENTO DE PLACA EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: PULIDA DE SUPERFICIE, TRATAMIENTO DE JUNTAS, LAVADO PARA RETIRO DE SUCIEDAD, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN	M2	0.00	156.41		$ 46,488.00	$ 7,271,188.08	$ (7,271,188.08)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	0.00	8.50		$ 29,027.00	$ 246,729.50	$ (246,729.50)			MAYOR	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0,15M A 0,20 M EXISTENTE EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	303.56		$ 107,321.00	$ 32,578,362.76	$ (32,578,362.76)			MAYOR	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	0.00	301.75		$ 161,712.00	$ 48,796,198.35	$ (48,796,198.35)			MAYOR	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	854.75	1296.16		$ 4,822.00	$ 6,250,083.52	$ (2,128,479.02)			MAYOR	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	21.00	84.00		$ 26,588.00	$ 2,233,392.00	$ (1,675,044.00)			MAYOR	63.00
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) CERTIFICADOS)	M2	16.00	2.88		$ 12,327.00	$ 35,501.76	$ 161,730.24			MENOR	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	0.00	9.00		$ 8,731.00	$ 78,579.00	$ (78,579.00)			MAYOR	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE	M	0.00	9.00		$ 21,288.00	$ 191,592.00	$ (191,592.00)			MAYOR	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	0.00	8.00		$ 8,731.00	$ 69,848.00	$ (69,848.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4'' INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	7.76		$ 27,261.00	$ 211,545.36	$ (211,545.36)			MAYOR	7.76
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/4 ''	UN	0.00	40.00		$ 13,976.00	$ 559,040.00	$ (559,040.00)			MAYOR	40.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4'' INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	0.88		$ 15,333.00	$ 13,493.04	$ (13,493.04)			MAYOR	0.88
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 3/4'	UN	0.00	4.00		$ 6,383.00	$ 25,532.00	$ (25,532.00)			MAYOR	4.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN	0.00	1.00		$ 84,122.00	$ 84,122.00	$ (84,122.00)			MAYOR	1.00
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	0.00	119.84		$ 25,975.00	$ 3,112,844.00	$ (3,112,844.00)			MAYOR	119.84
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	0.00	2.88		$ 113,205.00	$ 326,030.40	$ (326,030.40)			MAYOR	2.88
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	0.00	1.00		$ 40,084.00	$ 40,084.00	$ (40,084.00)			MAYOR	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	0.00	1.00		$ 32,716.00	$ 32,716.00	$ (32,716.00)			MAYOR	1.00

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
					SUBTOTAL I.E.D. FANNY MIKEY	**$ 823,617,480.93**					
CPF	**1912**	**IED**	**CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE**			**SEMANA No. 30**					
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS	M2	1256.41	1643.97		$ 17,585.00	$ 28,909,212.45	$ (6,815,242.60)			MAYOR	
TRATAMIENTO DE PLACA EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: PULIDA DE SUPERFICIE, TRATAMIENTO DE JUNTAS, LAVADO PARA RETIRO DE SUCIEDAD, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN	M2	0.00	1625.43		$ 46,487.71	$ 75,562,511.96	$ (75,562,511.96)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	1256.41	1625.43		$ 352,164.00	$ 572,417,930.52	$ (129,955,559.28)			MAYOR	
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TOP COAT O SIMILAR, PARA EXTERIORES EN COLORES PRIMARIOS, NO INCLUYE DISEÑO	M2	0.00	1727.34		$ 41,171.43	$ 71,117,148.07	$ (71,117,148.07)			MAYOR	
			SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. BRISAS DEL DIAMANTE			**$ 748,006,803.00**					
CPF	**1911**	**IED**	**OFELIA URIBE**			**SEMANA No. 30**					
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS	M2	409.70	394.25		$ 17,585.00	$ 6,932,886.25	$ 271,688.25			MENOR	-15.45
DEMOLICION DE ACABADO DE PISO ÍTEM: 1.2.8	M2	0.00	370.28		$ 31,765.00	$ 11,761,944.20	$ (11,761,944.20)			MAYOR	370.28
AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE	M2	0.00	370.28		$ 110,795.00	$ 41,025,172.60	$ (41,025,172.60)			MAYOR	370.28
CERRAMIENTO EN LONA	M	30.00	105.46		$ 30,319.00	$ 3,197,441.74	$ (2,287,871.74)			MAYOR	75.46
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UN	0.00	256.65		$ 23,603.00	$ 6,057,709.95	$ (6,057,709.95)			MAYOR	256.65
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	409.70	370.28		$ 352,164.00	$ 130,399,285.92	$ 13,882,304.88			MENOR	-39.42
ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	172.35		$ 12,208.00	$ 2,104,048.80	$ (2,104,048.80)			MAYOR	172.35
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	47.17		$ 29,027.00	$ 1,369,203.59	$ (1,369,203.59)			MAYOR	47.17
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	32.00	16.00		$ 297,746.00	$ 4,763,936.00	$ 4,763,936.00			MENOR	-16.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	44.92		$ 89,260.00	$ 4,009,559.20	$ (4,009,559.20)			MAYOR	44.92
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	0.00	30.00		$ 205,343.00	$ 6,160,290.00	$ (6,160,290.00)			MAYOR	30.00
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	172.35		$ 11,088.00	$ 1,911,016.80	$ (1,911,016.80)			MAYOR	172.35
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	0.56		$ 14,297.00	$ 8,006.32	$ (8,006.32)			MAYOR	0.56

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y ...	M2	8.00	12.80		$ 35,817.00	$ 458,457.60	$ (171,921.60)			MAYOR	4.80
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	43.00	45.00		$ 7,280.00	$ 327,600.00	$ (14,560.00)			MAYOR	2.00
CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M2	0.00	0.15		$ 625,445.00	$ 93,816.75	$ (93,816.75)			MAYOR	0.15
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	0.00	15.00		$ 172,614.00	$ 2,589,210.00	$ (2,589,210.00)			MAYOR	15.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	0.00	15.00		$ 39,716.00	$ 595,740.00	$ (595,740.00)			MAYOR	15.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	1.10		$ 81,396.00	$ 89,535.60	$ (89,535.60)			MAYOR	1.10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	0.00	2.00		$ 29,271.00	$ 58,542.00	$ (58,542.00)			MAYOR	2.00
UMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	0.00	8.00		$ 14,830.00	$ 118,640.00	$ (118,640.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	0.00	8.00		$ 15,661.00	$ 125,288.00	$ (125,288.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100- 240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	16.00	15.00		$ 61,735.00	$ 926,025.00	$ 61,735.00			MENOR	-1.00
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	414.92		$ 20,542.00	$ 8,523,286.64	$ (8,523,286.64)			MAYOR	414.92
			SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. OFELIA URIBE			**$ 233,606,642.96**					
CPF	**573**	**IED**	**COMPARTIR EL RECUERDO**			**SEMANA No. 30**					
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M2	30.00	24.00		$ 30,319.00	$ 727,656.00	$ 181,914.00			MENOR	-6.00
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	19.60		$ 67,341.00	$ 1,319,883.60	$ (1,319,883.60)			MAYOR	19.60
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	13.48	0	$ 110,911.00	$ 1,495,080.28	$ (1,495,080.28)			MAYOR	13.48
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	55.18	55.60		$ 31,765.00	$ 1,766,134.00	$ (13,341.30)			MAYOR	0.42
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13.05	41.98		$ 21,734.00	$ 912,393.32	$ (628,764.62)			MAYOR	28.93

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	69.82	108.20		$ 12,327.00	$ 1,333,781.40	$ (473,110.26)			MAYOR	38.38
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	4.67	19.29		$ 24,459.07	$ 471,815.48	$ (357,591.62)			MAYOR	14.62
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0.00	7.10		$ 139,987.00	$ 993,907.70	$ (993,907.70)			MAYOR	7.10
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	30.00	30.00		$ 26,588.00	$ 797,640.00	$ -			IGUAL	0.00
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	70.00	48.84		$ 20,183.00	$ 985,737.72	$ 427,072.28			MENOR	-21.16
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0.00	173.91		$ 139,987.00	$ 24,345,139.17	$ (24,345,139.17)			MAYOR	173.91
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	134.23	225.60		$ 89,260.00	$ 20,137,056.00	$ (8,155,686.20)			MAYOR	91.37
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND	0.00	22.00		$ 7,280.00	$ 160,160.00	$ (160,160.00)			MAYOR	22.00
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	60.00	30.50		$ 8,731.00	$ 266,295.50	$ 257,564.50			MENOR	-29.50
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	0.00	8.00		$ 8,731.00	$ 69,848.00	$ (69,848.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	13.35		$ 89,260.00	$ 1,191,621.00	$ (1,191,621.00)			MAYOR	13.35
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	17.70		$ 49,826.00	$ 881,920.20	$ (881,920.20)			MAYOR	17.70
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UND	0.00	9.00		$ 94,820.00	$ 853,380.00	$ (853,380.00)			MAYOR	9.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UND	0.00	4.00		$ 134,128.00	$ 536,512.00	$ (536,512.00)			MAYOR	4.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UND	0.00	7.00		$ 61,917.00	$ 433,419.00	$ (433,419.00)			MAYOR	7.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UND	0.00	10.00		$ 65,687.00	$ 656,870.00	$ (656,870.00)			MAYOR	10.00

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	19.49		$ 14,607.00	$ 284,690.43	$ (284,690.43)			MAYOR	19.49
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UND	0.00	9.00		$ 188,006.00	$ 1,692,054.00	$ (1,692,054.00)			MAYOR	9.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UND	0.00	10.00		$ 94,820.00	$ 948,200.00	$ (948,200.00)			MAYOR	10.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UND	8.00	2.00		$ 67,247.00	$ 134,494.00	$ 403,482.00			MENOR	-6.00
CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UND	0.00	2.00		$ 674,511.00	$ 1,349,022.00	$ (1,349,022.00)			MAYOR	2.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15X 0.15 M	KG	0.00	71.18		$ 7,344.00	$ 522,745.92	$ (522,745.92)			MAYOR	71.18
PLACA CONTRAPISO DE 10CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	0.00	41.93		$ 119,173.00	$ 4,996,923.89	$ (4,996,923.89)			MAYOR	41.93
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	0.00	42.83		$ 23,603.00	$ 1,010,916.49	$ (1,010,916.49)			MAYOR	42.83
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	M3	0.00	20.49		$ 178,689.00	$ 3,661,337.61	$ (3,661,337.61)			MAYOR	20.49
PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0.00	37.33		$ 40,541.00	$ 1,513,395.53	$ (1,513,395.53)			MAYOR	37.33
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	0.00	130.00		$ 101,554.00	$ 13,202,020.00	$ (13,202,020.00)			MAYOR	130.00
ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	50.00		$ 12,208.00	$ 610,400.00	$ (610,400.00)			MAYOR	50.00
RELLENOSUBBASEGRANULARTIPOINVIAS(SUMINISTRO,EXTENDIDO , NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0.00	7.51		$ 187,185.00	$ 1,405,759.35	$ (1,405,759.35)			MAYOR	7.51
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	0.00	13.66		$ 161,712.00	$ 2,208,985.92	$ (2,208,985.92)			MAYOR	13.66
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	55.18	18.00		$ 44,137.00	$ 794,466.00	$ 1,641,013.66			MENOR	-37.18
SUMINISTROEINSTALACIÓNDEMEDIACAÑAENGRANITOPULIDOBLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M2	41.56	25.00		$ 80,091.00	$ 2,002,275.00	$ 1,326,306.96			MENOR	-16.56
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	0.00	5.00		$ 851,255.00	$ 4,256,275.00	$ (4,256,275.00)			MAYOR	5.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	0.00	2.00		$ 601,133.00	$ 1,202,266.00	$ (1,202,266.00)			MAYOR	2.00
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	189.08	53.57		$ 4,127.00	$ 221,083.39	$ 559,249.77			MENOR	-135.51
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	0.00	28.97		$ 3,360.00	$ 97,339.20	$ (97,339.20)			MAYOR	28.97
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	40.00	32.00		$ 11,663.00	$ 373,216.00	$ 93,304.00			MENOR	-8.00

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y / OCIELO RASO, ANCHO <=15 CM, PROFUNDIDAD<=10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	0.00	27.50		$ 21,288.00	$ 585,420.00	$ (585,420.00)			MAYOR	27.50
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20METROS	M3	0.00	8.00		$ 33,842.00	$ 270,736.00	$ (270,736.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	0.00	35.78		$ 7,070.00	$ 252,964.60	$ (252,964.60)			MAYOR	35.78
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	55.18	19.60		$ 44,137.00	$ 865,085.20	$ 1,570,394.46			MENOR	-35.58
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADODE 1"	M2	0.00	28.00		$ 1,022,891.00	$ 28,640,948.00	$ (28,640,948.00)			MAYOR	28.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO=300A400mm)CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30mm y 40mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2)CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES-FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA YL OS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	149.68	279.93		$ 258,037.00	$ 72,232,297.41	$ (33,609,319.25)			MAYOR	130.25
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	0.00	1900.00		$ 22,456.00	$ 42,666,400.00	$ (42,666,400.00)			MAYOR	1900.00
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	149.68	279.93		$ 35,817.00	$ 10,026,252.81	$ (4,665,164.25)			MAYOR	130.25
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA A UNA DESCARGA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UN	0.00	10.00		$ 1,055,407.00	$ 10,554,070.00	$ (10,554,070.00)			MAYOR	10.00

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑOS ED, ESPESOR DE 1 CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	4.80	4.80		$ 1,099,280.00	$ 5,276,544.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	0.00	20.00	20.00	$ 175,743.00	$ 3,514,860.00	$ (3,514,860.00)			MAYOR	20.00
CIELORASOBLANCOPVCSISTEMA200GSCOLORBLANCO(INCLUYESUMINISTROEINSTALACIÓN,ACCESORIOS,INSTALACIÓNDELÁMPARA,SOPORTESETC.)ESPESOR(7MM-10MM)(INCLUYEANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	45.00	45	$ 134,767.00	$ 6,064,515.00	$ (6,064,515.00)			MAYOR	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. COMPARTIR EL RECUERDO					**$ 283,774,209.12**					
CPF	**539**	**IED**	**LOS TEJARES**			**SEMANA No. 30**					
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	30.00	26.20		$ 30,319.00	$ 794,357.80	$ 115,212.20			MENOR	-3.80
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	0.00	42.01		$ 21,734.00	$ 913,045.34	$ (913,045.34)			MAYOR	42.01
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	149.68	248.29		$ 35,817.00	$ 8,893,002.93	$ (3,531,914.37)			MAYOR	98.61
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	42.00	60.95		$ 26,101.00	$ 1,590,855.95	$ (494,613.95)			MAYOR	18.95
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	16.00	24.00		$ 7,280.00	$ 174,720.00	$ (58,240.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	20.00	3630.35		$ 22,456.00	$ 81,523,076.55	$ (81,073,956.55)			MAYOR	3610.35

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO=300A400mm)CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30mm y 40mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2)CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES-FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA YL OS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	183.38	326.90		$ 258,037.00	$ 84,352,295.30	$ (37,033,470.24)			MAYOR	143.52
MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, MASILLA, CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E=12 CM	M2	0.00	24.32		$ 164,556.00	$ 4,001,837.36	$ (4,001,837.36)			MAYOR	24.32
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M2	30.00	43.00		$ 22,722.00	$ 977,046.00	$ (295,386.00)			MAYOR	13.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120X30CM, 40W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	16.00	12.00		$ 232,000.00	$ 2,784,000.00	$ 928,000.00			MENOR	-4.00
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	0.00	54.61		$ 16,770.00	$ 915,809.70	$ (915,809.70)			MAYOR	54.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	16.00	30.00		$ 175,743.00	$ 5,272,290.00	$ (2,460,402.00)			MAYOR	14.00
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	129.47	187.68		$ 21,050.00	$ 3,950,664.00	$ (1,225,320.50)			MAYOR	58.21
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A= 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	54.61		$ 20,533.00	$ 1,121,307.13	$ (1,121,307.13)			MAYOR	54.61
PLACA EN CONCRETO 3000 PSI DE 15CM SOBRE LAMINA COLABORANTE 2"	M2	0.00	9.00		$ 238,672.00	$ 2,148,048.00	$ (2,148,048.00)			MAYOR	9.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5MM, DE 0.15X 0.15 M	KG	0.00	18.70		$ 7,344.00	$ 137,332.80	$ (137,332.80)			MAYOR	18.70
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120X30CM, 40W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	16.00	12.00		$ 232,000.00	$ 2,784,000.00	$ 928,000.00			MENOR	-4.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	12.00	15.00		$ 29,027.00	$ 435,405.00	$ (87,081.00)			MAYOR	
DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	7.20		$ 25,077.00	$ 180,554.40	$ (180,554.40)			MAYOR	

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	0.00	3.00		$ 11,663.00	$ 34,989.00	$ (34,989.00)			MAYOR	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.00	16.15		$ 69,499.00	$ 1,122,408.85	$ (1,122,408.85)			MAYOR	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	0.00	4.50		$ 151,090.00	$ 679,905.00	$ (679,905.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	0.00	11.00		$ 89,260.00	$ 981,860.00	$ (981,860.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	0.00	4.00	0	$ 39,716.00	$ 158,864.00	$ (158,864.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	0.00	9.00		$ 123,679.00	$ 1,113,111.00	$ (1,113,111.00)			MAYOR	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8.00	8.00		$ 206,316.00	$ 1,650,528.00	$ -			IGUAL	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	0.00	8.70	0	$ 238,656.00	$ 2,076,307.20	$ (2,076,307.20)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2	0.00	8.73	0	$ 192,870.00	$ 1,683,755.10	$ (1,683,755.10)			MAYOR	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0.00	22.15	0	$ 42,602.00	$ 943,634.30	$ (943,634.30)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD	M2	0.00	2.76	0	$ 161.491	$ 445.72	$ (445.72)			MAYOR	
CIELORASOBLANCOPVCSISTEMA200GSCOLORBLANCO(INCLUYESUMINISTROEINSTALACIÓN,ACCESORIOS,INSTALACIÓNDELÁMPARA,SOPORTESETC.)ESPESOR(7MM-10MM)(INCLUYEANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	12.50		$ 134,767.00	$ 1,684,587.50	$ (1,684,587.50)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE ,	UN	0.00	14.00	14	$ 205,343.00	$ 2,874,802.00	$ (2,874,802.00)			MAYOR	14.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UND	0.00	1.00		$ 558,005.00	$ 558,005.00	$ (558,005.00)			MAYOR	1.00
EMBALAJEENPOLIETILENODEBAJADENSIDADYDISPOSICIÓNFINAL DE TEJA EN ASBESTO	kg	0.00	2363.79		$ 3,276.00	$ 7,743,770.06	$ (7,743,770.06)			MAYOR	2363.79
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. LOS TEJARES					**$ 226,256,621.00**					

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
CPF	**576**	**IED**	**DIEGO MONTAÑA CUELLAR**			**SEMANA No. 30**					
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	16.32	16.66	0	$ 4,127.00	$ 68,755.82	$ (1,403.18)			MAYOR	0.34
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M2	30.00	117.20		$ 30,319.00	$ 3,553,386.80	$ (2,643,816.80)			MAYOR	87.20
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.32	2.40		$ 67,341.00	$ 161,618.40	$ 196,635.72			MENOR	-2.92
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.32	16.66		$ 31,765.00	$ 529,204.90	$ (10,800.10)			MAYOR	0.34
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34.00	18.82	0	$ 21,734.00	$ 409,033.88	$ 329,922.12			MENOR	-15.18
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	41.18	31.05	0	$ 12,327.00	$ 382,753.35	$ 124,872.51			MENOR	-10.13
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	4.06	6.84	0	$ 32,330.00	$ 221,137.20	$ (89,877.40)			MAYOR	2.78
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	8.00	10.00	0	$ 26,588.00	$ 265,880.00	$ (53,176.00)			MAYOR	2.00
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0.00	57.96		$ 42,602.00	$ 2,469,211.92	$ (2,469,211.92)			MAYOR	57.96
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.00	7.26	0	$ 69,499.00	$ 504,562.74	$ (504,562.74)			MAYOR	7.26
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	16.32	15.75	0	$ 44,137.00	$ 695,157.75	$ 25,158.09			MENOR	-0.57
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	0.00	40.59		$ 44,137.00	$ 1,791,520.83	$ (1,791,520.83)			MAYOR	40.59
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	16.32	15.80		$ 44,137.00	$ 697,364.60	$ 22,951.24			MENOR	-0.52
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	0.45	0.44		$ 1,022,891.00	$ 450,072.04	$ 10,228.91			MENOR	-0.01

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESTRUCTURA EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA FIBRO CEMENTO A UNA CARA DE 1/2" CON ESTRUCTURA . INCLUYE ARME Y DESARME DE ANDAMIOS, PARA ALTURAS MAXIMAS DE 10 METROS CON ANDAMIO CERTIFICADO, PARA ANCHOS DE HASTA 60 CM, INCLUYE ESTUCO Y PINTURA PARA EXTERIORES, PARA IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A - OCALIDAD DE USME	M	0.00	1715.00	100.00	$ 219,057.00	$ 375,682,755.00	$ (375,682,755.00)			MAYOR	1715.00
SUMINISTROEINSTALACIÓNDEMEDIACAÑAENGRANITOPULIDOBLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M2	20.60	22.41		$ 80,091.00	$ 1,794,839.31	$ (144,964.71)			MAYOR	1.81
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑOS ED, ESPESOR DE 1 CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.17	2.50		$ 1,099,280.00	$ 2,748,200.00	$ (362,762.40)			MAYOR	0.33
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	2.00	4.00		$ 418,333.00	$ 1,673,332.00	$ (836,666.00)			MAYOR	2.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	2.00		$ 752,783.00	$ 1,505,566.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADODE 1"	M2	8.28	6.34		$ 964,177.00	$ 6,112,882.18	$ 1,870,503.38			MENOR	-1.94
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5.00	5.00		$ 11,663.00	$ 58,315.00	$ -			IGUAL	0.00
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	3.00	5.00		$ 7,280.00	$ 36,400.00	$ (14,560.00)			MAYOR	2.00
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	ML	10.00	5.52		$ 57,553.00	$ 317,692.56	$ 257,837.44			MENOR	-4.48
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	40.00	21.82		$ 7,070.00	$ 154,267.40	$ 128,532.60			MENOR	-18.18
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	5.00	5.00		$ 65,687.00	$ 328,435.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	5.00	5.00		$ 61,917.00	$ 309,585.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	5.00	5.00		$ 94,820.00	$ 474,100.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	2.00		$ 123,679.00	$ 247,358.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE ,	UN	4.00	4.00		$ 205,343.00	$ 821,372.00	$ -			IGUAL	0.00

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE FLUXOMETRO, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	UN	1.00	2.00		$ 2,609,918.00	$ 5,219,836.00	$ (2,609,918.00)			MAYOR	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE MOVILIDAD REDUCIDA (NO INCLUYE ACCESORIOS)	UN	0.00	1.00		$ 1,019,900.00	$ 1,019,900.00	$ (1,019,900.00)			MAYOR	1.00
UMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN)	UN	1.00	1.00		$ 1,133,330.00	$ 1,133,330.00	$ -			IGUAL	0.00
UMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN)SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00	2.00		$ 40,084.00	$ 80,168.00	$ 80,168.00			MENOR	-2.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2.00	2.00		$ 32,716.00	$ 65,432.00	$ -			IGUAL	0.00
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	105.59	15.80		$ 29,027.00	$ 458,626.60	$ 2,606,334.33			MENOR	-89.79
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	0.00	19.50		$ 26,548.00	$ 517,686.00	$ (517,686.00)			MAYOR	19.50
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0.00	7.51		$ 187,185.00	$ 1,405,759.35	$ (1,405,759.35)			MAYOR	7.51
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	0.00	2.50		$ 7,413.00	$ 18,532.50	$ (18,532.50)			MAYOR	2.50
RAMPA EN CONCRETO	M2	0.00	5.28		$ 151,202.00	$ 798,346.56	$ (798,346.56)			MAYOR	5.28
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. DIEGO MONTAÑA CUELLAR					**$ 415,182,376.69**					
CPF	**1919**	**IED**	**ESTRELLA DEL SUR SEDE C**			**SEMANA No. 26**					
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	62.00	49.20		$ 30,319.00	$ 1,491,694.80	$ 388,083.20			MENOR	-12.80
DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	47.25	92.75		$ 112,034.00	$ 10,390,790.41	$ (5,097,183.91)			MAYOR	45.50
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.15	16.15		$ 32,330.00	$ 522,129.50	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	130.05	325.70		$ 32,330.00	$ 10,529,881.00	$ (6,325,364.50)			MAYOR	195.65

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
Suministro e instalación de portón metálico plegable con marco montante en lámina Cold rolled lisa calibre 18. Incluye bisagras, cerradura, pasador superior e inferior, doble manija interior - exterior, terminada con anticorrosivo, pintura esmalte - verificar en obra medidas, ángulos y numero de hoja, color gris o similar	M2	0.00	17.15		$ 1,078,457.00	$ 18,495,537.55	$ (18,495,537.55)			MAYOR	17.15
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS	M2	47.25	76.50		$ 393,484.64	$ 30,101,574.96	$ (11,509,425.72)			MAYOR	29.25
COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20X25 CM (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO), ESTE ITEM CORRESPONDE AL COLEGIO ESTRELLA DEL SUR SEDE C, PARA UNA CANTIDAD TOTAL DE 3 METROS	ML	0.00	5.80		$ 119,563.00	$ 693,465.40	$ (693,465.40)			MAYOR	5.80
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 20 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO, ESTE ITEM CORRESPONDE AL COLEGIO ESTRELLA DEL SUR SEDE C	ML	0.00	29.70		$ 107,977.00	$ 3,206,916.90	$ (3,206,916.90)			MAYOR	29.70
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0.00	19.92		$ 42,602.00	$ 848,631.84	$ (848,631.84)			MAYOR	19.92
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	0.00	64.56		$ 23,603.00	$ 1,523,809.68	$ (1,523,809.68)			MAYOR	64.56
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	0.00	99.20		$ 4,822.00	$ 478,342.40	$ (478,342.40)			MAYOR	99.20
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M2	0.00	15.12		$ 11,088.00	$ 167,650.56	$ (167,650.56)			MAYOR	15.12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM	0.00	920.00		$ 1,564.00	$ 1,438,880.00	$ (1,438,880.00)			MAYOR	920.00
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR SEDE C					**$ 79,889,305.00**					
CPF	**1962**		**ESTRELLA DEL SUR SEDE D**			**SEMANA No. 30**					
Suministro e instalación de portón metálico plegable con marco montante en lámina Cold rolled lisa calibre 18. Incluye bisagras, cerradura, pasador superior e inferior, doble manija interior - exterior, terminada con anticorrosivo, pintura esmalte - verificar en obra medidas, ángulos y numero de hoja, color gris o similar	M2		7.87		$ 1,078,457.00	$ 8,488,535.05	$ (8,488,535.05)				7.87
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	0.00	2538.11		$ 22,456.00	$ 56,995,805.33	$ (56,995,805.33)			MAYOR	2538.11


Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	88.90	78.34		$ 35,817.00	$ 2,805,903.78	$ 378,227.52			MENOR	-10.56
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO=300A400mm)CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30mm y 40mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2)CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES-FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA YL OS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	88.23	125.45		$ 258,037.00	$ 32,371,075.84	$ (9,604,471.33)			MAYOR	37.22
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8.00	25.00		$ 175,743.00	$ 4,393,575.00	$ (2,987,631.00)			MAYOR	17.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120X30CM,40W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00	25.00		$ 232,000.00	$ 5,800,000.00	$ (3,944,000.00)			MAYOR	17.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M2	45.00	50.00		$ 22,722.00	$ 1,136,100.00	$ (113,610.00)			MAYOR	5.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UND	0.00	1.00		$ 558,005.00	$ 558,005.00	$ (558,005.00)			MAYOR	1.00
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR SEDE D					**$ 112,549,000.00**					

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	**81.27%**
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA $	**2,922,882,438.69**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $	**3,596,376,728.07**

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Junio 07 de 2026


SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
FANNY MICKEY	$ 823,617,481.00	100.00%	$ 823,617,480.93	100.00%	$ 823,617,481.00	ENTREGADO
OFELIA URIBE	$ 276,898,268.00	100.00%	$ 233,606,642.96	84.37%	$ 276,898,268.00	-15.63%
BRISAS DEL DIAMANTE	$ 748,006,803.00	100.00%	$ 748,006,803.00	100.00%	$ 748,006,803.00	ENTREGADO
ESTRELLA DEL SUR - D	$ 112,549,000.00	100.00%	$ 112,549,000.00	100.00%	$ 112,549,000.00	ENTREGADO
LOS TEJARES - A	$ 226,256,621.00	100.00%	$ 226,256,621.00	100.00%	$ 226,256,621.00	ENTREGADO
COMPARTIR EL RDO - A	$ 207,833,643.06	45.40%	$ 283,774,209.12	61.99%	$ 457,805,803.07	16.59%
DIEGO MONTAÑA - A	$ 422,010,855.00	100.00%	$ 415,182,376.69	98.38%	$ 422,010,855.00	-1.62%
ESTRELLA DEL SUR - C	$ 79,889,305.00	100.00%	$ 79,889,305.00	100.00%	$ 79,889,305.00	ENTREGADO
ARBORIZADORA ALTA	$ 22,392,021.78	4.98%		0.00%	$ 449,342,592.00	-4.98%
TOTALES	**$ 2,919,453,997.84**	**81.18%**	**$ 2,922,882,438.69**	**81.27%**	**$ 3,596,376,728.07**	0.10%

OBSERVACIONES: De acuerdo a lo reflejado por la tabla anterior, de cuatro (4) frentes activos tres (3) registran a trasos al cierre de la presente semana. La ***IED Ofelia Uribe de Acosta*** presenta un atraso bastante elevado, el cual supera el 15%, luego tenemos a la ***IED Arbotizadora Alta*** , frente que inició recientemente, con un atraso cercano al 5% y por ultimo ***Diego Montaña*** con atraso del 1.62%. El contrato en general presenta un leve adelanto del 0.10% con relación a lo programado para esta fecha.

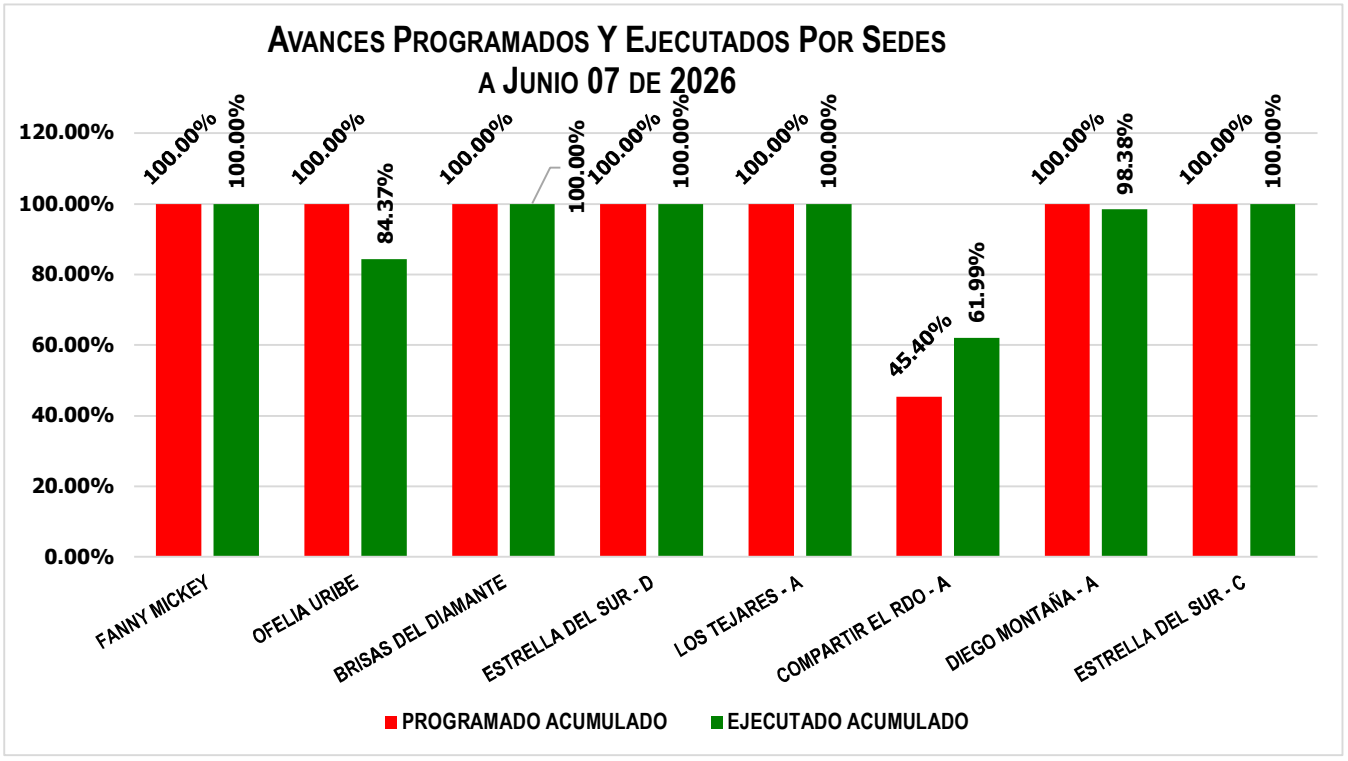



AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Jun. 07 2026

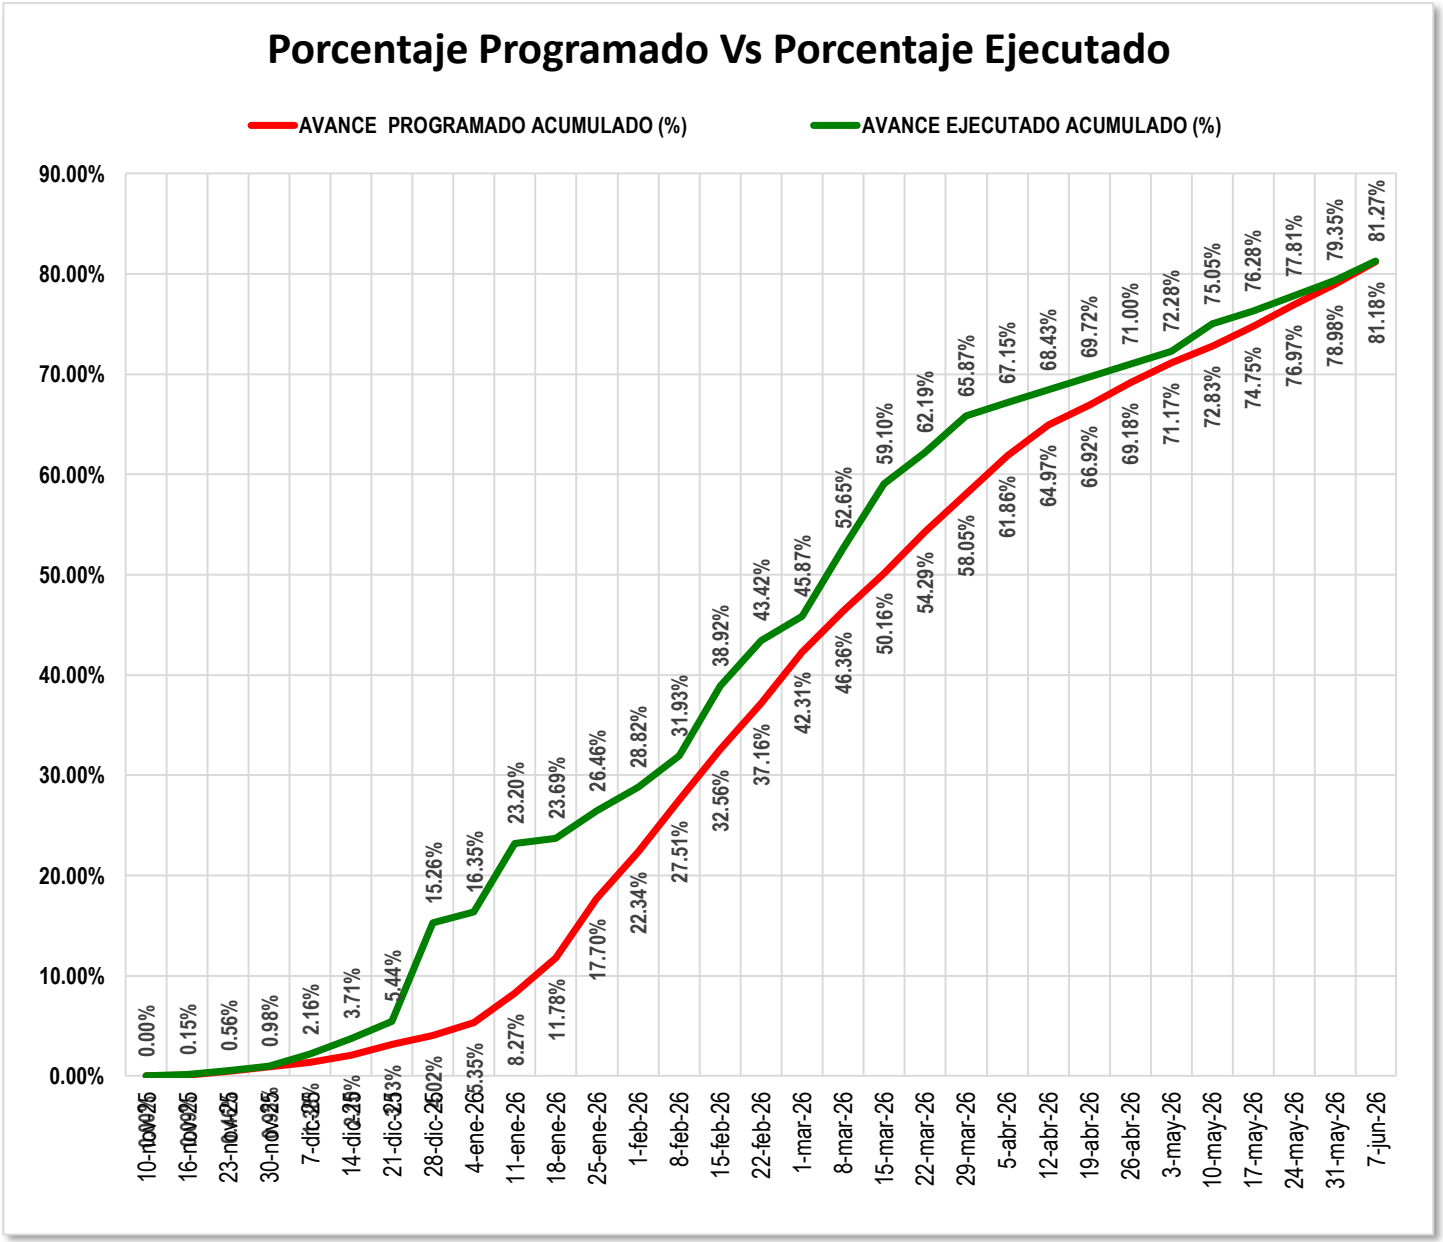

FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0,00%	0,00%
16-nov-25	0,09%	0,15%
23-nov-25	0,46%	0,56%
30-nov-25	0,95%	0,98%
7-dic-25	1,38%	2,16%
14-dic-25	2,10%	3,71%
21-dic-25	3,13%	5,44%
28-dic-25	4,02%	15,26%
4-ene-26	5,35%	16,35%
11-ene-26	8,27%	23,20%
18-ene-26	11,78%	23,69%
25-ene-26	17,70%	26,46%
1-feb-26	22,34%	28,82%
8-feb-26	27,51%	31,93%
15-feb-26	32,56%	38,92%
22-feb-26	37,16%	43,42%
1-mar-26	42,31%	45,87%
8-mar-26	46,36%	52,65%
15-mar-26	50,16%	59,10%
22-mar-26	54,29%	62,19%
29-mar-26	58,05%	65,87%
5-abr-26	61,86%	67,15%
12-abr-26	64,97%	68,43%
19-abr-26	66,92%	69,72%
26-abr-26	69,18%	71,00%
3-may-26	71,17%	72,28%
10-may-26	72,83%	75,05%
17-may-26	74,75%	76,28%
24-may-26	76,97%	77,81%
31-may-26	78,98%	79,35%
7-jun-26	**81,18%**	**81,27%**
14-jun-26	82,90%	
21-jun-26	84,61%	
28-jun-26	85,99%	
5-jul-26	87,31%	
12-jul-26	87,96%	
19-jul-26	88,51%	
26-jul-26	89,09%	

ANEXO 5. ACTA DE COBRO PARCIAL DE OBRA No. 5

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 5

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 DE ABRIL DE 2026 AL 05 DE JUNIO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155135 DE 2025

CONTRATISTA :	CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025	**OBJETO:**	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" - LOTE - 4				
DIRECCION :	TRANSVERSAL 21 BIS # 59-57						
C.C. ó NIT :	901.973.186-4	**ESTABLECIMIENTOS :**	LOTE 4		**PLAZO INICIAL**	:	7 MESES
TELEFONO :	3112887795	**LOCALIZACION :**	ZONA 4 SUR		**FECHA INICIACION**	:	06 DE OCTUBRE DE 2025
INTERVENTOR :	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	**VR. INICIAL :**	$ 2.703.337.443,00		**FECHA TERMINAC.INICIAL**	:	05 DE MAYO DE 2026
DIRECCION :	TRANSVERSAL 52 B # 2-23 AP202	**ANTICIPO**			**PLAZO ADICIONAL(MODF.CONT**	:	4 MESES Y 27 DIAS
C.C. ó NIT :	901.977.271-0	**VR. ADICIONAL :**	$ 1.342.467.488,00		**TIEMPO SUSPENDIDO**	:	N/A
TELEFONO :	3142190224	**VR. FINAL :**	$ 4.045.804.931,00		**PLAZO TOTAL**	:	11 MESES Y 27 DÍAS
					FECHA FINAL	:	01 DE OCTUBRE DE 2026

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
1642	21-feb-25	4985	5-sep-25	$ 2.703.337.443,00	$ 295.249.527,00	$ 295.249.527,00	
3694	5-dic-25	7553	18-dic-25	$ 479.467.488,00	$ 479.467.488,00	$ 469.030.396,00	$ 10.437.092,00
512	12-mar-26	3198	27-may-26	$ 863.000.000,00	$ 863.000.000,00		$ 863.000.000,00
TOTAL				**$ 4.045.804.931,00**	**$ 1.637.717.015,00**	**$ 764.279.923,00**	**$ 873.437.092,00**

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 764.279.923,00** SON: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE.

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
I	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" - LOTE 4	GL	1,00	$ 2.703.337.443,00	$ 2.703.337.443,00							
	COLEGIO CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE SEDE A											
1	**PRELIMINARES**											
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 17.585,00				1.963,82	$ 34.533.774,70	1.963,82	$ 34.533.774,70	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
16.1.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2		$ 352.164,00				1.605,59	$ 565.430.996,76	1.605,59	$ 565.430.996,76	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.545,00		1.605,59	$ 7.297.406,55			1.605,59	$ 7.297.406,55	
	COLEGIO FANNY MICKEY SEDE A											
1	**PRELIMINARES**											
1,1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 30.319,00				299,51	$ 9.080.843,69	299,51	$ 9.080.843,69	
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											
1.2.5	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0,15M A 0,20 M EXISTENTE EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 107.321,00				283,56	$ 30.431.942,76	283,56	$ 30.431.942,76	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 31.765,00				725,46	$ 23.044.236,90	725,46	$ 23.044.236,90	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 28.441,00				386,00	$ 10.978.226,00	386,00	$ 10.978.226,00	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) CERTIFICADOS)	M2		$ 12.327,00				2,88	$ 35.501,76	2,88	$ 35.501,76	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 26.588,00				84,00	$ 2.233.392,00	84,00	$ 2.233.392,00	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 17.585,00				303,45	$ 5.336.168,25	303,45	$ 5.336.168,25	

1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 8.731,00				9,00	$ 78.579,00	9,00	$ 78.579,00	
1,4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M		$ 21.288,00				9,00	$ 191.592,00	9,00	$ 191.592,00	
1.4.3	DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M		$ 4.436,00				314,60	$ 1.395.565,60	314,60	$ 1.395.565,60	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 33.842,00				259,18	$ 8.771.169,56	259,18	$ 8.771.169,56	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2,2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2		$ 161.712,00				283,56	$ 45.855.054,72	283,56	$ 45.855.054,72	
2,4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7.344,00				1.573,68	$ 11.557.105,92	1.573,68	$ 11.557.105,92	
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4,3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**											
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 27.261,00				7,76	$ 211.545,36	7,76	$ 211.545,36	
4.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/4 "	UN		$ 13.976,00				40,00	$ 559.040,00	40,00	$ 559.040,00	
4.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 15.333,00				0,88	$ 13.493,04	0,88	$ 13.493,04	
4.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 3/4'	UN		$ 6.383,00				4,00	$ 25.532,00	4,00	$ 25.532,00	
4,6	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN		$ 84.122,00				1,00	$ 84.122,00	1,00	$ 84.122,00	
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
7,1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 25.975,00				109,84	$ 2.853.094,00	109,84	$ 2.853.094,00	
7,2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M		$ 25.116,00				314,60	$ 7.901.493,60	314,60	$ 7.901.493,60	
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2		$ 113.205,00				2,88	$ 326.030,40	2,88	$ 326.030,40	
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
10.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN		$ 800.038,00				16,00	$ 12.800.608,00	16,00	$ 12.800.608,00	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN		$ 851.255,00				7,00	$ 5.958.785,00	7,00	$ 5.958.785,00	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN		$ 601.133,00				3,00	$ 1.803.399,00	3,00	$ 1.803.399,00	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN		$ 752.783,00				3,00	$ 2.258.349,00	3,00	$ 2.258.349,00	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN		$ 418.333,00				27,00	$ 11.294.991,00	27,00	$ 11.294.991,00	
10.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL LÍNEA INFANTIL	UN		$ 358.984,00				4,00	$ 1.435.936,00	4,00	$ 1.435.936,00	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN		$ 40.084,00				1,00	$ 40.084,00	1,00	$ 40.084,00	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 32.716,00				10,00	$ 327.160,00	10,00	$ 327.160,00	
10.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA TASA SANITARIO REF: CORONA O SIMILAR	UN		$ 713.949,00				7,00	$ 4.997.643,00	7,00	$ 4.997.643,00	
10.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA ADRIATICA, INCLUYE ASIENTO SANITARIO ENTRADA SUPERIOR PARA FLUXOMETRO DE CORONA O SIMILAR	UN		$ 1.487.960,00				17,00	$ 25.295.320,00	17,00	$ 25.295.320,00	
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 23.603,00				333,88	$ 7.880.569,64	333,88	$ 7.880.569,64	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
16.1.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2		$ 352.164,00				1.294,72	$ 455.953.774,08	1.294,72	$ 455.953.774,08	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M		$ 297.746,00				8,50	$ 2.530.841,00	8,50	$ 2.530.841,00	

16.1.25	AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE	M2		$ 110.795,00				725,46	$ 80.377.340,70	725,46	$ 80.377.340,70	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.545,00				1.294,72	$ 5.884.502,40	1.294,72	$ 5.884.502,40	
	COLEGIO COMPARTIR RECUERDO SEDE A											
1	**PRELIMINARES**											
1,1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4.127,00				53,57	$ 221.083,39	53,57	$ 221.083,39	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M		$ 30.319,00				47,50	$ 1.440.152,50	47,50	$ 1.440.152,50	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 3.360,00				28,97	$ 97.339,20	28,97	$ 97.339,20	
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 67.341,00				19,60	$ 1.319.883,60	19,60	$ 1.319.883,60	
1.2.7	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 110.911,00				30,34	$ 3.365.039,74	30,34	$ 3.365.039,74	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 31.765,00				55,60	$ 1.766.134,00	55,60	$ 1.766.134,00	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 21.734,00	17,65	$ 383.605,10		55,90	$ 1.214.930,60	73,55	$ 1.598.535,70	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 11.088,00	1,05	$ 11.642,40				1,05	$ 11.642,40	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 12.327,00	1,62	$ 19.969,74		108,20	$ 1.333.781,40	109,82	$ 1.353.751,14	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32.330,00				19,29	$ 623.645,70	19,29	$ 623.645,70	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 28.644,00				30,00	$ 859.320,00	30,00	$ 859.320,00	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 26.588,00				30,00	$ 797.640,00	30,00	$ 797.640,00	
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 20.183,00				70,00	$ 1.412.810,00	70,00	$ 1.412.810,00	
1.2.22	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 160.024,00				4,00	$ 640.096,00	4,00	$ 640.096,00	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 35.817,00	161,58	$ 5.787.310,86		70,12	$ 2.511.488,04	231,70	$ 8.298.798,90	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 31.741,00				225,60	$ 7.160.769,60	225,60	$ 7.160.769,60	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 11.663,00				32,00	$ 373.216,00	32,00	$ 373.216,00	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 7.280,00				22,00	$ 160.160,00	22,00	$ 160.160,00	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 17.585,00	34,19	$ 601.231,15		64,69	$ 1.137.573,65	98,88	$ 1.738.804,80	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 8.731,00	56,50	$ 493.301,50		60,00	$ 523.860,00	116,50	$ 1.017.161,50	
1,4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M		$ 21.288,00	12,00	$ 255.456,00		61,53	$ 1.309.850,64	73,53	$ 1.565.306,64	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 33.842,00				16,00	$ 541.472,00	16,00	$ 541.472,00	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2,1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 139.987,00	6,06	$ 848.321,22		5,88	$ 823.123,56	11,94	$ 1.671.444,78	

2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 187.185,00		1,00	$ 187.185,00	21,54	$ 4.031.964,90	22,54	$ 4.219.149,90	
2.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	M3		$ 172.104,00				39,98	$ 6.880.717,92	39,98	$ 6.880.717,92	
2,2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 119.173,00				19,60	$ 2.335.790,80	19,60	$ 2.335.790,80	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2		$ 161.712,00		1,83	$ 295.932,96	28,47	$ 4.603.940,64	30,30	$ 4.899.873,60	
2,4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.070,00		0,01	$ 70,70	71,56	$ 505.929,20	71,57	$ 505.999,90	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7.344,00		3,78	$ 27.760,32	99,76	$ 732.637,44	103,54	$ 760.397,76	
2,5	**ESTRUCTURA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.456,00		3.633,25	$ 81.588.262,00	639,08	$ 14.351.180,48	4.272,33	$ 95.939.442,48	
3,1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2		$ 151.090,00				1,00	$ 151.090,00	1,00	$ 151.090,00	
3,3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1.564,00		1.780,00	$ 2.783.920,00	720,00	$ 1.126.080,00	2.500,00	$ 3.910.000,00	
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4,2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 89.260,00				17,00	$ 1.517.420,00	17,00	$ 1.517.420,00	
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN		$ 39.716,00				31,00	$ 1.231.196,00	31,00	$ 1.231.196,00	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 49.826,00				12,50	$ 622.825,00	12,50	$ 622.825,00	
4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	UN		$ 21.473,00				7,00	$ 150.311,00	7,00	$ 150.311,00	
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN		$ 134.128,00				6,00	$ 804.768,00	6,00	$ 804.768,00	
4,3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS**											
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN		$ 18.390,00				3,00	$ 55.170,00	3,00	$ 55.170,00	
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 20.829,00		9,30	$ 193.709,70			9,30	$ 193.709,70	
4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1"	UN		$ 8.843,00		12,00	$ 106.116,00	5,00	$ 44.215,00	17,00	$ 150.331,00	
4.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 3/4'	M		$ 15.333,00		20,00	$ 306.660,00			20,00	$ 306.660,00	
4.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	UN		$ 6.383,00		36,00	$ 229.788,00			36,00	$ 229.788,00	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 14.607,00		15,50	$ 226.408,50	42,99	$ 627.954,93	58,49	$ 854.363,43	
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN		$ 4.870,00		27,00	$ 131.490,00	14,00	$ 68.180,00	41,00	$ 199.670,00	
4,5	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN		$ 65.687,00				15,00	$ 985.305,00	15,00	$ 985.305,00	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 61.917,00				20,00	$ 1.238.340,00	20,00	$ 1.238.340,00	
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN		$ 188.006,00				15,00	$ 2.820.090,00	15,00	$ 2.820.090,00	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN		$ 94.820,00				21,00	$ 1.991.220,00	21,00	$ 1.991.220,00	
4,6	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN		$ 119.504,00		4,00	$ 478.016,00			4,00	$ 478.016,00	
4.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN		$ 84.122,00		4,00	$ 336.488,00			4,00	$ 336.488,00	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN		$ 67.247,00		4,00	$ 268.988,00	4,00	$ 268.988,00	8,00	$ 537.976,00	
4,7	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.7.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 674.511,00				2,00	$ 1.349.022,00	2,00	$ 1.349.022,00	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 123.679,00		2,00	$ 247.358,00	3,00	$ 371.037,00	5,00	$ 618.395,00	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 206.316,00		1,00	$ 206.316,00			1,00	$ 206.316,00	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 205.343,00		4,00	$ 821.372,00	3,00	$ 616.029,00	7,00	$ 1.437.401,00	
7,1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
7,1,2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2		$ 44.137,00				55,60	$ 2.454.017,20	55,60	$ 2.454.017,20	

7.2.1	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2		$ 205.180,00				55,60	$ 11.408.008,00	55,60	$ 11.408.008,00		
7.2.8	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M		$ 64.127,00		2,00	$ 128.254,00	1,00	$ 64.127,00	3,00	$ 192.381,00		
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M		$ 15.895,00				31,42	$ 499.420,90	31,42	$ 499.420,90		
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M		$ 80.091,00				66,90	$ 5.358.087,90	66,90	$ 5.358.087,90		
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2		$ 101.554,00		1,05	$ 106.631,70	117,87	$ 11.970.169,98	118,92	$ 12.076.801,68		
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN		$ 851.255,00				5,00	$ 4.256.275,00	5,00	$ 4.256.275,00		
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN		$ 601.133,00				2,00	$ 1.202.266,00	2,00	$ 1.202.266,00		
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN		$ 752.783,00		2,00	$ 1.505.566,00			2,00	$ 1.505.566,00		
10.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M		$ 1.166.566,00				7,30	$ 8.515.931,80	7,30	$ 8.515.931,80		
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN		$ 418.333,00				14,00	$ 5.856.662,00	14,00	$ 5.856.662,00		
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN		$ 40.084,00		4,00	$ 160.336,00	6,00	$ 240.504,00	10,00	$ 400.840,00		
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 32.716,00				11,00	$ 359.876,00	11,00	$ 359.876,00		
11	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE ...	M2		$ 964.177,00		28,99	$ 27.951.491,23	12,23	$ 11.791.884,71	41,22	$ 39.743.375,94		
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2		$ 1.022.891,00		1,56	$ 1.595.709,96	0,60	$ 613.734,60	2,16	$ 2.209.444,56		
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 42.602,00		1,05	$ 44.732,10	173,91	$ 7.408.913,82	174,96	$ 7.453.645,92		
12.1.3	PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 40.541,00				55,51	$ 2.250.430,91	55,51	$ 2.250.430,91		
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 12.208,00				246,13	$ 3.004.755,04	246,13	$ 3.004.755,04		
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M		$ 9.170,00				104,78	$ 960.832,60	104,78	$ 960.832,60		
12.1.8	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 33.940,00		56,90	$ 1.931.186,00			56,90	$ 1.931.186,00		
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 23.603,00				104,78	$ 2.473.122,34	104,78	$ 2.473.122,34		
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 31.211,00		78,13	$ 2.438.515,43	57,31	$ 1.788.702,41	135,44	$ 4.227.217,84		
13	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 134.767,00		135,58	$ 18.271.709,86			135,58	$ 18.271.709,86		
14	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2		$ 120.125,00		7,39	$ 887.723,75			7,39	$ 887.723,75		
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 103.564,00		60,20	$ 6.234.552,80			60,20	$ 6.234.552,80		
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON	M2		$ 258.037,00		199,98	$ 51.602.239,26	31,72	$ 8.184.933,64	231,70	$ 59.787.172,90		
16.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M		$ 133.042,00		23,40	$ 3.113.182,80			23,40	$ 3.113.182,80		
16.1.25	AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE	M2		$ 110.795,00				64,69	$ 7.167.328,55	64,69	$ 7.167.328,55		
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.545,00		91,60	$ 416.322,00			91,60	$ 416.322,00		
18,1,4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2		$ 7.419,00		100,00	$ 741.900,00			100,00	$ 741.900,00		
	COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA												
1,1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 30.319,00				105,46	$ 3.197.441,74	105,46	$ 3.197.441,74		
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**												
1.2.4	DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE. CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 80.010,00				0,56	$ 44.805,60	0,56	$ 44.805,60		
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 31.765,00				370,28	$ 11.761.944,20	370,28	$ 11.761.944,20		
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 11.088,00				172,35	$ 1.911.016,80	172,35	$ 1.911.016,80		
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y	M2		$ 35.817,00				12,80	$ 458.457,60	12,80	$ 458.457,60		
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 7.280,00				45,00	$ 327.600,00	45,00	$ 327.600,00		

1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	17.585,00				394,25	$	6.932.886,25	394,25	$	6.932.886,25	
1,4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**														
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$	33.842,00		98,35	$	3.328.360,70			98,35	$	3.328.360,70	
2,2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**														
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M2		$	625.445,00					0,15	$	93.816,75	0,15	$	93.816,75	
2,3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**														
2.3.8	PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN		$	172.614,00					15,00	$	2.589.210,00	15,00	$	2.589.210,00	
4,2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**														
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$	89.260,00					44,92	$	4.009.559,20	44,92	$	4.009.559,20	
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN		$	39.716,00					15,00	$	595.740,00	15,00	$	595.740,00	
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$	81.396,00					1,10	$	89.535,60	1,10	$	89.535,60	
4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN		$	29.271,00					2,00	$	58.542,00	2,00	$	58.542,00	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**														
5.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$	14.830,00					8,00	$	118.640,00	8,00	$	118.640,00	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M		$	15.661,00					8,00	$	125.288,00	8,00	$	125.288,00	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$	205.343,00					30,00	$	6.160.290,00	30,00	$	6.160.290,00	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100- 240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN		$	61.735,00					15,00	$	926.025,00	15,00	$	926.025,00	
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**														
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$	12.208,00					172,35	$	2.104.048,80	172,35	$	2.104.048,80	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$	23.603,00					256,65	$	6.057.709,95	256,65	$	6.057.709,95	
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**														
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$	29.027,00		23,87	$	692.874,49	414,92	$	12.043.882,84	438,79	$	12.736.757,33	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$	20.542,00					47,17	$	968.966,14	47,17	$	968.966,14	
12.2.6	PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$	20.542,00					414,92	$	8.523.286,64	414,92	$	8.523.286,64	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**														
16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M		$	37.712,00		37,19	$	1.402.509,28				37,19	$	1.402.509,28	
16.1.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M		$	24.624,00		35,06	$	863.317,44				35,06	$	863.317,44	
16.1.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2		$	352.164,00		399,05	$	140.531.044,20				399,05	$	140.531.044,20	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M		$	297.746,00					16,00	$	4.763.936,00	16,00	$	4.763.936,00	
16.1.25	AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE	M2		$	110.795,00					370,28	$	41.025.172,60	370,28	$	41.025.172,60	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**														
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$	4.545,00		929,27	$	4.223.532,15				929,27	$	4.223.532,15	
	COLEGIO LOS TEJARES														
1	**PRELIMINARES**														
1,1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**														
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$	4.127,00		259,59	$	1.071.327,93				259,59	$	1.071.327,93	

1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 30.319,00		3,88	$ 117.637,72	26,20	$ 794.357,80	30,08	$ 911.995,52		
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**												
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 67.341,00		0,45	$ 30.303,45			0,45	$ 30.303,45		
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 21.734,00				42,01	$ 913.045,34	42,01	$ 913.045,34		
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 20.183,00		1,00	$ 20.183,00			1,00	$ 20.183,00		
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 26.101,00				60,95	$ 1.590.855,95	60,95	$ 1.590.855,95		
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 35.817,00				248,29	$ 8.893.002,93	248,29	$ 8.893.002,93		
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 31.741,00		4,50	$ 142.834,50			4,50	$ 142.834,50		
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 25.077,00				7,20	$ 180.554,40	7,20	$ 180.554,40		
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 11.663,00		5,00	$ 58.315,00	3,00	$ 34.989,00	8,00	$ 93.304,00		
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 7.280,00		1,00	$ 7.280,00	24,00	$ 174.720,00	25,00	$ 182.000,00		
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 4.279,00		5,00	$ 21.395,00			5,00	$ 21.395,00		
1,3	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.3.2	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2		$ 157.471,00		2,10	$ 330.689,10			2,10	$ 330.689,10		
2,2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)			$ 161.712,00		0,45	$ 72.770,40			0,45	$ 72.770,40		
2.2.15	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI DE 15 CM SOBRE LAMINA COLABORANTE 2"	M2		$ 238.672,00				9,00	$ 2.148.048,00	9,00	$ 2.148.048,00		
2.3.8	PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M			$ 172.614,00		2,00	$ 345.228,00			2,00	$ 345.228,00		
2,4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7.344,00				18,70	$ 137.332,80	18,70	$ 137.332,80		
2,5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.456,00		587,86	$ 13.200.984,16	3.080,43	$ 69.174.136,08	3.668,29	$ 82.375.120,24		
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
3.1.1.	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2		$ 69.499,00				16,15	$ 1.122.408,85	16,15	$ 1.122.408,85		
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2		$ 151.090,00				4,50	$ 679.905,00	4,50	$ 679.905,00		
3.1.7	PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREA DE CULATAS (HASTA 30 CM). INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M		$ 14.918,00		59,20	$ 883.145,60			59,20	$ 883.145,60		
3,3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1.564,00		1.440,00	$ 2.252.160,00			1.440,00	$ 2.252.160,00		
4,2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML		$ 89.260,00				7,00	$ 624.820,00	7,00	$ 624.820,00		
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN		$ 39.716,00				4,00	$ 158.864,00	4,00	$ 158.864,00		

4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	ML		$ 81.396,00		14,76	$ 1.201.404,96			14,76	$ 1.201.404,96	
4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN		$ 29.271,00		10,00	$ 292.710,00			10,00	$ 292.710,00	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE Nº12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 123.679,00				5,00	$ 618.395,00	5,00	$ 618.395,00	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 206.316,00		7,00	$ 1.444.212,00	4,00	$ 825.264,00	11,00	$ 2.269.476,00	
5.1.7	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 262.326,00		1,00	$ 262.326,00			1,00	$ 262.326,00	
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$ 558.005,00		1,00	$ 558.005,00			1,00	$ 558.005,00	
5.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 2X20A 10 KA	UN		$ 84.754,00		2,00	$ 169.508,00			2,00	$ 169.508,00	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 22.722,00		56,00	$ 1.272.432,00			56,00	$ 1.272.432,00	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M		$ 15.661,00		63,50	$ 994.473,50			63,50	$ 994.473,50	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 175.743,00		12,00	$ 2.108.916,00	16,00	$ 2.811.888,00	28,00	$ 4.920.804,00	
5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 232.000,00				12,00	$ 2.784.000,00	12,00	$ 2.784.000,00	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 205.343,00		10,00	$ 2.053.430,00			10,00	$ 2.053.430,00	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100- 240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN		$ 61.735,00		2,00	$ 123.470,00	4,00	$ 246.940,00	6,00	$ 370.410,00	
5.1.45	REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS EXISTENTES	UN		$ 34.783,00		2,00	$ 69.566,00			2,00	$ 69.566,00	
7,2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
7.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2		$ 238.656,00				8,70	$ 2.076.307,20	8,70	$ 2.076.307,20	
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
8.1.5	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2		$ 164.556,00				24,32	$ 4.002.001,92	24,32	$ 4.002.001,92	
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2		$ 192.870,00				8,73	$ 1.683.755,10	8,73	$ 1.683.755,10	
9,1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
9.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA CÁRCAMO DE 30 CM DE ANCHO EN ÁNGULO DE 2"X3/16 Y CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE 1-1/2" X 3/16" CON 20 MM DE DILATACIÓN	M2		$ 323.856,00		1,35	$ 437.205,60			1,35	$ 437.205,60	
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
12,1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 42.602,00				22,15	$ 943.634,30	22,15	$ 943.634,30	
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 21.050,00		151,36	$ 3.186.128,00	187,68	$ 3.950.664,00	339,04	$ 7.136.792,00	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 16.770,00				83,48	$ 1.399.959,60	83,48	$ 1.399.959,60	

12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.533,00					54,61	$ 1.121.307,13		54,61	$ 1.121.307,13	
12,3	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 9.479,00		13,40	$ 127.018,60				13,40	$ 127.018,60	
14	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
14.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD	M2		$ 161.491,00					2,76	$ 445.715,16		2,76	$ 445.715,16	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 103.564,00		36,91	$ 3.822.547,24					36,91	$ 3.822.547,24	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS	M2		$ 258.037,00		19,88	$ 5.129.775,56	240,11	$ 61.957.264,07		259,99	$ 67.087.039,63	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M		$ 297.746,00		29,05	$ 8.649.521,30				29,05	$ 8.649.521,30	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.545,00		259,99	$ 1.181.654,55					259,99	$ 1.181.654,55	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG		$ 3.276,00		3.270,00	$ 10.712.520,00					3.270,00	$ 10.712.520,00	
	COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A													
1	**PRELIMINARES**													
1,1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4.127,00					16,66	$ 68.755,82		16,66	$ 68.755,82	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 30.319,00		74,70	$ 2.264.829,30	75,30	$ 2.283.020,70		150,00	$ 4.547.850,00	
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**													
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 67.341,00		5,67	$ 381.823,47	2,40	$ 161.618,40		8,07	$ 543.441,87	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 31.765,00				16,66	$ 529.204,90		16,66	$ 529.204,90	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 21.734,00				18,82	$ 409.033,88		18,82	$ 409.033,88	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 12.327,00				31,05	$ 382.753,35		31,05	$ 382.753,35	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32.330,00				6,84	$ 221.137,20		6,84	$ 221.137,20	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 26.588,00				10,00	$ 265.880,00		10,00	$ 265.880,00	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 11.663,00				5,00	$ 58.315,00		5,00	$ 58.315,00	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 7.280,00				5,00	$ 36.400,00		5,00	$ 36.400,00	
1,4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 33.842,00		50,00	$ 1.692.100,00				50,00	$ 1.692.100,00	
2,1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 187.185,00		2,95	$ 552.195,75				2,95	$ 552.195,75	
2,2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M		$ 57.553,00				5,52	$ 317.692,56		5,52	$ 317.692,56	
2,4	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.070,00				21,82	$ 154.267,40		21,82	$ 154.267,40	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7.344,00		8,29	$ 60.881,76				8,29	$ 60.881,76	
3,1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2		$ 69.499,00				7,26	$ 504.562,74		7,26	$ 504.562,74	
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2		$ 27.466,00		1,20	$ 32.959,20				1,20	$ 32.959,20	

4,2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN		$ 134.128,00		2,00	$ 268.256,00				2,00	$ 268.256,00		
4,5	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN		$ 65.687,00				5,00	$ 328.435,00		5,00	$ 328.435,00		
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 61.917,00				5,00	$ 309.585,00		5,00	$ 309.585,00		
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN		$ 94.820,00				7,00	$ 663.740,00		7,00	$ 663.740,00		
4,6	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN		$ 67.247,00		5,00	$ 336.235,00				5,00	$ 336.235,00		
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA. CONECTORES. SOPORTES. ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 123.679,00				2,00	$ 247.358,00		2,00	$ 247.358,00		
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 206.316,00		1,00	$ 206.316,00				1,00	$ 206.316,00		
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 205.343,00				4,00	$ 821.372,00		4,00	$ 821.372,00		
7,2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2		$ 205.180,00				15,80	$ 3.241.844,00		15,80	$ 3.241.844,00		
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M		$ 80.091,00				22,41	$ 1.794.839,31		22,41	$ 1.794.839,31		
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2		$ 101.554,00				40,59	$ 4.122.076,86		40,59	$ 4.122.076,86		
7,1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2		$ 44.137,00				15,75	$ 695.157,75		15,75	$ 695.157,75		
9,1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
9.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PERSIANA METALICA SIN MARCO EN LAMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS	M2		$ 955.155,00		2,10	$ 2.005.825,50				2,10	$ 2.005.825,50		
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN		$ 752.783,00				2,00	$ 1.505.566,00		2,00	$ 1.505.566,00		
10.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE FLUXOMETRO, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	UN		$ 2.609.918,00				2,00	$ 5.219.836,00		2,00	$ 5.219.836,00		
10.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE MOVILIDAD REDUCIDA (NO INCLUYE ACCESORIOS)	UN		$ 1.019.900,00				1,00	$ 1.019.900,00		1,00	$ 1.019.900,00		
10.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN)	UN		$ 1.133.330,00				1,00	$ 1.133.330,00		1,00	$ 1.133.330,00		
10.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M		$ 1.166.566,00				2,50	$ 2.916.415,00		2,50	$ 2.916.415,00		
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN		$ 418.333,00				4,00	$ 1.673.332,00		4,00	$ 1.673.332,00		
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN		$ 40.084,00				2,00	$ 80.168,00		2,00	$ 80.168,00		
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 32.716,00				2,00	$ 65.432,00		2,00	$ 65.432,00		
10.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	UN		$ 721.458,00		1,00	$ 721.458,00				1,00	$ 721.458,00		
11	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 4"	M2		$ 964.177,00				6,34	$ 6.112.882,18		6,34	$ 6.112.882,18		
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2		$ 1.022.891,00				0,44	$ 450.072,04		0,44	$ 450.072,04		
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 42.602,00				57,96	$ 2.469.211,92		57,96	$ 2.469.211,92		
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 29.027,00		117,16	$ 3.400.803,32	15,80	$ 458.626,60		132,96	$ 3.859.429,92		
12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M		$ 26.548,00				19,50	$ 517.686,00		19,50	$ 517.686,00		
14	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2		$ 120.125,00		2,40	$ 288.300,00				2,40	$ 288.300,00		
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.545,00		917,31	$ 4.169.173,95				917,31	$ 4.169.173,95		
18.1.4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2		$ 7.413,00		484,98	$ 3.595.156,74	324,17	$ 2.403.072,21		809,15	$ 5.998.228,95		
	COLEGIO ESTRELLA DEL SUR SEDE D													
1,1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													

1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4.127,00				100,72	$ 415.671,44	100,72	$ 415.671,44	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 30.319,00	9,50	$ 288.030,50	11,20	$ 339.572,80	20,70	$ 627.603,30	
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											
1.217	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 26.101,00			39,00	$ 1.017.939,00	39,00	$ 1.017.939,00	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32.330,00			7,24	$ 234.069,20	7,24	$ 234.069,20	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 28.644,00	88,57	$ 2.536.999,08			88,57	$ 2.536.999,08	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 35.817,00	2,10	$ 75.215,70	92,80	$ 3.323.817,60	94,90	$ 3.399.033,30	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 7.280,00	2,00	$ 14.560,00			2,00	$ 14.560,00	
1,4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 33.842,00	12,00	$ 406.104,00			12,00	$ 406.104,00	
2,3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.3.7	PERFORACIÓN NÚCLEO 3" E= 0.10 M	UN		$ 159.935,00	2,00	$ 319.870,00	4,00	$ 639.740,00	6,00	$ 959.610,00	
2,5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.456,00			2.159,11	$ 48.484.974,16	2.159,11	$ 48.484.974,16	
3,3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1.564,00	1.080,00	$ 1.689.120,00			1.080,00	$ 1.689.120,00	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 123.679,00	4,00	$ 494.716,00			4,00	$ 494.716,00	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 206.316,00	2,00	$ 412.632,00			2,00	$ 412.632,00	
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$ 558.005,00	1,00	$ 558.005,00			1,00	$ 558.005,00	
5.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA	UN		$ 30.295,00	3,00	$ 90.885,00			3,00	$ 90.885,00	
5.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M		$ 14.830,00	37,80	$ 560.574,00			37,80	$ 560.574,00	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M		$ 15.661,00	42,20	$ 660.894,20			42,20	$ 660.894,20	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 175.743,00	9,00	$ 1.581.687,00			9,00	$ 1.581.687,00	
5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 232.000,00	9,00	$ 2.088.000,00			9,00	$ 2.088.000,00	
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
8.1.5	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2		$ 164.556,00	26,86	$ 4.419.974,16			26,86	$ 4.419.974,16	
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 23.603,00	53,80	$ 1.269.841,40			53,80	$ 1.269.841,40	
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 21.050,00	56,80	$ 1.195.640,00			56,80	$ 1.195.640,00	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 16.770,00	29,80	$ 499.746,00			29,80	$ 499.746,00	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.533,00	40,10	$ 823.373,30			40,10	$ 823.373,30	

12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2		$ 29.376,00		82,78	$ 2.431.745,28			82,78	$ 2.431.745,28	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 103.564,00		11,65	$ 1.206.520,60			11,65	$ 1.206.520,60	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 258.037,00		102,38	$ 26.417.828,06			102,38	$ 26.417.828,06	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.545,00		102,38	$ 465.317,10			102,38	$ 465.317,10	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG		$ 3.276,00		2.000,00	$ 6.552.000,00			2.000,00	$ 6.552.000,00	
	COLEGIO ESTRELLA DEL SUR SEDE C												
1,1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 30.319,00				99,20	$ 3.007.644,80	99,20	$ 3.007.644,80	
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**												
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 11.088,00				15,12	$ 167.650,56	15,12	$ 167.650,56	
1.2.16	DEMOLICION Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 112.034,00				90,19	$ 10.104.346,46	90,19	$ 10.104.346,46	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32.330,00				16,15	$ 522.129,50	16,15	$ 522.129,50	
2,4	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.070,00				285,70	$ 2.019.899,00	285,70	$ 2.019.899,00	
3,3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1.564,00				920,00	$ 1.438.880,00	920,00	$ 1.438.880,00	
9,3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2		$ 520.108,00				74,00	$ 38.487.992,00	74,00	$ 38.487.992,00	
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 42.602,00				19,92	$ 848.631,84	19,92	$ 848.631,84	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 23.603,00				64,56	$ 1.523.809,68	64,56	$ 1.523.809,68	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.545,00				99,20	$ 450.864,00	99,20	$ 450.864,00	
	EMERGENCIAS												
	COLEGIO CIUDAD VILLAVICENCIO SEDE A												
1	**PRELIMINARES**												
1,1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 30.319,00				53,40	$ 1.619.034,60	53,40	$ 1.619.034,60	
1,4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 33.842,00				7,00	$ 236.894,00	7,00	$ 236.894,00	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.545,00				388,33	$ 1.764.959,85	388,33	$ 1.764.959,85	
19	**MANTENIIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
19.1.2	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<15M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN		$ 730.021,00				3,00	$ 2.190.063,00	3,00	$ 2.190.063,00	
	COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE C												
1	**PRELIMINARES**												

1,1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 30.319,00				19,50	$ 591.220,50	19,50	$ 591.220,50			
1,4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 33.842,00				6,00	$ 203.052,00	6,00	$ 203.052,00			
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.545,00				36,25	$ 164.756,25	36,25	$ 164.756,25			
19	**MANTENIIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
19.1.2	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<15M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN		$ 730.021,00				1,00	$ 730.021,00	1,00	$ 730.021,00			
19.1.5	PODA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<15M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN		$ 440.767,00				1,00	$ 440.767,00	1,00	$ 440.767,00			
	COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE A													
1,1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4.127,00				28,60	$ 118.032,20	28,60	$ 118.032,20			
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 30.319,00				70,00	$ 2.122.330,00	70,00	$ 2.122.330,00			
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 3.360,00				78,00	$ 262.080,00	78,00	$ 262.080,00			
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**													
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 67.341,00				40,04	$ 2.696.333,64	40,04	$ 2.696.333,64			
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 21.734,00				52,91	$ 1.149.945,94	52,91	$ 1.149.945,94			
2,1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 139.987,00				22,02	$ 3.082.513,74	22,02	$ 3.082.513,74			
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 187.185,00				7,15	$ 1.338.372,75	7,15	$ 1.338.372,75			
2,2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
2.2.11	MUROS DE CONTENCIÓN 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE, NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1.411.127,00				17,22	$ 24.299.606,94	17,22	$ 24.299.606,94			
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 119.173,00				14,30	$ 1.704.173,90	14,30	$ 1.704.173,90			
2,4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.070,00				1.033,35	$ 7.305.784,50	1.033,35	$ 7.305.784,50			
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7.344,00				29,68	$ 217.969,92	29,68	$ 217.969,92			
3,3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1.564,00				1.510,00	$ 2.361.640,00	1.510,00	$ 2.361.640,00			
7,1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
7.1.4	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2		$ 42.311,00				40,04	$ 1.694.132,44	40,04	$ 1.694.132,44			
12,1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 42.602,00				53,84	$ 2.293.691,68	53,84	$ 2.293.691,68			
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 23.603,00				30,00	$ 708.090,00	30,00	$ 708.090,00			
12,2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 29.027,00				36,38	$ 1.056.002,26	36,38	$ 1.056.002,26			
15	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													

15.1.6	SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2		$ 30.613,00				2,00	$ 61.226,00	2,00	$ 61.226,00	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.545,00				88,00	$ 399.960,00	88,00	$ 399.960,00	
	COLEGIO COMPARTIR RECUERDO SEDE A											
1,1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 30.319,00		15,00	$ 454.785,00			15,00	$ 454.785,00	
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 67.341,00		26,40	$ 1.777.802,40			26,40	$ 1.777.802,40	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 31.765,00		5,00	$ 158.825,00			5,00	$ 158.825,00	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 21.734,00		2,00	$ 43.468,00			2,00	$ 43.468,00	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 8.731,00		6,00	$ 52.386,00			6,00	$ 52.386,00	
1,4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 33.842,00		1,00	$ 33.842,00			1,00	$ 33.842,00	
2,1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 139.987,00		1,00	$ 139.987,00			1,00	$ 139.987,00	
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 187.185,00		1,00	$ 187.185,00			1,00	$ 187.185,00	
2,2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 119.173,00		26,40	$ 3.146.167,20			26,40	$ 3.146.167,20	
2,4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7.344,00		54,78	$ 402.304,32			54,78	$ 402.304,32	
3,1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2		$ 151.090,00		2,00	$ 302.180,00			2,00	$ 302.180,00	
4,3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**											
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 14.607,00		2,00	$ 29.214,00			2,00	$ 29.214,00	
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN		$ 4.870,00		5,00	$ 24.350,00			5,00	$ 24.350,00	
7,1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2		$ 44.137,00		5,00	$ 220.685,00			5,00	$ 220.685,00	
7,2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
7.2.30	TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2		$ 125.502,00		5,00	$ 627.510,00			5,00	$ 627.510,00	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2		$ 90.491,00		24,24	$ 2.193.501,84			24,24	$ 2.193.501,84	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.545,00		25,40	$ 115.443,00			25,40	$ 115.443,00	
	COLEGIO COMPARTIR RECUERDO SEDE A											
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 31.765,00		53,40	$ 1.696.251,00			53,40	$ 1.696.251,00	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 28.644,00		23,38	$ 669.696,72			23,38	$ 669.696,72	

1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	25.077,00		35,59	$	892.490,43			35,59	$ 892.490,43	
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
8.1.2	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2		$	219.205,00		4,70	$	1.030.263,50			4,70	$ 1.030.263,50	
8.1.5	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2		$	164.556,00		23,38	$	3.847.319,28			23,38	$ 3.847.319,28	
COSTO TOTAL CONTRATO INICIAL						**$ 2.703.337.443,00**		**$**	**529.738.104,08**		**$ 2.060.577.362,48**		**$ 2.590.315.466,56**	**95,82%**

OBRA ADICIONAL (ITEM NO PREVISTOS ITEM MODIFICACIONES O MAYORES CANTIDADES)

OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
II	**MODIFICACION No.1**	**GL**	1,00	$ 479.467.488,00	$ 479.467.488,00							
II	**MODIFICACION No.2**	**GL**	1,00	$ 863.000.000,00	$ 863.000.000,00							
	ITEM NO PREVISTOS											
	COLEGIO CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE SEDE A											
NP-03	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TOP COAT O SIMILAR, PARA EXTERIORES EN COLORES PRIMARIOS, NO INCLUYE DISEÑO MAXIMO 3 MANOS.	M2		$ 41.171,00				1.605,59	$ 66.103.745,89	1.605,59	$ 66.103.745,89	
NP-04	TRATAMIENTO DE PLACA EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: PULIDA DE SUPERFICIE, TRATAMIENTO DE JUNTAS, LAVADO PARA RETIRO DE SUCIEDAD, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN	M2		$ 46.488,00				1.605,59	$ 74.640.667,92	1.605,59	$ 74.640.667,92	
	COLEGIO FANNY MIKEY SEDE A											
NP-03	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TOP COAT O SIMILAR, PARA EXTERIORES EN COLORES PRIMARIOS, NO INCLUYE DISEÑO MAXIMO 3 MANOS.	M2		$ 41.171,00				910,18	$ 37.473.020,78	910,18	$ 37.473.020,78	
NP-04	TRATAMIENTO DE PLACA EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: PULIDA DE SUPERFICIE, TRATAMIENTO DE JUNTAS, LAVADO PARA RETIRO DE SUCIEDAD, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN	M2		$ 46.488,00				136,41	$ 6.341.428,08	136,41	$ 6.341.428,08	
	COLEGIO COMPARTIR RECUERDO SEDE A											
NP-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA A UNA DESCARGA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UN		$ 1.055.407,00				10,00	$ 10.554.070,00	10,00	$ 10.554.070,00	
	COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A											
NP-01	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INCLUYE REFUERZO	M		$ 151.202,00		6,45	$ 975.252,90			6,45	$ 975.252,90	
NP-08	DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESTRUCTURA EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA FIBRO CEMENTO A UNA CARA DE 1/2" CON ESTRUCTURA . INCLUYE ARME Y DESARME DE ANDAMIOS, PARA ALTURAS MAXIMAS DE 10 METROS CON ANDAMIO CERTIFICADO, PARA ANCHOS DE HASTA 60 CM, INCLUYE ESTUCO Y PINTURA PARA EXTERIORES, PARA IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A - LOCALIDAD DE USME	M		$ 219.057,00		919,14	$ 201.344.050,98	562,74	$ 123.272.136,18	1.481,88	$ 324.616.187,16	
NP-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE GALVANIZADO CALIBRE 22 DESARROLLO DE 100 CM, PARA ALTURAS HASTA DE 10 METROS CON ANDAMIO CERTIFICADO. NO INCLUYE PINTURA	M		$ 275.030,00		117,16	$ 32.222.514,80			117,16	$ 32.222.514,80	
	COLEGIO ESTRELLA DEL SUR SEDE D											
NP-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON METÁLICO PLEGABLE CON MARCO MONTANTE EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA, PASADOR SUPERIOR E INFERIOR, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJA, COLOR GRIS O SIMILAR	M2		$ 1.078.457,00				7,24	$ 7.808.028,68	7,24	$ 7.808.028,68	

	COLEGIO ESTRELLA DEL SUR SEDE C												
NP-05	COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20X25 CM (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO), ESTE ITEM CORRESPONDE AL COLEGIO ESTRELLA DEL SUR SEDE C, PARA UNA CANTIDAD TOTAL DE 3 METROS	M		$ 119.562,00				5,80	$ 693.459,60	5,80	$ 693.459,60	
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 20 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO, ESTE ITEM CORRESPONDE AL COLEGIO ESTRELLA DEL SUR SEDE C	M		$ 107.977,00				29,70	$ 3.206.916,90	29,70	$ 3.206.916,90	
NP-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON METÁLICO PLEGABLE CON MARCO MONTANTE EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA, PASADOR SUPERIOR E INFERIOR, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJA, COLOR GRIS O SIMILAR"	M2		$ 1.078.457,00				16,15	$ 17.417.080,55	16,15	$ 17.417.080,55	
	COSTO TOTAL CONTRATO ADICIONAL				**$ 1.342.467.488,00**		**$ 234.541.818,68**		**$ 347.510.554,58**		**$ 582.052.373,26**	**43,4%**

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO TOTAL (AIU=32,18%)	**$ 4.045.804.931,00**	**$ 764.279.922,76**	**$ 2.408.087.917,06**	**$ 3.172.367.839,82**	**78,41%**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( )					
VALOR A PAGAR		**$ 764.279.922,76**	**$ 2.408.087.917,06**	**$ 3.172.367.839,82**	
VALOR AJUSTE AL PESO A PAGAR EN ACTA		**$ 0,24**	**-$ 1,06**	**-$ 0,82**	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO		**$ 764.279.923,00**	**$ 2.408.087.916,00**	**$ 3.172.367.839,00**	
DESCUENTOS POR CONCEPTO DE ANS: DESCUENTO POR EVALUACIÓN A LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS), DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 11 DE LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y EN LA CLÁUSULA 18 DE LA MINUTA DEL CONTRATO.			**$ 3.823.996,00**	**$ 3.823.996,00**	

SALDO DEL CONTRATO	**$ 873.437.092,00**	**SALDO POR AMORTIZAR**		**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**

NOMBRE DE CONTRATISTA : **CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025**
C.C. O NIT : 901.973.186-4
REP. LEGAL : MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
C.C. : 1.082.774.968

NOMBRE DE INTERVENTORIA : **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**
C.C. O NIT : 900.208.425-6
REP. LEGAL : HECTOR VILLAZON GUTIERREZ
C.C. : 8,767.031

ANEXO 6. MODIFICATORIO No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

MEMORANDO

Radicado N° **I-2026-70662**
Fecha: 03-06-2026 - 14:45
Folios: 161 Anexos: SI INCLUIDOS EN EL
Radicador: ANDRES IVANNO GALEANO TORO - 4300
Destino: 5220 - OFICINA DE CONTRATOS

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el codigo de verificación: 8XLPI

PARA: **ANA MARÍA BRICEÑO CAMPOS**
Jefe Oficina de Contratos

DE: **ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO**
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

ASUNTO: Remisión solicitud de modificación No. 2 del Contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.8169110 de 2025 – Grupo 2

Cordial saludo, respetada Ana María,

En el marco de las competencias asignadas a la Oficina de Contratos y para los fines pertinentes, me permito remitir nuevamente la solicitud de modificación No. 2 correspondiente a la adición y prórroga del Contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.8169110 de 2025 – Grupo 2 suscrito entre la SED y el CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO, con los ajustes requeridos por esa Oficina el pasado 26 de mayo de 2026.

Se precisa que el presente trámite se radica nuevamente, teniendo en cuenta que el supervisor designado del contrato de interventoría se encuentra disfrutando de su período de vacaciones. En consecuencia, la Solicitud de Modificación Contractual – SOC debió ser firmada nuevamente por el suscrito, en calidad de encargado de la supervisión, conforme a lo dispuesto en el Memorando No. I-2026-65413 del 25 de mayo de 2026.

Agradecemos su atención y apoyo, y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional que se considere necesario para continuar con el trámite correspondiente.

Sin otro particular,

Cordialmente,

ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Elaboró: Katherin Joan Velez Garcia – Abogada DCCEE – SED.
Reviso: Paula Andrea Panesso Sánchez – Líder Grupo Jurídico DCCEE SED

Anexo: SOC y anexos soportes.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		
1. DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
NO. CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8169110 DE 2025	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	
NOMBRE IDENTITARIO[1]:	No Aplica	
SUPERVISOR/INTERVENTOR	ING. ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos SUPERVISOR DELEGADO	
OBJETO:	*INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – LOTE 2.*	
VALOR INICIAL:	**SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS MCTE ($796´184.131),** incluido IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.	
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	
FECHA DE INICIO:	6 DE OCTUBRE DE 2025 según Acta de Inicio.	
1.1. GESTIÓN DEL TIEMPO:		
Acto que afecta el plazo (prórroga/suspensión)	**Fecha de suscripción**	**Impacto en el plazo**
MODIFICATORIO No. 01	23-12-2025	El contrato fue prorrogado por el término de un (1) mes y quince (15) días quedando como fecha de terminación el veinte (20) de junio de 2026.
1.2. GESTIÓN DE COSTOS		
Acto que afecta el valor del contrato (Adición/Disminución)	**Fecha de suscripción**	**Impacto en el valor**
MODIFICATORIO No. 01	23-12-2025	Se adicionó el valor del contrato por la suma de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($128´425.720),** equivalente a 90.21 SMMLV para la vigencia 2025., quedando el valor total del contrato por: **NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 924´609.851)** INCLUIDO IVA.
1.3. GESTIÓN DE ALCANCE/CALIDAD		
Acto que afecta el alcance del contrato (Modificaciones, cesiones, aclaratorios)	**Fecha de suscripción**	**Impacto en las condiciones del contrato**

[1] Numeral 5 Directiva 005 de 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. - Secretaría Distrital de Planeación

MODIFICATORIO No. 01	23-12-2025	Se aprobó la prórroga en tiempo con el fin de realizar la interventoría integral a los contratos de obra CO1.PCCNTR.8155135, CO1.PCCNTR.8154895 y CO1.PCCNTR.8154780 en la ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo a los frentes de obra a los que le fueron aprobados la ejecución de mayores cantidades de obra, así como la inclusión de nuevas sedes para su intervención así: **LOTE 4:** Mayores cantidades de obra para los colegios IED LOS TEJARES SEDE A – CPF 539 e IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A – CPF 576. **LOTE 5:** Mayores cantidades de obra para los colegios IED JOSÉ JAIME ROJAS – CPF 1934 e I ED LA JOYA DON BOSCO 1 – CPF 1973. **LOTE 6**: La inclusión de nuevos colegios IED GUILLERMO CANO ISAZA – CPF 1959 e IED TENERIFE GRANADA SUR SEDE A – CPF 548.
1.4 FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:		**1.5 VALOR ACTUAL**
20 de junio de 2026		NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 924´609.851) INCLUIDO IVA.

2. GESTIÓN DE INTEGRACIÓN DEL CONTRATO

AVANCE FÍSICO - EJECUCIÓN:	**AVANCE FINANCIERO**
El avance del contrato de interventoría es del 69.83% de acuerdo con el Acta Parcial de Interventoría No. 6 a corte del 05 de mayo de 2026 (SECOP II), y con respecto a los contratos de obra objeto de interventoría, se precisa: **Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155135 de 2025**: presenta un avance de ejecución del 90.79% conforme al informe semanal No. 25 con fecha de corte al 03-05-2026 (Anexo 1), frente al avance programado del 92.84%. Presenta ocho (8) frentes contractuales así: **1.** IED FANNY MICKEY: Finalizado **2.** IED OFELIA URIBE DE ACOSTA: 93.46% de ejecución **3.** IED ESTRELLA DEL SUR D: Finalizado **4.** IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR: 54.28% de ejecución **5.** IED ESTRELLA DEL SUR C: Finalizado **6.** IED COMPARTIR EL RECUERDO: 95.34% de ejecución **7.** IED CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE: Finalizado **8.** IED LOS TEJARES: 80.74% de ejecución. **Contrato de obra CO1.PCCNTR.8154895 de 2025**: presenta un avance de ejecución del 71.40% conforme al informe semanal No. 25 con fecha de corte al 03-05-2026 (Anexo 2), frente al avance programado del 68.07%. Presenta nueve (9) frentes contractuales así: **1.** IED LA ARABIA: Finalizado	A la fecha el avance de ejecución financiero es del 69.83% equivalente a $645´648.554, aprobado por la supervisión y reportado mediante las actas parciales: **ACTA PARCIAL DE INTREVENTORÍA No. 1** con un porcentaje de ejecución financiera del 5.715% equivalente a $45´496.236, valor ya pagado por la entidad. **ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 2** con un porcentaje de ejecución financiera del 5.715% equivalente a $45´496.236, valor ya pagado por la entidad. **ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 3** con un porcentaje de ejecución financiera del 13.72% equivalente a $141´587.751, valor ya pagado por la entidad. **ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 4** con un porcentaje de ejecución financiera del 8.57% equivalente a $79´227.162, valor ya pagado por la entidad. **ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 5** con un porcentaje de ejecución financiera del 7.39% equivalente a $68´288.881, valor ya pagado por la entidad. **ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 6** con un porcentaje de ejecución financiera del 28.72% equivalente a $265´552.288, valor en trámite de pago por la entidad. Pendiente por ejecución financiera un 30.17% equivalente a DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($278´961.297). **Valor pagado:** **$ 380´096.266**

2. IED LUIS EDUARDO MORA OSEJO: Finalizado **3.** IED BICENTENARIO TESORO DE LA CUMBRE: 75.02% de ejecución **4.** IED JOSÉ JAIME ROJAS: 52.74% de ejecución **5.** IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA: 31.97% de ejecución **6.** IED JOSÉ MARÍA VARGAS VILA: Finalizado **7.** IED ATABANZHA: Finalizado **8.** IED LA JOYA DON BOSCO 1: 75.39% de ejecución **9.** IED BRASILIA: 61.38% de ejecución. **Contrato de obra CO1.PCCNTR.8154780 de 2025**: presenta un avance de ejecución del 86.02% conforme al informe semanal No. 25 con fecha de corte al 03-05-2026 (Anexo 3), frente al avance programado del 86.39%. Presenta once (11) frentes contractuales así: **9.** IED ORLANDO FAL BORDA: Finalizado **10.** IED UNIÓN EUROPEA SEDE B: Finalizado **11.** IED SIERRA MORENA SEDE C: 95.37% de ejecución **12.** IED FABIO LOZANO SIMONELLI SEDE A: 98.43% de ejecución **13.** IED ARBORIZADORA BAJA SEDE A: 98.47% de ejecución **14.** IED CALASANZ BUENAVISTA: Finalizado **15.** IED ESTRELLA DEL SUR SEDE B: Finalizado **16.** IED SANTA LIBRADA: 76.89% de ejecución **17.** IED ESTRELLA DEL SUR SEDE A: Finalizado **18.** IED TENERIFE GRANADA SUR SEDE A: Finalizado **19.** IED GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A: 31.69 de ejecución.	**Valor pendiente de Pago:**	**$ 265´522.288**

3. GESTIÓN DE RIESGOS

3.1 GARANTÍAS

Amparos	Último anexo	Vigencia final	Valor asegurado final	Fecha de aprobación
Póliza de Cumplimiento No. BCH100046043 Cumplimiento	Anexo No. 6	20-12-2026	$ 184´921.970,20	14 de enero de 2026
Póliza de Cumplimiento No. BCH100046043 Prestaciones Sociales	Anexo No. 6	20-06-2029	$ 92´460.985,10	14 de enero de 2026
Póliza de Cumplimiento No. BCH100046043 Calidad del Servicio	Anexo No. 6	20-06-2031	$ 184´921.970,20	14 de enero de 2026

3.2 RIESGOS

Una vez revisada la matriz de riesgos incorporada en los documentos del proceso de contratación del cual se derivó el Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025, así como el alcance de la modificación contractual propuesta, se observa que esta no introduce tipologías de riesgo distintas a las inicialmente identificadas, ni altera la asignación de riesgos prevista entre las partes.

La modificación solicitada tiene como finalidad garantizar la continuidad del seguimiento y control integral a los contratos de obra Nos. CO1.PCCNTR.8155135 de 2025, CO1.PCCNTR.8154895 de 2025 y CO1.PCCNTR.8154780 de 2025, los cuales fueron objeto de modificación en valor y plazo para atender mayores cantidades de obra y/o la incorporación de nuevos frentes de intervención. En ese sentido, la presente modificación no implica que el contrato de interventoría ejecute directamente actividades de obra, sino que permite asegurar el acompañamiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo requerido durante el plazo adicional de ejecución de los contratos objeto de interventoría.

Así las cosas, la adición de recursos y la prórroga del contrato de interventoría guardan correspondencia con la necesidad de mantener la vigilancia, control y verificación especializada sobre las obras a cargo, bajo las mismas condiciones contractuales y sin modificar el objeto ni

la naturaleza del contrato. Por tanto, las actividades de interventoría que se desarrollarán durante el plazo adicional se enmarcan dentro de las mismas obligaciones y funciones originalmente pactadas.

De otra parte, las circunstancias que dan lugar a la presente modificación corresponden a la dinámica propia de los contratos de obra objeto de seguimiento, en los cuales se identificaron necesidades adicionales de intervención que requieren la continuidad del control integral por parte de la interventoría. En consecuencia, no se advierte que la modificación genere riesgos autónomos o no previstos en la etapa de estructuración, ni que implique una variación sustancial de las condiciones técnicas, jurídicas, financieras o administrativas inicialmente analizadas.

En relación con las diferencias reportadas entre el avance programado y el avance ejecutado de algunos frentes de obra, se precisa que dichas situaciones no constituyen, por sí mismas, la materialización de un riesgo contractual atribuible a la interventoría, en la medida en que no se evidencia afectación estructural de la ejecución ni desviaciones que comprometan el cumplimiento del objeto del contrato de interventoría. Por el contrario, la continuidad del acompañamiento especializado contribuye a fortalecer el seguimiento oportuno y la adopción de las medidas de control que resulten necesarias durante el plazo adicional.

En consecuencia, se concluye que los mecanismos de asignación y tratamiento de riesgos definidos desde la etapa precontractual se mantienen vigentes y resultan suficientes frente a la modificación planteada, sin que se requiera la actualización de la matriz de riesgos.

4. TIPO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		
OPCIÓN 1. ADICIÓN O DISMINUCIÓN DE VALOR	**CDP No.**	514 del 12 de marzo de 2026.
	Opción 1. Valor de la adición:	CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($162´875.214) INCLUIDO IVA.
	Porcentaje de la adición o disminución:	El porcentaje de adición corresponde al 20.45% equivalente a **CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($162´875.214,00) incluido el IVA**, es decir **93.02 SMMLV** para la vigencia **2026.** Teniendo en cuenta que el presupuesto inicial del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025 contempla un total de **559.31 SMMLV**, el límite máximo permitido equivale a **279.65 SMMLV.** Al considerar que la Adición No. 1 por valor de $128´425.720 equivale a **90.21 SMMLV**, se tiene que el acumulado de las adiciones contractuales asciende a **183.23 SMMLV (90.21+93.02)** valor que no supera el 50% del valor inicial del contrato, expresado en SMMLV. En consecuencia, la adición solicitada resulta jurídicamente viable al ajustarse a los parámetros previstos en la normativa contractual vigente.
	Valor final del contrato:	$ 1.087´485.065
OPCIÓN 2. PRÓRROGA	**Plazo inicial:**	7 MESES
	Plazo por prorrogar:	3.5 MESES
	Porcentaje de la prórroga:	50.00 %
	Fecha de terminación prevista teniendo en cuenta la prórroga:	**5 DE OCTUBRE DE 2026**
OPCIÓN 5. OTRAS MODIFICACIONES	Modificar la **CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO del ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA,** en el sentido de prorrogar el mismo por el término de tres (3) meses y quince (15) días calendario, contados a partir del 21 de junio de 2026 hasta el 5 de octubre de 2026, por tanto, la cláusula de plazo quedará de la siguiente manera:	

"El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, es decir hasta el cinco (5) de octubre de 2026.

Modificar la CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO del ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, en el sentido de adicionar la suma de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($162´875.214,00) incluido IVA., la cual quedará de la siguiente manera:

"El valor del contrato es hasta por la suma de MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.087´485.065) incluido IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, equivalentes a 763.95 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2025, suma que se discrimina de la siguiente manera:

PRESUPUESTO OFICIAL			
ETAPA	*VALOR ANTES DE IVA*	*IVA (%)*	*VALOR TOTAL*
INTERVENTORIA	*$880´862.903*	*$206´622.162*	*$1.087´485.065*
VALOR TOTAL INTERVENTORIA			*$1.087´485.065*

- El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

5.1 JUSTIFICACIÓN Y/O CONCEPTOS DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No. 2 PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

El Contratista de interventoría CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO mediante comunicación No. **SERINCO-SED-INT-2025-400** (anexo 04) de fecha 9 de abril de 2026, presentó ante la DCCEE-SED, la solicitud de adición y prórroga del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025, en aras de garantizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, y jurídico sobre los contratos de obra No. CO1.PCCNTR.8155135 de 2025, CO1.PCCNTR.8154895 de 2025 y CO1.PCCNTR.8154780 de 2025, manifestado lo siguiente:

*"En atención al contrato de referencia, suscrito entre **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE DISTRITO y CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO,** en atención a la Secretaría De Educación Del Distrito (SED), ha identificado que aún persiste la necesidad manifestada por la Secretaría De Educación Del Distrito (SED):*

1. *Mejoras en las condiciones físicas de los planteles educativos **I.E.D. CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE Sede A** con actividades de impermeabilización de cubiertas, **I.E.D. COMPARTIR EL RECUERDO Sede A** con actividades de cambio de cubierta en asbesto cemento, cambio de red eléctrica e impermeabilización de placas con poliurea, **I.E.D. ARBORIZADORA ALTA Sede B** con actividades de cambio de cubierta en aulas, cambio de red eléctrica, adecuación de baterías sanitarias y mejoramiento de cancha, los cuales pertenecen a la adición del Lote 4.*
2. *Mejoras en las condiciones físicas de los planteles educativos **I.E.D. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA** con actividades de Cambio de cubierta y adecuación eléctrica en el área de comedor y cocina, **I.E.D. PARAISO MIRADOR Sede D** con actividades de adecuaciones y mejoramiento de cerramiento perimetral, **I.E.D. RODRIGO LARA BONILLA Sede B** con actividades de mantenimiento en flanches/cubierta, los cuales pertenecen a la adición del Lote 5.*
3. *Incluir las actividades a realizar en la institución educativa **I.E.D CIUDAD DE VILLAVICENCIO Sede B** con actividades de mejoramiento correctivo en áreas de circulación y corredor principal, mejoramiento correctivo de cerramiento metálico y mejoramiento correctivo de redes de aguas lluvias, los cuales pertenecen a la adición del Lote 6.*

*En aras de dar cumplimiento a los lineamientos contractuales y a razón de las adiciones y prórroga del **CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 8155135, CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154895** y **CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154780***

que mediante la Resolución 0012 del 28 de marzo de 2025 la Entidad abrió el Proceso de Contratación SED-LP-OP-DCCEE-012-2025 y que por medio de la Resolución 0068 del 25 de julio de 2025, corregida mediante Resolución 0071 del 5 de agosto de 2025, la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista. entre la Secretaría De Educación Del Distrito (SED) con Nit. 860.532.363 quien actúa en calidad de contratante y los respectivos consorcios quienes actúan en calidad de contratista.

El Contratista de interventoría solicita una adición y prórroga del ***CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8169110*** *que la Entidad abrió el Proceso de selección de CONCURSO DE MERITOS No.SED-CM-A-DCCEE-018-2025 y que mediante la LICITACIÓN PUBLICA No. SED-LP-OP-DCCEE-012-2025, posteriormente la Entidad adjudicó el Contrato a la interventoría entre la Secretaría De Educación Del Distrito (SED) con Nit. 860.532.363 quien actúa en calidad de contratante y el CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO identificado con NIT. 901977271-0 quien actúa en calidad de interventoría, de cual esta interventoría se permite conceptuar: (…)" …*

2. ANTECEDENTES

(…) 2.3 El alcance proyectado contempla realizar las reparaciones locativas y atención de emergencias en los centros y sedes educativas y administrativas de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, en lo que se incluyen los mantenimientos programados, atención de emergencias en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, con el fin de mejorar las condiciones de cada una de las sedes intervenidas, por un valor de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UNO PESOS M/CTE. ($796.184.131) inc. IVA.

2.4 Si bien el objeto y el alcance del contrato se encuentra determinado y la destinación específica del mismo, por la modalidad de oferta económica presentada en la licitación pública de manera discriminada, la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO estableció y priorizó la ejecución de actividades de obra con las cantidades contenidas en el Formulario 1 del proceso licitatorio, conforme con el presupuesto oficial.

2.5 Conforme con las necesidades identificadas en las sedes educativas intervenidas, se suscribió el ***MODIFICATORIO No. 1*** *consistente en una adición y prórroga al contrato, sustentado en la necesidad de atender mayores cantidades de obra y frentes no previstos inicialmente, por un valor de* ***CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($128´425.720,00) INC IVA****, y una prórroga de* ***UN (1) MES Y QUINCE (15 DÍAS)*** *requeridos para garantizar la adecuada ejecución de las intervenciones, mejorar las condiciones de la infraestructura educativa y dar respuesta a situaciones detectadas durante el desarrollo del contrato, en concordancia con las prioridades establecidas por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.*

3 MOTIVACIONES

De acuerdo con lo ya detallado y las necesidades planteadas por parte de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, se presenta la solicitud de prórroga y adición requerida para el contrato de interventoría, conforme con las siguientes motivaciones:

3.1 La SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO tiene dentro de sus obligaciones mejorar las condiciones actuales de las instituciones educativas y administrativas de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, con el fin de garantizar el derecho a la Educación de la comunidad educativa, condición que bajo la inclusión de recursos para mejoramientos al contrato de obra puede beneficiar a más población y que a su vez involucra a la interventoría como entidad de control ante los contratos de obra.

3.2. A continuación, se presentan las intervenciones propuestas por la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y revisadas por parte de Contratista e Interventoría, las cuales son objeto de la solicitud de prórroga y adición:

Se recuerda que la adición de los lotes 4 y 5 se justifica por mayores cantidades requeridas en frentes contractuales y la incorporación de nuevos colegios antes relacionados, situación que responde a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio.

➢ **CPF 1912 I.E.D. Confederacion Brisas del Diamante - Sede A**

El alcance de las obras a ejecutar en esta sede educativa son los siguientes:

- Mayor área de impermeabilización de cubierta de danzas, administración y espacio de vigilancia, incluyendo retiro de manto, destronque de superficie y aplicación de pintura.

➢ **CPF 1911 I.E.D. Compartir El Recuerdo - Sede A**

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Cambio de cubierta en asbesto cemento
- Cambio de red eléctrica
- Impermeabilización de placas con poliurea

➢ **CPF 1940 I.E.D. Arborizadora Alta - Sede B**

El alcance de las obras a ejecutar en esta sede educativa son los siguientes:

- Cambio de cubierta en aulas
- Cambio de red eléctrica
- Adecuación de baterías sanitarias
- Mejoramiento de cancha

➢ **CPF 540 I.E.D. Miguel de Cervantes Saavedra - Sede A**

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Cambio de cubierta y adecuación eléctrica en el área de comedor y cocina

➢ **CPF 1982 I.E.D. Paraiso Mirador - Sede D**

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Adecuación y mejoramiento cerramiento perimetral

➢ **CPF 1921 I.E.D. Rodrigo Lara Bonilla - Sede B**

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Mantenimiento flanches cubierta
- Tratamiento de humedades en aulas y batería de baño primer piso

Se recuerda que la adición del lote 6 se justifica por la incorporación de actividades requeridas para un nuevo frente, las cuales serán agregadas al presente contrato. Esta situación obedece a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio. En consecuencia, se adiciona una sede adicional respecto de las ya contratadas como se observa a continuación:

➢ **CPF 545 Ciudad de Villavicencio - Sede B**

El alcance de las obras a ejecutar en esta sede educativa son los siguientes:

Mejoramiento correctivo de en áreas de circulación y corredor principal
Mejoramiento correctivo de cerramiento metálico
Mejoramiento correctivo de redes de aguas lluvias

3.3. Teniendo en cuenta los alcances indicados, a continuación, se relaciona el balance financiero de cada una de las intervenciones:

De acuerdo con los alcances y estimaciones financieras de las siete (7) instituciones educativas relacionadas anteriormente, es necesario disponer de una adición presupuestal al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110, de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 162´875.214,00) INLUIDO IVA y una prórroga de 3 MESES Y 15 DÍAS, es decir hasta el 05 de octubre de 2026.

4. CONCLUSIONES

De acuerdo con las consideraciones expuestas por parte del Contratista y las necesidades requeridas por parte de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, esta Interventoría indica que se realizó la debida revisión de cada uno de los alcances planteados por los Contratistas mediante comunicado del asunto, por lo que emitimos concepto favorable para la inclusión de las siguientes sedes educativas conforme con las actividades contractuales establecidas en el Formulario 1 del proceso licitatorio:

LOTE 4:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	LOCALIDAD	VALOR PRESUPUESTAL	TIEMPO
CPF 1912 Confederacion Brisas del Diamante	Ciudad Bolívar	$ 106.000.000,00	21 días (veintiún días)
CPF 1911 Compartir el Recuerdo	Ciudad Bolívar	$ 293.000.000,00	97 días (noventa y siete días)
CPF 1940 Arborizadora Alta	Ciudad Bolívar	$ 464.000.000,00	127 días (ciento veintisiete días)

LOTE 5:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	LOCALIDAD	VALOR PRESUPUESTAL	TIEMPO
CPF 540 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	Usme	$ 300.000.000,00	107 días (ciento siete días)
CPF 1982 PARAISO MIRADOR	Ciudad Bolívar	$ 252.000.000,00	106 días (ciento seis días)
CPF 1921 RODRIGO LARA BONILLA	Ciudad Bolívar	$ 65.000.000,00	80 días (ochenta días)

LOTE 6:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	LOCALIDAD	VALOR PRESUPUESTAL	TIEMPO
CPF 545 CIUDAD VILLAVICENCIO - SEDE B	Usme	$ 294,297,000,00	120 días (ciento veinte días)

Lo cual genera la necesidad de disponer de una adición presupuestal al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110, de ***CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 162.875.214,00)*** *INCLUIDO IVA y una prórroga de 3 MESES Y 15 DÍAS, es decir, hasta el 05 de octubre de 2026.*

5. SOLICITUDES

Esta interventoría de manera atenta pone a consideración de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO las siguientes solicitudes:

5.1 ADICIÓN: Con el fin de cumplir con los alcances necesarios en cada una de las sedes educativas planteadas, se solicita disponer de una adición presupuestal al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110, de ***CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES***

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 162.875.214,00) *INCLUIDO IVA.*

5.2 PRORROGA: Teniendo en cuenta el plazo necesario para la ejecución de las obras de adecuación, mantenimiento y/o mejoramiento en las sedes educativas, se solicita una prórroga al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 por el término de 3 MESES Y 15 DÍAS, es decir hasta el 05 de octubre de 2026."

5.4 CONSIDERACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8169110:

El Supervisor del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025, y el equipo de Apoyo a la Supervisión encargado del seguimiento a las actividades de los contratos de obra, analizó los soportes documentales y los conceptos de conveniencia remitidos por la interventoría mediante el comunicado SERINCO-SED-INT-2025-400 del 9 de abril de 2026

Con base en dicho análisis, en el cual la interventoría avala la prórroga de los contratos de obra No. CO1.PCCNTR.8155135 de 2025, CO1.PCCNTR.8154895 de 2025 y CO1.PCCNTR.8154780 de 2025, se determinó lo siguiente:

1. De acuerdo con el cuadro de proyectos para los Lote 4, 5 y 6 relacionados en los Estudios Previos del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155135 de 2025, CO1.PCCNTR.8154895 de 2025 y CO1.PCCNTR.8154780 de 2025, en el literal D. "Lugar de ejecución y domicilio contractual", las intervenciones previstas para estos lotes se encuentran ubicadas en la zona Sur, específicamente en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar. En ese sentido, las sedes educativas objeto de la modificación de los contratos de obra, se encuentran dentro del ámbito territorial definido desde la estructuración del proceso licitatorio SED-LP-OP-DCCEE-012-2025 y corresponden a instituciones ubicadas en la localidad de Usme y Ciudad Bolívar, por lo cual su atención resulta concordante con el alcance territorial del contrato.

2. Se deja constancia de que el Subsecretario de Acceso y Permanencia, en su calidad de Ordenador del Gasto, designó al señor Jorge Alberto Moreno Aldana como Supervisor del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025, mediante memorando I-2025-166630 del 4 de diciembre de 2025, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Manual de Supervisión e Interventoría de la Secretaría de Educación del Distrito (Resolución 1035 de 2018).

3. En virtud del Modificatorio No. 02, el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155135 de 2025 (Lote No. 04) fue prorrogado por 4 MESES, con nueva fecha de terminación al 1 de octubre de 2026. Esta fecha es posterior a la vigencia del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025, responsable del seguimiento integral y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por tanto, se hace necesaria la continuidad de la supervisión técnica especializada hasta la finalización de las obras, dada la complejidad de las actividades sociales, ambientales, jurídicas, administrativas y financieras propias de su ejecución.

4. De igual forma, el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8154895 de 2025 (Lote No. 05) fue prorrogado mediante el Modificatorio No. 2 por 3 MESES y 15 DÍAS, con fecha de terminación al 5 de octubre de 2026, siendo también posterior a la terminación del contrato de interventoría referido, lo que exige la continuidad del acompañamiento técnico especializado en todas las dimensiones mencionadas.

5. Asimismo, el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8154780 de 2025 (Lote No. 06) fue prorrogado por 3 MESES y 10 DÍAS, hasta el 30 de septiembre de 2026, en las mismas condiciones contractuales, técnicas y temporales, que demandan la extensión del acompañamiento de interventoría

6. En consecuencia, la interventoría, mediante el mismo comunicado SERINCO-SED-INT-2025-400 del 9 de abril de 2026, solicitó la Modificación No. 02 del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025, con el fin de prorrogar su vigencia por 3 MESES y 15 DÍAS, hasta el 5 de octubre de 2026, y adicionar la suma de **CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($162´875.214) Incluido IVA.,** en la que se presenta para aprobación de la entidad, la oferta económica acorde al personal requerido y el porcentaje de dedicación de cada profesional, esto con el fin de realizar la supervisión integral a cada una de las sedes objeto de mayores cantidades como de nuevas sede incorporadas, las cuales hacen parte de las adiciones en cada uno de los contratos de obra a cargo.

7. Frente a esta solicitud, la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos – DCCEE adelantó las verificaciones correspondientes. En ese contexto, el Supervisor del contrato, junto con el Apoyo a la Supervisión, remitieron al Área de Estudios Previos de la SED, mediante el oficio SIGA I-2026-44535 del 11 de abril de 2026 (Anexo 6), la propuesta económica presentada por la interventoría, contenida en el comunicado SERINCO-SED-INT-2025-400 del 9 de abril de 2026.

8. El Área de Estudios Previos, luego de verificar que el valor propuesto por la interventoría para cada profesional correspondiera al valor ofertado, mediante comunicado SIGA I-2026-56836 del 6 de mayo de 2026 (Anexo 7), indicó lo siguiente:

   "(…) Se realizó el cotejo respectivo frente a la información de la verificación aritmética del proceso SED-CM-A-DCCEE-018-2025 encontrando correcta la aplicación de los precios contractuales.

En consecuencia, a partir de la información revisada y suministrada por el apoyo a la supervisión del proyecto, el grupo de Estudios Previos concluye, que el valor resultante para la adición, en la verificación aritmética efectuada, es de ***CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($162.875.214,00) INCLUIDO I.V.A. DEL 19%****". (…)"*

9. Por lo anterior, el Supervisor del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025, y su Apoyo a la Supervisión consideran viable y oportuno, seguir contando con los siguientes profesionales, bajo las siguientes dedicaciones:

CARGO	DEDICACIÓN
UN (1) DIRECTOR DE INTERVENTORIA	100%
UN (1) PROFESIONAL DE APOYO	100%
UN (1) RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	100%
UN (1) ESPECIALISTA AMBIENTAL	15%
UN (1) TECNICO EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO	100%
UN (1) INSPECTOR DE INTERVENTORIA	100%

10. Así mismo, se considera procedente adicionar los recursos correspondientes a los honorarios requeridos para garantizar la prestación del servicio de interventoría durante el plazo adicional de tres (3) meses y quince (15) días, en concordancia con el término restante de ejecución de los contratos de obra objeto de seguimiento. Lo anterior, conforme a la propuesta económica presentada por el contratista de interventoría, la cual fue revisada y avalada por el Área de Estudios Previos de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, mediante comunicación interna I-2026-56836 del 6 de mayo de 2026.

11. Ahora bien, en relación con las modificaciones contractuales permitidas dentro del régimen de contratación estatal establecido por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), y en particular respecto a la figura de la prórroga contractual, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-300 de 2012, precisó lo siguiente: *"… 2.6.1. Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal.*

12. Por otra parte, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, mediante Concepto 112 de 2024, señaló en cuanto a la procedencia de la prórroga del contrato estatal que *"… La Ley 80 de 1993 no se refirió a la posibilidad de prorrogar los contratos estatales, al igual que tampoco lo prohibió. En vista de ello, es necesario partir de las remisiones que hace la Ley 80 de 1993 al derecho privado y al principio de la autonomía de la voluntad para llenar este aspecto—arts. 13, 32 y 40—. De esta manera, los particulares tienen amplia libertad para prorrogar el plazo de cualquier contrato y, salvo ciertas disposiciones específicas de algunas tipologías contractuales, no existen criterios que determinen límites a esta posibilidad ni a su alcance, de manera que el principio de la autonomía de la voluntad en este aspecto despliega ampliamente sus efectos, lo que a su vez es trasladable, como principio, a los contratos estatales…".*

13. Verificadas las garantías que amparan la ejecución del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025, se advierte que las mismas se encuentran vigentes a la fecha. Sin perjuicio de lo anterior, considerando que la modificación contractual propuesta comprende una adición de recursos por valor de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($162.875.214), incluido IVA, y la prórroga del plazo de ejecución hasta el cinco (5) de octubre de 2026, el contratista deberá actualizar las garantías contractuales en los amparos a que haya lugar, de conformidad con el nuevo valor y plazo del contrato y con las condiciones exigidas en los documentos contractuales, para su correspondiente revisión y aprobación por parte de la Entidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8169110&AwardContractDetailId=6338109&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#ContractExecution.

14. En conclusión, el Supervisor del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025, y su equipo de Apoyo a la supervisión consideran viable la prórroga y adición de recursos al contrato, a fin de garantizar el seguimiento técnico, ambiental, jurídico, financiero y en seguridad y salud en el trabajo, requerido para la correcta ejecución de las obras de infraestructura educativa

15. Finalmente, y con base en las consideraciones expuestas, el Supervisor del Contrato de Interventoría No.CO1.PCCNTR.8169110 de 2025, recomiendan y consideran viable modificar dicho contrato, en el sentido de prorrogar el

plazo de ejecución por **3 MESES Y 15 DÍAS** y adicionar recursos por un valor de **CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($162´875.214,00)** incluido IVA.

6. SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.8169110 DE 2025:

6.1 PRÓRROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Modificar la **CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO del ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA,** en el sentido de prorrogar el mismo por el término de tres (3) meses y quince (15) días calendario, contados a partir del 21 de junio de 2026 hasta el 5 de octubre de 2026, por tanto, la cláusula de plazo quedará de la siguiente manera:

"El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, es decir hasta el cinco (5) de octubre de 2026".

6.2 ADICIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Modificar la **CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO del ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA,** en el sentido de adicionar la suma de **CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($162´875.214,00)** incluido IVA., la cual quedará de la siguiente manera:

*"El valor del contrato es hasta por la suma de **MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.087´485.065)** incluido IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, equivalentes a 763.95 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2025, suma que se discrimina de la siguiente manera:*

PRESUPUESTO OFICIAL			
ETAPA	***VALOR ANTES DE IVA***	***IVA (%)***	***VALOR TOTAL***
INTERVENTORIA	***$880´862.903***	***$206´622.162***	***$1.087´485.065***
VALOR TOTAL INTERVENTORIA			***$1.087´485.065***

- *El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato."*

6. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

A la fecha el contratista de interventoría CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO avala los avances de ejecución de obra en un 90.79% para el Lote 4 según Informe Semanal No. 25 (Anexo 1), un 71.40% para el Lote 5 según Informe Semanal No. 25 (Anexo 2) y un 86.02% para el Lote 6 según Informe Semanal No. 25 (Anexo 3), adelantando una supervisión integral de los contratos de obra asignados en cada uno de los frentes de obra asignados dentro del alcance de cada contrato, cumpliendo con las obligaciones técnicas y administrativas, supervisando la ejecución de los alcances proyectados en cada una de las sedes, dentro de los tiempos establecidos en cronogramas y bajos las especificaciones técnicas exigidas.

6. NOTAS DE DILIGENCIAMIENTO Y TRÁMITE:

Nota 1: Conforme al artículo 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de estas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

Nota 2: Una vez perfeccionada la modificación, el supervisor/interventor deberá remitir copia de la modificación suscrita al respectivo garante, conforme el Artículo 1060 del Código de Comercio, a fin de que la aseguradora expida el respectivo certificado para su posterior remisión a la Oficina de Contratos para su posterior archivo.

Nota 3: Las demás cláusulas del **contrato** se mantienen iguales.

7. ANEXOS:

1. Informe Semanal No. 25 - Lote 4.
2. Informe Semanal No. 25 - Lote 5.
3. Informe Semanal No. 25 - Lote 6.
4. Comunicación SERINCO-SED-2025-400 LOTE 2.
5. Propuesta Económica Modificación No. 2 SERINCO.
6. I-2026-44535 Remisión Solicitud y Propuesta Económica Modificatorio 2 Cto8169110 Interv.
7. RESPUESTA PROPUESTA ECONOMICA RAD I-2026-56836.
8. DOCUMENTOS SERINCO.
9. CDP 514 - $162.875.214 PSMFormato_CDP0000869450.
10. CAP_CTO_8169110_AMP_M1.

ANDRES IVANNO CALLEJO TORO
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.
Secretaría de Educación del Distrito
Supervisor Delegado – Contrato de Interventoría
No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025

Revisó:	Paula Andrea Panesso Sánchez – Líder Grupo Jurídico DCCEE SED
	Katherin Vélez García – Contratista DCCEE SED
Elaboró:	Santiago Ángel Uribe – Contratista DCCEE SED

CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
NIT: 901.977.271-0
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: serinco.educativo@gmail.com

SERINCO-SED-INT-2025-400

Bogotá D.C., 09 de abril de 2025

Señores(a):
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE DISTRITO
ARQ. SANTIAGO ANGEL URIBE
Apoyo a la Supervisión
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos – DCCEE

REFERENCIA: *"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS",*

ASUNTO: Solicitud Modificatorio No. 02 Adición y Prórroga. - Cto Interventoría CO1.PCCNTR.8169110 Grupo 2

Respetado Arquitecto,

En atención al contrato de referencia, suscrito entre **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE DISTRITO y CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**, en atención a la Secretaría De Educación Del Distrito (SED), ha identificado que aún persiste la necesidad manifestada por la Secretaría De Educación Del Distrito (SED):

1. Mejoras en las condiciones físicas de los planteles educativos **I.E.D. CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE Sede A** con actividades de impermeabilización de cubiertas, **I.E.D. COMPARTIR EL RECUERDO Sede A** con actividades de cambio de cubierta en asbesto cemento, cambio de red eléctrica e impermeabilización de placas con poliurea, **I.E.D. ARBORIZADORA ALTA Sede B** con actividades de cambio de cubierta en aulas, cambio de red eléctrica, adecuación de baterías sanitarias y mejoramiento de cancha, los cuales pertenecen a la adición del Lote 4.
2. Mejoras en las condiciones físicas de los planteles educativos ***I.E.D. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA*** con actividades de Cambio de cubierta y adecuación eléctrica en el área de comedor y cocina, ***I.E.D. PARAISO MIRADOR Sede D*** con actividades de adecuaciones y mejoramiento de cerramiento perimetral, **I.E.D. RODRIGO LARA BONILLA Sede B** con actividades de mantenimiento en flanches/cubierta, los cuales pertenecen a la adición del Lote 5.
3. Incluir las actividades a realizar en la institución educativa ***I.E.D CIUDAD DE VILLAVICENCIO Sede B*** con actividades de mejoramiento correctivo en áreas de circulación y corredor principal, mejoramiento correctivo de cerramiento metálico y mejoramiento correctivo de redes de aguas lluvias, los cuales pertenecen a la adición del Lote 6.

SERINCO-SED-INT-2025-400

En aras de dar cumplimiento a los lineamientos contractuales y a razón de las adiciones y prórroga del ***CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 8155135***, ***CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154895*** y ***CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154780*** que mediante la Resolución 0012 del 28 de marzo de 2025 la Entidad abrió el Proceso de Contratación SED-LP-OP-DCCEE-012-2025 y que por medio de la Resolución 0068 del 25 de julio de 2025, corregida mediante Resolución 0071 del 5 de agosto de 2025, la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista. entre la Secretaría De Educación Del Distrito (SED) con Nit. 860.532.363 quien actúa en calidad de contratante y los respectivos consorcios quienes actúan en calidad de contratista.

El Contratista de interventoría solicita una adición y prórroga del ***CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8169110*** que la Entidad abrió el Proceso de selección de CONCURSO DE MERITOS No.SED-CM-A-DCCEE-018-2025 y que mediante la LICITACIÓN PUBLICA No. SED-LP-OP-DCCEE-012-2025, posteriormente la Entidad adjudicó el Contrato a la interventoría entre la Secretaría De Educación Del Distrito (SED) con Nit. 860.532.363 quien actúa en calidad de contratante y el CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO identificado con NIT. 901977271-0 quien actúa en calidad de interventoría, de cual esta interventoría se permite conceptuar:

1. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS "
CONTRATISTA	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO - NIT 901.977.271-0
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8169110

VALOR INICIAL	SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($796.184.131.00) INC. IVA
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE MAYO DE 2026
MODIFICATORIO No. 1	**ADICIÓN:** CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($ 128.425.720,00) INC. IVA **PRÓRROGA:** 1.5 MESES
VALOR TOTAL	NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 924.609.851,00) INC. IVA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE JUNIO DE 2026
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDADES DE CIUDAD BOLÍVAR Y USME

Conforme con lo indicado anteriormente y de acuerdo con las necesidades identificadas por parte de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, a continuación, se relacionan los antecedentes y requerimientos presentados por las partes, los cuales, se requieren incluir dentro del alcance del contrato de interventoría, con base en la justificación presentada por el Contratista y concepto emitido por esta interventoría.

2. ANTECEDENTES

2.1. La SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO de conformidad con lo establecido en el Decreto 330 del 2008 tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución

de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral. De igual forma como acciones tendientes a garantizar la permanencia escolar, promoción de la calidad educativa, prever y asegurar el funcionamiento normal, eficiencia y la buena presentación de las plantas físicas educativas y administrativas, la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, ha priorizado las obras menores y de mejoramiento con características de Reparaciones Locativas en las diferentes localidades de Bogotá, intervenciones que contribuyen a mejorar la infraestructura educativa en temas tales como, la atención prioritaria a las observaciones efectuadas por parte de Secretaria Distrital de Salud, obras menores de mitigación ante posibles riesgos y el mantenimientos correctivo, entre otros aspectos relacionados.

2.2. Es así que la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO adelantó la licitación pública cuyo objeto consistió en la "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" en cumplimiento de la normatividad vigente que rige la contratación pública, adjudicando a la firma CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO identificado con NIT. 901977271-0 mediante contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8169110.

2.3. El alcance proyectado contempla realizar las reparaciones locativas y atención de emergencias en los centros y sedes educativas y administrativas de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, en lo que se incluyen los mantenimientos programados, atención de emergencias en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, con el fin de mejorar las condiciones de cada una de las sedes intervenidas, por un valor de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UNO PESOS M/CTE. ($796.184.131) inc. IVA.

2.4. Si bien el objeto y el alcance del contrato se encuentra determinado y la destinación específica del mismo, por la modalidad de oferta económica presentada en la licitación pública de manera discriminada, la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO estableció y priorizó la ejecución de actividades de obra con las cantidades contenidas en el Formulario 1 del proceso licitatorio, conforme con el presupuesto oficial.

2.5. Conforme a las necesidades identificadas en las sedes educativas intervenidas, se suscribió el **MODIFICATORIO No.1** consistente en una adición y prórroga al contrato, sustentado en la necesidad de atender mayores cantidades de obra y frentes no previstos inicialmente, por un valor de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($ 128.425.720,00) INC. IVA,** y una prórroga de **UN (1) MES Y QUINCE (15 DÍAS)** requeridos para garantizar la adecuada ejecución de las intervenciones, mejorar las

condiciones de la infraestructura educativa y dar respuesta a situaciones detectadas durante el desarrollo del contrato, en concordancia con las prioridades establecidas por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

2.6. No obstante, y conforme con la dinámica del contrato de obra, la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ha identificado que siguen persistiendo necesidades en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar las cuales, son susceptible de intervención, con necesidades particulares en cuanto a obras de adecuación, mejoramiento y/o mantenimiento correctivo y/o el requerido, con el fin de mejorar las condiciones de las infraestructuras físicas distritales.

2.7. Por lo que, se plantea la necesidad de incluir unas obras adicionales al alcance de los contratos de obra de las siguientes sedes educativas, de lo cual la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO planteó las necesidades de intervención adicional al presupuesto inicial:

LOTE 4:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
CPF 1912 Confederacion Brisas del Diamante	**A**	**CRA. 18 I No. 69 D – 35 Sur**	**Ciudad Bolívar**
CPF 1911 Compartir el Recuerdo	**A**	**Calle 69 sur # 18 B 35**	**Ciudad Bolívar**
CPF 1940 Arborizadora Alta	**B**	**Carrera 43 #70a-50 Sur**	**Ciudad Bolívar**

La adición del presente lote se justifica por el incremento en las cantidades requeridas en dos sedes educativas y la incorporación de nuevas actividades por los colegios anteriormente mencionados, situación que responde a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio. En consecuencia, como se indicó previamente, se presentan mayores cantidades respecto a la sede **CPF 1912 Confederación Brisas del Diamante y CPF 1911 Compartir el Recuerdo**, y se adiciona una sede respecto de las ya contratadas.

LOTE 5:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
CPF 540 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	**A**	**CARRERA 14 B No 76 - 33 SUR**	**Usme**
CPF 1982 PARAISO MIRADOR	**D**	**CARRERA 27Q # 71N- 02 SUR**	**Ciudad Bolívar**
CPF 1921 RODRIGO LARA BONILLA	**B**	**Cl. 64 Sur #29-19 Sur**	**Ciudad Bolívar**

La adición del presente lote se justifica por el incremento en las cantidades requeridas en una sede educativa y la incorporación de nuevas actividades por los colegios anteriormente mencionados, situación que responde a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio. En consecuencia, como se indicó previamente, se presentan mayores cantidades respecto a la sede **CPF 540 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA**, y se adicionan actividades correspondientes a dos sedes adicionales respecto de las ya contratadas.

LOTE 6:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
CIUDAD DE VILLAVICENCIO	**B**	**Cra 6H Este # 114 - 88 Sur**	**Usme**

La adición del presente lote se justifica por la incorporación de un nuevo frente y las actividades requeridas por el colegio anteriormente mencionado, las cuales serán agregadas al presente contrato. Esta situación obedece a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio. En consecuencia, como se indicó previamente, se adicionan actividades correspondientes a una sede adicional respecto de las ya contratadas.

3. MOTIVACIONES

De acuerdo con lo ya detallado y las necesidades planteadas por parte de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, se presenta la solicitud de prórroga y adición requerida para el contrato de interventoría, conforme con las siguientes motivaciones:

3.1. La SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO tiene dentro de sus obligaciones mejorar las condiciones actuales de las instituciones educativas y administrativas de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, con el fin de garantizar el derecho a la Educación de la comunidad educativa, condición que bajo la inclusión de recursos para mejoramientos al contrato de obra puede beneficiar a más población y que a su vez involucra a la interventoría como entidad de control ante los contratos de obra.

3.2. A continuación, se presentan las intervenciones propuestas por la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y revisadas por parte de Contratista e Interventoría, las cuales son objeto de la solicitud de prórroga y adición:

Se recuerda que la adición de los lotes 4 y 5 se justifica por mayores cantidades requeridas en frentes contractuales y la incorporación de nuevos colegios antes relacionados, situación que responde a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio.

➢ **CPF 1912 I.E.D. Confederacion Brisas del Diamante - Sede A**

El alcance de las obras a ejecutar en esta sede educativa son los siguientes:

- Mayor área de impermeabilización de cubierta de danzas, administración y espacio de vigilancia, incluyendo retiro de manto, destronque de superficie y aplicación de pintura.

➢ **CPF 1911 I.E.D. Compartir El Recuerdo - Sede A**

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Cambio de cubierta en asbesto cemento
- Cambio de red eléctrica
- Impermeabilización de placas con poliurea

➢ **CPF 1940 I.E.D. Arborizadora Alta - Sede B**

El alcance de las obras a ejecutar en esta sede educativa son los siguientes:

- Cambio de cubierta en aulas
- Cambio de red eléctrica
- Adecuación de baterías sanitarias
- Mejoramiento de cancha

➢ **CPF 540 I.E.D. Miguel de Cervantes Saavedra - Sede A**

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Cambio de cubierta y adecuación eléctrica en el área de comedor y cocina

➢ **CPF 1982 I.E.D. Paraiso Mirador - Sede D**

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Adecuación y mejoramiento cerramiento perimetral

➢ **CPF 1921 I.E.D. Rodrigo Lara Bonilla - Sede B**

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Mantenimiento flanches cubierta
- Tratamiento de humedades en aulas y batería de baño primer piso

Se recuerda que la adición del lote 6 se justifica por la incorporación de actividades requeridas para un nuevo frente, las cuales serán agregadas al presente contrato. Esta situación obedece a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio. En consecuencia, se adiciona una sede adicional respecto de las ya contratadas como se observa a continuación

➢ **CPF 545 Ciudad de Villavicencio - Sede B**

El alcance de las obras a ejecutar en esta sede educativa son los siguientes:

Mejoramiento correctivo de en áreas de circulación y corredor principal
Mejoramiento correctivo de cerramiento metálico
Mejoramiento correctivo de redes de aguas lluvias

3.3. Teniendo en cuenta los alcances indicados, a continuación, se relaciona el balance financiero de cada una de las intervenciones:

De acuerdo con los alcances y estimaciones financieras de las siete (7) instituciones educativas relacionados anteriormente, es necesario disponer de una adición presupuestal al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110, de **CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CENTAVOS *M/CTE ($ 162.875.214,00)*** INCLUIDO IVA y una prórroga de 3 MESES Y 15 DÍAS, es decir, hasta el 05 de octubre de 2026.

Finalmente, conforme con las necesidades de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO respecto a las sedes a intervenir, esta interventoría concluye lo siguiente:

4. CONCLUSIONES

De acuerdo con las consideraciones expuestas por parte del Contratista y las necesidades requeridas por parte de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, esta Interventoría indica que se realizó la debida revisión de cada uno de los alcances planteados por los Contratistas mediante comunicado del asunto, por lo que emitimos concepto favorable para la inclusión de las siguientes sedes educativas conforme con las actividades contractuales establecidas en el Formulario 1 del proceso licitatorio:

LOTE 4:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	LOCALIDAD	VALOR PRESUPUESTAL	TIEMPO
CPF 1912 Confederacion Brisas del Diamante	**Ciudad Bolívar**	**$ 106.000.000,00**	**21 días (veintiún días)**
CPF 1911 Compartir el Recuerdo	**Ciudad Bolívar**	**$ 293.000.000,00**	**97 días (noventa y siete días)**
CPF 1940 Arborizadora Alta	**Ciudad Bolívar**	**$ 464.000.000,00**	**127 días (ciento veintisiete días)**

LOTE 5:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	LOCALIDAD	VALOR PRESUPUESTAL	TIEMPO
CPF 540 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	**Usme**	**$ 300.000.000,00**	**107 días (ciento siete días)**
CPF 1982 PARAISO MIRADOR	**Ciudad Bolívar**	**$ 252.000.000,00**	**106 días (ciento seis días)**
CPF 1921 RODRIGO LARA BONILLA	**Ciudad Bolívar**	**$ 65.000.000,00**	**80 días (ochenta días)**

LOTE 6:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	LOCALIDAD	VALOR PRESUPUESTAL	TIEMPO
CPF 545 CIUDAD VILLAVICENCIO - SEDE B	**Usme**	**$ 294,297,000,00**	**120 días (ciento veinte días)**

Lo cual genera la necesidad de disponer de una adición presupuestal al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110, de **CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CENTAVOS** ***M/CTE ($ 162.875.214,00)*** INCLUIDO IVA y una prórroga de 3 MESES Y 15 DÍAS, es decir, hasta el 05 de octubre de 2026.

5. SOLICITUDES

Esta interventoría de manera atenta pone a consideración de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO las siguientes solicitudes:

5.1. ADICIÓN: Con el fin de cumplir con los alcances necesarios en cada una de las sedes educativas planteadas, se solicita disponer de una adición presupuestal al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110, de **CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CENTAVOS** ***M/CTE ($ 162.875.214,00)*** INCLUIDO IVA.

5.2. PRÓRROGA: Teniendo en cuenta el plazo necesario para la ejecución de las obras de adecuación, mantenimiento y/o mejoramiento en las sedes educativas, se solicita una prórroga al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 por el término de 3 MESES Y 15 DÍAS, es decir hasta el 05 de octubre de 2026.

6. ANEXOS

Como soporte de la presente solicitud se anexa a la presente:

6.1. Propuesta económica
6.2. Certificados de Antecedentes:
- Contraloría y Personería
- Procuraduría y Policía
- Inhabilidades y RNMC

Sin otro particular.

Cordialmente;

HECTOR JOSE VILLAZON GUTIERREZ
Consorcio Serinco Educativo
Director de Interventoría
Cc Consecutivo
Anexo: Según indica

OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."

VALOR OFERTA ECONOMICA - ZONA SUR II

Nº	DESCRIPCIÓN	PLAZO	PRECIO OFERTADO MES	VALOR TOTAL
1	**COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**			
1.1	**PERSONAL PROFESIONAL**			
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA Cantidad: 1 con una dedicación 100%	3,50	$ 9.849.311,00	$ 34.472.589,00
1.1.2	PROFESIONAL DE APOYO Cantidad: 1 con una dedicación 100%	3,50	$ 6.296.042,00	$ 22.036.147,00
1.1.3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Cantidad: 1 con una dedicación 100%	3,50	$ 8.930.074,95	$ 31.255.262,00
1.1.5	ESPECIALISTA AMBIENTAL Cantidad: 1 con una dedicación 15%	3,50	$ 9.849.311,55	$ 5.170.889,00
1.2	**PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO**			
1.2.1	TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cantidad: 1 con una dedicación 100%	3,50	$ 2.422.509,00	$ 8.478.782,00
1.2.2	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA Cantidad: 1 con una dedicación 100%	3,50	$ 2.728.063,83	$ 9.548.223,00
SUBTOTAL	**1. COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**			**$ 110.961.892,00**
2	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**			
2.1	**GASTOS GENERALES**			
2.1.1	GASTOS GENERALES Y/O ADMINISTRATIVOS (OFICINA SENCILLA, PAPELERÍA, COMPUTADORES, SECUENCIA FOTOGRÁFICA, COSTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMUNICACIONES, IMPRESIÓN DE PLANOS PARA EL INTERVENTOR) IMPUESTOS, GARANTIAS Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	2,44	$ 10.600.000,00	$ 25.908.035,73
SUBTOTAL	**2. GASTOS ADMINISTRATIVOS**			**$ 25.908.035,73**
TOTAL COSTOS PERSONAL - ADMINISTRACIÓN - IMPUESTOS - GARANTÍAS - UTILIDAD ESTIMADA OFERTADA				**$ 136.869.927,73**
			I.V.A. (19%)	**$ 26.005.286,27**
			VALOR TOTAL OFERTADO	**$ 162.875.214,00**

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Todas las propuestas deben contemplar dentro de su OFERTA ECONÓMICA, la totalidad del personal mínimo exigido, los costos directos e indirectos y todos los demás gastos en que pueda incurrir el contratista durante la ejecución del contrato. Los proponentes que no diligencien la totalidad de los campos establecidos en el Formulario – "PROPUESTA ECONÓMICA", será objeto de subsanación, lo anterior teniendo en cuenta que la oferta económica corresponde a un requisito de carácter habilitante, que no otorga puntaje.

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO efectuará la revisión aritmética de la información contenida en la Propuesta Económica, para efectos del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Los valores propuestos deberán contemplar todos los costos directos e indirectos, para los cuales incurra el proponente en relación con la correcta ejecución del objeto de la presente contratación.

Los precios contenidos en la propuesta económica seleccionada NO ESTÁN SUJETOS A REAJUSTE ALGUNO durante la ejecución del contrato, por tal razón, el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la propuesta, su irrevocabilidad y los posibles incrementos durante la ejecución del contrato. La propuesta debe presentarse en pesos colombianos.

El presente proceso de selección se adjudicará por el valor total de la oferta económica presentada y habilitada por el proponente seleccionado. La Propuesta Económica DEBERÁ SER DILIGENCIADA, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y PRESENTADA DE FORMA COMPLETA JUNTO CON LA PROPUESTA AL MOMENTO DEL CIERRE

_____

FECHA:	3/05/2026
DIAS RESTANTES	29 Días
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO:	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME APOYO A LA SUPERVISION

GRUPO 4

CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	consorcio adecuaciones ARSAF 2025
3 de mayo de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	consorcio SERINCO educativo

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.6169110	CO1.PCCNTR.6155135	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131.00	$ 2,703,377,443.00
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES	$ 128,425,720.00	$ 479,000,000.00
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRÓRROGAS	30	27	TOTAL	$ 924,609,851.00	$ 3,182,377,443.00
TERMINACION FINAL	4 de junio de 2026	3 de junio de 2026	TOTAL	241	238			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 128,425,720.00	30	
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	18-dic-25	$ 479,000,000.00	27	
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE:: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH – 100046043 – Anexo 0	4 9 2025	4 10 2026	4 4 2026	4 4 2031	4 9 2025	4 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA
95098	4 9 2025	4 12 2026	4 9 2025	4 4 2029	4 4 2026	4 4 2028

POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
27661	4 9 2025	4 4 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (01-05-2026)		PROGR %		EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA
1981-L	FANNY MICKEY (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Villas del Diamante	100.00%	100.00%		100.00%			$ 814,870,147	$ 814,870,147.30	10/11/2025	11/04/2026
1962	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	D	Estrella del Sur (4)	84.35%	100.00%		100.00%			$ 90,810,134	$ 90,810,133.53	2/02/2026	30/04/2026
1919	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	Estrella III Sede C	100.00%	100.00%		100.00%			$ 76,247,492	$ 76,247,492.45	15/01/2026	28/03/2026
1912	CONFEDERACION BRISAS DEL	CIUDAD BOLIVAR	A	Confederación Suiza	99.44%	100.00%		100.00%			$ 706,778,611	$ 706,778,611.33	18/11/2025	28/03/2026
1911	COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Compartir Lucero Alto	75.20%	95.34%		79.90%			$ 278,172,403	$ 265,212,434.12	24/11/2025	1/06/2026
576	DIEGO MONTAÑA CUELLAR (IED)	USME	A	El Uval - Nuevo	32.09%	54.28%		71.55%			$ 411,761,249	$ 223,503,927.51	1/12/2025	1/06/2026
573	OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)	USME	A	El Bosque Nuevo	84.45%	93.46%		88.90%			$ 242,305,285	$ 226,464,757.04	24/11/2025	7/05/2026
539	LOS TEJARES (IED)	USME	A	Los Tejares	95.67%	80.74%		97.95%			$ 242,176,869	$ 195,525,869.72	1/12/2025	1/06/2026
TOTAL FRENTES DE OBRA						90.79%		92.84%			$ 2,863,122,191	$ 2,599,413,373		

EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (01-05-2026)		PROGR %		EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA
527	FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)	USME	C	María Auxiliadora Sede C		100.00%		100.00%			$ 2,129,816	$ 2,129,816.00	23/11/2025	24/11/2025
577	CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)	USME	A	lote - Puerta Al llano valle 12		100.00%		100.00%			$ 5,810,951	$ 5,810,951.00	22/11/2025	24/11/2025
1928	EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Manuela Beltràn		100.00%		100.00%			$ 54,711,914.00	$ 54,711,914.00	4/12/2025	7/01/2026
1911	COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Compartir Lucero Alto		100.00%								
533	RURAL LA UNION USME (CED)	USME	A	La Unión Usme										
533	RURAL LA UNION USME (CED)	USME	A	La Unión Usme										
1981-I	FANNY MICKEY (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Villas del Diamante		100.00%		100.00%			$ 3,839,556	$ 3,839,556	23/03/2026	13/04/2026

FECHA: 3/05/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 29 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				GRUPO 4
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155135	CONTRATISTA:	consorcio adecuaciones ARSAF 2025	
3/05/2026	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	consorcio SERINCO educativo	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 100.00%	FANNY MICKEY	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y TERRAZAS	 		
		INTERVENCION BATERIAS SANITARIAS (Cambio de sanitarios, orinales, lavamanos y griferia).	 	 	
2A 100.00%	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	IMPERMEABILIZACION DE CUPULAS (CUBIERTA)			 
3A 95.34%	COMPARTIR EL RECUERDO	Cerramiento en lona verde, replanteo, retiro de aparatos sanitarios, demolicion de enchape de pared y de piso			 

FECHA: 3/05/2026 DIAS RESTANTES 29 Dias	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
REGISTRO FOTOGRAFICO					GRUPO	4
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155135	CONTRATISTA:	consorcio adecuaciones ARSAF 2025		
3/05/2026	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	consorcio SERINCO educativo		

4A 80.74%	LOS TEJARES	CAMBIO DE CUBIERTA EDIFICIO No.2, INCLUYE MEJORAMIENTO ELETRICO DE LOS ESPACIOS A INTERVENIR (2 AULAS Y 2 COORDINACIONES)				
5A 93.46%	OFELIA URIBE DE ACOSTA	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y TERRAZAS, MEJORAMIENTO DE CANALES Y BAJANTES, ADECUACION DE CARCAMOS,				
6A 54.28%	DIEGO MONTAÑA CUELLAR	ADECUACION BATERIA SANITARIA PARA MOVILIDAD REDUCIDA, ADECUACION RAMPA ACCESO AREA DE COMEDOR (AUDITORIO), MEJORAMIENTO DE CORNISAS				
7C 100.00%	ESTRELLA DEL SUR - C	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PORTONES PRINCIPALES CAMBIO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL				

FECHA:	3/05/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME	
DIAS RESTANTES	29 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARÍA DE ACESO Y PERMANANCIA			APOYO A LA SUPERVISION	
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			GRUPO	4
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155135	CONTRATISTA:	consorcio adecuaciones ARSAF 2025		
3/05/2026	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	consorcio SERINCO educativo		

8C 100.00%	ESTRELLA DEL SUR - D	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PORTONES PRINCIPALES CAMBIO DE CUBIERTA				
7A 100.00%	FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME	TALA DE UN ARBOL Y PODA DE UN ARBOL				
8A 100.00%	CIUDAD DE VILLAVICENCIO	ADECUACION BATERIA SANITARIA PARA MOVILIDAD REDUCIDA, ADECUACION RAMPA ACCESO AREA DE COMEDOR (AUDITORIO), MEJORAMIENTO DE CORNISAS				
9A 100.00%	EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN	ADECUACION BATERIA SANITARIA PARA MOVILIDAD REDUCIDA, ADECUACION RAMPA ACCESO AREA DE COMEDOR (AUDITORIO), MEJORAMIENTO DE CORNISAS				

FECHA: 3/05/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME	
DIAS RESTANTES 29 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				APOYO A LA SUPERVISION	
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				GRUPO	4
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155135	CONTRATISTA:	consorcio adecuaciones ARSAF 2025		
3/05/2026	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	consorcio SERINCO educativo		

10A 100.00%	COMPARTIR EL RECUERDO (Emergencia 1)	RUPTURA DE TUBERÍA SOBRE BAÑO 2DO PISO Y EN PATIO PRINCIPAL, HUMEDAD SOBRE BAÑOS 2DO PISO				
11A 100.00%	FANNY MIKEY (Emergencia)	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION SOBRE COCINA DONDE SE ENCONTRABAN EQUIPOS DE COCINA				

CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA		2025
CPF	1981-L	IED	FANNY MIKEY			SEMANA No. 25					
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	119.00	299.51		$ 30,319.00	$ 9,080,843.69	$ (5,472,882.69)			MAYOR	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS	M2	268.86	303.45	0	$ 17,585.00	$ 5,336,168.25	$ (608,265.15)			MAYOR	
DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO ÍTEM: 1.29	M2	0.00	725.46	0	$ 31,765.00	$ 23,044,236.90	$ (23,044,236.90)			MAYOR	
AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA) ÍTEM: 16.1.25	M2	0.00	725.46		$ 110,795.00	$ 80,377,340.70	$ (80,377,340.70)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5MM, DE 0.15X 0.15 M	KG	0.00	1573.68		$ 7,344.00	$ 11,557,105.92	$ (11,557,105.92)			MAYOR	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	0.00	386.00		$ 28,441.00	$ 10,978,226.00	$ (10,978,226.00)			MAYOR	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	0.00	333.88		$ 23,603.00	$ 7,880,569.64	$ (7,880,569.64)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	2142.18	1294.72		$ 352,164.00	$ 455,953,774.08	$ 298,444,903.44			MENOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	0.00	7.00		$ 851,255.00	$ 5,958,785.00	$ (5,958,785.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00	3.00		$ 601,133.00	$ 1,803,399.00	$ -			IGUAL	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	17.00	16.00		$ 800,038.00	$ 12,800,608.00	$ 800,038.00			MENOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA ADRIATICA, INCLUYE ASIENTO SANITARIO ENTRADA SUPERIOR PARA FLUXOMETRO DE CORONA O SIMILAR	UN	2.00	17.00		$ 1,487,960.00	$ 25,295,320.00	$ (22,319,400.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	24.00	27.00		$ 418,333.00	$ 11,294,991.00	$ (1,254,999.00)			MAYOR	
DILATACIÓNENCONCRETOCONPULIDORAESPESORDE3MMPROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M	0.00	314.60		$ 4,436.00	$ 1,395,565.60	$ (1,395,565.60)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	0.00	315.60		$ 25,116.00	$ 7,926,609.60	$ (7,926,609.60)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	3.00		$ 752,783.00	$ 2,258,349.00	$ (752,783.00)			MAYOR	
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TOP COAT O SIMILAR, PARA EXTERIORES EN COLORES PRIMARIOS, NO INCLUYE DISEÑO	M2	0.00	910.18		$ 41,171.00	$ 37,473,020.78	$ (37,473,020.78)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA TASA SANITARIO REF: CORONA O SIMILAR	UN	0.00	10.00		$ 713,949.00	$ 7,139,490.00	$ (7,139,490.00)			MAYOR	

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL LÍNEA INFANTIL	UN	0,00	4,00		$ 358,984.00	$ 1,435,936,00	$ (1,435,936,00)			MAYOR	
TRATAMIENTO DE PLACA EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: PULIDA DE SUPERFICIE, TRATAMIENTO DE JUNTAS, LAVADO PARA RETIRO DE SUCIEDAD, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN	M2	0,00	136.41		$ 46,488.00	$ 6,341,428,08	$ (6,341,428,08)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	0.00	8.50		$ 29,027.00	$ 246,729.50	$ (246,729.50)			MAYOR	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0,15M A 0,20 M EXISTENTE EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	283.56		$ 107,321.00	$ 30,431,942.76	$ (30,431,942.76)			MAYOR	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	0.00	283.56		$ 161,712.00	$ 45,855,054.72	$ (45,855,054.72)			MAYOR	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	854.75	1296.16		$ 4,822.00	$ 6,250,083,52	$ (2,128,479,02)			MAYOR	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	21.00	84.00		$ 26,588.00	$ 2,233,392,00	$ (1,675,044,00)			MAYOR	63,00
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) CERTIFICADOS)	M2	16.00	2.88		$ 12,327.00	$ 35,501.76	$ 161,730.24			MENOR	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	0.00	9.00		$ 8,731.00	$ 78,579.00	$ (78,579.00)			MAYOR	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE	M	0.00	9.00		$ 21,288.00	$ 191,592.00	$ (191,592.00)			MAYOR	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	0.00	8.00		$ 8,731.00	$ 69,848,00	$ (69,848,00)			MAYOR	8,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	0,00	7.76		$ 27,261.00	$ 211,545,36	$ (211,545,36)			MAYOR	7,76
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/4 "	UN	0,00	40.00		$ 13,976.00	$ 559,040,00	$ (559,040,00)			MAYOR	40,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	0,00	0.88		$ 15,333.00	$ 13,493,04	$ (13,493,04)			MAYOR	0.88
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 3/4'	UN	0.00	4.00		$ 6,383.00	$ 25,532.00	$ (25,532.00)			MAYOR	4.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN	0.00	1.00		$ 84,122.00	$ 84,122.00	$ (84,122.00)			MAYOR	1.00
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	0,00	109.84		$ 25,975.00	$ 2,853,094,00	$ (2,853,094,00)			MAYOR	109,84
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	0.00	2,88		$ 113,205.00	$ 326,030,40	$ (326,030,40)			MAYOR	2,88
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	0,00	1,00		$ 40,084.00	$ 40,084,00	$ (40,084,00)			MAYOR	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	0.00	1.00		$ 32,716.00	$ 32,716,00	$ (32,716,00)			MAYOR	1.00
					SUBTOTAL I.E.D. FANNY MIKEY	**$ 814,870,147.30**					
CPF	**1912**	**IED**	**CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE**			**SEMANA No. 25**					
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS	M2	1256.41	1543.97		$ 17,585.00	$ 27,150,712.45	$ (5,056,742.60)			MAYOR	

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
TRATAMIENTO DE PLACA EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: PULIDA DE SUPERFICIE, TRATAMIENTO DE JUNTAS, LAVADO PARA RETIRO DE SUCIEDAD, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN	M2	0.00	1545.23		$ 46,487.71	$ 71,834,197.94	$ (71,834,197.94)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	1256.41	1545.23		$ 352,164.00	$ 544,174,377.72	$ (101,712,006.48)			MAYOR	
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TOP COAT O SIMILAR, PARA EXTERIORES EN COLORES PRIMARIOS, NO INCLUYE DISEÑO	M2	0.00	1545.23		$ 41,171.43	$ 63,619,323.22	$ (63,619,323.22)			MAYOR	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. BRISAS DEL DIAMANTE					**$ 706,778,611.33**					
CPF	**1911**	**IED**	**OFELIA URIBE**			**SEMANA No. 25**					
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS	M2	409.70	394.25		$ 17,585.00	$ 6,932,886.25	$ 271,688.25			MENOR	-15.45
DEMOLICION DE ACABADO DE PISO ÍTEM: 1.2.8	M2	0.00	370.28		$ 31,765.00	$ 11,761,944.20	$ (11,761,944.20)			MAYOR	370.28
AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE	M2	0.00	370.28		$ 110,795.00	$ 41,025,172.60	$ (41,025,172.60)			MAYOR	370.28
CERRAMIENTO EN LONA	M	30.00	105.46		$ 30,319.00	$ 3,197,441.74	$ (2,287,871.74)			MAYOR	75.46
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UN	0.00	256.65		$ 23,603.00	$ 6,057,709.95	$ (6,057,709.95)			MAYOR	256.65
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	409.70	350.00		$ 352,164.00	$ 123,257,400.00	$ 21,024,190.80			MENOR	-59.70
ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	172.35		$ 12,208.00	$ 2,104,048.80	$ (2,104,048.80)			MAYOR	172.35
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	47.17		$ 29,027.00	$ 1,369,203.59	$ (1,369,203.59)			MAYOR	47.17
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	32.00	16.00		$ 297,746.00	$ 4,763,936.00	$ 4,763,936.00			MENOR	-16.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	44.92		$ 89,260.00	$ 4,009,559.20	$ (4,009,559.20)			MAYOR	44.92
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	0.00	30.00		$ 205,343.00	$ 6,160,290.00	$ (6,160,290.00)			MAYOR	30.00
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	172.35		$ 11,088.00	$ 1,911,016.80	$ (1,911,016.80)			MAYOR	172.35
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	0.56		$ 14,297.00	$ 8,006.32	$ (8,006.32)			MAYOR	0.56

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y ...	M2	8.00	12.80		$ 35,817.00	$ 458,457.60	$ (171,921.60)			MAYOR	4.80
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	43.00	45.00		$ 7,280.00	$ 327,600.00	$ (14,560.00)			MAYOR	2.00
CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M2	0.00	0.15		$ 625,445.00	$ 93,816.75	$ (93,816.75)			MAYOR	0.15
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	0.00	15.00		$ 172,614.00	$ 2,589,210.00	$ (2,589,210.00)			MAYOR	15.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	0.00	15.00		$ 39,716.00	$ 595,740.00	$ (595,740.00)			MAYOR	15.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	1.10		$ 81,396.00	$ 89,535.60	$ (89,535.60)			MAYOR	1.10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	0.00	2.00		$ 29,271.00	$ 58,542.00	$ (58,542.00)			MAYOR	2.00
UMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	0.00	8.00		$ 14,830.00	$ 118,640.00	$ (118,640.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	0.00	8.00		$ 15,661.00	$ 125,288.00	$ (125,288.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100- 240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	16.00	15.00		$ 61,735.00	$ 926,025.00	$ 61,735.00			MENOR	-1.00
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	414.92		$ 20,542.00	$ 8,523,286.64	$ (8,523,286.64)			MAYOR	414.92
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. OFELIA URIBE					**$ 226,464,757.04**					
CPF	**573**	**IED**	**COMPARTIR EL RECUERDO**			**SEMANA No. 25**					
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M2	30.00	24.00		$ 30,319.00	$ 727,656.00	$ 181,914.00			MENOR	-6.00
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	19.60		$ 67,341.00	$ 1,319,883.60	$ (1,319,883.60)			MAYOR	19.60
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	13.48	0	$ 110,911.00	$ 1,495,080.28	$ (1,495,080.28)			MAYOR	13.48
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	55.18	55.60		$ 31,765.00	$ 1,766,134.00	$ (13,341.30)			MAYOR	0.42
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13.05	41.98		$ 21,734.00	$ 912,393.32	$ (628,764.62)			MAYOR	28.93
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	69.82	108.20		$ 12,327.00	$ 1,333,781.40	$ (473,110.26)			MAYOR	38.38

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	4.67	19.29		$ 24,459.07	$ 471,815.48	$ (357,591.62)			MAYOR	14.62
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0.00	7.10		$ 139,987.00	$ 993,907.70	$ (993,907.70)			MAYOR	7.10
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	30.00	30.00		$ 26,588.00	$ 797,640.00	$ -			IGUAL	0.00
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	70.00	48.84		$ 20,183.00	$ 985,737.72	$ 427,072.28			MENOR	-21.16
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0.00	173.91		$ 139,987.00	$ 24,345,139.17	$ (24,345,139.17)			MAYOR	173.91
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	134.23	225.60		$ 89,260.00	$ 20,137,056.00	$ (8,155,686.20)			MAYOR	91.37
DESMONTE DE LÀMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND	0.00	22.00		$ 7,280.00	$ 160,160.00	$ (160,160.00)			MAYOR	22.00
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	60.00	30.50		$ 8,731.00	$ 266,295.50	$ 257,564.50			MENOR	-29.50
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	0.00	8.00		$ 8,731.00	$ 69,848.00	$ (69,848.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	13.35		$ 89,260.00	$ 1,191,621.00	$ (1,191,621.00)			MAYOR	13.35
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	17.70		$ 49,826.00	$ 881,920.20	$ (881,920.20)			MAYOR	17.70
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UND	0.00	9.00		$ 94,820.00	$ 853,380.00	$ (853,380.00)			MAYOR	9.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UND	0.00	4.00		$ 134,128.00	$ 536,512.00	$ (536,512.00)			MAYOR	4.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UND	0.00	7.00		$ 61,917.00	$ 433,419.00	$ (433,419.00)			MAYOR	7.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UND	0.00	10.00		$ 65,687.00	$ 656,870.00	$ (656,870.00)			MAYOR	10.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	0.00	19.49		$ 14,607.00	$ 284,690.43	$ (284,690.43)			MAYOR	19.49
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UND	0.00	9.00		$ 188,006.00	$ 1,692,054.00	$ (1,692,054.00)			MAYOR	9.00

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UND	0,00	10.00		$ 94,820.00	$ 948,200,00	$ (948,200,00)			MAYOR	10,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UND	8.00	2.00		$ 67,247.00	$ 134,494.00	$ 403,482.00			MENOR	-6.00
CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UND	0.00	2.00		$ 674,511.00	$ 1,349,022.00	$ (1,349,022.00)			MAYOR	2.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15X 0.15 M	KG	0,00	71.18		$ 7,344.00	$ 522,745.92	$ (522,745.92)			MAYOR	71.18
PLACA CONTRAPISO DE 10CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	0,00	41.93		$ 119,173.00	$ 4,996,923,89	$ (4,996,923,89)			MAYOR	41.93
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	0,00	42.83		$ 23,603.00	$ 1,010,916,49	$ (1,010,916,49)			MAYOR	42,83
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	M3	0,00	20.49		$ 178,689.00	$ 3,661,337.61	$ (3,661,337.61)			MAYOR	20.49
PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0,00	37.33		$ 40,541.00	$ 1,513,395.53	$ (1,513,395.53)			MAYOR	37.33
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	0,00	130.00		$ 101,554.00	$ 13,202,020,00	$ (13,202,020,00)			MAYOR	130.00
ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0,00	50.00		$ 12,208.00	$ 610,400,00	$ (610,400.00)			MAYOR	50.00
RELLENOSUBBASEGRANULARTIPOINVIAS(SUMINISTRO,EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0,00	7,51		$ 187,185.00	$ 1,405,759,35	$ (1,405,759,35)			MAYOR	7,51
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	0,00	13.66		$ 161,712.00	$ 2,208,985.92	$ (2,208,985.92)			MAYOR	13.66
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	55.18	18.00		$ 44,137.00	$ 794,466,00	$ 1,641,013,66			MENOR	-37.18
SUMINISTROEINSTALACIÓNDEMEDIACAÑAENGRANITOPULIDOBLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M2	41.56	25.00		$ 80,091.00	$ 2,002,275.00	$ 1,326,306.96			MENOR	-16.56
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	0.00	5.00		$ 851,255.00	$ 4,256,275.00	$ (4,256,275.00)			MAYOR	5.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	0.00	2.00		$ 601,133.00	$ 1,202,266,00	$ (1,202,266,00)			MAYOR	2.00
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	189.08	53.57		$ 4,127.00	$ 221,083.39	$ 559,249.77			MENOR	-135.51
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	0,00	28,97		$ 3,360.00	$ 97,339,20	$ (97,339,20)			MAYOR	28,97
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	40.00	32.00		$ 11,663.00	$ 373,216,00	$ 93,304.00			MENOR	-8.00

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y / OCIELO RASO, ANCHO <=15 CM, PROFUNDIDAD<=10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	0.00	27.50		$ 21,288.00	$ 585,420.00	$ (585,420.00)			MAYOR	27.50
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20METROS	M3	0.00	8.00		$ 33,842.00	$ 270,736.00	$ (270,736.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	0.00	35.78		$ 7,070.00	$ 252,964.60	$ (252,964.60)			MAYOR	35.78
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	55.18	19.60		$ 44,137.00	$ 865,085.20	$ 1,570,394.46			MENOR	-35.58
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADODE 1"	M2	0.00	28.00	10	$ 1,022,891.00	$ 28,640,948.00	$ (28,640,948.00)			MAYOR	28.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO=300A400mm)CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30mm y 40mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2)CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES-FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA YL OS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	149.68	279.93		$ 258,037.00	$ 72,232,297.41	$ (33,609,319.25)			MAYOR	130.25
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	0.00	1500.00		$ 22,456.00	$ 33,684,000.00	$ (33,684,000.00)			MAYOR	1500.00
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	149.68	279.93		$ 35,817.00	$ 10,026,252.81	$ (4,665,164.25)			MAYOR	130.25
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA A UNA DESCARGA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UN	0.00	10.00		$ 1,055,407.00	$ 10,554,070.00	$ (10,554,070.00)			MAYOR	10.00

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑOS ED, ESPESOR DE 1 CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	4.80	4.80		$ 1,099,280.00	$ 5,276,544.00	$ -			IGUAL	0.00
	SUBTOTAL I.E.D.	**SUBTOTAL I.E.D. COMPARTIR EL RECUERDO**				**$ 265,212,434.12**					
CPF	**539**	**IED**	**LOS TEJARES**			**SEMANA No. 25**					
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	30.00	26.20		$ 30,319.00	$ 794,357.80	$ 115,212.20			MENOR	-3.80
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	0.00	42.01		$ 21,734.00	$ 913,045.34	$ (913,045.34)			MAYOR	42.01
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	149.68	248.29		$ 35,817.00	$ 8,893,002.93	$ (3,531,914.37)			MAYOR	98.61
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	42.00	60.95		$ 26,101.00	$ 1,590,855.95	$ (494,613.95)			MAYOR	18.95
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	16.00	24.00		$ 7,280.00	$ 174,720.00	$ (58,240.00)			MAYOR	8.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	20.00	3080.43	150.00	$ 22,456.00	$ 69,174,136.08	$ (68,725,016.08)			MAYOR	3060.43
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO=300A400mm)CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30mm y 40mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2)CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES-FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA YL OS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	183.38	360.11		$ 258,037.00	$ 92,921,704.07	$ (45,602,879.01)			MAYOR	176.73
MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, MASILLA, CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E=12 CM	M2	0.00	24.32		$ 164,556.00	$ 4,002,001.92	$ (4,002,001.92)			MAYOR	24.32

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M2	30.00	18.00		$ 22,722.00	$ 408,996.00	$ 272,664.00			MENOR	-12.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120X30CM, 40W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	16.00	12.00		$ 232,000.00	$ 2,784,000.00	$ 928,000.00			MENOR	-4.00
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	0.00	54.61	46.61	$ 16,770.00	$ 915,809.70	$ (915,809.70)			MAYOR	54.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	16.00	16.00		$ 175,743.00	$ 2,811,888.00	$ -			IGUAL	0.00
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	129.47	187.68	112.68	$ 21,050.00	$ 3,950,664.00	$ (1,225,320.50)			MAYOR	58.21
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A= 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00	54.61	41.51	$ 20,533.00	$ 1,121,307.13	$ (1,121,307.13)			MAYOR	54.61
PLACA EN CONCRETO 3000 PSI DE 15CM SOBRE LAMINA COLABORANTE 2"	M2	0.00	9.00		$ 238,672.00	$ 2,148,048.00	$ (2,148,048.00)			MAYOR	9.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5MM, DE 0.15X 0.15 M	KG	0.00	18.70		$ 7,344.00	$ 137,332.80	$ (137,332.80)			MAYOR	18.70
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120X30CM, 40W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	16.00	12.00		$ 232,000.00	$ 2,784,000.00	$ 928,000.00			MENOR	-4.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	12.00	15.00		$ 29,027.00	$ 435,405.00	$ (87,081.00)			MAYOR	
DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00	7.20		$ 25,077.00	$ 180,554.40	$ (180,554.40)			MAYOR	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	0.00	3.00		$ 11,663.00	$ 34,989.00	$ (34,989.00)			MAYOR	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.00	16.15		$ 69,499.00	$ 1,122,408.85	$ (1,122,408.85)			MAYOR	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	0.00	4.50		$ 151,090.00	$ 679,905.00	$ (679,905.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	0.00	11.00	4	$ 89,260.00	$ 981,860.00	$ (981,860.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	0.00	4.00	0	$ 39,716.00	$ 158,864.00	$ (158,864.00)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	0.00	5.00	0	$ 123,679.00	$ 618,395.00	$ (618,395.00)			MAYOR	

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8.00	4.00	0	$ 206,316.00	$ 825,264.00	$ 825,264.00			MENOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	0.00	8.70	0	$ 238,656.00	$ 2,076,307.20	$ (2,076,307.20)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2	0.00	8.73	0	$ 192,870.00	$ 1,683,755.10	$ (1,683,755.10)			MAYOR	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0.00	22.15	0	$ 42,602.00	$ 943,634.30	$ (943,634.30)			MAYOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD	M2	0.00	2.76	0	$ 161.49	$ 445.72	$ (445.72)			MAYOR	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. LOS TEJARES	**$ 195,525,869.72**					
CPF	**576**	**IED**	**DIEGO MONTAÑA CUELLAR**			**SEMANA No. 25**					
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	16.32	16.66	0	$ 4,127.00	$ 68,755.82	$ (1,403.18)			MAYOR	0.34
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M2	30.00	117.20		$ 30,319.00	$ 3,553,386.80	$ (2,643,816.80)			MAYOR	87.20
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.32	2.40		$ 67,341.00	$ 161,618.40	$ 196,635.72			MENOR	-2.92
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.32	16.66		$ 31,765.00	$ 529,204.90	$ (10,800.10)			MAYOR	0.34
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34.00	18.82	0	$ 21,734.00	$ 409,033.88	$ 329,922.12			MENOR	-15.18
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	41.18	31.05	0	$ 12,327.00	$ 382,753.35	$ 124,872.51			MENOR	-10.13
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	4.06	6.84	0	$ 32,330.00	$ 221,137.20	$ (89,877.40)			MAYOR	2.78
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND	8.00	10.00	0	$ 26,588.00	$ 265,880.00	$ (53,176.00)			MAYOR	2.00

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0.00	57.96		$ 42,602.00	$ 2,469,211.92	$ (2,469,211.92)			MAYOR	57.96
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.00	7.26	0	$ 69,499.00	$ 504,562.74	$ (504,562.74)			MAYOR	7.26
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	16.32	15.75	0	$ 44,137.00	$ 695,157.75	$ 25,158.09			MENOR	-0.57
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	0.00	40.59		$ 44,137.00	$ 1,791,520.83	$ (1,791,520.83)			MAYOR	40.59
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	16.32	15.80		$ 44,137.00	$ 697,364.60	$ 22,951.24			MENOR	-0.52
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	0.45	0.44		$ 1,022,891.00	$ 450,072.04	$ 10,228.91			MENOR	-0.01
DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESTRUCTURA EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA FIBRO CEMENTO A UNA CARA DE 1/2" CON ESTRUCTURA . INCLUYE ARME Y DESARME DE ANDAMIOS, PARA ALTURAS MAXIMAS DE 10 METROS CON ANDAMIO CERTIFICADO, PARA ANCHOS DE HASTA 60 CM, INCLUYE ESTUCO Y PINTURA PARA EXTERIORES, PARA IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A - OCALIDAD DE USME	M	0.00	839.16	257.72	$ 219,057.00	$ 183,823,872.12	$ (183,823,872.12)			MAYOR	839.16
SUMINISTROEINSTALACIÓNDEMEDIACAÑAENGRANITOPULIDOBLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M2	20.60	22.41		$ 80,091.00	$ 1,794,839.31	$ (144,964.71)			MAYOR	1.81
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑOS ED, ESPESOR DE 1 CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.17	2.50		$ 1,099,280.00	$ 2,748,200.00	$ (362,762.40)			MAYOR	0.33
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	2.00	4.00		$ 418,333.00	$ 1,673,332.00	$ (836,666.00)			MAYOR	2.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	2.00		$ 752,783.00	$ 1,505,566.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADODE 1"	M2	8.28	6.34		$ 964,177.00	$ 6,112,882.18	$ 1,870,503.38			MENOR	-1.94
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5.00	5.00		$ 11,663.00	$ 58,315.00	$ -			IGUAL	0.00
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	3.00	5.00		$ 7,280.00	$ 36,400.00	$ (14,560.00)			MAYOR	2.00
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	ML	10.00	5.52		$ 57,553.00	$ 317,692.56	$ 257,837.44			MENOR	-4.48
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	40.00	21.82		$ 7,070.00	$ 154,267.40	$ 128,532.60			MENOR	-18.18
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	5.00	5.00		$ 65,687.00	$ 328,435.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	5.00	5.00		$ 61,917.00	$ 309,585.00	$ -			IGUAL	0.00

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	5.00	5.00		$ 94,820.00	$ 474,100.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	2.00		$ 123,679.00	$ 247,358.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE ,	UN	4.00	4.00		$ 205,343.00	$ 821,372.00	$ -			IGUAL	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE FLUXOMETRO, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	UN	1.00	2.00		$ 2,609,918.00	$ 5,219,836.00	$ (2,609,918.00)			MAYOR	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE MOVILIDAD REDUCIDA (NO INCLUYE ACCESORIOS)	UN	0.00	1.00		$ 1,019,900.00	$ 1,019,900.00	$ (1,019,900.00)			MAYOR	1.00
UMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN)	UN	1.00	1.00		$ 1,133,330.00	$ 1,133,330.00	$ -			IGUAL	0.00
UMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN)SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00	2.00		$ 40,084.00	$ 80,168.00	$ 80,168.00			MENOR	-2.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2.00	2.00		$ 32,716.00	$ 65,432.00	$ -			IGUAL	0.00
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	105.59	15.80		$ 29,027.00	$ 458,626.60	$ 2,606,334.33			MENOR	-89.79
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	0.00	19.50		$ 26,548.00	$ 517,686.00	$ (517,686.00)			MAYOR	19.50
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	0.00	324.17		$ 7,413.00	$ 2,403,072.21	$ (2,403,072.21)			MAYOR	324.17
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. DIEGO MONTAÑA CUELLAR					$ 223,503,927.61					
CPF	1919	IED	ESTRELLA DEL SUR SEDE C			SEMANA No. 12					
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	62.00	49.20		$ 30,319.00	$ 1,491,694.80	$ 388,083.20			MENOR	-12.80
DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	47.25	90.19		$ 112,034.00	$ 10,104,346.46	$ (4,810,739.96)			MAYOR	42.94
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.15	16.15		$ 32,330.00	$ 522,129.50	$ -			IGUAL	0.00

Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	130.05	285.70		$ 32,330.00	$ 9,236,681.00	$ (5,032,164.50)			MAYOR	155.65
Suministro e instalación de portón metálico plegable con marco montante en lámina Cold rolled lisa calibre 18. Incluye bisagras, cerradura, pasador superior e inferior, doble manija interior - exterior, terminada con anticorrosivo, pintura esmalte - verificar en obra medidas, ángulos y numero de hoja, color gris o similar	M2	0.00	16.15		$ 1,078,457.00	$ 17,417,080.55	$ (17,417,080.55)			MAYOR	16.15
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS	M2	47.25	74.00		$ 393,484.64	$ 29,117,863.36	$ (10,525,714.12)			MAYOR	26.75
COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20X25 CM (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO), ESTE ITEM CORRESPONDE AL COLEGIO ESTRELLA DEL SUR SEDE C, PARA UNA CANTIDAD TOTAL DE 3 METROS	ML	0.00	5.80		$ 119,563.00	$ 693,465.40	$ (693,465.40)			MAYOR	5.80
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 20 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO, ESTE ITEM CORRESPONDE AL COLEGIO ESTRELLA DEL SUR SEDE C	ML	0.00	29.70		$ 107,977.00	$ 3,206,916.90	$ (3,206,916.90)			MAYOR	29.70
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	0.00	19.92		$ 42,602.00	$ 848,631.84	$ (848,631.84)			MAYOR	19.92
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	0.00	64.56		$ 23,603.00	$ 1,523,809.68	$ (1,523,809.68)			MAYOR	64.56
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	0.00	99.20		$ 4,822.00	$ 478,342.40	$ (478,342.40)			MAYOR	99.20
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M2	0.00	15.12		$ 11,088.00	$ 167,650.56	$ (167,650.56)			MAYOR	15.12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM	0.00	920.00		$ 1,564.00	$ 1,438,880.00	$ (1,438,880.00)			MAYOR	920.00
	SUBTOTAL I.E.D.	SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR SEDE C				$ 76,247,492.45					
CPF	**1962**		**ESTRELLA DEL SUR SEDE D**			**SEMANA No. 19**					
Suministro e instalación de portón metálico plegable con marco montante en lámina Cold rolled lisa calibre 18. Incluye bisagras, cerradura, pasador superior e inferior, doble manija interior - exterior, terminada con anticorrosivo, pintura esmalte - verificar en obra medidas, ángulos y numero de hoja, color gris o similar	M2		7.37		$ 1,078,457.00	$ 7,949,306.55	$ (7,949,306.55)				7.37
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	0.00	2038.11		$ 22,456.00	$ 45,767,805.33	$ (45,767,805.33)			MAYOR	2038.11


Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($) + AIU	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	mayores o menores cantidades de obra	Observaciones
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	88.90	78.34		$ 35,817.00	$ 2,805,903.78	$ 378,227.52			MENOR	-10.56
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO=300A400mm)CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30mm y 40mm, PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2)CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES-FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA YL OS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	88.23	100.51		$ 258,037.00	$ 25,935,298.87	$ (3,168,694.36)			MAYOR	12.28
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12(F)+1N°12(N)+1N°12(T)AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8.00	18.00	8.00	$ 175,743.00	$ 3,163,374.00	$ (1,757,430.00)			MAYOR	10.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120X30CM,40W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00	18.00	8.00	$ 232,000.00	$ 4,176,000.00	$ (2,320,000.00)			MAYOR	10.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M2	45.00	20.00	20.00	$ 22,722.00	$ 454,440.00	$ 568,050.00			MENOR	-25.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UND	0.00	1.00	1.00	$ 558,005.00	$ 558,005.00	$ (558,005.00)			MAYOR	1.00
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR SEDE C					$ 90,810,133.53					


PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA		90.79%
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA	$	2,599,413,373.10
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	2,863,122,191.27

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Mayo 03 de 2026


SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
FANNY MICKEY	$ 814,870,147.30	100.00%	$ 814,870,147.30	100.00%	$ 814,870,147.30	ENTREGADO
OFELIA URIBE	$ 215,397,286.26	88.90%	$ 226,464,757.04	93.46%	$ 242,305,285.25	4.57%
BRISAS DEL DIAMANTE	$ 706,778,611.33	100.00%	$ 706,778,611.33	100.00%	$ 706,778,611.33	0.00%
ESTRELLA DEL SUR - D	$ 90,810,133.53	100.00%	$ 90,810,133.53	100.00%	$ 90,810,133.53	ENTREGADO
LOS TEJARES - A	$ 237,220,991.57	97.95%	$ 195,525,869.72	80.74%	$ 242,176,869.00	-17.22%
COMPARTIR EL RDO - A	$ 222,254,488.55	79.90%	$ 265,212,434.12	95.34%	$ 278,172,403.41	15.44%
DIEGO MONTAÑA - A	$ 294,629,371.49	71.55%	$ 223,503,927.61	54.28%	$ 411,761,249.00	-17.27%
ESTRELLA DEL SUR - C	$ 76,247,492.45	100.00%	$ 76,247,492.45	100.00%	$ 76,247,492.45	ENTREGADO
TOTALES	$ 2,658,208,522.48	92.84%	$ 2,599,413,373.10	90.79%	$ 2,863,122,191.27	-2.05%

OBSERVACIONES: Al final del presente periodo, encontramos que en las ***IED Fanny Mickey y Brisas del Diamante*** finalizó el alcance inicial de las actividades- Por otro lado los colegios ***Tejares y Diego Montaña registran atrasos del 17.22 y 17.27%*** respectivamente. ***Ofelia Uribe y Compartir Recuerdo,*** luego de la reprogramación avalada por interventoría, presenta adelantos del 4.57 y 15.44%. El porcentaje de atraso del contrato se encuentra un poco por encima del 2.00%.

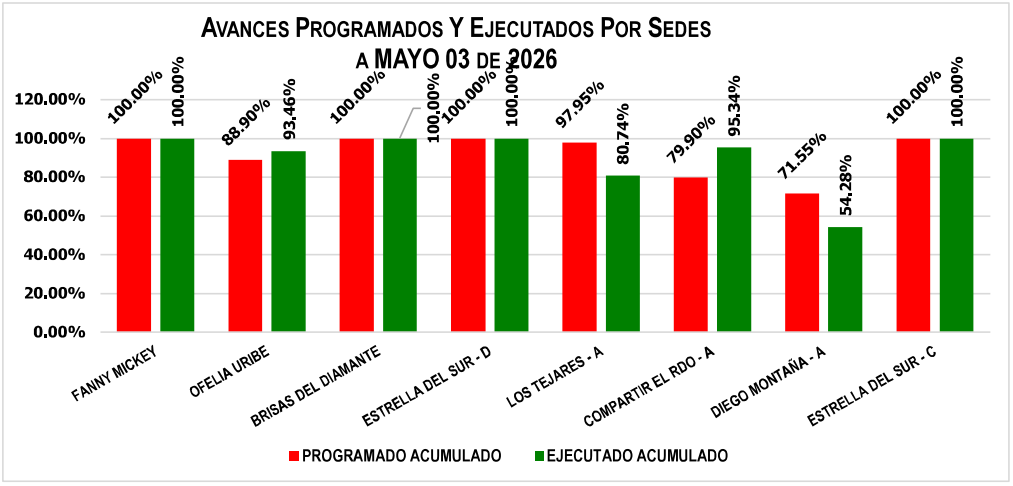

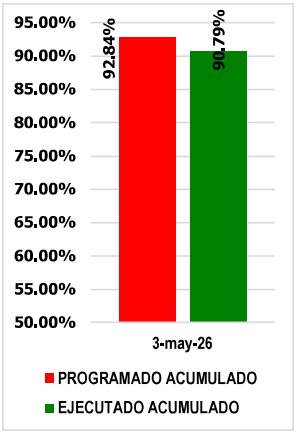

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - MAY. 03 2026

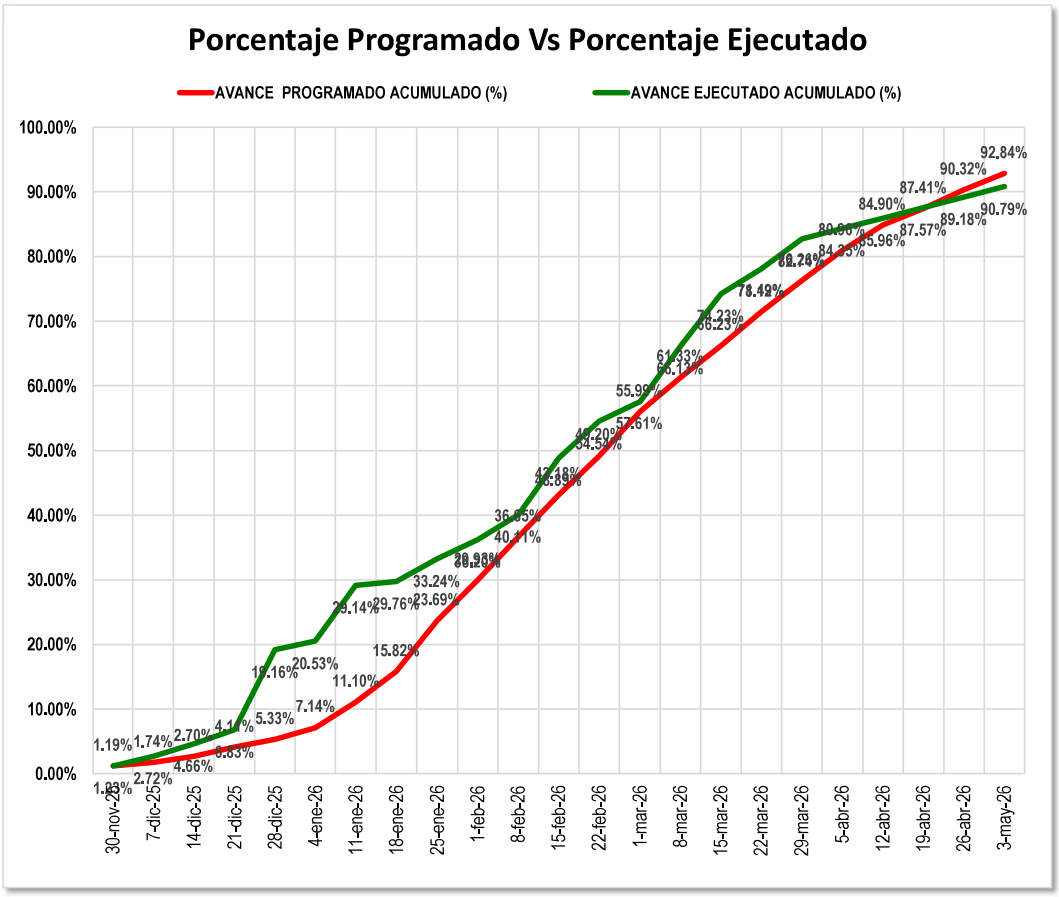

FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0.00%	0.00%
16-nov-25	0.11%	0.19%
23-nov-25	0.58%	0.70%
30-nov-25	1.19%	1.23%
7-dic-25	1.74%	2.72%
14-dic-25	2.70%	4.66%
21-dic-25	4.11%	6.83%
28-dic-25	5.33%	19.16%
4-ene-26	7.14%	20.53%
11-ene-26	11.10%	29.14%
18-ene-26	15.82%	29.76%
25-ene-26	23.69%	33.24%
1-feb-26	29.93%	36.20%
8-feb-26	36.65%	40.11%
15-feb-26	43.18%	48.89%
22-feb-26	49.20%	54.54%
1-mar-26	55.99%	57.61%
8-mar-26	61.33%	66.13%
15-mar-26	66.23%	74.23%
22-mar-26	71.49%	78.12%
29-mar-26	76.26%	82.74%
5-abr-26	80.96%	84.35%
12-abr-26	84.90%	85.96%
19-abr-26	87.41%	87.57%
26-abr-26	90.32%	89.18%
3-may-26	**92.84%**	**90.79%**
10-may-26	95.01%	
17-may-26	96.69%	
24-may-26	98.26%	
31-may-26	99.54%	
1-jun-26	100.00%	

FECHA:	3/05/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME APOYO A LA SUPERVISIÓN
DIAS RESTANTES	48 Días		GRUPO 5
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	consorcio FORTALEZA	
3 de mayo de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	consorcio SERINCO educativo	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168110	CO1.PCCNTR.8154895	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131	$ 1,965,028,364
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ 128,425,720.00	$ 315,000,000.00
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRORROGAS	46	46	TOTAL	$ 924,609,851.00	$ 2,280,028,364
TERMINACION FINAL	20 de junio de 2026	20 de junio de 2026	TOTAL	257	257			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1		$ 128,425,720.00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1		$ 315,000,000.00		
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH – 100048043 – Anexo 0	4 9 2025	4 10 2026	4 4 2026	4 4 2031	4 9 2025	4 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
320 – 47 – 994030033722	1 9 2025	1 12 2026	3 9 2025	3 4 2029	3 4 2026	3 4 2028	320 – 74 – 994030015128	1 9 2025	1 4 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (04-01-2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA
1923	LA ARABIA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	La Arabia	100.00%	100.00%	↓	100.00%	↓	$ 216,309,160.00	$ 216,308,158.83	24/11/2025	12/02/2026
1934	JOSE JAIME ROJAS (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	JOSE JAIME ROJAS (IED)	49.51%	52.74%	↑	55.35%	↓	$ 288,195,692.89	$ 190,809,179	18/11/2025	19/06/2026
540	MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)	USME	A	Miguel de Cervantes Saavedra	24.71%	31.97%	↑	23.80%	↑	$ 473,080,399.41	$ 151,266,822	13/01/2026	15/06/2026
1983	JOSE MARIA VARGAS VILA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Jose Maria Vargas Vila - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas	100.00%	100.00%	↓	100.00%	↓	$ 259,085,355.00	$ 259,085,206.18	10/11/2025	14/02/2026
550	ATABANZHA (IED)	USME	A	Valle de Cafam	86.45%	100.00%	↑	100.00%	✓	$ 154,311,171.56	$ 154,311,172	13/01/2026	18/04/2026
1973	DON BOSCO I	CIUDAD BOLIVAR	A	La Joya (Don Bosco I)	65.61%	75.39%	↑	63.19%	↑	$ 334,388,530.08	$ 252,107,880.29	10/11/2025	20/06/2026
508	BRASILIA - USME (IED)	USME	A	Brasilia	52.51%	61.38%	↑	58.20%	↑	$ 173,127,488.07	$ 106,261,427	15/12/2025	8/06/2026
566	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	USME	A	Nuevo Monteblanco- Eduardo Mora Osejo	100.00%	100.00%	↓	100.00%	↓	$ 69,333,391.78	$ 69,333,392	24/11/2025	24/01/2026
1986 L	BICENTENARIO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	La Esperanza - El tesoro - Lucero - La Joya	64.11%	75.02%	↑	78.22%	↓	$ 151,494,333.81	$ 113,649,999	19/01/2026	21/05/2026
TOTAL FRENTES DE OBRA						71.40%	↑	68.07%	↑	$ 2,119,224,523	$ 1,513,133,046		
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO													
1943	RAFAEL URIBE URIBE (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A		0.00%	100.00%	↑	100.00%	✓		$ 36,241,814.46	30/04/2026	2/05/2026
1931	EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B		80.68%	100.00%	↑	100.00%	✓	$ 82,019,485.13	$ 62,550,541	24/03/2026	8/05/2026
546	SANTA LIBRADA (IED)	USME	A		63.92%	100.00%	↑	75.00%	↑	$ 2,046,386.79	$ 2,165,225	13/04/2026	7/05/2026
523	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	C		92.28%	100.00%	↑	100.00%	✓	$ 36,795,761.66	$ 34,510,360	6/04/2026	17/05/2026
564	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	USME	B		100.00%	100.00%		100.00%		$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00		
556	NUEVA ESPERANZA (IED)	USME	A				↓		✓				
							↓		✓				
TOTAL FRENTES DE OBRA						100.00%	↑	95.00%	↑	$ 124,381,574	$ 138,976,742		

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
1	3	0	4	$ 1,513,133,046
ACUMULADO EMERGENCIAS				
4	1	0	5	$ 138,976,742
TOTAL				
5	4	0	9	$ 1,652,109,788
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	71.40%	0.00%	81.32%
PROGRAMADO	68.07%		
ATRASO	3.33%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			







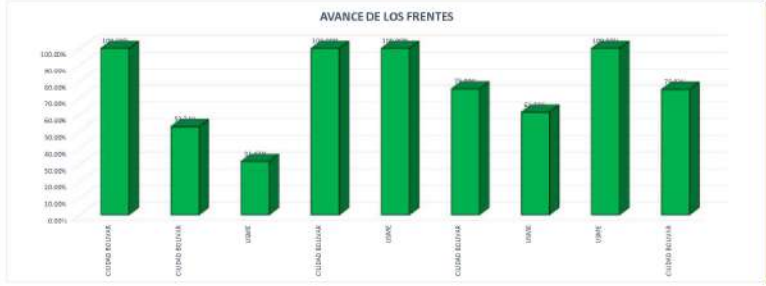

OBSERVACIONES:

FECHA:	31/08/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME	
DIAS RESTANTES	48 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARÍA DE ACESO Y PERMANANCIA		APOYO A LA SUPERVISION	
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		GRUPO	5
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0	
3/5/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 75.39%	DON BOSCO - LA JOYA	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA DE 0,15X 0.15M			
		PLACA CONTRA PISO DE 10 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.			
		CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN DETUBERÍAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS.			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES			
2A 100.00%	JOSE MARIA VARGAS VILA (IED)	IED ENTREGADO.			
3A 52.74%	JOSE JAIME ROJAS (IED)	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoria autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede			

FECHA:	31/08/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME	
DÍAS RESTANTES	48 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANANCIA			APOYO A LA SUPERVISION	
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			GRUPO	5
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0		
3/5/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0		

3A 52.74%	JOSE JAIME ROJAS (IED)	DESMONTE DE TODO TÍPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR,)			
		DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERIAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)			
		DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)			
		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA INCLIYE IZAJE, SOLDADURA , ANTICORROZIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA).			
4A 100.00%	LA ARABIA (IED)	IED ENTREGADO.			
5A 100.00%	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	IED ENTREGADO.			

FECHA:	31/08/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME	
DÍAS RESTANTES	48 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				APOYO A LA SUPERVISION	
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANANCIA				GRUPO	5
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS					
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0			
3/8/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0			

4A 61.38%	BRASILIA - USME (IED)	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO INDLUYE FILOS DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)			
		MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4			
7A 100.00%	ATABANZHA (IED)	IED ENTREGADO.			
8A 31.97%	MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			
		RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 6" INCLUYE ACCESORIOS			

FECHA:	31/08/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME	
DÍAS RESTANTES	48 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANANCIA			APOYO A LA SUPERVISION	
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			GRUPO	5
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0		
3/8/26	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0		

8A **31.97%**	**MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M			
		MESÓN EN CONCRETO ACABADO EN GRANITO PULIDO BLANCO, LAVAMANOS A= 0.55 M. DESPENSAS A= 0.45 M, COCINA A= 0.60 M, AULAS A= 0.55 M (INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE).			
		ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)			
		ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM			
		VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)			

FECHA: 31/08/2024		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME
DÍAS RESTANTES 48 Días		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				APOYO A LA SUPERVISION
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANANCIA				GRUPO 5
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0		
3/8/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0		
8A 31.97%	MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE				
9A 75.02%	BICENTENARIO (IED)	CERRAMIENTO EN LONA (Incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 - ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).				
		DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE				
		DESTRONQUE PLACAS DE CONCRETO				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)				
10A 100.00%	EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED)	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)				

FECHA:	31/08/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME
DÍAS RESTANTES	48 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANANCIA	APOYO A LA SUPERVISION
REGISTRO FOTOGRAFICO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	GRUPO 5
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA: 0
3/8/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR: 0

10A 100,00%	EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED)	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)			
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1.2 M (INCLUYE ANDAMIOS..			
		ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA			
11A 100,00%	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	EMERGENCIA ENTREGADA.			
12A 100,00%	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)			
		ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA			

FECHA:	31/08/2024	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME	
DÍAS RESTANTES	48 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			APOYO A LA SUPERVISION	
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANANCIA			GRUPO	5
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154895	CONTRATISTA:	0		
3/8/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	0		
	0					

13A 100.00%	SANTA LIBRADA (IED)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE REJILLACON SOSCO DE 4" A 3"			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS			
		PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS			
14A 100.00%	RAFAEL URIBE URIBE (IED)	IED TERMINADO A ESPERA DE ENTREGA.			

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
Item / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
CPF	1973	IED			DON BOSCO I			SEMANA		25		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	$ 175.12		175.12	310.26		$ 4,065.45	$ 1,261,347.98	$ (549,405.55)	177.17%	177.17%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	59.97		59.97	161.41		$ 29,861.65	$ 4,819,969.27	$ (3,029,165.99)	269.15%	269.15%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	175.12		175.12	163.23		$ 66,326.11	$ 10,826,411.26	$ 788,617.47	93.21%	93.21%	
DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	175.12		175.12	163.23		$ 27,546.47	$ 4,496,410.27	$ 327,527.53	93.21%	93.21%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	35.02	(40.98)	(5.96)	80.55		$ 129,963.14	$ 10,468,531.29	$ (5,917,221.97)	230.01%	230.01%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	2.11		2.11	2.11		$ 88,298.00	$ 186,308.78	$ -	100.00%	100.00%	
CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2	163.23		163.23	159.20		$ 53,214.00	$ 8,471,668.80	$ 214,452.42	97.53%	97.53%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M2		(4.08)		4.08		$ 168,996.00	$ 689,503.68	$ (689,503.68)	-100.00%	-100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	175.12		175.12	175.87		$ 11,259.00	$ 1,980,120.33	$ (8,444.25)	100.43%	100.43%	
CASETONES	M2	175.12		175.12	163.23		$ 47,415.00	$ 7,739,550.45	$ 563,764.35	93.21%	93.21%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	2,206.35		2,206.35	1,232.47		$ 6,964.00	$ 8,582,921.08	$ 6,782,100.32	55.86%	55.86%	
SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA DE 0.15X 0.15M	KG	365.02		365.02	466.55	23.47	$ 6,618.00	$ 3,087,627.90	$ (671,925.54)	127.81%	127.81%	
VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X15 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO).	M	75.84		75.84	124.41		$ 55,214.00	$ 6,869,173.74	$ (2,681,743.98)	164.04%	164.04%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 1 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE REFUERZO.	M	239.35		239.35	263.97		$ 93,190.00	$ 24,599,364.30	$ (2,294,337.80)	110.29%	110.29%	
PLACA CONTRA PISO DE 10 CM- CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	175.12		175.12	184.32	10.54	$ 110,642.00	$ 20,393,533.44	$ (1,017,906.40)	105.25%	105.25%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	175.12		175.12	163.23		$ 40,939.00	$ 6,682,472.97	$ 486,764.71	93.21%	93.21%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	175.12		175.12	163.23		$ 202,089.00	$ 32,986,987.47	$ 2,402,838.21	93.21%	93.21%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS.	M3	137.11		137.11	137.11		$ 45,115.00	$ 6,185,717.65	$ -	100.00%	100.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	20.47		20.47	57.14	36.67	$ 17,938.00	$ 1,024,977.32	$ (657,786.46)	279.14%	279.14%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES	M2	159.61		159.61	115.28	41.76	$ 736,301.00	$ 84,880,779.28	$ 32,640,223.33	72.23%	72.23%	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N*12 (F) + 1N*12 (N) + 1N*12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	14.00		14.00	14.00		$ 203,206.00	$ 2,844,884.00	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	47.80		47.80	47.80		$ 22,380.00	$ 1,069,764.00	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2" INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	60.61		60.61	60.61		$ 14,607.00	$ 885,330.27	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	175.12		175.12	240.01		$ 4,477.00	$ 1,074,524.77	$ (290,512.53)	137.05%	137.05%	
	SUBTOTAL I.E.D. DON BOSCO - LA JOYA							$ 252,107,880.29				
CPF	1983	IED			JOSE MARIA VARGAS VILA			SEMANA		17		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar	M2	3,001.00		3,001.00	525.00		$ 4,065.45	$ 2,134,363.71	$ 12,200,429.50	17.49%	17.49%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	45.00		45.00	42.00		$ 29,861.65	$ 1,254,189.39	$ 1,343,774.34	93.33%	93.33%	
MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2	83.41		83.41	83.41		$ 51,695.35	$ 4,311,909.31	$ 4,311,909.31	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS) INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	219.55		219.55	270.00		$ 23,029.90	$ 6,218,072.97	$ 5,056,214.52	122.98%	122.98%	
ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METALICOS DOS CARAS	M2	24.84		24.84	24.84		$ 26,632.05	$ 661,540.05	$ 661,540.05	100.00%	100.00%	
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	153.45		153.45	273.34		$ 37,143.16	$ 10,152,712.61	$ 5,699,618.61	178.13%	178.13%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	511.50		511.50	525.00		$ 346,857.39	$ 182,100,127.81	$ 177,417,553.10	102.64%	102.64%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA DE ALTO TRAFICO	M2	490.59		490.59	525.00		$ 30,742.21	$ 16,139,658.65	$ 15,081,819.31	107.01%	107.01%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PREONDULADA GALVANIZADA CUADRADA 1 1/2" CAL 10	M2	11.56		11.56	15.00		$ 172,046.90	$ 2,580,703.49	$ 1,988,862.15	129.76%	129.76%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	212.00			330.00		$ 36,576.90	$ 12,070,376.94	$ 7,754,302.76	155.66%	155.66%	
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE CON DESTRONCADO, INCLUYE DESBASTE Y PULIDO	M2	525.10			525.00		$ 36,402.14	$ 19,111,125.35	$ 19,114,765.56	99.98%	99.98%	
ASEO FINAL Y LIMPIEZA	M2	511.20		511.20	525.00		$ 4,477.00	$ 2,350,425.00		102.70%	102.70%	
					SUBTOTAL I.E.D. JOSÉ MARÍA VARGAS VILA			$ 259,085,206.18				
CPF	1934	IED			JOSE JAIME ROJAS (IED)			SEMANA		23		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede	M2	475.39		475.39	234.66	44.61	$ 4,065.45	$ 953,999.60	$ 1,751,316.57	49.36%	49.36%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	95.38		95.38	20.81		$ 29,861.65	$ 621,420.98	$ 2,848,204.38	21.82%	21.82%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS	M2	398.60		398.60	162.71		$ 35,277.00	$ 5,739,920.28	$ 14,061,411.25	40.82%	40.82%	
DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	101.22		101.22	83.04		$ 25,708.00	$ 2,134,792.32	$ 2,602,163.76	82.04%	82.04%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.)	M2	113.51		113.51	73.78	9.61	$ 31,263.00	$ 2,306,584.14	$ 3,248,225.70	65.00%	65.00%	
DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS).	M	195.28		195.28	9.40		$ 4,215.00	$ 39,621.00	$ 823,105.20	4.81%	4.81%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	6.00		6.00	6.00	6.00	$ 15,561.00	$ 93,366.00		100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	6.00		6.00	6.00	6.00	$ 9,715.00	$ 58,290.00		100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA INCLUYE IZAJE, SOLDADURA , ANTICORROZIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA).	KG	4,879.35		4,879.35	4,171.79	500.00	$ 22,117.00	$ 92,267,479.43	$ 96,858,083.95	85.50%	85.50%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERIA PVC Ø3/4" HASTA 4M. (INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONECXION E INS.	UN	14.00		14.00	2.00		$ 121,815.00	$ 243,630.00	$ 1,705,410.00	14.29%	14.29%	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	32.00		32.00	4.00		$ 203,206.00	$ 812,824.00	$ 6,502,592.00	12.50%	12.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	10.00		10.00	31.36		$ 22,380.00	$ 701,836.80	$ 223,800.00	313.60%	313.60%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	30.00		30.00	29.00		$ 173,095.00	$ 5,019,755.00	$ 5,192,850.00	96.67%	96.67%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	6.00		6.00	6.00		$ 228,505.00	$ 1,371,030.00	$ 1,371,030.00	100.00%	100.00%	
PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ÁREAS DE CULATAS (HASTA 30 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M	74.86		74.86	95.86		$ 14,693.00	$ 1,408,470.98	$ 1,099,917.98	128.05%	128.05%	
VINILO TIPO 1 A TRE MANOS (INCLUYE ANDAMIOS)	M2	765.09		765.09	99.12		$ 20,733.00	$ 2,055,054.96	$ 15,862,610.97	12.96%	12.96%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	M	148.04	-285.76	148.04	433.80		$ 19,062.00	$ 8,269,095.60	$ 2,821,938.48	293.03%	293.03%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20- DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	50.07		50.07	27.98		$ 102,002.00	$ 2,854,015.96	$ 5,107,240.14	55.88%	55.88%	
BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS).	M	24.00		24.00	5.00		$ 68,406.00	$ 342,030.00	$ 1,641,744.00	20.83%	20.83%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO) 300 A 400mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm Y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC.	M2	224.22		224.22	216.51		$ 254,148.00	$ 55,025,583.48	$ 56,985,064.56	96.56%	96.56%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	M	11.00		11.00	10.74		$ 293,259.00	$ 3,149,601.66	$ 3,225,849.00	97.64%	97.64%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2	8.75		8.75	17.86		$ 242,573.00	$ 4,332,353.78	$ 2,122,513.75	204.11%	204.11%	
ASEO FINAL Y LIMPIEZA	M2	414.60		414.60	134.87		$ 7,477.00	$ 1,008,422.99	$ 3,099,964.20	32.53%	32.53%	
					SUBTOTAL I.E.D. JOSÉ JAIME ROJAS			$ 190,809,178.96				
CPF	1923	IED			LA ARABIA (IED)			SEMANA		18		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede	M2	176.20		176.20	137.29		$ 4,065.45	$ 558,146.27	$ 716,333.11	77.92%	77.92%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	145.00	(36.80)	108.20	181.80		$ 29,861.65	$ 5,428,848.32	$ 4,329,939.53	125.38%	125.38%	
DEMOLICIÓN DE PLACA MACIZA H=0.08 A 0.10 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	31.20		31.20	9.78		$ 66,326.11	$ 648,669.37	$ 2,069,374.68	31.35%	31.35%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	14.25		14.25	12.96		$ 31,843.58	$ 412,692.77	$ 453,770.99	90.95%	90.95%	
DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE	M2	290.00		290.00	297.75		$ 47,789.75	$ 14,229,302.96	$ (370,275.00)	102.67%	102.67%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.00		145.00	152.10		$ 11,290.07	$ 1,717,219.61	$ 1,637,060.11	104.90%	104.90%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	178.56		178.56	40.16		$ 129,963.14	$ 5,219,319.85	$ 23,206,218.94	22.49%	22.49%	
VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3	10.44		10.44	12.70		$ 1,005,997.50	$ 12,776,168.31	$ 10,502,613.95	121.65%	121.65%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	812.00	(758.00)	812.00	1,570.00		$ 6,964.51	$ 10,934,284.87	$ 5,655,184.28	193.35%	193.35%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	362.50		362.50	303.00		$ 482,866.56	$ 146,308,566.36	$ 175,039,126.42	83.59%	83.59%	
PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE NO INCLUYE ACERO)	M3	5.18		5.18	5.18		$ 1,622,667.78	$ 8,397,305.75	$ 8,405,419.09	99.90%	99.90%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	14.25		14.25	12.96		$ 699,301.55	$ 9,062,948.15	$ 9,965,047.15	90.95%	90.95%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	393.70		393.70	137.29		$ 4,477.28	$ 614,686.25	$ 1,762,706.50	34.87%	34.87%	
				SUBTOTAL I.E.D. LA ARABIA				$ 216,308,158.83				
CPF	566	IED		LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)				SEMANA	13			
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	145.00	52.06	197.06	68.00		$ 4,065.45	$ 276,450.92	$ 589,490.93	46.90%	46.90%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	42.50		42.50	15.00		$ 2,206.81	$ 33,102.09	$ 93,789.27	35.29%	35.29%	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56.00		56.00	5.00		$ 78,804.00	$ 394,020.00	$ 4,413,024.00	8.93%	8.93%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	17.00	(7.00)	17.00	24.00		$ 19,878.87	$ 477,092.82	$ 337,940.75	141.18%	141.18%	
DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TODO TIPO DE ADOQUINES USADOS (INCLUYE CONFORMACIÓN DE NIVEL)	M2	36.00		36.00	36.00		$ 63,157.47	$ 2,273,668.85	$ 2,273,668.85	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	22.40		22.40	13.44		$ 88,297.99	$ 1,186,724.99	$ 1,977,874.99	60.00%	60.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	22.40		22.40	13.44		$ 168,996.00	$ 2,271,306.24	$ 3,785,510.40	60.00%	60.00%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	56.00		56.00	52.06		$ 110,642.00	$ 5,760,022.52	$ 6,195,952.00	92.96%	92.96%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	25.00	5.12	25.00	10.00		$ 40,765.00	$ 407,650.00	$ 1,019,125.00	40.00%	40.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	350		350	35.65		$ 6,964.00	$ 248,266.60	$ 2,437,400.00	10.19%	10.19%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	534.80	118.50	534.80	477.50		$ 6,818.00	$ 3,255,595.00	$ 3,646,266.40	89.29%	89.29%	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	4.80	6.00	4.80	6.00		$ 140,270.00	$ 841,620.00	$ 673,296.00	125.00%	125.00%	
LAVADO CON HIDROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	5.38		5.38			$ 9,334.00	$ -	$ 50,216.92	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	36.00		36.00	17.00		$ 87,915.00	$ 1,494,555.00	$ 3,164,940.00	47.22%	47.22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	18.00		18.00	13.00		$ 39,118.00	$ 508,534.00	$ 704,124.00	72.22%	72.22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS	UN	4.00		4.00	4.00		$ 177,448.00	$ 709,792.00	$ 709,792.00	100.00%	100.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UND	1.00		1.00	1.00		$ 840,807.00	$ 840,807.00	$ 840,807.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	67.20		67.20	52.00		$ 11,259.00	$ 585,468.00	$ 756,604.80	77.38%	77.38%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	56.00		56.00	52.00		$ 40,939.00	$ 2,128,828.00	$ 2,292,584.00	92.86%	92.86%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES	M2	56.00		56.00	52.06		$ 736,301.00	$ 38,331,830.06	$ 41,232,856.00	92.96%	92.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIONDE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTITUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5" TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4 ", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO PINTADA E INSTALADA VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS	M2	2.50		2.50	4.77		$ 516,204.00	$ 2,462,293.08	$ 1,290,510.00	190.80%	190.80%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE REJILLACON SOSCO DE 4" A 3"	UN	4.00		4.00	4.00		$ 32,223.00	$ 128,892.00	$ 128,892.00	100.00%	100.00%	
DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE.	UN	1.00		1.00	1.00		$ 3,424,439.00	$ 3,424,439.00	$ 3,424,439.00	100.00%	100.00%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	45.00		45.00	14.38		$ 39,551.00	$ 568,743.38	$ 1,779,795.00	31.96%	31.96%	
PINTURA EPOXÍCA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	20.40		20.40	23.54		$ 30,743.00	$ 723,690.22	$ 627,157.20	115.39%	115.39%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE DE FILTRO ZANJA DE 0.03 X 0.03 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000 GRAVA DE 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAXIMA 0.03 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12.00		12.00			$ 85,635.00	$ -	$ 1,027,620.00	0.00%	0.00%	
DEMOLICION DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTE DE ANCHO MENOR A 0.05 M (POR LAS 4 CARAS) INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE LA ZONA DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS.	M	1.64		1.64			$ 26,405.00	$ -	$ 43,304.20	0.00%	0.00%	
	SUBTOTAL I.E.D. LUIS EDUARDO MORA OSEJO							$ 69,333,391.78				
CPF	508	IED		BRASILIA - USME (IED)				SEMANA			20	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	79.50		79.50	50.39		$ 4,065.00	$ 204,835.35	$ 323,167.50	63.38%	63.38%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	44.16		44.16	5.40		$ 2,206.00	$ 11,912.40	$ 97,416.96	12.23%	12.23%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	34.00		34.00	40.00		$ 26,187.00	$ 1,047,480.00	$ 890,358.00	117.65%	117.65%	
DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	16.00		16.00	29.00		$ 14,081.00	$ 408,349.00	$ 225,296.00	181.25%	181.25%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0,08 M a 0,12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79.23		79.23	66.26		$ 31,286.00	$ 2,073,010.36	$ 2,478,789.78	83.63%	83.63%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	83.28		83.28	63.14		$ 21,406.00	$ 1,351,574.84	$ 1,782,691.68	75.82%	75.82%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	176.00		176.00	263.19		$ 12,141.00	$ 3,195,389.79	$ 2,136,816.00	149.54%	149.54%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	15.50		15.50	17.66		$ 31,843.00	$ 562,347.38	$ 493,566.50	113.94%	113.94%	
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.04		5.04	3.51		$ 28,212.00	$ 99,024.12	$ 142,188.48	69.64%	69.64%	
DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6" 4"3" 2"(INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUÉ Y RETIRODE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M	50.00		50.00	11.30		$ 26,930.00	$ 304,309.00	$ 1,346,500.00	22.60%	22.60%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	60.00		60.00	50.15		$ 17,938.00	$ 899,590.70	$ 1,076,280.00	83.58%	83.58%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	18.00		18.00	15.00		$ 60,985.00	$ 914,775.00	$ 1,097,730.00	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	20.00		20.00	27.00		$ 60,985.00	$ 1,646,595.00	$ 1,219,700.00	135.00%	135.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN	18.00		18.00	15.00		$ 174,544.00	$ 2,618,160.00	$ 3,141,792.00	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN	24.00		24.00	20.00		$ 93,391.00	$ 1,867,820.00	$ 2,241,384.00	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	12.00		12.00	10.00		$ 66,233.00	$ 662,330.00	$ 794,796.00	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN	2.00		2.00	2.00		$ 110,947.00	$ 221,894.00	$ 221,894.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN	1.00		1.00	1.00		$ 105,801.00	$ 105,801.00	$ 105,801.00	100.00%	100.00%	
CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80 EN MAMPOSTERÍA, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00		1.00	1.00		$ 840,807.00	$ 840,807.00	$ 840,807.00	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0,04	M2	79.23		79.23	61.80		$ 40,939.00	$ 2,530,030.20	$ 3,243,596.97	78.00%	78.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	95.52		95.52	32.65		$ 202,089.00	$ 6,598,205.85	$ 19,303,541.28	34.18%	34.18%	
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED BLANCA 30 X 45	M2	198.00		198.00	70.35		$ 94,283.00	$ 6,632,809.05	$ 18,668,034.00	35.53%	35.53%	
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE	UN	18.00		18.00	10.00		$ 1,066,706.00	$ 10,667,060.00	$ 19,200,708.00	55.56%	55.56%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	6.00		6.00	8.00		$ 741,439.00	$ 5,931,512.00	$ 4,448,634.00	133.33%	133.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	13.00		13.00	5.00		$ 1,083,037.00	$ 5,415,185.00	$ 14,079,481.00	38.46%	38.46%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	16.00		16.00	8.00		$ 388,380.00	$ 3,107,040.00		50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	12.00		12.00	6.00		$ 39,479.00	$ 236,874.00	$ 473,748.00	50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	81.43		81.43	29.00		$ 949,649.00	$ 27,539,821.00	$ 77,329,918.07	35.61%	35.61%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	8.00		8.00	7.00		$ 949,649.00	$ 6,647,543.00	$ 7,597,192.00	87.50%	87.50%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO INDLUYE FILOS DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	202.40		202.40	139.20	64.98	$ 39,551.00	$ 5,505,499.20	$ 5,435,098.42	68.77%	68.77%	
PINTURA EPOXÍCA 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO.	M2	64.00		64.00	19.59		$ 30,743.00	$ 602,255.37	$ 1,967,552.00	30.61%	30.61%	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6" (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	11.61		11.61	11.61		$ 15,549.00	$ 180,523.89	$ 180,523.89	100.00%	100.00%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	3.00		3.00	3.00		$ 1,177,272.00	$ 3,531,816.00	$ 3,531,816.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	14.00		14.00	2.40		$ 190,394.00	$ 456,945.60	$ 2,665,516.00	17.14%	17.14%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON NTI|CORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.46		1.46	1.46		$ 766,334.00	$ 1,118,847.64	$ 1,118,847.64	100.00%	100.00%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	4.51		4.51	4.51	4.51	$ 85,032.00	$ 383,494.32	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	79.50		79.50	31.26		$ 4,477.28	$ 139,959.88	$ 355,944.04	39.32%	39.32%	
				SUBTOTAL I.E.D. BRASILIA				$ 106,261,426.94				
CPF	550	IED		ATABANZHA (IED)				SEMANA			14	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	434.06		434.06	348.56		$ 4,065.00	$ 1,416,896.40	$ 1,764,453.90	80.30%	80.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	357.30		357.30	153.20		$ 2,606.00	$ 399,239.20	$ 931,123.80	42.88%	42.88%	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E=0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	166.80		166.80	116.80		$ 78,805.00	$ 9,204,424.00	$ 13,144,674.00	70.02%	70.02%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	66.72		66.72	28.33		$ 88,298.00	$ 2,501,482.34	$ 5,891,242.56	42.46%	42.46%	
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	33.36	$ (14.31)	33.36	14.31		$ 20,833.00	$ 298,120.23	$ 694,988.88	42.90%	42.90%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	33.36		33.36	124.19		$ 168,995.00	$ 20,987,489.05	$ 5,637,673.20	372.27%	372.27%	
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	166.80		166.80	123.28		$ 110,642.00	$ 13,639,945.76	$ 18,455,085.60	73.91%	73.91%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0,15 X 0,15 M	KG	1,501.20		1,501.20	293.00		$ 6,818.00	$ 1,997,674.00	$ 10,235,181.60	19.52%	19.52%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	200.16		200.16	193.10		$ 11,259.00	$ 2,174,112.90	$ 2,253,601.44	96.47%	96.47%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04	M2	199.18		199.18	198.44		$ 40,439.00	$ 8,024,715.16	$ 8,054,640.02	99.63%	99.63%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A5 CM (INCLUYE CARGUE Y FRETRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M	16.61		16.61	16.61		$ 17,938.00	$ 297,950.18	$ 297,950.18	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	218.17		218.17	198.44		$ 221,569.00	$ 43,968,152.36	$ 48,339,708.73	90.96%	90.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	68.08		68.08	69.80		$ 552,873.00	$ 38,590,535.40	$ 37,639,593.84	102.53%	102.53%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA- EXTERIOR	M2	10.50		10.50	8.98		$ 795,991.00	$ 7,147,999.18	$ 8,357,905.50	85.52%	85.52%	
PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ÁREAS DE CULATAS (HASTA 30 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M	26.00		26.00	19.80		$ 14,693.00	$ 290,921.40	$ 382,018.00	76.15%	76.15%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	7.00		7.00	7.00		$ 119,099.00	$ 833,693.00	$ 833,693.00	100.00%	100.00%	
DESINSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE.	UN	1.00		1.00	1.00		$ 2,537,821.00	$ 2,537,821.00	$ 2,537,821.00	100.00%	100.00%	
				SUBTOTAL I.E.D. ATABANZHA				$ 154,311,171.56				
CPF	540	IED		MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)				SEMANA			15	
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	731.25		731.25	466.83		$ 4,065.00	$ 1,897,663.95	$ 2,972,531.25	63.84%	63.84%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	404.70	(110.06)	397.50	243.81		$ 2,606.00	$ 635,368.86	$ 1,054,648.20	60.24%	60.24%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	17.00		17.00	6.00		$ 26,187.00	$ 157,122.00	$ 445,179.00	35.29%	35.29%	
DESMONTE DE GRIFERÍAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	10.00		10.00	3.00		$ 14,081.00	$ 42,243.00	$ 140,810.00	30.00%	30.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	78.00		78.00	24.24		$ 12,141.00	$ 294,297.84	$ 946,998.00	31.08%	31.08%	
DESMONTE DE DIVISION SENCILLA O DOBLE DIFERENTE MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	7.12		7.12	7.12		$ 24,699.00	$ 175,856.88	$ 175,856.88	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.50		16.50	2.68		$ 31,843.00	$ 85,339.24	$ 525,409.50	16.24%	16.24%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9.72		9.72	41.07		$ 21,406.00	$ 879,144.42	$ 208,066.32	422.53%	422.53%	
DESMONTE CANCA MÚLTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	UN	1.00		1.00	1.00		$ 382,945.00	$ 382,945.00	$ 382,945.00	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0,04 A 0,06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	341.25		341.25	443.82	22.06	$ 27,546.00	$ 12,225,465.72	$ 8,792,407.74	130.06%	130.06%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
DEMOLICOION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	341.25		341.25	455.99		$ 78,805.00	$ 35,934,291.95	$ 26,892,206.25	133.62%	133.62%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	250.00		250.00	12.00		$ 19,819.00					
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	8.40		8.40	6.42		$ 28,212.00	$ 181,121.04	$ 236,980.80	76.43%	76.43%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERÍAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	5.80		5.80	15.20		$ 13,242.00	$ 201,278.40	$ 76,803.60	262.07%	262.07%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	83.25		83.25	48.68		$ 39,551.00	$ 1,925,342.68	$ 3,292,620.75	58.47%	58.47%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7.00		18.00	3.00		$ 60,985.00	$ 182,955.00	$ 426,895.00	42.86%	42.86%	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2"	UN	10.00		20.00	3.00		$ 60,985.00	$ 182,955.00	$ 609,850.00	30.00%	30.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	5.00		12.00	3.00		$ 66,233.00	$ 198,699.00	$ 331,165.00	60.00%	60.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	136.50		136.50	106.80		$ 88,298.00	$ 9,430,226.40	$ 12,052,677.00	78.24%	78.24%	
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	186.00		186.00	129.00	42.84	$ 173,782.00	$ 22,417,878.00	$ 24,878,631.12	69.35%	69.35%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	8.40		8.40	49.44	15.74	$ 137,840.00	$ 6,814,809.60	$ (1,011,745.60)	588.57%	588.57%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	60.00		60.00	132.45		$ 87,915.00	$ 11,644,341.75	$ 5,274,900.00	220.75%	220.75%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	80.00		80.00	65.00		$ 39,119.00	$ 2,542,735.00	$ 3,129,520.00	81.25%	81.25%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	4.00		4.00	6.00		$ 840,807.00	$ 5,044,842.00	$ 3,363,228.00	150.00%	150.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX. 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	35.00		35.00	27.36	6.70	$ 85,635.00	$ 2,342,973.60	$ 2,423,470.50	78.17%	78.17%	
CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2	7.00		7.00	7.00		$ 53,214.00	$ 372,498.00	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.)	M2	23.30	(23.30)	23.30	23.30		$ 31,263.00	$ 728,427.90	$ 728,427.90	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS	UN	10.00		10.00	6.00		$ 130,987.00	$ 785,922.00	$ 1,309,870.00	60.00%	60.00%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	11.95		11.95	11.95		$ 87,409.00	$ 1,044,537.55	$ 1,044,537.55	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	41.75		41.75	12.98		$ 202,089.00	$ 2,623,115.22	$ 8,437,215.75	31.09%	31.09%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	78.00		78.00	34.69		$ 94,283.00	$ 3,270,677.27	$ 7,354,074.00	44.47%	44.47%	
WIN DE ALUMINIO	M	8.60		8.60	11.80		$ 14,756.00	$ 174,120.80	$ 126,901.60	137.21%	137.21%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	34.79		34.79	15.02		$ 30,220.00	$ 453,904.40	$ 1,051,353.80	43.17%	43.17%	
ACCESORIO CPVC 1/2"	UN	18.00		18.00	18.00		$ 9,199.00	$ 165,582.00	$ 165,582.00	100.00%	100.00%	
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	2.60		2.60	2.60		$ 76,792.00	$ 199,659.20	$ 199,659.20	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	10.00		10.00	1.00		$ 126,516.00	$ 126,516.00	$ 1,265,160.00	10.00%	10.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	14.40		14.40	14.40		$ 29,685.00	$ 427,464.00	$ 427,464.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2	465.00		465.00	430.17	430.17	$ 15,956.00	$ 6,863,792.52	$ 555,747.48	92.51%	92.51%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	3,241.88		3,241.88	1,655.58	1,655.58	$ 6,818.00	$ 11,287,744.44	$ 10,815,393.40	51.07%	51.07%	
MESÓN EN CONCRETO ACABADO EN GRANITO PULIDO BLANCO, LAVAMANOS A= 0,55 M. DESPENSAS A= 0.45 M, COCINA A= 0,60 M, AULAS A= 0,55 M (INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE).	M2	10.18		10.18	2.27	2.27	$ 293,243.00	$ 665,661.61	$ 2,319,552.13	22.30%	22.30%	
ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	17.21		17.21	17.21	17.21	$ 16,287.00	$ 280,299.27	$ -	100.00%	100.00%	
ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	3.08		3.08	3.08	3.08	$ 12,236.00	$ 37,686.88	$ -	100.00%	100.00%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	14.62		14.62	14.62	14.62	$ 28,087.00	$ 410,631.94	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE	UN	19.00		19.00	3.00	3.00	$ 1,066,706.00	$ 3,200,118.00	$ 17,067,296.00	15.79%	15.79%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	21.79		21.79	21.79		$ 106,864.00	$ 2,328,566.56	$ 2,328,566.56	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D. MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA.							$ 151,266,821.89				
CPF	1986-L	IED		BICENTENARIO (IED)				SEMANA		15		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	179.34		179.34	191.20		$ 4,065.00	$ 777,228.00	$ 729,017.10	106.61%	106.61%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	96.00		96.00	88.02	14.00	$ 29,861.65	$ 2,628,422.62	$ 2,866,718.60	91.69%	91.69%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUÉ Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	179.34		179.34	183.54		$ 17,317.00	$ 3,178,362.18	$ 3,105,630.78	102.34%	102.34%	
DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE	M2	95.00		95.00	30.00	30.00	$ 47,789.75	$ 1,433,692.55	$ 3,106,333.85	31.58%	31.58%	
DESTRONQUE PLACAS DE CONCRETO	M2	6.00		6.00	6.00	6.00	$ 32,170.00	$ 193,020.00	$ -	100.00%	100.00%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E=0,10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE.	M2	179.34		179.34	167.30		$ 109,110.00	$ 18,254,103.00	$ 19,567,787.40	93.29%	93.29%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M3	179.34		179.34	180.85		$ 346,806.00	$ 62,719,865.10	$ 62,196,188.04	100.84%	100.84%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	2.50		2.50	3.90		$ 87,915.00	$ 342,868.50	$ 219,787.50	156.00%	156.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	7.00		7.00	14.00		$ 39,119.00	$ 547,666.00	$ 273,833.00	200.00%	200.00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	274.00		274.00	40.00		$ 5,341.00	$ 213,640.00	$ 1,463,434.00	14.60%	14.60%	
PERFORACIÓN NUCLEO 4" E=10,873"0,10 M	UN	2.00		2.00	2.00		$ 160,254.00	$ 320,508.00	$ 320,508.00	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	M	54.18		54.18	27.70		$ 293,259.00	$ 8,123,274.30	$ 15,888,772.62	51.13%	51.13%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	95.00		95.00	30.00	30.00	$ 482,866.56	$ 14,485,996.67	$ 31,386,326.12	31.58%	31.58%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	413.94		413.94	96.30		$ 4,477.28	$ 431,162.40	$ 1,853,326.72	23.26%	23.26%	
	SUBTOTAL I.E.D. BICENTENARIO.							$ 113,649,809.31				

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	71.40%
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA	$ 1,513,133,045.74
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2,119,224,522.70

CPF	564	IED	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)					SEMANA		1		
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS	M2	175.00		175.00	175.00		$ 20,000.00	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D. BTENERIFE GRANADA SUR.							$ 3,500,000.00				

CPF	1931	IED	EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED)					SEMANA		4		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	211.54		211.54	150.26		$ 4,065.00	$ 610,806.90	$ 859,910.10	71.03%	71.03%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	27.09	12.70	27.09	18.67		$ 29,861.65	$ 557,517.04	$ 808,952.16	68.92%	68.92%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS	M2	211.54		211.54	150.26		$ 35,277.00	$ 5,300,721.66	$ 7,462,496.08	71.03%	71.03%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	32.00		32.00	32.00	32.00	$ 15,561.00	$ 497,952.00	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	32.00		32.00	32.00	32.00	$ 9,714.00	$ 310,848.00	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1.2 M (INCLUYE ANDAMIOS..	M	211.54		59.85	127.35	67.50	$ 8,800.00	$ 1,120,680.00	$ 1,267,552.00	60.20%	60.20%	
"SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO) 900 A 1000mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm Y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC	M2	211.54		211.54	150.71		$ 254,148.00	$ 38,302,645.08	$ 53,762,467.92	71.24%	71.24%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	M	54.18		54.18	35.60		$ 293,259.00	$ 10,440,020.40	$ 15,888,772.62	65.71%	65.71%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N*12 (F) + 1N*12 (N) + 1N*12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES	UN	16.00		16.00	24.00		$ 173,095.00	$ 4,154,280.00	$ 2,769,520.00	150.00%	150.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	56.08		56.08	56.08		$ 22,380.00	$ 1,255,070.40	$ 1,255,070.40	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	150.26		150.26	150.26	150.26	$ 4,477.28	$ 672,756.61	$ -	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D. MINUTO DE BUENOS AIRES							$ 62,550,541.49				

CPF	523	IED	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)					SEMANA		3		
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	144.00		144.00	126.18		$ 4,065.00	$ 512,921.70	$ 585,360.00	87.63%	87.63%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M2	20.00		20.00	18.67		$ 29,861.65	$ 557,517.04	$ 597,233.04	93.35%	93.35%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	144.00		144.00	126.18		$ 17,319.00	$ 2,185,311.42	$ 2,493,936.00	87.63%	87.63%	

CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12.00		12.00	7.60		$ 19,878.00	$ 17,319.00	$ 238,536.00	7.26%	7.26%	
PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	144.00		144.00	125.65		$ 15,118.00	$ 1,899,576.70	$ 2,176,992.00	87.26%	87.26%	
AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0,10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA)	M2	144.00		144.00	122.36		$ 109,126.00	$ 13,352,657.36	$ 15,714,144.00	84.97%	84.97%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	30.69		30.69	30.69		$ 6,964.51	$ 213,740.89	$ 213,740.89	100.00%	100.00%	
PLACA CONTRA PISO DE 10 CM- CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	2.40		2.40	2.40		$ 110,642.00	$ 265,540.80	$ -	100.00%	100.00%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA.	M	5.00		5.00	3.18		$ 26,930.00	$ 85,637.40	$ 49,012.60	63.60%	63.60%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.10		0.10	0.10		$ 12,141.00	$ 1,214.10	$ (24.28)	102.04%	102.04%	
MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	144.00		144.00	127.04	77.89	$ 65,791.00	$ 8,358,088.64	$ 1,115,815.36	88.22%	88.22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	12.00		12.00	9.86		$ 55,782.00	$ 550,010.52	$ 119,373.48	82.17%	82.17%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	8.00		8.00	8.00		$ 20,061.00	$ 160,488.00	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	ML	13.20		13.20	13.20		$ 26,195.00	$ 345,774.00	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1"	UN	16.00		16.00	16.00		$ 11,798.00	$ 188,768.00	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	0.20		0.20	0.20		$ 19,491.00	$ 3,898.20	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	1.00		1.00	1.00		$ 24,536.00	$ 24,536.00	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN	2.00		2.00	2.00		$ 110,947.00	$ 221,894.00	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	32.00		32.00	87.45		$ 25,835.00	$ 2,259,270.75	$ (1,432,550.75)	273.28%	273.28%	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	ML	82.37		82.37	82.37		$ 33,389.00	$ 2,750,251.93	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	144.00		144.00	126.18	126.18	$ 4,477.28	$ 564,943.63	$ 79,785.19	87.63%	87.63%	
	SUBTOTAL I.E.D. FABIO LOZANO SIMONELLI							$ 34,519,360.09				

CPF	546	IED		SANTA LIBRADA (IED)				SEMANA		2		
DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2.17		2.17	2.19		$ 27,546.47	$ 60,326.77	$ 59,706.97	101.04%	101.04%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	8.67		8.67	8.76		$ 26,966.00	$ 236,222.16	$ 233,795.22	101.04%	101.04%	
PERFORACIÓN NÚCLEO 3" E= 0,10 M	UN	3.00		3.00	1.00		$ 148,483.00	$ 148,483.00	$ 445,449.00	33.33%	33.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.00		6.00	1.27		$ 75,567.00	$ 95,970.09	$ 453,402.00	21.17%	21.17%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	12.00		12.00	7.00		$ 27,176.00	$ 190,232.00	$ 326,112.00	58.33%	58.33%	
AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0,10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA)	M2	2.17		2.17	2.19		$ 109,126.00	$ 238,985.94	$ 236,530.61	101.04%	101.04%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE REJILLACON SOSCO DE 4" A 3"	UN	4.00		4.00	4.00	4.00	$ 32,223.00	$ 128,892.00	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	2.00		2.00	2.00	2.00	$ 124,525.00	$ 249,050.00	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	8.55		8.55	8.55	8.55	$ 16,517.00	$ 141,220.35	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	2.00		2.00	4.00	2.00	$ 168,961.00	$ 675,844.00	$ -	200.00%	200.00%	
	SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA.							$ 2,165,226.31				


CPF	1943	IED		RAFAEL URIBE URIBE (IED)				SEMANA		1		
	M2			-				$ 36,241,614.46	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
	SUBTOTAL I.E.D. RAFAEL URIBE URIBE.							$ 36,241,614.46				


VALOR TOTAL DE EMERGENCIAS.	$	138,976,742.34

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Mayo 03 2026						
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
LA ARABIA	$ 216,308,160.00	100.00%	$ 216,308,158.83	100.00%	$ 216,308,160.00	ENTREGADO
JOSE JAIME ROJAS	$ 200,237,857.73	55.35%	$ 190,809,178.96	52.74%	$ 361,768,066.00	-2.61%
MIGUEL DE CERVANTES	$ 112,610,868.25	23.80%	$ 151,266,821.89	31.97%	$ 473,080,399.41	8.17%
JOSE VARGAS VILA	$ 259,085,355.00	100.00%	$ 259,085,206.18	100.00%	$ 259,085,355.00	ENTREGADO
ATABANZHA	$ 154,311,171.56	100.00%	$ 154,311,171.56	100.00%	$ 154,311,171.56	ENTREGADO
DON BOSCO	$ 211,312,849.14	63.19%	$ 252,107,880.29	75.39%	$ 334,388,530.08	12.20%
BRASILIA	$ 100,768,372.05	58.20%	$ 106,261,426.94	61.38%	$ 173,127,488.07	3.17%
LUIS E MORA OSEJO	$ 69,333,391.78	100.00%	$ 69,333,391.78	100.00%	$ 69,333,391.78	ENTREGADO
EL TESORO	$ 118,493,397.52	78.22%	$ 113,649,809.31	75.02%	$ 151,484,333.81	-3.20%
TOTALES	**$ 1,442,461,423.03**	**68.07%**	**$ 1,513,133,045.74**	**71.40%**	**$ 2,119,224,522.70**	3.33%


OBSERVACIONES:

El contratista presentó reprogramación de obra para las ***IED Brasilia, Bicentenario (El Tesoro) y Miguel de Cervantes***, las cuales fueron aprobadas por interventoria. De los cinco (5) frentes en ejecución, las ***IED José Jaime Rojas y Bicentenario*** registran atrasos en promedio del 3%, mientras que ***Miguel de Cervantes Saavedra, Brasilia y Don Bosco***, registran adelantos del 8.17, 3.17 y 12.20% respectivamente. Luego de la reprogramación presentada, el contrato presenta un adelanto general del 3.33%.

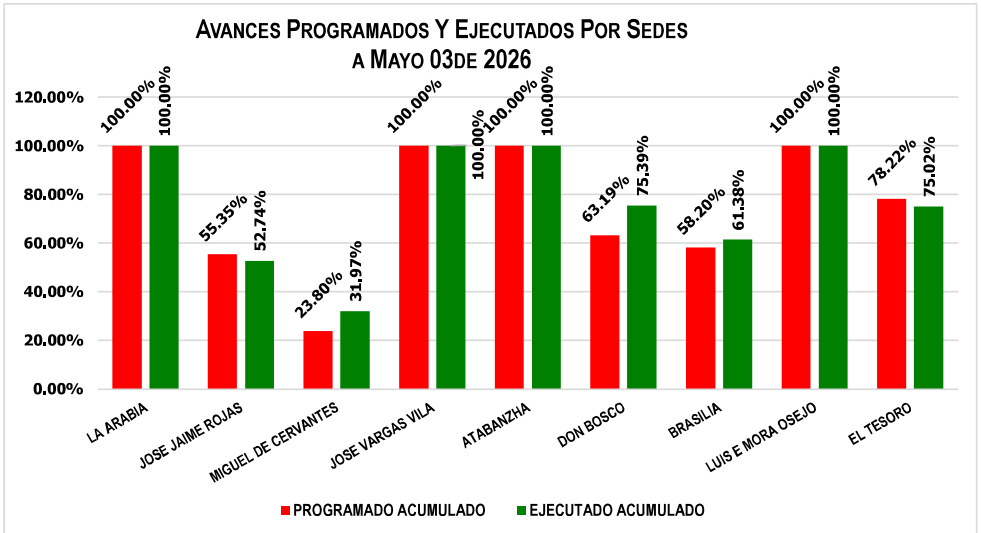

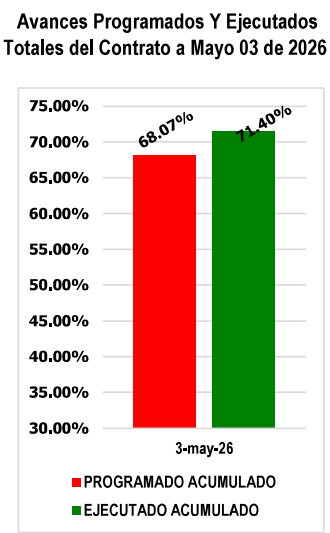

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Mayo 03 2026

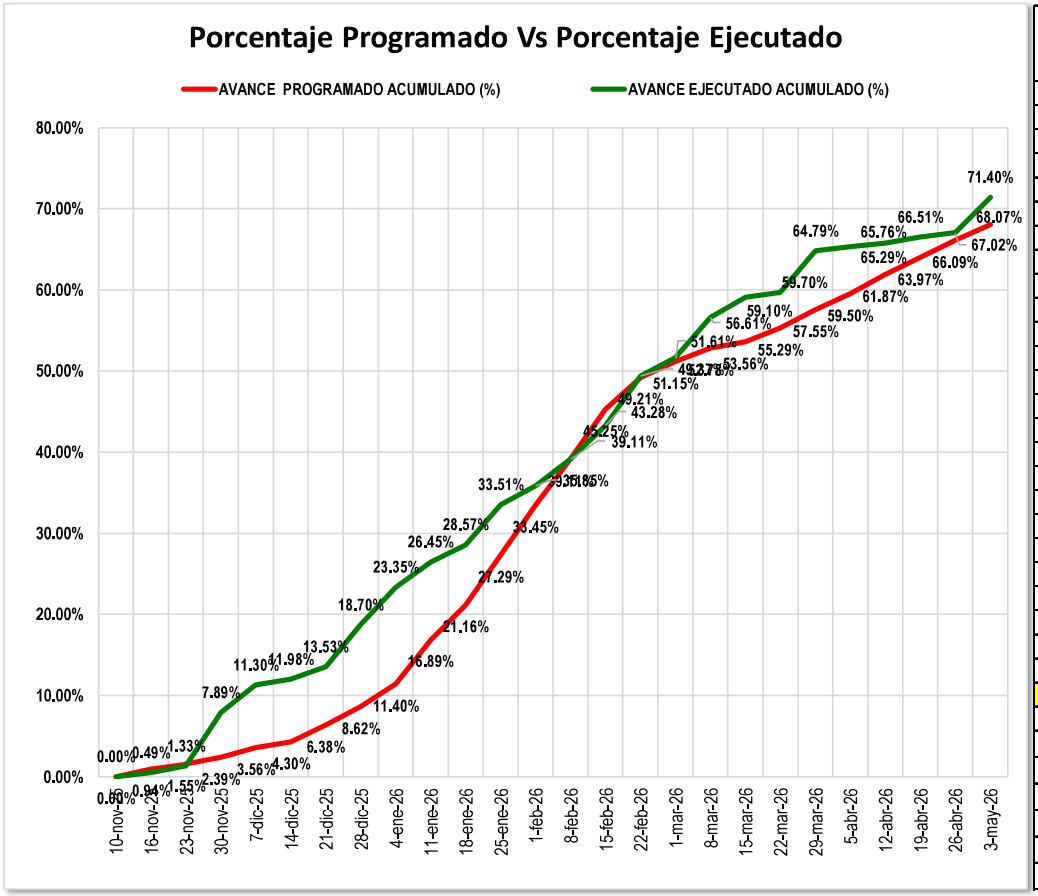

FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0.00%	0.00%
16-nov-25	0.94%	0.49%
23-nov-25	1.55%	1.33%
30-nov-25	2.39%	7.89%
7-dic-25	3.56%	11.30%
14-dic-25	4.30%	11.98%
21-dic-25	6.38%	13.53%
28-dic-25	8.62%	18.70%
4-ene-26	11.40%	23.35%
11-ene-26	16.89%	26.45%
18-ene-26	21.16%	28.57%
25-ene-26	27.29%	33.51%
1-feb-26	33.45%	35.85%
8-feb-26	39.11%	39.11%
15-feb-26	45.25%	43.28%
22-feb-26	49.21%	49.37%
1-mar-26	51.15%	51.61%
8-mar-26	52.78%	56.61%
15-mar-26	53.56%	59.10%
22-mar-26	55.29%	59.70%
29-mar-26	57.55%	64.79%
5-abr-26	59.50%	65.29%
12-abr-26	61.87%	65.76%
19-abr-26	63.97%	66.51%
26-abr-26	66.09%	67.02%
3-may-26	**68.07%**	**71.40%**
10-may-26	72.02%	
17-may-26	77.92%	
24-may-26	84.23%	
31-may-26	92.23%	
7-jun-26	95.72%	
14-jun-26	98.68%	
20-jun-26	100.00%	

FECHA: 3/05/2026

DIAS RESTANTES: 48 Dias

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME APOYO A LA SUPERVISION

GRUPO 2

CORTE DEL INFORME: 3 de mayo de 2026

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO PAIS

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8154760	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131	$ 2,332,049,023
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES	$ 128,425,720	$ 785,001,422
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRÓRROGAS	46	46	TOTAL	$ 924,609,851	$ 3,117,050,445
TERMINACION FINAL	20 de junio de 2026	20 de junio de 2026	TOTAL	257	257			

MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 128,425,720.00	46	
2				
3				
4				

MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	22-dic-25	$ 785,001,422.00	46	
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

GARANTIA	POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	SEGUROS MUNDIAL
	BCH-1010048943	6 10 2025	20 12 2029	20 6 2026	20 6 2031	6 10 2025	20 6 2029	

POLIZAS CONTRATO DE OBRA

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	SEGUROS DEL ESTADO RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
33-44-101175397	6 10 2025	27 2 2027	6 12 2025	28 6 2029	5 5 2026	5 5 2028	33-83-101045911	6 12 2025	23 6 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (01/03/2026)	PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA
581	ORLANDO FALS BORDA (IED)	USME	A	Barranquillita Nuevo	100.00%	100.00%	100.00%		$ 169,920,087	$ 169,920,087	19/11/2025	26/02/2029
1930	UNION EUROPEA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Maria Cano	100.00%	100.00%	100.00%		$ 165,727,196	$ 165,727,196	18/11/2025	21/02/2029
1913	SIERRA MORENA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	Divino Niño	96.05%	95.37%	100.00%		$ 113,917,854	$ 108,648,739	19/11/2025	18/04/2026
523	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	A	Fabio Lozano Simonelli	98.76%	98.43%	100.00%		$ 234,917,332	$ 231,228,088	1/12/2025	11/04/2026
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja	98.48%	98.47%	100.00%		$ 632,978,974	$ 623,292,062	24/11/2025	28/02/2029
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	100.00%	100.00%	100.00%		$ 186,103,596	$ 186,103,596	10/12/2025	21/03/2026
1918	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Estrella II	100.00%	100.00%	100.00%		$ 72,206,451	$ 72,206,450	1/12/2025	14/03/2026
546	SANTA LIBRADA (IED)	USME	A	Santa Librada	60.35%	76.89%	100.00%		$ 219,755,203	$ 168,977,700	15/01/2026	2/05/2026
1917	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Estrella I	100.00%	100.00%	100.00%		$ 75,074,063	$ 75,074,063	15/01/2026	28/02/2026
548	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	USME	A	Tenerife	76.90%	100.00%	30.78%		$ 102,227,058	$ 102,227,058	9/03/2026	7/05/2026
1959	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Guillermo Cano Isaza	21.49%	31.98%	37.03%		$ 379,449,204	$ 120,255,347	13/01/2026	19/05/2026
TOTAL FRENTES DE OBRA						86.02%	86.39%		$ 2,351,268,718	$ 2,022,650,447		
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO												
598	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	USME	D.L.E	CADEL USME	100.00%	100.00%	100.00%		$ 26,605,858	$ 26,605,858	26/01/2026	1/03/2026
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja					$ 35,000,000			
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	14.51%	24.17%	42.00%		$ 100,413,274	$ 24,268,941	7/04/2026	22/05/2026
TOTAL FRENTES DE OBRA						62.08%	71.00%		$ 162,019,132	$ 50,874,799		

ACUMULADO FRENTES DE OBRA

TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
4	5	6	9	$ 2,022,650,447
ACUMULADO EMERGENCIAS				
1	1	0	2	$ 52,874,799
TOTAL				
5	6	6	11	$ 2,075,525,246
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1	$ 391,963,041.00	12		1	$ 45,490,336.00	12		23	
2		13		2	$ 45,490,336.00	13		24	
3		14		3		14		25	
4		15		4		15		26	
5		16		5		16		27	
6		17		6		17		28	
7		18		7		18		29	
8		19		8		19		30	
9		20		9		20		31	
10			TOTAL OBRA	10		21		32	TOTAL INTERVENTORIA
11			$ 391,963,041.00	11		22		33	$ 90,980,672

AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	86.02%	11.61%	81.32%
PROGRAMADO	86.39%		
ATRASO	-0.37%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			









OBSERVACIONES:

FECHA: 30/5/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
AVANCE OBRA: 100 %					GRUPO 2
REGISTRO FOTOGRAFICO					
CORTE DEL INFORME: 5/4/26	CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1154788		CONTRATISTA: CONSORCIO PAIS		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1169118		INTERVENTOR: CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 100,00%	ORLANDO FALS BORDA (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA CUBIERTA BLOQUE RECTORÍA	 	  	FRENTE AL 100%
2C 95,37%	SIERRA MORENA (IED)	* ADECUACIÓN DE CUARTOS DE BASURA * ACCESIBILIDAD REDUCIDA RAMPAS * PINTURA 4 AULAS	 	 	  

FECHA: 30/5/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
AVANCE OBRA: 100 %					
REGISTRO FOTOGRAFICO					GRUPO 2
CORTE DEL INFORME: 5/4/26	CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1154788		CONTRATISTA: CONSORCIO PAIS		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1169118		INTERVENTOR: CONSORCIO SERVICO EDUCATIVO		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
3B 100,00%	UNION EUROPEA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA PARA 3 AULAS, INCLUYE LA EDECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	 	 	FRENTE AL 100%
4A 98,47%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA BLOQUE PRIMERA INFANCIA, INCLUYE MEJORAMIENTO ELECTRICO * ADECUACIÓN CANCHA DEPROTIVA	 	 	 

FECHA: 30/5/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.					INFORME APOYO A LA SUPERVISION
AÑO INFORME: 2026	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA					GRUPO 2
CORTE DEL INFORME	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS					
5/4/26	CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1154788		CONTRATISTA: CONSORCIO PAIS			
	CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1169118		INTERVENTOR: CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO			

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
5A 98,43%	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	* CAMBIO DE PISOS AULAS DE SER PISO BLOQUE A * MANEJO AGUAS LLUVIAS CANCHA * MEJORAMIENTO BATERÍAS SANITARIAS SER PISO B	 	 	 
6B 100,00%	ESTRELLA DEL SUR (IED) SEDE B	* CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANA DE LA SEDE * CAMBIO DEL PORTON PRINCIPAL	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA:	30/5/2026		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
AÑO INFORME:	100					GRUPO	2
REGISTRO FOTOGRAFICO							
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.1154788		CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS		
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.1169118		INTERVENTOR:	CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
7A 100,00%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	* CAMBIO DE CUBIERTA AULA MULTIPLE	 	 	FRENTE AL 100%
8A 76,89%	SANTA LIBRADA (IED)	* MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERRAZAS Y JARDINERA * ADECUACION JUNTA ESTRUCTURAL COMEDOR	 	 	  

FECHA: 30/5/2025	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
AÑO INFORME: 100	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				GRUPO 2
CORTE DEL INFORME: 5/4/25	CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1154788		CONTRATISTA: CONSORCIO PAIS		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1169118		INTERVENTOR: CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
9A 100,00%	IED ESTRELLA DEL SUR, SEDE A	* ADEACUACIÓN BATERÍAS SANITARIAS * ADECUACIÓN PORTON PRINCIPAL	 	 	FRENTE AL 100%
10A 81,58%	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME - EMERGENCIA	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA TANQUES DE AGUA POTABLE * RESANE HUMEDAD BAÑO MUJERES	 	 	EMERGENCIA AL 100%

FECHA	30/6/2026								
AÑO INFORME	166								
REGISTRO FOTOGRAFICO									
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:		CO1.PCCNTR.1154788			CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS		
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:		CO1.PCCNTR.1169118			INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME APOYO A LA SUPERVISION

GRUPO 2

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
11A 31,69%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	* ADECUACIÓN SANITARIAS BACHILLERATO BATERÍAS BLOQUE	 	 	 
12A 100,00%	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE * Instalación Barandas Metalicas	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA:	30/5/2025	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
ANEXO FOTOGRAFICO	166	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA			GRUPO 2
		DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.1154788	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/25	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.1169118	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
13A 24,17%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED) EMERGENCIA	* INSTALACIÓN DIVISIONES DE BAÑOS *AMPLIACIÓN CAPACIDAD TANQUE DE AGUA *ADECUACIÓN RAMPA PARA ENTRADA AULA MULTIPLE	 	 	 

CONTRATO DE OBRA		CO1.PCCNTR.8154780					CONTRATO DE INTERVENTORIA	CO1.PCCNTR.8169110			VIGENCIA	2025
CPF	1923	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 25				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO	m2	36.50	225.50	262.00	262.00		$ 4,233.48	$ 1,109,170.66	$ (954,648.79)	717.81%	717.81%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	91.00	(62.60)	28.40	28.40		$ 31,110.25	$ 883,530.99	$ 1,947,501.40	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.50	211.26	247.76	247.76		$ 18,044.21	$ 4,470,634.09	$ (3,812,020.33)	678.79%	678.79%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0,08 M a 0,12 M YGUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	301.34	-266.74	34.60	34.60		$ 33,201.35	$ 1,148,766.74	$ 8,856,128.37	11.48%	11.48%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79.20	40.80	120.00	120.00		$ 69,099.55	$ 8,291,946.35	$ (2,819,261.76)	151.52%	151.52%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34.00	199.20	233.20	233.20		$ 107,273.69	$ 25,015,880.42	$ (21,368,575.08)	685.87%	685.87%	
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	16.00	(13.00)	3.00	3.00		$ 166,952.47	$ 500,857.42	$ 2,170,382.16	18.75%	18.75%	
SUMISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	1.50			1.50		$ 62,023.52	$ 93,035.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.00			34.00	23.00	$ 91,590.40	$ 3,114,073.57	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0.30			0.30		$ 135,394.33	$ 40,618.30	$ -	100.00%	100.00%	
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0.24			0.24		$ 181,045.17	$ 43,450.84	$ -	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	15.00			15.00		$ 22,829.47	$ 342,442.05	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	19.00			19.00		$ 19,858.75	$ 377,316.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3 + 3 DIMENSIONES 1,00 M. X 1,00 M.	M2	15.36			15.36		$ 177,336.50	$ 2,723,888.59	$ -	100.00%	100.00%	
MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	58.50	136.16	194.66	194.66		$ 27,185.71	$ 5,291,971.11	$ (3,701,606.83)	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	73.00	189.00	249.56	249.56		$ 45,289.29	$ 11,302,394.46	$ (7,996,276.51)	341.86%	341.86%	
DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M			127.20	127.20		$ 4,291.49	$ 545,877.16	$ (545,877.16)	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	344.96			340.58	10.18	$ 4,663.84	$ 1,588,397.08	$ 20,440.72	98.73%	98.73%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	262.00	20.37	282.37	282.37		$ 361,355.09	$ 102,035,835.61	$ (7,360,803.10)	107.77%	107.77%	
				SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ORLANDO FALS BORDA				$ 168,920,087.00				
CPF	547	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 25				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	47.37	223.92	271.29	271.29		$ 7,045.00	$ 1,911,238.10	$ (1,577,516.00)	572.70%	572.70%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	60.00	13.00	73.00	73.00		$ 31,110.25	$ 2,271,047.96	$ (404,433.20)	121.67%	121.67%	

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	m3	1.76	-1.76	0.00	-		$ 274,656.52	$ -	$ 483,395.00	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	20.80	7.20	28.00	28.00		$ 21,488.46	$ 601,677.01	$ (154,716.95)	134.62%	134.62%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.60			12.60		$ 11,376.96	$ 143,349.70	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.84			36.84		$ 107,273.69	$ 3,951,962.61	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	32.64	0.72	31.92	-		$ 93,547.94	$ -	$ 3,053,405.00	0.00%	0.00%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7.20			3.40		$ 15,633.37	$ 53,153.46	$ 59,407.00	47.22%	47.22%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.29			4.00		$ 11,761.45	$ 47,045.82	$ 15,172.00	75.61%	75.61%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	1.76	6.86	8.62	4.45		$ 91,988.38	$ 409,348.31	$ (247,448.75)	252.84%	252.84%	
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	24.87	-9.60	15.27	15.27		$ 21,702.97	$ 331,382.67	$ 208,370.00	61.40%	61.40%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	m2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	7.00	7.00	14.00	14.00		$ 176,060.25	$ 2,464,579.38	$ (1,232,158.00)	199.98%	199.98%	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	12.60	3.76	16.36	16.36		$ 146,133.16	$ 2,390,738.55	$ (549,461.00)	129.84%	129.84%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	m	6.00			-		$ 78,726.73	$ -	$ 472,360.38	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	un	8.00			-		$ 28,310.86	$ -	$ 226,487.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	un	2.00			-		$ 129,729.46	$ -	$ 259,458.91	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	m	29.00			-		$ 14,988.50	$ -	$ 434,667.00	0.00%	0.00%	
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0,15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	42.05	8.55	50.60	50.60		$ 193,996.53	$ 9,816,224.55	$ (1,658,670.00)	120.33%	120.33%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	2.96			2.96		$ 592,067.38	$ 1,752,519.43	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	420.50	(366.54)	53.96	53.96		$ 7,255.46	$ 391,504.61	$ 2,659,416.00	12.83%	12.83%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	91.39			91.39		$ 7,103.01	$ 649,144.22	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.00	10.00	16.00	16.00		$ 143,600.90	$ 2,297,614.44	$ (1,436,009.00)	266.67%	266.67%	
CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 M X 0,60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1.00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0,20 M	un	4.00	-4.00	0.00	-		$ 1,618,437.02	$ -	$ 6,473,748.09	0.00%	0.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	3.00			1.00		$ 875,947.70	$ 875,947.70	$ 1,751,895.00	33.33%	33.33%	

MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2	15.77	1.25	17.02	17.02		$ 159,158.72	$ 2,708,881.47	$ (198,948.00)	107.93%	107.93%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR, INSTALADO, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	33.78			33.78		$ 1,120,163.13	$ 37,839,110.41	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	172.00	-172.00	0.00	-		$ 65,757.83	$ -	$ 11,310,347.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2			146.06	146.06		$ 77,589.44	$ 11,332,713.49	$ (11,332,713.00)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	14.08	2.72	16.80	16.80		$ 98,222.57	$ 1,650,139.25	$ (267,165.00)	119.32%	119.32%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0,04 M	M2	4.08			4.08		$ 45,289.29	$ 184,780.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	4.84			4.84	4.84	$ 126,224.49	$ 610,926.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.08	0.05	5.13	5.13		$ 798,362.30	$ 4,095,598.62	$ (39,918.00)	100.98%	100.98%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	193.76	-98.31	95.45	95.45		$ 29,785.43	$ 2,843,019.27	$ 2,928,206.00	49.26%	49.26%	
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	61.76	14.44	76.20	76.20		$ 29,785.43	$ 2,269,649.75	$ (430,102.00)	123.38%	123.38%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	226.80	92.51	319.31	319.31		$ 23,042.63	$ 7,357,741.55	$ (2,131,674.00)	140.79%	140.79%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm, PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	36.84	-23.74	13.10	13.10		$ 264,771.67	$ 3,468,508.85	$ 6,285,679.00	35.56%	35.56%	
								SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SIERRA MORENA	**$ 108,648,798.97**			

CPF	1930	IED				UNIÓN EUROPEA		SEMANA 25				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	168.00	10.14	178.14	178.14		$ 4,233.48	$ 754,151.38	$ (42,927.00)	106.04%	106.04%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	45.00	7.80	52.80	23.83		$ 31,110.25	$ 741,422.37	$ 658,538.70	52.96%	52.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3,5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	136.13	-104.13	32.00	32.00		$ 3,248.63	$ 103,956.25	$ 338,280.13	23.51%	23.51%	

DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.83	0.00	5.83	-		$ 144,722.00	$ -	$ 843,729.29	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	36.30			36.30		$ 26,782.33	$ 972,198.70	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5.15	7.35	12.50	12.50		$ 27,938.51	$ 349,231.40	$ (205,348.06)	242.72%	242.72%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	168.00	5.63	173.63	173.63		$ 36,752.18	$ 6,381,281.40	$ (206,914.79)	103.35%	103.35%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 11,967.87	$ 287,228.79	$ (71,807.20)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 7,469.97	$ 179,279.20	$ (44,819.80)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.	un	1.00			-		$ 55,922.89	$ -	$ 55,922.89	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	7.00	0.00	7.00	-		$ 32,498.47	$ -	$ 227,489.29	0.00%	0.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERÍA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	m	3.90	-3.90	0.00	-		$ 18,687.73	$ -	$ 72,882.16	0.00%	0.00%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	19.43			19.43		$ 21,844.63	$ 424,441.11	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3.90			3.90		$ 89,839.27	$ 350,373.14	$ -	100.00%	100.00%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	3515.11	-1076.19	2438.92	2,438.92		$ 23,042.63	$ 56,199,126.28	$ (80,997,372.11)	-226.63%	-226.63%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ (825,185.65)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM. ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	0.50			0.50		$ 341,855.19	$ 170,927.60	$ (170,927.60)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	26.40	18.13	44.53	44.53		$ 91,590.40	$ 4,078,520.47	$ (1,660,533.93)	245.62%	245.62%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	1.00	-1.00	0.00			$ 875,947.70	$ -	$ 875,947.70	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	kg	213.75	0.29	214.04	214.04		$ 264,771.67	$ 56,671,727.78	$ (76,783.78)	100.14%	100.14%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18.15			18.15		$ 106,267.26	$ 1,928,750.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.90			34.9		$ 91,590.40	$ 3,196,504.93	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	42.00			42		$ 23,315.15	$ 979,236.14	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	42.00			42		$ 20,790.98	$ 873,221.16	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 180,330.15	$ 4,327,923.59	$ (540,990.45)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 238,055.44	$ 5,713,330.57	$ (714,166.32)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	22.50	8.50	31.00	31		$ 304,166.74	$ 9,429,168.84	$ (2,585,417.26)	137.78%	137.78%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M2	32.35	0.75	33.10	33.1		$ 222,048.37	$ 7,349,801.01	$ (166,536.28)	102.32%	102.32%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	61.70			61.70		$ 17,207.77	$ 1,061,719.44	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	224.21			224.21		$ 4,663.84	$ 1,045,679.27	$ -	100.00%	100.00%	
								SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. UNION EUROPEA	**$ 165,727,196.00**			

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 25				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	786.72	463.91	1250.63	1,250.63		$ 7,045.00	$ 8,810,688.60	$ (3,268,246.00)	158.97%	158.97%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	96.25	73.00	169.25	169.25		$ 31,110.25	$ 5,265,409.14	$ (2,271,047.96)	175.84%	175.84%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0,16 M HASTA H= 0,30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	466.58	9.42	476.00	476.00		$ 107,273.69	$ 51,062,274.77	$ (1,010,518.00)	102.02%	102.02%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0,13 HASTA E= 0,17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	5.25			-		$ 22,300.62	$ -	$ 117,078.27	0.00%	0.00%	

DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0,08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.00	6.23	151.23	151.23		$ 32,594.26	$ 4,929,229.33	$ (203,062.21)	104.30%	104.30%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0,04	M2	145.00	123.77	21.23	21.23		$ 42,650.45	$ 905,469.00	$ 5,278,845.87	14.64%	14.64%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	130.00			130.00		$ 69,868.54	$ 9,082,910.19	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	323.02			323.02		$ 36,752.18	$ 11,871,653.14	$ 37.00	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	35.50			35.50		$ 8,680.11	$ 308,143.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	25.00			25.00		$ 7,469.97	$ 186,749.17	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	2.00			2.00		$ 398,950.46	$ 797,900.91	$ -	100.00%	100.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	21.00			-		$ 11,761.45	$ -	$ 246,991.00	0.00%	0.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	16.80	5.76	22.56	22.56	5.76	$ 91,988.38	$ 2,075,257.93	$ (529,853.00)	134.29%	134.29%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	258.10	-36.51	221.59	221.59		$ 79,962.51	$ 17,718,891.73	$ 2,919,431.00	85.85%	85.85%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	22.83			22.83		$ 135,394.33	$ 3,091,052.48	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	15.52			2.22		$ 66,591.58	$ 147,833.30	$ 885,668.00	14.30%	14.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	103.10	68.26	171.36	171.36		$ 176,060.25	$ 30,169,684.13	$ (12,017,873.00)	166.21%	166.21%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	m3	129.05	25.90	154.95	154.95		$ 176,060.25	$ 27,280,535.46	$ (4,559,960.00)	120.07%	120.07%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	m	87.00			87.00		$ 76,033.93	$ 6,614,951.64	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	90.00			90.00		$ 97,085.28	$ 8,737,675.50	$ -	100.00%	100.00%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	18.70	5.00	23.70	23.70	5.00	$ 165,931.21	$ 3,932,569.57	$ (829,656.00)	126.74%	126.74%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	90.00			90.00		$ 164,788.52	$ 14,830,966.59	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM. ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	1.52			1.52		$ 358,768.86	$ 545,328.67	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M	0.90			0.90		$ 156,990.72	$ 141,291.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	1809.76	-142.50	1667.26	1,667.26		$ 23,042.63	$ 38,418,051.96	$ 3,283,574.00	92.13%	92.13%	
CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	2.00					$ 1,088,548.32	$ -	$ 2,177,097.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2	684.78	-162.78	522.00	522.00		$ 11,730.42	$ 6,123,281.59	$ 1,909,479.00	76.23%	76.23%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	m	3.00			2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 5,565.00	66.67%	66.67%	

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm, PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	m2	323.02			323.02		$ 264,771.67	$ 85,526,544.13	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (60 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	m	35.50			35.50		$ 305,515.84	$ 10,845,812.21	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MD-10 PARA CANCHA DEPORTIVA E=8 CM, (INCLUYE: EMULSION ASFALTICA, ASFALTO MD-10 Y ACABADO CON SLURRY	m2	484.50	-43.86	440.64	440.64		$ 225,361.76	$ 99,303,405.31	$ 9,884,367.00	90.95%	90.95%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	484.50	-484.50	0.00	-		$ 77,589.44	$ -	$ 37,592,083.00	0.00%	0.00%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	714.00			610.00		$ 65,757.83	$ 40,112,277.64	$ 6,838,815.00	85.43%	85.43%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	66.67			66.67		$ 62,023.52	$ 4,135,108.31	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	620.45			620.45		$ 7,255.46	$ 4,501,650.03	$ -	100.00%	100.00%	
DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	353.72			353.72		$ 18,365.30	$ 6,496,173.31	$ -	100.00%	100.00%	
CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	2.00	-1.00	1.00	1.00		$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.00	50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ 126,906.00	80.00%	80.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	118.00			118.00		$ 15,217.85	$ 1,795,706.06	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	118.00			118.00		$ 16,070.48	$ 1,896,316.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25.00			25.00		$ 180,330.15	$ 4,508,253.74	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	22.00			22.00		$ 238,055.44	$ 5,237,219.69	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3.00			3.00		$ 193,810.36	$ 581,431.07	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1.2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	194.18			194.18		$ 9,167.13	$ 1,780,074.18	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 5.00 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 3" E= 3.81 MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			17.50		$ 2,042,059.82	$ 35,736,046.83	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 2.50 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓ N EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES, VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			17.50		$ 1,257,854.97	$ 22,012,461.99	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	130.00			130.00		$ 237,210.90	$ 30,837,417.51	$ -	100.00%	100.00%	
LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (INCLUYE INSUMOS)	ML	197.54			197.54		$ 5,046.98	$ 996,981.04	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ARBORIZADORA BAJA		$ 623,292,062.12			
CPF	523	IED					Fabio Lozano Simonelli		SEMANA 25			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoria autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	1201.02	10.05	1211.07	1,211.07		$ 4,233.48	$ 5,127,035.54	$ (42,546.00)	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	51.83	104.17	156.00	156.00		$ 31,110.25	$ 4,853,198.38	$ (3,240,754.33)	300.98%	300.98%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235.29	20.63	255.92	255.92		$ 32,594.26	$ 8,341,522.00	$ (672,419.50)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			68.70	68.70		$ 107,273.69	$ 7,369,702.26	$ (7,369,702.26)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ASITIOS AUTORIZADOS)	M2	28.64	1.35	29.99	29.99		$ 22,300.62	$ 668,795.68	$ (30,105.84)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	55.48	30.02	85.50	85.50		$ 12,649.16	$ 1,081,503.32	$ (379,727.83)	154.11%	154.11%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28.00			28.00		$ 20,708.69	$ 579,843.18	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS))	M3	15.05			3.93		$ 66,591.58	$ 261,545.07	$ 740,658.14	26.10%	26.10%	

DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÀLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.32			17.32		$ 33,174.37	$ 574,580.07	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	28.00			28.00		$ 27,281.50	$ 763,882.01	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	66.00			66.00		$ 27,938.51	$ 1,843,941.79	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00			8.00		$ 7,469.97	$ 59,759.73	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	55.30			49.77		$ 32,569.97	$ 1,621,007.52	$ 180,111.95	90.00%	90.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22.90			22.90		$ 18,687.73	$ 427,949.09	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12.80			12.80		$ 135,394.33	$ 1,733,047.38	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 m	M2	194.67			194.67		$ 135,394.33	$ 26,357,213.62	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	49.31			49.31		$ 135,394.33	$ 6,676,294.26	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	548.06	-548.06	0.00			$ 69,868.54	$ -	$ 38,292,151.98	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	158.76	-24.95	133.81	133.81		$ 7,103.01	$ 950,453.97	$ 177,220.14	84.28%	84.28%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	171.60	-44.68	126.92	122.00		$ 140,306.40	$ 17,117,380.80	$ 6,959,197.44	71.10%	71.10%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	M	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	M	8.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4", INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	32.00			32.00		$ 23,315.15	$ 746,084.68	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	32.00			32.00		$ 20,790.98	$ 665,311.36	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00			8.00		$ 238,055.44	$ 1,904,443.52	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	15.00			15.00		$ 361,355.09	$ 5,420,326.29	$ -	100.00%	100.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00			1.00		$ 875,947.70	$ 875,947.70	$ -	100.00%	100.00%	

CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	55.30			55.30		$ 130,345.99	$ 7,208,133.51	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	226.69	12.39	239.08	239.08		$ 126,224.49	$ 30,177,196.69	$ (1,563,366.10)	105.46%	105.46%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17.44	76.23	93.67	93.67		$ 33,727.50	$ 3,159,254.93	$ (2,571,047.33)	537.10%	537.10%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M2	0.00	5.40	5.40	5.40		$ 62,023.52	$ 334,927.03	$ (334,927.03)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
WIN DE ALUMINIO	M	18.00			18.00		$ 15,372.99	$ 276,713.90	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	131.00			131.00		$ 98,222.57	$ 12,867,157.27	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACIÓN DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	11.73	-4.73	7.00	7.00		$ 1,128,301.00	$ 7,898,107.00	$ 5,336,863.73	59.68%	59.68%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIMSIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	47.82	-6.22	41.60	41.60		$ 989,338.00	$ 41,156,460.80	$ 6,153,682.36	86.99%	86.99%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORÍNAL	M2	1.80	0.30	1.50	1.50		$ 989,338.00	$ 1,484,007.00	$ 296,801.40	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00			3.00		$ 772,427.21	$ 2,317,281.62	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2" PARA REGULACION DE PRESION, CONSUMO DE AGUA DE 4,8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	11.00			11.00	4.00	$ 1,117,185.66	$ 12,289,042.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	14.00			14.00		$ 404,611.28	$ 5,664,557.91	$ -	100.00%	100.00%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	66.72	216.43	283.15	283.15		$ 20,236.50	$ 5,729,964.98	$ (4,379,785.70)	424.39%	424.39%	
ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0.60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M			52.00	45.00		$ 8,484.49	$ 381,802.05	$ (381,802.05)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	0.00		33.77	33.77		$ 32,026.28	$ 1,081,527.64	$ (1,081,527.64)	100.00%	100.00%	
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	176.38			176.38		$ 6,610.59	$ 1,165,975.86	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. FABIO SIMONELLI	$ 231,228,088.35				

CPF	1918	IED						Estrella del Sur Sede B	SEMANA 25			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoria autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28	20.48	577.76	577.76		$ 4,233.48	$ 2,445,932.98	$ (86,702.00)	103.67%	103.67%	
CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2").	M	88.20	-88.20	0.00	-		$ 154,730.98	$ -	$ (13,647,272.19)	0.00%	0.00%	

DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	54.17			33.24		$ 33,174.37	$ 1,102,716.03	$ 694,339.54	61.36%	61.36%	
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	95.99	-32.70	63.29	63.29		$ 29,391.49	$ 1,860,302.19	$ 960,987.18	65.94%	65.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	28.37					$ 707,267.02	$ -	$ 20,065,165.47	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	25.81	6.00	31.81	31.81		$ 829,259.39	$ 26,378,824.17	$ (4,975,639.28)	123.25%	123.25%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.43			1.43		$ 798,362.30	$ 1,145,011.22	$ (3,353.12)	100.29%	100.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	87.25			63.29		$ 467,649.33	$ 29,597,525.99	$ 11,204,877.91	72.54%	72.54%	
ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	141.20			141.20		$ 9,408.62	$ 1,328,459.99	$ 37.63	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	141.20			141.20		$ 22,829.47	$ 3,223,429.87	$ 91.32	100.00%	100.00%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	141.20			141.20		$ 17,207.77	$ 2,429,668.36	$ 68.83	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	577.76			577.76		$ 4,663.84	$ 2,694,579.45	$ -	100.00%	100.00%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - B			$ 72,206,450.25				

CPF	1918	IED			CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)			SEMANA 25				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoria autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	538.32	-88.32	450.00	450.00		$ 4,233.48	$ 1,905,064.11	$ 373,901.00	83.59%	83.59%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	78.28	11.72	90.00	90.00		$ 31,137.23	$ 2,802,350.52	$ (364,928.00)	114.97%	114.97%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3,5 (de acuerdo a solicitud de interventorias para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	538.32					$ 3,248.63	$ -	$ 1,748,804.00	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	12.00	(1.00)	11.00	11.00		$ 7,469.97	$ 82,169.63	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			5.00	5.00		$ 23,315.15	$ 116,575.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M			20.00	20.00		$ 20,790.98	$ 415,819.60	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	1.00			1.00		$ 101,214.88	$ 101,214.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	538.82	-134.52	404.30	404.30		$ 36,752.18	$ 14,858,907.26	$ 4,943,904.00	75.03%	75.03%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1841.40	-941.87	899.53	899.53		$ 23,042.63	$ 20,727,535.16	$ 21,703,160.03	48.85%	48.85%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	44.00			44.00		$ 130,345.99	$ 5,735,223.77	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	633.15			632.63		$ 4,663.84	$ 2,950,473.25	$ 2,436.22	99.92%	99.92%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA METÁLICA PARA CERCHA METÁLICA	M2	30.00			30.00		$ 37,696.55	$ 1,130,896.57	$ -	100.00%	100.00%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2			87.00	87.00		$ 106,267.26	$ 9,245,251.44	$ (9,245,251.44)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	KG	538.31	-538.31	0.00	-		$ 264,771.67	$ -	$ 142,529,236.49	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 50 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR 50 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 24 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA LOS METROS CUADRADOS RALMENTE INSTALADOS)	KG	0.00	0.00	410.94	410.94		$ 306,692.25	$ 126,032,114.08	$ (126,032,114.08)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. CALASANZ BUENA VISTA			$ 186,103,596.00				

CPF	1918	IED			SANTA LIBRADA (IED)			SEMANA 25				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance fisico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoria autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28			557.28		$ 4,233.48	$ 2,359,231.39	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	128.18			25.00		$ 31,110.25	$ 777,756.15	$ 3,209,955.18	19.50%	19.50%	

CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	65.03	-39.70	25.33	25.33		$ 15,633.37	$ 395,993.28	$ 620,644.82	38.95%	38.95%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67.90			16.47		$ 32,594.26	$ 536,827.40	$ 1,676,322.59	24.26%	24.26%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	27.20			13.34		$ 21,844.63	$ 291,407.33	$ 302,766.53	49.04%	49.04%	
PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	372.13			334.28		$ 13,385.77	$ 4,474,588.57	$ 506,658.09	89.83%	89.83%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	63.87			63.87		$ 34,724.48	$ 2,217,879.69	$ (26.83)	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.47	-16.47	0.00			$ 18,044.21	$ -	$ -	0.00%	0.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	194.87			194.87		$ 9,443.70	$ 1,840,293.82	$ 1,840,293.82	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	59.96			59.96		$ 91,988.38	$ 5,515,765.80	$ 5,515,765.80	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	63.33			13.44		$ 91,988.38	$ 1,236,323.87	$ 1,236,323.87	21.22%	21.22%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0,04 M	M2	281.83			218.00		$ 45,289.29	$ 9,873,200.43	$ 9,873,200.43	77.35%	77.35%	
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0,15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2			20.36	20.36	20.36	$ 193,996.53	$ 3,949,769.41	$ 3,949,769.41	100.00%	100.00%	
PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2			20.36	20.36	20.36	$ 122,272.98	$ 2,489,477.88	$ 2,489,477.88	100.00%	100.00%	
PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0,04 M (PROMEDIO). INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE)	M2	333.93	1.67	335.60	218.00		$ 69,679.67	$ 15,190,376.21	$ 15,190,376.21	65.28%	65.28%	
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	208.04			118.00		$ 25,122.94	$ 2,964,506.94	$ 2,964,506.94	56.72%	56.72%	
SUMISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	19.60			13.44		$ 62,023.52	$ 833,596.15	$ 833,596.15	68.57%	68.57%	
Demolición de Materas en concreto o fibrocemento 1,2x1,2x0,3 m y 1x0,7x0,7 m	M	48.00			24.00		$ 16,863.75	$ 404,730.00	$ 404,730.00	50.00%	50.00%	
TRATAMIENTO DE PISOS EN LADRILLO O ADOQUIN: LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS y REEMBOQUILLADO DE JUNTAS, (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN,	M	110.00	69.08	179.08	110.00		$ 16,863.75	$ 1,855,012.50	$ 1,855,012.50	100.00%	100.00%	#####
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	356.60	-300.35	56.25	56.25		$ 34,369.67	$ 1,933,294.03	$ 1,933,294.03	15.77%	15.77%	
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6.00	(6.00)	-	-		$ 68,114.71	$ -	$ -	0.00%	0.00%	

DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	7.20			7.20		$ 157,817.72	$ 1,136,287.57	$ 1,136,287.57	100.00%	100.00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	67.71			67.71		$ 5,565.04	$ 376,808.69	$ 376,808.69	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 4,5 KG/M	M	6.00	3.60	9.60	9.60		$ 101,978.47	$ 978,993.30	$ 978,993.30	160.00%	160.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.				19.00	19.00		$ 305,515.84	$ 5,804,800.90	$ 5,804,800.90	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	335.60			281.00	93.00	$ 361,355.09	$ 101,540,779.00	$ 101,540,779.00	83.73%	83.73%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA			$ 168,977,700.31				

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 25				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance fisico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoria autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	20.56			20.56		$ 4,233.48	$ 87,040.26	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	40.30	-31.81	8.49	8.49		$ 31,110.25	$ 264,138.88	$ 989,604.00	21.07%	21.07%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0,08 M a 0,12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-2.22	17.30	17.30		$ 32,594.26	$ 563,880.63	$ 72,359.00	88.63%	88.63%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0,13 HASTA E= 0,17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-5.96	13.56	13.56		$ 22,300.62	$ 302,396.45	$ 132,912.00	69.47%	69.47%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.65	-2.49	38.16	38.16		$ 12,649.16	$ 482,692.01	$ 31,496.00	93.87%	93.87%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-4.52	15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ 93,603.00	76.84%	76.84%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.36	-5.02	6.34	6.34		$ 33,174.37	$ 210,325.50	$ 166,535.00	55.81%	55.81%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15.00			15.00		$ 27,281.50	$ 409,222.50	$ -	100.00%	100.00%	
SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15.00			15.00		$ 182,479.27	$ 2,737,188.99	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0,04	M2	19.52			19.52		$ 42,650.45	$ 832,536.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19.52	-1.99	17.53	17.53		$ 126,224.49	$ 2,212,715.38	$ 251,187.00	89.81%	89.81%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.80			0.80		$ 67,218.91	$ 53,775.13	$ -	100.00%	100.00%	
WIN DE ALUMINIO	M	3.00			3.00		$ 15,372.99	$ 46,118.98	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	44.84			40.81		$ 116,158.86	$ 4,740,210.72	$ 468,353.00	91.01%	91.01%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.20			5.20		$ 707,267.02	$ 3,677,788.50	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIMSIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACIÓN DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.16	0.12	2.28	2.28		$ 1,127,967.67	$ 2,571,766.29	$ (135,356.00)	105.56%	105.56%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	7.00	1.00	8.00	8.00		$ 873,470.75	$ 6,987,765.98	$ (873,471.00)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			2.00		$ 616,820.66	$ 1,233,641.32	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			5.00		$ 404,611.28	$ 2,023,056.40	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIMSIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTÍACIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	28.82	12.82	41.64	41.64		$ 989,338.20	$ 41,196,042.70	$ (12,683,316.00)	144.48%	144.48%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIMSIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORÍNAL	M2	1.80	-0.80	1.00	1.00		$ 989,338.20	$ 989,338.20	$ 791,471.00	55.56%	55.56%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	44.84			40.81		$ 36,193.65	$ 1,476,990.67	$ 145,933.00	91.01%	91.01%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35.50			35.50		$ 21,599.09	$ 766,767.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2.16			2.16		$ 123,260.52	$ 266,242.73	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	111.32			100.19		$ 4,663.84	$ 467,270.00	$ 51,909.00	90.00%	90.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - A	$ 75,074,063.00				

CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 25				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	125.48			56.47		$ 4,233.48	$ 239,064.38	$ 292,152.00	45.00%	45.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	68.00			27.20		$ 31,110.25	$ 846,198.69	$ 1,269,298.00	40.00%	40.00%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	129.54			56.06		$ 32,594.26	$ 1,827,233.99	$ 2,395,026.00	43.28%	43.28%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150.00			76.50		$ 11,376.96	$ 870,337.46	$ 836,207.00	51.00%	51.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40.00			25.00		$ 7,469.97	$ 186,749.17	$ 112,050.00	62.50%	62.50%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERÍA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	100.00			55.00		$ 18,687.73	$ 1,027,825.33	$ 840,948.00	55.00%	55.00%	

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	364.26			129.31		$ 12,649.16	$ 1,635,663.09	$ 2,971,921.00	35.50%	35.50%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	7.20			5.10		$ 65,869.81	$ 335,936.02	$ 138,327.00	70.83%	70.83%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	22.00			8.80		$ 20,708.69	$ 182,236.43	$ 273,355.00	40.00%	40.00%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.61			7.56		$ 33,174.37	$ 250,798.23	$ 631,972.00	28.41%	28.41%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	78.00			26.00		$ 27,281.50	$ 709,319.01	$ 1,418,638.00	33.33%	33.33%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0,04 M	M2	35.00			18.85		$ 61,099.39	$ 1,151,723.50	$ 986,755.00	53.86%	53.86%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	129.54			101.94		$ 126,224.49	$ 12,867,324.94	$ 3,483,796.00	78.69%	78.69%	
WIN DE ALUMINIO	M	30.00			18.00		$ 15,372.99	$ 276,713.90	$ 184,476.00	60.00%	60.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M2	7.20			7.12		$ 1,128,300.90	$ 8,033,502.39	$ 90,264.00	98.89%	98.89%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	364.26			177.00		$ 36,193.65	$ 6,406,276.90	$ 6,777,624.00	48.59%	48.59%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	119.96	(45.93)	74.03	26.10	8.11	$ 21,599.09	$ 563,736.28	$ 2,027,291.00	21.76%	21.76%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	135.38			52.69	32.38	$ 989,338.20	$ 52,128,229.82	$ 81,808,376.00	38.92%	38.92%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	5.40	-0.60	4.80	1.20	0.93	$ 989,338.20	$ 1,187,205.84	$ 4,155,220.00	22.22%	22.22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2 PARA REGULACION DE PRESION, CONSUMO DE AGUA DE 4,8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	45.00			14.00	5.00	$ 1,117,185.66	$ 15,640,599.28	$ 34,632,756.00	31.11%	31.11%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	m2	364.26			141.40		$ 98,222.57	$ 13,888,672.05	$ 21,889,883.00	38.82%	38.82%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA			$ 120,255,346.68				


CPF	548	IED			TENERIFE - GRANADA SUR (IED)			SEMANA 25				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	Observaciones
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoria autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	193.00	41.34	234.34	234.34		$ 4,233.48	$ 992,072.72	$ (175,012.00)	121.42%	121.42%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	39.00			26.00		$ 31,110.25	$ 808,866.40	$ 404,433.00	66.67%	66.67%	
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	24.83	65.79	90.62	90.62		$ 38,696.24	$ 3,506,652.84	$ (2,545,825.00)	364.96%	364.96%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	44.28	25.88	70.16	70.16		$ 361,355.09	$ 25,352,672.83	$ (9,351,870.00)	158.45%	158.45%	


PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	44.28	25.88	70.16	70.16		$ 65,757.83	$ 4,613,569.51	$ (1,701,813.00)	158.45%	158.45%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	412.00	(366.94)	45.06	45.06		$ 32,026.28	$ 1,443,104.40	$ 11,751,725.00	10.94%	10.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1-1/4" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS	M	43.00	-7.64	35.36	35.36		$ 190,851.78	$ 6,748,518.96	$ 1,458,108.00	82.23%	82.23%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS, PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS	M	5.50	-0.80	4.70	4.70		$ 1,120,163.13	$ 5,264,766.69	$ 896,131.00	85.45%	85.45%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	964.27	(570.86)	393.41	393.41		$ 4,663.84	$ 1,834,783.56	$ 2,662,416.00	40.80%	40.80%	
SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA PVC PLASTIFICADO SIKAPLAN 15 PR O SIMILAR	M3	150.00	(15.20)	134.80	134.80		$ 383,249.63	$ 51,662,050.10	$ 5,825,394.00	89.87%	89.87%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERÍFE GRANADA SUR							$ 102,227,058.00				

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA		86.02%
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA	$	2,022,660,446.68
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	2,351,268,718.00


AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - May 03 2026						
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
ORLANDO FALS BORDA	$ 168,920,087.00	100.00%	$ 168,920,087.00	100.00%	$ 168,920,087.00	ENTREGADO
UNION EUROPEA	$ 165,727,196.00	100.00%	$ 165,727,196.00	100.00%	$ 165,727,196.00	ENTREGADO
SIERRA MORENA	$ 113,917,854.00	100.00%	$ 108,648,798.97	95.37%	$ 113,917,854.00	-4.63%
FABIO LOZANO	$ 234,917,032.00	100.00%	$ 231,228,088.35	98.43%	$ 234,917,032.00	-1.57%
ARBORIZADORA BAJA	$ 632,970,974.00	100.00%	$ 623,292,062.12	98.47%	$ 632,970,974.00	-1.53%
BUENAVISTA	$ 186,103,596.00	100.00%	$ 186,103,596.00	100.00%	$ 186,103,596.00	ENTREGADO
ESTRELLA DEL SUR - B	$ 72,206,451.00	100.00%	$ 72,206,450.25	100.00%	$ 72,206,451.00	ENTREGADO
SANTA LIBRADA	$ 219,755,203.00	100.00%	$ 168,977,700.31	76.89%	$ 219,755,203.00	-23.11%
ESTRELLA DEL SUR - A	$ 75,074,063.00	100.00%	$ 75,074,063.00	100.00%	$ 75,074,063.00	ENTREGADO
TENERIFE GRANADA SUR SEDE A	$ 21,244,804.06	20.78%	$ 102,227,058.00	100.00%	$ 102,227,058.00	79.22%
GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A	$ 140,508,348.84	37.03%	$ 120,255,346.68	31.69%	$ 379,449,204.00	-5.34%
TOTALES	$ 2,031,345,608.91	86.39%	$ 2,022,660,446.68	86.02%	$ 2,351,268,718.00	-0.37%

OBSERVACIONES: Para el cierre de este periodo, encontramos que cinco (5) de las once (11) entidades educativas han sido entregadas. Las ***IED Sierra Morena y Guillermo Cano*** presentan atrasos cercanos al 5%. Por otro lado ***Fabio Lozano y Arborizadora Baja*** registran atrasos por debajo del 2%. La ***IED Santa Librada requiere que se implemente urgentemente un Plan de Choque para*** mitigar ***el atraso del 23.11% que registra a la fecha***. El porcentaje de atraso del contrato es inferior al 0.5%.

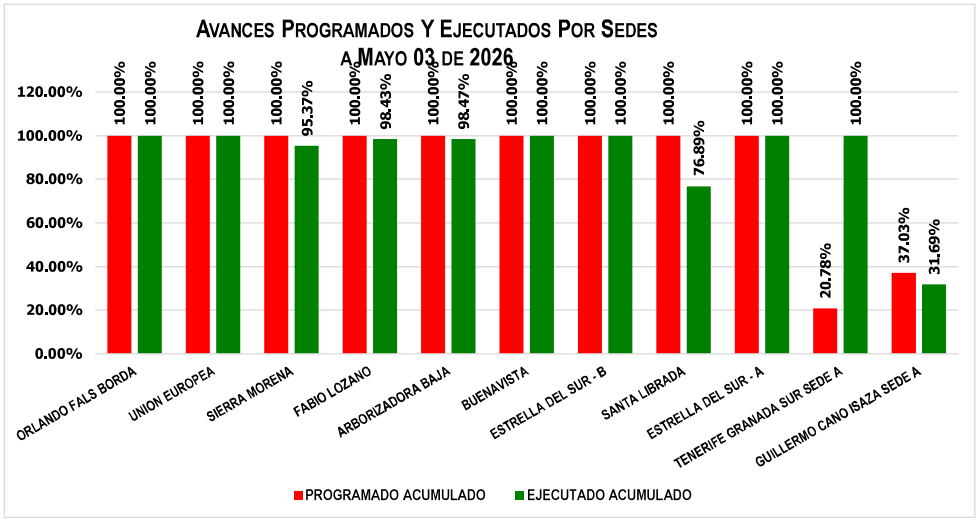

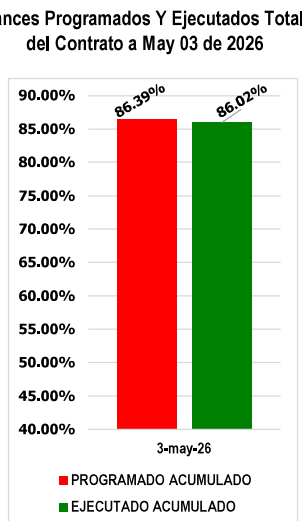

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - May. 03 2026

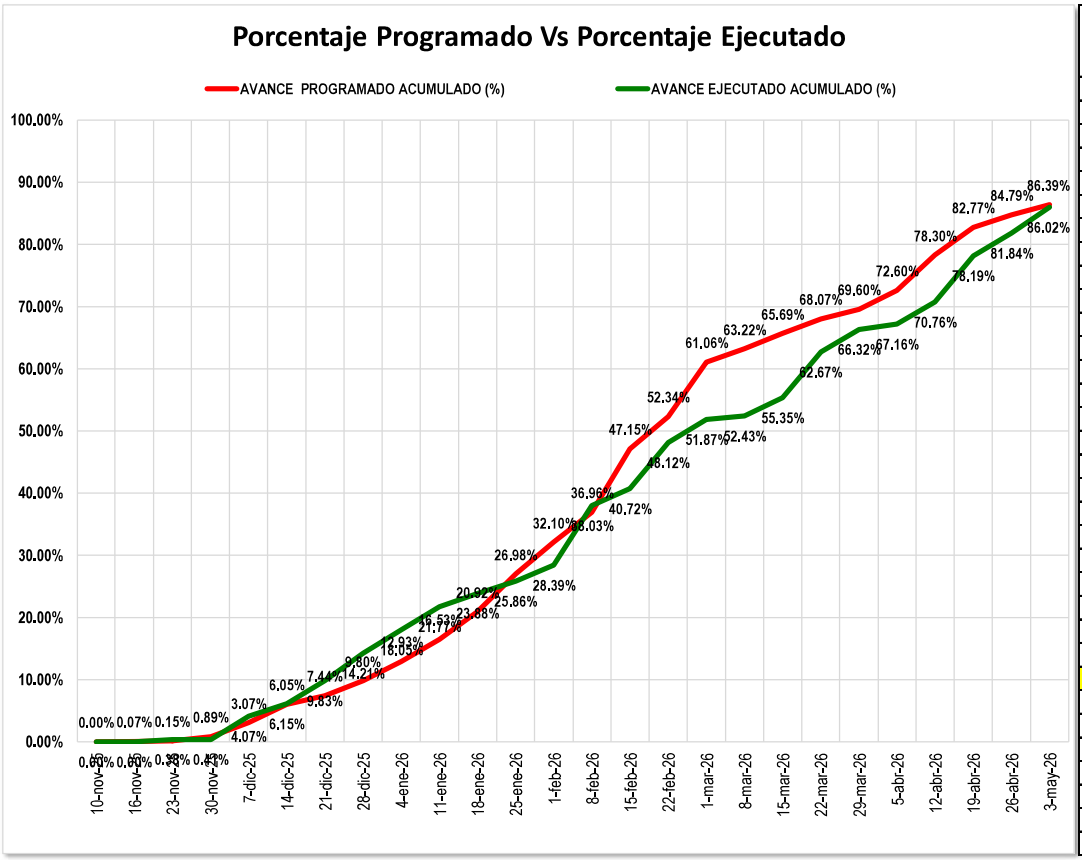

FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0.00%	0.00%
16-nov-25	0.07%	0.00%
23-nov-25	0.15%	0.38%
30-nov-25	0.89%	0.41%
7-dic-25	3.07%	4.07%
14-dic-25	6.05%	6.15%
21-dic-25	7.44%	9.83%
28-dic-25	9.80%	14.21%
4-ene-26	12.93%	18.05%
11-ene-26	16.53%	21.77%
18-ene-26	20.92%	23.88%
25-ene-26	26.98%	25.86%
1-feb-26	32.10%	28.39%
8-feb-26	36.96%	38.03%
15-feb-26	47.15%	40.72%
22-feb-26	52.34%	48.12%
1-mar-26	61.06%	51.87%
8-mar-26	63.22%	52.43%
15-mar-26	65.69%	55.35%
22-mar-26	68.07%	62.67%
29-mar-26	69.60%	66.32%
5-abr-26	72.60%	67.16%
12-abr-26	78.30%	70.76%
19-abr-26	82.77%	78.19%
26-abr-26	84.79%	81.84%
3-may-26	**86.39%**	**86.02%**
10-may-26	88.02%	
17-may-26	91.72%	
24-may-26	93.83%	
31-may-26	96.92%	
7-jun-26	98.26%	
14-jun-26	99.11%	
20-jun-26	100.00%	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado N° I-2026-44535
Fecha: 11-04-2026 - 23:59
Folios: 1 Anexos:
Radicador: SANTIAGO ANGEL URIBE - 4300
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: LH5LC

MEMORANDO.

PARA: MARIA TEREZA RODRIGUEZ MIRKE.
Contratista DCCEE

DE: **SANTIAGO ANGEL URIBE**
Apoyo a la Supervisión Cto de Interventoría CO1.PCCNTR.8169110 DE 2025
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Asunto: REMISION DE PROPUESTA ECONOMICA MODIFICATORIO No 2 - ADICION Y PROROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA. CO1.PCCNTR.8169110 - GRUPO 2 - 2025 CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

Cordial saludo,

En atención al asunto de la referencia, me permito remitir, como archivo anexo, el oficio con consecutivo **SERINCO-SED-INT-2025-400** de fecha 9 de abril de 2026, presentado por la firma interventora **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**, mediante el cual fue allegada a esta supervisión - en cabeza de la DCCEE — la propuesta económica y su respectiva justificación, destinadas a sustentar la **Solicitud de Modificación No. 2 (Adición y Prórroga)** del Contrato de interventoría No. **CO1.PCCNTR.8169110 de 2025 – Grupo 2 – 2025**.

Dicha propuesta corresponde al objeto contractual consistente en la ***"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"***.

En virtud de lo anterior, y conforme a sus competencias, solicito que la Oficina realice la evaluación presupuestal correspondiente y emita el aval requerido, a efectos de continuar con el trámite administrativo del modificatorio en curso-

Cordialmente,

SANTIAGO ANGEL URIBE
Contratista DCCEE
Apoyo a la Supervisión Contrato de Interventoría
CO1.PCCNTR.8169110 DE 2025

Anexo: COMUNICACION SERINCO-SED-INT-2025-121 (10 FOLIOS)
PROPUESTA ECONOMICA (1 FOLIO)

Radicado Nº I-2026-56836
Fecha: 06-05-2026 - 14:26
Folios: 1 Anexos:
Radicador: DEISI KATERINE SANCHEZ CANCELADO - 4300
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: HVKP8

PARA: **SANTIAGO ÁNGEL URIBE**
Apoyo a la supervisión contrato CO1.PCCNTR. 8169110 de 2025

DE: **MARIA TERESA RODRÍGUEZ MIRKE**
Contratista DCCEE

ASUNTO: Revisión solicitud modificación No. 2 (adición y prorroga) del contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR. 8169110 de 2025 Contratista: CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO - Objeto: *"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".* LOTE No. 2.

Cordial saludo,

En atención a la solicitud del asunto, el Grupo de Estudios Previos ha efectuado revisión al costeo recibido mediante radicado I-2026-44535 del 11 de abril de 2026, y alcance recibido mediante correo electrónico el 04 de mayo de 2026, para efectos de la modificación No. 2 (adición y prorroga) al Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR. 8169110 de 2025, de acuerdo con lo descrito en el oficio de interventoría SERINCO-SED-INT-2025-463, referente a la adición de frentes de obra a los colegios: I.E.D. Confederación Brisas Del Diamante Sede A, I.E.D. Compartir El Recuerdo Sede A, I.E.D. Arborizadora Alta Sede B, I.E.D. Miguel de Cervantes Saavedra, I.E.D. Paraiso Mirador Sede D, I.E.D. Rodrigo Lara Bonilla Sede B e I.E.D Ciudad de Villavicencio Sede B.

De esta manera, se realizó el cotejo respectivo frente a la información de la verificación aritmética del proceso SED-CM-A-DCCEE-018-2025 encontrando correcta la aplicación de los precios contractuales.

En consecuencia, a partir de la información revisada y suministrada por el apoyo a la supervisión del proyecto, el grupo de Estudios Previos concluye, que el valor resultante para la adición, en la verificación aritmética efectuada, es de **CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($162.875.214,00) INCLUIDO I.V.A. DEL 19%.**

No obstante, es importante aclarar que el Grupo de Estudios Previos no tiene la facultad de aprobar, modificar y/o autorizar los perfiles necesarios, ni la cantidad de personal, ni sus dedicaciones dentro de la adición requerida para el equipo mínimo de interventoría, así como tampoco modificaciones, gastos, prórrogas, adición de recursos o cualquier otra circunstancia particular en la que deban incurrir los contratistas de la Dirección de Construcciones para la debida ejecución de sus contratos, dado que el alcance del Grupo de Estudios Previos se limita a la revisión y análisis de requerimientos o metodologías presentadas por la supervisión.

Igualmente, será responsabilidad del supervisor del contrato verificar las condiciones contractuales, la pertinencia de la adición, así como la documentación allegada, de manera que sean acordes con la realidad del proyecto y se hayan enmarcado dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados

Cordialmente,

MARIA TERESA RODRÍGUEZ MIRKE
CONTRATISTA DCCEE

Anexos: justificación remitida por la supervisión y propuesta económica.
Proyectó: Katerine Sánchez C– contratista DCCEE.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFERTA ECONOMICA INICIAL

OBJETO : "INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN LA TRAZA DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."

VALOR OFERTA ECONOMICA - ZONA SUR 5

Nº	DESCRIPCIÓN	PLAZO		PRECIO OFERTADO MES	VALOR TOTAL
1	COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO				
1.1	PERSONAL PROFESIONAL				
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA- DE OBRA- Cantidad: 1 con una dedicación 100%	7	$	9.869.511,00	$69.592.177,00
1.1.2	PROFESIONAL DE APOYO Cantidad: 1 con una dedicación 100%	7	$	8.290.042,00	$ 44.072.294,00
1.1.3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Cantidad: 3 con una dedicación 100%	6	$	26.760.228,00	$ 160.741.368,00
1.1.4	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Cantidad: 1 con una dedicación 30%	6	$	2.904.765,00	$ 17.728.756,00
1.1.5	ESPECIALISTA AMBIENTAL Cantidad: 1 con una dedicación 60%	6	$	5.809.597,00	$ 35.457.522,00
1.1.6	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOCantidad: 1 con una dedicación 30%	6	$	2.904.765,00	$ 17.728.756,00
1.1.7	ESPECIALISTA EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS, VOZ Y DATOS Cantidad: 1 con una dedicación 30%	6	$	2.904.765,00	$ 17.728.756,00
1.1.8	ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS GAS Y RECI CONTRA INCENDIOS Cantidad: 1 con una dedicación 30%	6	$	2.904.765,00	$ 17.728.756,00
1.1.9	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA Cantidad: 1 con una dedicación 30%	7	$	2.070.025,00	$ 19.751.161,00
1.1.10	ASESOR JURIDICO Cantidad: 1 con una dedicación 15%	7	$	1.477.397,00	$ 10.341.779,00
1.2	PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR TECNICO				
1.2.1	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cantidad: 6 con una dedicación 100%	6	$	14.599.594,00	$87.213.324,00
1.2.2	INSPECTOR DE INTERVENTORIA Cantidad: 6 con una dedicación 100%	6	$	10.464.276,00	$ 66.425.656,00
SUBTOTAL	1. COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO				$ 564.662.389,00
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
2.1	GASTOS GENERALES				
2.1.1	GASTOS GENERALES Y/O ADMINISTRATIVOS (OFICINA, SENCILLA, PAPELERIA, COMPUTADORES, SEGURIDAD, FOTOCOPIAS,), COSTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, CONSECUCIONES, IMPRESIÓN DE PLANOS PARA EL ADMINISTRACIÓN Y IMPUESTOS, GARANTIAS Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	7	$	10.800.000,00	$ 74.256.000,00
SUBTOTAL	2. GASTOS ADMINISTRATIVOS				$ 74.256.000,00
	TOTAL COSTOS PERSONAL - ADMINISTRACIÓN - IMPUESTOS - GARANTIAS - UTILIDAD ESTIMADA OFERTADA				$ 638.918.389,00
	I.V.A. (19%)				$ 121.414.494,00
	VALOR TOTAL OFERTADO				$ 760.332.883,00

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Todas las propuestas deben contemplar dentro de su OFERTA ECONÓMICA, la totalidad del personal mínimo exigido, los costos directos e indirectos y todos los demás gastos en que pueda incurrir el contratista durante la ejecución del contrato. Los proponentes que no diligencien la totalidad de las campos establecidos en el Formulario - "PROPUESTA ECONÓMICA", será objeto de subsanación, la anterior teniendo en cuenta que la oferta económica corresponde a un requisito de carácter habilitante, que no otorga puntaje.

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO efectuará la revisión aritmética de la información contenida en la Propuesta Económica, para efectos del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Los valores propuestos deberán contemplar todos los costos directos e indirectos, para los cuales incurra el proponente en relación con la correcta ejecución del objeto de la presente contratación.

Los precios contenidos en la propuesta económica seleccionada NO ESTAN SUJETOS A REAJUSTE ALGUNO durante la ejecución del contrato, por tal razón, el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la propuesta, su irrevocabilidad y los posibles incrementos durante la ejecución del contrato. La propuesta debe presentarse en pesos colombianos.

El presente proceso de selección se adjudicará por el valor total de la oferta económica presentada y habilitada por el proponente seleccionado. La Propuesta Económica DEBERÁ SER OLEOINCIDA, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y PRESENTADA DE FORMA COMPLETA JUNTO CON LA PROPUESTA AL MOMENTO DEL CIERRE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFERTA ECONOMICA INICIAL DESGLOSADA

OBJETO : "INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN LA TRAZA DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."

VALOR OFERTA ECONOMICA - ZONA SUR 5

Nº	DESCRIPCIÓN	PLAZO	PRECIO OFERTADO MES DEDICACIÓN 100% CANTIDAD 1	CANTIDAD	% DEDICACION	VALOR TOTAL
1	COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO					
1.1	PERSONAL PROFESIONAL					
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA- DE OBRA- Cantidad: 1 con una dedicación 100%	7	$ 9.869.511,00	1	100%	$ 69.592.177,00
1.1.2	PROFESIONAL DE APOYO Cantidad: 1 con una dedicación 100%	7	$ 8.290.042,00	1	100%	$ 44.072.294,00
1.1.3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Cantidad: 3 con una dedicación 100%	6	$ 9.920.075,00	3	100%	$ 160.741.368,00
1.1.4	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Cantidad: 1 con una dedicación 30%	6	$ 9.869.512,00	1	30%	$ 17.728.756,00
1.1.5	ESPECIALISTA AMBIENTAL Cantidad: 1 con una dedicación 60%	6	$ 9.869.511,00	1	60%	$ 35.457.522,00
1.1.6	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOCantidad: 1 con una dedicación 30%	6	$ 9.869.512,00	1	30%	$ 17.728.756,00
1.1.7	ESPECIALISTA EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS, VOZ Y DATOS Cantidad: 1 con una dedicación 30%	6	$ 9.869.512,00	1	30%	$ 17.728.756,00
1.1.8	ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS GAS Y RECI CONTRA INCENDIOS Cantidad: 1 con una dedicación 30%	6	$ 9.869.512,00	1	30%	$ 17.728.756,00
1.1.9	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA Cantidad: 1 con una dedicación 30%	7	$ 9.869.079,00	1	30%	$ 19.751.161,00
1.1.10	ASESOR JURIDICO Cantidad: 1 con una dedicación 15%	7	$ 9.869.513,00	1	15%	$ 10.341.779,00
1.2	PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR TECNICO					
1.2.1	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cantidad: 6 con una dedicación 100%	6	$ 2.433.099,00	6	100%	$ 87.213.324,00
1.2.2	INSPECTOR DE INTERVENTORIA Cantidad: 6 con una dedicación 100%	6	$ 2.754.046,00	6	100%	$ 66.425.656,00
SUBTOTAL	1. COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO					$ 564.662.389,00
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2.1	GASTOS GENERALES					
2.1.1	GASTOS GENERALES Y/O ADMINISTRATIVOS (OFICINA, SENCILLA, PAPELERIA, COMPUTADORES, SEGURIDAD, FOTOCOPIAS,), COSTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, CONSECUCIONES, IMPRESIÓN DE PLANOS PARA EL ADMINISTRACIÓN Y IMPUESTOS, GARANTIAS Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	7	10.600.000,00			$ 74.256.000,00
SUBTOTAL	2. GASTOS ADMINISTRATIVOS					$ 74.256.000,00
	TOTAL COSTOS PERSONAL - ADMINISTRACIÓN - IMPUESTOS - GARANTIAS - UTILIDAD ESTIMADA OFERTADA					$ 638.918.389,00
	I.V.A. (19%)					$ 121.414.494,00
	VALOR TOTAL OFERTADO					$ 760.332.883,00

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Todas las propuestas deben contemplar dentro de su OFERTA ECONÓMICA, la totalidad del personal mínimo exigido, los costos directos e indirectos y todos los demás gastos en que pueda incurrir el contratista durante la ejecución del contrato. Los proponentes que no diligencien la totalidad de las campos establecidos en el Formulario - "PROPUESTA ECONÓMICA", será objeto de subsanación, la anterior teniendo en cuenta que la oferta económica corresponde a un requisito de carácter habilitante, que no otorga puntaje.

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO efectuará la revisión aritmética de la información contenida en la Propuesta Económica, para efectos del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Los valores propuestos deberán contemplar todos los costos directos e indirectos, para los cuales incurra el proponente en relación con la correcta ejecución del objeto de la presente contratación.

Los precios contenidos en la propuesta económica seleccionada NO ESTAN SUJETOS A REAJUSTE ALGUNO durante la ejecución del contrato, por tal razón, el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la propuesta, su irrevocabilidad y los posibles incrementos durante la ejecución del contrato. La propuesta debe presentarse en pesos colombianos.

El presente proceso de selección se adjudicará por el valor total de la oferta económica presentada y habilitada por el proponente seleccionado. La Propuesta Económica DEBERÁ SER OLEOINCIDA, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y PRESENTADA DE FORMA COMPLETA JUNTO CON LA PROPUESTA AL MOMENTO DEL CIERRE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFERTA ECONOMICA MODIFICATORIO No.2

OBJETO : "INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN LA TRAZA DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."

VALOR OFERTA ECONOMICA - ZONA SUR 5

Nº	DESCRIPCIÓN	PLAZO	PRECIO OFERTADO MES DEDICACIÓN 100% CANTIDAD 1	CANTIDAD	% DEDICACION	VALOR TOTAL
1	COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO					
1.1	PERSONAL PROFESIONAL					
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA- DE OBRA- Cantidad: 1 con una dedicación 100%	3,5	$ 9.869.511,00	1	100%	$ 34.472.588,50
1.1.2	PROFESIONAL DE APOYO Cantidad: 1 con una dedicación 100%	3,5	$ 8.290.042,00	1	100%	$ 22.036.147,00
1.1.3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Cantidad: 1 con una dedicación 100%	3,5	$ 9.920.075,00	1	100%	$ 34.720.262,50
1.1.4	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Cantidad: 1 con una dedicación 30%					$ 0,00
1.1.5	ESPECIALISTA AMBIENTAL Cantidad: 1 con una dedicación 15%	3,5	$ 9.869.512,00	1	15%	$ 5.170.869,00
1.1.6	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOCantidad: 1 con una dedicación 30%					$ 0,00
1.1.7	ESPECIALISTA EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS, VOZ Y DATOS Cantidad: 1 con una dedicación 30%					$ 0,00
1.1.8	ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS GAS Y RECI CONTRA INCENDIOS Cantidad: 1 con una dedicación 30%					$ 0,00
1.1.9	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA Cantidad: 1 con una dedicación 30%					$ 0,00
1.1.10	ASESOR JURIDICO Cantidad: 1 con una dedicación 15%					$ 0,00
1.2	PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR TECNICO					
1.2.1	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cantidad: 1 con una dedicación 100%	3,5	$ 2.433.099,00	1	100%	$ 8.515.746,50
1.2.2	INSPECTOR DE INTERVENTORIA Cantidad: 1 con una dedicación 100%	3,5	$ 2.754.046,00	1	100%	$ 9.639.161,00
SUBTOTAL	1. COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO					$ 119.082.632,00
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2.1	GASTOS GENERALES					
2.1.1	GASTOS GENERALES Y/O ADMINISTRATIVOS (OFICINA, SENCILLA, PAPELERIA, COMPUTADORES, SEGURIDAD, FOTOCOPIAS,), COSTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, CONSECUCIONES, IMPRESIÓN DE PLANOS PARA EL ADMINISTRACIÓN Y IMPUESTOS, GARANTIAS Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	3,5	7.390.313,00			$ 25.997.099,50
SUBTOTAL	2. GASTOS ADMINISTRATIVOS					$ 25.997.099,50
	TOTAL COSTOS PERSONAL - ADMINISTRACIÓN - IMPUESTOS - GARANTIAS - UTILIDAD ESTIMADA OFERTADA					$ 138.909.523,50
	I.V.A. (19%)					$ 26.392.809,47
	VALOR TOTAL OFERTADO					$ 165.302.332,97

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Todas las propuestas deben contemplar dentro de su OFERTA ECONÓMICA, la totalidad del personal mínimo exigido, los costos directos e indirectos y todos los demás gastos en que pueda incurrir el contratista durante la ejecución del contrato. Los proponentes que no diligencien la totalidad de las campos establecidos en el Formulario - "PROPUESTA ECONÓMICA", será objeto de subsanación, la anterior teniendo en cuenta que la oferta económica corresponde a un requisito de carácter habilitante, que no otorga puntaje.

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO efectuará la revisión aritmética de la información contenida en la Propuesta Económica, para efectos del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Los valores propuestos deberán contemplar todos los costos directos e indirectos, para los cuales incurra el proponente en relación con la correcta ejecución del objeto de la presente contratación.

Los precios contenidos en la propuesta económica seleccionada NO ESTAN SUJETOS A REAJUSTE ALGUNO durante la ejecución del contrato, por tal razón, el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la propuesta, su irrevocabilidad y los posibles incrementos durante la ejecución del contrato. La propuesta debe presentarse en pesos colombianos.

El presente proceso de selección se adjudicará por el valor total de la oferta económica presentada y habilitada por el proponente seleccionado. La Propuesta Económica DEBERÁ SER OLEOINCIDA, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y PRESENTADA DE FORMA COMPLETA JUNTO CON LA PROPUESTA AL MOMENTO DEL CIERRE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
NIT: 901.977.271-0
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: serinco.educativo@gmail.com

SERINCO-SED-INT-2025-463

Bogotá D.C., 04 de mayo de 2025

Señores(a):
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE DISTRITO
ARQ. SANTIAGO ANGEL URIBE
Apoyo a la Supervisión
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos – DCCEE

REFERENCIA: *"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS",*

ASUNTO: Alcance al Comunicado Solicitud Modificatorio No. 02 Adición y Prórroga. - Cto Interventoría CO1.PCCNTR.8169110 Grupo 2

Respetado Arquitecto,

En atención al contrato de referencia, suscrito entre **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE DISTRITO y CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**, y de acuerdo con nuestras obligaciones contractuales y dando alcance al Comunicado ***Solicitud Modificatorio No. 02 Adición y Prórroga. - Cto Interventoría CO1.PCCNTR.8169110 Grupo 2*** señalamos que la propuesta enviada el pasado 09-abr-2026 presentaba unos errores aritméticos los cuales fueron subsanados.

1. ANEXOS

Como soporte de la presente solicitud se anexa a la presente:

1.1. Comunicado SERINCO-SED-2025-400-INT-Solicitud Modificatorio No. 02 Adición y Prórroga. - Cto Interventoría
1.2. Propuesta económica
1.3. Copia del CDP

Sin otro particular.

Cordialmente;

HECTOR JOSE VILLAZON GUTIERREZ
Consorcio Serinco Educativo
Director de Interventoría

Cc Consecutivo
Anexo: Según indica

Oficina Principal Calle 98 No 70-91 Oficina 703 Teléfono 3688490 – Bogotá D.C

CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
NIT: 901.977.271-0
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: serinco.educativo@gmail.com

SERINCO-SED-INT-2025-400

Bogotá D.C., 09 de abril de 2025

Señores(a):
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE DISTRITO
ARQ. SANTIAGO ANGEL URIBE
Apoyo a la Supervisión
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos – DCCEE

REFERENCIA: *"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS",*

ASUNTO: Solicitud Modificatorio No. 02 Adición y Prórroga. - Cto Interventoría CO1.PCCNTR.8169110 Grupo 2

Respetado Arquitecto,

En atención al contrato de referencia, suscrito entre **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE DISTRITO y CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**, en atención a la Secretaría De Educación Del Distrito (SED), ha identificado que aún persiste la necesidad manifestada por la Secretaría De Educación Del Distrito (SED):

1. Mejoras en las condiciones físicas de los planteles educativos **I.E.D. CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE Sede A** con actividades de impermeabilización de cubiertas, **I.E.D. COMPARTIR EL RECUERDO Sede A** con actividades de cambio de cubierta en asbesto cemento, cambio de red eléctrica e impermeabilización de placas con poliurea, **I.E.D. ARBORIZADORA ALTA Sede B** con actividades de cambio de cubierta en aulas, cambio de red eléctrica, adecuación de baterías sanitarias y mejoramiento de cancha, los cuales pertenecen a la adición del Lote 4.
2. Mejoras en las condiciones físicas de los planteles educativos ***I.E.D. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA*** con actividades de Cambio de cubierta y adecuación eléctrica en el área de comedor y cocina, ***I.E.D. PARAISO MIRADOR Sede D*** con actividades de adecuaciones y mejoramiento de cerramiento perimetral, **I.E.D. RODRIGO LARA BONILLA Sede B** con actividades de mantenimiento en flanches/cubierta, los cuales pertenecen a la adición del Lote 5.
3. Incluir las actividades a realizar en las instituciones educativas ***I.E.D CIUDAD DE VILLAVICENCIO Sede B*** con actividades de mejoramiento correctivo de cubierta y piso en acceso y corredor principal, mejoramiento correctivo de cerramiento metálico y mejoramiento correctivo de redes de aguas lluvias, los cuales pertenecen a la adición del Lote 6.

SERINCO-SED-INT-2025-400

En aras de dar cumplimiento a los lineamientos contractuales y a razón de las adiciones y prórroga del ***CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 8155135***, ***CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154895*** y ***CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154780*** que mediante la Resolución 0012 del 28 de marzo de 2025 la Entidad abrió el Proceso de Contratación SED-LP-OP-DCCEE-012-2025 y que por medio de la Resolución 0068 del 25 de julio de 2025, corregida mediante Resolución 0071 del 5 de agosto de 2025, la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista. entre la Secretaría De Educación Del Distrito (SED) con Nit. 860.532.363 quien actúa en calidad de contratante y los respectivos consorcios quienes actúan en calidad de contratista.

El Contratista de interventoría solicita una adición y prórroga del ***CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8169110*** que la Entidad abrió el Proceso de selección de CONCURSO DE MERITOS No.SED-CM-A-DCCEE-018-2025 y que mediante la LICITACIÓN PUBLICA No. SED-LP-OP-DCCEE-012-2025, posteriormente la Entidad adjudicó el Contrato a la interventoría entre la Secretaría De Educación Del Distrito (SED) con Nit. 860.532.363 quien actúa en calidad de contratante y el CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO identificado con NIT. 901977271-0 quien actúa en calidad de interventoría, de cual esta interventoría se permite conceptuar:

1. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS "
CONTRATISTA	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO - NIT 901.977.271-0
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8169110

VALOR INICIAL	SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($796.184.131.00) INC. IVA
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE MAYO DE 2026
MODIFICATORIO No. 1	**ADICIÓN:** CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($ 128.425.720,00) INC. IVA **PRÓRROGA:** 1.5 MESES
VALOR TOTAL	NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 924.609.851,00) INC. IVA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE JUNIO DE 2026
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDADES DE CIUDAD BOLÍVAR Y USME

Conforme con lo indicado anteriormente y de acuerdo con las necesidades identificadas por parte de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, a continuación, se relacionan los antecedentes y requerimientos presentados por las partes, los cuales, se requieren incluir dentro del alcance del contrato de interventoría, con base en la justificación presentada por el Contratista y concepto emitido por esta interventoría.

2. ANTECEDENTES

2.1. La SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO de conformidad con lo establecido en el Decreto 330 del 2008 tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución

de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral. De igual forma como acciones tendientes a garantizar la permanencia escolar, promoción de la calidad educativa, prever y asegurar el funcionamiento normal, eficiencia y la buena presentación de las plantas físicas educativas y administrativas, la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, ha priorizado las obras menores y de mejoramiento con características de Reparaciones Locativas en las diferentes localidades de Bogotá, intervenciones que contribuyen a mejorar la infraestructura educativa en temas tales como, la atención prioritaria a las observaciones efectuadas por parte de Secretaria Distrital de Salud, obras menores de mitigación ante posibles riesgos y el mantenimientos correctivo, entre otros aspectos relacionados.

2.2. Es así que la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO adelantó la licitación pública cuyo objeto consistió en la "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" en cumplimiento de la normatividad vigente que rige la contratación pública, adjudicando a la firma CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO identificado con NIT. 901977271-0 mediante contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8169110.

2.3. El alcance proyectado contempla realizar las reparaciones locativas y atención de emergencias en los centros y sedes educativas y administrativas de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, en lo que se incluyen los mantenimientos programados, atención de emergencias en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, con el fin de mejorar las condiciones de cada una de las sedes intervenidas, por un valor de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UNO PESOS M/CTE. ($796.184.131) inc. IVA.

2.4. Si bien el objeto y el alcance del contrato se encuentra determinado y la destinación específica del mismo, por la modalidad de oferta económica presentada en la licitación pública de manera discriminada, la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO estableció y priorizó la ejecución de actividades de obra con las cantidades contenidas en el Formulario 1 del proceso licitatorio, conforme con el presupuesto oficial.

2.5. Conforme a las necesidades identificadas en las sedes educativas intervenidas, se suscribió el **MODIFICATORIO No.1** consistente en una adición y prórroga al contrato, sustentado en la necesidad de atender mayores cantidades de obra y actividades no previstas inicialmente, por un valor de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($ 128.425.720,00) INC. IVA,** y una prórroga de **UN (1) MES Y (QUINCE DÍAS)** requeridos para garantizar la adecuada ejecución de las intervenciones, mejorar las

condiciones de la infraestructura educativa y dar respuesta a situaciones detectadas durante el desarrollo del contrato, en concordancia con las prioridades establecidas por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

2.6. No obstante, y conforme con la dinámica del contrato de obra, la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ha identificado que siguen persistiendo necesidades en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar las cuales, son susceptible de intervención, con necesidades particulares en cuanto a obras de adecuación, mejoramiento y/o mantenimiento correctivo y/o el requerido, con el fin de mejorar las condiciones de las infraestructuras físicas distritales.

2.7. Por lo que, se plantea la necesidad de incluir unas obras adicionales al alcance de los contratos de obra de las siguientes sedes educativas, de lo cual la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO planteó las necesidades de intervención adicional al presupuesto inicial:

LOTE 4:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
CPF 1912 Confederacion Brisas del Diamante	**A**	**CRA. 18 I No. 69 D – 35 Sur**	**Ciudad Bolívar**
CPF 1911 Compartir el Recuerdo	**A**	**Calle 69 sur # 18 B 35**	**Ciudad Bolívar**
CPF 1940 Arborizadora Alta	**A**	**Carrera 43 #70a-50 Sur**	**Ciudad Bolívar**

La adición del presente lote se justifica por el incremento en las cantidades requeridas en una sede educativa y la incorporación de nuevas actividades por los colegios anteriormente mencionados, situación que responde a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio. En consecuencia, como se indicó previamente, se presentan mayores cantidades respecto a la sede **CPF 1912 Confederacion Brisas del Diamante y CPF 1911 Compartir el Recuerdo**, y se adicionan actividades correspondientes a una sedes adicional respecto de las ya contratadas.

LOTE 5:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
CPF 540 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	**A**	**CARRERA 14 B No 76 - 33 SUR**	**Usme**
CPF 1982 PARAISO MIRADOR	**D**	**CARRERA 27Q # 71N- 02 SUR**	**Ciudad Bolívar**
CPF 1921 RODRIGO LARA BONILLA	**B**	**Cl. 64 Sur #29-19 Sur**	**Ciudad Bolívar**

La adición del presente lote se justifica por el incremento en las cantidades requeridas en una sede educativa y la incorporación de nuevas actividades por los colegios anteriormente mencionados, situación que responde a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio. En consecuencia, como se indicó previamente, se presentan mayores cantidades respecto a la sede **CPF 540 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA**, y se adicionan actividades correspondientes a dos sedes adicionales respecto de las ya contratadas.

LOTE 6:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
CIUDAD DE VILLAVICENCIO	**B**	**Cra 6H Este # 114 - 88 Sur**	**Usme**

La adición del presente lote se justifica por la incorporación de nuevas actividades requeridas por el colegio anteriormente mencionado, las cuales serán agregadas al presente contrato. Esta situación obedece a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio. En consecuencia, como se indicó previamente, se adicionan actividades correspondientes a una sede adicional respecto de las ya contratadas.

3. MOTIVACIONES

De acuerdo con lo ya detallado y las necesidades planteadas por parte de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, se presenta la solicitud de prórroga y adición requerida para el contrato de interventoría, conforme con las siguientes motivaciones:

3.1. La SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO tiene dentro de sus obligaciones mejorar las condiciones actuales de las instituciones educativas y administrativas de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, con el fin de garantizar el derecho a la Educación de la comunidad educativa, condición que bajo la inclusión de recursos para mejoramientos al contrato de obra puede beneficiar a más población y que a su vez involucra a la interventoría como entidad de control ante los contratos de obra.

3.2. A continuación, se presentan las intervenciones propuestas por la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y revisadas por parte de Contratista e Interventoría, las cuales son objeto de la solicitud de prórroga y adición:

Se recuerda que la adición del lote 4 y 5 se justifica por el incremento en las cantidades requeridas y la incorporación de nuevas actividades por los colegios anteriormente mencionados, situación que responde a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio. En consecuencia, como se indicó previamente, se presentan mayores cantidades respecto de las sedes ya contratadas como se observa a continuación:

➢ **CPF 1912 I.E.D. Confederacion Brisas del Diamante - Sede A**

El alcance de las obras a ejecutar en esta sede educativa son los siguientes:

- Mayor área de impermeabilización de cubierta de danzas, administración y espacio de vigilancia, incluyendo retiro de manto, destronque de superficie y aplicación de pintura.

➢ **CPF 1911 I.E.D. Compartir El Recuerdo - Sede A**

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Cambio de cubierta en asbesto cemento
- Cambio de red eléctrica
- Impermeabilización de placas con poliurea

➢ **CPF 1940 I.E.D. Arborizadora Alta - Sede B**

El alcance de las obras a ejecutar en esta sede educativa son los siguientes:

- Cambio de cubierta en aulas
- Cambio de red eléctrica
- Adecuación de baterías sanitarias
- Mejoramiento de cancha

➢ **CPF 540 I.E.D. Miguel de Cervantes Saavedra - Sede A**

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Cambio de cubierta y adecuación eléctrica en el área de comedor y cocina

➢ **CPF 1982 I.E.D. Paraiso Mirador - Sede D**

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Adecuación y mejoramiento cerramiento perimetral

➢ **CPF 1921 I.E.D. Rodrigo Lara Bonilla - Sede B**

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Mantenimiento flanches cubierta
- Tratamiento de humedades en aulas y batería de baño primer piso

Se recuerda que la adición del presente lote 6 se justifica por la incorporación de nuevas actividades requeridas por los colegios anteriormente mencionados, las cuales serán agregadas al presente contrato. Esta situación obedece a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio. En consecuencia, como se indicó previamente, se adicionan actividades

correspondientes a dos sedes adicionales respecto de las ya contratadas como se observa a continuación:

➢ **CPF 545 Ciudad de Villavicencio - Sede B**

El alcance de las obras a ejecutar en esta sede educativa son los siguientes:

- Mejoramiento correctivo de cubierta y piso en acceso y corredor principal
- Mejoramiento correctivo de cerramiento metálico
- Mejoramiento correctivo de redes de aguas lluvias

3.3. Teniendo en cuenta los alcances indicados, a continuación, se relaciona el balance financiero de cada una de las intervenciones:

De acuerdo con los alcances y estimaciones financieras de las siete (7) instituciones educativas relacionados anteriormente, es necesario disponer de una adición presupuestal al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110, de **CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CENTAVOS** ***M/CTE ($ 162.875.214,00)*** INCLUIDO IVA y una prórroga de CIENTO SIETE (107) DÍAS CALENDARIO, es decir, hasta el 05 de octubre de 2026.

Finalmente, conforme con las necesidades de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO respecto a las sedes a intervenir, esta interventoría concluye lo siguiente:

4. CONCLUSIONES

De acuerdo con las consideraciones expuestas por parte del Contratista y las necesidades requeridas por parte de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, esta Interventoría indica que se realizó la debida revisión de cada uno de los alcances planteados por los Contratistas mediante comunicado del asunto, por lo que emitimos concepto favorable para la inclusión de las siguientes sedes educativas conforme con las actividades contractuales establecidas en el Formulario 1 del proceso licitatorio:

LOTE 4:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	LOCALIDAD	VALOR PRESUPUESTAL	TIEMPO
CPF 1912 Confederacion Brisas del Diamante	**Ciudad Bolívar**	**$ 106.000.000,00**	**21 días (veintiún días)**
CPF 1911 Compartir el Recuerdo	**Ciudad Bolívar**	**$ 293.000.000,00**	**97 días (noventa y siete días)**
CPF 1940 Arborizadora Alta	**Ciudad Bolívar**	**$ 464.000.000,00**	**127 días (ciento veintisiete días)**

LOTE 5:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	LOCALIDAD	VALOR PRESUPUESTAL	TIEMPO
CPF 540 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	**Usme**	**$ 300.000.000,00**	**107 días (ciento siete días)**
CPF 1982 PARAISO MIRADOR	**Ciudad Bolívar**	**$ 252.000.000,00**	**106 días (ciento seis días)**
CPF 1921 RODRIGO LARA BONILLA	**Ciudad Bolívar**	**$ 65.000.000,00**	**80 días (ochenta días)**

LOTE 6:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	LOCALIDAD	VALOR PRESUPUESTAL	TIEMPO
CPF 545 CIUDAD VILLAVICENCIO - SEDE B	**Usme**	**$ 294,297,000,00**	**101 días (ciento un días)**

Lo cual genera la necesidad de disponer de una adición presupuestal al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110, de **CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CENTAVOS** ***M/CTE ($ 162.875.214,00)*** INCLUIDO IVA y una prórroga de CIENTO SIETE (107) DÍAS CALENDARIO, es decir, hasta el 05 de octubre de 2026.

5. SOLICITUDES

Esta interventoría de manera atenta pone a consideración de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO las siguientes solicitudes:

5.1. ADICIÓN: Con el fin de cumplir con los alcances necesarios en cada una de las sedes educativas planteadas, se solicita disponer de una adición presupuestal al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110, de **CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CENTAVOS** ***M/CTE ($ 162.875.214,00)*** INCLUIDO IVA.

5.2. PRÓRROGA: Teniendo en cuenta el plazo necesario para la ejecución de las obras de adecuación, mantenimiento y/o mejoramiento en las sedes educativas, se solicita una prórroga al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 por el término de CIENTO SIETE DÍAS CALENDARIO (3.53 MESES), es decir hasta el 05 de octubre de 2026.

6. ANEXOS

Como soporte de la presente solicitud se anexa a la presente:

6.1. Propuesta económica
6.2. Certificados de Antecedentes:
- Contraloría y Personería
- Procuraduría y Policía
- Inhabilidades y RNMC

Sin otro particular.

Cordialmente;

HECTOR JOSE VILLAZON GUTIERREZ
Consorcio Serinco Educativo
Director de Interventoría
Cc Consecutivo
Anexo: Según indica

0112 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

@firmaDigital1

CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ

Número : 514

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2026 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117220120200008	Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.	O2320202005040154129 Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	1-100-F039 VA-CRÉDITO	162.875.214
			Total	**162.875.214**

Objeto:

M_2_ ADICIÓN CONTRATO INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.CO1.PCCNTR.8169110/25 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 2.

Se expide a solicitud de ABEL REINERIO MATIZ SALAZAR Cargo SUBSECRETARIO DE ACCESO Y PERMANENCIA, mediante oficio número 390 de MARZO 09 DE 2026.

Bogotá D.C. MARZO 12 DE 2026

Documento firmado por: CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: CCARMONA 12.03.2026

Elaboró: RHERNANDEZ 12.03.2026

Impresión: 12.03.2026-19:58:39 CCARMONA 0000869450 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

OFERTA ECONOMICA MODIFICATORIO No.2

OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."

VALOR OFERTA ECONOMICA - ZONA SUR II

Nº	DESCRIPCIÓN	PLAZO	PRECIO OFERTADO MES DEDICACIÓN 100% CANTIDAD 1	CANTIDAD	% DEDICACION	VALOR TOTAL
1	**COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**					
1.1	**PERSONAL PROFESIONAL**					
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA Cantidad: 1 con una dedicación 100%	3,5	$ 9.849.311,00	1	100%	$ 34.472.589,00
1.1.2	PROFESIONAL DE APOYO Cantidad: 1 con una dedicación 100%	3,5	$ 6.296.042,00	1	100%	$ 22.036.147,00
1.1.3	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA Cantidad: 1 con una dedicación 100%	3,5	$ 8.930.075,00	1	100%	$ 31.255.263,00
1.1.4	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Cantidad: 1 con una dedicación 30%					$ 0,00
1.1.5	ESPECIALISTA AMBIENTAL Cantidad: 1 con una dedicación 15%	3,5	$ 9.849.311,67	1	15%	$ 5.170.890,00
1.1.6	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOCantidad: 1 con una dedicación 30%					$ 0,00
1.1.7	ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, VOZ Y DATOS Cantidad: 1 con una dedicación 30%					$ 0,00
1.1.8	ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS GAS Y RED CONTRA INCENDIOS Cantidad: 1 con una dedicación 30%					$ 0,00
1.1.9	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA Cantidad: 1 con una dedicación 30%					$ 0,00
1.1.10	ASESOR JURÍDICO Cantidad: 1 con una dedicación 15%					$ 0,00
1.2	**PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO**					
1.2.1	TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cantidad: 1 con una dedicación 100%	3,5	$ 2.422.509,00	1	100%	$ 8.478.782,00
1.2.2	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA Cantidad: 1 con una dedicación 100%	3,5	$ 2.734.046,00	1	100%	$ 9.569.161,00
SUBTOTAL	**1. COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**					**$ 110.982.832,00**
2	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**					
2.1	**GASTOS GENERALES**					
2.1.1	GASTOS GENERALES Y/O ADMINISTRATIVOS (OFICINA SENCILLA, PAPELERÍA, COMPUTADORES, SECUENCIA FOTOGRÁFICA, COSTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMUNICACIONES, IMPRESIÓN DE PLANOS PARA EL INTERVENTOR) IMPUESTOS, GARANTIAS Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	3,5	$ 7.396.313,09			$ 25.887.096,00
SUBTOTAL	**2. GASTOS ADMINISTRATIVOS**					**$ 25.887.096,00**
	TOTAL COSTOS PERSONAL - ADMINISTRACIÓN - IMPUESTOS - GARANTÍAS - UTILIDAD ESTIMADA OFERTADA					**$ 136.869.928,00**
	I.V.A. (19%)					**$ 26.005.286,00**
	VALOR TOTAL OFERTADO					**$ 162.875.214,00**

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Todas las propuestas deben contemplar dentro de su OFERTA ECONÓMICA, la totalidad del personal mínimo exigido, los costos directos e indirectos y todos los demás gastos en que pueda incurrir el contratista durante la ejecución del contrato. Los proponentes que no diligencien la totalidad de los campos establecidos en el Formulario – "PROPUESTA ECONÓMICA", será objeto de subsanación, lo anterior teniendo en cuenta que la oferta económica corresponde a un requisito de carácter habilitante, que no otorga puntaje.

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO efectuará la revisión aritmética de la información contenida en la Propuesta Económica, para efectos del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Los valores propuestos deberán contemplar todos los costos directos e indirectos, para los cuales incurra el proponente en relación con la correcta ejecución del objeto de la presente contratación.

Los precios contenidos en la propuesta económica seleccionada NO ESTÁN SUJETOS A REAJUSTE ALGUNO durante la ejecución del contrato, por tal razón, el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la propuesta, su irrevocabilidad y los posibles incrementos durante la ejecución del contrato. La propuesta debe presentarse en pesos colombianos.

El presente proceso de selección se adjudicará por el valor total de la oferta económica presentada y habilitada por el proponente seleccionado. La Propuesta Económica DEBERÁ SER DILIGENCIADA, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y PRESENTADA DE FORMA COMPLETA JUNTO CON LA PROPUESTA AL MOMENTO DEL CIERRE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.602.923**

CASTILLO CURIEUX

APELLIDOS

ERICK JOSE

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-ENE-1974**

SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-ABR-1992 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00001321-M-0079602923-20080321 0000035081A 1 6180002081

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79602923 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 06/05/2026 08:38 AM

Código Verificación: **U4J1R7SNKZ**

Válida hasta: **04/08/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 295350486

PIB
15:50:18

Bogotá DC, 05 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79602923:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Olga Lucía Tibocha Cortés
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 295353601

PIB
16:02:24

Bogotá DC, 05 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S identificado(a) con NIT número 9010942892:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Olga Lucía Tibocha Cortés
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 05 de mayo de 2026, a las 15:52:04, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79602923
Código de Verificación	79602923260505155204

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 05 de mayo de 2026, a las 15:53:01, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9010942892
Código de Verificación	901094289226050515530 1

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/05/2026 04:10:09 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **79602923** y Nombre: **ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **139564927** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/05/2026 04:08:18 p. m. para **- NIT, sin digito de verificación:** Nº. **901094289**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **139564603** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 04:05:11 PM horas del 05/05/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **79602923**
Apellidos y Nombres: **CASTILLO CURIEUX ERICK JOSE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 16:12:19 horas del 05/05/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **79602923,** Apellidos y Nombres **CASTILLO CURIEUX ERICK JOSE**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **ARINCO**, con NIT **901094289-2** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 14 de mayo de 2026, a las 15:49:06, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	80070003
Código de Verificación	80070003260514154906

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 14 de mayo de 2026, a las 15:49:19, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9002084256
Código de Verificación	9002084256260514154919

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 295976667

PIB
15:48:33

Bogotá DC, 14 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona SEIING S.A.S. BIC identificado(a) con NIT número 9002084256:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 295976558

PIB
15:47:38

Bogotá DC, 14 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80070003:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 15:45:01 horas del 14/05/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **80070003,** Apellidos y Nombres **GONZALEZ CAMARGO LUIS ALEJANDRO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **seiing s.a.s**, con NIT **900208425-6** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

© 2026 Policía Nacional de Colombia - Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DIJIN

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 14/05/2026 03:45:57 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **80070003** y Nombre: **LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **140213563** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:40:34 PM horas del 14/05/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **80070003**

Apellidos y Nombres: **GONZALEZ CAMARGO LUIS ALEJANDRO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Todos los derechos reservados.

0112 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

@firmaDigital1

CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ

Número : 514

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2026 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117220120200008	Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.	O2320202005040154129 Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	1-100-F039 VA-CRÉDITO	162.875.214
			Total	**162.875.214**

Objeto:

M_2_ ADICIÓN CONTRATO INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.CO1.PCCNTR.8169110/25 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 2.

Se expide a solicitud de ABEL REINERIO MATIZ SALAZAR Cargo SUBSECRETARIO DE ACCESO Y PERMANENCIA, mediante oficio número 390 de MARZO 09 DE 2026.

Bogotá D.C. MARZO 12 DE 2026

Documento firmado por: CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: CCARMONA 12.03.2026

Elaboró: RHERNANDEZ 12.03.2026

Impresión: 12.03.2026-19:58:39 CCARMONA 0000869450 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Outlook

SOLICITUD_CONTINUIDAD_FLUJO_DE_APROBACION_POLIZA_CTO_8169110_AMP_M1_CONSORCIO_SERINCO_EDUCATIVO

Desde GLORIA ADRIANA CHAPARRO PINZON <gchaparro@educacionbogota.gov.co>
Fecha Mié 14/01/2026 14:38
Para ANA MARIA BRICENO CAMPOS <ana.briceno@educacionbogota.gov.co>

4 archivos adjuntos (38 MB)
3) MEMORANDO.pdf; 4) POLIZAS.pdf; 5) MODIFICACION 1.pdf; CAP_CTO_8169110_AMP_M1_CONSORCIO_SERINCO_EDUCATIVO.docx;

¡Cordial Saludo Doctora Ana María!


De manera atenta remito CAP y póliza del **Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 del 04 de septiembre de 2025**, suscrito con **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO con** NIT 901.977.271-0, expedida para amparar la Modificación 1 de fecha 23 de diciembre de 2025, cuyos aspectos generales se encuentran detallados en la póliza allegada, para su aprobación, según solicitud de radicado I-2026-1941 del 14 de enero del 2026.

La garantía se encuentra en flujo de aprobación en plataforma SECOP II.

Una vez la póliza quede aprobada realizaré el cargue de la documentación en SharePoint, se remitirá a la supervisión del contrato.

Adicionalmente, la póliza fue consultada con la Aseguradora como se evidencia en la captura de pantalla:

Póliza de Cumplimiento BCH 100046043 Certificado No.97140828, Anexo 6
Fecha Expedición: 31 de diciembre del 2025

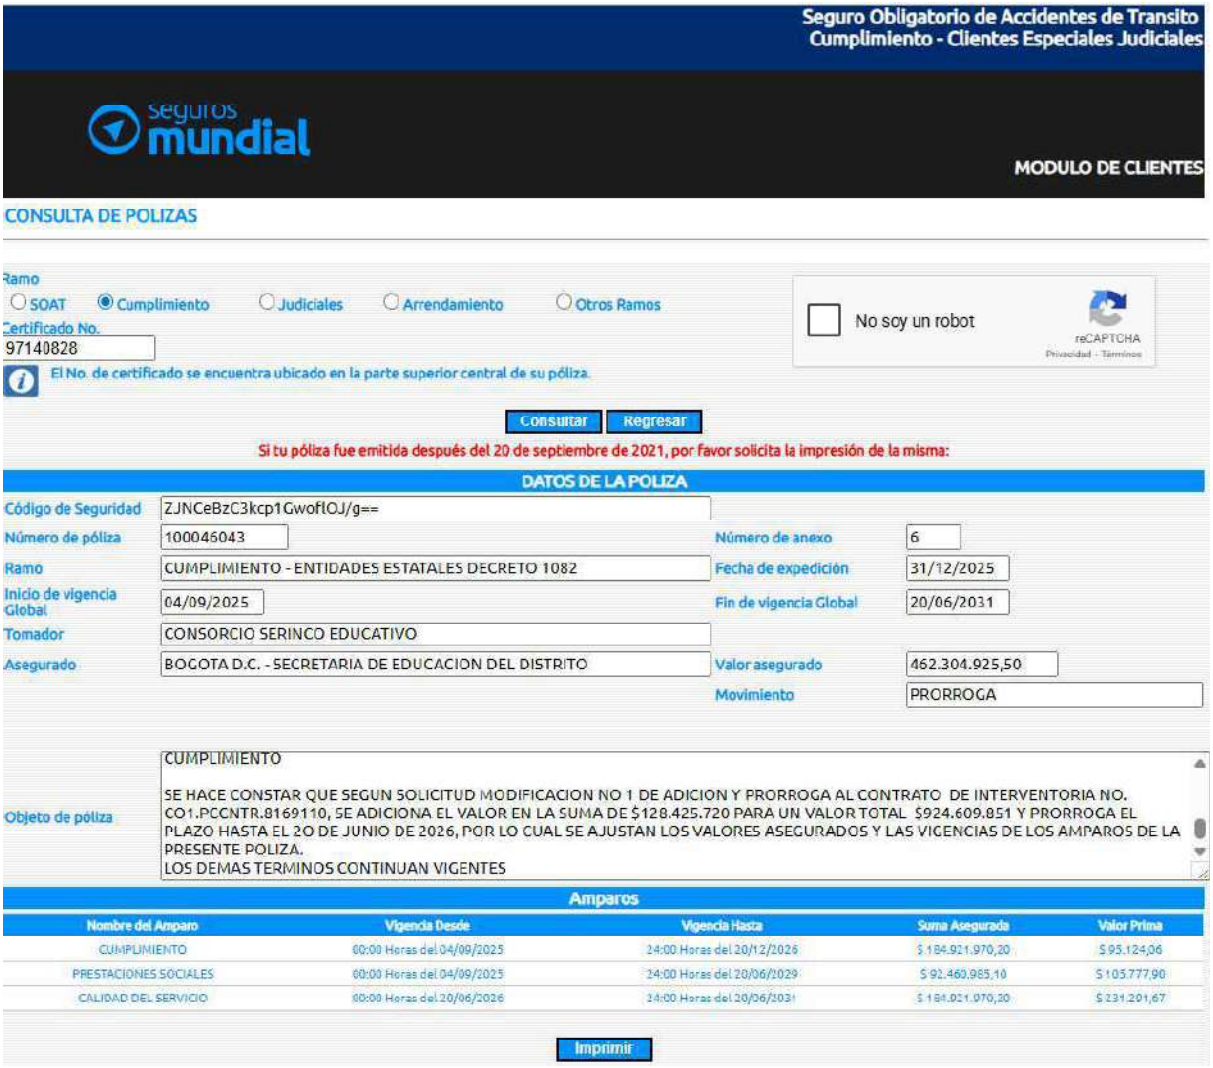

Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito
Cumplimiento - Clientes Especiales Judiciales

seguros mundial

MODULO DE CLIENTES

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo
SOAT Cumplimiento Judiciales Arrendamiento Otros Ramos

Certificado No.
97140828

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.

No soy un robot
reCAPTCHA
Privacidad - Términos

Consultar Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	ZJNCeBzC3kcp1GwofIOJ/g==		
Número de póliza	100045043	Número de anexo	6
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	31/12/2025
Inicio de vigencia Global	04/09/2025	Fin de vigencia Global	20/06/2031
Tomador	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		
Asegurado	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	Valor asegurado	462.304.925,50
		Movimiento	PRORROGA

Objeto de póliza:
CUMPLIMIENTO

SE HACE CONSTAR QUE SEGUN SOLICITUD MODIFICACION NO 1 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO1.PCCNTR.8169110, SE ADICIONA EL VALOR EN LA SUMA DE $128.425.720 PARA UN VALOR TOTAL $924.609.851 Y PRORROGA EL PLAZO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2026, POR LO CUAL SE AJUSTAN LOS VALORES ASEGURADOS Y LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 04/09/2025	24:00 Horas del 20/12/2026	$ 184.921.970,20	$ 95.124,06
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 04/09/2025	24:00 Horas del 20/06/2029	$ 92.460.985,10	$ 105.777,90
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 20/06/2026	24:00 Horas del 20/06/2031	$ 184.921.970,20	$ 231.201,67

Imprimir

Cordialmente,

Gloria Adriana Chaparro Pinzón
Profesional Universitario (E)
Oficina de Contratos
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
gchaparro@educacionbogota.gov.co
Bogotá, Colombia

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA		
No. Radicación:	Código Depende.	Consecutivo
FECHA:	/ /	

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA

Aprobación: SECOP II

PARA: **ANDRES IVANNO GALEANO TORO**
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

DE: **ANA MARIA BRICEÑO CAMPOS**
Jefe de Oficina de Contratos

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 del 04 de septiembre de 2025
Proceso de Contratación: SED-CM-A-DCCEE-018-2025
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
NIT 901.977.271-0

FECHA DE APROBACION: 14 de enero del 2026

La Oficina de Contratos de la SED **APROBÓ** la garantía constituida en relación con el contrato de la referencia, en los términos legalmente requeridos, expedida para amparar la Modificación 1 de fecha 23 de diciembre de 2025, cuyos aspectos generales se encuentran detallados en la póliza allegada y cargada en la plataforma SECOP II y en SharePoint.

RADICADO:	I-2026-1941 del 14 de enero del 2026
GARANTE O ASEGURADOR:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
BENEFICIARIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
AFIANZADO O TOMADOR	**CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**
GARANTIAS:	Póliza de Cumplimiento BCH 100046043 Certificado No.97140828, Anexo 6 Fecha Expedición: 31 de diciembre del 2025

*En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación.

IMPORTANTE: Para la aprobación de cada pago, es responsabilidad del supervisor y/o interventor verificar: 1. Vigencia de la(s) garantía(s). 2. Cumplimiento del contratista de las obligaciones, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

Se recuerda a la supervisión, que para efectos de ejecución del Contrato se requiere previamente, la expedición del CRP y la aprobación de la garantía.

Adicionalmente, se recuerda que es obligación del supervisor verificar que se actualicen las garantías del contrato en cada modificación contractual y allegarlas oportunamente a la Oficina de Contratos.

ANA MARIA BRICEÑO CAMPOS
Jefe de Oficina de Contratos

Elaboró: Gloria Adriana Chaparro Pinzón - Profesional Universitario -Of de Contratos
Original: Archivo Expediente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

No. Radicación: Código Depende. -Consecutivo

FECHA: / /

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía	CO1.WRT.18819347
Referencia de la garantía	Poliza de Cumplimiento
Estado	Aprobado
Justificación	☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ☑ Cumplimiento - Pago de salarios ☑ Cumplimiento - Calidad del servicio
Tipo de garantía	◉ Contrato de seguro ○ Patrimonio autónomo ○ Garantía bancaria
Entidad aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Número de póliza	BCH-100046043
Tomador	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
Beneficiario	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	184.921.970,20 COP	20/12/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	92.460.985,10 COP	20/06/2029 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	184.921.970,20 COP	20/06/2031 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	Poliza_10_BCH-100046043_6_compressed.pdf	Poliza_10_BCH-100046043_6_compressed.pdf	Descargar	Detalle

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

MEMORANDO

Radicado Nº **I-2026-1941**
Fecha: 14-01-2026 - 07:40
Folios: 16 Anexos: 1
Radicador: ANDRES IVANNO GALEANO TORO - 4300
Destino: 5220 - OFICINA DE CONTRATOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: HND58

PARA: **ANA MARIA BRICEÑO CAMPOS**
Oficina de Contratos
e-mail: ana.briceno@educacionbogota.gov.co

DE: **ANDRES GALEANO TORO**
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Subsecretaría de Acceso y Permanencia

ASUNTO: Remisión Actualización Póliza de Cumplimiento Modificatorio No. 01 – Contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.8169110 de 2025 – CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

Respetada Doctora Ana María,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de la firma y revisión preliminar de la garantía exigida conforme a lo establecido en el pliego de condiciones del Contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.8169110, celebrado entre la Secretaría de Educación Distrital (SED) y el CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO, nos permitimos de manera atenta radicar para su revisión y aprobación la actualización de la póliza según acta de inicio

ASEGURADORA	PÓLIZA No.	ANEXO	DESCRIPCIÓN	No. FOLIOS
Compañía Seguros Mundial	BCH-100046043	3, 4, 5 6 6	Póliza de Cumplimiento	14

Los documentos relacionados se encuentran cargados en la plataforma transaccional SECOP II para su consulta.

Cordialmente

ANDRÉS GALEANO TORO
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

ANEXO: Póliza BCH-100046043 (14 folios)

Revisó: Arq. Jorge Moreno – Profesional DCCEE

Elaboró: Arq. Santiago Angel – Contratista DCCEE

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.12.31 11:52:28 -05:00

Código de Seguridad: ZJNCeBzC3kcp1GwoflOJ/g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100045043	**No. ANEXO**	6	**No. CERTIFICADO**	97140828	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	31/12/2025	**SUC. EXPEDIDORA**	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2025	24:00 Horas Del	20/06/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.977.271-0
DIRECCIÓN	TV 52 B # 2 - 30 AP 202	**TELÉFONO**	3142190224
ASEGURADO	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	TV 78K # 41A 04 SUR	**TELÉFONO**	3241000
BENEFICIARIO	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	TV 78K # 41A 04 SUR	**TELÉFONO**	3241000

OBJETO DE CONTRATO

SE HACE CONSTAR QUE SEGUN SOLICITUD MODIFICACION NO 1 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO1.PCCNTR.8169110, SE ADICIONA EL VALOR EN LA SUMA DE $128.425.720 PARA UN VALOR TOTAL $924.609.851 Y PRORROGA EL PLAZO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2026, POR LO CUAL SE AJUSTAN LOS VALORES ASEGURADOS Y LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO1.PCCNTR.8169110 , CUYO OBJETO ES EL OBJETO DEL CONTRATO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE NO. 2

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 04/09/2025	24:00 Horas Del 20/12/2026	184.921.970,20	95.124,86
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 04/09/2025	24:00 Horas Del 20/06/2029	92.460.985,10	105.777,90
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 20/06/2026	24:00 Horas Del 20/06/2031	184.921.970,20	231.291,67
		TOTAL ASEGURADO	$ 462.304.925,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CPM ASESORES EN SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	432.193,63
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	432.193,63
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	82.116,79
TOTAL A PAGAR	$	514.310,42

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 31/12/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100046043	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	97140828	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	31/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2025	24:00 Horas Del	20/06/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR: CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO CONFORMADO POR:
ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S NIT: 901.094.289-2 PART. 50 %
SEIING SAS NIT: 900.208.425-6 PART. 50 %
ASEGURADO/BENEFICIARIO: BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO NIT: 899.999.061-9

NOTA: EL AMPARO DE PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA A PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES POR 5 AÑOS PLAZO DE GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA


PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Safety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BCH-100046043** y endoso, **6** cuyo afianzado es: **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO** Asegurado o Beneficiario: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO / BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO** , expedida por la Compañía en **31/12/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN BOGOTA - CHICO a los **31** días del mes **DICIEMBRE** del año **2025**.



Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 2SHKQd5UGE9+J52mktdCwQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100046043	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	97136166	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2025	24:00 Horas Del	06/05/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	No. DOC. IDENTIDAD	901.977.271-0
DIRECCIÓN	TV 52 B # 2 - 30 AP 202	TELÉFONO	3142190224
ASEGURADO	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.061-9
DIRECCIÓN	TV 78K # 41A 04 SUR	TELÉFONO	3241000
BENEFICIARIO	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.061-9
DIRECCIÓN	TV 78K # 41A 04 SUR	TELÉFONO	3241000

OBJETO DE CONTRATO

SE HACE CONSTAR QUE SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA OCTUBRE 06/2025 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. C01.PCCNTR.8169110, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMAPROS DE LA PRESENTE POLIZA, QUEDANDO COMO SE INDICA EN LA SECCION DE AMPAROS.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. C01.PCCNTR.8169110 , CUYO OBJETO ES EL OBJETO DEL CONTRATO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES. QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS. GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE NO. 2

TOMADOR: CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO CONFORMADO POR:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 04/09/2025	24:00 Horas Del 05/11/2026	159.236.827,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 04/09/2025	24:00 Horas Del 05/05/2029	79.618.414,00	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 06/05/2026	24:00 Horas Del 06/05/2031	159.236.827,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 398.092.068,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CPM ASESORES EN SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/10/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente.
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y ASIA - ANIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100046043	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	97136166	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/10/2025	SUC EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2025	24:00 Horas Del	06/05/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S NIT: 901.094.289-2 PART. 50 %
SEING SAS NIT: 900.208.425-6 PART. 50 %
ASEGURADO/BENEFICIARIO: BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO NIT: 899.999.061-9

NOTA: EL AMPARO DE PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA A PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES POR 5 AÑOS PLAZO DE GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BCH-100046043** y endoso, **5** cuyo afianzado es: **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO** Asegurado o Beneficiario: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO / BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO** , expedida por la Compañía en **24/10/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN BOGOTA - CHICO a los **30** días del mes **DICIEMBRE** del año **2025.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: EvaEzZoDIMX+QAIPO8sguQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100046043	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	97136114	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	24/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2025	24:00 Horas Del	04/04/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	No. DOC. IDENTIDAD	901.977.271-0
DIRECCIÓN	TV 52 B # 2 - 30 AP 202	TELÉFONO	3142190224
ASEGURADO	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.061-9
DIRECCIÓN	TV 78K # 41A 04 SUR	TELÉFONO	3241000
BENEFICIARIO	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.061-9
DIRECCIÓN	TV 78K # 41A 04 SUR	TELÉFONO	3241000

OBJETO DE CONTRATO

SE HACE CONSTAR QUE EFECTUA ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA MANTENIENDO LAS VIGENCIAS INICIALES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO1.PCCNTR.8169110 , CUYO OBJETO ES EL OBJETO DEL CONTRATO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE NO. 2

TOMADOR: CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO CONFORMADO POR:
ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S NIT: 901.094.289-2 PART. 50 %

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 04/09/2025	24:00 Horas Del 04/10/2026	159.236.827,00	310.185,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 04/09/2025	24:00 Horas Del 04/04/2029	79.618.414,00	513.571,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 04/04/2026	24:00 Horas Del 04/04/2031	159.236.827,00	1.433.917,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 398.092.068,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CPM ASESORES EN SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	2.257.673,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	2.257.673,00
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	430.439,87
TOTAL A PAGAR	$	2.695.912,87

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 23/10/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente.
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100046043	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	97136114	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/10/2025	SUC EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2025	24:00 Horas Del	04/04/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SEIING SAS NIT: 900.208.425-6 PART. 50 %
ASEGURADO/BENEFICIARIO: BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO NIT: 899.999.061-9

NOTA: EL AMPARO DE PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA A PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES POR 5 AÑOS PLAZO DE GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BCH-100046043** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO** Asegurado o Beneficiario: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO / BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO** , expedida por la Compañía en **24/10/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN BOGOTA - CHICO a los **07** días del mes **ENERO** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	97136114

Fecha de Facturación	24/10/2025	
TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	BCH-100046043	
Periodo Facturado	04/09/2025	04/04/2031

Fecha Límite de Pago	23/11/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	2.265.473,00
IVA	430.439,87
VALOR TOTAL A PAGAR $	2.695.912,87

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
TV 52 B # 2 - 30 AP 202	901977271
Intermediario	CPM ASESORES EN SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	97136114

Fecha de Facturación	24/10/2025	
TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	BCH-100046043	
Periodo Facturado	04/09/2025	04/04/2031

Fecha Límite de Pago	23/11/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	2.265.473,00
IVA	430.439,87
VALOR TOTAL A PAGAR $	2.695.912,87

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
TV 52 B # 2 - 30 AP 202	901977271
Intermediario	CPM ASESORES EN SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000097136114(3900)269591287(96)20251123

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229900000097136114(3900)269591287(96)20251123

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: +Bg4oIgKNBPISvTBlYHcQQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANULACION DE ANEXO DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100046043	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	97136093	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	06/10/2025	24:00 Horas Del	06/05/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	No. DOC. IDENTIDAD	901.977.271-0
DIRECCIÓN	TV 52 B # 2 - 30 AP 202	TELÉFONO	3142190224
ASEGURADO	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.061-9
DIRECCIÓN	TV 78K # 41A 04 SUR	TELÉFONO	3241000
BENEFICIARIO	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.061-9
DIRECCIÓN	TV 78K # 41A 04 SUR	TELÉFONO	3241000

OBJETO DE CONTRATO

SE HACE CONSTAR QUE SE ANULA EL ANEXO NO 2 EN RAZON A QUE LA ENTIDAD CONTRATANTE EXIGE QUE LAS VIGENCIAS DEBEN MANTNERSE DESDE SU INICIACION.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO1.PCCNTR.8169110 , CUYO OBJETO ES EL OBJETO DEL CONTRATO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES. QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS. GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE NO. 2

TOMADOR: CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO CONFORMADO POR:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 06/10/2025	24:00 Horas Del 05/11/2026	-159.236.827,00	-310.185,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 06/10/2025	24:00 Horas Del 06/05/2029	-79.618.414,00	-513.571,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 06/05/2026	24:00 Horas Del 06/05/2031	-159.236.827,00	-1.433.917,00
		TOTAL ASEGURADO	$ -398.092.068,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CPM ASESORES EN SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	-2.257.673,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	-2.257.673,00
GASTOS EXP.	$	-7.800,00
IVA	$	-430.439,87
TOTAL A PAGAR	$	-2.695.912,87

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 23/10/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente.
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANULACION DE ANEXO DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100046043	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	97136093	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/10/2025	SUC EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	06/10/2025	24:00 Horas Del	06/05/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S NIT: 901.094.289-2 PART. 50 %
SEING SAS NIT: 900.208.425-6 PART. 50 %
ASEGURADO/BENEFICIARIO: BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO NIT: 899.999.061-9

NOTA: EL AMPARO DE PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA A PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES POR 5 AÑOS PLAZO DE GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BCH-100046043** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO** Asegurado o Beneficiario: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO / BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO** , expedida por la Compañía en **23/10/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN BOGOTA - CHICO a los **07** días del mes **ENERO** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Radicado Nº I-2025-169875
Fecha: 12-12-2025 - 07:30
Folios: 100 Anexos: INCLUIDOS
Radicador: ANDRES IVANNO GALEANO TORO - 4300
Destino: 5220 - OFICINA DE CONTRATOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: 79AG7

Bogotá D.C., diciembre de 2025

MEMORANDO

Para: **ANA MARÍA BRICEÑO CAMPOS**
Jefe Oficina de Contratos

De: **ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO**
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Asunto: Remisión Solicitud de Modificación No. 1 – Adición y Prórroga – Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025

Respetada,

En el marco de las competencias asignadas a la Oficina de Contratos y para los fines pertinentes, me permito remitir la solicitud de modificación No. 1 correspondiente a la adición y prorroga del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025 suscrito entre la SED y CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO.

Agradecemos su atención y apoyo, y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional para el avance del trámite.

Sin otro particular,

Cordialmente,

ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos – SED

Proyecto: Katherin Velez García – Abogada Contratista DCCEE.

Anexo: Soc y anexos del mismo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA
No.
Radicación:

Dependencia Responsable:	**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DCCEE**		
I. DATOS CONTRACTUALES			
No. Contrato/convenio:	CO1.PCCNTR.8169110 DE 2025	**Tipo de contrato/convenio:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Contratista/Asociado:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	**Plazo Inicial:**	SIETE (07) MESES
Objeto:	*INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"* – LOTE 2.		
Valor inicial	SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHNETA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS MCTE ($ 796´184.131), INCLUIDO IVA Y DEMÁS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN POR EL HECHO DE SU CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN, EQUIVALENTES A 559,31 SMMLV PARA EL AÑO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 2025.	**Fecha de inicio**	**06-10-2025**
		Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación:	**05-05-2026**

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Nº y fecha de la Modificación anterior	Garantías - Fecha de aprobación y Nº Póliza	Modificación del Plazo de Ejecución				Plazo Total de ejecución con Prórrogas, suspensiones y Reducciones	Modificación del Valor		Valor Total con Adiciones y Disminuciones
		Prórroga	Reducción	Suspensión	Reactivación		Adición	Disminución	
	-	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	

Cesión	Otros Aspectos Modificados
N.A	N.A

III. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del Contrato	Valor Ejecutado	Valor pagado	Valor Pendiente de Pago	Saldo por Ejecutar
$ 796.184.131 100%	$ 45.496.236 5.71%	$ 0.00 0.0%	$ 45.496.236 5.71%	$ 750.687.895 94.29%

IV. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN — **MODIFICACIÓN No. 01**

Adición Valor	Disminución del Valor	Prórroga del Plazo*	Reducción del Plazo
Valor de la presente adición: **$ 128.425.720**	N/A	Tiempo: **1.5 meses**	N/A
CDP No.: **3698**			
CDP Fecha: **05-12-2025**	N/A	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga: **20 DE JUNIO DE 2026.**	Fecha prevista para la terminación en virtud de la prórroga del plazo: N. A
CDP Valor: **$ 128.507.632**			
Valor Total del Contrato incluida la presente adición: **$ 924´609.851**			

Suspensión	Reactivación	Actualización de fechas en virtud de la suspensión	Cesión	Terminación anticipada
Fecha inicio: N/A	Fecha reactivación contrato: N/A	Se modifica el plazo de ejecución: SI __ NO ____	Nombre Cesionario: N. A	Fecha a partir de: N.A
Fecha terminación: N/A	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la reactivación: N/A	Nueva fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión: N. A	Fecha Cesión: N. A	

* El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad, ni desequilibrio contractual alguno.

OTROS ASPECTOS A MODIFICAR:

I. JUSTIFICACIÓN

1. ANTECEDENTES

La Secretaría de Educación del Distrito adelantó el proceso de selección por LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL No. SED-LP-OP-DCCEE-012-2025, el cual fue adjudicado mediante Resolución No. 0071 del 05 de agosto de 2025, siendo seleccionados los CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025 para el Lote No. 04, lo cual se perfeccionó con la celebración del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155135 de 2025; CONSORCIO FORTALEZA para el Lote No. 5, lo cual se perfeccionó con la celebración del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8154895 de 2025 y CONSORCIO PAIS para el Lote No. 6 lo cual se perfeccionó con la celebración del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8154780 de 2025 cuyo objeto son: *"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"*. Los datos generales de los contratos de obra No. CO1.PCCNTR.8155135 de 2025, CO1.PPCNTR.8154895 de 2025 y CO1.PCCNTR.8154780 de 2025 son los siguientes:

DATOS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA – LOTE 4	
Contrato	CO1.PCCNTR.8155135 de 2025
Contratista	CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025
Plazo inicial	7 meses
Prórroga No. 1	27 días
Plazo Total	7 meses y 27 días
Valor Inicial	$ 2.703´337.443
Adición No. 1	$ 479´467.488
Valor Total	$ 3.182´804.931
Fecha de inicio	6 de octubre de 2025
Fecha de Terminación inicial	**5 de mayo de 2026**

DATOS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA – LOTE 5	
Contrato	CO1.PCCNTR.8154895 de 2025
Contratista	CONSORCIO FORTALEZA
Plazo inicial	7 meses
Prórroga No. 1	1.5 meses
Plazo Total	8 meses y 16 días
Valor Inicial	$ 2.269´368.717
Adición No. 1	$ 515´000.000
Valor Total	$ 2.784´368.717
Fecha de inicio	6 de octubre de 2025
Fecha de Terminación inicial	**5 de mayo de 2026**

DATOS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA – LOTE 6	
Contrato	CO1.PCCNTR.8154780 de 2025
Contratista	CONSORCIO PAIS
Plazo inicial	7 meses
Prórroga No. 1	1.5 meses
Plazo Total	8 meses y 15 días
Valor Inicial	$ 2.332´049.023
Adición No. 1	785´001.422
Valor Total	$ 3.117´050.445
Fecha de inicio	6 de octubre de 2025
Fecha de Terminación inicial	**5 de mayo de 2026**

En aras de garantizar el seguimiento integral del contrato de obra anteriormente referido, y acatando lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la Secretaría de Educación del Distrito adelantó proceso de selección por Concurso de Méritos Abierto No. SED-CM-A-DCCEE-018-2025 en virtud del cual, el día 4 de septiembre de 2025, se adjudicó y celebró el Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025, con **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO** cuyo objeto es: *"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN,*

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 2", son los siguientes:

DATOS ACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contrato	CO1.PCCNTR.8169110 de 2025
Contratista	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
Plazo inicial	7 meses
Valor Inicial	$ 796´184.131
Fecha de inicio	6 de octubre de 2025
Fecha de Terminación inicial	**5 de mayo de 2025**

De acuerdo con la estructura del proceso que dio origen al presente contrato, la interventoría en cabeza de **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**, tiene a cargo el seguimiento y control de los Lotes 4, 5 y 6 de los contratos de obra de mejoramientos:

Tabla No. 1 – Distribución de interventorías por zonas

ZONAS	INTERVENTORÍAS	OBRA	SEDES	SEDES POR LOTE INTERVENTORÍA	INTERVENCIONES
SUR	LOTE 1	LOTE 1	7	19	El cual atenderá las intervenciones en modalidad programada y emergencia en las localidades de: Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz.
		LOTE 2	5		
		LOTE 3	7		
	LOTE 2	LOTE 4	8	26	El cual atenderá las intervenciones en modalidad programada y emergencia en las localidades de: Ciudad Bolívar y Usme
		LOTE 5	9		
		LOTE 6	9		

En ese sentido, teniendo en cuenta que, los contratistas correspondientes a los Lotes 4, 5 y 6 de la zona Sur, solicitaron modificar sus contratos de obra de mejoramientos en el sentido de:

LOTE 04 CO1.PCCNTR.8155135 - CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025

- Inclusión de mayores cantidades de obra en dos (2) frentes de obra, IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR – CPF 576 y IED LOS TEJARES SEDE A – CPF 539
- Adición por $279´467.488, incluido AIU, impuestos, tasas y contribuciones, y todos los costos asociados al desarrollo de contrato, por mayores cantidades.
- Adición por $200´000.000, incluido AIU, impuestos, tasas y contribuciones, y todos los costos asociados al desarrollo de contrato, por mayores cantidades por concepto de atención de emergencias

LOTE 05 CO1.PCCNTR.8154895 - CONSORCIO FORTALEZA

- Inclusión de mayores cantidades de obra en dos (2) frentes de obra, IED LA JOYA DON BOSCO I – CPF 1973 y IED JOSE JAIME ROJAS – CPF 1934
- Adición por $315´000.000, incluido AIU, impuestos, tasas y contribuciones, y todos los costos asociados al desarrollo de contrato, por mayores cantidades.
- Adición por $200´000.000, incluido AIU, impuestos, tasas y contribuciones, y todos los costos asociados al desarrollo de contrato, por mayores cantidades por concepto de atención de emergencias

LOTE 06 CO1.PCCNTR.8154780 - CONSORCIO PAIS

- Inclusión de dos (2) nuevos frentes de obra, IED GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A – CPF 1959 y IED TENERIFE GRANADA SUR SEDE A – CPF 548

- Adición por $585´001.422, incluido AIU, impuestos, tasas y contribuciones, y todos los costos asociados al desarrollo de contrato, por mayores cantidades.
- Adición por $200´000.000, incluido AIU, impuestos, tasas y contribuciones, y todos los costos asociados al desarrollo de contrato, por mayores cantidades por concepto de atención de emergencias

Se hace necesario incorporar al contrato de interventoría las modificaciones de plazo y valor que apliquen, para el acompañamiento a las actividades de obra.

2. AVANCE FÍSICO INFORME

El Contrato de obra No. **CO1.PCCNTR.8155135 de 2025 – LOTE 4**, a la fecha cuenta con un porcentaje programado acumulado de 0.52% y un porcentaje ejecutado acumulado de 0.81%, de acuerdo con lo reportado por la Interventoría en el Informe Semanal No. 22 con fecha de corte al 23 de noviembre de 2025.

El Contrato de obra No. **CO1.PCCNTR.8154895 de 2025 – LOTE 5**, a la fecha cuenta con un porcentaje programado acumulado de 1.69% y un porcentaje ejecutado acumulado de 1.44%, de acuerdo con lo reportado por la Interventoría en el Informe Semanal No. 22 con fecha de corte al 23 de noviembre de 2025.

El Contrato de obra No. **CO1.PCCNTR.8154780 de 2025 – LOTE 6**, a la fecha cuenta con un porcentaje programado acumulado de 0.53% y un porcentaje ejecutado acumulado de 0.43%, de acuerdo con lo reportado por la Interventoría en el Informe Semanal No. 22 con fecha de corte al 23 de noviembre de 2025.

Al respecto, es preciso señalar que, de conformidad con lo establecido en los estudios previos del proceso SED-LP-OP-DCCEE-012-2025, literal g.4 y g.4.1, así como en la minuta contractual, cláusula novena, numeral 4, a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato de obra se dispuso un plazo máximo de veintiún (21) días hábiles para la etapa de diagnóstico. Dicho término fue cumplido dentro del periodo previsto, durante el cual se realizaron las evaluaciones técnicas necesarias para identificar las condiciones y requerimientos de intervención de la obra.

Concluida la fase de diagnóstico, se dio inicio a la ejecución de los mejoramientos contemplados contractualmente, de acuerdo con la programación aprobada. En este contexto, el avance reportado en los informes arriba referenciados, lo que resulta consistente con el desarrollo de las actividades previstas, teniendo en cuenta que el periodo inicialmente transcurrido estuvo destinado en su totalidad a la ejecución de la etapa de diagnóstico.

II. JUSTIFICACIÓN Y/O CONCEPTOS QUE SUSTENTAN LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No.01 PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.

El Contratista de interventoría CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO mediante comunicación No. SERINCO-SED-INT-2025-121 de fecha 2 de diciembre de 2025, presentó ante la DCCEE-SED, la solicitud de adición y prórroga del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025, en aras de garantizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, y jurídico sobre los contratos de obra No. CO1.PCCNTR.8155135 de 2025, CO1.PCCNTR.8154895 de 2025 y CO1.PCCNTR.815478 de 2025, manifestado lo siguiente:

*"En atención al contrato de referencia, suscrito entre **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE DISTRITO y CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**, en atención a la Secretaría De Educación Del Distrito (SED), ha identificado que aún persiste la necesidad manifestada por la Secretaría De Educación Del Distrito (SED):*

1. *Mejoras en las condiciones físicas de los planteles educativos **I.E.D. LOS TEJARES Sede A – Los Tejares** con actividades de Cambio de cubierta en áreas de baños y cafetería, y Cambio de accesorios y Red Eléctrica, **I.E.D. DIEGO MONTAÑA CUELLAR Sede A – El Uval Nuevo** con Desmonte de superboard afectado en cornisas e Instalación de superboard, aplicación de estuco y pintura para exteriores en cornisas los cuales pertenecen a la adición del Lote 4.*
2. *Mejoras en las condiciones físicas de los planteles educativos **I.E.D. JOSE JAIME ROJAS Sede A – Naciones Unidas** con actividades de Cambio de cubiertas y mejoramiento eléctrico en bloque de aulas, **I.E.D. DON BOSCO I Sede A - La Joya** con Adecuaciones con Piso CHIP en área de juegos infantiles y Suministro de Motobombas los cuales pertenecen a la adición del Lote 5.*
3. *Incluir las actividades a realizar en las instituciones educativas **GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A** con actividades de mejoramiento de batería sanitaria en los distintos edificios, mejoramiento de instalaciones sanitarias y la adecuación de la red eléctrica de baterías sanitarias y **TENERIFE GRANADA SUR SEDE A** con impermeabilización tanque agua potable, mantenimiento correctivo motobombas y mejoramiento de barandas los cuales pertenecen a la adición del Lote 6.*

*"En aras de dar cumplimiento a los lineamientos contractuales y a razón de las adiciones y prórroga del **CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 8155135**, **CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154895** y **CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154780** que mediante la Resolución 0012 del 28 de marzo de 2025 la Entidad abrió el Proceso de Contratación SED-LP-OP-DCCEE-012-2025 y que por medio de la Resolución 0068 del 25 de julio de 2025, corregida mediante Resolución 0071 del 5 de agosto de 2025, la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista. entre la Secretaría De Educación Del Distrito (SED) con Nit. 860.532.363 quien actúa en calidad de contratante y los respectivos consorcios quienes actúan en calidad de contratista.*

(…)
Conforme con lo indicado anteriormente y de acuerdo con las necesidades identificadas por parte de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, a continuación, se relacionan los antecedentes y requerimientos presentados por las partes, los cuales, se requieren incluir dentro del alcance del contrato de interventoría, con base en la justificación presentada por el Contratista y concepto emitido por esta interventoría.

2. ANTECEDENTES

2.1. La SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO de conformidad con lo establecido en el Decreto 330 del 2008 tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral. De igual forma como acciones tendientes a garantizar la permanencia escolar, promoción de la calidad educativa, prever y asegurar el funcionamiento normal, eficiencia y la buena presentación de las plantas físicas educativas y administrativas, la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, ha priorizado las obras menores y de mejoramiento con características de Reparaciones Locativas en las diferentes localidades de Bogotá, intervenciones que contribuyen a mejorar la infraestructura educativa en temas tales como, la atención prioritaria a las observaciones efectuadas por parte de Secretaria Distrital de Salud, obras menores de mitigación ante posibles riesgos y el mantenimientos correctivo, entre otros aspectos relacionados.

2.2. Es así que la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO adelantó la licitación pública cuyo objeto consistió en la "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" en cumplimiento de la normatividad vigente que rige la contratación pública, adjudicando a la firma CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO identificado con NIT. 901977271-0 mediante contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8169110.

2.3. El alcance proyectado contempla realizar las reparaciones locativas y atención de emergencias en los centros y sedes educativas y administrativas de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, en lo que se incluyen los mantenimientos programados, atención de emergencias en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, con el fin de mejorar las condiciones de cada una de las sedes intervenidas, por un valor de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UNO PESOS M/CTE. ($796.184.131) inc. IVA.

2.4. Si bien el objeto y el alcance del contrato se encuentra determinado y la destinación específica del mismo, por la modalidad de oferta económica presentada en la licitación pública de manera discriminada, la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO estableció y priorizó la ejecución de actividades de obra con las cantidades contenidas en el Formulario 1 del proceso licitatorio, conforme con el presupuesto oficial.

2.5. No obstante, y conforme con la dinámica del contrato de obra, la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ha identificado que siguen persistiendo necesidades en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar las cuales, son susceptible de intervención, con necesidades particulares en cuanto a obras de adecuación, mejoramiento y/o mantenimiento correctivo y/o el requerido, con el fin de mejorar las condiciones de las infraestructuras físicas distritales.

2.6. Por lo que, se plantea la necesidad de incluir unas obras adicionales al alcance de los contratos de obra de las siguientes sedes educativas, de lo cual la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO planteo las necesidades de intervención adicional al presupuesto inicial:

LOTE 4:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
CPF 529 Los Tejares – Los Tejares	A	CL 75 C Bis SUR No 5 52	Usme
CPF 576 Diego Montaña Cuellar – El Uval Nuevo	A	TV 6B No 100 C 55 Sur	Usme

La adición del presente lote se justifica por el incremento en las cantidades requeridas por los colegios anteriormente mencionados, situación que responde a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio. En consecuencia, como se indicó previamente, se presentan mayores cantidades respecto de las sedes ya contratadas.

LOTE 5:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
CPF 1973 Don Bosco I – La Joya	A	Calle 80A Sur No. 18C - 70	Ciudad Bolívar
CPF 1934 José Jaime Rojas	A	Cra. 18 No. 77A Sur 27	Ciudad Bolívar

La adición del presente lote se justifica por el incremento en las cantidades requeridas por los colegios anteriormente mencionados, situación que responde a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio. En consecuencia, como se indicó previamente, se presentan mayores cantidades respecto de las sedes ya contratadas.

LOTE 6:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
CPF 1959 Guillermo Cano Isaza	A	Cra. 16A No. 62 - 35 Sur	Ciudad Bolívar
CPF 0548 Tenerife Granada Sur	A	Cra. 14B Bis No. 91 Sur14	Usme

La adición del presente lote se justifica por la incorporación de nuevas actividades requeridas por los colegios anteriormente mencionados, las cuales serán agregadas al presente contrato. Esta situación obedece a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio. En consecuencia, como se indicó previamente, se adicionan actividades correspondientes a dos sedes adicionales respecto de las ya contratadas.

3. MOTIVACIONES

De acuerdo con lo ya detallado y las necesidades planteadas por parte de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, se presenta la solicitud de prórroga y adición requerida para el contrato de interventoría, conforme con las siguientes motivaciones:

3.1. La SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO tiene dentro de sus obligaciones mejorar las condiciones actuales de las instituciones educativas y administrativas de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, con el fin de garantizar el derecho a la Educación de la comunidad educativa, condición que bajo la inclusión de recursos para mejoramientos al contrato de obra puede beneficiar a más población y que a su vez involucra a la interventoría como entidad de control ante los contratos de obra.

3.2. A continuación, se presentan las intervenciones propuestas por la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y revisadas por parte de Contratista e Interventoría, las cuales son objeto de la solicitud de prórroga y adición:

- **CPF 529 I.E.D. Los Tejares Sede A - Los Tejares**

El alcance de las obras a ejecutar en esta sede educativa son los siguientes:

- Cambio de cubierta en áreas de baños y cafetería
- Cambio de accesorios y red electica.

- **CPF 576 Diego Montaña Cuellar Sede A – El Uval Nuevo**

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Desmonte de superboard afectado en cornisas
- Instalación de superboard, aplicación de estuco y pintura para exteriores en cornisas

- **CPF 1973 Don Bosco Sede A La Joya**

El alcance de las obras a ejecutar en esta sede educativa son los siguientes:

- Adecuación Piso CHIP en área de juegos infantiles
- Suministro e instalación de motobombas

- **CPF 1934 José Jaime Rojas**

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Cambio de cubierta y mejoramiento eléctrico en bloque de aulas

Se recuerda que la adición del presente lote 6 se justifica por la incorporación de nuevas actividades requeridas por los colegios anteriormente mencionados, las cuales serán agregadas al presente contrato. Esta situación obedece a las motivaciones expuestas en el cuerpo de este oficio. En consecuencia, como se indicó previamente, se adicionan actividades correspondientes a dos sedes adicionales respecto de las ya contratadas como se observa a continuación:

- **CPF 1959 Guillermo Cano Isaza**

El alcance de las obras a ejecutar en esta sede educativa son los siguientes:

- Mejoramiento de las baterías sanitarias de los pisos 1, 2 y 3 del Bloque de Bachillerato
- Mejoramiento de instalaciones hidrosanitarias de las baterías señaladas
- Adecuación de la red eléctrica de las baterías sanitarias mencionadas

- **CPF 0548 Tenerife Granada Sur**

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Impermeabilización tanque agua potable
- Mantenimiento correctivo motobombas
- Mejoramiento de barandas

3.3. Teniendo en cuenta los alcances indicados, a continuación, se relaciona el balance financiero de cada una de las intervenciones:

De acuerdo con los alcances y estimaciones financieras de las seis (6) instituciones educativas relacionados anteriormente, es necesario disponer de una adición presupuestal al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110, de ***CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 128.425.720,00)*** *INCLUIDO IVA y una prórroga de* ***UNO PUNTO CINCUENTA Y TRES MESES*** *(1,53 MESES), es decir, hasta el 20 de junio de 2026.*

Finalmente, conforme con las necesidades de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO respecto a las sedes a intervenir, esta interventoría concluye lo siguiente:

4. CONCLUSIONES

De acuerdo con las consideraciones expuestas por parte del Contratista y las necesidades requeridas por parte de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, esta Interventoría indica que se realizó la debida revisión de cada uno de los alcances planteados por los Contratistas mediante comunicado del asunto, por lo que emitimos concepto favorable para la inclusión de las siguientes sedes educativas conforme con las actividades contractuales establecidas en el Formulario 1 del proceso licitatorio:

LOTE 4:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	LOCALIDAD	VALOR PRESUPUESTAL	TIEMPO
CPF 529 Los Tejares – Los Tejares	Usme	$ 79.579.768,00	Siete (7) días calendario
CPF 576 Diego Montaña Cuellar – El Uval Nuevo	Usme	$ 199.887.720,00	Setenta y Siete (77) días calendario

LOTE 5:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	LOCALIDAD	VALOR PRESUPUESTAL	TIEMPO
CPF 1934 José Jaime Rojas	Ciudad Bolívar	$ 124.701.594,00	Treinta y cinco (35) días calendario
CPF 1973 Don Bosco - La Joya	Ciudad Bolívar	$ 190.298.406,00	Treinta y nueve (39) días calendario

LOTE 6:

NOMBRE SEDE EDUCATIVA	LOCALIDAD	VALOR PRESUPUESTAL	TIEMPO
CPF 1959 Guillermo Cano Isaza	Ciudad Bolívar	$ 454.994.966,00	Ciento Cincuenta y Ocho (158) días calendario
CPF 0548 Tenerife Granada Sur	Usme	$ 130.006.456,00	Ochenta y Cinco (85) días calendario

*Lo cual genera la necesidad de disponer de una adición presupuestal al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110, de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 128.425.720,00)** INCLUIDO IVA y una prórroga de **UNO PUNTO CINCUENTA Y TRES MESES** (1,53 MESES), es decir, hasta el 20 de junio de 2026.*

5. SOLICITUDES

Esta interventoría de manera atenta pone a consideración de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO las siguientes solicitudes:

*5.1. ADICIÓN: Con el fin de cumplir con los alcances necesarios en cada una de las sedes educativas planteadas, se solicita disponer de una adición presupuestal al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110, de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MDA/CTE ($ 128.425.720,00)** INCLUIDO IVA.*

5.2. PRÓRROGA: Teniendo en cuenta el plazo necesario para la ejecución de las obras de adecuación, mantenimiento y/o mejoramiento en las sedes educativas, se solicita una prórroga al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 por el término de CUARENTA Y SEIS DIAS CALENDARIO (1.53 MESES), es decir hasta el 20 de junio de 2026."

III. CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8169110 DE 2025

El Supervisor del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025, y el equipo de Apoyo a la Supervisión encargado del seguimiento a las actividades de los contratos de obra, analizó los soportes documentales y los conceptos de conveniencia remitidos por la interventoría mediante el comunicado SERINCO-SED-INT-2025-121 del 2 de diciembre de 2025.

Con base en dicho análisis, en el cual la interventoría avala la prórroga de los contratos de obra No. CO1.PCCNTR.8155135 de 2025, CO1.PCCNTR.8154895 de 2025 y CO1.PCCNTR.8154780 de 2025, se determinó lo siguiente:

1. Se deja constancia de que el Subsecretario de Acceso y Permanencia, en su calidad de Ordenador del Gasto, designó al señor Jorge Alberto Moreno Aldana como Supervisor del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025, mediante memorando del 4 de diciembre de 2025, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Manual de Supervisión e Interventoría de la Secretaría de Educación del Distrito (Resolución 1035 de 2018).

2. En virtud del Modificatorio No. 01, el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155135 de 2025 (Lote No. 04) fue prorrogado por veintisiete (27) días, con nueva fecha de terminación al 1 de junio de 2026. Esta fecha es posterior a la vigencia del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025, responsable del seguimiento integral y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por tanto, se hace necesaria la continuidad de la supervisión técnica especializada hasta la finalización de las obras, dada la complejidad de las actividades sociales, ambientales, jurídicas, administrativas y financieras propias de su ejecución.

3. De igual forma, el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8154895 de 2025 (Lote No. 05) fue prorrogado mediante el Modificatorio No. 1 por 1.5 meses, con fecha de terminación al 20 de junio de 2026, siendo también posterior a la terminación del contrato de interventoría referido, lo que exige la continuidad del acompañamiento técnico especializado en todas las dimensiones mencionadas.

4. Asimismo, el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8154780 de 2025 (Lote No. 06) fue prorrogado por 1.5 meses, hasta el 20 de junio de 2026, en las mismas condiciones contractuales, técnicas y temporales, que demandan la extensión del acompañamiento de interventoría.

5. En consecuencia, la interventoría, mediante el mismo comunicado SERINCO-SED-INT-2025-121 del 2 de diciembre de 2025, solicitó la Modificación No. 01 del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025, con el fin de prorrogar su vigencia por 1.5 meses, hasta el 20 de junio de 2026, y adicionar la suma de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MDA/CTE ($128.425.720,00)** IVA incluido.

6. Frente a esta solicitud, la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos – DCCEE adelantó las verificaciones correspondientes. En ese contexto, el Supervisor del contrato, junto con el Apoyo a la Supervisión, remitieron al Área de Estudios Previos de la SED, mediante el oficio SIGA I-2025-1667372 del 4 de diciembre de 2025, la propuesta económica presentada por la interventoría, contenida en el comunicado SERINCO-SED-INT-2025-121, radicado con el número SIGA E-2025-193086.

7. El Área de Estudios Previos, mediante el comunicado SIGA I-2025-166422 del 4 de diciembre de 2025, indicó: *"(…) se efectuó el cotejo respectivo frente a la información derivada de la verificación del proceso SED-CM-A DCCEE-018-2025, encontrando correcta la aplicación de los precios contractuales. A partir de la información revisada y suministrada por el Apoyo a la Supervisión del proyecto, el Área de Estudios Previos concluye que el valor resultante para la adición, en la verificación aritmética efectuada, es de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MDA/CTE ($128.425.720,00) IVA incluido (19%)".***

8. Por lo anterior, el Supervisor del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025, y su Apoyo a la Supervisión consideran viable y oportuno, seguir contando con los siguientes profesionales, bajo las siguientes dedicaciones:

CARGO	DEDICACION
Un (1) Director de Interventoría	100%
Un (1) profesional de apoyo	100%
Tres (3) residentes de interventoría	100%
Un (1) asesor estructural	15%
Un (1) asesor ambiental y seguridad industrial	15%
Un (1) asesor en redes eléctricas, telefónicas, voz y datos	15%
Un (1) asesor en redes hidrosanitarias, red contra incendios y gas	15%
Un (1) profesional en seguridad y salud en el trabajo	15%
Un (1) asesor de costos, presupuestos y programación de obra	15%
Un (1) asesor jurídico	15%
Un (1) técnico o tecnólogo SST	100%
Dos (2) inspectores de interventoría	100%

9. Así mismo, se considera procedente adicionar los honorarios correspondientes a 1.5 meses de tiempo restante de ejecución de los contratos de obra, conforme a la propuesta económica del contratista de interventoría, la cual fue avalada por el Área de Estudios Previos.

10. Ahora bien, en relación con las modificaciones contractuales permitidas dentro del régimen de contratación estatal establecido por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), y en particular respecto a la figura de la prórroga contractual, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-300 de 2012, precisó lo siguiente: "… *2.6.1. Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal.* ***(Subrayado fuera del texto).***

11. Por otra parte, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, mediante Concepto 112 de 2024, señaló en cuanto a la procedencia de la prórroga del contrato estatal que *"… La Ley 80 de 1993 no se refirió a la posibilidad de prorrogar los contratos estatales, al igual que tampoco lo prohibió. En vista de ello, es necesario partir de las remisiones que hace la Ley 80 de 1993 al derecho privado y al principio de la autonomía de la voluntad para llenar este aspecto—arts. 13, 32 y 40—. De esta manera, los particulares tienen amplia libertad para prorrogar el plazo de cualquier contrato y, salvo ciertas disposiciones específicas de algunas tipologías contractuales, no existen criterios que determinen límites a esta posibilidad ni a su alcance, de manera que el principio de la autonomía de la voluntad en este aspecto despliega ampliamente sus efectos, lo que a su vez es trasladable, como principio, a los contratos estatales…".*

12. La presente solicitud de adición se encuentra dentro de los límites establecidos en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual dispone que: *"…Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales."* En efecto, el valor a adicionar corresponde a **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($128.425.720,00) IVA incluido**, equivalentes a **90,21 SMMLV** para la vigencia **2025**; y teniendo en cuenta que el presupuesto inicial del **Contrato de Interventoría No. CO1. PCCNTR.8169110 de 2025** contempla salarios por un total de **559,31 SMMLV**, se verifica que la adición propuesta **no supera el 50% del valor inicial del contrato, expresado en SMMLV**, y que, en consecuencia, el valor final del contrato corresponderá al **valor inicial más $128.425.720,00** (esto es, **90,21 + 559,31 = 649,52 SMMLV**), razón por la cual **la adición resulta jurídicamente viable** bajo los parámetros previstos por la normativa contractual vigente.

13. Verificadas las garantías que amparan la ejecución del presente contrato, se encuentra que las mismas están vigentes y pueden ser consultadas en el siguiente link:

- https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8169110&AwardContractDetailId=6338109&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#ContractExecution.

14. En conclusión, el Supervisor del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025, y su equipo de Apoyo a la supervisión consideran viable la prórroga y adición de recursos al contrato, a fin de garantizar el seguimiento técnico, ambiental, jurídico, financiero y en seguridad y salud en el trabajo, requerido para la correcta ejecución de las obras de infraestructura educativa.

15. Finalmente, y con base en las consideraciones expuestas, **el Supervisor del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025**, recomiendan y consideran viable modificar dicho contrato, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución por 1.5 meses y adicionar recursos por un valor de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MDA/CTE ($128.425.720,00)** incluido IVA.

IV. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8169110 de 2025

a. PRÓRROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Modificar la **CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO del ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA,** en el sentido de prorrogar el mismo por el término de un (1) mes y quince (15) días calendario, contados a partir del 5 de mayo de 2026 hasta el 20 de junio de 2026, por tanto, la cláusula de plazo quedará de la siguiente manera:

"El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de ocho (8) meses y quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, es decir hasta el 20 de junio de 2026.

b. ADICIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Modificar la **CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO del ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**, en el sentido de adicionar la suma de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($128.425.720,00)** incluido IVA., la cual quedará de la siguiente manera:

*"El valor del contrato es hasta por la suma de **NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($924.609.851)** incluido IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, equivalentes a 649,52 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2025, suma que se discrimina de la siguiente manera:*

PRESUPUESTO OFICIAL			
ETAPA	*VALOR ANTES DE IVA*	*IVA (%)*	*VALOR TOTAL*
INTERVENTORIA	*$776´983.069*	*$147´626.782*	*$924´609.851*
VALOR TOTAL INTERVENTORIA			*$924´609.851*

El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato."

Las demás cláusulas del Contrato de Interventoría No. **CO1.PCCNTR.8169110 de 2025** que no hayan sido objeto de modificación se mantienen vigentes.

Nota 1: Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de estas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

Nota 2: Para las modificaciones diferentes a adiciones y prórrogas, tenga en cuenta que una vez perfeccionada la modificación, el supervisor/interventor deberá remitir copia de la misma al respectivo garante, conforme el Artículo 1060 del Código de Comercio, a fin de que la aseguradora expida el respectivo certificado para su posterior remisión a la Oficina de Contratos para su posterior archivo.

VII. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8155135 de 2025, a la fecha cuenta con un porcentaje programado acumulado de 0.52% y un porcentaje ejecutado acumulado de 0.81%, de acuerdo con lo reportado por la Interventoría en el Informe Semanal No. 22 con fecha de corte al 23 de noviembre de 2025.

El Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8154895 de 2025, a la fecha cuenta con un porcentaje programado acumulado de 1.69% y un porcentaje ejecutado acumulado de 1.44%, de acuerdo con lo reportado por la Interventoría en el Informe Semanal No. 22 con fecha de corte al 23 de noviembre de 2025.

El Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8154780 de 2025, a la fecha cuenta con un porcentaje programado acumulado de 0.53% y un porcentaje ejecutado acumulado de 0.43%, de acuerdo con lo reportado por la Interventoría en el Informe Semanal No. 22 con fecha de corte al 23 de noviembre de 2025.

Al respecto, es preciso señalar que, de conformidad con lo establecido en los estudios previos del proceso SED-LP-OP-DCCEE-012-2025, literal g.4 y g.4.1, así como en la minuta contractual, cláusula novena, numeral 4, a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato de obra se dispuso un plazo máximo de veintiún (21) días hábiles para la etapa de diagnóstico. Dicho término fue cumplido dentro del periodo previsto, durante el cual se realizaron las evaluaciones técnicas necesarias para identificar las condiciones y requerimientos de intervención de la obra.

Concluida la fase de diagnóstico, se dio inicio a la ejecución de los mejoramientos contemplados contractualmente, de acuerdo con la programación aprobada. En este contexto, el avance reportado en los informes arriba referenciados, lo que resulta consistente con el desarrollo de las actividades previstas, teniendo en cuenta que el periodo inicialmente transcurrido estuvo destinado en su totalidad a la ejecución de la etapa de diagnóstico.

VII. ANEXOS:

1. Informe Semana No. 2 - Lote 4
2. Informe Semana No. 2 – Lote 5
3. Informe Semana No. 2 – Lote 6
4. Comunicación SERINCO-SED-INT-2025-121
5. Oferta económica - adición interventoría
6. I-2025-166373 Remisión Solicitud y Propuesta Económica Modificatorio 1 CTO8169110.
7. I-2025-166422_RADICADO_RESPUESTA
8. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.3698 DE 2025 L2 INTERVENTORÍA.

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.

Notas:

1. **El supervisor y/o Interventor recomiendan la modificación al ordenador del gasto.**
2. **Se ha verificado el mapa de riesgos y el mismo se mantiene.**
3. **Declaramos que se ha realizado la verificación del pago al SGSS y parafiscales, encontrándose a paz y salvo.**
4. **La presente solicitud, no requiere adición que supere el 50% del valor del contrato inicial expresado en SMMLV.**
5. **Verificadas las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de interés el contratista no se encuentra incurso en ninguna de las mencionadas.**

JORGE ALBERTO MORENO ALDANA
Profesional Especializado - Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos – DCCEE
Supervisor Contrato de Interventoría
CO1.PCCNTR.8169110 de 2025

SANTIAGO ANGEL URIBE
Contratista DCCEE
Apoyo a la Supervisión Contrato de Interventoría
CO1.PCCNTR.8169110 DE 2025

Contratista de Interventoría
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
NIT: 901.977.271-0
ERICK JOSE CASTILLO COURIEUX
CC. 79.602.923
Representante Legal

Revisó: Paula Andrea Panesso Sánchez – Líder Grupo Jurídico DCCEE SED
Katherin Vélez García – Contratista DCCEE SED
Robin Daniel Ramírez Morales – Contratista DCCEE SED
Elaboró: Santiago Ángel Uribe – Contratista DCCEE

Outlook

Contrato de interventoría mejoramientos Lote 2

Desde MATEO GIUSEPPE ENRIQUEZ ENRIQUEZ <menriquez@educacionbogota.gov.co>
Fecha Mar 12/05/2026 2:34 PM
Para PAULA PANESSO SANCHEZ <ppanesso@educacionbogota.gov.co>; KATHERIN JOAN VELEZ GARCIA <kvelez@educacionbogota.gov.co>

Buenas tardes,

Revisado el SOC de la modificación del contrato del asunto, favor continuar con el trámite de radicación ante la OC.

Un cordial saludo,

Mateo Giuseppe Enríquez
Asesor SAP
Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales.
_____ La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº I-2026-65413
Fecha: 25-05-2026 - 11:46
Folios: 1 Anexos:
Radicador: MARTHA CRISTINA VELASCO LOPEZ - 4000
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: JCON2

MEMORANDO

PARA: **ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO**
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

DE: **ABEL MATIZ SALAZAR**
Subsecretario de Acceso y Permanencia

ASUNTO: Designación al Director de la DCCEE de la supervisión de los contratos de interventoría No. 8168824, 8169110 y 8169112 del 2025 del 25 de mayo al 16 de junio del 2025.

Cordial saludo Andrés.

Atendiendo el periodo de vacaciones concedido al funcionario Jorge Alberto Moreno Aldana mediante la Resolución No. 726 del 27 de febrero del 2026, se informa que, durante dicho periodo comprendido entre el 25 de mayo al 16 de junio del 2026, en su calidad de Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos se le designa la supervisión de los contratos de interventoría que se relacionan a continuación:

NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	LOTES
CO1.PCCNTR. 8168824	EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS	1
CO1.PCCNTR. 8169110	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	2
CO1.PCCNTR. 8169112	ELSA TORRES ARENALES	4

Es preciso señalar que el ejercicio de la supervisión deberá realizarse con estricto cumplimiento de lo previsto en los artículos 83 al 85 de la Ley 1474 de 2011, así como en el Manual de Supervisión e Interventoría de la SED. Para efectos de consulta, los documentos contractuales se encuentran disponibles en la Plataforma Transaccional SECOP II.

Una vez notificada la presente designación, deberá realizarse su publicación en la Plataforma Transaccional SECOP II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Asimismo, deberá garantizarse que, durante toda la gestión y dentro de los términos establecidos contractual y legalmente, se realice el cargue completo y oportuno de los documentos relacionados con la ejecución contractual.

Finalmente, se precisa que la presente designación no requiere modificación alguna al contrato, conforme a lo establecido en el numeral 10. Supervisión, nota 4, del Estudio Previo que soportó la celebración de los contratos, el cual indica: “NOTA 4: El ordenador del gasto podrá modificar la designación de la supervisión cuando así lo requiera, sin que ello implique modificación

contractual alguna. Para el efecto bastará una comunicación escrita del Ordenador del Gasto al nuevo supervisor designado, con copia a la Dirección de Contratación y a la Dirección Financiera".

Cumplido el plazo señalado previamente, la supervisión de los contratos del asunto será asumida nuevamente por el profesional especializado código 222, grado 24, Jorge Alberto Moreno Aldana, es decir, a partir del 17 de junio del 2026.

Cordialmente,

ABEL MATIZ SALAZAR
Subsecretario de Acceso y Permanencia

Copia: Oficina de Contratos

Elaboró: María Alejandra Chacón Cardona. Abogada DCCEE
Revisó: Paula Andrea Panesso Sánchez. Líder Jurídica Contratista DCCEE
Aprobó: Mateo Giuseppe Enríquez Enríquez – Asesor Contratista SAP

ANEXO 7. POLIZAS DE INTERVENTORIA

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: lg94u1QZP3+EpGUKYHQQtw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100046043	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	97151263	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/06/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2025	24:00 Horas Del	05/10/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.977.271-0
DIRECCIÓN	TV 52 B # 2 - 30 AP 202	**TELÉFONO**	3142190224
ASEGURADO	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CALLE 20 NO 68 A 06	**TELÉFONO**	3822500
BENEFICIARIO	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CALLE 20 NO 68 A 06	**TELÉFONO**	3822500

OBJETO DE CONTRATO

SE HACE CONSTAR QUE SEGUN MODIFICACION NO.2 DEL 26 DE MAYO DEL 2026 SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE $162,875,214 PARA UN VALOR FINAL DE $1,087,485,065 Y SE PRORROGA EL PLAZO POR 3 MESES Y 15 DIAS QUEDANDO HASTA EL 5 DE OCTUBRE DE 202, POR LO CUAL SE AUMENTAN LOS VALORES ASEGURADOS Y SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO1.PCCNTR.8169110 , CUYO OBJETO ES EL OBJETO DEL CONTRATO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE NO. 2

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 04/09/2025	24:00 Horas Del 05/04/2027	217.497.013,00	189.518,32
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 04/09/2025	24:00 Horas Del 05/10/2029	108.748.506,50	168.629,46
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 05/10/2026	24:00 Horas Del 05/10/2031	217.497.013,00	293.175,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 543.742.532,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CPM ASESORES EN SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	651.322,78
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	651.322,78
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	123.751,33
TOTAL A PAGAR	$	775.074,11

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/06/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100046043	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	97151263	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/06/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2025	24:00 Horas Del	05/10/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR: CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO CONFORMADO POR:
ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S NIT: 901.094.289-2 PART. 50 %
SEIING SAS NIT: 900.208.425-6 PART. 50 %
ASEGURADO/BENEFICIARIO: BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO NIT: 899.999.061-9

NOTA: EL AMPARO DE PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES HACE REFERENCIA A PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES POR 5 AÑOS PLAZO DE GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BCH-100046043** y endoso, **7** cuyo afianzado es: **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO** Asegurado o Beneficiario: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO / BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO** , expedida por la Compañía en **11/06/2026,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN BOGOTA - CHICO a los **11** días del mes **JUNIO** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	97151263

Fecha de Facturación	11/06/2026
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	BCH-100046043
Periodo Facturado	04/09/2025 — 05/10/2031

Fecha Límite de Pago	11/07/2026
Prima (incluye gastos de expedición)	651.322,78
IVA	123.751,33
VALOR TOTAL A PAGAR $	775.074,11

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
TV 52 B # 2 - 30 AP 202	901.977.271
Intermediario	CPM ASESORES EN SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	97151263

Fecha de Facturación	11/06/2026
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	BCH-100046043
Periodo Facturado	04/09/2025 — 05/10/2031

Fecha Límite de Pago	11/07/2026
Prima (incluye gastos de expedición)	651.322,78
IVA	123.751,33
VALOR TOTAL A PAGAR $	775.074,11

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO
TV 52 B # 2 - 30 AP 202	901.977.271
Intermediario	CPM ASESORES EN SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)0000009715126 3(3900)000000775074(96)20260711

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990097151263(3900)000000775074(96)20260711

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 8. ACTAS DE COMITE

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 25

LUGAR DE LA REUNIÓN:	https://meet.google.com/vxw-ansg-tay	**FECHA:**	12	05	2026	**HORA INICIO:**	3:00 PM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	El Realizar seguimiento del contrato de obra CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025 – Lote 4						
PRESIDE:	Interventoría	**PRESIDE:**			Interventoría		
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMINETO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA
Santiago Ángel Uribe	DCCEE	Apoyo a la Supervisión	
Héctor Villazón	Consorcio Serinco Educativo	Director de Interventoría	
Cesar Carvajal	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría	
Nicolas Hernández	Consorcio Serinco Educativo	Auxiliar de Coordinación	
Deiby Yecid Arias B	Consorcio Adecuaciones Arsaf	Director de Obra	
Diego Pinzón Espitia	Consorcio Adecuaciones Arsaf	Residente de Obra	
Miguel Guzmán	Consorcio Adecuaciones Arsaf	Ingeniero de Apoyo	Miguel Guzman

ORDEN DEL DIA	
1	Avance en Frentes de Obra
2	Retiro de Escombros y Atención de Garantías
3	Seguimiento a Emergencias y Garantías
4	Avance de Actividades en la Sede Diego Montaña Cuellar
5	Definición Técnica en la Sede Compartir el Recuerdo
6	Cumplimiento de Plazos y Programación de Entregas
7	Revisión de Pendientes en Estrellas del Sur Sede D y Los Tejares
8	Revisión Presupuestal y Control Financiero
9	Elaboración de Actas de Cobro
10	Programación de Visita Técnica a Arborizadora Alta

DESARROLLO

1. **Avance en Frentes de Obra**

   Durante la reunión se presentó el estado general de avance de los frentes de obra correspondientes a las diferentes sedes educativas incluidas dentro del contrato. El proyecto presenta un atraso general del 0,73%, asociado principalmente a las sedes Los Tejares y Diego Montaña Cuellar. Se informó que actualmente cuatro sedes cuentan con actividades de obra y se registra las siguientes diferencias respecto al porcentaje programado:

   - **Fanny Mickey:** Ejecutado de 100%
   - **Brisas del Diamante:** Ejecutado de 100%
   - **Compartir el Recuerdo:** Avance de 11,78%
   - **Diego Montaña Cuellar**: Atraso de 5,62%

- **Ofelia Uribe de Acosta:** Atraso de 3,59%
- **Los Tejares:** Atraso de 9,01%
- **Estrella del sur Sede C: Ejecutado de 100%**
- **Estrella del sur Sede D: Ejecutado de 100%**

2. IED Brisas del Diamante

Se informó que las actividades en la sede Brisas del Diamante ya finalizaron; sin embargo, aún se encuentra pendiente el retiro de escombros y material tipo manto, situación que ha impedido la entrega formal de la sede. El contratista manifestó que el retiro había sido reprogramado en varias oportunidades debido a la disponibilidad del vehículo, estableciendo finalmente la ejecución de dicha actividad para el jueves 14-may-2026

Adicionalmente, se abordó la emergencia pendiente relacionada con esta sede, la cual quedó aplazada para periodo de vacaciones debido a que el rector no autorizó la entrega de salones. Se indicó que el gestor territorial contó con una fecha de recepción previamente confirmada por la institución educativa, razón por la cual deberá coordinarse nuevamente el ingreso o, en su defecto, programarse las actividades para el periodo de receso escolar, contemplando aproximadamente tres semanas de trabajo a partir del primero de junio.

3. IED Ofelia Uribe de Acosta

En la sede Ofelia Uribe de Acosta se informó la finalización de la aplicación de poliurea, registrándose un atraso del 3.59% frente a un avance ejecutado del 96.41%. Durante la revisión se identificó que dicho porcentaje no refleja realmente retrasos constructivos significativos, sino diferencias asociadas principalmente a cantidades de pintura y actividades de estuco bajo placa y pañete.

Se acordó mantener el porcentaje de atraso como reserva para la ejecución de cárcamos pendientes, los cuales aún no se reflejan formalmente debido a la falta de aprobación de NP. En consecuencia, el atraso deberá justificarse indicando que los cárcamos se encuentran en fabricación y pendientes de entrega, teniendo en cuenta que la sede no podrá ser entregada sin la ejecución de dichas actividades.

Finalmente, se previó que la entrega de la sede pueda realizarse el jueves 21-may-2026, siempre que la visita de verificación confirme el cumplimiento total de las actividades, con acompañamiento del almacenista del colegio.

4. IED Diego Montaña Cuellar

Se informó que la sede presenta un atraso del 5.62% frente a un avance ejecutado del 70.20%. Dentro de las actividades desarrolladas recientemente se destacan trabajos en cornisas y fundida de concreto para la rampa de acceso.

5. IED Los Tejares

En la sede Los Tejares se reportó un atraso del 9.01% frente a un avance ejecutado del 89.63%. Se aclaró que dicho atraso corresponde principalmente al componente eléctrico, teniendo en cuenta que las actividades relacionadas con estructura, instalación de PVC, bajantes y canales ya se encuentran ajustadas a la programación establecida.

Respecto a los tableros eléctricos, se acordó que el tablero a instalar en las oficinas ubicadas junto a la cafetería deberá conectarse al tablero localizado debajo de las oficinas intervenidas mediante una acometida parcial independiente con tubería. Asimismo, se descartó la instalación de un nuevo sistema de puesta a tierra, considerando que el sistema adecuado debería abarcar integralmente todo el colegio desde el contador principal.

Pese a las dificultades identificadas en el componente eléctrico y la complejidad de las tuberías, se ratificó el compromiso de entrega de la sede para el día 19-may-2026. Adicionalmente, se

recomendó realizar el marcado e identificación completa de tableros y circuitos previo a la entrega oficial.

6. IED Compartir el Recuerdo

Durante el comité se informó que en la sede Compartir Recuerdo se ejecutaron actividades relacionadas con instalación de cubierta, desmonte de muros y divisiones internas en salones, registrándose un avance ejecutado del 97.36%.

Se reportó además una emergencia derivada del daño en la tubería de agua potable ocasionado durante el desmontaje e instalación de mesones en los baños. El contratista indicó que la reparación quedaría finalizada a más tardar el viernes 15-may-2026.

En atención a la necesidad prioritaria de la institución educativa, se acordó entregar al menos uno de los baños en el menor tiempo posible, estableciendo como compromiso la finalización de ambos baños, incluidos espejos, para el martes 19-may-2026.

Durante la revisión técnica se identificó que la instalación inicial de los mesones generó afectaciones sobre algunas tabletas, proponiéndose como solución la instalación del espejo a una distancia aproximada de dos centímetros del salpicadero, permitiendo cubrir visualmente las afectaciones presentadas.

En relación con la cubierta, se confirmó que la totalidad del área ya se encuentra techada. Respecto al sistema de iluminación, se acordó utilizar luminarias rectangulares de **120x30** cm en reemplazo de las luminarias cuadradas inicialmente propuestas.

También se informó que permanecen pendientes algunas emergencias relacionadas con el componente eléctrico y acabados de pisos y muros. Adicionalmente, el almacenista solicitó la instalación de material insonorizante tipo frescasa en los muros de los salones de música. Frente a ello, se indicó que dicha solicitud deberá ser formalizada por parte de la institución educativa para justificar técnicamente la necesidad de una NP adicional.

7. IED Estrellas del Sur

Se informó que la sede Estrella del Sur sede C ya fue entregada oficialmente, mientras que la sede Estrella del Sur sede D finalizó actividades constructivas, encontrándose pendiente únicamente la entrega formal debido a subsanaciones aún por ejecutar.

Se solicitó al contratista elaborar y presentar el informe completo de subsanaciones, indicando claramente los aspectos que aplican y los que no aplican, acompañado del respectivo registro fotográfico. Igualmente, se programó reunión con la rectora de la institución para el martes a las 10:00 a.m.

Adicionalmente, se indicó que el portón ubicado en la sede continúa siendo una observación pendiente, razón por la cual el contratista deberá coordinar con la rectora la disposición de un espacio temporal de acopio o definir una nueva ubicación.

8. Coordinación de Entregas

Se acordó mantener la programación de entrega de la sede Los Tejares para el mar-19-may-2026. De igual manera, si los baños de Compartir Recuerdo se encuentran finalizados para dicha fecha, también se realizará su entrega. La entrega de Estrella del Sur sede D podría efectuarse el miércoles 20-may-2026.

Con el fin de optimizar la coordinación con los rectores y personal administrativo de las instituciones educativas, se solicitó programar los recorridos y visitas de entrega entre las 7:30 a.m. y las 8:00 a.m.

9. Revisión de Actas y Tala de Árbol – Rural La Union

El contratista informó que ya fue remitida la subsanación del acta correspondiente, encontrándose pendiente revisión por parte de la interventoría. Se solicitó priorizar la revisión tanto de dicha acta como de la correspondiente a Fortaleza.

Igualmente, se recordó la coordinación prevista para la tala del árbol correspondiente a la emergencia de Rural La Union programada para el vie-15-may-2026, indicando que el contratista deberá presentarse en sitio a las 7:30 a.m. para coordinar las labores de desenergización requeridas.

10. Obras Adicionales y Logística del Personal

Se solicitó al contratista presentar a más tardar el martes siguiente una propuesta formal que incluya tiempos de ejecución y programación correspondiente a la obra adicional proyectada.

Asimismo, se discutió la logística del personal operativo, recomendando que el equipo permanezca alojado en la institución educativa para evitar inconvenientes relacionados con transporte y alimentación. El contratista manifestó la viabilidad de esta alternativa, señalando únicamente preocupaciones asociadas a las condiciones climáticas.

Se indicó que se buscará gestionar un espacio dentro del colegio para alojamiento temporal del personal, mientras que la subcontratista Carolina coordinará el componente alimentario. Para ello, se solicitó programar reunión con dicha subcontratista el martes siguiente.

Finalmente, se reiteró que la programación de la obra adicional quedará sujeta a la aprobación del modificatorio contractual correspondiente, proyectando el inicio de actividades alrededor del primero de junio de 2026.

11. Retiro de Materiales y Escombros

Se recordó que permanecen pendientes actividades de retiro de materiales y escombros en las sedes Brisas del Diamante y Ofelia Uribe de Acosta, particularmente material tipo manto. Asimismo, en las sedes Los Tejares y Compartir Recuerdo aún se encuentra pendiente el retiro de cubierta y teja desmontada recientemente.

12. Solicitud de Balances y Presupuestos Finales

El apoyo a la supervisión, Arq. Santiago Ángel solicitó a todos los contratistas atender el requerimiento enviado mediante correo electrónico relacionado con la entrega de balances y presupuestos finales de las emergencias atendidas.

Se indicó que es indispensable remitir los presupuestos finales debidamente firmados para realizar la comparación de valores manejados por la Entidad frente a los reportados por los contratistas, permitiendo establecer el saldo disponible real del contrato. El contratista confirmó que revisará y remitirá oportunamente la información solicitada.

COMPROMISOS

#	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Realizar el retiro de escombros y material tipo manto pendiente en la sede Brisas del Diamante el día jueves siguiente al comité, coordinando la disposición final con el gestor ambiental.	Alta	Consorcio Arsaf	Entre jueves y viernes de la semana en curso	
2	Entrega del colegio Los Tejares el día 19 de mayo de 2026, garantizando la culminación de las	Alta	Consorcio Arsaf e Interventoría	Martes – 19 de mayo del presente año	

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 25

COMPROMISOS					
#	**ACTIVIDAD/Tarea**	**PRIORIDAD**	**RESPONSABLE**	**FECHA EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
	actividades eléctricas pendientes y el marcado de tableros y circuitos.				
3	El contratista deberá finalizar la reparación de la tubería de agua potable en la sede Compartir el Recuerdo a más tardar el 19 de mayo.	Alta	Interventoría	Martes – 19 de mayo del presente año	
4	Subsanación de observaciones en IED Estrella del Sur sede D	Alta	Consorcio Arsaf	Martes – 19 de mayo del presente año	
5	Emergencia Rural la Union – Tala de árbol, y remisión de presupuestos y programación.	Alta	Consorcio Arsaf	A la mayor brevedad posible	

Convocatoria próximo comité:	19-05-2026
Hora de finalización:	03:45 pm

COMITÉ TECNICO – LOTE 4

12 DE MAYO DE 2026

“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

CONTRATISTA

CONSORCIO ARSAF 2025

INTERVENTORIA

Consorcio Serinco EDUCATIVO

SUPERVISION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ

ORDEN DEL DIA

1. INFORMACION GENERAL
2. ESTADO GENERAL DE CONTRATO
3. ESTADO DE FRENTES DE OBRA
4. REGISTRO FOTOGRAFICO
5. OBSERVACIONES / COMPROMISOS

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Alcance: **“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.**

Contratista: **CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025**

Interventoría: **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**

Inversión del proyecto: **$2.703.337.443**

Modificatorio 1: **Adición $479.467.488**

Valor total: **$3.182.804.931**

Lote: **4** **Sedes:** **8**

Plazo total : **Siete (7) Meses y 27 días calendario**

Fecha de terminación: **1 de junio de 2026**

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Lote	CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE EDUCATIVA	DIRECCION	INICIO DE OBRA	FIN DE OBRA
4	1981	CIUDAD BOLIVAR	FANNY MICKEY	A – VILLAS DEL DIAMANTE	KR. 18 N No 71 A 51 SUR	10 DE NOVIEMBRE DE 2025	11 DE ABRIL DE 2026
	573	USME	OFELIA URIBE DE ACOSTA	A – EL BOSQUE NUEVO	TV 1 ESTE No 85 10 SUR	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	07 DE MAYO DE 2026
	1962	CIUDAD BOLIVAR	ESTRELLA DEL SUR	D – ESTRELLA DEL SUR (ESTRELLA IV)	KR 18 D No 73 50 SUR	2 DE FEBRERO DE 2026	30 DE ABRIL DE 2026
	576	USME	DIEGO MONTAÑA CUELLAR	A – EL UVAL NUEVO	TV 6B No 100 C 55 SUR	1 DE DICIEMBRE DE 2025	1 DE JUNIO DE 2026
	1919	CIUDAD BOLIVAR	ESTRELLA DEL SUR	C – ESTRELLA III	CL 74 A SUR No 18 23	15 DE ENERO DE 2026	28 DE MARZO DE 2026
	1911	CIUDAD BOLIVAR	COMPARTIR RECUERDO	A – COMPARTIR LUCERO ALTO	CL 69 SUR No 18B 35	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	1 DE JUNIO DE 2026
	1912	CIUDAD BOLIVAR	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	A – CONFEDERACION SUIZA	KR 18 I No 69D 35 SUR	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	28 DE MARZO DE 2026
	539	USME	LOS TEJARES	A – LOS TEJARES	CL 75 C BIS SUR No 5 52	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	1 DE JUNIO DE 2026

ESTADO DE FRENTE DE OBRA

SEDE EDUCATIVA	INICIO DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	ESTADO DE EJECUCION
FANNY MICKEY	10 DE NOVIEMBRE DE 2025	• CERRAMIENTO EN LONA • RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS • DEMOLICION DE ACABADO DE PISO AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA) • SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5MM, DE 0.15X 0.15 M • DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M • PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO CERRAMIENTO EN LONA • RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS • DEMOLICION DE ACABADO DE PISO ÍTEM: 1.29 • AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA) ÍTEM: 16.1.25 • SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5MM, DE 0.15X 0.15 M • DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS) • PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO • SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM • SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO, ORINAL , LAVAMANOS, TAZA ADRIATICA, GRIFERÍA DE LAVAMANOS.	• Se entrega a satisfacción la totalidad de la obra	• PROGRAMADO 100,00% • EJECUTADO 100,00% ENTREGADO

ESTADO DE FRENTE DE OBRA

SEDE EDUCATIVA	INICIO DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE EJECUCION
CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	• RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS • TRATAMIENTO DE PLACA EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: PULIDA DE SUPERFICIE, TRATAMIENTO DE JUNTAS, LAVADO PARA RETIRO DE SUCIEDAD, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN • SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM • SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TOP COAT O SIMILAR, PARA EXTERIORES EN COLORES PRIMARIOS, NO INCLUYE DISEÑO	• Se finalizan actividades de obra. • Pendiente de entrega	• PROGRAMADO 100,00% • EJECUTADO 100,00% • PENDIENTE DE ENTREGA

ESTADO DE FRENTE DE OBRA

SEDE EDUCATIVA	INICIO DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE EJECUCION
OFELIA URIBE DE ACOSTA	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	• RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS • DEMOLICION DE ACABADO DE PISO ÍTEM: 1.2.8 • AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE	• Finalización de aplicación de poliuria	• PROGRAMADO 100,00% • EJECUTADO 96,41% • ATRASO 3,59%
DIEGO MONTAÑA CUELLAR	1 DE DICIEMBRE DE 2025	• REPLANTEO • DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M • DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA • DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M • DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA • DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS • DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC • PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES • MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5 • MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M • SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45 • SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO • ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM	• Actividades en cornisas • Cargue en concreto de rampa	• PROGRAMADO 75,82% • EJECUTADO 70,20% • ATRASO 5,62%

ESTADO DE FRENTE DE OBRA

SEDE EDUCATIVA	INICIO DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE EJECUCION
LOS TEJARES	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	• CERRAMIENTO EN LONA • DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M • DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC • DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA • DESMONTE DE LÁMPARAS • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL • SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10MM • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120X30CM, 40W	• No se registran actividades	• PROGRAMADO 98,64% • EJECUTADO 89,63% • ATRASO 9,01%

ESTADO DE FRENTE DE OBRA


SEDE EDUCATIVA	INICIO DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE EJECUCION
COMPARTIR RECUERDO	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	• CERRAMIENTO EN LONA • DEMOLICIÓN PLACA MACIZA , ACABADO Y ALISTADO DE PISO, MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS, ENCHAPE DE MUROS Y PEGA • DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC • DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" • PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES • DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE • DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" • TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS • INSTALACION DE TUBERIA, PUNTOS SANITARIOS, VALVULA. • CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA • SUMINISTROEINSTALACIÓNMALLAELECTROSOLDADA5MM,DE0. 15X 0.15 M • PLACA CONTRAPISO DE 10CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. • PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA • PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 • SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45).	• Instalación de cubierta • Desmonte de muros y divisiones en salones	• PROGRAMADO 85,58% • EJECUTADO 97,36% • AVANCE 11,78%

ESTADO DE FRENTE DE OBRA

SEDE EDUCATIVA	INICIO DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE EJECUCION
ESTRELLA DEL SUR SEDE C	15 DE ENERO DE 2026	• Se entrega a satisfacción la totalidad de la obra	• PROGRAMADO 100,00% • EJECUTADO 100,00% ENTREGADO
ESTRELLA DEL SUR SEDE D	02 DE FEBRERO DE 2026	• Pendiente de entrega por subsanaciones en obra.	• PROGRAMADO 100,00% • EJECUTADO 100,00% ENTREGADO

ESTADO DE FRENTE DE OBRA

AVANCE GENERAL				
AVANCE	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO	
	94,28%	0,00%	90,76%	
PROGRAMADO	95,01%			
ATRASO	-0,73%	EN EJECUCION		

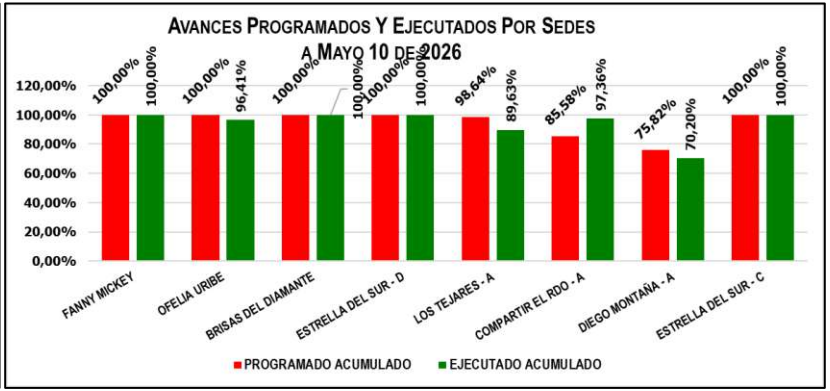

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (01-05-2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA
1981-L	FANNY MICKEY (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Villas del Diamante	100,00%	100,00%	↓	100,00%	↑	$ 814.870.147	$ 814.870.147,30	10/11/2025	11/04/2026
1962	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	D	Estrella del Sur (4)	100,00%	100,00%	→	100,00%	↓	$ 90.810.134	$ 90.810.133,53	2/02/2026	30/04/2026
1919	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	Estrella III Sede C	100,00%	100,00%	↑	100,00%	✓	$ 76.247.492	$ 76.247.492,45	15/01/2026	28/03/2026
1912	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	CIUDAD BOLIVAR	A	Confederación Suiza	100,00%	100,00%	→	100,00%	↑	$ 706.778.611	$ 706.778.611,33	18/11/2025	28/03/2026
1911	COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Compartir Lucero Alto	95,34%	97,36%	↑	85,58%	↑	$ 278.172.403	$ 270.826.434,12	24/11/2025	1/06/2026
576	DIEGO MONTAÑA CUELLAR (IED)	USME	A	El Uval - Nuevo	54,28%	70,20%	↑	75,82%	↓	$ 411.761.249	$ 289.040.593,81	1/12/2025	1/06/2026
573	OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)	USME	A	El Bosque Nuevo	93,46%	96,41%	↑	100,00%	↓	$ 242.305.285	$ 233.606.642,96	24/11/2025	7/05/2026
539	LOS TEJARES (IED)	USME	A	Los Tejares	80,74%	89,63%	↑	98,64%	↓	$ 242.176.869	$ 217.057.444,79	1/12/2025	1/06/2026

ESTADO GENERAL DE EMERGENCIAS

Lote	CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	ALCANCE	INICIO DE OBRA
4	527	USME	FRANCISCO ANTONIO ZEA	C	1 TALA Y 1 PODA DE ARBOL	EJECUTADO 100,00%
	577	USME	CIUDAD DE VILLAVICENCIO	A	TALA DE 3 ARBOLES	EJECUTADO 100,00%
	1928	CIUDAD BOLIVAR	MANUELA BELTRAN PARAISO	A	REEMPLAZO DE MURO	EJECUTADO 100,00%
	1931	USME	RURAL LA UNION	A	TALA DE 1 ARBOL	PENDIENTE
	1931	USME	RURAL LA UNION	A	MEJORAMIENTO MANEJO AGUAS LLUVIAS – ARREGLO MURO	PENDIENTE
	1911	CIUDAD BOLIVAR	COMPARTIR EL RECUERDO	A	ARREGLO DE FILTRACIONES POR DAÑO DE TUBERIA E IMPERMEABILIZACION DE PLACA	EJECUTADO 100,00%
	1981	CIUDAD BOLIVAR	FANNY MICKEY	A	IMPERMEABILIZACION PLACA EQUIPOS COCINA	EJECUTADO 100,00%
	1911	CIUDAD BOLIVAR	COMPARTIR EL RECUERDO	A	ADECUACION ELECTRICA	PENDIENTE
	1912	CIUDAD BOLIVAR	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	A	ADECUACION BAJANTES Y CONEXION	PENDIENTE
	1911	CIUDAD BOLIVAR	COMPARTIR EL RECUERDO	A	ADECUACION DE PUSOS Y DIVISIONES EN DRYWALL	PENDIENTE

REGISTRO FOTOGRAFICO

FANNY MICKEY









- Se entrega a satisfacción la totalidad de la obra

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE







- Se finalizan actividades de obra.

REGISTRO FOTOGRAFICO

COMPARTIR EL RECUERDO







- Armado de estructura y retiro de piso en salón de danzas.

REGISTRO FOTOGRAFICO

LOS TEJARES IED








- Instalación de cielo raso

REGISTRO FOTOGRAFICO

OFELIA URIBE DE ACOSTA

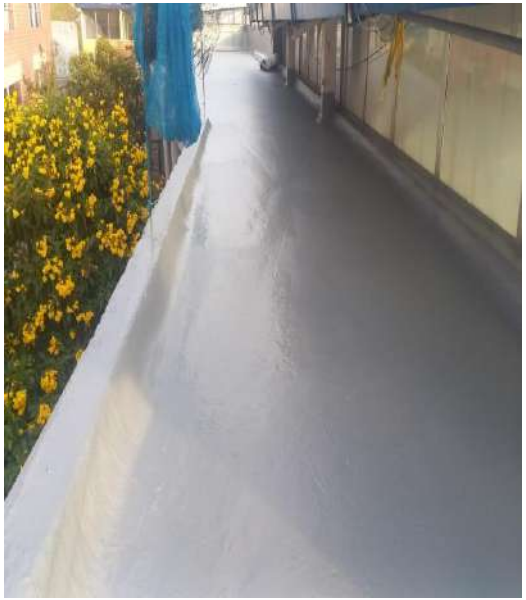





- Finalización aplicación de poliuria

REGISTRO FOTOGRAFICO

DIEGO MONTAÑA CUELLAR







- Actividades en cornisas
- Cargue en concreto de rampa

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTRELLA DEL SUR – SEDE C









- Se entrega a satisfacción la totalidad de la obra

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTRELLA DEL SUR - SEDE D







- Se entrega a satisfacción la totalidad de la obra





OBSERVACIONES / COMPROMISOS

CONTRATISTA

1. **De acuerdo al daño presentado en la tubería de agua potable al bajar los mesones del baño de compartir el recuerdo, fecha de entrega del mismo – ENTREGA BAÑOS PROXIMO MARTES 19 DE MAYO**
2. **De acuerdo a la nuevas recomendaciones del especialista eléctrico en la visita del día de hoy en tejares, esto Cambia la fecha de entrega programada para el día martes 19 - CUMPLE**
3. **Fecha de subsanaciones de observaciones en estrella D para culminar la entrega del colegio – MARTES 19 DE MAYO**
4. **Recordar que la tala de Rural la unión quedo para este viernes, siendo así programación de intervención en el muro de esa misma institución con presupuesto y demás. MARTES 19 DE MAYO**
5. **Fecha de entrega colegio Ofelia Uribe de Acosta -**
6. **Estado del retiro de materiales**
7. **Estado de NP´s**

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 26

LUGAR DE LA REUNIÓN:	https://meet.google.com/fyx-totd-fou	**FECHA:**	20	05	2026	**HORA INICIO:**	4:00 PM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	El Realizar seguimiento del contrato de obra CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025 – Lote 4						
PRESIDE:	INTERVENTORIA	**PRESIDE:**			INTERVENTORIA		
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMINETO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA
Santiago Ángel Uribe	DCCEE	Apoyo a la Supervisión	
Héctor Villazón	Consorcio Serinco Educativo	Director de interventoría	
Cesar Carvajal	Consorcio Serinco Educativo	Residente de interventoría	
Nicolas Hernández	Consorcio Serinco Educativo	Auxiliar de coordinación	
Deiby Yecid Arias B	Consorcio Adecuaciones Arsaf	Director de obra	
Diego Pinzón Espitia	Consorcio Adecuaciones Arsaf	Residente de obra	
Miguel Guzmán	Consorcio Adecuaciones Arsaf	Ingeniero de apoyo	

ORDEN DEL DIA	
1	Avance en Frentes de Obra
2	Estado de las Obras
3	Retiro de Escombros
4	Coordinación de Fechas de Entrega
5	Presupuesto para Emergencia en Rural La Unión
6	Entrega de Estrella del Sur - Sede D
7	Estado de los NPS
8	Adición Presupuestal del Contrato
9	Presupuesto y Alcance en Diego Montaña
10	Revisión de Manuales de Mantenimiento

DESARROLLO

1. **Avance en Frentes de Obra**
   Durante la reunión se presentó el estado general de avance de los frentes de obra correspondientes a las diferentes sedes educativas incluidas dentro del contrato. El proyecto presenta un atraso general del 0,88%, asociado principalmente a las sedes Los Tejares y Diego Montaña Cuellar. Se informó que actualmente cuatro sedes cuentan con actividades de obra y se registra las siguientes diferencias respecto al porcentaje programado:

   - **Fanny Mickey:** Ejecutado de 100%
   - **Brisas del Diamante:** Ejecutado de 100%
   - **Compartir el Recuerdo:** Avance de 7,20%
   - **Diego Montaña Cuellar**: Atraso de 5,32%

- **Ofelia Uribe de Acosta:** Atraso de 3,59%
- **Los Tejares:** Atraso de 5,99%
- **Estrella del sur Sede C:** Ejecutado de 100%
- **Estrella del sur Sede D:** Ejecutado de 100%

2. Estado de las Obras

- **Emergencias en Rural La Unión y Compartir Recuerdo**
  Se informa la culminación de la emergencia presentada en la sede Rural La Unión, relacionada con la tala de un árbol. En cuanto a la emergencia en Compartir Recuerdo, se realizaron actividades de retiro de divisiones y actualmente se avanza en la adecuación de pisos, alcanzando aproximadamente un 15% de ejecución.

- **Entrega de Baños en Compartir Recuerdo**
  Como resultado del recorrido efectuado entre contratista de obra e interventoría, se confirmó la correcta instalación del espejo que había resultado afectado durante el proceso de montaje. Actualmente se adelantan labores de aseo final en los baños y se coordina una visita de verificación para el día siguiente con el propósito de avanzar en la entrega definitiva a la interventoría.

- **Pendientes en Los Tejares**
  Se discute la falta de demolición de una poceta y las dificultades presentadas con una tubería reportada por Diego. Santiago Ángel manifiesta su inconformidad frente al retraso evidenciado en esta sede, considerando que la entrega estaba prevista para el 19 de mayo, e insta al equipo responsable a resolver de manera inmediata los elementos pendientes.

- **Barandas de Rampa en Diego Montaña**
  Consorcio Arsaf informa que las barandas de la rampa se encuentran actualmente en proceso de fabricación. Se adquiere el compromiso de reportar el viernes una fecha estimada de instalación y entrega, requisito necesario para la recepción final del colegio.

- **Estado y Entrega de IED Ofelia Acosta de Acosta**
  Se informa que actualmente se atienden observaciones pendientes relacionadas con el componente eléctrico. Frente a las manchas observadas en columnas por pintura antigua y filtraciones menores en claraboyas, se aclara que cualquier responsabilidad deberá encontrarse debidamente sustentada documentalmente. Arsaf Consorcio se compromete a realizar una nueva verificación de las redes eléctricas y ejecutar los retoques de pintura requeridos, incluyendo el muro afectado por palomas, con el propósito de proceder posteriormente con la entrega de la sede.

- **Seguimiento a Filtraciones en Brisas del Diamante**
  Santiago Ángel, Apoyo a la Supervisión, informa que remitirá un correo con el fin de consultar nuevamente la fecha para la recepción de dichos espacios.

- **Informe Silvicultural y Garantía de Fanny Mickey**
  Consorcio Arsaf se compromete a entregar el informe silvicultural el próximo 28 de mayo de 2026. En relación con la grifería instalada en la sede Fanny Mickey, se informa que la visita fue reprogramada para el 29 de mayo, fecha en la cual deberá aclararse a la institución educativa cuáles intervenciones corresponden a garantía contractual y cuáles no.

- **Pruebas de Tintas en Compartir Recuerdo**
  Cesar Carvajal recomienda coordinar lo antes posible las pruebas de tintas sobre la estructura de Compartir Recuerdo, aprovechando que ya se dispone del material eléctrico y de PVC necesario, con el objetivo de liberar dicha estructura y continuar con el avance de las actividades.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 26

3. **Retiro de Escombros**
   Durante el comité se evidenció un pendiente general relacionado con el retiro de RCD en los frentes de obra de Los Tejares, Diego Montaña Cuellar y Compartir Recuerdo. Consorcio Arsaf informa que se encuentra coordinando un cronograma para efectuar dichas actividades, programando el retiro en Compartir Recuerdo para mañana 21-may-2026, en Diego Montaña Cuellar para el viernes 22-may-2026 y en Confederación Brisas del Diamante para el próximo lunes 25-may-2026.

4. **Coordinación de Fechas de Entrega**
   El Arq. Santiago Ángel, Apoyo a la Supervisión, recalca la necesidad de definir, a más tardar el viernes 22-may-2026, todas las fechas de entrega de las obras, con el fin de informar oportunamente a los gestores y coordinar las actividades con las instituciones educativas. Así mismo, solicita a interventoría y contratista mantener un cronograma claro y garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos, evitando justificaciones relacionadas con falta de información.

5. **Presupuesto para Emergencia en Rural La Unión**
   Se acuerda que el presupuesto correspondiente a la tala del árbol en la sede Rural La Unión será cerrado el mismo día del comité y remitido al día siguiente, incluyendo las actividades ejecutadas y la disposición final de la madera resultante.

6. **Entrega de Estrella del Sur - Sede D**
   El Ing. Cesar Carvajal, residente de interventoría, informa que la obra se encuentra finalizada, salvo una conexión eléctrica pendiente desde el tablero principal, actividad que requiere aproximadamente dos días de ejecución. Se evaluará la posibilidad de realizar dicho procedimiento en una jornada sin presencia de estudiantes, sujeto a coordinación con la rectora de la institución. Adicionalmente, se reporta como pendiente la definición sobre el retiro o reubicación de un portón existente.

7. **Estado de los NPS**
   Arsaf Consorcio manifiesta que ya fueron realizadas las subsanaciones correspondientes a las observaciones recibidas. Actualmente, la documentación se encuentra en revisión y compilación por parte de la interventoría para su posterior envío completo.

8. **Adición Presupuestal del Contrato**
   Se informa que la adición presupuestal aún no ha sido aprobada y actualmente el trámite se encuentra radicado ante la abogada encargada. Santiago Ángel enfatiza la necesidad de obtener dicha aprobación antes del 1 de junio de 2026 para evitar una posible suspensión contractual. Así mismo, recuerda que, una vez aprobada la adición, deberán actualizarse las pólizas correspondientes en un plazo máximo de tres (3) días.

9. **Presupuesto y Alcance en Diego Montaña**
   Durante el comité se informa que el presupuesto ejecutado asciende a $416 millones lo que permite intervenir veinticuatro (24) cornisas. Santiago Ángel manifiesta que con este recurso se cumplir con el alcance proyectado desde un inicio lo que permite mantener el equilibrio financiero del contrato

10. **Revisión de Manuales de Mantenimiento**
    El Arq. Santiago Ángel, Apoyo a la Supervisión, advierte sobre la importancia de elaborar adecuadamente los manuales de mantenimiento de las sedes intervenidas. Como ejemplo, menciona el caso de un contratista que actualmente enfrenta reclamaciones debido a la omisión de especificaciones relacionadas con el mantenimiento de una viga canal, instando a los asistentes a redactar cuidadosamente dichos documentos para prevenir futuros riesgos legales y financieros.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 26

COMPROMISOS					
#	**ACTIVIDAD/Tarea**	**PRIORIDAD**	**RESPONSABLE**	**FECHA EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	Se deberán definir y socializar, a más tardar el viernes, las fechas definitivas de entrega de cada una de las sedes intervenidas.	Alta	Consorcio Arsaf e Interventoría	A mas tardar, viernes 22 de mayo de 2026.	
2	Consorcio Arsaf reportará el viernes la fecha estimada de instalación y entrega de las barandas de la rampa en la sede Diego Montaña Cuellar	Alta	Consorcio Arsaf	viernes 22 de mayo del presente año	
3	La interventoría revisará y remitirá la documentación correspondiente a los NPS una vez finalizada la compilación de las subsanaciones entregadas por Consorcio Arsaf.	Alta	Interventoría	A la mayor brevedad posible	
4	Entrega de informe silvicultural de Fanny Mickey	Alta	Consorcio Arsaf	28 de mayo de 2026	
5	Entrega de presupuesto de la emergencia Rural la Union	Alta	Consorcio Arsaf	21 de mayo de 2026	

Convocatoria próximo comité:	Martes, 26/05/2026
Hora de finalización:	04:45 pm

COMITÉ TECNICO – LOTE 4

20 DE MAYO DE 2026

“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

CONTRATISTA

CONSORCIO ARSAF 2025

INTERVENTORIA

Consorcio Serinco EDUCATIVO

SUPERVISION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ

ORDEN DEL DIA

1. INFORMACION GENERAL
2. ESTADO GENERAL DE CONTRATO
3. ESTADO DE FRENTES DE OBRA
4. REGISTRO FOTOGRAFICO
5. OBSERVACIONES / COMPROMISOS

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Alcance: **“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.**

Contratista: **CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025**

Interventoría: **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**

Inversión del proyecto: **$2.703.337.443**

Modificatorio 1: **Adición $479.467.488**

Valor total: **$3.182.804.931**

Lote: **4** **Sedes:** **8**

Plazo total : **Siete (7) Meses y 27 días calendario**

Fecha de terminación: **1 de junio de 2026**

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Lote	CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE EDUCATIVA	DIRECCION	INICIO DE OBRA	FIN DE OBRA
4	1981	CIUDAD BOLIVAR	FANNY MICKEY	A – VILLAS DEL DIAMANTE	KR. 18 N No 71 A 51 SUR	10 DE NOVIEMBRE DE 2025	11 DE ABRIL DE 2026
	573	USME	OFELIA URIBE DE ACOSTA	A – EL BOSQUE NUEVO	TV 1 ESTE No 85 10 SUR	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	07 DE MAYO DE 2026
	1962	CIUDAD BOLIVAR	ESTRELLA DEL SUR	D – ESTRELLA DEL SUR (ESTRELLA IV)	KR 18 D No 73 50 SUR	2 DE FEBRERO DE 2026	30 DE ABRIL DE 2026
	576	USME	DIEGO MONTAÑA CUELLAR	A – EL UVAL NUEVO	TV 6B No 100 C 55 SUR	1 DE DICIEMBRE DE 2025	1 DE JUNIO DE 2026
	1919	CIUDAD BOLIVAR	ESTRELLA DEL SUR	C – ESTRELLA III	CL 74 A SUR No 18 23	15 DE ENERO DE 2026	28 DE MARZO DE 2026
	1911	CIUDAD BOLIVAR	COMPARTIR RECUERDO	A – COMPARTIR LUCERO ALTO	CL 69 SUR No 18B 35	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	1 DE JUNIO DE 2026
	1912	CIUDAD BOLIVAR	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	A – CONFEDERACION SUIZA	KR 18 I No 69D 35 SUR	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	28 DE MARZO DE 2026
	539	USME	LOS TEJARES	A – LOS TEJARES	CL 75 C BIS SUR No 5 52	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	1 DE JUNIO DE 2026

ESTADO DE FRENTE DE OBRA

SEDE EDUCATIVA	INICIO DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	ESTADO DE EJECUCION
FANNY MICKEY	10 DE NOVIEMBRE DE 2025	• CERRAMIENTO EN LONA • RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS • DEMOLICION DE ACABADO DE PISO AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA) • SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5MM, DE 0.15X 0.15 M • DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M • PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO CERRAMIENTO EN LONA • RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS • DEMOLICION DE ACABADO DE PISO ÍTEM: 1.29 • AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA) ÍTEM: 16.1.25 • SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5MM, DE 0.15X 0.15 M • DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS) • PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO • SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM • SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO, ORINAL , LAVAMANOS, TAZA ADRIATICA, GRIFERÍA DE LAVAMANOS.	• Se entrega a satisfacción la totalidad de la obra	• PROGRAMADO 100,00% • EJECUTADO 100,00% ENTREGADO

ESTADO DE FRENTE DE OBRA

SEDE EDUCATIVA	INICIO DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE EJECUCION
CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	• RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS • TRATAMIENTO DE PLACA EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: PULIDA DE SUPERFICIE, TRATAMIENTO DE JUNTAS, LAVADO PARA RETIRO DE SUCIEDAD, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN • SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM • SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TOP COAT O SIMILAR, PARA EXTERIORES EN COLORES PRIMARIOS, NO INCLUYE DISEÑO	• Se finalizan actividades de obra. • Pendiente de entrega	• PROGRAMADO 100,00% • EJECUTADO 100,00% • PENDIENTE DE ENTREGA

ESTADO DE FRENTE DE OBRA

SEDE EDUCATIVA	INICIO DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE EJECUCION
OFELIA URIBE DE ACOSTA	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	• RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS • DEMOLICION DE ACABADO DE PISO ÍTEM: 1.2.8 • AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE	• No se registran actividades	• PROGRAMADO 100,00% • EJECUTADO 96,41% • ATRASO 3,59%
DIEGO MONTAÑA CUELLAR	1 DE DICIEMBRE DE 2025	• REPLANTEO • DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M • DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA • DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M • DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA • DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS • DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC • PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES • MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5 • MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M • SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45 • SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO • ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM	• Actividades en cornisas	• PROGRAMADO 83,50% • EJECUTADO 78,18% • ATRASO 5,32%

ESTADO DE FRENTE DE OBRA

SEDE EDUCATIVA	INICIO DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE EJECUCION
LOS TEJARES	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	• CERRAMIENTO EN LONA • DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M • DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC • DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA • DESMONTE DE LÁMPARAS • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL • SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10MM • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120X30CM, 40W	• Instalación de tablero, toma corriente, Interruptores y luminarias	• PROGRAMADO 98,83% • EJECUTADO 92,84% • ATRASO 5,99%

ESTADO DE FRENTE DE OBRA


SEDE EDUCATIVA	INICIO DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE EJECUCION
COMPARTIR RECUERDO	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	• CERRAMIENTO EN LONA • DEMOLICIÓN PLACA MACIZA , ACABADO Y ALISTADO DE PISO, MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS, ENCHAPE DE MUROS Y PEGA • DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC • DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" • PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES • DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE • DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" • TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS • INSTALACION DE TUBERIA, PUNTOS SANITARIOS, VALVULA. • CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA • SUMINISTROEINSTALACIÓNMALLAELECTROSOLDADA5MM,DE0. 15X 0.15 M • PLACA CONTRAPISO DE 10CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. • PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA • PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 • SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45).	• Pintura de estructura • Se tiene ya el material eléctrico para inciar con este componente.	• PROGRAMADO 91,37% • EJECUTADO 98,57% • AVANCE 7,20%

ESTADO DE FRENTE DE OBRA

SEDE EDUCATIVA	INICIO DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE EJECUCION
ESTRELLA DEL SUR SEDE C	15 DE ENERO DE 2026	• Se entrega a satisfacción la totalidad de la obra	• PROGRAMADO 100,00% • EJECUTADO 100,00% ENTREGADO
ESTRELLA DEL SUR SEDE D	02 DE FEBRERO DE 2026	• Se entrega a satisfacción la totalidad de la obra	• PROGRAMADO 100,00% • EJECUTADO 100,00% ENTREGADO

ESTADO DE FRENTE DE OBRA

AVANCE GENERAL				
AVANCE	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO	
	95,81%	0,00%	93,70%	
PROGRAMADO	96,69%			
ATRASO	-0,88%	EN EJECUCION		

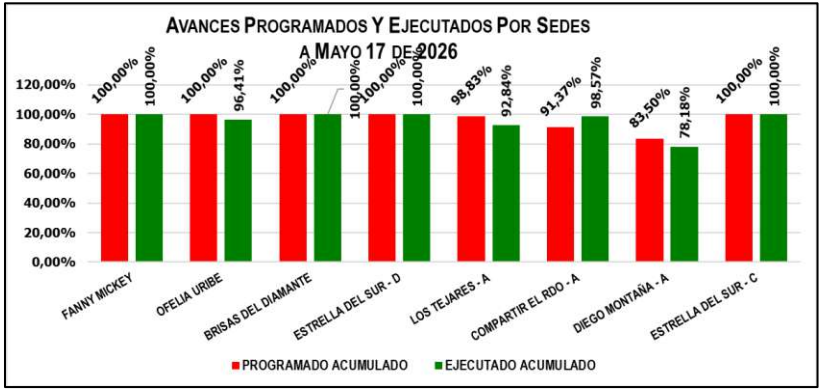

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (17-05-2026)	PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA
1981-L	FANNY MICKEY (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Villas del Diamante	100,00%	100,00%	100,00%		$ 814.870.147,30	$ 814.870.147,30	10/11/2025	11/04/2026
1962	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	D	Estrella del Sur (4)	100,00%	100,00%	100,00%		$ 90.810.133,53	$ 90.810.133,53	2/02/2026	30/04/2026
1919	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	Estrella III Sede C	100,00%	100,00%	100,00%		$ 76.247.492,45	$ 76.247.492,45	15/01/2026	28/03/2026
1912	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	CIUDAD BOLIVAR	A	Confederación Suiza	100,00%	100,00%	100,00%		$ 706.778.611,33	$ 706.778.611,33	18/11/2025	28/03/2026
1911	COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Compartir Lucero Alto	97,36%	98,57%	91,37%		$ 278.172.403,41	$ 274.194.834,12	24/11/2025	1/06/2026
576	DIEGO MONTAÑA CUELLAR (IED)	USME	A	El Uval - Nuevo	70,20%	78,18%	83,50%		$ 411.761.249,00	$ 321.899.143,81	1/12/2025	1/06/2026
573	OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)	USME	A	El Bosque Nuevo	96,41%	96,41%	100,00%		$ 242.305.285,25	$ 233.606.642,96	24/11/2025	7/05/2026
539	LOS TEJARES (IED)	USME	A	Los Tejares	89,63%	92,84%	98,83%		$ 242.176.869,00	$ 224.838.683,79	1/12/2025	1/06/2026

ESTADO GENERAL DE EMERGENCIAS

Lote	CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	ALCANCE	INICIO DE OBRA
4	527	USME	FRANCISCO ANTONIO ZEA	C	1 TALA Y 1 PODA DE ARBOL	EJECUTADO 100,00%
	577	USME	CIUDAD DE VILLAVICENCIO	A	TALA DE 3 ARBOLES	EJECUTADO 100,00%
	1928	CIUDAD BOLIVAR	MANUELA BELTRAN PARAISO	A	REEMPLAZO DE MURO	EJECUTADO 100,00%
	1931	USME	RURAL LA UNION	A	TALA DE 1 ARBOL	EJECUTADO 100,00%
	1931	USME	RURAL LA UNION	A	MEJORAMIENTO MANEJO AGUAS LLUVIAS – ARREGLO MURO	PENDIENTE
	1911	CIUDAD BOLIVAR	COMPARTIR EL RECUERDO	A	ARREGLO DE FILTRACIONES POR DAÑO DE TUBERIA E IMPERMEABILIZACION DE PLACA	EJECUTADO 100,00%
	1981	CIUDAD BOLIVAR	FANNY MICKEY	A	IMPERMEABILIZACION PLACA EQUIPOS COCINA	EJECUTADO 100,00%
	1911	CIUDAD BOLIVAR	COMPARTIR EL RECUERDO	A	ADECUACION ELECTRICA	PENDIENTE
	1912	CIUDAD BOLIVAR	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	A	ADECUACION BAJANTES Y CONEXION	PENDIENTE
	1911	CIUDAD BOLIVAR	COMPARTIR EL RECUERDO	A	ADECUACION DE PUSOS Y DIVISIONES EN DRYWALL	EJECUCION 15%

REGISTRO FOTOGRAFICO

FANNY MICKEY









- Se entrega a satisfacción la totalidad de la obra

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE







- Se finalizan actividades de obra.

REGISTRO FOTOGRAFICO

COMPARTIR EL RECUERDO







- Pintura de estructura
- Se tiene ya el material eléctrico para iniciar con este componente.

REGISTRO FOTOGRAFICO

LOS TEJARES IED








- Instalación de tablero, toma corriente, Interruptores y luminarias

REGISTRO FOTOGRAFICO

OFELIA URIBE DE ACOSTA

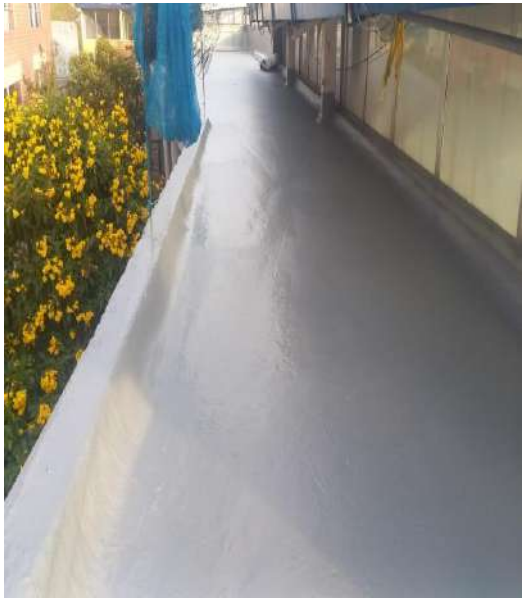





REGISTRO FOTOGRAFICO

DIEGO MONTAÑA CUELLAR







- Actividades en cornisas

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTRELLA DEL SUR – SEDE C









- Se entrega a satisfacción la totalidad de la obra

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTRELLA DEL SUR - SEDE D







- Se realizan subsanaciones de obra, se tiene pendiente realizar la parcial eléctrica desde el tablero principal hasta el tablero instalado por el contratista en la sala de sistemas.

REGISTRO FOTOGRAFICO - EMERGENCIAS

RURAL LA UNION






- Tala de árbol

REGISTRO FOTOGRAFICO - EMERGENCIAS

COMPARTIR EL RECUERDO



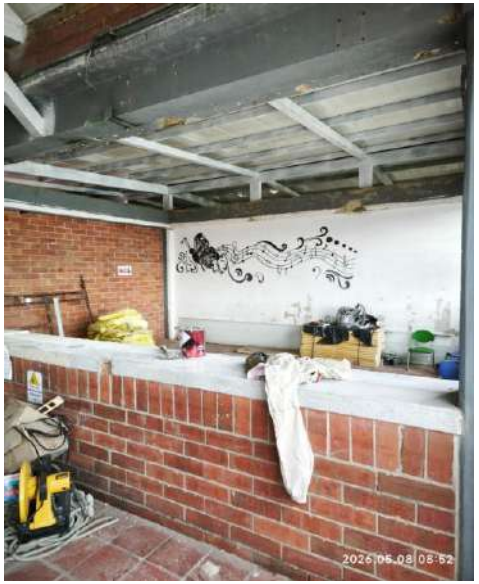



- Retiro de la totalidad de las divisiones

OBSERVACIONES / COMPROMISOS

CONTRATISTA

1. **Retiro de escombros en los diferentes frentes de obra (tejares, ofelia, diego montaña, compartir)**
2. **Fecha de entrega baños compartir -**
3. **Fecha de entrega tejares -**
4. **Fecha de entrega de barandas rampa diego montaña para posterior entrega del Colegio -**
5. **Presupuesto de la Emergencia Rural la Unión teniendo en cuenta que ya se realizó la tala. – 21 MAYO**
6. **Entrega de IED Ofelia Uribe de Acosta teniendo en cuenta las observaciones eléctricas realizadas -**
7. **Entrega estrella del sur - sede D -**
8. **Se sabe algo en relación a la recepción de las áreas que no presentan filtraciones en brisas**
9. **Estado de los NPS**
10. **Estado de la adición**

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 27

LUGAR DE LA REUNIÓN:	https://meet.google.com/ktd-xjmu-vqz	**FECHA:**	26	05	2026	**HORA INICIO:**	2:30 PM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	El Realizar seguimiento del contrato de obra CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025 – Lote 4						
PRESIDE:	INTERVENTORIA	**PRESIDE:**			INTERVENTORIA		
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMINETO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA
Santiago Ángel Uribe	DCCEE	Apoyo a la Supervisión	
Héctor Villazón	Consorcio Serinco Educativo	Director de interventoría	
Cesar Carvajal	Consorcio Serinco Educativo	Residente de interventoría	
Nicolas Hernández	Consorcio Serinco Educativo	Auxiliar de coordinación	
Deiby Yecid Arias B	Consorcio Adecuaciones Arsaf	Director de obra	
Diego Pinzón Espitia	Consorcio Adecuaciones Arsaf	Residente de obra	
Miguel Guzmán	Consorcio Adecuaciones Arsaf	Ingeniero de apoyo	Miguel Guzman

ORDEN DEL DIA	
1	Avance en Frentes de Obra
2	Estado de las Obras
3	Coordinación de Fechas de Entrega
4	Ajuste de Balances Financieros
5	Logística de Entrega de Manuales de Mantenimiento
6	Revisión de Manuales de Mantenimiento
7	Reportes Ambientales
8	Adición contractual y liquidación
9	Lectura de Acta y Compromisos del Presente Comité

DESARROLLO

1. Avance en Frentes de Obra

Durante la reunión se presentó el estado general de avance de los frentes de obra correspondientes a las diferentes sedes educativas incluidas dentro del contrato. El proyecto presenta un atraso general del 0,52%. Se informó que actualmente tres sedes cuentan con actividades de obra y se registra las siguientes diferencias respecto al porcentaje programado:

- **Fanny Mickey:** Ejecutado de 100%
- **Brisas del Diamante:** Ejecutado de 100%
- **Compartir el Recuerdo:** Avance de 2,82%
- **Diego Montaña Cuellar**: Atraso de 1,78%
- **Ofelia Uribe de Acosta:** Atraso de 3,59%
- **Los Tejares:** Ejecutado de 100%

- **Estrella del sur Sede C:** Ejecutado de 100%
- **Estrella del sur Sede D:** Ejecutado de 100%

2. Estado de las Obras

Retiro de Escombros y Limpieza
Arsaf confirmó la programación del retiro de escombros en las sedes ***Diego Montaña y Compartir el Recuerdo***. En este sentido, se acordó que, a más tardar el viernes 29-may-2026, todas las áreas intervenidas deberán quedar completamente libres de escombros, residuos y materiales sobrantes, incluyendo aquellos provenientes del retiro de cubiertas y demás elementos desmontados durante la ejecución de las obras.

Adecuaciones Eléctricas en Los Tejares
Se discutió el estado pendiente de la instalación de dos tomacorrientes en la cafetería de la sede Tejares. Luego de evaluar la posibilidad de que la institución educativa gestione directamente esta actividad, el arq. Santiago Ángel, Apoyo de la Supervisión, y el equipo acordaron establecer como fecha límite el día 10-jul-2026, considerando que para ese momento el personal institucional habrá retornado de vacaciones y podrá definirse si el colegio asumirá la ejecución de las adecuaciones requeridas.

Emergencia en Estrella del Sur, Sede D
Arsaf manifestó la necesidad de realizar ajustes al presupuesto inicialmente planteado para la atención de la emergencia en ***Estrella del Sur sede D***, debido a la complejidad estructural encontrada durante la revisión técnica. Frente a ello, Santiago Ángel aclaró que el alcance aprobado corresponde únicamente a la intervención de la estructura ubicada sobre el área central, con el fin de corregir las filtraciones existentes. Finalmente, solicitó que el presupuesto detallado sea entregado el próximo sábado al mediodía para su respectiva revisión.

Entrega de Ofelia Uribe de Acosta
Se coordinó la entrega de la sede Ofelia Uribe de Acosta para el día siguiente a las 10:00 a.m. El equipo confirmó que durante la jornada actual serán atendidos los pendientes relacionados con detalles de pintura, reposición de una luminaria con fallas y corte de varillas del cerramiento, con el objetivo de garantizar una entrega satisfactoria ante la rectora de la institución educativa.

3. Coordinación por Jornadas Electorales
El Apoyo a la Supervisión, Santiago Ángel informó que varias instituciones educativas serán nuevamente habilitadas como puestos de votación, situación que restringirá el acceso a las sedes durante el viernes y sábado de la presente semana. En consecuencia, para el caso específico de ***Estrella del Sur Sede D***, se acordó coordinar la intervención eléctrica para el siguiente fin de semana, aprovechando el lunes festivo, y evitando interferencias con las actividades electorales programadas.

4. Ajuste de Balances Financieros
Durante la reunión, el Arq. Santiago Ángel, Apoyo a la Supervisión. manifestó preocupación frente a un desfase financiero dentro del proyecto. Por tal motivo, instruyó al equipo responsable para que, antes del próximo lunes 01-jun-2026, se realice el ajuste y actualización de los balances financieros de todos los frentes de obra dentro del informe semanal, garantizando que la información presentada sea precisa y consistente para la revisión del director de construcciones.

5. Logística de Entrega de Manuales de Mantenimiento
El equipo debatió la importancia de realizar la entrega formal de los manuales de mantenimiento y matrices técnicas a todas las instituciones intervenidas, con el fin de evitar futuros inconvenientes relacionados con garantías y responsabilidades legales. En este sentido, Santiago Ángel solicitó que los manuales correspondientes a las sedes Fanny Micky, Estrella del Sur, Ofelia Uribe de Acosta, Diego Montaña, Brisas del Diamante y Tejares sean entregados en formato digital durante la presente semana, garantizando la debida trazabilidad documental.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 27

6. Revisión de Manuales de Mantenimiento

César Carvajal, residente de interventoría, informó que actualmente se encuentra finalizando la revisión de los manuales de mantenimiento, incorporando observaciones específicas relacionadas con canales y cubiertas. Lo anterior con el propósito de garantizar que la documentación quede completa y permita minimizar futuros inconvenientes asociados a garantías, tal como ha ocurrido en proyectos anteriores. Se espera contar con todos los manuales revisados y validados para impresión y entrega final al cierre de la semana.

7. Reportes Ambientales

Se recordó el compromiso de entregar el informe silvicultural el día 28. Adicionalmente, Arq. Santiago Ángel, Apoyo a la Supervisión, reiteró la necesidad de mantener proactividad frente a la elaboración y entrega de informes mensuales y reportes requeridos por la Secretaría de Ambiente, evitando llamados de atención por parte de la entidad. Asimismo, recordó que la interventoría será la encargada de consolidar toda la documentación correspondiente.

8. Adición contractual y liquidación

Finalmente, Santiago Ángel informó sobre el estado actual del trámite de adición contractual, indicando que la documentación fue nuevamente radicada y actualmente se encuentra pendiente de firma. Respecto al proceso de liquidación final del contrato, recomendó al Director de interventoría, Héctor Villazón y a todo el equipo, estructurar un cronograma detallado y una lista de verificación que permita organizar oportunamente la recopilación de planos récord, memorias técnicas, balances financieros y demás soportes documentales, evitando dejar estas actividades para la etapa final del contrato.

9. Lectura de Acta y Compromisos del Presente Comité

Tras la finalización del presente comité se da lectura al acta y se acuerdan los compromisos pactados, en los cuales todos los participantes responsables están de acuerdo.

COMPROMISOS

#	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Realizar el retiro total de escombros y materiales sobrantes en las sedes Diego Montaña y Compartir el Recuerdo.	Alta	Consorcio Arsaf e Interventoría	A más tardar, viernes 29 de mayo de 2026.	
2	Remitir el presupuesto correspondiente a la emergencia de Estrella del Sur sede D.	Alta	Consorcio Arsaf	Durante el transcurso de la semana	
3	Actualizar y ajustar los balances financieros de todos los frentes de obra e incorporarlos en el informe semanal.	Alta	Interventoría	Para el próximo informe semanal	
4	Entregar en formato digital los manuales de mantenimiento y matrices de las sedes intervenidas.	Alta	Consorcio Arsaf	Durante la presente semana	
5	Mantener actualizados los informes mensuales y reportes requeridos por la Secretaría de Ambiente.	Alta	Consorcio Arsaf	Permanente	

Convocatoria próximo comité:	02 de junio de 2026
Hora de finalización:	03:10 pm

COMITÉ TECNICO – LOTE 4

26 DE MAYO DE 2026

“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

CONTRATISTA

CONSORCIO ARSAF 2025

INTERVENTORIA

Consorcio Serinco EDUCATIVO

SUPERVISION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ

ORDEN DEL DIA

1. INFORMACION GENERAL
2. ESTADO GENERAL DE CONTRATO
3. ESTADO DE FRENTES DE OBRA
4. REGISTRO FOTOGRAFICO
5. OBSERVACIONES / COMPROMISOS

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Alcance: **“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.**

Contratista: **CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025**

Interventoría: **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**

Inversión del proyecto: **$2.703.337.443**

Modificatorio 1: **Adición $479.467.488**

Valor total: **$3.182.804.931**

Lote: **4** **Sedes:** **8**

Plazo total : **Siete (7) Meses y 27 días calendario**

Fecha de terminación: **1 de junio de 2026**

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Lote	CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE EDUCATIVA	DIRECCION	INICIO DE OBRA	FIN DE OBRA
4	1981	CIUDAD BOLIVAR	FANNY MICKEY	A – VILLAS DEL DIAMANTE	KR. 18 N No 71 A 51 SUR	10 DE NOVIEMBRE DE 2025	11 DE ABRIL DE 2026
	573	USME	OFELIA URIBE DE ACOSTA	A – EL BOSQUE NUEVO	TV 1 ESTE No 85 10 SUR	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	07 DE MAYO DE 2026
	1962	CIUDAD BOLIVAR	ESTRELLA DEL SUR	D – ESTRELLA DEL SUR (ESTRELLA IV)	KR 18 D No 73 50 SUR	2 DE FEBRERO DE 2026	30 DE ABRIL DE 2026
	576	USME	DIEGO MONTAÑA CUELLAR	A – EL UVAL NUEVO	TV 6B No 100 C 55 SUR	1 DE DICIEMBRE DE 2025	1 DE JUNIO DE 2026
	1919	CIUDAD BOLIVAR	ESTRELLA DEL SUR	C – ESTRELLA III	CL 74 A SUR No 18 23	15 DE ENERO DE 2026	28 DE MARZO DE 2026
	1911	CIUDAD BOLIVAR	COMPARTIR RECUERDO	A – COMPARTIR LUCERO ALTO	CL 69 SUR No 18B 35	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	1 DE JUNIO DE 2026
	1912	CIUDAD BOLIVAR	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	A – CONFEDERACION SUIZA	KR 18 I No 69D 35 SUR	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	28 DE MARZO DE 2026
	539	USME	LOS TEJARES	A – LOS TEJARES	CL 75 C BIS SUR No 5 52	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	1 DE JUNIO DE 2026

ESTADO DE FRENTE DE OBRA

SEDE EDUCATIVA	INICIO DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	ESTADO DE EJECUCION
FANNY MICKEY	10 DE NOVIEMBRE DE 2025	• CERRAMIENTO EN LONA • RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS • DEMOLICION DE ACABADO DE PISO AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA) • SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5MM, DE 0.15X 0.15 M • DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M • PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO CERRAMIENTO EN LONA • RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS • DEMOLICION DE ACABADO DE PISO ÍTEM: 1.29 • AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA) ÍTEM: 16.1.25 • SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5MM, DE 0.15X 0.15 M • DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS) • PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO • SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM • SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO, ORINAL , LAVAMANOS, TAZA ADRIATICA, GRIFERÍA DE LAVAMANOS.	• Se entrega a satisfacción la totalidad de la obra	• PROGRAMADO 100,00% • EJECUTADO 100,00% ENTREGADO

ESTADO DE FRENTE DE OBRA

SEDE EDUCATIVA	INICIO DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE EJECUCION
CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	• RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS • TRATAMIENTO DE PLACA EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: PULIDA DE SUPERFICIE, TRATAMIENTO DE JUNTAS, LAVADO PARA RETIRO DE SUCIEDAD, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN • SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM • SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TOP COAT O SIMILAR, PARA EXTERIORES EN COLORES PRIMARIOS, NO INCLUYE DISEÑO	• Se finalizan actividades de obra. • Pendiente de entrega	• PROGRAMADO 100,00% • EJECUTADO 100,00% • PENDIENTE DE ENTREGA

ESTADO DE FRENTE DE OBRA

SEDE EDUCATIVA	INICIO DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE EJECUCION
OFELIA URIBE DE ACOSTA	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	• RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS • DEMOLICION DE ACABADO DE PISO ÍTEM: 1.2.8 • AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE	• No se registran actividades	• PROGRAMADO 100,00% • EJECUTADO 96,41% • ATRASO 3,59%
DIEGO MONTAÑA CUELLAR	1 DE DICIEMBRE DE 2025	• REPLANTEO • DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M • DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA • DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M • DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA • DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS • DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC • PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES • MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5 • MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M • SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45 • SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO • ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM	• Actividades en cornisas	• PROGRAMADO 91,18% • EJECUTADO 89,39% • ATRASO 1,78%

ESTADO DE FRENTE DE OBRA

SEDE EDUCATIVA	INICIO DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE EJECUCION
LOS TEJARES	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	• CERRAMIENTO EN LONA • DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M • DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC • DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA • DESMONTE DE LÁMPARAS • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL • SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10MM • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120X30CM, 40W	• Finalizan actividades de obra	• PROGRAMADO 100,00% • EJECUTADO 100,00% ENTREGADO

ESTADO DE FRENTE DE OBRA


SEDE EDUCATIVA	INICIO DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE EJECUCION
COMPARTIR RECUERDO	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	• CERRAMIENTO EN LONA • DEMOLICIÓN PLACA MACIZA , ACABADO Y ALISTADO DE PISO, MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS, ENCHAPE DE MUROS Y PEGA • DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC • DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" • PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES • DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE • DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" • TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS • INSTALACION DE TUBERIA, PUNTOS SANITARIOS, VALVULA. • CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA • SUMINISTROEINSTALACIÓNMALLAELECTROSOLDADA5MM,DE0. 15X 0.15 M • PLACA CONTRAPISO DE 10CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. • PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA • PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 • SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45).	• Instalación de estructura cielo raso • Instalación tubería emt para luminarias y aparatos • Prueba de tintas penetrantes en estructura.	• PROGRAMADO 95,75% • EJECUTADO 98,57% • AVANCE 2,82%

ESTADO DE FRENTE DE OBRA

SEDE EDUCATIVA	INICIO DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE EJECUCION
ESTRELLA DEL SUR SEDE C	15 DE ENERO DE 2026	• Se entrega a satisfacción la totalidad de la obra	• PROGRAMADO 100,00% • EJECUTADO 100,00% ENTREGADO
ESTRELLA DEL SUR SEDE D	02 DE FEBRERO DE 2026	• Se finalizan actividades de obra. • Pendiente parcial electrica • Pendiente de entrega	• PROGRAMADO 100,00% • EJECUTADO 100,00% • PENDIENTE DE ENTREGA

ESTADO DE FRENTE DE OBRA

AVANCE GENERAL				
	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO	
AVANCE	97,74%	0,00%	96,64%	
PROGRAMADO	98,26%			
ATRASO	-0,52%	EN EJECUCION		

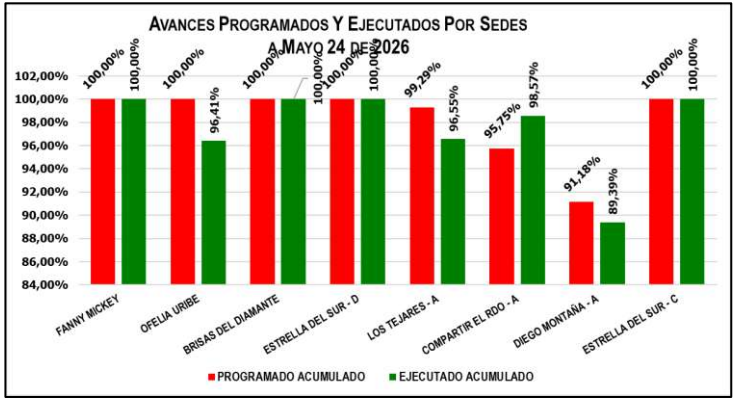

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (24-05-2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA
1981-L	FANNY MICKEY (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Villas del Diamante	100,00%	100,00%	→	100,00%	↑	$ 814.870.147	$ 814.870.147,30	10/11/2025	11/04/2026
1962	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	D	Estrella del Sur (4)	100,00%	100,00%	→	100,00%	↓	$ 90.810.134	$ 90.810.133,53	2/02/2026	30/04/2026
1919	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	Estrella III Sede C	100,00%	100,00%	→	100,00%	✓	$ 76.247.492	$ 76.247.492,45	15/01/2026	28/03/2026
1912	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	CIUDAD BOLIVAR	A	Confederación Suiza	100,00%	100,00%	→	100,00%	↑	$ 706.778.611	$ 706.778.611,33	18/11/2025	28/03/2026
1911	COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Compartir Lucero Alto	98,57%	98,57%	→	95,75%	↑	$ 278.172.403	$ 274.194.834,12	24/11/2025	1/06/2026
576	DIEGO MONTAÑA CUELLAR (IED)	USME	A	El Uval - Nuevo	78,18%	89,39%	↑	91,18%	↓	$ 411.761.249	$ 368.085.121,69	1/12/2025	1/06/2026
573	OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)	USME	A	El Bosque Nuevo	96,41%	96,41%	→	100,00%	↓	$ 242.305.285	$ 233.606.642,96	24/11/2025	7/05/2026
539	LOS TEJARES (IED)	USME	A	Los Tejares	92,84%	96,55%	↑	99,29%	↓	$ 242.176.869	$ 233.821.083,79	1/12/2025	1/06/2026

ESTADO GENERAL DE EMERGENCIAS

Lote	CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	ALCANCE	INICIO DE OBRA
4	527	USME	FRANCISCO ANTONIO ZEA	C	1 TALA Y 1 PODA DE ARBOL	EJECUTADO 100,00%
	577	USME	CIUDAD DE VILLAVICENCIO	A	TALA DE 3 ARBOLES	EJECUTADO 100,00%
	1928	CIUDAD BOLIVAR	MANUELA BELTRAN PARAISO	A	REEMPLAZO DE MURO	EJECUTADO 100,00%
	1931	USME	RURAL LA UNION	A	TALA DE 1 ARBOL	EJECUTADO 100,00%
	1931	USME	RURAL LA UNION	A	MEJORAMIENTO MANEJO AGUAS LLUVIAS – ARREGLO MURO	PENDIENTE
	1911	CIUDAD BOLIVAR	COMPARTIR EL RECUERDO	A	ARREGLO DE FILTRACIONES POR DAÑO DE TUBERIA E IMPERMEABILIZACION DE PLACA	EJECUTADO 100,00%
	1981	CIUDAD BOLIVAR	FANNY MICKEY	A	IMPERMEABILIZACION PLACA EQUIPOS COCINA	EJECUTADO 100,00%
	1911	CIUDAD BOLIVAR	COMPARTIR EL RECUERDO	A	ADECUACION ELECTRICA	PENDIENTE
	1912	CIUDAD BOLIVAR	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	A	ADECUACION BAJANTES Y CONEXION	PENDIENTE
	1911	CIUDAD BOLIVAR	COMPARTIR EL RECUERDO	A	ADECUACION DE PUSOS Y DIVISIONES EN DRYWALL	EJECUCION 25%

REGISTRO FOTOGRAFICO

FANNY MICKEY









- Se entrega a satisfacción la totalidad de la obra

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE







- Se finalizan actividades de obra.

REGISTRO FOTOGRAFICO

COMPARTIR EL RECUERDO







- Instalación de estructura cielo raso
- Instalación tubería emt para luminarias y aparatos
- Prueba de tintas penetrantes en estructura.

REGISTRO FOTOGRAFICO

LOS TEJARES IED








REGISTRO FOTOGRAFICO

OFELIA URIBE DE ACOSTA

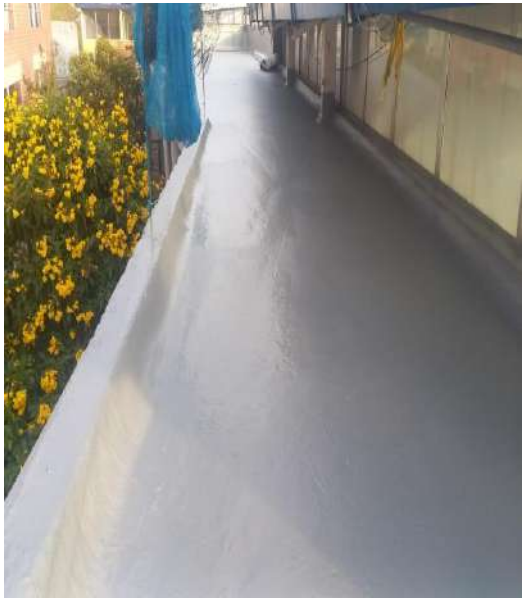





REGISTRO FOTOGRAFICO

DIEGO MONTAÑA CUELLAR







- Actividades en cornisas

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTRELLA DEL SUR – SEDE C









- Se entrega a satisfacción la totalidad de la obra

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTRELLA DEL SUR - SEDE D








- se tiene pendiente realizar la parcial eléctrica desde el tablero principal hasta el tablero instalado por el contratista en la sala de sistemas.

REGISTRO FOTOGRAFICO - EMERGENCIAS

COMPARTIR EL RECUERDO



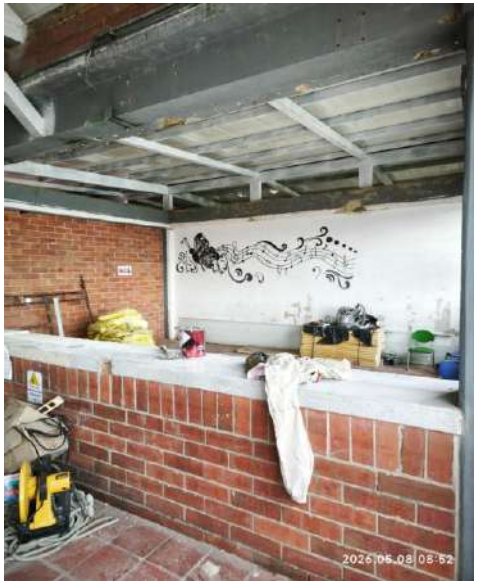



OBSERVACIONES / COMPROMISOS

CONTRATISTA

1. **Retiro de escombros Compartir el Recuerdo y Diego Montaña – MAX VIERNES (ESCOMBROS)**
2. **De acuerdo a lo acordado ayer en tejares qué el colegio hará la adecuaciones de la cafetería para instalar las 2 tomacorrientes restantes, hasta cuando se le dará plazo a la IED para hacer estas actividades – 10 JULIO**
3. **De acuerdo a la asignación de la emergencia de estrella D entregar presupuesto y programación – SABADO 30**
4. **Ajustar balances (Tejares, Ofelia, Diego Montaña, compartir) fecha de entrega - BALANCES ACTUALIZADOS PARA EL PROXIMO INFORME SEMANAL**
5. **Recordar que la entrega de Ofelia Uribe de Acosta es el día de mañana 10 am**
6. **Recordar que la emergencia de brisas se hará en el periodo de vacaciones**
7. **Entrega de espacios sin afectaciones en brisas el día de mañana**
8. **Entrega actas de vecindad en físico – TRANSCURSO DE LA SEMANA**

ENTREGAS MANUAL DE MANTENIMIENTO Y MATRIZ

Lote 4 - Consorcio Arsaf			
COLEGIO	**OFICIOS**	**MATRIZ**	**MANUAL**
Brisas del Diamante			
Diego Montaña			
Estrella del Sur Sede C	Firma de Recibido	No	X
Estrella del Sur Sede D			
Fanny Mickey	Firma de Recibido	No	X
Los Tejares	Firma de Recibido	X	X

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.28

LUGAR DE LA REUNIÓN:	https://meet.google.com/qqv-aovw-kir	**FECHA:**	01	06	2026	**HORA INICIO:**	2:30 PM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	El Realizar seguimiento del contrato de obra CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025 – Lote 4						
PRESIDE:	INTERVENTORIA	**PRESIDE:**			INTERVENTORIA		
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMINETO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA
Santiago Ángel Uribe	DCCEE	Apoyo a la Supervisión	
Héctor Villazón	Consorcio Serinco Educativo	Director de interventoría	
Cesar Carvajal	Consorcio Serinco Educativo	Residente de interventoría	
Nicolas Hernández	Consorcio Serinco Educativo	Auxiliar de coordinación	
Deiby Yecid Arias	Consorcio Adecuaciones Arsaf	Director de obra	
Diego Pinzón Espitia	Consorcio Adecuaciones Arsaf	Residente de obra	

ORDEN DEL DIA	
1	Avance en Frentes de Obra

DESARROLLO

Durante la reunión se recordó la necesidad de realizar el cierre y ajuste de los balances financieros de cada frente de obra, verificando que los recursos asignados correspondan a los valores efectivamente ejecutados. Se indicó que, en caso de identificarse saldos disponibles o recursos que no vayan a ser utilizados en algún frente de trabajo, los contratistas deberán informar oportunamente esta situación para adoptar las medidas correspondientes.

Asimismo, se reiteró la obligación de corregir y ajustar los informes semanales, garantizando la consistencia de la información reportada. Se enfatizó que el cierre financiero del contrato debe realizarse de acuerdo con los valores aprobados en la adición contractual y con los recursos destinados a la atención de emergencias.

De igual forma, se informó sobre la existencia de observaciones relacionadas con algunos NPS, las cuales deberán ser subsanadas de manera prioritaria y urgente.

Finalmente, se programó la visita para recibir la obra correspondiente a Brisas del Diamante, resaltando la importancia de la participación de los residentes de obra, y/o personal necesario para la entrega de este.

COMPROMISOS

#	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Remitir los balances financieros actualizados de las sedes educativas, incorporando la información	Alta	Consorcio Arsaf	Cumplimiento inmediato	

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.28

COMPROMISOS					
#	**ACTIVIDAD/Tarea**	**PRIORIDAD**	**RESPONSABLE**	**FECHA EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
	real de ejecución y los ajustes correspondientes.				
2	Presentar los informes semanales debidamente actualizados, incluyendo los balances financieros consolidados, avances de ejecución y demás soportes que reflejen el estado real del proyecto.	Alta	Interventoría	Sujeto a entrega de balances por contratistas, remisión a la mayor brevedad posible.	

Convocatoria próximo comité:	11-06-2026
Hora de finalización:	03:15 pm

ANEXO 9. PLANILLAS DE PAGO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901094289-2	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS	CL 98 70 91 OF 703	6013688490	financieraconsorciosarinco@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		70997177		7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$28,005,431	$6.910.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.050.500	0		0		0	0	0	0	1.050.500	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	560.400	0	0	0	0	0	0		560.400	2
230301	Porvenir	800224808-8	3.640.700	0	0	87.500	87.500	0	0		3.815.700	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	345.000				345.000	0	0	345.000			3.450	345.000	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	929.000	0	0	929.000	5
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	140.200	0	0	140.200	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	1.120.600	1.120.600
Pensión	2	4.376.100	4.376.100
Riesgos Laborales	1	345.000	345.000
CCF	2	1.069.200	1.069.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	6.910.900	6.910.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901094289-2	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS		CL 98 70 91 OF 703	6013688490	financieraconsorciosarinco@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		70997177		7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$28,005,431	$6.910.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000688837	CAÑON GUERRERO KAREN NATALIA	1	0			S																	230301	466.908	8	74.800	0	0	0	0	EPS005	466.908	8	18.700	14-11	466.908	8	1	2.500	CCF24	466.908	8	18.700	0	0	0	0	0
2	CC 1000688837	CAÑON GUERRERO KAREN NATALIA	1	0			S											X						230301	1.283.997	22	205.500	0	0	0	0	EPS005	1.283.997	22	51.400	14-11	1.283.997	22	1	0	CCF24	1.283.997	22	0	0	0	0	0	0
3	CC 1018489482	CEBALLOS GARCIA JULIETH STEFANIA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1082861645	RAMIREZ CURIEUX REBECA PATRICIA	1	0			S																	230301	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS005	1.459.088	25	58.400	14-11	1.459.088	25	5	101.600	CCF33	1.459.088	25	58.400	0	0	0	0	0
5	CC 1082861645	RAMIREZ CURIEUX REBECA PATRICIA	1	0			S												X					230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS005	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	0	CCF33	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
6	CC 36522707	CURIEUX DE CASTILLO LIDICE MERCEDES	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 79602923	CASTILLO CURIEUX ERICK JOSE	1	0			S																	230301	17.500.000	30	2.800.000	0	0	87.500	87.500	EPS005	17.500.000	30	700.000	14-11	17.500.000	30	1	91.400	CCF24	17.500.000	30	700.000	0	0	0	0	0
8	CC 84452367	CURIEUX BORJA JHAN CARLOS	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF33	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
9	CC 84456959	CURIEUX BORJA KEWING ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018462373	JOHN FREDDY CASTAÑEDA MESIAS	calle 38 b sur 50a 53	3007637384	j.casta717@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88681077	05/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018462373	JOHN FREDDY CASTAÑEDA MESIAS	calle 38 b sur 50a 53	3007637384	j.casta717@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88681077	05/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excenuado	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1018462373	CASTAÑEDA MESIAS JOHN FREDDY	57	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900208425-6	SEIING SAS	transv 52b 2-30	3115134135	seiingadmon2020@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		85158497	16/06/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$10,505,430	$2.261.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.200	0		0		0	11	1.200	0	141.400	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	280.400	0		0		0	11	2.300	0	282.700	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	11	2.300	0	282.500	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	11	2.300	0	282.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	560.400	0	0	0	0	11	4.600	0	565.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	280.600				280.600	11	2.300	282.900			2.806	282.900	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	420.600	11	3.400	424.000	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	11	0	0	0
ICBF				
0	11	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	420.600	424.100
Pensión	3	1.120.800	1.130.000
Riesgos Laborales	1	280.600	282.900
CCF	1	420.600	424.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.242.600	2.261.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900208425-6	SEIING SAS		transv 52b 2-30	3115134135	seiingadmon2020@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		85158497	16/06/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$10,505,430	$2.261.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF					PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiando	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 19307265	GUTIERREZ SEGURA HORACIO	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 24756524	GONZALEZ MEJIA MARIA LETICIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 53037176	GARZON UZETA NOHORA LEONOR	1	0			S																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 79207204	CANTOR RIVERA FREDY	1	0			S																		25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 80070003	GONZALEZ CAMARGO LUIS ALEJANDRO	1	0			S																		25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 80257171	SIERRA HERNANDEZ EDWIN FERNANDO	1	0			S																		230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901977271-0	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	TV 52 B # 2 - 30 AP 202	6015372584	aic.gerencia.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		87086286	05/06/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	Y	$0	$1.863.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	656.700	0		0		0	0	0	0	656.700	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	560.400	0	0	0	0	0	0		560.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	365.700				365.700	0	0	365.700			3.657	365.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	656.700	656.700
Pensión	2	840.600	840.600
Riesgos Laborales	1	365.700	365.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.863.000	1.863.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901977271-0	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	TV 52 B # 2 - 30 AP 202	6015372584	aic.gerencia.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		87086286	05/06/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	Y	$0	$1.863.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excenuado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1024465811	PAREDES SERRANO FABIAN ADOLFO	59	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC 1026289628	CARDENAS RODRIGUEZ CAMILO ANDRES	59	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC 1030640730	MOLANO GALLO IVAN RENE	59	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	8767031	HECTOR JOSE VILLAZON GUTIERREZ	Carrera 15a1 N diag 53b - 31	3157351268	hectorvillazon@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	SOLEDAD		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		81963760	12/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$536.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	235.000	0		0		0	1	200	0	235.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	300.800	0	0	0	0	1	300	0	301.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	235.000	235.200
Pensión	1	300.800	301.100
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	535.800	536.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	8767031	HECTOR JOSE VILLAZON GUTIERREZ	Carrera 15a1 N diag 53b - 31	3157351268	hectorvillazon@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	SOLEDAD		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		81963760	12/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$536.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excenvalo	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 8767031	VILLAZON GUTIERREZ HECTOR JOSE	3	0			N																	25-14	1.880.000	30	300.800	0	0	0	0	EPS042	1.880.000	30	235.000		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901219974-9	SEGA INGENIERIA SAS BIC	cra 57 17-36	3112319124	segaingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88902712	16/06/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$5,252,715	$1.401.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	140.300				140.300	0	0	140.300			1.403	140.300	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	210.300	0	0	210.300	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	210.300	210.300
Pensión	3	840.600	840.600
Riesgos Laborales	1	140.300	140.300
CCF	1	210.300	210.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.401.500	1.401.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901219974-9	SEGA INGENIERIA SAS BIC	cra 57 17-36	3112319124	segaingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88902712	16/06/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$5,252,715	$1.401.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COR/RECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016053198	MIRANDA CAÑON VIVIANA ALEJANDRA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 79844429	PEREZ OLMOS FRANZ ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 80793169	PARRADO ROZO GERMAN ALONSO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018462373	JOHN FREDDY CASTAÑEDA MESIAS	calle 38 b sur 50a 53	3007637384	j.casta717@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88681077	05/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018462373	JOHN FREDDY CASTAÑEDA MESIAS	calle 38 b sur 50a 53	3007637384	j.casta717@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88681077	05/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excenuado	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1018462373	CASTAÑEDA MESIAS JOHN FREDDY	57	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80229176	JUAN CARLOS CORTES CORTES	Cll 3 A Sur No 19 42 Apto 502	6015974562	ingcortesjc@yahoo.com.ar	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78068368	28/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$928.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	400.000	0		0		0	0	0	0	400.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	512.000	0	0	0	0	0	0		512.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	16.800				16.800	0	0	16.800			168	16.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	400.000	400.000
Pensión	1	512.000	512.000
Riesgos Laborales	1	16.800	16.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	928.800	928.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80229176	JUAN CARLOS CORTES CORTES	Cll 3 A Sur No 19 42 Apto 502	6015974562	ingcortesjc@yahoo.com.ar	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78068368	28/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$928.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 80229176	CORTES CORTES JUAN CARLOS	57	0			N																	231001	3.200.000	30	512.000	0	0	0	0	EPS008	3.200.000	30	400.000	14-11	3.200.000	30	1	16.800		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1072193503	CESAR ALDEMAR CARVAJAL GONZALEZ	calle 16 #5-33	0315295794	cesar_carvajal1707@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SIBATÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	14/05/2026	67559437	$620.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades						Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización											
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	121.800							121.800			76	121.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre		Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	121.800	121.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	620.900	620.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1072193503	CESAR ALDEMAR CARVAJAL GONZALEZ		calle 16 #5-33	0315295794	cesar_carvajal1707@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SIBATÉ	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	14/05/2026	67559437	$620.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1072193503	CARVAJAL GONZALEZ CESAR ALDEMAR	57	0			N																	230201	1.750.000	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.000	218.900	14-4	1.750.000	1	121.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1099209679
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANA JUDITH PARDO DUARTE
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	TRANS 65 59 21 SUR TORRES DE	TELÉFONO:	4202020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6013421455**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		266699991

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

Planilla Pagada

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016043952		BERMUDEZ ANDRADE ANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 15 #47-82	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3168254288	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05		9504529534	I	2026/06/12			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,680,000	$428,800			$2,680,000	$335,000			$2,680,000	$53,600			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,680,000	$428,800			$2,680,000	$335,000			$2,680,000	$53,600			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,680,000	$428,800			$2,680,000	$335,000			$2,680,000	$53,600			$0	$0		$0	$0
1	CC 1016043952	BERMUDEZ ANA	25-14	30	$2,680,000	$428,800	EPS005	30	$2,680,000	$335,000	CCF24	30	$2,680,000	$53,600		0	$0	$0	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,680,000	$428,800			$2,680,000	$335,000			$2,680,000	$53,600			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016043952		BERMUDEZ ANDRADE ANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 15 #47-82	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3168254288	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05		9504529534	I	2026/06/12			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$428,800	$0	$0	$428,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$428,800	$0	$0	$428,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$53,600	$0	$0	$53,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$53,600	$0	$0	$53,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$335,000	$0	$0	$335,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$335,000	$0	$0	$335,000
TOTAL				1	$817,400	$0	$0	$817,400

ANEXO 10. CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES

NIT. 901.977.271-0

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSION, ARL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 204 DE LA LEY 100 DE 1993 - ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 - ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007.

En mi condición de Revisora Fiscal de la sociedad CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO, identificada con NIT. N° 901.977.271-0, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y revisados los estados financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondientes a los Sistemas de pensiones, Riegos Profesionales, y Cajas de Compensación Familiar, la empresa se encuentra a paz y salvo y ha realizado los respectivos pagos durante los seis (6) meses anteriores a esta certificación.

Respecto a los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social en Salud, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la sociedad se encuentra exonerada de acuerdo con lo señalado taxativamente en el inciso 1 del artículo 65 de la ley 1819 de 2016, el cual adiciono el artículo 114-1 del Estatuto Tributario “Exoneración de aportes”.

Así mismo, respecto a los pagos laborales, por prestación de servicios y no laborales del personal vinculado, la empresa se encuentra a paz y salvo por todo concepto prestacional, salarial y no salarial.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes.

Se expide en Bogotá D.C. a los cinco (05) días del mes de junio del año 2026.

Atentamente,

ARQ. ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
CC. 79.602.923 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA GLADYS RINCON HURTADO
TP 126815-T
Revisora Fiscal

OFICINA PRINCIPAL
CALLE 98 No. 70-91
TELEFAX 3688490
BOGOTA, D.C.
propuestas@arincosas.com.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **46.674.785**

RINCON HURTADO

APELLIDOS

MARIA GLADYS

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-NOV-1978**

DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

13-MAR-1997 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0707900-00129117-F-0046674785-20081118 **0006**260471A 1 7300010240

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



126815-T

MARIA GLADYS
RINCON HURTADO
C.C. 46674785
RESOLUCION INSCRIPCION 142 FECHA 07/06/2007
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COL.

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 136938

FIRMA DEL TITULAR 48430

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOSOFORMAS S.A. 1086 05/2006

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F 9 2 F 9 5 8 1 1 4 0 1 6 9 2 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA GLADYS RINCON HURTADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46674785 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 126815-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ANEXO 11. ACTA DE COBRO PARCIAL DE INTERVENTORIA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DISTRITALES

ACTA PARCIAL No. 6

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **CO1.PCCNTR.8169110 - 2025**

ACTA CORRESPONDIENTE AL COBRO FIJO MENSUAL: 06 DE MARZO AL 05 DE MAYO DE 2026
FECHA DE CORTE FINAL DEL AVANCE DE OBRA: 05 DE MARZO DEL 2026

CONTRATISTA : CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 2

DIRECCION :	CALLE 98 NO. 70-91						
C.C. ó NIT :	901.977.271-0	**ESTABLECIMIENTO :**	GRUPO No.2 (ZONA SUR) CIUDAD BOLIVAR - USME	**PLAZO INICIAL :**	7 MESES
TELEFONO :	6013688490			**FECHA INICIACION :**	06 DE OCTUBRE DEL 2025
SUPERVISOR:	JORGE ALBERTO MORENO ALDANA	**LOCALIDADES :**	5 Y 19	**FECHA TERMINAC.INICIAL :**	05 DE MAYO DEL 2026
DIRECCION :	Av. El dorado No. 66 -63	**VR. INICIAL :**	$ 796.184.131,00	**PLAZO ADICIONAL :**	1,5 MESES
C.C. ó NIT :	79,258,415	**VR. ADICIONAL :**	$ 128.425.720,00	**TIEMPO SUSPENDIDO :**	
TELEFONO :	3241000 EXT.3149	**VR. FINAL :**	$ 924.609.851,00	**PLAZO TOTAL :**	8,5 MESES
				FECHA TERMINACION FINAL :	20 DE JUNIO DEL 2026

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
1984	10-mar-25	5012	5-sep-25	$ 796.184.131,00	$ 484.376.746,00	$ 265.555.239,00	$ 218.821.507,00
3698	5-dic-25	7587	23-dic-25	$ 128.425.720,00	$ 128.425.720,00		$ 128.425.720,00
TOTALES				$ 924.609.851,00	$ 612.802.466,00	$ 265.555.239,00	$ 347.247.227,00

A PAGAR **$ 265.555.239,00** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES / INTERVENTORIA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	COSTO DIRECTO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
1	PAGOS FIJO MENSUAL DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO	MES	7,00	$ 38.232.131,14	$ 267.624.917,98	2,00	$ 76.464.262,28	5,00	$ 191.160.655,70	7,00	$ 267.624.917,98	100,00%
2	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.4 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato inicial de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.4	%	100,00%	$ 148.563.595,22	$ 148.563.595,22	19,42%	$ 28.855.438,96	38,59%	$ 57.330.691,40	58,01%	$ 86.186.130,36	58,01%
3	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.5 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato inicial de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.5	%	100,00%	$ 124.714.573,22	$ 124.714.573,22	14,10%	$ 17.584.237,95	25,94%	$ 32.350.960,29	40,04%	$ 49.935.198,24	40,04%
4	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.6 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato inicial de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.6	%	100,00%	$ 128.159.208,53	$ 128.159.208,53	60,12%	$ 77.047.685,75	17,21%	$ 22.056.199,79	77,33%	$ 99.103.885,54	77,33%
	COSTO DIRECTO				**$ 669.062.294,95**		**$ 199.951.624,94**		**$ 302.898.507,18**		**$ 502.850.132,12**	**75,16%**

MODIFICACION No.1 / INTERVENTORIA ADICIONAL EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	COSTO DIRECTO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
1	PAGOS FIJO MENSUAL DURANTE EL PLAZO DE MODIFICACION DEL CONTRATO	MES	1,50	$ 28.778.872,83	$ 43.168.309,25							
2	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.4 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato adicionado de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.4	%	100,00%	$ 17.447.172,59	$ 17.447.172,59	19,42%	$ 3.388.756,33	38,59%	$ 6.732.863,90	58,01%	$ 10.121.620,23	58,01%
3	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.5 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato adicionado de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.5	%	100,00%	$ 18.740.152,58	$ 18.740.152,58	14,10%	$ 2.642.283,85	25,94%	$ 4.861.195,58	40,04%	$ 7.503.479,42	40,04%
4	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.6 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato adicionado de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.6	%	100,00%	$ 28.565.138,69	$ 28.565.138,69	60,12%	$ 17.172.997,98	17,21%	$ 4.916.060,37	77,33%	$ 22.089.058,35	77,33%
	COSTO DIRECTO ADICION				**$ 107.920.773,11**		**$ 23.204.038,16**		**$ 16.510.119,85**		**$ 39.714.158,00**	**36,8%**

RESUMEN EJECUTIVO

			PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 776.983.068,06**	**$ 223.155.663,10**	**$ 319.408.627,03**	**$ 542.564.290,13**	**69,83%**
IVA SOBRE COSTO DIRECTO	**19%**	**$ 147.626.782,94**	**$ 42.399.575,99**	**$ 60.687.639,15**	**$103.087.215,14**	**69,83%**
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		**$ 924.609.851,00**	**$ 265.555.239,09**	**$ 380.096.266,18**	**$645.651.505,27**	**69,83%**
AJUSTE AL PESO SEGÚN			**-$ 0,09**	**-$ 0,18**	**-$ 0,27**	
VALOR A PAGAR EN ACTA			**$ 265.555.239,00**	**$ 380.096.266,00**	**$ 645.651.505,00**	
DESCUENTO POR ANS PARA EL ACTA (Luego de lo acordado entre las partes el descuento es de)		**$ -**				
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION		**278.958.346,00**	**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**	

CONTRATISTA — **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**
Nit/ C.C **901.977.271-0**
REP. LEGAL — **ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX**
C.C. **79.602.923**

APOYO A LA SUPERVISION — **SANTIAGO ANGEL URBIBE**
Nit/CC. **79.598.873**

SUPERVISOR — **JORGE ALBERTO MORENO ALDANA**
Nit/ C.C **79.464.477**

ANEXO 12. REGISTRO DE CAPACITACIONES

SAFRID	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Codigo	SAF-FOR-074
		Fecha	Mar/24
		Version	Version 1.0

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

Contrato N°: CO1.PCCNTR.8155135 Objeto del contrato: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	Ciudad: Bogotá D.C. Ubicación donde se realiza el trabajo: (frente de obra) montale en cubierta del colegio compartir el rincon
Fecha de Inicio 04/05/26	Fecha de final: 09/05/26
Descripción de la tarea a realizar montale de estructura metalica en cubierta, techado teja sintex.	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	

NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADORES	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO		CARGO	FIRMA						
				LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Yulbert Ingate	PPT	6195800	Oficial	Yulbert	Yulbert	Yulbert	Yulbert	Yulbert	Yulbert	
[illegible]	PPT	5841696	Oficial	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Jesus Gonzalez	PPT	6636944	Oficial	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Antonio [illegible]	PPT	C.I. 93[illegible]08	Ayudante	Antonio	Antonio	Antonio	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
JUAN C	PPT	1928665	OFICIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
Manuales	X	*Martillo, metro, cegueta, llana metalica, rodillo, valdes, espatula, brochas, lija*
Electricas	X	*Extensiones*
Hidráulicas		NA
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Que se va a ejecutar en el lugar de trabajo?	4 metros
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Trabajos a nivel
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	No aplica
¿Se han realizados cálculos de la distancia de caída?	No aplica
¿Cuales son los sistemas de protección y protección requeridos?	NA
¿Cuales son los elementos de protección requeridos?	Casco con barbiquejo, gafas de protección, tapaoidos, guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, camisa manga larga
¿Cuantos trabajadores se requieren?	4
¿Que materiales y recursos se utilizaran?	Pintura esmalte, anchaje, madera, tornillos, agua, cemento, pegador
¿Existen toxias o gases dentro del area de trabajo?	NA
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del area de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Electricidad, superficies poco resistentes chispas, objetos filosos, condiciones climaticas

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Alistamiento de herramientas , materiales y equipo	Caidas caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones , muerte.	Orden y aseo, almacenar adecuadamente las herramientas y equipos de alturas, evitar bromas durante estas actividades, uso de elementos de proteccion personal. Identificar que herraminta necesita y que no , no lleve cosas que no necesite. Inspecione los equipos de alturas que va a utilizar verifique etiquetas , estado de correas , partes metalicas , ajuste correcto de los ganchos.
Dirigirse a el area de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Dirijase a el área de trabajo de forma ordenada , evite realizar bromas , durante el recorrido no pierda de vista sus herramientas y sus equipos si debe desplazarse por fuera de la plaza, lleve siempre ubicado su casco de seguridad como debe ser, evite retirarlo por cualquier motivo, acceda a el lugar de trabajo por el lugar autorizado.

Acceder al área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo, caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, muerte.	Firme su ATS ,inspeccione los equipos y herramientas que va a utilizar.
Verificacion de área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Una vez alla llegado al area de trabajo verifique si el area es segura para iniciar labores.
Inicio de labores	Caidas a nivel, golpes, sofreesfuerzos, cortaduras	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Personal con experiencia, acompañamiento permanente, condiciones de salud optimas.
Terminación de tarea	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Una vez terminada la tarea del dia ,garantice que no queden objetos herramientas o materiales que puedan obsruir el paso y generar incidentes, deje sus área de trabajo en perfecto estado de orden y aseo.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☒ No, continue con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y apellido Residente Obra	Cedula	Firma
Antonio Zarn	6145422	Antonio
Miguel Guzman	1066340379	
Nombre y Apellido Maestro de Obra y/o Encargado de Cuadrilla	**Cedula**	**Firma**
Yulbert Dugarte	6195800	Yulbert
Nombre y Apellido Residente SST	**Cedula**	**Firma**
Jaiberth Gamboa	1092334405	

Elaboró	Revisó	Aprobó
Ing. Yuma Blanco	Ing. Miguel Cerón M.	Ing. Miguel Cerón M.

SAFRID	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Codigo	SAF-FT-GI-074
		Fecha	Mar/24
		Version	Version 1.0

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

Contrato N°. CO1.PCCNTR.8155135	Ciudad: Bogota D.C.
Objeto del contrato: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"	Ubicación donde se realiza el trabajo: (frente de obra) Colegio Compartir - Cubierta.
Fecha de Inicio 11/03/26	Fecha de final 16/03/26
Descripción de la tarea a realizar: Montaje Estructura metalica, tejas.	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	

NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADORES	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
JUAN CAMILO RINCON PPT	1428665	OFICIAL							
Jesus Gonzalez	PPT. 6636447	Oficial							
Yulbert Delgado	PPT. 6195800	Oficial							

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
Manuales	X	*Martillo, metro, cegueta, llana metalica, rodillo, valdes, espatula, brochas, lija*
Electricas	X	*Extensiones*
Hidraulicas		NA
Otras		

¿Que tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	4 metros aproximado
¿Cual es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Trabajos a nivel
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	No aplica
¿Se han realizado los calculos de resistencia de anclaje?	No aplica
¿Cuales son los sistemas de prevención y protección requeridos?	NA
¿Cuales son los elementos de protección requeridos?	Casco con barbuquejo, gafas de protección, tapaoidos, guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, camisa manga larga.
¿Cuantos trabajadores se requieren?	4
¿Que materiales y recursos van a ingresar?	Pintura, esmalte, enchape, madera, cerraduras, aguja, cemento, pegacor
¿Existen riesgos o peligros dentro del area de trabajo?	NA
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del area de trabajo?	SI
¿Que otros peligros hay en el lugar de trabajo? (choque, electrocutar, quimicos, superficie resbalosa, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Electrocutar, superficies poco resistentes choques, objetos filosos condiciones climaticas.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Alistamiento de herramientas , materiales y equipos	Caidas caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones , muerte.	Orden y aseo, almacenar adecuadamente las herramientas y equipos de alturas, evitar bromas durante estas actividades, uso de elementos de proteccion personal. identificar que herramienta necesita y que no , no lleve cosas que no necesite, Inspecione los equipos de alturas que va a utilizar verifique etiquetas , estado de correas , partes metalicas , ajuste correcto de los ganchos.
Dirigirse a el área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Dirijase a el área de trabajo de forma ordenada , évite realizar bromas , durante el recorrido no pierda de vista sus herramientas y sus equipos si debe desplazarse por fuera de la plaza, lleve siempre ubicado su casco de seguridad como debe ser, evite retirarlo por cualquier motivo, acceda a el lugar de trabajo por el lugar autorizado.

Acceder al área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo, caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, muerte.	Firme su ATS ,inspeccione los equipos y herramientas que va a utilizar.
Verificacion de área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Una vez alla llegado al area de trabajo verifique si el area es segura para iniciar labores.
Inicio de labores	Caidas a nivel, golpes, sofreesfuerzos. cortaduras	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Personal con experiencia, acompañamiento permanente, condiciones de salud optimas.
Terminación de tarea	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Una vez terminada la tarea del dia ,garantice que no queden objetos herramientas o materiales que puedan obsruir el paso y generar incidentes, deje sus área de trabajo en perfecto estado de orden y aseo.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y apellido Residente Obra	Cedula	Firma
Miguel Guzman	1066549379	
Nombre y Apellido Maestro de Obra y/o Encargado de Cuadrilla	**Cedula**	**Firma**
Gulbert Ospina	6195800	
Nombre y Apellido Residente SST	**Cedula**	**Firma**
Josbedy Gonzalez	1012339950	

Elaboró	Revisó	Aprobó
Ing. Yanna Blanco	Ing. Miguel Cerón M.	Ing. Miguel Cerón M.

SAFRID	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Codigo	SST-FOR-074
		Fecha	Mar/24
		Version	Version 1.0

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

Contrato N°. CO1.PCCNTR.8155135

Objeto del contrato: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO.

Ciudad: Bogotá D.C.

Ubicación donde se realiza el trabajo (frente de obra): Colegio Compartir - Salon tercer piso Cubierta.

Fecha de Inicio: 19/05/25

Fecha de final: 24/05/25

Descripción de la tarea a realizar: Pintura en estructura Metalica.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	

NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADORES	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Jesus Gonzalez	PPT 6536447	Oficial							
JUAN CARLOS VALDES	PPT 1128665	OFICIAL							

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
Manuales	X	*Martillo, metro, cegueta, llana metalica, rodillo, valdes, espatula, brochas, lija*
Electricos		*Extensiones*
Hidraulicos	X	NA
Otros		

ANALISIS DE LA TAREA	
Que hay alli, se encuentra en Lugar de Trabajo?	4 metros
Cual es el sistema de acceso al Lugar de Trabajo?	Trabajos a nivel
Se han establecido los puntos de anclaje?	No aplica
Se han realizado los calculos de la distancia de caida?	No aplica
Cuales son los elementos de prevencion y protección requeridos?	NA
Cuales son los elementos de protección requeridos?	Casco con barbuquejo, gafas de proteccion, tapaoidos, guantes, botas de seguridad ropa de trabajo, camisa manga larga
Cuantos trabajadores se requieren?	4
Que materiales y recursos van a utilizarse?	Pintura, esmalte, anchape, madera, barandas, agua, cemento, pegacor
Existen riesgos o grietas cerca del area de trabajo?	NA
Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor de area de trabajo?	SI
Que otros peligros hay en el Lugar de Trabajo? (riesgos electricidad, químicos, superficie resbaladiza superficies calientes, objetos filosos, caidas posibles, etc.)	Electricidad, superficies poco resistentes, chapas, objetos filosos, condiciones climaticas

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Alistamiento de herramientas, materiales y equipos	Caidas, caidas a mismo nivel, golpes, cortes, sobreesfuerzo.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones, muerte.	Orden y aseo, almacenar adecuadamente las herramientas y equipos de alturas, evitar bromas durante estas actividades, uso de elementos de proteccion personal. Identificar que herraminta necesita y que no, no lleve cosas que no necesite. Inspecione los equipos de alturas que va a utilizar verifique etiquetas, estado de correas, partes metalicas, ajuste correcto de los ganchos.
Dirigirse a el area de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes, cortes, sobreesfuerzo.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones, caida de objetos, robos, muerte.	Dirijase a el área de trabajo de forma ordenada, evite realizar bromas, durante el recorrido no pierda de vista sus herramientas y sus equipos si debe desplazarse por fuera de la plaza, lleve siempre ubicado su casco de seguridad como debe ser, evite retirarlo por cualquier motivo, acceda a el lugar de trabajo por el lugar autorizado.

Acceder al área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo, caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, muerte.	Firme su ATS ,inspeccione los equipos y herramientas que va a utilizar.
Verificacion de área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos. robos, muerte.	Una vez alla llegado al area de trabajo verifique si el area es segura para iniciar labores.
Inicio de labores	Caidas a nivel, golpes, sofreesfuerzos, cortaduras	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos. robos, muerte.	Personal con experiencia, acompañamiento permanente, condiciones de salud optimas.
Terminación de tarea	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos. robos, muerte.	Una vez terminada la tarea del dia ,garantice que no queden objetos herramientas o materiales que puedan obsruir el paso y generar incidentes, deje sus área de trabajo en perfecto estado de orden y aseo.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☐ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y apellido Residente Obra	Cedula	Firma
Miguel Guzman	1066340579	
Nombre y Apellido Maestro de Obra y/o Encargado de Cuadrilla	**Cedula**	**Firma**
Jesus Gonzalez	6636447	
Nombre y Apellido Residente SST	**Cedula**	**Firma**
Jasbeidy Gonzalez	1123394910	

Elaboró	Revisó	Aprobó
Ing. Yinina Blanco	Ing. Miguel Cerón M.	Ing. Miguel Cerón M.

SAFRID ingeniería sas

FORMATO PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO:	FOR-SAF-SST-002
VERSIÓN:	1.0
FECHA:	2024

1. FECHA DE ELABORACION DE PERMISO: 04/05/26
2. LUGAR ESPECIFICO DE LA ACTIVIDAD: Colegio Compartir Piso 3 Cubierta.
3. ALTURA APROX. DE LA ACTIVIDAD: 4 metros
4. FECHA DE INICIO: 04/05/26 — FECHA FINAL: 09/05/26
5. HORA DE INICIO: 07:00 A.m — HORA FINAL: 4:00 p.m.

6. TIPO DE TRABAJO A REALIZAR

Describa la actividad que se va a realizar

Montaje de estructura y tela en Cubierta Piso 3

7. TIPO DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Describa las herramientas que se van a utilizar

Taladro, Alicates herramienta menor equipo soldadura,

8. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR

Describa los elementos de protección personal que se van a utilizar

Casco, Guantes tapa bocas, Gafas, Arnes eslinga, botas

9. DATOS Y REQUISITOS DEL TRABAJADOR QUE EJECUTARA EL TRABAJO

#	NOMBRE	CEDULA	FECHA CURSO ALTURAS	FECHA SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	FECHA DE EXAMEN MEDICO (apto para trabajo en alturas)	FIRMA TRABAJADOR
1	Yulbert Duarte	619580	15-03-26	17-04-26	22-11-25	Yulbert
2	Jesús Gonzalez	663644	15-03-25	17-04-26	24-02-26	
3	JUAN C Bermudez	1428669	15-01-26	14/04-26	14/04/26	
4	Antonio [illegible]	C1951	15-03-25	17-04-26	13-02-26	Antonio
5						
6						
7						
8						

Al firmar este documento, el trabajador manifiesta que para realizar la labor en alturas anteriormente nombrada tiene la capacidad fisica y mental para la tarea y su estado de salud es bueno, adicional que se revisaron las certificaciones correspondientes para alturas y examen medico.

10.MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Equipos de Protección Contra Caídas a Utilizar (Marca con una x)

Arnés cuerpo completo	Si ☑	No ☐	Línea de vida vertical portátil	Si ☐	No ☒	Punto de anclaje fijo	Si ☒	No ☐	Mosquetón	Si ☐	No ☒
línea de vida vertical	Si ☐	No ☑	Eslinga en y con adsorbedor	Si ☒	No ☐	Punto de anclaje portátil (tie off)	Si ☐	No ☒	Freno Arrestador	Si ☐	No ☒
línea de vida horizontal	Si ☒	No ☐	Eslinga de posicionamiento	Si ☒	No ☐	Silla de suspensión	Si ☐	No ☒	Descendedor	Si ☐	No ☒

11.MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCIÓN

Medidas a adoptar (Marca con una x)

Delimitación del área	Si ☐	No ☒	Ayudante de seguridad	Si ☑	No ☐	Barandas	Si ☐	No ☒	PermisoT.A	☐	Si ☒ No ☐

Señalización del area	Si ☒ No ☐	Manejo de desnivales y orificios (huecos):	Si ☐ No ☒	Control de acceso	Si ☐ No ☒	Otro_ ¿Cuál?	

12 SISTEMAS DE ACESSO

Sistema de acceso a utilizar (Marca con una x)

Andamio colgante	Si ☐ No ☒	Andamio tubular	Si ☒ No ☐	Escaleras fijas	Si ☐ No ☒	Escaleras portatiles	Si ☐ No ☒

13. REQUERIMIENTOS GENERALES - LISTA DE CHEQUEO DIARIA

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENTE (C)CUMPLE, (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se realizó el analisis de trabajo seguro (ATS) y socialización antes de iniciar la labor	C	C	C	C	C	C	
Se realizo charla pero-peracionalantes de iniciar la labor	C	C	C	C	C	C	
Los trabajadores están aptos para desarrollar la labor (estado de salud y con conceplo medico vigente)	C	C	C	C	C	C	
los trabajadores están certificados en alturas (curso avanzado y/o re-entrenamiento vigente)	C	C	C	C	C	C	
Se han verificado los sistemas de anclaje	C	C	C	C	C	C	
Caidas de diferente nivel	C	C	C	C	C	C	
Caida al mismo nivel	C	C	C	C	C	C	
El area de trabajo esta libre de obstáculos	C	C	C	C	C	C	
Cambio brusco de temperatura	C	C	C	C	C	C	
Contacto con corriente electrica	C	C	C	C	C	C	
Contacto con partes en movimiento	C	C	C	C	C	C	
Agentes infecciosos	C	C	C	C	C	C	
Presencia de gases y vapores	C	C	C	C	C	C	
Movimientos repetitivos	C	C	C	C	C	C	
Adopcion de posturas inadecuadas	C	C	C	C	C	C	
Caida de objetos	C	C	C	C	C	C	
Manipulacion de elementos cortates	C	C	C	C	C	C	
Proyeccion de particulas	C	C	C	C	C	C	
Manejo de herramientas manuales	C	C	C	C	C	C	
Exposicion a ruido	C	C	C	C	C	C	
Condicion de orden y aseo	C	C	C	C	C	C	
Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo (cinta, conos, señales de tal manera que se pueda aislar o restringir la zona y no se permita el paso de personas ajenos a la labor?	C	C	C	C	C	C	

Agentes infecciosos							
Presencia de gases y vapores							
Movimientos repetitivos							
Adopcion de posturas inadecuadas							
Caida de objetos							
Manipulacion de elementos cortantes							
Proyeccion de particulas							
Manejo de herramientas manuales							
Exposicion a ruido							
Condicion de orden y aseo							
Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo (cinta, conos, señales de tal manera que se pueda aislar o restringir la zona y no se permita el paso de personas ajenos a la labor?							

VERIFICACION DE SISTEMAS DE ACCESO

ANDAMIOS

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENTE (C)CUMPLE (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Los cuerpos del andamio se encuentran asegurados y cuenta con todas sus piezas (verticales, horizontes, diagonales,							
Cuenta con area firme para su correcto armado y nivelacion?							
Cuenta contodas sus plataformas y estas estan apoyadas firmemente ?							
La superficie de trabajo se encuentra cubierta por plataformas, libre de huecos?							
Cuenta con escaleras y estas se encuentran aseguradas adecuadamente al andamio?							
El andamio presenta alguna tipo de oxidación o desgaste?							
El andamio esta aislado de lineas o equipos energizados?							
El andamio cuenta con ficha de autorización?							

ESCALERAS

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENTE (C)CUMPLE (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Las escaleras están en adecuadas condiciones?							
Las bases están apoyadas sobre una superficie plana?							
Esta libre de grasa, aceite u otras sustancias?							
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes?							
El área alrededor de la escalera se encuentra señalizada?							

VERIFICACIÓN EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

ARNES DE CUERPO COMPLETO

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENTE (C)CUMPLE (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
El arnes cuenta con la ficha de identificacion del fabricante?							
El arnes cuenta con la ficha de fabricacion y inspeccion?							
Las correas del equipo son ajustables?							
El arnes cuenta con la ficha donde esta la fecha de fabricacion y inspeccion?							
El equipo tiene los puntos de conexión necesarios y estan en buen estado, Argollas, hebillas.							
Las eslingas se encuntran sin manchas de pintura, grasa, oxido, quemaduras y/o perforaciones?							
El absorvedor de choque de la eslinga se encuntra sin manchas de pintura, grasa, quemadura y/o perforaciones?							
El tie off se encuntra sin manchas de pintura, grasa, oxido, quemaduras y/o perforaciones?							
La linea de vida cuenta con su ficha en donde se observa la fecha de fabricacion y fabricante?							
La linea de vida se encuentra libre de pintura, grasa, oxido, quemaduras, deshilachamiento y/o perforaciones?							

ESLINGAS DE CARGA

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENTE (C)CUMPLE (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Cuenta con sus etiquetas legibles y se puede ver la fecha de fabricacion?							
las fibras y costuras están libres de desgaste, deshilachamiento y cortes?							
Las eslingas estan protegidas contra cualquier elemento que genere abracion?							

ESLINGAS DE CARGA

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Cuenta con sus etiquetas legibles y se puede ver la fecha de fabricacion?	NA	NA	NA	NA	NA		
las fibras y costuras están libres de desgaste, deshilachamiento y cortes?	NA	NA	NA	NA	NA		
Las eslingas estan protegidas contra cualquier elemento que genere abracion?	NA.	NA	NA	NA	NA		

LINEAS DE VIDAS

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Cuenta con sus etiquetas legibles y se puede ver la fecha de fabricacion?	C	C	C	C	C		
las fibras y costuras están libres de oxido, pintura, grasa, deshilachamiento y cortes?	C	C	C	C	C		
Funcionamiento de cierre y apertura de los ganchos metálicos es correcto?	C	C	C	C	C		

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Casco con barbuquejo	C	C	C	C	C		
Guantes de seguridad	C	C	C	C	C		
Gafas de seguridad	C	C	C	C	C		
Tapaoidos	C	C	C	C	C		
Careta de esmeriar	NA	NA	NA	NA	NA		
Careta de soldador	C	C	C	C	C		
Ropa de trabajo	C	C	C	C	C		
Arnes	C	C	C	C	C		
Eslinga	C	C	C	C	C		
Tie off	NA	NA	NA	NA	NA		

OBSERVACIONES: Toda actividad que se realice debe estar aprobada por ex-SST antes de Firmar los documentos de no conocer dicha labor NO se responsabilizara por accidentes ocurridos, el personal debe contar con los EPCCC y USO EPP apropiado para actividad los EQUIPOS deben estar actos para su uso

APROBACION DEL PERMISO

ENCARGADOS	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Inspector SST	Jasbleidy G	1073334980	
Residente de obra	Miguel	1066349379	
Maestro o encargado de la actividad	Gilbert	6195800	
coordinador (TA) de obra	Jasbleidy G	1073334980	

CIERRE DE PERMISO

ENCARGADOS	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Inspector SST	Jasbleidy G	1073334980	
Residente de obra	Miguel Guzman	1066349379	
Maestro o encargado de la actividad	Gilbert	6195800	
coordinador (TA) de obra	Jasbleidy G	1073334980	

TENGA EN CUENTA : SI REQUIERE CAMBIAR DE ACTIVIDAD O LOS EQUIPOS CON LOS CUALES ESTA LABORANDO, INFORME AL ÁREA SST PARA UNA NUEVA INSPECCION.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado Por:
Yinna Blanco Arenas	Miguel Cerón	Miguel Cerón
Responsable SG-SST	Empleador	Empleador

SAFRID	FORMATO PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO:	FOR-SAF-SST-002
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	2024

1. FECHA DE ELABORACION DE PERMISO: 11 mayo 2026
2. LUGAR ESPECIFICO DE LA ACTIVIDAD: Colegio Compartir el rincon de teiado.
3. ALTURA APROX. DE LA ACTIVIDAD: 4 metros aproximados
4. FECHA DE INICIO: 11/05/26 — FECHA FINAL: 16/05/26
5. HORA DE INICIO: 07:00 — HORA FINAL: 04:00

6. TIPO DE TRABAJO A REALIZAR

Describa la actividad que se va a realizar:

Montaje de estructura metalica, teiado - reforno (olte estructura.

7. TIPO DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Describa las herramientas que se van a utilizar:

Pulidoras, equipo soldadura, herramientas manuales

8. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR

Describa los elementos de protección personal que se van a utilizar:

Cascos, guantes, Gafas, arnes eslinga botas,

9. DATOS Y REQUISITOS DEL TRABAJADOR QUE EJECUTARA EL TRABAJO

#	NOMBRE	CEDULA	FECHA CURSO ALTURAS	FECHA SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	FECHA DE EXAMEN MEDICO (apto para trabajo en alturas)	FIRMA TRABAJADOR
1	JULIO CESAR BERMUDEZ	1428665	15-04-26	14-04-26	14/04/26	
2	Jesús Gonzalez	6636449	15/03/26	17/04/26	29/04/26	
3	Yulbert Duarte	6195800	15/03/26	7/04/26	111	
4						
5						
6						
7						
8						

Al firmar este documento, el trabajador manifiesta que para realizar la labor en alturas anteriormente nombrada tiene la capacidad fisica y mental para la tarea y su estado de salud es bueno, adicional que se revisaron las certificaciones correspondientes para alturas y examen medico.

10. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Equipos de Protección Contra Caídas a Utilizar (Marca con una x)

Arnés cuerpo completo	Si ☒	No ☐	Linea de vida vertical portátil	Si ☐	No ☒	Punto de anclaje fijo	Si ☐	No ☒	Mosquetón	Si ☐	No ☒
linea de vida vertical	Si ☒	No ☐	Eslinga en y con adsorbedor	Si ☒	No ☐	Punto de anclaje portátil (tie off)	Si ☐	No ☒	Freno Arrestador	Si ☐	No ☒
linea de vida horizontal	Si ☐	No ☐	Eslinga de posicionamiento	Si ☐	No ☐	Silla de suspensión	Si ☐	No ☒	Descendedor	Si ☐	No ☒

11. MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCIÓN

Medidas a adoptar (Marca con una x)

Delimitación del área	Si ☒	No ☐	Ayudante de seguridad	Si ☒	No ☐	Barandas	Si ☐	No ☒	PermisoT.A	Si ☒	No ☐

Señalización del area	Si ☑ No ☐	Manejo de desniveles y orificios (huecos):	Si ☐ No ☑	Control de acceso	Si ☑ No ☐	Otro_ ¿Cual?			

12.SISTEMAS DE ACESSO

Sistema de acceso a utilizar (Marca con una x)

Andamio colgante	Si ☐ No ☑	Andamio tubular	Si ☒ No ☐	Escaleras fijas	Si ☐ No ☒	Escaleras portatiles	Si ☒ No ☐		

13. REQUERIMIENTOS GENERALES - LISTA DE CHEQUEO DIARIA

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se realizó el análisis de trabajo seguro (ATS) y socialización antes de iniciar la labor	C	C	C	C	C		
Se realizó charla pero-peracionalantes de iniciar la labor	C	C	C		C		
Los trabajadores están aptos para desarrollar la labor (estado de salud y con concepto medico vigente)	C	C	C		C		
los trabajadores están certificados en alturas (curso avanzado y/o re-entrenamiento vigente)	C	C	C		C		
Se han verificado los sistemas de anclaje	C	C	C		C		
Caidas de diferente nivel	C	C	C		C		
Caida al mismo nivel	C	C	C		C		
El area de trabajo esta libre de obstáculos	C	C	C		C		
Cambio brusco de temperatura	C	C	C		C		
Contacto con corriente electrica	C	C	C		C		
Contacto con partes en movimiento	C	C	C		C		
Agentes infecciosos	C	C	C		C		
Presencia de gases y vapores	C	C	C		C		
Movimientos repetitivos	C	C	C		C		
Adopcion de posturas inadecuadas	C	C	C		C		
Caida de objetos	C	C	C		C		
Manipulacion de elementos cortates	C	C	C		C		
Proyeccion de particulas	C	C	C		C		
Manejo de herramientas manuales	C	C	C		C		
Exposicion a ruido	C	C	C		C		
Condicion de orden y aseo	C	C	C		C		
Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo (cinta, conos, señales de tal manera que se pueda aislar o restringir la zona y no se permita el paso de personas ajenos a la labor?	C	C	C		C		

VERIFICACION DE SISTEMAS DE ACCESO

ANDAMIOS

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Los cuerpos del andamio se encuentran asegurados y cuenta con todas sus piezas (verticales, horizontes, diagonales, pines, llantas o husillo nivelador ?	C	C	NA		C		
Cuenta con area firme para su correcto armado y nivelacion?	C	C	NA		C		
Cuenta contodas sus plataformas y estás estan apoyadas firmemente ?	C	C	NA		C		
La superficie de trabajo se encuentra cubierta por plataformas, libre de huecos?	C	C	NA		C		
Cuenta con escaleras y estas se encuentran aseguradas adecuadamente al andamio?	C	C	NA		C		
El andamio presenta alguna tipo de oxidación o desgaste?	C	C	NA		C		
El andamio esta aislado de lineas o equipos energizados?	C	C	NA		C		
El andamio cuenta con ficha de autorización?	C	C	NA		C		

ESCALERAS

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Las escaleras están en adecuadas condiciones?	C	NA	C		NA		
Las bases están apoyadas sobre una superficie plana?	C	NA	C		NA		
Esta libre de grasa, aceite u otras sustancias?	C	NA	C		NA		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes?	C	NA	C		NA		
El área alrededor de la escalera se encuentra señalizada?	C	NA	C		NA		

VERIFICACIÓN EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

ARNES DE CUERPO COMPLETO

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
El arnes cuenta con la ficha de identificacion del fabticante?	C	C	C		C		
El arnes cuenta con la ficha de fabricacion y inspeccion?	C	C	C		C		
Las correas del equipo son ajustables?	C	C	C		C		
El arnes cuenta con la ficha donde esta la fecha de fabricacion y inspeccion?	C	C	C		C		
El equipo tiene los puntos de conexión necesarios y estan en buen estado, Argollas, hebillas.	C	C	C		C		
Las eslingas se encuntran sin manchas de pintura, grasa, oxido, quemaduras y/o perforaciones?	C	C	C		C		
El absorvedor de choque de la eslinga se encuntra sin manchas de pintura, grasa, quemadura y/o perforaciones?	C	C	C		C		
El tie off se encuntra sin manchas de pintura, grasa, oxido, quemaduras y/o perforaciones?	C	C	C		C		
La linea de vida cuenta con su ficha en donde se observa la fecha de fabricacion y fabricante?	C	C	C		C		
La linea de vida se encuentra libre de pintura, grasa, oxido, quemaduras, deshilachamiento y/o perforaciones?	C	C	C		C		

ESLINGAS DE CARGA

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Cuenta con sus etiquetas legibles y se puede ver la fecha de fabricacion?	NA	NA	NA	NA	NA		
las fibras y costuras están libres de desgaste, deshilachamiento y cortes?	NA	NA	NA	NA	NA		
Las eslingas estan protegidas contra cualquier elemento que genere abracion?	NA	NA	NA	NA	NA		

LINEAS DE VIDAS

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Cuenta con sus etiquetas legibles y se puede ver la fecha de fabricacion?	C	C	C		NA		
las fibras y costuras están libres de oxido, pintura, grasa, deshilachamiento y cortes?	C	C	C		NA		
Funcionamiento de cierre y apertura de los ganchos metálicos es correcto?	C	C	C		NA		

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Casco con barbuquejo	C	C	C		C		
Guantes de seguridad	C	C	C		C		
Gafas de segundad	C	C	C		C		
Tapaoidos	C	C	C		C		
Careta de esmeriar	NA	NA	NA		NA		
Careta de soldador	C	C	C		C		
Ropa de trabajo	C	C	C		C		
Arnes	C	C	C		C		
Eslinga	C	C	C		C		
Tie off	NA	NA	NA		C		

OBSERVACIONES: Toda actividad realizada en trabajos en altura debe estar aprobada y suscrita autorizada por inspector coordinador de trabajo en altura, NO se permite ni se validan trabajos en altura EPCC los arnes deben estar en perfectas condiciones para laborar trabajo en altura que no tenga permiso no tiene autorizacion.

APROBACION DEL PERMISO

ENCARGADOS	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Inspector SST	Jaobedy6	1023324	
Residente de obra	Miguel	1066349379	
Maestro o encargado de la actividad	Ruber10	1116611	
coordinador (TA) de obra	Jaobedy6	1023324	

CIERRE DE PERMISO

ENCARGADOS	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Inspector SST	Jaobedy6	1023324	
Residente de obra	Miguel	1066349379	
Maestro o encargado de la actividad	Ruber10	1116611	
coordinador (TA) de obra	Jaobedy6	1023324	

TENGA EN CUENTA : SI REQUIERE CAMBIAR DE ACTIVIDAD O LOS EQUIPOS CON LOS CUALES ESTA LABORANDO, INFORME AL ÁREA SST PARA UNA NUEVA INSPECCION.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado Por:
Yinna Blanco Arenas	Miguel Cerón	Miguel Cerón
Responsable SG-SST	Empleador	Empleador

SAFRID	SG-SST	CODIGO: SAF-FRC-025
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	VERSIÓN: 1
		FECHA: 08-2024

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: 04 05 26 — PERMISO VÁLIDO HASTA: 04 05 26

HORA DE INICIO: 07:00 — HORA DE FINALIZACIÓN: 4:000

EMPRESA EJECUTORA: OBRA Colegio Compuertas Abierta — Nº CONTRATO: CONTRATO 8155185

AREA O LUGAR: Area de estructura y soldadura — Nº PERSONAS EJECUTORAS: andale de tela

ACTIVIDAD A REALIZAR: pulidora equipo soldadura y taladro

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR:

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos — SI [X] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona, estan en buen estado?	X		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	X		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?		X	
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	X		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?	X		
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	X		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?	X		
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	X		
¿Los electrodos y cables se encuentran en buen estado?	X		
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?	X		

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	X		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura	X		
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas			X
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura	X		

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar (Registros de inspección)	X	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES		X

5 Requerimientos adicionales	SI	NO
1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura	X	
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados		X
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo?		X

6 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR, He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR, He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

SUSPENSIÓN DEL PERMISO: (Cualquier persona que supervisa la actividad evidencia incumplimiento en el procedimiento puede suspender el trabajo y debe notificar inmediatamente al encargado de SST del lugar de trabajo.

Motivos de la suspensión:

Fecha y hora de la suspensión:

Suspensión realizada por:

EJECUTORES

Item	Nombre y apellido	Cedula	Cargo	Firma
1	Yulber Duarte	6195000	Oficial	
2	Fabian Leon	5941498	Ayudante	
3	Jesus Gonzalez	6636447	oficial	
4	Antonio Jose J	6195469	Ayudante	
5	JUAN C	1128665	OFICIAL	
6				
7				

RENOVACIÓN

Tiempo de validación del permiso(fecha):

Hora: Desde-Hasta:

Autorizado por: Supervisado por:

Numero de personas que ejecutan la actividad:

OBSERVACIONES:

Sin novedad.

Solo diligenciar personal a cargo (JEFE INMEDIATO, ENCARGADO, ENCARGADO DE SST)

Item	Nombre y apellido	Cedula	Cargo	Firma
1	Jose Medina	6023646		
2				
3				
4				

TRABAJO TERMINADO

¿Finalizo el trabajo?

Si no a finalizado explique porque

El área de trabajo quedo limpia y ordenada

Fecha:

Hora:

Ing. Yirina Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Coordinador SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal

SAFRID	SG-SST	CODIGO: SAF-PRC-025
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	VERSIÓN: 1
		FECHA: 08-2024

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: 11 05 25 — PERMISO VÁLIDO HASTA: 17 05 25

HORA DE INICIO: 07:00 AM — HORA DE FINALIZACIÓN: 4:00 PM

EMPRESA EJECUTORA: GPF

ÁREA O LUGAR: Medio computin PSV 3

ACTIVIDAD A REALIZAR: Corte y pulida de estructura.

Nº CONTRATO: LP202401363

Nº PERSONAS EJECUTORAS: 2

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: pulidoras

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [X] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)

	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona, estan en bueb estado?	X		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	X		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	X		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	X		
Si el suelo es de material combustible ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?			X
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	X		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?	X		
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	X		
¿Los electrodos y cables se encuentran en buen estado?	X		
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			X

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos

	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de camaza delantal)?	X		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura			X
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas			X
El trabajador cuenta con: protección respiratoria para gases y humos de soldadura			X

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)

	SI	NO
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)		
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	X	

5 Requerimientos adicionales

	SI	NO
1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura		X
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados.		X
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo?		X

6 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutar la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

EJECUTORES

Item	Nombre y apellido	Cedula	Cargo	Firma
1	Jesus Gonzalez	66.364.497	Oficial	
2	Jaider Rojas	6195800	Ayudante	
3				
4				
5				
6				
7				

Solo diligenciar personal a cargo (JEFE INMEDIATO, ENCARGADO, ENCARGADO DE SST)

Item	Nombre y apellido	Cedula	Cargo	Firma
1	Jaider Rojas	1.023.934.480	Inspector SST	
2				
3				
4				

SUSPENSIÓN DEL PERMISO: (Cualquier persona que supervisa la actividad evidencia incumplimiento en el procedimiento puede suspender el trabajo y debe notificar inmediatamente al encargado de SST del lugar de trabajo.

Motivos de la suspensión

Fecha y hora de la suspensión

Suspensión realizada por

RENOVACIÓN

Tiempo de validación del permiso(fecha)

Hora: Desde-Hasta

Autorizado por | Supervisado por

Número de personas que ejecutan la actividad

OBSERVACIONES:

Sin novedad

TRABAJO TERMINADO

¿Finalizo el trabajo?

Si no a finalizado explique porque

El área de trabajo quedo limpia y ordenada

Fecha

Hora

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Coordinador SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal

SAFRID	INSPECCION DIARIA DE EQUIPOS DE ALTURAS	Codigo: SAF-FOR-099 Fecha:Nov 2021 Versión: 02

PROYECTO: Okato Compuitiv AREA: Obreta.

IDENTIFICACION DEL EQUIPOS SERIE Y /O MARCA: INSAFE 112

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Montale de estructura metalica y Telas INSAFE 112

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO EN SEGURO EN ALTURAS

DESDE: 01/05/26 HASTA: 07/05/26

CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A

Marque con una X segun corresponda

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
ARNES																						
TEJIDO O CORREA																						
Se evidencia la etiqueta (Informacion del Equipo)	X			X			X			X			X			X						
Fibras externas cortadas, desgastadas	X			X			X			X			X			X						
Cortes o rotura del tejido o costuras	X			X			X			X			X			X						
Fisura	X			X			X			X			X			X						
Estiramiento excesivo (elongación de la fata)	X			X			X			X			X			X						
Deterioro general	X			X			X			X			X			X						
Decoloración del material	X			X			X			X			X			X						
Presencia de moho	X			X			X			X			X			X						
COSTURAS																						
Cortaduras	X			X			X			X			X			X						
Deshilachamiento	X			X			X			X			X			X						
Hilos faltantes	X			X			X			X			X			X						
ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																						
Deformaciones (dobladuras, etc)	X			X			X			X			X			X						
Picaduras, grietas	X			X			X			X			X			X						
Presenta desgaste	X			X			X			X			X			X						
Corrosión u oxidación	X			X			X			X			X			X						

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
ACCESORIOS																						
TIE OFF (ADAPTADOR PORTATIL)																						
Se evidencia la etiqueta (Informacion del Equipo)	X			X			X			X			X			X						
Fibras externas cortadas, desgastadas	X			X			X			X			X			X						
Cortes o rotura del tejido o costuras	X			X			X			X			X			X						
Estiramiento excesivo	X			X			X			X			X			X						
Piezas faltantes	X			X			X			X			X			X						
Presencia de moho	X			X			X			X			X			X						

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
MOSQUETONES Y GANCHOS																						
Deformaciones (dobladuras, etc)			X			X			X			X			X			X				
Ajuste excesivo de mosquetones			X			X			X			X			X			X				
Grietas o picaduras			X			X			X			X			X			X				
Estado de pasadores			X			X			X			X			X			X				
Gatillo			X			X			X			X			X			X				
Deterioro general			X			X			X			X			X			X				
Corrosón			X			X			X			X			X			X				
Presencia de moho			X			X			X			X			X			X				

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
ESLINGAS																						INSAFE 36
Se evidencia la etiqueta (Informacion del Equipo)	X			X			X			X			X									
Fibras externas cortadas, desgastadas	X			X			X			X			Y									
Cortes o rotura del tejido o costuras	X			X			X			X			X			X						
Estiramiento excesivo	X			X			X			X			X			X						
Deformaciones (dobladuras, etc)	X			X			X			X			X			X						
Corrusion en partes metálicas	X			X			X			X			X			X						

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
LINEA DE VIDA																						
Deformaciones (dobladuras, etc)	X			X			X			X			X			X						
Picaduras, grietas	X			X			X			X			X			X						
Presencia desgaste	X			X			X			X			X			X						
Fibras externas cortadas, desgastadas	X			X			X			X			X			X						
Cortes o rotura del tejido o costuras	X			X			X			X			X			X						
Estiramiento excesivo	X			X			X			X			X			X						
Contacto con bordes contundentes	X			X			X			X			X			X						

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	

SAFRID

INSPECCION DIARIA DE EQUIPOS DE ALTURAS

Código: SAF-FOR-099
Fecha:Nov 2021
Versión: 02

	EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
SILLA	Se evidencia la etiqueta (Información del Equipo)			X			X			X			X			X			X				
	Fibras externas cortadas, desgastadas			X			X			X			X			X			X				
	Cortes o rotura del tejido o costuras			X			X			X			X			X			X				
	Estiramiento excesivo			X			X			X			X			X			X				
	Deformaciones (hebillas, etc)			X			X			X			X			X			X				
	Corrosión en partes metálicas			X			X			X			X			X			X				
	Contacto con bordes cortantes/filos			X			X			X			X			X			X				
ARRESTADOR DE CAIDAS	Deformaciones (dobladuras, etc)			X			X			X			X			X			X				
	Ajuste excesivo de mosquetones			X			X			X			X			X			X				
	Grietas o picaduras			X			X			X			X			X			X				
	Freno			X			X			X			X			X			X				
	Deterioro general			X			X			X			X			X			X				
	Corrosión			X			X			X			X			X			X				
	Presencia de moho			X			X			X			X			X			X				

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
JOHAN BENAVIDES	OFICIAL	

FIRMA INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
[illegible]	RSP SST	

FIRMA DEL RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CLIENTE

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA

SAFRID

INSPECCION DIARIA DE EQUIPOS DE ALTURAS

Código: SAF-FOR-099
Fecha: Nov 2021
Versión: 02

PROYECTO: Colegio Compartir AREA: Obstetra - XP 348

IDENTIFICACION DEL EQUIPOS SERIE Y /O MARCA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Montale de estructura metalica y teja

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO EN SEGURO EN ALTURAS

FECHA — DESDE: 04/05/26 HASTA: 09/05/2026

CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A

Marque con una X según corresponda

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES C	LUNES NC	LUNES N/A	MARTES C	MARTES NC	MARTES N/A	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	MIERCOLES N/A	JUEVES C	JUEVES NC	JUEVES N/A	VIERNES C	VIERNES NC	VIERNES N/A	SABADO C	SABADO NC	SABADO N/A	DOMINGO C	DOMINGO NC	DOMINGO N/A	OBSERVACIONES
ARNES																						
TEJIDO O CORREA																						
Se evidencia la etiqueta (Informacion del Equipo)	X			X			X			X			X			X						
Fibras externas cortadas, desgastadas	X			X			X			X			X			X						
Cortes o rotura del tejido o costuras	X			X			X			X			X			X						
Fisura	X			X			X			X			X			X						
Estiramiento excesivo (elongación de la nata)	X			X			X			X			X			X						
Deterioro general	X			X			X			X			X			X						
Decoloración del material	X			X			X			X			X			X						
Presencia de moho	X			X			X			X			X			X						
COSTURAS																						
Cortaduras	X			X			X			X			X			X						
Deshilachamiento	X			X			X			X			X			X						
Hilos faltantes	X			X			X			X			X			X						
ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																						
Deformaciones (dobladuras, etc)	X			X			X			X			X			X						
Picaduras, grietas	X			X			X			X			X			X						
Presenta desgaste	X			X			X			X			X			X						
Corrosión u oxidacion	X			X			X			X			X			X						

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES C	LUNES NC	LUNES N/A	MARTES C	MARTES NC	MARTES N/A	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	MIERCOLES N/A	JUEVES C	JUEVES NC	JUEVES N/A	VIERNES C	VIERNES NC	VIERNES N/A	SABADO C	SABADO NC	SABADO N/A	DOMINGO C	DOMINGO NC	DOMINGO N/A	OBSERVACIONES
ACCESORIOS																						
TIE OFF (ADAPTADOR PORTATIL)																						
Se evidencia la etiqueta (Informacion del Equipo)	X			X			X			X			X			X						
Fibras externas cortadas, desgastadas	X			X			X			X			X			X						
Cortes o rotura del tejido o costuras	X			X			X			X			X			X						
Estiramiento excesivo	X			X			X			X			X			X						
Piezas faltantes	X			X			X			X			X			X						
Presencia de moho	X			X			X			X			X			X						

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES C	LUNES NC	LUNES N/A	MARTES C	MARTES NC	MARTES N/A	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	MIERCOLES N/A	JUEVES C	JUEVES NC	JUEVES N/A	VIERNES C	VIERNES NC	VIERNES N/A	SABADO C	SABADO NC	SABADO N/A	DOMINGO C	DOMINGO NC	DOMINGO N/A	OBSERVACIONES
MOSQUETONES Y GANCHOS																						
Deformaciones (dobladuras, etc)	X			X			X			X			X			X						
Ajuste excesivo de mosquetones	X			X			X			X			X			X						
Grietas o picaduras	X			X			X			X			X			X						
Estado de pasadores	X			X			X			X			X			X						
Gatillo	X			X			X			X			X			X						
Deterioro general	X			X			X			X			X			X						
Corrosión	X			X			X			X			X			X						
Presencia de moho	X			X			X			X			X			X						

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES C	LUNES NC	LUNES N/A	MARTES C	MARTES NC	MARTES N/A	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	MIERCOLES N/A	JUEVES C	JUEVES NC	JUEVES N/A	VIERNES C	VIERNES NC	VIERNES N/A	SABADO C	SABADO NC	SABADO N/A	DOMINGO C	DOMINGO NC	DOMINGO N/A	OBSERVACIONES
ESLINGAS																						XRE-219102
Se evidencia la etiqueta (Informacion del Equipo)	X			X			X			X			X			X						
Fibras externas cortadas, desgastadas	X			X			X			X			X			X						
Cortes o rotura del tejido o costuras	X			X			X			X			X			X						
Estiramiento excesivo	X			X			X			X			X			X						
Deformaciones (dobladuras, etc)	X			X			X			X			X			X						
Corrosión en partes metálicas	X			X			X			X			X			X						

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES C	LUNES NC	LUNES N/A	MARTES C	MARTES NC	MARTES N/A	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	MIERCOLES N/A	JUEVES C	JUEVES NC	JUEVES N/A	VIERNES C	VIERNES NC	VIERNES N/A	SABADO C	SABADO NC	SABADO N/A	DOMINGO C	DOMINGO NC	DOMINGO N/A	OBSERVACIONES
LINEA DE VIDA																						
Deformaciones (dobladuras, etc)	X			X			X			X			X			X						
Picaduras, grietas	X			X			X			X			X			X						
Presenta desgaste	X			X			X			X			X			X						
Fibras externas cortadas, desgastadas	X			X			X			X			X			X						
Cortes o rotura del tejido o costuras	X			X			X			X			X			X						
Estiramiento excesivo	X			X			X			X			X			X						
Contacto con bordes contundentes	X			X			X			X			X			X						

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES C	LUNES NC	LUNES N/A	MARTES C	MARTES NC	MARTES N/A	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	MIERCOLES N/A	JUEVES C	JUEVES NC	JUEVES N/A	VIERNES C	VIERNES NC	VIERNES N/A	SABADO C	SABADO NC	SABADO N/A	DOMINGO C	DOMINGO NC	DOMINGO N/A	OBSERVACIONES

SAFRID

INSPECCION DIARIA DE EQUIPOS DE ALTURAS

Código: SAF-FOR-099
Fecha: Nov 2021
Versión: 02

	EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
SILLA	Se evidencia la etiqueta (Información del Equipo)			X			X			X			X			X			X				
	Fibras externas cortadas desgastadas			X			X			X			X			X			X				
	Cortes o rotura del tejido o costuras			X			X			X			X			X			X				
	Estiramiento excesivo			X			X			X			X			X			X				
	Deformaciones (dobladuras, etc)			X			X			X			X			X			X				
	Corrosión en partes metálicas			X			X			X			X			X			X				
	Contacto con bordes contundentes			X			X			X			X			X			X				
ARRESTADOR DE CAIDAS	Deformaciones (dobladuras, etc)			X			X			X			X			X			X				
	Ajuste excesivo de mosquetones			X			X			X			X			X			X				
	Grietas o picaduras			X			X			X			X			X			X				
	Freno			X			X			X			X			X			X				
	Deterioro general			X			X			X			X			X			X				
	Corrosión			X			X			X			X			X			X				
	Presencia de moho			X			X			X			X			X			X				

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA						
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Jesús Gonzalez	Oficial							—

FIRMA INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA						
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Jabbers	Insp. SST							—

FIRMA DEL RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CLIENTE

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA						
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
—	—							

SAFRID

INSPECCION DIARIA DE EQUIPOS DE ALTURAS

Código: SAF-FOR-099
Fecha: Nov 2021
Versión: 02

PROYECTO: Colegio Compartir. AREA: Abierta.

IDENTIFICACION DEL EQUIPOS SERIE Y /O MARCA: 493 Insafe

DESCRIPCION DEL TRABAJO: montaje de telas y estructura.

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO EN SEGURO EN ALTURAS

DESDE: 04/05/25 HASTA: 09/05/25

CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A

Marque con una X según corresponda

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
ARNES																						
TEJIDO O CORREA																						
Se evidencia la etiqueta (Informacion del Equipo)	X			X			X															
Fibras externas cortadas desgastadas	X			X			X															
Cortes o rotura del tejido o costuras	X			X			X															
Fisura	X			X			X															
Estiramiento excesivo (elongación de la fibra)	X			X			X															
Deterioro general	X			X			X															
Decoloración del material	X			X			X															
Presencia de moho	X			X			X															
COSTURAS																						
Cortaduras	X			X			X															
Deshilachamiento	X			X			X															
Hilos faltantes	X			X			X															
ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																						
Deformaciones (dobladuras, etc)	X			X			X															
Picaduras, grietas	X			X			X															
Presenta desgaste	X			X			X															
Corrosión u oxidación	X			X			X															

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
ACCESORIOS																						
TIE OFF (ADAPTADOR PORTATIL)																						
Se evidencia la etiqueta (Informacion del Equipo)	X			X			X															
Fibras externas cortadas, desgastadas	X			X			X															
Cortes o rotura del tejido o costuras	X			X			X															
Estramiento excesivo	X			X			X															
Piezas faltantes	X			X			X															
Presencia de moho	X			X			X															

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
MOSQUETONES Y GANCHOS																						
Deformaciones (dobladuras, etc)			X			X			X													
Ajuste excesivo de mosquetones			X			X			X													
Grietas o picaduras			X			X			X													
Estado de pasadores			X			X			X													
Gatillo			X			X			X													
Deterioro general			X			X			X													
Corrosión			X			X			X													
Presencia de moho			X			X			X													

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
ESLINGAS																						
Se evidencia la etiqueta (Informacion del Equipo)	X			X			X															14
Fibras externas cortadas, desgastadas	X			X			X															
Cortes o rotura del tejido o costuras	X			X			X															
Estramiento excesivo	X			X			X															
Deformaciones (dobladuras, etc)	X			X			X															
Corrosión en partes metálicas	X			X			X															

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
LINEA DE VIDA																						
Deformaciones (dobladuras, etc)	X			X			X															
Picaduras, grietas	X			X			X															
Presenta desgaste	X			X			X															
Fibras externas cortadas, desgastadas	X			X			X															
Cortes o rotura del tejido o costuras	X			X			X															
Estiramiento excesivo	X			X			X															
Contacto con bordes contundentes	X			X			X															

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	

SAFRID

INSPECCION DIARIA DE EQUIPOS DE ALTURAS

Código: SAF-FOR-099
Fecha:Nov 2021
Versión: 02

	EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES C	LUNES NC	LUNES N/A	MARTES C	MARTES NC	MARTES N/A	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	MIERCOLES N/A	JUEVES C	JUEVES NC	JUEVES N/A	VIERNES C	VIERNES NC	VIERNES N/A	SABADO C	SABADO NC	SABADO N/A	DOMINGO C	DOMINGO NC	DOMINGO N/A	OBSERVACIONES
SILLA	Se evidencia la etiqueta (Informacion del Equipo)			✓			✓			✓													
	Fibras externas cortadas, desgastadas			✓			✓			✓													
	Cortes o rotura del tejido o costuras			✓			✓			✓													
	Estiramiento excesivo			✓			✓			✓													
	Deformaciones (dobladuras, etc)			✓			✓			✓													
	Corrosión en partes metálicas			✓			✓			✓													
	Contacto con bordes contundentes			✓			✓			✓													
ARRESTADOR DE CAIDAS	Deformaciones (dobladuras, etc)			✓			✓			✓													
	Ajuste excesivo de mosquetones			✓			✓			✓													
	Grietas o picaduras			✓			✓			✓													
	Freno			✓			✓			✓													
	Deterioro general			✓			✓			✓													
	Corrosión			✓			✓			✓													
	Presencia de moho			✓			✓			✓													

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Antonio Zoon	Ayudante	Antonio Zoon						

FIRMA INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Jasbedis	Insp - SST							

FIRMA DEL RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CLIENTE

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

SAFRID

INSPECCION DIARIA DE EQUIPOS DE ALTURAS

Código: SAF-FOR-099
Fecha: Nov 2021
Versión: 02

PROYECTO: Colegio Compultir AREA: Cubierta,

IDENTIFICACION DEL EQUIPOS SERIE Y /O MARCA: INSAFE 100

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Montaje de estructura metalica. y tejido INSAFE 100

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO EN SEGURO EN ALTURAS

DESDE: 04/05/26 HASTA: 09/05/26

CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A

Marque con una X según corresponda

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
ARNES																						
TEJIDO O CORREA																						
Se evidencia la etiqueta (Informacion del Equipo)	X			X			X															
Fibras externas cortadas, desgastadas	X			X			X															
Cortes o rotura del tejido o costuras	X			X			X															
Falura	X			X			X															
Estiramiento excesivo (elongación de la fala)	X			X			X															
Deterioro general	X			X			X															
Decoloración del material	X			X			X															
Presencia de moho	X			X			X															
COSTURAS																						
Cortaduras			X			X			X													
Deshilachamiento			X			X			X													
Hilos faltantes			X			X			X													
ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																						
Deformaciones (dobladuras, etc)	X			X			X															
Picaduras, grietas	X			X			X															
Presenta desgaste	X			X			X															
Corrosión u oxidación	X			X			X															

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
ACCESORIOS																						
TIE OFF (ADAPTADOR PORTATIL)																						
Se evidencia la etiqueta (Informacion del Equipo)	X			X			X															
Fibras externas cortadas, desgastadas	X			X			X															
Cortes o rotura del tejido o costuras	X			X			X															
Estiramiento excesivo	X			X			X															
Piezas faltantes	X			X			X															
Presencia de moho	X			X			X															

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
MOSQUETONES Y GANCHOS																						
Deformaciones (dobladuras, etc)			X			X	X															
Ajuste excesivo de mosquetones			X			X	X															
Grietas o picaduras			X			X	X															
Estado de pasadores			X			X	X															
Gatillo			X			X	X															
Deterioro general			X			X	X															
Corrosión			X			X	X															
Presencia de moho			X			X	X															

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
ESLINGAS																						
Se evidencia la etiqueta (Informacion del Equipo)	X			X			X															1758
Fibras externas cortadas, desgastadas	X			X			X															RAUK
Cortes o rotura del tejido o costuras	X			X			X															
Estiramiento excesivo	X			X			X															
Deformaciones (dobladuras, etc)	X			X			X															
Corrosión en partes metálicas	X			X			X															

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
LINEA DE VIDA																						
Deformaciones (dobladuras, etc)	X			X			X															
Picaduras, grietas	X			X			X															
Presenta desgaste	X			X			X															
Fibras externas cortadas, desgastadas	X			X			X															
Cortes o rotura del tejido o costuras	X			X			X															
Estiramiento excesivo	X			X			X															
Contacto con bordes contundentes	X			X			X															

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	

SAFRID

INSPECCION DIARIA DE EQUIPOS DE ALTURAS

Código: SAF-FOR-099
Fecha:Nov 2021
Versión: 02

	EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
SILLA	Se evidencia la etiqueta (Informacion del Equipo)			X			X																
	Fibras externas cortadas, desgastadas																						
	Cortes o rotura del tejido o costuras																						
	Estiramiento excesivo																						
	Deformaciones (dobladuras, etc)																						
	Corrosión en partes metálicas																						
	Contacto con bordes contundentes																						
APRESTADOR DE CAIDAS	Deformaciones (dobladuras, etc)																						
	Ajuste excesivo de mosquetones																						
	Grietas o picaduras																						
	Freno																						
	Deterioro general																						
	Corrosión																						
	Presencia de moho																						

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Gilbert Ruzcate	operacional							

FIRMA INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
[illegible]	INSP - 357							

FIRMA DEL RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CLIENTE

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

SAFRID ingeniería sas	INSPECCION DE HERRAMIENTA	**Código:** SAF-FOR-098 **Fecha:** Nov 2021 **Versión:** 02

FECHA 11/05/25 OBRA: Colegio Comfenalco.

DESCRIPCIÓN	FECHA DESDE: 11/05/25 HASTA 17/05/25. CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A. Marque con una X según corresponda																				
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
HERRAMIENTAS MANUALES																					
Se usa la adecuada al trabajo	X			X			X			X			X			X					
Se encuentran en buen estado	X			X			X			X			X			X					
Se guardan y portan adecuadamente	X			X			X			X			X			X					
Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos	X			X			X			X			X			X					
HERRAMIENTAS DE CORTE																					
Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	X					X	X					X	X			X					
Los cinceles se encuentran afilados	X					X	X					X	X			X					
Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	X					X	X					X	X			X					
Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	X					X	X					X	X			X					
Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	X					X	X					X	X			X					
Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	X					X	X					X	X			X					
Los cuchillos disponen de mangos y fundas	X					X	X					X	X			X					
HERRAMIENTAS DE GOLPE																					
Se emplea el martillo adecuado según la labor	-		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X			
Sus caras y bordes están en buen estado			X			X			X			X			X			X			
Su mango no está quebrado, astillado ni flojo			X			X			X			X			X			X			
HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES																					
Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			X			X			X			X			X			X			
Se observan en la llave huellas y palancas			X			X			X			X			X			X			
Se dispone de llaves para golpear			X			X			X			X			X			X			
Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o detenoradas			X			X			X			X			X			X			
La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			X			X			X			X			X			X			
La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado			X			X			X			X			X			X			
Se dispone de herramientas que no produzcan chispas			X			X			X			X			X			X			
HERRAMIENTAS ELECTRICAS																					
Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	X			X			X			X			X			X					
Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X			X			X			X			X			X					
Estan limpia y lubricadas	X			X			X			X			X			X					
Tienen sus guardas	X			X			X			X			X			X					
Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X			X			X			X			X			X					
El cable y enchufe no presentan daños	X			X			X			X			X			X					
En los taladros se observa el mandil con golpes			X			X			X			X			X			X			

Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			X			X			X			X			X			X											
Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			X			X			X			X			X			X											
Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve			X			X			X			X			X			X											
Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas			X			X			X			X			X			X											
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados			X			X			X			X			X			X											
HERRAMIENTA NEUMATICA																														
Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado																														
Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta																														
Se trabaja a las presiones indicadas																														
La herramienta es descargada al terminar																														
HERRAMIENTA POR DETONACION																														
El personal es autorizado																														
Emplean los elementos de protección																														
Se descarga y es almacenada																														

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA INSPECTOR FIRMA						
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Abbady González	Inp. SST							

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Responsables SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal
Elaboro	Revisó	Aprobado

SAFRID ingeniería sas

INSPECCION DE HERRAMIENTA

Código: SAF-FOR-098
Fecha: Nov 2021
Versión: 02

FECHA: 19 mayo 2026

OBRA: Colegio Compartir.

DESCRIPCIÓN	FECHA DESDE: 14/05/26 HASTA: 24/05/26 — CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A — Marque con una X segun corresponda																							
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO					
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A			
HERRAMIENTAS MANUALES																								
Se usa la adecuada al trabajo	X			X			X						X			X								
Se encuentran en buen estado	X			X			X						X			X								
Se guardan y portan adecuadamente	X			X			X						X			X								
Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos	X			X			X						X			X								
HERRAMIENTAS DE CORTE																								
Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			X			X			X				X			X								
Los cinceles se encuentran afilados			X			X			X				X			X								
Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes			X			X			X				X			X								
Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos			X			X			X				X			X								
Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			X			X			X				X			X								
Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes estan completos			X			X			X				X			X								
Los cuchillos disponen de mangos y fundas			X			X			X				X			X								
HERRAMIENTAS DE GOLPE																								
Se emplea el martillo adecuado según la labor	X			X			X								X			X						
Sus caras y bordes están en buen estado	X			X			X								X			X						
Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	X			X			X								X			X						
HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES																								
Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			X			X			X						X			X						
Se observan en la llave huelles y pelancas			X			X			X						X			X						
Se dispone de llaves para golpear			X			X			X						X			X						
Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deteriorados			X			X			X						X			X						
La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			X			X			X						X			X						
La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado			X			X			X						X			X						
Se dispone de herramientas que no produzcan chispas			X			X			X						X			X						
HERRAMIENTAS ELECTRICAS																								
Las herramientas segun Las adecuadas segun el riesgo (humedad, vapores)	X		•			X									X			X						
Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X					X									X			X						
Están limpia y lubricadas	X					X									X			X						
Tienen sus guardas	X					X									X			X						
Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X					X									X			X						
El cable y enchufe no presentan daños	X					X								X				X						
En los taladros se observa el mandil con golpes			X				X											X						

Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X					
Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			X			X			X			X			X			X					
Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve			X			X			X			X			X			X					
Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas			X			X			X			X			X			X					
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados			X			X			X			X			X			X					
HERRAMIENTA NEUMATICA																							
Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado																							
Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta																							
Se trabaja a las presiones indicadas																							
La herramienta es descargada al terminar																							
HERRAMIENTA POR DETONACION																							
El personal es autorizado																							
Emplean los elementos de protección																							
Se descarga y es almacenada																							

OBSERVACIONES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA INSPECTOR	FIRMA
Jobledy Gonzalez	Insp. SST		

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Celon	Ing. Miguel Celon
Responsables SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal
Elaboró	Revisó	Aprobado

SAFRID ingeniería sas

INSPECCION DE PULIDORA

Código: SAF-FOR-096
Fecha: Nov 2021
Versión: 02

PROYECTO: Adecuación comunal. AREA: Abierta.

IDENTIFICACION DEL EQUIPOS SERIE Y /O MARCA: Milwaukee M18 FSAG125XB DESCRIPCION DEL TRABAJO: Corte Pulida en estructura.

FECHA DESDE: 11/05/26 HASTA: 17/05/26.

CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A

Marque con una X según corresponda

No	INDICADOR PARA EVALUAR LA CORTADORA	LUNES C	LUNES NC	LUNES N/A	MARTES C	MARTES NC	MARTES N/A	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	MIERCOLES N/A	JUEVES C	JUEVES NC	JUEVES N/A	VIERNES C	VIERNES NC	VIERNES N/A	SABADO C	SABADO NC	SABADO N/A	DOMINGO C	DOMINGO NC	DOMINGO N/A	OBSERVACIONES
1	¿ El cable de alimentación esta libre de cortes, aplastamientos, empalmes y la clavija no presenta daños ?	X			X			X						X			X						
2	¿ El cuerpo de la pulidora esta libre de fisuras y golpes ?	X			X			X						X			X						
3	¿ La pulidora cuenta con mango auxiliar, y está ajustado ?	X			X			X						X			X						
4	¿ El interruptor o botón de encendido funciona correctamente de acuerdo al manual ?	X			X			X						X			X						
5	¿ La rosca o fuerca de sujeción del disco ajusta correctamente ?	X			X			X						X			X						
6	¿ El botón de bloqueo del eje fuciona correctamente de acuerdo al manual ?	X			X			X						X			X						
7	¿ La pulidora cuenta con protector del disco-guarda de seguridad y el seguro ajusta correctamente ?	X			X			X						X			X						
8	¿ El disco que va a utilizar es acorde con el tamaño de la pulidora, esta completo y libre de fisuras ?	X			X			X						X			X						
9	¿ las rejillas de ventilación de la pulidora están completas y libres de obstrucción ?	X			X			X						X			X						

FIRMA OPERARIO AUTORIZADO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Jesús Gonzalez	Oficial						

FIRMA INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Jotbeth Gonzalez	Inp. SST.						

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Coordinador SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal

53

SAFRID	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Codigo	SAF-FOR-074
		Fecha	Mar24
		Version	Versión: 1.0

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

Contrato N°: CO1.PCCNTR.8155135	Ciudad: Bogotá D.C.
Objeto del contrato: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – LOTE 4	Ubicación donde se realiza el trabajo: (frente de obra): Colegio Diego Montañas.
Fecha de Inicio 18/05/2026	Fecha de final: 24/05/2026
Descripción de la tarea a realizar: Desmonte e Instalación de Eternit, Resanes, Estucado y Pintura.	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADORES	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO		CARGO	FIRMA						
				LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DANIEL HERNANDEZ	PPT	89-28-77	AYUDANTE		DANIEL	DANIEL	DANIEL	DANIEL	DANIEL	
Adrian Gonzalez	PPT	54304152	OFICIAL		Adrian	Adrian	Adrian	Adrian	Adrian	
RAMON CASTILLO	PPT	6935472	AYUDANTE		RAMON	RAMON	RAMON	RAMON	RAMON	
Junior Rodriguez	CC	1116828053	OFICIAL		Junior	Junio	Junior	Junior	Junior	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
Manuales	X	*Martillo, metro, cegueta, llana metalica, rodillo, valdes, espatula, brochas, lija*
Electricas		*Extensiones*
Hidráulicas		NA
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Trabajos a nivel
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	No aplica
¿Se han realizado los calculos de la distancia de caida?	No aplica
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	NA
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco con barbuquejo, gafas de protección, tapaodios, guantes, botas de seguridad,ropa de trabajo, camisa manga larga
¿Cuántos trabajadores se requieren?	4
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pintura, estuco, enchape, madera, barandas, agua, cemento, pegacor.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NA
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Electricidad, superficies poco resistentes,chispas, objetos filosos, condiciones climaticas.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Alistamiento de herramientas , materiales y equi	Caidas caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones , muerte.	Orden y aseo, almacenar adecuadamente las herramientas y equipos de alturas, evitar bromas durante estas actividades, uso de elementos de proteccion personal. Identificar que herraminta necesita y que no , no lleve cosas que no necesite, Inspecione los equipos de alturas que va a utlizar verifique etiquetas , estado de correas , partes metalicas , ajuste correcto de los ganchos.
Dirigirse a el área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Dirijase a el área de trabajo de forma ordenada , evite realizar bromas , durante el recorrido no pierda de vista sus herramientas y sus equipos si debe desplazarse por fuera de la plaza, lleve siempre ubicado su casco de seguridad como debe ser, evite retirarlo por cualquier motivo, acceda a el lugar de trabajo por el lugar autorizado.

Acceder al área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo, caica de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, muerte.	Firme su ATS ,inspeccione los equipos y herramientas que va a utilizar.
Verificacion de área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos robos, muerte.	Una vez alla llegado al area de trabajo verifique si el area es segura para iniciar labores.
Inicio de labores	Caidas a nivel, golpes, sofreesfuerzos, cortaduras	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos robos, muerte.	Personal con experiencia, acompañamiento permanente, condiciones de salud optimas.
Terminación de tarea	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos robos, muerte.	Una vez terminada la tarea del dia garantice que no queden objetos herramientas o materiales que puedan obsruir e paso y generar incidentes, deje sus área de trabajo en perfecto estado de orden y aseo.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Apellido Residente Obra	Cedula	Firma
Diego Pinzón	1014136674	
Nombre y Apellido Maestro de Obra y/o Encargado de Cuadrilla	**Cedula**	**Firma**
Adrian Gonzales	94304452	Adrian
Nombre y Apellido Residente SST	**Cedula**	**Firma**
Adrian Martinez	1.064.727.217	

Elaboró	Revisó	Aprobó
Ing. Yonna Blanco	Ing. Miguel Cerón M.	Ing. Miguel Cerón M.

SAFRID ingeniería sas	FORMATO PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO:	FOR-SAF-SST-002
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	2024

1.FECHA DE ELABORACION DE PERMISO:	18/05/2026		
2.LUGAR ESPECIFICO DE LA ACTIVIDAD:	Colegio Diego Montañas - Comizas		
3.ALTURA APROX. DE LA ACTIVIDAD:	8 mts		
4.FECHA DE INICIO:	18/05/2026	FECHA FINAL:	24/05/2026
5.HORA DE INICIO :	7:00 am	HORA FINAL:	4:00 pm

6. TIPO DE TRABAJO A REALIZAR

Describa la actividad que se va a realizar:

Desmonte e Instalación de estibal, Resanes, Estucado y Pintura

7. TIPO DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Describa las herramientas que se van a utilizar:

Herramientas menores, Pulidoras, Taladros

8. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR

Describa los elementos de protección personal que se van a utilizar:

Andamios, Arnés, Eslingas, Casco, Guantes, Gafas, Tapabocas, Etc.

9. DATOS Y REQUISITOS DEL TRABAJADOR QUE EJECUTARA EL TRABAJO

#	NOMBRE	CEDULA	FECHA CURSO ALTURAS	FECHA SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	FECHA DE EXAMEN MEDICO (apto para trabajo en alturas)	FIRMA TRABAJADOR
1	DANIEL HERNANDEZ	89-28-27	13-04-26	22-06-26	07-04-26	DANIEL
2	RAMON CASTILLO	6935472	12-03-26	22-06-26	10-03-26	RAMON
3	Adrian Gonzales	5430452	12-03-26	22-06-26	10-03-26	Adrian
4	Junior Rodriguez	M1683	12-03-26	22-06-26	12/03-26	JUNIOR
5						
6						
7						
8						

Al firmar este documento, el trabajador manifiesta que para realizar la labor en alturas anteriormente nombrada tiene la capacidad física y mental para la tarea y su estado de salud es bueno, adicional que se revisaron las certificaciones correspondientes para alturas y examen medico.

10.MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Equipos de Protección Contra Caídas a Utilizar (Marca con una x)

Arnés cuerpo completo	Sí	X	No		Línea de vida vertical portátil	Sí	X	No		Punto de anclaje fijo	Sí		No	X	Mosquetón	Sí		No	X
línea de vida vertical	Sí	X	No		Eslinga en y con adsorbedor	Sí	X	No		Punto de anclaje portátil (tie off)	Sí		No	X	Freno Arrestador	Sí		No	X
línea de vida horizontal	Sí		No	X	Eslinga de posicionamiento	Sí	X	No		Silla de suspensión	Sí		No	X	Descendedor	Sí		No	X

11.MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCIÓN

Medidas a adoptar (Marca con una x)

Delimitación del área	Sí	X	No		Ayudante de seguridad	Sí	X	No		Barandas	Sí	X	No		PermisoT.A		Sí	X	No	

Señalización del area	Sí ☑	No ☐	Manejo de desniveles y orificios (huecos):	Sí ☑	No ☐	Control de acceso	Sí ☑	No ☐	Otro_ ¿Cuál?	

12.SISTEMAS DE ACESSO

Sistema de acceso a utilizar (Marca con una x)

Andamio colgante	Sí ☐	No ☑	Andamio tubular	Sí ☑	No ☐	Escaleras fijas	Sí ☐	No ☒	Escaleras portatiles	Sí ☑ No ☐

13. REQUERIMIENTOS GENERALES - LISTA DE CHEQUEO DIARIA

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE, (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se realizó el análisis de trabajo seguro (ATS) y socialización antes de iniciar la labor		C	C	C	C	C	
Se realizó charla pero-peracionalantes de iniciar la labor		C	C	C	C	C	
Los trabajadores están aptos para desarrollar la labor (estado de salud y con concepto medico vigente)		C	C	C	C	C	
los trabajadores están certificados en alturas (curso avanzado y/o re-entrenamiento vigente)		C	C	C	C	C	
Se han verificado los sistemas de anclaje		C	C	C	C	C	
Caidas de diferente nivel		C	C	C	C	C	
Caida al mismo nivel		C	C	C	C	C	
El area de trabajo esta libre de obstáculos		C	C	C	C	C	
Cambio brusco de temperatura		C	C	C	C	C	
Contacto con corriente electrica		C	C	C	C	C	
Contacto con partes en movimiento		C	C	C	C	C	
Agentes infecciosos		C	C	C	C	C	
Presencia de gases y vapores		C	C	C	C	C	
Movimientos repetitivos		C	C	C	C	C	
Adopcion de posturas inadecuadas		C	C	C	C	C	
Caida de objetos		C	C	C	C	C	
Manipulacion de elementos cortates		C	C	C	C	C	
Proyeccion de particulas		C	C	C	C	C	
Manejo de herramientas manuales		C	C	C	C	C	
Exposicion a ruido		C	C	C	C	C	
Condicion de orden y aseo		C	C	C	C	C	
Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo (cinta, conos, señales de tal manera que se pueda aislar o restringir la zona y no se permita el paso de personas ajenos a la labor?		C	C	C	C	C	

VERIFICACION DE SISTEMAS DE ACCESO

ANDAMIOS

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Los cuerpos del andamio se encuentran asegurados y cuenta con todas sus piezas (verticales, horizontes, diagonales, pines, llantas o husillo nivelador ?		C	C	C	C	C	
Cuenta con area firme para su correcto armado y nivelacion?		C	C	C	C	C	
Cuenta contodas sus plataformas y estás estan apoyadas firmemente ?		C	C	C	C	C	
La superficie de trabajo se encuentra cubierta por plataformas, libre de huecos?		C	C	C	C	C	
Cuenta con escaleras y estas se encuentran aseguradas adecuadamente al andamio?		C	C	C	C	C	
El andamio presenta alguna tipo de oxidación o desgaste?		C	C	C	C	C	
El andamio esta aislado de lineas o equipos energizados?		C	C	C	C	C	
El andamio cuenta con ficha de autorización?		C	C	C	C	C	

ESCALERAS

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Las escaleras están en adecuadas condiciones?		C	C	C	C	C	
Las bases están apoyadas sobre una superficie plana?		C	C	C	C	C	
Esta libre de grasa, aceite u otras sustancias?		C	C	C	C	C	
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes?		C	C	C	C	C	
El área alrededor de la escalera se encuentra señalizada?		C	C	C	C	C	

VERIFICACIÓN EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

ARNES DE CUERPO COMPLETO

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
El arnes cuenta con la ficha de identificacion del fabticante?		C	C	C	C	C	
El arnes cuenta con la ficha de fabricacion y inspeccion?		C	C	C	C	C	
Las correas del equipo son ajustables?		C	C	C	C	C	
El arnes cuenta con la ficha donde esta la fecha de fabricacion y inspeccion?		C	C	C	C	C	
El equipo tiene los puntos de conexión necesarios y estan en buen estado, Argollas, hebillas.		C	C	C	C	C	
Las eslingas se encuntran sin manchas de pintura, grasa, oxido, quemaduras y/o perforaciones?		C	C	C	C	C	
El absorvedor de choque de la eslinga se encuntra sin manchas de pintura, grasa, quemadura y/o perforaciones?		C	C	C	C	C	
El tie off se encuntra sin manchas de pintura, grasa, oxido, quemaduras y/o perforaciones?		C	C	C	C	C	
La linea de vida cuenta con su ficha en donde se observa la fecha de fabricacion y fabricante?		C	C	C	C	C	
La linea de vida se encuentra libre de pintura, grasa, oxido, quemaduras, deshilachamiento y/o perforaciones?		C	C	C	C	C	

ESLINGAS DE CARGA

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Cuenta con sus etiquetas legibles y se puede ver la fecha de fabricacion?		C	C	C	C	C	
las fibras y costuras están libres de desgaste, deshilachamiento y cortes?		C	C	C	C	C	
Las eslingas estan protegidas contra cualquier elemento que genere abracion?		C	C	C	C	C	

LINEAS DE VIDAS

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Cuenta con sus etiquetas legibles y se puede ver la fecha de fabricacion?		C	C	C	C	C	
las fibras y costuras están libres de oxido, pintura, grasa, deshilachamiento y cortes?		C	C	C	C	C	
Funcionamiento de cierre y apertura de los ganchos metálicos es correcto?		C	C	C	C	C	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Casco con barbuquejo		C	C	C	C	C	
Guantes de seguridad		C	C	C	C	C	
Gafas de seguridad		C	C	C	C	C	
Tapaoidos		C	C	C	C	C	
Careta de esmerilar		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Careta de soldador		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Ropa de trabajo		C	C	C	C	C	
Arnes		C	C	C	C	C	
Eslinga		C	C	C	C	C	
Tie off		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

OBSERVACIONES:

APROBACION DEL PERMISO

ENCARGADOS	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Inspector SST	Adrian M	1064121217	
Residente de obra	Diego D	1014173694	
Maestro o encargado de la actividad	Adrian	5.130.152	Adrian
coordinador (TA) de obra	Adrian M	1064121217	

CIERRE DE PERMISO

ENCARGADOS	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Inspector SST	Adrian M	1064121217	
Residente de obra	Diego Pinzón	1014137694	
Maestro o encargado de la actividad	Adrian	5.130.152	Adrian
coordinador (TA) de obra	Adrian M	1064121217	

TENGA EN CUENTA : SI REQUIERE CAMBIAR DE ACTIVIDAD O LOS EQUIPOS CON LOS CUALES ESTA LABORANDO, INFORME AL ÁREA SST PARA UNA NUEVA INSPECCION.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado Por:
Yinna Blanco Arenas	Miguel Cerón	Miguel Cerón
Responsable SG-SST	Empleador	Empleador

SAFRID ingeniería sas	SG-SST	CODIGO: SAF-PRC-025
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	VERSIÓN: 1
		FECHA: 08-2024

1 Generalidades

FECHA DE INICIO:	DIA (dos) 18	MES (dos) 05	AÑO (dos) 26	PERMISO VÁLIDO HASTA:	DIA (dos) 24	MES (dos) 05	AÑO (dos) 26
HORA DE INICIO	7:00 am			HORA DE FINALIZACIÓN	4:00 pm		

EMPRESA EJECUTORA: Consorcio Adecuaciones Assaf — N° CONTRATO: 3416 - 2025

ÁREA O LUGAR: Colegio Diego Montaña - Cormas — N° PERSONAS EJECUTORAS:

ACTIVIDAD A REALIZAR: Corte de Electroducto

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Soldadoras, Taladros.

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [X] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona, estan en bueb estado?	X		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	X		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	X		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	X		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?			X
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	X		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?			X
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	X		
¿Los electrodos y cables se encuentran en buen estado?			X
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			X

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	X		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura			X
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.			X
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.			X

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	X	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES		X

5 Requerimientos adicionales	SI	NO
1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura.	X	
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados.		X
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo?		X

6 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

SUSPENSIÓN DEL PERMISO: (Cualquier persona que supervisa la actividad evidencia incumplimiento en el procedimiento puede suspender el trabajo y debe notificar inmediatamente al encargado de SST del lugar de trabajo.

Motivos de la suspensión:

Fecha y hora de la suspensión:

Suspensión realizada por:

EJECUTORES

Ítem	Nombre y apellido	Cedula	Cargo	Firma
1	Adrian Gonzalez	5'130.153	OFICIAL	Adrian
2	Junior Rodriguez	MI6 828053	OFICIAL	Junior
3				
4				
5				
6				
7				

RENOVACIÓN

Tiempo de validación del permiso(fecha).

Hora; Desde-Hasta.

Autorizado por: | Supervisado por:

Número de personas que ejecutan la actividad:

OBSERVACIONES:

Solo diligenciar personal a cargo (JEFE INMEDIATO, ENCARGADO, ENCARGADO DE SST)

Ítem	Nombre y apellido	Cedula	Cargo	Firma
1	Adrian Martinez	1064121217	Insp. SST	
2				
3				
4				

TRABAJO TERMINADO

¿Finalizo el trabajo?

Si no a finalizado explique porque

El área de trabajo quedo limpia y ordenada

Fecha:

Hora:

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Coordinador SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal

SAFRID ingeniería sas

INSPECCION DE PULIDORA

Código: SAF-FOR-096
Fecha: Nov 2021
Versión: 02

PROYECTO: Colegio Diego Montañas. AREA: Cornizas

IDENTIFICACION DEL EQUIPOS SERIE Y /O MARCA: Dewalt

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Corte de Ekiboal

No	INDICADOR PARA EVALUAR LA CORTADORA	FECHA DESDE: 18/05/2026 HASTA: 24/05/2026 — CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A — Marque con una X según corresponda																					OBSERVACIONES
		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
1	¿ El cable de alimentación esta libre de cortes, aplastamientos, empalmes y la clavija no presenta daños ?				/			/			/			/			/						
2	¿ El cuerpo de la pulidora esta libre de fisuras y golpes ?				/			/			/			/			/						
3	¿ La pulidora cuenta con mango auxiliar, y está ajustado ?				/			/			/			/			/						
4	¿ El interruptor o botón de encendido funciona correctamente de acuerdo al manual ?				/			/			/			/			/						
5	¿ La rosca o tuerca de sujeción del disco ajusta correctamente ?				/			/			/			/			/						
6	¿ El botón de bloqueo del eje fuciona correctamente de acuerdo al manual ?				/			/			/			/			/						
7	¿ La pullidora cuenta con protector del disco-guarda de seguridad y el seguro ajusta correctamente ?				/			/			/			/			/						
8	¿ El disco que va a utilizar es acorde con el tamaño de la pulidora, esta completo y libre de fisuras ?				/			/			/			/			/						
9	¿ las rejillas de ventilación de la pulidora están completas y libres de obstrucción ?				/			/			/			/			/						

FIRMA OPERARIO AUTORIZADO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA					
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Junior Rodriguez	oficial		Junior	Junior	Junior	Junior	Junior

FIRMA INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA					
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Adrian Martinez	Insp. SST						

Yinna Blanco Arenas		
Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Ceron	Ing. Miguel Ceron
Coordinador SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal

SAFRID ingeniería sas

INSPECCION DE PULIDORA

Código: SAF-FOR-096
Fecha: Nov 2021
Versión: 02

PROYECTO: Colegio Diego Montañas
AREA: Cornizas
IDENTIFICACION DEL EQUIPOS SERIE Y /O MARCA: Dewalt
DESCRIPCION DEL TRABAJO: Corte de Ceramica

FECHA — DESDE: 18/05/2026 HASTA: 24/05/2026

CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A

Marque con una X según corresponda

No	INDICADOR PARA EVALUAR LA CORTADORA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
1	¿ El cable de alimentación esta libre de cortes, aplastamientos, empalmes y la clavija no presenta daños ?				✓			✓			✓			✓			✓						
2	¿ El cuerpo de la pulidora esta libre de fisuras y golpes ?				✓			✓			✓			✓			✓						
3	¿ La pulidora cuenta con mango auxiliar, y está ajustado ?				✓			✓			✓			✓			✓						
4	¿ El interruptor o botón de encendido funciona correctamente de acuerdo al manual ?				✓			✓			✓			✓			✓						
5	¿ La rosca o tuerca de sujeción del disco ajusta correctamente ?				✓			✓			✓			✓			✓						
6	¿ El botón de bloqueo del eje fuciona correctamente de acuerdo al manual ?				✓			✓			✓			✓			✓						
7	¿ La pullidora cuenta con protector del disco-guarda de seguridad y el seguro ajusta correctamente ?				✓			✓			✓			✓			✓						
8	¿ El disco que va a utilizar es acorde con el tamaño de la pulidora, esta completo y libre de fisuras ?				✓			✓			✓			✓			✓						
9	¿ las rejillas de ventilación de la pulidora están completas y libres de obstrucción ?				✓			✓			✓			✓			✓						

FIRMA OPERARIO AUTORIZADO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Adrian Gonzalez	oficial		Adrian	Adrian	Adrian	Adrian	Adrian

FIRMA INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Adrian Martinez	Insp. SST		✓	✓	✓	✓	✓

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Coordinador SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal

SAFRID ingeniería sas

INSPECCION DE TALADRO

Código: SAF-FOR-044
Fecha: Abril 2022
Versión: 01

PROYECTO: Colegio Diego Montañas

MARCA TALADRO: Dewalt | PROPIO: X | ALQUILADO:

INDIQUE CON UNA X B=Si el componente esta en Buenas condiciones o M= Si el componente esta en malas condiciones

ÍTEM	FECHA 18/05/2026										24/05/2026	
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADOS	
	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
Estado de gatillo de velocidad variable			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de boton de bloqueo encendio			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de conmutador de funciones de rotacion			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de boton de avance y reversa			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de mandril			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de protector de cable con sujeta llave			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de cable electrico			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de mango lateral			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de mango principal			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de llave Mandril			✓		✓		✓		✓		✓	
El trabajador esta instruido sobre el correcto			✓		✓		✓		✓		✓	
uso y manejo del equipo			✓		✓		✓		✓		✓	

NOTA: Toda anomalia detectada, avisar al Inspector SST para solucionar el problema, pero recuerde siempre

OBSERVACIONES

APROBADO SI X NO	CON RESTRICCIÓN SI NO X

OPERADOR

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Junior Rodriguez	OFICIAL	JUNIOR

INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Adrian Martinez	Insp. SST	

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Coordinador SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal

SAFRID ingeniería sas

INSPECCION DE TALADRO

Código: SAF-FOR-044
Fecha: Abril 2022
Versión: 01

PROYECTO: Colegio Diego Montañas

MARCA TALADRO: Dewalt | PROPIO: X | ALQUILADO:

INDIQUE CON UNA X B=Si el componente esta en Buenas condiciones o M= Si el componente esta en malas condiciones

FECHA: 18/05/2026 — 24/05/2026

ÍTEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADOS	
	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
Estado de gatillo de velocidad variable			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de boton de bloqueo encendio			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de conmutador de funciones de rotacion			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de boton de avance y reversa			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de mandril			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de protector de cable con sujeta llave			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de cable electrico			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de mango lateral			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de mango principal			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de llave Mandril			✓		✓		✓		✓		✓	
El trabajador esta instruido sobre el correcto			✓		✓		✓		✓		✓	
uso y manejo del equipo			✓		✓		✓		✓		✓	

NOTA: Toda anomalia detectada, avisar al Inspector SST para solucionar el problema, pero recuerde siempre

OBSERVACIONES

APROBADO SI X NO ___ | CON RESTRICCIÓN SI ___ NO X

OPERADOR

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Adrian Gonzales	OFICIAL	Adrian

INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Adrian Martinez	Insp. SST	

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Ceron	Ing. Miguel Ceron
Coordinador SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal

SAFRID ingeniería sas	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	Código: SAF-FOR-100 Fecha: ENE-2025 Versión: 01

PROYECTO	Colegio Diego Montañas.	
NOMBRE ENCARGADO	RAMON CASTILLO	FIRMA RAMON

Marque con una X según corresponda

DESCRIPCION	FECHA DD	MM	AA	DIA			OBSERVACIONES
Areas de trabajo limpias y ordenadas	18	05	26	LUN	C		Festivo
					NC	x	
	19	05	26	MAR	C	x	Ninguna
					NC		
	20	05	26	MIE	C	x	Ninguna
					NC		
	21	05	26	JUE	C	x	Ninguna
					NC		
	22	05	26	VIE	C	x	Ninguna
					NC		
	23	05	26	SAB	C	x	Ninguna
					NC		

FIRMA INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Adrian Martinez	Insp. SST	

SAFRID ingeniería sas

INSPECCION DE HERRAMIENTA

Código: SAF-FOR-098
Fecha:Nov 2021
Versión: 02

FECHA: 18/05/2026

OBRA: Colegio Diego Montañas.

DESCRIPCIÓN	FECHA DESDE: 18/05/2026 HASTA: 24/05/2026 — CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A — Marque con una X según corresponda																							
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO					
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
HERRAMIENTAS MANUALES																								
Se usa la adecuada al trabajo				/			/			/			/			/								
Se encuentran en buen estado				/			/			/			/			/								
Se guardan y portan adecuadamente				/			/			/			/			/								
Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.				/			/			/			/			/								
HERRAMIENTAS DE CORTE																								
Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo				/			/			/			/			/								
Los cinceles se encuentran afilados				/			/			/			/			/								
Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes				/			/			/			/			/								
Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos				/			/			/			/			/								
Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias				/			/			/			/			/								
Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos				/			/			/			/			/								
Los cuchillos disponen de mangos y fundas				/			/			/			/			/								
HERRAMIENTAS DE GOLPE																								
Se emplea el martillo adecuado según la labor				/			/			/			/			/								
Sus caras y bordes están en buen estado				/			/			/			/			/								
Su mango no está quebrado, astillado ni flojo				/			/			/			/			/								
HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES																								
Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas						/			/			/			/			/						
Se observan en la llave huellas y palancas						/			/			/			/			/						
Se dispone de llaves para golpear						/			/			/			/			/						
Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas						/			/			/			/			/						
La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente						/			/			/			/			/						
La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado						/			/			/			/			/						
Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.						/			/			/			/			/						
HERRAMIENTAS ELECTRICAS																								
Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)						/			/			/			/			/						
Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada						/			/			/			/			/						
Están limpia y lubricadas						/			/			/			/			/						
Tienen sus guardas						/			/			/			/			/						
Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas						/			/			/			/			/						
El cable y enchufe no presentan daños						/			/			/			/			/						
En los taladros se observa el mandil con golpes						/			/			/			/			/						

Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños																						
Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados																						
Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve																						
Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.																						
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados																						
HERRAMIENTA NEUMATICA																						
Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado																						
Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta																						
Se trabaja a las presiones indicadas																						
La herramienta es descargada al terminar.																						
HERRAMIENTA POR DETONACION																						
El personal es autorizado																						
Emplean los elementos de protección																						
Se descarga y es almacenada																						

OBSERVACIONES:

FIRMA INSPECTOR									
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA							
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
Adrian Martinez	Insp. SST								

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Ceron	Ing. Miguel Ceron
Responsables SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal
Elaboró	Revisó	Aprobado

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: Abril 2022
		Version:03

CHARLA:		CAPACITACIÓN:	x	REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C. 19/05/2026
DURACIÓN:	15 min
TEMA:	Actos y Condiciones Inseguras
EXPOSITOR:	Adrian Martinez
TOTAL ASISTENCIA:	04 Personas

El trabajador firma en constancia de:
1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Adrian Gonzales	54304152	OFICIAL	Adrian
2	RAMON CASTILLO	6935472	AYUDANTE	RAMON
3	Junior Rodriguez	MI6828053	OFICIAL	JUNIOR
4	DANIEL HERNANDES	89-28-27	AYUDANTE	DANIEL
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

FIRMA EXPOSITOR

Yinna Blanco Arenas		
Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: Abril 2022
		Version:03

CHARLA:		CAPACITACIÓN:	X	REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C. 27/05/2026
DURACIÓN:	10 min
TEMA:	Actos y Condiciones Inseguras.
EXPOSITOR:	Adrian Martinez
TOTAL ASISTENCIA:	04 Personas

El trabajador firma en constancia de:
1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Junior Rodriguez	1116 820053	OFICIAL	Junior
2	Adrian Gonzalez	54304752	oficial	Adrian
3	DANIEL HERNANDES	89-28-27	AYUDANTE	DANIEL
4	RAMON CASTILLO	6935472	AYUDANTE	RAMON
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: Abril 2022
		Version:03

CHARLA:		CAPACITACIÓN:	X	REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C. 23/05/2026.
DURACIÓN:	20 min
TEMA:	Actividades de alto riesgo (Alturas, Caliente).
EXPOSITOR:	Adrian Martinez
TOTAL ASISTENCIA:	04 Personas

El trabajador firma en constancia de:
1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	RAMON CASTILLO	6935472	AYUDANTE	RAMON
2	DANIEL HERNANDES	89-28-27	AYUDANTE	DANIEL
3	Adrian Gonzales	5430182	OFICIAL	Adrian
4	Junior Rodriguez	111 BLBOS7	OFICIAL	JUNIOR
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

SU

SAFRID ingeniería sas	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Codigo	SAF-FOR-074
		Fecha	Mar24
		Version	Versión 1.0

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

Contrato N°: CO1.PCCNTR.8155135 Objeto del contrato: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – LOTE 4.	Ciudad: Bogotá D.C. Ubicación donde se realiza el trabajo: (frente de obra): Colegio Diego Montaña
Fecha de Inicio 25/05/2026	Fecha de final: 31/05/2026
Descripción de la tarea a realizar: Desmonte e Instalación de Uniboard, Resanes, Estucado y Pinturas.	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADORES	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO		CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
RAMON CASTILLO	PPT	6935472	AYUDANTE	RAMON	RAMON	RAMON	RAMON	RAMON	RAMON	
JUNIOR RODRIGUEZ	CC	1116828053	OFICIAL	JUNIOR	JUNIOR	JUNIOR	JUNIOR	JUNIOR	JUNIOR	
Adrian Gonzales	PPT	54301152	OFICIAL	Adrián	Adrián	Adrian	Adrián	Adrian	Adrian	
DANIEL HERNANDEZ	PPT	89-28-27	AYUDANTE	DANIEL	DANIEL	DANIEL	DANIEL	DANIEL	DANIEL	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
Manuales	X	*Martillo, metro, cegueta, liana metalica, rodillo, valdes, espatula, brochas, lija*
Electricas		*Extensiones*
Hidráulicas		NA
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Trabajos a nivel
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	No aplica
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	No aplica
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	NA
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco con barbuquejo, gafas de protección, tapaoidos, guantes, botas de seguridad,ropa de trabajo, camisa manga larga
¿Cuántos trabajadores se requieren?	4
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pintura, estuco, enchape, madera, barandas, agua, cemento,, pegacor
¿Existen hoyos o grietes debajo del área de trabajo?	NA
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Electricidad, superficies poco resistentes,chispas, objetos filosos, condiciones climaticas

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Alistamiento de herramientas , materiales y equip	Caidas caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones , muerte.	Orden y aseo, almacenar adecuadamente las herramientas y equipos de alturas, evitar bromas durante estas actividades, uso de elementos de proteccion personal. Identificar que herraminta necesita y que no , no lleve cosas que no necesite, Inspecione los equipos de alturas que va a utilizar verifique etiquetas , estado de correas , partes metalicas , ajuste correcto de los ganchos.
Dirigirse a el área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Dirijase a el área de trabajo de forma ordenada , evite realizar bromas , durante el recorrido no pierda de vista sus herramientas y sus equipos si debe desplazarse por fuera de la plaza, lleve siempre ubicado su casco de seguridad como debe ser, evite retirarlo por cualquier motivo, acceda a el lugar de trabajo por el lugar autorizado.

Acceder al área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo, caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, muerte.	Firme su ATS ,inspeccione los equipos y herramientas que va a utilizar.
Verificacion de área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Una vez alla llegado al area de trabajo verifique si el area es segura para iniciar labores.
Inicio de labores	Caidas a nivel, golpes, sofreesfuerzos, cortaduras	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Personal con experiencia, acompañamiento permanente, condiciones de salud optimas.
Terminación de tarea	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Una vez terminada la tarea del dia ,garantice que no queden objetos herramientas o materiales que puedan obsruir el paso y generar incidentes, deje sus área de trabajo en perfecto estado de orden y aseo.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y apellido Residente Obra	Cedula	Firma
Diego Pinzón	1014133694	
Nombre y Apellido Maestro de Obra y/o Encargado de Cuadrilla	**Cedula**	**Firma**
Adrian Gonzales	5413041S2	Adrian
Nombre y Apellido Residente SST	**Cedula**	**Firma**
Adrian Martinez	1064121217	

Elaboró Ing. Yinna Blanco	Revisó Ing. Miguel Cerón M.	Aprobó Ing. Miguel Cerón M.

SAFRID ingeniería sas	FORMATO PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO:	FOR-SAF-SST-002
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	2024

1.FECHA DE ELABORACION DE PERMISO: 25/05/2026

2.LUGAR ESPECIFICO DE LA ACTIVIDAD: Colegio Diego Montañas - Coimizos

3.ALTURA APROX. DE LA ACTIVIDAD: 8 mts.

4.FECHA DE INICIO: 25/05/2026 — FECHA FINAL: 31/05/2026

5.HORA DE INICIO: 7:00 am — HORA FINAL: 4:00 pm

6. TIPO DE TRABAJO A REALIZAR

Describa la actividad que se va a realizar:

Desmonte e Instalación de cielo raso, Resanes, Estucado y Pintura.

7. TIPO DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Describa las herramientas que se van a utilizar:

Herramientas menores, Pulidoras y Taladros

8. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR

Describa los elementos de protección personal que se van a utilizar:

Andamios, Arnés, Eslingas, Lineas de Vida, Casco, Guantes, Gafas, Etc.

9.DATOS Y REQUISITOS DEL TRABAJADOR QUE EJECUTARA EL TRABAJO

#	NOMBRE	CEDULA	FECHA CURSO ALTURAS	FECHA SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	FECHA DE EXAMEN MEDICO (apto para trabajo en alturas)	FIRMA TRABAJADOR
1	RAMON CASTILLO	6935472	12-03-26	22-06-26	10-03-26	RAMON
2	Adrián Gonzales	5130152	17-03-26	22-06-26	10-03-26	Adrian
3	Junior Rodriguez	1168280	17-03-26	22-06-26	12-03-26	JUNIOR
4	DANIEL HERNANDEZ	89-28-27	13-04-26	22-06-26	07-04-26	DANIEL
5						
6						
7						
8						

Al firmar este documento, el trabajador manifiesta que para realizar la labor en alturas anteriormente nombrada tiene la capacidad física y mental para la tarea y su estado de salud es bueno, adicional que se revisaron las certificaciones correspondientes para alturas y examen medico.

10.MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Equipos de Protección Contra Caídas a Utilizar (Marca con una x)

Arnés cuerpo completo	Sí ☒	No ☐	Línea de vida vertical portátil	Sí ☒	No ☐	Punto de anclaje fijo	Sí ☒	No ☐	Mosquetón	Sí ☐	No ☒
línea de vida vertical	Sí ☒	No ☐	Eslinga en y con adsorbedor	Sí ☒	No ☐	Punto de anclaje portátil (tie off)	Sí ☐	No ☒	Freno Arrestador	Sí ☐	No ☒
línea de vida horizontal	Sí ☒	No ☐	Eslinga de posicionamiento	Sí ☒	No ☐	Silla de suspensión	Sí ☐	No ☒	Descendedor	Sí ☐	No ☒

11.MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCIÓN

Medidas a adoptar (Marca con una x)

Delimitación del área	Sí ☒	No ☐	Ayudante de seguridad	Sí ☒	No ☐	Barandas	Sí ☒	No ☐	PermisoT.A	☐	Sí ☒	No ☐

Señalización del area	Sí ☒	No ☐	Manejo de desniveles y orificios (huecos):	Sí ☑	No ☐	Control de acceso	Sí ☑	No ☐	Otro_ ¿Cuál?	

12.SISTEMAS DE ACESSO

Sistema de acceso a utilizar (Marca con una x)

Andamio colgante	Sí ☐	No ☑	Andamio tubular	Sí ☑	No ☐	Escaleras fijas	Sí ☒	No ☐	Escaleras portatiles	Sí ☒ No ☐

13. REQUERIMIENTOS GENERALES - LISTA DE CHEQUEO DIARIA

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se realizó el análisis de trabajo seguro (ATS) y socialización antes de iniciar la labor	C	C	C	C	C	C	
Se realizó charla pero-peracionalantes de iniciar la labor	C	C	C	C	C	C	
Los trabajadores están aptos para desarrollar la labor (estado de salud y con concepto medico vigente)	C	C	C	C	C	C	
los trabajadores están certificados en alturas (curso avanzado y/o re-entrenamiento vigente)	C	C	C	C	C	C	
Se han verificado los sistemas de anclaje	C	C	C	C	C	C	
Caidas de diferente nivel	C	C	C	C	C	C	
Caida al mismo nivel	C	C	C	C	C	C	
El area de trabajo esta libre de obstáculos	C	C	C	C	C	C	
Cambio brusco de temperatura	C	C	C	C	C	C	
Contacto con corriente electrica	C	C	C	C	C	C	
Contacto con partes en movimiento	C	C	C	C	C	C	
Agentes infecciosos	C	C	C	C	C	C	
Presencia de gases y vapores	C	C	C	C	C	C	
Movimientos repetitivos	C	C	C	C	C	C	
Adopcion de posturas inadecuadas	C	C	C	C	C	C	
Caida de objetos	C	C	C	C	C	C	
Manipulacion de elementos cortates	C	C	C	C	C	C	
Proyeccion de particulas	C	C	C	C	C	C	
Manejo de herramientas manuales	C	C	C	C	C	C	
Exposicion a ruido	C	C	C	C	C	C	
Condicion de orden y aseo	C	C	C	C	C	C	
Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo (cinta, conos, señales de tal manera que se pueda aislar o restringir la zona y no se permita el paso de personas ajenos a la labor?	C	C	C	C	C	C	

VERIFICACION DE SISTEMAS DE ACCESO

ANDAMIOS

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Los cuerpos del andamio se encuentran asegurados y cuenta con todas sus piezas (verticales, horizontes, diagonales, pines, llantas o husillo nivelador ?	C	C	C	C	C	C	
Cuenta con area firme para su correcto armado y nivelacion?	C	C	C	C	C	C	
Cuenta contodas sus plataformas y estás estan apoyadas firmemente ?	C	C	C	C	C	C	
La superficie de trabajo se encuentra cubierta por plataformas, libre de huecos?	C	C	C	C	C	C	
Cuenta con escaleras y estas se encuentran aseguradas adecuadamente al andamio?	C	C	C	C	C	C	
El andamio presenta alguna tipo de oxidación o desgaste?	C	C	C	C	C	C	
El andamio esta aislado de líneas o equipos energizados?	C	C	C	C	C	C	
El andamio cuenta con ficha de autorización?	C	C	C	C	C	C	

ESCALERAS

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Las escaleras están en adecuadas condiciones?	C	C	C	C	C	C	
Las bases están apoyadas sobre una superficie plana?	C	C	C	C	C	C	
Esta libre de grasa, aceite u otras sustancias?	C	C	C	C	C	C	
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes?	C	C	C	C	C	C	
El área alrededor de la escalera se encuentra señalizada?	C	C	C	C	C	C	

VERIFICACIÓN EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

ARNES DE CUERPO COMPLETO

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
El arnes cuenta con la ficha de identificacion del fabticante?	C	C	C	C	C	C	
El arnes cuenta con la ficha de fabricacion y inspeccion?	C	C	C	C	C	C	
Las correas del equipo son ajustables?	C	C	C	C	C	C	
El arnes cuenta con la ficha donde esta la fecha de fabricacion y inspeccion?	C	C	C	C	C	C	
El equipo tiene los puntos de conexión necesarios y estan en buen estado, Argollas, hebillas.	C	C	C	C	C	C	
Las eslingas se encuntran sin manchas de pintura, grasa, oxido, quemaduras y/o perforaciones?	C	C	C	C	C	C	
El absorvedor de choque de la eslinga se encuntra sin manchas de pintura, grasa, quemadura y/o perforaciones?	C	C	C	C	C	C	
El tie off se encuntra sin manchas de pintura, grasa, oxido, quemaduras y/o perforaciones?	C	C	C	C	C	C	
La linea de vida cuenta con su ficha en donde se observa la fecha de fabricacion y fabricante?	C	C	C	C	C	C	
La linea de vida se encuentra libre de pintura, grasa, oxido, quemaduras, deshilachamiento y/o perforaciones?	C	C	C	C	C	C	

ESLINGAS DE CARGA

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Cuenta con sus etiquetas legibles y se puede ver la fecha de fabricacion?	C	C	C	C	C	C	
las fibras y costuras están libres de desgaste, deshilachamiento y cortes?	C	C	C	C	C	C	
Las eslingas estan protegidas contra cualquier elemento que genere abracion?	C	C	C	C	C	C	

LINEAS DE VIDAS

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Cuenta con sus etiquetas legibles y se puede ver la fecha de fabricacion?	C	C	C	C	C	C	
las fibras y costuras están libres de oxido, pintura, grasa, deshilachamiento y cortes?	C	C	C	C	C	C	
Funcionamiento de cierre y apertura de los ganchos metálicos es correcto?	C	C	C	C	C	C	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Casco con barbuquejo	C	C	C	C	C	C	
Guantes de seguridad	C	C	C	C	C	C	
Gafas de seguridad	C	C	C	C	C	C	
Tapaoidos	C	C	C	C	C	C	
Careta de esmerilar	NIA	NIA	NIA	NIA	NIA	NIA	
Careta de soldador	NIA	NIA	NIA	NIA	NIA	NIA	
Ropa de trabajo	C	C	C	C	C	C	
Arnes	C	C	C	C	C	C	
Eslinga	C	C	C	C	C	C	
Tie off	NIA	NIA	NIA	NIA	NIA	NIA	

OBSERVACIONES:

APROBACION DEL PERMISO				CIERRE DE PERMISO			
ENCARGADOS	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	ENCARGADOS	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Inspector SST	Adrian M	1064121717		Inspector SST	Adrian M	1064121717	
Residente de obra	Diego P	1014133694		Residente de obra	Diego P.	1014133694	
Maestro o encargado de la actividad	Adrian	5430452	Adrian	Maestro o encargado de la actividad	Adrian	5430452	Adrian
coordinador (TA) de obra	Adrian M	1064121717		coordinador (TA) de obra	Adrian M	1064121717	

TENGA EN CUENTA : SI REQUIERE CAMBIAR DE ACTIVIDAD O LOS EQUIPOS CON LOS CUALES ESTA LABORANDO, INFORME AL ÁREA SST PARA UNA NUEVA INSPECCION.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado Por:
Yinna Blanco Arenas	Miguel Cerón	Miguel Cerón
Responsable SG-SST	Empleador	Empleador

SAFRID	SAFRID INGENIERIA S.A.S	CODIGO: SAF-PRC-025
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	VERSIÓN: 2
		FECHA:May-2022

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: 25 | 05 | 26 (DIA | MES | AÑO)

HORA DE INICIO: 7:00 am

PERMISO VÁLIDO HASTA: 31 | 05 | 26 (DIA | MES | AÑO)

HORA DE FINALIZACIÓN: 4:00 pm

EMPRESA EJECUTORA: Consorcio Adecuaciones Pisaf

Nº CONTRATO: 02 Pisa

ÁREA O LUGAR: Colegio Diego Montañas

Nº PERSONAS EJECUTORAS: 02 Personas

ACTIVIDAD A REALIZAR: Cork de Drywall

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pulideras, Taladros.

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [X] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutara el trabajo está libre de sustancias quimicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona, estan en bueb estado?	X		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	X		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	X		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	X		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?			X
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	X		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?			X
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	X		
¿Los electrodos y cables se encuentran en buen estado?			X
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			X

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	X		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura			X
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.			X
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.			X

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	X	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES		X

5 Requerimientos adicionales	SI	NO
1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura.	X	
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados.		X
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo?		X

6 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

SUSPENSIÓN DEL PERMISO: (Cualquier persona que supervisa la actividad evidencia incumplimiento en el procedimiento puede suspender el trabajo y debe notificar inmediatamente al encargado de SST del lugar de trabajo.

Motivos de la suspensión:

Fecha y hora de la suspensión:

Suspensión realizada por:

EJECUTORES

Item	Nombre y apellido	Cedula	Cargo	Firma
1	Adrian Gonzalez	5430752	OFICIAL	
2	Junior Rodriguez	1116828053	OFICIAL	
3				
4				
5				
6				
7				

RENOVACIÓN

Tiempo de validación del permiso(fecha).

Hora: Desde-Hasta.

Autorizado por: Supervisado por:

Número de personas que ejecutan la actividad:

OBSERVACIONES:

Solo diligenciar personal a cargo (JEFE INMEDIATO, ENCARGADO, ENCARGADO DE SST)

Item	Nombre y apellido	Cedula	Cargo	Firma
1	Adrian Martinez	1064117217	Insp. SST	
2				
3				
4				

TRABAJO TERMINADO

¿Finalizo el trabajo?

Si no a finalizado explique porque

El área de trabajo quedo limpia y ordenada

Fecha:

Hora:

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
SST	Rep. Legal	Rep. Legal

SAFRID ingeniería sas

INSPECCION DE PULIDORA

Código: SAF-FOR-096
Fecha: Nov 2021
Versión: 02

PROYECTO: Colegio Diego Montañas AREA: Cornizas

IDENTIFICACION DEL EQUIPOS SERIE Y /O MARCA: Dewalt.

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Corte de Drywall

No	INDICADOR PARA EVALUAR LA CORTADORA	FECHA DESDE: 25/05/2026 HASTA: 31/05/2026 — CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A — Marque con una X según corresponda																				OBSERVACIONES
		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
1	¿ El cable de alimentación esta libre de cortes, aplastamientos, empalmes y la clavija no presenta daños ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
2	¿ El cuerpo de la pulidora esta libre de fisuras y golpes ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	¿ La pulidora cuenta con mango auxiliar, y está ajustado ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	¿ El interruptor o botón de encendido funciona correctamente de acuerdo al manual ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	¿ La rosca o tuerca de sujeción del disco ajusta correctamente ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6	¿ El botón de bloqueo del eje fuciona correctamente de acuerdo al manual ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	¿ La pullidora cuenta con protector del disco-guarda de seguridad y el seguro ajusta correctamente ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	¿ El disco que va a utilizar es acorde con el tamaño de la pulidora, esta completo y libre de fisuras ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	¿ las rejillas de ventilación de la pulidora están completas y libres de obstrucción ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						

FIRMA OPERARIO AUTORIZADO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Adrian Gonzales	Oficial	Adrian	Adrian	Adrian	Adrian	Adrian	Adrian

FIRMA INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Adrian Martinez	Insp. SST						

Yinna Blanco Arenas		
Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Coordinador SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal

SAFRID ingeniería sas	INSPECCION DE TALADRO	Código: SAF-FOR-044 Fecha: Abril 2022 Versión: 01

PROYECTO: Colegio Diego Montañas

MARCA TALADRO: Bosch 11 | PROPIO: X | ALQUILADO:

INDIQUE CON UNA X B=Si el componente esta en Buenas condiciones o M= Si el componente esta en malas condiciones

ÍTEM	FECHA: 25 ost 2026										31 ost 2026	
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADOS	
	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
Estado de gatillo de velocidad variable	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de boton de bloqueo encendio	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de conmutador de funciones de rotacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de boton de avance y reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de mandril	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de protector de cable con sujeta llave	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de cable electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de mango lateral	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de mango principal	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de llave Mandril	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
El trabajador esta instruido sobre el correcto	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
uso y manejo del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

NOTA: Toda anomalia detectada, avisar al Inspector SST para solucionar el problema, pero recuerde siempre

OBSERVACIONES

APROBADO SI X NO ___	CON RESTRICCIÓN SI ___ NO X

OPERADOR

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Adrian Gonzales	oficial	Adrian

INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Adrian Martinez	Insp. SST	

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Coordinador SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal

SAFRID ingeniería sas

INSPECCION DE TALADRO

Código: SAF-FOR-044
Fecha: Abril 2022
Versión: 01

PROYECTO: Colegio Diego Montañas Villa H.

MARCA TALADRO:

PROPIO: X | ALQUILADO:

INDIQUE CON UNA X B=Si el componente esta en Buenas condiciones o M= Si el componente esta en malas condiciones

FECHA: 25/05/2026 - 31/05/2026

ÍTEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADOS	
	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
Estado de gatillo de velocidad variable	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de boton de bloqueo encendio	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de conmutador de funciones de rotacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de boton de avance y reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de mandril	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de protector de cable con sujeta llave	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de cable electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de mango lateral	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de mango principal	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de llave Mandril	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
El trabajador esta instruido sobre el correcto	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
uso y manejo del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

NOTA: Toda anomalia detectada, avisar al Inspector SST para solucionar el problema, pero recuerde siempre

OBSERVACIONES

APROBADO	CON RESTRICCIÓN
SI X NO ___	SI ___ NO X

OPERADOR

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Junior Gonzales	OFICIAL	Junior

INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Adrian Martinez	Insp. SST	

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Ceron	Ing. Miguel Ceron
Coordinador SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal

SAFRID ingeniería sas	INSPECCION DE HERRAMIENTA	Código: SAF-FOR-098
		Fecha:Nov 2021
		Versión: 02

FECHA: 25/05/2026

OBRA: Colegio Diego Montañas.

DESCRIPCIÓN	FECHA DESDE: 25/05/2026 HASTA: 31/05/2026. CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A. Marque con una X según corresponda																				
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
HERRAMIENTAS MANUALES																					
Se usa la adecuada al trabajo	/			/			/			/			/			/					
Se encuentran en buen estado	/			/			/			/			/			/					
Se guardan y portan adecuadamente	/			/			/			/			/			/					
Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	/			/			/			/			/			/					
HERRAMIENTAS DE CORTE																					
Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	/			/			/			/			/			/					
Los cinceles se encuentran afilados	/			/			/			/			/			/					
Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	/			/			/			/			/			/					
Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	/			/			/			/			/			/					
Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	/			/			/			/			/			/					
Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	/			/			/			/			/			/					
Los cuchillos disponen de mangos y fundas	/			/			/			/			/			/					
HERRAMIENTAS DE GOLPE																					
Se emplea el martillo adecuado según la labor	/			/			/			/			/			/					
Sus caras y bordes están en buen estado	/			/			/			/			/			/					
Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	/			/			/			/			/			/					
HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES																					
Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			/			/			/			/			/			/			
Se observan en la llave huellas y palancas			/			/			/			/			/			/			
Se dispone de llaves para golpear			/			/			/			/			/			/			
Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			/			/			/			/			/			/			
La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			/			/			/			/			/			/			
La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado			/			/			/			/			/			/			
Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			/			/			/			/			/			/			
HERRAMIENTAS ELECTRICAS																					
Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			/			/			/			/			/			/			
Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada			/			/			/			/			/			/			
Están limpia y lubricadas			/			/			/			/			/			/			
Tienen sus guardas			/			/			/			/			/			/			
Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas			/			/			/			/			/			/			
El cable y enchufe no presentan daños			/			/			/			/			/			/			
En los taladros se observa el mandil con golpes			/			/			/			/			/			/			

Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
HERRAMIENTA NEUMATICA																						
Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se trabaja a las presiones indicadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
La herramienta es descargada al terminar.			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
HERRAMIENTA POR DETONACION			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
El personal es autorizado			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Emplean los elementos de protección			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se descarga y es almacenada			✓			✓			✓			✓			✓			✓				

OBSERVACIONES:

FIRMA INSPECTOR								
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA						
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Adrian Martinez	Insp. SST							

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Ceron	Ing. Miguel Ceron
Responsables SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal
Elaboró	Revisó	Aprobado

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: Abril 2022
		Version:03

CHARLA:		CAPACITACIÓN:	X	REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C. 25/05/2026
DURACIÓN:	25 min
TEMA:	Responsabilidades SST
EXPOSITOR:	Adrian Martinez
TOTAL ASISTENCIA:	04 Personas

El trabajador firma en constancia de:
1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	RAMON CASTILLO	6935472	AYUDANTE	RAMON
2	Adrian Gonzales	5430452	OFICIAL	Adrian
3	Junior Rodriguez	1116828053	OFICIAL	JUNIOR
4	DANIEL HERNANDE	99-78-27	AYUDANTE	DANIEL
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Colegio Diego Montaña.

FIRMA EXPOSITOR

Yinna Blanco Arenas		
Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: Abril 2022
		Version:03

CHARLA:		CAPACITACIÓN:	X	REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C 27/05/2026
DURACIÓN:	10 min
TEMA:	Salud Mental
EXPOSITOR:	Adrian Martinez
TOTAL ASISTENCIA:	04 Personas

El trabajador firma en constancia de:
1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Junior Rodriguez	1116828053	OFICIAL	Junior
2	RAMON CASTILLO	6935472	AYUDANTE	Ramon
3	Adrian Gonzalez	5430452	OFICIAL	Adrian
4	DANIEL HERNANDES	89-2877	AYUDANTE	DANIEL
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Colegio Diego Montaña.

FIRMA EXPOSITOR

Yinna Blanco Arenas		
Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: Abril 2022
		Version:03

CHARLA:		CAPACITACIÓN:	X	REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	

CIUDAD Y FECHA:	Bogota D.C 29/05/2026
DURACIÓN:	20 min
TEMA:	Reciclaje de Materiales.
EXPOSITOR:	Adrian Martinez
TOTAL ASISTENCIA:	04 Personas

El trabajador firma en constancia de:
1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Adrian Gonzales	5430452	OFICIAL	Adrian
2	Junior Rodriguez	1116828053	OFICIAL	Junior
3	RAMON CASTILLO	69354472	AYUDANTE	RAMON
4	DANIEL HERNANDEZ	99-78-77	AYUDANTE	DANIEL
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Colegio Diego Montañas.

FIRMA EXPOSITOR

Yinna Blanco Arenas		
Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

SAFRID ingeniería sas Obras civiles y arquitectura	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS (EPCC)	CÓDIGO: FOR-SAF-061 FECHA: 2022 VERSIÓN: 03 Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)				
NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	CARGO	UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:
Ramon Castillo	PPT	6935472	Ay	C. Diego M.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por CONSORCIO MANTENIMEIMTOS ARDISAF con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12): Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST
El presente compromiso quedará archivado en el Área SST para los fines pertinentes."

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Guantes	1	25/05/26	RAMON
2	Gafas	1	25/05/26	RAMON
3	Tapabocas	1	25/05/26	RAMON
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1				
2				
3				
4				
5				
6				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Adrian Martinez	1064121117	Insp. SST	

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Gerón	Ing. Miguel Gerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

SAFRID ingeniería sas	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS (EPCC)	CÓDIGO: FOR-SAF-061
		FECHA: 2022
		VERSIÓN: 03
		Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)				
NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	CARGO	UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:
Adrian Gonzalez	PPT	5430452	Of	C. Diego M.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por CONSORCIO MANTENIMEIMTOS ARDISAF con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCION 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12): Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST
El presente compromiso quedará archivado en el Área SST para los fines pertinentes."

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Guantes	1	25/05/26	Adrian
2	Gafas	1	25/05/26	Adrian
3	Tapabocas	1	25/05/26	Adrian
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1				
2				
3				
4				
5				
6				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Adrian Martinez	1064121217	Insp. SST	

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

SAFRID ingeniería sas	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS (EPCC)	CÓDIGO: FOR-SAF-061 FECHA: 2022 VERSIÓN: 03 Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)				
NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	CARGO	UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:
Junior Rodriguez	CC	1116828053	Of	C. Diego M.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por CONSORCIO MANTENIMEIMTOS ARDISAF con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12): Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST
El presente compromiso quedará archivado en el Área SST para los fines pertinentes."

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Guantes	1	25/05/26	Junior
2	Gafas	1	25/05/26	Junior
3	Tapabocas	1	25/05/26	Junior
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1				
2				
3				
4				
5				
6				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Adrian Martinez	1064121217	Insp. SST	

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Gerón	Ing. Miguel Gerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

SAFRID ingeniería sas	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS (EPCC)	CÓDIGO: FOR-SAF-061 FECHA: 2022 VERSIÓN: 03 Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)				
NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	CARGO	UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:
Daniel Hernandez	PPT	892827	Ay	C. Diego M.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por CONSORCIO MANTENIMEIMTOS ARDISAF con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122. sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12): Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST
El presente compromiso quedará archivado en el Área SST para los fines pertinentes."

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Guantes	1	25/05/26	DANIEL
2	Gafas	1	25/05/26	DANIEL
3	Tapabocas.	1	25/05/26	DANIEL
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1				
2				
3				
4				
5				
6				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Adrian Martinez	1064121217	Insp. SST	

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Gerón	Ing. Miguel Gerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

53

SAFRID	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Codigo	SAF-FOR-074
		Fecha	Mar24
		Version	Versión: 1.0

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

Contrato N°: CO1.PCCNTR.8155135	Ciudad: Bogotá D.C.
Objeto del contrato: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – LOTE 4	Ubicación donde se realiza el trabajo: (frente de obra): Colegio Diego Montañas.
Fecha de Inicio 18/05/2026	Fecha de final: 24/05/2026
Descripción de la tarea a realizar: Desmonte e Instalación de Eternit, Resanes, Estucado y Pintura.	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADORES	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO		CARGO	FIRMA						
				LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DANIEL HERNANDEZ	PPT	89-28-77	AYUDANTE		DANIEL	DANIEL	DANIEL	DANIEL	DANIEL	
Adrian Gonzalez	PPT	54304152	OFICIAL		Adrian	Adrian	Adrian	Adrian	Adrian	
RAMON CASTILLO	PPT	6935472	AYUDANTE		RAMON	RAMON	RAMON	RAMON	RAMON	
Junior Rodriguez	CC	1116828053	OFICIAL		Junior	Junio	Junior	Junior	Junior	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
Manuales	X	*Martillo, metro, cegueta, llana metalica, rodillo, valdes, espatula, brochas, lija*
Electricas		*Extensiones*
Hidráulicas		NA
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Trabajos a nivel
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	No aplica
¿Se han realizado los calculos de la distancia de caida?	No aplica
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	NA
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco con barbuquejo, gafas de protección, tapaodios, guantes, botas de seguridad,ropa de trabajo, camisa manga larga
¿Cuántos trabajadores se requieren?	4
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pintura, estuco, enchape, madera, barandas, agua, cemento, pegacor.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NA
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Electricidad, superficies poco resistentes,chispas, objetos filosos, condiciones climaticas.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Alistamiento de herramientas , materiales y equi	Caidas caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones , muerte.	Orden y aseo, almacenar adecuadamente las herramientas y equipos de alturas, evitar bromas durante estas actividades, uso de elementos de proteccion personal. Identificar que herraminta necesita y que no , no lleve cosas que no necesite, Inspecione los equipos de alturas que va a utlizar verifique etiquetas , estado de correas , partes metalicas , ajuste correcto de los ganchos.
Dirigirse a el área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Dirijase a el área de trabajo de forma ordenada , evite realizar bromas , durante el recorrido no pierda de vista sus herramientas y sus equipos si debe desplazarse por fuera de la plaza, lleve siempre ubicado su casco de seguridad como debe ser, evite retirarlo por cualquier motivo, acceda a el lugar de trabajo por el lugar autorizado.

Acceder al área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo, caica de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, muerte.	Firme su ATS ,inspeccione los equipos y herramientas que va a utilizar.
Verificacion de área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos robos, muerte.	Una vez alla llegado al area de trabajo verifique si el area es segura para iniciar labores.
Inicio de labores	Caidas a nivel, golpes, sofreesfuerzos, cortaduras	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos robos, muerte.	Personal con experiencia, acompañamiento permanente, condiciones de salud optimas.
Terminación de tarea	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos robos, muerte.	Una vez terminada la tarea del dia garantice que no queden objetos herramientas o materiales que puedan obsruir e paso y generar incidentes, deje sus área de trabajo en perfecto estado de orden y aseo.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Apellido Residente Obra	Cedula	Firma
Diego Pinzón	1014136674	
Nombre y Apellido Maestro de Obra y/o Encargado de Cuadrilla	**Cedula**	**Firma**
Adrian Gonzales	94304452	Adrian
Nombre y Apellido Residente SST	**Cedula**	**Firma**
Adrian Martinez	1.064.727.217	

Elaboró	Revisó	Aprobó
Ing. Yonna Blanco	Ing. Miguel Cerón M.	Ing. Miguel Cerón M.

SAFRID ingeniería sas	FORMATO PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO:	FOR-SAF-SST-002
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	2024

1.FECHA DE ELABORACION DE PERMISO:	18/05/2026		
2.LUGAR ESPECIFICO DE LA ACTIVIDAD:	Colegio Diego Montañas - Comizas		
3.ALTURA APROX. DE LA ACTIVIDAD:	8 mts		
4.FECHA DE INICIO:	18/05/2026	FECHA FINAL:	24/05/2026
5.HORA DE INICIO :	7:00 am	HORA FINAL:	4:00 pm

6. TIPO DE TRABAJO A REALIZAR

Describa la actividad que se va a realizar:

Desmonte e Instalación de estibal, Resanes, Estucado y Pintura

7. TIPO DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Describa las herramientas que se van a utilizar:

Herramientas menores, Pulidoras, Taladros

8. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR

Describa los elementos de protección personal que se van a utilizar:

Andamios, Arnés, Eslingas, Casco, Guantes, Gafas, Tapabocas, Etc.

9. DATOS Y REQUISITOS DEL TRABAJADOR QUE EJECUTARA EL TRABAJO

#	NOMBRE	CEDULA	FECHA CURSO ALTURAS	FECHA SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	FECHA DE EXAMEN MEDICO (apto para trabajo en alturas)	FIRMA TRABAJADOR
1	DANIEL HERNANDEZ	89-28-27	13-04-26	22-06-26	07-04-26	DANIEL
2	RAMON CASTILLO	6935472	12-03-26	22-06-26	10-03-26	RAMON
3	Adrian Gonzales	5430452	12-03-26	22-06-26	10-03-26	Adrian
4	Junior Rodriguez	M1683	12-03-26	22-06-26	12/03-26	JUNIOR
5						
6						
7						
8						

Al firmar este documento, el trabajador manifiesta que para realizar la labor en alturas anteriormente nombrada tiene la capacidad física y mental para la tarea y su estado de salud es bueno, adicional que se revisaron las certificaciones correspondientes para alturas y examen medico.

10.MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Equipos de Protección Contra Caídas a Utilizar (Marca con una x)

Arnés cuerpo completo	Sí	X	No		Línea de vida vertical portátil	Sí	X	No		Punto de anclaje fijo	Sí		No	X	Mosquetón	Sí		No	X
línea de vida vertical	Sí	X	No		Eslinga en y con adsorbedor	Sí	X	No		Punto de anclaje portátil (tie off)	Sí		No	X	Freno Arrestador	Sí		No	X
línea de vida horizontal	Sí		No	X	Eslinga de posicionamiento	Sí	X	No		Silla de suspensión	Sí		No	X	Descendedor	Sí		No	X

11.MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCIÓN

Medidas a adoptar (Marca con una x)

Delimitación del área	Sí	X	No		Ayudante de seguridad	Sí	X	No		Barandas	Sí	X	No		PermisoT.A		Sí	X	No	

Señalización del area	Sí ☑	No ☐	Manejo de desniveles y orificios (huecos):	Sí ☑	No ☐	Control de acceso	Sí ☑	No ☐	Otro_ ¿Cuál?	

12.SISTEMAS DE ACESSO

Sistema de acceso a utilizar (Marca con una x)

Andamio colgante	Sí ☐	No ☑	Andamio tubular	Sí ☑	No ☐	Escaleras fijas	Sí ☐	No ☒	Escaleras portatiles	Sí ☑ No ☐

13. REQUERIMIENTOS GENERALES - LISTA DE CHEQUEO DIARIA

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE, (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se realizó el análisis de trabajo seguro (ATS) y socialización antes de iniciar la labor		C	C	C	C	C	
Se realizó charla pero-peracionalantes de iniciar la labor		C	C	C	C	C	
Los trabajadores están aptos para desarrollar la labor (estado de salud y con concepto medico vigente)		C	C	C	C	C	
los trabajadores están certificados en alturas (curso avanzado y/o re-entrenamiento vigente)		C	C	C	C	C	
Se han verificado los sistemas de anclaje		C	C	C	C	C	
Caidas de diferente nivel		C	C	C	C	C	
Caida al mismo nivel		C	C	C	C	C	
El area de trabajo esta libre de obstáculos		C	C	C	C	C	
Cambio brusco de temperatura		C	C	C	C	C	
Contacto con corriente electrica		C	C	C	C	C	
Contacto con partes en movimiento		C	C	C	C	C	
Agentes infecciosos		C	C	C	C	C	
Presencia de gases y vapores		C	C	C	C	C	
Movimientos repetitivos		C	C	C	C	C	
Adopcion de posturas inadecuadas		C	C	C	C	C	
Caida de objetos		C	C	C	C	C	
Manipulacion de elementos cortates		C	C	C	C	C	
Proyeccion de particulas		C	C	C	C	C	
Manejo de herramientas manuales		C	C	C	C	C	
Exposicion a ruido		C	C	C	C	C	
Condicion de orden y aseo		C	C	C	C	C	
Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo (cinta, conos, señales de tal manera que se pueda aislar o restringir la zona y no se permita el paso de personas ajenos a la labor?		C	C	C	C	C	

VERIFICACION DE SISTEMAS DE ACCESO

ANDAMIOS

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Los cuerpos del andamio se encuentran asegurados y cuenta con todas sus piezas (verticales, horizontes, diagonales, pines, llantas o husillo nivelador ?		C	C	C	C	C	
Cuenta con area firme para su correcto armado y nivelacion?		C	C	C	C	C	
Cuenta contodas sus plataformas y estás estan apoyadas firmemente ?		C	C	C	C	C	
La superficie de trabajo se encuentra cubierta por plataformas, libre de huecos?		C	C	C	C	C	
Cuenta con escaleras y estas se encuentran aseguradas adecuadamente al andamio?		C	C	C	C	C	
El andamio presenta alguna tipo de oxidación o desgaste?		C	C	C	C	C	
El andamio esta aislado de lineas o equipos energizados?		C	C	C	C	C	
El andamio cuenta con ficha de autorización?		C	C	C	C	C	

ESCALERAS

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Las escaleras están en adecuadas condiciones?		C	C	C	C	C	
Las bases están apoyadas sobre una superficie plana?		C	C	C	C	C	
Esta libre de grasa, aceite u otras sustancias?		C	C	C	C	C	
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes?		C	C	C	C	C	
El área alrededor de la escalera se encuentra señalizada?		C	C	C	C	C	

VERIFICACIÓN EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

ARNES DE CUERPO COMPLETO

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
El arnes cuenta con la ficha de identificacion del fabticante?		C	C	C	C	C	
El arnes cuenta con la ficha de fabricacion y inspeccion?		C	C	C	C	C	
Las correas del equipo son ajustables?		C	C	C	C	C	
El arnes cuenta con la ficha donde esta la fecha de fabricacion y inspeccion?		C	C	C	C	C	
El equipo tiene los puntos de conexión necesarios y estan en buen estado, Argollas, hebillas.		C	C	C	C	C	
Las eslingas se encuntran sin manchas de pintura, grasa, oxido, quemaduras y/o perforaciones?		C	C	C	C	C	
El absorvedor de choque de la eslinga se encuntra sin manchas de pintura, grasa, quemadura y/o perforaciones?		C	C	C	C	C	
El tie off se encuntra sin manchas de pintura, grasa, oxido, quemaduras y/o perforaciones?		C	C	C	C	C	
La linea de vida cuenta con su ficha en donde se observa la fecha de fabricacion y fabricante?		C	C	C	C	C	
La linea de vida se encuentra libre de pintura, grasa, oxido, quemaduras, deshilachamiento y/o perforaciones?		C	C	C	C	C	

ESLINGAS DE CARGA

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Cuenta con sus etiquetas legibles y se puede ver la fecha de fabricacion?		C	C	C	C	C	
las fibras y costuras están libres de desgaste, deshilachamiento y cortes?		C	C	C	C	C	
Las eslingas estan protegidas contra cualquier elemento que genere abracion?		C	C	C	C	C	

LINEAS DE VIDAS

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Cuenta con sus etiquetas legibles y se puede ver la fecha de fabricacion?		C	C	C	C	C	
las fibras y costuras están libres de oxido, pintura, grasa, deshilachamiento y cortes?		C	C	C	C	C	
Funcionamiento de cierre y apertura de los ganchos metálicos es correcto?		C	C	C	C	C	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Casco con barbuquejo		C	C	C	C	C	
Guantes de seguridad		C	C	C	C	C	
Gafas de seguridad		C	C	C	C	C	
Tapaoidos		C	C	C	C	C	
Careta de esmerilar		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Careta de soldador		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Ropa de trabajo		C	C	C	C	C	
Arnes		C	C	C	C	C	
Eslinga		C	C	C	C	C	
Tie off		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

OBSERVACIONES:

APROBACION DEL PERMISO

ENCARGADOS	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Inspector SST	Adrian M	1064121217	
Residente de obra	Diego D	1014173694	
Maestro o encargado de la actividad	Adrian	5.130.152	Adrian
coordinador (TA) de obra	Adrian M	1064121217	

CIERRE DE PERMISO

ENCARGADOS	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Inspector SST	Adrian M	1064121217	
Residente de obra	Diego Pinzón	1014137694	
Maestro o encargado de la actividad	Adrian	5.130.152	Adrian
coordinador (TA) de obra	Adrian M	1064121217	

TENGA EN CUENTA : SI REQUIERE CAMBIAR DE ACTIVIDAD O LOS EQUIPOS CON LOS CUALES ESTA LABORANDO, INFORME AL ÁREA SST PARA UNA NUEVA INSPECCION.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado Por:
Yinna Blanco Arenas	Miguel Cerón	Miguel Cerón
Responsable SG-SST	Empleador	Empleador

SAFRID ingeniería sas	SG-SST	CODIGO: SAF-PRC-025
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	VERSIÓN: 1
		FECHA: 08-2024

1 Generalidades

FECHA DE INICIO:	DIA (dos) 18	MES (dos) 05	AÑO (dos) 26	PERMISO VÁLIDO HASTA:	DIA (dos) 24	MES (dos) 05	AÑO (dos) 26
HORA DE INICIO	7:00 am			HORA DE FINALIZACIÓN	4:00 pm		

EMPRESA EJECUTORA: Consorcio Adecuaciones Assaf — N° CONTRATO: 3416 - 2025

ÁREA O LUGAR: Colegio Diego Montaña - Cormas — N° PERSONAS EJECUTORAS:

ACTIVIDAD A REALIZAR: Corte de Electroducto

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Soldadoras, Taladros.

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [X] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona, estan en bueb estado?	X		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	X		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	X		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	X		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?			X
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	X		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?			X
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	X		
¿Los electrodos y cables se encuentran en buen estado?			X
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			X

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	X		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura			X
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.			X
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.			X

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	X	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES		X

5 Requerimientos adicionales	SI	NO
1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura.	X	
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados.		X
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo?		X

6 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

SUSPENSIÓN DEL PERMISO: (Cualquier persona que supervisa la actividad evidencia incumplimiento en el procedimiento puede suspender el trabajo y debe notificar inmediatamente al encargado de SST del lugar de trabajo.

Motivos de la suspensión:

Fecha y hora de la suspensión:

Suspensión realizada por:

EJECUTORES

Ítem	Nombre y apellido	Cedula	Cargo	Firma
1	Adrian Gonzalez	5'130.153	OFICIAL	Adrian
2	Junior Rodriguez	MI6 828053	OFICIAL	Junior
3				
4				
5				
6				
7				

RENOVACIÓN

Tiempo de validación del permiso(fecha).

Hora; Desde-Hasta.

Autorizado por: | Supervisado por:

Número de personas que ejecutan la actividad:

OBSERVACIONES:

Solo diligenciar personal a cargo (JEFE INMEDIATO, ENCARGADO, ENCARGADO DE SST)

Ítem	Nombre y apellido	Cedula	Cargo	Firma
1	Adrian Martinez	1064121217	Insp. SST	
2				
3				
4				

TRABAJO TERMINADO

¿Finalizo el trabajo?

Si no a finalizado explique porque

El área de trabajo quedo limpia y ordenada

Fecha:

Hora:

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Coordinador SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal

SAFRID ingeniería sas

INSPECCION DE PULIDORA

Código: SAF-FOR-096
Fecha: Nov 2021
Versión: 02

PROYECTO: Colegio Diego Montañas. AREA: Cornizas

IDENTIFICACION DEL EQUIPOS SERIE Y /O MARCA: Dewalt

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Corte de Ekiboal

No	INDICADOR PARA EVALUAR LA CORTADORA	FECHA DESDE: 18/05/2026 HASTA: 24/05/2026 — CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A — Marque con una X según corresponda																					OBSERVACIONES
		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
1	¿ El cable de alimentación esta libre de cortes, aplastamientos, empalmes y la clavija no presenta daños ?				/			/			/			/			/						
2	¿ El cuerpo de la pulidora esta libre de fisuras y golpes ?				/			/			/			/			/						
3	¿ La pulidora cuenta con mango auxiliar, y está ajustado ?				/			/			/			/			/						
4	¿ El interruptor o botón de encendido funciona correctamente de acuerdo al manual ?				/			/			/			/			/						
5	¿ La rosca o tuerca de sujeción del disco ajusta correctamente ?				/			/			/			/			/						
6	¿ El botón de bloqueo del eje fuciona correctamente de acuerdo al manual ?				/			/			/			/			/						
7	¿ La pullidora cuenta con protector del disco-guarda de seguridad y el seguro ajusta correctamente ?				/			/			/			/			/						
8	¿ El disco que va a utilizar es acorde con el tamaño de la pulidora, esta completo y libre de fisuras ?				/			/			/			/			/						
9	¿ las rejillas de ventilación de la pulidora están completas y libres de obstrucción ?				/			/			/			/			/						

FIRMA OPERARIO AUTORIZADO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA					
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Junior Rodriguez	oficial		Junior	Junior	Junior	Junior	Junior

FIRMA INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA					
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Adrian Martinez	Insp. SST						

Yinna Blanco Arenas		
Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Ceron	Ing. Miguel Ceron
Coordinador SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal

SAFRID ingeniería sas

INSPECCION DE PULIDORA

Código: SAF-FOR-096
Fecha: Nov 2021
Versión: 02

PROYECTO: Colegio Diego Montañas
AREA: Cornizas
IDENTIFICACION DEL EQUIPOS SERIE Y /O MARCA: Dewalt
DESCRIPCION DEL TRABAJO: Corte de Ceramica

FECHA — DESDE: 18/05/2026 HASTA: 24/05/2026

CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A

Marque con una X según corresponda

No	INDICADOR PARA EVALUAR LA CORTADORA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
1	¿ El cable de alimentación esta libre de cortes, aplastamientos, empalmes y la clavija no presenta daños ?				✓			✓			✓			✓			✓						
2	¿ El cuerpo de la pulidora esta libre de fisuras y golpes ?				✓			✓			✓			✓			✓						
3	¿ La pulidora cuenta con mango auxiliar, y está ajustado ?				✓			✓			✓			✓			✓						
4	¿ El interruptor o botón de encendido funciona correctamente de acuerdo al manual ?				✓			✓			✓			✓			✓						
5	¿ La rosca o tuerca de sujeción del disco ajusta correctamente ?				✓			✓			✓			✓			✓						
6	¿ El botón de bloqueo del eje fuciona correctamente de acuerdo al manual ?				✓			✓			✓			✓			✓						
7	¿ La pullidora cuenta con protector del disco-guarda de seguridad y el seguro ajusta correctamente ?				✓			✓			✓			✓			✓						
8	¿ El disco que va a utilizar es acorde con el tamaño de la pulidora, esta completo y libre de fisuras ?				✓			✓			✓			✓			✓						
9	¿ las rejillas de ventilación de la pulidora están completas y libres de obstrucción ?				✓			✓			✓			✓			✓						

FIRMA OPERARIO AUTORIZADO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Adrian Gonzalez	oficial		Adrian	Adrian	Adrian	Adrian	Adrian

FIRMA INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Adrian Martinez	Insp. SST		✓	✓	✓	✓	✓

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Coordinador SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal

SAFRID ingeniería sas

INSPECCION DE TALADRO

Código: SAF-FOR-044
Fecha: Abril 2022
Versión: 01

PROYECTO: Colegio Diego Montañas

MARCA TALADRO: Dewalt | PROPIO: X | ALQUILADO:

INDIQUE CON UNA X B=Si el componente esta en Buenas condiciones o M= Si el componente esta en malas condiciones

ÍTEM	FECHA 18/05/2026										24/05/2026	
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADOS	
	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
Estado de gatillo de velocidad variable			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de boton de bloqueo encendio			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de conmutador de funciones de rotacion			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de boton de avance y reversa			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de mandril			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de protector de cable con sujeta llave			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de cable electrico			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de mango lateral			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de mango principal			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de llave Mandril			✓		✓		✓		✓		✓	
El trabajador esta instruido sobre el correcto			✓		✓		✓		✓		✓	
uso y manejo del equipo			✓		✓		✓		✓		✓	

NOTA: Toda anomalia detectada, avisar al Inspector SST para solucionar el problema, pero recuerde siempre

OBSERVACIONES

APROBADO SI X NO	CON RESTRICCIÓN SI NO X

OPERADOR

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Junior Rodriguez	OFICIAL	JUNIOR

INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Adrian Martinez	Insp. SST	

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Coordinador SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal

SAFRID ingeniería sas

INSPECCION DE TALADRO

Código: SAF-FOR-044
Fecha: Abril 2022
Versión: 01

PROYECTO: Colegio Diego Montañas

MARCA TALADRO: Dewalt | PROPIO: X | ALQUILADO:

INDIQUE CON UNA X B=Si el componente esta en Buenas condiciones o M= Si el componente esta en malas condiciones

FECHA: 18/05/2026 — 24/05/2026

ÍTEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADOS	
	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
Estado de gatillo de velocidad variable			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de boton de bloqueo encendio			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de conmutador de funciones de rotacion			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de boton de avance y reversa			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de mandril			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de protector de cable con sujeta llave			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de cable electrico			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de mango lateral			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de mango principal			✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de llave Mandril			✓		✓		✓		✓		✓	
El trabajador esta instruido sobre el correcto			✓		✓		✓		✓		✓	
uso y manejo del equipo			✓		✓		✓		✓		✓	

NOTA: Toda anomalia detectada, avisar al Inspector SST para solucionar el problema, pero recuerde siempre

OBSERVACIONES

APROBADO SI X NO ___ | CON RESTRICCIÓN SI ___ NO X

OPERADOR

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Adrian Gonzales	OFICIAL	Adrian

INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Adrian Martinez	Insp. SST	

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Ceron	Ing. Miguel Ceron
Coordinador SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal

SAFRID ingeniería sas	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	Código: SAF-FOR-100 Fecha: ENE-2025 Versión: 01

PROYECTO	Colegio Diego Montañas.	
NOMBRE ENCARGADO	RAMON CASTILLO	FIRMA RAMON

Marque con una X según corresponda

DESCRIPCION	FECHA DD	MM	AA	DIA			OBSERVACIONES
Areas de trabajo limpias y ordenadas	18	05	26	LUN	C		Festivo
					NC	x	
	19	05	26	MAR	C	x	Ninguna
					NC		
	20	05	26	MIE	C	x	Ninguna
					NC		
	21	05	26	JUE	C	x	Ninguna
					NC		
	22	05	26	VIE	C	x	Ninguna
					NC		
	23	05	26	SAB	C	x	Ninguna
					NC		

FIRMA INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Adrian Martinez	Insp. SST	

SAFRID ingeniería sas

INSPECCION DE HERRAMIENTA

Código: SAF-FOR-098
Fecha:Nov 2021
Versión: 02

FECHA: 18/05/2026

OBRA: Colegio Diego Montañas.

DESCRIPCIÓN	FECHA DESDE: 18/05/2026 HASTA: 24/05/2026 — CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A — Marque con una X según corresponda																							
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO					
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
HERRAMIENTAS MANUALES																								
Se usa la adecuada al trabajo				/			/			/			/			/								
Se encuentran en buen estado				/			/			/			/			/								
Se guardan y portan adecuadamente				/			/			/			/			/								
Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.				/			/			/			/			/								
HERRAMIENTAS DE CORTE																								
Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo				/			/			/			/			/								
Los cinceles se encuentran afilados				/			/			/			/			/								
Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes				/			/			/			/			/								
Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos				/			/			/			/			/								
Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias				/			/			/			/			/								
Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos				/			/			/			/			/								
Los cuchillos disponen de mangos y fundas				/			/			/			/			/								
HERRAMIENTAS DE GOLPE																								
Se emplea el martillo adecuado según la labor				/			/			/			/			/								
Sus caras y bordes están en buen estado				/			/			/			/			/								
Su mango no está quebrado, astillado ni flojo				/			/			/			/			/								
HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES																								
Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas						/			/			/			/			/						
Se observan en la llave huellas y palancas						/			/			/			/			/						
Se dispone de llaves para golpear						/			/			/			/			/						
Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas						/			/			/			/			/						
La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente						/			/			/			/			/						
La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado						/			/			/			/			/						
Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.						/			/			/			/			/						
HERRAMIENTAS ELECTRICAS																								
Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)						/			/			/			/			/						
Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada						/			/			/			/			/						
Están limpia y lubricadas						/			/			/			/			/						
Tienen sus guardas						/			/			/			/			/						
Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas						/			/			/			/			/						
El cable y enchufe no presentan daños						/			/			/			/			/						
En los taladros se observa el mandil con golpes						/			/			/			/			/						

Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños																						
Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados																						
Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve																						
Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.																						
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados																						
HERRAMIENTA NEUMATICA																						
Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado																						
Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta																						
Se trabaja a las presiones indicadas																						
La herramienta es descargada al terminar.																						
HERRAMIENTA POR DETONACION																						
El personal es autorizado																						
Emplean los elementos de protección																						
Se descarga y es almacenada																						

OBSERVACIONES:

FIRMA INSPECTOR									
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA							
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
Adrian Martinez	Insp. SST								

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Ceron	Ing. Miguel Ceron
Responsables SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal
Elaboró	Revisó	Aprobado

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: Abril 2022
		Version:03

CHARLA:		CAPACITACIÓN:	x	REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C. 19/05/2026
DURACIÓN:	15 min
TEMA:	Actos y Condiciones Inseguras
EXPOSITOR:	Adrian Martinez
TOTAL ASISTENCIA:	04 Personas

El trabajador firma en constancia de:
1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Adrian Gonzales	54304152	OFICIAL	Adrian
2	RAMON CASTILLO	6935472	AYUDANTE	RAMON
3	Junior Rodriguez	MI6828053	OFICIAL	JUNIOR
4	DANIEL HERNANDES	89-28-27	AYUDANTE	DANIEL
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

FIRMA EXPOSITOR

Yinna Blanco Arenas		
Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: Abril 2022
		Version:03

CHARLA:		CAPACITACIÓN:	X	REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C. 27/05/2026
DURACIÓN:	10 min
TEMA:	Actos y Condiciones Inseguras.
EXPOSITOR:	Adrian Martinez
TOTAL ASISTENCIA:	04 Personas

El trabajador firma en constancia de:
1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Junior Rodriguez	1116 820053	OFICIAL	Junior
2	Adrian Gonzalez	54304752	oficial	Adrian
3	DANIEL HERNANDES	89-28-27	AYUDANTE	DANIEL
4	RAMON CASTILLO	6935472	AYUDANTE	RAMON
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: Abril 2022
		Version:03

CHARLA:		CAPACITACIÓN:	X	REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C. 23/05/2026.
DURACIÓN:	20 min
TEMA:	Actividades de alto riesgo (Alturas, Caliente).
EXPOSITOR:	Adrian Martinez
TOTAL ASISTENCIA:	04 Personas

El trabajador firma en constancia de:
1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	RAMON CASTILLO	6935472	AYUDANTE	RAMON
2	DANIEL HERNANDES	89-28-27	AYUDANTE	DANIEL
3	Adrian Gonzales	5430182	OFICIAL	Adrian
4	Junior Rodriguez	111 BLBOS7	OFICIAL	JUNIOR
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

FIRMA EXPOSITOR

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

SU

SAFRID ingeniería sas	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Codigo	SAF-FOR-074
		Fecha	Mar24
		Version	Versión 1.0

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

Contrato N°: CO1.PCCNTR.8155135 Objeto del contrato: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – LOTE 4.	Ciudad: Bogotá D.C. Ubicación donde se realiza el trabajo: (frente de obra): Colegio Diego Montaña
Fecha de Inicio 25/05/2026	Fecha de final: 31/05/2026
Descripción de la tarea a realizar: Desmonte e Instalación de Uniboard, Resanes, Estucado y Pinturas.	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADORES	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO		CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
RAMON CASTILLO	PPT	6935472	AYUDANTE	RAMON	RAMON	RAMON	RAMON	RAMON	RAMON	
JUNIOR RODRIGUEZ	CC	1116828053	OFICIAL	JUNIOR	JUNIOR	JUNIOR	JUNIOR	JUNIOR	JUNIOR	
Adrian Gonzales	PPT	54301152	OFICIAL	Adrián	Adrián	Adrian	Adrián	Adrian	Adrian	
DANIEL HERNANDEZ	PPT	89-28-27	AYUDANTE	DANIEL	DANIEL	DANIEL	DANIEL	DANIEL	DANIEL	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
Manuales	X	*Martillo, metro, cegueta, liana metalica, rodillo, valdes, espatula, brochas, lija*
Electricas		*Extensiones*
Hidráulicas		NA
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Trabajos a nivel
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	No aplica
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	No aplica
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	NA
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco con barbuquejo, gafas de protección, tapaoidos, guantes, botas de seguridad,ropa de trabajo, camisa manga larga
¿Cuántos trabajadores se requieren?	4
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pintura, estuco, enchape, madera, barandas, agua, cemento,, pegacor
¿Existen hoyos o grietes debajo del área de trabajo?	NA
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Electricidad, superficies poco resistentes,chispas, objetos filosos, condiciones climaticas

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Alistamiento de herramientas , materiales y equip	Caidas caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones , muerte.	Orden y aseo, almacenar adecuadamente las herramientas y equipos de alturas, evitar bromas durante estas actividades, uso de elementos de proteccion personal. Identificar que herraminta necesita y que no , no lleve cosas que no necesite, Inspecione los equipos de alturas que va a utilizar verifique etiquetas , estado de correas , partes metalicas , ajuste correcto de los ganchos.
Dirigirse a el área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Dirijase a el área de trabajo de forma ordenada , evite realizar bromas , durante el recorrido no pierda de vista sus herramientas y sus equipos si debe desplazarse por fuera de la plaza, lleve siempre ubicado su casco de seguridad como debe ser, evite retirarlo por cualquier motivo, acceda a el lugar de trabajo por el lugar autorizado.

Acceder al área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo, caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, muerte.	Firme su ATS ,inspeccione los equipos y herramientas que va a utilizar.
Verificacion de área de trabajo	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Una vez alla llegado al area de trabajo verifique si el area es segura para iniciar labores.
Inicio de labores	Caidas a nivel, golpes, sofreesfuerzos, cortaduras	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Personal con experiencia, acompañamiento permanente, condiciones de salud optimas.
Terminación de tarea	Caidas a mismo nivel, golpes , cortes , sobreesfuerzo,caida de objetos.	Heridas, golpes, lumbagos, contusiones ,caida de objetos, robos, muerte.	Una vez terminada la tarea del dia ,garantice que no queden objetos herramientas o materiales que puedan obsruir el paso y generar incidentes, deje sus área de trabajo en perfecto estado de orden y aseo.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y apellido Residente Obra	Cedula	Firma
Diego Pinzón	1014133694	
Nombre y Apellido Maestro de Obra y/o Encargado de Cuadrilla	**Cedula**	**Firma**
Adrian Gonzales	5413041S2	Adrian
Nombre y Apellido Residente SST	**Cedula**	**Firma**
Adrian Martinez	1064121217	

Elaboró Ing. Yinna Blanco	Revisó Ing. Miguel Cerón M.	Aprobó Ing. Miguel Cerón M.

SAFRID ingeniería sas	FORMATO PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO:	FOR-SAF-SST-002
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	2024

1.FECHA DE ELABORACION DE PERMISO: 25/05/2026

2.LUGAR ESPECIFICO DE LA ACTIVIDAD: Colegio Diego Montañas - Coimizos

3.ALTURA APROX. DE LA ACTIVIDAD: 8 mts.

4.FECHA DE INICIO: 25/05/2026 — FECHA FINAL: 31/05/2026

5.HORA DE INICIO: 7:00 am — HORA FINAL: 4:00 pm

6. TIPO DE TRABAJO A REALIZAR

Describa la actividad que se va a realizar:

Desmonte e Instalación de cielo raso, Resanes, Estucado y Pintura.

7. TIPO DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Describa las herramientas que se van a utilizar:

Herramientas menores, Pulidoras y Taladros

8. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR

Describa los elementos de protección personal que se van a utilizar:

Andamios, Arnés, Eslingas, Lineas de Vida, Casco, Guantes, Gafas, Etc.

9.DATOS Y REQUISITOS DEL TRABAJADOR QUE EJECUTARA EL TRABAJO

#	NOMBRE	CEDULA	FECHA CURSO ALTURAS	FECHA SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	FECHA DE EXAMEN MEDICO (apto para trabajo en alturas)	FIRMA TRABAJADOR
1	RAMON CASTILLO	6935472	12-03-26	22-06-26	10-03-26	RAMON
2	Adrián Gonzales	5130152	17-03-26	22-06-26	10-03-26	Adrian
3	Junior Rodriguez	1168280	17-03-26	22-06-26	12-03-26	JUNIOR
4	DANIEL HERNANDEZ	89-28-27	13-04-26	22-06-26	07-04-26	DANIEL
5						
6						
7						
8						

Al firmar este documento, el trabajador manifiesta que para realizar la labor en alturas anteriormente nombrada tiene la capacidad física y mental para la tarea y su estado de salud es bueno, adicional que se revisaron las certificaciones correspondientes para alturas y examen medico.

10.MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Equipos de Protección Contra Caídas a Utilizar (Marca con una x)

Arnés cuerpo completo	Sí ☒	No ☐	Línea de vida vertical portátil	Sí ☒	No ☐	Punto de anclaje fijo	Sí ☒	No ☐	Mosquetón	Sí ☐	No ☒
línea de vida vertical	Sí ☒	No ☐	Eslinga en y con adsorbedor	Sí ☒	No ☐	Punto de anclaje portátil (tie off)	Sí ☐	No ☒	Freno Arrestador	Sí ☐	No ☒
línea de vida horizontal	Sí ☒	No ☐	Eslinga de posicionamiento	Sí ☒	No ☐	Silla de suspensión	Sí ☐	No ☒	Descendedor	Sí ☐	No ☒

11.MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCIÓN

Medidas a adoptar (Marca con una x)

Delimitación del área	Sí ☒	No ☐	Ayudante de seguridad	Sí ☒	No ☐	Barandas	Sí ☒	No ☐	PermisoT.A	☐	Sí ☒	No ☐

Señalización del area	Sí ☒	No ☐	Manejo de desniveles y orificios (huecos):	Sí ☑	No ☐	Control de acceso	Sí ☑	No ☐	Otro_ ¿Cuál?	

12.SISTEMAS DE ACESSO

Sistema de acceso a utilizar (Marca con una x)

Andamio colgante	Sí ☐	No ☑	Andamio tubular	Sí ☑	No ☐	Escaleras fijas	Sí ☒	No ☐	Escaleras portatiles	Sí ☒ No ☐

13. REQUERIMIENTOS GENERALES - LISTA DE CHEQUEO DIARIA

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se realizó el análisis de trabajo seguro (ATS) y socialización antes de iniciar la labor	C	C	C	C	C	C	
Se realizó charla pero-peracionalantes de iniciar la labor	C	C	C	C	C	C	
Los trabajadores están aptos para desarrollar la labor (estado de salud y con concepto medico vigente)	C	C	C	C	C	C	
los trabajadores están certificados en alturas (curso avanzado y/o re-entrenamiento vigente)	C	C	C	C	C	C	
Se han verificado los sistemas de anclaje	C	C	C	C	C	C	
Caidas de diferente nivel	C	C	C	C	C	C	
Caida al mismo nivel	C	C	C	C	C	C	
El area de trabajo esta libre de obstáculos	C	C	C	C	C	C	
Cambio brusco de temperatura	C	C	C	C	C	C	
Contacto con corriente electrica	C	C	C	C	C	C	
Contacto con partes en movimiento	C	C	C	C	C	C	
Agentes infecciosos	C	C	C	C	C	C	
Presencia de gases y vapores	C	C	C	C	C	C	
Movimientos repetitivos	C	C	C	C	C	C	
Adopcion de posturas inadecuadas	C	C	C	C	C	C	
Caida de objetos	C	C	C	C	C	C	
Manipulacion de elementos cortates	C	C	C	C	C	C	
Proyeccion de particulas	C	C	C	C	C	C	
Manejo de herramientas manuales	C	C	C	C	C	C	
Exposicion a ruido	C	C	C	C	C	C	
Condicion de orden y aseo	C	C	C	C	C	C	
Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo (cinta, conos, señales de tal manera que se pueda aislar o restringir la zona y no se permita el paso de personas ajenos a la labor?	C	C	C	C	C	C	

VERIFICACION DE SISTEMAS DE ACCESO

ANDAMIOS

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Los cuerpos del andamio se encuentran asegurados y cuenta con todas sus piezas (verticales, horizontes, diagonales, pines, llantas o husillo nivelador ?	C	C	C	C	C	C	
Cuenta con area firme para su correcto armado y nivelacion?	C	C	C	C	C	C	
Cuenta contodas sus plataformas y estás estan apoyadas firmemente ?	C	C	C	C	C	C	
La superficie de trabajo se encuentra cubierta por plataformas, libre de huecos?	C	C	C	C	C	C	
Cuenta con escaleras y estas se encuentran aseguradas adecuadamente al andamio?	C	C	C	C	C	C	
El andamio presenta alguna tipo de oxidación o desgaste?	C	C	C	C	C	C	
El andamio esta aislado de líneas o equipos energizados?	C	C	C	C	C	C	
El andamio cuenta con ficha de autorización?	C	C	C	C	C	C	

ESCALERAS

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Las escaleras están en adecuadas condiciones?	C	C	C	C	C	C	
Las bases están apoyadas sobre una superficie plana?	C	C	C	C	C	C	
Esta libre de grasa, aceite u otras sustancias?	C	C	C	C	C	C	
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes?	C	C	C	C	C	C	
El área alrededor de la escalera se encuentra señalizada?	C	C	C	C	C	C	

VERIFICACIÓN EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

ARNES DE CUERPO COMPLETO

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
El arnes cuenta con la ficha de identificacion del fabticante?	C	C	C	C	C	C	
El arnes cuenta con la ficha de fabricacion y inspeccion?	C	C	C	C	C	C	
Las correas del equipo son ajustables?	C	C	C	C	C	C	
El arnes cuenta con la ficha donde esta la fecha de fabricacion y inspeccion?	C	C	C	C	C	C	
El equipo tiene los puntos de conexión necesarios y estan en buen estado, Argollas, hebillas.	C	C	C	C	C	C	
Las eslingas se encuntran sin manchas de pintura, grasa, oxido, quemaduras y/o perforaciones?	C	C	C	C	C	C	
El absorvedor de choque de la eslinga se encuntra sin manchas de pintura, grasa, quemadura y/o perforaciones?	C	C	C	C	C	C	
El tie off se encuntra sin manchas de pintura, grasa, oxido, quemaduras y/o perforaciones?	C	C	C	C	C	C	
La linea de vida cuenta con su ficha en donde se observa la fecha de fabricacion y fabricante?	C	C	C	C	C	C	
La linea de vida se encuentra libre de pintura, grasa, oxido, quemaduras, deshilachamiento y/o perforaciones?	C	C	C	C	C	C	

ESLINGAS DE CARGA

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Cuenta con sus etiquetas legibles y se puede ver la fecha de fabricacion?	C	C	C	C	C	C	
las fibras y costuras están libres de desgaste, deshilachamiento y cortes?	C	C	C	C	C	C	
Las eslingas estan protegidas contra cualquier elemento que genere abracion?	C	C	C	C	C	C	

LINEAS DE VIDAS

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Cuenta con sus etiquetas legibles y se puede ver la fecha de fabricacion?	C	C	C	C	C	C	
las fibras y costuras están libres de oxido, pintura, grasa, deshilachamiento y cortes?	C	C	C	C	C	C	
Funcionamiento de cierre y apertura de los ganchos metálicos es correcto?	C	C	C	C	C	C	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ASPECTOS A VERIFICAR DIARIAMENETE (C)CUMPLE. (NC)NO CUMPLE (NA)NO APLICA	SEMANA DE TRABAJO						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Casco con barbuquejo	C	C	C	C	C	C	
Guantes de seguridad	C	C	C	C	C	C	
Gafas de seguridad	C	C	C	C	C	C	
Tapaoidos	C	C	C	C	C	C	
Careta de esmerilar	NIA	NIA	NIA	NIA	NIA	NIA	
Careta de soldador	NIA	NIA	NIA	NIA	NIA	NIA	
Ropa de trabajo	C	C	C	C	C	C	
Arnes	C	C	C	C	C	C	
Eslinga	C	C	C	C	C	C	
Tie off	NIA	NIA	NIA	NIA	NIA	NIA	

OBSERVACIONES:

APROBACION DEL PERMISO				CIERRE DE PERMISO			
ENCARGADOS	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	ENCARGADOS	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Inspector SST	Adrian M	1064121717		Inspector SST	Adrian M	1064121717	
Residente de obra	Diego P	1014133694		Residente de obra	Diego P.	1014133694	
Maestro o encargado de la actividad	Adrian	5430452	Adrian	Maestro o encargado de la actividad	Adrian	5430452	Adrian
coordinador (TA) de obra	Adrian M	1064121717		coordinador (TA) de obra	Adrian M	1064121717	

TENGA EN CUENTA : SI REQUIERE CAMBIAR DE ACTIVIDAD O LOS EQUIPOS CON LOS CUALES ESTA LABORANDO, INFORME AL ÁREA SST PARA UNA NUEVA INSPECCION.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado Por:
Yinna Blanco Arenas	Miguel Cerón	Miguel Cerón
Responsable SG-SST	Empleador	Empleador

SAFRID	SAFRID INGENIERIA S.A.S	CODIGO: SAF-PRC-025
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	VERSIÓN: 2
		FECHA:May-2022

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: 25 | 05 | 26 (DIA | MES | AÑO)

HORA DE INICIO: 7:00 am

PERMISO VÁLIDO HASTA: 31 | 05 | 26 (DIA | MES | AÑO)

HORA DE FINALIZACIÓN: 4:00 pm

EMPRESA EJECUTORA: Consorcio Adecuaciones Pisaf

Nº CONTRATO: 02 Pisa

ÁREA O LUGAR: Colegio Diego Montañas

Nº PERSONAS EJECUTORAS: 02 Personas

ACTIVIDAD A REALIZAR: Cork de Drywall

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pulideras, Taladros.

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [X] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutara el trabajo está libre de sustancias quimicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona, estan en bueb estado?	X		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	X		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	X		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	X		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?			X
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	X		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?			X
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	X		
¿Los electrodos y cables se encuentran en buen estado?			X
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			X

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	X		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura			X
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.			X
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.			X

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	X	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES		X

5 Requerimientos adicionales	SI	NO
1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura.	X	
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados.		X
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo?		X

6 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

SUSPENSIÓN DEL PERMISO: (Cualquier persona que supervisa la actividad evidencia incumplimiento en el procedimiento puede suspender el trabajo y debe notificar inmediatamente al encargado de SST del lugar de trabajo.

Motivos de la suspensión:

Fecha y hora de la suspensión:

Suspensión realizada por:

EJECUTORES

Item	Nombre y apellido	Cedula	Cargo	Firma
1	Adrian Gonzalez	5430752	OFICIAL	
2	Junior Rodriguez	1116828053	OFICIAL	
3				
4				
5				
6				
7				

RENOVACIÓN

Tiempo de validación del permiso(fecha).

Hora: Desde-Hasta.

Autorizado por: Supervisado por:

Número de personas que ejecutan la actividad:

OBSERVACIONES:

Solo diligenciar personal a cargo (JEFE INMEDIATO, ENCARGADO, ENCARGADO DE SST)

Item	Nombre y apellido	Cedula	Cargo	Firma
1	Adrian Martinez	1064117217	Insp. SST	
2				
3				
4				

TRABAJO TERMINADO

¿Finalizo el trabajo?

Si no a finalizado explique porque

El área de trabajo quedo limpia y ordenada

Fecha:

Hora:

Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
SST	Rep. Legal	Rep. Legal

SAFRID ingeniería sas

INSPECCION DE PULIDORA

Código: SAF-FOR-096
Fecha: Nov 2021
Versión: 02

PROYECTO: Colegio Diego Montañas AREA: Cornizas

IDENTIFICACION DEL EQUIPOS SERIE Y /O MARCA: Dewalt.

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Corte de Drywall

No	INDICADOR PARA EVALUAR LA CORTADORA	FECHA DESDE: 25/05/2026 HASTA: 31/05/2026 — CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A — Marque con una X según corresponda																				OBSERVACIONES
		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
1	¿ El cable de alimentación esta libre de cortes, aplastamientos, empalmes y la clavija no presenta daños ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
2	¿ El cuerpo de la pulidora esta libre de fisuras y golpes ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	¿ La pulidora cuenta con mango auxiliar, y está ajustado ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	¿ El interruptor o botón de encendido funciona correctamente de acuerdo al manual ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	¿ La rosca o tuerca de sujeción del disco ajusta correctamente ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6	¿ El botón de bloqueo del eje fuciona correctamente de acuerdo al manual ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	¿ La pullidora cuenta con protector del disco-guarda de seguridad y el seguro ajusta correctamente ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	¿ El disco que va a utilizar es acorde con el tamaño de la pulidora, esta completo y libre de fisuras ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	¿ las rejillas de ventilación de la pulidora están completas y libres de obstrucción ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						

FIRMA OPERARIO AUTORIZADO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Adrian Gonzales	Oficial	Adrian	Adrian	Adrian	Adrian	Adrian	Adrian

FIRMA INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Adrian Martinez	Insp. SST						

Yinna Blanco Arenas		
Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Coordinador SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal

SAFRID ingeniería sas	INSPECCION DE TALADRO	Código: SAF-FOR-044 Fecha: Abril 2022 Versión: 01

PROYECTO: Colegio Diego Montañas

MARCA TALADRO: Bosch 11 | PROPIO: X | ALQUILADO:

INDIQUE CON UNA X B=Si el componente esta en Buenas condiciones o M= Si el componente esta en malas condiciones

ÍTEM	FECHA: 25 ost 2026										31 ost 2026	
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADOS	
	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
Estado de gatillo de velocidad variable	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de boton de bloqueo encendio	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de conmutador de funciones de rotacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de boton de avance y reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de mandril	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de protector de cable con sujeta llave	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de cable electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de mango lateral	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de mango principal	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de llave Mandril	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
El trabajador esta instruido sobre el correcto	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
uso y manejo del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

NOTA: Toda anomalia detectada, avisar al Inspector SST para solucionar el problema, pero recuerde siempre

OBSERVACIONES

APROBADO SI X NO ___	CON RESTRICCIÓN SI ___ NO X

OPERADOR

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Adrian Gonzales	oficial	Adrian

INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Adrian Martinez	Insp. SST	

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Coordinador SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal

SAFRID ingeniería sas

INSPECCION DE TALADRO

Código: SAF-FOR-044
Fecha: Abril 2022
Versión: 01

PROYECTO: Colegio Diego Montañas Villa H.

MARCA TALADRO:

PROPIO: X | ALQUILADO:

INDIQUE CON UNA X B=Si el componente esta en Buenas condiciones o M= Si el componente esta en malas condiciones

FECHA: 25/05/2026 - 31/05/2026

ÍTEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADOS	
	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
Estado de gatillo de velocidad variable	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de boton de bloqueo encendio	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de conmutador de funciones de rotacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de boton de avance y reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de mandril	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de protector de cable con sujeta llave	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de cable electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de mango lateral	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de mango principal	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de llave Mandril	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
El trabajador esta instruido sobre el correcto	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
uso y manejo del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

NOTA: Toda anomalia detectada, avisar al Inspector SST para solucionar el problema, pero recuerde siempre

OBSERVACIONES

APROBADO	CON RESTRICCIÓN
SI X NO ___	SI ___ NO X

OPERADOR

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Junior Gonzales	OFICIAL	Junior

INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Adrian Martinez	Insp. SST	

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Ceron	Ing. Miguel Ceron
Coordinador SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal

SAFRID ingeniería sas	INSPECCION DE HERRAMIENTA	Código: SAF-FOR-098
		Fecha:Nov 2021
		Versión: 02

FECHA: 25/05/2026

OBRA: Colegio Diego Montañas.

DESCRIPCIÓN	FECHA DESDE: 25/05/2026 HASTA: 31/05/2026. CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A. Marque con una X según corresponda																				
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
HERRAMIENTAS MANUALES																					
Se usa la adecuada al trabajo	/			/			/			/			/			/					
Se encuentran en buen estado	/			/			/			/			/			/					
Se guardan y portan adecuadamente	/			/			/			/			/			/					
Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	/			/			/			/			/			/					
HERRAMIENTAS DE CORTE																					
Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	/			/			/			/			/			/					
Los cinceles se encuentran afilados	/			/			/			/			/			/					
Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	/			/			/			/			/			/					
Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	/			/			/			/			/			/					
Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	/			/			/			/			/			/					
Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	/			/			/			/			/			/					
Los cuchillos disponen de mangos y fundas	/			/			/			/			/			/					
HERRAMIENTAS DE GOLPE																					
Se emplea el martillo adecuado según la labor	/			/			/			/			/			/					
Sus caras y bordes están en buen estado	/			/			/			/			/			/					
Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	/			/			/			/			/			/					
HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES																					
Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			/			/			/			/			/			/			
Se observan en la llave huellas y palancas			/			/			/			/			/			/			
Se dispone de llaves para golpear			/			/			/			/			/			/			
Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			/			/			/			/			/			/			
La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			/			/			/			/			/			/			
La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado			/			/			/			/			/			/			
Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			/			/			/			/			/			/			
HERRAMIENTAS ELECTRICAS																					
Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			/			/			/			/			/			/			
Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada			/			/			/			/			/			/			
Están limpia y lubricadas			/			/			/			/			/			/			
Tienen sus guardas			/			/			/			/			/			/			
Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas			/			/			/			/			/			/			
El cable y enchufe no presentan daños			/			/			/			/			/			/			
En los taladros se observa el mandil con golpes			/			/			/			/			/			/			

Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
HERRAMIENTA NEUMATICA																						
Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se trabaja a las presiones indicadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
La herramienta es descargada al terminar.			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
HERRAMIENTA POR DETONACION			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
El personal es autorizado			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Emplean los elementos de protección			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se descarga y es almacenada			✓			✓			✓			✓			✓			✓				

OBSERVACIONES:

FIRMA INSPECTOR								
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA						
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Adrian Martinez	Insp. SST							

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Ceron	Ing. Miguel Ceron
Responsables SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal
Elaboró	Revisó	Aprobado

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: Abril 2022
		Version:03

CHARLA:		CAPACITACIÓN:	X	REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C. 25/05/2026
DURACIÓN:	25 min
TEMA:	Responsabilidades SST
EXPOSITOR:	Adrian Martinez
TOTAL ASISTENCIA:	04 Personas

El trabajador firma en constancia de:
1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	RAMON CASTILLO	6935472	AYUDANTE	RAMON
2	Adrian Gonzales	5430452	OFICIAL	Adrian
3	Junior Rodriguez	1116828053	OFICIAL	JUNIOR
4	DANIEL HERNANDE	99-78-27	AYUDANTE	DANIEL
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Colegio Diego Montaña.

FIRMA EXPOSITOR

Yinna Blanco Arenas		
Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: Abril 2022
		Version:03

CHARLA:		CAPACITACIÓN:	X	REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C 27/05/2026
DURACIÓN:	10 min
TEMA:	Salud Mental
EXPOSITOR:	Adrian Martinez
TOTAL ASISTENCIA:	04 Personas

El trabajador firma en constancia de:
1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Junior Rodriguez	1116828053	OFICIAL	Junior
2	RAMON CASTILLO	6935472	AYUDANTE	Ramon
3	Adrian Gonzalez	5430452	OFICIAL	Adrian
4	DANIEL HERNANDES	89-2877	AYUDANTE	DANIEL
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Colegio Diego Montaña.

FIRMA EXPOSITOR

Yinna Blanco Arenas		
Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

SAFRID ingeniería sas	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y FORMACION	Codigo: SAF-FOR-004
		Fecha: Abril 2022
		Version:03

CHARLA:		CAPACITACIÓN:	X	REUNIÓN:	
INDUCCION:		REINDUCCIÓN:		OTROS:	

CIUDAD Y FECHA:	Bogota D.C 29/05/2026
DURACIÓN:	20 min
TEMA:	Reciclaje de Materiales.
EXPOSITOR:	Adrian Martinez
TOTAL ASISTENCIA:	04 Personas

El trabajador firma en constancia de:
1.Ha recibido y entendido el contenido de la charla relacionada en el presente formato
2.Se encuentra en buenas condiciones de salud.
3.Conoce el mecanismo de comunicación establecido por la empresa en caso de presentarse algun AT o incidente.
4.Se compromete a reportar durante la jornada laboral cualquier síntoma asociado a

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Adrian Gonzales	5430452	OFICIAL	Adrian
2	Junior Rodriguez	1116828053	OFICIAL	Junior
3	RAMON CASTILLO	69354472	AYUDANTE	RAMON
4	DANIEL HERNANDEZ	99-78-77	AYUDANTE	DANIEL
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Colegio Diego Montañas.

FIRMA EXPOSITOR

Yinna Blanco Arenas		
Ing. Yinna Blanco Arenas	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

SAFRID ingeniería sas Obras civiles y arquitectura	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS (EPCC)	CÓDIGO: FOR-SAF-061 FECHA: 2022 VERSIÓN: 03 Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)				
NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	CARGO	UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:
Ramon Castillo	PPT	6935472	Ay	C. Diego M.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por CONSORCIO MANTENIMEIMTOS ARDISAF con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12): Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST
El presente compromiso quedará archivado en el Área SST para los fines pertinentes."

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Guantes	1	25/05/26	RAMON
2	Gafas	1	25/05/26	RAMON
3	Tapabocas	1	25/05/26	RAMON
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1				
2				
3				
4				
5				
6				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Adrian Martinez	1064121117	Insp. SST	

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Gerón	Ing. Miguel Gerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

SAFRID ingeniería sas	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS (EPCC)	CÓDIGO: FOR-SAF-061
		FECHA: 2022
		VERSIÓN: 03
		Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)				
NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	CARGO	UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:
Adrian Gonzalez	PPT	5430452	Of	C. Diego M.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por CONSORCIO MANTENIMEIMTOS ARDISAF con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCION 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12): Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST
El presente compromiso quedará archivado en el Área SST para los fines pertinentes."

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Guantes	1	25/05/26	Adrian
2	Gafas	1	25/05/26	Adrian
3	Tapabocas	1	25/05/26	Adrian
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1				
2				
3				
4				
5				
6				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Adrian Martinez	1064121217	Insp. SST	

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

SAFRID ingeniería sas	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS (EPCC)	CÓDIGO: FOR-SAF-061 FECHA: 2022 VERSIÓN: 03 Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)				
NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	CARGO	UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:
Junior Rodriguez	CC	1116828053	Of	C. Diego M.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por CONSORCIO MANTENIMEIMTOS ARDISAF con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12): Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST
El presente compromiso quedará archivado en el Área SST para los fines pertinentes."

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Guantes	1	25/05/26	Junior
2	Gafas	1	25/05/26	Junior
3	Tapabocas	1	25/05/26	Junior
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1				
2				
3				
4				
5				
6				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Adrian Martinez	1064121217	Insp. SST	

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Gerón	Ing. Miguel Gerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

SAFRID ingeniería sas	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS (EPCC)	CÓDIGO: FOR-SAF-061 FECHA: 2022 VERSIÓN: 03 Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)				
NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	CARGO	UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:
Daniel Hernandez	PPT	892827	Ay	C. Diego M.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por CONSORCIO MANTENIMEIMTOS ARDISAF con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122. sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12): Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST
El presente compromiso quedará archivado en el Área SST para los fines pertinentes."

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Guantes	1	25/05/26	DANIEL
2	Gafas	1	25/05/26	DANIEL
3	Tapabocas.	1	25/05/26	DANIEL
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1				
2				
3				
4				
5				
6				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Adrian Martinez	1064121217	Insp. SST	

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Gerón	Ing. Miguel Gerón
Elaboró	Revisó	Aprobó

SAFRID ingeniería sas

INSPECCION DE HERRAMIENTA

Código: SAF-FOR-098
Fecha:Nov 2021
Versión: 02

FECHA: 11/05/2026

OBRA: Colegio Diego Montañas

DESCRIPCIÓN	FECHA DESDE: 11/05/2026 HASTA: 17/05/2026 — CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A — Marque con una X según corresponda																				
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
HERRAMIENTAS MANUALES																					
Se usa la adecuada al trabajo	/			/			/			/			/			/					
Se encuentran en buen estado	/			/			/			/			/			/					
Se guardan y portan adecuadamente	/			/			/			/			/			/					
Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	/			/			/			/			/			/					
HERRAMIENTAS DE CORTE																					
Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	/			/			/			/			/			/					
Los cinceles se encuentran afilados	/			/			/			/			/			/					
Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	/			/			/			/			/			/					
Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	/			/			/			/			/			/					
Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	/			/			/			/			/			/					
Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	/			/			/			/			/			/					
Los cuchillos disponen de mangos y fundas	/			/			/			/			/			/					
HERRAMIENTAS DE GOLPE																					
Se emplea el martillo adecuado según la labor	/			/			/			/			/			/					
Sus caras y bordes están en buen estado	/			/			/			/			/			/					
Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	/			/			/			/			/			/					
HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES																					
Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			/			/			/			/			/			/			
Se observan en la llave huellas y palancas			/			/			/			/			/			/			
Se dispone de llaves para golpear			/			/			/			/			/			/			
Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			/			/			/			/			/			/			
La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			/			/			/			/			/			/			
La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado			/			/			/			/			/			/			
Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			/			/			/			/			/			/			
HERRAMIENTAS ELECTRICAS																					
Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			/			/			/			/			/			/			
Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada			/			/			/			/			/			/			
Están limpia y lubricadas			/			/			/			/			/			/			
Tienen sus guardas			/			/			/			/			/			/			
Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas			/			/			/			/			/			/			
El cable y enchufe no presentan daños			/			/			/			/			/			/			
En los taladros se observa el mandil con golpes			/			/			/			/			/			/			

Powered by CamScanner

Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
HERRAMIENTA NEUMATICA																				
Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se trabaja a las presiones indicadas			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
La herramienta es descargada al terminar.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
HERRAMIENTA POR DETONACION			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
El personal es autorizado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Emplean los elementos de protección			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se descarga y es almacenada			✓			✓			✓			✓			✓			✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA INSPECTOR								
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA						
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Adrian Martinez.	Insp. SST							

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Responsables SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal
Elaboró	Revisó	Aprobado

Powered by CamScanner

ANEXO 13. REGISTRO FOTOGRAFICO

BRISAS DEL DIAMANTE



Fotografía No.1



Fotografía No.2



Fotografía No. 3



Fotografía No. 4

Tabla 17. *Registro fotográfico Colegio Brisas del diamante*
Fuente: *Propia*

OFELIA URIBE DE ACOSTA



	
Fotografía No.5	**Fotografía No.6**
	
Fotografía No.7	**Fotografía No.8**

Tabla 18. *Registro fotográfico Colegio Ofelia Uribe de Acosta*
Fuente: Propia

FANNY MICKEY



Fotografía No.9

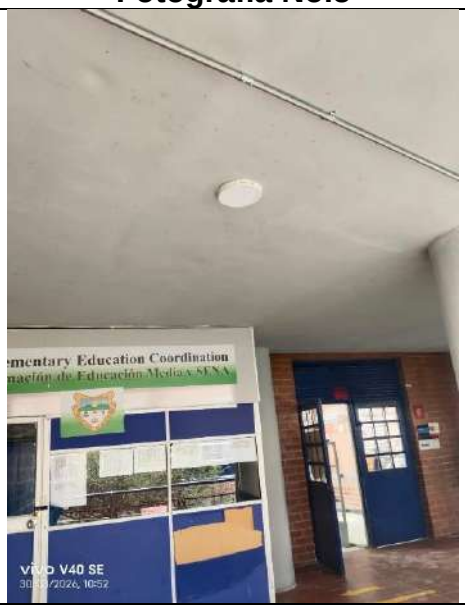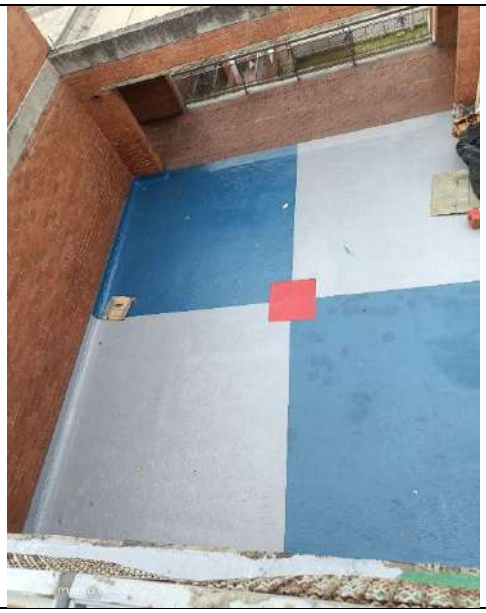

Fotografía No.10



Fotografía No.11




Fotografía No.12

Tabla 19. *Registro fotográfico Colegio Fanny Mickey*
Fuente: *Propia*

COMPARTIR EL RECUERDO



Fotografía No.13

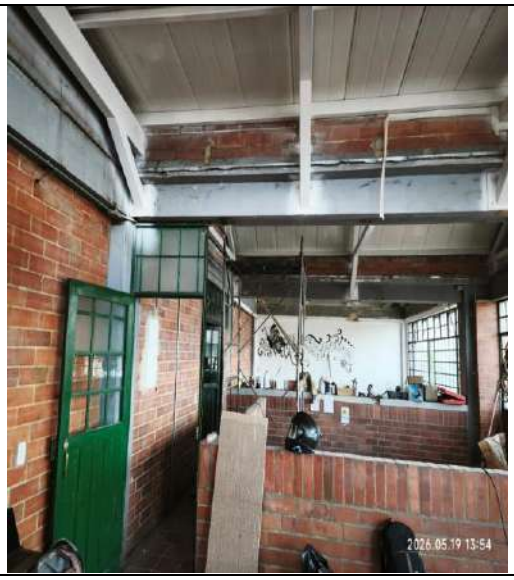

Fotografía No.14



Fotografía No.15



Fotografía No.16

Tabla 20. Registro fotográfico Colegio Compartir el Recuerdo
Fuente: *Propia*

LOS TEJARES

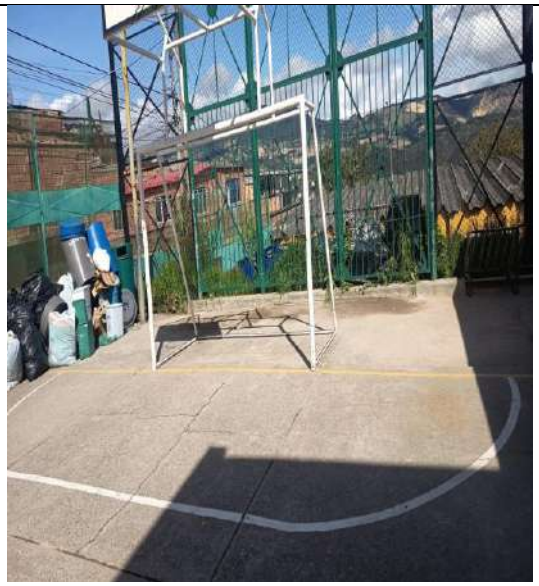
	
Fotografía No.17	**Fotografía No.18**
	
Fotografía No.19	

Tabla 21. *Registro fotográfico Colegio Los Tejares*
Fuente: *Propia*

DIEGO MONTAÑA CUELLAR

	
Fotografía No.20	**Fotografía No.21**
	
Fotografía No.22	**Fotografía No.23**

Tabla 22 *Registro fotográfico Colegio Diego Montaña Cuellar*
Fuente: *Propia*

ESTRELLA DEL SUR SEDE C

	
Fotografía No.24	**Fotografía No.25**
	
Fotografía No.26	**Fotografía No.27**

Tabla 23 *Registro fotográfico Colegio Estrella del Sur Sede C*
Fuente: *Propia*

ESTRELLA DEL SUR SEDE D

	
Fotografía No.28	**Fotografía No.29**

Tabla 23 *Registro fotográfico Colegio Estrella del Sur Sede D*
Fuente: *Propia*

ANEXO 14.
CORRESPONDENCIA

ANEXO 1	CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA SED-CM-A-DCCEE-018-2025.	
PERIODO: MAYO 2026		
FECHA: 05 DE JUNIO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"	
VERSION: 1		

No. CONSECUTIVO	TIPO	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	GRUPO	ASUNTO	MODO DE RADICACION	ARCHIVO	ELABORADO POR:	No. RADICADO
CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA										
SERINCO-SDE-L5-2025-001	COMUNICACIÓN	8 sep 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - FORMATOS LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-002	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - FORMATOS LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-003	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION DE DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L4-2025-004	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - FORMATOS LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-005	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION		REMISION DE DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-006	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISIÓN FORMATOS DE INFORME MENSUALE Y PRELIMINAR - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-007	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISIÓN FORMATOS DE INFORME MENSUALE Y PRELIMINAR - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L4-2025-008	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISIÓN FORMATOS DE INFORME MENSUALE Y PRELIMINAR - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-009	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	RADICACIÓN DE POLIZA EN FISICO				
SERINCO-SDE-L6-2025-010	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-011	COMUNICACIÓN	1 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-012	COMUNICACIÓN	1 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L4-2025-013	COMUNICACIÓN	1 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-014	COMUNICACIÓN	3 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-015	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-016	COMUNICACIÓN	6 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISIÓN DE ACTA DE INICIO - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-017	COMUNICACIÓN	6 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISIÓN DE ACTA DE INICIO - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-018	COMUNICACIÓN	6 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISIÓN DE ACTA DE INICIO - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-019	COMUNICACIÓN	6 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REITERACIÓN SERINCO-SDE-L5-2025-001 - REMISIÓN INFORMACIÓN ACTAS DE INICIO	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-020	COMUNICACIÓN	6 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REITERACIÓN SERINCO-SDE-L6-2025-002 - REMISIÓN INFORMACIÓN ACTAS DE INICIO	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L4-2025-021	COMUNICACIÓN	6 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REITERACIÓN SERINCO-SDE-L6-2025-004 - REMISIÓN INFORMACIÓN ACTAS DE INICIO	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-022	COMUNICACIÓN	7 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	OBSERVACIONES INFORME PRELIMINAR	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L4-2025-023	COMUNICACIÓN	7 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L4-2025-024	COMUNICACIÓN	8 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION OBSERVACIONES PRESUPUESTOS POR SEDE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-025	COMUNICACIÓN	8 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION DE OBSERVACIONES A PRESUPUESTO POR SEDE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-026	COMUNICACIÓN	8 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SERINCO-SDE-2025-026-L5-REMISION DE OBSERVACIONES A LOS PRESUPUESTOS POR SEDE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON	
SERINCO-SDE-L5-2025-027	COMUNICACIÓN	9 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-028	COMUNICACIÓN	9 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	ACTUALIZACION DE POLIZAS SEGUN ACTA DE INICIO - INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-029	COMUNICACIÓN	10 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-030	COMUNICACIÓN	14 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJA DE VIDA PARA CAMBIO DE RESIDENTE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-031	COMUNICACIÓN	15 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	TRASLADO SED-CF-L5-2025-004	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-032	COMUNICACIÓN	15 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION DE OBSERVACIONES A HOJAS DE VIDA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-033	COMUNICACIÓN	17 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION DE OBSERVACIONES A HOJAS DE VIDA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-034	COMUNICACIÓN	17 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD DE REMISIÓN DEL INFORME PRELIMINAR	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-035	COMUNICACIÓN	22 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION DE HOJAS DE VIDA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-036	COMUNICACIÓN	20 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	NO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L4-2025-037	COMUNICACIÓN	21 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-038	COMUNICACIÓN	22 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION DE OBSERVACIONES A HOJAS DE VIDA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-039	COMUNICACIÓN	22 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	TRASLADO SED-CF-L5-2025-005 - PWT	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-040	COMUNICACIÓN	22 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-041	COMUNICACIÓN	23 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L4-2025-042	COMUNICACIÓN	24 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	RADICACION DE HOJAS DE VIDA - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-043	COMUNICACIÓN	24 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	RADICACION DE HOJAS DE VIDA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-044	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PENDIENTE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-045	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-046	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	CONCEPTOS TECNICO Y PROGRAMACIONES DE OBRA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-047	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 6	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-048	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-049	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	CONCEPTOS TECNICO Y PROGRAMACIONES DE OBRA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-050	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	CONCEPTOS TECNICO Y PROGRAMACIONES DE OBRA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-051	COMUNICACIÓN	29 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	CONCEPTOS TECNICO Y PROGRAMACIONES DE OBRA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-052	COMUNICACIÓN	31 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-053	COMUNICACIÓN	31 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-054	COMUNICACIÓN	4 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	SOLICITUD AJUSTE DE APU E INFORMACION PENDIENTE POR ENTREGA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L4-2025-057	COMUNICACIÓN	7 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SDE-L5-2025-058	COMUNICACIÓN	7 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SDE-L6-2025-059	COMUNICACIÓN	7 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SDE-L6-2025-060	COMUNICACIÓN	10 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION DE DOCUMENTACION PARCIAL APROBADA DEL CONTRATISTA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-061	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION DE DOCUMENTACION APROBADA DEL CONTRATISTA - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-062	COMUNICACIÓN	10 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION DE DOCUMENTACION PARCIALAPROBADA DEL CONTRATISTA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-063	COMUNICACIÓN	10 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	LISTADO DE PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L4-2025-064	COMUNICACIÓN	11 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	TRASLADO 046-ARSAF-2025 - JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DETALLADA PARA LA SELECCIÓN DE FIRMA/CAMENTO EN LA REDOSICIÓN DE CONVIAS JED DIEGO MONTAÑA SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-065	COMUNICACIÓN	12 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REITERACION APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-066	COMUNICACIÓN	12 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REITERACION APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-067	COMUNICACIÓN	12 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	RECOMENDACIONES LISTADO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-068	COMUNICACIÓN	12 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	AJUSTE DE PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-069	COMUNICACIÓN	12 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	RECOMENDACIONES LISTADO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-070	COMUNICACIÓN	12 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	RECOMENDACIONES PARA APROBACIÓN DE LISTADO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-071	COMUNICACIÓN	13 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION DE PROGRAMACION DE OBRA Y PRESUPUESTO POR SEDE - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-072	COMUNICACIÓN	13 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-073	COMUNICACIÓN	13 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISION DE PROGRAMACION DE OBRA Y PRESUPUESTO POR SEDE - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-074	COMUNICACIÓN	13 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION DE PROGRAMACION DE OBRA Y PRESUPUESTO POR SEDE - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-075	COMUNICACIÓN	13 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-076		13 nov 2025		CONSORCIO PAIS	LOTE 6	ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-077	COMUNICACIÓN	14 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	OBSERVACIONES E INGRESO DEL PERSONAL - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-078	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME SEMANAL N°1 (10 AL 16 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-079	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME SEMANAL N°1 (10 AL 16 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS		
SERINCO-SDE-L5-2025-080	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME SEMANAL N°1 (10 AL 16 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS		
SERINCO-SDE-L5-2025-081	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME PRELIMINAR	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SDE-L5-2025-082	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME PRELIMINAR	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SDE-L5-2025-083	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME PRELIMINAR	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SDE-L5-2025-084	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION		REMISIÓN CUENTA No. 1 - COSTOS FIJOS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SDE-L5-2025-085	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REITERACION DE REMISION DE INFORMACION SOLICITADA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-086	COMUNICACIÓN	19 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-087	COMUNICACIÓN	19 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION DE DOCUMENTACION APROBADA DEL CONTRATISTA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-088	COMUNICACIÓN	19 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	ATRASOS EN LA PRIMERA SEMANA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SDE-L5-2025-089	COMUNICACIÓN	19 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	ATRASOS EN LA PRIMERA SEMANA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SDE-L5-2025-090	COMUNICACIÓN	19 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	ATRASOS EN LA PRIMERA SEMANA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SDE-L5-2025-091	COMUNICACIÓN	20 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	TRASLADO DE REMISION DE BALANCE Y ALCANCE - Colegio Guillermo Cano Isaza - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-092	COMUNICACIÓN	21 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INSPECTORES - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-093	COMUNICACIÓN	20 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	TRASLADO	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-094	COMUNICACIÓN	21 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	TRASLADO DE COMUNICADO - OFI-SED-L6-041, APANTALLAMIENTO CUBIERTA BLOQUE PRE-ESCOLAR COLEGIO APROPIADORA BAJA SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-095	COMUNICACIÓN	24 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION		REMISIÓN CUENTA No. 2 - COSTOS FIJOS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SDE-L5-2025-096	COMUNICACIÓN	24 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME SEMANAL N°2 (17 AL 23 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-097	COMUNICACIÓN	24 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME SEMANAL N°2 (17 AL 23 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-098	COMUNICACIÓN	24 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME SEMANAL N°2 (17 AL 23 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-099	COMUNICACIÓN	24 nov 2025	C SERINCO	CONTRATISTAS	LOTE 4,5 Y 6	REMISIÓN FORMATO DE INFORME MENSUAL SST	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-

SERINCO-SED-L4-2025-104	COMUNICACIÓN	26 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	TRASLADO DE PROPUESTA DE BAJANTES Y GÁRGOLAS - IED OFELIA URIBE DE ACOSTA SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L4-2025-105	COMUNICACIÓN	26 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	TRASLADO SOLICITUD DE MOVIMIENTO DE MOBILIARIO PARA INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA - IED LOS TEJARES SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L5-2025-106	COMUNICACIÓN	26 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Comunicado SED-CF-L5-2025-014; Solicitud de Modificatorio No. 01 Adición y Prórroga.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L6-2025-107	COMUNICACIÓN	26 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Comunicado OFI-SED-L6-045. Solicitud de Modificatorio 01 Adición y Prórroga	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA		
SERINCO-SED-L4-2025-108	COMUNICACIÓN	26 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Comunicado N° 067-ARSAF-2025. Solicitud de Modificatorio 01 Adición y Prórroga	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LX-2025-109	COMUNICACIÓN	27 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	RECOMENDACIONES SG-SST	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L6-2025-110	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Comunicado OFI-SED-L6-050. Solicitud de Modificatorio 01 Adición y Prorroga CTO 8154780-L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-111	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Alcance al Comunicado SED-CF-L5-2025-014; Solicitud Modificatorio No. 01 Adición y Prórroga.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LX-2025-112	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	OBSERVACIONES NP - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-LX-2025-113	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - COL MINUTO DE BUENOS AIRES	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L6-2025-114	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-047 - Alcance - Solicitud de Modificación Plazo de Ejecución Colegio Santa Librada Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-115	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Comunicado SED-CF-L5-2025-014; Solicitud Modificatorio No. 01 Adición y Prórroga.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LX-2025-116	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L6-2025-117	COMUNICACIÓN	1 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 3 - Nov 24 al 30 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-118	COMUNICACIÓN	1 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 3 - Nov 24 al 30 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-119	COMUNICACIÓN	1 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	TRASLADO DE PROPUESTA ESQUEMA CERRAMIENTO COLEGIO LA ARABIA - Col La Arabia	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L5-2025-120	COMUNICACIÓN	1 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 3 - Nov 24 al 30 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LX-2025-121	COMUNICACIÓN	1 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORÍA	Solicitud Modificatorio No. 01 Adición y Prórroga. - Cto Interventoría	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L6-2025-122	COMUNICACIÓN	2 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Reiteración por Incumplimiento Parcial de las Obligaciones Contractuales - Grupo 2 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-123	COMUNICACIÓN	4 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Aprobación de Analisis de Precios Unitarios de Items No Previstos - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-124	COMUNICACIÓN	4 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Presupuesto de Emergencia CEIF 1931 - IED El Minuto de Buenos Aires, Sede B - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-125	COMUNICACIÓN	5 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado con Asunto Solicitud Autorización Ingreso de Equipo - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LX-2025-126	COMUNICACIÓN	5 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de ensayos según especificaciones tecnicas - Col Jose Jaime Rojas	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-LX-2025-127	COMUNICACIÓN	5 dic 2025	C SERINCO	CONSTRUCTORA PAIS	LOTE 6	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - DIRECCION LOCAL DE USME - CAE SAE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA		
SERINCO-SED-L4-2025-128	COMUNICACIÓN	9 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 4 - Dic 01 al 07 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-129	COMUNICACIÓN	9 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 4 - Dic 01 al 07 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-130	COMUNICACIÓN	9 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 4 - Dic 01 al 07 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-131	COMUNICACIÓN	11 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-046 Solicitud de Modificación fecha de inicio intervención Colegios Santa Librada Sede A y Estrella del Sur Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-132	COMUNICACIÓN	11 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado Procedimiento Desmonte e Instalación Cubierta Arborizadora Baja	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-133	COMUNICACIÓN	12 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Incumplimiento en la Asistencia del Director de Obra a los Comités Presenciales	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-134	COMUNICACIÓN	12 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Incumplimiento en la Entrega de los Informes Mensuales - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-135	COMUNICACIÓN	12 dic 2025	C SERINCO	CONSTRUCTORA PAIS	LOTE 6	Incumplimiento en la Entrega de los Informes Mensuales - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-136	COMUNICACIÓN	12 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Incumplimiento en la Entrega de los Informes Mensuales - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-137	COMUNICACIÓN	12 dic 2025	C SERINCO	CONSTRUCTORA PAIS	LOTE 6	Observaciones Informe Mensual No. 1 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA		
SERINCO-SED-L4-2025-138	COMUNICACIÓN	12 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Comunicados No. 073 ARSAF - 2025 y No. 080 ARSAF - 2025 - REMISIÓN DE CONCEPTO ESTRUCTURAL CUBIERTA IED LOS TEJARES SEDE A - V1 Y V2	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L6-2025-139	COMUNICACIÓN	15 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 5 - Dic 08 al 14 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-140	COMUNICACIÓN	15 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 5 - Dic 08 al 14 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-141	COMUNICACIÓN	15 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 5 - Dic 08 al 14 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-142	COMUNICACIÓN	16 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-071. Hallazgo de Dos Capas de Piso en Cerámica y Alistado	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LX-2025-143	COMUNICACIÓN	16 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Alcance al Comunicado SERINCO-SED-L6-2025-132 - Traslado de Comunicado Procedimiento Desmonte e Instalación Cubierta Arborizadora Baja	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-144	COMUNICACIÓN	17 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Aprobación de Analisis de Precios Unitarios de Items No Previstos - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-145	COMUNICACIÓN	17 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INSPECTORES - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA		
SERINCO-SED-L5-2025-146	COMUNICACIÓN	18 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Traslado Comunicado SED-CF-L5-2025-013 y Aprobación Concepto Estructural Losa de Piso Bpo Borco, La Joya - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-147	COMUNICACIÓN	18 dic 2025	C SERINCO	CONSTRUCTORA PAIS	LOTE 6	Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-148	COMUNICACIÓN	18 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-149	COMUNICACIÓN	18 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME TECNICO No. 2 Periodo 6-11-2025 al 5-12-2025 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L5-2025-150	COMUNICACIÓN	18 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME TECNICO No. 2 Periodo 6-11-2025 al 5-12-2025 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L6-2025-151	COMUNICACIÓN	18 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME TECNICO No. 2 Periodo 6-11-2025 al 5-12-2025 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L5-2025-152	COMUNICACIÓN	19 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Acta Parcial No. 1 - Periodo (06.11.25 al 05.11.25)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS		
SERINCO-SED-L4-2025-153	COMUNICACIÓN	19 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Acta Parcial No. 1 - Periodo (06.11.25 al 05.11.25)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS		
SERINCO-SED-LX-2025-154	COMUNICACIÓN	19 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION		Remisión Acta Costos fijos y costos variables - Periodo (06.11.25 al 05.11.25) - Interventoria	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS		
SERINCO-SED-L4-2025-155	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 6 - Dic 15 al 21 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-156	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 6 - Dic 15 al 21 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-157	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 6 - Dic 15 al 21 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-158	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Actividades en Ejecución I.E.D. Estrella del Sur Sede B - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA		
SERINCO-SED-L5-2025-159	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Reiteración Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-160	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-161	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION 02 INF TÉCNICO MENSUAL No. 02 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS			
SERINCO-SED-L5-2025-162	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISION 02 INF TÉCNICO MENSUAL No. 02 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS			
SERINCO-SED-L6-2025-163	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION 02 INF TÉCNICO MENSUAL No. 02 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS			
SERINCO-SED-L4-2025-164	COMUNICACIÓN	26 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Respuesta a Radicado No. 091 ARSAF - 2025. Solicitud de información - Actividades no previstas (APUS)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L4-2025-165	COMUNICACIÓN	26 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Traslado comunicado Radicado N.° 092-ARSAF-2025 y solicitud de disposición de punto de acop	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L6-2025-166	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 7- Dic 22 al 28 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LX-2025-167	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Traslado Comunicado RADICADO N° 080-ARSAF-2025 y Aprobación Concepto Estructural CUBIERTA IED LOS TEJARES SEDE A - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L4-2025-168	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 7- Dic 22 al 28 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-169	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 7- Dic 22 al 28 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-170	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Ensayos según Especificaciones Técnicas - I.E.D. Unión Europea Sede B	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA		
SERINCO-SED-L5-2025-171	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Traslado Diseño de cubierta Biblioteca y Aprobación Concepto Estructural IED JOSE JAIME ROJAS - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L5-2025-172	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Traslado Diseño de cubierta Orientación y Aprobación Concepto Estructural IED JOSE JAIME ROJAS - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L6-2025-173	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado Comunicado OFI-SED-L6-079. Radicación presupuesto y esquema manejo Aguas Lluvias Unión Europea Sede B	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-174	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado Comunicado OFI-SED-L6-080. Radicación presupuesto y diagnóstico Dirección Local de Educación de Usme	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-175	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Ensayos según Especificaciones Técnicas - I.E.D. Arborizadora Baja, Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA		
SERINCO-SED-L6-2025-176	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Respuesta a Comunicado OFI-SED-L6-073 - Mejoramiento Cancha Multideportiva Norte Colegio Arborizadora Baja Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA		
SERINCO-SED-L5-2025-177	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Llamado de atención SST - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L6-2025-178	COMUNICACIÓN	31 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de APU´s Contractuales por Ajuste en la descripción de los Ítems 7.1.1, 7.1.5, 7.2.30, 7.2.31, 7.2.32, 7.2.33 y 16.1.25. - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-179	COMUNICACIÓN	31 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado Comunicado OFI-SED-L6-082 - Alcance OFI-SED-L6-071 Hallazgo dos Capas de Piso en Cerámica y Alistado	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-180	COMUNICACIÓN	31 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Entrega Inmediata e Implementación de un Plan de Contingencia - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-181	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 097 Arsaf - 2025 - Hallazgos en Red Eléctrica I.E.D Compartir Recuerdo Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-182	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 8- Dic 29 2025 a Ene 04 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-183	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 8- Dic 29 2025 a Ene 04 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-184	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 8- Dic 29 2025 a Ene 04 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-185	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Respuesta a Radicado No. 096 Arsaf - 2025 - Remisión de Dosificación de Concreto Utilizado Para Placas de Patios, Pasillos y Andenes	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL		
SERINCO-SED-L6-2025-186	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Situación Presentada en el Piso del Bloque de Primera Infancia del Colegio Arborizadora Baja	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA		
SERINCO-SED-L4-2025-187	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de Entrega de los Informes Mensuales (7 de enero) - lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L4-2025-188	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de APU´s Contractuales por Ajuste en la descripción de los Ítems 7.1.1, 7.1.5, 7.2.30, 7.2.31, 7.2.32, 7.2.33 y 16.1.25. - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-189	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Entrega de los Informes Mensuales (7 de enero) - lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L6-2025-190	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Entrega de los Informes Mensuales (7 de enero) - lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA		
SERINCO-SED-L6-2025-191	COMUNICACIÓN	7 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Acabados en la Instalación de Cubierta Colegio Arborizadora Baja - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA		
SERINCO-SED-L4-2025-192	COMUNICACIÓN	8 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION CUENTA DE OBRA No. 1	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS		
SERINCO-SED-L5-2025-193	COMUNICACIÓN	8 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION CUENTA DE OBRA No. 1	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS		
SERINCO-SED-L6-2025-194	COMUNICACIÓN	8 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION CUENTA DE OBRA No. 1	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS		
SERINCO-SED-INT-2025-195	COMUNICACIÓN	8 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION CUENTA DE INTERVENTORIA No. 3	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS		
SERINCO-SED-L4-2025-196	COMUNICACIÓN	9 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Entrega de Primer Paquete de Análisis de Precios Unitarios de Items No Previstos Conciliados con Estudios Previos (CEP) - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-197	COMUNICACIÓN	9 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Entrega del Primer Paquete de Análisis de Precios Unitarios de Items No Previstos Conciliados con Estudios Previos (CEP) - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-198	COMUNICACIÓN	13 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 9 - Ene 05 al 11 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-199	COMUNICACIÓN	13 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 9 - Ene 05 al 11 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-200	COMUNICACIÓN	13 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 9 - Ene 05 al 11 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-201	COMUNICACIÓN	13 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de Ensayos según Especificaciones Técnicas - I.E.D. Los Tejares, Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL		
SERINCO-SED-L4-2025-202	COMUNICACIÓN	13 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Ausencia de Personal Operativo en I

SERINCO-SED-LS-2025-213	COMUNICACIÓN	20 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L6-2025-214	COMUNICACIÓN	16 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA		
SERINCO-SED-LX-2025-215	COMUNICACIÓN	16 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SERINCO-SED-2025-215-L4-Traslado de RADICADO No. 106 ARSAF - 2025 - NOVEDAD ENTREGA D	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-LX-2025-216	COMUNICACIÓN	17 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	ALCANCE SERINCO-SED-L4-2025-192-REMISION CUENTA DE OBRA No. 1	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L4-2025-217	COMUNICACIÓN	19 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 10 - Ene 12 al 18 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-218	COMUNICACIÓN	19 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 10 - Ene 12 al 18 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-219	COMUNICACIÓN	19 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración Solicitud de Entrega Inmediata e Implementación Inmediata de un Plan de Contingencia - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LS-2025-220	COMUNICACIÓN	19 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 10 - Ene 12 al 18 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-221	COMUNICACIÓN	19 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LS-2025-222	COMUNICACIÓN	19 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LS-2025-223	COMUNICACIÓN	20 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L4-2025-224	COMUNICACIÓN	20 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	TRASLADO DE RADICADO No. 116 ARSAF - 2025 - SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE INICIO FRENTE DE OBRA IED ESTRELLA DEL SUR SEDE C	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L6-2025-225	COMUNICACIÓN	20 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Incumplimiento en la Entrega del Informe Mensual No.3 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA		
SERINCO-SED-L6-2025-226	COMUNICACIÓN	20 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud para Mantener en buen Estado los Cerramientos Provisionales en los Diferentes Frentes de Obra - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA		
SERINCO-SED-L4-2025-227	COMUNICACIÓN	20 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Incumplimiento en la Entrega del Informe Mensual No.3 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L4-2025-228	COMUNICACIÓN	21 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud para Mantener en buen Estado los Cerramientos Provisionales en los Diferentes Frentes de Obra - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL		
SERINCO-SED-LS-2025-229	COMUNICACIÓN	21 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Incumplimiento en la Entrega del Informe Mensual No.3 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-LS-2025-230	COMUNICACIÓN	21 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de entregables pendientes - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L6-2025-231	COMUNICACIÓN	21 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Respuesta a Comunicados OFI-SED-L6-109 y OFI-SED-L6-110	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LX-2025-232	COMUNICACIÓN	21 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de documentación requerida por la SED - Atenciones de emergencia - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L4-2025-233	COMUNICACIÓN	22 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Entrega del Segundo Paquete de Análisis de Precios Unitarios de ítems No Previstos Conciliados con Estudios Previos (SED) - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-234	COMUNICACIÓN	22 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Entrega del Segundo Paquete de Análisis de Precios Unitarios de ítems No Previstos Conciliados con Estudios Previos (SED) - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-235	COMUNICACIÓN	22 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Comunicado Radicado No. 104 ARSAF-2025-Remisión de Informes Avifauna y Silvicultural Atención de Emergencias de Tala y Poda	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LS-2025-236	COMUNICACIÓN	23 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de información de Pin ambiental - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L6-2025-237	COMUNICACIÓN	23 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de información de Pin ambiental - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA		
SERINCO-SED-L4-2025-238	COMUNICACIÓN	23 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de información de Pin ambiental - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-LS-2025-239	COMUNICACIÓN	23 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Segundo llamado de atención SST - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L4-2025-240	COMUNICACIÓN	26 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 11 - Ene 19 al 25 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LS-2025-241	COMUNICACIÓN	26 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 11 - Ene 19 al 25 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-242	COMUNICACIÓN	26 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 11 - Ene 19 al 25 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LS-2025-243	COMUNICACIÓN	26 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Orden y Aseo en las Diferentes Sedes Intervenidas	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO		
SERINCO-SED-L4-2025-244	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	SED - CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Compromisos Adquiridos en Mesa de Trabajo IED Los Tejares - Enero-23-2026	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-245	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración de Mantener en Buen Estado de Cerramiento Provisional IED Unión Europea.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA		
SERINCO-SED-L6-2025-246	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Información Sobre el inicio de Actividades de Obra en la IED Guillermo Cano Isaza	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA		
SERINCO-SED-L4-2025-247	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Segunda Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL		
SERINCO-SED-L6-2025-248	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Segunda Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA		
SERINCO-SED-LS-2025-249	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Segunda Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-250	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L4-2025-251	COMUNICACIÓN	28 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Estado de las Obras en IED Confederación Brisas del Diamante	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LS-2025-252	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Aprobación de Analisis de Precios Unitarios de Items No Previstos - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-253	COMUNICACIÓN	29 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Estado Actual Frente de Obra y Cerramiento Provisional en I.E.D. Unión Europea - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA		
SERINCO-SED-LS-2025-254	COMUNICACIÓN	30 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Ausencia de Personal Operativo en I.E.D. Miguel De Cervantes Saavedra	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO		
SERINCO-SED-LS-2025-255	COMUNICACIÓN	30 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Observaciones al Acabado Final de la Reja Metálica y Fecha de Entrega del Colegio.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO		
SERINCO-SED-LS-2025-256	COMUNICACIÓN	2 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 12 - Ene 26 a Feb 01 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-257	COMUNICACIÓN	2 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 12 - Ene 26 a Feb 01 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-258	COMUNICACIÓN	2 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Tercera Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LS-2025-259	COMUNICACIÓN	2 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Tercera Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-260	COMUNICACIÓN	2 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 12 - Ene 26 a Feb 01 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-261	COMUNICACIÓN	2 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Tercera Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-262	COMUNICACIÓN	4 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Actividad de Desmonte de Cubierta I.E.D Calasanz (Buenavista) Sede A.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA		
SERINCO-SED-L6-2025-263	COMUNICACIÓN	5 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Programa de Trabajo en Alturas para Actividad Desmonte Cubierta I.E.D Calasanz (Buenavista), Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA		
SERINCO-SED-LS-2025-264	COMUNICACIÓN	5 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD DE PERSONAL CONTRACTUAL	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-LX-2025-265	COMUNICACIÓN	5 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	RADICACIÓN DE CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORÍA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-LX-2025-266	COMUNICACIÓN	5 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-LX-2025-267	COMUNICACIÓN	6 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L6-2025-268	COMUNICACIÓN	6 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Información sobre el Número de Tanques Elevados a Reinstalar en la Dirección Local de Educación de Usme - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-269	COMUNICACIÓN	9 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 13 - Feb 02 al 08 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-270	COMUNICACIÓN	9 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 13 - Feb 02 al 08 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LS-2025-271	COMUNICACIÓN	9 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 13 - Feb 02 al 08 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-272	COMUNICACIÓN	9 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Ausencia del Residente de Obra en los Diferentes Frentes en Ejecución - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL		
SERINCO-SED-L6-2025-273	COMUNICACIÓN	9 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reubicación Zona de Acopio de Materiales de Desecho - IED. Colegio Orlando Fals Borda	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA		
SERINCO-SED-L6-2025-274	COMUNICACIÓN	9 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Estado Actual Frentes de Obra y Solicitud de Información de las Fecha de Terminación de cada Colegio	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA		
SERINCO-SED-L6-2025-275	COMUNICACIÓN	11 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Orden de Suspensión Inmediata de Actividades y Requerimiento de Cumplimiento Normativo - Resolución 4272/2021 - IED Buenavista (Calazans)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA		
SERINCO-SED-L6-2025-276	COMUNICACIÓN	11 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	SERINCO-SED-2025-276-L6-Entrega de EPP y Garantizar su uso por el Personal de Obra	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA		
SERINCO-SED-L4-2025-277	COMUNICACIÓN	11 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	TRASLADO DE RADICADO No. 135 ARSAF - 2025 - RESPUESTA OBSERVACIONES INFORMES SILVICULTURALES	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L6-2025-278	COMUNICACIÓN	12 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - IED ARBORIZADORA BAJA - CPF 1904	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA		
SERINCO-SED-L4-2025-279	COMUNICACIÓN	12 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - COL. FANNY MICKEY - CPF 1081	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L4-2025-280	COMUNICACIÓN	12 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INSPECTOR DE OBRA Y TECNICO SST - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L6-2025-281	COMUNICACIÓN	13 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración de Mantener en buen Estado los Cerramientos Provisionales en los Diferentes Frentes de Obra - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LS-2025-282	COMUNICACIÓN	13 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud para Mantener en buen Estado los Cerramientos Provisionales en los Diferentes Frentes de Obra - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-283	COMUNICACIÓN	13 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Reiteración de Mantener en buen Estado los Cerramientos Provisionales en los Diferentes Frentes de Obra - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-284	COMUNICACIÓN	16 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 14 - Feb 09 al 15 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L-2025-285	COMUNICACIÓN	16 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 14 - Feb 09 al 15 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LX-2025-286	COMUNICACIÓN	16 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 14 - Feb 09 al 15 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-287	COMUNICACIÓN	16 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	CAMBIO DE HOJA DE VIDA DE RESIDENTE DE OBRA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA		
SERINCO-SED-L6-2025-288	COMUNICACIÓN	16 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración de Suspensión de Actividades y Rechazo de Documentación - Oficio OFI-SED-L6-124.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA		
SERINCO-SED-L6-2025-289	COMUNICACIÓN	16 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Citación al Representante Legal de Consorcio País a Recorrido de Obra - Santa Librada	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA		
SERINCO-SED-LX-2025-290	COMUNICACIÓN	17 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Ausencia Periódica del Residente de Obra en los Diferentes Frentes en Ejecución - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL		
SERINCO-SED-LX-2025-291	COMUNICACIÓN	17 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Incumplimiento Reiterado en la Asistencia del Director de Obra a los Comités y Reuniones de Seguimiento - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL		
SERINCO-SED-L6-2025-292	COMUNICACIÓN	20 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION DE DOCUMENTO ANS - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA		
SERINCO-SED-LX-2025-293	COMUNICACIÓN	20 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	EVALUACION ANS PERIODOS 6-OCT-25 AL 05-FEB-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR.8155135, LOTE 4- CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-LS-2025-294	COMUNICACIÓN	20 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISION DE DOCUMENTO ANS - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L4-2025-295	COMUNICACIÓN	20 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION DE DOCUMENTO ANS - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-LX-2025-296	COMUNICACIÓN	17 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	TRASLADO RADICADO No. 143 ARSAF - 2025 - NOVEDAD EN PROTECCIÓN DE ELEMENTOS EN ESPACIOS DE INFORMATICA IED ESTRELLA DEL SUR SEDE D	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-LS-2025-297	COMUNICACIÓN	18 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Ausencia del Residente de Obra en los Diferentes Frentes en Ejecución - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO		
SERINCO-SED-L6-2025-298	COMUNICACIÓN	18 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Respuesta a Comunicado OFI-SED-L6-129	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA		
SERINCO-SED-L4-2025-299	COMUNICACIÓN	18 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME TECNICO No. 4 Periodo 6-01-2026 al 5-02-2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-LS-2025-300	COMUNICACIÓN	18 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME TECNICO No. 4 Periodo 6-01-2026 al 5-02-2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L6-2025-301	COMUNICACIÓN	18 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME TECNICO No. 4 Periodo 6-01-2026 al 5-02-2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA		
SERINCO-SED-L6-2025-302	COMUNICACIÓN	19 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	VIABILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE CUBIERTA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS			
SERINCO-SED-L4-2025-303	COMUNICACIÓN	19 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	RESPUESTA A RADICADO No. 141 ARSAF - 2025 - REMISIÓN DE DISEÑO PLACAS DE RECREACIÓN IED FANNY MICKEY SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-INT-2025-304	COMUNICACIÓN	20 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Respuesta a Correo con Asunto Contrato Mejoramientos. Verificación Ítems Contractuales	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LX-2025-305	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION CUENTA DE OBRA No. 2 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-LX-2025-306	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION CUENTA DE OBRA No. 2 - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-LX-2025-307	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION CUENTA DE OBRA No. 2 - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA		
SERINCO-SED-L4-2025-308	COMUNICACIÓN	23 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 15 - Feb 16 al 22 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LS-2025-309	COMUNICACIÓN	23 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 15 - Feb 16 al 22 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-310	COMUNICACIÓN	23 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 15 - Feb 16 al 22 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-311	COMUNICACIÓN	23 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Tercer Llamado de Atención por Ausencia Prolongada del Residente de Obra en los Diferentes Frentes en Ejecución - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL		

SERINCO-SED-LX-2025-312	COMUNICACIÓN	23 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION CUENTA DE INTERVENTORIA No. 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-L6-2025-313	COMUNICACIÓN	24 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	CAMBIO DE HOJA DE VIDA DE RESIDENTE DE OBRA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LS-2025-314	COMUNICACIÓN	24 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	EVALUACION ANS PERIODOS 6-OCT-25 AL 05-FEB-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR.8154895. LOTE 5- CONSORCIO FORTALEZA.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-315	COMUNICACIÓN	24 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	EVALUACION ANS PERIODOS 6-OCT-25 AL 05-FEB-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR.8154780. LOTE 6- CONSORCIO PAIS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LS-2025-316	COMUNICACIÓN	25 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Información Sobre Atención de Emergencia en IED Rafael Uribe Uribe - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-317	COMUNICACIÓN	25 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Incumplimiento en la entrega de balance y reprogramacion - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-318	COMUNICACIÓN	25 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Incumplimiento en la entrega de balance y reprogramacion - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-INT-2025-319	COMUNICACIÓN	27 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Listado de Actividades Criticas para Entregas de Colegios y Tareas no Incluidas en el Balance Inicial	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LS-2025-320	COMUNICACIÓN	27 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Poca Presencia de Personal Operativo Durante el mes de Febrero en las Diferentes Sedes Educativas	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-LX-2025-321	COMUNICACIÓN	27 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISIÓN DE INFORME ELÉCTRICO - IED COMPARTIR RECUERDO SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LS-2025-322	COMUNICACIÓN	27 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Demoras en la Entrega de Espacios a la Interventoria y Falta de Control ¨por de Consorcio Fortaleza en la Toma de Detalles	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-LX-2025-323	COMUNICACIÓN	27 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INSPECTORES - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-324	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 16 - Feb 23 a Mar 01 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-325	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 16 - Feb 23 a Mar 01 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LS-2025-326	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 16 - Feb 23 a Mar 01 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-327	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	EVALUACION ANS PERIODOS 4-SEP-25 AL 05-FEB-26, PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8169110 - CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-328	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Cuarto Llamado de Atención por Ausencia Prolongada del Residente de Obra en los Diferentes Frentes en Ejecución - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-329	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - COL SANTA LIBRADA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-330	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTO E INSPECTOR - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-331	COMUNICACIÓN	3 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INSPECTOR DE OBRA Y RESIDENTE DE OBRA - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LS-2025-332	COMUNICACIÓN	4 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Citación para Levantamiento de Actas de Vecindad a Baterías Sanitarias Biblioteca Chandul, Usme - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-333	COMUNICACIÓN	4 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION 04 INF TÉCNICO MENSUAL No. 04 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-334	COMUNICACIÓN	5 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Informe Ejecutivo Seguimiento de Obras de Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L6-2025-335	COMUNICACIÓN	5 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de APU de NP-03 Suministro e Instalación de Cubierta Modular Tipo Sandwich (ancho=50 mm) - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-336	COMUNICACIÓN	5 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION 04 INF TÉCNICO MENSUAL No. 04 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LS-2025-337	COMUNICACIÓN	5 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION 04 INF TÉCNICO MENSUAL No. 04 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-338	COMUNICACIÓN	6 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Observación y solicitud — Incumplimiento en entrega de formatos, registros e informes del SG-SST y control de obra y subcontratistas CONSORCIO ARSAF LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-339	COMUNICACIÓN	9 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 17 - Mar 02 al 08 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LS-2025-340	COMUNICACIÓN	9 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 17 - Mar 02 al 08 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-341	COMUNICACIÓN	9 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 17 - Mar 02 al 08 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-342	COMUNICACIÓN	10 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de APU´s de NP-01 Suministro e Instalación de Sanitario y NP-07 Demolición de Acabado y Alistado de Piso e= 0.18 Mt - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-343	COMUNICACIÓN	11 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Implementación de plan de mejoramiento - Entrega semanal de formatos SST (Lote 4)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-344	COMUNICACIÓN	12 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Llamado de atención a Inspector SST de Localidad de Usme y Solicitud de Cumplimiento de Obligaciones Contractuales - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LS-2025-345	COMUNICACIÓN	12 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Comunicado SED-CF-LS-2025-026 - Solicitud Modificatorio No. 2 Adición y Prorroga - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-346	COMUNICACIÓN	12 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - COL FABIO LOZANO SIMONELLI	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-347	COMUNICACIÓN	16 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 18 - Mar 09 al 15 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-348	COMUNICACIÓN	16 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 18 - Mar 09 al 15 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LS-2025-349	COMUNICACIÓN	16 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 18 - Mar 09 al 15 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-350	COMUNICACIÓN	16 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Llamado de Atención por Material Utilizado en Relleno de la Zona de la Tarima	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-351	COMUNICACIÓN	16 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	TRASLADO RADICADO No. 159 ARSAF - 2025 - INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN DE SALIDAS Y LUMINARIAS IED COMPARTIR RECUERDO SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-352	COMUNICACIÓN	16 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	TRASLADO RADICADO No. 169 ARSAF - 2025 - REMISIÓN DE REPROGRAMACIÓN FRENTE DE OBRA IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-353	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de Entrega de APU´s de ítems No Previstos Evidenciados a la Fecha- Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LS-2025-354	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Entrega de APU´s de ítems No Previstos Evidenciados a la Fecha- Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-355	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Entrega de APU´s de ítems No Previstos Evidenciados a la Fecha- Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-356	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME TECNICO No. 5 Periodo 6-02-2026 al 5-03-2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LS-2025-357	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME TECNICO No. 5 Periodo 6-02-2026 al 5-03-2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-358	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME TECNICO No. 5 Periodo 6-02-2026 al 5-03-2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-359	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Calasanz Buenavista - CPF 1904	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LS-2025-360	COMUNICACIÓN	18 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Tenerife Granada Sur, Sede B - CPF 564	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LS-2025-361	COMUNICACIÓN	18 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 546 - IED Santa Librada, Sede A - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LS-2025-362	COMUNICACIÓN	18 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 523 - IED Fabio Lozano Simonelli, Sede C - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LS-2025-363	COMUNICACIÓN	19 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Nueva Esperanza, Sede A - CPF 556	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-364	COMUNICACIÓN	20 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Luis Eduardo Mora Osejo, Sede A - CPF 566	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-365	COMUNICACIÓN	20 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1904 - IED Arborizadora Baja, Sede A - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LS-2025-366	COMUNICACIÓN	20 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Traslado de Comunicado SED-CF-LS-2025-030 - Solicitud prorroga entrega Colegio Brasilia, Miguel de Cervantes Saavedra Y Bicentenario	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-367	COMUNICACIÓN	24 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 19 - Mar 16 al 22 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-368	COMUNICACIÓN	25 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 180 Arsaf - 2025 - Solicitud de Modificatorio No. 2 de Adición y Prorroga Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155135 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-369	COMUNICACIÓN	24 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 19 - Mar 16 al 22 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LS-2025-370	COMUNICACIÓN	24 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 19 - Mar 16 al 22 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-371	COMUNICACIÓN	24 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1974 - IED Calasanz Buenavista, Sede A - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-372	COMUNICACIÓN	24 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración de la Solicitud de Entrega de los Informes Técnicos y Manuales de Mantenimientos de las IED Estrella del Sur, Sedes A y B, y Unión Europea	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LS-2025-373	COMUNICACIÓN	24 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED José María Vargas Vila, Sede A - CPF 1983	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-374	COMUNICACIÓN	25 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Compartir Recuerdo, Sede A - Compartir Lucero Alto CPF 1911	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-375	COMUNICACIÓN	26 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION CUENTA DE OBRA No. 3 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-376	COMUNICACIÓN	27 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISION CUENTA DE OBRA No. 3 - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-377	COMUNICACIÓN		C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION CUENTA DE OBRA No. 3 - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-378	COMUNICACIÓN	26 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	EVALUACION ANS PERIODO 6-FEB-26 AL 05-MAR-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR.8155135. LOTE 4- CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-379	COMUNICACIÓN	26 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION DE DOCUMENTO ANS PERIODO 6-FEB-26 AL 05-MAR-26 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-380	COMUNICACIÓN	30 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 20 - Mar 23 al 29 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-381	COMUNICACIÓN	30 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 20 - Mar 23 al 29 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LS-2025-382	COMUNICACIÓN	30 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 20 - Mar 23 al 29 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-383	COMUNICACIÓN	30 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión manual de mantenimiento - COL Brasilia, Luis Eduardo mora y Don Bosco	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-384	COMUNICACIÓN	30 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISIÓN CUENTA DE COBRO INTERVENTORIA No. 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-LX-2025-385	COMUNICACIÓN	31 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Respuesta a correo de Seguimiento y cumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en los Contratos de Obra CO1.PCCNTR. 8155135, CO1.PCCNTR. 8154895 y CO1.PCCNTR. 8154780 / Interventoria No CO1.PCCNTR. 8169110. Vigencia 2025.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA	
SERINCO-SED-LX-2025-386	COMUNICACIÓN	31 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Respuesta a correo de Solicitud de revisión periódica sobre el uso adecuado de elementos de protección personal en obra de los contratos No. CO1.PCCNTR. 8155135, CO1.PCCNTR. 8154895 y CO1.PCCNTR. 8154780, pertenecientes a los Lotes No 04, 05 y 06 vigencia 2025.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA	
SERINCO-SED-LX-2025-387	COMUNICACIÓN	31 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 05 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-388	COMUNICACIÓN	31 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 05 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-389	COMUNICACIÓN	31 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 05 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-390	COMUNICACIÓN	1 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-mar al 05-abr 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LS-2025-391	COMUNICACIÓN	1 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-mar al 05-abr 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-392	COMUNICACIÓN	1 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-mar al 05-abr 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LS-2025-393	COMUNICACIÓN	1 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED La Arabia, Sede B - CPF 1966	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-394	COMUNICACIÓN	1 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1981 - IED Fanny Mickey, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-395	COMUNICACIÓN	6 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 21 - Mar 30 a Abr 05 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-396	COMUNICACIÓN	6 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 21 - Mar 30 a Abr 05 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LS-2025-397	COMUNICACIÓN	6 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 21 - Mar 30 a Abr 05 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-398	COMUNICACIÓN	7 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia No. 2 y Remisión Ficha SAE - IED Calasanz Buenavista - CPF 1974	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-399	COMUNICACIÓN	7 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Respuesta de RADICADO No. 188 - ARSAF - 2025 - SOLICITUD DE PROTECCIÓN A VIDRIOS EN INTERVENCIÓN DE FACHADA - COLEGIO DIEGO MONTAÑA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-INT-2025-400	COMUNICACIÓN	8 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Solicitud Modificatorio No. 02 Adición y Prórroga. - Cto Interventoria CO1.PCCNTR.8169110 Grupo 2	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-401	COMUNICACIÓN	9 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-160 Radicación Documentos para Prórroga 02	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	

SERINCO-SED-L4-2025-402	COMUNICACIÓN	9 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de RADICADO No. 189 ARSAF -2025 - TRAZABILIDAD DE GESTIÓN DE CARGUE EN PLATAFORMA SDA - PIN 27920 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L6-2025-403	COMUNICACIÓN	9 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE RESIDENTE DE OBRA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA		
SERINCO-SED-LX-2025-404	COMUNICACIÓN	10 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de RADICADO No. 191 ARSAF -2025 - PROGRAMACIÓN DE ENTREGA DE CORNISAS IED DIEGO MONTAÑA SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-LX-2025-405	COMUNICACIÓN	10 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de OFI-SED-L6-165. Solicitud de revisión de descuentos aplicados por concepto de ANS - Posible doble cobro	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA		
SERINCO-SED-L4-2025-406	COMUNICACIÓN	13 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 22 - Abr 06 al 12 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-407	COMUNICACIÓN	13 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 22 - Abr 06 al 12 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-408	COMUNICACIÓN	13 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 22 - Abr 06 al 12 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-409	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME TECNICO No. 6 Periodo 6-03-2026 al 5-04-2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L5-2025-410	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME TECNICO No. 6 Periodo 6-03-2026 al 5-04-2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L6-2025-411	COMUNICACIÓN	13 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME TECNICO No. 6 Periodo 6-03-2026 al 5-04-2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA		
SERINCO-SED-LX-2025-412	COMUNICACIÓN	13 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de RADICADO No. 199 ARSAF -2025 - AREAS DE CUBIERTAS PARA ENTREGA IED CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-LX-2025-413	COMUNICACIÓN	14 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Llamado de atención por incumplimiento en la entrega del anexo de bitácoras de obra conforme a obligaciones contractuales - lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-LX-2025-414	COMUNICACIÓN	14 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Llamado de atención por incumplimiento en la entrega del anexo de bitácoras de obra conforme a obligaciones contractuales - lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L5-2025-415	COMUNICACIÓN	15 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1966 - IED La Arabia, Sede B - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-416	COMUNICACIÓN	15 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 556 - IED Nueva Esperanza, Sede A - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-417	COMUNICACIÓN	15 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Relación de Fechas Contractuales y Según Modificatorio No. 1 para las Entregas de las Obras de las Instituciones Educativas Intervenidas - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-418	COMUNICACIÓN	15 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Relación de Fechas Contractuales y Según Modificatorio No. 1 para las Entregas de las Obras de las Instituciones Educativas Intervenidas - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-419	COMUNICACIÓN	15 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Relación de Fechas Contractuales y Según Modificatorio No. 1 para las Entregas de las Obras de las Instituciones Educativas Intervenidas - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-420	COMUNICACIÓN	15 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Solicitud Concepto de Especialista Eléctrico y Actualización Ficha SAE para Atención de Emergencia, IED. Colegio Luis Eduardo Mora Osejo, Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA		
SERINCO-SED-L4-2025-421	COMUNICACIÓN	16 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Confederación Brisas del Diamante, Sede A - CPF 1912	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-422	COMUNICACIÓN	16 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Paquete de APU´s de Items No Previstos del NP-08 al NP-12 Aprobados por Interventoria- Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-423	COMUNICACIÓN	16 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Observaciones errores en bitácoras de obra.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO		
SERINCO-SED-L4-2025-424	COMUNICACIÓN	17 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Respuesta a RADICADO No. 201 ARSAF -2025 - RESPUESTA COMUNICADO SERINCO-SED-L4-2025-413 REMISIÓN DE INFORME MENSUAL TÉCNICO, AMBIENTAL Y SST VERSIÓN 2	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-425	COMUNICACIÓN	20 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 23 - Abr 13 al 19 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-426	COMUNICACIÓN	20 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 23 - Abr 13 al 19 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-427	COMUNICACIÓN	20 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 23 - Abr 13 al 19 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LX-2025-428	COMUNICACIÓN	20 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 06 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-LX-2025-429	COMUNICACIÓN	20 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 06 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L6-2025-430	COMUNICACIÓN	20 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 06 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA		
SERINCO-SED-L4-2025-431	COMUNICACIÓN	21 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Falla Prematura en Bisagras de Portón Plegable - Solicitud de Solución Técnica	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL		
SERINCO-SED-L5-2025-432	COMUNICACIÓN	22 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1983 - IED José María Vargas Vila, Sede A - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-433	COMUNICACIÓN	22 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 564 - IED Tenerife Granada Sur, Sede B - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-434	COMUNICACIÓN	24 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1912 - IED Confederación Brisas del Diamante, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-435	COMUNICACIÓN	24 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Brasilia - CPF 508	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-436	COMUNICACIÓN	24 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Compartir Recuerdo, Sede A - CPF 1911	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-437	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 24 - Abr 20 al 26 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-438	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 24 - Abr 20 al 26 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-439	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 24 - Abr 20 al 26 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-440	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Garantía Portón IED Estrella del Sur Sede C	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL		
SERINCO-SED-L5-2025-441	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Gabriel García Márquez, Sede A, Villa Diana - CPF 579	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-INT-2025-442	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTES 4 y 6	Solicitud para Gestionar Devolución de Dineros de Doble Cobro por Concepto de ANS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-443	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - Dirección Local de Usme, DILE - CPF 590	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-444	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Informe Ejecutivo Técnico Sobre Intervención de Baterías Sanitarias en IED Compartir Recuerdo, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL		
SERINCO-SED-L6-2025-445	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-172-Atención Observaciones APUS de NP-08, NP-09, NP-10, y NP-12 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-446	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-abr al 05-may 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-447	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-abr al 05-may 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-448	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-abr al 05-may 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-449	COMUNICACIÓN	28 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	EVALUACION ANS PERIODO 6-FEB-26 AL 05-MAR-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR.8155135. LOTE 4- CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L4-2025-450	COMUNICACIÓN	28 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION DE DOCUMENTO ANS PERIODO 6-MAR-26 AL 05-ABR-26 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L6-2025-451	COMUNICACIÓN	29 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Guillermo Cano Isaza, Sede A - CPF 1959	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-452	COMUNICACIÓN	29 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	EVALUACION ANS PERIODOS 6-MAR-26 AL 05-ABR-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR.8154780. LOTE 6- CONSORCIO PAIS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA		
SERINCO-SED-L6-2025-453	COMUNICACIÓN	29 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION DE DOCUMENTO ANS - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA		
SERINCO-SED-L6-2025-454	COMUNICACIÓN	29 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-174-Atención a Observaciones - Ítems NP-13 al NP-16 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-455	COMUNICACIÓN	30 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Traslado de Comunicado SED-CF-L5-2025-033 - Reprogramación y Balances, Colegio Brasilia, Miguel de Cervantes Saavedra y Bicentenario - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-456	COMUNICACIÓN	30 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	EVALUACION ANS PERIODOS 6-MAR-26 AL 05-ABR-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR.8154895. LOTE 5- CONSORCIO FORTALEZA.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L6-2025-457	COMUNICACIÓN	7 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION CUENTA DE OBRA No. 3 - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA		
SERINCO-SED-L4-2025-458	COMUNICACIÓN	30 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1911 - IED Compartir Recuerdo, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-459	COMUNICACIÓN	30 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 212 ARSAF - 2025 - Remisión de Reprogramación Contrato de Obra No. CO1. PCCNTR.8155135, Balance de Presupuestos y Disponibilidad de Espacios	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-460	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 25 - Abr 27 a May 03 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-461	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 25 - Abr 27 a May 03 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-462	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 25 - Abr 27 a May 03 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-INT-2025-463	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Alcance al Comunicado Solicitud Modificatorio No. 02 Adición y Prórroga. - Cto Interventoria CO1.PCCNTR.8169110 Grupo 2	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-464	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 218 Arsaf - 2025 - Respuesta a solicitud de fechas de entrega de baterias sanitarias de primaria y espacios piso 3 bloque A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-465	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Alcance a Comunicado Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Luis Eduardo Mora Osejo, Sede A - CPF 566	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-466	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Traslado de RADICADO No. 222 ARSAF - 2025 - SOLICITUD DE INGRESO DE PERSONAL PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA IED CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L5-2025-467	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	CAMBIO DE HOJA DE VIDA DE RESIDENTE DE OBRA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L4-2025-468	COMUNICACIÓN	5 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicados N° 190-ARSAF-2025 y N° 213-ARSAF-2025 Con Anexos y Concepto Estructural de Interventoría IED Rural La Unión - Usme	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-469	COMUNICACIÓN	5 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Alcance a Comunicado SERINCO-SED-2025-415-L5-Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1966 - IED La Arabia, Sede B - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-470	COMUNICACIÓN	5 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION CUENTA DE OBRA No. 4 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L5-2025-471	COMUNICACIÓN	5 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 569 - IED Gabriel García Márquez, Sede A, Villa Diana - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-472	COMUNICACIÓN	5 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION CUENTA DE OBRA No. 4 - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L4-2025-473	COMUNICACIÓN	6 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado N° 217 - Arsaf-2025-Remisión de Grupo de Actividades No Previstas No. 2 Versión No. 3 de NP-09 a NP-16	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-474	COMUNICACIÓN	7 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado no. 225 Arsaf - 2025 - Remisión de Evidencia de Filtración de Agua en Placa de Aula bajo Gradas IED Fanny Mikey Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-475	COMUNICACIÓN	7 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 508 - IED Brasilia - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-476	COMUNICACIÓN	7 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Respuesta Solicitud de Observaciones a Actividades No Conformes - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO		
SERINCO-SED-L5-2025-477	COMUNICACIÓN	8 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Informe por Entrega Final IED La Arabia, Sede A - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO		
SERINCO-SED-L4-2025-478	COMUNICACIÓN	11 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 26 - May 04 al 10 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-479	COMUNICACIÓN	11 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 26 - May 04 al 10 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-480	COMUNICACIÓN	11 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 26 - May 04 al 10 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-481	COMUNICACIÓN	11 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Retiro de Materiales Sobrantes de Construcción IED Unión Europea, Sede B - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA		
SERINCO-SED-L4-2025-482	COMUNICACIÓN	11 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Garantía Bateria Sanitaria IED Fanny Mickey Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL		
SERINCO-SED-L5-2025-483	COMUNICACIÓN	11 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Fernando González Ochoa, Sede A Chico Sur - CPF 510	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-INT-2025-484	COMUNICACIÓN	14 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISIÓN CUENTA DE COBRO INTERVENTORIA No. 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L6-2025-485	COMUNICACIÓN	15 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Paquete de APU´s de Items No Previstos del NP-12 a NP-16 Aprobados por Interventoria- Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-486	COMUNICACIÓN	15 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1959 - IED Guillermo Cano Isaza - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-487	COMUNICACIÓN	15 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME TECNICO No. 7 Periodo 6-04-2026 al 5-05-2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L5-2025-488	COMUNICACIÓN	15 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME TECNICO No. 7 Periodo 6-04-2026 al 5-05-2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L6-2025-489	COMUNICACIÓN	15 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME TECNICO No. 7 Periodo 6-04-2026 al 5-05-2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA		
SERINCO-SED-L6-2025-490	COMUNICACIÓN	16 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-185 - Atención Observaciones Presentadas por el Área de Estudios Previos SED	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-491	COMUNICACIÓN	16 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Estrella del Sur, Sede D - CPF 1962	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L5-2025-492	COMUNICACIÓN	16 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Bicentenario (El Tesoro de la Cumbre), Sede C - CPF 1986	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		

SERINCO-SED-LS-2025-493	COMUNICACIÓN	16 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED José Celestino Mutis, Sede A El Clavel (Mochuelo) - CPF 1985	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LS-2025-494	COMUNICACIÓN	19 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 27 - May 11 al 17 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-495	COMUNICACIÓN	19 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 27 - May 11 al 17 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-496	COMUNICACIÓN	19 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 27 - May 11 al 17 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-497	COMUNICACIÓN	20 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 230 Arsaf - 2025 - Remisión de Grupo de Actividades No Previstas No. 2 Versión No. 3 de NP-09 a NP-16	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LS-2025-498	COMUNICACIÓN	21 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de APU´s de Items No Previstos NP-06 al NP-10 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LS-2025-499	COMUNICACIÓN	21 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Entrega Formal en Físico de las Actas de Vecindad - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-500	COMUNICACIÓN	21 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de Entrega Formal en Físico de las Actas de Vecindad - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-501	COMUNICACIÓN	21 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Entrega Formal en Físico de las Actas de Vecindad - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LS-2025-502	COMUNICACIÓN	21 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia No. 2 y Remisión Ficha SAE - IED José Celestino Mutis, Sede A El Clavel (Mochuelo) - CPF 1985	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-503	COMUNICACIÓN	21 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION 07 INF TÈCNICO MENSUAL No. 07 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-LS-2025-504	COMUNICACIÓN	22 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 07 - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L6-2025-505	COMUNICACIÓN	22 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 07 - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA		
SERINCO-SED-LS-2025-506	COMUNICACIÓN	25 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 28 - May 18 al 24 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-507	COMUNICACIÓN	25 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 28 - May 18 al 24 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-508	COMUNICACIÓN	25 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 28 - May 18 al 24 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-509	COMUNICACIÓN	25 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Cundinamarca, Sede A La Riviera del Sur - CPF 1980	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-510	COMUNICACIÓN	25 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Toma de Detalles Varios IED Ofelia Uribe de Acosta, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LS-2025-511	COMUNICACIÓN	25 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Programación de Obras para Intervención de Baterías Sanitarias IED Miguel de Cervantes, Sede B Biblioteca Marichuela - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-512	COMUNICACIÓN	25 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 533 - IED Rural La Unión, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-513	COMUNICACIÓN	26 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 510 - IED Fernando González Ochoa, Sede A Chico Sur - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-514	COMUNICACIÓN	26 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado a la SED de Primer Paquete de Manuales y Matrices de Mantenimiento - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-515	COMUNICACIÓN	26 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado a la SED de Primer Paquete de Manuales y Matrices de Mantenimiento - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LS-2025-516	COMUNICACIÓN	26 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Traslado a la SED de Primer Paquete de Manuales y Matrices de Mantenimiento - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LS-2025-517	COMUNICACIÓN	26 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia No. 2 CPF 1985 - IED José Celestino Mutis, Sede A El Clavel (Mochuelo) - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-518	COMUNICACIÓN	28 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZAS Y SOPORTES DE REPORTES AMBIENTALES	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA		
SERINCO-SED-LS-2025-519	COMUNICACIÓN	28 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Respuesta a Solicitud de Atención de Garantía Divisiones de Baño en Acero Inoxidable CPF 508 IED Brasilia - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO		
SERINCO-SED-L4-2025-520	COMUNICACIÓN	28 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZAS Y SOPORTES DE REPORTES AMBIENTALES	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-LS-2025-521	COMUNICACIÓN	28 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZAS Y SOPORTES DE REPORTES AMBIENTALES	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON		
SERINCO-SED-L4-2025-522	COMUNICACIÓN	29 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado N° 234-Arsaf-2025 - Solicitud de Información para Entrega de Espacios, Manual y Matriz de Mantenimiento del IED Confederación Brisas del Diamante Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-523	COMUNICACIÓN	29 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado N° 236-Arsaf-2025 - Remisión de Informe de Verificación de Avifauna y Ejecución de Tratamientos Silviculturales	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-524	COMUNICACIÓN	1 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 29 - May 25 al 31 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LS-2025-525	COMUNICACIÓN	1 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 29 - May 25 al 31 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-526	COMUNICACIÓN	1 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 29 - May 25 al 31 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-527	COMUNICACIÓN	3 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de RADICADO N° 244-ARSAF-2025 -REMISIÓN DE POLIZAS ACTUALIZADA CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155135 SEGÚN MODIFICATORIO No. 2	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ		
SERINCO-SED-L4-2025-528	COMUNICACIÓN	3 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 243 Arsaf - 2025 - Remisión de Atención de Observaciones Grupo No. 2 de Actividades No Previstas.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-529	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-196 Atención Observaciones NP´s 12 15 y 16	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-530	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-195 Atención Observaciones NP´s 10 y 11	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-531	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 242 Arsaf - 2025 - Remisión de Programación Frentes de Obra por Modificatorio No. 2 y Presupuesto IED Arborizadora Alta	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LS-2025-532	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia No. 1 y Remisión Ficha SAE - IED José Celestino Mutis, Sede A El Clavel (Mochuelo) - CPF 1985	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-533	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto, Cronograma de Emergencia y Ficha SAE - IED Luis Eduardo Mora Osejo, Sede A - CPF 566	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-534	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Reiteración de Entrega Formal en Físico de las Actas de Vecindad - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LS-2025-535	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Reiteración de Entrega Formal en Físico de las Actas de Vecindad - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-536	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración de Entrega Formal en Físico de las Actas de Vecindad - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-537	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-LS-2025-538	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-539	COMUNICACIÓN	4 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L6-2025-540	COMUNICACIÓN	5 jun 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia No. 3 y Remisión Ficha SAE - IED Calasanz Buenavista - CPF 1974	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
SERINCO-SED-L4-2025-541	COMUNICACIÓN	5 jun 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 240 Arsaf - 2025 - Respuesta Derecho de Petición por Filtración de agua IED Ofelia Uribe de Acosta Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G		
