Interior

Al contestar cite Radicado 2026-3-003122-018181 Id: 790471
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 19-06-2026 15:25:41
Folios: 2
Anexos: 0

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

DE: **ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GARCÍA**
SUPERVISOR
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA.

ASUNTO: REMISIÓN INFORMES DE SUPERVISIÓN MES DE ABRIL DE 2026

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor, me permito remitir a su dependencia los informes de supervisión correspondientes al mes de abril de 2026, para su conocimiento y trámite correspondiente.

N° CONVENIO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FOLIOS
1313-23	ARGELIA	CAUCA	46
1767-24	CHACHAGUI	NARIÑO	199
2311-25	CIÉNAGA DE ORO	CÓRDOBA	88
1470-24	CONSACA	NARIÑO	191
2323-25	CUBARRAL	META	152
2306-24	DISTRISEGURIDAD		29
2307-25	EL PEÑOL	NARIÑO	64
1543-20	GIRARDOT	CUNDINAMARCA	131
1918-22	IPIALES	NARIÑO	350
2180-25	LA GLORIA	CESAR	81
901-21	LETICIA	AMAZONAS	97
2345-25	MANZANARES	CALDAS	100
2314-25	MORROA	SUCRE	21
2315-25	POTOSÍ	NARIÑO	52
1878-21	RIONEGRO	ANTIOQUIA	296

2299-25	SAN MARTÍN DE LOS LLANOS	META	161
2053-21	SANTA FE DE ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	73
2175-25	SANTA FE DE ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	38
2336-25	SAPUYES	NARIÑO	441
2311-22	TIBACUY	CUNDINAMARCA	22
2301-25	TUCHÍN	CÓRDOBA	68
2050-21	TUMACO	NARIÑO	55
1617-23	VILLA RICA	CAUCA	40
2331-25	VISTAHERMOSA	META	105

Cordialmente,

ANDRES FELIPE HERNÁNDEZ GARCÍA
Supervisor – Profesional Especializado – SPS

Elaboró: Alejandra Benavides Galviz – Profesional Apoyo a la supervisión - SPS

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
No. 2306 DE 2024, DISTRISEGURIDAD -CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C, BOLIVAR
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ABRIL DE 2026

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON Y DISTRISEGURIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA – MECAR".		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	SECTOR CHAMBACU EDF INTELIGENTE CRA 13 OFC 609, CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C, BOLIVAR		
BENEFICIARIO:	POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA – MECAR		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		**$11.698.693.876**
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		**$3.000.000.000**
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		**$14.698.693.876**
FECHA SUSCRIPCIÓN	15 de noviembre de 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	30/05/2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Ing. Andrés Felipe Hernández		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Ing. Sergio Sanjuan Santiago	15/11/2024	7/03/2025
	Ing. Angela Jaramillo Gómez	08/03/2025	10/04/2025
	Ing. Andrés Felipe Hernández	11/04/2025	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Oscar A Spath Grass	20/01/2025	10/04/2025
	Alejandra Benavides Galviz	11/04/2025	31/12/2025
	Alejandra Benavides Galviz	26/01/2026	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 105524	18/11/2024	
	No. 1225	09/01/2025	
NUMERO DOCUMENTO CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 40824	31/10/2024	
	No. 1225	2025-01-09 00:00:00	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)			
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 21-44-101459255	12/12/2024	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	12/12/2024		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: 11-03-2025
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: 10-06-2025
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: 26-12-2025
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: N/A
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: N/A
	REINICIO		FECHA: N/A

PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	Cumplimiento: 10/12/2025
	Calidad de servicio: 10/06/2027
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: 10/06/2027
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A
VALOR DE OBRA	N/A
VALOR INTERVENTORÍA	N/A
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes documentos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio	N/A	24-02-2025	$5.685.565.224
SEGUNDO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes documentos: A. Publicación del evento de cotización para adquisición mediante el acuerdo Marco de Vehículos III - CCE-163-III-AMP-2020. B. Proyecto de prepliegos del proceso contractual que adelante DISTRISEGURIDAD, para los vehículos no cubiertos por el acuerdo marco.	N/A	24-09-2025	$3.790.376.816
ÚLTIMO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes documentos: A. Soporte de recibo a cabalidad de los vehículos contratados. B. Informe de ejecución, de acuerdo con el cronograma de actividades. C. Acta de entrega y recibo a satisfacción de los vehículos adquiridos expedida por la supervisión designada por el Ministerio del Interior. D. Informe de seguimiento financiero de los recursos (anexo 5 del Ministerio del Interior) acompañado de sus correspondientes soportes.	N/A		$2.222.751.836
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 9.475.942.040
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$0

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
21-44-101459255	Cumplimiento	$ 1.469.869.387,60	11/12/2024	15/09/2025
	Calidad de servicio	$ 734.934.693,80	15/03/2025	15/03/2027
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 1.469.869.387,60	15/03/2025	15/03/2027
21-44-101459255-3	Cumplimiento	$ 1.469.869.387,60	11/12/2024	10/12/2025
	Calidad de servicio	$ 734.934.693,80	10/06/2025	10/06/2027
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 1.469.869.387,60	10/06/2025	10/06/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

VEHÍCULOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE TVEC				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR ORDEN DE COMPRA**	**ORDEN DE OMPRA**
1	Camionetas 4x4 pick –up doble cabina uniformadas	16	$ 3.849.769.353	146403
2	Camionetas 4x4 pick –up doble cabina no uniformada	1	$ 226.769.644	146392
3	Vehículo sedan no uniformado	3	$263.790.650	148773

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR ORDEN DE COMPRA
1	Vehículos uniformados para transporte de capturados	10	$ 3.731.300.000,00
2	Adquisición de unidad móvil para el transporte de caninos k9 uniformado	1	$ 353.900.000,00
3	Camioneta blindada 7 puestos no uniformada.	2	$1.093.000.000,00
4	Cuatrimotos uniformados	6	$ 496.800.000,00
5	Buggy para seguridad de playas uniformado	2	$ 356.400.000,00

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	N/A		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A		$ 0,00
	N/A		$ 0,00
Nombre contratista	N/A		
Fecha de Acta de inicio del contrato	N/A		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	N/A	
	SUSPENSIÓN	N/A	
	REINICIO	N/A	
Fecha de terminación del contrato	N/A		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**N/A**		
PÓLIZA No.	N/A		
FECHA DE LA PÓLIZA	N/A		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	N/A	$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A	$ 0,00
	N/A	$ 0,00

Nombre contratista	N/A		
Fecha de Acta de inicio del contrato	N/A		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	N/A	
	SUSPENSIÓN	N/A	
	REINICIO	N/A	
Fecha de terminación del contrato	N/A		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**N/A**		
PÓLIZA No.	N/A		
FECHA DE LA PÓLIZA	N/A		

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	N/A		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A		$ 0,00
	N/A		$ 0,00
Nombre contratista	N/A		
Fecha de Acta de inicio del contrato	N/A		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	N/A	
	SUSPENSIÓN	N/A	
	REINICIO	N/A	
Fecha de terminación del contrato	**N/A**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**N/A**		
PÓLIZA No.	N/A		
FECHA DE LA PÓLIZA	N/A		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	N/A		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	N/A		$ 0,00
	N/A		$ 0,00
Nombre contratista	N/A		
Fecha de Acta de inicio del contrato	N/A		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	N/A	
	SUSPENSIÓN	N/A	
	REINICIO	N/A	
Fecha de terminación del contrato	N/A		

VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**N/A**
PÓLIZA No.	**N/A**
FECHA DE LA PÓLIZA	**N/A**

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO / ENTIDAD

:	SI	NO
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO / ENTIDAD: Abril 2026	X	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA: N/A		X
INFORME FINANCIERO: Abril 2026	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA: $ 3.582.532.733,03	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO: Se recibió por las partes un total de 33 de los 50 vehículos establecidos en el Acuerdo Marco. Adicionalmente, Distriseguridad informa que, se encuentra surtiendo el debido proceso las publicaciones en la TVEC y en SECOP II para los vehículos pendientes de adquirir	X	
OTROS		X

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**N/A**
% EJECUTADO DE OBRA	**N/A**

Componente Técnico

Durante el mes de abril de 2026, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024 suscrito entre el Ministerio del Interior y Distriseguridad, presenta un avance de ejecución **del 82%**, reflejado en un total de vehículos de 41 vehículos adquiridos, distribuidos de la siguiente manera:

Adquisiciones mediante Acuerdo Marco III - CCE-163-III-AMP-2020:

- Evento 148773: 3 vehículos sedán no uniformados por $263.790.650.
- Evento 146392: 1 camioneta no uniformada por $226.769.644.
- Evento 146403: 16 camionetas uniformadas por $3.849.769.353.

Adquisiciones mediante Subasta Inversa No. DSPSA-SIE-003-2024 – Lote 2:

- 10 vehículos uniformados para transporte de capturados por $3.731.300.000.
- 1 unidad móvil uniformada para transporte de caninos K9 por $353.900.000.
- 2 camionetas tipo SUV blindadas no uniformadas por $1.093.000.000.
- 6 cuatrimotos uniformadas por $496.800.000.
- 2 buggies para seguridad de playas uniformados por $356.400.000.

En cumplimiento de las funciones de supervisión por parte del Ministerio del Interior, y con base en la información contenida en el informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026, remitido por Distriseguridad, se presenta el resumen del avance técnico del Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024:

Durante el mes de abril de 2026, el convenio continuo con 41 vehículos adquiridos, de los cuales 33 han sido entregados y recibidos a satisfacción por las partes, mediante acta de entrega definitiva suscrita el 2 de octubre de 2025, que formaliza la transferencia de 14 vehículos adicionales (5 vans uniformadas para transporte de capturados, 6 cuatrimotos y 2 buggys uniformados para seguridad en playas). Todos los vehículos fueron inspeccionados por el equipo técnico de Distriseguridad y la Policía Metropolitana de Cartagena, verificando su cumplimiento con las especificaciones contractuales.

En cuanto a los procesos de adquisición pendientes, Distriseguridad reportó que las dos órdenes de compra publicadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), relacionadas con un bus para transporte de 40 pasajeros no uniformado y una camioneta tipo van de 15 a 19 pasajeros no uniformada, fueron declaradas desiertas mediante Resolución No. 122 del 22 de octubre de 2025, al no presentarse oferentes. Asimismo, en relación con el Lote No. 3, publicado bajo la modalidad de Subasta Inversa (Proceso DSPSA–SIE–001–2025) en la plataforma SECOP II, se informó que el único oferente no cumplió con los requisitos técnicos establecidos, por lo cual el proceso será declarado desierto en los próximos días.

En términos globales, el avance técnico acumulado del convenio alcanza el 82 %, considerando que 33 vehículos han sido entregados, 8 se encuentran contratados y pendientes de recibo (incluyendo unidades K9, camionetas blindadas y vehículos para transporte de capturados), y 7 vehículos permanecen sin adjudicar debido a la falta de oferentes en los procesos de contratación.

Esto muestra un avance en la contratación pendiente, aunque han presentado condicionada por las dificultades del mercado automotor y la disponibilidad de los vehículos con las especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo marco y el anexo técnico del convenio.

Componente administrativo

En el mes de abril de 2026 se realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones especificas consignadas en la minuta del Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024:

- El 6 de abril de 2026 se envió a Distriseguridad, mediante correo electrónico, la citación para la reunión de seguimiento virtual al Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024, programada para realizarse el 8 de abril de 2026.

- El 10 de abril de 2026 se recibió, por medio de correo electrónico enviado por Distriseguridad, el Oficio No. 0326, mediante el cual se presenta el informe mensual correspondiente al mes de marzo de 2026.

- El 13 de abril de 2026 se remitió, mediante correo electrónico, a Distriseguridad el acta de la reunión de seguimiento presencial realizada el 8 de abril de 2026, con el fin de socializar su contenido y gestionar la firma por parte de los asistentes en donde se trató el estado de avance del convenio 82%, el seguimiento a la entrega de los vehículos pendientes especialmente los blindados y K9, y la necesidad de realizar verificación en campo para validar su estado real. Así mismo, se evidenciaron retrasos frente al cronograma, debilidades en la trazabilidad de la información por vehículo y riesgos asociados a los procesos de adecuación y blindaje, por lo que se requirió la presentación de un informe detallado, la formulación de un plan de choque y el cumplimiento de compromisos con fechas definidas para garantizar la ejecución dentro del plazo contractual.

- El 24 de abril de 2026 se envió mediante oficio con memorando No. 2026-2-003122-017877 Id: 750219, con asunto “Requerimiento de cumplimiento de compromisos y solicitud de cronograma actualizado de entrega de vehículos – Convenio No. 2306 de 2024”, una comunicación formal a Distriseguridad en la que se reiteró el incumplimiento de los compromisos establecidos en el acta de seguimiento del 8 de abril de 2026 , cuyos plazos vencieron sin que se recibiera respuesta, incluyendo la remisión del informe mensual de marzo 9 de abril, el informe detallado del estado de los vehículos pendientes 13 de abril, la presentación del plan de choque 13 de abril y la entrega del vehículo tipo Hyundai 15 de abril, en consecuencia, se requirió el cumplimiento inmediato de dichas obligaciones, así como la remisión de un cronograma actualizado, detallado y verificable de entrega de los vehículos pendientes, advirtiendo que, a la fecha del requerimiento, no se había recibido respuesta formal y que el convenio tiene como fecha límite de ejecución el 30 de mayo de 2026.

- El 29 de abril de 2026 se envió a Distriseguridad, mediante correo electrónico, la citación para la reunión de seguimiento presencial al Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024, programada para realizarse el 6 de mayo de 2026.

Componente financiero

Se presenta el estado financiero del convenio a corte de abril de 2026
El convenio presenta un avance financiero del 70,56%

ESTADO COMPONENTE FINANCIERO	
VALOR DESEMBOLSADO A ABRIL DE 2026	$3.852.222.016,83 a
ORDENES DE COMPRA EN TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)	$ 4.340.329.647,00
LOTE ADJUDICADO SUBASTA DSPSA SIE 003-2024	$ 6,031,400,000.00
VALOR TOTAL, ADJUDICADO	$ 10.371.729.647,00

Componente Jurídico

- En el mes de Abril de 2026 el convenio no presento ninguna actuación contractual

Documentos Anexos

- Anexo correo de citación a reunión de seguimiento
- Anexo oficio No. 0326 Informe marzo 2026
- Anexo corre de socialización de acta de reunión de seguimiento
- Anexo oficio con radicado No 2026-2-003122-017877 Id: 750219
- Anexo correo de citación a reunión de seguimiento presencial

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Durante el mes de abril de 2026, El Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024 presenta un avance técnico acumulado del 82 %, con 41 vehículos adquiridos, de los cuales 33 han sido entregados y recibidos a satisfacción, mientras que 8 se encuentran contratados y pendientes de recibo, incluyendo unidades K9, vehículos blindados y de transporte de capturados. Adicionalmente, 7 vehículos no han sido adjudicados debido a procesos declarados desiertos por falta de oferentes, lo cual ha impactado el alcance inicial del proyecto.

Durante el mes de abril se evidenciaron retrasos en el inicio del proceso formal de recibo por parte del Ministerio, pese a estar programado, situación que motivó la emisión de alertas de presunto incumplimiento por parte de la supervisión. Si bien Distriseguridad ha adelantado la entrega progresiva de vehículos y la verificación técnica, documental y operativa de los mismos, la ejecución se ha visto condicionada por factores como la disponibilidad del mercado automotor, los tiempos de adecuación y blindaje, y la necesidad de fortalecer el seguimiento a los contratos derivados. En consecuencia, se han requerido acciones correctivas para garantizar el cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo vigente, previsto hasta el 30 de mayo de 2026.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

11/04/2025	20/08/2025	30/09/2025	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8. SUPERVISOR

IM-Distriseguridad-4-26 **ING. ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GARCÍA** Supervisor del Convenio -2306-24 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON	**ALEJANDRA BENAVIDES GALVIZ** Elaboró – Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON

Oficio No. 0487
INFORME PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ABRIL DE 2026 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2306 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DISTRISEGURIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS CON BPIN 2024130010032

Cartagena de Indias D.T Y C. 15 de mayo de 2026

PARA: ANDRES FELIPE HERNANDEZ GARCIA - Supervisor del Convenio 2306 de 2024
ALEJANDRA BENAVIDES GALVIZ – Apoyo a la Supervisión del Convenio
JOSÉ AHUMADA SOTO – Apoyo Jurídico del Convenio

DE: JAIME RICARDO HERNADEZ AMIN – Director General
LUIS FELIPE RECIO SARMIENTO - Supervisor del Convenio 2306 de 2024

Saludos cordiales,

Saludos cordiales, Con fundamento en la función general de vigilar la ejecución contractual y ejercer el control sobre el cumplimiento de las condiciones pactadas en el Convenio descrito en la referencia, y en virtud de la obligación establecida en la Cláusula Décima Sexta – Informes del Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024, suscrito entre el Ministerio del Interior – FONSECON y DISTRISEGURIDAD, se presenta el informe correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 31 de abril de 2026.

GENERALIDADES DEL CONVENIO	
No. CONTRATO Y/O CONVENIO	No. 2306 DE 2024
OBJETO	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON Y DISTRISEGURIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA – MECAR".*
VALOR	$14.698.693.876 APORTES MINISTERIO - FONSECON: $11.698.693.876 DISTRISEGURIDAD: $3.000.000.000
CONTRATISTA/CONVENIDO/REPRESENTANTE LEGAL	DISTRISEGURIDAD
C.C. O NIT	806.013.404-2

NOMBRE SUPERVISOR	LUIS FELIPE RECIO SARMIENTO
C.C.	72126151
PLAZO INICIAL	(03) TRES MESES
LUGAR DE EJECUCION	DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
FECHA DE INICIO	12/12/2024
FECHA FINAL DEL CONVENIO	26/12/2025
PRORROGA/ADICIÓN	Las partes suscribieron tres (03) actas modificatorias del Convenio en el sentido de: 1- Prorrogar el plazo de ejecución inicialmente pactado por tres (03) meses más. 2- Prorrogar el plazo de ejecución convenido hasta el 26 de diciembre de 2025 3- Prorrogar el plazo de ejecución convenido hasta el 30 de mayo de 2026

ACTAS SUSCRITAS POR LA ENTIDAD EN DESARROLLO DEL CONVENIO.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril y el 31 de abril de 2026, no se suscribieron actas con ocasión a la suscripción del Convenio.

COPIA DEL ÚLTIMO INFORME DE INTERVENTORÍA

No aplica.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL.

Durante el periodo objeto del presente informe se adelantaron diferentes actividades de seguimiento técnico, administrativo, jurídico y contractual relacionadas con la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024, especialmente orientadas al control y verificación de los contratos derivados para la adquisición y adecuación de los vehículos destinados al fortalecimiento de la movilidad de la Policía Metropolitana de Cartagena – MECAR.

En desarrollo de lo anterior, el día 08 de abril de 2026 se llevó a cabo reunión de seguimiento y control al convenio entre el Ministerio del Interior – FONSECON y DISTRISEGURIDAD, en la cual se revisó el estado técnico, financiero y contractual de la

ejecución del Convenio, así como el avance de los vehículos pendientes de entrega y las medidas requeridas para mitigar riesgos de incumplimiento contractual.

En el marco de dicha reunión, la supervisión del Ministerio del Interior requirió a Distriseguridad fortalecer los mecanismos de control y seguimiento respecto de los contratos derivados, solicitando la consolidación de información detallada por vehículo, el ajuste del cronograma conforme a la ejecución real y la implementación de acciones orientadas a superar los retrasos evidenciados en los procesos de adecuación, blindaje y alistamiento de las unidades pendientes.

Así mismo, conforme a los compromisos adquiridos en la mencionada mesa de seguimiento, Distriseguridad adelantó visita técnica y actividades de verificación documental y física sobre el estado real de los vehículos pendientes, evidenciando avances parciales en las unidades blindadas Toyota Prado Land Cruiser TX y en el vehículo tipo K9 Chevrolet Colorado, así como condiciones técnicas y logísticas asociadas a retrasos derivados de factores externos relacionados con disponibilidad de mercado, procesos de importación y suministro de materiales especializados para blindaje.

De igual forma, durante el mes de abril de 2026 se adelantó el trámite administrativo y jurídico correspondiente a la solicitud de prórroga – sexta modificación del contrato derivado No. CO1.PCCNTR.7919459, suscrito con A.T.V. PREMIUM S.A.S., cuyo objeto corresponde a la adquisición de vehículos con mantenimiento preventivo y adecuaciones no cubiertas por el Acuerdo Marco de Precios.

Dicha solicitud fue sustentada por el contratista mediante comunicación formal del 29 de abril de 2026, en la cual manifestó la persistencia de circunstancias técnicas, logísticas y de mercado que han impactado la ejecución contractual, tales como retrasos en la cadena de suministro, escasez de materiales balísticos y anomalías técnicas presentadas en una de las unidades vehiculares, situaciones que incidieron directamente en la reprogramación del cronograma contractual.

En atención a lo anterior, mediante Memorando No. 0447 de fecha 29 de abril de 2026, la Dirección Operativa remito al director general la solicitud de autorización para iniciar los trámites correspondientes a la solicitud de prórroga – sexta modificación al contrato No. CO1.PCCNTR.7919459, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 29 de mayo de 2026, con el propósito de garantizar la culminación de las adecuaciones técnicas, superar las contingencias de suministro y asegurar la entrega a satisfacción de los bienes contratados.

Adicionalmente, en cumplimiento de los compromisos establecidos con la supervisión del Ministerio del Interior, Distriseguridad adelantó las actuaciones administrativas necesarias para formalizar la entrega definitiva de uno (1) vehículo tipo Hyundai Staria 2.2L Diesel destinado a la Policía Metropolitana de Cartagena – MECAR, adquirido en el marco del Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024.

En ese sentido, se elaboró y remitió el acta de entrega definitiva de bienes a terceros beneficiarios, documento que contiene las especificaciones técnicas del vehículo, verificación documental, recomendaciones operativas y constancia de recibo, el cual fue suscrito por el Director General y el Director Operativo de Distriseguridad y remitido a la

Policía Metropolitana de Cartagena para su correspondiente revisión, firma y aprobación institucional.

Lo anterior se desarrolló conforme a las competencias funcionales de Distriseguridad relacionadas con el apoyo logístico y tecnológico a los organismos de seguridad, y en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024, orientadas al fortalecimiento de las capacidades operativas de la Policía Metropolitana de Cartagena.

INFORME FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Se remite INFORME FINANCIERO que refleja los movimientos a corte abril 2026, el cual se adjunta con sus respectivos soportes en formato PDF y formato EXCEL.

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

El Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024 continúa en etapa de seguimiento administrativo, contractual y financiero, en el marco de la prórroga vigente hasta el 30 de mayo de 2026, manteniéndose las actuaciones orientadas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.

SOPORTE DOCUMENTAL

1. Acta de reunión de seguimiento de fecha 08 de abril de 2026.
2. Memorando No. 0447 – Solicitud de prórroga sexta modificación contrato No. CO1.PCCNTR.7919459.
3. Acta de entrega definitiva del vehículo Hyundai Staria 2.2L Diesel.
4. Cronograma actualizado de ejecución y entrega de vehículos.
5. Informe financiero corte abril de 2026

Atentamente,

LUIS FELIPE RECIO SARMIENTO
PUE OPERATIVO
SUPERVISOR

Proyectó: Nayib Pájaro – Asesora Jurídica Externa
Lorena Chacón – Asesor externo D.O
Proyecto componente económico: Erich Piña – Asesor externo D.O
Revisó: Karen Orozco – Asesor externo D.O
Andrés Acuña – Asesor externo D.O
Aprobó: Julio Cesar Devoz Carrasquilla – Director Operativo DS.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2306 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DISTRISEGURIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS CON BPIN 2024130010032

INFORME FINANCIERO DEL 1 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2026.
DISTRISEGURIDAD

PROYECTO (S): CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS CON BPIN 2024130010032

CUENTA (AHORROS) No.0241-0000-5172 **DEL BANCO:** **Davivienda**

VALOR CONVENIO $14.698.693.876

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $11.698.693.876
VALOR APORTE ENTIDAD $3.000.000.000

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	24/02/2025	GIRO 1	5685565224
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	24/09/2025	GIRO 2	3790376816
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR		**$ 9.475.942.040,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 9.475.942.040,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO		VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO	
CO1.PCCNTR.7919459	900512057-1-A.T.V. PREMIUM S.A.S.	**$ 6.031.400.000,00**		**$ 6.031.400.000,00**		**$ 6.031.400.000,00**	
OC 146403	DISTRIBUIDORA NISSAN	**$ 3.849.769.353,00**		**$ 3.849.769.353,00**		**$ 3.849.769.353,00**	
OC 146392	DISTRIBUIDORA NISSAN	**$ 226.769.644,00**		**$ 226.769.644,00**		**$ 226.769.644,00**	
OC 148773	DISTRIBUIDORA NISSAN	**$ 263.790.650,00**		**$ 263.790.650,00**		**$ 263.790.650,00**	
TOTAL CONTRATADO						**$ 10.371.729.647,00**	

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION EN CUENTA BANCARIA RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACIÓN CAUSADO EN CDP MINISTERIO	AFECTACION EN CUENTA BANCARIA RECURSOS DE LA ENTIDAD	AFECTACIÓN CAUSADO EN CDP ENTIDAD	VALOR DEL PAGO
C01.PCCNTR.7919459	Pago anticipado correspondiente al 50% del valor total del contrato OTROS No. CO1.PCCNTR.7919459 de 2025. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUS ADECUACIONES NO CUBIERTOS POR EL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS III No CCE-163-III-AMP-2020, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 2306 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DISTRISEGURIDAD.	11766	30279	5/06/2025	**$ 13.971.812,00**	**$ 15.700.000,00**	**$ 2.669.773.109,00**	**$ 3.000.000.000,00**	**$ 2.683.744.921,00**
C01.PCCNTR.7919459	FA ATV 248, AVT 258 Y OTROS SEGUN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7919459 de 2025 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUS ADECUACIONES NO CUBIERTOS POR EL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS III No CCE-163-III-AMP-2020, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 2306 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DISTRISEGURIDAD.	13295	32003	11/11/2025	**$ 1.331.045.164,00**	**$ 1.545.990.000,00**			**$ 1.331.045.164,00**
OC 146392	FTS FT N041-202007 - FT No. O041-83435 - FT O041-83436 - FT O041-8343 - FT 83445 SEGUN CONTRATO OTROS No. OC-146392 de 2025. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS III No CCE-163- III- AMP-2020, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2306 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR Y DISTRISEGURIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS CON BPIN 2024130010032. ORDEN COMPRA 146392	13456	32161	28/11/2025	**$ 212.551.462,00**	**$ 226.769.644,00**			**$ 212.551.462,00**
OC 14403	FT N041-202008 HASTA FT N041-202024 SEGUN CONTRATO OTROS No. OC-146403 de 2025. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS III No CCE-163- III- AMP-2020, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2306 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR Y DISTRISEGURIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS CON BPIN 2024130010032. Orden de compra 14403	13455	32160	28/11/2025	**$ 3.578.878.034,00**	**$ 3.849.769.353,00**			**$ 3.578.878.034,00**
C01.PCCNTR.7919459	FA No. ATV 328, No. ATV 329 No. ATV 330 SEGUN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7919459 de 2025. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUS ADECUACIONES NO CUBIERTOS POR EL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS III No CCE-163-III-AMP-2020, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 2306 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DISTRISEGURIDAD.	14307	33091	30/12/2025	**$ 493.547.216,00**	**$ 559.695.000,00**			**$ 493.547.216,00**
									$ 0,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 5.629.993.688,00**	**$ 6.197.923.997,00**	**$ 2.669.773.109,00**	**$ 3.000.000.000,00**	**$ 8.299.766.797,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
Nov 30 de 2024	$ 0,00
DIC 31 DE 2024	$ 0,00
ENE 31 DE 2025	$ 0,00
FEB 28 DE 2025	$ 78.176,52
MAR 31 DE 2025	$ 483.279,68
ABR 30 2025	$ 466.262,38
MAYO 31 DE 2025	$ 483.360,40
JUN 30 DE 2025	$ 465.347,32
JULIO 31 DE 2025	$ 482.253,43
AGOSTO 31 DE 2025	$ 482.294,42
SEPTIEMBRE 30DE 2025	$ 537.834,36
OCURBRE 31 DE 2025	$ 804.563,16
NOVIEMBRE 30 DE 2025	$ 672.379,27
DICIEMBRE 31 DE 2025	$ 366.571,81
ENERO 31 DE 2026	$ 327.358,00
FEBRERO 28 DE 2026	$ 296.573,04
MARZO 31 DE 2026	$ 327.411,04
ABRIL 30 DE 2026	$ 310.716,20
TOTAL (3)	**$ 6.584.381,03**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ---------- ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
N/A	$ 0,00	
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 9.475.942.040,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 5.629.993.688,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 6.584.381,03
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 6.584.381,03**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 3.852.532.733,03**

OBSERVACIONES SE ENVÍA CON CORTE MAYO 8 POR LA DEVOLUCIÓN DE VALOR A CUENTA QUE SE HABÍA TRASLADADO POR ERROR

FIRMA

LUIS FELIPE RECIO
P.U.E.Operativo- SUPERVISOR

BRUNO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL (E)

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

CUENTA DE AHORROS


0241 0000 5172

INFORME DEL MES: ABRIL /2026

Apreciado Cliente
DISTRISEGURIDAD
DISTRISEGURIDAD@CARTAGENA.GOV.CO

Saldo Anterior	$3,852,222,016.83
Más Créditos	$310,716.20
Menos Débitos	$270,000,000.00
Nuevo Saldo	$3,582,532,733.03
Saldo Promedio	$3,789,222,016.83

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
24 04	$ 270,000,000.00-	5989	Dcto por Transferencia de Fondos 560057169995792 8060134042	PORTAL-EMPRESARIAL
30 04	$ 310,716.20+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

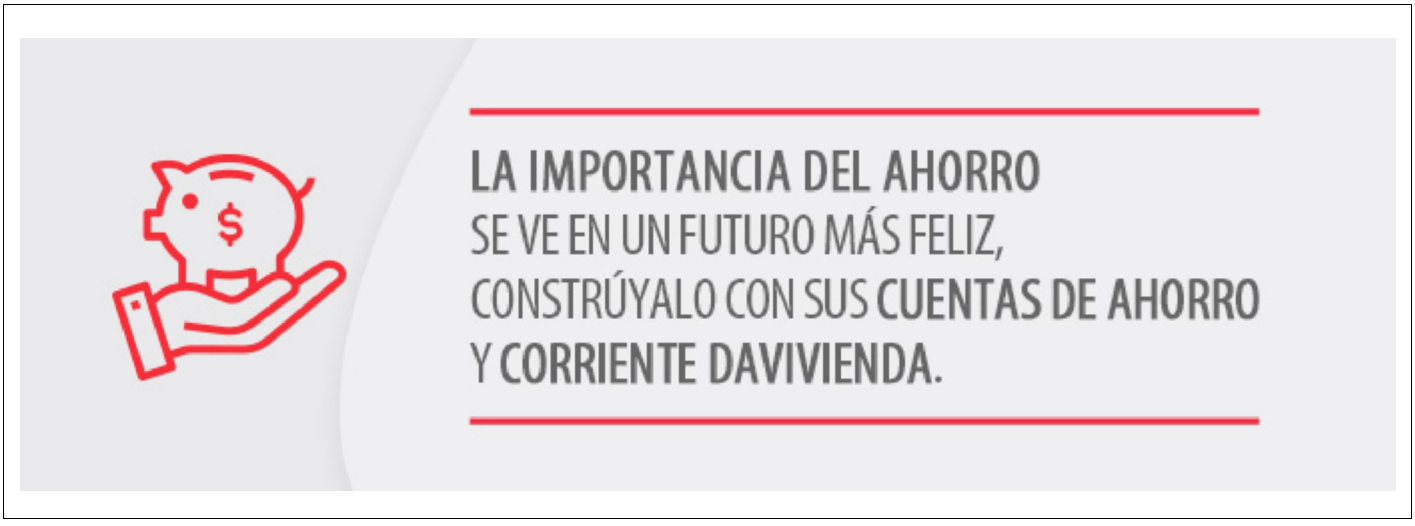

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

DISTRISEGURIDAD

Nit: 806.013.404-2

MEMORANDO

N°. 0483

Cartagena de indias D.T y C, 11 de mayo de 2026.

DE: REMBERTO VIAÑA GONZALEZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PARA: LUIS FELIPE RECIO SARMIENTO – PE OPERATIVO

Asunto: RESPUESTA MEMORANDO 0479- MOVIMIENTO CUENTA DE AHORRO 5172 RECURSOS CONVENIO MININTERIOR.

Cordial Saludo.

En atención a su solicitud relacionada con el soporte del movimiento financiero por valor de **Doscientos Setenta Millones De pesos MCTE ($270.000.000)**, registrado el día 24 de abril del presente año en la cuenta de referencia del Convenio 2306 suscrito entre el Ministerio del Interior y Distriseguridad, me permito remitir adjunto el soporte del reintegro de los recursos efectuado el día 08 de mayo de la presente vigencia.

Este movimiento se originó debido a un error involuntario en la realización de trasferencias de recursos entre las cuentas bancarias de Distriseguridad, las cuales tienen números similares.

En este sentido, con esta aclaración esperamos contribuir al proceso de conciliación y presentación del balance financiero del convenio, conforme a los requerimientos establecidos para los informes mensuales.

Quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.

Atentamente.

REMBERTO VIAÑA GONZALEZ
Director Administrativo y Financiero

Proyecto: Angelica Leal V. Asesor Externo- DAF
Reviso: Consuelo Nova – PE. Financiera

Anexo:1







Saldo Cuenta Ahorro - 05500241****5172

Resumen

Saldo Total	$ 3.852.532.733,03
Saldo Disponible	$ 3.852.532.733,03
Canje Local	$ 0,00
Canje Plaza	$ 0,00
Saldo Congelado por Embargo	$ 0,00

Movimientos

Fecha	Valor	Documento	Clase de Movimiento	Oficina
08/05/2026	$ 270.000.000,00	81099	Notas Crédito	PORTAL-EMPRESARIAL
01/05/2026	$ 310.716,20	99999999	Notas Crédito	BTA PROCESOS ESP.
24/04/2026	$ 270.000.000,00	405989	Notas Débito	PORTAL-EMPRESARIAL
01/04/2026	$ 327.411,04	99999999	Notas Crédito	BTA PROCESOS ESP.

Outlook

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CV 2306-24 DISTRISEGURIDAD

Organizador	Dayra Alejandra Benavides Galviz <dayra.benavides@mininterior.gov.co>
Hora de la reunión	Mié 8/04/2026, de 10:00 AM a 10:30 AM
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	Julio Devoz Carrasquilla, Luis Felipe Recio, Jose Antonio Ahumada Soto, Andres Felipe Hernandez Garcia
Mensaje enviado	Lun 6/04/2026 4:32 PM

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito convocar a la reunión de seguimiento del Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024, con el fin de evaluar el avance que presenta el convenio en cuanto al estado de los vehículos pendientes de entrega.

Cordialmente,

Alejandra Benavides G.

Apoyo a la supervisión
Ministerio del Interior

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/21861657729952?p=R4ljiaF6kzIWOJvbSV

Id. de reunión: 218 616 577 299 52

Código de acceso: 9rP7zx9a

¿Necesita ayuda? | Referencia del sistema

Para organizadores: Opciones de la reunión

Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR

Privacidad y seguridad

Outlook

OFICIO 0326 INFORME PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 Y 31 DE MARZO 2026 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2306 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DISTRISEGURIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS ORGAN...

Desde Distriseguridad <distriseguridad@cartagena.gov.co>
Fecha Vie 10/04/2026 6:54 PM
Para Andres Felipe Hernandez Garcia <andresf.hernandez@mininterior.gov.co>; Dayra Alejandra Benavides Galviz <dayra.benavides@mininterior.gov.co>
CC Julio Devoz Carrasquilla <operaciones@dscartagena.gov.co>; Luis Felipe Recio <ingenieria@dscartagena.gov.co>

3 archivos adjuntos (871 KB)

CTA AHO 5172- MARZO 2026 MINISTERIO.pdf; INFORME CONVENIO 2306 CORTE 31 MARZO 2026 (1) (1) (1).pdf; INFORME FINANCIERO CONVENIO 2306 MARZO 2026.pdf;

Oficio No. 0326

Cartagena de Indias D.T Y C. 8 de abril de 2026

INFORME PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2026 -CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2306 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN -MINISTERIO DEL INTERIOR Y DISTRISEGURIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO,JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS CON BPIN 2024130010032

PARA: ANDRES FELIPE HERNANDEZ GARCIA - Supervisor del Convenio 2306 de 2024
ALEJANDRA BENAVIDES GALVIZ – Apoyo a la Supervisión del Convenio
JOSÉ AHUMADA SOTO – Apoyo Jurídico del Convenio

DE: JAIME RICARDO HERNADEZ AMIN – Director General
LUIS FELIPE RECIO SARMIENTO - Supervisor del Convenio 2306 de 2024

Atentamente

DISTRISEGURIDAD

SAIDA PATRICIA CABEZA TORRES
Secretaria Direccion General
Edificio Inteligente Chambacú
Cartagena de Indias
www.distriseguridad.gov.co

Outlook

Socialización de Acta – Reunión de Seguimiento Virtual 08/04/2026

Desde Dayra Alejandra Benavides Galviz <dayra.benavides@mininterior.gov.co>
Fecha Lun 13/04/2026 8:05 AM
Para Luis Felipe Recio <ingenieria@dscartagena.gov.co>; Julio Devoz Carrasquilla <operaciones@dscartagena.gov.co>
CC Andres Felipe Hernandez Garcia <andresf.hernandez@mininterior.gov.co>; Jose Antonio Ahumada Soto <jose.ahumada@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (760 KB)
2026_04_08 - REU SEGUIMIENTO VIRTUAL.pdf;

Señores

JAIME RICARDO HERNANDEZ AMIN
Representante Legal -DISTRISEGURIDAD
direccion@distriseguridad.gov.co

LUIS FELIPE RECIO SARMIENTO
Supervisor Convenio No. 2306-24 – DISTRISEGURIDAD
ingenieria@distriseguridad.gov.co

JULIO DEVOZ
Director de Operaciones- DISTRISEGURIDAD
operaciones@distriseguridad.gov.co

Ref: **Convenio 2306 de 2023** *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON Y DISTRISEGURIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA – MECAR"*

ASUNTO: Socialización de Acta – Reunión de Seguimiento Virtual 08/04/2026

Cordial saludo,

En atención al Convenio Interadministrativo suscrito entre la Nación – Ministerio del Interior (FONSECON) y Distriseguridad, me permito socializar el acta correspondiente a la reunión de seguimiento virtual realizada el 8 de abril de 2026, para su revisión y fines pertinentes.

Se solicita a la supervisión de Distriseguridad que, en coherencia con las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del convenio, gestione la recolección de las firmas de los asistentes relacionados en el acta y remita el documento debidamente suscrito en el menor tiempo posible.

En caso de no recibirse respuesta, se entenderá el acta como aceptada y el presente comunicado se tomará como evidencia de la gestión del Ministerio del Interior para el cumplimiento del compromiso de firma/suscripción por parte de los asistentes.

Cordialmente,


Interior

Profesional, Apoyo a la supervisión
ING ALEJANDRA BENAVIDES GALVIZ
dayra.benavides@mininterior.gov.co
SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Cra. 8 No. 12B-31. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

ACTA No.	23
FECHA	08 de abril de 2026
CIUDAD	Bogotá D.C.;
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2306 de 2024.
OBJETO:	"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Interior - FONSECON y DISTRISEGURIDAD para el fortalecimiento de las condiciones de Movilidad de la Policía Metropolitana de Cartagena – MECAR."
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION DEL CONVENIO%	82%
MOTIVO:	Seguimiento y control al convenio

PARTES

Ministerio del Interior	**Contratista/Convenido**
Alejandra Benavides Galviz **Cargo:** Apoyo a la supervisión SPS **Entidad:** Ministerio del Interior.	**Luis Felipe Recio** **Cargo:** Supervisor del Convenio **Entidad:** DISTRISEGURIDAD
José Antonio Ahumada Soto **Cargo:** Apoyo jurídico a la supervisión SPS **Entidad:** Ministerio del Interior.	**Andrés Acuña Soto** **Cargo:** Asesor externo, Distriseguridad **Entidad:** DISTRISEGURIDAD

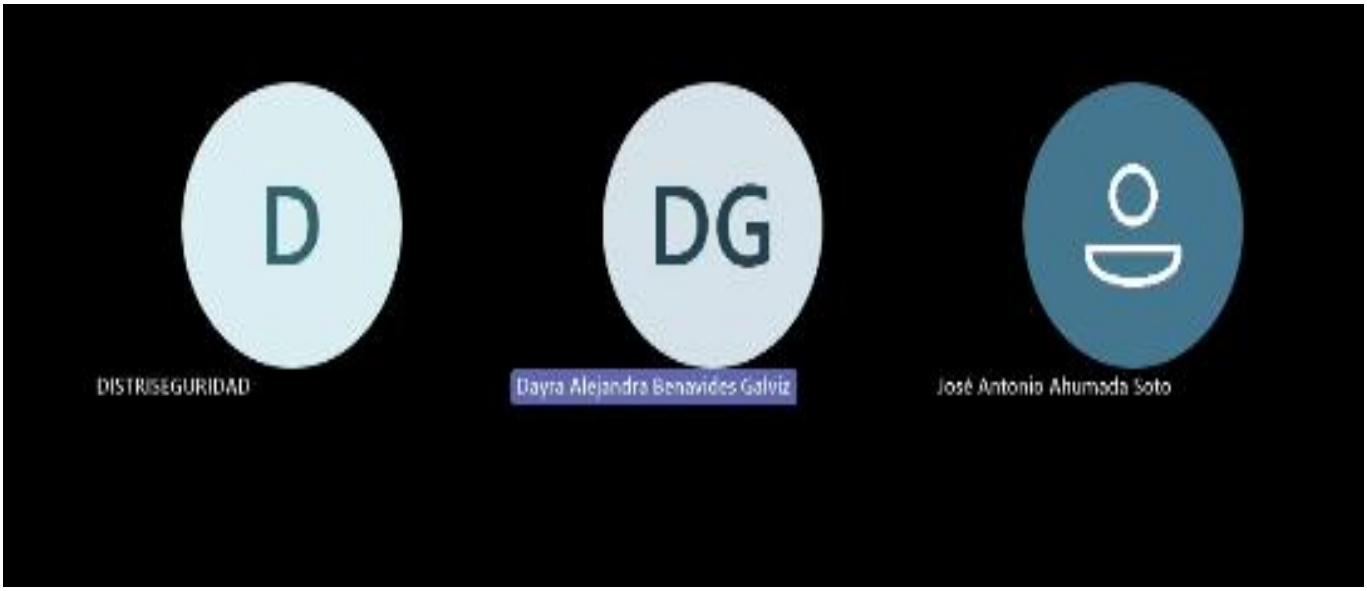

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 02:30 pm. del 08 de abril de 2025, se da inicio a la reunión de seguimiento del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación **No. 2036 de 2024**, suscrito entre **DISTRISEGURIDAD** y el **Ministerio del Interior – FONSECON**, cuyo objeto es *""Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Interior - FONSECON y DISTRISEGURIDAD para el fortalecimiento de las condiciones de Movilidad de la Policía Metropolitana de Cartagena – MECAR".*

La reunión comenzó con la presentación de los asistentes, en la cual cada uno explicó su rol en el desarrollo del Convenio

OBJETO DE LA REUNIÓN

Conocer el estado de avance técnico, financiero y contractual de la ejecución del convenio.

En el desarrollo de la reunión, la supervisión del Ministerio del Interior solicitó a Distriseguridad un informe detallado sobre el estado actual de los vehículos pendientes de entrega, haciendo especial énfasis en aquellos que presentan mayor criticidad dentro del cronograma, como lo son los vehículos blindados y las unidades que requieren adecuaciones especiales vehículo K9 y otros.

Distriseguridad informó que, en ejercicio de la supervisión de los contratos derivados, se programó una visita técnica al proveedor TV Premium S.A.S. para el día 9 de abril de 2026, con el propósito de realizar una verificación integral en campo del estado real de los vehículos, incluyendo inspección física, levantamiento de evidencia fotográfica y revisión documental. Esta actividad tiene como objetivo validar el grado de avance en los procesos de adecuación, blindaje y alistamiento, así como contrastar la información reportada previamente en los cronogramas con la situación real de ejecución.

Así mismo, Distriseguridad manifestó que, de manera paralela, ha requerido formalmente al contratista información actualizada sobre el estado de las adecuaciones técnicas, con el fin de asegurar el cumplimiento de los tiempos establecidos contractualmente. No obstante, la supervisión evidenció que la información disponible a la fecha no permite tener una trazabilidad completa y detallada del avance individual de cada vehículo, lo que limita la capacidad de control y seguimiento oportuno.

En ese sentido, la supervisión del Ministerio del Interior identificó los siguientes aspectos críticos:

- Falta de consolidación de información detallada por unidad: No se cuenta con un reporte individualizado que permita conocer con precisión el estado técnico, documental y operativo de cada vehículo pendiente.

- Dependencia de verificaciones futuras: El estado real de varios vehículos se encuentra sujeto a la visita técnica programada, lo cual evidencia debilidad en los mecanismos de seguimiento permanente por parte del ejecutor.

- Riesgo en procesos de adecuación y blindaje: Estos procesos, por su naturaleza técnica y tiempos de ejecución, representan un factor crítico que puede impactar directamente el cumplimiento del cronograma general del convenio.

- Desalineación entre cronograma y ejecución real: Se evidencia que las fechas inicialmente proyectadas no se han cumplido en su totalidad, generando incertidumbre sobre la capacidad de entrega en los plazos restantes.

En virtud de lo anterior, la supervisión reiteró la necesidad de que Distriseguridad fortalezca de manera inmediata sus mecanismos de control sobre los contratos derivados, garantizando:

- La consolidación de un informe técnico detallado por vehículo, que incluya estado actual, porcentaje de avance, actividades pendientes y fecha estimada de entrega.

- La alineación del cronograma contractual con la ejecución real, identificando desviaciones y proponiendo acciones correctivas.

Finalmente, la supervisión enfatizó que el estado actual de los vehículos pendientes constituye un elemento crítico para el cumplimiento del objeto del convenio, y que la falta de claridad y precisión en esta información incrementa el riesgo de incumplimiento, especialmente considerando la proximidad de la fecha de terminación contractual 30 de mayo de 2026.

La supervisión del Ministerio del Interior evidenció que, si bien se han adelantado acciones para la entrega de los vehículos, persisten retrasos significativos frente al cronograma contractual, particularmente en la entrega de unidades pendientes y en los procesos de adecuación y blindaje. Lo anterior genera un riesgo alto de incumplimiento, considerando la proximidad de la fecha de terminación del convenio. En consecuencia, se reiteró la necesidad de adoptar medidas inmediatas, incluyendo la implementación de un plan de choque, el fortalecimiento del seguimiento a los contratistas derivados y la entrega oportuna de información detallada que permita a la supervisión ejercer un control efectivo sobre la ejecución del convenio.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
DISTRISEGURIDAD	Entrega formal del vehículo tipo Hyundai a la Policía Nacional y notificación al Ministerio	15 de abril de 2026
DISTRISEGURIDAD	Remisión de informe detallado del estado de los vehículos pendientes	13 de abril de 2026
DISTRISEGURIDAD	Presentación de plan de choque para superar atrasos del cronograma	13 de abril de 2026
DISTRISEGURIDAD	Remisión del informe mensual de marzo	9 de abril de 2026
DISTRISEGURIDAD	Verificación en campo del estado de vehículos (incluidos blindados y K9)	Por definir

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Alejandra Benavides Galviz
Cargo: Apoyo a la supervisión SPS
Entidad: Ministerio del Interior.

Luis Felipe Recio
Cargo: Supervisor del Convenio
Entidad: DISTRISEGURIDAD

José Antonio Ahumada Soto
Cargo: Apoyo jurídico a la supervisión SPS
Entidad: Ministerio del Interior.

Andrés Acuña Soto
Cargo: Asesor externo, Distriseguridad
Entidad: DISTRISEGURIDAD

Proyectó: Alejandra Benavides G./ Apoyo a la Supervisión SPS – Ministerio del Interior
Revisó: José Antonio Ahumada Soto. / Apoyo jurídico a la Supervisión SPS – Ministerio del Interior
Revisó: Andrés Felipe Hernández G. / Supervisor del Convenio SPS – Ministerio del Interior

Interior

Al contestar cite Radicado 2026-2-003122-017877 Id: 750219
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: DISTRISEGURIDAD@CARTAGENA.GOV.CO
Fecha: 24-04-2026 15:25:24
Folios: 3
Anexos: 0

Señores:

JAIME RICARDO HERNANDEZ AMIN
Representante Legal -DISTRISEGURIDAD
direccion@distriseguridad.gov.co

JULIO DEVOZ
Director de Operaciones- DISTRISEGURIDAD
operaciones@distriseguridad.gov.co

LUIS FELIPE RECIO SARMIENTO
Supervisor Convenio No. 2306-24 – DISTRISEGURIDAD
ingenieria@distriseguridad.gov.co

Asunto: Requerimiento de cumplimiento de compromisos y solicitud de cronograma actualizado de entrega de vehículos – Convenio No. 2306 de 2024

Ref.: Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024 suscrito entre el Ministerio del Interior y Distriseguridad, cuyo objeto es *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON Y DISTRISEGURIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA – MECAR".*

Respetados Señores:

En mi calidad de supervisor designado para el Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024, suscrito entre el Ministerio del Interior – FONSECON y Distriseguridad, cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Interior - FONSECON y Distriseguridad para el fortalecimiento de las condiciones de movilidad de la Policía Metropolitana de Cartagena – MECAR*", y con fundamento en lo consignado en el acta de reunión de seguimiento de fecha 08 de abril de 2026, me permito manifestar lo siguiente:

De acuerdo con lo evidenciado por la supervisión, a la fecha Distriseguridad no ha dado cumplimiento a los compromisos establecidos en el acta mencionada, dentro de los plazos definidos, los cuales se relacionan a continuación:

- Remisión de informe detallado del estado de los vehículos pendientes, con fecha límite 13 de abril de 2026.
- Presentación del plan de choque para superar los atrasos del cronograma, con fecha límite 13 de abril de 2026.
- Entrega formal del vehículo tipo Hyundai a la Policía Nacional y notificación al Ministerio, con fecha límite 15 de abril de 2026.
- Verificación en campo del estado de los vehículos (incluidos blindados y K9), actividad con fecha pendiente de definición, sin que a la fecha se haya reportado avance formal.

En este sentido, resulta necesario precisar que, con corte al 24 de abril de 2026, no se ha recibido respuesta formal por parte de Distriseguridad respecto del cumplimiento de los compromisos señalados, configurándose una situación de incumplimiento frente a las obligaciones derivadas del convenio.

Así mismo, es importante reiterar que, de conformidad con la tercera prórroga, el convenio mantiene su vigencia hasta el 30 de mayo de 2026, fecha en la cual deberán encontrarse cumplidas la totalidad de las obligaciones contractuales.

En consecuencia, se requiere remitir de manera inmediata:

1. El cumplimiento de los compromisos pendientes anteriormente relacionados.
2. Un cronograma actualizado, detallado y verificable de entrega de los vehículos pendientes, que incluya estado actual por unidad, porcentaje de avance, actividades pendientes y fechas ciertas de entrega.

Lo anterior, teniendo en cuenta que los vehículos deberán ser entregados y recibidos a satisfacción por las partes a más tardar en la fecha de terminación contractual, es decir el 30 de mayo de 2026.

Finalmente, se solicita que la información requerida sea remitida a más tardar el lunes 27 de abril de 2026.

Atentamente,

Al contestar cite Radicado 2026-2-003122-017877 Id: 750219
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: DISTRISEGURIDAD@CARTAGENA.GOV.CO
Fecha: 24-04-2026 15:25:24
Folios: 3
Anexos: 0

Andrés Felipe Hernández García
Supervisor del Convenio 2306 de 2024

Proyectó: Ing. Alejandra Benavides – Apoyo a la supervisión SPS
Revisó: José A. Ahumada Soto – Abogado Contratista – Apoyo jurídico a la supervisión SPS

Outlook

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO PRESENCIAL CV 2306-24 DISTRISEGURIDAD

Organizador	Dayra Alejandra Benavides Galviz <dayra.benavides@mininterior.gov.co>
Hora de la reunión	Mié 6/05/2026, de 9:00 AM a 9:30 AM
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	Julio Devoz Carrasquilla, Luis Felipe Recio, Jose Antonio Ahumada Soto, Andres Felipe Hernandez Garcia
Mensaje enviado	Mié 29/04/2026 3:12 PM

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito convocar a la reunión presencial de seguimiento del Convenio Interadministrativo No. 2306 de 2024, con el propósito de evaluar el estado actual del convenio, en particular el avance en la entrega de los vehículos pendientes.

Así mismo, se revisará la fecha prevista para la entrega de dichos vehículos, teniendo en cuenta que el convenio tiene como fecha de terminación el 30 de mayo de 2026.

En este sentido, se solicita remitir el nombre completo y número de cédula de las personas que participarán en la reunión, la cual se llevará a cabo el día miércoles 6 de mayo de 2026 a las 9:00 a.m. en las instalaciones del Ministerio del Interior en la ciudad de Bogota.

Agradezco su atención y quedo atento a su respuesta.

Cordialmente,

Alejandra Benavides G.

Apoyo a la supervisión
Ministerio del Interior

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/296980894827148?p=iXdtgdGJI6eQtPxBI7

Id. de reunión: 296 980 894 827 148

Código de acceso: SV32u6br

¿Necesita ayuda? | Referencia del sistema

Para organizadores: Opciones de la reunión

Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR

Privacidad y seguridad
