NOTA 02.
25/11/25

NOTA QUE DESCRIBE EL BUEN MANEJO DE LA BITACORA:

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO POR LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE ; PARA EL BUEN USO Y MANEJO DE ESTA BITACORA SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES :

1.) ESTA BITACORA ESTARA TODO EL TIEMPO BAJO CUSTODIA DEL RESIDENTE DE OBRA Y DISPONIBLE PARA CUALQUIER CONSULTA.

2) SE ESTABLECE UN PLAZO DE 24 HORAS PARA LA FIRMA DE LAS NOTAS.

3) QUEDA PROHIBIDA LA MODIFICACIÓN DE LAS NOTAS DE BITACORA YA FIRMADAS, AÚN CUANDO SE TRATE DEL AUTOR DE LAS MISMAS.

4) LAS NOTAS ELIMINADAS DEBERAN TACHARSE MEDIANTE EL USO DE LINEAS DIAGONALES Y DEBERAN CONTENER "ELIMINADO POR ERRORES DE REDACCIÓN"

5) TODAS LAS NOTAS DEBERAN ENUMERARSE EN FORMA SERIADA Y FECHARSE CONSECUTIVAMENTE RESPETANDO, SIN EXCEPCIÓN EL ORDEN ESTABLECIDO.

6) LAS NOTAS DEBEN EFECTUARSE CLARAMENTE CON TINTA INDELEBLE, LETRA LEGIBLE Y SIN ABREVIATURAS.

7) SE DEBERAN CANCELAR LOS ESPACIOS SOBRANTES DE UNA HOJA AL COMPLETARSE EL LLENADO DE LA MISMA.

8) NOTA QUE NO CONTENGA COMPLETAS LAS FIRMAS REGISTRADAS O APROBADAS CARECERA DE TODA VALIDEZ LEGAL.

EN CONSTANCIA FIRMAN:

Residente de obra.

DRO - Interventoría

NOTA 03. 25/11/25. SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA EN LOS BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PATIO DEL COLEGIO, SE REALIZA EL DESMONTE DE SANITARIOS, DESMONTE DE DIVISIONES METALICAS, DESMONTE DE LAVAMANOS, SE INICIA CON LA DEMOLICIÓN de enchape de muros, demolicion de Mezon de lavamanos en baño niños, demolición de placa en concreto, demolición de orinal corrido, demolición de acabado de PVO y sobrepiso, Ingresa a obra material para cerramiento, pintura y mamparas para los baños de profesores que se intervendran despues del 5 de diciembre. En obra se cuenta con: Tres (3) personas operativas y un (1) residente de obra.

Residente de obra. · Victor Mora Residente de interventoria

NOTA 04 26/11/25. Se continua con demolición de placa en baño niños, se Desmontan puertas Metalicas de acceso a baños y cuarto de insumos; En baño de niñas se inicia con demolición de enchape en muros, demolicion de Mezon de Lavamanos. En la parte exterior de los baños se realiza instalacion de cerramiento para el almacenamiento de residuos provenientes de las demoliciones y elementos desmontados. En obra se cuenta con: Tres (3) personas operativas, un (1) residente de obra.

Residente de obra. · Victor Mora Residente de Interventoria

NOTA 05 27/11/25 En baño de niños se realiza excavacion de terreno, Desmonte de tuberias sanitarias antiguas, regatas en muros para desmonte de tuberia hidraulica; En el baño de niñas se realiza el desmonte de ventanas, desmonte de luminarias y

red electrica y se inicia con la demolicion de los muros del cuarto de insumos. SE REALIZA ACTA DE ELEMENTOS desmontados la cual se le entrega al almacenista de la institucion (william). En obra se cuentan con: tres (3) personal operativos, un (1) residente de obra.

Residente de obra

- Victor Mora
Residente de Interventoria

NOTA 06 28/11/25

Se culmina con la demolicion de muros y vigas del cuarto de insumos, se inicia en el baño de niñas con la demolicion de placa contrapiso, demolicion de acabado de piso y sobrepiso, se inicia con la demolicion del pañete existente. y se da inicio a la excavacion del terreno. por otro lado, en el baño de niños se termina la excavacion del terreno llevandolo al nivel cero. En obra se cuentan con: tres (3) personal operativos, un (1) residente de obra.

Residente de obra.

Victor Mora
Residente de Interventoria

NOTA 07 29/11/25.

En baño niñas se culmina con la demolicion de placa de contrapiso, se continua con la demolicion de pañete en muros, se culmina con la excavacion manual llevando el nivel a cero. Se realiza demolicion de muro y viga aerea en baño de niños. Ingresa volqueta a obra y se retira escombros. En obra se cuenta con: tres (3) personal operativo un (1) residente de obra y (1) SST.

Residente de obra.

Victor Mora
Residente de interventoria

Norma

Powered by CamScanner

NOTA 08 01/12/25 Al Realizar la demolición de Pañete en los Muros de los baños se logra observar que dichos Muros ya habían tenido otro enchape anteriormente, por lo cual se continua con la demolicion de pañete doble en los muros de los baños tanto de niñas como de niños. En obra se cuenta con: Tres (3) personal operativos, (1) un residente de obra. y un (1) SST.

Residente de obra.

Victor Mora
Residente de Interventoria

NOTA 09 02/12/25 Se termina con el desmonte de la red electrica antigua de los baños en la zona del Patio, Se continua con la demolicion de Pañete doble en muros; Ingresa a obra Material correspondiente a las redes Sanitarias e hidraulicas. En obra se cuenta con: Tres (3) personal operativos, un (1) Residente de obra y una (1) SST.

Victor Mora
Residente de Interventoria

Residente de obra

NOTA 10 03/12/25 Se finaliza con la demolicion de pañete doble en muros; Se Realiza la excavacion de zanjas para la instalacion de la Tuberia Sanitaria de ambos baños; Se inicia con la instalacion de Tuberia 4" y 2" Sanitaria con sus respectivos accesorios; De igual manera se realizan regatos sobre Muros para la instalacion de nueva red Sanitaria. En obra se cuenta con: Tres (3) personas operativas, un (1) residente de obra y 1 SST.

Victor Mora
Residente de Interventoria

Residente de obra.

Powered by CamScanner

NOTA 11. 04/12/25 A la hora de realizar las excavaciones en zanja para la Tubería Sanitaria se encontraron unas vigas que no cumplían ninguna función las cuales se procedieron a demoler; se continua con la instalación de tubería 4" y 2" Sanitaria con sus respectivos accesorios. En obra se cuenta con: Tres (3) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Residente de obra

Victor Mora
Residente Interventoría.

NOTA 12 05/12/25 Se inicia con el levante de muro en los extremos de cada baño se continua con la instalación de tubería 4" y 2" Sanitaria con sus respectivos accesorios. A las 3:20 pm se presentan lluvias constantes hasta las 5pm. En obra se cuenta con: Tres (3) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Victor Mora
Residente Interventoría

Residente de obra

NOTA 13. 06/12/25. Se inicia con la instalación de red hidraulica y se continua con la instalación de la red Sanitaria y todos sus respectivos accesorios. Se realiza Jornada de orden y aseo en toda la obra. En obra se cuenta con: Tres (3) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Victor Mora.
Residente Interventoría

Residente de obra.

Powered by CamScanner

NOTA 14
09/12/25

Se continua con la instalacion de redes hidraulicas y sanitarias; se inicia con la construccion de la caja de inspeccion en el baño de niñas; se realiza retiro de escombros provenientes de demoliciones. En obra se cuenta con: tres (3) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Victor Mont
Residente interventoria.

Residente de obra

NOTA 15
10/12/25

Se evidencia que los muros de la fachada de los baños se encuentran desplomados aproximadamente 3cm, se envia a interventoria via correo la situacion presentada y se opta por realizar el mejoramiento de estos; se continua con la instalacion de las redes hidrosanitarias, se termina construccion de caja inspeccion en baño niñas, se realiza demolicion de muros fachada de baños. En obra se cuenta con: tres (3) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Victor Mont.
Residente Interventoria

Residente de obra

NOTA 16
11/12/25

Se realiza instalacion de Acero de refuerzo para viga de paso en la fachada de los baños y se realiza su respectiva fundicion en concreto. Se termina la instalacion de redes hidraulicas y redes sanitarias y se realizan tapas para las cajas de paso de los baños en concreto. En obra se cuenta con: tres (3) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Residente de obra

Powered by CamScanner

Victor Mant
Residente Interventoria

NOTA 17. 12/12/25 Ingresa a obra la subbase granular para relleno; se terminan acabados en cajas de paso, se continua con el levante de muros en mamposteria para la fachada de los baños; se realiza el desmonte de divisiones en los baños de profesores; se inicia con el relleno subbase granular y su respectiva compactacion. En obra se cuenta con: Tres(3) personal operativa), un (1) residente de obra y una(1) SST.

Victor Mant
Residente Interventoria

Residente de obra

NOTA 18 13/12/25. Se continua y se finaliza con el relleno de la subbase granular y su compactacion; se continua levantando muros de la fachada de los baños; se realiza Jornada de orden y Aseo en la obra. En obra se cuenta con: TRES(3) Personal operativa), un(1) residente de obra y una(1) SST.

Victor Mant
Residente Interventoria

Residente de obra

NOTA 19 15/12/25 Se realiza la instalacion de Medicaña en PVC 6cm en los baños de profesores; por otro lado en el baño de los patio se terminan de levantar los muros en mamposteria de la fachada de los mismos y se inician con Actividade de pañete en muros. En obra se cuenta con: cuatro(4) personal operativa), un(1) residente de obra y una(1) inspectora SST.

Victor Mant
Residente Interventoria

Residente de obra

Norma

Powered by CamScanner

NOTA 20
16/12/25 Se continuan actividades de pañete en muros internos y externos de los baños del patio, ingresa a obra geotextil y malla electrosoldada para placa; se presentan lluvias constantes desde las 2PM. En obra se cuenta con: cuatro (4) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Victor Mora.
Residente Interventoria

Residente de obra

NOTA 21
17/12/25 Se realiza instalacion de geotextil en piso de baños del patio; se realiza instalacion de malla electrosoldada en ambos baños y se realiza la fundicion de placas en concreto de los dos baños de la zona de los patios. En obra se cuenta con: cuatro (4) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Victor Mora
Residente Interventoria

Residente de obra

NOTA 22
18/12/25 Se continua y se finalizan actividades de pañetes en muros de los baños del patio. En obra se cuenta con: tres (3) personas operativas, 1 residente obra y una (1) SST.

Victor Mora
Residente Interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

NOTA 23. 19/12/25 Se inician actividades de fibro en ventanas y puertas de los baños del patio. En obra se cuenta con: dos (2) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Victor Mora — Residente Interventoría

Residente obra

NOTA 24 20/12/25 Se continuan actividades de fibro en ventanas y puertas, en los baños del patio; y se realiza jornada de orden y aseo en la obra. En obra se cuenta con: dos (2) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Victor Mora — Residente Interventoría

Residente obra

NOTA 25 22/12/25. Se terminan actividades de fibro en ventanas y puertas en baños del patio; ingresa a obra enchape de muros de pisos, sanitarios, orinal y demas aparatos sanitarios. En obra se cuenta con: dos (2) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Victor Mora — Residente Interventoría

Residente obra

NOTA 26 23/12/25 Se inician actividades de instalación de enchape en muros de los baños ubicados en el patio de la institución. En obra se cuenta con: cuatro (4) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Norma

Powered by CamScanner

Victor Mora
Residente Interventoria

Residente obra

NOTA 27
24/12/25

Se continuan actividades de instalacion del enchape en muros; y se inicia con la instalacion del enchape de piso en los baños del patio. En obra se cuenta con: cuatro (4) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Victor Mora.
Residente Interventoria

Residente obra

NOTA 28.
26/12/25

Se termina la instalacion de enchape en muros y se termina con la instalación de enchape de piso en los baños del patio de la institucion. En obra se cuenta con: tres (3) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Victor Mora.
Residente Interventoria

Residente obra

NOTA 29
27/12/25

Se terminan detalles minimos en el enchape de piso y se realiza jornada de orden y aseo en toda la obra. En obra se cuenta con: dos (2) operativos, un (1) residente y una (1) SST.

Victor Mora
Residente Interventoria

Residente obra

Norma

Powered by CamScanner

NOTA 30. 29/12/25 Por solicitud de la entidad y de la interventoria se procede a realizar el cambio del piso en el baño de los profesores debido a que NO cumple con los parametros de higiene requeridos. Para ello se realiza el desmonte de la Mediacaña en PVC 6cm., se realiza desmonte de Sanitarios y se realiza la demolicion de TODO el piso existente con su respectivo traslego hasta el punto de acopio. En obra se cuenta con: Cuatro (4) Personal operativos, Un(1) residente de obra y Una(1) SST.

Victor Mora — Residente Interventoria

Residente obra

NOTA 31 30/12/25 Se realiza el replanteo del piso en los baños de profesores y se realiza el nuevo afinado de piso para poder instalar el nuevo enchape. En obra Se cuenta con: Cuatro (4) Personal operativos, Un(1) residente de obra y una (1) INSPECTORA SST.

Victor Mora — Residente Interventoria

Residente obra

NOTA 32. 05/01/26 Se inicia con la instalación de enchape de piso en los baños de los profesores. Se reportan constantes y fuertes lluvias desde la 1pm hasta las 5 pm. En obra se cuenta con: dos(2) Personal operativos, Un(1) residente de obra y una (1) Inspectora SST.

Victor Mora — Residente Interventoria

Residente obra.

Norma

Powered by CamScanner

NOTA 33 06/01/26. Se termina con la instalación del piso en porcelanato de los baños de profesores, se empieza aplicar boquilla en todos los enchapes instalados. De igual manera se da inicio a la instalación de media caña en PVC en los baños de profesores. En obra se cuenta con: dos (2) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Victor Mora — Residente Interventoría
Residente obra

NOTA 34 07/01/26 Se continua con la instalación de la media caña en PVC en los baños de profesores. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativos, un (1) residente obra y una (1) SST.

Victor Mora — Residente Interventoría
Residente obra

NOTA 35. 08/01/26 Se termina con la instalación de media caña en PVC en baño de profesores y se realiza la instalación de sanitarios. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Victor Mora — Residente Interventoría.
Residente obra.

09/01/26. NOTA 36. Se termina intervención de obra civil en los baños de profesores y se inicia con la instalación de Media caña en granito en baños de los patios. En obra

Se cuenta con: dos (2) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST. Se presentan lluvias constantes todo el día.

Victor Mora
Residente Interventoría.

Residente obra

NOTA 37 - Día sabado,
13/01/26. - Personal en Obra: (1) Residente Tecnico (2) Residente SST (1) Maestro (1) Oficial (1) Ayud
- Interventoria, Director, Residente,
- Se realiza inspección de Obra, con el acompañamiento de la Interventoria, y con el contratista, solicitando los arreglos pertinentes, del enchape, pared y piso.
- Se solicita las fichas tecnicas, para verificar materiales en Sitio.
- Se socializa que el colegio tiene apertura, el dia 26. de Enero - 2026. y se recomienda que no afecte el funcionamiento del Colegio, organizar con polisombra y cerramiento,
- Fecha de entrega 02 de Marzo, 2026.
- Actividades, Se continua con estuco en baños Patio,

Residente obra

Victor Mora
Residente Interventoría.

NOTA 38. Se realizan los arreglos pertinentes del enchape de pared y
14/01/26 piso solicitados; se realiza pulida de medicación en granito de los baños del patio y se terminan detalles de estuco y filos en puerta y ventana. En obra se cuenta con: Cuatro (4) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Residente obra

Victor Mora
Residente Interventoría.

Norma

Powered by CamScanner

NOTA 39. 15/01/26 Se terminan los arreglos puntuales solicitados en el enchape de pisos y muros. Se realiza retiro de escombros y demonte del cerramiento del punto de acopio; se termina con la pulida de la media caña en granito; En obra se cuenta con: cuatro (4) Personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Victor Mora — Residente Interventoria

Residente obra

NOTA 40. 16/01/26. Se realiza poceta en baño de niñas en los baños del patio, se recoge todo tipo de material en obra y se realiza una jornada completa de Aseo en todas las areas de la obra y areas adyacentes. En obra se cuenta con: tres (3) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Victor Mora — Residente Interventoria

Residente obra

NOTA 41. 19/01/26. Se realiza Aplicacion de boquilla en muros que presentan fisuramientos en baños de profesores y se realiza la aplicacion de pintura en esmalte a rejas, y marcos de las puertas en los baños de profesores. En obra se cuenta con: dos (2) Personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Victor Mora — Residente Interventoria

Residente obra

Powered by CamScanner

NOTA 42. 20/01/26. Se realiza detalles de estuco en muros de baños del patio y su respectivo lijado dejando listas las superficies para aplicar pintura. Se realiza orden y aseo en la obra. En obra se cuenta con: dos(2) personal operativos, un(1) residente de obra y una(1) SST.

Victor Mora — Residente Interventoría
Residente obra

NOTA 43. 24/01/26. Se realiza instalación de cerramiento en Tela verde en los baños de los patios, y se deja todos los espacios seguros para el ingreso de los niños a clase. En esta obra se cuenta con: dos (2) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Victor Mora — Residente Interventoría
Residente obra

NOTA 44. 25/01/26. Se atiende emergencia presentada en la institución por incendio presentado al exterior del colegio. Se realiza acometida provisional para restablecer la electricidad en las instalaciones. En obra se cuenta con: un (1) electrico, un(1) residente de obra y una(1) SST.

Victor Mora — Residente Interventoría
Residente obra

NOTA 45. 26/01/26. Se realiza ingreso e instalación de baños portatiles a la institución. En obra se cuenta con: dos(2) personal operativos y un(1) residente de obra.

Norma

Powered by CamScanner

Residente obra

Victor Mont
Residente Interventoria

NOTA 46. 03/02/26. Se realiza instalacion de cerramiento en tela verde para las puertas de los baños de profesores de manera provisional mientras llega a obra la carpinteria metalica. Se instala cerramiento en tela verde en la parte superior de los baños en la zona de patio. En obra se cuenta con: dos (2) Personal operativo y un (1) residente obra.

Victor Mont
Residente Interventoria

Residente obra

NOTA 47. 04/02/26. Se realiza instalacion de ventanal en los baños de los patios. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativo, un (1) residente de obra y un (1) SST.

Victor Mont
Residente Interventoria

Residente obra

NOTA 48 09/02/26. Ingresa a obra material electrico para dar inicio a estas actividades en los baños del piso. En obra se cuenta con: un (1) electrico y un (1) residente de obra.

Victor Mont
Residente Interventoria

Residente obra

Powered by CamScanner

NOTA 49. 10/02/26. Se inicia con las instalaciones de red electrica en los baños en la zona del PATIO. En obra se cuenta con: dos (2) electricos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente obra

NOTA 50 11/02/26. Se realiza instalacion de divisiones en acero inoxidable en baños de Profesores; se continua con las instalaciones electricas en baños del PATIO y se realiza lavado y limpieza en baños portatiles. En obra se cuenta con: cuatro (4) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente obra

NOTA 51 12/02/26 Se continua con las instalaciones electricas en los baños del PATIO. En obra se cuenta con: dos (2) electricos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente obra

NOTA 52 13/02/26 Se realiza aplicacion de PINTURA en interiores de los baños de Profesores y en los baños de los PATIOS. Se continuan actividades electricas llevando acometida hasta el tablero principal; se realiza lavado y limpieza de baños portatiles. En obra se cuenta con: CINCO

Norma

Powered by CamScanner

(5) personal operativo), un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente obra

NOTA 53 16/02/26 Se realiza instalacion de lavamanos en policuarzo en los baños del patio; de igual manera ingresan a obra las divisiones en acero inoxidable para estos baños y se inicia con su respectiva instalacion; se realiza Mantenimiento en Muros de los baños de profesores, limpiando, lavando, emboquillando y cambiando piezas de enchape danadas. En obra se cuenta con: Nueve (9) personas operativas, un(1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente obra

NOTA 54 17/02/26. Se realiza instalacion de Sanitarios en baños del patio; Se realiza instalacion de push en lavamanos de policuarzo, Aplicacion de pintura en fachada baños patio, instalaciones electricas; instalacion de divisiones en acero inoxidable; lavado y limpieza de baños portatiles. En obra se cuenta con: siete (7). personas operativas, un(1) residente de obra y una(1) inspectora SST.

Residente obra

Norma

Powered by CamScanner

NOTA 55 Se realiza instalacion de TOMAS GFCI, interruptores y luminarias en baños PATIO; Aplicacion de Pintura en fachada, instalacion urinal baño niños, relanes y detalles finales interiores. En obra se cuenta con: Siete (7) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente obra

NOTA 56 Se realiza aplicacion de ultima mano de PINTURA EN MUROS del baño de los PATIOS; se realiza Aseo y limpieza en los espacios intervenidos; se realiza instalacion de ALISTADO para sanitarios del baño profesores y baños PATIO; se realiza detalles de frisos en techo de profesores; se continuan actividades electrical. En obra se cuenta con: Siete (7) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Residente obra

NOTA 57 Se realiza limpieza y lavado de baños portatiles; retiro y relanes generales para entrega; actividades electricas, mantenimiento en muros enchapados baño de profesores, ALISTAR superficies y bancos para PORTEAR. En obra se cuenta con: Seis (6) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente obra

Norma

Powered by CamScanner

NOTA 58 Se culminan actividades electricas dejando todo energizado;
21/02/26. se realiza Aseo general en toda la obra. En obra se cuenta con: Tres (3) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente obra

NOTA 59 Llevan Puertas de baño a obra. debido a que presentan
22/02/26 Medidas mas grandes de las solicitadas se empieza a realizar en los vanos Ajustes de pulida y debastacion de los vanos existentes. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativo, un (1) residente de obra.

Residente obra

NOTA 60 Se empieza la instalacion de puertas mientra se va realizando
23/02/26 los resanes y acabados finales en los vanos afectados. En obra se cuenta con: seis (6) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente obra

NOTA 61 Se realiza entrega a satisfaccion de los oficios inter-
24/02/26. ventados a la institucion, secretaria de educacion e interventoria mediante acta de entrega final. En obra se cuenta con: cuatro (4) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente obra

NOTA 62 28/02/26. Por solicitud de secretaria de educacion, se realizo instalacion de divisiones para orinales en los baños de profesores. En obra se cuenta con dos (2) personal operativos, un (1) residente de obra y una SST.

Residente obra

Norma

Powered by CamScanner

7. I.E.D.
CLASS SEDE B

taladros, 2 pulidoras, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones electricas largas, 4 correctillas, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas con sus accesorios, 2 sopletes para instalación de manto, 2 inflables de mano y 1 nivel digital.
Actividades: Se verifica medidas de policarbonato y de estructura metalica en acompañamiento del Arq. Hubert Molina con el fin de aclarar dudas las cuales ya se cerraron en este ultimo corte de obra, se continua con remates de manto, se termina de instalar el policarbonato almacen de domo 2 y se valida con la instalación de manto de cachuchas. Se realizan verificaciones tecnicas en compañía de interventoría.

Victor Mena
Residente Interventoria

Nota Nº 64
14/02/2026

Estado del Clima: Dia soleado en la mañana y con lluvias en la tarde
Personal del Contratista: Edwin Machado, Jorge Figueroa, Jhon Salgado, Ing. Cristian, Figura Mayer.
Personal Interventoría: Hubert Molina
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, mallas largas, 1 linea de vida, 2 pipetas de gas para manto, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 pulidoras, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones electricas largas, 4 correctillas, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas con sus accesorios, 2 sopletes para instalación de manto, 2 inflables manuales y 1 nivel digital.
Actividades: Se continua con remates de cachuchas, también se realizan remates y resellos de manto, se realiza evacuación de escombro y realiza limpieza de zonas de trabajo.

Victor Mena
Residente Interventoría

MKA

Nota Nº 65
16/02/2026

Estado del Clima: Día oscuro con lluvias.
Personal del Contratista: Brayan Toro, Edwin Machado, Jorge Figueroa, Jhon Salgado, Laura Mor, Ing. Cristian Conde.
Personal de Interventoría:
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manillas largas, 1 línea de vida, 2 pipetas de gas para mantos, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 pulidoras, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones eléctricas largas, 4 carretillas, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnés para trabajo en alturas, 2 soplete para instalación de manto, 2 niveles manuales y 1 nivel digital.
Actividades: Se continua con remates de manto contra cara de domo de ludoteca y se realiza sellado en sus remates laterales. El avance del resto de actividades al igual que la no instalación del policarbonato debido a fuertes lluvias que se presentaron todo el día.

Ing. Victor Mort
Residente Interventoría

Nota Nº 66
17/02/2026

Estado del Clima: Mañana oscura pero llovio toda la tarde.
Personal del Contratista: Brayan Toro, Edwin Machado, Jorge Figueroa, Jhon Salgado, Laura Mor, Ing. Cristian Conde.
Personal Interventoría: Hubert Molina.
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manillas largas, 1 línea de vida, 2 pulidoras, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones eléctricas largas, 4 carretillas, 4 Secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas, 2 soplete para instalación de manto, 2 niveles manuales y 1 nivel digital.
Actividades: Se realiza retiro de empaque de policarbonato alrededor de domo 3 ludoteca hasta donde lo permitio las lluvias, se continua con remates de manto.

Ing Victor Mort
Residente Interventoría

Scanned with CamScanner

Nota Nº 67
18/02/2026

Estado del Clima: Día con lluvias la mayor parte del día.
Personal de Interventoría: Hubert Molina
Personal del Contratista: Brayan Toro, Edwin Machado, Jorge Figueroa, Jhon Salgado.
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, mantas largas, 1 línea de vida, 2 taladros, 2 pulidoras, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones eléctricas largas, 4 carretillas, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas con sus accesorios, 2 soportes para instalación de equipo, 2 niveles de mano y 1 nivel digital.
Actividades: Se verifican cantidades de obra en compañía del Arq Hubert Molina de Interventoría y se concilia cualquier diferencia restante, se continua con la instalación de policarbonato alveolar, cambio de canal de domo y otras actividades.

Ing. Victor Mora
Residente Interventoría

Nota Nº 68
19/02/2026

Estado del Clima: Mañana con lluvias, tarde soleada.
Personal del Contratista: Brayan Toro, Edwin Machado, Jorge Figueroa, Jhon Salgado y Juan Pablo Machado, Ing. Jairo Arteaga, Laura Mier, Ing. Cristian Conde, Ing. Marlon Conde.
Personal Interventoría: Huber Molina, Ing. Victor Mora, Arq. Harry Arango.
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, mantas largas, 1 línea de vida, 2 taladros, 2 pulidoras, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones eléctricas largas, 4 carretillas, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas con sus accesorios, soportes para pipeta de gas, 2 niveles de mano y 1 nivel digital.
Actividades: El día de hoy se realiza recorrido de frentes de obra y comite en el colegio Class sede B, se verifican varios temas entre las actividades pendiente, se toma de aplicar una capa de protección al adhesivo que

se lavo con acido Nitrico y clorhidrico en domo 1 y 2, para lo cual se protegera con Hidrofugo un total de 200m2 igual al que se limpio con acido. Se continua con remaches y manto, se continua con la instalación de policarbonato alveolar, cambio de canales de lucetaria. Se habla de fecha tentativa del proyecto el 2 de Marzo pero si se puede ante informar a la interventoría.

Ing. Victor Mora
Residente Interventoria

Nota Nº 69
20/02/2026

Estado del Clima: Dia asoleado pasado por lluvias.
Personal del Contratista: Brayan Toro, Edwin Machado, Jorge Figueroa, Jhon Salgado.
Personal Int.:
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manilas Vargas, 1 linea de vida, 2 pipetos de gas para manto, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 pulidoras, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones electricas largas, 4 cometillos, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en altura, 2 sopletes para instalación de manto, 2 niveles manuales y 1 digital.
Actividades: Se termino de instalar policarbonato alveolar y se realiza esgolinero del mismo, se instalo en su totalidad el manto en las areas planas y se realiza resellado de manto en uniones y demás detalles, se cambio en su totalidad los canales de lucetaria y se realizo perforaciones y realizo instalación a canal de uniones de sosco con tobera para colocar los 2 Bajante de tuberia como se solicito por Interventoria en comité pasado.

Ing. Victor Mora
Residente Interventoria

Scanned with CamScanner

Nota Nº70 Estado del Clima: Mañana soleada.
2/02/2026 Personal del Contratista: Edwin Machado y Jhon Agudelo.
Personal Interventoría:
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, mantos largos, 1 línea de vida, 2 pipetas de gas para maarto, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 pulidoras, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones eléctricas larga, 4 caricitillos, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 aines para trabajo en alturas, accesorios de aines, 2 sopletes para pipeta de gas maarto, 2 niveles de mano y 1 digital
Actividades: Se ejecuta remates de muro en cubierta y se realizo el desprendimiento del muro en el primer area de cubierta intervenida de este contrato, esto se realiza a solicitud explicita del Residente Victor Mora, el director de interventoría Harry Arango ya que tenia un detalle estetico, aunque fundamentalmente no tenia ninguna fisuración o mala instalación, el cambio se realizo por estetica, ya que se aclara que durante enero y Febrero de 2026 ha habido mucha precipitación en la zona y hasta el momento antes de extender el requerimiento nunca hubo fisuración alguna, se aclara que se cambio con la salvedad de que no se debe hacer para evitar fisuraciones posteriores, también es importante explicar que esta actividad se ejecuta de la manera más limpia posible.

Ing. Victor Mora
Residente Interventoría

Nota Nº71 Estado del Clima: Mañana oscura
23/02/2026 Personal del Contratista: Brayan Toro, Edwin Machado, Jhon Salgado.
Personal Int.:

Equipos y Herramientas: Herramienta menor, mantlas largas, 1 linea de vida, 2 pipetas de gas para instalación de manto, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 polidoras, 2 Rotomartillos 1 Hidrolavadora, 2 extensiones electricas largas, 4 carretillas, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas con sus accesorios, 2 sopletes para instalación de manto, 2 niveles de mano y 1 digital.
Actividades: Se realizo trabajos de corte de policarbonato para descargar los palomeras de domos, se remato tramos de manto y se realizo goteros en manto en remates contramuro.

Ing. Victor Mora
Residente Interventoria

Nota Nº 72 Estado del Clima: Mañana oscura,
24/02/2026 Personal del Contratista: Brayan Toro, Duban Ramirez.
Personal Interventoria:
Equipos y Herramientas: Herramienta menor mantlas largas, 1 linea de vida, 2 pipetas de gas para manto, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 polidoras, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones electricas largas, 4 carretillas, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas con sus accesorios, 2 sopletes para pipeta de gas para manto, 2 niveles de mano y 1 digital.
Actividades: Se realizo remates en el policarbonato, se realizo instalación de tuberia de canales de cubierta o Domo Ludoteca, se realiza demolición de muro para pase de tuberia PVC.

Ing. Victor Mora
Residente Interventoria

Nota Nº 73 Estado del Clima: Mañana soleada
25/02/2026 Personal del Contratista.
Personal Interventoría: Arq. Hubert Molina, Ing. Victor Mora.

Scanned with CamScanner

Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manillas largas, 1 línea de vida, 2 pipetas de gas para mapeo, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 polidoras, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones electricas largas, 4 carretillas, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas con accesorios, 2 sopletes para pipeta de gas para mapeo, 2 niveles de mano y 1 digital.
Actividades: Limpieza de zonas de Ludoteca, aplicación de pintura bituminosa de goteros de remates contramuro.
- Observaciones.
- De acuerdo al recorrido, se evidencie que el policarbonato del Domo 4 tiene 11 perforaciones, que se sellaron con silicona pero desde que se realizo la actividad presento un color rojizo, se le recomienda al contratista corregir, estas laminas.

Ing. Victor Mora - Residente interventoria

Nota 74
26/02/2026

Estado del Clima: Mañana soleada, tarde con lluvias.
Personal del Contratista: Edwin Machado, Brayan Toro, Juan Salgado.
Personal Int.: Arq. Hubert Molina, Ing. Victor Mora.
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manillas largas, 1 linea de vida, 2 pipetas de gas para mapeo, 2 extensiones electricas largas, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 polidoras, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 4 carretillas, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas, 2 sopletes para pipeta de gas para mapeo, 2 niveles de mano y 1 digital, 1 polea grande
Actividades: Se inicia con la instalación de Planchas de cobertura del Domo de Ludoteca, se inicia la instalación de mapeo de placa de Domo ludoteca.

Ing. Victor Mora
Residente Interventoria

Nota Nº 75
27/02/2026

Estado del Clima: Mañana soleada.
Personal del Contratista: Edwin Machado,

Brayan Toro, Jhon Salgado, Doban Ramirez
Personal de Interventoría: Ing. Victor Mora.
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manillas largas, 1 linea de vida, 2 pipetos de gas para manto, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 polidoras, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones electricas largas, 4 caretillas, 9 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas, 2 sopletes para instalación de manto, 2 niveles de mano y 1 digital.
Actividades: Se realiza las adecuaciones solicitadas por Interventoría el 25 de Febrero del presente año, se cambia las laminas de policarbonato solicitados con sus tornillos, se cambia el empaque por uno que no necesite aplicación de silicona. Se instala manto en la placa de Ludoteca. Se verifica que el Contratista de los sondeos realice correctamente lo solicitado, sonde cada bajante de placa, queda faltando sondear las cajas de primer piso.

Ing. Victor Mora
Residente Interventoria

Nota Nº 76 Estado del Clima: Dia soleado
28/02/2026 Personal del Contratista: Brayan Toro, Edwin Machado, Jhon Salgado, Doban Ramirez.
Personal Interventoría: Ing. Victor Mora, Arq. Hubert Molina.
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manillas largas, 1 linea de vida, 2 pipetos de gas para manto, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 polidoras, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones electricas largas, 4 caretillas, 9 seciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas, 2 sopletes para instalación de manto, 2 niveles de mano y 1 digital.
Actividades: Brayan Toro, Jhon Salgado, Edwin Machado, Doban Ramirez, SST Laura Mier, Ing. Cristian Conde,

Ing. Jairo Arteaga.
Personal Int.: Hubert Molina Arq. Ing. Victor, Arq Harry
Actividades: Se realizan remates en cubierta con detallado de la instalación de retesos de esquinas con la forma del domo de Ludoteca, se realiza resellado del manto en esta misma zona, se realiza limpieza general de areas de cubierta, se continua con cambio de laminas de policarbonato de domos 1 y 2 cumpliendo requerimiento del Ing de secretaria. Se realiza sondeo de cada punto de bajante de cubierta

Ing. Victor Mora
Residente Interventoría

Nota Nº 77
02/03/2026

Estado del Clima: Mañana soleada con lluvias en la tarde
Personal del Contratista: Brayan Toro, Shan salgado, Edwin Machado, Edward Hernandez, Laura Mier SST, Ing. Cristian Conde, Ing. Jairo Arteaga.
Personal de Int.: Arq. Hubert Molina, Ing. Victor Mora
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manilas largas, 1 linea de vida, 2 pipetas de gas para manto, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 pulidoras, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones electricas largas, 4 careteillos, 4 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas con sus accesorios, 2 sopletes para instalación para manto, 2 niveles de mano y 1 digital.
Actividades: Se realiza pruebas de descarga de cubierta para mirar el estado de los punto de evacuación y su estado actual, se puede observar que son muchos puntos de desagüe conectados a un solo punto, se cambio la terminación del policarbonato y se remata Filos de manto pendientes. Se aplica pintura Bituminosa en sellos de juntas o cualquier zona donde haya un desprendimiento del Foil del manto para protegerlo.

Scanned with CamScanner

Nota Nº 78 Estado del Clima: Mañana soleada, tarde oscura.
03/03/2026 Personal del Contratista: Jhon Salgado, Edwin Machado, Laura Mier, Ing. Cristian Conde, Ing. Jairo Arteaga.
Personal Int.: Arq Hubert Molina, Ing. Victor Mora
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manilas largas, 1 línea de vida, 2 pipetas de gas para manto, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones electricas largas, 4 carretillos, 9 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas, 2 sopletes para instalación de manto, 2 niveles de mano y 1 digital.
Actividades: Se realiza instalación de manto de la canal del domo 2, la cual estaba pendiente por lo complicado de la zona de trabajo, se retoma obtenimos

Ing. Victor Mora
Residente Interventoría

Nota Nº 79 Estado del Clima: Mañana soleada
04/03/2026 Personal del Contratista: Brayan Toro, Eduard Hernandez, Edwin Machado
Personal Int.: Arq. Henry Araujo, Ing. Victor Mora, Arq Hubert
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manilas largas, 1 línea de vida, 2 pipetas de gas para manto, 2 escaleras largas, 2 taladros, 2 rotomartillos, 1 Hidrolavadora, 2 extensiones electricas largas, 4 carretillos, 9 secciones de andamio, 1 polea grande, 4 arnes para trabajo en alturas con sus respectivos accesorios, 2 sopletes para instalación de manto, 2 niveles de mano y 1 digital.
Actividades: Se realiza comité de obra y recorrido de obra, donde se verifica la aplicación del impermeabilizante o de llamado Hidrofugo el cual se le aplico toma, pero el contratante o interventoría dijo que debe ser hidrofugo transparente neutro y nada más, por lo cual se compraron una marca con sus certificados avalada, pero se

hace la salvedad que ningun hidrofugo del mercado da garantia de 12 años y que las marcas conocidos solo manejan entre 8 y 10 años. Se continua con trabajos en area de ludoteca bajo placa y cubierta de placa plantando perfiles y placa, se continua con cambio de empaques de policarbonato.

Nota Nº 80
05/03/2026


Estado del Clima: Mañana Oscura,
Personal del Contratista: Brayan Toro, Edwin Machado, Jhon Salgado, Edwin Hernandez, SST Laura Mier, Ing. Cristian Conde, Ing. Jairo Arteaga.
Personal la Interventoría:
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manilas largas.

Scanned with CamScanner

8. I.E.D
PILOTO SEDE D

OBRA: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, Y GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR. 8155233
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS DT.
INTERVENTORIA: UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS.

NOTA 01 19/12/25 CERTIFICACION DE APERTURA BITACORA DE OBRA: CON ESTA FECHA SE DA APERTURA A LA PRESENTE BITACORA CON EL FIN DE DEJAR CONSTANCIA DE LAS VISITAS DE OBRA, RECOMENDACIONES TECNICAS, CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES Y DEMAS ACTUACIONES Y RECOMENDACIONES QUE AFECTEN DE MANERA DIRECTA O INDIRECTAMENTE LAS ACTIVIDADES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155233. LAS FIRMAS QUE APARECERAN AL FINAL, IDENTIFICAN OFICIALMENTE A LAS PERSONAS DE LA SUPERVISION, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA QUE ESTAN FACULTADAS PARA LA UTILIZACION DE ESTE LIBRO DE BITACORA.
EN CONSTANCIA FIRMAN:



Residente de obra.

Powered by CamScanner

NOTA 02
19/12/25

NOTA QUE DESCRIBE EL BUEN MANEJO DE LA BITACORA:
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO POR LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO QUE, PARA EL BUEN USO Y MANEJO DE ESTA BITACORA SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES:

1) ESTA BITACORA ESTARA TODO EL TIEMPO BAJO CUSTODIA DEL RESIDENTE DE OBRA Y DISPONIBLE PARA CUALQUIER CONSULTA.
2) SE ESTABLECE UN PLAZO DE 24 HORAS PARA LA FIRMA DE LAS NOTAS.
3) QUEDA PROHIBIDA LA MODIFICACIÓN DE LAS NOTAS DE BITACORA YA FIRMADAS, AUN CUANDO SE TRATE DEL AUTOR DE LAS MISMAS.
4) LAS NOTAS ELIMINADAS DEBERAN TACHARSE MEDIANTE EL USO DE LINEAS DIAGONALES Y DEBERAN CONTENER "ELIMINADO POR ERRORES DE REDACCION"
5) TODAS LAS NOTAS DEBERAN ENUMERARSE EN FORMA SERIADA Y FECHARSE CONSECUTIVAMENTE RESPETANDO, SIN EXCEPCIÓN EL ORDEN ESTABLECIDO.
6) LAS NOTAS DEBERAN EFECTUARSEN CLARAMENTE CON TINTA INDELEBLE, LETRA LEGIBLE Y SIN ABREVIATURAS
7) SE DEBERAN CANCELAR LOS ESPACIOS SOBRANTES DE UNA HOJA AL COMPLETARSE EL LLENADO DE LA MISMA.
8) NOTA QUE NO CONTENGA COMPLETAS LAS FIRMAS REGISTRADAS O APROBADAS CARECERA DE TODA VALIDEZ LEGAL.

EN CONSTANCIA FIRMAN:

Residente de obra

NOTA 03 19/12/25	SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA DEL PATIO DEL COLEGIO EN LA ZONA DE JUEGOS, REALIZANDO EL DESMONTE DEL PARQUE INFANTIL EXISTENTE E INICIANDO CON LA DEMOLICIÓN DEL ANDEN EN ESTA ZONA. EN OBRA SE CUENTA CON: TRES (3) PERSONAS OPERATIVAS, UN (1) RESIDENTE DE OBRA Y UNA (1) INSPECTORA SST. Residente de obra
NOTA 04 20/12/25.	SE TERMINA LA DEMOLICION DEL ANDEN EN EL PATIO ZONA DE JUEGOS Y SE INICIA LA DEMOLICION DE LA PLACA EXISIENTE EN TODO ESTE ESPACIO. EN OBRA SE CUENTA CON: TRES (3) PERSONAS OPERATIVAS, UN (1) RESIDENTE DE OBRA Y UN (1) INSPECTORA SST. Residente de obra
NOTA 05 22/12/25	SE REALIZA DISPOSICION DE RED'S Y SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE LA PLACA EXISTENTE EN LA ZONA DE JUEGOS. EN OBRA SE CUENTA CON: CUATRO (4) PERSONAS OPERATIVAS, UN (1) RESIDENTE DE OBRA Y UNA (1) SST. Residente de obra
NOTA 06 23/12/25	SE CONTINUA CON LA DEMOLICION DE LA PLACA EXISTENTE

Powered by CamScanner

EN LA ZONA DE JUEGOS. EN OBRA SE CUENTA CON: CUATRO (4) PERSONAS OPERATIVAS, UN (1) RESIDENTE DE OBRA Y UNA (1) INSPECTORA SST.

Residente de obra

NOTA 07 26/12/25

SE CULMINA CON LA DEMOLICION DE LA PLACA EN LA ZONA DE JUEGOS Y SE EVIDENCIA QUE EL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUA NO SE ENCUENTRA FUNCIONAL, YA QUE SE EVIDENCIA UNA CAJA DE INSPECCION TOTALMENTE COLMATADA. EN OBRA SE CUENTA CON: CUATRO (4) PERSONAS OPERATIVAS, UN(1) RESIDENTE DE OBRA Y UNA (1) SST.

Residente de obra

NOTA 08. 27/12/25

SE PROCEDE A REALIZAR EN LA CAJA DE INSPECCION ENCONTRADA LABORES DE EXCAVACION, DESTAPE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO LOGRANDO INTERVENIR UN TRAMO APROXIMADO DE 2.50m. EN DONDE SE CONSTATÓ: PERSISTENCIA DE OBSTRUCCIONES INTERNAS, FALTA DE CONTINUIDAD HIDRAULICA Y TRAMOS DE TUBERIA SUELTOS, ROTOS, Y SIN LA ADECUADA CONFORMACION. EN OBRA SE CUENTA CON: CUATRO (4) PERSONAS OPERATIVAS, UN (1) Residente de obra Y UNA (1) SST.

Residente de obra

Powered by CamScanner

NOTA 09 06/01/26.	Se envia via correo electronico a interventoría propuesta para el manejo de agua en la zona del punto que se encuentran en intervención. Se queda a la espera de revision y aprobación para continuar con las actividades. Residente de obra
NOTA 10 17/01/26	Se reanudan actividades realizando excavacion manual para sistema de evacuacion de agua, y se procede a iniciar con la instalacion de tuberia sanitaria 4". De igual manera se realiza excavacion para caja de inspeccion. En obra se cuenta con: Cuatro (4) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) SST. Residente de obra
NOTA 11 19/01/26	Se termina instalacion de red sanitaria, se realiza excavacion para el concreto en concreto, se realiza replanteo de todo el terreno, y se empieza con el relleno con subbase granular. En obra se cuenta con: cuatro (4) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST. residente de obra

Powered by CamScanner

NOTA 12
20/01/26.

Se continua con el relleno en subbase granular y la respectiva compactación, se realiza fundición de la base del carcamo en concreto. En obra se cuenta con: cuatro (4) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente de obra

NOTA 13
21/01/26

Se termina con la compactación de toda la subbase granular, se realiza la construcción de las cajas de inspección y se instala formaleta para fundir el carcamo en su totalidad. En obra se cuenta con: cuatro (4) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente de obra

NOTA 14.
22/01/26

Se realiza fundición de carcamo el concreto, se realiza instalación de geotextil en toda la superficie de la placa, y de igual manera se instala toda la malla electrosoldada en la superficie de la placa. En obra se cuenta con: cinco (5) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente de obra

Powered by CamScanner

NOTA 15. 23/01/26 Se funde placa en concreto de todo el patio toma de juegos que se encuentra en intervencion. En obra se cuenta con: cinco (5) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente de obra

NOTA 16 24/01/26 Se realiza hidratacion a la placa fundida y se realiza su respectivo acabado final. En obra se cuenta con: cinco (5) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente de obra


NOTA 17 26/01/26. Se desencofra cardcamo en concreto y se le da su acabado final, Tambien se inicia con la demolicion de sobrepiso existente en el patio principal del colegio. En obra se cuenta con: Cuatro (4) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente de obra

NOTA 18 27/01/26. Se termina con la demolicion del sobrepiso existente en el patio principal y se da inicio al picado de la superficie. En obra se cuenta con: Tres (3) personal


Powered by CamScanner

operativos), un (1) residente de obra y una (1) SST.




Residente de obra

NOTA 19. 28/01/26 Se termina con todo el picado de la superficie en la plaza del patio principal y se realiza la disposición de todos los RCD's provenientes de las demoliciones realizadas. En obra se cuenta con: tres (3) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.



Residente de obra

NOTA 20. 10/02/26. Se realiza instalación de malla gallinero para piso del patio principal del colegio, de igual manera se elaboran las tapas de las cajas de inspección ya construidas. En obra se cuenta con: Tres (3) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) SST.



Residente de obra

NOTA 21 11/02/26. Se culmina la instalación de la malla gallinero, se realiza replanteo y toma de niveles de la zona y se inicia con la fundición del nuevo sobrepiso en el patio principal del colegio. En obra se

	Cuenta con: TRES (3) Personal operativos, UN (1) Residente de obra y una (1) Inspectora SST. Residente de obra
NOTA 22 12/02/26.	Se continua con la funcion del sobrepiso en el Patio Principal del colegio y se procede a realizar su respectivo acabado final. En obra se cuenta con: TRES (3) personal operativos, un (1) Residente de obra y una (1) Inspectora SST. Residente de obra
NOTA 23 13/02/26.	DIA LLUVIOSO. Durante toda la jornada laboral, lo cual impidio seguir con las labores. En obra se cuto con: dos (2) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST. Residente de obra
NOTA 24 18/02/26	Ingresa baño portatil a la obra. Residente de obra

Powered by CamScanner

NOTA 25. 25/02/26. Despues de 3 dias que el colegio se quedo sin Agua se reanudan actividades realizando la instalacion de rejillas en los sardineles de concreto, se culmina sobrepiso con su acabado final en el patio Principal del colegio, En obra se cuenta con: dos(2) personal operativos, un(1) Residente de obra y una (1) SST.

Residente de obra

NOTA 26. 27/02/26. Se realiza dilatacion de placas en el patio principal mediante corte con pulidora, se terminan todos los detalles menores pendientes y se realiza la instalación de las tapas terminadas en las cajas de inspeccion. En obra se cuenta con: dos(2) personal operativos, un(1) residente de obra y una(1) SST.

Residente de obra

NOTA 27 03/03/26. Se realiza instalacion de juego infantil en el patio principal y se realiza el aseo final de la obra en sus espacios intervenidos. En obra se cuenta con: dos(2) personal operativos, un(1) residente y una(1) SST.

Residente de obra


Powered by CamScanner

9. I.E.D.
PILOTO SEDE A

OBRA: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155233.
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS DT.
INTERVENTORIA: UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS.

NOTA 01 17/12/25

CERTIFICACION DE APERTURA BITACORA DE OBRA: CON ESTA FECHA SE DA APERTURA A LA PRESENTE BITACORA CON EL FIN DE DEJAR CONSTANCIA DE LAS VISITAS DE OBRA, RECOMENDACIONES TECNICAS, CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES Y DEMAS ACTUACIONES Y RECOMENDACIONES QUE AFECTEN DE MANERA DIRECTA O INDIRECTAMENTE LAS ACTIVIDADES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155233. LAS FIRMAS QUE APARECEN AL FINAL, IDENTIFICAN OFICIALMENTE A LAS PERSONAS DE LA SUPERVISION, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA QUE ESTAN FACULTADAS PARA LA UTILIZACION DE ESTE LIBRO DE BITACORA:
EN CONSTANCIA FIRMAN:



Residente de obra

Powered by CamScanner

NOTA 02
17/12/25

NOTA QUE DESCRIBE EL BUEN MANEJO DE LA BITACORA:
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO POR LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO QUE, PARA EL BUEN USO Y MANEJO DE ESTA BITACORA SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES:

1) ESTA BITACORA ESTARA TODO EL TIEMPO BAJO CUSTODIA DEL RESIDENTE DE OBRA Y DISPONIBLE PARA CUALQUIER CONSULTA.
2) SE ESTABLECE UN PLAZO DE 24 HORAS PARA LA FIRMA DE LAS NOTAS.
3) QUEDA PROHIBIDA LA MODIFICACIÓN DE LAS NOTAS DE BITACORA YA FIRMADAS, AUN CUANDO SE TRATE DEL AUTOR DE LAS MISMAS.
4) LAS NOTAS ELIMINADAS DEBERAN TACHARSE MEDIANTE EL USO DE LINEAS DIAGONALES Y DEBERAN CONTENER "ELIMINADO POR ERRORES DE REDACCIÓN"
5) TODAS LAS NOTAS DEBERAN ENUMERARSE EN FORMA SERIADA Y FECHARSE CONSECUTIVAMENTE RESPETANDO, SIN EXCEPCIÓN EL ORDEN ESTABLECIDO.
6) LAS NOTAS DEBERAN EFECTUARSEN CLARAMENTE CON TINTA INDELEBLE, LETRA LEGIBLE Y SIN ABREVIATURAS.
7) SE DEBERAN CANCELAR LOS ESPACIOS SOBRANTES DE UNA HOJA AL COMPLETARSE EL LLENADO DE LA MISMA.
8) NOTA QUE NO CONTENGA COMPLETAS LAS FIRMAS REGISTRADAS O APROBADAS CARECERA DE TODA VALIDEZ LEGAL.

EN CONSTANCIA FIRMAN:

Residente de obra

Powered by CamScanner

NOTA 03. 17/12/25.	Se inicia actividades en los baños a intervenir realizando recorrido de obra con el almacenista del colegio y con la interventoria, marcando los push que requieren cambio por deterioro o mal funcionamiento. En obra se cuenta con 1(un) residente de obra. Residente de obra
NOTA 04. 18/12/25	Se inician actividades de obra realizando la demolicion de acabados en los puntos a intervenir, desmontando sanitarios de push a intervenir y desmontando griferia de push en lavamanos que requieren cambio. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativos, un (1) Residente de obra y una (1) inspectora SST. Residente de obra
NOTA 05. 19/12/25.	Se realiza actividades de orden y aseo recogiendo y enlonando los RCD's provenientes de las demoliciones y limpiando las zonas de intervención. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST. Residente de obra

Powered by CamScanner

NOTA 06. 22/12/25.	Se realiza instalacion de tapones en cada uno de los puntos que se empezaron a intervenir para evitar que salga agua y el colegio pueda tener agua Mientras llegan los Push nuevos a instalar. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativos, un (1) Residente de obra y una (1) inspectora SST. Residente de obra
NOTA 07 19/01/26.	Ingresa Material a obra (Push, Tuberia, accesorios) los cuales debido a la epoca navideña el proveedor Cerro y el despacho se demoro más de lo esperado. En obra se cuenta con: un (1) residente de obra. Residente de obra
NOTA 08. 21/01/26.	Se reanudan actividades de obra realizando la demolicion de muñete en muros, y se inicia con la instalacion de la nueva Tuberia y Push en la toma de los lavamanos ubicados en los baños del primer piso al lado de los comedores. En obra se cuenta con: Tres (3) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) SST. Residente de obra

Powered by CamScanner

NOTA 09. 22/01/26. Se continuan actividades de instalacion de tuberia PVCP y Push, esta vez en los baños del primer piso del bloque C. Se evidencia que el sistema hidraulico de los sanitarios NO es el correcto dado que la tuberia vertical donde se carga el agua para vaciar los sanitarios tiene apenas 20cm, la cual como minimo deberia de tener 80cm de carga de agua para que funcione correctamente, dado que como se encuentra el sistema actualmente esta trabajando por presion lo cual hace que los push se puedan dañar facilmente o tener un desgaste significativamente alto. En obra se cuenta con: tres (3) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Residente de obra

NOTA 10. 23/01/26. Se continua actividades de instalacion de tuberia PVCP. y push, esta vez en los baños del primer piso al lado de los talleres. Con respecto al sistema hidraulico expresado en la nota anterior se le informa a interventoria y se propone bajar los push para poder darle con tuberia una mayor carga de agua al sistema. Por indicaciones de interventoria NO se aprueban estas intervenciones y se exige que los push se mantengan tal cual estaban con el mismo sistema hidraulico existente. En obra se cuenta con: tres (3) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Residente de obra

Powered by CamScanner

NOTA 11. 24/01/26.	Se realiza Aplicacion de pintura resaltando todos los puntos ya intervenidos en la zona de los lavamanos, de esta manera protegiendo las intervenciones previo al ingreso de los estudiantes el día lunes 26 de enero. De igual manera se realiza aseo y limpieza de las zonas intervenidas y se realiza el sellamiento de las baterias sanitarias que se encuentran en intervencion. En obra se cuenta con: tres (3) personal operativo, un (1) Residente de obra y una (1) inspectora SST. Residente de obra
NOTA 12 26/01/26.	Se inician intervenciones en las zonas de los sanitarios de acuerdo a las instrucciones dadas por la interventoria resaltando que este contratista no se hace responsable de daños en los pisos ocasionados por el sistema hidraulico existente en el colegio. En obra se cuenta con: Tres (3) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) SST. Residente de obra
NOTA 13. 27/01/26.	Se realiza el desmonte de espejos existentes, el desmonte de lavamanos existentes en policuarzo de los baños ubicados al lado del comedor y se inicia con la pulida de la superficie intervenida para poder empezar a instalar su respectivo acabado final en enchape duro. En obra se cuenta con: Tres (3) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Powered by CamScanner

Residente de obra

NOTA 14. 28/01/26. Se realiza desmonte de mesones en policuerpo de los baños del primer piso del bloque C y en los baños al lado de los talleres. Se continua con la instalacion de tuberia pepc e instalación de push en los sanitarios de los baños; y de igual manera se alista la superficie para empezar a enchapar los muros. En obra se cuenta con: tres (3) operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST. A obra ingresan ocho (8) baterias de baños portatil para atender la contingencia presentada.

Residente de obra

NOTA 15 29/01/26. Se realiza instalacion de enchape en baños ubicados en el primer piso al lado de los comedores. de igual manera se continuan intervenciones en sanitarios de los demas baños instalando tuberia y push. En obra se cuenta con: cinco (5) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) SST.

Residente de obra

NOTA 16 30/01/26. Se realiza Socializacion del uso adecuado de los baños por-talleres a la lectora, docentes y almacenista del colegio

Powered by CamScanner

Se continua con la instalacion de enchape en zonas intervenidas en los baños del primer piso - bloque C, Se continua con las actividades de intervencion en Sanitarios de los baños ubicados al lado de los talleres. Tambien se realiza la reinstalacion de los mejores en Policuerdo de los baños ubicados al lado de los comedores. En obra se cuenta con: seis (6) Personal operativos, un (1) Residente de obra y una (1) Inspectora SST.




Residente de obra

NOTA 17. 31/01/26. Se realiza intervencion completa del Sanitario en baños de profesores y se deja funcionando y habilitado para el uso de los mismos. Se realiza Aseo final en baños ubicados en la zona de comedores para realizar la entrega al colegio el dia lunes. En obra se cuenta con: Seis (6) Personal operativos, un (1) Residente de obra y una (1) Inspectora SST.

Residente de obra

NOTA 18. 02/02/26. Se termina con la instalacion de enchape en el ultimo baño ubicado en el primer piso al lado de los talleres, se realizareinstalacion de Sanitarios y mejores en Policuerdo en los baños del primer piso - bloque C. de igual manera se realizan ajustes de observaciones para entrega en los baños ubicados al lado de los comedores. En obra se cuenta con: Seis (6) Personal




Powered by CamScanner

	operativos), un(1) residente de obra y una (1) SST.  Residente de obra
NOTA 19 03/02/26	Se continua con la reinstalacion de lavamanos en policuerpo en los baños del Primer Piso - bloque C. y se terminan con la subsanación de observaciones para entrega de los baños al lado de los comedores. En obra se cuenta con: cinco (5) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) SST.  Residente de obra
NOTA 20 04/02/26.	Se realiza entrega parcial al colegio de las dos primeras baterias sanitarias ubicadas en el primer piso al lado de los comedores. tambien se continua con la reinstalacion de sanitarios y lavamanos en los baños primer piso del bloque C. En obra se cuenta con: cinco (5) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) SST.  Residente de obra
NOTA 21 05/02/26.	Se realiza lavado, limpieza y aseo final en baños del primer piso - bloque C alistandolos para entrega. de igual manera se inicia con la reinstalacion de los

Powered by CamScanner

	lavamanos en policarbonato de los baños ubicados en el 1er piso al lado de los talleres. En obra se cuenta con: Cuatro (4) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST. Residente de obra
NOTA 22. 06/02/26	Se realiza entrega parcial al colegio de las siguientes dos baterías sanitarias ubicadas en el primer piso del bloque C. También se continua con la reinstalación de lavamanos en policarbonato de los baños ubicados al lado de los talleres. En obra se cuenta con: cuatro (4) personal operativos, un (1) residente de obra y una SST. Residente de obra
NOTA 23. 07/02/26	Se realiza mantenimiento a orinal en baño niños del primer piso de talleres. que presentaba taponamiento y push aberiado. Se realiza instalación de espejos en todos los baños intervenidos. En obra se cuenta con: Seis (6) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST. Residente de obra

NOTA 24. 09/02/26.	Se evidencia que uno de los sanitarios del baño de niñas en los baños primer piso al lado de talleres se encuentra fisurado presentando filtraciones por lo cual se solicita el cambio por uno nuevo. de igual manera se termina con la instalacion de lavamanos y se procede a realizar el aseo, limpieza y lavado final de los ultimos baños para realizar la entrega. En obra se cuenta con: Cuatro (4) Personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) SST. Residente de obra
NOTA 25. 10/02/26.	Se termina con el aseo y limpieza final de los baños ubicados en el primer piso al lado de los Talleres para entregar al colegio. A la espera de que llegue el sanitario para cambio reportado en la nota anterior. En obra se cuenta con: cuatro (4) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) INSPECTORA SST. Residente de obra
NOTA 26. 11/02/26.	Se realiza instalacion del sanitario pendiente y se entrega todo para realizar la entrega al colegio. En obra se cuenta con: dos(2) personal operativo, un(1) residente obra y una(1) SST. Residente de obra

NOTA 27. 12/02/26.	Se realiza entrega de los baños ubicados en el primer piso al lado de talleres al colegio. En obra se cuenta con: Un (1) residente de obra.  Residente de obra
NOTA 28. 18/02/26.	Se realiza pruebas de presion al sistema Hidraulico del colegio en presencia del especialista hidraulico de la Secretaria de educacion, almacenista del colegio, interventoria y contratista, donde se evidencia que el sistema presenta picos con variaciones de presion por lo que se propone instalar una valvula de regulacion de presión en el cuarto de bombas. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST. Se retiran baños portatiles.  Residente de obra
NOTA 29 20/02/26.	Se realiza instalacion de dos (2) divisiones en acero inoxidable para los baños de niños en los baños del primer piso al lado de los comedores. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativo y un (1) residente obra  Residente de obra

NOTA 30. 28/02/26.	Por solicitud de secretaria de educacion debido al vandalismo de los estudiantes se realiza reinstalacion de divisiones existentes, sellamiento de fisis de las pisos desmontables con pegamento especial y sellado de todo tipo de huecos en muros existentes en los baños intervenidos). En obra se cuenta con: dos(2) personal operativos, un(1) residente de obra y una(1) inspectora SST. Residente de obra

Powered by CamScanner

ACTAS DE VISITA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	19 Feb 26	Inicio	8:00 am	Fin	2:30 pm	Lugar	Colegios Grupo 09
Asunto	Avance Contractual Grupo 09						
Asistentes	Interventoría y Contratista Obra.					Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración	19 Feb 26	Elaborado por	Interventoría.			Próxima Reunión	

* IED. SAN Benito Abad
- 2 oficiales
- 1 Electrico.

Actividades.
- Remates de pintura en Baño. primera.
- Ajustes electricos.
- Remates Baños Profesores

Recomendación
- Arreglos de Acabados, Filos.
- Arreglos acabados electricos.
- llave de poceta, ocultarla.
- Remate pintura en Cubierta.
- Baños profesores.
- Remates generales de Boquilla.
- Remate en pintura.
- Grifería instada. en lavamanos.

* IED. Marco Fidel Suarez
- 1 Encargado
- 2 oficial
- 3 Ayudantes
- 1 SST.

- Actividades.
- Pañete Interior
- lijando Puertas.

recomendación.
- Remate general de Cubierta
- Remates de Calatas.
- Pintura en Perfil de Cubierta.
- Recoger escombro en excavacion tuberia

* IED Venecia - B.
- 2 oficiales.

Actividades.
- Remate Pulido de mediacaña.

Recomendaciones
- Terminar. emboquillado.
- Terminar. media, caña.
- Verificar la calidad en el enchape.
- proxima semana, instalacion de divisiones.

* IED Leonardo Posada.
* 2 oficiales
* 2 Ayudantes

Actividades.
* Pañete en Baños
* Instalacion tuberia en Baños.

Recomendaciones.
- cover tuberia para la Ubicacion de Sanitario
- Hacer pruebas de manto.
- mover puntos sanitarios

* IED CLASS-B.
- 1 Maestro.
- 1 oficial
- 3 Ayudantes.

ACTIVIDADES.
- Cambio de policarbonato en zona C
- Terminación en Manto. remates.

Recomendaciones.
- Arreglo. de Cielo raso. en daños.
- Tener cuidado con las laminas en la zona. C. se esta instalando policarbonato.

* IED. SAN Rafael - B.
- 2 oficial.
- 2 Ayudantes

Actividades
- Instalación tablon,
- emboquillado de enchape.
- Estuco plastico.

Recomendacion
- Alinear Actividades con el Colegio, ingreso puerta posterior

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	19 Feb 26	Inicio	8:00 am	Fin	2:30 pm	Lugar	Colegios Grupo 09.
Asunto	Avance Contractual Grupo 09.						
Asistentes	Interventoría y Contratista Obra.					Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración	19 Feb 26	Elaborado por	Interventoría.			Próxima Reunión	

- IED Villa RICA - A.
  - Sin personal
- Act.
  - Fundicion de placa. zona Tanques

* IED Piloto. - D.
  Sin personal en Obra
- Remates plaza
- IED. Piloto A.
- Sin personal.

- DILE
  Sin personal.
  Trabajo en taller.
* IED. Eloisa.
* Trabajando en propuesta

Emergencia
* NICOLAS Esguerra.
  Pendiente NP Puertas.
* Debora Arango.
  Pendiente Visita y NP.

Compromisos.

- Colegio San Benito Abad, Instalacion de puertas, espejos, para el dia 21 de Febrero 2026.
- Colegio San Benito Abad, Entrega para el Colegio el dia Lunes 23 de Febrero 2026, Actas
- Colegio Marco Fidel Suarez, mejoramientos de Pañete, arreglo de Cubierta, remates perimetrales exteriores.
- Colegio Venecia - B, Entregar las 2 Baterias el 06 Marzo 2026
- Colegio Leonardo Posada, Entrega de cubierta. Martes 24 Febrero 2026
- Colegio Class - B. Entrega parcial. 02 Marzo. 2026.
- Colegio San Rafael - B. entrega Final 02 Marzo 2026.
- Colegio VillaRICA - se compromete a realizar la fundición el dia Martes 24 febrero 2026.
- Colegio Instituto Tecnico Industrial Piloto - D. el contratista se compromete a entregar el Pcto el 27 Feb-26.
- Colegio Instituto Tecnico Industrial Piloto - A. - El contratista enviara correo solicitando el Valvula reguladora.
- Colegio Eloisa Gaszon. el contratista enviara programacion de inicio de trabajo

NOMBRE: John Alexander Amaya
CARGO: Apoyo Interventoría

NOMBRE: ~~MAURICIO C. CONDE B~~
CARGO: ~~DIRECTOR DE PROYECTO.~~

NOMBRE:
CARGO: Apoyo Tecnico

Victor Noel
Residente Obra.

Sebastian Guzman.
Residente de obra

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	04 Marzo 26	Inicio	8:00 am	Fin	2:00 pm.	Lugar	Colegios Grupo 9.
Asunto	Avance Contractual Grupo 9.						
Asistentes	Interventoría Contratista				Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración	4 Marzo 2026	Elaborado por				Próxima Reunión	

* IED. LEONARDO POSADA.
2 oficiales
1 Ayudante
- Cubierta, pendiente terminar.
- Pulida de media caña
- Romper. placa, conexion punto sanitario, de sanitario
- Demolición de paredes para adecuación de Baño condición.

* IED CLASS-B.
- 2 Personas.
- Act. sellando Juntas Bituminosa
- Remate de manto.

* IED. SAN RAFAEL-B.
- 1 oficial
- 6 Ayudantes.
- Remate de Adoquín.

- Pintura en zona Ubinta
- Emboquillado de Enchape

* IED. Villa RICA.
- No hay personal en el Colegio.
- Sin Actividad
* Falta propuesta electrica, lunes 09 Marzo. 2026.

* IED. Venecia-B.
- 1 oficial
- 2 electricos.
- Terminación de Baños.
- Adecuar lavamanos.
- Instalación de toma electrico
-

* IED. Piloto-D.
- Sin personal
- Limpieza de Concreto
- Entrega de zona patio
- Destroncar Piso.

* IED. Marco Fidel Suarez
- 1 Encargado
- 1 oficial
- 2 Ayudantes.
- Act.
- Enchape de Pared zona Plaza.
- Estuco en Salones interior.
- Pintura de Pared.
- Observaciones. - Revisar Pintura

Emergencias.
* Debora Arango.
Pendientes NP.
* Nicolas Esguerra.
Pendiente Aprobación NP.
* Prospero Pinzón.
Pendiente Aprobación NP.
* Hernando Ruian Duzan
Pendiente Aprobeo NP.
se inicia actividad. el 11 de Marzo 2026 con las Actividades contractuales.
* Bernardo Jaramillo.
No se ha recibido ficha de Alertas

Compromisos.
- Colegio terminado programado entrega 30/Marzo/2026 - Preentrega 24/Marzo/2026
- Colegio CLASS-B. Programado entrega y 8 dias despues - Preentrega. 04/Marzo/2026.
- Colegio San Rafael-B - Preentrega el dia 13 Marzo. 2026.
- Sele solicita personal al contratista, en el Colegio Villa RICA
- Colegio Venecia-B. preentrega Viernes 13 Marzo 2026.
- Sele solicita al contratista reforzar en cada uno de los frentes mano de Obra.
* Programar entregas, con Anterioridad
- Se le solicita al Contratista dar inicio en el Frente Eloisa Garzón, Ya que se va el tiempo Contractual

Victor Mont
Residente Interventoria

MARCELO CARDOZO
DIRECTOR DE OBRA

Sebastian Guzman
Residente de obra

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Educación
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	11 Marzo 26	Inicio	8:00 am	Fin	13:00.	Lugar	Colegios Grupo 9.		
Asunto	Avance Contractual Grupo 9.								
Asistentes	Contratista & Interventoria					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	11 Marzo 26	Elaborado por	Interventoria.					Próxima Reunión	

*IED. Leonardo Posada
+1 Maestro.
*1 Oficial.
Act. Pañete de Baño.
• Pañete Baño discapacitados.
Observación.
- Instalar fachada en ladrillo existente y continuar con el la puerta, celosia.
• No ha llegado material, Bloque.
- Manto, Remate en pintura.
- Apozamientos, verificar sellos perimetrales.
- Uniones, de manto sin sellar.

*IED. CLASS-B.
- 2 Personas, oficiales.
Act. Aplicación de Hidrafugo,
- El ladrillo le falta reemboquillado observaciones
- Arreglo de manto. en cubierta.
• Arreglo de policarbonatos.

*IED SAN RAFAEL-B.
- 1 oficial.
- 2 Ayudantes.
Act. Aplicación de Pintura.
- Instalación de Granito en escalera.
- Recomendaciones.

*IED. VILLA RICA
- 1 oficial.
Act. Remate de Placa.
Falta aplicación de pintura Concha
No se ha enviado propuesta dacha
• Pendiente Material Pintura Concha

*IED. Venecia-B.
- 1 Maestro.
- 2 oficiales. Instalación Cajon tura Metalica.
Act, Remate enchape Baño.
- Instalación de divisiones Baño.

realizar remates entrega.
*IED Marco Fidel Suarez.
- 2 oficiales
- 2 Ayudantes.
Act. Fundición de Anden
- Instalación de Baldosa.
observaciones.
- Recoger. material en zona de Acopio.
*Piloto-A.

Compromiso.
- El contratista sigue con la fecha de preentrega. Colegio Leonardo Posada. 24 Marzo 2026
- El contratista sigue con la fecha de preentrega, Colegio Class-B, Sabado 14 Marzo. 2026.
- El contratista sigue con la fecha de preentrega, Colegio San Rafael-B. Viernes 13 Marzo 2026.
• El contratista. programa fecha de entrega, colegio Ville. Rica
•El contratista sigue con la fecha de preentrega. Colegio. Venecia-B. Viernes 13 Marzo 2026
- El contratista se programa preentrega colegio Marco fidel Suarez - 28 Marzo 2026.
• sele solicita al contratista del ingreso de personal en los frentes de trabajo,
- El contratista se compromete en iniciar labores el dia del Colegio Piloto-A.
- El contratista realiza labores en la emergencia Colegio Heinado Juan Russan el dia 12-Marzo-2026.
- El contratista se compromete en iniciar el DILE Bosa Viernes 13 Marzo 2026.

- Victor Mora
Residente Interventoria

John Harry Arango
Pla. Interventoria.

Sebastian Guzman.
Residente de obra

21-IF-001
V.1

Powered by CamScanner

CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS DT - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155233-2025

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."

ANEXO No. 1

INFORME DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

PERIODO: Del 14 de febrero de 2026 al 13 de marzo de 2026

VERSIÓN 0
VOLUMEN 1 DE 1

REGISTRO DE REVISIONES Y APROBACIONES

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ	Harry Arango	Director de Interventoría	
PRESENTÓ	Marlon Gustavo Conde B.	Director de Obra Contratista	
ELABORÓ	Paula Juliana Sánchez Rodríguez	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	

MODIFICACIONES		
FECHA	**VERSIÓN**	**CAMBIO**
Marzo de 2026	V2	Elaboración del documento

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 4
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO 8
4. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL CONTRATO 10
4.1. PERSONAL DEL CONTRATANTE – SED 10
4.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA – CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS DT. 10
5. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO 11
6. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 11
6.1. ATENCIÓN DE QUEJAS, RECLAMOS O SUGERENCIAS: 11
7. PERSONAL DEL PROYECTO 12
8. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 15
9. REGISTRO DE INSPECCIONES PLANEADAS Y PERMISOS DE TRABAJO 15
10. REGISTRÓ ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 15
11. FORMACIÓN DE PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 16
12. GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 17
13. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 17
14. ACTIVIDADES DE ORDEN Y ASEO EN EL PROYECTO 19
15. CONCLUSIONES 19

LISTADO DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Sedes a Intervenir en el Proyecto 7
Tabla 2. Información del contrato. 9
Tabla 3. Personal del Contratante. 10
Tabla 4. Personal del Contratista. 10
Tabla 5. Socialización para el inicio de actividades de Obra. 11

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Pág.

Ilustración 1. Mapa de Ubicación General. 5
Ilustración 2. Mapa de Ubicación Regional 6

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El pasado 28 de marzo de 2025, La Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá D.C. convoca a las empresas interesadas en el proceso de licitación Pública No. SED-LP-OP-DCCEE-012-2025 cuyo objeto fue "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICASPRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Posteriormente, el 29 de abril de 2025, consorcio Obras Educativas DT presenta su propuesta, la cual es seleccionada y adjudicada mediante la resolución 0071 del 05 de agosto de 2025.

Así las cosas, el 03 de septiembre de 2025, se suscribe el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155233-2025, entre la Secretaría de Educación Distrital y el consorcio Obras Educativas DT.

Habiéndose cumplido todos los requisitos de perfeccionamiento del contrato No. CO1.PCCNTR.8155233-2025, el día 14 de octubre de 2025 se dio inicio al mismo, mediante la firma de Acta de Inicio correspondiente.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado de la siguiente manera:

- **País:** Colombia.
- **Departamento:** Cundinamarca
- **Municipio:** Bogotá D.C.
- **Localidades:**
  06 - Tunjuelito
  07 - Bosa
  08 - Kennedy
- **Dirección:** Varias – Ver Tabla No. 1

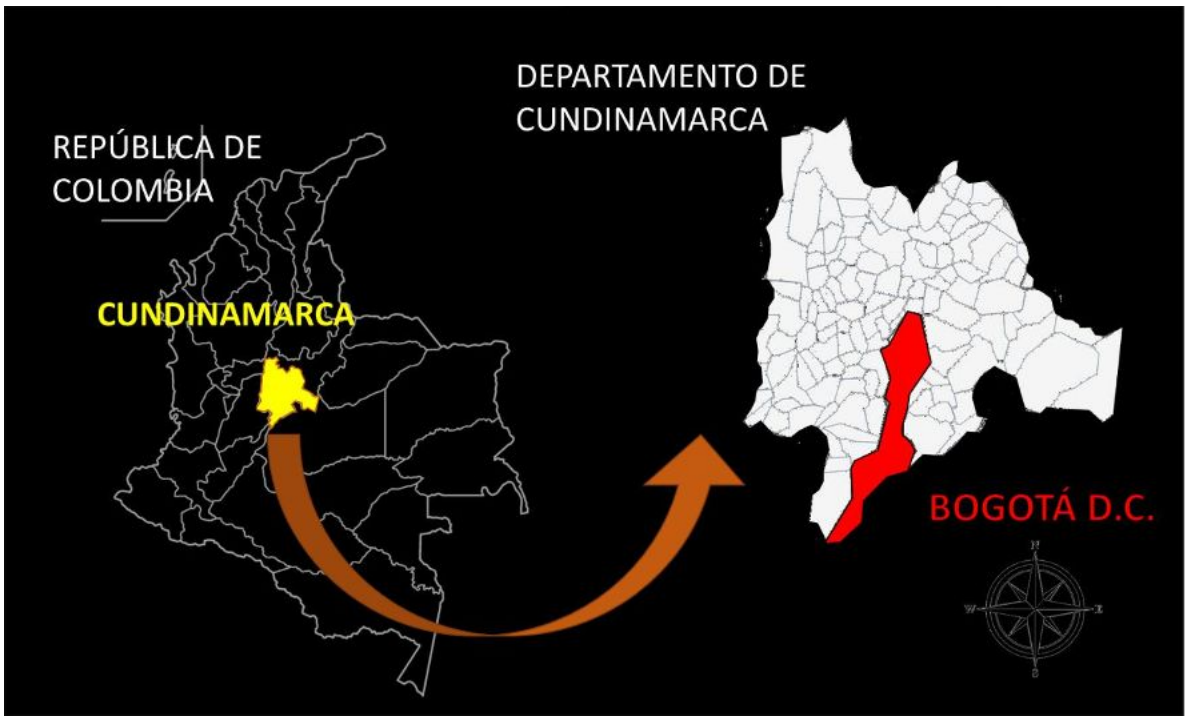


Ilustración 1. *Mapa de Ubicación General.*
Fuente: *https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Palmira%2C_Valle%2C_Colombia_%28ubicaci%C3%B3n%29.PNG*

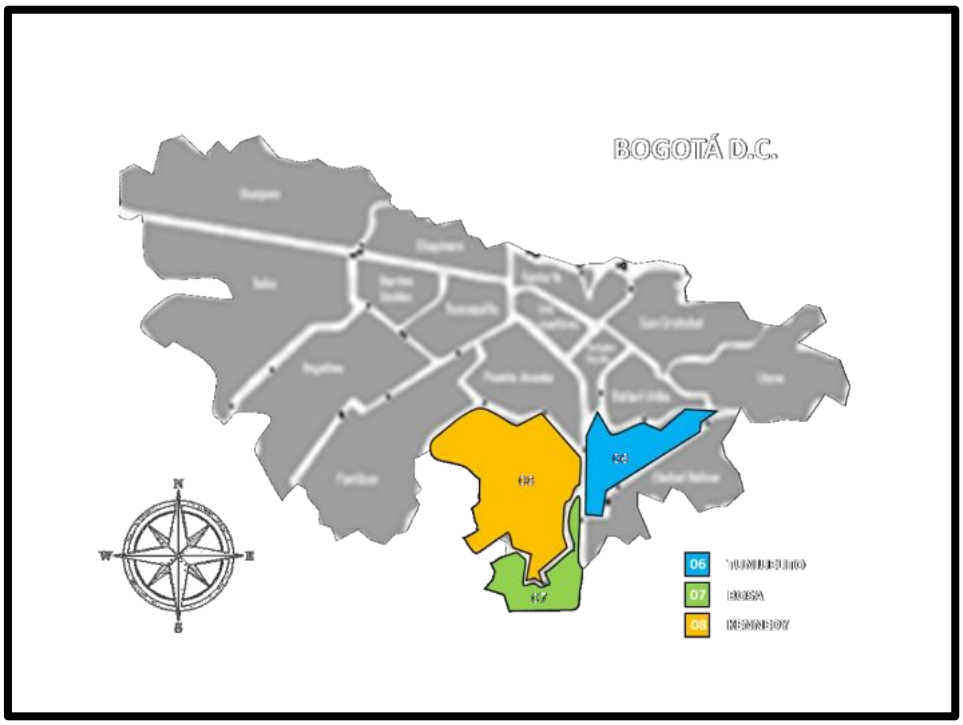


Ilustración 2. *Mapa de Ubicación Regional*
Fuente: *Producción Propia*

Las Instituciones Educativas a cargo de la secretaria de Educación Distrital, en las cuales se estableció se harán obras de mejoramiento a la infraestructura de las mismas, se encuentran distribuidas en las localidades de la ciudad de Bogotá mencionadas líneas arriba; se intervendrán las ocho (08) sedes que componen el proyecto y que son mencionadas a continuación, las cuales cuentan con la siguiente localización y características:

No.	CPF	LOCALIDAD	INSTITUCIÓN EDUCATIVA / COLEGIO / ENTIDAD	SEDE	NOMBRE DE SEDE	DIRECCIÓN	ZONA	COORDENADAS
SEDES CONTACTUALES INICIALES								
1	618	TUNJUELITO	VENECIA	SEDE B	NUEVO MUZÚ	KR 59 # 52 A - 30 SUR. BOGOTÁ D.C.	SUR OCCIDENTE	4°35'10.29"N 74° 8'51.49"O
2	745	BOSA	LEONARDO POSADA PEDRAZA	SEDE A	METROVIVIENDA	KR 92 # 72 - 42 SUR. BOGOTÁ D.C.	SUR OCCIDENTE	4°37'38.30"N 74°12'3.28"O
3	812	KENNEDY	SAN RAFAEL	SEDE B	CATALINA	TV 78 D # 53 - 21 SUR. BOGOTÁ D.C.	SUR OCCIDENTE	4°36'36.98"N 74°10'8.46"O
4	605	TUNJUELITO	MARCO FIDEL SUAREZ	SEDE A	MARCO FIDEL SUAREZ	DG 52 SUR # 25 - 00 / KR 25 # 52 C - 92 SUR. BOGOTÁ D.C.	SUR OCCIDENTE	4°34'41.09"N 74° 8'6.31"O
5	845	KENNEDY	VILLA RICA	SEDE A	VILLA RICA	KR 77 K BIS A # 50 - 26 SUR. BOGOTÁ D.C.	SUR OCCIDENTE	4°36'20.51"N 74°10'1.52"O
6	623	TUNJUELITO	SAN BENITO ABAD	SEDE A	DIANA TURBAY	CL 58 SUR # 19 B - 67. BOGOTÁ D.C.	SUR OCCIDENTE	4°33'58.94"N 74° 8'13.83"O
7	860	KENNEDY	CLASS	SEDE B	CIUDAD ROMA	CL 56 A SUR # 78 A - 20. BOGOTÁ D.C.	SUR OCCIDENTE	4°36'30.08"N 74°10'16.91"O
8	608	TUNJUELITO	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO	SEDE D	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	CL 51 SUR # 36 - 86. BOGOTÁ D.C.	SUR OCCIDENTE	4°35'15.66"N 74° 8'14.82"O

***Tabla 1**. Sedes a Intervenir en el Proyecto*
Fuente: Producción Propia

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO

PROCESO No.	SED-LP-OP-DCCEE-012-2025			
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA			
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No.	0071			
FECHA DE ADJUDICACIÓN	5/08/2025			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8155233-2025			
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	3/09/2025			
LUGAR DE EJECUCIÓN	**No.**	**Institución Educativa**	**Sede**	**Dirección**
	1	CPF 618 I.E.D. VENECIA	SEDE B - NUEVO MUZÚ	KR 59 # 52 A - 30 SUR, LOCALIDAD DE TUNJUELITO, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	2	CPF 745 I.E.D. LEONARDO POSADA PEDRAZA	SEDE A - METROVIVIENDA	KR 92 # 72 - 42 SUR, LOCALIDAD DE BOSA, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	3	CPF 812 I.E.D.SAN RAFAEL	SEDE B - CATALINA	TV 78 D # 53 - 21 SUR, LOCALIDAD DE KENNEDY, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	4	CPF 605 I.E.D. MARCO FIDEL SUAREZ	SEDE A - MARCO FIDEL SUAREZ	DG 52 SUR # 25 - 00 - KR 25 # 52 C - 92 SUR, LOCALIDAD DE TUNJUELITO, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	5	CPF 845 I.E.D. VILLA RICA	SEDE A - VILLA RICA	KR 77 K BIS A # 50 - 26 SUR, LOCALIDAD DE KENNEDY, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	6	CPF 623 I.E.D.SAN BENITO ABAD	SEDE A - DIANA TURBAY	CL 58 SUR # 19 B - 67, LOCALIDAD DE TUNJUELITO, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	7	CPF 860 I.E.D.CLASS	SEDE B - CIUDAD ROMA	CL 56 A SUR # 78 A - 20, LOCALIDAD DE KENNEDY, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	8	CPF 608 I.E.D. INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO	SEDE D - NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	CL 51 SUR # 36 - 86, LOCALIDAD DE TUNJUELITO, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - GRUPO 9			
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.426.857.240,00			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN LETRAS	DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SITE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS			
VALOR ADICIÓN No. 1	$ 0,00			
FECHA ADICIÓN No. 1	A LA FECHA NO SE REGISTRAN ADICIONES AL CONTRATO			
VALOR ADICIÓN No. 1 EN LETRAS	A LA FECHA NO SE REGISTRAN ADICIONES AL CONTRATO			
VALOR ADICIÓN No. 2	$ 0,00			
FECHA ADICIÓN No. 2	N.A.			

VALOR ADICIÓN No. 2 EN LETRAS	N.A.			
VALOR TOTAL ADICIONES	$ 0,00			
VALOR ADICIONES EN LETRAS	A LA FECHA NO SE REGISTRAN ADICIONES AL CONTRATO			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 2.426.857.240,00			
VALOR FINAL DEL CONTRATO EN LETRAS	DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SITE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS			
FECHA DE INICIO	14/10/2025			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	**EN DÍAS**	212	**EN MESES**	7
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	13/05/2026			
FECHA PRÓRROGA No. 1	N.A			
PLAZO PRÓRROGA No. 1	**EN DÍAS**		**EN MESES**	
FECHA PRÓRROGA No. 2	N.A			
PLAZO PRÓRROGA No. 2	**EN DÍAS**		**EN MESES**	
FECHA PRÓRROGA No. 3	N.A			
PLAZO PRÓRROGA No. 3	**EN DÍAS**		**EN MESES**	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	**EN DÍAS**	212	**EN MESES**	7
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	13/05/2026			
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL			
N.I.T.	899.999.061 – 9			
ORDENADOR DEL GASTO	ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	16.070.546	MANIZALES, CALDAS.	
CARGO	DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SED			
SUPERVISOR DE CONTRATO	ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO			
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. OSCAR JULIAN TELLEZ QUITIAN			
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO No. 66-63. BOGOTÁ D.C.			
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS DT			
N.I.T.	901.973.776 – 1			
CONSORCIADO No. 1	DOMO ACUSTICA S.A.S.		PORCENTAJE PARTICIPACIÓN	10,00%
N.I.T.	900.499.791 – 4			
CONSORCIADO No. 2	GRUPO TITANIUM S.A.S.		PORCENTAJE PARTICIPACIÓN	90,00%
N.I.T.	900.749.719 – 7			
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	1.019.007.501	BOGOTÁ D.C.	
DIRECCIÓN	CARRERA 55 No. 152B - 68. OFICINA 1503. BOGOTÁ D.C.			
TELÉFONO	(57 - 60 - 1) 718 94 31			
CORREO ELECTRÓNICO	obraseducativasdt.2025@gmail.com			
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S.			
N.I.T.	829.000.956-3			
CONTRATO No.	CO1. PCCNTR.8169111-2025			
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	MIRIAM LUZ GUTIÉRREZ CORREA			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	46.644.261		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRRECTIVO DE LAS PALANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS Y PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE No 3			
DIRECCIÓN	SUBA			

TELÉFONO	3102009455
CORREO ELECTRÓNICO	lote3uniobras@gmail.com

Tabla 2. *Información del contrato.*
Fuente: *Producción Propia.*

4. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL CONTRATO

El proyecto cuenta con el siguiente personal asignado por el Contratante y el Contratista:

4.1. PERSONAL DEL CONTRATANTE – SED

PERSONAL AUTORIZADO POR SED	
NOMBRE	**CARGO**
ING. OSCAR JULIAN TELLEZ QUITIAN	APOYO A LA SUPERVISION

Tabla 3. *Personal del Contratante.*
Fuente: *Producción Propia.*

4.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA – CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS DT.

PERSONAL AUTORIZADO POR CONTRATISTA DE OBRA	
CARGO	**NOMBRE**
Representante Legal	Carlos Andrés Salazar Tobón
Director de Obra	Marlon Gustavo Conde Benavides
Residente de Obra	Javier Sebastián Guzmán Munar
Especialista Estructural	Walber Alex Salazar Hernández
Especialista Ambiental	Ingrid Johanna Salcedo Sierra
Especialista en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos	Jorge Orlando Salazar Saldarriaga
Especialista en Redes Hidrosanitarias, de Gas y Red Contraincendios	Ángela Isabel Ríos Fresneda
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Paula Juliana Sánchez Rodríguez
Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	Nelson Rodrigo Saavedra Nieto
Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo 1	Adriana Isabel Herrera Ortiz
Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo 2	Judy Yineth Ruiz Cubillos
Inspector de Obra 1	Nicolás Santiago Vergara Alfonso
Inspector de Obra 2	Santiago Rueda Caro

Tabla 4. *Personal del Contratista.*
Fuente: *Producción Propia.*

5. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO

El día 22 de octubre de 2025, se realizó la caracterización del proyecto mediante el levantamiento de las actas de vecindad de las ocho (8) instituciones que contractualmente hacen parte del alcance; dichas actas se anexan al presente informe.

6. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

6.1. ATENCIÓN DE QUEJAS, RECLAMOS O SUGERENCIAS:

A la fecha del presente informe, no se ha recibido activado ningún mecanismo de atención a la comunidad (PQRS).

Sin embargo, se realizó la socialización con los rectores y personal administrativo de las diferentes instituciones educativas. Se anexan al presente informe.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
CPF 618 I.E.D. VENECIA, SEDE B - NUEVO MUZÚ	24/12/2025
CPF 745 I.E.D. LEONARDO POSADA PEDRAZA, SEDE A - METROVIVIENDA	11/12/2025
CPF 812 I.E.D.SAN RAFAEL, SEDE B - CATALINA	24/12/2025
CPF 605 I.E.D. MARCO FIDEL SUAREZ, SEDE A - MARCO FIDEL SUAREZ	13/11/2025
CPF 845 I.E.D. VILLA RICA, SEDE A - VILLA RICA	27/11/2025
CPF 623 I.E.D.SAN BENITO ABAD, SEDE A - DIANA TURBAY	12/11/2025
CPF 860 I.E.D.CLASS, SEDE B - CIUDAD ROMA	20/11/2025
CPF 608 I.E.D. INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO, SEDE D - NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	12/11/2025

Tabla 5. *Socialización para el inicio de actividades de Obra.*
Fuente: *Producción Propia.*

7. PERSONAL DEL PROYECTO

Durante el periodo comprendido entre el **14 de febrero de 2026 y 13 de marzo de 2026**, el proyecto contó con el personal requerido para la ejecución de las actividades programadas.

DETALLE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO	Nº IDENTIFICACION	CARGO	CONTRATISTA	FRENTE DE OBRA
Javier Sebastián Guzmán Munar	1.014.266.805	Residente de Obra	Consorcio Obras Educativas DT	Marco Fidel Suarez – Piloto sede D
Aura Dayana Espinel Mora	52.964.201	Inspectora SST	Consorcio Obras Educativas DT	Marco Fidel Suarez – Piloto sede D – Nuevo Muzú
Nelson Leonardo Ramírez Chiguazuque	79.977.653	Oficial	Group Integral Pro	Marco Fidel Suarez – Villa Rica
Kevin Daniel Ramírez Páez	1.010.174.421	Ayudante	Group Integral Pro	Marco Fidel Suarez
Cristian David Ramírez Páez	1.011.200.779	Ayudante	Group Integral Pro	Marco Fidel Suarez
Wilmar Ramírez Chocontá	1.010.165.365	Oficial	Group Integral Pro	Marco Fidel Suarez
Juan Carlos Trujillo Herrera	93.129.093	Oficial	COBE	San Rafael
Brayan Alejandro Toro Rodríguez	1.030.647.473	Oficial	COBE	Class Sede B
Jhon Alejandro Salgado Santana	1.007.296.319	Oficial	COBE	Class Sede B
Jorge Eliecer Figueroa Ramírez	1.002.323.053	Ayudante	COBE	Class sede B
Duban Stiven Ramírez Arciniegas	1.001.202.640	Ayudante	COBE	San Rafael
Juan Pablo Machado Peña	1.000.136.741	Ayudante	COBE	San Rafael
Edwin Alberto Machado Peña	1.000.136.733	Oficial	COBE	Class Sede B
Albert Enrrique Yanes Hernández	6.524.974	Oficial	COBE	San Rafael
Jairo Alberto Arteaga Barrera	80.037.620	Ingeniero de Apoyo	COBE	Class Sede B – San Rafael
Laura Camila Mier Albadán	1.030.695.974	SST	COBE	Class Sede B – San Rafael

Cristhian Joseph Conde Benavides	1.091.677.393	Contratista	COBE	Class Sede B – San Rafael
Brayan Camilo Rayo Ardila	1.072.717.848	Inspector de Obra	Consorcio Obras Educativas DT	Nuevo Muzú – Leonardo Posada – Villa Rica
Paula Juliana Sánchez Rodríguez	1.110.570.333	Residente SST	Consorcio Obras Educativas DT	Leonardo Posada – Villa Rica
Édison Albeiro Torres Salcedo	1.110.454.803	Maestro	Group Integral Pro	Nuevo Muzú – Leonardo Posada
Marcos Adalber Galvis Cardozo	1.032.386.686	Oficial	Group Integral Pro	Nuevo Muzú
Daniel Alejandro Beltrán Rodríguez	1.010.840.328	Ayudante	Group Integral Pro	Nuevo Muzú – Leonardo Posada
Brandon Stiven Rativa Betancur	1.073.679.830	Ayudante	Group Integral Pro	Nuevo Muzú
Cesar Augusto Alcala Metty	6.811.968	Eléctrico	Energiza	Nuevo Muzú
Mauricio Bermudez Romero	79.510.176	Eléctrico	Energiza	Nuevo Muzú
Pablo Enrique Huérfano	2.996.024	Maestro	Group Integral Pro	Piloto sede D
Edwin Andrés Huérfano Criollo	1.012.406.005	Ayudante	Group Integral Pro	Piloto sede D
Luis Felipe Rincón Narváez	1.023.039.411	Ayudante	Group Integral Pro	Piloto sede D
Gerson Arbey Velazco Castro	93.383.437	Oficial	Group Integral Pro	Leonardo Posada

Nota: Para el periodo evaluado comprendido entre el **14 de febrero de 2026 y el 13 de marzo de 2026, s**e anexan las planillas de seguridad social correspondientes al mes de febrero, en cumplimiento de la obligación de reporte y pago

INGRESO DE PERSONAL

Durante el periodo evaluado **se registró el ingreso de personal operativo** al proyecto, vinculado por el **Consorcio Obras Educativas DT** y por los diferentes subcontratistas, con el fin de atender las necesidades de ejecución en los distintos frentes de obra.

El personal ingresado cumplió con el proceso de vinculación establecido, incluyendo el registro de ingreso, la verificación de afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social, la inducción en Seguridad

y Salud en el Trabajo y la socialización de los riesgos asociados a las labores a desempeñar, previo al inicio de actividades.

A continuación, se presenta el detalle del personal ingresado durante el periodo:

NOMBRE Y APELLIDO	Nº IDENTIFICACION	CARGO	CONTRATISTA	FECHA DE INGRESO	FRENTE DE OBRA
Kevin Daniel Ramírez Páez	1.010.174.421	Ayudante	Group Integral Pro	18/02/2026	Marco Fidel Suarez
Cristian David Ramírez Páez	1.011.200.779	Ayudante	Group Integral Pro	18/02/2026	Marco Fidel Suarez
Wilmar Ramírez Chocontá	1.010.165.365	Oficial	Group Integral Pro	18/02/2026	Marco Fidel Suarez
Daniel Alejandro Beltrán Rodríguez	1.010.840.328	Ayudante	Group Integral Pro	04/03/2026	Leonardo Posada - Nuevo Muzú
Brandon Stiven Rativa Betancur	1.073.679.830	Ayudante	Group Integral Pro	17/02/2026	Nuevo Muzú
Cesar Augusto Alcala Metty	6.811.968	Eléctrico	Energiza	26/02/2026	Nuevo Muzú
Mauricio Bermudez Romero	79.510.176	Eléctrico	Energiza	02/03/2026	Nuevo Muzú
Gerson Arbey Velazco Castro	93.383.437	Oficial	Group Integral Pro	04/03/2026	Leonardo Posada

RETIRO DE PERSONAL

Durante el periodo evaluado **se presentó el retiro de personal**, conforme a la información reportada por los subcontratistas vinculados al proyecto, efectuándose la respectiva actualización de los registros de control de personal.

NOMBRE Y APELLIDO	Nº IDENTIFICACION	CARGO	CONTRATISTA	FECHA DE RETIRO	FRENTE DE OBRA
Eduar Estiven Hernández Orjuela	1.105.690.752	Ayudante	COBE	06/03/2026	Class sede B – San Rafael
Duván Rodríguez Rodríguez	1.000.992.579	Ayudante	COBE	16/02/2026	Class sede B – San Rafael
Argemiro Ramos Acero	1.106.738.994	Ayudante	Group Integral Pro	14/02/2026	Nuevo Muzú
Brandon Stiven Rativa Betancur	1.073.679.830	Ayudante	Group Integral Pro	23/02/2026	Nuevo Muzú
Pablo Enrique Huérfano	2.996.024	Maestro	Group Integral Pro	09/03/2026	Piloto sede D
Edwin Andrés Huérfano Criollo	1.012.406.005	Ayudante	Group Integral Pro	09/03/2026	Piloto sede D

Luis Felipe Rincón Narváez	1.023.039.411	Ayudante	Group Integral Pro	23/02/2026	Piloto sede D
José Raúl Niño Vargas	79.604.703	Maestro	Group Integral Pro	14/02/2026	Leonardo Posada
Luis Fernando Cruz Rodríguez	1.023.943.690	Ayudante	Group Integral Pro	14/02/2026	Leonardo Posada
Darley Alberto Moná Vega	79.899.187	Oficial	Group Integral Pro	14/02/2026	Leonardo Posada
Misael Niño Rojas	3.072.054	Oficial	Group Integral Pro	14/02/2026	Leonardo Posada

MEDICINA PREVENTIVA LABORAL

AUSENTISMO EN EL PROYECTO

Para el periodo comprendido entre el **14 de febrero de 2026 al 13 de marzo de 2026**, no se registraron ausentismos por causas médicas ni por accidentes de trabajo (AT).

NOMBRE Y APELLIDO	CONTRATISTA	FECHA INICIO INCAPACIDAD	FECHA FIN DE INCAPACIDAD	DIAS DE INCAPACIDAD	DIAGNOSTICO

ACCIDENTALIDAD DEL PROYECTO

Durante la vigencia del periodo comprendido entre el **14 de febrero de 2026 al 13 de marzo de 2026**, no se presentaron accidentes de trabajo en ninguno de los frentes de obra en ejecución.

INDICE MENSUAL	INDICE FRECUENCIA	INDICE SEVERIDAD	INDICE LESIONES INCAPACITANTES

CONSOLIDADO DE INDICADORES

Durante el periodo evaluado, y de acuerdo con los registros disponibles, los indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo presentan un resultado de **cero (0)**, debido a que no se registraron accidentes de trabajo, enfermedades laborales ni ausentismo por causa médica en los frentes de obra en ejecución.

INDICADOR	FORMULA	RESULTADO
Frecuencia de Accidentalidad	(# Accidentes de trabajo en el periodo / # de trabajadores promedio en el periodo) * 100	0
Severidad de Accidentalidad	(# de días de incapacidad por AT en el periodo / # de trabajadores promedio en el periodo) * 100	0

Incidencia de Enfermedad Laboral	(# de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo / promedio de trabajadores en el periodo) * 100.000	0
Ausentismo por causa medica	(# de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / # de días trabajados programados en el mes) * 100	0

AGENDA DE SEGURIDAD

Durante la vigencia del periodo comprendido entre el **14 de febrero de 2026 al 13 de marzo de 2026**, se desarrollaron actividades de promoción y prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo, orientadas a la identificación, control y mitigación de los riesgos presentes en los diferentes frentes de obra, así como al fortalecimiento de la cultura de autocuidado y cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Dentro de las principales actividades ejecutadas se destacan:

- **Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo,** orientadas en la prevención de accidentes, el autocuidado, el uso adecuado de elementos de protección personal y el cumplimiento de los procedimientos seguros de trabajo.
- **Inducción en SST al personal vinculado durante el periodo,** garantizando la socialización de normas de seguridad, riesgos asociados a las actividades, las medidas preventivas y lineamientos generales del SG-SST antes del inicio de labores.
- **Inspecciones de seguridad** en los frentes de obra, con el fin de verificar condiciones locativas, orden y aseo, señalización, uso de EPP y cumplimiento de las medidas de control establecidas, generando las recomendaciones correspondientes.
- **Entrega y verificación del uso de Elementos de Protección Personal (EPP),** asegurando que el personal cuente con los elementos adecuados de acuerdo con su labor y que estos sean utilizados de manera correcta durante la jornada de trabajo.

Estas actividades se desarrollaron de manera continua y articulada, permitiendo mantener el control de los riesgos, mejorar las condiciones de trabajo y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el SG-SST del proyecto.

8. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el periodo evaluado, **CONSORCIO OBRAS EDUCATVAS DT** realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los subcontratistas,

confirmando que contaran con personal calificado para la ejecución de las actividades programadas bajo parámetros de seguridad.

Así mismo, el área de SST efectuó seguimiento en los diferentes frentes de obra al cumplimiento de las medidas preventivas establecidas, tales como permisos de trabajo, señalización, capacitaciones y pausas activas, así como a la correcta aplicación de las medidas de protección colectiva e individual, incluyendo el uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP).

9. REGISTRO DE INSPECCIONES PLANEADAS Y PERMISOS DE TRABAJO

En relación con los riesgos asociados a la seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de las actividades del proyecto, se realizaron **inspecciones planeadas de seguridad** y verificación de permisos de trabajo en los diferentes frentes de obra, con el fin de identificar condiciones subestándares y garantizar el cumplimiento de las medidas de control establecidas.

INSPECCIÓN	MES DE EJECUCIÓN	CANTIDAD	FRENTE DE OBRA
Inspección de camilla	Marzo	1	Class sede B
Inspección de herramientas	Marzo	1	Class sede B
Inspección EPP	Marzo	1	Class sede B
Inspección ambiental	Marzo	1	Class sede B
Inspección ambiental	Marzo	1	San Rafael
Inspección herramientas	Marzo	1	San Rafael
Inspección EPP	Marzo	1	San Rafael
Inspección de camilla	Febrero	1	San Rafael
Inspección de extintor	Marzo	1	San Rafael
Inspección pulidora	Febrero	2	Marco Fidel
Inspección herramientas	Febrero	1	Marco Fidel
	Marzo	1	Marco Fidel
Inspección pulidora	Febrero	1	Nuevo Muzú
	Marzo	1	Nuevo Muzú
Inspección de herramientas	Marzo	1	Villa Rica
Inspección de pulidora	Febrero	1	Piloto sede D
	Marzo	1	Piloto sede D
Inspección de EPP	Febrero	1	Leonardo Posada
Inspección de herramientas	Marzo	1	Leonardo Posada
Inspección Locativa	Febrero	1	Leonardo Posada
Inspección de pulidora	Febrero	1	Leonardo Posada

10. REGISTRÓ ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Durante el periodo evaluado se desarrollaron actividades propias del alcance del proyecto en los diferentes frentes de obra, las cuales fueron ejecutadas bajo los lineamientos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando la aplicación de las medidas preventivas y de protección correspondientes.

FRENTE DE OBRA	MES DE EJECUCIÓN	CANTIDAD ATS
Class sede B	Febrero	3
	Marzo	2
Marco Fidel	Febrero	2
	Marzo	2
Nuevo Muzú	Febrero	2
	Marzo	2
San Rafael	Febrero	2
	Marzo	2
Villa Rica	Marzo	1
Piloto sede D	Febrero	2
	Marzo	1
Leonardo Posada	Febrero	2
	Marzo	2

11. FORMACIÓN DE PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Con el objetivo de informar y concientizar a los trabajadores sobre su propia Seguridad y Salud en el trabajo, se comprende realizar charlas que logren fortalecer el compromiso en materia de SST, considerando como instancia de participación de todas las partes del proyecto. Se relaciona los temas que se trataron en los frentes de obra en la siguiente tabla.

FECHA	TEMA	FRENTE DE OBRA
17/02/2026	Riesgos locativos	Class sede B
20/02/2026	Puntos de encuentro	Class sede B
23/02/2026	Uso correcto de EPP	Class sede B
27/02/2026	Cerramiento en la obra	Class sede B
04/03/2026	Brigadas de emergencia	Class sede B
06/03/2026	Posturas inadecuadas	Class sede B
09/03/2026	Movimientos repetitivos	Class sede B
14/03/2026	Manejo de herramientas	Class sede B
19/02/2026	Como actuar en caso de accidente de trabajo	Marco Fidel
25/02/2026	Respeto hacia compañeros	Marco Fidel

02/03/2026	Inspección de equipos y herramientas	Marco Fidel
09/03/2026	Pausas activas para iniciar actividades	Marco Fidel
10/03/2026	Cuidado de las manos	Marco Fidel
19/02/2026	Cuidado de las manos	Nuevo Muzú
28/02/2026	Uso adecuado de las herramientas	Nuevo Muzú
14/03/2026	Como actuar en caso de accidente laboral	Nuevo Muzú
18/02/2026	Puntos de encuentro	San Rafael
19/02/2026	Riesgos locativos	San Rafael
27/02/2026	Cerramiento en obra	San Rafael
29/02/2026	Uso correcto de EPP	San Rafael
02/03/2026	Normativa en SST para obra	San Rafael
04/03/2026	Brigadas de emergencia	San Rafael
12/03/2026	Posturas prolongadas	San Rafael
14/03/2026	Movimientos repetitivos	San Rafael
09/03/2026	Riesgo mecánico	Villa Rica
10/03/2026	Riesgo biológico – riesgo biomecánico, medidas preventivas	Villa Rica
23/02/2026	Uso adecuado de herramientas	Piloto sede D
03/03/2026	Pausas activas antes de iniciar actividades	Piloto sede D
16/02/2026	Riesgo biomecánico – movimientos repetitivos	Leonardo Posada
18/02/2026	Uso obligatorio de protectores auditivos	Leonardo Posada
23/02/2026	Autocuidado	Leonardo Posada
25/02/2026	Levantamiento manual de cargas	Leonardo Posada
02/03/2026	Uso adecuado y medidas preventivas equipos eléctricos	Leonardo Posada
04/03/2026	Inducción en seguridad y salud en el trabajo	Leonardo Posada
09/03/2026	Uso obligatorio de elementos de protección personal	Leonardo Posada
11/03/2026	Reporte de actos y condiciones inseguras	Leonardo Posada

Fotografía: Charla de seguridad y entrega de dotación

12. GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS



Durante el periodo evaluado se realizó la **conformación de Brigadas de Emergencia e**n los diferentes frentes de obra del proyecto, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La conformación de las brigadas se formalizó mediante **actas de reunión por cada institución educativa,** las cuales se anexan al presente informe.

Así mismo, se efectuó la verificación de la disponibilidad y estado de los **elementos de atención de emergencias, t**ales como camilla, botiquín de primeros auxilios y extintores, conforme a las condiciones y necesidades de cada frente de obra.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

		
SAN RAFAEL	**NUEVO MUZÚ**	

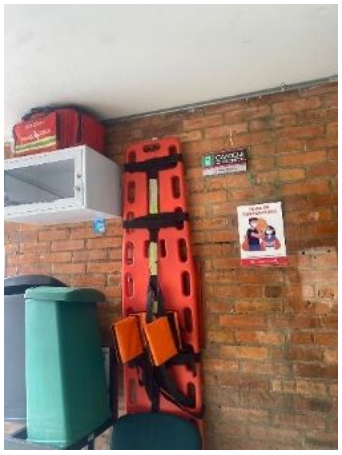		
MARCO FIDEL		
		
CLASS	**LEONARDO POSADA**	

REGISTRO FOTOGRAFICO SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTO DE OBRA

	INICIO DE OBRA	27 feb 2026 10:52:10 a. m. 52C-88 Carrera 25 Tunjuelito Bogotá
		USO OBLIGATORIO DE E.P.P.
	ACOPIO TEMPORAL DE MATERIALES	

VIGÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Durante el periodo evaluado se llevó a cabo la reunión del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normatividad vigente aplicable. La actividad fue formalizada mediante la respectiva acta de reunión, en el cual se registraron temas tratados y las acciones definidas para el seguimiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El acta correspondiente se anexa en el presente informe como soporte documental.

Así mismo, durante el periodo evaluado se realizó la primera reunión del Comité de Convivencia Laboral, previamente conformado, en la cual se socializaron sus funciones, responsabilidades y la normativa aplicable, así como los lineamientos para la promoción de ambientes laborales sanos y el adecuado manejo de situaciones relacionadas con la convivencia.

La reunión fue formalizada mediante la respectiva acta, la cual se anexa en el presente informe como soporte documental.

PROGAMA DE MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN Y EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN

Con el fin de garantizar la adecuada gestión de los residuos de construcción, demolición y excedentes de excavación generados por las actividades del proyecto, durante el periodo comprendido entre el **14 de febrero de 2026 y el 13 de marzo de 2026** se implementaron acciones orientadas al manejo, almacenamiento temporal, transporte y disposición final de los RCD, procurando mantener las áreas de trabajo en condiciones adecuadas y prevenir, minimizar y controlar los impactos ambientales asociados.





Fotografías: Transporte RCD

14. ACTIVIDADES DE ORDEN Y ASEO EN EL PROYECTO

En los diferentes frentes de obra se llevaron a cabo actividades permanentes de orden y aseo, orientadas al mantenimiento de condiciones adecuadas del entorno de trabajo durante la ejecución de los procesos constructivos, contribuyendo a la seguridad, organización y limpieza de las áreas laborales.

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

	
Fotografía: Orden y aseo	

15. CONCLUSIONES

- Durante el periodo comprendido entre el **14 de febrero de 2025 y el 13 de marzo de 2026**, el proyecto dio cumplimiento a las actividades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrollando acciones de promoción, prevención y control orientadas a la protección de la integridad y salud de los trabajadores.
- Las actividades de inducción, capacitación, inspecciones de seguridad, entrega y verificación de uso de Elementos de Protección Personal y seguimiento a las condiciones de trabajo permitieron mantener un control adecuado de los riesgos identificados en los frentes de obra, fortaleciendo la cultura de autocuidado y el cumplimiento de los procedimientos de seguridad.
- Durante el periodo evaluado no se registraron accidentes de trabajo ni enfermedades laborales, lo cual evidencia la efectividad de las medidas preventivas implementadas y el compromiso del personal y los subcontratistas con la aplicación del SG-SST.
- El proyecto cuenta con los registros, actas y soportes documentales que evidencian el desarrollo de las actividades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales se anexan al presente informe para verificación y seguimiento por parte de la interventoría.
- Se continuará con la ejecución y fortalecimiento de las acciones establecidas en el SG-SST, manteniendo el seguimiento permanente a las condiciones de trabajo, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales durante la ejecución del proyecto.

CLASS SEDE B

BASE DE DATOS PERSONAL

CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS EDT	FORMATO DE PERSONAL ACTUALIZADO										
CENTRO DE TRABAJO	CLASS - SEDE B PERSONAL DE OBRA										
ITEM	CEDULA	NOMBRE	APELLIDOS	CARGO	EPS	ARL	AFP	INGRESO	SALIDA	FECHA EXAMEN MEDICO	FECHA CURSO DE ALTURAS
1	1105690752	EDUAR ESTIVEN	HERNANDEZ ORJUELA	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	02/12/2025	6/03/2026	02/12/2025	
2	1.000.992.579	DUVAN	RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	05/12/2025	16/02/2026	05/12/2025	
3	1.030.647.473	BRAYAN ALEJANDRO	TORO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	FAMISANAR	SURA	PORVENIR	10/12/2025		10/12/2025	10/01/2026
4	1.002.323.053	JORGE ELIECER	FIGUEROA RAMIREZ	AYUDANTE AVANZADO	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	18/02/2026		18//02/2026	
5	1007296319	JHON ALEJANDRO	SALGADO SANTANA	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	05/12/2025		05/12/2025	
6	1.000.136.733	EDWIN ALBERTO	MACHADO PEÑA	OFICIAL DE OBRA	COMPENSAR	SURA	COLPENSIONES	15/12/2025		15/12/2025	
		PERSONAL ADMINISTRATIVO									
1	80.037.620	JAIRO ALBERTO	ARTEAGA BARRERA	ING DE APOYO	FAMISANAR	SURA	COLSUBSIDIO	18/12/2025		18/12/2025	
2	1.030.695.974	LAURA CAMILA	MIER ALBADÁN	SST	COMPENSAR	SURA	PROTECCIÓN	08/01/2025		08/01/2025	10/01/2026
3	1.091.677.393	CRISTHIAN JOSEPH	CONDE BENAVIDES	INGENIERO RESIDENTE	SANITAS	SURA	PORVENIR	2/12/2025		2/12/2025	

DOCUMENTACIÓN INGRESO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.002.323.053**

FIGUEROA RAMIREZ

APELLIDOS

JORGE ELIECER

NOMBRES

Jorge Eliecer Figueroa R

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-JUN-1993**

MARIA LA BAJA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-SEP-2011 MARIA LA BAJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0504000-00344684-M-1002323053-20111110 **0028**412075A 1 37451095

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4016287936	0|6|0|2|2|0|2|6

I. DATOS DEL TRÁMITE **(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)**

1.tipo de tramite
A. Afiliación ☐ **B.**Reporte de Novedades ☒

2.Tipo afiliacion
A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐
B. Colectiva ☐ **C.** Institucional ☐ **D.** De oficio ☐

3.Regimen
A.Contributivo ☒ **B.**Subsidiado ☐

4.Contribución Solidaria
Si ☐ No ☒

5. Tipo de afiliado
A. Cotizante ☒ **B.** Cabeza de Familia ☐ **C.** Beneficiario ☐ **D.** Afiliado adicional ☐

6. Tipo de cotizante
A. Dependiente ☒ **B.** Independiente ☐ **C.** Pensionado ☐

7.Codigo (a registrar por la EPS) 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante , cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8.Apellidos y nombres			
FIGUEROA Primer apellido	RAMIREZ Segundo apellido	JORGE Primer nombre	ELIECER Segundo nombre

9.Tipo documento de Identidad	10.Número del documento de Identidad	11.Sexo biológico	12.Sexo identificación
CC	1002323053	Femenino ☐ Masculino ☒	F ☐ M ☒ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual

13. Nacionalidad	14.Lugar Nacimiento					15.Fecha Nacimiento
	Pais:	Departamento:	Municipio:			
COLOMBIA	COLOMBIA	BOGOTA	BOGOTA			1|1|0|6|1|9|9|3

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

16.Etnia	17.Comunidad	18.Discapacidad	Si ☐ No ☒
6		Categoria Discapacidad	

19.Tiene encuesta SISBEN	20.Clasificación SISBEN		21.Grupo población especial
SI ☐ NO ☒	Nivel	Grupo	

22. Administradora de riesgos Laborales - ARL	23. Administradora de Pensiones	24. Ingreso base de cotizacion - IBC	25. Tarifa Contribución Solidaria
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	HORIZONTE SAF	1750905	

26.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
CR 90B 54 11		3508690420	JORGEFIGUEROA1638@GMAIL.COM

Departamento	Municipio/Distrito	Localidad / comuna	zona
BOGOTA	BOGOTA		Urbana cabecera municipal ☒ Rural dispersa ☐ Urbana centro poblado ☐ Resto rural ☐

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

27. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

28. Tipo documento de identidad	29. Número documento identidad	30. Sexo biológico	31. Sexo identificación
		Femenino ☐ Masculino ☐	F ☐ M ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual

32. Nacionalidad	33.Lugar Nacimiento			34.Fecha Nacimiento
	Pais:	Departamento:	Municipio:	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

35. Apellidos y nombres				
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	36. Tipo documento de identidad	37. Número de identidad	38. Nacionalidad	39.Sexo Biológico		40.Sexo Identificación						41.Lugar Nacimiento			42.Fecha de nacimiento
				Femenino	Masculino	F	M	T	NB	otro	cual	Pais	Departamento	Municipio	
B1															
B2															
B3															
B4															
B5															

Datos complementarios del Beneficiario

	43.Parentesco	44.Etnia	45.Comunidad	46.Grupo poblacional especial	47.Encuesta SISBEN		48.Clasificación SISBEN		49.Discapacidad			50.Incapacidad Permanente	
					Si	No	Nivel	Grupo	Si	No	Categoria	Si	No
B1													
B2													
B3													
B4													
B5													

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio/Distrito	Zona				Teléfono Fijo y/o celular	52.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
			Cabecera municipal	Centro poblado	Rural dispersa	Resto rural		
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	Dirección	Localidad/Comuna	Correo Electrónico
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

Seleccion de la IPS Primaria

	53. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS		54.Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C		VS OLAYA - UOD DENTOLASER OLAYA	VSOLAYA - DENTOOLAYA
B		-	-
B		-	-
B		-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA O RESPONSABLES DE PAGO

55. Nombre o razón social	56. Tipo de identificación	57. Numero de documento de Identificación	58. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
COBE CONSTRUCTORES S A S	NIT	901190795	01

59.Ubicación

Dirección	Teléfono fijo o celular	Correo electrónico	Departamento	Municipio/distrito
CR 16 4 03	6017552	COBECONSTRUCTOTOSAS@GMAIL.COM	CESAR	SAN MARTIN

No de Radicacion
4016287936

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. Tipo de Novedad

- ☐ **1.** Modificación datos básicos de identificación
- ☐ **2.** Corrección datos básicos de identificación
- ☐ **3.** Actualización documento de identidad
- ☐ **4.** Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ **5.** Terminación de la inscripcion en la EPS. Código: ☐
- ☐ **6.** Reporte de pago a través de un tercero; Código: ☐
- ☐ **7.** Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ **8.** Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ **9.** Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ **10.** Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ **11.** Inscripción EPS retorno al país.
- ☐ **12.** Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **13.** Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **14.** Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ **15.** Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ **16.** Reporte de fallecimiento del cotizante o cabeza de familia
- ☐ **17.** Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ **18.** Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ **19.** Reporte de la calidad del pensionado
- ☐ **20.** Ingreso a contribución solidaria
- ☐ **21.** Retiro de contribución solidaria

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	62. Sexo biológico	63. Sexo identificación	64. Fecha de nacimiento
☐		Femenino ☐ Masculino ☐	F ☐ M ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual	

65. EPS anterior	66. Fecha de Novedad	67. Motivo de traslado Código:	68. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones
	0|5|0|2|2|0|2|6	☐	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- **69.** ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- **70.** ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- **71.** ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- **72.** ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- **73.** ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- **74.** ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- **75.** ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- **76.** ☐ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto
- **77.** ☐ Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes
- **78.** ☐ Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según encuesta del Sisbén vigente

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Apellidos y nombres

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad
☐	

IX. FIRMAS

80. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	81. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio
Jorge Figueroa	claudia Trujillo

X. ANEXOS

- ☐ **82.** Anexo Copia del documento de identidad: **CN.** ☐ **RC.** ☐ **TI.** ☐ **CC.** ☐ **PA.** ☐ **CE.** ☐ **CD.** ☐ **SC.** ☐ **PT.** ☐

  Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0

- ☐ **83.** Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ **84.** Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ **85.** Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ **86.** Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ **87.** Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ **88.** Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ **89.** Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ **90.** Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ **91.** Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial		93. Nombre de la Institución
Código del municipio	Código del Departamento	
☐	☐	

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y Nombres

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	95. Firma del funcionario
☐		

96. Fecha de Radicación	97. Fecha de Validación	

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

Medellín, 04 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de COBE CONSTRUCTORES S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL CESAR		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1002323053	FIGUEROA RAMIREZ JORGE ELIECER	05/02/2026		M2422518	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 04/02/2026 15:20:22 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.155.210.36, 192.230.104.14, 172.16.42.57

IPS GUADALUPE SAS
Nit: 901835329
Dirección: Calle 9B # 7-25 Barrio Avenidas
Teléfono: 3102577557
Email: ipsguadalupes@gmail.com

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL - PRE - INGRESO

Información General

N° ingreso	**149257**	**Fecha Impresión**	2026-02-19
Fecha Ingreso	2026-02-18 09:14:37	**Ciudad**	FLORENCIA
Nombre	JORGE ELIECER FIGUEROA RAMIREZ	**CC**	1002323053
Sede	ipsguadalupes@gmail.com	**Ocupación**	AYUDANTE
Tipo de Examen	PRE - INGRESO	**Fecha Nacimiento**	1993-06-11
Edad	32 años	**Dirección**	
Teléfono	3133869874	**Estado Civil**	Soltero(a)
N° Hijos	1		
Grupo sanguíneo / RH	O+		
Fecha Salida	2026-02-18 17:05:41	**Empresa Contratante**	COBE CONSTRUCTORES SAS
Nit Empresa Contratante	901190795	**A.E. Empresa Contratante**	CONTRUCION DE OBRAS CIVILES
Nit Empresa	901190795		
EPS	SSS E.P.S. SANITAS S.A.	**ARL**	POSITIVA ARL
Fondo Pensiones	SSS ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.	**Nombre Acompañante**	EL USUARIO ASISTE A LA EVALUACIÓN SIN ACOMPAÑANTE
Departamento	BOLÍVAR		

Certificación de Aptitud - PRE - INGRESO

APTO

Concepto de acuerdo al énfasis

OSTEOMUSCULAR	APTO

Recomendaciones Generales

- Control periódico ocupacional
- Hábitos nutricionales saludables
- Utilización de EPP Elementos de Protección personal de acuerdo al cargo
- Ejercicio regular 3 veces / semana

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

- **OSTEOMUSCULAR:** Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.

Recomendaciones Especificas Empresa

Incluir en programas de vigilancia de acuerdo a los riesgos laborales prioritarios para el cargo definidos en la matriz de riesgos de la empresa.

Enfasis en el examen del sistema osteomuscular

En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERÍDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Profesional: Martha Cecilia Osorio Garcia
CC: 29673871
Registro médico: 29673871
Licencia N°: 0778 - 26/05/21

Firma del trabajador: JORGE ELIECER FIGUEROA RAMIREZ
CC 1002323053

CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS DT	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
	EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nombre: Jorge Figueroa	**Cedula:** 1002-323053
Fecha: 06/02/2026	**Cargo:** Ayudante avanzado.

1. Relacione con una línea la parte del cuerpo donde debemos colocarnos cada elemento de protección personal o de seguridad



2. Señale con un X lo que NO se permite hacer en la obra.



CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS DT

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3. El trabajo en alturas según la Resolución 4272 de 2021 aplica a partir de:
   a. 1 metro
   b. 1.50 metros
   X c. 2 metros
   d. 3 metros

4. Si detectas un riesgo en tu área, lo primero que debes hacer es:
   a. Ignorarlo
   b. Contárselo a un compañero
   X c. Reportarlo al jefe inmediato o SST
   d. Continuar trabajando

5. El lavado de manos y la higiene ayudan a prevenir enfermedades respiratorias en obra. Verdadero o falso (V)
6. Menciona dos riesgos que puedas encontrar en tu frente de obra
   - caidas
   - Formadora de asido
7. ¿Cuál es el color de la señal de advertencia que indica peligro?

   a. Azul
   b. Verde
   X c. Rojo
   d. Amarillo

8. Identifique cuales son los actos y condiciones inseguras:



acto



acto




acto



acto



Condicion



acto

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN 100%.

dorge

FIRMA TRABAJADOR

C.C: 1002323053

Scanned with CamScanner
