Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	16/06/2026	PERIODO No.	22	DEL	08/06/2026	AL	14/06/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Lerida - Tolima

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	096 de 2025	CONTRATO No.:	087 de 2025
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025	PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO FASE II:	13 de enero de 2026	FECHA DE INICIO FASE II:	13 de enero de 2026
PRORROGA 1 - FASE II:	8 meses y 21 dias	PRORROGA 1 - FASE II:	8 meses y 21 dias
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FASE II:	30/10/2026	FECHA DE TERMINACIÓN FASE II:	30/10/2026
PLAZO ACTUALIZADO:	291	PLAZO ACTUALIZADO:	291
PLAZO TRANSCURRIDO:	153 EQUIVALE AL 52,58%	PLAZO TRANSCURRIDO:	153 EQUIVALE AL 52,58%
VALOR INICIAL TOTAL:	$ 695.439.660,00	VALOR INICIAL TOTAL:	$ 9.219.977.851,00
VALOR FASE II:	$ 548.691.855,00	VALOR FASE II:	$ 8.856.622.686,00
VALOR FASE I:	$ 146.747.805,00	VALOR FASE I:	$ 305.830.000,00
VALOR PROVISIÓN:	$ 0,00	VALOR PROVISIÓN:	$ 57.525.165,00
VALOR ADICION No. 1 FASE II:	$ 409.354.755,00	VALOR ADICION No. 1 FASE II:	$ 1.358.067.479,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 1.104.794.415,00	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 10.578.045.330,00
VALOR ACTUALIZADO FASE II:	$ 958.046.610,00	VALOR ACTUALIZADO FASE II:	$ 10.214.690.165,00
VALOR PAGADO:	$ 21.658.889,00	VALOR PAGADO:	$ 0,00
VALOR POR PAGAR:	$ 936.387.721,00	VALOR POR PAGAR:	$ 10.214.690.165,00
VALOR PAGADO PROVISION:	N/A	VALOR PAGADO PROVISION:	$ 0,00
VALOR POR PAGAR PROVISION:	N/A	VALOR POR PAGAR PROVISION:	$ 57.525.165,00
SUPERVISOR:	JENNY MILENA PEREZ MECON	INTERVENTOR:	CONSORCIO TAU

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del item (Actividades Ruta Critica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
0	Firma Acta de Inicio	13/01/2026	13/01/2026	1	13/01/2026	13/01/2026	1	0	0
1,01	Localización y trazado	13/01/2026	19/02/2026	38	13/01/2026	12/06/2026	151	0	-113
1,02	Replanteo	09/02/2026	15/07/2026	157	09/02/2026		ejecución	0	ejecución
1.03	Acometida Provisional de Electricidad hasta una distancia maxima de 50 m	13/02/2026	17/02/2026	5	26/01/2026	17/02/2026	23	18	0
1.04	Red provisional de suministro de agua potable	17/02/2026	19/02/2026	3	17/02/2026	19/02/2026	3	0	0
1,05	Desmonte de reja metalica existente	19/02/2026	23/02/2026	5	23/02/2026	01/03/2026	7	-4	-6
1,06	Desmonte Malla eslabonada	19/02/2026	23/02/2026	5	23/02/2026	12/06/2026	110	-4	-109
1,07	Demolicion perimetral de cerramiento en ladrillo	19/02/2026	25/02/2026	7	05/03/2026	12/06/2026	100	-14	-107
1,08	Demolicion de columna de cerramiento existente	25/02/2026	27/02/2026	3	05/03/2026	12/06/2026	100	-8	-105
1,09	Demolicion de viga de cimentacion de cerramiento existente	25/02/2026	02/03/2026	6	09/06/2026	12/06/2026	4	-104	-102
1,10	Tala de arboles	19/02/2026	10/03/2026	20	20/02/2026	10/03/2026	19	-1	0
1,11	Demolicion Placa de Concreto	26/03/2026	21/04/2026	27	09/06/2029	12/06/2026	-1.092	-1171	-52
1,13	Retiro Manual de Tuberia existente hasta 12	31/03/2026	02/04/2026	3	31/03/2026	12/06/2026	74	0	-71
1,14	Retiro de tuberia de redes de acueducto	31/03/2026	02/04/2026	3	31/03/2026	12/06/2026	74	0	-71
1,15	Demolicion de caja de inspeccion	02/04/2026	07/04/2026	6	02/04/2026	12/06/2026	72	0	-66
1,16	Demolicion de Muro en concreto reforzado	11/05/2026	16/06/2026	37	09/06/2026		ejecución	-29	ejecución
1,17	Demolicion de edificacion existente	19/01/2026	20/02/2026	33	19/01/2026	20/02/2026	33	0	0
2,01	Excavacion Manual	13/03/2026	08/04/2026	27	04/03/2026	12/06/2026	101	9	-65
2,02	Excavación mecánica de material rocoso, bajo cualquier grado de humedad, incluye: roca descompuesta, bolas de roca, material suelto, recebo compactado, tierra negra, etc., cargue	20/02/2026	26/03/2026	35	18/02/2026	12/06/2026	115	2	-78
2,03	Descapote de zonas exteriores del edificio para renovación de vías, andenes y parqueaderos. Incluye Cargue	20/02/2026	05/03/2026	14	18/02/2026	12/06/2026	115	2	-99
2,04	Suministro, transporte y colocacion Base Granular	19/05/2026	15/06/2026	28	21/05/2026		ejecución	-2	ejecución
3,01	Colocacion de Concreto 14MP para solado	13/03/2026	23/05/2026	72	04/03/2026		ejecución	9	ejecución
3,02	Zapatas de concreto de 3000 psi	25/03/2026	24/04/2026	31	19/03/2026		ejecución	6	ejecución
3,03	Zarpa de concreto de 3000 psi	25/03/2026	19/05/2026	56	17/04/2026		ejecución	-23	ejecución
3,04	Tanque en concreto de 4000 psi	19/05/2026	15/06/2026	28	05/05/2026	06/06/2026	33	14	9
3,05	Vigas de cimentacion en concreto 3000 psi	25/03/2026	12/05/2026	49	19/03/2026		ejecución	6	ejecución
3,06	Concreto de 3000 psi para placa de contrapiso	15/06/2026	26/06/2026	12	02/06/2026		ejecución	13	ejecución
3,07	Muro de contencion de concreto de 3000 psi	13/04/2026	29/06/2026	78	04/05/2026		ejecución	-21	ejecución
4,01	Construcción de Escaleras en concreto de 3000 PSI	12/06/2026	27/07/2026	46	22/05/2026		ejecución	21	ejecución
4,02	Construccion de pantalla y columnas en concreto	13/04/2026	18/06/2026	67	07/05/2026		ejecución	-24	ejecución
4,03	Placa Maciza en concreto fc=21 e= 15 m	05/06/2026	25/06/2026	21			no iniciado	no iniciado	no iniciado
4,06	Placa Aerea Nervada en Concreto	11/05/2026	14/07/2026	65			no iniciado	no iniciado	no iniciado
5,01	Acero de Refuerzo Fy= 60000 psi, suminsitro e instalacion	25/03/2026	08/07/2026	106	09/03/2026		ejecución	16	ejecución
5,02	Suministro e instalacion de malla electrosoldada 7,5mm de 15x15 cm	05/06/2026	11/06/2026	7	01/06/2026		ejecución	4	ejecución
8,04	Acabado de piso en cocnreto enduredido sellado para trafico vehicular. Dialtado	15/10/2026	26/10/2026	12	06/06/2026	08/06/2026	3	131	140
12,01	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc presion 1/2"	03/06/2026	12/08/2026	71			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12,02	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc presion 3/4"	03/06/2026	23/07/2026	51			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12,03	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc presion 1"	03/06/2026	10/07/2026	38			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12,04	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc presion 1 1/4"	03/06/2026	29/06/2026	27			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12,05	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc presion 1 1/2"	03/06/2026	18/08/2026	77			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12,06	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc presion 2"	03/06/2026	10/07/2026	38			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12,07	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc presion 2 1/2"	03/06/2026	16/06/2026	14			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12,26	NIPLE PASAMURO A. INOX SCH 40 DE 4	12/08/2026	13/08/2026	2	05/06/2026	06/06/2026	2	68	68
12,27	NIPLE PASAMURO SCH 40 L=60 CM RUANA HR 1"	13/08/2026	13/08/2026	1	05/06/2026	06/06/2026	2	69	68
13,01	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc sanitaria 2"	13/08/2026	17/08/2026	5	28/05/2026		ejecución	77	ejecución
13,02	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc sanitaria 3"	17/08/2026	18/08/2026	2	28/05/2026		ejecución	81	ejecución
13,03	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc sanitaria 4"	18/08/2026	21/08/2026	4	28/05/2026		ejecución	82	ejecución
13,04	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc sanitaria 6"	21/08/2026	24/08/2026	4	28/05/2026		ejecución	85	ejecución
13,07	Transporte, Suministro e instalacion accesorios pvc sanitaria 2"	25/08/2026	07/09/2026	14	28/05/2026		ejecución	89	ejecución
13,08	Transporte, Suministro e instalacion accesorios pvc sanitaria 3"	25/08/2026	26/08/2026	2	28/05/2026		ejecución	89	ejecución
13,09	Transporte, Suministro e instalacion accesorios pvc sanitaria 4"	26/08/2026	08/09/2026	14	28/05/2026		ejecución	90	ejecución
13,13	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60*0.60*<1.0 m EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN RECEBO COMUN, PLACA CONCRETO, LADRILLO TOLETE,	26/08/2026	08/09/2026	14	28/05/2026		ejecución	90	ejecución
13,14	CAJA DE INSPECCIÓN 0.80*0.80*<1.2 m EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN RECEBO COMUN, PLACA CONCRETO, LADRILLO TOLETE,	26/08/2026	08/09/2026	14	28/05/2026		ejecución	90	ejecución
14,03	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc sanitaria 6" aguas lluvias	12/06/2026	08/07/2026	27	28/05/2026		ejecución	15	ejecución
14,09	Caja de inspeccion 60x60 en mampsoteria	11/09/2026	17/09/2026	7	12/06/2026		ejecución	91	ejecución
14,10	Caja de inspeccion 80x80 en mampsoteria	17/09/2026	17/09/2026	1	10/06/2026	12/06/2026	3	99	97
14,11	transporte, suministro e instalacion de rejilla aluminio tipo cupula 4x3 3	05/06/2026	08/06/2026	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
14,12	transporte, suministro e instalacion de rejilla aluminio tipo cupula 6x4 4	05/06/2026	08/06/2026	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
14,14	Filtro tipo geodren h:2	05/06/2026	16/06/2026	12	04/06/2026	13/06/2026	10	1	3
17,11,01	desenergizacion, desmonte de la red de media tension ,desmonte de la red de baja tension y desmonte de transformador existente del punto fisico de alimentacion del predio ubicado en la calle 8 con carrera 11b	19/09/2026	25/09/2026	7	11/06/2026	12/06/2026	2	100	105
17,11,11	suministro instalacion y puesta en funcionamiento tablero de bombeo	07/10/2026	09/10/2026	3	11/06/2026	12/06/2026	2	118	119
Plazo del proyecto en días				138					

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	DIAS DE (+) ADELANTO (-) ATRASO EN LA RUTA CRÍTICA A LA FECHA DE CORTE		% sobre el plazo total
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 2.247.231.836,30	22,0%	0,0%	Al inicio de la actividad	-12,00	-4,12%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	$ 2.247.231.836,30	22,0%		Al final de la actividad	0,00	0,00%

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	16/06/2026	PERIODO No.	22	DEL	08/06/2026	AL	14/06/2026

CURVA "S"

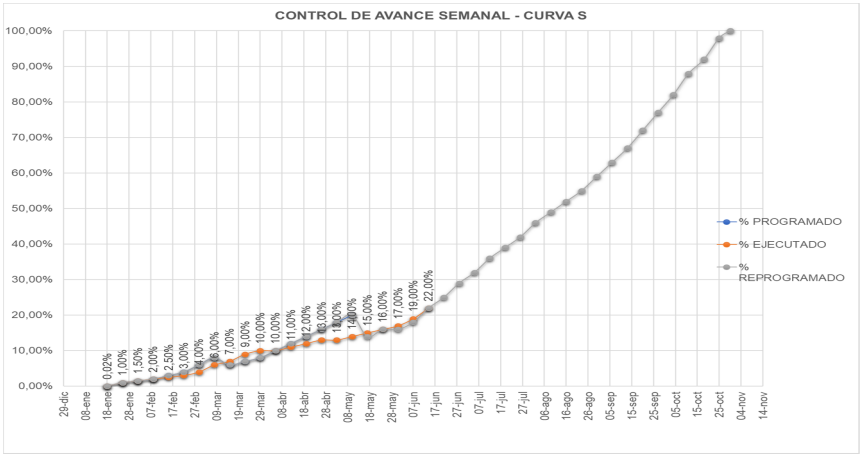

Programación

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
Programado	22%
Ejecutado	22%
Diferencia	--

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para esta semana con base a la reprogramacion presentada se evidencia un avance ejecutado del 22% frente al 22% programado, correspondiente al capítulo de Preliminares, Acero Estructural, red aguas residuales, aguas lluvias y electricas.

3.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Ya que a la fecha se cuenta con el pago del anticipo realizado el día 27 de marzo, conforme a la orden de pago Presupuestal de gastos No. 85356226, por un valor de CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($4.085.876.066,00), dichos recursos fueron girados a Fiduciaria Alianza.

En esta semana se realizo aprobacion de desembolso No 4 por un valor de $20,075,000 correspondiente a los rubros 1 adquisicion de materiales de construccion para el proveedor Maribel Guzman Ramirez y desembolso No 5 por un valor de $100,019,452 correspondiente a los rubros 1 adquisicion de materiales de construccion para el proveedor Hierros HD del Norte.

Resumen de manejo de anticipo:

VALOR TOTAL ANTICIPO		$ 4.085.876.066
Desembolso No 1	$	325.734.403,20
Desembolso No 2	$	325.734.403,20
Desembolso No 3	$	388.752.581,21
Desembolso No 4	$	20.075.000,00
Desembolso No 5	$	100.019.452,00
Saldo a pagar de Anticipo	**$**	**2.925.560.226,39**

3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

A la fecha se presente corte de Obra No 1 por un valor de $1,451,976,019, con fecha de corte al 12 de Mayo 2026, se realizo amortizacion de anticipo del 40% por un valor de $580,790,408.

3.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

A la fecha, el contrato ha completado la diecinueveava semana de ejecución que comprende el periodo entre el 08 y 14 de Junio 2026, durante la cual se han desarrollado principalmente actividades correspondientes a la Fase II – Preliminares, Acero Estructural , red de aguas lluvias, estructura en concreto, cimentacion y movimiento de tierras. Sobre estas, se informa lo siguiente:

Demolición de muro perimetral , acero placa entre piso ejes 7-4 entre ejes AB , filtro tipo geodren eje A entre ejes 1-7 , niples de muro tanque de almacenamiento eje A entre ejes 4-6 , cajas de inspección aguas residuales eje 1 entre AB , eje 2 entre AB, tubería PVC sanitaria eje 1 entre ejes AB , movimiento red media tensión y transformador existente.

3.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

* Durante la semana se verifico el informe semanal de obra e informe mensual correspondiente al N°04.
* El día 10 de junio del 2026, se evidencio en obra el ingreso de camillas maderables el cual cumplió en el tiempo establecido y vigencia del salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica.
* Durante la semana se realizó la debida subsanación de las observaciones dadas por la subsanación, referente al informe PGAS de la interventoría y anexo correspondientes.
* Durante la semana se realizó reunión con la profesional de obra en campo con el objetivo de socializar los formatos ambientales para implementar en obra, lo cuales fueron remitidos por la supervisión ambiental de la entidad.
* Se asistió de manera puntual al comité de obra entre las partes supervisión, obra e interventoría.

3.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Durante el periodo evaluado, se desarrollaron las actividades de seguridad industrial programadas, realizando seguimiento permanente a las condiciones de trabajo y promoviendo el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales. Las actividades ejecutadas contribuyeron al desarrollo seguro de la obra y al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las actividades realizadas son las siguientes:
1.Se realizaron inspecciones diarias en los diferentes frentes de trabajo de la edificación, verificando el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
2.Se realizo verificación de charlas de seguridad antes del inicio de la jornada laboral, abordando temas relacionados con trabajo seguro en alturas, manejo de herramientas manuales y eléctricas, prevención de caídas y orden y aseo.
3.Se verificó el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), incluyendo casco, botas de seguridad, guantes, gafas de protección, arnés y línea de vida para actividades en altura.
4.Se verificó la inspección de andamios, escaleras, plataformas de trabajo y sistemas de protección contra caídas, garantizando condiciones seguras para el personal.
5.Se verifico el acceso a las áreas de trabajo restringidas y se verificó la correcta instalación y mantenimiento de la señalización de seguridad.
6.Se efectuó seguimiento al orden y aseo de la obra, garantizando la adecuada disposición de materiales, herramientas y residuos de construcción.
7.Se inspeccionó el estado de las instalaciones eléctricas provisionales, extensiones y tableros eléctricos, verificando el cumplimiento de las condiciones de seguridad requeridas.
8.Se realizó seguimiento al cumplimiento de los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo, especialmente trabajos en altura.
9.Se registraron observaciones de seguridad y se implementaron acciones correctivas inmediatas para las condiciones inseguras identificadas durante las inspecciones.

Observaciones
•Se evidenció cumplimiento general de las medidas de seguridad por parte del personal de obra.
•Se reforzaron las recomendaciones relacionadas con el uso permanente de los EPP y el aseguramiento de herramientas durante trabajos en altura.
•Se mantuvo la señalización y delimitación de las zonas de riesgo en los diferentes niveles de la edificación.

3.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Durante el período reportado, se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades contempladas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) implementado por el Contratista, en los diferentes frentes de obra donde se ejecutaron actividades constructivas. Las labores de supervisión permitieron verificar la aplicación de medidas de prevención, promoción y control de riesgos laborales, evidenciándose acciones orientadas a la protección de la salud de los trabajadores, la mitigación de factores de riesgo ocupacional y el fortalecimiento de la cultura de autocuidado.
Entre las principales actividades verificadas durante el período se destacan las siguientes:
Verificación de condiciones de higiene y seguridad
Se realizaron recorridos de inspección en los diferentes frentes de trabajo con el propósito de evaluar las condiciones de orden, aseo y seguridad, verificando la adecuada disposición y almacenamiento de materiales, herramientas y equipos, así como el mantenimiento de condiciones locativas seguras que permitieran el desarrollo de las actividades constructivas sin generar riesgos adicionales para los trabajadores.
Verificación de afiliación al Sistema General de Seguridad Social
Se efectuó control documental al personal vinculado al proyecto, verificando el cumplimiento de los requisitos de afiliación y cobertura al Sistema General de Seguridad Social Integral, incluyendo salud, pensión y Administradora de Riesgos Laborales (ARL), garantizando que el personal autorizado para el ingreso y permanencia en obra contara con la protección legal y asistencial requerida para el desarrollo de sus funciones.
Actividades de promoción y prevención
Se verificó la ejecución de actividades de sensibilización dirigidas al personal de obra, enfocadas en la prevención de enfermedades laborales, promoción de hábitos saludables, autocuidado y fortalecimiento de conductas seguras durante la ejecución de las labores constructivas.
Seguimiento a condiciones ergonómicas y riesgos biomecánicos
La Interventoría evidenció el seguimiento realizado por el Contratista a las condiciones ergonómicas asociadas a las actividades de manipulación manual de materiales, transporte de elementos y ejecución de labores repetitivas, promoviendo medidas preventivas encaminadas a reducir la incidencia de lesiones osteomusculares y fatiga física.
Verificación de condiciones de bienestar
Se inspeccionaron las áreas destinadas al bienestar del personal, incluyendo unidades sanitarias, zonas de alimentación, puntos de hidratación y espacios de descanso, constatando condiciones adecuadas de limpieza, mantenimiento e higiene para el desarrollo de las actividades laborales.
Con base en las verificaciones efectuadas durante la semana evaluada, la Interventoría concluye que el Contratista mantuvo condiciones aceptables de gestión en materia de Salud Ocupacional, evidenciándose el cumplimiento de las actividades programadas y la implementación de medidas orientadas a la protección integral de la salud y el bienestar de los trabajadores vinculados al proyecto.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	16/06/2026	PERIODO No.	22	DEL	08/06/2026	AL	14/06/2026

3.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

En el área social, la ubicación del predio cuenta con espacios libres naturales colindantes con los predios vecinos, hasta la fecha no se ha presentado ninguna afectación ni impacto sobre dichos predios. Se continua con seguimiento de verificacion de cumplimiento de personal de la zona.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría: N/A
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista: N/A
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de DEAJ: N/A
Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

6. ***COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

De acuerdo con esta reprogramación, durante la presente semana se evidencia un avance ejecutado del 22% frente al 22% programado sin presentar diferencia de %. representado en las actividades de , demolicion muro contencion, Acero Estructural , red de aguas lluvias, estructura en concreto, cimentacion y movimiento de tierras. Se realiza supervision del cumplimiento del plan de contingencia presentado.

Se recomienda mantener y fortalecer la implementación de las medidas de prevención, promoción y control de riesgos establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), garantizando su aplicación efectiva en cada uno de los frentes de obra y durante todas las etapas de ejecución contractual. La implementación y mejora continua de estas acciones contribuirá a la reducción de la accidentalidad laboral, la prevención de incidentes y enfermedades de origen ocupacional, el fortalecimiento del desempeño del SG-SST y el mantenimiento de condiciones de trabajo seguras y saludables para todo el personal vinculado al proyecto, en concordancia con los requisitos normativos vigentes y las obligaciones contractuales aplicables.

******* Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Excavación mecánica / Demolición viga de cimentación / Retiro de tubería / Descapote MC04



Demolicion Muro Perimetral



Acero Placa entrepiso (entre eje 7-4) (proyectado)




Niples en muros de tanques ya fundidos

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia



INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	16/06/2026	PERIODO No.	22	DEL	08/06/2026	AL	14/06/2026






Cajas de inspección aguas residuales 60x60 y 80x80



Tuberia PVC Sanitaria 4"






Geodren y traslado de poste











Señalizacion, uso adecuado de epps y equipos, charlas diarias

FIRMA INTERVENTOR - REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO TAU

NOMBRE: **STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON**

VoBo SUPERVISOR (FIRMA)

NOMBRE SUPERVISOR: JENNY MILENA PÉREZ MECÓN
