	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	FECHA	10/29/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN MAYO 2026 | **INSERTAR 05**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N/A

CONSECUTIVO N° N/A

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-141-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	1/24/2025	**FECHA INCIO**	4/10/2025
	ICCU-221-2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	3/3/2025	**FECHA INCIO**	4/10/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024	**NIT**	NIT: 901.903.428 -2
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	**NIT**	NIT: 901.915.916 - 7
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	El plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2026 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	El plazo de ejecución hasta el 15 de julio de 2026 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).				
MODIFICACIONES AL CONVENIO (DetallaR Otrosies, modificatorios, etc)	N/A				
PRORROGAS No 1 (ICCU-CTO -141-2025)	6 MESES				
PRORROGAS No 1 (ICCU-CTO -221-2025)	6 MESES Y 15 DIAS				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	El plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de 2025 según acta de inicio				
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (ICCU-CTO -141-	El plazo de ejecución es hasta el 30 de junio del 2026				
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (ICCU-CTO 221-	El plazo de ejecución es hasta el 15 de julio del 2026				
FORMA DE PAGO - OBRA	1, FORMA DE PAGO CARACTERIZACIÓN DE CORREDORES VIALES Y ENSAYOS: a) Un primer desembolso correspondiente al 25% se realizará una vez sea entregado y aprobado por interventoría el PLAN DE CAMPO, METODOLOGÍA DE TRABAJO YCRONOGRAMA DE TRABAJO. b) Un segundo desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría. c) Un tercer desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el restante 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría. d) El 25% restante se pagará posterior a la entrega de los documentos técnicos que resulten del análisis de las caracterizaciones, ensayos y demás documentos técnicos requeridos, los cuales serán aprobados por la interventoría. 2. FORMA DE PAGO OBRA DE CORREDORES VIALES: El sistema de pago del componente de obra de los corredores viales se realizará de la siguiente manera: a. En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. El anticipo se regirá por las condiciones señaladas dentro del presente anexo. b. El valor restante del contrato se pagará en pagos parciales entregado y aprobado por la interventoría, y la supervisión, conforme al cumplimiento de todos los requerimientos y entregables de cada volumen en el presente Anexo Técnico hasta completar el 95% del valor total del contrato. c. Se realizará un último pago correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, una vez suscrita el acta de liquidación por parte de la entidad previa aprobación de la supervisión e interventoría. Para cada uno de los pagos se requiere de la presentación del informe.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$28,220,954,599.00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	FORMA DE PAGO 1. La entidad entregara un anticipo equivalente al 20% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez sea firmada el acta de liquidación del contrato. El pago al interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el interventor al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Parágrafo 1. La entidad realizará al interventor el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará una vez suscrita el acta de liquidación del contrato.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$3,865,474,620.00
		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	1 al 31 de Mayo 2026		

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		**Vigencia**		**Valor Amparado**
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	NB - 100372291 ANEXO 1	4/10/2025	6/30/2026	$ 5,644,190,919.80
Buen manejo del anticipo		4/10/2025	6/30/2026	$ 8,466,286,379.70
Prestaciones Sociales		4/10/2025	12/31/2028	$ 1,411,047,729.95
Calidad del servicio		12/31/2025	12/31/2028	$ 626,505,192.10
Estabilidad de la obra		12/31/2025	12/31/2027	$ 8,466,286,379.70
RCE	NB - 100096328 ANEXO 1	1/24/2025	12/31/2026	$ 1,411,047,729.00

Contrato de interventoría				
Póliza:		**Vigencia**		**Valor Amparado**
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	21-44-101464046 ANEXO 2	4/10/2025	6/13/2026	$ 579,821,193.00
Buen manejo del anticipo		4/10/2025	6/13/2026	$ 773,094,924.00
Prestaciones Sociales		4/10/2025	2/12/2029	$ 386,547,462.00
Calidad del servicio		2/12/2026	2/12/2031	$ 773,094,924.00
ANEXO PRORROGA 1	21-44-101464046 ANEXO 3	MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 15 DE JULIO DE 2026,		SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)		
Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	**Responsable diligenciamiento**	Estefania Hernandez Vargas
	Fecha diligenciamiento	No Aplica

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

En calidad de supervisor del ICCU y continuando con la respectiva supervision del contrato a continuacion se presenta en resumen relavante la gestion por cada tramo.


Durante la supervisión se verificó la ejecución de obras de drenaje, estabilización y estructuras de contención en los diferentes tramos del proyecto. Se constató el avance en la construcción y hormigonado de alcantarillas en Caparrapí, Bituima, San Juan de Rioseco y Guayabal de Síquima; la construcción de cunetas, ventanas y filtros en Puerto Salgar, Pulí y Vianí; y el desarrollo de actividades para muros de contención en Quebrada Negra y San Francisco. Asimismo, se evidenció la continuidad de trabajos de adecuación vial, excavaciones, armado de acero e instalación de tuberías. Los tramos de Albán, Sasaima y Beltrán permanecen a la espera del inicio de las actividades de estabilización de la rasante conforme a la programación vigente.

Es evidente el nivel de atraso que presenta actualmente la ejecución del contrato; por tal razón, se considera necesario realizar una evaluación integral de las condiciones actuales del proyecto, con el fin de determinar los tiempos reales requeridos para la culminación de las actividades pendientes y establecer un nuevo modificatorio que refleje de manera objetiva y sustentada la fecha de terminación contractual.

En este sentido, resulta indispensable efectuar una reprogramación ajustada a la realidad de la obra, teniendo en cuenta que cualquier modificación a los plazos deberá surtir el correspondiente proceso de revisión y aprobación por parte de la entidad. Asimismo, se reitera que, para el período objeto de análisis, no se contemplan adiciones presupuestales, considerando que, aunque se han otorgado prórrogas al contrato, no se han aprobado modificaciones que impliquen recursos adicionales.

Por parte de la Supervisión se realizará el respectivo seguimiento y evaluación una vez se tramite formalmente la solicitud presentada por la Interventoría y el Contratista de Obra, verificando la consistencia técnica y contractual de las condiciones planteadas para la reprogramación del proyecto.

RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO:
Información reportada en el informe Semanal No 58

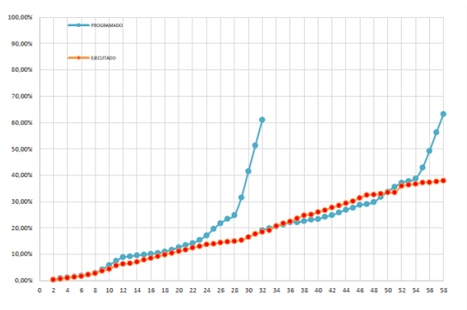

Tomado de: Graficas de avance presentadas dentro del informe Semanal No 58

RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO:
Información reportada en el informe Mensual No 58

AVANCE GENERAL DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	56,32%	37,93%	-18,40%
Durante el periodo	6,92%	0,40%	-6,51%
Acumulado Actual	63,24%	38,33%	-24,91%

Tomado de: Tablas de avance presentadas dentro del informe Mensual No 58

5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024	CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI
Anticipo	$8,466,286,380.00	$773,094,924.00
Pago No. 1 Acta Parcial Caracterización	$438,011,739.00	N/A
Pago No. 2 Acta Parcial Caracterización	$438,011,739.00	N/A
Pago No. 3 Acta Parcial Caracterización	$438,011,739.00	N/A
Pago No. 4 Acta Parcial Caracterización	$0.00	N/A
Pago No. 1 Acta parcial de obra	$658,011,688.00	$84,898,468.00
Pago No. 2 Acta Parcial de obra	$1,738,688,975.00	$126,819,300.00
Pago No. 3 Acta Parcial de obra	$1,117,944,904.00	$156,472,040.00
Pago No. 4 Acta Parcial de obra	$569,806,728.00	$167,936,380.00
Pago No. 5 Acta Parcial de obra	$0.00	$1,024,143,774.00
Pago No. 6 Acta Parcial de obra		
Pago No. 7 Acta Parcial de obra		
Valor Pagado Total	$5,398,487,512.00	$1,560,269,962.00
Saldo Pendiente por Cancelar	$22,822,467,087.00	$2,305,204,658
Porcentaje de ejecución Caracterizacion	88.80%	88.80%
Porcentaje de ejecución Obra Fisica	38.33%	78.34%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)	**Responsable diligenciamiento**	EN REVISIÓN POR EL ÁREA DE SST Y LOS DEMAS PERIODOS YA FUERON APROBADOS
	Fecha diligenciamiento	5 de Junio de 2026

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	si	**Chalecos**	si
			Otros	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	x	**NO**	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

TRAMO 1_Caparrapi.
Durante el mes al tramo se le ha realizado la resspectiva supervision a la construcción de la alcantarilla (encole y descole) del la abscisa K1+370Adecuación de la vía mediante explanación del material y posterior compactación para mejorar el paso de material a los frentes de obra K1+450







TRAMO 2_Puerto Salgar:
Desde lasupervision del contrato realiza seguimiento a la continuidad de la actividad de CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS en el tramo PUERTO SALGAR en las abscisa K2+360 LADO DERECHO, con ello se pretende mejorar significativamente manejo de aguas de escorrentía de la vía.







Tramo 3_Alban:
Tramo en espera para inicio de estabilizado de la rasante.

Tramo 4_Quebrada Negra:
Avanza en construcion de alcatariilas y muro se evidencia Hormigonado del dentellón y la zarpa para construcción de la cimentación superficial del muro de contención en el K0+920, limpieza de 6 alcantarillas.







Tramo No 5 San Francisco:
Avanza en construcion de alcatariilas y muro se evidencia Hormigonado del dentellón y la zarpa para construcción de la cimentación superficial del muro de contención en el K1+720.








TRAMO_6_Sasaima.
Tramo en espera para inicio de estabilizado de la rasante.

Tramo 7_ Beltran:
Tramo en espera para inicio de estabilizado de la rasante.

TRAMO 8_Bituima:
Avanza en construcion hormigonado del encole y descole para la construcción de la alcantarilla del K11+630 pendiente llenos perimetrales.






TRAMO 9_Puli:
Avanza la imprimacion de la capa doble riego con un avance en el K4+030, Termina esta actividad en el frente de obra.Dando continuidad a la conforemacion y construcción de cunetas en el K0+000 K+0140 y K3+090 a K3+470 K1+260 al K1+530 costado derecho, avanzando en filtris







TRAMO 10_San Juan de Rioseco
La supervision realiza seguimiento a la continuidad de la actividad de CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS en las abscisa K4+345, K4+850 Y K4+160 Y k2+165 con ello se pretende mejorar significativamente las zonas laterales de la vía y brindar mejor visibilidad a los actores viales.







Tramo 11_Guayabal de Squima
La supervision realiza seguimiento a la continuidad de la actividad de CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS en las abscisa K0+090 Y K0+830 con ello se pretende mejorar significativamente manejo de aguas de escorrentía de la vía.







Tramo 12_Viani:
Continúa la actividad de estabilizado de la rasante con químico no convencional entre el K3+600 al K4+090.Construcción del filtro K3+310 al K3+400









9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. COMUNICACIONES FORMALES

Durante el presente periodo, la Supervisión del Contrato ICCU adelantó diversas gestiones administrativas y técnicas relacionadas con la comunicación oficial entre la Entidad, la Interventoría, los municipios y el contratista. A continuación, se presentan las principales actuaciones:

En seguimiento a la interventoría, se verificó que las actividades ejecutadas (rocería, limpieza de alcantarillas, conformación de la rasante y estabilización) han permitido contar con las condiciones técnicas mínimas para continuar el proyecto.

El dia 07 de mayo de 2026, se envia comunicación solicitando Solicitud de cumplimiento del Anexo Técnico – Numeral 7.3 Maquinaria ycondiciones técnicas vinculadas al proyecto.
El dia 11 de mayo de 2026, se presenta a la Interventoria un oficio de Aprobación informe mensual de interventoría No. 12 V.1. Marzo 2026 Ref.: Contrato No. **ICCU-221 DE 2025.**
El dia 22 de mayo de 2026, se hace entrega a la Interventoria Aprobación informe Mensual No 13 periodo 1 al 30 de Abril de 2026.
El dia 25 de mayo se solicita a la Interventoria el concepto técnico sobre el plan de contingencia de obligaciones contractuales y cumplimiento del contrato **ICCU-141-2025,** con el fin de dar lugar al seguimiento de atrasos presentados durante la ejecucion del contrato.

Se realiza VT Comisión Estefania Hernández, Luz Angela Sanabria, 27 de mayo 2026 alMunicipio de San Juan de Rio Seco – Socialización con comunidad tramo delproyecto Caminos Vecinales, Caminos Para Quedarse..

2. Actas de pago parciales - Interventoria, se presentan de las actas para el mes de mayo, sin embargo se dan los pagos a las mimas en el presente mes.
El 13 de mayo se radica a la entidad para gestion pertinente el **Acta No 3** de Obra mediante oficio **No ICCU-S-2026-0004061.**
El 13 de mayo se radica a la entidad para gestion pertinente el **Acta No 5** mediante oficio No **ICCU-S-2026-0004060**, de Interventoria correspondiente al contrato de interventoría, que consolida los costos acumulados durante el periodo comprendido entre agosto a diciembre de 2025.
El 24 de mayo se radica el **Acta No 4** de obra mediante oficio **No ICCU-S-2026-0004431.**

Actas de pago parciales - Obra. Durante el transcurso del mes se gestionaron y tramitaron dos actas parciales de pago, correspondientes al avance de las actividades ejecutadas en obra. Asimismo, se encuentra en proceso la estructuración del Acta No. 5, cuya radicación se prevé una vez se alcance un avance representativo en las actividades de estabilización de los diferentes tramos.

De igual manera, se llegó a un acuerdo con la Interventoría respecto al esquema de cobro, definiendo la presentación de un acta acumulada correspondiente al Acta No. 5, la cual consolidará los servicios prestados durante el período comprendido entre agosto y diciembre de 2025.

3. Seguimiento a Entregables programados.
Se culminó la revisión y aprobación de los entregables presentados por la Interventoría correspondientes a las propuestas de los 12 tramos del proyecto. Como resultado, se realizó la actualización de los presupuestos conforme a las observaciones y recomendaciones emitidas por la Supervisión del contrato, quedando definidos los valores y actividades con los cuales actualmente se adelanta la ejecución de las obras.

10- ANEXOS

Informe Semanal No 58- Mayo 2026.
VT 27 de mayo 2026 al Municipio de San Juan de Rio Seco – Socialización con comunidad alcance al tramo.

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ/SUPERVISOR (A)
ESTEFANIA HERNANDEZ VARGAS	GESTOR / SUPERVISOR	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - SUBDIRECTORA**
LUZ ANGELA SANABRIA	SUBDIRECTORA / DIRECCION CAMINOS VECINALES	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	5 de Junio de 2026	

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	**FECHA**	viernes, 29 de mayo de 2026	**SEMANA No.**	**58**	DEL	**22-may-26**	AL	**28-may-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Municipios de Caparrapí, Puerto Salgar, Albán, Quebradanegra, San Francisco, Sasaima, Beltrán, Bituima, Pulí, San Juan de Rioseco, Guayabal de Síquima, Vianí.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	Contrato ICCU-221 de 2025	**CONTRATO No.:**	Contrato de obra ICCU-141 de 2025
PLAZO INICIAL:	11 meses o hasta el 31 de diciembre de 2025	**PLAZO INICIAL:**	11 meses o hasta el 31 de diciembre de 2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	10 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	10 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N.A.	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N.A.
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N.A.	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION PRORROGA1	30 de junio de 2026	**FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION PRORROGA1**	30 de junio de 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	447 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	447 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	414 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	414 días
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.620	**VALOR INICIAL :**	$ 28.220.954.599
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.620	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 28.220.954.599
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.620	**VALOR POR PAGAR:**	$ 28.220.954.599
VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.924	**VALOR ANTICIPO:**	$ 8.466.286.380
SUPERVISOR:	ESTEFANIA HERNANDEZ VARGAS	**GESTOR OBRA:**	ESTEFANIA HERNANDEZ VARGAS

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

OBSERVACIONES

Se requiere al contratista que cualquier obra adicional al presupuesto debe ser consultada con la interventoría para no afectar el presupuesto ni el avance del estabilizado objeto del contrato.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Magdalena Bajo

Tramo No 1 CAPARRAPI

Hormigonado de la alcantarilla (encole y descole) del la abscisa K0+450
Adecuación de la vía mediante explanación del material y posterior compactación para mejorar el paso de material a los frentes de obra K1+350

Tramo No 2 Puerto Salgar

Construcción de cunetas y ventanas con material estabilizado (fórmula modificada cemento 5%) entre el K1+910 - K2+200 total a la fecha 1810 ml construcción de ventanas para evacuación de aguas.

Gualivá

Tramo No 3 Albán

Tramo en espera para inicio de estabilizado de la rasante.

Tramo No 4 Quebrada Negra

Armado de aceros de refuerzo para armado del dentellón y la zapata para construcción de la cimentación superficial del muro de contención en el K0+920

Tramo No 5 San Francisco

Continúa la excavación mecánica para la construcción de la cimentación superficial del muro de contención en el K1+720
Llega material pétreo para concreto (grava y arena de rio)

Tramo No 6 Sasaima

Tramo en espera para inicio de estabilizado de la rasante.

Tramo No 7 Beltrán

Tramo en espera para inicio de estabilizado de la rasante.

Magdalena Centro

Tramo No 8 Bituima

No se evidenció personal en obra por parte de la interventoría en la semana y esta pendiente la construcción de la alcantarilla del K11+630.

Tramo No 9 Pulí

Colocación de la capa doble riego con un avance en el K3+910 al K4+030 y del K3+620 al K3+660 primera capa.
Construcción de cunetas entre el K1+260 al K1+530 lado derecho

Tramo No 10 San Juan de Rioseco

Inicia la construcción de las alcantarillas del K4+345 y K4+850 mediante la excavación mecánica y manual e instalación de tubería en concreto reforzado total 12ml.
Demolición del cabezal de la alcantarilla existente en el K4+160

Tramo No 11 Guayabal de Síquima

Construcción de alcantarilla K0+090 y K0+830 mediante actividad de excavación mecánica y manual armado de aceros de refuerzo para las elevaciones de las alcantarillas

Tramo No 12 Vianí

Se retoma actividad de estabilizado de la rasante con químico no convencional entre el K3+170 al K3+270.
Construcción del filtro K3+310 al K3+400

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Critica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
	Caracterización y ejecución	10-abr-25	30-jun-26	447	10-abr-25	30-jun-26	447	0	0
	Topografía	10-abr-25	24-may-25	45	10-abr-25		ejecución	0	ejecución
	Ensayos de laboratorio	10-abr-25	24-ago-25	137	10-abr-25		ejecución	0	ejecución
	Informes de suelos y pavimentos	10-abr-25	31-ago-25	144	10-abr-25		ejecución	0	ejecución
	Ejecución de obra	26-jul-25	30-jun-26	340	28-jul-25		ejecución	-2	ejecución
	Explanación y excavaciones	26-jul-25	18-oct-25	85	11-ago-25		ejecución	-16	ejecución
	Estructura de pavimento	27-oct-25	20-dic-25	55	30-oct-25		ejecución	-3	ejecución
	De acuerdo a la ruta critica las actividades implican un atraso en el contrato son: Topografía y ensayos de laboratorio.								

Plazo del proyecto: 447 días

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	FECHA	viernes, 29 de mayo de 2026	SEMANA No.	58	DEL	22-may-26	AL	28-may-26

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	56,32%	37,93%	-18,40%
Durante el periodo	6,92%	0,40%	-6,51%
Acumulado Actual	63,24%	38,33%	-24,91%

AVANCE CARACTERIZACION

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	90,55%	88,80%	-1,75%
Durante el periodo	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado Actual	90,55%	88,80%	-1,75%


AVANCE OBRA

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	53,13%	32,84%	-20,29%
Durante el periodo	7,59%	0,44%	-7,15%
Acumulado Actual	60,72%	33,28%	-27,44%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
447 días	414,00	33	-111,33

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

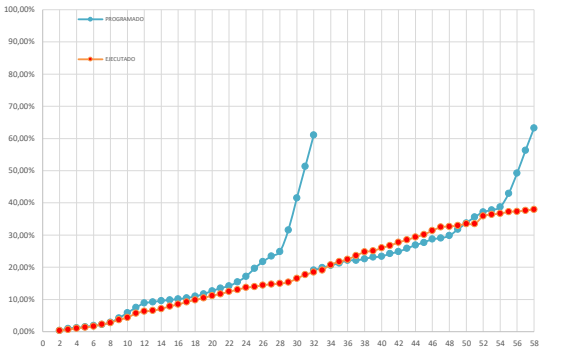

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 15.895.085.126	$ 10.703.766.567	67%
Durante el periodo	$ 1.951.889.871	$ 114.221.920	6%
Acumulado Actual	$ 17.846.974.996	$ 10.817.988.486	61%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-39%	-$	7.028.986.510

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 7.358.662.242	$ 7.091.761.246	
Durante el periodo	$ 1.107.624.138	$ 1.374.025.133	
Acumulado Actual	$ 8.466.286.380	$ 8.465.786.379	

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

1.La Interventoría realiza seguimiento ambiental a las actividades de la obra.
2.Seguimiento ambiental en obra:

Tramo 2 Puerto Salgar
Se realiza seguimiento a las actividades de estabilización, se realiza recolección de residuos.

Tramo 3 Albán
En la obra el Contratista realiza la demarcación de la obra
Se realiza manejo del material de construcción en acopio.

Tramo 4 Quebrada Negra
Se realiza manejo del material generado por las actividades de limpieza de obras de drenaje.
Se ubicó acopio temporal de materiales de construcción y se mantiene la demarcación correspondiente.

Tramo 5 San Francisco
Se realiza el manejo de material generado por las actividades de limpieza

Tramo 6 – Sasaima
Se realiza demarcación de las áreas de intervención de la obra.
Se realiza mantenimiento a la demarcación del acopio de materiales.
Se realiza manejo de materiales de construcción.

Tramo 7 Beltrán
Se realiza manejo de residuos sólidos ordinarios, recolectándolos en las canecas del punto ecológico
Se mantiene la demarcación al acopio de materiales de construcción y RCD
Se realiza mantenimiento a la demarcación de los frentes de obra

Tramo 8 Bituima
El Contratista de obra realiza mantenimiento a la demarcación de los frentes de trabajo.
Se realiza manejo de los residuos generados en la obra.
Se realiza retiro de RCD en acopio.

Tramo 10 San Juan de Rio Seco
El Contratista de obra realiza el manejo del material generado por las actividades de limpieza de las obras de drenaje.
Se realiza manejo del material generado por las actividades de rocería.

Tramo 11 Guayabal
El Contratista de obra realiza manejo de los residuos generados por las actividades de limpieza.
El Contratista de obra, ubica punto de acopio temporal de materiales.

Tramo 12 Viani
El Contratista realiza manejo del material generado por las actividades de obra
El Contratista realizó actividades de orden y aseo.
El Contratista de obra, realiza manejo de los materiales de construcción en acopio.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

El 19 de mayo se revisó y aprobó las piezas de convocatoria para los comités de participación de Sasaima y Beltrán adicionalmente, se revisó el volante informativo para el cierre de la vía programado en San Juan de río seco.

El 20 de mayo se revisaron y se aprobaron las presentaciones para los comités de participación comunitario de Sasaima y Beltrán

El 21 de mayo se realizó acompañamiento a la realización de los comités de participación de Beltrán y Sasaima.

Durante la semana el contratista continúa con la atención al usuario a través de los canales presenciales y virtuales

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	FECHA	viernes, 29 de mayo de 2026	SEMANA No.	58	DEL	22-may-26	AL	28-may-26

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Gestión en los tramos de: Puerto Salgar, Quebradanegra, Dan Francisco, Sasaima, Beltrán, Bituima, Pulí , San Juan y Vianí

REPORTE DE PERSONAL EN OBRA

Viernes, 22 de MAYO de 2026		Sabado, 23 de MAYO de 2026		Lunes, 25 de MAYO de 2026		Martes, 26 de MAYO de 2026		Miercoles, 27 de MAYO de 2026		Jueves, 28 de MAYO de 2026	
Operativos	57	Operativos	56	Operativos	56	Operativos	57	Operativos	58	Operativos	58
Administrativos	9	Administrativos	9	Administrativos	9	Administrativos	9	Administrativos	9	Administrativos	9
Administrativos Bogota	10	Administrativos Bogota	10	Administrativos Bogota	10	Administrativos Bogota	10	Administrativos Bogota	10	Administrativos Bogota	10
Ingresos	0	Ingresos	0	Ingresos	3	Ingresos	3	Ingresos	0	Ingresos	0
Retiros	0	Retiros	1	Retiros	2	Retiros	2	Retiros	0	Retiros	0
Ingreso - Retiro	0	Ingreso - Retiro	0	Ingreso - Retiro	0	Ingreso - Retiro	0	Ingreso - Retiro	0	Ingreso - Retiro	0
Subcontratado	7	Subcontratado	7	Subcontratado	7	Subcontratado	7	Subcontratado	7	Subcontratado	7
Total	83	Total	81	Total	83	Total	84	Total	84	Total	84

Para la semana del 22 al 28 de mayo de 2026, hay un total de 84 trabajadores activos de los cuales 59 promedio son operativos y 19 administrativos (9 en campo y 10 en Bogotá), se presentó 6 novedad de ingreso y 5 retiros de personal, durante el transcurso de la semana, se presenta accidente laboral por parte del contratista, el señor RODRIGO OSWALDO MORENO CAMACHO con numero de cedula 1.076.220.639, el día jueves 21 de mayo 2026 a las 9:00 am; según versión del trabajador, este se encontraba descargando bultos de cemento, cuando al pasar por una base de tablas para llegar al punto de acopio, se tropieza y al caerse le cae el bulto de cemento en su pie derecho y generándose un esguince. Una vez en el centro médico de otorgan 3 días de incapacidad.
Por parte de la interventoría se presenta reporte de un total de 22 trabajadores vinculados al contrato, adicionalmente a la fecha, no se han presentado casos de accidentes de trabajo.

REPORTE DE NOVEDADES E INCIDENTES / OBSERVACIONES

No se han presentado casos de accidentes de trabajo.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

El seguimiento de calidad para las obras de construcción de alcantarillas, muros de contención, limpieza de alcantarillas, rocería y estabilización de la rasante en vías terciarias se realiza de acuerdo con las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS y a los lineamientos de interventoría aplicados por el ICCU, garantizando el cumplimiento de los criterios técnicos, estructurales, hidráulicos y ambientales. Este seguimiento se apoya en un Plan de Inspección y Ensayos que permite verificar, de manera sistemática, la calidad de los materiales, los procesos constructivos y la correcta ejecución de cada actividad antes de su aceptación.

Para las alcantarillas y muros de contención, el control de calidad se enfoca en la verificación del diseño, alineación, cotas, pendientes y dimensiones, así como en la correcta ejecución de cimentaciones y drenajes. Se realizan ensayos de materiales (suelos, concretos y acero de refuerzo) donde aplique por tipo de obra, para controlar la compactación de rellenos y confirmar que las estructuras cumplan con las tolerancias y resistencias mínimas exigidas por el INVIAS, asegurando su estabilidad estructural y adecuado funcionamiento hidráulico.

En cuanto a la limpieza de alcantarillas y la rocería, el seguimiento de calidad se garantiza con la remoción total de sedimentos, residuos y vegetación que afecten el libre flujo del agua y la correcta ejecución de las obras. Estas actividades se ejecutan bajo criterios de manejo ambiental, dejando las áreas intervenidas en condiciones óptimas para la operación del drenaje y la posterior estabilización de la vía, con soporte documental mediante registros fotográficos.

Para la estabilización de la rasante con químico no convencional más cemento al 3 %, el control de calidad incluye los ensayos previos de caracterización del suelo, verificación de la dosificación y homogeneidad de la mezcla, control de la humedad y compactación según las especificaciones del proyecto, y ensayos de resistencia que confirmen la mejora de las propiedades mecánicas del suelo. El seguimiento adecuado de estas actividades asegura una rasante estable, durable y conforme a las normas vigentes, contribuyendo a la vida útil y desempeño estructural de la vía terciaria.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

La interventoría, en el seguimiento a la programación presentada por el contratista y a las visitas técnicas realizadas en obra, evidencia bajo rendimiento en la construcción de cunetas en el tramo de puerto Salgar por lo que se requiere al contratista mejorar estos rendimientos. En obra a la fecha continúan los bajos rendimientos en esta actividad una vez que dan inicio a las actividades de cunetas en el tramo de Pulí.

El contratista presenta programación semanal de obra según las actividades que programan para la semana.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

La interventoría reconoce una mejora progresiva en la calidad de los trabajos terminados en los diferentes frentes de obra; no obstante, reitera que es responsabilidad directa del contratista, a través de sus residentes de obra, velar de manera permanente porque las formaletas, moldes y demás elementos utilizados en el vaciado de concretos cumplan con un estándar de alta calidad, garantizando estabilidad, alineación, hermeticidad y adecuada resistencia durante el proceso de fundida.

El adecuado estado y correcta instalación de las formaletas es un proceso determinante para garantizar acabados homogéneos, dimensiones conforme a diseño, superficies sin segregaciones ni vacíos, y una correcta conformación de aristas y juntas. En este sentido, la interventoría enfatiza que previo a cada vaciado de concreto se debe verificar la limpieza, nivelación, rigidez y ajuste de las formaletas, así como la correcta ubicación del acero de refuerzo y de los elementos embebidos, con el fin de prevenir reprocesos y garantizar la durabilidad y calidad estructural de las obras ejecutadas.

Igualmente, se recuerda al contratista que el control de calidad no se limita al resultado final, sino que debe integrarse a todo el proceso constructivo, siendo indispensable la supervisión técnica continua por parte de los residentes, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las normas vigentes y las buenas prácticas de ingeniería en cada uno de los frentes de trabajo.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Velar por los correctos acabados de las obras hidráulicas y muros de contención en todos los tramos al igual que buenas prácticas ingenieriles en los procesos constructivos.	CONTRATISTA	INMEDIATO
Instalación de vallas informativas en los tramos de: Guayabal, San Juan de Río Seco, San francisco, Queda negra y Caparrapí		
Revisar formaletas ya onduladas para hacer su respectivo cambio.		
Velar porque la apertura de nuevos frentes de trabajo cumplan con el PMT		
Disponer en sitios autorizados los RCD provenientes de las excavaciones y demoliciones generales de obra.		
Informar a la interventoría sobre obras nuevas que se requieran en algún frente de obra antes de su ejecución, verificar el estado de las alcantarillas existentes antes de intervenirlas si están en buen estado y avisar a la interventoría.		
Contratación de nuevo personal para los frentes activos y los que se vayan a iniciar previo a la entrega de dotación completa a los trabajadores que vayan a iniciar actividades de obra.		

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	FECHA	viernes, 29 de mayo de 2026	SEMANA No.	58	DEL	22-may-26	AL	28-may-26

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Sin obras no previstas en la semana

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Como interventoría, y de acuerdo con el seguimiento realizado a las actividades de rocería, limpieza de alcantarillas existentes, conformación de la rasante y procesos previos de estabilización, se evidencia que los frentes de obra cuentan con las condiciones técnicas mínimas para dar continuidad a la ejecución del proyecto, en concordancia con las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS y los lineamientos aplicables del ICCU. Los trabajos ejecutados han permitido liberar las zonas de intervención, mejorar las condiciones de drenaje superficial y preparar la rasante para la construcción de obras hidráulicas.

El inicio de las obras de drenaje nuevas deberá estar acompañado de un control de calidad permanente, incluyendo registros en bitácora, ensayos de materiales y verificaciones previas al cierre de cada frente de trabajo. La correcta y oportuna construcción de las alcantarillas es importante para la durabilidad de la estabilización de la rasante y para el adecuado manejo de las aguas, mitigando riesgos de erosión, socavación y deterioro prematuro de la vía en los tramos intervenidos.

Se da apertura de otros frentes de trabajo (Caparrapí, guayabal de Síquima, san juan) con ello se tienen 8 frentes activos aunque algunos están en espera de inicio de la actividad de estabilización de la rasante. Lo cual permite avanzar en la ejecución general de obra, pero se le recuerda al contratista la importancia de estar pendiente de las fechas de inicio y fin de cada actividad acorde a la programación presentada ya que algunas actividades presentan atrasos en las fechas de inicio o fin.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

TRAMO VIAL No. 12 - CAPARRAPI CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS



Fecha:	
DEL 21 DE MAYO AL 28 DE MAYO 2026	La interventoría realiza seguimiento a la continuidad de la actividad de CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS en el tramo CAPARRAPI en las abscisa K0+450 con ello se pretende mejorar significativamente manejo de aguas de escorrentía de la vía.

TRAMO # 8 - BITUIMA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS



Fecha:	
DEL 21 DE MAYO AL 28 DE MAYO 2026	La interventoría realiza seguimiento a la continuidad de la actividad de CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS en el tramo BITUIMA en las abscisa K11+630 con ello se pretende mejorar significativamente manejo de aguas de escorrentía de la vía.

TRAMO # 11 - GUAYABAL DE SIQUIMA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS



Fecha:	
DEL 21 DE MAYO AL 28 DE MAYO 2026	La interventoría realiza seguimiento a la continuidad de la actividad de CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS en el tramo GUAYABAL DE SIQUIMA en las abscisa K0+090 Y K0+830 con ello se pretende mejorar significativamente manejo de aguas de escorrentía de la vía.

TRAMO VIAL No. 2 - PUERTO SALGAR CONSTRUCCIÓN CUNETAS ZONA LATERAL



Fecha:	
DEL 21 DE MAYO AL 28 DE MAYO 2026	La interventoría realiza seguimiento a la continuidad de la actividad de CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS en el tramo PUERTO SALGAR en las abscisa K2+220 LADO DERECHO, con ello se pretende mejorar significativamente manejo de aguas de escorrentía de la vía.

TRAMO VIAL No. 9 - PULÍ CONSTRUCCIÓN CUNETAS ZONA LATERAL



Fecha:	
DEL 21 DE MAYO AL 28 DE MAYO 2026	La interventoría realiza seguimiento a la continuidad de la actividad de CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS en el tramo PULÍ en la abscisa K1+260 LADO DERECHO, con ello se pretende mejorar significativamente manejo de aguas de escorrentía de la vía.

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	**FECHA**	viernes, 29 de mayo de 2026	**SEMANA No.**	**58**	DEL	**22-may-26**	AL	**28-may-26**

TRAMO VIAL No. 9 - PULÍ COLOCACIÓN CAPA DOBLE RIEGO



Fecha: DEL 21 DE MAYO AL 28 DE MAYO 2026	La interventoría realiza seguimiento a la continuidad de la actividad de COLOCACIÓN CAPA DOBLE RIEGO en el tramo PULÍ en la abscisa K4+030 PRIMERA CAPA, con ello se pretende mejorar significativamente la resistencia al deslizamiento entre las llantas del vehículo y la superficie de rasante de la vía estabilizada.

TRAMO VIAL No. 5 - SAN FRANCISCO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN



Fecha: DEL 21 DE MAYO AL 28 DE MAYO 2026	La interventoría realiza seguimiento a la continuidad de la actividad de CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN en el tramo SAN FRANCISCO en las abscisa K1+720 LADO DERECHO, con ello se pretende retener los movimientos horizontales de tierra en el sector intervenido.

TRAMO VIAL No. 10 - TRAMO DE SAN JUAN DE RIO SECO - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS



Fecha: DEL 21 DE MAYO AL 28 DE MAYO 2026	La interventoría realiza seguimiento a la continuidad de la actividad de CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS en el tramo de SAN JUAN DE RIO SECO en las abscisa K4+345, K4+850 Y K4+160 Y k2+165 con ello se pretende mejorar significativamente las zonas laterales de la vía y brindar mejor visibilidad a los actores viales.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS

CUADRO DE INVERSION

Semana	Periodo		Costo Prorroga 1	Costo acumulado	% Programado	% Prog. Acum.	Ejecutado	Ejecutado Acumulado	% Ejecutado	% Eject. Acum.	Avance/Atraso
1	10/4/2025	24/4/2025	$ 16.868.250,00	$ 16.868.250,00	0,06%	0,06%	$ 91.439.797,00	$ 91.439.797,00	0,32%	0,32%	0,26%
2	25/4/2025	1/5/2025	$ 68.449.370,01	$ 85.317.620,01	0,24%	0,30%	$ 81.159.080,00	$ 172.598.877,00	0,29%	0,61%	0,31%
3	2/5/2025	8/5/2025	$ 191.161.301,70	$ 276.478.921,71	0,68%	0,98%	$ 127.185.537,00	$ 299.784.414,00	0,45%	1,06%	0,08%
4	9/5/2025	15/5/2025	$ 63.125.743,41	$ 339.604.665,12	0,22%	1,20%	$ 71.817.843,00	$ 371.602.257,00	0,25%	1,32%	0,11%
5	16/5/2025	22/5/2025	$ 82.294.717,24	$ 421.899.382,36	0,29%	1,49%	$ 103.759.840,00	$ 475.362.097,00	0,37%	1,68%	0,19%
6	23/5/2025	29/5/2025	$ 101.343.461,40	$ 523.242.843,76	0,36%	1,85%	$ 167.233.472,00	$ 642.595.569,00	0,59%	2,28%	0,42%
7	30/5/2025	5/6/2025	$ 89.414.402,25	$ 612.657.246,01	0,32%	2,17%	$ 140.511.071,00	$ 783.106.640,00	0,50%	2,77%	0,60%
8	6/6/2025	12/6/2025	$ 204.167.602,60	$ 816.824.848,61	0,72%	2,89%	$ 261.452.674,00	$ 1.044.559.314,00	0,93%	3,70%	0,81%
9	13/6/2025	19/6/2025	$ 384.922.388,00	$ 1.201.747.236,61	1,36%	4,26%	$ 190.646.493,00	$ 1.235.205.807,00	0,68%	4,38%	0,12%
10	20/6/2025	26/6/2025	$ 448.579.069,60	$ 1.650.326.306,21	1,59%	5,85%	$ 364.396.781,00	$ 1.599.602.588,00	1,29%	5,67%	-0,18%
11	27/6/2025	3/7/2025	$ 459.489.054,00	$ 2.109.815.360,21	1,63%	7,48%	$ 175.955.572,00	$ 1.775.558.160,00	0,62%	6,29%	-1,18%
12	4/7/2025	10/7/2025	$ 393.108.861,80	$ 2.502.924.222,01	1,39%	8,87%	$ 64.787.310,00	$ 1.840.345.470,00	0,23%	6,52%	-2,35%
13	11/7/2025	17/7/2025	$ 95.606.262,36	$ 2.613.605.379,21	0,39%	9,26%	$ 161.933.333,33	$ 2.002.278.803,33	0,57%	7,10%	-2,17%
14	18/7/2025	24/7/2025	$ 110.681.157,20	$ 2.681.335.670,25	0,24%	9,50%	$ 221.879.026,67	$ 2.224.157.830,00	0,79%	7,88%	-1,62%
15	25/7/2025	31/7/2025	$ 67.730.291,04	$ 2.765.998.534,05	0,30%	9,80%	$ 167.151.410,24	$ 2.391.309.240,24	0,59%	8,47%	-1,33%
16	1/8/2025	7/8/2025	$ 84.662.863,80	$ 2.850.661.397,85	0,30%	10,10%	$ 213.671.312,72	$ 2.604.980.552,96	0,76%	9,23%	-0,87%
17	8/8/2025	14/8/2025	$ 86.918.043,89	$ 2.937.579.441,74	0,31%	10,41%	$ 176.002.745,70	$ 2.780.983.298,66	0,62%	9,85%	-0,55%
18	15/8/2025	21/8/2025	$ 149.431.743,90	$ 3.087.011.185,64	0,53%	10,94%	$ 173.032.639,80	$ 2.954.015.938,46	0,61%	10,47%	-0,47%
19	22/8/2025	28/8/2025	$ 201.840.043,00	$ 3.288.851.228,64	0,72%	11,65%	$ 203.012.304,48	$ 3.157.028.242,94	0,72%	11,19%	-0,47%
20	29/8/2025	4/9/2025	$ 269.707.194,30	$ 3.558.558.422,94	0,96%	12,61%	$ 150.237.157,00	$ 3.307.265.399,94	0,53%	11,72%	-0,89%
21	5/9/2025	11/9/2025	$ 246.173.261,80	$ 3.804.731.684,74	0,87%	13,48%	$ 204.936.373,01	$ 3.512.201.772,95	0,73%	12,45%	-1,04%
22	12/9/2025	18/9/2025	$ 193.053.246,90	$ 3.997.784.931,64	0,68%	14,17%	$ 160.045.700,36	$ 3.672.247.473,31	0,57%	13,01%	-1,15%
23	19/9/2025	25/9/2025	$ 357.637.844,90	$ 4.355.422.776,54	1,27%	15,43%	$ 192.513.940,91	$ 3.864.761.414,22	0,68%	13,69%	-1,74%
24	26/9/2025	2/10/2025	$ 473.856.126,20	$ 4.829.278.902,74	1,68%	17,11%	$ 69.018.337,10	$ 3.933.779.751,32	0,24%	13,94%	-3,17%
25	3/10/2025	9/10/2025	$ 699.857.151,20	$ 5.529.136.053,94	2,48%	19,59%	$ 143.100.230,36	$ 4.076.879.981,67	0,51%	14,45%	-5,15%
26	10/10/2025	16/10/2025	$ 602.671.319,90	$ 6.131.807.373,84	2,14%	21,73%	$ 70.185.829,64	$ 4.147.065.811,32	0,25%	14,69%	-7,03%
27	17/10/2025	23/10/2025	$ 465.564.507,40	$ 6.597.371.881,24	1,65%	23,38%	$ 72.608.062,60	$ 4.219.673.873,92	0,26%	14,95%	-8,43%
28	24/10/2025	30/10/2025	$ 413.777.200,20	$ 7.011.149.081,44	1,47%	24,84%	$ 109.641.713,36	$ 4.329.315.587,27	0,39%	15,34%	-9,50%
29	31/10/2025	6/11/2025	$ 1.885.899.453,00	$ 8.897.048.534,44	6,68%	31,53%	$ 327.495.481,74	$ 4.656.811.069,02	1,16%	16,50%	-15,03%
30	7/11/2025	13/11/2025	$ 2.803.528.856,00	$ 11.700.577.390,44	9,93%	41,46%	$ 337.699.228,90	$ 4.994.510.297,92	1,20%	17,70%	-23,76%
31	14/11/2025	20/11/2025	$ 2.767.011.783,00	$ 14.467.589.173,44	9,80%	51,27%	$ 208.617.682,49	$ 5.203.127.980,41	0,74%	18,44%	-32,83%
32	21/11/2025	27/11/2025	$ 2.761.779.440,00	$ 17.229.368.613,44	9,79%	61,05%	$ 187.790.939,87	$ 5.390.918.920,28	0,67%	19,10%	-41,95%
Reprogramacion de obra de acuerdo a la prorroga no.1											
33	28/11/2025	4/12/2025	$ 208.841.471,90	$ 5.599.760.392,18	0,74%	19,84%	$ 468.296.372,77	$ 5.859.215.293,05	1,66%	20,76%	0,92%
34	5/12/2025	11/12/2025	$ 215.609.758,32	$ 5.815.370.150,50	0,76%	20,61%	$ 272.991.495,58	$ 6.132.206.788,62	0,97%	21,73%	1,12%
35	12/12/2025	18/12/2025	$ 192.356.787,14	$ 6.007.726.937,64	0,68%	21,29%	$ 209.046.355,70	$ 6.341.253.144,32	0,74%	22,47%	1,18%
36	19/12/2025	25/12/2025	$ 243.724.112,09	$ 6.251.451.049,73	0,86%	22,15%	$ 318.983.485,78	$ 6.660.236.630,11	1,13%	23,60%	1,45%
37	26/12/2025	1/1/2026	$ -	$ 6.251.451.049,73	0,00%	22,15%	$ 324.152.822,62	$ 6.984.389.452,73	1,15%	24,75%	2,60%
38	2/1/2026	8/1/2026	$ 135.511.631,63	$ 6.386.962.681,36	0,48%	22,63%	$ 94.582.720,82	$ 7.078.972.173,55	0,34%	25,08%	2,45%
39	9/1/2026	15/1/2026	$ 135.626.494,97	$ 6.522.589.176,33	0,48%	23,11%	$ 254.099.984,49	$ 7.333.072.158,03	0,90%	25,98%	2,87%
40	16/1/2026	22/1/2026	$ 73.709.185,19	$ 6.596.298.361,52	0,26%	23,37%	$ 215.549.921,95	$ 7.548.622.079,99	0,76%	26,75%	3,37%
41	23/1/2026	29/1/2026	$ 235.403.863,69	$ 6.831.702.225,21	0,83%	24,21%	$ 274.665.074,76	$ 7.823.287.154,75	0,97%	27,72%	3,51%
42	30/1/2026	5/2/2026	$ 182.299.169,51	$ 7.014.001.394,72	0,65%	24,85%	$ 216.841.751,08	$ 8.040.128.905,84	0,77%	28,49%	3,64%
43	6/2/2026	12/2/2026	$ 278.665.526,53	$ 7.292.666.921,25	0,99%	25,84%	$ 242.803.600,00	$ 8.282.932.505,84	0,86%	29,35%	3,51%

Semana	Periodo		Costo Prorroga 1	Costo acumulado	% Programado	% Prog. Acum.	Ejecutado	Ejecutado Acumulado	% Ejecutado	% Eject. Acum.	Avance/Atraso
44	13/2/2026	19/2/2026	$ 298.105.984,59	$ 7.590.772.905,84	1,06%	26,90%	$ 232.252.064,64	$ 8.515.184.570,48	0,82%	30,17%	3,28%
45	20/2/2026	26/2/2026	$ 224.174.524,49	$ 7.814.947.430,33	0,79%	27,69%	$ 338.506.694,54	$ 8.853.691.265,02	1,20%	31,37%	3,68%
46	27/2/2026	5/3/2026	$ 294.849.650,77	$ 8.109.797.081,10	1,04%	28,74%	$ 306.891.010,11	$ 9.160.582.275,13	1,09%	32,46%	3,72%
47	6/3/2026	12/3/2026	$ 84.791.068,43	$ 8.194.588.149,53	0,30%	29,04%	$ 61.739.747,46	$ 9.222.322.022,59	0,22%	32,68%	3,64%
48	13/3/2026	19/3/2026	$ 217.098.782,78	$ 8.411.686.932,31	0,77%	29,81%	$ 79.731.352,59	$ 9.302.053.375,18	0,28%	32,96%	3,15%
49	20/3/2026	26/3/2026	$ 551.465.363,70	$ 8.963.152.296,01	1,95%	31,76%	$ 147.852.714,37	$ 9.449.906.089,55	0,52%	33,49%	1,72%
50	27/3/2026	2/4/2026	$ 564.111.304,90	$ 9.527.263.600,91	2,00%	33,76%	$ -	$ 9.449.906.089,55	0,00%	33,49%	-0,27%
51	3/4/2026	9/4/2026	$ 516.217.665,22	$ 10.043.481.266,13	1,83%	35,59%	$ 674.335.151,23	$ 10.124.241.240,79	2,39%	35,87%	0,29%
52	10/4/2026	16/4/2026	$ 445.993.519,23	$ 10.489.474.785,36	1,58%	37,17%	$ 149.353.300,45	$ 10.273.594.541,24	0,53%	36,40%	-0,76%
53	17/4/2026	23/4/2026	$ 168.318.493,01	$ 10.657.793.278,37	0,60%	37,77%	$ 71.713.577,73	$ 10.345.308.118,97	0,25%	36,66%	-1,11%
54	24/4/2026	30/4/2026	$ 266.759.629,06	$ 10.924.552.907,43	0,95%	38,71%	$ 163.179.928,46	$ 10.508.488.047,43	0,58%	37,24%	-1,47%
55	1/5/2026	7/5/2026	$ 1.177.484.921,29	$ 12.102.037.828,72	4,17%	42,88%	$ 24.860.972,09	$ 10.533.349.019,51	0,09%	37,32%	-5,56%
56	8/5/2026	14/5/2026	$ 1.791.076.488,91	$ 13.893.114.317,63	6,35%	49,23%	$ 95.003.387,53	$ 10.628.352.407,04	0,34%	37,66%	-11,57%
57	15/5/2026	21/5/2026	$ 2.001.970.807,87	$ 15.895.085.125,50	7,09%	56,32%	$ 75.414.159,71	$ 10.703.766.566,75	0,27%	37,93%	-18,40%
58	22/5/2026	28/5/2026	$ 1.951.889.870,71	$ 17.846.974.996,21	6,92%	63,24%	$ 114.221.919,55	$ 10.817.988.486,30	0,40%	38,33%	-24,91%
59	29/5/2026	4/6/2026	$ 2.116.271.984,50	$ 19.963.246.980,71	7,50%	70,74%					
60	5/6/2026	11/6/2026	$ 2.290.511.135,64	$ 22.253.758.116,35	8,12%	78,86%					
61	12/6/2026	18/6/2026	$ 2.513.792.052,05	$ 24.767.550.168,40	8,91%	87,76%					
62	19/6/2026	25/6/2026	$ 1.300.603.051,26	$ 26.068.153.219,66	4,61%	92,37%					
63	26/6/2026	30/6/2026	$ 2.152.801.379,28	$ 28.220.954.598,94	7,63%	100,00%					

CUADRO SEGUIMIENTO DE OBRA POR PROVINCIA

		MAG CENTRO			GUIALIVA			BAJO MAG				S58		
ACTIVIDAD	UND	CANT.	VALOR UNT	TOTAL	CANT.	VALOR UNT	TOTAL	CANT.	VALOR UNT	TOTAL		MAG CENTRO	GUIALIVA	BAJO MAG
PRELIMINARES				**$ 192.378.600,00**			**$ 183.358.000,00**			**$ 167.582.000,00**		**$ -**	**$ -**	**$ -**
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	106877,00	$ 1.800,00	$ 192.378.600,00	91679,00	$ 2.000,00	$ 183.358.000,00	83791,00	$ 2.000,00	$ 167.582.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA				**$ 203.110.000,00**			**$ 179.413.000,00**			**$ 113.588.000,00**		**$ 12.793.750,00**	**$ 5.508.000,00**	**$ 5.535.300,00**
AFIRMADO	M3	345	$ 90.000,00	$ 31.050.000,00	336	$ 115.000,00	$ 38.640.000,00	131	$ 200.000,00	$ 26.200.000,00	CANT	14,34	0	15,9
											$	$ 1.290.600,00	$ -	$ 3.180.000,00
DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	245	$ 225.000,00	$ 55.125.000,00	175	$ 255.000,00	$ 44.625.000,00	87	$ 225.000,00	$ 19.575.000,00	CANT	12,4	0	0
											$	$ 2.790.000,00	$ -	$ -
REMOCION DE ALCANTARILLAS	M	140	$ 90.000,00	$ 12.600.000,00	100	$ 85.000,00	$ 8.500.000,00	50	$ 90.000,00	$ 4.500.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	761	$ 75.000,00	$ 57.075.000,00	615	$ 78.000,00	$ 47.970.000,00	433	$ 75.000,00	$ 32.475.000,00	CANT	94,37	0	15,9
											$	$ 7.077.750,00	$ -	$ 1.192.500,00
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1390	$ 34.000,00	$ 47.260.000,00	1167	$ 34.000,00	$ 39.678.000,00	907	$ 34.000,00	$ 30.838.000,00	CANT	48,1	162	34,2
											$	$ 1.635.400,00	$ 5.508.000,00	$ 1.162.800,00
MANTENIMIENTO RASANTE				**$ 8.034.762.500,00**			**$ 5.181.768.000,00**			**$ 4.931.491.000,00**		**$ -**	**$ -**	**$ -**
CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y Organosilanos para suelo in situ)	M3	2341	$ 260.000,00	$ 608.660.000,00	1896	$ 260.000,00	$ 492.960.000,00	1342	$ 265.000,00	$ 355.630.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	35109	$ 31.000,00	$ 1.088.379.000,00	28440	$ 31.000,00	$ 881.640.000,00	20128	$ 35.000,00	$ 704.480.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
ALCANTARILLAS				**$ 2.075.227.500,00**			**$ 1.638.073.600,00**			**$ 1.101.892.000,00**		**$ 6.737.900,00**	**$ -**	**$ 22.289.200,00**
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	150	$ 850.000,00	$ 127.500.000,00	107	$ 1.000.000,00	$ 107.000.000,00	54	$ 1.100.000,00	$ 59.400.000,00	CANT	1,3	0	1,6
											$	$ 1.105.000,00	$ -	$ 1.760.000,00
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	94	$ 1.080.000,00	$ 101.520.000,00	67	$ 1.100.000,00	$ 73.700.000,00	34	$ 1.300.000,00	$ 44.200.000,00	CANT	0	0	1,6
											$	$ -	$ -	$ 2.080.000,00
CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	139	$ 610.000,00	$ 84.790.000,00	99	$ 630.000,00	$ 62.370.000,00	50	$ 800.000,00	$ 40.000.000,00	CANT	5,59	0	3,5
											$	$ 3.409.900,00	$ -	$ 2.800.000,00
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	29459	$ 9.500,00	$ 279.860.500,00	21042	$ 9.300,00	$ 195.690.600,00	10521	$ 11.000,00	$ 115.731.000,00	CANT	234	0	480
											$	$ 2.223.000,00	$ -	$ 5.280.000,00
RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	369	$ 90.000,00	$ 33.210.000,00	263	$ 135.000,00	$ 35.505.000,00	132	$ 228.000,00	$ 30.096.000,00	CANT	0	0	16,4
											$	$ -	$ -	$ 3.739.200,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	140	$ 1.000.000,00	$ 140.000.000,00	100	$ 1.020.000,00	$ 102.000.000,00	50	$ 1.105.000,00	$ 55.250.000,00	CANT	0	0	6
											$	$ -	$ -	$ 6.630.000,00
CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM	M	29880	$ 42.000,00	$ 1.254.960.000,00	24204	$ 42.000,00	$ 1.016.568.000,00	17130	$ 42.000,00	$ 719.460.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	20	$ 965.000,00	$ 19.300.000,00	16	$ 965.000,00	$ 15.440.000,00	11	$ 955.000,00	$ 10.505.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	29	$ 290.000,00	$ 8.410.000,00	20	$ 275.000,00	$ 5.500.000,00	10	$ 295.000,00	$ 2.950.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	8100	$ 3.170,00	$ 25.677.000,00	8100	$ 3.000,00	$ 24.300.000,00	8100	$ 3.000,00	$ 24.300.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
MUROS				**$ 218.476.000,00**			**$ 214.267.000,00**			**$ 230.125.000,00**		**$ -**	**$ 26.940.900,00**	**$ -**
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	57	$ 930.000,00	$ 53.010.000,00	53	$ 1.000.000,00	$ 53.000.000,00	49	$ 1.000.000,00	$ 49.000.000,00	CANT	0	11,49	0
											$	$ -	$ 11.490.000,00	$ -
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	57	$ 1.050.000,00	$ 59.850.000,00	53	$ 1.100.000,00	$ 58.300.000,00	49	$ 1.250.000,00	$ 61.250.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -

		MAG CENTRO			GUIALIVA			BAJO MAG				S58		
ACTIVIDAD	UND	CANT.	VALOR UNT	TOTAL	CANT.	VALOR UNT	TOTAL	CANT.	VALOR UNT	TOTAL		MAG CENTRO	GUIALIVA	BAJO MAG
CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	10	$ 600.000,00	$ 6.000.000,00	9	$ 630.000,00	$ 5.670.000,00	8	$ 800.000,00	$ 6.400.000,00	CANT	0	2,53	0
											$	$ -	$ 1.593.900,00	$ -
RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	158	$ 92.000,00	$ 14.536.000,00	145	$ 140.000,00	$ 20.300.000,00	135	$ 215.000,00	$ 29.025.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	10	$ 125.000,00	$ 1.250.000,00	9	$ 200.000,00	$ 1.800.000,00	8	$ 290.000,00	$ 2.320.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	139	$ 16.000,00	$ 2.224.000,00	128	$ 16.000,00	$ 2.048.000,00	119	$ 15.000,00	$ 1.785.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	82	$ 54.000,00	$ 4.428.000,00	75	$ 54.000,00	$ 4.050.000,00	70	$ 58.000,00	$ 4.060.000,00	CANT	0	0	0
											$	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8124	$ 9.500,00	$ 77.178.000,00	7430	$ 9.300,00	$ 69.099.000,00	6935	$ 11.000,00	$ 76.285.000,00	CANT	0	1490	0
											$	$ -	$ 13.857.000,00	$ -
ITEMS NO PREVISTOS												**$ 10.260.000,00**	**$ -**	**$ 13.002.000,00**
CUNETA EN SUELO ESTABILIZADO			$ 57.000,00									180	0	140
												$ 10.260.000,00	$ -	$ 7.980.000,00
CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE			$ 1.674,00									0	0	3000
												$ -	$ -	$ 5.022.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN POLIETILENO DIAMETRO 36"			$ 1.151.523,00									0	0	0
												$ -	$ -	$ -
TOTAL X PROVINCIA				**$ 10.723.954.600,00**			**$ 7.396.879.600,00**			**$ 6.544.678.000,00**		**$ 29.791.650,00**	**$ 32.448.900,00**	**$ 40.826.500,00**
CARACTERIZACIÓN	$ 2.502.924.222,00													
PMT	$ 333.650.000,00											$ 926.895,38	$ 1.463.667,93	$ 2.081.349,41
PAGA	$ 526.868.177,00											$ 1.463.664,56	$ 2.311.284,45	$ 2.908.007,81
PROVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN COSTOS EN INSUMOS	$ 192.000.000,00													
TOTAL OBRA	**$ 28.220.954.599,00**											**$ 114.221.919,55**		

REPORTE DE LLUVIAS

PROYECTO: LOTE 4: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATO No.: ICCU-141 de 2025

PERIODO: DEL 22 AL 28 MAYO DEL 2026

CONTRATISTA: CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024

INTERVENTORIA: CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI

CONTROL DE LLUVIAS PROVINCIA DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA - MAYO 2026

PROVINCIA	MUNICIPIO	FECHA	HORARIO		CANTIDAD HORAS LLUVIA	OBSERVACION
			INICIAL	FINAL		
BAJO MAGDALENA	CAPARRAPI					
		TOTAL HORAS LLUVIAS CAPARRAPI			0:00:00	
	PUERTO SALGAR				00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS PTO SALGAR			0:00:00	
TOTAL LLUVIAS BAJO MAGDALENA					0:00:00	
GUALIVA	ALBAN				00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS ALBAN			0:00:00	
	QUEBRADA-NEGRA				00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS QUEBRADANEGRA			0:00:00	
	SAN FRANCISCO	26/5/2026	12:00 p.m.	3:00 p.m.	03:00:00	Lluvia ligera
		27/5/2026	2:00 p.m.	5:00 p.m.	03:00:00	Lluvia ligera
		TOTAL HORAS LLUVIAS SAN FRANCISCO			3:00:00	
	SASAIMA				00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS SASAIMA			0:00:00	
TOTAL LLUVIAS GUALIVA					3:00:00	
MAGDALENA CENTRO	BELTRAN				00:00:00	
					00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS BELTRAN			0:00:00	
	BITUIMA				00:00:00	
					00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS BITUIMA			0:00:00	
	PULI				00:00:00	
					00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS PULI			0:00:00	
	SAN JUAN DE RIOSECO				00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS SAN JUAN DE RIOSECO			0:00:00	
	GUAYABAL DE SIQUIMA				00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS GUAYABAL			0:00:00	
	VIANI				00:00:00	
					00:00:00	
					00:00:00	
		TOTAL HORAS LLUVIAS VIANI			0:00:00	
TOTAL LLUVIAS MAGDALENA CENTRO					0:00:00	
TOTAL LLUVIAS TRAMOS CONTRATO No.: ICCU-141 de 2025					3:00:00	

RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
NOMBRE : ANIBAL CASTRO

RESIDENTE INTERVENTORIA
NOMBRE : ALIDA GUERRA MONTAÑEZ

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD		GPS-533-02	V.1. Fecha Modifificación28.02.2025
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL			
Contrato No.:	ICCU-141-DE 2025	**HORA INICIO:** 09:00A.M	**Hoja**
FECHA:	27 De Mayo 2026	**HORA DE FINALIZACIÓN:** 12:30 P.M	**Acta N° 1**

PROYECTO:INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 4

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación, Introducción y Bienvenida

2. Presentación programa Caminos Vecinales y Proceso de elección tramo Reines

3. Avances En La Rehabilitación

4. Componente Gestión Social

5. Componente Ambiental

6. Area SST

5. Espacio Para Inquietudes

6. Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En el marco del proyecto de intervención de vías que conforman el Programa de Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse en la Provincia de Bajo Magdalena, en el Departamento de Cundinamarca y atendiendo la solicitud de la comunidad se realiza la presente reunión.
Durante el presente espacio se contó con el acompañamiento de la ingeniera Estefania Hernández Vargas Supervisora del contrato ICCU, equipo profesional del Consorcio Caminos ICCU 2024 (CONTRATISTA) y del Consorcio Caminos Vecinales CCI (INTERVENTORIA) así como la presencia en este espacio del secretario de Infraestructura y Obras Públicas del municipio de San Juan De Rioseco y de la Señora Alcaldesa municipal de San Juan De Rioseco Erika Gonzalez. El presente espacio tiene el objetivo de informar las principales características del contrato y los avances por componentes técnicos, sociales y ambientales del proyecto, con el siguiente orden del día:

1. Presentación, Introducción y Bienvenida

•CONTRATO DE OBRA ICCU - 141 DE 2025 "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DEL MAGDALENA CENTRO, GUALIVÁ Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 4"

•CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU - 221 DE 2025
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

•PROFESIONALES ICCU (SUPERVISIÓN)
Supervisión ICCU contrato 221 2025 y Gestora contrato 141 2025 : Ing. Estefania Hernández Vargas
Apoyo a la Supervisión: Ing. Isabel Hernández
Profesional Gestión Ambiental: Ing. Andrés Tolosa
Profesional Social: Alexandra Martínez

•Presentación del contratista.

CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024
No de contrato: ICCU – 141 – 2025
Fecha Acta de inicio: 10 abril 2025
Fecha inicial de finalización: 31 de Diciembre 2025
Fecha programada de finalización: 30 de Junio 2026

•PROFESIONALES CONTRATISTA

Director de Obra: Ing. Anibal Castro – Ing. Jorge González
Profesional Gestión Social: T.S Natalia Moreno Quiroga
Residente: Carlos Lopez Profesionales Ambientales: Ing. Olga Moreno – Ing. Valentina Rodríguez
Profesional SST: Tatiana Martínez

•Presentación del interventor.

CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI
No de contrato: ICCU – 221 DE 2025
Fecha acta de inicio: 10 de abril 2025
Fecha inicial de finalización: 31 de diciembre 2025
Fecha programada de finalización: 15 de julio 2026

•PROFESIONALES INTERVENTORIA
Director de interventoría: Ing. Jorge Velásquez
Residentes: Ing. Alida Guerra – Ing. Nelson Borja
Profesionales sociales: T.S Milena Sánchez – T.S Stefany Guerra
Profesional Ambiental: Ing. Myriam Sánchez
Profesional SST: Ing. Daniel Velásquez

2.Presentación programa Caminos Vecinales y Proceso de elección tramo Molinos

El Programa: Caminos Vecinales "Caminos para Quedarse ", se ejecuta bajo la Meta 287 del Plan de Desarrollo de Cundinamarca "Gobernando: más que un plan 2024 – 2028".

CONTRATACIÓN $ 145.754.264.599,00 (13 provincias = 44 corredores viales)
ICCU-141 de 2025 e ICCU-221 de 2025 $ 32.086.429.219,00 3 – Provincias 12 corredores viales Contar con:

INVERSION PARA EL MUNICIPIO

FORMATO	GPS-533-02	V.1. Fecha Modifificación28.02.2025
ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD		
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL		

Contrato No.:	ICCU-141-DE 2025	**HORA INICIO:**	09:00A.M	**Hoja**
FECHA:	27 De Mayo 2026	**HORA DE FINALIZACIÓN**:	12:30 P.M	**Acta N° 1**

PROYECTO:INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 4

Valor de la obra: $ 2.777.891.854
Valor Caracterización: $ 286.566.552
Valor PMT: $38.200.489
Valor PAGA: $60.322.560
INVERSIÓN TOTAL: $3.162.981.455

- Ease II de caracterización “Culminación"
- Diseño de formula de trabajo y diseño de estructuras estabilizadas
- Costo asociado a la implementación en campo alcance real de la intervención física
- Plan de contingencia programa "caminos vecinales – caminos para quedarse"
- Trabajo articulado entre ICCU, Alcaldía municipal y Comunidad
- Oportunidad: Formula de trabajo definitiva
- Idoneidad profesional
- Maquinaria e insumos – Instituciones
- Apoyo de las comunidades

3.Avances en el mejoramiento de la via

LIMPIEZA ALCANTARILLAS

1	K0+760	5	K3+550	9	K4+070	13	K5+250	17	K7+770	21	K5+420
2	K3+240	6	K3+650	10	K4+070	14	K9+430	18	K7+720	22	K6+830
3	K3+300	7	K4+010	11	K4+640	15	K8+200	19	K6+990	23	K5+920
4	K3+430	8	K4+070	12	K4+920	16	K8+660	20	K4+340	24	K6+530

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS

1	K4+160	3	K4+850	5	K6+700
2	K4+345	4	K6+590	6	K6+910

MURO DE CONTENCIÓN

1	K1+050	Long 10 Mt
2	K1+370	Long 10 Mt
3	K1+880	Long 10 Mt
4	K4+160	Long 15 Mt

Actividades en ejecución

Excavación e instalación tuberias K4+850 Y K6+590

Tramo a estabilizar

Longitud total a estabilizar	4,83
Ancho promedio de via	4

4.Componente Gestión Social

Actas de vecindad de Inicio: 13 de Marzo 2026
Piezas comunicativas: Cierres de vía, inicios de obra, levantamiento de actas de vecindad, Reuniones.
Conformación Comité De Participación Comunitaria: 16 de Septiembre 2025
Comité de Participación Comunitaria CPC: 27 de Mayo 2026 (Encuentros mensuales con los integrantes para entregar avances de las obras y conocer las quejas, inquietudes, felicitaciones o solicitudes referentes al programa).

5.Componente Gestión Ambiental

CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL
Está conformado desde el primer mes de ejecución de actividades, integrado por:
- Residente ambiental
- Profesional ambiental
- Residente de obra
- Maestro de obra
- Auxiliar de obra

El grupo se reúne de manera mensual, donde se verifica el cumplimiento de las acciones contempladas en cada uno de los programas
CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONA DE OBRA
- Se realiza de manera mensual
- Se tiene cronograma establecido desde el inicio del proyecto.

Entrega de Residuos sólidos ordinarios y convencionales a la empresa de servicios Públicos de Viani EMSERVIANI. El cual se paga facturación mensual y entregan respectivo certificado. NO SE HA REQUERIDO LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

6.Area SST

FORMATO	GPS-533-02	V.1. Fecha Modifificación28.02.2025
ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD		
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL		

Contrato No.:	ICCU-141-DE 2025	**HORA INICIO:**	09:00A.M	**Hoja**
FECHA:	27 De Mayo 2026	**HORA DE FINALIZACIÓN**:	12:30 P.M	**Acta N° 1**

PROYECTO:INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 4


Entrega de dotación: Se ha gestionado y entregado la entrega de EPP relacionados con las actividades ejecutadas en el tramo San Juan De Rioseco.
Hidratación: Suministro a frente de obra hidratación (agua) 4 bolsas de 6 litros Y/o 6 pacas de 30 unidades individuales.
Pausas Activas: se implemento el programa de pausas activas esto en aras de fomentar la salud física y mental
Charlas 5 Minutos: Uso de EPP, Manejo de Herramientas manuales, Procedimientos, Manejo de químicos (hoja de seguridad), Cuidado de Manos, Golpes de Calor y Caídas a Nivel.
Señalizaciones: Se realizó la Instalación de señalización en las áreas de trabajo Señalizaciones Señales de Prohibición Señales de Advertencia o Peligro (Amarillo) como maquinaria amarilla entre otros, Señales de Obligación (Azul) como uso de EPP, Señales de Salvamento, Auxilio o Información (Verde) como camillas, extintores.
PMT: Durante la ejecución del proyecto en el tramo de puerto salgar se realizó la implementación del plan manejo de tráfico (PMT) en vías terciarias, tal como lo indica la norma. Se implemento de la siguiente manera:
Utilización de maletines y colombinas, cinta de peligro alrededor de las excavaciones y/o muros de contención, instalación de Latas a cada 100 mts (hombres trabajando, velocidad máxima 30, reducción de calzada, inicio y fin de obra, maquinaria en la vía.)
Para la estabilización del tramo se realizó el cierre total de la vía y con esto se implementó controladores de tráfico a cada extremo de la vía debidamente dotadas (radios de comunicación entre otros).
Actividades de Seguridad (inspecciones y/o preoperacionales para maquinaria amarilla en obra).
Mediante el formato de preoperacionales aplicado o realizado cada 8 días a la maquinaria se lograba identificar el estado de la maquinaria en campo, asegurando que estuviese en condiciones optimas para operar sin riesgos.
A su vez también se implemento el programa de inspecciones, aplicados en el tramo a las herramientas eléctricas, herramientas manuales entre otras.
Entrega de implementos de Emergencia: se hizo entrega al tramo de un botiquín tipo A, un extintor multipropósito y una camilla con inmovilizadores, acompañado de capacitaciones en primeros auxilios, manejo de extintores, traslados de pacientes entre otros.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Durante El espacio de sugerencias los asistentes expresan:
La Sra alcaldesa municipal Erika González; agradece la participación de la comunidad en este espacio, el acompañamiento de la supervisora del contrato delegada del ICCU y al contratista por la presentación realizada de manera aterrizada en el municipio de San Juan De Rioseco.
Seguidamente, el Señor Alvaro Enrique Castillo pregunta que quisiera saber de que punto a que punto se realizó la caracterización, también desea conocer los puntos críticos a intervenir, que van a hacer con los tubos de las alcantarillas que fueron extraídos para la construcción de las alcantarillas.
El director de Obra Ingeniero Anibal Castro contesta, que se realizó estudios geotécnicos y se ubicó 4 puntos crítico. Encontrando la necesidad de construir muros de contención en puntos críticos obteniendo para este tramo 4,830 mts sin incluir placa huellas.
Durante el espacio de reunión se realiza entrega de manera física del presupuesto correspondiente al tramo, así como la línea de avance del proyecto.
La supervisora del contrato la Ingeniera Estefanía Hernández indica a los asistentes que desde la entidad (ICCU) tienen el compromiso para realizar el arreglo de las vías en los tramos que debido a la reducción por los imprevistos presentados no se alcanzan a estabilizar, este ejercicio indica se realizará con la maquinaria amarilla de la entidad.
Dentro del espacio, se comparte con los asistentes pieza comunicativa referente a información para la atención al usuario (teléfono y correo electrónico) al cual pueden realizar las solicitudes, quejas, inquietudes referentes al proyecto.
Se finaliza espacio de reunión sin novedades.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Acudir al contratista cuando se tengan dudas referentes al proyecto	Comunidad	Durante la ejecución del proyecto

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Natalia Moreno Quiroga	Natalia Moreno Quiroga	Milena Sanchez
CARGO	Profesional Social Contratista	Profesional Social Contratista	Profesional Social Interventoria
FIRMA			

ANEXOS:	**SI: X**	**NO**	**TIPO DE ANEXO: REGISTRO FOTOGRAFICO / LISTADO DE ASISTENCIA**	**CANTIDAD: 3**

FORMATO	GPS-533-12	V.1. Fecha Modifificación28.02.2025
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL		

FECHA: 27 DE MAYO 2026

TEMA: REUNIÓN SAN JUAN DE RIOSECO









FORMATO	GPS-SST-04	V.1. Fecha Modificación 28.02.2025
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES	ICCU	CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL		

FECHA: 27-5-2026 TEMA: Reunión Socialización

LUGAR: Vereda Libertad - San Juan

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	TELÉFONO FIJO O CELULAR	VEREDA/CORREGIMIENTO/CENTRO POBLADO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		3162711	JOSE GABRIEL SARMIENTO	LA LIBERTAD	324 964 46 39	LA LIBERTAD		JOSE SARMIENTO
2		3162969	Eldevento Serrucho	la Libertad.	3114842919	la libertad.		Eldevento Serrucho
3		79207534	Jesus A Sarmiento	la libertad.	3			
4		80402111	Luis Eduardo B	Sanisidro	3025549670	Sanisidro		
5		1069432766	Joseph Sosa	San isidro	3223697707	San isidro		
6		1.069.432.209	ALEJANDRO RUIZ C	LA LIBERTAD	302 554 98 76	LA LIBERTAD	alejadro.ruiz66@6:	
7		1.000731527	Jose Francisco	La libertad	302 127 6426	La liberta	francisco.sarmiento.2003@gmail.com	
8		79424995	Jhon Jairo Tri	Libertad	3218062774	Libertad		
9		2090563	Ismania Cirdoba	Libertad	3143227260	Libertad	Ismaniacerdoba@...com	Ismania Cerdoba
10		20804649	Sandra P Peña Cha	Olivos Altos	3133022616	Olivos	Penachasandra1@gmail.com	Sandra Peña
11		51.725.731	Gloria E Reyes S	olivos Altos	3167517829	olivos	gloriaes63@gmail.com	gloria Reyes S.
12			Dario Eliecer Ba	San Isidro	3026184578	San isidro		
13		1003496.172	Angela M Barbosa C	La Libertad	3025550284	La Libertad	ab1495116@gmail.com	Angela Barbosa
14		3.161.508	Pedro A Romero Hun	Olivos Altos	324 812 27 11	Olivos Altos		
15		3.143.019	Jesus A. Calderon	Olivos Alto	3025550118	olivos Alto		

GPS-533-04	V.1. Fecha Modificación 28.02.2025

FORMATO

FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL

FECHA: 27-05-2026 | TEMA: Reunión San Juan

LUGAR: Vereda libertad

No	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	TELÉFONO FIJO O CELULAR	VEREDA/CORREGIMIENTO/CENTRO POBLADO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		1925446[illegible]	[illegible]	Olivo Alto	3125519424		[illegible]	
2		41[illegible]30462	Elena Lozado	olivos Alto	3237162443	olivos		
3		3145935	Gabriel Zapata	Sanisidro	3029554692	Sanisidro		
4		79482666	William Ramirez	Libertad	302 6738067	Libertad		
5		1.062.906458	Kelly Illeros	Libertad	3115900458	Libertad		Kelly Yalitza
6	CC	3158551	Daniel Martinez Bulla	Planeacion alcaldia San Juan Ruiseñor	3144418415	Alcaldia	Planeacion@sanjuanruiseñor.gov.co	
7		35'535491	ERIKA GONZALEZ	ALCALDIA	3102332776	ALCALDIA		
8		1014199303	Nieves S. Guerra M	Interventoria	3001272687	Consorcio Caminos.		
9		80048059	Cador A. Lopez	Contratista	3102928614	Consorcio Caminos		
10		9659283	NELSON BORJA	INTERVENTOR	3007915030	N/A	—	
11	Cc	1.05[illegible]7	Tatiana [illegible]	Contratista.	3213549183.	— . —	— . —	
12	Cc	10142794439	Valentina Rodriguez	Contratista. Amb.	3166022110	consorcio caminos ICCU 2024		
13	Cc	1003496518	Juan Diego Amado Quevedo	Contratista SST/Amb	3125593045	Consorcio Caminos		Juan Diego Amado Q.
14	CC	2477782	Misael Diaz	sanisidro	3028000777	Sanisidro		
15	CC	1131110326	Fabian Sneyder DIAZR	San Isidro	3204431474	San Isidro	Fsneyderd@hotmail.com	Fabian Sneyder Diaz

FORMATO		GPS-533-04	V.1. Fecha Modificación 28.10.2025
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES			
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL			

FECHA: TEMA: Reunión San Juan

LUGAR: 27-05-2026 - Vereda Libertad

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	TELÉFONO FIJO O CELULAR	VEREDA/CORREGIMIENTO/CENTRO POBLADO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		7.169.943	Jose Anibal Castro	Comerciante	3128962498		clnscastro@gmail.com	
2		1070613988	Natalia Moreno	Contratista	3194233221	Viani		
3		1026601907	Estefania Hernandez	ICCU	3213979726			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

FORMATO

FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL

GPS-SSY-04 | V.1. Fecha Modificación 28.02.2025

FECHA

LUGAR

TEMA

No.	C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	TELÉFONO FIJO O CELULAR	VEREDA/CORREGIMIENTO/CENTRO POBLADO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		20855908	MariaBlanca Olivos		3237284652			
2		4168103	AURAN DIAZ S		3238059371	Olivos Alto		
3		13446350	Pedro A Ortega	diberia	3507692775			
4		7915 [illegible]	Edilberto Ortiz	SANISIDRO	3239213648			
5		80402157	Jorge Sarmiento	Sanisidro	323623032	Sanisidro		
6		3145935	Gabriel Toledo	San Isidro	3027959622	Sandro		
7		1069434873	DUVAN RUIZ	SAN ISIDRO.		SANISIDRO.		
8		80401809	Alonso Santo	Libertad	3025738444			
9		1.003.496.026	Edgar cifuentes	San Isidro	3024939502	San Isidro		
10		1123143565	Jhan Javier Soso.	la libertad	3025549651			
11		80403728	José Mauricio S.R.	JAC	3025549654	San Isidro	josemauricio8003@gmail.com	J Mauricio S.R.
12		1053342132	Leydy Mora	J.AC.	3237298861	san Isidro	leydymorab@gmail.com	
13		77437447	Facundo ing m	olivos Alto	3238458887	olivos Alto		Facundo ing m
14		1053341931	SANDRA M. MORA BRICEÑO	SANISIDRO	311 2249448	SANISIDRO		
15		51727595	MARGARITA SARMIENTO	LA LIBERTAD	302 6367782	LA LIBERTAD.		
