CONSORCIO OBRAS GRL

4,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	$ 35.613,11	0,00	$	-
4,05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	$ 1.314.935,07	1,00	$	1.314.935,00
4,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 687.687,73	4,00	$	2.750.751,00
4,07	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	$ 879.898,99	2,00	$	1.759.798,00
4,08	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16. LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	M	$ 177.734,62	0,00	$	-
4,09	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	$ 27.056,94	0,00	$	-
4,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	$ 6.394,07	0,00	$	-
4,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	$ 102.172,31	0,00	$	-
	ITEMS NO PREVISTOS					
NP 4,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML	$ 3.977,52	338,60	$	1.346.790,00
NP 4,02	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	ML	$ 33.823,00	72,00	$	2.435.256,00
NP 4,03	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA	M2	$ 73.816,76	14,04	$	1.036.387,00
NP 4,04	PINTURA EPÓXICA SOBRE PLACAS	M2	$ 36.000,00	429,68	$	15.468.480,00
NP 4,05	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	$ 67.757,01	12,00	$	813.084,00
NP 4,06	PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M	$ 10.854,24	84,00	$	911.756,00
NP 4,07	MATENIMIENTO Y PINTURA CANAL	M	$ 55.000,00	50,00	$	2.750.000,00
Subtotal					**$**	**41.896.670,00**
5	POLIDEPORTIVO PRADO					
5,01	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	$ 14.429,63	20,77	$	299.703,00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

5,02	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	$ 18.228,40	167,95	$	3.061.460,00
5,03	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	$ 35.613,11	124,24	$	4.424.573,00
5,04	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	$ 1.314.935,07	1,00	$	1.314.935,00
5,05	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 687.687,73	1,00	$	687.688,00
5,06	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 15.617.415,88	0,00	$	-
5,07	MANTENIMIENTO DE ETRUCTURAS METALICAS	M	$ 879.898,99	2,00	$	1.759.798,00
5,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON 2.00 X2.00M; INCLUYE 2 HOJAS TUBERIA A.N. 1-1/4"; E=1.5MM Y MALLA ESLABONADA	U	$ 681.520,42	1,00	$	681.520,00
5,09	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL	M2	$ 3.852,00	21,42	$	82.510,00
	ITEMS NO PREVISTOS					
NP 5,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML	$ 3.977,52	318,00	$	1.264.853,00
NP 5,02	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.629,22	733,44	$	4.862.134,00
NP 5,03	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	$ 27.056,94	0,00	$	-
NP 5,04	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA	M2	$ 73.816,76	15,36	$	1.133.825,00
NP 5,05	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	$ 56.190,36	72,00	$	4.045.706,00
NP 5,06	PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M	$ 8.547,80	72,00	$	615.441,00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

NP 5,07	PINTURA EPÓXICA SOBRE PLACAS	M2	$ 36.000,00	420,48	$	15.137.280,00
Subtotal					**$**	**39.371.426,00**
6	POLIDEPORTIVO VILLA SUIZA					
6,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.629,22	354,25	$	2.348.400,00
6,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	$ 14.429,63	55,33	$	798.391,00
6,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	$ 18.228,40	161,32	$	2.940.606,00
6,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	$ 35.613,11	68,80	$	2.450.182,00
6,05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	$ 1.314.935,07	1,00	$	1.314.935,00
6,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 687.687,73	1,00	$	687.688,00
6,07	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 15.617.415,88	2,00	$	31.234.832,00
6,08	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL	M2	$ 13.667,53	492,48	$	6.730.985,00
6,09	MANTENIMIENTO DE ESRUCTURAS METALICAS	M	$ 879.898,99	2,00	$	1.759.798,00
	ITEMS NO PREVISTOS					
NP 6,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML	$ 3.977,52	352,20	$	1.400.884,00
NP 6,02	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA .	PTO	$ 100.000,00	3,00	$	300.000,00
Subtotal					**$**	**51.966.701,00**
7	POLIDEPORTIVO LA VICTORIA					
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.884,99	217,43	$	1.497.002,00
7,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	$ 15.018,52	46,20	$	693.856,00
7,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	$ 18.863,31	102,38	$	1.931.226,00
7,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	$ 37.282,10	68,85	$	2.566.873,00
7,05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	$ 1.359.260,60	1,00	$	1.359.261,00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

7,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 731.621,32	1,00	$	731.621,00
7,07	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 16.713.374,90	2,00	$	33.426.750,00
7,08	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	$ 924.191,93	0,00	$	-
7,09	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	$ 6.438,19	0,00	$	-
7,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	$ 105.336,91	10,00	$	1.053.369,00
7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	$ 129.839,65	0,00	$	-
	ITEMS NO PREVISTOS					
NP 7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML	$ 4.130,99	377,69	$	1.560.232,00
NP 7,02	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL	M2	$ 18.314,49	78,00	$	1.428.530,00
NP 7,03	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	ML	$ 33.823,00	98,00	$	3.314.654,00
NP 7,04	REFORZAMIENTO DE TEJA METALICA EXISTENTE EN POLIDEPORTIVO ALTURA 10M Y MAX 10M2 DE INTERVENCION	GL	$ 1.000.000,00	1,00	$	1.000.000,00
NP 7,05	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA	M2	$ 73.816,76	56,70	$	4.185.410,00
NP 7,06	SUMIISITRO E INSTALACION DE ANGULO 1 1/2" x 3/16 PARA REFORZAMIENTO DE MALLA	ML	$ 72.004,56	42,00	$	3.024.192,00
NP 7,07	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4"	M2	$ 63.807,49	40,00	$	2.552.299,00

	X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE				
Subtotal					$ 60.325.275,00
8	POLIDEPORTIVO HUMAPO				
8,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.884,99	374,98	$ 2.581.732,00
8,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	$ 15.018,52	36,04	$ 541.268,00
8,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	$ 18.863,31	255,78	$ 4.824.858,00
8,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	$ 37.282,10	83,16	$ 3.100.380,00
8,05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	$ 1.359.260,60	1,00	$ 1.359.261,00
8,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 731.621,32	0,00	$ -
8,07	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 16.713.374,90	2,00	$ 33.426.750,00
8,08	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	$ 924.191,93	0,00	$ -
8,09	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	$ 6.438,19	0,00	$ -
8,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	$ 105.336,91	0,00	$ -
8,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EM MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	$ 129.839,65	88,00	$ 11.425.889,00
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP 8,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML	$ 4.130,99	344,38	$ 1.422.629,00
NP 8,02	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM	M2	$ 73.816,76	8,64	$ 637.777,00

	TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA				
NP 8,03	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA .	PTO	$ 100.000,00	8,00	$ 800.000,00
NP 8,04	REPARACION DE PUNTOS DE ANCLAJE DE COLUMNAS METALICAS INCLUYE RELLENO CON CONCRETO PARA PROTECCION	PTO	$ 100.000,00	0,00	$ -
NP 8,05	PINTURA MALLA ESLABONADA PARA CERRAMIENTO	M2	$ 18.314,49	153,6	$ 2.813.106,00
NP 8,06	REPARACION DE PUNTOS DE ANCLAJE DE COLUMNAS METALICAS CON ELEMENTOS DE ACERO. INCLUYE RECUBRIMIENTO EN CONCRETO Y PINTURA	PTO	$ 1.400.000,00	12,00	$ 16.800.000,00
Subtotal					**$ 79.733.650,00**
9	POLIDEPORTIVO JUANA SOFIA				
9,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	$ 3.541,38	24,00	$ 84.993,00
9,02	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	$ 31.475,72	8,80	$ 276.986,00
9,03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	$ 701.543,17	5,18	$ 3.633.994,00
9,04	VIGA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	$ 1.043.239,51	2,00	$ 2.086.479,00
9,05	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	$ 1.403.792,39	0,64	$ 898.427,00
9,06	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	$ 1.882.201,91	0,80	$ 1.505.762,00
9,07	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:4)	M2	$ 140.058,21	32,76	$ 4.588.307,00
9,08	ACERO VIGAS: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	$ 8.199,41	339,59	$ 2.784.438,00

9,09	ACERO COLUMNA: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	$ 8.199,41	140,68	$	1.153.493,00
9,10	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	$ 18.228,40	45,30	$	825.747,00
9,11	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	$ 1.314.935,07	1,00	$	1.314.935,00
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	$ 122.759,51	160,00	$	19.641.522,00
9,13	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 15.617.415,88	2,00	$	31.234.832,00
	ITEMS NO PREVISTOS					
NP 9,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.629,22	45,30	$	300.304,00
NP 9,02	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML	$ 3.977,52	271,55	$	1.080.097,00
Subtotal					**$**	**71.410.316,00**
10	POLIDEPORTIVO EL C.I.C					
10,01	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	U	$ 82.833,34	2,00	$	165.667,00
10,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	$ 713.382,09	4,00	$	2.853.528,00
10,03	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10x0.20x0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	$ 56.592,58	4,82	$	272.776,00
10,04	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	$ 37.661,46	10,59	$	398.835,00
10,05	PINTURA VINITO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	$ 12.008,92	255,40	$	3.067.078,00
10,06	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	$ 14.429,63	593,26	$	8.560.520,00
10,07	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	$ 18.228,40	331,22	$	6.037.612,00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

10,08	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	$ 1.314.935,07	1,00	$	1.314.935,00
10,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCIÓN CANCHAS	M2	$ 122.759,51	152,40	$	18.708.550,00
10,10	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.629,22	1.128,12	$	7.478.552,00
10,11	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	U	$ 537.435,17	1,00	$	537.435,00
10,12	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	$ 109.702,93	0,00	$	-
10,13	ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA	M2	$ 15.702,54	100,76	$	1.582.188,00
10,14	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 15.617.415,88	0,00	$	-
10,15	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 1000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 1.171.628,59	2,00	$	2.343.257,00
	ITEMS NO PREVISTOS					
NP 10,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M	$ 3.977,52	349,47	$	1.390.025,00
NP 10,02	PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M	$ 8.547,80	57,10	$	488.079,00
NP 10,03	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	$ 13.025,88	64,00	$	833.656,00
NP 10,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	$ 39.342,57	64,00	$	2.517.924,00
NP 10,05	REACONDICIONAMIENTO BAJANTES 4"	UND	$ 90.643,50	10,00	$	906.435,00
NP 10,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" A.N. (0.128", 3.25 MM) CERRAMIENTO EXTERIOR, INCLUYE ANCLAJE	M	$ 90.952,52	34,10	$	3.101.481,00
Subtotal					**$**	**62.558.533,00**

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com


CONSORCIO OBRAS GRL

11	POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE				
11,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.629,22	549,96	$ 3.645.804,00
11,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	$ 14.429,63	41,04	$ 592.192,00
11,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	$ 18.228,40	414,13	$ 7.548.929,00
11,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	$ 35.613,11	94,79	$ 3.375.767,00
11,05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	$ 1.314.935,07	1,00	$ 1.314.935,00
11,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 687.687,73	0,00	$ -
11,07	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 15.617.415,88	2,00	$ 31.234.832,00
11,08	MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS	M	$ 879.898,99	0,00	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP 11,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M	$ 3.977,52	416,42	$ 1.656.321,00
NP 11,02	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA .	PTO	$ 100.000,00	8,00	$ 800.000,00
NP 11,03	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	M	$ 33.823,00	126,00	$ 4.261.698,00
Subtotal					**$ 54.430.478,00**
				COSTO DIRECTO	**$ 614.452.803,00**
				ADMINISTRACION 28%	**$ 172.046.784,84**
				IMPREVISTOS 1%	**$ 6.144.528,03**
				UTILIDAD 5%	**$ 30.722.640,15**
				AIU %	**$ 208.913.953,02**
				COSTO TOTAL	**$ 823.366.756,00**

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

GRÁFICA DE AVANCE FÍSICO

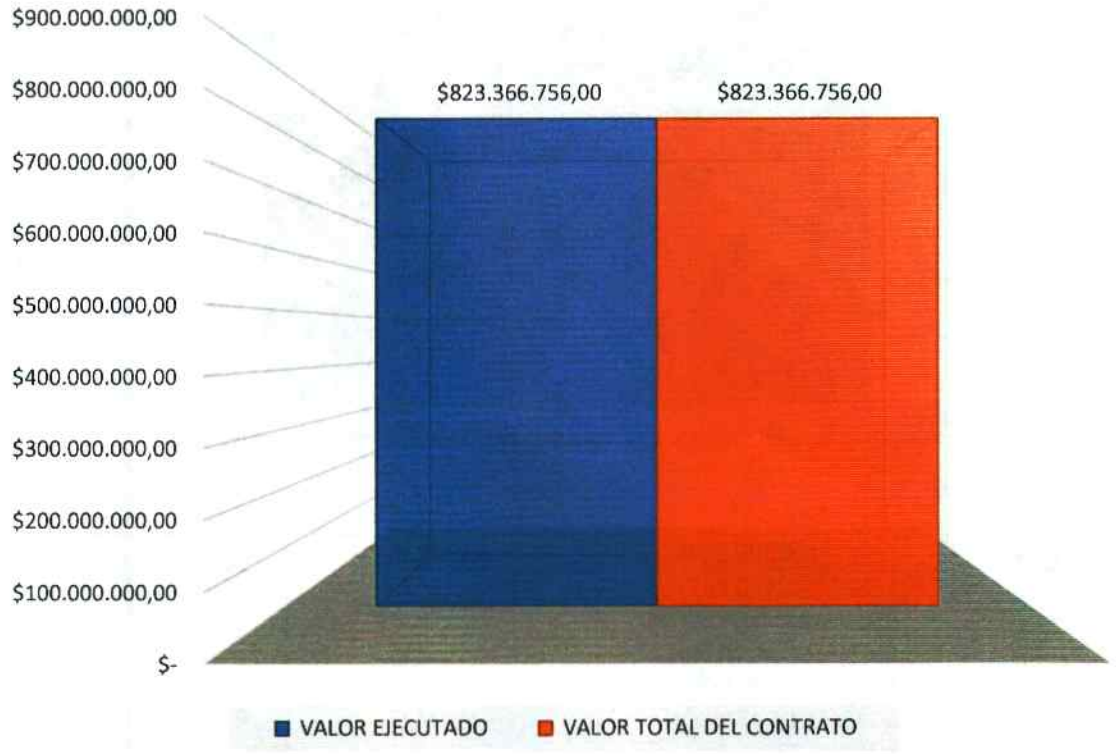

Durante la ejecución de los 10 días de prórroga se evidencia un avance ejecutado del 100%. Logrando así, dar cumplimiento a la totalidad de actividades programadas, dando por completado el objeto del contrato a satisfacción de las partes.

A continuación, se mencionan las actividades realizadas durante el último periodo.

REGISTRO DE AVANCE

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
1,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA PROTECCION CANCHAS	196,8 M2	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

	
OBSERVACIONES	Se instaló la malla eslabonada para protección sobre el cerramiento de la cancha de tenis

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
1,4,1	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	200 M2	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se instaló malla de nylon de refuerzo sobre todo el perímetro de la cancha sintética		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
2,14	MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS	8 M	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

	
OBSERVACIONES	Se realizó el refuerzo en las bases de las columnas metálicas


ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
4,07	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	2 M	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se realizó el refuerzo en las bases de las columnas metálicas		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 4,03	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA	14,04 M2	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

	
OBSERVACIONES	Se hizo mantenimiento de las mallas del cerramiento

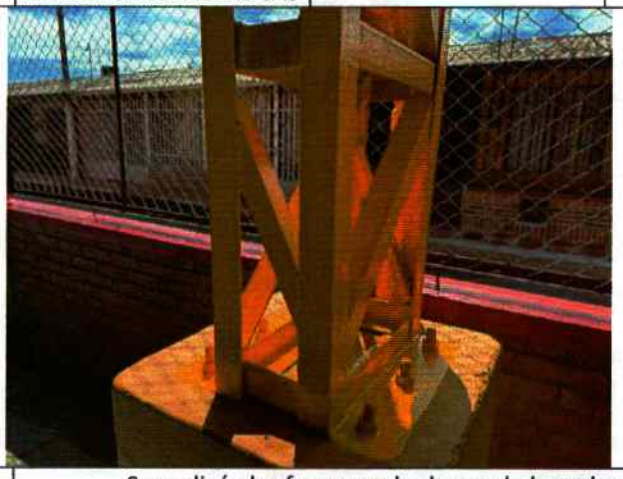ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
5,07	MANTENIMIENTO DE ETRUCTURAS METALICAS	2 M	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se realizó el refuerzo en las bases de las columnas metálicas		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
5,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON 2.00 X2.00M; INCLUYE 2 HOJAS TUBERIA A.N. 1-1/4"; E=1.5MM Y MALLA ESLABONADA	1 U	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

	
OBSERVACIONES	Se instaló portón metálico totalmente nuevo

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 5,04	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA	15,36 M2	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se realizó el mantenimiento de la malla eslabonada en mal estado		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
6,09	MANTENIMIENTO DE ESRUCTURAS METALICAS	2 M	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL



OBSERVACIONES	Se realizó el refuerzo en las bases de las columnas metálicas

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 7,07	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	40 M2	100,00%



OBSERVACIONES	Se instaló malla en nylon sobre uno de los muros de cerramiento

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS	160 M2	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

	EN MALLA PROTECCION CANCHAS		
			
OBSERVACIONES	Se instalaron módulos en malla para protección de canchas		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
10,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCIÓN CANCHAS	152,40 M2	100,00%
			
OBSERVACIONES	Se instalaron los módulos en malla protección para el cerramiento del escenario deportivo.		

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE	%
NP 10,02	PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	57,1 M	100,00%

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

	
OBSERVACIONES	Se realizó el mantenimiento y pintura de el par de canchas metálicas

RELACIÓN DE PERSONAL

A continuación, se menciona el personal técnico y operativo empleado durante el primer mes de ejecución para el desarrollo de las actividades, los cuales cuentan con afiliaciones y pagos de seguridad vigentes a la fecha; y elementos de protección personal para realizar labores en obra.

SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2026							
NOMBRE	**CÉDULA**	**CARGO**	**DÍAS COTIZADOS**	**PENSIÓN**	**SALUD**	**ARL**	**PLANILLA**
ROSEMBERTH LÓPEZ HERNANDEZ	86039315	DIRECTOR DE OBRA	30	COLPENSIONES	SANITAS	SURA	9506052020
LUIS FERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA	1006718337	RESIDENTE DE OBRA	2	PROTECCIÓN	SANITAS	SURA	9505633072
ROSEMARY HURTADO MEJÍA	1121834191	PROFESIONAL SST	30	POVENIR	SANITAS	SURA	9506055293
DIXON GERMAN MARTINEZ BELTRAN	1069898533	AYUDANTE DE ORNAMENTACIÓN	2	PORVENIR	FAMISANAR	SURA	9505633072
MIGUEL ANGEL PRIETO SALAMANCA	86086169	ORNAMENTADOR	2	PORVENIR	FAMISANAR	SURA	9505633072

CONSORCIO OBRAS GRL

CONCLUSIONES

Durante el último periodo de ejecución se logró terminar la totalidad de las actividades contractuales a pesar de las condiciones climáticas actuales las cuales presentaron impedimentos algunos días para la realización de labores en obra; siguiendo las especificaciones técnicas y los procedimientos necesarios para garantizar la calidad de las mismas, dando así cumplimiento del objeto contractual del contrato a satisfacción de las partes.

Actualmente, se encuentra en trámite el acta parcial de pago No. 01 por un avance del 90%, por lo que se procederá a iniciar el proceso de liquidación del 10% restante del valor total del contrato, como lo indica la CLAUSULA TRES. FORMA DE PAGO del contrato de obra.

ING. ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS GRL


Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONTROL DE LLUVIAS

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GRL
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META
MES:	01 AL 31 DE MAYO DE 2026

CLIMA	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTAL DIAS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
NUBLADO																																0
TORMENTA	X	X					X		X				X		X					X	X	X				X	X					11
LLUVIOSO			X					X		X				X		X			X				X		X				X	X	X	11
SOLEADO				X	X	X					X	X					X	X						X				X				9
																								TOTAL DÍAS POR MES							31

Dia laboral	
Domingo	
Festivo	
Dia no laboral	

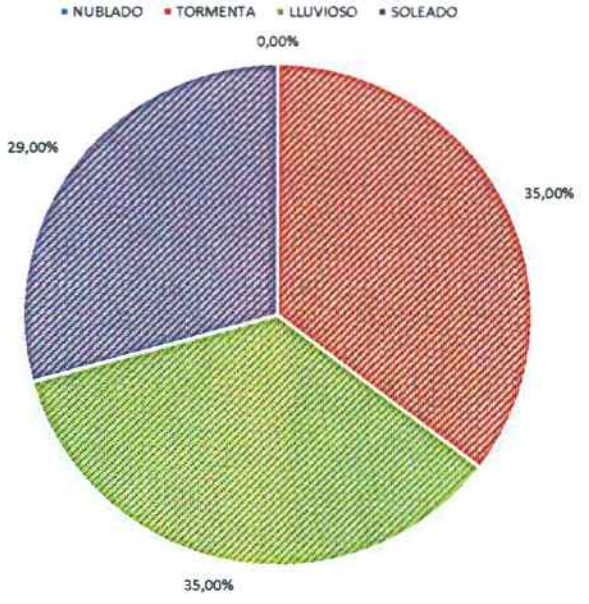

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRATISTAS	Código: F - 248 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:

Fecha: 2/06/2026

OBJETO CONTRATO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META
OBJETO PROYECTO:	
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GRL
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
INTERVENTORIA:	

NOMBRE	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL.		NORMA A CUMPLIR	FECHA DE RECIBIDO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		ELEMENTOS DE PROTECIÓN PERSONAL / DOTACIÓN	CANTIDAD			
LUIS FERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA	RESIDENTE DE OBRA	GAFAS LENTE OSCURO	1	NTC 1771	23/05/2026	
ROSEMARY HURTADO MEJIA	RESIDENTE HSEQ	GAFAS LENTE OSCURO	1	NTC 1771	23/05/2026	
RUBIEL DE JESUS OSORIO ARBOLEDA	MAESTRO DE OBRA	GAFAS LENTE OSCURO PROTECTOR AUDITIVO	1 1	NTC 1771 NTC 2272 y NTC 2273	23/05/2026	rubiel osorio
FABIO JAIME GARZON	MAESTRO DE OBRA	GAFAS LENTE OSCURO PROTECTOR AUDITIVO	1 1	NTC 1771 NTC 2272 y NTC 2273	23/05/2026	fabio garzon
PRIETO SALAMANCA MIGUEL ANGEL	ORNAMENTADOR	GAFAS LENTE OSCURO PROTECTOR AUDITIVO	1 1 1 1	NTC 1771 NTC 2272 y NTC 2273	23/05/2026	miguel prieto
DIXON GERMAN MARTINEZ BELTRAN	AYUDANTE	GAFAS LENTE OSCURO PROTECTOR AUDITIVO	1 1	NTC 1771 NTC 2272 y NTC 2273	2/05/2026	Dixon G. Martinez

Con la firma de este registro certifico que:
1. Recibí los elementos de proteccion person
2. Los revise y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso.
4. Me comprometo a usarlo.
5. Me comprometo a mantenerlo en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **2/06/2026**

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional:

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONSORCIO OBRAS GRL

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO

PROYECTO PUERTO LOPEZ

CONTRATO DE OBRA N° 103-13-09-005 DE 2025

"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META"

PERIODO: Del 23 MAYO al 2 de junio del 2026.

ELABORO	REVISO	APROBO
ROSEMARY HURTADO MEJIA **PROFESIONAL SST**	ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ **DIRECTOR DE OBRA**	LUIS FERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA **RESIDENTE DE OBRA**

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL	INFORME DE GESTION MENSUAL		
SG-SST	VERSION 01	FECHA	31/10/2024

EMPRESA CONSTRATISTA

CONSORCIO OBRAS GRL
NIT: 902.021.128-6

CONTRATO DE OBRA N° 103-13-09-005 DE 2025

ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL	INFORME DE GESTION MENSUAL		
SG-SST	VERSION 01	FECHA	31/10/2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 4
2. OBJETIVOS 4
3. ALCANCE 4
4. INFORMACION BASICA CONTRATO DE OBRA 5
   4.1 TURNOS DE TRABAJO 5
5. INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROYECTO PUERTO LOPEZ 6
   5.1 LISTADO DEL PERSONAL QUE ESTÁ EJECUTANDO EL CONTRATO .6
   5.2 AFILIACION Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 6
   5.3 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE Y RIESGOS 6
   5.4 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 7
   5.5 ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO LABORAL 7
   5.6 CERTIFICADO DE SINIESTRALIDAD EMITIDO POR LA ARL 7
   5.7 ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO 7
   5.8 PROGRAMA DE CAPACITACION Y CHARLAS 7
6. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 8
   6.1 INSPECCIONES SST 8
   6.2 REGISTRO FOTOGRAFICO 8
7. ANEXOS 8

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

1. INTRODUCCION

La seguridad es la confianza de realizar un trabajo determinado sin llegar al descuido. Por tanto, CONSORCIO OBRAS GRL, velara por la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST, garantizando un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los trabajadores y al mismo tiempo estimular la prevención de accidentes fuera del área de trabajo. Si las causas de los accidentes industriales pueden ser controladas, la repetición de éstos será reducida.

La seguridad es parte fundamental de todos los proyectos. Es política de CONSORCIO OBRAS GRL, proveer un óptimo nivel de seguridad para todos los empleados. Lo anterior debe incluir, pero no limitarse a crear una actitud positiva hacia la seguridad, establecer procedimientos de actuación y operación seguras, proveer equipos e instalaciones adecuadas y suministrar la información necesaria para la prevención y control de siniestros de cualquier naturaleza.

Por todo lo anterior se justifica la elaboración e implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que garantice el mejoramiento continuo de las Condiciones de Salud, Trabajo y el bienestar de los trabajadores. Para que se desempeñen de una manera adecuada y eficiente permitiendo su crecimiento personal, a la vez el mejoramiento de la productividad del proyecto.

2. OBJETIVOS

- Sensibilizar a la población trabajadora
- Hacer seguimiento periódico a las áreas de trabajo verificando la ejecución de las diferentes medidas de control, realizadas por CONSORCIO OBRAS GRL.
- Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones generales de salud y calidad de vida de los trabajadores, que integren el proyecto.

3. ALCANCE

El presente informe es para la verificación de las actividades aplicadas por todo el personal que labora en la obra "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL

DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META" referente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. INFORMACION BASICA CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°	103-13-09-005 DE 2025
OBJETO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GRL
LOCALIZACION	PUERTO LOPEZ
PLAZO	3 MESES 18 DÍAS
FECHA DE ACTA DE INICIO	23 DE ENERO DE 2025

4.1 TURNOS DE TRABAJO

El personal administrativo es el que se encuentra como base dentro de las instalaciones de CONSORCIO OBRAS GRL, por lo que aparece dentro de la planilla de seguridad Social. El personal contratado para el proyecto puede variar de acuerdo con las necesidades específicas del mismo.

A continuación, se detallan de manera general los turnos y horarios de la fuerza de trabajo de CONSORCIO OBRAS GRL, distribuidos de la siguiente manera.

HORARIOS DE TRABAJO

AREAS DE TRABAJO	HORARIOS	DESCANSO
Oficina administrativa	Lunes a viernes 08:00 am – 12:00 pm, 2:00 pm a 6:00 pm sábados de 08:00 am a 1:00 pm	15 minutos en cada jornada. 2 horas de almuerzo
Lugar de ejecución del proyecto	Lunes a viernes 7:00 am – 5:00 pm sábados de 08:00 am a 12:00 pm	15 minutos en cada jornada. 2 horas de almuerzo

5. INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROYECTO PUERTO LOPEZ

El objetivo particular de este corresponde al informe mensual del periodo transcurrido del Del 23 mayo al 2 de junio del 2026, de las actividades ejecutadas durante el avance de obra con el personal actualmente vinculado al proyecto.

5.1 LISTADO DEL PERSONAL QUE ESTÁ EJECUTANDO EL CONTRATO

Durante el periodo que comprende este informe no se realiza la contratación de personal para los avances de obra.

Anexo 1: Listado de personal asignado al proyecto.

5.2 AFILIACION Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Garantizando el bienestar de nuestros colaboradores y en cumplimiento de las obligaciones legales requeridas, se realizan las afiliaciones y aportes al Sistema General de Riesgos Laborales (EPS, ARL, AFP, CCF) de cada uno de los colaboradores que laboran en el proyecto.

Se realiza la validación de los pagos de seguridad social del personal actualmente vinculado con el proyecto.

Anexo 2: planilla de Seguridad Social

5.3 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE Y RIESGOS

A través de esta herramienta de gestión, basada en la GTC45 le permite a CONSORCIO OBRAS GRL,determinar de manera objetiva cuales son los riesgos relevantes para la seguridad y salud y de todoslos colaboradores que prestan el servicio para este contrato y los controles a establecer.

La gestión de peligros se realiza por medio de la implementación de medidas prevención y control determinadas de acuerdo con la siguiente jerarquización:

- ✓ Eliminación del peligro.
- ✓ Sustitución
- ✓ Controles de Ingeniería

- ✓ Controles administrativos
- ✓ Equipos y Elemento de protección personal

Anexo 3: Matriz IPEVR

5.4 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Se suministran los equipos y elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, se desarrollan las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores, para que estos conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos y para que el mantenimiento o reemplazo de estos se haga de forma tal, que se asegure su buen funcionamiento y recambio según vida útil para la protección de los trabajadores.

5.5 ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO LABORAL

Durante el periodo que comprende este informe, se presentan, CERO (0) accidentes laborales y cero (0) incidentes.

IFAT = (N° TOTAL DE A.T EN EL AÑO / N° HHT AÑO) *K

Anexo 4: Estadística ausentismo y accidentalidad.

5.6 CERTIFICADO DE SINIESTRALIDAD EMITIDO POR LA ARL

Durante el periodo que comprende este informe, se presenta CERO (0) accidentes laborales y cero (0) incidentes laborales.

5.7 ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO

Durante este periodo no se realizan actividades de alto riesgo.

5.8 PROGRAMA DE CAPACITACION Y CHARLAS

CHARLAS DE SEGURIDAD

Se realizan charlas de seguridad antes del inicio de las actividades, con el fin de prevenir
