NP 10,03	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	$ 13.025,88	64,00	$	833.656,00
NP 10,04	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	$ 39.342,57	64,00	$	2.517.924,00
NP 10,05	REACONDICIONAMIENTO BAJANTES 4"	UND	$ 90.643,50	10,00	$	906.435,00
NP 10,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" A.N. (0.128", 3.25 MM) CERRAMIENTO EXTERIOR, INCLUYE ANCLAJE	M	$ 90.952,52	34,10	$	3.101.481,00
Subtotal					$	**62.558.533,00**
11	POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE					
11,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.629,22	549,96	$	3.645.804,00
11,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	$ 14.429,63	41,04	$	592.192,00
11,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	$ 18.228,40	414,13	$	7.548.929,00
11,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	$ 35.613,11	94,79	$	3.375.767,00
11,05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	$ 1.314.935,07	1,00	$	1.314.935,00
11,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 687.687,73	0,00	$	-
11,07	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 15.617.415,88	2,00	$	31.234.832,00
11,08	MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS	M	$ 879.898,99	0,00	$	-
	ITEMS NO PREVISTOS					
NP 11,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M	$ 3.977,52	416,42	$	1.656.321,00
NP 11,02	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA .	PTO	$ 100.000,00	8,00	$	800.000,00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

NP 11,03	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	M	$ 33.823,00	126,00	$ 4.261.698,00
Subtotal					**$ 54.430.478,00**
				COSTO DIRECTO	**$ 614.452.803,00**
				ADMINISTRACION 28%	**$ 172.046.784,84**
				IMPREVISTOS 1%	**$ 6.144.528,03**
				UTILIDAD 5%	**$ 30.722.640,15**
				AIU %	**$ 208.913.953,02**
				COSTO TOTAL	**$ 823.366.756,00**

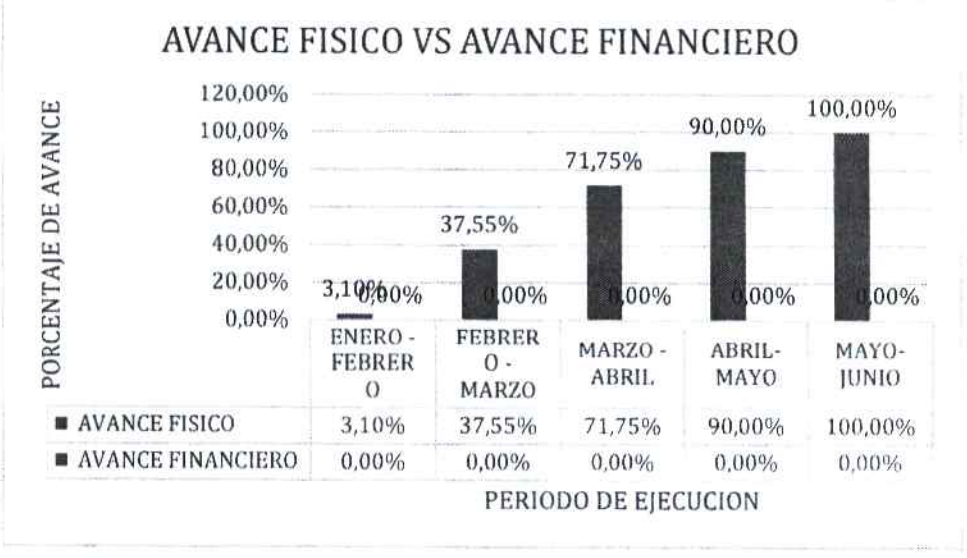
PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES			-	-	-	-	-

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: *23/05/2026 AL 02/06/2026*

Avance físico ejecutado 100,00 % y avance financiero ejecutado 0,00 %



INVERSION ANTICIPO

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: *Diligenciar F-226 Acta Plan de Inversión del Anticipo y F-259 Informe Plan Inversión Anticipo Obra, remitir como anexo al presente informe cuando aplique.*

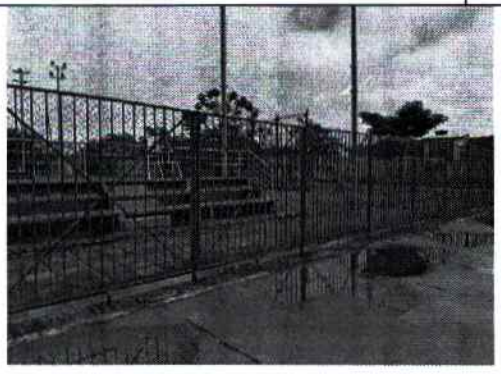
F. PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

Durante el periodo del presente informe no se presentaron problemas para le ejecución del contrato.

G. AVANCE FISICO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

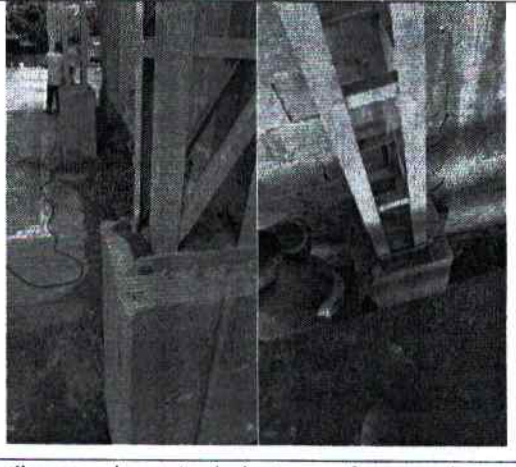
A la fecha de corte del presente informe, el contrato de obra registra un avance físico ejecutado del cien por ciento (100%), en concordancia con el avance programado del cien por ciento (100%), evidenciándose el cumplimiento integral de las actividades contempladas dentro del alcance contractual y el desarrollo de las mismas conforme al cronograma establecido.

H. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE REPORTADO A LA FECHA.

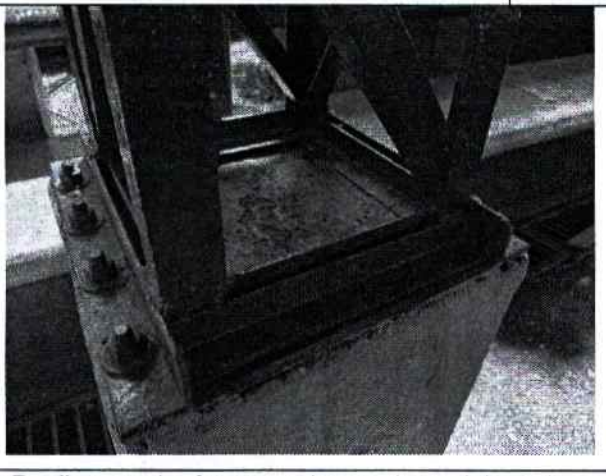
ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
1,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA PROTECCION CANCHAS	196,8 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la instalacion de malla eslabonada a cerramiento de la cancha de tenis.		

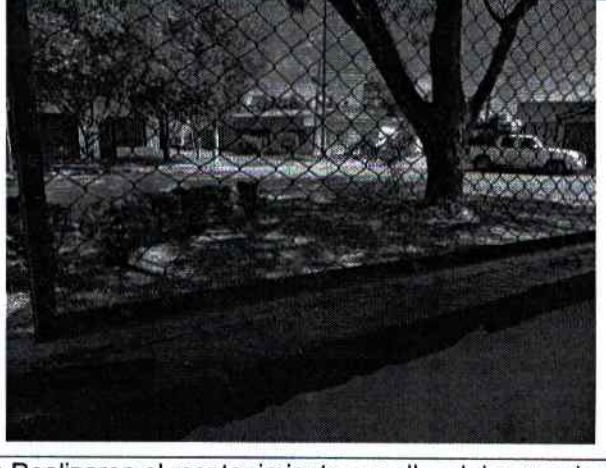
NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
1,4,1	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	200 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Se realizo la instalacion de malla en nylon sobre todo el perímetro de la canhca sintética.		

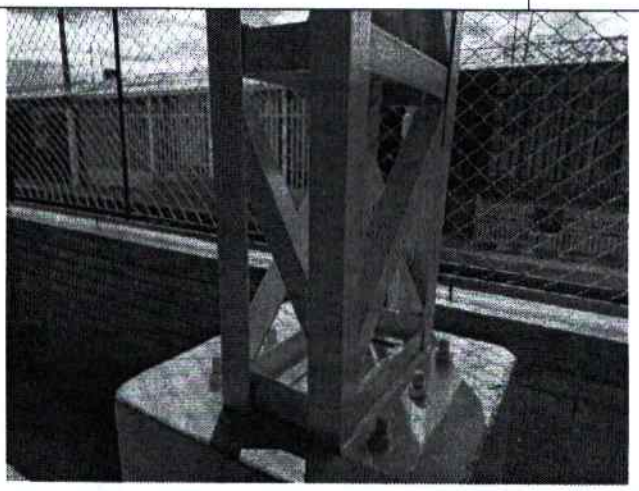
ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
2,14	MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS	8 M	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron el mantenimiento y refuerzo a base de anclaje de las columnas de la estructura metalica de la cubierta.		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
4,07	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	2 M	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron el refuerzo en bases de anclaje de las columnas de la estructura metalica de la cubierta.		

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
NP 4,03	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA	14,04 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron el mantenimiento a mallas del cerramiento.		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
5,07	MANTENIMIENTO DE ETRUCTURAS METALICAS	2 M	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron el refuerzo a las bases de anclaje de las columnas de la estructura metalica de la cubierta.		

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
5,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON 2.00 X2.00M; INCLUYE 2 HOJAS TUBERIA A.N. 1-1/4"; E=1.5MM Y MALLA ESLABONADA	1 U	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la fabricacion e instalacion de porton.		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
NP 5,04	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA	15,36 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron el mantenimiento de la malla del cerramiento que se encontraba en mal estado.		

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
6,09	MANTENIMIENTO DE ESRUCTURAS METALICAS	2 M	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron el mantenimiento a bases de anclaje de las columnas de la estructura metalica de la cubierta.		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
NP 7,07	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	40 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la instalacion de malla en nylon para cerramiento.		

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	160 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la instalacion de modulos en malla para muros de protección de canchas.		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
10,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCIÓN CANCHAS	152,40 M2	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron la fabricacion e instalacion de modulos en malla para el cerramiento.		

ITEMS	ACTIVIDAD	AVANCE	%
NP 10,02	PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	57,1 M	100%
			
	OBSERVACIONES: Realizaron el mantenimeinto y pintura de las estrucutras de cancha multiple.		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

H. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD A TRAMITE DE MODIFICACION – ADICION PRESUPUESTAL

Durante el periodo del presente informe no se presentaron problemas para le ejecución del contrato.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Como resultado del seguimiento técnico, administrativo, financiero y legal efectuado durante la ejecución contractual, se evidenció la culminación del cien por ciento (100%) de las actividades contempladas en el contrato, alcanzando el cumplimiento integral del objeto contractual. Lo anterior se logró pese a las condiciones climáticas adversas presentadas durante el último periodo de ejecución, las cuales generaron restricciones temporales para el desarrollo de algunas labores en obra.

- La ejecución de las actividades se realizó conforme a las especificaciones técnicas, diseños, normas aplicables y procedimientos constructivos establecidos contractualmente, garantizando los estándares de calidad, funcionalidad y estabilidad requeridos para el proyecto. En consecuencia, la supervisión deja constancia de que las obras fueron ejecutadas a satisfacción y en cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por las partes.

Firma

MARYLIN FONSECA CRUZ
SUPERVISORA ASIGNADA

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

	CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	Código: F -261
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA N° 103-13-09-005 DE 2025

OBJETO DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
FECHA DE INSPECCIÓN:	1/06/2026	N° DE TRABAJADORES:	6

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
1	Tiene copia cada trabajador de Afiliaciones (nuevos) y pagos(> 30 días) ARP, EPS y AFP	X				
2	Existe el Registro de charla diaria (de la semana en curso), y capacitación	X				
3	Existen inspecciones o registros preoperacionales de: (Herramientas, EPP)	X				
4	Existe un panorama de riesgos actualizado acorde a las actividades.	X				
5	Se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado, disponible, vigente y firmado por el representante legal de la empresa	X				
6	Se cuentan con las hojas de seguridad de los productos químicos en el sitio de trabajo y almacenamiento (combustibles, etc.).					X
7	Se poseen procedimientos de trabajo , en el cual encuentran identificadas las actividades críticas con sus riesgos y controles.	X				
8	Se cuenta con el plan de emergencia, para actividades críticas y en general que correspondan al alcance de la actividad desarrollada.	X				
9	El personal cuenta con un programa de inducción en SGSST, Medio ambiente, actividades y riesgos del cargo.(divulgacion de procedimientos)	X				
	SUBTOTAL	80	0	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(90- NA)	100%				

ÍTEM	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	10	5	3	0	N.A
10	Está la zona de trabajo limpia, ordenada sin residuos.	X				
11	Las unidades sanitarias fijas ó portátiles están limpias.					X
12	Están demarcado y organizado el almacenamiento provisional de los residuos para la disposición final					X
13	Esta demarcado y organizado el almacenamiento provisional de residuos generados de todas clases.					X
14	El material, equipos y herramientas están organizado.	X				
15	El materia de descapote se acopia y se protege					X
16	La bodega de almacenamiento esta en orden y aseo					X
	SUBTOTAL	20	0	0	0	5
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	100%				

ÍTEM	GESTIÓN DEL PELIGRO	10	5	3	0	N.A
17	Las Excavaciones son seguras (escombro a 1 metro de la orilla o más según profundidad)					X
18	La excavación cuenta con escaleras, pasos firmes, señalización, se tiene entibado o se maneja talud, el personal está alejado de la herramienta mecánica					X
19	Herramientas y/o escombros en areas vecinas, que generen algun tipo de riesgo al personal.					X
20	Hay recurso de comunicaciones constante en buen estado de funcionamiento que garanticen la comunicación integral en caso de necesitarse.					X
21	Se cuenta con los equipos necesarios para realizar monitoreo de atmosferas requerido (gases)					X
22	Los equipos tienen guarda de seguridad (Ranas, mezcladoras, etc..)					X
23	Se cuenta con equipos de rescate en sitio para trabajos en alturas y/o espacios confinados					X
	SUBTOTAL	0	0	0	0	7
	Valor % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)					

ÍTEM	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA	10	5	3	0	N.A
24	Están las Eslingas en óptimo estado de funcionamiento y cuentan con etiqueta de capacidad de carga y características del fabricante					X
25	Se cuenta con Plan de Izaje y tiene todos los riesgos asociados a la labor, cuenta con cálculos según norma (capacidades, puntos de apoyo ASME B30.5).					X
26	El personal que realiza la labor se encuentra certificado (aparejador, supervisor del Izaje, Operador).					X
27	Se señaliza y demarca la carga					X

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
34	El personal posee y utiliza de manera adecuada los EPP requeridos para la labor	X				
35	El personal cuenta con dotación adecuada	X				
36	Cascos de seguridad con ratcher para trabajos en alturas	X				
37	Se cuenta con barbuquejo	X				
38	Botas de caucho en buen estado con punta reforzada					X
39	Botas de cuero en buen estado con punta reforzada	X				
40	Protección respiratoria adecuada para la labor.					X
41	Camisa manga larga y pantalón en buen estado	X				
42	Cuentan con gafas de seguridad oscuras y claras	X				
43	Están utilizando protección auditiva adecuada para la labor.					X
44	se cuenta en campo con elementos de protección de personal para reposición según necesidad.	X				
45	El personal visitante tiene los EPP de acuerdo al riesgo para ingresar.	X				
	SUBTOTAL	90	0	0	0	3
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(120-NA)	100%				

ÍTEM	MEDICINA PREVENTIVA	10	5	3	0	N.A
46	Se han practicado los exámenes de ingreso y periódicos a los trabajadores, Ver registro (Registro expedido por medico especialista en S.O)	X				
47	Conformación, Capacitación, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	X				
48	Existen beneficios de recreación y deporte para el personal, de conformidad con el Artículo 21 de la Ley 50 de 1990.					X
	SUBTOTAL	20	0	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(30-NA)	100%				

ÍTEM	SEÑALIZACIÓN	10	5	3	0	N.A
49	Se evidencian etiquetas con advertencias de peligro e instrucciones generales.					X
50	Se cuenta con avisos preventivos, conos, demarcación con cinta peligro, identificando excavaciones, trabajos en vías, etc.	X				
51	Tienen Protección o señalización las varillas salientes de las estructuras o pisos					X
52	Se tiene señalizada y demarcada las áreas de trabajo	X				
53	Las áreas de trabajo están delimitadas y tiene avisos de prevención	X				
	SUBTOTAL	30	0	0	0	2
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(50-NA)	100%				

ÍTEM	TRABAJOS EN ALTURAS	10	5	3	0	N.A
54	Se cuenta con elementos de protección pasiva, equipos certificados y cumplen con especificaciones técnicas. (escaleras, andamios, plataformas).					X
55	Se cuenta con los elementos y equipos de protección personal de acuerdo al trabajo a realizar (arnés, cuerdas, eslingas, conectores) y se tienen las fichas de inspección de cada uno. (Ver registro)					X
56	Se cuenta con kit y plan de rescate para trabajos en altura especifico para la labor					X
57	Se cuenta con el coordinador certificado para trabajo seguro en alturas					X

OBJETO DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
FECHA DE INSPECCIÓN:	1/06/2026	N° DE TRABAJADORES:	6

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN				
		A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
	SUBTOTAL	0	0	0	0	4
	Valor : % Obtenido (A+B+C)/(40-NA)					

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN				
		A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
68	Se cuenta con el rescatista certificado para trabajo seguro en alturas					X
	SUBTOTAL	0	0	0	0	5
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(40-NA)					

ITEM	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	10	5	3	0	N.A
28	Se cuenta con el kit de primeros auxilios en el frente de trabajo de acuerdo a la labor y numero de trabajadores expuestos.	X				
29	Se realiza divulgación y entrenamiento en el plan de emergencias a trabajadores y visitantes	X				
30	Los extintores están ubicados adecuadamente en el área y los trabajadores conocen su ubicación y utilización	X				
31	La ruta de evacuación está debidamente señalizada, y el personal está enterado de la ubicación del punto de encuentro	X				
32	La empresa tiene contemplado un plan para la atención de emergencias de riesgo identificado	X				
33	Se tienen conformadas la brigada de emergencia (incendio, evacuación, primeros auxilios) y poseen un programa de entrenamiento periódico.	X				
	SUBTOTAL	60	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(60-NA)	100%				

GESTION EN CAMPO

	COMPONENTES	% OBTENIDO	10	5	3	0	N.A
1	DOCUMENTACION EN CAMPO	100%	80	0	0	0	1
2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	100%	90	0	0	0	3
3	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	100%	20	0	0	0	5
4	MEDICINA PREVENTIVA	100%	20	0	0	0	1
5	GESTIÓN DEL PELIGRO		0	0	0	0	7
6	SEÑALIZACIÓN	100%	30	0	0	0	2
7	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA		0	0	0	0	4
8	TRABAJOS EN ALTURAS		0	0	0	0	5
9	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	100%	60	0	0	0	0
	RESULTADO DE NUESTRA GESTIÓN EN CAMPO	100,0%	300	0	0	0	28

ALTO	MEDIO	BAJO
X		

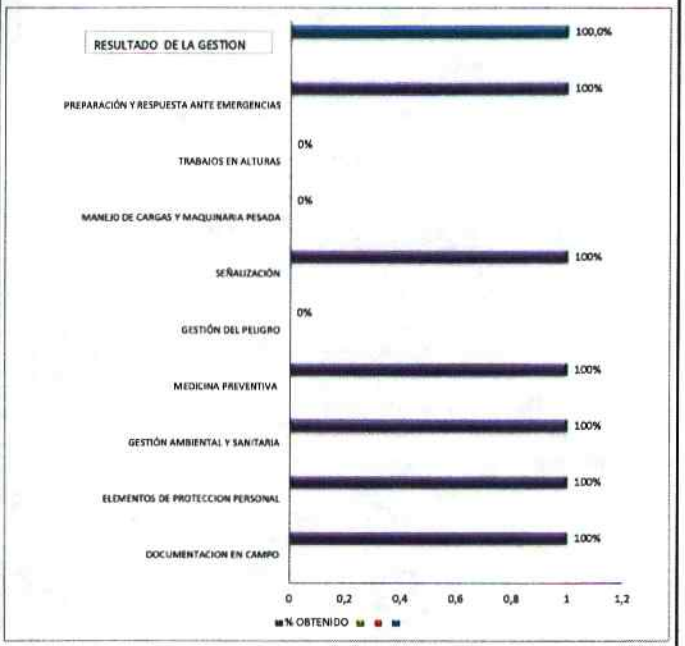


GRAFICO DE GESTION SISO

OBSERVACIONES

ÍTEM RELACIONADO	RECOMENDACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Firma
Luis Fernando Valencia Castañeda
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037-0626193 CND

Firma
Nombre
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional:

Firma ROSEMARY HURTADO MEJIA
Rosemary Hurtado Mejia
PROFESIONAL SGSST OBRA
N° Matrícula Profesional: Lic 6837

Firma
Nombre
PROFESIONAL EN SGSST INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ACTA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL	Código: F- 250
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

Fecha: 1/06/2026

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GRL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	
INTERVENTORÍA:	

FECHA DE INSPECCION:	1/06/2026

SUELO

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
		SI	NO	APLICA		
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Capacitación Personal	X		SI	5	
	Separación y clasificación	X		SI	5	
	Disposición Final			N/A		
	Programación de retiro			N/A		
	Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas			N/A		
	Limpieza interna y externa de la obra	X		SI	5	
	Almacenamiento de materiales y combustibles			N/A		
	Campamento			N/A		
	Manejo de Vegetacion			N/A		
	Estabilidad de Taludes			N/A		
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	15	
				PROMEDIO	5	

AGUA

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE VERTIMIENTOS	Capacitación Personal	X		SI	5	
	Manejo Escorrentia			N/A		
	Protección del suelo y agua en la manipulación de sustancias peligrosas.			N/A		
	Medidas de contingencia			N/A		
	Zonas de trabajo secas			N/A		
	Manejo nivel freático			N/A		
	Separación y clasificación de vertimientos			N/A		
	Conexión a sistema de tratamiento (manejo de aguas residuales domesticas)			N/A		
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	5	
				PROMEDIO	5	

RESOLUCIONES	NUMERO	
CONCESIÓN DE AGUAS		
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS		
OCUPACIÓN DE CAUCE		

AIRE

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
ATMOSFERICO Y CONTROL DE RUIDO	Capacitación Personal			N/A		
	Humedicimiento de áreas de trabajo			N/A		
	Cubrimiento de acopios de materiales			N/A		
	Uso de mallas proctectoras			N/A		
	No exceder volumenes del volco de los camiones			N/A		
	Olores desagradables			N/A		
	Aseo Interno y externo de la obra	X		SI	5	
	Uso de equipos en buen estado	X		SI	5	
	Apantallamiento sonoro del área			N/A		
	Planificación de horarios de trabajo	X		SI	5	
	Medidas de Contingencia	X		SI	5	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	20	
				PROMEDIO	5	

CAMPAMENTO, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
CUIDADOS AMBIENTALES	Programa de manejo y almacenamiento de materiales	X		SI	5	
	Almacenamiento adecuado de combustibles			N/A		
	Localización y señalización en el Campamento			N/A		
	Elementos de seguridad, botiquín, camilla, extintor entre otros	X		SI	5	
	Obras de contención			N/A		
	Capacitación del Personal			N/A		
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	10	
				PROMEDIO	5	

SEÑALIZACIÓN

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN	Capacitación Personal	X		SI	5	
	Demarcación del perímetro			N/A		
	Zonificación de la obra			N/A		
	Lona de Cerramiento			N/A		
	Cinta de Reflectiva	X		SI	5	
	Señales Informativas y preventivas	X		SI	5	
	Uso de Paleteros			N/A		
	Iluminación Nocturna			N/A		
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	15	
				PROMEDIO	5	

GESTIÓN SOCIAL						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	Capacitación Personal	X		SI	5	
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	5	
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X		SI	5	
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos	X		SI	5	
	Programa de información a a la comunidad			N/A		
	Socializaciones			N/A		
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	20	
				PROMEDIO	5	

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Capacitación del Personal	X		SI	5	
	Mantenimiento Preventivo			N/A		
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	5	
	Ficha de control de actividades			N/A		
	Uso de equipos en buen estado, Certificados	X		SI	5	
	Elementos de protección personal	X		SI	5	
	Extintores	X		SI	5	
	Medidas de Contingencia	X		SI	5	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	30	
				PROMEDIO	5	

MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS	Capacitación del Personal			N/A		
	Mantenimiento Preventivo			N/A		
	Definición de Horarios de trabajo			N/A		
	Ficha de control de actividades			N/A		
	Uso de equipos en buen estado,			N/A		
	Elementos de protección personal			N/A		
	Extintores			N/A		
	Medidas de Contingencia			N/A		
	Volumen de material (m3)			N/A		
	Volumen de excavcion (m3)			N/A		
	Volumen de demolicion (m3)			N/A		
	Volumen de tierra (m3)			N/A		
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	0	
				PROMEDIO	0	

DOCUMENTACIÓN	NUMERO	
REGISTRO PROVEEDOR:		
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN ESCOMBRERA:		

MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACIÓN	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES	Capacitación Personal			N/A		
	Dotación de elementos de protección personal			N/A		
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional			N/A		
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos			N/A		
	Programa de información a a la comunidad			N/A		
	Socializaciones			N/A		
	Arboles talados			N/A		
	Arboles podados			N/A		
	Arboles bloqueados			N/A		
	Arboles sembrados			N/A		
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	0	
				PROMEDIO	0	

RESULTADO DE LA GESTION EN CAMPO	PUNTAJE	%	RESULTADO
	35,00	83,3	Buena

OBSERVACIONES GENERALES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia **martes, 2 de junio de 2026**

Firma
ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202093647 CND

Firma
MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SUPERVISOR
N° Matrícula Profesional: 25202-394697

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**	**Código: F - 252** Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META**

Fecha: 2/06/2026

CONTRATO N°	**N° 103-13-09-005 DE 2025**	**PROYECTO N°**	**N° 103-13-09-005 DE 2025**
OBJETO DEL PROYECTO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GRL		
NIT:	902.021.128-6		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

NUMERO DE PLANILLA:	9506052020 - 9505633072 - 9506055293	**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:**	23 de mayo de 2026	a	2 de junio de 2026

Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ	DIRECTOR DE OBRA	86.039.315	$ 1.750.905	30	SANITAS	$ 218.900,00	COLPENSIONES	$ 280.200,00	$ 121.900,00				$ 621.000
LUIS FERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA	RESIDENTE DE OBRA	1.006.718.337	$ 1.750.905	2	SANITAS	$ 4.700,00	PROTECCIÓN	$ 18.700,00	$ 8.200,00			$ 4.700,00	$ 36.300
ROSEMARY HURTADO MEJIA	RESIDENTE HSEQ	1.121.834.191	$ 1.750.905	30	FAMISANAR	$ 218.900,00	PORVENIR	$ 280.200,00	$ 121.900,00				$ 621.000
PRIETO SALAMANCA	ORNAMENTADOR	86.086.169	$ 1.750.905	2	FAMISANAR	$ 4.700,00	PORVENIR	$ 18.700,00	$ 8.200,00			$ 4.700,00	$ 36.300
DIXON GERMAN MARTINEZ BELTRAN	AYUDANTE	1.069.898.533	$ 1.750.905	2	FAMISANAR	$ 4.700,00	PORVENIR	$ 18.700,00	$ 8.200,00			$ 4.700,00	$ 36.300
												Total	$ 1.350.900,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **2/06/2026**

Firma:
ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS GRL

Firma:
ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202093647 CND

Firma:
WALVIN JHOVANNY CAICEDO GARCIA
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 268627-T

Firma:
MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SUPERVISOR
N° Matrícula Profesional: 25202-394697

OBSERVACIONES.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LÓPEZ - META	23	5	2026	7:00 a.m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	103-13-09-005 DE 2025	PROYECTO N°	103-13-09-005 DE 2025
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N/A		
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se realizan actividades intermitentes a causa de las lluvias
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias		3		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	2	SI		EQUIPO DE SOLDADURA	1	
OFICIAL				COMPRESOR	1	
OPERARIO						
AYUDANTE	4	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCIÓN CANCHAS	M2	CIC	24,74	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
N/A	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO VALENCIA C.	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 091037-0626193 CND	
Nombre: N/A	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre: ROSEMBERTH LÓPEZ HERNÁNDEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093647 CND	
Nombre: N/A	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LÓPEZ - META	24	5	2026	7:00 a.m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	103-13-09-005 DE 2025	PROYECTO N°	103-13-09-005 DE 2025
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N/A		
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se realizan actividades con normalidad
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	2	SI		EQUIPO DE SOLDADURA	1	
OFICIAL				COMPRESOR	1	
OPERARIO						
AYUDANTE	4	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCIÓN CANCHAS	M2	CIC	24,74	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
N/A	SE REALIZARON ACTIVIDADES EL DÍA DOMINGO PARA RECUPERAR PARTE DEL TIEMPO PERDIDO DURANTE LA SEMANA ANTERIOR A CAUSA DE LAS FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO VALENCIA C.	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 091037-0626193 CND	
Nombre: N/A	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre: ROSEMBERTH LÓPEZ HERNÁNDEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093647 CND	
Nombre: N/A	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LÓPEZ - META	25	5	2026	7:00 a.m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	103-13-09-005 DE 2025	PROYECTO N°	103-13-09-005 DE 2025
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N/A		
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se realizan actividades intermitentes a causa de las lluvias
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias		2		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	2	SI		EQUIPO DE SOLDADURA	1	
OFICIAL				COMPRESOR	1	
OPERARIO						
AYUDANTE	4	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	POLIDEPORTIVO JUANA SOFIA	100,00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
SI	Se realizan actividades intermitentes a causa de las lluvias

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO VALENCIA C.	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 091037-0626193 CND	
Nombre: N/A	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre: ROSEMBERTH LÓPEZ HERNÁNDEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093647 CND	
Nombre: N/A	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LÓPEZ - META	26	5	2026	7:00 a.m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	103-13-09-005 DE 2025	PROYECTO N°	103-13-09-005 DE 2025
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N/A		
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presentan fuertes lluvias
TORMENTA	X	X		
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias		8		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	2	SI		EQUIPO DE SOLDADURA	1	
OFICIAL				COMPRESOR	1	
OPERARIO						
AYUDANTE	4	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
SI	NO ES POSIBLE REALIZAR ACTIVIDADES POR CAUSA DE LAS FUERTES LLUVIAS DURANTE EL DÍA

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO VALENCIA C.	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 091037-0626193 CND	
Nombre: N/A	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre: ROSEMBERTH LÓPEZ HERNÁNDEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093647 CND	
Nombre: N/A	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LÓPEZ - META	27	5	2026	7:00 a.m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	103-13-09-005 DE 2025	PROYECTO N°	103-13-09-005 DE 2025
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N/A		
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presentan fuertes lluvias
TORMENTA	X	X		
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias	8			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	2	SI		EQUIPO DE SOLDADURA	1	
OFICIAL				COMPRESOR	1	
OPERARIO						
AYUDANTE	4	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
SI	NO ES POSIBLE REALIZAR ACTIVIDADES POR CAUSA DE LAS FUERTES LLUVIAS DURANTE EL DÍA

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO VALENCIA C.	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 091037-0626193 CND	
Nombre: N/A	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre: ROSEMBERTH LÓPEZ HERNÁNDEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093647 CND	
Nombre: N/A	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LÓPEZ - META	28	5	2026	7:00 a.m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	103-13-09-005 DE 2025	PROYECTO N°	103-13-09-005 DE 2025
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N/A		
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	2	SI		EQUIPO DE SOLDADURA	1	
OFICIAL				COMPRESOR	1	
OPERARIO						
AYUDANTE	4	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	POLIDEPORTIVO JUANA SOFIA	60,00	SI	SI
PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL	M2	VILLA SUIZA	61,56	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
SI	NO ES POSIBLE EJECUTAR LABORES DEBIDO A QUE EL SERVICIO DE ENERGÍA FUE SUSPENDIDO DE 7:00 AM A 5:00 PM EN TODO EL MUNICIPIO

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO VALENCIA C.	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 091037-0626193 CND	
Nombre: N/A	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre: ROSEMBERTH LÓPEZ HERNÁNDEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093647 CND	
Nombre: N/A	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LÓPEZ - META	29	5	2026	7:00 a.m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	103-13-09-005 DE 2025	PROYECTO N°	103-13-09-005 DE 2025
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N/A		
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se realizan actividades intermitentes a causa de las lluvias
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias		2		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	2	SI		EQUIPO DE SOLDADURA	1	
OFICIAL				COMPRESOR	1	
OPERARIO						
AYUDANTE	4	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
MANTENIMIENTO DE ETRUCTURAS METALICAS	M	POLIDEPORTIVO JULIO FLOREZ	2,00	SI	SI
MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA	M2	POLIDEPORTIVO JULIO FLOREZ	14,04	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
SI	Se realizan actividades intermitentes a causa de las lluvias

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO VALENCIA C.	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 091037-0826193 CND	
Nombre: N/A	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre: ROSEMBERTH LÓPEZ HERNÁNDEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093647 CND	
Nombre: N/A	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
PUERTO LÓPEZ - META	30	5	2026	7:00 a.m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	103-13-09-005 DE 2025	PROYECTO N°	103-13-09-005 DE 2025
CONTRATO INTERVENTORIA N°	N/A		
OBJETO PROYECTO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se realizan actividades intermitentes a causa de las lluvias
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias		2		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	2	SI		EQUIPO DE SOLDADURA	1	
OFICIAL				COMPRESOR	1	
OPERARIO						
AYUDANTE	4	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
MANTENIMIENTO DE ETRUCTURAS METALICAS	M	POLIDEPORTIVO EL PRADO	2,00	SI	SI
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON 2.00 X2.00M; INCLUYE 2 HOJAS TUBERIA A.N. 1-1/4"; E=1.5MM Y MALLA ESLABONADA	U	POLIDEPORTIVO EL PRADO	1,00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
N/A	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS FERNANDO VALENCIA C.	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 091037-0626193 CND	
Nombre: N/A	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre: ROSEMBERTH LÓPEZ HERNÁNDEZ	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202093647 CND	
Nombre: N/A	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.
