





	operativos, un (1) residente de obra y una (1) SST.  Residente de obra
NOTA 19 03/02/26	Se continua con la reinstalacion de lavamanos en policuerpo en los baños del primer piso - bloque C. y se terminan con la subsanacion de observaciones para entrega de los baños al lado de los comedores. En obra se cuenta con: cinco (5) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) SST.  Residente de obra
NOTA 20 04/02/26.	Se realiza entrega parcial al colegio de las dos primeras baterias sanitarias ubicadas en el primer piso al lado de los comedores. tambien se continua con la reinstalacion de sanitarios y lavamanos en los baños primer piso del bloque C. En obra se cuenta con: cinco (5) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) SST.  Residente de obra
NOTA 21 05/02/26.	Se realiza lavado, limpieza y aseo final en baños del primer piso - bloque C alistandolos para entrega. de igual manera se inicia con la reinstalacion de los

	lavamanos en policarbonato de los baños ubicados en el 1er Piso al lado de los talleres. En obra se cuenta con: Cuatro (4) personal operativos, Un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.  Residente de obra
NOTA 22. 06/02/26.	Se realiza entrega parcial al colegio de las siguientes dos baterías sanitarias ubicadas en el primer piso del bloque C. También se continua con la reinstalación de lavamanos en policarbonato de los baños ubicados al lado de los talleres. En obra se cuenta con: Cuatro (4) personal operativos, un (1) residente de obra y una SST.  Residente de obra
NOTA 23. 07/02/26	Se realiza mantenimiento a orinal en baño niños del primer piso de talleres. que presentaba taponamiento y push abierado. Se realiza instalación de espejos en todos los baños intervenidos. En obra se cuenta con: Seis (6) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.  Residente de obra

NOTA 24. 09/02/26.	Se evidencia que uno de los sanitarios del baño de niñas en los baños primer piso al lado de talleres se encuentra fisurado presentando filtraciones por lo cual se solicita el cambio por uno nuevo. de igual manera se termina con la instalacion de lavamanos y se procede a realizar el aseo, limpieza y lavado final de los ultimos baños para realizar la entrega. En obra se cuenta con: Cuatro (4) personal operatival, un(1) residente de obra y una(1) SST. Residente de obra
NOTA 25 10/02/26.	Se termina con el aseo y limpieza final de los baños ubicados en el primer piso al lado de los talleres para entregar al colegio. A la espera de que llegue el sanitario para cambio reportado en la nota anterior. En obra se cuenta con: cuatro (4) personal operatival, un (1) residente de obra y una (1) Inspectora SST. Residente de obra
NOTA 26. 11/02/26.	Se realiza instalacion del sanitario pendiente y se culmina todo para realizar la entrega al colegio. En obra se cuenta con: dos(2) personal operatival, un(1) residente obra y una(1) SST. Residente de obra

NOTA 27. 12/02/26.	Se realiza entrega de los baños ubicados en el primer piso al lado de talleres al colegio. En obra se cuenta con: Un (1) residente de obra.  Residente de obra
NOTA 28. 18/02/26.	Se realiza pruebas de presion al sistema Hidraulico del colegio en presencia del especialista hidraulico de la Secretaria de educacion, almacenista del colegio, Interventoria y Contratista, donde se evidencia que el sistema presenta picos con variaciones de presion por lo que se propone instalar una valvula de regulacion de presión en el cuarto de bombas. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativos, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST. Se retiran baños portatiles.  Residente de obra
NOTA 29 20/02/26.	Se realiza instalacion de dos (2) divisiones en acero inoxidable para los baños de niños en los baños del primer piso al lado de los comedores. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativos y un (1) residente obra  Residente de obra

NOTA 30. 28/02/26.	Por solicitud de secretaria de educacion debido al vandalismo de los estudiantes se realiza reinstalacion de divisiones existentes, sellamiento de flish de las pared desmontables con pegamento especial y sellado de todo tipo de huecos en muros existentes en los baños intervenidos. En obra se cuenta con: dos(2) personal operativos, un(1) residente de obra y una(1) inspectora SST. Residente de obra
NOTA 31 18/03/26	Se realiza visita con el Asesor hidraulico y el subcontratista para revisar ubicacion y alcance de la valvula reguladora en el cuarto de bombas. Residente de obra
NOTA 32 30/03/26.	Se realiza el desmonte de los Mesones en Policarbonato existentes de los baños del primer piso; de igual manera ingresan los nuevos Mesones color Amarillo y se da inicio con su instalacion; En obra se cuenta con: Cuatro(4) Personal operativos, un (1) residente de obra y una(1) inspectora SST. Residente de obra

NOTA 33 01/04/26	Se continua y finaliza el montaje e instalacion de los nuevos mesones en policuarzo de los baños del primer piso. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativo, un(1) residente de obra y una SST. Residente de obra
NOTA 34. 04/04/26.	Se realiza la instalacion de sifones nuevos para los lavamanos, Se hacen pruebas y se realiza el aseo final de los espacios para la entrega final al colegio. En obra se cuenta con: Cuatro(4) personal operativo, un (1) residente de obra y una (1) SST. Residente de obra
NOTA 35 22/04/26	Se realiza cambio de push en lavamanos en los baños de profesores - 2do Piso, Se realiza limpieza y aseo final de los mismos para poner en funcionamiento; Se realiza intervencion en baño niñas bloque C Tercer piso, cambiando push del Sanitario de Movilidad reducida, Se realiza el aseo y limpieza final para poner en funcionamiento. En obra se cuenta con: dos (2) personal operativo y un(1) Residente obra. Residente de obra

NOTA 36. 01/05/26. Se realiza cambio Push de lavamanos en baño niños del bloque C - tercer piso, con todas las actividades que se requieren para ello, incluyendo su limpieza y aseo final. Tambien se realiza cambio de push de lavamanos en baño niñas del bloque B - tercer piso, con todas las actividades que se requieren incluyendo el aseo y limpieza final para poner en funcionamiento. En obra se cuenta con: dos (2) personas operativas, un (1) residente de obra y una (1) inspectora SST.

Residente de obra

NOTA 37. 04/05/26. Se retira escombros y basura de la obra y se le hace entrega de todos los espacios al colegio, en obra se cuenta con: dos (2) personas operativas y un (1) residente de obra.

Residente de obra

11 ₱₫ILE
BOSA

Nota No 001- Certificacion de apertura
10-03-2026

con esta fecha se da apertura a la Presente bitacora, con el fin de asentar y dejar constancia de las visitas a obra, recomendaciones tecnica, cambios de especificaciones y demas actuaciones y acontecimientos que afecte de manera directa o indirecta las actividades y acontecimiento correspondientes a la ejecucion del contrato de obra No 001 PCCNTR.8155233, suscrito entre la secretaria de educación del distrito de bogota y el consorcio obras educativas DT, cuya interventoria estara a cargo de la empres uniobras del oriente sas, la formas que aparecen al final identifican oficialmente a las Personas del contratista, interventoria y supervision que estaran facultadas para la utilizacion de este libro de Bitacora.

Director de interventoria
uniobras del oriente SAS

Residente de interventoria
uniobras del oriente SAS

Director de obra
Consorcio obras educativas
DT

Residente de obra
Consorcio obras educativas
DT

supervision
Secretaria de educación del distrito de
Bogota.

Nota No 003 - 10/03/2020

Clima : soleado
Inicio: 7:00 fin 5:00

Personal en obra : Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

se da inicio a la intervencion para el mejoramiento y mantenimiento en la Direccion local de educacion de Bosa.

Nota No.004 - 11/03/2020

Clima : soleado
Inicio 7:00 fin 5:00

Personal en obra : Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

se inicia con el desmonte de la teja de barro Presente en el Pasillo de la direccion local de educacion.

Nota No 005 - 12/03/2026

Clima: soleado
Inicio 7:00 fin 5:00

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

se continua con desmonte de teja de barro, se desmonta placa de superboard y se procede a montar placa nueva.

Nota N 006 - 13/03/2026

Clima : soleado
Inicio 7:00 fin 5:00

Personal en obra: Residente de obra, 1 ofical, 1 ayudante

se continua con desmonte de teja de barro, desmonte de placa de Puper board, montaje de placa en superboar y montaje de teja en eternit

Nota N 007 - 14/03/2026

Clima: soleado
Inicio 7:00 fin 5:00

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se continua con desmonte de teja de barro, montaje de placa en superboard y montaje de teja en eternit

Nota No. 008 16/03/2026

Clima: Soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 5:00 p.m

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 Ayudante.

Se continua con desmonte de teja de barro, montaje de placa en superboard, desmonte de placa de superboad (antigua) y preparación y montaje de teja en eternit

Nota No. 009 17/03/2026

Clima: Soleado
Inicio: 7:00 a.m Fin: 5:00pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante.

Se continua con desmonte de teja de barro, desmonte de placa superboard y preparación de teja eternit.

Nota No. 010 18/03/2026

Clima: Soleado
Inicio: 7:00 a.m Fin 5:00 p.m

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se continuan trabajos en cubierta, desmonte de teja de barro, placa superboard y montajes de placa superboard

Nota No.011 19/03/2026

Clima: lluvioso
Inicio: 7:00 am Fin: 5:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se continua con desmontaje de teja de barro en horas de la mañana, por dia lluvioso se detiene el trabajo en cubierta

Nota No. 012 20/03/2026

Clima: soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 5:00pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se retoman labores de desmonte de teja de barro y placa superboard, se prepara la teja eternit para próximo montaje

Nota No.013 21/03/2026

Clima: soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 12:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 Ayudante

Se finaliza el desmonte de teja y superboard

Norma

Nota No. 014 24/03/2026

Clima: Soleado
Inicio: 7:00am Fin: 5:00pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se continua con el montaje de placa superboard y tejas eternit existentes.

Nota No. 015 25/03/2026

Clima: soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 5:00pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se continua el montaje de elementos en cubierta y se adelantan labores de pintura en oficina de la directora DILE

Nota No. 016 26/03/2026

Clima: Soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 5:00pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se hacen resanes y pintura en oficina principal, se prepara el espacio para pintura en muro interior.

Norma

Nota NO. 017 27/03/2026

Clima: Soleado

Inicio: 7:00 am Fin 5:00pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se inicia con la pintura de muro interior Dile, esto incluye preparacion del área, retiro de elementos y resane

Nota No. 018 28/03/2026

Clima: Soleado

Inicio: 7:00 am Fin: 12:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se continuan labores de pintura y resane, se detiene el trabajo en cubierta por falta de material

Nota No. 019 30/03/2026

Clima: soleado

Inicio: 7:00 am Fin: 12:00pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se terminan labores de pintura en zona interior y se da inicio a mantenimiento en fachada exterior

Nota No. 020 31/03/2026

Clima: Soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 5:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante.

Se continua con el picado de muro en fachada exterior, retiro de revoque y pintura existente.

Nota No. 021 01/04/2026

Clima: Soleado
inicio: 7:00 am Fin: 5:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Continuan las labores de picado de muro en fachada exterior y preparación del espacio para empañetar.

Nota No. 022 04/04/2026

Clima: soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 5:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se da inicio a la aplicación de pañete en muro exterior y retiro de enchape de piso en zona exterior

Norma

Nota No. 023 06/04/2026

Clima. Soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 5:00pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se continua con la aplicación de pañete en muro exterior y retiro de enchape de piso y escaleras exteriores

Nota No. 024 07/04/2026

Clima: soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 5:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se continua con el retiro de enchape en piso y escaleras de la zona exterior, y con la aplicación de pañete, de igual manera se da pintura a elementos en madera pertenecientes a columas exteriores

Nota No. 025 08/04/2026

Clima: Soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 5:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se finaliza el aplicado de pañete en muro exterior, se continua

el retiro de enchape y pintura de elementos en madera

Nota No. 026 09/04/2026

Clima: Soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 5:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se espera secado de pañete mientras se finaliza el retiro de enchape existente tanto piso como escaleras

Nota. No. 027 10/04/2026

Clima: Soleado
Inicio: 7:00am Fin: 5:00pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se retoman labores correspondientes a cubierta con la instalación de teja en eternit con la llegada del material

12

Nota No.028 11/04/2026

Clima: Soleado
Inicio 7:00 am Fin: 12:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se continua con la instalación de teja de eternit

Nota: No. 029 13/04/2026

Clima: Soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 5:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se continua con montaje de teja eternit y se verifica el secado de pañete aplicado en muro exterior

Nota. No. 030 14/04/2026
C
Clima: Soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 5:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se continua con montaje teja eternit y se finaliza el retiro de enchape en zona exterior

Nota. No.031 15/04/2026

Clima: Soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 5:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se continua con el montaje en cubierta, correspondiente a la teja eternit

Nota No.032 16/04/2026

Clima: Soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 5:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se continua la instalación de teja eternit, y se adelantan labores de pintura en muro exterior previamente pañetado

Nota: No. 033 17/04/2026

Clima: soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 5:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se continua con la instalación de teja eternit

14

Nota No. 034 18/04/2026

Clima: Soleado
Inicio: 7:00 am Fin. 12:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se continuan labores de montaje en cubierta

Nota No. 035 20/04/2026

Clima: Soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 5:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se finaliza en su totalidad el cambio de teja de barro, por teja eternit y el superboard antiguo por uno nuevo.

Nota No. 036 21/04/2026

Clima: soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 5:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se procede con la pintura del muro previamente empañetado en la zona exterior

Nota No. 037 21/04/2026

Clima: Soleado
Inicio: 7:00am Fin: 5:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se continua con la aplicación de pintura en muros exteriores y se inicia con la instalación del nuevo enchape

Nota No. 038 22/04/2026

Clima: Soleado
Inicio: 7:00am Fin: 5:00pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se finaliza la pintura de muros, y se continua con la instalación de enchape en piso y tableta en gres para las escaleras

Nota No. 039 23/04/2026

Clima: Soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 5:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se continuan labores de instalación de enchape

Nota No.040 24/04/2026

Clima. soleado
Inicio: 7:00 am Fin 5:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se continuan labores que incluyen el enchapado de piso y escaleras exteriores

Nota No. 041 25/04/2026

Clima: soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 12:00pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se continua instalando el enchape en piso y escalera exteriores.

Nota No. 042 27/04/2026

Clima: Soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 7:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se continua con la instalación de enchape

Nota No. 043 28/04/2026

Clima: Soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 5:00pm

Personal en Obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se continua con instalación de enchape y tableta en gres

Nota No. 044 29/04/2026

Clima: Soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 5:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se continua con instalación de enchape y tableta en gres, se procede con el retiro de anclajes previamente instalados por cambio en diseño de reja

Nota No. 045 30/04/2026

Clima: Soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 5:00 pm

Se continua con instalación de enchape en piso y tableta en gres

Norma

Nota No.046 02/05/2026

Clima: Soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 12:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 Ayudante

Se finaliza la instalación de enchape en piso y tableta en gres de escaleras

Nota No. 047 04/05/2026

Clima: Soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 5:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se inicia con la instalación de reja ornamental zona posterior DILE

Nota No.048 05/05/2026

Clima:(7:00 am) Soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 5:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se continua con la instalación de la reja en la zona posterior DILE

Nota No.049 06/05/2026

Clima: Soleado
Inicio: 7:00 am Fin: 5:00 pm

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se finaliza la instalación de reja ornamental y se procede a la aplicación de pintura en las rejas correspondientes a ventanería de fachada exterior

Nota No.050 07/05/2026

Clima: Soleado
Inicio: 7:00am Fin: 5:00 pm

Personal en obra: Director de interventoría, Residente de interventorra, director de obra, residente de obra, Profesional SST, ingenieros administrativos de obra, 1 oficial, 1 ayudante

Se realiza visita de obra en compañía de profesionales de interventoría, donde se realiza una revisión general de las actividades intervenidas, donde se evidencia que dichas actividades se ejecutaron en su totalidad conforme a lo planeado. Asimismo se atienden observaciones realizadas por interventoría y se programa la entrega del establecimiento para el dra 11 de mayo de 2026

Norma

CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS DT - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155233-2025

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."

ANEXO No. 1

INFORME DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

PERIODO: Del 14 de abril de 2026 al 13 de mayo de 2026

VERSIÓN 2
VOLUMEN 1 DE 1

REGISTRO DE REVISIONES Y APROBACIONES

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ	Harry Arango	Director de Interventoría	
PRESENTÓ	Marlon Gustavo Conde B.	Director de Obra Contratista	
ELABORÓ	Paula Juliana Sánchez Rodríguez	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	

MODIFICACIONES		
FECHA	**VERSIÓN**	**CAMBIO**
Mayo de 2026	V2	Elaboración del documento

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 4
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO 8
4. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL CONTRATO 10
4.1. PERSONAL DEL CONTRATANTE – SED 10
4.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA – CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS DT. 10
5. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO 11
6. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 11
6.1. ATENCIÓN DE QUEJAS, RECLAMOS O SUGERENCIAS: 11
7. PERSONAL DEL PROYECTO 12
8. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 15
9. REGISTRO DE INSPECCIONES PLANEADAS Y PERMISOS DE TRABAJO 15
10. REGISTRÓ ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 15
11. FORMACIÓN DE PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 16
12. GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 17
13. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 17
14. ACTIVIDADES DE ORDEN Y ASEO EN EL PROYECTO 19
15. CONCLUSIONES 19

Introduce el texto aquí

LISTADO DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Sedes a Intervenir en el Proyecto 7
Tabla 2. Información del contrato. 9
Tabla 3. Personal del Contratante. 10
Tabla 4. Personal del Contratista. 10
Tabla 5. Socialización para el inicio de actividades de Obra. 11

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Pág.

Ilustración 1. Mapa de Ubicación General. 5
Ilustración 2. Mapa de Ubicación Regional 6

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El pasado 28 de marzo de 2025, La Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá D.C. convoca a las empresas interesadas en el proceso de licitación Pública No. SED-LP-OP-DCCEE-012-2025 cuyo objeto fue "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICASPRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Posteriormente, el 29 de abril de 2025, consorcio Obras Educativas DT presenta su propuesta, la cual es seleccionada y adjudicada mediante la resolución 0071 del 05 de agosto de 2025.

Así las cosas, el 03 de septiembre de 2025, se suscribe el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155233-2025, entre la Secretaría de Educación Distrital y el consorcio Obras Educativas DT.

Habiéndose cumplido todos los requisitos de perfeccionamiento del contrato No. CO1.PCCNTR.8155233-2025, el día 14 de octubre de 2025 se dio inicio al mismo, mediante la firma de Acta de Inicio correspondiente.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado de la siguiente manera:

- **País:** Colombia.
- **Departamento:** Cundinamarca
- **Municipio:** Bogotá D.C.
- **Localidades:**
  06 - Tunjuelito
  07 - Bosa
  08 - Kennedy
- **Dirección:** Varias – Ver Tabla No. 1

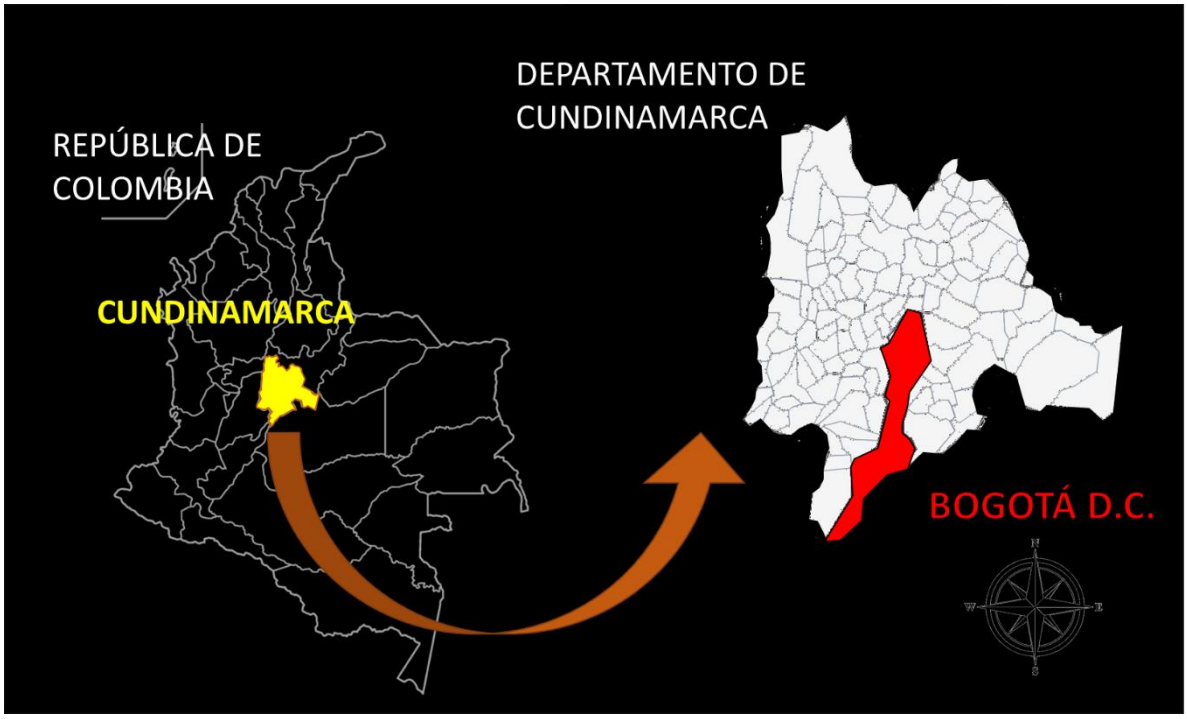


Ilustración 1. *Mapa de Ubicación General.*
Fuente: *https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Palmira%2C_Valle%2C_Colombia_%28ubicaci%C3%B3n%29.PNG*

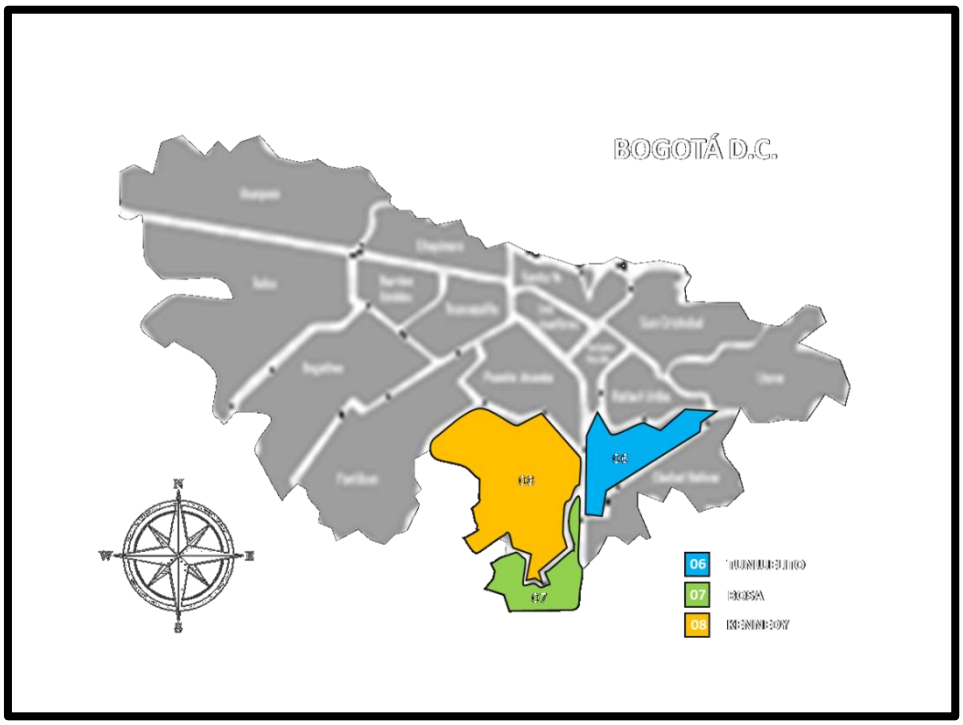


Ilustración 2. *Mapa de Ubicación Regional*
Fuente: *Producción Propia*

Las Instituciones Educativas a cargo de la secretaria de Educación Distrital, en las cuales se estableció se harán obras de mejoramiento a la infraestructura de las mismas, se encuentran distribuidas en las localidades de la ciudad de Bogotá mencionadas líneas arriba; se intervendrán las ocho (08) sedes que componen el proyecto y que son mencionadas a continuación, las cuales cuentan con la siguiente localización y características:

No.	CPF	LOCALIDAD	INSTITUCIÓN EDUCATIVA / COLEGIO / ENTIDAD	SEDE	NOMBRE DE SEDE	DIRECCIÓN	ZONA	COORDENADAS
SEDES CONTACTUALES INICIALES								
1	618	TUNJUELITO	VENECIA	SEDE B	NUEVO MUZÚ	KR 59 # 52 A - 30 SUR. BOGOTÁ D.C.	SUR OCCIDENTE	4°35'10.29"N 74° 8'51.49"O
2	745	BOSA	LEONARDO POSADA PEDRAZA	SEDE A	METROVIVIENDA	KR 92 # 72 - 42 SUR. BOGOTÁ D.C.	SUR OCCIDENTE	4°37'38.30"N 74°12'3.28"O
3	812	KENNEDY	SAN RAFAEL	SEDE B	CATALINA	TV 78 D # 53 - 21 SUR. BOGOTÁ D.C.	SUR OCCIDENTE	4°36'36.98"N 74°10'8.46"O
4	605	TUNJUELITO	MARCO FIDEL SUAREZ	SEDE A	MARCO FIDEL SUAREZ	DG 52 SUR # 25 - 00 / KR 25 # 52 C - 92 SUR. BOGOTÁ D.C.	SUR OCCIDENTE	4°34'41.09"N 74° 8'6.31"O
5	845	KENNEDY	VILLA RICA	SEDE A	VILLA RICA	KR 77 K BIS A # 50 - 26 SUR. BOGOTÁ D.C.	SUR OCCIDENTE	4°36'20.51"N 74°10'1.52"O
6	623	TUNJUELITO	SAN BENITO ABAD	SEDE A	DIANA TURBAY	CL 58 SUR # 19 B - 67. BOGOTÁ D.C.	SUR OCCIDENTE	4°33'58.94"N 74° 8'13.83"O
7	860	KENNEDY	CLASS	SEDE B	CIUDAD ROMA	CL 56 A SUR # 78 A - 20. BOGOTÁ D.C.	SUR OCCIDENTE	4°36'30.08"N 74°10'16.91"O
8	608	TUNJUELITO	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO	SEDE D	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	CL 51 SUR # 36 - 86. BOGOTÁ D.C.	SUR OCCIDENTE	4°35'15.66"N 74° 8'14.82"O

***Tabla 1**. Sedes a Intervenir en el Proyecto*
Fuente: Producción Propia

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO

PROCESO No.	SED-LP-OP-DCCEE-012-2025			
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA			
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No.	0071			
FECHA DE ADJUDICACIÓN	5/08/2025			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8155233-2025			
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	3/09/2025			
LUGAR DE EJECUCIÓN	**No.**	**Institución Educativa**	**Sede**	**Dirección**
	1	CPF 618 I.E.D. VENECIA	SEDE B - NUEVO MUZÚ	KR 59 # 52 A - 30 SUR, LOCALIDAD DE TUNJUELITO, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	2	CPF 745 I.E.D. LEONARDO POSADA PEDRAZA	SEDE A - METROVIVIENDA	KR 92 # 72 - 42 SUR, LOCALIDAD DE BOSA, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	3	CPF 812 I.E.D.SAN RAFAEL	SEDE B - CATALINA	TV 78 D # 53 - 21 SUR, LOCALIDAD DE KENNEDY, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	4	CPF 605 I.E.D. MARCO FIDEL SUAREZ	SEDE A - MARCO FIDEL SUAREZ	DG 52 SUR # 25 - 00 - KR 25 # 52 C - 92 SUR, LOCALIDAD DE TUNJUELITO, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	5	CPF 845 I.E.D. VILLA RICA	SEDE A - VILLA RICA	KR 77 K BIS A # 50 - 26 SUR, LOCALIDAD DE KENNEDY, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	6	CPF 623 I.E.D.SAN BENITO ABAD	SEDE A - DIANA TURBAY	CL 58 SUR # 19 B - 67, LOCALIDAD DE TUNJUELITO, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	7	CPF 860 I.E.D.CLASS	SEDE B - CIUDAD ROMA	CL 56 A SUR # 78 A - 20, LOCALIDAD DE KENNEDY, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
	8	CPF 608 I.E.D. INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO	SEDE D - NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	CL 51 SUR # 36 - 86, LOCALIDAD DE TUNJUELITO, SUR OCCIDENTE. BOGOTÁ D.C.
NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - GRUPO 9			
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.426.857.240,00			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN LETRAS	DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SITE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS			
VALOR ADICIÓN No. 1	$ 0,00			
FECHA ADICIÓN No. 1	A LA FECHA NO SE REGISTRAN ADICIONES AL CONTRATO			
VALOR ADICIÓN No. 1 EN LETRAS	A LA FECHA NO SE REGISTRAN ADICIONES AL CONTRATO			
VALOR ADICIÓN No. 2	$ 0,00			
FECHA ADICIÓN No. 2	N.A.			

VALOR ADICIÓN No. 2 EN LETRAS	N.A.			
VALOR TOTAL ADICIONES	$ 0,00			
VALOR ADICIONES EN LETRAS	A LA FECHA NO SE REGISTRAN ADICIONES AL CONTRATO			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 2.426.857.240,00			
VALOR FINAL DEL CONTRATO EN LETRAS	DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SITE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS			
FECHA DE INICIO	14/10/2025			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	**EN DÍAS**	212	**EN MESES**	7
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	13/05/2026			
FECHA PRÓRROGA No. 1	N.A			
PLAZO PRÓRROGA No. 1	**EN DÍAS**		**EN MESES**	
FECHA PRÓRROGA No. 2	N.A			
PLAZO PRÓRROGA No. 2	**EN DÍAS**		**EN MESES**	
FECHA PRÓRROGA No. 3	N.A			
PLAZO PRÓRROGA No. 3	**EN DÍAS**		**EN MESES**	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	**EN DÍAS**	212	**EN MESES**	7
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	13/05/2026			
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL			
N.I.T.	899.999.061 – 9			
ORDENADOR DEL GASTO	ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	16.070.546	MANIZALES, CALDAS.	
CARGO	DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SED			
SUPERVISOR DE CONTRATO	ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO			
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. OSCAR JULIAN TELLEZ QUITIAN			
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO No. 66-63. BOGOTÁ D.C.			
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS DT			
N.I.T.	901.973.776 – 1			
CONSORCIADO No. 1	DOMO ACUSTICA S.A.S.		PORCENTAJE PARTICIPACIÓN	10,00%
N.I.T.	900.499.791 – 4			
CONSORCIADO No. 2	GRUPO TITANIUM S.A.S.		PORCENTAJE PARTICIPACIÓN	90,00%
N.I.T.	900.749.719 – 7			
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	1.019.007.501	BOGOTÁ D.C.	
DIRECCIÓN	CARRERA 55 No. 152B - 68. OFICINA 1503. BOGOTÁ D.C.			
TELÉFONO	(57 - 60 - 1) 718 94 31			
CORREO ELECTRÓNICO	obraseducativasdt.2025@gmail.com			
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S.			
N.I.T.	829.000.956-3			
CONTRATO No.	CO1. PCCNTR.8169111-2025			
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	MIRIAM LUZ GUTIÉRREZ CORREA			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	46.644.261		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRRECTIVO DE LAS PALANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS Y PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE No 3			
DIRECCIÓN	SUBA			

TELÉFONO	3102009455
CORREO ELECTRÓNICO	lote3uniobras@gmail.com

Tabla 2. *Información del contrato.*
Fuente: *Producción Propia.*

4. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL CONTRATO

El proyecto cuenta con el siguiente personal asignado por el Contratante y el Contratista:

4.1. PERSONAL DEL CONTRATANTE – SED

PERSONAL AUTORIZADO POR SED	
NOMBRE	**CARGO**
ING. OSCAR JULIAN TELLEZ QUITIAN	APOYO A LA SUPERVISION

Tabla 3. *Personal del Contratante.*
Fuente: *Producción Propia.*

4.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA – CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS DT.

PERSONAL AUTORIZADO POR CONTRATISTA DE OBRA	
CARGO	**NOMBRE**
Representante Legal	Carlos Andrés Salazar Tobón
Director de Obra	Marlon Gustavo Conde Benavides
Residente de Obra	Javier Sebastián Guzmán Munar
Especialista Estructural	Walber Alex Salazar Hernández
Especialista Ambiental	Ingrid Johanna Salcedo Sierra
Especialista en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos	Jorge Orlando Salazar Saldarriaga
Especialista en Redes Hidrosanitarias, de Gas y Red Contraincendios	Ángela Isabel Ríos Fresneda
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Paula Juliana Sánchez Rodríguez
Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	Nelson Rodrigo Saavedra Nieto
Inspector de Obra 1	Nicolás Santiago Vergara Alfonso
Inspector de Obra 2	Santiago Rueda Caro

Tabla 4. *Personal del Contratista.*
Fuente: *Producción Propia.*

5. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO

El día 22 de octubre de 2025, se realizó la caracterización del proyecto mediante el levantamiento de las actas de vecindad de las ocho (8) instituciones que contractualmente hacen parte del alcance; dichas actas se anexan al presente informe.

6. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

6.1. ATENCIÓN DE QUEJAS, RECLAMOS O SUGERENCIAS:

A la fecha del presente informe, no se ha recibido activado ningún mecanismo de atención a la comunidad (PQRS).

Sin embargo, se realizó la socialización con los rectores y personal administrativo de las diferentes instituciones educativas. Se anexan al presente informe.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
CPF 618 I.E.D. VENECIA, SEDE B - NUEVO MUZÚ	24/12/2025
CPF 745 I.E.D. LEONARDO POSADA PEDRAZA, SEDE A - METROVIVIENDA	11/12/2025
CPF 812 I.E.D.SAN RAFAEL, SEDE B - CATALINA	24/12/2025
CPF 605 I.E.D. MARCO FIDEL SUAREZ, SEDE A - MARCO FIDEL SUAREZ	13/11/2025
CPF 845 I.E.D. VILLA RICA, SEDE A - VILLA RICA	27/11/2025
CPF 623 I.E.D.SAN BENITO ABAD, SEDE A - DIANA TURBAY	12/11/2025
CPF 860 I.E.D.CLASS, SEDE B - CIUDAD ROMA	20/11/2025
CPF 608 I.E.D. INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO, SEDE D - NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	12/11/2025
IDE HERNANDO DURAN DUSSAN	24/03/2026
DILE BOSA	26/03/2026

Tabla 5. *Socialización para el inicio de actividades de Obra.*
Fuente: *Producción Propia.*

7. PERSONAL DEL PROYECTO

Durante el periodo comprendido entre el **14 de abril de 2026 y 13 de mayo de 2026**, el proyecto contó con el personal requerido para la ejecución de las actividades programadas.

DETALLE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO	Nº IDENTIFICACION	CARGO	CONTRATISTA	FRENTE DE OBRA
Javier Sebastián Guzmán Munar	1.014.266.805	Residente de Obra	Consorcio Obras Educativas DT	Marco Fidel Suarez – Piloto sede D
Aura Dayana Espinel Mora	52.964.201	Inspectora SST	Consorcio Obras Educativas DT	Marco Fidel Suarez – Piloto sede D – Nuevo Muzú
Brayan Camilo Rayo Ardila	1.072.717.848	Inspector de Obra	Consorcio Obras Educativas DT	Nuevo Muzú – Leonardo Posada – Villa Rica – DILE BOSA
Paula Juliana Sánchez Rodríguez	1.110.570.333	Residente SST	Consorcio Obras Educativas DT	Leonardo Posada – Villa Rica – DILE BOSA
Édison Albeiro Torres Salcedo	1.110.454.803	Maestro	Group Integral Pro	Leonardo Posada
Jorge González Solano	13.375.363	Maestro	Group Integral Pro	DILE BOSA
Baudilio Ramírez Angulo	10.321.025	Ayudante	Group Integral Pro	DILE BOSA

Nota: Para el periodo evaluado comprendido entre el **14 de abril de 2026 y el 13 de mayo de 2026, s**e anexan las planillas de seguridad social correspondientes al mes de abril, en cumplimiento de la obligación de reporte y pago

INGRESO DE PERSONAL

Durante el periodo evaluado **se registró el ingreso de personal operativo** al proyecto, vinculado por el **Consorcio Obras Educativas DT** y por los diferentes subcontratistas, con el fin de atender las necesidades de ejecución en los distintos frentes de obra.

El personal ingresado cumplió con el proceso de vinculación establecido, incluyendo el registro de ingreso, la verificación de afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social, la inducción en Seguridad

y Salud en el Trabajo y la socialización de los riesgos asociados a las labores a desempeñar, previo al inicio de actividades.

A continuación, se presenta el detalle del personal ingresado durante el periodo:

NOMBRE Y APELLIDO	Nº IDENTIFICACION	CARGO	CONTRATISTA	FECHA DE INGRESO	FRENTE DE OBRA
Cristian David Ramírez Paez	1.011.200.779	Ayudante	Group Integral Pro	13/04/2026	Villa Rica
Lisandro Mauricio Villada	80.113.959	Oficial	Group Integral Pro	13/04/2026	Villa Rica

RETIRO DE PERSONAL

Durante el periodo evaluado **se presentó el retiro de personal**, conforme a la información reportada por los subcontratistas vinculados al proyecto, efectuándose la respectiva actualización de los registros de control de personal.

NOMBRE Y APELLIDO	Nº IDENTIFICACION	CARGO	CONTRATISTA	FECHA DE RETIRO	FRENTE DE OBRA
Kevin Daniel Ramírez Páez	1.010.174.421	Ayudante	Group Integral Pro	30/04/2026	Marco Fidel Suarez
Wilmar Ramírez Chocontá	1.010.165.365	Oficial	Group Integral Pro	30/04/2026	Marco Fidel Suarez
Jarol Sebastián Martínez Rincón	1.012.350.124	Eléctrico	Energiza	04/04/2026	Marco Fidel Suarez
Wilmar Eduardo Rodríguez García	1.015.436.153	Eléctrico	Energiza	04/04/2026	Marco Fidel Suarez
Brayan Alejandro Toro Rodríguez	1.030.647.473	Maestro	COBE	07/03/2026	Hernando Duran Dussan
Jhon Alejandro Salgado Santana	1.007.296.319	Oficial	COBE	15/04/2026	Hernando Duran Dussan
Duban Stiven Ramírez Arciniegas	1.001.202.640	Ayudante	COBE	08/04/2026	Class
Pablo Enrique Huérfano	2.996.024	Maestro	Group Integral Pro	28/03/2026	Piloto sede D
Edwin Andrés Huérfano Criollo	1.012.406.005	Ayudante	Group Integral Pro	28/03/2026	Piloto sede D
Juan López Mendoza	4.906.745	Oficial	Group Integral Pro	11/04/2026	Piloto sede D
Marcos Adalber Galvis Cardozo	1.032.386.686	Oficial	Group Integral Pro	12/04/2026	Leonardo Posada
Gerson Arbey Velazco Castro	93.383.437	Oficial	Group Integral Pro	12/04/2026	Leonardo Posada

MEDICINA PREVENTIVA LABORAL

AUSENTISMO EN EL PROYECTO

Para el periodo comprendido entre el **14 de abril de 2026 al 13 de mayo de 2026**, no se registraron ausentismos por causas médicas ni por accidentes de trabajo (AT).

NOMBRE Y APELLIDO	CONTRATISTA	FECHA INICIO INCAPACIDAD	FECHA FIN DE INCAPACIDAD	DIAS DE INCAPACIDAD	DIAGNOSTICO

ACCIDENTALIDAD DEL PROYECTO

Durante la vigencia del periodo comprendido entre el **14 de abril de 2026 al 13 de mayo de 2026**, no se presentaron accidentes de trabajo en ninguno de los frentes de obra en ejecución.

INDICE MENSUAL	INDICE FRECUENCIA	INDICE SEVERIDAD	INDICE LESIONES INCAPACITANTES

CONSOLIDADO DE INDICADORES

Durante el periodo evaluado, y de acuerdo con los registros disponibles, los indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo presentan un resultado de **cero (0)**, debido a que no se registraron accidentes de trabajo, enfermedades laborales ni ausentismo por causa médica en los frentes de obra en ejecución.

INDICADOR	FORMULA	RESULTADO
Frecuencia de Accidentalidad	(# Accidentes de trabajo en el periodo / # de trabajadores promedio en el periodo) * 100	0
Severidad de Accidentalidad	(# de días de incapacidad por AT en el periodo / # de trabajadores promedio en el periodo) * 100	0
Incidencia de Enfermedad Laboral	(# de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo / promedio de trabajadores en el periodo) * 100.000	0
Ausentismo por causa medica	(# de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / # de días trabajados programados en el mes) * 100	0

AGENDA DE SEGURIDAD

Durante la vigencia del periodo comprendido entre el **14 de abril de 2026 al 13 de mayo de 2026**, se desarrollaron actividades de promoción y prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo, orientadas a la identificación, control y mitigación de los riesgos presentes en los diferentes frentes de obra, así como al fortalecimiento de la cultura de autocuidado y cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Dentro de las principales actividades ejecutadas se destacan:

- **Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo,** orientadas en la prevención de accidentes, el autocuidado, el uso adecuado de elementos de protección personal y el cumplimiento de los procedimientos seguros de trabajo.
- **Inducción en SST al personal vinculado durante el periodo,** garantizando la socialización de normas de seguridad, riesgos asociados a las actividades, las medidas preventivas y lineamientos generales del SG-SST antes del inicio de labores.
- **Inspecciones de seguridad** en los frentes de obra, con el fin de verificar condiciones locativas, orden y aseo, señalización, uso de EPP y cumplimiento de las medidas de control establecidas, generando las recomendaciones correspondientes.
- **Entrega y verificación del uso de Elementos de Protección Personal (EPP),** asegurando que el personal cuente con los elementos adecuados de acuerdo con su labor y que estos sean utilizados de manera correcta durante la jornada de trabajo.

Estas actividades se desarrollaron de manera continua y articulada, permitiendo mantener el control de los riesgos, mejorar las condiciones de trabajo y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el SG-SST del proyecto.

8. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el periodo evaluado, **CONSORCIO OBRAS EDUCATVAS DT** realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los subcontratistas, confirmando que contaran con personal calificado para la ejecución de las actividades programadas bajo parámetros de seguridad.

Así mismo, el área de SST efectuó seguimiento en los diferentes frentes de obra al cumplimiento de las medidas preventivas establecidas, tales como permisos de trabajo, señalización, capacitaciones y pausas activas, así como a la correcta aplicación de las medidas de protección colectiva e individual, incluyendo el uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP).

9. REGISTRO DE INSPECCIONES PLANEADAS Y PERMISOS DE TRABAJO

En relación con los riesgos asociados a la seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de las actividades del proyecto, se realizaron **inspecciones planeadas de seguridad** y verificación de permisos de trabajo en los diferentes frentes de obra, con el fin de identificar condiciones subestándares y garantizar el cumplimiento de las medidas de control establecidas.

INSPECCIÓN	MES DE EJECUCIÓN	CANTIDAD	FRENTE DE OBRA
Inspección de herramientas	Mayo	1	Villa Rica
Inspección de pulidora	Abril	1	Villa Rica
Inspección EPP	Abril	1	Villa Rica
Inspección Locativa	Abril	1	Villa Rica
Inspección ambiental	Abril	1	Leonardo Posada
Inspección herramientas	Abril	1	Leonardo Posada
Inspección locativa	Abril	1	Leonardo Posada
Inspección ambiental	Abril	1	DILE BOSA
Inspección herramientas	Mayo	1	DILE BOSA
Inspección taladro	Abril	1	DILE BOSA

10. REGISTRÓ ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Durante el periodo evaluado se desarrollaron actividades propias del alcance del proyecto en los diferentes frentes de obra, las cuales fueron ejecutadas bajo los lineamientos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando la aplicación de las medidas preventivas y de protección correspondientes.

FRENTE DE OBRA	MES DE EJECUCIÓN	CANTIDAD ATS
Villa Rica	Abril	3
	Mayo	2
Leonardo Posada	Abril	3
	Mayo	1
DILE BOSA	Abril	3
	Mayo	1

11. FORMACIÓN DE PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Con el objetivo de informar y concientizar a los trabajadores sobre su propia Seguridad y Salud en el trabajo, se comprende realizar charlas que logren fortalecer el compromiso en materia de SST, considerando como instancia

de participación de todas las partes del proyecto. Se relaciona los temas que se trataron en los frentes de obra en la siguiente tabla.

FECHA	TEMA	FRENTE DE OBRA
15/04/2026	Socialización análisis de trabajo seguro	Villa Rica
22/04/2026	Reporte de actos y condiciones inseguras	Villa Rica
29/04/2026	¿Qué hacer en caso de sismo?	Villa Rica
06/05/2026	Actividad segura – Trabajo en caliente	Villa Rica
14/04/2026	Medidas de prevención riesgo químico – Polvo inorgánico	Leonardo Posada
21/04/2026	Movimientos repetitivos – Riesgo biomecánico	Leonardo Posada
28/04/2026	Autocuidado	Leonardo Posada
17/04/2026	Socialización análisis de trabajo seguro	DILE BOSA
24/04/2026	Riesgo químico	DILE BOSA
02/05/2026	Medidas de prevención en uso de pulidora	DILE BOSA





Fotografía: Charla de seguridad y entrega de dotación

12. GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Durante el periodo evaluado se realizó la **conformación de Brigadas de Emergencia e**n los diferentes frentes de obra del proyecto, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
