UNION TEMPORAL BIT MEDELLIN	**PLAN DE CALIDAD**	FO-01-2025
		VERSIÓN 1
	CONTROL DE DAÑOS Y ATENCIÓNES REPORTADAS, PROGRAMADAS Y ATENDIDAS	FECHA: 25/09/25
NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600105555 del año 2025.	
ENCARGADO DE PROGRAMACIÓN:	PRIORIDAD DE ATENCIÓN: ALTA: Intersecciones apagadas. MEDIA-ALTA. Intersecciones en intermitencia. MEDIA: Intersecciones funcionales pero con algún elemento defectuoso. BAJA: Mantenimiento preventivo. NO PRIORITARIO: No genera afectaciones sobre la funcionalidad de la red semafórica, principalmente aspectos estéticos	

#	FECHA	DIRECCIÓN	DAÑO O REPORTE	MEDIO DEL REPORTE	QUIEN REPORTA O SOLICITA	PRIORIDAD DE ATENCIÓN					FECHA DE PROGRAMACIÓN ATENCIÓN	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIONES DE ATENCIÓN
						ALTA	MEDIA-ALTA	MEDIA	BAJA	NO PRIORITARIO			
495	10/4/2026	AV 80 x CL 6-9	Sin comunicación en RMS	Grupo WhatsApp	Entidad	x					16/04/2026	16/04/2026	
496	11/4/2026	CR 70 x CL 24	Lámpara amarilla con riesgo de caída	Grupo WhatsApp	Entidad	x					16/04/2026	16/04/2026	
497	11/4/2026	CR 45 x CL 47	Lámpara amarilla apagada en ménsula	Grupo WhatsApp	Entidad			x			20/4/2026	20/4/2026	
498	12/4/2026	CR 36 x CL 45	Revisar acometida. Variación en voltaje	Grupo WhatsApp	Entidad	X					13/4/2026	13/4/2026	
499	12/4/2026	CR 43 x CL 50-54	Sin comunicación en RMS	Grupo WhatsApp	Entidad	x							
500	14/4/2026	CR 53 x CL 30	Sin comunicación en RMS	Grupo WhatsApp	Entidad	x					15/4/2026	15/4/2026	
501	17/4/2026	CR 52 x CL 2 SUR	Revisar G3 en corto	Grupo WhatsApp	Entidad	x					22/4/2026	22/4/2026	
502	18/4/2026	CR 74 x CL 53	Poste golpeado en accidente de tránsito	Grupo WhatsApp	Entidad	x					19/4/2026	19/4/2026	
503	19/4/2026	CR 76 x CL 34	Revisar cruce apagado	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					19/04/2026	19/04/2026	
504	21/4/2026	CR 55 x CL 30A	Peatonales apagados	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					28/04/2026	28/04/2026	
505	21/4/2026	CR 52 x CL 2 SUR	Revisar lámpara amarilla en corto	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					22/4/2026	22/4/2026	
506	21/4/2026	CR 49 x CL 57	Revisar lámparas verdes apagadas	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					21/4/2026	21/4/2026	
507	21/4/2026	CR 85 x CL 76	Sin comunicación en RMS	Grupo WhatsApp	Entidad	x					30/04/2026	30/04/2026	
508	21/4/2026	UPB, frente a UNICENTRO	Pulsadores en mal estado	Grupo WhatsApp	Entidad	x					23/4/2026	23/4/2026	
509	21/4/2026	CR 43 x CL 67	Semáforo girado	Grupo WhatsApp	Entidad	x			X		23/4/2026	23/4/2026	
510	21/4/2026	CR 48C x CL 16 SUR	Semáforo girado	Grupo WhatsApp	Entidad	x			X		23/4/2026	23/4/2026	
511	21/4/2026	PASO PEATONAL UNICENTRO	Pulsadores en mal estado	Grupo WhatsApp	Entidad	x					23/4/2026	23/4/2026	
512	23/4/2026	BULERIAS	Semáforo vehícular golpeado	Grupo WhatsApp	Entidad			x			05/05/2026	05/05/2026	

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	**PLAN DE CALIDAD**	FO-01-2025
		VERSIÓN 1
	CONTROL DE DAÑOS Y ATENCIÓNES REPORTADAS, PROGRAMADAS Y ATENDIDAS	FECHA: 25/09/25
NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600105555 del año 2025.	
ENCARGADO DE PROGRAMACIÓN:	PRIORIDAD DE ATENCIÓN: ALTA: Intersecciones apagadas. MEDIA-ALTA. Intersecciones en intermitencia. MEDIA: Intersecciones funcionales pero con algún elemento defectuoso. BAJA: Mantenimiento preventivo. NO PRIORITARIO: No genera afectaciones sobre la funcionalidad de la red semafórica, principalmente aspectos estéticos	

#	FECHA	DIRECCIÓN	DAÑO O REPORTE	MEDIO DEL REPORTE	QUIEN REPORTA O SOLICITA	PRIORIDAD DE ATENCIÓN					FECHA DE PROGRAMACIÓN ATENCIÓN	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIONES DE ATENCIÓN
						ALTA	MEDIA-ALTA	MEDIA	BAJA	NO PRIORITARIO			
513	23/4/2026	CR 45 x CL 55-56	Problema de acometida	Grupo WhatsApp	Entidad	x					23/4/2026	23/4/2026	
514	24/4/2026	CR 50FF x CL 8 SUR	Cruce fuera de servicio. Revisar G1	Grupo WhatsApp	Entidad	x					24/4/2026	24/4/2026	
515	25/4/2026	CR 55 x CL 50-51	Cruce apagado por vandalismo. Asegurar puerta de controlador	Grupo WhatsApp	Entidad	x					25/4/2026	25/4/2026	
516	27/4/2026	CR 47-49 x CL 53	Falla en G5	Grupo WhatsApp	Entidad	x					28/04/2026	28/04/2026	
517	23/4/2026	CR 45 x CL 55-56	Cruce fuera de servicio. Revisar acometida	Grupo WhatsApp	Entidad	x					23/4/2026	23/4/2026	Se revisa el cruce y no se encuentra novedad alguna
518	25/4/2026	CR 50FF x CL 8 SUR	Revisar G1 , se deja en intermitencia	Grupo WhatsApp	Entidad	x					25/4/2026	25/4/2026	
519	25/4/2026	CR 55 x CL 50-51	Vandalismo en controlador local	Grupo WhatsApp	Entidad	x					25/4/2026	25/4/2026	Se asegura la puerta del controlador con zuncho
520	27/4/2026	CR 77 x CL 30	Lámpara verde en semáforo vehicular por fuera del aspecto	Grupo WhatsApp	Entidad	x					27/4/2026	27/4/2026	
521	27/4/2026	CR 47-49 x CL 53	Revisar G5 por falla en cable	Grupo WhatsApp	Entidad	x					28/4/2026	28/4/2026	
522	27/4/2026	CR 55 x CL 30A	Construir canalización en zona verde (53 m), reformar caja e instalar herraje.	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					22/5/2026	22/5/2026	
523	27/4/2026	CR 53 x CL 30A	Construir canalización en zona dura (5 m), Construir canalización en pavimento (2 m),construir caja.	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					22/5/2026	22/5/2026	
524	27/4/2026	CR 48 x CL 18	Construir canalización en zona dura (20 m), Construir canalización en pavimento (9 m + 5m).	Grupo WhatsApp	Interventoría	x							
525	27/4/2026	CR 48 x CL 18	Lámpara peatonal verde no enciende N-S, E.	Grupo WhatsApp	Interventoría			X			29/4/2026	29/4/2026	
526	27/4/2026	CR 30 x CL 47	Aspecto de lámpara vehicular roja abierto E-W,S	Grupo WhatsApp	Entidad			X			26/5/2026	26/5/2026	
527	27/4/2026	CR 50 x CL 35	Construir canalización en pavimento (15 m + 8m).	Grupo WhatsApp	Interventoría	x							
528	27/4/2026	CR 47 x CL 52	Cruce apagado	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					28/4/2026	28/4/2026	
529	27/4/2026	CR 49 x CL 50	Cruce apagado	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					04/05/2026	04/05/2026	

UNION TEMPORAL BIT MEDELLIN	**PLAN DE CALIDAD**	FO-01-2025
		VERSIÓN 1
	CONTROL DE DAÑOS Y ATENCIÓNES REPORTADAS, PROGRAMADAS Y ATENDIDAS	FECHA: 25/09/25
NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600105555 del año 2025.	
ENCARGADO DE PROGRAMACIÓN:	PRIORIDAD DE ATENCIÓN: ALTA: Intersecciones apagadas. MEDIA-ALTA. Intersecciones en intermitencia. MEDIA: Intersecciones funcionales pero con algún elemento defectuoso. BAJA: Mantenimiento preventivo. NO PRIORITARIO: No genera afectaciones sobre la funcionalidad de la red semafórica, principalmente aspectos estéticos	

#	FECHA	DIRECCIÓN	DAÑO O REPORTE	MEDIO DEL REPORTE	QUIEN REPORTA O SOLICITA	PRIORIDAD DE ATENCIÓN					FECHA DE PROGRAMACIÓN ATENCIÓN	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIONES DE ATENCIÓN
						ALTA	MEDIA-ALTA	MEDIA	BAJA	NO PRIORITARIO			
530	27/4/2026	CR 51 x CL 56	Cruce apagado	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					04/05/2026	04/05/2026	
531	27/4/2026	CR 45 x CL 67 PALOS VERDES	Construir canalización en zona verde, Construir canalización en pavimento .	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					25/5/2026	26/5/2026	
532	27/4/2026	CR 45 x CL 67 PALOS VERDES	Lámpara roja a ménsula apagada	Grupo WhatsApp	Interventoría			x			19/5/2026	19/5/2026	
533	27/4/2026	CR 51 x CL 73	Construir canalización en zona verde, Construir canalización en zona dura, Construir canalización en pavimento, construcción de cajas, vaciado de anclajes para ménsula .	Grupo WhatsApp	Interventoría	x							
534	27/4/2026	CR 76 x CL 60	G9 y G10 en corto	Grupo WhatsApp	Entidad	x					27/4/2026	27/4/2026	Pertenece al PMT del metro de la 80
535	27/4/2026	CR 52 x CL 29C-25	G4 en corto	Grupo WhatsApp	Entidad	x					28/4/2026	28/4/2026	
536	28/4/2026	CR 43A x CL 10	G11 en corto	Grupo WhatsApp	Entidad	x					29/4/2026	29/4/2026	
537	30/4/2026	CR 25 x CL 10	Revisión de pulsadores	Grupo WhatsApp	Entidad	x					04/05/2026	04/05/2026	
538	1/5/2026	CR 52 x CL 82	Revisión de G7 en corto	Grupo WhatsApp	Entidad	x					27/5/2026	27/5/2026	
539	2/5/2026	CR 54-55 x CL 53	Revisión de G9 en corto	Grupo WhatsApp	Entidad	x					04/05/2026	04/05/2026	
540	2/5/2026	CR 53 x CL 30	Revisión de G3 en corto	Grupo WhatsApp	Entidad	x					3/5/2026	3/5/2026	
541	3/5/2026	CR 50FF x CL 8 SUR	Cruce apagado	Grupo WhatsApp	Entidad	x					3/5/2026	3/5/2026	Problema solucionado por EPM
542	4/5/2026	BULERÍAS	Poste derribado en accidente de tránsito	Grupo WhatsApp	Entidad	x					05/05/2026	05/05/2026	
543	4/5/2026	CR 25 x CL 10	Lámpara verde, en semáforo vehicular a ménsula, apagada.	Grupo WhatsApp	Interventoría			x			19/5/2026	19/5/2026	
544	5/5/2026	CR 64B x CL 50	Falla en pulsador E-W Separador	Grupo WhatsApp	Entidad	x					6/5/2026	6/5/2026	
545	5/5/2026	TV INF x CL 10	Cambiar ménsula	Grupo WhatsApp	Interventoría			x			21/5/2026	21/5/2026	
546	5/5/2026	CR 77 x CL 30	Enderezar semáforo vehicular en poste de ménsula	Grupo WhatsApp	Interventoría			x			5/5/2026	5/5/2026	

UNION TEMPORAL BIT MEDELLIN	**PLAN DE CALIDAD**	FO-01-2025
		VERSIÓN 1
	CONTROL DE DAÑOS Y ATENCIÓNES REPORTADAS, PROGRAMADAS Y ATENDIDAS	FECHA: 25/09/25
NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600105555 del año 2025.	
ENCARGADO DE PROGRAMACIÓN:	PRIORIDAD DE ATENCIÓN: ALTA: Intersecciones apagadas. MEDIA-ALTA. Intersecciones en intermitencia. MEDIA: Intersecciones funcionales pero con algún elemento defectuoso. BAJA: Mantenimiento preventivo. NO PRIORITARIO: No genera afectaciones sobre la funcionalidad de la red semafórica, principalmente aspectos estéticos	

#	FECHA	DIRECCIÓN	DAÑO O REPORTE	MEDIO DEL REPORTE	QUIEN REPORTA O SOLICITA	PRIORIDAD DE ATENCIÓN					FECHA DE PROGRAMACIÓN ATENCIÓN	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIONES DE ATENCIÓN
						ALTA	MEDIA-ALTA	MEDIA	BAJA	NO PRIORITARIO			
547	5/5/2026	CR 48 x CL 25 SURA INDUSTRIALES	Pulsador dañado	Grupo WhatsApp	Entidad	x					6/5/2026	6/5/2026	
548	6/5/2026	CR 46 x CL 57	Falla en peatonales G15	Grupo WhatsApp	Entidad	x					6/5/2026	6/5/2026	Atendido por personal del Cios
549	7/5/2026	CR 65 x CL 30a	Cambiar semáforo w-e	Grupo WhatsApp	Interventoría			x			8/5/2026	8/5/2026	
550	7/5/2026	CR 55 x CL 30A	Terminar canalización	Grupo WhatsApp	Interventoría						21/5/2026	21/5/2026	
551	7/5/2026	CR 55 x CL 30A	Cerrar de forma correcta las tapas de hierro, soldar tapas.	Grupo WhatsApp	Interventoría			x			11/5/2026	11/5/2026	
552	7/5/2026	CR 76 x CL 28	Semáforo con riesgo de caída. # 76-04. Girado y sin viseras	Grupo WhatsApp	Entidad	x					8/5/2026	8/5/2026	
553	7/5/2026	CR 55 x CL 30A	Instalar marco y tapa y construir canalización	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					21/5/2026	21/5/2026	
554	7/5/2026	CR 52 x CL 29	Reparar herraje suelto en un extremo	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					8/5/2026	8/5/2026	
555	7/5/2026	CR 43G x CL 30	Terminar trabajos en cambio de ménsula	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					8/5/2026	8/5/2026	
556	7/5/2026	CR 69B x CL 30	Terminar caja y organizar andén	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					11/5/2026	11/5/2026	
557	7/5/2026	CR 32 x CL 2 SUR	Aplicar pavimento en canalización	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					15/5/2026	15/5/2026	
558	7/5/2026	AV 80 x CL 25	Falta terminar cajas de inspección y la instalación de la tubería IMC en el puente	Grupo WhatsApp	Interventoría	x							
559	7/5/2026	Parroquia San Lucas	Aplicar pavimento en canalización	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					15/5/2026	15/5/2026	
560	7/5/2026	AV 80 x CL 9	Falta instalación de herrajes en cajas de inspección nuevas	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					25/5/2026	25/5/2026	
561	8/5/2026	CR 70 x CL 16-19	Revisión y reparación de G8	Grupo WhatsApp	Entidad	x					8/5/2026	8/5/2026	
562	8/5/2026	CR 83 x CL 31A	Semáforo peatonal girado	Grupo WhatsApp	Interventoría				x		11/5/2026	11/5/2026	
563	8/5/2026	CR 34-35 x CL 10	Cable de comunicación sin continuidad	Grupo WhatsApp	Entidad	x					20/5/2026	20/5/2026	
564	8/5/2026	CR 70 x CL 16-19	Falla en G8 peatonal	Grupo WhatsApp	Entidad	x					8/5/2026	8/5/2026	

UNION TEMPORAL BIT MEDELLIN	**PLAN DE CALIDAD**	FO-01-2025
		VERSIÓN 1
	CONTROL DE DAÑOS Y ATENCIÓNES REPORTADAS, PROGRAMADAS Y ATENDIDAS	FECHA: 25/09/25
NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600105555 del año 2025.	
ENCARGADO DE PROGRAMACIÓN:	PRIORIDAD DE ATENCIÓN: ALTA: Intersecciones apagadas. MEDIA-ALTA. Intersecciones en intermitencia. MEDIA: Intersecciones funcionales pero con algún elemento defectuoso. BAJA: Mantenimiento preventivo. NO PRIORITARIO: No genera afectaciones sobre la funcionalidad de la red semafórica, principalmente aspectos estéticos	

#	FECHA	DIRECCIÓN	DAÑO O REPORTE	MEDIO DEL REPORTE	QUIEN REPORTA O SOLICITA	PRIORIDAD DE ATENCIÓN					FECHA DE PROGRAMACIÓN ATENCIÓN	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIONES DE ATENCIÓN
						ALTA	MEDIA-ALTA	MEDIA	BAJA	NO PRIORITARIO			
565	11/5/2026	CR 69B x CL 30	Sellar adoquín de andén con arenilla	Grupo WhatsApp	Interventoría				x		11/5/2026	11/5/2026	
566	11/5/2026	CR 40 x CL 10	Peatonales apagados	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					25/5/2026	25/5/2026	
567	11/5/2026	CR 47 x CL 54	Revisar instalación de tornillos en semáforos de piso	Grupo WhatsApp	Interventoría			x			11/5/2026	11/5/2026	
568	11/5/2026	CR 53 x CL 59	Falla en cable de comunicación	Grupo WhatsApp	Entidad	x							
569	13/5/2026	CR 44-45-46 x CL 71-71A	Se solicita reubicación de controlador. El punto se mantiene lleno de basura y escombros	Grupo WhatsApp	Entidad	x							
570	13/5/2026	CR 44-45-46 x CL 73-74	Se solicita reubicación de controlador. El punto se mantiene lleno de basura y escombros	Grupo WhatsApp	Entidad	x							
571	13/5/2026	CR 42 x CL 48	Semáforo peatonal girado	Grupo WhatsApp	Entidad			x			22/5/2026	22/5/2026	
572	13/5/2026	CR 43 x CL 48	Semáforo peatonal girado	Grupo WhatsApp	Entidad			x			19/5/2026	19/5/2026	
573	13/5/2026	CR 45 x CL 73	Vaciar anclaje para ménsula en mal estado. Ya se retiró el brazo	Grupo WhatsApp	Entidad	X					22/5/2026	22/5/2026	
574	14/5/2026	CR 53 x CL 49	Terminar trabajos de instalación de anclaje y construcción de caja	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					15/5/2026	15/5/2026	
575	14/5/2026	CR 49 x CL 78	Caída de ménsula en mal estado	Grupo WhatsApp	Entidad	x					14/5/2026	15/5/2026	
576	15/5/2026	CR 46 x CL 55	Revisar peatonales apagados	Grupo WhatsApp	Entidad	x					22/5/2026	22/5/2026	
577	15/5/2026	CR 49 x CL 78	Revisar G1 en corto	Grupo WhatsApp	Entidad	x					16/5/2026	16/5/2026	
578	16/5/2026	CR 54/55 x CL 52/53	Revisar G3 en corto	Grupo WhatsApp	Entidad	x					22/5/2026	22/5/2026	
579	18/5/2026	AV 80 x CL 32	Aspecto amarillo por fuera del semáforo	Grupo WhatsApp	Entidad	x					19/5/2026	19/5/2026	
580	18/5/2026	CR 54/55 x CL 52/53	Revisar G9, G10 por variación de voltaje	Grupo WhatsApp	Entidad	x					20/5/2026	20/5/2026	
581	20/5/2026	CR 43A x CL 1 SUR	Semáforo vehicular girado. W-E, SC	Grupo WhatsApp	Entidad			x			27/05/2026	27/05/2026	
582	20/5/2026	CR 39 x CL 49	Semáforo peatonal golpeado a punto de caerse	Grupo WhatsApp	Entidad	x					20/5/2026	20/5/2026	

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	**PLAN DE CALIDAD**	FO-01-2025
		VERSIÓN 1
	CONTROL DE DAÑOS Y ATENCIÓNES REPORTADAS, PROGRAMADAS Y ATENDIDAS	FECHA: 25/09/25
NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600105555 del año 2025.	
ENCARGADO DE PROGRAMACIÓN:	PRIORIDAD DE ATENCIÓN: ALTA: Intersecciones apagadas. MEDIA-ALTA. Intersecciones en intermitencia. MEDIA: Intersecciones funcionales pero con algún elemento defectuoso. BAJA: Mantenimiento preventivo. NO PRIORITARIO: No genera afectaciones sobre la funcionalidad de la red semafórica, principalmente aspectos estéticos	

#	FECHA	DIRECCIÓN	DAÑO O REPORTE	MEDIO DEL REPORTE	QUIEN REPORTA O SOLICITA	PRIORIDAD DE ATENCIÓN					FECHA DE PROGRAMACIÓN ATENCIÓN	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIONES DE ATENCIÓN
						ALTA	MEDIA-ALTA	MEDIA	BAJA	NO PRIORITARIO			
583	20/5/2026	ALPUJARRA	Semáforos peatonales desparecidos.E-W	Grupo WhatsApp	Entidad	x							
584	20/5/2026	CR 53 x CL 30A	Pavimentar y hacer limpieza	Grupo WhatsApp	Interventoría		x				21/5/2026	21/5/2026	
585	21/5/2026	CR 30 x CL 47	Semáforo con aspecto abierto	Grupo WhatsApp	Interventoría			x			26/5/2026	26/5/2026	
586	21/5/2026	CR 54 x CL 53	Soldar caja de 60 x 80 para evitar vandalismo	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					22/05/2026	22/05/2026	
587	21/5/2026	CR 65 x CL 78	Daño en fibra óptica	Grupo WhatsApp	Entidad	x					22/5/2026	22/5/2026	
588	22/5/2026	CR 55 x CL 50	Gabinete zunchado por puerta vandalizada. Incluir en cambio de gabinetes para reemplazarlo	Grupo WhatsApp	Entidad	x						1/6/2026	
589	23/5/2026	CR 51 x CL 67	Vandalismo en acometida. Cruce apagado	Grupo WhatsApp	Entidad	x					23/5/2026	23/5/2026	
590	25/5/2026	CR 52 x CL 29A	Reemplazar pulsador en mal estado	Grupo WhatsApp	Entidad	x					26/05/2026	26/05/2026	
591	25/5/2026	CR 69 x CL 73	Semáforo vehicular golpeado	Grupo WhatsApp	Entidad	x					25/5/2026	25/5/2026	
592	25/5/2026	CR 43A x CL 1 SUR	Semáforo vehicular girado.	Grupo WhatsApp	Interventoría			x			26/05/2026	26/05/2026	
593	25/5/2026	CR 46 x CL 41	Semáforo vehicular girado.	Grupo WhatsApp	Interventoría			x			27/05/2026	27/05/2026	
594	25/5/2026	CR 54/55 x CL 52/53	Revisar acometida. Voltaje inestable	Grupo WhatsApp	Entidad	x					26/05/2026	26/05/2026	
595	26/5/2026	CR 87 x CL 47D - 47DD	Falla en cable de potencia G9 W-E, S	Grupo WhatsApp	Entidad	x					27/05/2026	27/05/2026	
596	26/5/2026	CR 55 x CL 50	Zunchar controlador	Grupo WhatsApp	Entidad	x					27/05/2026	27/05/2026	
597	26/5/2026	CR 25 x CL 5	Vandalismo en cable de comunicación	Grupo WhatsApp	Entidad	x							
598	26/5/2026	CR 48 x CL 25 SURA INDU	Reemplazar pulsador en mal estado	Grupo WhatsApp	Entidad	x					29/5/2026	29/5/2026	
599	26/5/2026	CR 52 x CL 82	Revisar acometida. Voltaje inestable	Grupo WhatsApp	Entidad	x						05/06/2026	

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	**PLAN DE CALIDAD**	FO-01-2025
		VERSIÓN 1
	CONTROL DE DAÑOS Y ATENCIÓNES REPORTADAS, PROGRAMADAS Y ATENDIDAS	FECHA: 25/09/25
NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600105555 del año 2025.	
ENCARGADO DE PROGRAMACIÓN:	PRIORIDAD DE ATENCIÓN: ALTA: Intersecciones apagadas. MEDIA-ALTA. Intersecciones en intermitencia. MEDIA: Intersecciones funcionales pero con algún elemento defectuoso. BAJA: Mantenimiento preventivo. NO PRIORITARIO: No genera afectaciones sobre la funcionalidad de la red semafórica, principalmente aspectos estéticos	

#	FECHA	DIRECCIÓN	DAÑO O REPORTE	MEDIO DEL REPORTE	QUIEN REPORTA O SOLICITA	PRIORIDAD DE ATENCIÓN					FECHA DE PROGRAMACIÓN ATENCIÓN	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIONES DE ATENCIÓN
						ALTA	MEDIA-ALTA	MEDIA	BAJA	NO PRIORITARIO			
600	27/5/2026	CR 65 x TV 78	Daño de G16	Grupo WhatsApp	Entidad	x					28/5/2026	28/5/2026	
601	27/5/2026	CR 87 x CL 47D	Lámpara roja a ménsula apagada	Grupo WhatsApp	Interventoría			x				11/6/2026	
602	27/5/2026	CR 52 x CL 9 SUR y 12 SUR	Reparar comunicación	Grupo WhatsApp	Entidad	x							
603	29/5/2026	CR 52 x CL 30	Semáforo peatonal y ciclista golpeados y girados	Grupo WhatsApp	Interventoría			x				1/6/2026	
604	31/5/2026	CR 39 x CL 48	Semáforo a ménsula girado hacia abajo	Grupo WhatsApp	Entidad			X				9/6/2026	

VERIFICACIÓN		
RESPONSABLE CONTRATISTA		**RESPONSABLE INTERVENTORÍA**
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: MARIA VICTORIA DURANGO	NOMBRE: CARLOS ALBERTO DÍAZ PEÑA	NOMBRE: QUENY PATRICIA BARRENECHE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: TECNÓLOGA AUXILIAR DE OBRA	CARGO: INGENIERO RESIDENTE	CARGO: INGENIERA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ANEXO 8

UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN

DOCUMENTACIÓN SOPORTE

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	**PLAN DE CALIDAD**	FO-01-2025
		VERSIÓN 1
	CONTROL DE DAÑOS Y ATENCIÓNES REPORTADAS, PROGRAMADAS Y ATENDIDAS	FECHA: 25/09/25
NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600105555 del año 2025.	
ENCARGADO DE PROGRAMACIÓN:	PRIORIDAD DE ATENCIÓN: ALTA: Intersecciones apagadas. MEDIA-ALTA. Intersecciones en intermitencia. MEDIA: Intersecciones funcionales pero con algún elemento defectuoso. BAJA: Mantenimiento preventivo. NO PRIORITARIO: No genera afectaciones sobre la funcionalidad de la red semafórica, principalmente aspectos estéticos	

#	FECHA	DIRECCIÓN	DAÑO O REPORTE	MEDIO DEL REPORTE	QUIEN REPORTA O SOLICITA	PRIORIDAD DE ATENCIÓN					FECHA DE PROGRAMACIÓN ATENCIÓN	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIONES DE ATENCIÓN
						ALTA	MEDIA-ALTA	MEDIA	BAJA	NO PRIORITARIO			
538	1/5/2026	CR 52 x CL 82	Revisión de G7 en corto	Grupo WhatsApp	Entidad	x					27/5/2026	27/5/2026	
539	2/5/2026	CR 54-55 x CL 53	Revisión de G9 en corto	Grupo WhatsApp	Entidad	x					04/05/2026	04/05/2026	
540	2/5/2026	CR 53 x CL 30	Revisión de G3 en corto	Grupo WhatsApp	Entidad	x					3/5/2026	3/5/2026	
541	3/5/2026	CR 50FF x CL 8 SUR	Cruce apagado	Grupo WhatsApp	Entidad	x					3/5/2026	3/5/2026	Problema solucionado por EPM
542	4/5/2026	BULERÍAS	Poste derribado en accidente de tránsito	Grupo WhatsApp	Entidad	x					05/05/2026	05/05/2026	
543	4/5/2026	CR 25 x CL 10	Lámpara verde, en semáforo vehicular a ménsula, apagada.	Grupo WhatsApp	Interventoría			x			19/5/2026	19/5/2026	
544	5/5/2026	CR 64B x CL 50	Falla en pulsador E-W Separador	Grupo WhatsApp	Entidad	x					6/5/2026	6/5/2026	
545	5/5/2026	TV INF x CL 10	Cambiar ménsula	Grupo WhatsApp	Interventoría			x			21/5/2026	21/5/2026	
546	5/5/2026	CR 77 x CL 30	Enderezar semáforo vehicular en poste de ménsula	Grupo WhatsApp	Interventoría			x			5/5/2026	5/5/2026	
547	5/5/2026	CR 48 x CL 25 SURA INDUSTRIALES	Pulsador dañado	Grupo WhatsApp	Entidad	x					6/5/2026	6/5/2026	
548	6/5/2026	CR 46 x CL 57	Falla en peatonales G15	Grupo WhatsApp	Entidad	x					6/5/2026	6/5/2026	Atendido por personal del Cios
549	7/5/2026	CR 65 x CL 30a	Cambiar semáforo w-e	Grupo WhatsApp	Interventoría			x			8/5/2026	8/5/2026	
550	7/5/2026	CR 55 x CL 30A	Terminar canalización	Grupo WhatsApp	Interventoría						21/5/2026	21/5/2026	
551	7/5/2026	CR 55 x CL 30A	Cerrar de forma correcta las tapas de hierro, soldar tapas.	Grupo WhatsApp	Interventoría			x			11/5/2026	11/5/2026	
552	7/5/2026	CR 76 x CL 28	Semáforo con riesgo de caída. # 76-04. Girado y sin viseras	Grupo WhatsApp	Entidad	x					8/5/2026	8/5/2026	
553	7/5/2026	CR 55 x CL 30A	Instalar marco y tapa y construir canalización	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					21/5/2026	21/5/2026	
554	7/5/2026	CR 52 x CL 29	Reparar herraje suelto en un extremo	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					8/5/2026	8/5/2026	
555	7/5/2026	CR 43G x CL 30	Terminar trabajos en cambio de ménsula	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					8/5/2026	8/5/2026	

UNION TEMPORAL BIT MEDELLIN	**PLAN DE CALIDAD**	FO-01-2025
		VERSIÓN 1
	CONTROL DE DAÑOS Y ATENCIÓNES REPORTADAS, PROGRAMADAS Y ATENDIDAS	FECHA: 25/09/25
NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600105555 del año 2025.	
ENCARGADO DE PROGRAMACIÓN:	PRIORIDAD DE ATENCIÓN: ALTA: Intersecciones apagadas. MEDIA-ALTA. Intersecciones en intermitencia. MEDIA: Intersecciones funcionales pero con algún elemento defectuoso. BAJA: Mantenimiento preventivo. NO PRIORITARIO: No genera afectaciones sobre la funcionalidad de la red semafórica, principalmente aspectos estéticos	

#	FECHA	DIRECCIÓN	DAÑO O REPORTE	MEDIO DEL REPORTE	QUIEN REPORTA O SOLICITA	PRIORIDAD DE ATENCIÓN					FECHA DE PROGRAMACIÓN ATENCIÓN	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIONES DE ATENCIÓN
						ALTA	MEDIA-ALTA	MEDIA	BAJA	NO PRIORITARIO			
556	7/5/2026	CR 69B x CL 30	Terminar caja y organizar andén	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					11/5/2026	11/5/2026	
557	7/5/2026	CR 32 x CL 2 SUR	Aplicar pavimento en canalización	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					15/5/2026	15/5/2026	
558	7/5/2026	AV 80 x CL 25	Falta terminar cajas de inspección y la instalación de la tubería IMC en el puente	Grupo WhatsApp	Interventoría	x							
559	7/5/2026	Parroquia San Lucas	Aplicar pavimento en canalización	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					15/5/2026	15/5/2026	
560	7/5/2026	AV 80 x CL 9	Falta instalación de herrajes en cajas de inspección nuevas	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					25/5/2026	25/5/2026	
561	8/5/2026	CR 70 x CL 16-19	Revisión y reparación de G8	Grupo WhatsApp	Entidad	x					8/5/2026	8/5/2026	
562	8/5/2026	CR 83 x CL 31A	Semáforo peatonal girado	Grupo WhatsApp	Interventoría				x		11/5/2026	11/5/2026	
563	8/5/2026	CR 34-35 x CL 10	Cable de comunicación sin continuidad	Grupo WhatsApp	Entidad	x					20/5/2026	20/5/2026	
564	8/5/2026	CR 70 x CL 16-19	Falla en G8 peatonal	Grupo WhatsApp	Entidad	x					8/5/2026	8/5/2026	
565	11/5/2026	CR 69B x CL 30	Sellar adoquín de andén con arenilla	Grupo WhatsApp	Interventoría				x		11/5/2026	11/5/2026	
566	11/5/2026	CR 40 x CL 10	Peatonales apagados	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					25/5/2026	25/5/2026	
567	11/5/2026	CR 47 x CL 54	Revisar instalación de tornillos en semáforos de piso	Grupo WhatsApp	Interventoría			x			11/5/2026	11/5/2026	
568	11/5/2026	CR 53 x CL 59	Falla en cable de comunicación	Grupo WhatsApp	Entidad	x							
569	13/5/2026	CR 44-45-46 x CL 71-71A	Se solicita reubicación de controlador. El punto se mantiene lleno de basura y escombros	Grupo WhatsApp	Entidad	x							
570	13/5/2026	CR 44-45-46 x CL 73-74	Se solicita reubicación de controlador. El punto se mantiene lleno de basura y escombros	Grupo WhatsApp	Entidad	x							
571	13/5/2026	CR 42 x CL 48	Semáforo peatonal girado	Grupo WhatsApp	Entidad			x			22/5/2026	22/5/2026	
572	13/5/2026	CR 43 x CL 48	Semáforo peatonal girado	Grupo WhatsApp	Entidad			x			19/5/2026	19/5/2026	
573	13/5/2026	CR 45 x CL 73	Vaciar anclaje para ménsula en mal estado. Ya se retiró el brazo	Grupo WhatsApp	Entidad	X					22/5/2026	22/5/2026	

UNION TEMPORAL BIT MEDELLIN	**PLAN DE CALIDAD**	FO-01-2025
		VERSIÓN 1
	CONTROL DE DAÑOS Y ATENCIÓNES REPORTADAS, PROGRAMADAS Y ATENDIDAS	FECHA: 25/09/25
NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600105555 del año 2025.	
ENCARGADO DE PROGRAMACIÓN:	PRIORIDAD DE ATENCIÓN: ALTA: Intersecciones apagadas. MEDIA-ALTA. Intersecciones en intermitencia. MEDIA: Intersecciones funcionales pero con algún elemento defectuoso. BAJA: Mantenimiento preventivo. NO PRIORITARIO: No genera afectaciones sobre la funcionalidad de la red semafórica, principalmente aspectos estéticos	

#	FECHA	DIRECCIÓN	DAÑO O REPORTE	MEDIO DEL REPORTE	QUIEN REPORTA O SOLICITA	PRIORIDAD DE ATENCIÓN					FECHA DE PROGRAMACIÓN ATENCIÓN	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIONES DE ATENCIÓN
						ALTA	MEDIA-ALTA	MEDIA	BAJA	NO PRIORITARIO			
574	14/5/2026	CR 53 x CL 49	Terminar trabajos de instalación de anclaje y construcción de caja	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					15/5/2026	15/5/2026	
575	14/5/2026	CR 49 x CL 78	Caída de ménsula en mal estado	Grupo WhatsApp	Entidad	x					14/5/2026	15/5/2026	
576	15/5/2026	CR 46 x CL 55	Revisar peatonales apagados	Grupo WhatsApp	Entidad	x					22/5/2026	22/5/2026	
577	15/5/2026	CR 49 x CL 78	Revisar G1 en corto	Grupo WhatsApp	Entidad	x					16/5/2026	16/5/2026	
578	16/5/2026	CR 54/55 x CL 52/53	Revisar G3 en corto	Grupo WhatsApp	Entidad	x					22/5/2026	22/5/2026	
579	18/5/2026	AV 80 x CL 32	Aspecto amarillo por fuera del semáforo	Grupo WhatsApp	Entidad	x					19/5/2026	19/5/2026	
580	18/5/2026	CR 54/55 x CL 52/53	Revisar G9, G10 por variación de voltaje	Grupo WhatsApp	Entidad	x					20/5/2026	20/5/2026	
581	20/5/2026	CR 43A x CL 1 SUR	Semáforo vehicular girado. W-E, SC	Grupo WhatsApp	Entidad			x			27/05/2026	27/05/2026	
582	20/5/2026	CR 39 x CL 49	Semáforo peatonal golpeado a punto de caerse	Grupo WhatsApp	Entidad	x					20/5/2026	20/5/2026	
583	20/5/2026	ALPUJARRA	Semáforos peatonales desparecidos.E-W	Grupo WhatsApp	Entidad	x							
584	20/5/2026	CR 53 x CL 30A	Pavimentar y hacer limpieza	Grupo WhatsApp	Interventoría		x				21/5/2026	21/5/2026	
585	21/5/2026	CR 30 x CL 47	Semáforo con aspecto abierto	Grupo WhatsApp	Interventoría			x			26/5/2026	26/5/2026	
586	21/5/2026	CR 54 x CL 53	Soldar caja de 60 x 80 para evitar vandalismo	Grupo WhatsApp	Interventoría	x					22/05/2026	22/05/2026	
587	21/5/2026	CR 65 x CL 78	Daño en fibra óptica	Grupo WhatsApp	Entidad	x					22/5/2026	22/5/2026	
588	22/5/2026	CR 55 x CL 50	Gabinete zunchado por puerta vandalizada. Incluir en cambio de gabinetes para reemplazarlo	Grupo WhatsApp	Entidad	x						1/6/2026	
589	23/5/2026	CR 51 x CL 67	Vandalismo en acometida. Cruce apagado	Grupo WhatsApp	Entidad	x					23/5/2026	23/5/2026	
590	25/5/2026	CR 52 x CL 29A	Reemplazar pulsador en mal estado	Grupo WhatsApp	Entidad	x					26/05/2026	26/05/2026	

UNION TEMPORAL BIT MEDELLIN	**PLAN DE CALIDAD**	FO-01-2025
		VERSIÓN 1
	CONTROL DE DAÑOS Y ATENCIÓNES REPORTADAS, PROGRAMADAS Y ATENDIDAS	FECHA: 25/09/25
NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600105555 del año 2025.	
ENCARGADO DE PROGRAMACIÓN:	PRIORIDAD DE ATENCIÓN: ALTA: Intersecciones apagadas. MEDIA-ALTA. Intersecciones en intermitencia. MEDIA: Intersecciones funcionales pero con algún elemento defectuoso. BAJA: Mantenimiento preventivo. NO PRIORITARIO: No genera afectaciones sobre la funcionalidad de la red semafórica, principalmente aspectos estéticos	

#	FECHA	DIRECCIÓN	DAÑO O REPORTE	MEDIO DEL REPORTE	QUIEN REPORTA O SOLICITA	PRIORIDAD DE ATENCIÓN					FECHA DE PROGRAMACIÓN ATENCIÓN	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIONES DE ATENCIÓN
						ALTA	MEDIA-ALTA	MEDIA	BAJA	NO PRIORITARIO			
591	25/5/2026	CR 69 x CL 73	Semáforo vehicular golpeado	Grupo WhatsApp	Entidad	x					25/5/2026	25/5/2026	
592	25/5/2026	CR 43A x CL 1 SUR	Semáforo vehicular girado.	Grupo WhatsApp	Interventoría			x			26/05/2026	26/05/2026	
593	25/5/2026	CR 46 x CL 41	Semáforo vehicular girado.	Grupo WhatsApp	Interventoría			x			27/05/2026	27/05/2026	
594	25/5/2026	CR 54/55 x CL 52/53	Revisar acometida. Voltaje inestable	Grupo WhatsApp	Entidad	x					26/05/2026	26/05/2026	
595	26/5/2026	CR 87 x CL 47D - 47DD	Falla en cable de potencia G9 W-E, S	Grupo WhatsApp	Entidad	x					27/05/2026	27/05/2026	
596	26/5/2026	CR 55 x CL 50	Zunchar controlador	Grupo WhatsApp	Entidad	x					27/05/2026	27/05/2026	
597	26/5/2026	CR 25 x CL 5	Vandalismo en cable de comunicación	Grupo WhatsApp	Entidad	x							
598	26/5/2026	CR 48 x CL 25 SURA INDU	Reemplazar pulsador en mal estado	Grupo WhatsApp	Entidad	x					29/5/2026	29/5/2026	
599	26/5/2026	CR 52 x CL 82	Revisar acometida. Voltaje inestable	Grupo WhatsApp	Entidad	x						05/06/2026	
600	27/5/2026	CR 65 x TV 78	Daño de G16	Grupo WhatsApp	Entidad	x					28/5/2026	28/5/2026	
601	27/5/2026	CR 87 x CL 47D	Lámpara roja a ménsula apagada	Grupo WhatsApp	Interventoría			x				11/6/2026	
602	27/5/2026	CR 52 x CL 9 SUR y 12 SUR	Reparar comunicación	Grupo WhatsApp	Entidad	x							
603	29/5/2026	CR 52 x CL 30	Semáforo peatonal y ciclista golpeados y girados	Grupo WhatsApp	Interventoría			x				1/6/2026	
604	31/5/2026	CR 39 x CL 48	Semáforo a ménsula girado hacia abajo	Grupo WhatsApp	Entidad			X				9/6/2026	

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: MARIA VICTORIA DURANGO	NOMBRE: CARLOS ALBERTO DÍAZ PEÑA	NOMBRE: QUENY PATRICIA BARRENECHE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: TECNÓLOGA AUXILIAR DE OBRA	CARGO: INGENIERO RESIDENTE	CARGO: INGENIERA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ANEXO 9

UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN

DOCUMENTACIÓN SOPORTE

INGENIEROS CIVILES

IL 0669-26

Medellín, 15 de mayo de 2026

Ingeniero
OSCAR CARO
MANTENIMIENTO SEMAFORIZACIÓN
UNIÓN TEMPORAL SIT
Medellín

Asunto: Ensayos de densidad en el terreno. Obra: “MANTENIMIENTO SEMAFORIZACIÓN”

Cordial Saludo:

Nos complace hacerle entrega de resultados de ocho (08) ensayos de densidad en el terreno, realizados por medio del cono y arena, los cuales fueron tomados por nuestra oficina el día 13 de mayo de 2026 sobre una capa de base granular procedentes de cantera Santa Rita, dichos materiales están siendo utilizados en la obra del asunto.

Los resultados obtenidos para la capa de base granular se encuentran en 97.9% y 100.9, estos resultados deben ser comparados con las especificaciones del proyecto.

Para el control de compactación en obra se tienen en cuenta los siguientes parámetros:

Material: Base granular procedente de Santa Rita *

Densidad seca máxima:	2339	Kg/m^3
Humedad óptima:	5.4	%

* El valor del proctor fue suministrado por el Cliente.

www.aimingenieros.com.co
(604) 440 00 40 Carrera 43B No.16-95 Of. 1701 Medellín - Colombia

El presente informe consta de cuatro (04) páginas, los resultados son confidenciales y aplicables solo a las muestras ensayadas, no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de AIM SAS.

Para cualquier información adicional utilice el correo electrónico laboratorio@aimingenieros.com.co. Le agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. Puede calificar nuestro servicio ingresando a la encuesta de satisfacción.

En caso de tener alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación lo invitamos a conocer nuestro procedimiento de PQRSF o utilizar alguno de los canales establecidos por la empresa formulario PQRSF o correo electrónico calidad@aimingenieros.com.co

Rev.No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA AL INFORME	FECHA
		dd/mm/aa

Cordialmente,

WILMAR ANDRES BOTIA DIAZ
Director de Laboratorio

Anexos:NA

INGENIEROS CIVILES

www.aimingenieros.com.co
(604) 440 00 40 Carrera 43B No.16-95 Of. 1701 Medellín - Colombia

INGENIEROS CIVILES	**INFORME DE ENSAYO DE DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA INV. E 161-13**	**Código:** F-EP-41 **Versión:** 5 **Fecha de Vigencia:** 14/02/2024

CONSECUTIVO: 5358 **FECHA ENSAYO:** 2026-05-13

CLIENTE: UNIÓN TEMPORAL SIT **FECHA INFORME:** 2026-05-15

PROYECTO: MANTENIMIENTO SEMAFORIZACION **IE:** 13218

ENSAYO	1	2	3	4	5
Localización	CLL 33 CON CR 43 COSTADO ORIENTAL #1	CLL 33 CON CR 43 COSTADO ORIENTAL #2	CR 43 CON CLL 33 #1	CR 43 CON CLL 33 #12	CLL 33 CON CR 43 COSTADO OCCIDENTAL #1
Peso del depósito y arena, antes de empezar la prueba - (g)	6222	5800	6144	5882	6027
Peso del depósito y arena retenida, después de llenado el hoyo - (g)	2333	1701	2400	2012	2133
Peso de la arena empleada - (g)	3889	4099	3744	3870	3894
Constante del cono - (g)	1800	1800	1800	1800	1800
Peso de la arena empleada para llenar el hoyo - (g)	2089	2299	1944	2070	2094
Densidad de la arena (g/cm3)	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535
Volumen del hoyo - (cm3)	1361	1498	1266	1349	1364
Peso de material húmedo y recipiente - (g)	3543	3880	3323	3524	3558
Peso del recipiente - (g)	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0
Peso de material humedo - (g)	3355	3692	3135	3336	3370
Densidad humeda del material - (g/cm3)	2,465	2,465	2,475	2,474	2,470
Porcentaje de humedad	5,3	5,3	5,3	5,4	5,4
Densidad seca del material - (g/cm3)	2,341	2,340	2,350	2,346	2,343
Densidad seca máxima del material - (g/cm3)	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330
Contenido Optimo de humedad (%)	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Porcentaje de compactación alcanzado en el terreno (%)	**100,5**	**100,4**	**100,9**	**100,7**	**100,6**
Porcentaje de compactación Requerido (%)	-	-		-	-
Material	BASE	BASE	BASE	BASE	BASE
Cantera	SANTA RITA	SANTA RITA	SANTA RITA	SANTA RITA	SANTA RITA

OBSERVACIONES

*** El cliente suministra la información de proctor, cantera, descripción y localización.**
*** Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente al material y sitio analizado.**
*** Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM INGENIEROS CIVILES SAS.**

EJECUTÓ	APROBÓ	RECIBIÓ Espacio exclusivo para control por parte del cliente
NOMBRE: ALEJANDRO VANEGAS	**NOMBRE: ING. WILMAR ANDRES BOTÍA**	**NOMBRE:**
CARGO: AUXILIAR DE LABORATORIO	**CARGO: DIRECTOR DE LABORATORIO**	**FECHA:**
	FIRMA: 	**FIRMA:**

INGENIEROS CIVILES	**INFORME DE ENSAYO DE DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA INV. E 161-13**	**Código:** F-EP-41 **Versión:** 5 **Fecha de Vigencia:** 14/02/2024

CONSECUTIVO: 5358 **FECHA ENSAYO:** 2026-05-13

CLIENTE: UNIÓN TEMPORAL SIT **FECHA INFORME:** 2026-05-15

PROYECTO: MANTENIMIENTO SEMAFORIZACION **IE:** 13218

ENSAYO	6	7	8	9	10
Localización	CLL 33 CON CR 43 COSTADO OCCIDENTAL #1	CR 43 CON CLL 31 #1	CR 43 CON CLL 31 #2	-	-
Peso del depósito y arena, antes de empezar la prueba - (g)	5981	5966	5843	-	-
Peso del depósito y arena retenida, después de llenado el hoyo - (g)	2635	2300	1988	-	-
Peso de la arena empleada - (g)	3346	3666	3855	-	-
Constante del cono - (g)	1800	1800	1800	-	-
Peso de la arena empleada para llenar el hoyo - (g)	1546	1866	2055	-	-
Densidad de la arena (g/cm3)	1,535	1,535	1,535	-	-
Volumen del hoyo - (cm3)	1007	1216	1339	-	-
Peso de material húmedo y recipiente - (g)	2615	3190	3507	-	-
Peso del recipiente - (g)	188,0	188,0	188,0	-	-
Peso de material humedo - (g)	2427	3002	3319	-	-
Densidad humeda del material - (g/cm3)	2,410	2,469	2,479	-	-
Porcentaje de humedad	5,6	5,6	5,6	-	-
Densidad seca del material - (g/cm3)	2,282	2,337	2,347	-	-
Densidad seca máxima del material - (g/cm3)	2,330	2,330	2,330	-	-
Contenido Optimo de humedad (%)	5,4	5,4	5,4	-	-
Porcentaje de compactación alcanzado en el terreno (%)	**97,9**	**100,3**	**100,7**	**-**	**-**
Porcentaje de compactación Requerido (%)			-	-	-
Material	BASE	BASE	BASE	-	-
Cantera	SANTA RITA	SANTA RITA	SANTA RITA	-	-

OBSERVACIONES

*** El cliente suministra la información de proctor, cantera, descripción y localización.**
*** Los resultados del presente informe corresponden exclusivamente al material y sitio analizado.**
*** Prohibida la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización de AIM INGENIEROS CIVILES SAS.**

EJECUTÓ	APROBÓ	RECIBIO Espacio exclusivo para control por parte del cliente
NOMBRE: ALEJANDRO VANEGAS	**NOMBRE: ING. WILMAR ANDRES BOTÍA**	**NOMBRE:**
CARGO: AUXILIAR DE LABORATORIO	**CARGO: DIRECTOR DE LABORATORIO**	**FECHA:**
	FIRMA: 	**FIRMA:**

.----------FIN DEL INFORME DE RESULTADOS----------.

INGENIEROS CIVILES	**BITÁCORA DE RESULTADOS DE DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA INV. E 161-13**	**Código:** F-EP-109 **Versión:** 0 **Fecha de Vigencia:** 14/02/2024

CONSECUTIVO: **FECHA ENSAYO: 2026-05-13**

CLIENTE: UNIÓN TEMPORAL SIT **FECHA INFORME:**

PROYECTO: MANTENIMIENTO SEMAFORIZACION **IE:**

ENSAYO	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
LOCALIZACIÓN	CLL 33 CON CR 43 COSTADO ORIENTAL #1	CLL 33 CON CR 43 COSTADO ORIENTAL #2	CR 43 CON CLL 33 #1	CR 43 CON CLL 33 #12	CLL 33 CON CR 43 COSTADO OCCIDENTAL #1
a) Peso del depósito y arena, antes de empezar la prueba - (g)	6222	5800	6144	5882	6027
b) Peso del depósito y arena retenida, después de llenado el hoyo - (g)	2333	1701	2400	2012	2133
c) Peso de la arena empleada (a - b) - (g)	3889	4099	3744	3870	3894
d) Constante del cono - (g)	1800	1800	1800	1800	1800
e) Peso de la arena empleada para llenar el hoyo (c - d) - (g)	2089	2299	1944	2070	2094
f) Densidad de la arena (g/cm3)	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
g) Volumen del hoyo (e/f) - (cm3)	1360.9	1497.7	1266.4	1348.5	1364.2
h) Peso de las piedras, tierra húmeda y recipiente - (g)	3543	3880	3323	3524	3558
i) Peso del recipiente - (g)	188.0	188.0	188.0	188.0	188.0
l) Peso de la tierra húmeda (h-i) - (g)	3355.0	3692.0	3135.0	3336.0	3370.0
p) Densidad de la tierra húmeda (l/g), - (g/cm3)	2.465	2.465	2.475	2.474	2.470
t) Porcentaje de humedad (%)	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4
u) Densidad de la tierra seca (p x 100) / (100 + t) - (g/cm3)	2.341	2.340	2.350	2.346	2.343
v) Densidad seca máxima del material (véase curva de compactación) - (g/cm3)	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
Contenido Optimo de humedad (%)	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
Porcentaje de compactación alcanzado en el terreno (u/v x 100) - (%)	**100.5**	**100.4**	**100.9**	**100.7**	**100.6**
Porcentaje de compactación Requerido (%)	-	-		-	-
Material	BASE	BASE	BASE	BASE	BASE
Cantera	SANTA RITA	SANTA RITA	SANTA RITA	SANTA RITA	SANTA RITA

OBSERVACIONES

BALANZA: **CII - M062**		**HUMEDOMETRO:** **CII - P003-1**

*Nota: Toda vez que se cometan errores en el diligenciamiento de la bitácora de resultados, el valor no debe tacharse. Se debe poner una x que permita que el valor sea legible y al lado se escribirá el dato que corresponda acompañado de las iniciales del nombre del operario.

EJECUTÓ	**DIGITÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE:	**NOMBRE:**	**NOMBRE:**
FECHA:	**FECHA:**	**FECHA:**

INGENIEROS CIVILES	**BITÁCORA DE RESULTADOS DE DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA INV. E 161-13**	**Código:** F-EP-109 **Versión:** 0 **Fecha de Vigencia:** 14/02/2024

CONSECUTIVO: **FECHA ENSAYO: 2026-05-13**

CLIENTE: UNIÓN TEMPORAL SIT **FECHA INFORME:**

PROYECTO: MANTENIMIENTO SEMAFORIZACION **IE:**

ENSAYO	6	7	8	9	10
LOCALIZACIÓN	CLL 33 CON CR 43 COSTADO OCCIDENTAL #1	CR 43 CON CLL 31 #1	CR 43 CON CLL 31 #2	-	-
a) Peso del depósito y arena, antes de empezar la prueba - (g)	5981	5966	5843	-	-
b) Peso del depósito y arena retenida, después de llenado el hoyo - (g)	2635	2300	1988	-	-
c) Peso de la arena empleada (a - b) - (g)	3346	3666	3855	-	-
d) Constante del cono - (g)	1800	1800	1800	-	-
e) Peso de la arena empleada para llenar el hoyo (c - d) - (g)	1546	1866	2055	-	-
f) Densidad de la arena (g/cm3)	1.535	1.535	1.535	-	-
g) Volumen del hoyo (e/f) - (cm3)	1007.2	1215.6	1338.8	-	-
h) Peso de las piedras, tierra húmeda y recipiente - (g)	2615	3190	3507	-	-
i) Peso del recipiente - (g)	188.0	188.0	188.0	-	-
l) Peso de la tierra húmeda (h-i) - (g)	2427.0	3002.0	3319.0	-	-
p) Densidad de la tierra húmeda (l/g), - (g/cm3)	2.410	2.469	2.479	-	-
t) Porcentaje de humedad (%)	5.6	5.6	5.6	-	-
u) Densidad de la tierra seca (p x 100) / (100 + t) - (g/cm3)	2.282	2.337	2.347	-	-
v) Densidad seca máxima del material (véase curva de compactación) - (g/cm3)	2.330	2.330	2.330	-	-
Contenido Optimo de humedad (%)	5.4	5.4	5.4	-	-
Porcentaje de compactación alcanzado en el terreno (u/v x 100) - (%)	**97.9**	**100.3**	**100.7**	**-**	**-**
Porcentaje de compactación Requerido (%)			-	-	-
Material	BASE	BASE	BASE	-	-
Cantera	SANTA RITA	SANTA RITA	SANTA RITA	-	-

OBSERVACIONES

BALANZA: **CII - M062** **HUMEDOMETRO:** **CII - P003-1**

*Nota: Toda vez que se cometan errores en el diligenciamiento de la bitácora de resultados, el valor no debe tacharse. Se debe poner una x que permita que el valor sea legible y al lado se escribirá el dato que corresponda acompañado de las iniciales del nombre del operario.

EJECUTÓ	DIGITÓ	APROBÓ
NOMBRE:	**NOMBRE:**	**NOMBRE:**
FECHA:	**FECHA:**	**FECHA:**

ANEXO 10

UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN

DOCUMENTACIÓN SOPORTE

ASFACOL Asfaltadora Colombia S.A.S ESPECIALISTAS EN VIAS	**CONTENIDO DE ASFALTO Y GRADACIÓN MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC-19** COPIA DEL SIG	CODIGO: C-LYM-F17 VERSIÓN: 01 FECHA: 02/10/2023

CLIENTE:	VARIOS
PROYECTO:	SUMINISTRO
FECHA:	martes, 5 de mayo de 2026
LUGAR DE PRODUCCIÓN:	Planta MARINI Asfaltadora Colombia S.A.S
ESPECIFICACIÓN :	Mezcla Asfaltica tipo MDC-19 Diseño CL-0265-25-191-01-779 INTEINSA

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA: 098 -M-1

1) CONTENIDO DE ASFALTO


Peso inicial de la muestra (gr) = 1.499,0
Peso final de la muestra (gr) = 1.421,0

CONTENIDO DE ASFALTO (%)	*5,20%*

2) GRADACIÓN

Peso inicial de la muestra (gr) = 1.421,0
Peso final de la muestra (gr) = 1342,2

ESPECIFICACIÓN									
TAMIZ		**3/4"**	**1/2"**	**3/8"**	**No.4**	**No.10**	**No.40**	**No.80**	**No.200**
TAMIZ (mm)		**19,00**	**12,50**	**9,50**	**4,75**	**2,00**	**0,425**	**0,180**	**0,075**
INVIAS	**MINIMO**	**100**	**80**	**70**	**49**	**29**	**14**	**8**	**4**
INVIAS	**MAXIMO**	**100**	**95**	**88**	**65**	**45**	**25**	**17**	**8**
F. TRABAJO	**F.MINIMO**	***100***	***85,5***	***77,5***	***52,9***	***30,2***	***14,0***	***8,0***	***4,0***
F. TRABAJO	**F.MAXIMO**	***100***	***93,5***	***85,5***	***60,9***	***36,2***	***18,4***	***12,1***	***7,7***
GRADACIÓN									
PESO RETENIDO		0,0	123,8	91,0	369,0	383,3	233,3	76,4	65,4
% RETENIDO		0,0	8,7	6,4	26,0	27,0	16,4	5,4	4,6
% PASA TOTAL		***100,0***	***91,3***	***84,9***	***58,9***	***31,9***	***15,5***	***10,1***	***5,5***

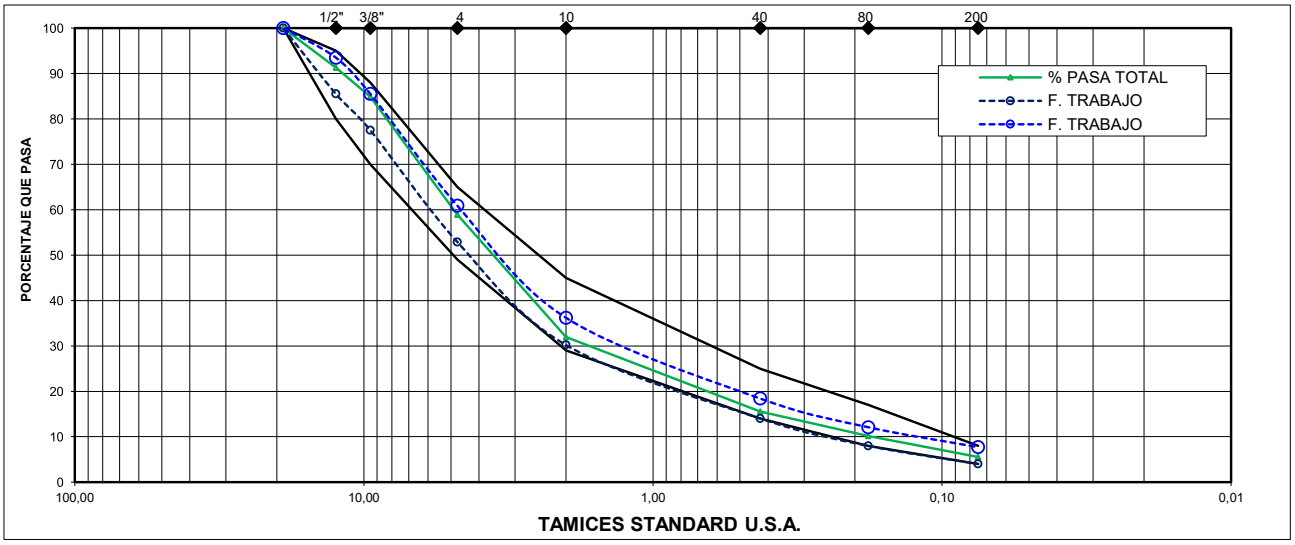

ELABORÓ : Eliecer Perez
LABORATORISTA

APROBÓ : Cesar Prieto
DIR DE PRODUCCIÓN.

ASFACOL Asfaltadora Colombia S.A.S	**CONTENIDO DE ASFALTO Y GRADACIÓN MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC-19** COPIA DEL SIG	CODIGO: C-LYM-F17 VERSIÓN: 01 FECHA: 02/10/2023

CLIENTE:	VARIOS
PROYECTO:	SUMINISTRO
FECHA:	martes, 5 de mayo de 2026
LUGAR DE PRODUCCIÓN:	Planta MARINI Asfaltadora Colombia S.A.S
ESPECIFICACIÓN :	Mezcla Asfaltica tipo MDC-19 Diseño CL-0265-25-191-01-779 INTEINSA

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA: 098 -M-2

1) CONTENIDO DE ASFALTO

Peso inicial de la muestra (gr) = 1.504,7

Peso final de la muestra (gr) = 1.425,0


CONTENIDO DE ASFALTO (%)	*5,30%*

2) GRADACIÓN

Peso inicial de la muestra (gr) = 1.425,0

Peso final de la muestra (gr) = 1339,4

ESPECIFICACIÓN									
TAMIZ		**3/4"**	**1/2"**	**3/8"**	**No.4**	**No.10**	**No.40**	**No.80**	**No.200**
TAMIZ (mm)		**19,00**	**12,50**	**9,50**	**4,75**	**2,00**	**0,425**	**0,180**	**0,075**
INVIAS	**MINIMO**	**100**	**80**	**70**	**49**	**29**	**14**	**8**	**4**
INVIAS	**MAXIMO**	**100**	**95**	**88**	**65**	**45**	**25**	**17**	**8**
F. TRABAJO	**F.MINIMO**	***100***	***85,5***	***77,5***	***52,9***	***30,2***	***14,0***	***8,0***	***4,0***
F. TRABAJO	**F.MAXIMO**	***100***	***93,5***	***85,5***	***60,9***	***36,2***	***18,4***	***12,1***	***7,7***
GRADACIÓN									
PESO RETENIDO		0,0	131,9	92,0	366,9	367,3	243,2	75,2	62,9
% RETENIDO		0,0	9,3	6,5	25,7	25,8	17,1	5,3	4,4
% PASA TOTAL		***100,0***	***90,7***	***84,3***	***58,5***	***32,8***	***15,7***	***10,4***	***6,0***

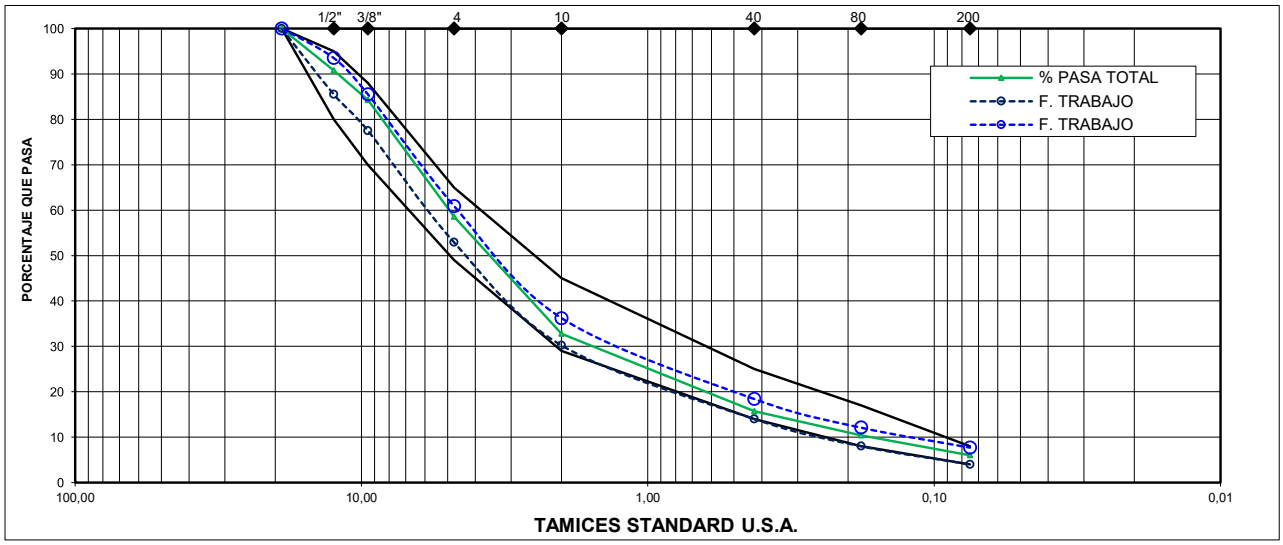

ELABORÓ : Eliecer Perez — **LABORATORISTA**

APROBÓ : Cesar Prieto — **DIR DE PRODUCCIÓN.**

ASFACOL Asfaltadora Colombia S.A.S	**CONTENIDO DE ASFALTO Y GRADACIÓN MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC-19** COPIA DEL SIG	CODIGO: C-LYM-F17 VERSIÓN: 01 FECHA: 02/10/2023

CLIENTE:	VARIOS
PROYECTO:	SUMINISTRO
FECHA:	martes, 5 de mayo de 2026
LUGAR DE PRODUCCIÓN:	Planta MARINI Asfaltadora Colombia S.A.S
ESPECIFICACIÓN :	Mezcla Asfaltica tipo MDC-19 Diseño CL-0265-25-191-01-779 INTEINSA

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA: 098 -M-3

1) CONTENIDO DE ASFALTO

Peso inicial de la muestra (gr) = 1.501,5

Peso final de la muestra (gr) = 1.424,0


CONTENIDO DE ASFALTO (%)	*5,16%*

2) GRADACIÓN

Peso inicial de la muestra (gr) = 1.424,0

Peso final de la muestra (gr) = 1344,2

ESPECIFICACIÓN									
TAMIZ		**3/4"**	**1/2"**	**3/8"**	**No.4**	**No.10**	**No.40**	**No.80**	**No.200**
TAMIZ (mm)		**19,00**	**12,50**	**9,50**	**4,75**	**2,00**	**0,425**	**0,180**	**0,075**
INVIAS	**MINIMO**	**100**	**80**	**70**	**49**	**29**	**14**	**8**	**4**
INVIAS	**MAXIMO**	**100**	**95**	**88**	**65**	**45**	**25**	**17**	**8**
F. TRABAJO	**F.MINIMO**	***100***	***85,5***	***77,5***	***52,9***	***30,2***	***14,0***	***8,0***	***4,0***
F. TRABAJO	**F.MAXIMO**	***100***	***93,5***	***85,5***	***60,9***	***36,2***	***18,4***	***12,1***	***7,7***
GRADACIÓN									
PESO RETENIDO		0,0	133,2	111,0	355,4	363,3	232,5	79,3	69,5
% RETENIDO		0,0	9,4	7,8	25,0	25,5	16,3	5,6	4,9
% PASA TOTAL		***100,0***	***90,6***	***82,9***	***57,9***	***32,4***	***16,1***	***10,5***	***5,6***

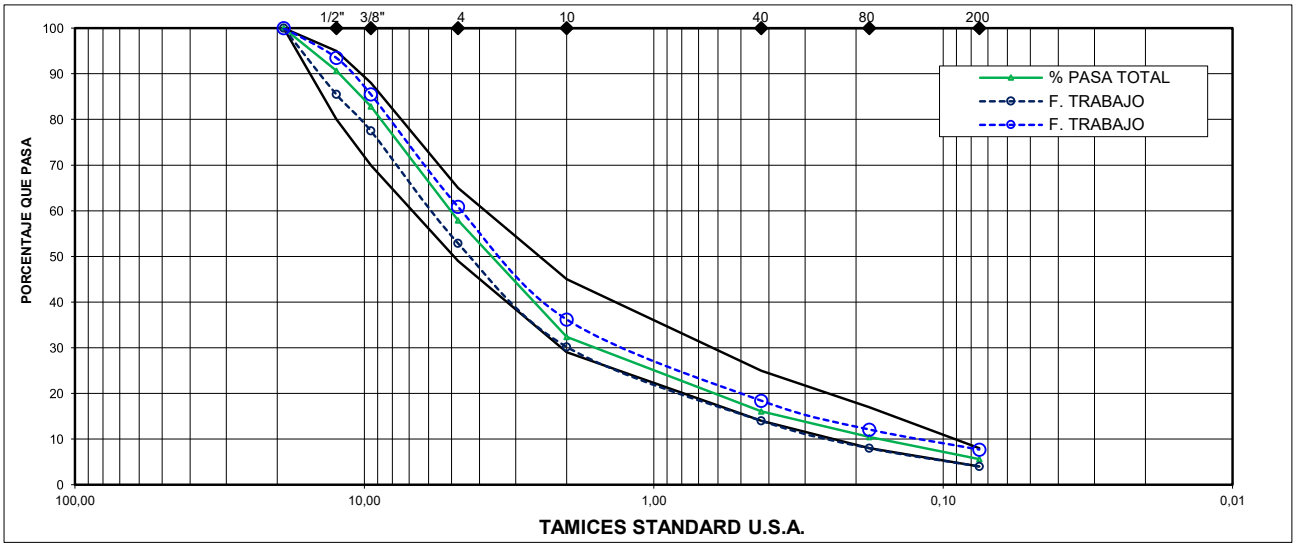

ELABORÓ : Eliecer Perez — **LABORATORISTA**

APROBÓ : Cesar Prieto — **DIR DE PRODUCCIÓN.**

CONTROL DE MEZCLAS ASFÁLTICAS MÉTODO MARSHALL

COPIA DEL SIG

Código : C-LYM-F15
Versión : 01
Fecha: 02/10/2023

FECHA:	05 DE MAYO DEL 2026	NORMA : INV. 2013,tabla 450-10	
CLIENTE:	VARIOS	PESO ESPECIFICO ASFÁLTO:	1,022
PROYECTO:	SUMINISTRO	PESO ESPECÍFICO AGREGADOS:	2,786
MEZCLA:	Mezcla Asfaltica tipo MDC-19 Diseño CL-0265-25-191-01-779 INTEINSA		
CONSECUTIVO:	098		

MUESTRA No.	No.	% DE ASFALTO	ESPESOR PROBETA (mm)	PESO (g)			VOL	T (°C)	FACTOR DE CORREC K	PESO ESPEC APAREN A 25°C	PESO UNITAR (Kg/m3)	PESO ESPEC TEORICO MÁX	ASFALTO (%)		VOLUMEN % TOTAL			% DE VACÍOS			ESTABILIDAD (kN)		FLUJO (mm)	ESTABILIDAD/ FLUJO (kN/mm)
				Aire	SSS	Agua							Absorbido	Efectivo	Asfalto efectivo	Agregados	Vacíos con aire	Agregados	Mezcla total	Llenos	Medida	Corregida		
1	1	5,20	63,6	1203,2	1207,0	713,2	493,8	25,0	1,000000	2,437	2429	2,563	0,10	5,1	12,15	82,9	4,9	17,1	4,9	71,1	11,62	11,60	2,8	4,14
	2	5,20	62,9	1199,8	1204,3	712,9	491,4	25,0	1,000000	2,442	2434	2,563	0,10	5,1	12,18	83,1	4,7	16,9	4,7	72,0	12,36	12,56	3,0	4,19
	3	5,30	63,8	1203,2	1208,3	714,2	494,1	25,0	1,000000	2,435	2428	2,563	0,17	5,1	12,22	82,8	5,0	17,2	5,0	71,0	11,05	10,97	3,3	3,33
	4	5,30	63,7	1202,5	1207,9	713,2	494,7	25,0	1,000000	2,431	2423	2,563	0,17	5,1	12,20	82,6	5,2	17,4	5,2	70,3	12,06	12,00	3,3	3,64
PROMEDIO		**5,25**	**Rel LL/L=**	**1,1**	-	-	-	-	-	**2,436**	**2429**	**2,563**	**0,14**	**5,1**	**12,19**	**82,8**	**5,0**	**17,2**	**5,0**	**71,1**	**11,8**	**11,78**	**3,1**	**3,82**
FORMULA DE TRABAJO		5.03% - 5.63%	-	0.8% - 1.2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	> 15	4.0 - 6.0	65 - 75	-	9.67 - 13.43	2.0 - 3.5	3.0 - 6.0

OBSERVACIONES

EQUIPO UTILIZADO	CÓDIGO	FECHA CALIBRACIÓN
Prensa Marshall soiltest .	LAB-01-009	13/04/2026
Balanza TRUMAX 6000 g	LAB-01-003	14/04/2026

ELABORÓ : Eliecer Perez — **LABORATORISTA**

APROBÓ : Cesar Prieto — **DIR DE PRODUCCION.**

ANEXO 11

UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN

DOCUMENTACIÓN SOPORTE

Certificated of Calibration and Verification

OTDR

VER TEST E3LN011456

This document certifies that the reference device is functioning normally and that meets the measurement accuracy specifications provided by the manufacturer. The above parameters have been checking the manner specified by the manufacturer and provide a reliability level of 95% using K = 2 and following the NTC2194 guidelines. The instruments used for this calibration are drawn international standard measurement to NIST (National Institute of Standards and Technology) – USA

Company:	*SOLTEC*	***Manufacturer:***	*V6.02*	***Serial:***
Reference:	*OTDR*	***Model:***	*V6.02/7.18*	*E3LN011456*
Reference:	*E3LN011456*	***Model:***	*V6.02/7.18*	
Calibration Place:	*Calle 37B # 96-104*	***City***	*Medellin*	
Calibration Data	*10/06/2026*	***Calibration Due***		*10/06/2027*

1. Measurement repeatability short distances

Longitude (1310nm)		***Attenuation(1310nm)***	
Patron	***Measured***	***Patron***	***Measured***
0.199	*0.199*	*0.1*	*0.1*
0.199	*0.199*	*0.1*	*0.2*
0.199	*0.199*	*0.1*	*0.1*
0.199	*0.199*	*0.1*	*0.2*
0.199	*0.199*	*0.2*	*0.1*
0.199	*0.199*	*0.1*	*0.1*
0.199	*0.199*	*0.2*	*0.2*
0.199	*0.199*	*0.1*	*0.1*
Standard deviation	*0.0000*	*Standard deviation*	*0.0463*
Pass/fail	***Pass***	***Pass/fail***	***Pass***

Longitude (1550nm)		*Attenuation(1550nm)*	
Patron	***Measured***	***Patron***	***Measured***
0.199	*0.199*	*0.2*	*0.1*
0.199	*0.199*	*0.2*	*0.2*
0.199	*0.199*	*0.2*	*0.1*
0.199	*0.199*	*0.1*	*0.1*
0.199	*0.199*	*0.2*	*0.1*
0.199	*0.199*	*0.1*	*0.2*
0.199	*0.199*	*0.2*	*0.1*
0.199	*0.199*	*0.1*	*0.1*
Standard deviation	*0.0000*	*Standard deviation*	*0.0463*
Pass/fail	***Pass***	***Pass/fail***	***Pass***

2. Long distance verification

Measurement results	***L otdr 1***	***L otdr 2***	***Unit***
Measure 1	12065.2	4479.8	m
Measure 2	12065.2	4479.8	m
Measure 3	12065.2	4479.8	m
Measure 4	12065.2	4479.8	m
Measure 5	12065.2	4479.8	m
Measure 6	12065.2	4479.8	m
Mean	12065.2	4479.80	m
Standard deviation	0.000	0.000	m
Standard deviation of the mean	0.000	0.000	m

Summary								
Reference length	Measured length	Deviation	Uncertainty	Specification		Tolerance		Verification
(m)	(m)	(m)	(m)	(m)		(m)		
4479.8	4479.8	0.0	0.371	≤	0.162	≤	-0.209	CR)
12065.3	12065.2	-0.1	1.020	≤	0.402	≤	-0.62	CR)

Performance verification device is shown in the table

CS	*Conform to specifications;*
CR	*Conform with uncertainty;*
NI	*Non-conform with uncertainty;*
NS	*Non-conform to specifications.*
Status	***Pass***

In accordance with the International Laboratory Accreditation Cooperation guide ILAC-G8.

3. Attenuation verification

Summary						
Aexp (dB/km)	Aotdr (dB/km)	Deviation (dB/km)	Uncertainty (dB/km)	Maximum specified deviation (dB/km)		Verification
0.320	0.318	0.000	0.054	≤	0.017	CR)
0.322	0.321	-0.001	0.054	≤	0.017	CR)
0.323	0.321	0.002	0.054	≤	0.016	CR)
0.320	0.323	-0.001	0.054	≤	0.016	CR)
0.321	0.325	-0.003	0.054	≤	0.016	CR)
0.327	0.325	-0.003	0.054	≤	0.016	CR)
0.325	0.323	-0.002	0.054	≤	0.016	CR)
0.331	0.210	-0.001	0.054	≤	0.017	CR)
0.328	0.325	-0.003	0.054	≤	0.016	CR)
0.322	0.320	0.000	0.054	≤	0.016	CR)
0.320	0.330	-0.001	0.054	≤	0.017	CR)

Performance verification device is shown in the table

In accordance with the International Laboratory Accreditation Cooperation guide ILAC-G8.


CS	*Conform to specifications;*
CR	*Conform with uncertainty;*
NI	*Non-conform with uncertainty;*
NS	*Non-conform to specifications.*
Status	***Pass***


4. Environmental Conditions

Temperature	23 ºC ± 1 ºC
Relative Humidity	60 % ± 1 %

5. Traceability



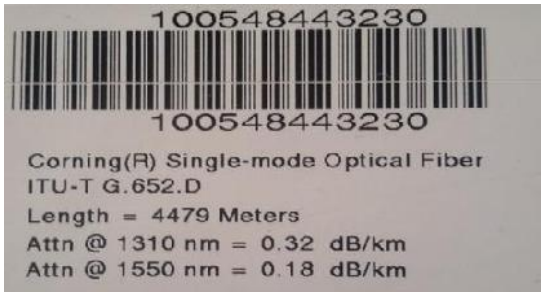

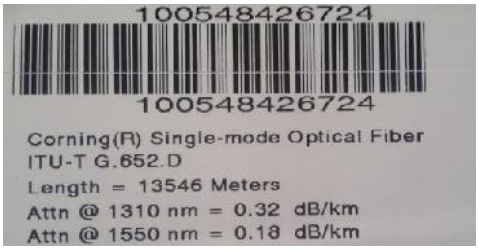

Approved by:

Ing. Luis Echeverri

NIT. 900.864.878-1
LABORATORIO

ANEXO 12

UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN

DOCUMENTACIÓN SOPORTE

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código:SIT-FO-CA-005
		Fecha: 30/09/2025
	PRODUCTO NO CONFORME	Versión: 01

Proyecto	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Número de contrato	4600105555 del año 2025.

FECHA:	30/04/26	RESPONSABLES EJECUCIÓN: Carlos Alberto Diaz Peña- Maria Victoria Durango

1. IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O HALLAZGO

ACCIÓN CORRECTIVA Nº	X	**ACCIÓN PREVENTIVA Nº**		**ACCIÓN DE MEJORA**	

Fuente	
Auditoría interna	
Queja o Reclamo	
Sugerencia Interna	
Revisión por la Gerencia	
Producto no conforme	X
Impacto ambiental	
Seguridad y Salud en el Trabajo	
Seguimiento procesos (Indicadores)	
No conformidad menor	
Reunión de calidad o Comité de calidad	
Otra _____	

No Conformidad o Descripción de la Situación	
Durante actividades de seguimiento y control de calidad ejecutadas en diferentes frentes de obra asociados al contrato de mantenimiento y reposición de la red semafórica del Distrito de Medellín, se identificaron no conformidades relacionadas con deficiencias en terminación de obras civiles y calidad de acabados. Entre los hallazgos evidenciados se encuentran: *Cajas sin terminación y/o con acabados deficientes *Deficiencias en acabados de brechas y andenes	
Detectada Por:	Interventoría
Responsable del proceso que la generó:	Proceso operativo de mantenimiento y obras civiles

Norma que afecta	ISO 9001	X	ISO 14001		ISO 45001	

Numeral de la norma o requisito del proceso que se incumple: ISO 9001:2015 Numeral 8.5.1 – Control de la producción y de la provisión del servicio.

2. CORRECCIÓN

Mejorar acabados de cajas y brechas.
Ajustar instalación de herrajes

3. ANÁLISIS DE CAUSAS

Priorización en la intervención de otros puntos, generando deficiencia en la programación para puntos identificados por la interventoría

4. PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO

Recorrido y recopilación de puntos pendientes por terminación y con acabados deficientes, elaboración de listado para generar programación

Responsable de implementar (nombre y cargo):	Carlos Alberto Díaz Peña	Fecha estimada:	30/05/26
Responsable del seguimiento (nombre y cargo):	Lina Maria Giraldo Botero	Fecha de seguimiento:	31/05/26

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código:SIT-FO-CA-005
		Fecha: 30/09/2025
	PRODUCTO NO CONFORME	Versión: 01

5. SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN

SEGUIMIENTO 1	Fecha: 30/05/26	**SEGUIMIENTO 2**	**APLICA: SI NO**	Fecha:

Se Aplicó Plan de Acción SI X NO	Se Aplicó Plan de Acción SI NO:
Evidencia de la Aplicación y Verificación de la Eficacia Registro fotográfico SI	Evidencia de la Aplicación y Verificación de la Efica
EFICACIA SI: x NO:	**EFICACIA SI:** **NO:**
Observaciones: Se realizan los correctivos requeridos relacionados	**Observaciones finales:**
firma responsbable de implementar:	
Firma responsable seguimiento:	Firma responsable seguimiento:

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN





UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código:SIT-FO-CA-005
		Fecha: 30/09/2025
	PRODUCTO NO CONFORME	Versión: 01

Proyecto	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Número de contrato	4600105555 del año 2025.

FECHA:	30/05/26	RESPONSABLES EJECUCIÓN: Carlos Alberto Diaz Peña- Maria Victoria Durango

1. IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O HALLAZGO

ACCIÓN CORRECTIVA Nº	X	**ACCIÓN PREVENTIVA Nº**		**ACCIÓN DE MEJORA**	

Fuente	
Auditoría interna	
Queja o Reclamo	
Sugerencia Interna	
Revisión por la Gerencia	
Producto no conforme	
Impacto ambiental	
Seguridad y Salud en el Trabajo	
Seguimiento procesos (Indicadores)	
No conformidad	X
Reunión de calidad o Comité de calidad	
Otra _____	

No Conformidad o Descripción de la Situación	
La Interventoría evidenció deficiencias en la ejecución y cierre de algunas actividades de mantenimiento y obra civil, relacionadas con: Permanencia de cintas de señalización, elementos temporales de obra y escombros después de finalizadas las intervenciones en diferentes puntos de la ciudad (57x54, 52x5, 45x73, 54x53, entre otros). Deficiencias en los acabados de obra civil en varios cruces intervenidos (29x47, 44x73, entre otros). Falta de implementación oportuna de Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en actividades que así lo requerían, como en el sector Palos Verdes. Permanencia de frentes de trabajo abiertos durante varios días sin culminar completamente las actividades programadas (55x30A, 80x25). Cierre inadecuado de tapas y elementos de infraestructura (55x30). Incumplimiento en los tiempos requeridos para la restitución definitiva de pavimentos y brechas	
Detectada Por:	Interventoría
Responsable del proceso que la generó:	Proceso de Operación y Mantenimiento de la Red Semafórica

Norma que afecta	ISO 9001	X	ISO 14001		ISO 45001	

Numeral de la norma o requisito del proceso que se incumple: 8.1 Planificación y control operacional.

2. CORRECCIÓN

Retiro inmediato de cintas, residuos de construcción y materiales sobrantes.
Corrección de acabados de obra civil observados.
Verificación y ajuste del cierre adecuado de tapas y cajas intervenidas.

3. ANÁLISIS DE CAUSAS

Priorización de nuevas atenciones operativas antes de finalizar completamente algunos frentes de trabajo.
Falta de seguimiento a las observaciones pendientes emitidas por la Interventoría.
Falta de validación previa del cumplimiento de requisitos asociados a PMT, aseo del área intervenida y restitución definitiva antes del cierre de la orden de trabajo.

4. PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO

Establecer inspección de cierre por parte del Auxiliar de Residencia o Supervisor antes de reportar una actividad como terminada.
Crear matriz de seguimiento de observaciones emitidas por la Interventoría con control de fechas de cierre.

Responsable de implementar (nombre y cargo):	Carlos Alberto Díaz Peña	Fecha estimada:	
Responsable del seguimiento (nombre y cargo):	Lina Maria Giraldo Botero	Fecha de seguimiento:	

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código:SIT-FO-CA-005
		Fecha: 30/09/2025
	PRODUCTO NO CONFORME	Versión: 01

5. SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN

SEGUIMIENTO 1	Fecha:	**SEGUIMIENTO 2**	**APLICA: SI NO**	Fecha:
Se Aplicó Plan de Acción SI _____ NO _____ Evidencia de la Aplicación y Verificación de la Eficacia Registro fotográfico SI **EFICACIA SI:** ____ NO: _____		Se Aplicó Plan de Acción SI _____ NO: _____ Evidencia de la Aplicación y Verificación de la Efica **EFICACIA SI:** _____ **NO:** _____		
Observaciones:		**Observaciones finales:**		
firma responsbable de implementar:				
Firma responsable seguimiento:		Firma responsable seguimiento:		

ANEXO 4.

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD LABORAR.

MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01-F-02 Versión: 4.0 Fecha: Marzo 09 de 2022 Página 1 de 1

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL VALLE DEL CAUCA

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2026717600100005599
FECHA RADICADO:	31-03-2026
NOMBRE - RAZÓN SOCIAL:	SOLUTRAFFIC INGENIERÍA SAS
IDENTIFICACIÓN:	900564496-4

A. NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	10
B. NÚMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	01
C. NÚMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	01
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	10.00


ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.
Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES: ……..
……

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dada en Santiago de Cali, a los trece (13) días del mes de Abril del Año Dos Mil Veintiséis (2026)





SOLY ACOSTA
Coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites

Verificó y Elaboró: GA Colonia T.
Revisó/Aprobó: Soly A.

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-05-05, 02:28:04 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1081789941

Periodo Cotización 202604 **Periodo Servicio** 202605

Cliente: NI900564496 SOLUTRAFFIC INGENIERIA S A S

PAGADA 2026-05-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLUTRAFFIC INGENIERIA S A S				
Documento	NI 900564496	**Dirección**	CR 19A #15 A - 41		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4893017		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	RUIZ QUINTERO JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 13890310		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1020837485		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DUARTE RUIZ MARIA DE LOS ANGELES	11001000 - 11	000000001	BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.927.200	25-14		16 %	$ 1.927.200	$ 308.400	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.927.200	$ 77.100	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.927.200	$ 10.100	CCF22	4 %	$ 1.927.200	$ 77.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 308.400	$ 0	$ 0	$ 77.100	$ 10.100	$ 77.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-10, 03:56:43 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1079549685

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202602

Cliente: NI900564496 SOLUTRAFFIC INGENIERIA S A S

PAGADA 2026-02-10

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLUTRAFFIC INGENIERIA S A S				
Documento	NI 900564496	**Dirección**	CR 19A #15 A - 41		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4893017		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	RUIZ QUINTERO JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 13890310		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1020837485		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DUARTE RUIZ MARIA DE LOS ANGELES	11001000 - 11	000000001	BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30					F	$ 1.927.200	25-14		16 %	$ 1.927.200	$ 308.400	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.927.200	$ 77.100	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.927.200	$ 10.100	CCF22	4 %	$ 1.927.200	$ 77.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 308.400	$ 0	$ 0	$ 77.100	$ 10.100	$ 77.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-03-02, 08:49:07 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1080004421

Periodo Cotización 202602 **Periodo Servicio** 202603

Cliente: NI900564496 SOLUTRAFFIC INGENIERIA S A S

PAGADA 2026-03-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLUTRAFFIC INGENIERIA S A S				
Documento	NI 900564496	**Dirección**	CR 19A #15 A - 41		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4893017		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	RUIZ QUINTERO JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 13890310		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1020837485		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DUARTE RUIZ MARIA DE LOS ANGELES	11001000 - 11	000000001	BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.927.200	25-14		16 %	$ 1.927.200	$ 308.400	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.927.200	$ 77.100	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.927.200	$ 10.100	CCF22	4 %	$ 1.927.200	$ 77.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 308.400	$ 0	$ 0	$ 77.100	$ 10.100	$ 77.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-01, 02:17:50 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1080884008

Periodo Cotización 202603 **Periodo Servicio** 202604

Cliente: NI900564496 SOLUTRAFFIC INGENIERIA S A S

PAGADA 2026-04-01

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLUTRAFFIC INGENIERIA S A S				
Documento	NI 900564496	**Dirección**	CR 19A #15 A - 41		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4893017		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	RUIZ QUINTERO JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 13890310		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1020837485		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DUARTE RUIZ MARIA DE LOS ANGELES	11001000 - 11	000000001	BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	10	10	10	10		F	$ 1.927.200	25-14		16 %	$ 642.400	$ 102.800	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 642.400	$ 25.700	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 642.400	$ 3.400	CCF22	4 %	$ 642.400	$ 25.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												X			0	20	20	20	20		F	$ 1.927.200	25-14		16 %	$ 1.284.800	$ 205.600	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.284.800	$ 51.400	$ 0	14-11		0,000 %	$ 1.284.800	$ 0	CCF22	4 %	$ 1.284.800	$ 51.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 308.400	$ 0	$ 0	$ 77.100	$ 3.400	$ 77.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 466.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-01, 04:16:18 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082430104

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI900564496 SOLUTRAFFIC INGENIERIA S A S

PAGADA 2026-06-01

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLUTRAFFIC INGENIERIA S A S				
Documento	NI 900564496	**Dirección**	CR 19A #15 A - 41		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4893017		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	RUIZ QUINTERO JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 13890310		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1020837485		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DUARTE RUIZ MARIA DE LOS ANGELES	11001000 - 11	000000001	BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.927.200	25-14		16 %	$ 1.927.200	$ 308.400	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.927.200	$ 77.100	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.927.200	$ 10.100	CCF22	4 %	$ 1.927.200	$ 77.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 308.400	$ 0	$ 0	$ 77.100	$ 10.100	$ 77.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

ANEXO 5.

FICHAS TECNICAS

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagûi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**FERROSVEL S A S**	Fecha Impresión	**25/09/13**	Informe N°:	**120568**
Dirección:	**CL 31 B 89 E 140 MEDELLIN**	No. Remisión:	**187234532**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**3136838991**	Página:	**1 de 2**	Centro:	**Centro Itagui**

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES QUIMICAS**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PROD	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% Mo
C8000080	ANGULO 2 1/2"x1/4" 6m A572/G50	A011997814	NTC 4537	Ternium	0.22	0.81	0.16	0.019	0.018	0.132	0.063	0.170	0.019	0.029
C8000075	ANGULO 2 1/2"x3/16" 6m A572/G50	A011892915	NTC 4537	Ternium	0.20	0.70	0.16	0.028	0.010	0.119	0.063	0.148	0.019	0.018
C8000061	ANGULO 2"x1/4" 6m A572/G50	A011976216	NTC 4537	Ternium	0.21	0.72	0.16	0.023	0.022	0.234	0.083	0.162	0.018	0.026
C8000061	ANGULO 2"x1/4" 6m A572/G50	A011976217	NTC 4537	Ternium	0.21	0.72	0.16	0.023	0.022	0.234	0.083	0.162	0.018	0.026

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES QUIMICAS**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PROD	FABRICANTE	% Nb
C8000080	ANGULO 2 1/2"x1/4" 6m A572/G50	A011997814	NTC 4537	Ternium	0.001
C8000075	ANGULO 2 1/2"x3/16" 6m A572/G50	A011892915	NTC 4537	Ternium	0.002
C8000061	ANGULO 2"x1/4" 6m A572/G50	A011976216	NTC 4537	Ternium	0.002
C8000061	ANGULO 2"x1/4" 6m A572/G50	A011976217	NTC 4537	Ternium	0.002

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagûi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**FERROSVEL S A S**	Fecha Impresión	**25/09/13**	Informe N°:	**120568**
Dirección:	**CL 31 B 89 E 140 MEDELLIN**	No. Remisión:	**187234532**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**3136838991**	Página:	**2 de 2**	Centro:	**Centro Itagui**

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES FISICAS**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PROD	FABRICANTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Resiste. Tracción2 MPa	Alargamiento 2 %	Resist. Fluencia2 MPa
C8000080	ANGULO 2 1/2"x1/4" 6m A572/G50	A011997814	NTC 4537	Ternium	409	561	24	556	24	404
C8000075	ANGULO 2 1/2"x3/16" 6m A572/G50	A011892915	NTC 4537	Ternium	393	519	24	523	23	396
C8000061	ANGULO 2"x1/4" 6m A572/G50	A011976216	NTC 4537	Ternium	389	528	20	517	21	375
C8000061	ANGULO 2"x1/4" 6m A572/G50	A011976217	NTC 4537	Ternium	389	528	20	517	21	375

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

ACEROS AREQUIPA

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.
AV. ANTONIO MIRO QUESADA 425
PISO 17, MAGDALENA DEL MAR
LIMA 17, PERÚ.

CERTIFICADO DE CALIDAD

N° E-5103624405-5172373125-90005-1_1

PRODUCTO :ANGULO
PROCEDENCIA :AA Cali Yumbo
CLIENTE :DOBLAMOS SAS

NORMAS TÉCNICAS :ASTM A36/A36M - A572/A572M G50
NORMA DE ENSAYO :ASTM A370/E8/E415
FACTURA N° :5103624405

DIMENSIÓN NOMINAL	N° DE COLADA	COMPOSICIÓN QUÍMICA (*)																LÍMITE DE FLUENCIA	RESIST TRACCIÓN	ALARGAM. EN 200 mm
		C (%)	Mn (%)	Si (%)	P (%)	S (%)	Cr (%)	Ni (%)	Mo (%)	Cu (%)	Sn (%)	Al (%)	V (%)	Ti (%)	Nb (%)	B (ppm)	N (ppm)	MPa	MPa	%
2" X 2" x 1/4" x 6M	B00030444	0.15	0.83	0.22	0.021	0.019	0.16	0.11	0.02	0.28	0.014	0.003	0.003	0.001	0.010	2	97	386.0	518.0	29.7
2" X 2" x 1/8" x 6M	B00030438	0.14	0.79	0.23	0.014	0.021	0.13	0.12	0.03	0.27	0.021	0.002	0.003	0.001	0.011	2	102	423.0	539.0	26.5

(*) Análisis en la Cuchara.

DIMENSIÓN NOMINAL	N° DE COLADA	PESO MÉTRICO	
		kg/m	%
2" X 2" x 1/4" x 6M	B00030444	4.737	
2" X 2" x 1/8" x 6M	B00030438	2.453	

/ GUIA:

DESPACHO N°

YUMBO, 09/10/2025

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A

Ing. Ricardo Gutiérrez Lara, CIP 57087
SUPERINTENDENTE DE METALURGIA

ACEROS AREQUIPA

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.
AV. ANTONIO MIRO QUESADA 425
PISO 17, MAGDALENA DEL MAR
LIMA 17, PERÚ.

CERTIFICADO DE CALIDAD

N° E-5103624405-5172373125-90005-1_1

PRODUCTO :ANGULO
PROCEDENCIA :AA Cali Yumbo
CLIENTE :DOBLAMOS SAS

NORMAS TÉCNICAS :ASTM A36/A36M - A572/A572M G50
NORMA DE ENSAYO :ASTM A370/E8/E415
FACTURA N° :5103624405

DIMENSIÓN NOMINAL	N° DE COLADA	COMPOSICIÓN QUÍMICA (*)																LÍMITE DE FLUENCIA	RESIST TRACCIÓN	ALARGAM. EN 200 mm
		C (%)	Mn (%)	Si (%)	P (%)	S (%)	Cr (%)	Ni (%)	Mo (%)	Cu (%)	Sn (%)	Al (%)	V (%)	Ti (%)	Nb (%)	B (ppm)	N (ppm)	MPa	MPa	%
2" X 2" x 1/4" x 6M	B00030444	0.15	0.83	0.22	0.021	0.019	0.16	0.11	0.02	0.28	0.014	0.003	0.003	0.001	0.010	2	97	386.0	518.0	29.7
2" X 2" x 1/8" x 6M	B00030438	0.14	0.79	0.23	0.014	0.021	0.13	0.12	0.03	0.27	0.021	0.002	0.003	0.001	0.011	2	102	423.0	539.0	26.5

(*) Análisis en la Cuchara.

DIMENSIÓN NOMINAL	N° DE COLADA	PESO MÉTRICO	
		kg/m	%
2" X 2" x 1/4" x 6M	B00030444	4.737	
2" X 2" x 1/8" x 6M	B00030438	2.453	

/ GUIA:

DESPACHO N°

YUMBO, 09/10/2025

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A

Ing. Ricardo Gutiérrez Lara, CIP 57087
SUPERINTENDENTE DE METALURGIA

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**DOBLAMOS BODEGA LA 33**	Fecha Impresión	**25/03/18**	Informe N°:	
Dirección:	**CR 52 36 65 CARABOBO CON LA 3 MEDELLIN**	No. Remisión:	**187139382**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**2882044**	Página:	**1 de 4**	Centro:	**Centro Itagui**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PROD	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu	% V
C8014228	TUBO EST REC 2.5x150x50mm 6m NTC4526/C	PZS078810Z	NTC 4526 GRC	Ternium	0.14	0.88	0.013	0.01	0.011				0.03	
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A011781614	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.86	0.16	0.015	0.013	0.44	0.185	0.058	0.197	0.004

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PROD	FABRICANTE	% Mo
C8014228	TUBO EST REC 2.5x150x50mm 6m NTC4526/C	PZS078810Z	NTC 4526 GRC	Ternium	
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A011781614	NTC 2289 GR60	Ternium	0.021

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**DOBLAMOS BODEGA LA 33**	Fecha Impresión	**25/03/18**	Informe N°:	
Dirección:	**CR 52 36 65 CARABOBO CON LA 3 MEDELLIN**	No. Remisión:	**187139382**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**2882044**	Página:	**3 de 4**	Centro:	**Centro Itagui**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PROD	FABRICANTE	Espaciamiento	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos
					mm	Kg/m	mm	mm
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A011781614	NTC 2289 GR60	Ternium	10.3	1.511	1.15	3.8

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PROD	FABRICANTE	Angulo Resalte
					°
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A011781614	NTC 2289 GR60	Ternium	59

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagûi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	DOBLAMOS BODEGA LA 33	Fecha Impresión	25/03/18	Informe N°:	
Dirección:	CR 52 36 65 CARABOBO CON LA 3 MEDELLIN	No. Remisión:	187139382	Informe Ant N°:	
Teléfono:	2882044	Página:	4 de 4	Centro:	Centro Itagui

Material	Ensayo	Método	Fecha Ensayo
C8014228	TRACCIÓN	NTC 3353	18.02.2025
C8014228	TRACCIÓN	NTC 3353	18.02.2025
C8014228	TRACCIÓN	NTC 3353	18.02.2025

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	DOBLAMOS BODEGA LA 33	Fecha Impresión	25/03/18	Informe N°:	
Dirección:	CR 52 36 65 CARABOBO CON LA 3 MEDELLIN	No. Remisión:	187139382	Informe Ant N°:	
Teléfono:	2882044	Página:	2 de 4	Centro:	Centro Itagui

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS				
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PROD	FABRICANTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF
C8014228	TUBO EST REC 2.5x150x50mm 6m NTC4526/C	PZS078810Z	NTC 4526 GRC	Ternium	470	546	20.3		
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A011781614	NTC 2289 GR60	Ternium	451	605	15	SinGrieta	1.34

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

DESTINATARIO

NOMBRE	DIRECCIÓN	N° ORDEN DE COMPRA
SOLDAMOS Y PINTAMOS S.A.S.	CL 56 54 106	PV/1787520

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

P-SGI-16-R01
Versión 5
30/08/2024

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE:	Agofer S.A.S.	**No. INTERNO**	54,963	**REPORTE DE PRODUCTO**	RPT5307	**FECHA DE PRODUCCIÓN**	2024-04-10
N.I.T.	800.216.499-1	**PLANTA**	**Malambo**	**N° ORDEN DE PRODUCCIÓN**	PO3305	**UNIDADES PRODUCIDAS**	258.0
DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN		KM 3-100 Vía a Caracolí					

DATOS DEL PRODUCTO

PRODUCTO		Lámina HR Alfajor 2.5mm x 1.20m x 3.00m												
N°	**NORMA DE FABRICACIÓN**	**N° DE TRAZABILIDAD DE LA MATERIA PRIMA**	**PROPIEDADES QUÍMICAS (%)**										**RECUBRIMIENTO**	**PROPIEDADES MECÁNICAS**		
			C	**Si**	**Mn**	**P**	**S**	**Al**	**Cu**	**Ni**	**Cr**	**Mo**		**Fluencia (F/Y)**	**Tracción (F/T)**	**Elongación (%)**
1	ASTM A36	2318168	0.1907	0.0650	0.3600	0.0070	0.0134	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	No aplica	339.0	490.0	29.0
2	ASTM A36	803011-2	0.0170	0.0160	0.3200	0.0160	0.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	No aplica	318.0	421.0	31.0

NOTA: Certificamos que los datos descritos de la composición química y de las propiedades mecánicas son una fiel copia de los certificados de calidad emitidos por el fabricante de la materia prima utilizada, en caso que la propiedades mecánicas estén con valor 0 significa que el fabricante no lo certifica ya que la norma de fabricación no lo exige como aspecto obligatorio.

ENSAYOS REALIZADOS

PRUEBAS DESTRUCTIVAS			
Abocardado	NA	**Doblado**	NA
Aplastamiento	NA		

PRUEBAS DIMENSIONALES					
Diámetro	NA	**Espesor**	Conforme	**Radios**	NA
Dimensiones	Conforme	**Longitud**	Conforme	**Rectitud**	Conforme

Certificamos que el material aquí descrito fue producido, revisado y aprobado en la fecha escrita en nuestras instalaciones. Si requiere trazabilidad adicional puede solicitarla al personal de Agofer S.A.S. con el número interno.

Isabelly Angulo Suaréz
Directora del S.I.G.

Declaración generada en **Bogotá** el **12/04/2024**

本钢板材股份有限公司
BENGANG STEEL PLATES Co., LTD

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

辽宁省本溪市平山区钢铁路 邮编117000
Gangtie Road ,Pingshan District,117000
Benxi City,Liaoning Province,P.R.CHINA
联系电话/TEL NO：024-47830097

制 造 厂：本钢板材股份有限公司热连轧厂
Manufacturer: BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. HOT ROLLING MILL

订货单位 Buyer	鞍钢集团国际经济贸易有限公司本溪分公司	产品名称 Product	热轧花纹板 Hot rolled checker steel sheet	证明书编号 Certificate No.	B02505300328
收货单位 Consignee	鞍钢集团国际经济贸易有限公司本溪分公司	交货状态 Delivery Condition	热轧 AS ROLLED	合同编号 Contract No.	B2550021001
客户名称 Customer	鞍钢集团国际经济贸易有限公司本溪分公司	计重方式 Weight Mode	实际重量 Actual Weight	购单号 Purchase No.	R2505BC312BX
标准 Specification	Q/BB 273-2022	发货日期 Date of Delivery	20250530	商检批次号 Ins.Lot.No.	
牌号 Grade	ASTM A36	车号	辽EA6555		

序号 No.	物料号 Pack No.	熔炼号 Heat No.	重量(kg) Weight	张数 Sheets	化学成分 Chemical Composition (%) 成分类型 C. C. T.	C 10 -2	Si 10 -2	Mn 10 -2	P 10 -3	S 10 -3	Als 10 -3
1	D250449101J11	5C13378	3915	66	0	16	15	22	9	10	28
2	D250449101J12	5C13378	3915	66	0	16	15	22	9	10	28
3	D250449101J13	5C13378	3915	66	0	16	15	22	9	10	28
合计Total		总重量Total Weight	11745	总毛重Total Gross Weight	11745	总张数 Total Sheets	198				

序号 No.	物料号 Pack No.	规格 Size 厚度 Thick mm	宽度 Width mm	长度 Length m	取样位置 Sample Location	拉伸试验 Tensile Test 标距: 方向 Direction	屈服 Y.S. MPa	抗拉 T.S. MPa	伸长率 EL (%)	屈强比 Y.S./T.S.	冷弯试验 Bend Test a= ° d=	冲击试验 Impact Test 方向 Direction	温度 C°	冲击功 (J) Impact Energy 1	2	3	Ave	冲击试样尺寸 Sample Size(mm)	冲击剪切面积 Impact SA % 1	2	3	Ave	落锤试验 DWTT 方向 Direction	温度 C°	剪切比 SA % 1	2	Ave	硬度 Hardness
1	D250449101J11	2.51	1002	3			276	428																			
2	D250449101J12	2.51	1002	3			276	428																			
3	D250449101J13	2.51	1002	3			276	428																			

备注 Remarks	上述元素仅列出参与复合公式的有意添加元素，但复合元素结果是严格按公式计算得出。	说明 Description	兹证明本表所列产品，均按标准进行制造和试验，并且符合规范之要求。本产品质量证明书盖章有效。 WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN, WAS BEEN MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD TECHNIQUE.EFFECTIVELY SEAL THE PRODUCT QUALITY CERTIFICATE.
注释 Notes	成分类型 (C.C.T.=Chemical Composition Type)： 0:熔炼分析 Heat Analysis 1:产品分析Product Analysis; 拉伸试验 (Tensile Test)：Y.S.=Yield Strength T.S.=Tensile Strength EL=Elongation G.L.=Gauge Length; 取样位置(Sample Location): B=Bottom 尾部 T= Top 头部 M= Middle 中部; 方向(Direction): L= Longi(纵向) T= Trans(横向) 3= 30° To The Rolling Direction(与轧制方向成30°) 8= Z向 9= 纵向+横向 0= 与纵向成60度 D= 45° To The Rolling Direction(与轧制方向成45°)。	质量保证负责人 Quality Manager	热轧产品合格专用章

天津市新宇彩板有限公司
Tianjin Xinyu Color Plate Co.,Ltd

产品质量证明书
MILL TEST CERTIFICATE

品名 COMMODITY	HOT DIPPED ZN-AL-MG COATED STEEL SHEET		标准 Specification
订货单位 CUSTOMER	TIANJIN HAOYU STEEL CO., LTD.	交货地 Delivery Place	TIANJIN XINYU COLOR PLATE CO.,LTD.	证书编号 Certificate No.	HY
收货单位 CONSIGNEE	CUMIC STEEL LIMITED	合同号 Contract No.	HYW8-250104	发货日期 Date of Delivery	

钢卷号	钢种	锌层重量 Coat Mass g/㎡	规格及重量 Material			化学成分（熔炼分析） Chemical Composistion %					拉伸测试 Tensile Test			性能 Properties			
BUNDLE No.	Grade		厚度*宽度*长度 Size	片数 Pieces	重量 N.W.	C	Si	Mn	P	S	屈服强度 Y.S	抗拉强度 T.S	延伸率 EL	锌花 Spangle	硬度	表面级别 Surface	弯曲性能 Bend
			mm		(kg)						MPa	MPa	%		HRB0T		
20250305001	CS-B	ZM120	0.85*1000*2000	350	4395	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	332	402	25	正常	62	FA	OK
20250305002	CS-B	ZM120	0.85*1000*2000	350	4395	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	332	402	25	正常	62	FA	OK
20250305003	CS-B	ZM120	0.85*1000*2000	350	4390	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	332	412	28	正常	62	FA	OK
20250305004	CS-B	ZM120	0.85*1000*2000	351	4400	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	332	412	28	正常	62	FA	OK
20250305005	CS-B	ZM120	0.55*1219*2438	327	3875	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	332	402	25	正常	62	FA	OK
20250305006	CS-B	ZM120	0.55*1219*2438	327	3875	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	332	402	25	正常	62	FA	OK
20250305007	CS-B	ZM120	0.55*1219*2438	327	3875	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	332	402	25	正常	62	FA	OK
20250305008	CS-B	ZM120	0.55*1219*2438	327	3875	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	332	402	25	正常	62	FA	OK
20250305009	CS-B	ZM120	0.55*1219*2438	327	3882	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	332	402	25	正常	62	FA	OK
20250305010	CS-B	ZM120	0.55*1219*2438	327	3882	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	332	402	25	正常	62	FA	OK
20250305011	CS-B	ZM120	0.7*1219*2438	273	4185	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	332	402	25	正常	62	FA	OK
20250305012	CS-B	ZM120	0.7*1219*2438	273	4185	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	334	401	27	正常	61	FA	OK
20250305013	CS-B	ZM120	0.7*1219*2438	273	4185	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	334	401	27	正常	61	FA	OK
20250305014	CS-B	ZM120	0.7*1219*2438	273	4175	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	330	396	28	正常	63	FA	OK
20250305015	CS-B	ZM120	0.7*1219*2438	273	4175	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	330	396	28	正常	63	FA	OK
20250305016	CS-B	ZM120	0.7*1219*2438	273	4195	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	330	396	28	正常	63	FA	OK
20250305017	CS-B	ZM120	0.7*1219*2438	273	4190	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	330	396	28	正常	63	FA	OK
20250305018	CS-B	ZM120	0.7*1219*2438	273	4190	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	334	401	27	正常	61	FA	OK
20250305019	CS-B	ZM120	0.7*1219*2438	273	4175	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	334	401	27	正常	61	FA	OK
20250305020	CS-B	ZM120	0.7*1219*2438	273	4180	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	330	396	28	正常	63	FA	OK
20250305021	CS-B	ZM120	0.7*1219*2438	268	4190	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	330	396	28	正常	63	FA	OK
20250305022	CS-B	ZM120	0.85*1219*2438	223	4185	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	334	401	27	正常	61	FA	OK
20250305023	CS-B	ZM120	0.85*1219*2438	223	4185	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	329	391	28	正常	64	FA	OK
20250305024	CS-B	ZM120	0.85*1219*2438	223	4180	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	329	391	28	正常	64	FA	OK
合计 (Total)					99419								数量	24		Quantity	24

备注 Remarks	本产品已按上述标准要求制造和检验，其结果符合要求，特此证明。贵方查询有关问题，请与我公司联系。 We hereby certify that material described here in has manufactured and tested with satisfactory results in accordance with the requirements of the above material	日期 Date: 新宇品质管理部 XINYU Quality Manageme

Powered by CamScanner

ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

ArcelorMittal

Usina / Plant: ArcelorMittal Tubarão

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 526, Polo Industrial Tubarão, Serra-ES, CEP 29160-904 CNPJ: 17.469.701/0104-82
Telefone:+55(27)3348-1240/ 3348-2220 Fax:+55(27)3348-1482/ 3348-2271

Certificado de Qualidade / Mill Sheet / Quality Certificate

Ordem de Venda / Order No:	Nº do pedido do cliente / Buyer ref. No:	Nº pedido do consumidor / Customer Ref. No:	Nº do certificado / Certificate	Data de emissão / Issue Date:
197171016 / 000001	0006000315/000005		004651001301	20.06.2022

Consumidor / Customer: ARCELORMITTAL INTERNATIONAL LUXEMBO

Cliente final / End user: CENTRO ACEROS DEL CARIBE

Aplicação / Aplication: DISTRIBUIÇÃO E CENTROS DE SERVIÇOS - CORTE EM CHAPAS /SERVICE AND DISTRIBUTION CENTERS - CUT TO LENGTH

Produto / Product: Bobina Laminada a Quente / Hot Rolled Coil

Norma do Produto / Product Standard: ASTM A1011SS36-2

Part Number: CONFORME NORMA

Espessura / Thickness: (MM)	Largura / Width: (MM)	Borda / Edge:	Tipo de dimensão / type of dimension:	Óleo / Oil:	Aspecto Superficial / Surface Aspect	Cond. Especial / Special Cond.	Nº Protocolo / No Protocol:
2,50	1.200	Natural	Nominal	Não/No	X	NORMAL	CO0042-00-16

Composição Química/ Chemical Composition (%) - L = Análise de Panela / Ladle Analysis - P = Análise de Produto / Product Analysis

Corrida	Cód.	C	Si	Mn	P	S	Al	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Nb	N	H	Sn	Ti	B	Ca
1545344	L	0,12	0,013	0,520	0,014	0,0105	0,038	0,012	0,007	0,022	0,001	0,000	0,0001	0,0021		0,0010	0,000	0,0000	0,0000

Nº da amostra / Sample No:	Tração/ Tensile Unidade / Unit = MPa Base / Basis = GL=50mm, W=12,5mm						Dobramento / Bending W = 40 mm		Dureza/ Hardness Test:		BH		Impacto / Charpy Unid. Temp. / Temp. Unit: Unid. Energ. / Energy Unit: CP/TS:								DWTT Unid. Temp. / Temp. Unit: CP/TS :						T. Grão / Grain Size		Embutimento / Cupping test (mm)	Inclusões / Inclusion				Anisotropia / Anisotropy				Expansão de furo / hole expansion
	Pos - Dir / Position - Direction	LE / YS	LR / TS	Razão El / Yield Ratio (%)	Along / Elong (%)	Red. Área (%) Area Reduc.	Pos - Dir / Position - Direction	Julg / Judgment (Ângulo / Ratio)	Posição / Position	Média/ Average	BH1	BH2	Pos - Dir / Position - Direction	Temperatura/ Temperature	TRS / TRE	Energia/ Energy F. Dúctil/Ductile F: Frágil Exp. Lateral/ L. Expansion 1	2	3	Méd/ Ave	Pos - Dir / Position - Direction	Temperatura/ Temperature	Área ductil % / Ductile Área % 1	2	3	Méd/ Ave.	TGF / FGS	TGA / AGS						n	n	r	r	
T0676496T	T4L	301	431	70	35		T4L	A 90 2,0							/																				
T0676496T	T4L	301	431	70	35		T4L	A 90 2,0							/																				

Número do lote / lot ID	Nº da nota fiscal / Issue Number	Peso liq. / Net weight t	Corrida / Heat No	Comprimento Real / Real Length(m)	Amostra 1 / Sample 1	Amostra 2 / Sample 2	Amostra 3 / Sample 3
L5165451	005843065	12,740	1545344	541,00	T0676496T		
L5165452	005843065	12,300	1545344	521,00	T0676496T		
L5169141	005843065	12,800	1545344	542,00	T0676496T		
L5169142	005843065	12,300	1545344	520,00	T0676496T		
L5169151	005843065	12,750	1545344	541,00	T0676496T		
L5169152	005843065	12,130	1545344	514,00	T0676496T		

Códigos / Codes

(1) POSIÇÃO / POSITION
T - Topo / Head
2 - ¼ Largura / ¼ Width
M - Meio / Body
4 - ¾ Largura / ¾ Width
C - Cauda / Tail
DIREÇÃO / DIRECTION
L - Longitudinal
A - 45°
T - Transversal
DOBRAMENTO / BEND
A - Aprovado / Aproved

(2) INCLUSÕES
TIPO / TYPE
A - Sulfeto / Sulphide
B - Aluminato / Aluminate
C - SiCato / Silicate
D - Óxido / Oxide
T - Total / Total
SÉRIE
F - Fina / Thin
G - Grossa / Heavy

Obs.

CERTIFICAMOS QUE O MATERIAL AQUI DESCRITO, FOI INSPECIONADO E APROVADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUE NÃO ESTÁ CONTAMINADO POR RADIOATIVIDADE ACIMA DOS LIMITES NORMAIS E QUE O MATERIAL NÃO SOFREU CONTAMINAÇÃO POR MERCÚRIO DURANTE O SEU PROCESSO DE FABRICAÇÃO. / WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN SATISFACTORY INSPECTED IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATIONS, HAS NOT BEEN CONTAMINATED BY ANY RADIOACTIVITY ABOVE NORMAL BACKGROUND LEVELS AND HAS NOT COME INTO CONTACT WITH ANY MERCURY BEARING INSTRUMENTS OR MERCURE CONTAMINANTS DURING ITS PRODUCTIVE PROCESS.
PROCESSO DE FABRICAÇÃO: ACIARIA LD - LINGOTAMENTO CONTÍNUO - LAMINAÇÃO A QUENTE CONTÍNUO / MANUFACTURING PROCESS: BASIC OXYGEN LD, CONTINUOUS CASTING, HOT STRIP MILL (as rolled). LICENÇA PARA USO DA MARCA ABNT DE QUALIDADE AMBIENTAL - ROTULO ECOLÓGICO ABNT - PARA EMPRESAS (BOBINA LAMINADA A QUENTE). LICENSE FOR USING ABNT ENVIRONMENTAL MARK - ABNT ECOLABEL - TO THE COMPANY (HOT ROLLED COIL)
CERTIFICAÇÕES NAVAIS / SHIPBUILDING CERTIFICATIONS: ABS, BV, DNV GL, LR, RINA, CCS, NKK, KRS.

André Carvalho Prado
Gerência de Assistência Técnica a Clientes
Customer Technical Support Manager

ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

Usina / Plant: ArcelorMittal Tubarão

leiro Eduardo Gomes, 526, Polo Industrial Tubarão, Serra-ES,
)-904 CNPJ: 17.469.701/0104-82
-55(27)3348-1240/ 3348-2220 Fax:+55(27)3348-1482/ 3348-2271

Certificado de Qualidade / Mill Sheet / Quality Certificate

Ordem de Venda / Order No:	Nº do pedido do cliente / Buyer ref. No:	Nº pedido do consumidor / Customer Ref. No:	Nº do certificado / Certificate	Data de emissão / Issue Date:
9750465 / 000003	0009749214/000007		003684852901	16.08.2021

Consumidor / Customer:	Cliente final / End user:
ARCELORMITTAL INTERNATIONAL LUXEMBO	CENTRO ACEROS DEL CARIBE

Aplication:	Produto / Product:	Norma do Produto / Product Standard:	Part Number:
IÇÃO E CENTROS DE SERVIÇOS - CORTE EM CHAPAS /SERVICE RIBUTION CENTERS - CUT TO LENGTH	Bobina Laminada a Quente / Hot Rolled Coil	ASTM A1011SS36-2	CONFORME NORMA

Thickness: (MM)	Largura / Width: (MM)	Borda / Edge:	Tipo de dimensão / type of dimension:	Óleo / Oil:	Aspecto Superficial / Surface Aspect	Cond. Especial / Special Cond.	Nº Protocolo / No Protocol:
3,00	1.200	Natural	Nominal	Não/No	X	NORMAL	CO0042-00-14

Composição Química/ Chemical Composition (%) - L = Análise de Panela / Ladle Analysis - P = Análise de Produto / Product Analysis

Cód.	C	Si	Mn	P	S	Al	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Nb	N	H	Sn	Ti	B	Ca
L	0,12	0,010	0,510	0,027	0,0089	0,039	0,005	0,004	0,023	0,000	0,000	0,0001	0,0023		0,0000	0,000	0,0000	0,0003

	Tração/ Tensile Unidade / Unit = MPa Base / Basis = GL=50mm, W=12,5mm						Dobramento / Bending W = 40 mm		Dureza/ Hardness Test:		BH		Impacto / Charpy Unid. Temp. / Temp. Unit: Unid. Energ. / Energy Unit: CP/TS:								DWTT Unid. Temp. / Temp. Unit: CP/TS :						T. Grão / Grain Size		Embutimento / Cupping test (mm)	Inclusões / Inclusion				Anisotropia / Anisotropy				Expansão de furo / hole expansion
	Pos - Dir / Position - Direction	LE / YS	LR / TS	Razão El / Yield Ratio (%)	Along / Elong (%)	Red. Área (%) Area Reduc.	Pos - Dir / Position - Direction	Julg / Julgment (Ângulo / Ratio)	Posição / Position	Média/ Average	BH1	BH2	Pos - Dir / Position - Direction	Temperatura/ Temperature	TRS / TRE	Energia/ Energy F. Dúctil/Ductile F: Frágil Exp. Lateral/ L. Expansion 1	2	3	Méd/ Ave	Pos - Dir / Position - Direction	Temperatura/ Temperature	Área ductil % / Ductile Área % 1	2	3	Méd/ Ave.	TGF / FGS	TGA / AGS						n	n	r	r	
T	T4L	326	456	71	33		T4L	A 90 2,0							/																				
T	T4L	308	432	71	35		T4L	A 90 2,0							/																				

te /	Nº da nota fiscal / Issue Number	Peso liq. / Net weight t	Corrida / Heat No	Comprimento Real / Real Length(m)	Amostra 1 / Sample 1	Amostra 2 / Sample 2	Amostra 3 / Sample 3
1	005147787	12,670	3896189	447,00	T0623783T		
2	005147787	12,210	3896189	433,00	T0623783T		
1	005147787	12,500	3896189	442,00	T0623783T		
2	005147787	12,310	3896189	436,00	T0623783T		
1	005147803	12,670	3896189	447,00	T0623783T		
2	005147803	12,250	3896189	433,00	T0623783T		
1	005147787	12,640	3896189	445,00	T0623783T		
2	005147787	12,320	3896189	435,00	T0623783T		
1	005147787	12,550	3896189	448,00	T0623783T		
2	005147787	12,410	3896189	443,00	T0623783T		
1	005147787	12,620	3896189	444,00	T0623783T		
2	005147787	12,080	3896189	426,00	T0623783T		
1	005147787	12,580	3896189	446,00	T0623784T		

Códigos / Codes

(1) POSIÇÃO / POSITION
T - Topo / Head
2 - ½ Largura / ½ Width
M - Melo / Body
4 - ¼ Largura / ¼ Width
C - Cauda / Tail

DIREÇÃO / DIRECTION
L - Longitudinal
A - 45°
T - Transversal

DOBRAMENTO / BEND
A - Aprovado / Aproved

(2) INCLUSÕES
TIPO / TYPE
A - Sulfeto / Sulphide
B - Aluminato / Aluminate
C - Silicato / Silicate
D - Óxido / Oxide
T - Total / Total

SÉRIE
F - Fina / Thin
G - Grossa / Heavy

Obs.

CERTIFICAMOS QUE O MATERIAL AQUI DESCRITO, FOI INSPECIONADO E APROVADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUE NÃO ESTÁ CONTAMINADO POR RADIOATIVIDADE ACIMA DOS LIMITES NORMAIS E QUE O MATERIAL NÃO SOFREU CONTAMINAÇÃO POR MERCÚRIO DURANTE O SEU PROCESSO DE FABRICAÇÃO. / WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN SATISFACTORY INSPECTED IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATIONS, HAS NOT BEEN CONTAMINATED BY ANY RADIOACTIVITY ABOVE NORMAL BACKGROUND LEVELS AND HAS NOT COME INTO CONTACT WITH ANY MERCURY BEARING INSTRUMENTS OR MERCURE CONTAMINANTS DURING ITS PRODUCTIVE PROCESS

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: ACIARIA LD - LINGOTAMENTO CONTÍNUO - LAMINAÇÃO A QUENTE CONTÍNUO / MANUFACTURING PROCESS: BASIC OXYGEN LD, CONTINUOUS CASTING, HOT STRIP MILL (as rolled). LICENÇA PARA USO DA MARCA ABNT DE QUALIDADE AMBIENTAL - ROTULO ECOLÓGICO ABNT - PARA EMPRESAS (BOBINA LAMINADA A QUENTE). LICENSE FOR USING ABNT ENVIRONMENTAL MARK - ABNT ECOLABEL - TO THE COMPANY (HOT ROLLED COIL)

CERTIFICAÇÕES NAVAIS / SHIPBUILDING CERTIFICATIONS: ABS, BV, DNV GL, LR, RINA, CCS, NKK, KRS

André Carvalho Prado
Gerência de Assistência Técnica a Clientes
Customer Technical Support Manager

CERTIFICADO DE CALIDAD

PINTURA ELECTROSTÁTICA

Fecha de análisis: 29/10/2025
Código del Producto: 1019003425
Descripción del Producto: Blanco Dynamic Liso Sb Pol
Tipo de pintura: Poliéster
Lote del Producto: **A11013235**
Este lote se compone de las cajas: #1 a la #158 por 25Kg
Cantidad de producto certificado: 3950 Kg

PROPIEDADES*	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN	NORMA	LOTE A11013235
Tamaño de partícula (D4,3)	µm	38 - 44	NTC 2682/Cilas 990	40.1
Curado (Temperatura/tiempo)	°C/min	190/12	---	190/12
Espesor de película	µm	60 - 70	NTC 591	67
Color	dE* (CIE 2000)	0.0 - 0.8	ASTM D2244	0.36
Brillo	u.b	60 - 80	NTC 592	80
Flexibilidad - (Mandril Cónico)	pulg	1/8”	NTC 1115	1/8”.
Impacto Directo	Kg-cm	Pasa 60 Kg-cm	NTC 877	Pasa.
Impacto Reverso	Kg-cm	Pasa 60 Kg-cm	NTC 877	Pasa.
Test de polimerización: Xileno.	Frotes	50 Frotes	ASTM D5402	Pasa 50 frotes
PRODUCTO CONFORME	---	**SI/NO**	---	**SI.**
FECHA DE MANUFACTURA				**29/10/2025**
FECHA DE VENCIMIENTO				**28/10/2026**
*Sustrato: Lámina de Acero Cold Rolled de 0.9 mm de espesor y pretratada con fosfato de hierro.				
OBSERVACIONES				

Jorge Mario Muñoz
Analista de Calidad
Departamento de Calidad RECYA S.A.S

ANEXO 6.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICADO DE PAGO.

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1017144470		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DIAZ PEÑA CARLOS ALBERTO	5001000 - 5	000000004	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 9.056.977	230301		16 %	$ 9.056.977	$ 1.449.200	$ 45.300	$ 45.300	EPS010		4 %	$ 9.056.977	$ 362.300	$ 0	14-4	4	4,350 %	$ 9.056.977	$ 394.000	CCF04	4 %	$ 9.056.977	$ 362.300	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.449.200	$ 45.300	$ 45.300	$ 362.300	$ 394.000	$ 362.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.658.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1098736267		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					TRUJILLO VANEGAS JORGE LUIS	5001000 - 5	000000002	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30			$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-4	2	1,044 %	$ 1.750.905	$ 18.300	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 18.300	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 32220126		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GIRALDO BOTERO LINA MARIA	5001000 - 5	000000004	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**COR**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRP**	**Días AFP**	**Días EPS**	**Días ARP**	**Días CCF**						**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30					F	$ 5.434.148	25-14		16 %	$ 5.434.148	$ 869.500	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 5.434.148	$ 217.400	$ 0	14-4	4	4,350 %	$ 5.434.148	$ 236.400	CCF04	4 %	$ 5.434.148	$ 217.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 869.500	$ 0	$ 0	$ 217.400	$ 236.400	$ 217.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.540.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 42683289		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DURANGO ARENAS MARIA VICTORIA	5001000 - 5	000000004	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30		F	$ 5.255.000	25-14		16 %	$ 5.255.000	$ 840.800	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 5.255.000	$ 210.200	$ 0	14-4	4	4,350 %	$ 5.255.000	$ 228.600	CCF04	4 %	$ 5.255.000	$ 210.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 840.800	$ 0	$ 0	$ 210.200	$ 228.600	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.489.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1098752603		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL	5001000 - 5	000000004	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30		F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-4	4	4,350 %	$ 1.750.905	$ 76.200	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 76.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-02, 01:39:18 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1082471285

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 02/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN		
Documento	NI901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413
Total Afiliados	27	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000537976	JUAN JOSE ROA SILVA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.297.830	$ 367.700	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 2.297.830	$ 92.000	6,960	$ 2.297.830	$ 160.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.297.830	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 711.700
CC 1017144470	CARLOS ALBERTO DIAZ PEÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 9.056.977	$ 1.539.800	(EPS010) EPS SURA	$ 9.056.977	$ 362.300	4,350	$ 9.056.977	$ 394.000	(CCF04) COMFAMA	$ 9.056.977	$ 362.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.658.400
CC 1017221580	LAURA MARCELA PADILLA GIRALDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.805.621	$ 288.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.805.621	$ 72.300	6,960	$ 1.805.621	$ 125.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.805.621	$ 72.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 559.200
CC 1037368900	ANDRES FERLEY BEDOYA VALENCIA	01	00																	0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	6,960	$ 1.575.815	$ 109.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.575.814	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.100
CC 1037368900	ANDRES FERLEY BEDOYA VALENCIA	01	00											X						0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 175.091	$ 28.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 175.091	$ 0	0,000	$ 175.091	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 175.090	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.100
CC 1038810427	EDWIN DAVID SANTOS HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.529.739	$ 404.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.529.739	$ 101.200	6,960	$ 2.529.739	$ 176.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.529.739	$ 101.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 783.300
CC 1039597832	YEISON ALEJANDRO GALEANO PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1049894058	CARLOS MARIO GONZALEZ MORA	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.894.718	$ 303.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.894.718	$ 75.800	6,960	$ 1.894.718	$ 131.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.894.718	$ 75.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 586.700
CC 1049894058	CARLOS MARIO GONZALEZ MORA	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 135.337	$ 21.700	(EPS010) EPS SURA	$ 135.337	$ 5.500	0,000	$ 135.337	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 135.337	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.200
CC 1052982270	JENIFER DEL CARMEN ALTAMIRANDA DIAZ	01	00																	0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 2.102.000	$ 336.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.102.000	$ 84.100	6,960	$ 2.102.000	$ 146.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.102.000	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650.900
CC 1052982270	JENIFER DEL CARMEN ALTAMIRANDA DIAZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 420.400	$ 67.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 420.400	$ 16.900	0,000	$ 420.400	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 420.400	$ 16.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.100
CC 1065913019	SIMEON FERNANDO VIVAS MANDON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.028.409	$ 324.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.028.409	$ 81.200	6,960	$ 2.028.409	$ 141.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.028.409	$ 81.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 628.200
CC 1069484054	MOISES JESUS FLOREZ ACERO	01	00	X																0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION	$ 525.272	$ 84.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 525.272	$ 21.100	6,960	$ 525.272	$ 36.600	(CCF04) COMFAMA	$ 525.271	$ 21.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.900
CC 1076817116	CRISTIAN MENA CORDOBA	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.634.178	$ 261.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.634.178	$ 65.400	6,960	$ 1.634.178	$ 113.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.634.178	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 506.100
CC 1076817116	CRISTIAN MENA CORDOBA	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116.727	$ 18.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 116.727	$ 0	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.700
CC 1096218904	JAIME ESTIVEN PALACIO ACEVEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1096247524	CARLOS ANDRES ZUÑIGA BENAVIDES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1096247535	BRAYAN ESMID PALACIO ACEVEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1098701110	OSCAR RAUL CARO TRUJILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.402.374	$ 544.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.402.374	$ 136.100	4,350	$ 3.402.374	$ 148.100	(CCF04) COMFAMA	$ 3.402.374	$ 136.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 964.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 02/06/2026 | **Empresa NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN** | **Planilla Nro: 1082471285** | **Periodo Cotización: mayo de 2026** | **Periodo Servicio: junio de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098736267	JORGE LUIS TRUJILLO VANEGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
CC 1098752603	MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
CC 11222857	JOSE ALCIBIADES ANDRADE GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.946.091	$ 311.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.946.091	$ 77.900	6,960	$ 1.946.091	$ 135.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.946.091	$ 77.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 602.700
CC 1151966785	CHRISTIAN BARBOSA YEPES	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 2.176.445	$ 348.300	(EPS010) EPS SURA	$ 2.176.445	$ 87.100	6,960	$ 2.176.445	$ 151.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.176.445	$ 87.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 674.000
CC 1151966785	CHRISTIAN BARBOSA YEPES	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 155.460	$ 24.900	(EPS010) EPS SURA	$ 155.460	$ 6.300	0,000	$ 155.460	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 155.460	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.200
CC 1152187124	ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.150.539	$ 504.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.150.539	$ 126.100	6,960	$ 3.150.539	$ 219.300	(CCF04) COMFAMA	$ 3.150.539	$ 126.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 975.600
CC 1214743297	GINA PAOLA MARTINEZ VELASQUEZ	01	00																	0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 1.866.666	$ 298.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.866.666	$ 74.700	0,522	$ 1.866.666	$ 9.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.866.666	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 457.900
CC 1214743297	GINA PAOLA MARTINEZ VELASQUEZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 133.333	$ 21.400	(EPS010) EPS SURA	$ 133.333	$ 5.400	0,000	$ 133.333	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 133.333	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.800
CC 16791906	FRANKLIN BARBOSA PALOMINO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.166.400	$ 506.700	(EPS010) EPS SURA	$ 3.166.400	$ 126.700	6,960	$ 3.166.400	$ 220.400	(CCF04) COMFAMA	$ 3.166.400	$ 126.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.500
CC 32220126	LINA MARIA GIRALDO BOTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.434.148	$ 869.500	(EPS010) EPS SURA	$ 5.434.148	$ 217.400	4,350	$ 5.434.148	$ 236.400	(CCF04) COMFAMA	$ 5.434.148	$ 217.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.540.700
CC 42683289	MARIA VICTORIA DURANGO ARENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.255.000	$ 840.800	(EPS010) EPS SURA	$ 5.255.000	$ 210.200	4,350	$ 5.255.000	$ 228.600	(CCF04) COMFAMA	$ 5.255.000	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.489.800
CC 4852397	AGUEDO ALCIDES RIASCO REYES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 91452201	LUIS DANOVER LOZANO ROJAS	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 2.201.553	$ 352.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.201.553	$ 88.100	6,960	$ 2.201.553	$ 153.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.201.553	$ 88.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.800
CC 91452201	LUIS DANOVER LOZANO ROJAS	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 157.253	$ 25.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 157.253	$ 6.300	0,000	$ 157.253	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 157.253	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.500
CC 98681775	WILLIAN ALBEIRO CHAVARRIA BUILES	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.364.170	$ 378.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.364.170	$ 94.600	6,960	$ 2.364.170	$ 164.600	(CCF04) COMFAMA	$ 2.364.170	$ 94.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 732.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 69.963.881	$ 69.963.881	$ 69.963.881	$ 69.963.878	$ 11.286.400	$ 2.788.500	$ 3.906.800	$ 2.765.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.746.700	$ 0	$ 20.746.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-06-02, 01:06:36 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
NIT	NI 901979396
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1082471285
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	358441989
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 20.746.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	13	$ 5.432.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	9	$ 2.853.600	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 2.115.100	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	$ 885.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 136.100	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3	$ 210.300	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 77.900	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	11	$ 908.400	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 21.100	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	$ 92.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	9	$ 1.342.700	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	27	$ 3.906.800	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	27	$ 2.765.000	$ 0
		SubTotales:		$ 20.746.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 20.746.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 4852397		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					RIASCO REYES AGUEDO ALCIDES	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30			$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1037368900		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					BEDOYA VALENCIA ANDRES FERLEY	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0	27	27	27	27			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.575.815	$ 252.200	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.575.815	$ 109.700	CCF04	4 %	$ 1.575.814	$ 63.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0
									X					0	3	3	3	3			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	EPS002		0 %	$ 175.091	$ 0	$ 0	14-4		0,000 %	$ 175.091	$ 0	CCF04	0 %	$ 175.090	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.300	$ 0	$ 0	$ 63.100	$ 109.700	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1152187124		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GOMEZ MEJIA ANYELO DANIEL	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 3.150.539	230201		16 %	$ 3.150.539	$ 504.100	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 3.150.539	$ 126.100	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 3.150.539	$ 219.300	CCF04	4 %	$ 3.150.539	$ 126.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 504.100	$ 0	$ 0	$ 126.100	$ 219.300	$ 126.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 975.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1096247535		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					PALACIO ACEVEDO BRAYAN ESMID	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 1.750.905	230201		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1096247524		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ZUÑIGA BENAVIDES CARLOS ANDRES	5088000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1049894058		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GONZALEZ MORA CARLOS MARIO	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0		28	28	28	28			F	$ 2.030.055	230301		16 %	$ 1.894.718	$ 303.200	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.894.718	$ 75.800	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.894.718	$ 131.900	CCF04	4 %	$ 1.894.718	$ 75.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0
										X				0		2	2	2	2			F	$ 2.030.055	230301		16 %	$ 135.337	$ 21.700	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 135.337	$ 5.500	$ 0	14-4		0,000 %	$ 135.337	$ 0	CCF04	0 %	$ 135.337	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 324.900	$ 0	$ 0	$ 81.300	$ 131.900	$ 75.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1151966785		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					BARBOSA YEPES CHRISTIAN	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0		28	28	28	28		F	$ 2.331.906	230301		16 %	$ 2.176.445	$ 348.300	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 2.176.445	$ 87.100	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.176.445	$ 151.500	CCF04	4 %	$ 2.176.445	$ 87.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0
										X				0		2	2	2	2		F	$ 2.331.906	230301		16 %	$ 155.460	$ 24.900	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 155.460	$ 6.300	$ 0	14-4		0,000 %	$ 155.460	$ 0	CCF04	0 %	$ 155.460	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 373.200	$ 0	$ 0	$ 93.400	$ 151.500	$ 87.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 705.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1076817116		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MENA CORDOBA CRISTIAN	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0	28	28	28	28			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.634.178	$ 261.500	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.634.178	$ 65.400	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.634.178	$ 113.800	CCF04	4 %	$ 1.634.178	$ 65.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0
									X					0	2	2	2	2			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 116.727	$ 18.700	$ 0	$ 0	EPS002		0 %	$ 116.727	$ 0	$ 0	14-4		0,000 %	$ 116.727	$ 0	CCF04	0 %	$ 116.727	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 65.400	$ 113.800	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1038810427		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					SANTOS HERNANDEZ EDWIN DAVID	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 2.529.739	25-14		16 %	$ 2.529.739	$ 404.800	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 2.529.739	$ 101.200	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.529.739	$ 176.100	CCF04	4 %	$ 2.529.739	$ 101.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 404.800	$ 0	$ 0	$ 101.200	$ 176.100	$ 101.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 783.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 16791906		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					BARBOSA PALOMINO FRANKLIN	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30			F	$ 3.166.400	231001		16 %	$ 3.166.400	$ 506.700	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 3.166.400	$ 126.700	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 3.166.400	$ 220.400	CCF04	4 %	$ 3.166.400	$ 126.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 506.700	$ 0	$ 0	$ 126.700	$ 220.400	$ 126.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1096218904		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					PALACIO ACEVEDO JAIME ESTIVEN	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1214743297		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MARTINEZ VELASQUEZ GINA PAOLA	5001000 - 5	000000001	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0		28	28	28	28		F	$ 2.000.000	230201		16 %	$ 1.866.666	$ 298.700	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.866.666	$ 74.700	$ 0	14-4	1	0,522 %	$ 1.866.666	$ 9.800	CCF04	4 %	$ 1.866.666	$ 74.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0
										X				0		2	2	2	2		F	$ 2.000.000	230201		16 %	$ 133.333	$ 21.400	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 133.333	$ 5.400	$ 0	14-4		0,000 %	$ 133.333	$ 0	CCF04	0 %	$ 133.333	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 320.100	$ 0	$ 0	$ 80.100	$ 9.800	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 484.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1052982270		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ALTAMIRANDA DIAZ JENIFER DEL CARMEN	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0	25	25	25	25			F	$ 2.522.400	230201		16 %	$ 2.102.000	$ 336.400	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 2.102.000	$ 84.100	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.102.000	$ 146.300	CCF04	4 %	$ 2.102.000	$ 84.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												X		0	5	5	5	5			F	$ 2.522.400	230201		16 %	$ 420.400	$ 67.300	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 420.400	$ 16.900	$ 0	14-4		0,000 %	$ 420.400	$ 0	CCF04	4 %	$ 420.400	$ 16.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 403.700	$ 0	$ 0	$ 101.000	$ 146.300	$ 101.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 11222857		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ANDRADE GARCIA JOSE ALCIBIADES	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30		F	$ 1.946.091	230301		16 %	$ 1.946.091	$ 311.400	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.946.091	$ 77.900	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.946.091	$ 135.500	CCF04	4 %	$ 1.946.091	$ 77.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 311.400	$ 0	$ 0	$ 77.900	$ 135.500	$ 77.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 602.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1000537976		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ROA SILVA JUAN JOSE	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30				230201		16 %	$ 2.297.830	$ 367.700	$ 0	$ 0	EPS040		4 %	$ 2.297.830	$ 92.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.297.830	$ 160.000	CCF04	4 %	$ 2.297.830	$ 92.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 367.700	$ 0	$ 0	$ 92.000	$ 160.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 711.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1017221580		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					PADILLA GIRALDO LAURA MARCELA	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30			$ 1.805.621	230201		16 %	$ 1.805.621	$ 288.900	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.805.621	$ 72.300	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.805.621	$ 125.700	CCF04	4 %	$ 1.805.621	$ 72.300	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 288.900	$ 0	$ 0	$ 72.300	$ 125.700	$ 72.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 559.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 91452201		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					LOZANO ROJAS LUIS DANOVER	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0	28	28	28	28			F	$ 2.358.807	230301		16 %	$ 2.201.553	$ 352.300	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 2.201.553	$ 88.100	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.201.553	$ 153.300	CCF04	4 %	$ 2.201.553	$ 88.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0
										X				0	2	2	2	2			F	$ 2.358.807	230301		16 %	$ 157.253	$ 25.200	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 157.253	$ 6.300	$ 0	14-4		0,000 %	$ 157.253	$ 0	CCF04	0 %	$ 157.253	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 377.500	$ 0	$ 0	$ 94.400	$ 153.300	$ 88.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 713.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1069484054		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					FLOREZ ACERO MOISES JESUS	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
X															0	9	9	9	9		F	$ 1.750.905	230201		16 %	$ 525.272	$ 84.100	$ 0	$ 0	ESSC24		4 %	$ 525.272	$ 21.100	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 525.272	$ 36.600	CCF04	4 %	$ 525.271	$ 21.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS-S COOSALUD	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 21.100	$ 36.600	$ 21.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1098701110		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CARO TRUJILLO OSCAR RAUL	5001000 - 5	000000004	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30		F	$ 3.402.374	230301		16 %	$ 3.402.374	$ 544.400	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 3.402.374	$ 136.100	$ 0	14-4	4	4,350 %	$ 3.402.374	$ 148.100	CCF04	4 %	$ 3.402.374	$ 136.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 544.400	$ 0	$ 0	$ 136.100	$ 148.100	$ 136.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 964.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1065913019		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					VIVAS MANDON SIMEON FERNANDO	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30				230201		16 %	$ 2.028.409	$ 324.600	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 2.028.409	$ 81.200	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.028.409	$ 141.200	CCF04	4 %	$ 2.028.409	$ 81.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 324.600	$ 0	$ 0	$ 81.200	$ 141.200	$ 81.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 628.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 98681775		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CHAVARRIA BUILES WILLIAN ALBEIRO	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30		F	$ 2.364.170	231001		16 %	$ 2.364.170	$ 378.300	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 2.364.170	$ 94.600	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.364.170	$ 164.600	CCF04	4 %	$ 2.364.170	$ 94.600	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 378.300	$ 0	$ 0	$ 94.600	$ 164.600	$ 94.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 732.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 01:39:57 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082471285

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-06-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1039597832		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GALEANO PARRA YEISON ALEJANDRO	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230201		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

ANEXO 7.

CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.609.537**

DIAZ MONTAÑEZ
APELLIDOS

SERGIO ANDRES
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-FEB-1986**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

01-MAR-2004 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2701900-00326728-M-1098609537-20110825 **00278**35625A 1 36171416

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

El suscrito, **SERGIO ANDRES DIAZ MONTAÑEZ,** identificado con **C.C. No. 1.098.609.537 de Bucaramanga** en mi condición de **CONTADOR PÚBLICO** de la **UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN** identificada con **NIT 901.979.396 - 1**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983) cuando a ello tuvo lugar, fueron* pagados por la compañía desde el periodo comprendido entre el **01 de Mayo de 2026 al 31 de Mayo de 2026** para la ejecución del **CONTRATO DE OBRA N° 4600105555 DE 2025, CUYO OBJETO ES REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN,** Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en **Medellín, Antioquia**, a los **Cinco (05)** días del mes de **Junio** de **2026**.

SERGIO ANDRES DIAZ MONTAÑEZ
C.C. 1.098.609.537 de Bucaramanga
Contador Público - T.P 187097-T
UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

Cordialmente,

JORGE TRUJILLO NIÑO
C.C 13.893.413 de Barrancabermeja
R/L. UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

85F0BC83F70EAB0A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SERGIO ANDRES DIAZ MONTAÑEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098609537 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 187097-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

187097-T

SERGIO AMORES
DIAZ MONTAÑEZ
C.C. 1098609537
RESOLUCION INSCRIPCION 110
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FECHA 26/02/2014

DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

198121



187681

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

ANEXO 8.

PAGO DE NOMINA.

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260501 - 20260530**
Comprobante Número:**214**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **Carlos Alberto Diaz Peña**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1017144470**
Cargo: **Residente Técnico**
Salario básico: **$7.300.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 7.300.000
Horas extras diurnas 125%			25.0	3	$ 124.432
Hora extra diurna dominical o festiva			105.0	24	$ 1.632.545
Bonificaciones ocasionales				0	$ 400.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 754.446
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 90.534
Provisión de Prima*				0	$ 754.446
Provisión de Vacaciones*				0	$ 304.410
				Total Ingresos	**$ 11.360.813**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 362.279
Fondo de pensión	4.00	$ 362.279
Fondo de solidaridad pensional	1.00	$ 90.570
Retefuente		$ 229.113
	Total Deducciones	**$ 1.044.241**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 10.316.572**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 10.316.572

Soporte de pago: DNE214
CUNE:
6a4b451928201c4ffa2d098d8bb49313f1ec454f160e1859bedb3d399abcf5d7575d1691aa3d20c2c9a2291518c835b1

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Período de Pago: **20260501 - 20260530**
Comprobante Número: **228**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **Jorge Luis Trujillo Vanegas**
Ciudad: **Barrancabermeja**
Identificación: **1098736267**
Cargo: **Coordinador de Proyectos**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.750.905
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.095
Provisión de Cesantías*				0	$ 166.600
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 19.992
Provisión de Prima*				0	$ 166.600
Provisión de Vacaciones*				0	$ 73.013
			Total Ingresos		**$ 2.426.205**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 70.036
Fondo de pensión	4.00	$ 70.036
	Total Deducciones	**$ 140.072**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) **$ 2.286.133**

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo $ 2.286.133

Jorge Luis Trujillo V
1098736267

Soporte de pago: DNE228
CUNE:
340c6a8d498e581e5f2e0cb1b4d2c09c3222eb60b8548a65be6298ed9998c80dca412c645cbb73e9a5e396488cdc22f7

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260501 - 20260530**
Comprobante Número:**235**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **Lina Maria Giraldo Botero**
Ciudad: **Medellin**
Identificación: **32220126**
Cargo: **Profesional SST**
Salario básico: **$5.255.000**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 5.255.000
Horas extras diurnas 125%			25.0	6	$ 179.148
Provisión de Cesantías*				0	$ 452.665
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 54.320
Provisión de Prima*				0	$ 452.665
Provisión de Vacaciones*				0	$ 219.134
				Total Ingresos	**$ 6.612.932**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 217.366
Fondo de pensión	4.00	$ 217.366
	Total Deducciones	**$ 434.732**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 6.178.200**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 6.178.200

Soporte de pago: DNE235
CUNE:
be6ac7b9399e7cac73b390cbacebbe8420c01328d1ad1d9501cae286c0306b42e987390f2fbe374f4758a96b62fe401c

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260501 - 20260530**
Comprobante Número:**236**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **Maria Victoria Durango Arenas**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **42683289**
Cargo: **Auxiliar de residencia**
Salario básico: **$5.255.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 5.255.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 437.742
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 52.529
Provisión de Prima*				0	$ 437.742
Provisión de Vacaciones*				0	$ 219.134
			Total Ingresos		**$ 6.402.147**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 210.200
Fondo de pensión	4.00	$ 210.200
	Total Deducciones	**$ 420.400**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 5.981.747**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 5.981.747


Soporte de pago: DNE236
CUNE:
a66fc4a47415a3ad54f8894acb1a2cf087ca2223ab9467bab5cdf0918b9b71c7796d1fa5bf15293f480b000e2242172c

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

Maria Victoria Durango
CC 42 683 289

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN



Periodo de Pago: **20260501 - 20260530**
Comprobante Número: **229**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **Miguel Angel Osorio Gomez**
Ciudad: **Bucaramanga**
Identificación: **1098752603**
Cargo: **Director de Obra**
Salario básico: **$1.750.905**

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.750.905
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.095
Provisión de Cesantías*				0	$ 166.600
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 19.992
Provisión de Prima*				0	$ 166.600
Provisión de Vacaciones*				0	$ 73.013
			Total Ingresos		**$ 2.426.205**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 70.036
Fondo de pensión	4.00	$ 70.036
	Total Deducciones	**$ 140.072**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) **$ 2.286.133**

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo $ 2.286.133

1098752603

Soporte de pago: DNE229
CUNE:
ed6d479682d85b2aaaaa120fffff0c1d6c2ec32fb894f24bf399d6836db7177907d92b143b134f212ae8bd5628fdb778

SOLUTRAFFIC INGENIERIA SAS NIT 900564496 - 4

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica N° CPE-649

Empleado	
Empleado: ANGIE TATIANA MORIANO POLINDARA	Tipo Contrato: Obra o Labor
Documento: NIT 1144190459	Sueldo: 4,400,000.00
Direccion: CO 76 76892 Cra 19b # 19c 68 apto 503 torre 22	Email: tatianamoriano830@gmail.com
Salario Integral: False	Alto Riesgo: False

Datos de Documento	Prefijo CPE	CUNE	a7118b922b800a5916157b8c83a3067d6f5310d7d82ed64e561eccaca2701b2bac35a4803265acc4c17629d52cd0c3c5

Fecha *Generación*	Fecha Liquidación *Inicio*	Fecha Liquidación *Fin*	*Fecha Ingreso*	*Fecha Retiro*	Tiempo *Laborado*	Periodo *Nomina*	***Devengados***	***Deducciones***	***Total Neto***
2026-06-01	2026-05-01	2026-05-31	2023-03-27		1145	Mensual	**5,349,507.00**	**352,000.00**	**4,997,507.06**

Pagos

Forma Pago	Metodo	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Fecha Pago
Contado	Consignación bancaria	005600078	AHORROS	51495784332	2026-06-01

Devengados

Datos Generales

Días trabajados	30.0
Sueldo trabajado	4,400,000.00

Transporte

Auxilio Transporte	0.00
Viatico/manu/aloj/salarial	0.00
Viatico/manu/aloj/ no salarial	0.00

Horas Extras Diarias

Cant.	0
%	0.00
Pago	0.00

Horas Extras Nocturnas

Cant.	0
%	0.00
Pago	0.00

Horas Recargo Nocturnas

Cant.	0
%	0.00
Pago	0.00

Horas Recargo Diarias Dominicales y Festivas

Cant.	0
%	0.00
Pago	0.00

Horas Extra Nocturnas Dominicales y Festivas

Cant.	0
%	0.00
Pago	0.00

Horas Recargo Nocturnas Dominicales y Festivas

Cant.	0
%	0.00
Pago	0.00

Horas Extra Diarias Dominicales y Festivas

Cant.	0
%	0.00
Pago	0.00

Vacaciones

Comunes Inicio/Fin	-
Comunes Cantidad	30
Comunes Pago	183,480.00
Compensadas Cantidad	0
Compensadas Pago	0.00

Primas

Cantidad	30
Pago	366,520.00
Pago No Salarial	0.00

Cesantias

Pago	366,520.00
%	8.33
Intereses	32,987.00

Otros

Dotación	0.00
Apoyo Sostenibilidad	0.00
Teletrabajo	0.00
Bonificación	0.00
Indemnización	0.00
Reintegro	0.00

Deducciones

Salud Deducción		176,000.00		Salud %		4.0	
Fondo Pension Deducción		176,000.00		Fondo Pension %		4.0	
Fondo Solidaridad Pensional Deducción		0.00		Fondo Solidaridad Pensional %		0.0	
Fondo Subsistencia Deducción		0.00		Fondo Subsistencia %		0.0	
Sindicatos Deducción		0.00		Sindicatos Porcentaje %		0.0	
Sancion Publica		0.00		Sanción Privada		0.00	
Libranzas Deducción		0.00		Libranzas Descripción		None	
Pago Tercero	0.00	Anticipo	0.0	Pension Voluntaria	0.00	Retencion Fuente	0.0
AFC	0.00	Cooperativa	0.0	Embargo Fiscal	0.00	Plan Complementario	0.0

Tatiana Moriano
1144190459

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260501 - 20260530**
Comprobante Número:**237**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **Aguedo Alcides Riasco Reyes**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **4852397**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.750.904
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Provisión de Cesantías*				0	$ 166.600
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 19.992
Provisión de Prima*				0	$ 166.600
Provisión de Vacaciones*				0	$ 73.013
				Total Ingresos	**$ 2.426.205**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 70.036
Fondo de pensión	4.00	$ 70.036
	Total Deducciones	**$ 140.072**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.286.133**

Observaciones:

Al Cel de Riasco
21 85239 1

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.286.133

Soporte de pago: DNE237
CUNE:
c5b9fbb982d44eeb91ddae2b9a1fd8964ddc55c037db471f2b7cbe6739b01cc2d29bf057662882e4074fc71621511037

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260501 - 20260530**
Comprobante Número:**216**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **Andres Ferley Bedoya Valencia**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1037368900**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				27	$ 1.575.814
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				27	$ 224.186
Provisión de Cesantías*				0	$ 149.940
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 17.993
Provisión de Prima*				0	$ 149.940
Provisión de Vacaciones*				0	$ 65.711
				Total Ingresos	**$ 2.183.584**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 63.033
Fondo de pensión	4.00	$ 63.033
	Total Deducciones	**$ 126.066**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
Licencia no remunerada	18/05/2026	20/05/2026	3

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.057.518**

Andres Bedoya
1037368900

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.057.518

Soporte de pago: DNE216
CUNE:
04b6befd859e171a38a4712c62d18ebd50d3a8eca74067bfcc6288b0e0394fd6b8090607a66246b66a1c03d686cc75c8

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260501 - 20260530**
Comprobante Número:**232**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **Anyelo Daniel Gomez Mejia**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1152187124**
Cargo: **Almacenista**
Salario básico: **$2.791.456**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 2.791.456
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Horas extras diurnas 125%			25.0	0	$ 7.930
Hora extra diurna dominical o festiva			105.0	13	$ 351.153
Provisión de Cesantías*				0	$ 283.190
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 33.983
Provisión de Prima*				0	$ 283.190
Provisión de Vacaciones*				0	$ 116.404
				Total Ingresos	**$ 4.116.402**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 126.022
Fondo de pensión	4.00	$ 126.022
	Total Deducciones	**$ 252.044**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 3.864.358**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 3.864.358

Soporte de pago: DNE232
CUNE:
bbace0afceec220d2103dbbbab1cee629f2074515e537a89439c97e035e70f9744c04258212e05f3a75d5536a1f438f2

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260501 - 20260530**
Comprobante Número:**226**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **Brayan Esmid Palacio Acevedo**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1096247535**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.750.904
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Provisión de Cesantías*				0	$ 166.600
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 19.992
Provisión de Prima*				0	$ 166.600
Provisión de Vacaciones*				0	$ 73.013
				Total Ingresos	**$ 2.426.205**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 70.036
Fondo de pensión	4.00	$ 70.036
	Total Deducciones	**$ 140.072**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.286.133**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.286.133

Bancam P
1096247535

Soporte de pago: DNE226
CUNE:
a99695dfede859fb28e88f4b6dfde89f832beb66fa5ea7eb529603028a7855fefc573ffef10c054a4c71af97179bdc7f

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260501 - 20260530**
Comprobante Número:**225**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **Carlos Andres Zuñiga Benavides**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1096247524**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				23	$ 1.342.360
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				23	$ 190.973
Incapacidad por enfermedad general al 100%	01/05/2026	06/05/2026		6	$ 350.181
Licencia remunerada	14/05/2026	14/05/2026		1	$ 58.364
Provisión de Cesantías*				0	$ 161.758
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 19.411
Provisión de Prima*				0	$ 161.758
Provisión de Vacaciones*				0	$ 73.013
			Total Ingresos		**$ 2.357.818**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 70.036
Fondo de pensión	4.00	$ 70.036
	Total Deducciones	**$ 140.072**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.217.746**

Carlos Zuñiga
1096247524

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.217.746

Soporte de pago: DNE225
CUNE:
0ebf913b095e8ec28dd2240f6302ff7fae8753cbb1f01f0c3397680037750b24fa2d25749f2222ba6df6211a0dd6520c

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260501 - 20260530**
Comprobante Número:**219**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **Carlos Mario Gonzalez Mora**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1049894058**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				28	$ 1.634.178
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				28	$ 232.489
Horas extras diurnas 125%			25.0	1	$ 9.948
Hora extra diurna dominical o festiva			105.0	16	$ 269.202
Incapacidad por enfermedad general al 100%	12/05/2026	13/05/2026		2	$ 116.727
Auxilio de baño				0	$ 100.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 188.470
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 22.616
Provisión de Prima*				0	$ 188.470
Provisión de Vacaciones*				0	$ 73.013
			Total Ingresos		**$ 2.835.113**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 81.202
Fondo de pensión	4.00	$ 81.202
	Total Deducciones	**$ 162.404**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.672.709**

Observaciones:

Carlos Gonzalez
1049894058

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.672.709

Soporte de pago: DNE219
CUNE:
27344121917e56b8dcf0848b60176bad1c76093caf8a1fceb9f32296c5138f1e8b04888ed0d5f459014df5d22d2f9732

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260501 - 20260530**
Comprobante Número:**231**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **Christian Barbosa Yepes**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1151966785**
Cargo: **Conductor - Aux. Mantenimiento**
Salario básico: **$2.312.200**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				27	$ 2.080.980
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				27	$ 224.185
Horas extras diurnas 125%			25.0	1	$ 19.707
Incapacidad por enfermedad general al 100%	14/05/2026	15/05/2026		2	$ 154.147
Licencia remunerada	27/05/2026	27/05/2026		1	$ 77.073
Auxilio de baño				0	$ 104.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 212.922
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 25.551
Provisión de Prima*				0	$ 212.922
Provisión de Vacaciones*				0	$ 96.419
			Total Ingresos		**$ 3.207.906**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 93.277
Fondo de pensión	4.00	$ 93.277
	Total Deducciones	**$ 186.554**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 3.021.352**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 3.021.352

Soporte de pago: DNE231
CUNE:
84bce9d47ef698508463a4d4dfb5e1b644c255000ce196b6600b03bdb87d1f84ab5ff3dedc2fb10786203fcf106b9397

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260501 - 20260530**
Comprobante Número:**223**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **Cristian Mena Cordoba**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1076817116**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				26	$ 1.517.452
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				26	$ 215.882
Horas extras diurnas 125%			25.0	5	$ 54.715
Auxilio de baño				0	$ 100.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 148.944
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 17.873
Provisión de Prima*				0	$ 148.944
Provisión de Vacaciones*				0	$ 63.278
				Total Ingresos	**$ 2.267.088**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 62.887
Fondo de pensión	4.00	$ 62.887
	Total Deducciones	**$ 125.774**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**
Licencia no remunerada	03/05/2026	04/05/2026	2
Licencia no remunerada	24/05/2026	25/05/2026	2

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.141.314**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.141.314

cristian Mena Cordoba

Soporte de pago: DNE223
CUNE:
f8580649d8bc15a95b414d5939843328cf21225e70a0971ba6a936c99fb780059229a051e1cbd0c0195fe31aa5360414

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260501 - 20260530**
Comprobante Número:**217**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **Edwin David Santos Hernández**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1038810427**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$2.300.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 2.300.000
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Horas extras diurnas 125%			25.0	2	$ 26.136
Hora extra diurna dominical o festiva			105.0	9	$ 203.602
Auxilio de baño				0	$ 112.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 231.477
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 27.777
Provisión de Prima*				0	$ 231.477
Provisión de Vacaciones*				0	$ 95.910
			Total Ingresos		**$ 3.477.475**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 101.190
Fondo de pensión	4.00	$ 101.190
	Total Deducciones	**$ 202.380**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 3.275.095**

Observaciones: Edwin Santos

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 3.275.095

Soporte de pago: DNE217
CUNE:
fa2ab2dabee747d04213ae1746bfd320db5741cf14dbd2410c7697ba4454b85d33b41bc42d49fa4feadbb8be6a8d950e

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260501 - 20260530**
Comprobante Número:**234**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **Franklin Barbosa Palomino**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **16791906**
Cargo: **Conductor - Aux. Mantenimiento**
Salario básico: **$2.312.200**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				29	$ 2.235.127
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				29	$ 240.792
Horas extras diurnas 125%			25.0	15	$ 197.063
Hora extra diurna dominical o festiva			105.0	30	$ 657.138
Licencia remunerada	26/05/2026	26/05/2026		1	$ 77.073
Auxilio de baño				0	$ 112.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 283.819
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 34.058
Provisión de Prima*				0	$ 283.819
Provisión de Vacaciones*				0	$ 96.419
			Total Ingresos		**$ 4.217.308**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 126.656
Fondo de pensión	4.00	$ 126.656
	Total Deducciones	**$ 253.312**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 3.963.996**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 3.963.996

Soporte de pago: DNE234
CUNE:
88d1f2cf4206bd2de42386d872f2f52ee2b2b73baf82c6420144b1b450b8c246c0c631984fa52e5ca2632b11586739e2

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260501 - 20260530**
Comprobante Número:**224**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **Jaime Stiven Palacio Acevedo**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1096218904**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.750.904
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Provisión de Cesantías*				0	$ 166.600
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 19.992
Provisión de Prima*				0	$ 166.600
Provisión de Vacaciones*				0	$ 73.013
				Total Ingresos	**$ 2.426.205**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 70.036
Fondo de pensión	4.00	$ 70.036
	Total Deducciones	**$ 140.072**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.286.133**

Observaciones:

Stiven P
1096218904

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.286.133

Soporte de pago: DNE224
CUNE:
ace8278c9f4e2de4e9a75b5d3899c7fe093247b9598d6ce9d46136abd305af8e0e2ea7ac2cf3753e431321a51eea7d26

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260501 - 20260530**
Comprobante Número:**233**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **Gina Paola Martinez Velasquez**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1214743297**
Cargo: **Auxiliar Administrativo**
Salario básico: **$2.000.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				28	$ 1.866.667
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				28	$ 232.489
Incapacidad por enfermedad general al 100%	05/05/2026	06/05/2026		2	$ 133.333
Provisión de Cesantías*				0	$ 190.362
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 22.843
Provisión de Prima*				0	$ 190.362
Provisión de Vacaciones*				0	$ 83.400
Hora dominical o festiva nocturna				2	$ 52.773
			Total Ingresos		**$ 2.772.229**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 82.115
Fondo de pensión	4.00	$ 82.115
	Total Deducciones	**$ 164.230**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.607.999**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.607.999

Gina Martinez
1.214.743.297

Soporte de pago: DNE233
CUNE:
d99de73d8e45d6b939a9d9505f617743547eb8699f860c08cdcd89d51787a399a6941d0cc24339e8fa6f12af6ccdb05a

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260501 - 20260530**
Comprobante Número:**220**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **Jenifer del Carmen Altamiranda Diaz**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1052982270**
Cargo: **Tecnóloga Ambiental**
Salario básico: **$2.522.400**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				24	$ 2.017.920
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				24	$ 199.276
Licencia por luto	14/05/2026	15/05/2026		2	$ 168.160
Licencia por luto	18/05/2026	21/05/2026		4	$ 336.320
Provisión de Cesantías*				0	$ 226.716
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 27.206
Provisión de Prima*				0	$ 226.716
Provisión de Vacaciones*				0	$ 105.184
			Total Ingresos		**$ 3.307.498**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 100.896
Fondo de pensión	4.00	$ 100.896
	Total Deducciones	**$ 201.792**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 3.105.706**

Observaciones:

Condiciones de pago: Trámite simple (Recarga o envío) $ 3.105.706

Soporte de pago: DNE220
CUNE:
8ed81d76eb80ca545c80a7342a7f8f36ad727ac520dc514e9f775dc2dca5972f827591c87adaf2be3931e992d219fb65

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

Jenifer Altamiranda Diaz
CC: 1052982270

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260501 - 20260530**
Comprobante Número:**230**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **José Alcibíades Andrade Garcia**
Ciudad: **Colombia**
Identificación: **11222857**
Cargo: **Maestro de Obra**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.750.904
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Horas extras diurnas 125%			25.0	6	$ 64.664
Hora extra diurna dominical o festiva			105.0	8	$ 130.522
Auxilio de baño				0	$ 116.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 182.859
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 21.943
Provisión de Prima*				0	$ 182.859
Provisión de Vacaciones*				0	$ 73.013
			Total Ingresos		**$ 2.771.860**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 77.844
Fondo de pensión	4.00	$ 77.844
	Total Deducciones	**$ 155.688**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.616.172**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.616.172

Soporte de pago: DNE230
CUNE:
f25b2886cfbb9e0ba38b04e67b917ccca124513255bb469c9b4605c3b6380947dd26e9feddcbef5fd0af8bf207fe1526

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260501 - 20260530**
Comprobante Número:**213**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **Juan José Roa Silva**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1000537976**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$2.100.000**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 2.100.000
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Horas extras diurnas 125%			25.0	1	$ 11.932
Hora extra diurna dominical o festiva			105.0	9	$ 185.898
Auxilio de baño				0	$ 112.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 212.159
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 25.459
Provisión de Prima*				0	$ 212.159
Provisión de Vacaciones*				0	$ 87.570
				Total Ingresos	**$ 3.196.273**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 91.913
Fondo de pensión	4.00	$ 91.913
	Total Deducciones	**$ 183.826**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 3.012.447**

Observaciones:

Juan José Roa Silva
CC 1000537976

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 3.012.447

Soporte de pago: DNE213
CUNE:
cd3c3a044d33f19d9d4b2f6ca651487abdf267476386d2f7c984cbea30258050444d70eac420729366e227e43c6c3e6b

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260501 - 20260530**
Comprobante Número:**215**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **Laura Marcela Padilla Giraldo**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1017221580**
Cargo: **Auxiliar Operativa**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.750.904
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Auxilio de baño				0	$ 108.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 166.600
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 19.992
Provisión de Prima*				0	$ 166.600
Provisión de Vacaciones*				0	$ 73.013
				Total Ingresos	**$ 2.534.205**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 70.036
Fondo de pensión	4.00	$ 70.036
	Total Deducciones	**$ 140.072**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.394.133**

Observaciones:

Condiciones de pago: Trámite simple (Recarga o envío) $ 2.394.133

LauraMPG

Soporte de pago: DNE215
CUNE:
52604b1e9c3229fa0402653e912b5589a8d7e78d0c3faa1489db36e5faa7209a8fe6548063afb1ea3a5310d737402c46

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260501 - 20260530**
Comprobante Número:**238**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **LUIS DANOVER LOZANO ROJAS**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **91452201**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$2.300.000**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				28	$ 2.146.667
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				28	$ 232.489
Horas extras diurnas 125%			25.0	4	$ 58.807
Incapacidad por enfermedad general al 100%	14/05/2026	15/05/2026		2	$ 153.333
Auxilio de baño				0	$ 100.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 215.855
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 25.903
Provisión de Prima*				0	$ 215.855
Provisión de Vacaciones*				0	$ 95.910
			Total Ingresos		**$ 3.244.819**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 94.352
Fondo de pensión	4.00	$ 94.352
	Total Deducciones	**$ 188.704**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 3.056.115**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 3.056.115

Soporte de pago: DNE238
CUNE:
413e3ad126517d0c471d41c85fa43f8bb16871311c966c40af8ecb128777606bf62f850f4a658cb9098654b83f63329e

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260516 - 20260530**
Comprobante Número:**222**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **Moises Jesús Florez Acero**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1069484054**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				9	$ 525.272
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				9	$ 74.728
Provisión de Cesantías*				0	$ 49.980
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 5.998
Provisión de Prima*				0	$ 49.980
Provisión de Vacaciones*				0	$ 21.904
			Total Ingresos		**$ 727.862**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 21.011
Fondo de pensión	4.00	$ 21.011
	Total Deducciones	**$ 42.022**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 685.840**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 685.840

1069484054

Soporte de pago: DNE222
CUNE:
79032da09d16b75ededfd15b4d9c59f6f03e4692cd73f4d4ee1e7c4c75911346dc491d7242250e5fdf5bc359ac7cbcef

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260501 - 20260530**
Comprobante Número:**227**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **Oscar Raul Caro Trujillo**
Ciudad: **Piedecuesta**
Identificación: **1098701110**
Cargo: **Administrador**
Salario básico: **$3.153.000**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 3.153.000
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Horas extras diurnas 125%			25.0	9	$ 161.233
Hora extra diurna dominical o festiva			105.0	3	$ 88.141
Provisión de Cesantías*				0	$ 304.167
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 36.500
Provisión de Prima*				0	$ 304.167
Provisión de Vacaciones*				0	$ 131.480
				Total Ingresos	**$ 4.427.784**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 136.095
Fondo de pensión	4.00	$ 136.095
	Total Deducciones	**$ 272.190**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 4.155.594**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 4.155.594

1098701110

Soporte de pago: DNE227
CUNE:
1ffbfa5d88ee4978b1fad129980b3ca349425bbea045be12f1bddfe27419ca91b74d2f1ce4c15a036c0e78a27ef25367

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260501 - 20260530**
Comprobante Número:**221**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **Simeon Fernando Vivas Mandon**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1065913019**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$2.000.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 2.000.000
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Horas extras diurnas 125%			25.0	2	$ 28.409
Auxilio de baño				0	$ 112.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 189.716
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 22.766
Provisión de Prima*				0	$ 189.716
Provisión de Vacaciones*				0	$ 83.400
				Total Ingresos	**$ 2.875.103**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 81.136
Fondo de pensión	4.00	$ 81.136
	Total Deducciones	**$ 162.272**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.712.831**

Observaciones:

Fernando Vivas

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.712.831

Soporte de pago: DNE221
CUNE:
6c963a6b46f1a23ae1447f96dcb876f5deb482339f6071bd61137e21bd786ddaa692a787b7a794c32343463b182540cb

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260501 - 20260530**
Comprobante Número:**239**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **William Albeiro Chavarria Builes**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **98681775**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$2.100.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 2.100.000
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Hora extra diurna dominical o festiva			105.0	13	$ 264.170
Auxilio de baño				0	$ 108.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 217.685
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 26.122
Provisión de Prima*				0	$ 217.685
Provisión de Vacaciones*				0	$ 87.570
				Total Ingresos	**$ 3.270.328**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 94.567
Fondo de pensión	4.00	$ 94.567
	Total Deducciones	**$ 189.134**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 3.081.194**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 3.081.194

Soporte de pago: DNE239
CUNE:
b7e6129bb732c8c32bcc392c4e7e38233db39ca279811e14995d386820e92b5c34b4facb9709ba864551e9016743ce5c

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260501 - 20260530**
Comprobante Número:**218**
Fecha y hora de generación: **01/06/2026 - 07:31 AM**
Fecha y hora de expedición: **01/06/2026 - 07:31 AM**

Empleado: **Yeison Alejandro Galeano Parra**
Ciudad: **Bello**
Identificación: **1039597832**
Cargo: **Oficial**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.750.904
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Auxilio de baño				0	$ 108.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 166.600
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 19.992
Provisión de Prima*				0	$ 166.600
Provisión de Vacaciones*				0	$ 73.013
				Total Ingresos	**$ 2.534.205**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 70.036
Fondo de pensión	4.00	$ 70.036
	Total Deducciones	**$ 140.072**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.394.133**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.394.133

1039597832
Yeison Galeano

Soporte de pago: DNE218
CUNE:
95bff3843511839a35ed1ec19545618249707bd73a31e5c3b980d182ea6b1a0ec69c5efed2583177af1318146f0b4419

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

ANEXO 9.

PAGO A PROVEEDORES

Número del registro
1

Fecha de aplicación
09 Jun 2026

Nombre del destinatario
Indumecanizados In

Identificación destinatario
901197070

Producto destino
609 - 971439 - 68

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.187.025,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 10.

SUMINISTROS DE MAYO

1 Versión 1 septiembre 2025	CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CONTRATO Nº 46001055 de 2025 DE MOVILIDAD	SECRETARIA	FORMATO SUMINISTRO DE MATERIALES

Contrato para la Ampliación, Reposición y Mantenimiento de la red de semáforos

MATERIAL	Pedido	Entrega	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA	DIRECCION/ENTREGA	NUMERO SERIAL
Suministro de gabinete para controlador local, en lámina calibre 16. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte gris mate. El gabinete debe incluir dos chapas adicionales para seguridad en la puerta con llave maestra.	X		und	25	12/06/2026		
Suministro de gabinete para controlador local, en lámina calibre 16. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte gris mate. El gabinete debe incluir dos chapas adicionales para seguridad en la puerta con llave maestra.		X	und	25	12/06/2026	CIOS	

CONTRATISTA

IINTERVENTORÍA

Mario A. Ruiz L.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Solicitud de Elementos de Amoblamiento de la red de semaforos
Contrato No. 4600105555 de 2025

Objeto:
Ampliación, Reposición Y Mantenimiento de La Red de Semáforos

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DE: SECRETARIA DE MOVILIDAD

PARA: UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

12 de JUNIO de 2026			
Descripción	**Medida**	**Cant.**	**Fecha**
Suministros			
Suministro de gabinete para controlador local, en lámina calibre 16. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte gris mate. El gabinete debe incluir dos chapas adicionales para seguridad en la puerta con llave maestra.	und	25	12/06/2026

Mario A. Ruiz L.

Supervisor
SMM

Contratista

Interventoría

ANEXO 11.

REINTEGRO DE MAYO

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	PLAN DE CALIDAD	
		VERSIÓN 1
	REINTEGRO DE ELEMENTOS	1/09/2025
NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ", SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
NÚMERO DEL CONTRATO	4600105555 de 2025	(UNION TEMPORAL SIT)

Entregado por: ANYELO GOMEZ M. | **Recibido por: FRANK GARCIA**

FECHA	ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
7/5/2026	CABLE ENCAUCHETADO 4X16 / 4X18	1714	SINIESTROS
7/5/2026	HERRAJES DE 50X50 CON TAPA CONCRETO	12	SINIESTROS
7/5/2026	MARCOS SIN TAPA DE 50X50	6	SINIESTROS
7/5/2026	HERRAJES DE 60X60 CON TAPA ESPECIAL	1	SINIESTROS
7/5/2026	PLACAS DE CONTRASTE	86	SINIESTROS
7/5/2026	PULSADORES TOUCHLESS	27	SINIESTROS
7/5/2026	POSTE DE MENSULA	7	SINIESTROS
7/5/2026	POSTE DE ENTERRAMIENTO	3	SINIESTROS
7/5/2026	SEÑAL DE MOTOS	2	SINIESTROS
7/5/2026	RACKS DE CONTROLADORES EC-1Y2	3	BUENOS
7/5/2026	CABLE TELEFONICO 10-20 O MAS PARES	12	SINIESTROS
7/5/2026	CABLE UTP	85	SINIESTROS
7/5/2026	DISCOS DIRECCIONAL	7	SINIESTROS
7/5/2026	GABINETES DE CONTROL	4	SINIESTROS
**	***	**	******
**	***	**	******
**	***	**	******
**	***	**	******
**	***	**	******
**	***	**	******
**	***	**	******
**	***	**	******
**	***	**	******
**	***	**	******

VERIFICACION

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:		*FIRMA PERSONA QUE RECIBE*	
nombre	ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA	nombre	FRANK GARCIA
cargo	ALMACENISTA	cargo	CIOS

	PLAN DE CALIDAD	
		VERSIÓN 1
	REINTEGRO DE ELEMENTOS	1/09/2025
NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600135555 de 2025	(UNION TEMPORAL SIT)

Entregado por: ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA **Recibido por:** FRANK GARCIA

FECHA	ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
21/5/2026	GABINETES DE CONTROL - MAESTRO	1	SINIESTROS
21/5/2026	POSTE DE ENTERRAMIENTO	2	SINIESTROS
21/5/2026	POSTE DE MENSULA	4	SINIESTROS
21/5/2026	POSTE RECTO DE PLATINA	1	SINIESTROS
21/5/2026	HERRAJES 50X50 CON TAPA CONCRETO	10	SINIESTROS
21/5/2026	HERRAJES 50X50 CON TAPA POLIPROPILENO	5	SINIESTROS
21/5/2026	MARCOS 50X50 SIN TAPA	14	SINIESTROS
21/5/2026	CABLE ENCAUCHETADO 4X16-4X18	717	SINIESTROS
21/5/2026	CARCAZA DE SEMAFORO VEHICULAR	12	SINIESTROS
21/5/2026	CARCAZA DE SEMAFORO PEATONAL	4	SINIESTROS
21/5/2026	PLACAS DE CONTRASTE	18	SINIESTROS
21/5/2026	FLAUTAS METALICAS	10	SINIESTROS
21/5/2026	ARAÑAS METALICAS	4	SINIESTROS

VERIFICACIÓN

	FIRMA PERSONA QUE ENTREGA		FIRMA PERSONA QUE RECIBE
nombre	ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA	nombre	FRANK GARCIA
cargo	ALMACENISTA	cargo	CIOS

ANEXO 12.

PLANILLAS

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · Unión Temporal SIT Medellín · Consorcio Int Farol Med 2025 · RMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	03 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Bolsosa	16791906			Jose Cortes	1098727131
Jose Andrade	11 222857				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr53 Cl30A			Costado en cota del Grupo 3			261
			Se corrige cota en 0051c recto			
			Se realizan dos Empalmes en semaforos			94
			Vehicular y del Grupo 3			

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INT PAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	04-05-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	LUNES		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038810427			Jose cortes	1098727737
Juan Ron				Alvaro londoño	71775791

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ cra 25 x cll 10 AV superior			revicion de pulsadores de boton y cambio de cable de potencia PB3 y PB7.	9:00Am		
	S-W	W-E	Retiro de 30mts de cable 4x16 PB3 del poste al controlador			173
	S-W	N-S	retiro de 34mts de cable 4x16 PB7 del poste al controlador incluyendo el repetidor.			173
			suministro instalacion de 41mts de cable 4x18 nuevos PB3			215
			suministro instalacion de 46mts de cable 4x18 nuevos PB7 incluyendo el repetido.			215
			retiro de 3 pulsadores de boton a poste			177
			Reinstalacion de 3 pulsadores de boton a poste			214
			construccion de 3 empalmes en los pulsadores			94
	separador central	W-E	retiro de 7 pulsador de boton en mal estado a poste			177
			instalacion de 7 pulsador de boton de segunda a poste		3:00pm	214
			construccion de 7 empalmes en el pulsador			94
			nota: queda pendiente cambiar borneras o soldar las tapas			

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta Menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD**	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	04 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	lunes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Frantelin Barbosa	16791906			Jose cortes	1098727131
Jose Andrade	11 222 857			Alvaro Londoño	71775731
luis lozano	91452201				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ Cr66B Cll 33			Siniestro vial en dos Postes RETO, (1 hostado)	07:00		
			Semaforos 2 peatonales y dos Vehiculares. (cableado hurtado)			
			Retiro de Postereto en mal estado.			168 ✓
			Canalizacion para poste 1:50 retro			
			Reconstrucion de herraje			
			Suministro instalacion de Poste RETO (nuevo)			206 ✓
			Suministro instalacion de Disco Direccion al nuevo ↑			83 ✓
			Instalacion de 2 Semaforos Peatonales de Segunda			208 ✓
			Instalacion de 2 Semaforos Vehiculares de Segunda			208 ✓
			Instalacion de 40 metros de cableado nuevo 4x18			215 ✓
			construccion de 6 empulmes.			94 ✓
			Arreglo de Ureras de Semaforo Vehicular			260 ✓
					5 pm	

EQUIPO EN OBRA:

Planta electrica, Martillo demoledor, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INT FAROL MED 2025 RHY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	01 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	lunes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime cortes	71480 679			Jose Cortes	1098727131
Alberto ogueda	15485 477				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ cra 54-85 x 53	or	N-S	SE RECUSO cable del Grupo 9 en corto. demolicion	8 AM	12 PM	
			Y limpieza de una caja 50x50 concentrada			1-54
			instalacion de 5 mts de cable de control 4x18 nuevo			215
			concentrada de 1 caja 50x50. SE HicieRON 2			263
			empalmes electricos SE PUSO en Funcionamiento			94
			el Grupo. peatonal			
✓ cra 51 x 56			SE HiSO visita para revisar Grupo 1 en corto	1 PM	3 PM	
			los Herrajes NO abrieron los tornillos estan			261
			oxidados cambiar 2 Herrajes 50x50 para			
			poder cambiar el cableado			
✓ cra 52 x 82			SE HiSO visita para cambiar reparar Cable	4 PM	15 PM	
			Grupo 7 en corto canalizacion esmuida			261
			y tornillos oxidados cambiar 1 Herraje 60x60			

EQUIPO EN OBRA:
Martillo demoledor, Planta electrica herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Sondeo oli os 2026 cra 52 x 82

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	04/05/2026	TIEMPO	SECO	✓	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Lunes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Luis Fernando G. M	7.070.804.034			Jose Cortes	1098127131
Juan Camilo Restre	772 954 92			Wilmer Bonilla	4306855
Jorge Luis Rodriguez	PPT 7137342			Cindy Morales	1017750777
				Alvaro Londoño	71775731

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR52 C125	SP	N S	Retiro de 3 hurgos de 50 X 50 contapa de concreto	9 33		187
			Retiro de un hurgo de 50X50 contapa de Plastico.			187
			Se hace Sondeo de tuberia y Cableado. en Cajas de Semaforos			
			Instalacion de 4 hurgos nuevos metalicos de Seguridad. Apolo.		4 05	13

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

Se solicita colocar las vanillas para cerrar los tapas. Se toman conductos inmediatamente sin unidades sanitarias

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Olemy Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEPAROL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	4 Mayo 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	lunes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Yan Carlos Vega	1.214.729.941			Jose Cortes	1098727131
Jose Perez	PPT 5.240.599				
Yelson Canas	1.035.861.703				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 55	E	S-N	Limpieza de caja de inspeccion de 50x50	10:00		54
Ente calles 30A y 30A			Suministro e instalacion de U en varilla de media de 35cm 4 unidades. (la caja de inspeccion no tenia ni herraje ni tapa)			
			Suministro e instalacion de herraje de seguridad 50x50			13
	N	E-W	Limpieza de caja de inspeccion de 50x50			54
			Suministro e instalacion de U en varilla de media de 35cm 4 unidades (la caja de inspeccion no tenia ni herraje ni tapa)			
			Suministro e instalacion de herraje seguridad 50x50			13
	Separador central	E-W	Demolicion de tapa de caja de inspeccion de 50x50x35 cm			1
			Limpieza de caja de inspeccion de 50x50			54
			Suministro e instalacion de herraje de seguridad 50x50			13
			Soldadura de tapa de caja de inspeccion (Baul)		15:50	262
Calle 30A entre Carreras 53 y 55	S	W-E	Concretada de tapa de caja de inspeccion de 60x60.	16:00	16:30	263

EQUIPO EN OBRA:

Planta electrica, Martillo demoledor, Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN · CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 · RAY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 05-05-2026 DIA: MARTES VEHÍCULOS: TSG 405	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	SI	UNIFORMES	CUMPLE SI NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038810427			Jose Cortes	1098727131
Juan ROA					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Bodega del estudio			retiro de 1 gavinete con tablero maestro	8:00Am		165
			retiro de 1 caja metalica			
			retiro de 4 bateria			
			retiro de 1 caja de fuentes con tarjetas		12:00pm	
			retiro de 2 lamines de 2 mts			
CRA 77 x Cll 30	S-W	W-E	orientacion de 1 semaforo vehicular a poste	2:00Pm	2:20pm	258

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTFAROL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	5 5 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	martes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa	16791906			Jose cortes	1098727131
Jose Andrade					
Cristian mena					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ Cr47 Cll54	W	NS	Retiro de Poste recto	07		168
			Retiro de Semaforo Peatonal y Vehicular			172
			Retiro de 8 metros de cableado 4x18 (se deja en caja)			173
			Instalacion de Anclaje con ducteria correspondiente			97
			a caja de Paso. y Suministro.		5 30 pm	
			Tuberia 1 metro			

EQUIPO EN OBRA:

Martillo demoledor, Planta electrica, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNIÓN TEMPORAL EMI MEDELLÍN · CONSORCIO INT FAROL MED 2025 · PAV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 5/5/25	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA: Martes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS: DXT928		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Christian Barbosa Yepes	1.151.966.785			Jose cortes	1098727131
Simeon Vivas	1.065.917.019			Jonathan Reeden	1036962270
Luis Lozano	91.452.901			Queny Patricia	43068550

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ Tv inf x Cl 12	N	WE	Se realiza perforacion con copa ciclica Se instala corriza 1 metro con accesorios Se realiza empalme a Radar de deteccion			94 ✓
✓ Tv inf x Cl 10	W	NS	Se realiza perforacion con copa ciclica Se instala 1 metro de corriza con accesorios Se realiza empalme a Radar de deteccion			94 ✓
✓ Tv inf x Cl 7	N	EW	Se realiza perforacion con copa ciclica Se instala corriza 1 metro con accesorios Se realiza empalme a Radar de deteccion			94 ✓
✓ Tv sup x Cl 5			Se realiza perforacion con copa ciclica Se instala corriza 1 metro con accesorios Se realiza empalme a Radar de deteccion			94 ✓
✓ Tv sup x Cl 10			Se realiza perforacion con copa ciclica Se instala corriza 1 metro con accesorios Se realiza empalme a Radar de deteccion			94 ✓

EQUIPO EN OBRA: Planta electrica, taladro, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN · CONSORCIO INT FAROL MED 2025 · PDV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 05-05-2026 DIA: Martes – Lunes VEHÍCULOS:	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	X	UNIFORMES	CUMPLE SI NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI / NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Nilson Chavarria	98(e) 77J			Jose Cortes	1098727131
Laura marcela Giraldo	1017[illegible]580			Yeison Angel Ramos Valencia	43068 55 77 225 231

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cll 50	N W	E-W	pintura de pasa recto sin resquitiar	7:10		225
Calle 52	S W	E-W	pintura de pasa recto sin resquitiar			225
	S W	S N	pintura de pasa recto sin resquitiar			225
	S E	S N	pintura de pasa recto sin resquitiar			225
	S E	E-W	pintura de pasa recto sin resquitiar			225
	N E	S N	pintura de pasa recto sin resquitiar		4:30	225

EQUIPO EN OBRA:

Brocha, tapa bocas

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	05.05.2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71.180.675			Jose Cortes	1098727131
Alberto Oquendo	15.405.477				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 51 X 56	OS	OR.OC	SE REVISO cable del Grupo 1 en corto	8. AM	4. PM	
			demolicion y retiro de 2 Herrajes 50X50 metalicos			187
			instalacion de 2 Herrajes metalicos nuevos 50X50			13
			instalacion de 35 mts de cable de control 4X18			215
			nuevo. SE HICIERON 2 empalmes electricos			94
			limpieza de dos cajas.			54
			Suministro instalacion de 8 anclajes en N vizora			
			asegurar Herrajes en barilla de 3/8			

EQUIPO EN OBRA:
Planta electrica, Martillo demoledor, herramienta menor, pulidora

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

1|2

Alcaldía de Medellín / Unión Temporal EIT Medellín / Consorcio Int Farol Med 2025 / RAV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 06-04-2026 DIA: LUNES VEHÍCULOS:	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	SI	UNIFORMES	CUMPLE SI ✓ NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI ✓ NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038910427			Jose Cortes	1098727137
Simeon Vivas				Alvaro Leiva	71275431

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cxv 76 x cll 60	separador central	E-W W-E	revicion de pulsador digital con falla en poste retiro de 1 pulsador digital a poste retiro de 1 pulsador digital a poste retiro de 27 mts de cable 4x18 del poste al controlador incluye el repetidor. suministro instalacion de 31 mts de cable 4x18 nuevos del poste al controlador incluye repetidor reinstalacion de 1 pulsador digital a poste reinstalacion de 1 pulsador digital a poste construccion de 2 empalmes en el pulsador	8:20 AM		177 177 173 215 214 214 94
A.V 80 x cll 77B	separador	N-S	retiro de 1 garrucha nueva para reinstalar en la cxv 70 por cll 16	9:46 AM	9:30 AM	—
cxv 70 x cll 16	S-W	N-S	reinstalacion de 1 garrucha nueva que se retiro en la A.V 80 por cll 77B		11:00 AM	216
Acta mayo No se había elaborado						

EQUIPO EN OBRA:

Pesca, herramienta Menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA		FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría	

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 / RAY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	06 - 05 - 2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIERCOLES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	TSG 405		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038810427			Jose Cortes	1098727131
Juan Roa					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ cra 65 x cll 59A	N-E	S-N	cambio de pulsador de boton bandalizado a poste	9:00Am		
			retiro de 1 pulsador de boton a poste para reintegro			177
			Istalación de 1 pulsador de boton de segunda a poste		9:30Am	214
✓ cra 48 x cll 25 paso peatonal Bancolombia			cambio de pulsadores touchless a poste	11:20Am		
	S-W	N-S	retiro de 1 base de pulsador touchless bandalizado			177
			perforación en poste con taladro, broca, cerra y machuchos			
			suministro istalación de 3 mts de cable 4x18 nuevos del pulsador al semaforo peatonal.			215
			Istalacion de 1 pulsador toten de segunda a poste			214
			construccion de 1 empalme electrico a poste			94
			construccion de 2 empalmes electricos en el pulsador			94
	S-E	S-N	retiro de 1 pulsador touchless a poste			177
			perforacion en poste con taladro, broca de lamina y machuelos			
			suministro istalacion de 15 mts de cable 4x18 nuevos al peatonal			215
			Istalacion de 1 pulsador toten de segunda a poste			214
			construccion de 1 empalme electrico a poste			94
			construccion de 2 empalmes electricos en el pulsador a poste		3:00Pm	94

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERVENTORIA MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	06 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa	16791906			Jose Cortes	1098727131
Luis Lozano					
Jose Andrade					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ Cr 73 CQ 4	N	EW	Instalacion de Gabinete nuevo	07 am		216
✓ Cr 70 CQ 1	Separador	SN	Instalacion de Gabinete nuevo			216
✓ Cr 76 Cll 28	N	WE	Instalacion de Gabinete nuevo			216
✓ Cr 43 C66F	W	NS	Instalacion de Gabinete nuevo			216
✓ Cr 76 Cll 25	separador	NS	Instalacion de Gabinete nuevo			216
✓ Cr 76 Cll 16	E	SN	Instalacion de Gabinete nuevo		05pm	216
			Nota: Cada Gabinete fue instalado con su respectiva Tornilleria			

EQUIPO EN OBRA:

taladro, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN · CONSORCIO INT FAROL MED 2025 · ROAY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	6/5/2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	DX7978		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Christian Barbosa				Jose cortes	1098727131
Simeon Arias					
Cristian Mona					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 65 x Cl 81	Separados	NS	Se realiza perforacion con copa corta			
			Se instala 1 metro de cerca con accesorios			
			Se realiza empalme a radar de deteccion			94 -
			Se realiza acompañamiento a grupo tecnico para conectar equipo			
			controlador y conectar el cruce de la Cr 65 x Cl 81 al			
			equipo de la Cr 65 con Cl 81C se realizan 2 empalmes			94 -
			y realizan la desconeccion de equipo de la Cr 65 por Cl 80			
Cr 70 x Cl 104	E	SN	Se realiza perforacion con copa corta			
			Se instala 1 metro de cerca con accesorios			
			Se realiza empalme a radar de deteccion			94 -

EQUIPO EN OBRA:

taladro, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / RAV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	07 - 05 - 2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	TSG 405		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin santos	1038910427			Jose cortes	1098727131
Juan ROA					
Laura					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ cra45 x cll29			cambio de disco direccional por cambio de sentido en lavia	8:30 pm		
	N-E	E-W	retiro de 1 disco direccional # a poste			179
			retiro de 1 señal informativa de prohibido giro derecha			179
			suministro instalación de 1 disco direccional # nuevo a poste		9:00 pm	83
✓ cra64 x cll67			istalacion de pulsador, demolición de tapa y cambio de peatonal	9:30 am		
	N-E	S-N	demolicion de tapa concretada de 50x50			1
			perforacion en poste con taladro, broca ciocha, y manchurlos			
			reestalacion de 6 mts de cable 4x16 que se encontraba en la caja			215
			istalacion de 1 pulsador de boton de segunda a poste			214
			concretada de tapa de 50x50			263
	S-W	N-S	retiro de 1 semaforo peatonal partido a poste			172
			istalacion de 1 semaforo peatonal de segunda a poste			208
			construccion de 1 empalme electrico a poste		3:30 pm	94

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTEAROL MED 2025 · UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN · ROY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	07/05/26	TIEMPO	SECO	x	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Sabado		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Gonzalez	1049894058			Jose Cortes	1098727137
Yeison Galeano	1039897835			Queny Barrell	43068957
Luis Lopez	97452201			Alvaro Cortes	71.775.719

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 47	N-O	N-S	Instalacion de semaforo de piso	08:00		212
C 11 54			Serial: 20250780 stiker 0858			
			Instalacion de Fuente electrica			
			Serial: 20250770 stiker 0325			
			Suministro e instalacion de 50 cm			
			de Coraza Flexible			
			Suministro e instalacion de 2 mts			215
			de cable 4X18			
			Construccion de 2 empalmes.			94
	N-W	N-S	Instalacion de semaforo de piso			212
			serial: 20250070 stiker: 0856			
			Instalacion de Fuente electrica			
			Serial: 20250768 stiker: 0324			
			Suministro e instalacion de 2mts de coraza			
			Suministro e instalacion de 3 mts de cable			215
			Se realiza canalizacion de 2 mts en Cond Dura		16:00	
			Construccion de 3 empalmes			94

EQUIPO EN OBRA:
Pulidora, Planta electrica, Martillo demoledor, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTEGRAL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	07. 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI	✓		SI	✓		SI	✓
VEHÍCULOS:	ESO 669 JMC		DURACIÓN			NO			NO			NO	

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71.680.675			Jose cortes	1098727731
Leon Agudelo	15.485.497			Eliel David	4306857
Jose Perez	PPT 5.240.599			Nombre	37.725.721

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ cra 52 x 29A	Separado	N-S	demolicion y limpieza de 2 cajas 50x50			1
			concretadas			54
			instalacion de 2 Herrajes 50x50			13
			nuevos metalicos Apolo			
			se hizo y sondeo de canalizaciones			237
			para instalar cable de fibra			
			toca canalizar en zo verde y en			
			via			
			Suministro e Instalacion de 1 en vanillade			
			3/8 3 unidades.			

EQUIPO EN OBRA:
Planta electrica, Pulidora, Martillo demoledor, herramiente menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA


VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Sondeo 07.05.2026 consorcio

Carrera 52 x 29 A

Calle 29A

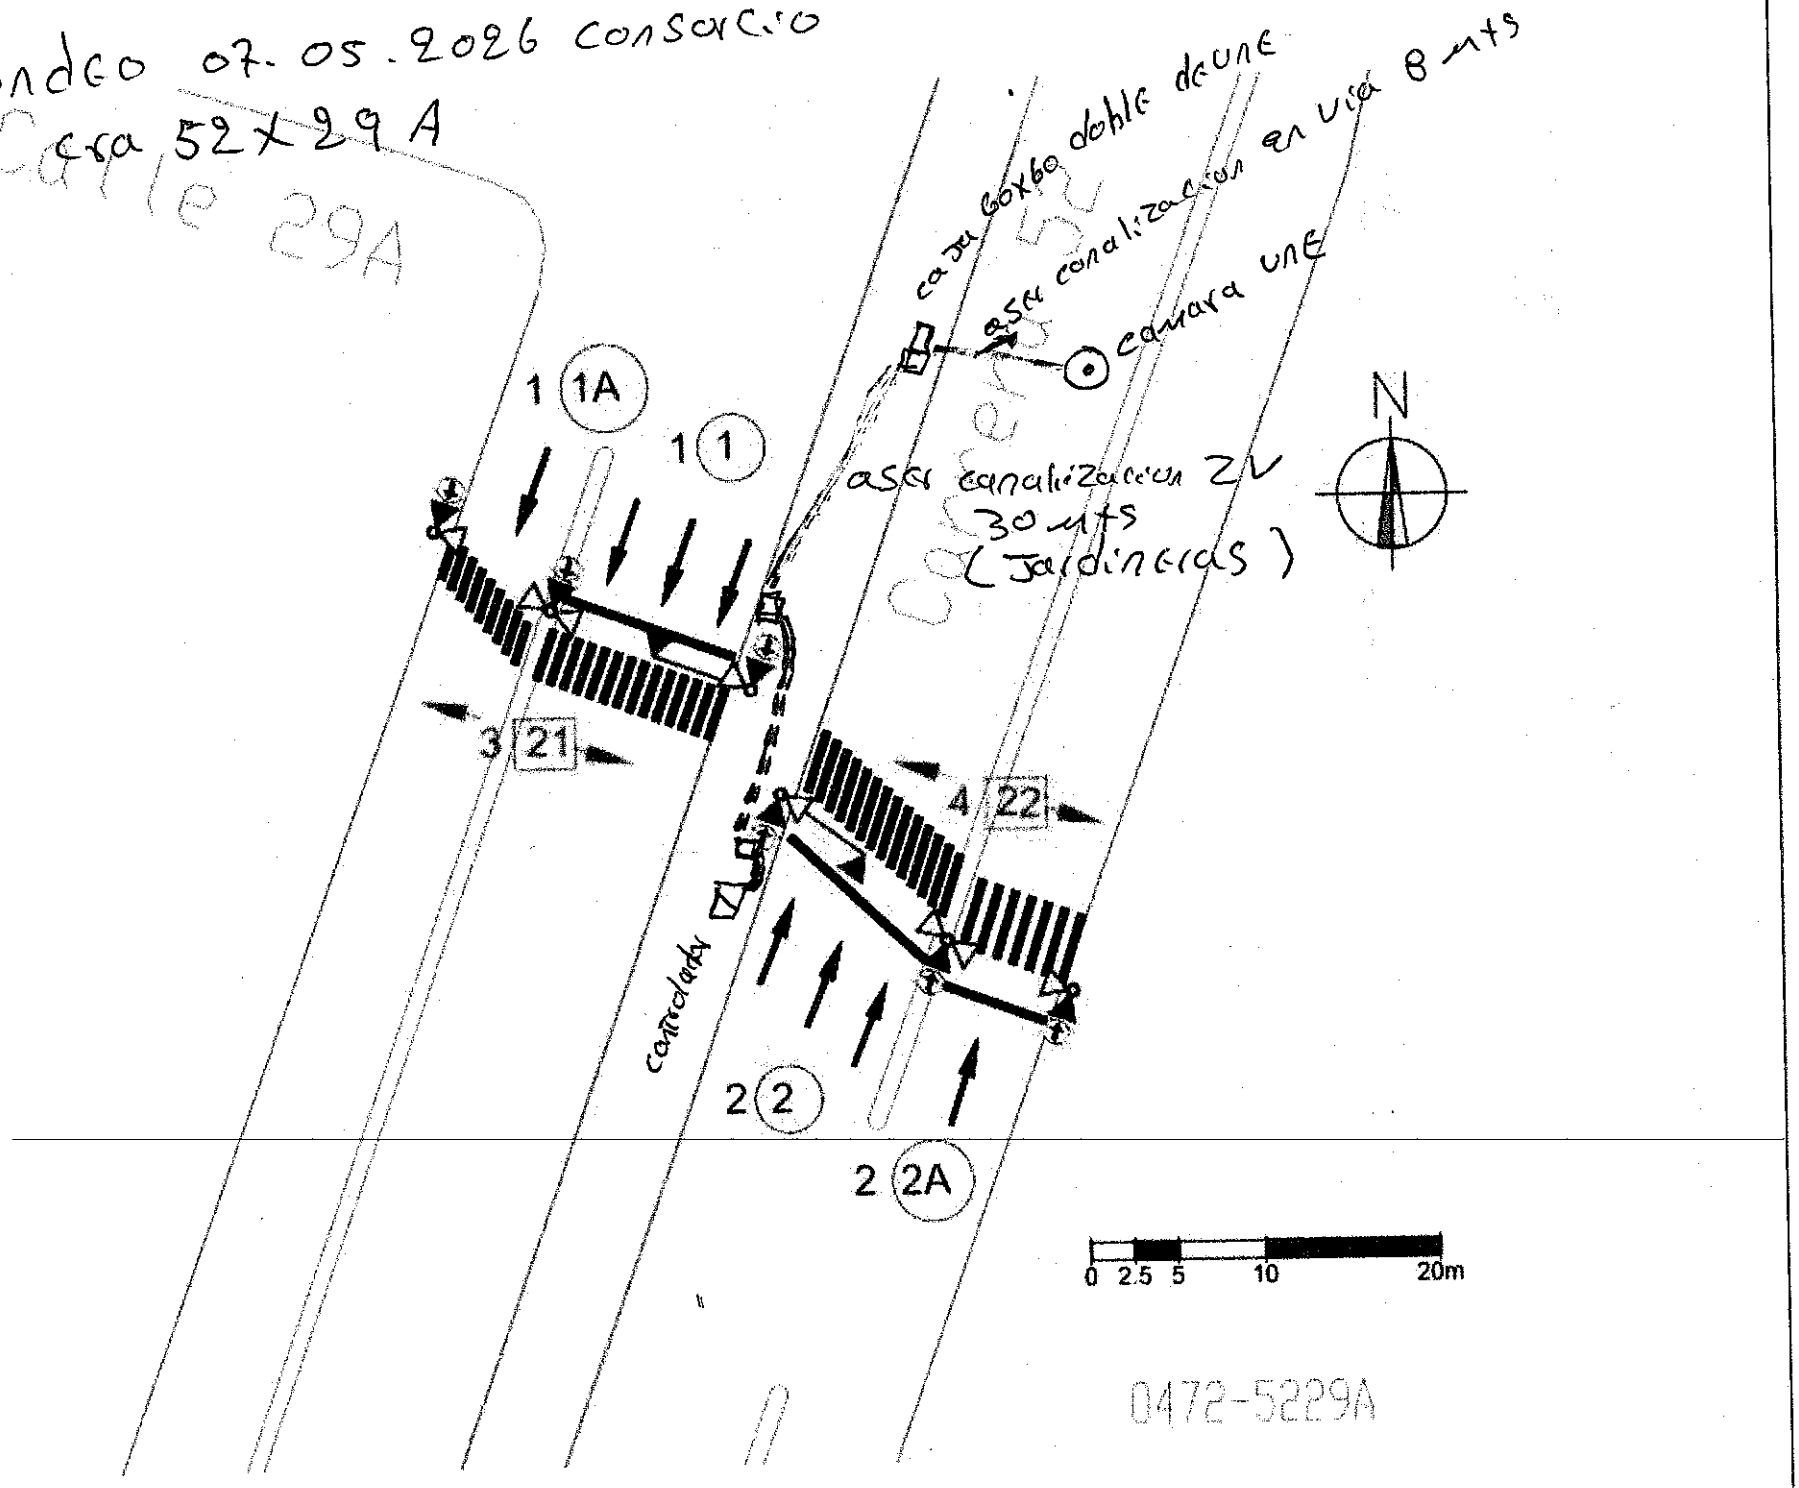

0472-5229A

CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD**	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	07/05/2026.	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	CKN 741.		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juan Camilo Restrepo	71295492.			Jose cortes	1098727191
Yeison Cañas	1035861703.				
Leomar Riera.	PPT. 4350715.				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ CR 47x C11 54	n-e.	n-s.	RETIRO 01 semaforo Vehicular.	0800.		172
			RETIRO 01 semaforo Peatonal			172
			RETIRO 01. Disco direccional.			179
			RETIRO 12m cable 4X16.			173
			RETIRO 01 poste entorramiento directo.			168 → Pendiente brazo
			Instalación 01 poste de mensula			—
			Instalación 10m cable 4x16. (entregado x Consorcio)			215
			Instalacion disco direccional. x 01 und.			220
			Instalacion semaforo peatonal. x 01 und			208
			Instalacion semaforo Vehicular. x 01 und.			208
			Construccion empalme electrico. x 05 und		1500	94
✓ CR 47x C11 57			Revision de estado de interseccion, luces, semaforos y estructuras	1330	1345.	

EQUIPO EN OBRA:
Escalera, arnes, eslinga, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	PLAN DE CALIDAD	
		VERSIÓN 1
	REINTEGRO DE ELEMENTOS	1/09/2025
NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
NÚMERO DEL CONTRATO	4600105555 de 2025	(UNION TEMPORAL SIT)

Entregado por: ANYELO GOMEZ M. **Recibido por: FRANK GARCIA**

FECHA	ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
7/5/2026	CABLE ENCAUCHETADO 4X16 / 4X18	1714	SINIESTROS
7/5/2026	HERRAJES DE 50X50 CON TAPA CONCRETO	12	SINIESTROS
7/5/2026	MARCOS SIN TAPA DE 50X50	6	SINIESTROS
7/5/2026	HERRAJES DE 60X60 CON TAPA ESPECIAL	1	SINIESTROS
7/5/2026	PLACAS DE CONTRASTE	86	SINIESTROS
7/5/2026	PULSADORES TOUCHLESS	27	SINIESTROS
7/5/2026	POSTE DE MENSULA	7	SINIESTROS
7/5/2026	POSTE DE ENTERRAMIENTO	3	SINIESTROS
7/5/2026	SEÑAL DE MOTOS	2	SINIESTROS
7/5/2026	RACKS DE CONTROLADORES EC-1Y2	3	BUENOS
7/5/2026	CABLE TELEFONICO 10-20 O MAS PARES	12	SINIESTROS
7/5/2026	CABLE UTP	85	SINIESTROS
7/5/2026	DISCOS DIRECCIONAL	7	SINIESTROS
7/5/2026	GABINETES DE CONTROL	4	SINIESTROS
**	***	**	******
**	***	**	******
**	***	**	******
**	***	**	******
**	***	**	******
**	***	**	******
**	***	**	******
**	***	**	******
**	***	**	******
**	***	**	******

VERIFICACIÓN

	FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:		FIRMA PERSONA QUE RECIBE
nombre	ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA	nombre	FRANK GARCIA
cargo	ALMACENISTA	cargo	CIOS

112

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / RAV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	08 - 05 - 2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	455405		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1039610427			Jose Cortes	1098727131
Juan Pava				Dueny Paul	43008500

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ cra 76 x cll 28			cambio de 2 semaforos vehiculares en mal estado	8:00Am		
	N-E	E-W	retiro de 1 semaforo vehicular a poste			172
			instalacion de 1 semaforo vehicular de segunda a poste			208
			instalacion de 1 visor en semaforo peatonal a poste			211
			construccion de 1 empalme electrico a poste			94
			limpieza de semaforo vehicular			-
	S-E	E-W	retiro de 1 placa de contraste en semaforo vehicular a poste			199
	S-E	S-N	retiro de 1 placa de contraste en semaforo vehicular a poste			199
	N-W	N-S	retiro de 1 semaforo vehicular a poste			172
			instalacion de 1 semaforo vehicular de segunda a poste			208
			limpieza de semaforo vehicular			-
			construccion de 1 empalme electrico a poste		11:00Am	94

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor, escalera

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN · CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 · RDV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	08-05-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	TSG 405		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038860427			Jose Cortes	1098727131
Juan Rua				Alvaro Cortes	71775731

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ Cra 65 x Cll 30A	S-W	W-E	cambio de semaforo vehicular de 4 aspectos por mal estado	1:30 pm		
			retiro de 1 semaforo vehicular de 4 aspectos a poste			1725
			retiro de 4 lamparas leds 1 roja 2 amarillas 1 verde del semaforo vehicular.			241
			Ensamble de semaforo vehicular de 4 aspectos de segunda			
			reestalacion de 4 lamparas leds 1 roja 2 amarillas 1 verde			
			limpieza de semaforo vehicular de 4 aspectos			
			estalacion de 1 semaforo vehicular de 4 aspectos de segunda a poste.			208
			construccion de 2 empalmes electricos a poste		3:30 pm	94

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 / UTY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	08/05/2026.	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Viernes.		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897.		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juan Camilo Restrepo	71793992			Jose cortes	1098727197
Leonar Rivera	DPT 4350715				
Yeison Casas.	1035861703				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 43A x CII 31.	W.	N-S.	Retiro Lampara amarilla cantilever a ménsula	1330.		196
			Instalacion Lampara amarilla cantilever nueva. #0865. y		1420.	219
			Suministro. Construccion empalme electrico.			94
CR 47 x CII 54.	E.	N-S.	Reinstalacion de brazo de mensula.	0800.		—
			Instalación semaforo Vehicular a mensula (Reutilizado)			207
			Instalacion cable 4x18 nuevo 9m (inicia 7641-7650.			215
			Construccion de empalme electrico x 01 und.		1230.	94
CR 43G x Cll 29	W.	S-N.	Instalacion de brazo de mensula nuevo suministro	1430		—
			Instalacion semaforo vehicular a mensula suministro		1600.	69
			Instalación cable 4x18 nuevo 9m. (inicia 7650-7659)			215
			Construccion de empalme electrico. x 01 und.			94
			Suministro e instalacion lampara rojo. Led #0862.			
			Suministro e instalacion Lampara Verde Led #0864.			
			Suministro e instalacion Lampara Led Amarille Cantilever #0863			

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 / RHV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	8 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Viernes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Balboa	16791906			Jose cortes	1098727131
Jose Andrade					
luis lozano					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 43G C11 29	W	SN	Instalacion de rake para mensula.	07 am		
			Soldada de rake			
			concreto para base de mensula			263
Cr 52 C11 29	E	NS	Concreto reparacion de muro de caja y Anden			263
			50 PSO			

EQUIPO EN OBRA:

Planta electrica, equipo soldador herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN · CONSORCIO INT FAROL MED 2025 · PMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	08/05/26	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Viernes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Gonzalez	1049891058			Jose cortes	1098727131
Yeison Galeano	1039597832			Alvaro Londoño	71775731

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 69B	N-E	W-E	Reconstruccion de Andeu de 1.70 de Ancho	08:00		
Cll 30			Por 2.20 mts de largo en tacil de 40x40		15:00	53

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta Menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

258
252

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNION TEMPORAL SIT MEDELLÍN · CONSORCIO INT FAROL MED 2025 · RMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	7-8/5/2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves y Viernes		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	DX7979		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Christian Barbosa	1.151.966.785			Jose Cortes	1098727131
Simeon Urrea				Mauricio Lotero	71775717
Cristian Mena					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ Cl 16 y 19 C 70	S	W E	Se realiza desoldada de 5 cajas de paso	8:00		183
			Se abren 16 cajas de paso			215
			Se instalan 515 metros de cable 4x18			
			Se realiza perforacion con copa ciclica			
			Se instala 1 metro de canaza con accesorios			94
			Se realiza 1 empalme para radar de deteccion			91
			Se instala radar de deteccion			94
			Se corrige empalme del grupo 8			
			Se solda 5 cajas de paso (Grupo de Fran Klyn)		5:00	262

EQUIPO EN OBRA:
equipo soldador, planta electrica, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN · CONSORCIO INT FAROL MED 2025 · ROY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	8 mayo	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Viernes		LLUVIOSO			SI ✓			SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO			NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Given Patricio				Jose Cortes	4098727131
Andres Blasco					
Andres Bedoya					
Brayan Parjaro					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 34 Cll 10	N-E	W-E	Construcion Base Controladora Semaforos	8 am	5 Pm	33
			Canalizacion 3 tubos 3" 1 M en andenes			-

EQUIPO EN OBRA:

Martillo demoledor, Planta electrica herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

6

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 RUV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	8 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:	ESD 669		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Duma Cifuentes	71 480 675			Jose cortes	1098727131
Alberto oquendo	15.405.477				
Yoi carlos usuga	1.214.729.941				
JOSE PEREZ	PPT 5.240.599				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 52 x 27	sapocudal	Calor	limpieza de 8 cajas 50x50			54
			instalación de 8 Herrajes metalicos nuevos			13
			50x50 Tipo Apolo			
			Suministro e Instalación de refuerzo			
			con varilla de 3/8 = 4 * 8 = 32un			

EQUIPO EN OBRA:

herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín · UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN · CONSORCIO INTEAROL MED 2025 · RMV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 9 Mayo	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA: Sabado		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Stiven Palacio				Jose cortes	1098727131
Andres Bedoya					
Alcides Riasco					
Brayan Palacio					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ Av 80 Cll 28			Instalacion Gavinete			216 ✓
✓ Cra 82a Cll 28			Instalacion Gavinete			216 ✓
✓ Cra 82a Cll 30			Instalacion Gavinete			216 ✓
✓ Cra 83 Cll 30			Instalacion Gavinete			216 ✓
✓ Cra 87 Cll 30			Instalacion Gavinete			216 ✓
✓ Cra 74 Cll 50			Instalacion Gavinete			216 ✓
			Nota = a Cada Gavinete Se le instalaron 10 Pernos de Seguridad.			✓

EQUIPO EN OBRA:

Taladro, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

1/2

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN · CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 · EPM	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	9.05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Sabado		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71 480 675			Jose Soto	1098727131
Aleo Mav Ruiz	PPT 4.350.715				
Yeison Cañas	1.035.861.703				
Viviana Anto	1.017.162.399				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ AV 80 X 2	oc	N-S	lavado de 1 brazo de menzula. lavado de 1 poste de menzula. lavado de 1 semaforo de menzula lavado de 1 semaforo vehicular lavado de 2 semaforos peatonales lavado de 1 disco direccional			229-230-235-234-231-236-
✓ AV 80 X 2	oc	oc-or	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula lavado de 1 semaforo de menzola lavado de 1 semaforo vehicular de poste. lavado de 1 disco			229-230-235-234-236-
✓ AV 80 X cra 66	oc	N-S	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula lavado de 1 semaforo menzula lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 disco direccional lavado de 1 disco pec lavado de 1 pulsador			229-230-235-234-234-236-231-236-
✓ AV 80 X 65	oc	N-S	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula lavado de 1 semaforo de menzula lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado			229-230-235-234-

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma	de 1 disco direccional	236-

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

2/2

CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 RMY

PLAN DE CALIDAD

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025

SIT-SGC-F-001 | VERSIÓN 1 | ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 9 05 2026 DIA: sabado VEHÍCULOS: WLY 897	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE SI ✓ NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI ✓ NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71480675			Jose cortes	1098722131
Leomar Rieia	PPT 4.350.715				
Yelson Cañas	1.035.961.703				
Viviana Pinto	1.017.162.399				

TRABAJOS REALIZADOS

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO		HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
AV 80 X 55	OC	N-S	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula lavado de 1 semaforo de menzula lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 semaforos peatonales lavado de 1 disco direccional lavado de 1 disco pel lavado de 1 pulsador			229-230 235 234 231 236 232
AV 80 X carrera OC calle 9 sur	OC	N-S	lavado de 1 menzula 1 poste de menzula 1 brazo de menzula 1 semaforo de menzula 1 semaforo vehicular de poste 1 semaforo peatonal 1 disco direccional			230-229 235 234-236

Plataforma

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA		FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría

1/3

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN · CONSORCIO INT FAROL MED 2025 · DMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	11-05-2026	TIEMPO	SECO	51	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	LUNES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	TSG 405		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1039410477			Jose Cortes	1098727137
Juan Roa					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ CRR 49 X CLL 62	N-W	N-S	cambio de semaforo vehicular partido y en mal estado	9:30Am		172
			retiro de 1 semaforo vehicular a poste			241
			Ensamble de 1 carcasa vehicular de segunda			
			instalacion de 3 lamparas vehicolares leotec de segunda			
			lavada de semaforo vehicular			208
			instalación de 1 semaforo vehicular de segunda a poste		9:20Am	94
			construccion de 1 empalme electrico a poste			
✓ CRR 52 X CLL 25	separador central	S-N	cambio de semaforos vehicolares partidos y en mal estado	10:00Am		172
			retiro de 1 semaforo vehicular a poste			241
			Ensamble de 1 carcasa vehicular de segunda			
			instalacion de 3 lamparas vehicolares leotec de segunda			
			lavada de semaforo vehicular			208
			instalación de 1 semaforo vehicular de segunda a poste		10:30Am	94
			construccion de 1 empalme electrico a poste			

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

2/3

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL BIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / RGV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	11 - 05 - 2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	LUNES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	TSG 405		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038810427			Jose Cortes	1098727131
Juan ROA					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CRR 52 X CLL 25	S-E	S-N	retiro de 1 semaforo vehicular en mal estado a poste	7:00pm		172
	separador		retiro de 3 lamparas Vehiculares led tec			241
			ensamble de 1 carcasa vehicular de segunda			
			lavada de semaforo vehicular			
			reestalacion de 3 lamparas vehiculares led tec			208
			Istalacion de 1 semaforo vehicular de segunda a poste			94
			construccion de 1 empalme electrico a poste			
	S-E	E-W	Istalacion de 2 viseras metalicas de segunda en semaforo peatonal a poste			211
	separador central	N-S	retiro de 1 semaforo vehicular en mal estado a poste			172
			retiro de 3 lamparas vehiculares led tec			241
			ensamble de 1 carcasa vehicular de segunda			
			lavada de semaforo vehicular			
			reestalacion de 3 lamparas vehiculares led tec			208
			Istalacion de 1 semaforo vehicular de segunda a poste			94
			construccion de 1 empalme electrico a poste		3:30pm	

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

3/3

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN · CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 · Roy	**REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	11 - 05 - 2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	LUNES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	TSG 405		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin santos	1038960427			Jose cortes	1098727131
Juan Roa					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 52 x cll 25	N-W separador	N-S	retiro de 1 semaforo vehicular en mal estado a poste	7:00pm		172
			ensamble de 1 carcasa vehicular de segunda			
			lavada de semaforo vehicular			241
			istalacion de 3 lamparas vehiculares leatec de segunda			
			Istalación de 1 semaforo vehicular de segunda a poste			208
			construccion de 1 empalme electrico a poste		3:30pm	94

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD**	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	11 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	lunes		LLUVIOSO			SI ✓		SI		SI ✓
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Bahos	16791906			Jose Cortes	1098727137
Jose Andrade					
Cristian mena					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 65 Cll 81	Separador		Concreto a tres Tapes	07am		263
Cr 53 Cll 49	E	SN	Demolicion de base de mensula 50x50			1
Cr 54 Cll 52	N	EW	Instalacion de Viscera de Segunda. a posic			211

EQUIPO EN OBRA:

Planta electrica, Martillo demoledor, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / EPM	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 11/5/2026 DIA: lunes VEHÍCULOS: DXT928	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	✓	UNIFORMES	CUMPLE SI ✓ NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI ✓ NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Christian Barbosa	1.151.966.785			Jose cortes	1098727131
Simeon Vivas					
Luis Lozano					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ C 83 x C 132	EN	SN	Se realiza Ajuste de semaforo peatonal			260
✓ C 155 x C 130	N	EW	Se realiza cierre de tapa mal cerrada			—
✓ C 146 x C 152	W	NS	Se realiza reparacion de semaforos de piso se realiza descalado de caja Se instala cuenta nueva Se realizan 3 encalmes Semaforo quedan funcionando Se pega semaforo de piso con silicona transparente			183 — 94 — —

EQUIPO EN OBRA: equipo soldador, planta electrica, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA

ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	RESPONSABLE INTERVENTORÍA APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

114

Alcaldía de Medellín / Unión Temporal SIT Medellín / Consorcio Int Farol Med 2025 / BMV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	12 - 05 - 2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI ✓		SI		SI
VEHÍCULOS:	TS6405		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038810427			Jose Cortes	1098727131
Juan Roa					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ Cra 45 x Cll 69			cambio de semaforos peatonal y vehicular y correctivos de lamparas y viseras	8:40am		
	N-E	E-W	retiro de 1 semaforo peatonal en mal estado a poste			172
			retiro de 1 placa de contraste en semaforo vehicular a poste			199
			instalacion de 1 lampara roja peatonal de segunda			218
			suministro instalacion de 1 lampara verde peatonal dinamica nueva			218
			lavada de semaforo peatonal			231
			instalacion de 1 semaforo peatonal de segunda a poste			208
			construccion de 1 empalme electrico a poste			94
	S-E	E-W	retiro de 1 viisera en semaforo peatonal a poste			198
			instalacion de 1 viisera plastica de segunda en semaforo peatonal a poste.			211
	N-E	N-S	Ajuste de lampara roja peatonal a poste			260
			Ajuste de lampara verde peatonal a poste		10:50am	260

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

44

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN · CONSORCIO INT FAROL MED 2025 · RMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	12 - 05 -2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	TSG405		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038460427			Jose Cortes	1098727131
Juan Roa					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ Cra 45 x cll 69	N-W	N-S	retiro de 1 semaforo vehicular en mal estado a poste	8:40 Am		172
			retiro de 1 lampara roja vehicular led tec			
			retiro de 1 lampara verde vehicular led tec			
			retiro de 1 lampara de contra regresivo			
			ensamble de 1 carcasa vehicular de segunda en bodega			241
			lavada de semaforo vehicular en bodega			
			perstalacion de 1 lampara roja vehicular led tec			
			perstalacion de 1 lampara de contra regresivo			
			perstalacion de 1 lampara verde vehicular led tec			
			istalacion de 1 semaforo vehicular de segunda a poste			208
			construccion de 1 empalme electrico a poste			94
	N-W	W-E	orientacion de 1 semaforo peatonal a poste		10:50 Am	258

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

3/4

Alcaldía de Medellín / Unión Temporal EPM Medellín / Consorcio Int Farol Med 2025 / ROY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	12-05-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	TSG405		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038910427			Jose Cortes	1098727131
Juan Roa					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ cxv 45 x cll 77A	S-E	E-W	orientacion de 1 semaforo peatonal a poste	7:12 Am		258
	N-W	W-E	orientacion de 1 semaforo vehicular a poste			258
			ajuste de aspecto cerrado en semaforo vehicular en la lampara roja		11:23 Am	260
✓ cxv 45 x cll 73			cambio de lamparas peatonales en mal estado	7:43 Am		
	N-W	N-S	retiro de 1 lampara roja peatonal a poste			195
			instalacion de 1 lampara roja peatonal de segunda a poste			218
			construccion de 1 empalme electrico a poste			94
	N-W	N-S	retiro de 1 lampara roja peatonal a poste			195
			instalacion de 1 lampara roja peatonal de segunda a poste			218
			construccion de 1 empalme electrico a poste			94
	S-E	E-W	orientacion de 1 semaforo peatonal a poste			258
			ajuste de aspecto cerrado en semaforo peatonal a poste		12:20 Pm	260

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INT. EAROL MED. 2025 · UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN · Alcaldía de Medellín	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	12 - 05 - 2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	TSG 405		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin santos	1038810427			Jose Cortes	1e98727131
Juan Roa					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ cra 45 x cll 78	N-E	E-W	Retiro de 1 lampara verde peatonal en mal estado a poste	3:00pm		195 -
			Retiro de 1 aspecto en mal estado a poste			241 -
			Istalacion de 1 aspecto de segunda a poste			
			suministro istalacion de 1 lampara verde peatonal dinamica nueva a poste.			94 -
			construccion de 1 empalme electrico a poste		3:20pm	

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN · CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 · BCV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 12 05 2026 DIA: martes VEHÍCULOS:	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE SI ✓ NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI ✓ NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI ✓ NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbara P	16791906			Jose Cortes	1098727131
William Chavarria	98081775				
Yeison Golcano	1039597832				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr46 Cll48	Separado		Instalacion de Semaforo de Piso2 (Serial: 0855-0839	07:am		212
			Dos puentes Instalacion y Suministro (Serial: 0253-0257			—
			Construccion de 6 empalmes.			94
			Canalizacion en zona dura con Tuberia Flexible			
			de 1" pulgada 1 metro			
			Instalacion de Cableado 4X18 6 metros.	5pm		215

EQUIPO EN OBRA:
Planta electrica, Pulidora, Martillo demoledor, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / EDY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 12/Mayo/2026 DIA: Martes VEHÍCULOS: Dx1979	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE SI ✓ NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI ✓ NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Christian Barbosa				Jose Cortes	1098727131
Simeon Uribe					
Laura Padilla					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
D674A x TV39CA	N	E W	Se realiza corrección de empalme a semaforo de piso			94
✓ D674A x TV 40	N	E W	Se realiza corrección de empalme al semaforo de piso			94
✓ C170 x C1 47D	S	W E	Se realiza revicion de semaforos de piso se evidencia uno de ellos en corto se deja aislado Se realiza 2 empalmes			94
	W y E	N S	Se realiza revicion de semaforos de piso de ambos costados se realiza 6 empalmes y los semaforos quedan funcionando correctamente			94

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTEGRAL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD**	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	11 y 12 mayo 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	lunes martes		LLUVIOSO			SI ✓		SI		SI ✓
VEHÍCULOS:	B54 669		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71.490.675				
Alberto Oquendo	15.495.477				
Jose Deiez	PPT 5.240.599				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 52 x 29A	separador	N-S	se hizo canalizacion de zona verde para instalacion	8 AM	5 PM	
			de cable de Fibra para comunicacion			25 ✓
			30 mts con 2 Tubos puc de 2"			34 ✓
			construccion de 1 caja 50x50			13 ✓
			instalacion de 1 herraje 50x50 metalico nuevo			
			Tipo Apolo			
			suministro instalacion de 4 barillas en U de 30 cms			
			cada una			

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor, Pulidora

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD**	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	12-mayo-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:			LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	CTOS		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
				Jose cortes	1098727131

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
			Suministro de (10) und. de Switch Capa 3.			130
CTOS.			Suministro de (20) und de. Hervajes Apto.			16
			Suministro de (25) und de Gabinetes de Control.			147

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

1/3

CONSORCIO INTEAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 12-05-2026 DIA: Martes VEHÍCULOS: IKN 741	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	X	UNIFORMES	CUMPLE SI NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santos	1038806300			Jose Cortes	1098727131
Leomar Riera	98TA350715				
Yeison Cañas	1035861703				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CRSO-S1			Sondeo y levantamiento			237
Calle 38			Instalación de 153mts de cabuya de reguarda			
CRS1 CL 38	N-E.		Soldada de 2 tapas de 50x50.			262
			Nota: Programar reposición de herraje 50x50 en la calle 38 # 50-31.			
			Programar instalación de herrajes 50x50 en la CR 50 CL 38 costado S-W. y en el costado S-E.			
CR-S1-S2			Sondeo y levantamiento			
calle 38			Instalación de 102mts de cabuya de reguarda			237
CS1 CL 38	N-W		Soldada de 2 tapas 50x50.			
CR S2 CL38	N-E.		Retiro de soldadura a 2 tapas 50x50.			262
			Soldada de 2 tapas 50x50.			183
						262


EQUIPO EN OBRA: Equipo soldador, Planta electrica, Pesca, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA


ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	RESPONSABLE INTERVENTORÍA APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Dueny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

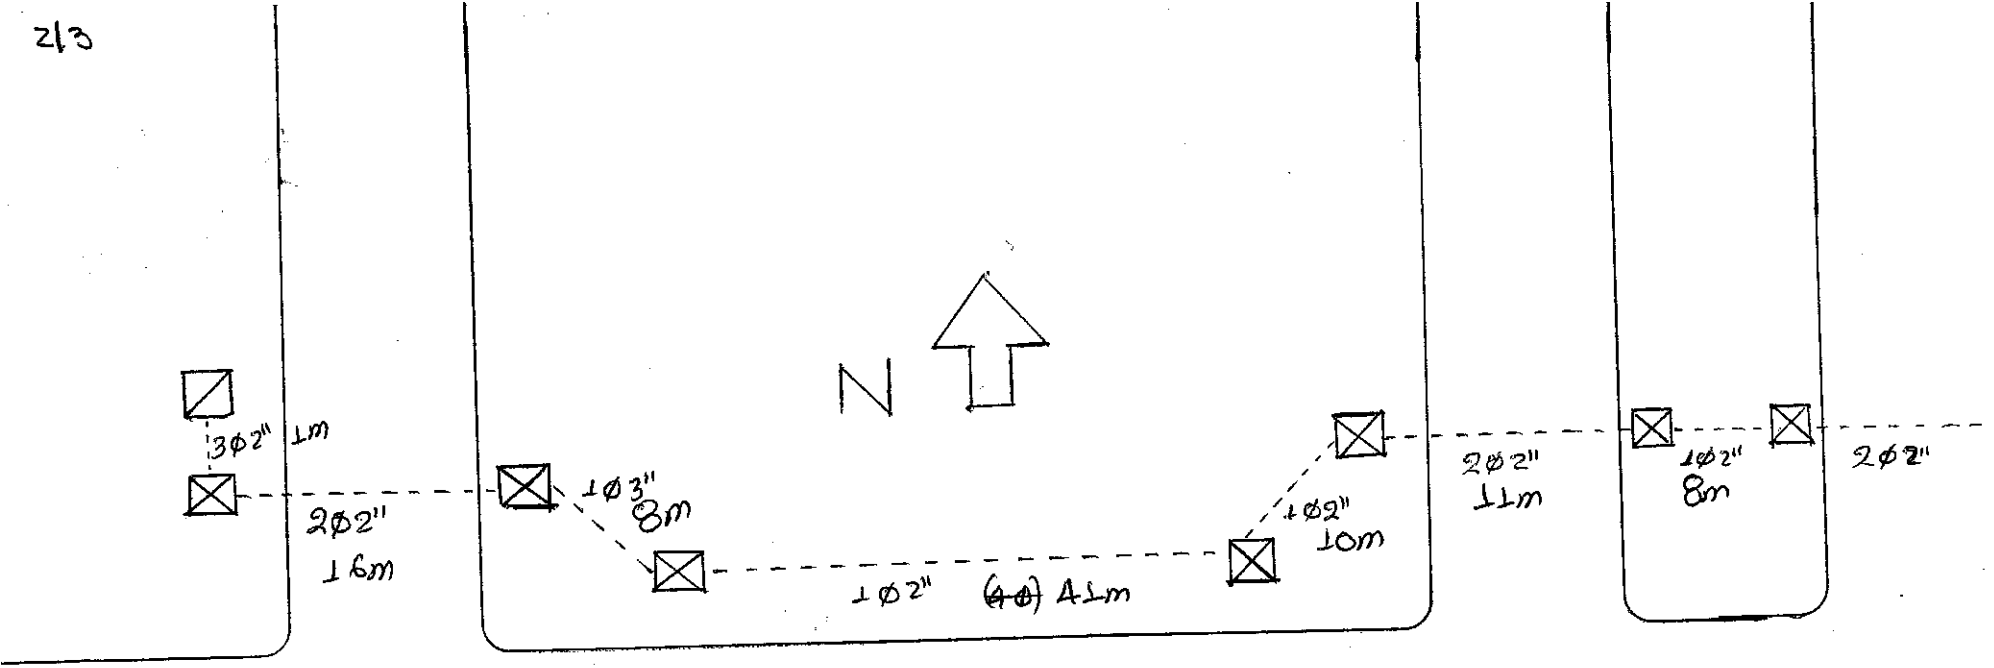

CL 38

CR 52

CR 51

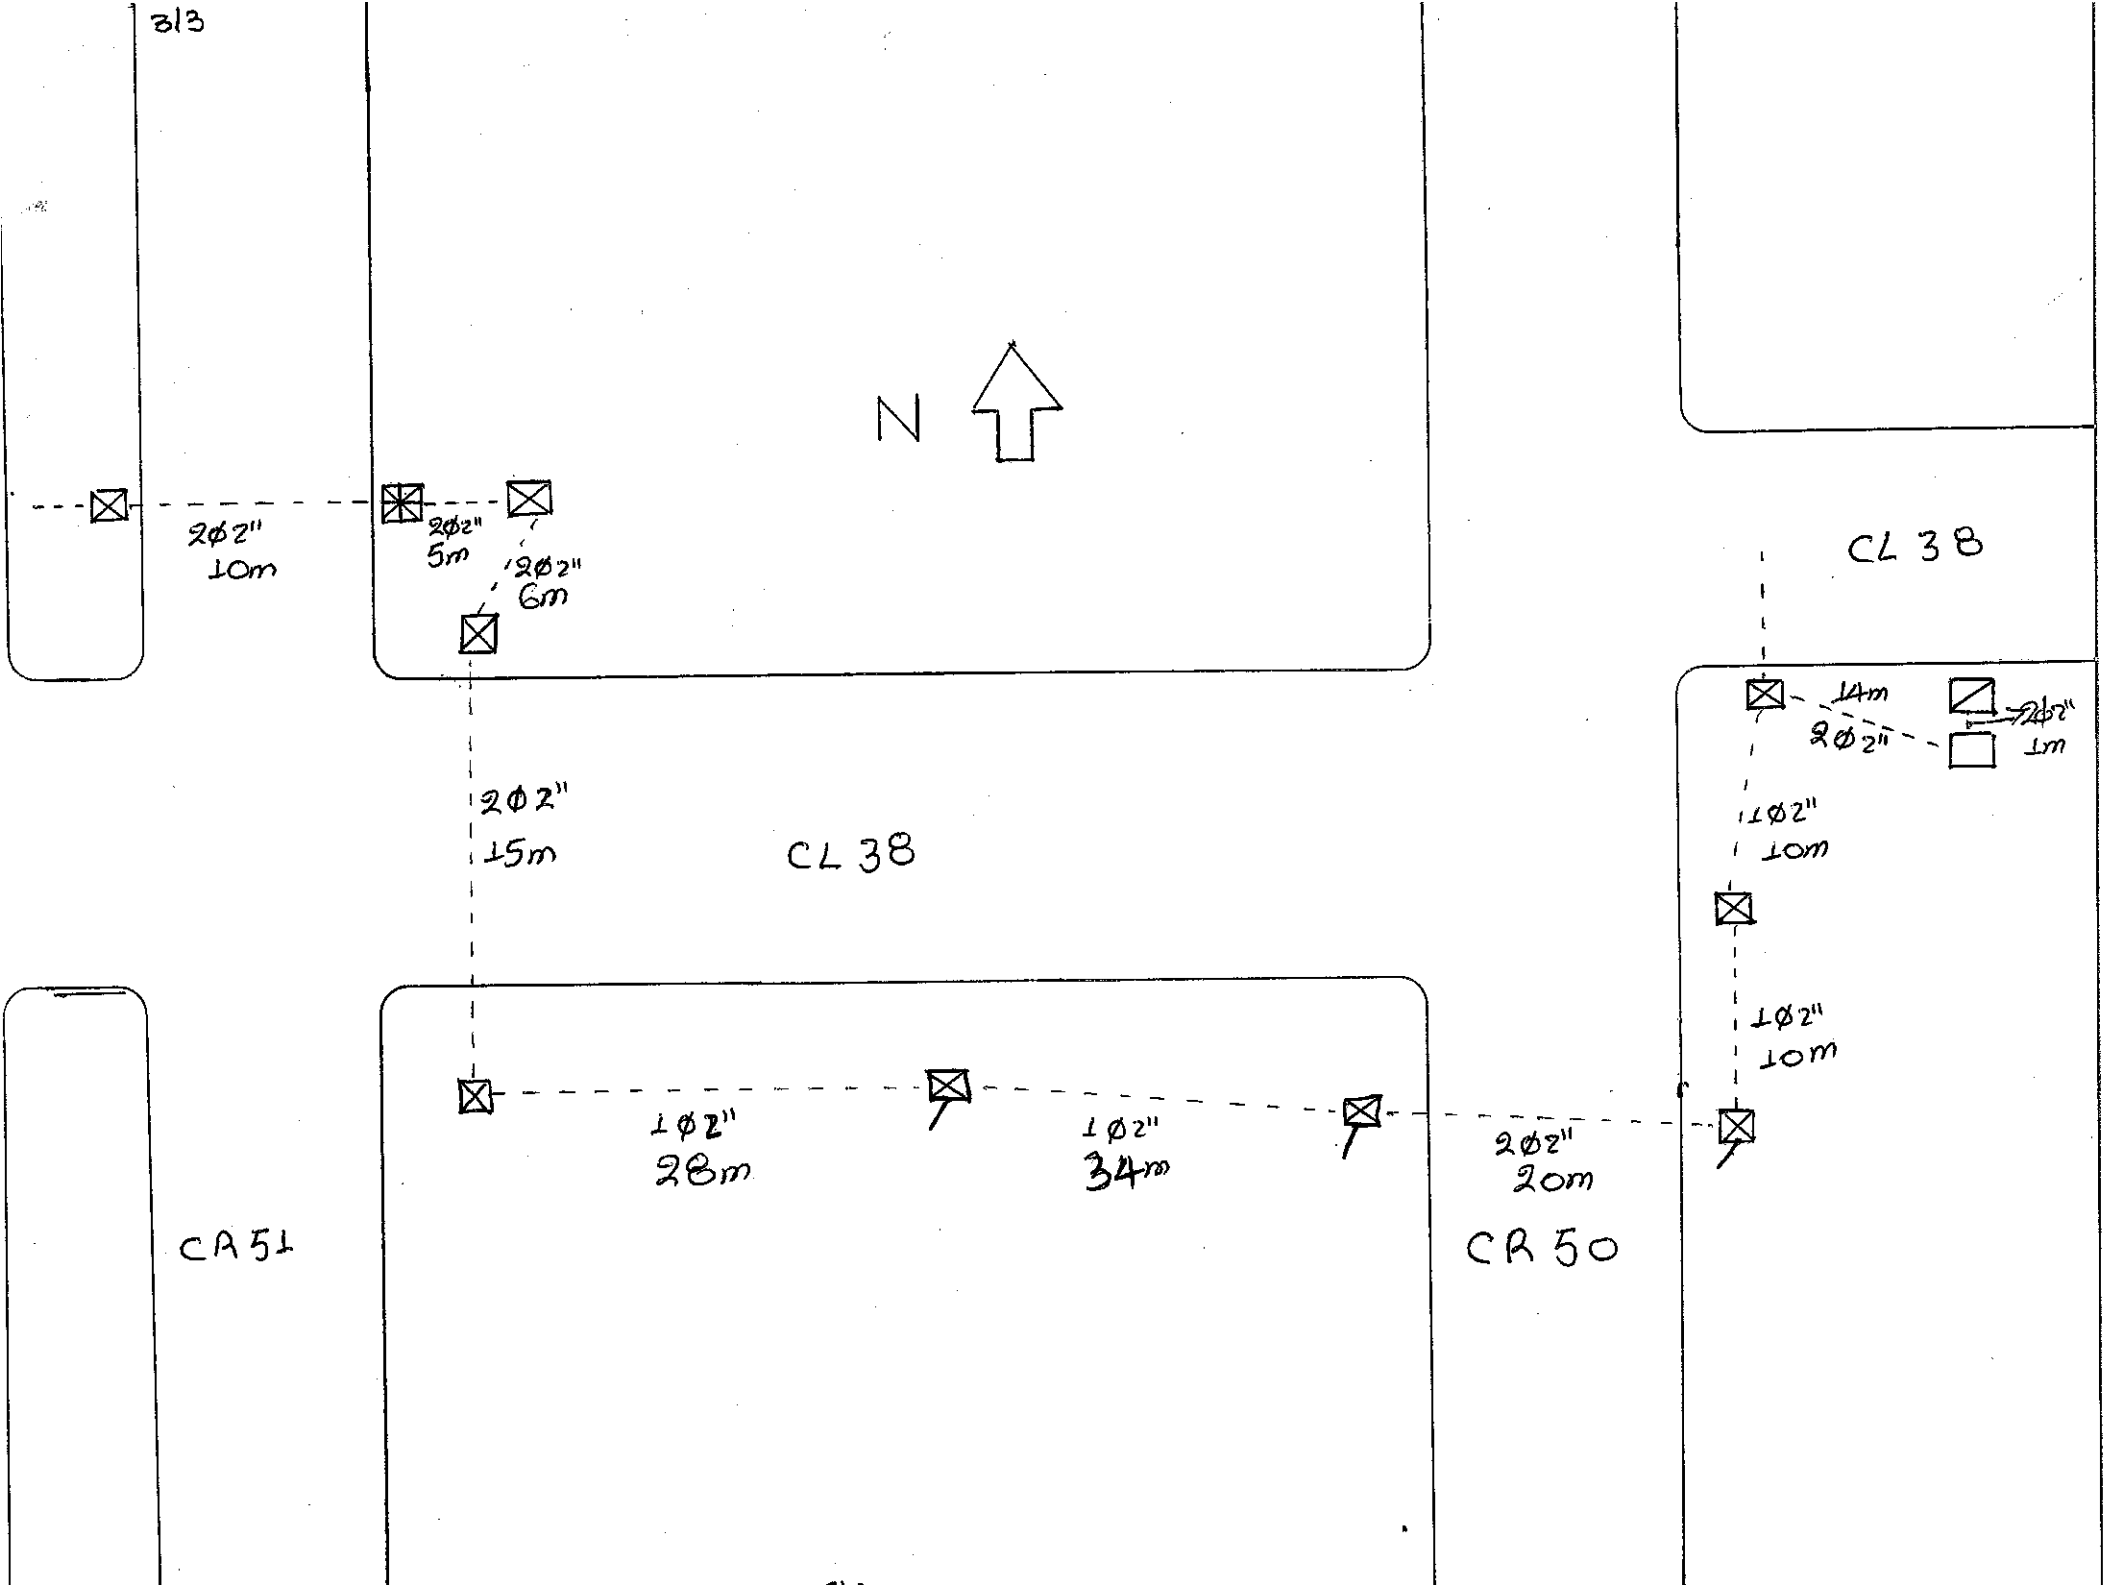
313
N
2Ø2"
10m
2Ø2"
5m
2Ø2"
6m
2Ø2"
15m
CL 38
CL 38
14m
2Ø2"
2Ø2"
1m
1Ø2"
10m
1Ø2"
10m
1Ø2"
28m
1Ø2"
34m
2Ø2"
20m
CR 50
CA 51

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 / RAV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	13-05-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIERCOLES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	756405		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
edwin santos	1038810427			Jose cortes	1098727137
juan ROA					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ cra 45 x cll 80			cambio de semaforos peatonales en mal estado	8:52 Am		
	N-E	E-W	retiro de 1 semaforo peatonal a poste			172
			instalacion de 1 semaforo peatonal de segunda a poste			208
			instalacion de 1 lampara roja peatonal de segunda			218
			suministro instalacion de 1 lampara verde peatonal dinamica nueva			218
			construccion de 1 empalme electrico a poste			94
	N-W	W-E	retiro de 1 semaforo peatonal a poste			172
			retiro de 1 lampara roja peatonal			195
			instalacion de 1 lampara verde peatonal dinamica de segunda			218
			reinstalacion de 1 lampara roja peatonal			218
			instalacion de 1 semaforo peatonal de segunda a poste			208
			construccion de 1 empalme electrico a poste			94
	S-W	W-E	excentacion de 1 semaforo peatonal a poste		10:23 Am	258

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INTEAROL-MED 2025 / ROW	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	13-05-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIERCOLES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	TSG 405		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038810427			Jose Cortes	1098727131
Juan Rom					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ Cra 45 x Cll 84			cambio de semaforo peatonal ajuste de lampara y cambio de lampara peatonal	10:43 Am		172.-
	S-W	W-E	retiro de 1 semaforo peatonal en mal estado a poste instalacion de 1 semaforo peatonal de segunda a poste construccion de 1 empalme electrico a poste			208.- 94.-
	N-E	N-S	retiro de 1 lampara verde peatonal a poste instalacion de 1 lampara verde peatonal de segunda a poste construccion de 1 empalme electrico a poste			195.- 218.- 94.-
	S-E	S-N	retiro de 1 aspecto en semaforo vehicular a poste instalacion de 1 aspecto de segunda en semaforo vehicular a poste		12:12 Pm	241.-

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

3/4

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 / RAY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	13 - 05 - 2026	TIEMPO	SECO	51	UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIERCOLES		LLUVIOSO			SI	✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	TSG405		DURACIÓN			NO			NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin santos	1038810427			Jose cortes	1098727131
Juan Roa					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ cra 45 x cll 86			cambio de semaforos vehicular y peatonal x correctivos de aspecto	1:40 pm		172 -
	N-E	E-W	retiro de 1 semaforo vehicular a poste			258 -
			orientacion de 1 semaforo peatonal a poste			
			Ensamble de 1 carcasa vehicular de segunda en bodega			
			lavada de semaforo vehicular			241 -
			Estalacion de 3 lamparas vehiculares leatc de segunda			
			Estalacion de 1 semaforo vehicular de segunda a poste			94 -
			construccion de 1 empalme electrico a poste			
	S-E	S-N	Retiro de 1 aspecto en semaforo vehicular a poste			241 -
			Estalacion de 1 aspecto de segunda en semaforo vehicular a poste			
	S-W	N-S	Estalacion de 1 viscera metalica de segunda en semaforo peatonal a poste		3:20pm	211 -

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN · CONSORCIO INTEROLMED 2025 · R&V	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	13-05-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIERCOLES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:	TSG405		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
edwin santos	1038810427			Jose cortes	1098727131
juan ROA					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ cvv 45 x cll 96	N-W	W-E	retiro de 1 semaforo peatonal a poste en mal estado	1:40pm		172
			retiro de 1 lampara roja peatonal			195
			retiro de 1 lampara verde peatonal			195
			reestalacion de 1 lampara roja peatonal			218
			reestalacion de 1 lampara verde peatonal			218
			estalacion de 1 semaforo peatonal de segunda a poste			208
			construccion de 1 empalme electrico a poste			94
	N-W	N-S	orientacion de 1 semaforo peatonal a poste		3:20pm	258

EQUIPO EN OBRA:
Escalera, arnes, eslinga, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · Unión Temporal SIT Medellín · Consorcio Intebol Med 2025 · RAV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	13 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	miercoles		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa P.	16791906			Jose cortes	1098727131
Willian Chaverria	98681775				
Yeison Caleano	1039597832				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ Cr 46 C 48	E	N S	Instalacion de Semaforo de Piso 2 (serial: 0853 - 0854	07 am		212
	W	S N	Instalacion Suministro de 2 puentes (serial: 0245 - 0250			94
			Construcion de 6 Empalmes			
			Canalizacion en zona dura con tuberia flexible			
			de 1" pulgada 15 metros			
			Instalacion de Cableado 4x18 15 m		5pm	215

EQUIPO EN OBRA:

Planta electrica, pulidora, martillo demoledor, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN · CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 · ROY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	13 Mayo	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Alcides Rasco				Jose cortes	1098727139
Andres Bedoya					
Stwan Palacio					
Brayan palacio					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ CRA 53C11 49			Construccion anclaje Semaforico			97 -
13 Mayo						
✓ Construccion			Construccion Caja 50 x 50 Especial			34 -
✓ CRA 53C11 49			Instalacion de Herraje De Apoio			13
			Con 4 Pernos de barilla			
			Demolicion y Reparacion de anden 0.60 x 1.20 x 0.10			1 -

EQUIPO EN OBRA:

Planta electrica, martillo demoledor, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN · CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 · R&V	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	13-05-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miércoles		LLUVIOSO			SI X		SI X		SI
VEHÍCULOS:	IKN741		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Sanchez	1038806300			Jose Cortes	1098727131
Teisan Correa	1035861703				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 51 CL 36			Excavación Central norte.	3-15	4-50	
			Retiro de Soldadura a la tapa 50 x 50			183
			Retiro de Soldadura a la tapa 60 x 80			183
			Soldada de la tapa 50 x 50			262
			Soldada de la tapa 60 x 80			262
			Sondeo y levantamiento Parcial Programar			237
			Continuidad del sondeo para integrar lo			
			todo en un mismo Corte.			

EQUIPO EN OBRA:

Equipo Soldador, planta electrica, Pesca

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN · CONSORCIO INFRAEST. MED 2025 · DAV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	13 Mayo 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WL2 049		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Wilson Fdo. Guerrero	1.070.857.034			Jose Cortes	1098727451
Miguel Ullegas	1.018.229.962				
Elmis Torres	1.073.030.497				
Jorge Rodriguez	PPT 1.137.342				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 52 x	Occidental	S-N	Construccion de Canalizacion en zona verde con 2 tubos pvc de 2" 7,40 metros	8:00		25
Calle 9 Sur			Construccion de Canalizacion en zona dura con 2 tubos pvc de 2" 1,00 metros.			22
			Construccion de canalizacion en adoquin con 2 tubos pvc de 2" 1,20 metros			23
			Retiro de 84 metros de Cable de control 4x18			173
			Instalacion de 100 metros de cable de control 4x18 nuevo.			215
			Construccion de empalme electrico en sumidero peatonal 02 unidades.		17:00	94

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta Menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN · CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 · RMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	13-05-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miércoles		LLUVIOSO			SI ✓			SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:	Esp 669		DURACIÓN			NO			NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime cifuentes	71480675			Jose cortes	1098727731
Alberto oquendo	15485477				
Jose Perez	PPT 5.240.599				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 52 x 82	oc	N-S	se hizo corte en Anden para arreglar tubería ostruida construcion de 1 caja nueva 60x60	8 AM	11 PM	35
			pendiente instalar 1 Herraje 60x60			
			pendiente instalar Herraje cambiar por uno			
			que los tornillos esta oxidados y no abre			
			se arreglo tubería ostruida en el Anden pero			
			continua ostruida en la via rompa para			
			arreglarla			
			llenado con escombros 1 concretada de 1 caja			263
			mientras se instala el Herraje			


EQUIPO EN OBRA: Pulidora, Planta electrica, Martillo demoledor, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

13 05 2026 consecu **CARRERA 52 X CALLE 82**

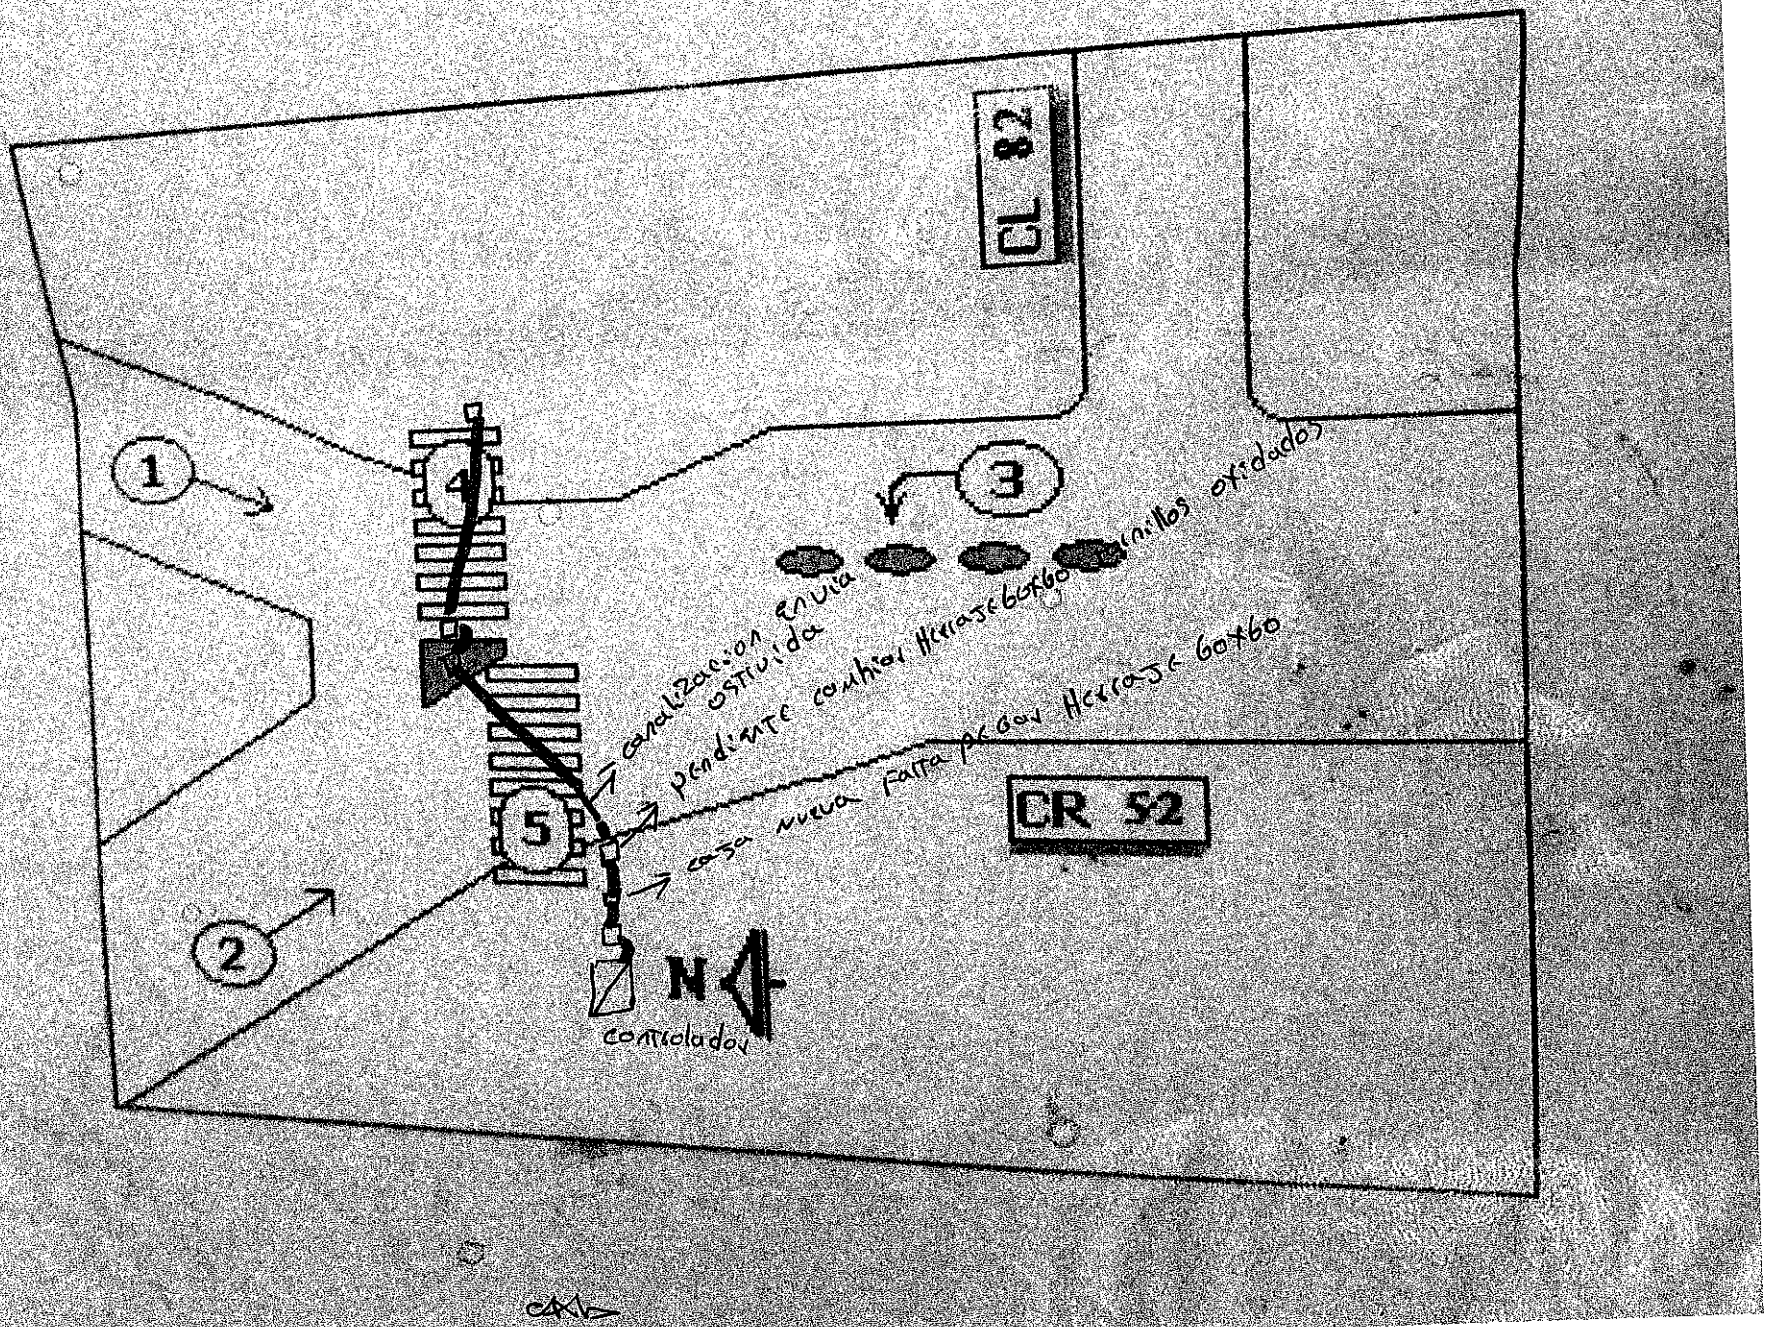

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEAROL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	VERSIÓN 1
	Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	13/05/2026.	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	miercoles		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897.		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juan Camilo Restrepo	71295492			Jose Cortes	1098727131
Cesar Riera.	PPT 4350715.				
Gberto Cadrazco.	13461111				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR42 x cll 47	S.	e-w	Retiro de antena de comunicaciones	1100.		
CR42x cll 46	S.	w-e.	Retiro de antena de comunicaciones.		1230.	
CR57x cll57.	w.	n-s.	Instalación Antena de comunicaciones	1330.		
Postelores Sw.			Suministro e instalación 02 Terminales RJ45.		1430.	
CR45x cll 73.	n.	e-w.	Retiro de semaforo demensula.	1500.		170
			Retiro de Brazo de mensula.		1700.	—
			Retiro de 5m cable 4x16.			173
			Se realiza el retiro del brazo por mal estado de la mensula. Queda pendiente programar el vaciado del anclaje			

EQUIPO EN OBRA:

plataforma, herramienta Menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL EIT MEDELLIN / CONSORCIO INTERVENTOR MED 2025 / RGV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	13/5/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Dmes Miercoles		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Christian Balbosa				Jose cortes	1098727137
Simeon Viveros					
Laura Padilla					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 70 x Cl 44			Se revisan 10 conaptores de fuse agrupados	8:06		
			8 se encuentran en corto			
			7 no encienden			
			Se realiza 10 empalmes		1:06	94
Cr 75 x Cl 44			Se retiran 6 constrastes	2:00	4:36	199

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 · UNION TEMPORAL SIT MEDELLÍN · RAV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	14 -05 -2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	ESR 528		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
edwin santos	1038810427			Jonathan Pinden	036662210
Juan Ipia					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 51 x c 11 53	S-E	S-N	Aplomada de poste recto en zona dura orientación de semaforo peatonal a poste	9:49 pm	12:24 pm	197 258
cra 45 x c 11 53	S-W	W-E	se ase la visita ala interseccion ala los peatonales apagados se verifican cable en corto en el rojo se ase seguimiento del cable y se para la actividad por camaras de EPM queda pendiente programar abrir las tapas	1:30 pm	2:30 pm	261

EQUIPO EN OBRA:

Planta electrica, Herramienta menor, Vehiculo publico

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

Se verifica señalizacion y EPP

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN · CONSORCIO INT FAROL MED 2025 · RDV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	14 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa P.	16791906			Jose cortes	1098727131
Simeon Vivas.	1039597892				
Galeano Yeisson	1065930 19				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ Cr 53 Cl 53			Reporte de Semaforo Peatonal Apagado y Verde Vehicular apagado.	07am		94
			Se repara empalme en caja de paso en costado del Verde Vehicular.			
			no se encuentra cableado del peatonal (Pendiente)			263
			Concretada de base de mensula.			
✓ Cr 49 Cl 78			Retiro de mensula caida en mal estado			166
			Retiro de Semaforo Vehicular a poste			172
			Retiro de Semaforos Peatonales a poste 2			172
			Retiro de Semaforo Vehicular a brazo mensula.			172
			Retiro de Cableado 4X18 en mal estado 20 metros.			173

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / RAV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 14 mayo DIA: Jueves VEHÍCULOS:	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE SI ✓ NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI ✓ NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Alcides Riasco				Jose cortes	1098727131
Andres Bedoya					
Brayan Rolaco					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 73 Cll 50			Instalacion Gavinete Instalacion 10 pernos de Seguridad			216
Cra 73 Cll 47D			instalacion Gavinete instalacion 10 pernos de Seguridad			216
Cra 69A Cll 49D			Instalacion Gavinete instalacion 10 pernos Seguridad			216
Cra 48 Cll 61			instalacion Gavinete instalacion 10 pernos Seguridad			216
Cra 57 Cll 54			Instalacion Gavinetes instalacion de 10 pernos de Seguridad			216

EQUIPO EN OBRA:

Taladro, Planta electrica, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INFRAROJO MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	14/03/2026.	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI	✓		SI	✓		SI	✓
VEHÍCULOS:	WLY 897		DURACIÓN			NO			NO			NO	

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juan Camilo Restrepo	71795492.			Jose Cortes	1098727131
Ebert Cabrazco	13461111				
Cesar Nieva.	PPT 4350715				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 53 x CL 149	e	S-N.	RETiro Semaforo Vehicular 2 mensula x 01 und.	0730.		170
			RETiro BRAZO de mensula x 01 und.			166
			RETiro Tapa Bornera.			-
			RETiro 09 m. cable 4x18.			173
			Instalación Tapa Bornera.		0900.	
CR 57 x CL 1158	e.	S-N	Demolición de Tapas en concreto de 20cm. x 05 und	1000.		1
			Instalación cable UTP. inicia 223 Termina 305. x 82 metros			110
			Instalación Antena de comunicaciones.			-
Archivo fibra optica			Configuración 02 antenas de comunicaciones.			54
			Limpieza de 05 cajas.			263
			Vaciado de Tapa en concreto de 05 cajas x 20 cm.		1700.	
			Se recogen escombros			

EQUIPO EN OBRA:
Plataforma, herramienta menor, Planta electrica, Martillo demoledor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	14 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI ✓		SI		SI
VEHÍCULOS:	ESD 669		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71.680.675			Jose cortes	1098727137
Alberto oquendo	15.495.477				
JOSE RIOS	PPT 5.240.599				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ cra 54x53	oc	oriOc	se recibio Grupo peatonal apagado cable malo sin continuidad y canalizacion obstruida toca asea sondeo por camaras de EPM y UNE	8.1m	11 1m	261
cra 52x53	or-oc	N-S	se Hizo visita para revisar postes asea canalizacion y cambiar 1 poste y resticar 1 poste	12 Pm	1 Pm	261
✓ cra 53x49	or	S-N	instalacion de 1 poste de mezcla retiro de 1 semaforo vehicular de poste retiro de 1 semaforo peatonal retiro de 1 disco direccional instalacio de 1 semaforo vehicular instalacion de 1 semaforo peatonal 1 disco direccional instalacion de 90 mts de cable de control nuevo 4x18. se hicieron 4 empalmes electricos en semaforos y caja	2 Pm	5 Pm	172 172-179 208 208-220 215 94

EQUIPO EN OBRA:

se realizaron las roscas con machuelo de 4 toscas de Anclaje

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

Plataforma, herramienta menor

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNION TEMPORAL SIT MEDELLÍN · CONSORCIO INT FAROL MED 2025 · PMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 14-05-2026 DIA: jueves VEHÍCULOS:	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE SI ✓ NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI ✓ NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI ✓ NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Amado Cardona	8.414.281	Marco Tulio Hernández	3.483.580	Jose Cortes	1098727131
Hernán Hernández	3.483.721				
Leonel Sánchez	15.257.566				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 43x CL 31	N	N-S	Suministro e Instalación de mezcla asfáltica densa en caliente, espesor 6". = 8,70 m			57
CR 43x CL 33			Suministro e Instalación de mezcla asfáltica densa en caliente, espesor 6". = 22,40m			57
CR 54x CL 53			Suministro e Instalación de mezcla asfáltica densa en caliente, espesor 6". = 2,7 m			57
TV INF x CL 25SUR			Suministro e Instalación de mezcla asfáltica densa en caliente, espesor 6" = 1,40 m			57
CR 27x CL 20SUR			Suministro e Instalación de mezcla asfáltica densa en caliente, espesor 6". = 1,20 m			57

EQUIPO EN OBRA:

Canguro, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	15-05-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
edwin santos	1038810427			Jose cortes	1098727151
simcon vivas					
franklin barbosa					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra49 x cll78	S-E	S-N	demolicion de concreto 50x50 por 20cm de fondo	8:00Am		1
			retiro de 1 platina de poste de mensula			—
			estalacion de 1 poste de platina de mensula de segunda			—
			suministro estalacion de 23 mts de cable 4x18 nuevos del poste asta la caja de 50x50			215
			retiro de 4 cordones de 15cm en tapa de 50x50			187
			Reestalacion de 1 semaforo vehicular a poste			208
			reestalacion de 2 semaforos peatonales a poste			208
			reestalacion de 1 desco direccional a poste			220
			construccion de 3 empalmes electricos a poste			94
			construccion de 3 empalmes electricos en la caja de 50x50			94
			suministro estalacion de 23 mts de cable 4x18 nuevos de la caja al controlador			215
			concretada en platina de poste 50x50 por 20cm de pondo			263
	S-W	W-E	orientacion de 1 semaforo peatonal a poste			258

EQUIPO EN OBRA:

Planta electrica, Martillo demoledor, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 / RDV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 15 mayo	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA: Viernes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaikidos Rusco				Jose cortes	1098727131
Andres Bedoya					
Braian Parado					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CRA 54 Cll 77 D			Pintada y Pintada de 5 Postes	8am		225
BODEGA			Sin Resquebradura De mensula		5 PM	

EQUIPO EN OBRA:

Tapa bocas

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN · CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 · RMY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	15/05/2026.	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Viernes		LLUVIOSO			SI ✓			SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WLY B97		DURACIÓN			NO			NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA

NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juan Restrepo	71295492.		
Eberto cadrasco.	13461111.		
Leonar Riera	PPT. 4350715.		

INTERVENTORÍA

NOMBRE	CÉDULA
Jose ortes	1098727757

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
KR53 x Cll 49	e.	S-N.	Instalacion de 01 Brazo de mensula nuevo.	0900.		203
			Instalacion de 01 semaforo de mensula nuevo suministro SIT	✓		67
			Instalacion de 09m cable 4x18 nuevo suministro SIT.			215
			Construccion 02 empalmes electricos.		1200.	94
KR49 x Cll 48	e.	S-N	Instalacion de 01 Brazo de mensula; de 2da.	1300.		203
			Lavado de 01 Brazo de mensula.			207
			Instalacion de 01 Semaforo de mensula de 2da.			94
			Construccion de 01 empalme electrico.		1600.	
			se realiza la apertura de 02 huecos para Tornillos en la brida			
			Suministro de 08 Tornillos de 5/8" x 2" con doble arandela.			
			Camara Led roja nueva cod 0866.			
			Camara Led Amarilla nueva cod. 0867.			
			Camara Led verde nueva cod 0868.			

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

1/3

CONSORCIO INTEAROLMED 2025 | RAY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	14 y 15/05/2026	TIEMPO	SECO	✓	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves y Viernes		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI /
VEHÍCULOS:	WC2 049		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Luis Fernando Cameron	70708078314			Jose cortes	1098727131
Ennis Torres	1.028. 030.497				
Jorge Luis Rodrigues	PPT 1.137. 342				
Miguel Angel Villegas	1.018. 229. 962				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 45 44 y 46		OR occ	Se hace Sondeo de tubería y Cableado Semaforico	9 Am.		237
Cll			Se hace Arreglos en la tubería Por obstrucciones			
29			Reposicion de 5 Cajas Con sus tapas. Y Con sus tapas de las mismas las			1
			Cajas son de 50 x 50			263
			Construccion de una canalizacion en zona Verde de			28
			6 mt Con un tubo de 2"			
			Se hacen dos apiques en Anden de 50 cm x Por			
			40 cm de Ancho Por 50 cm de Profundidad		5 Pm	
			Se hacen 4 Registros o apiques en zona Verde			
	SP		de un metro Por 60 cm Para Arreglar una			
			obstruccion de 50 cm de Profundidad			
			hay que instalar 8 barras de Anclaje			


EQUIPO EN OBRA:


Pesca. Planta electrica. Martillo demoledor, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

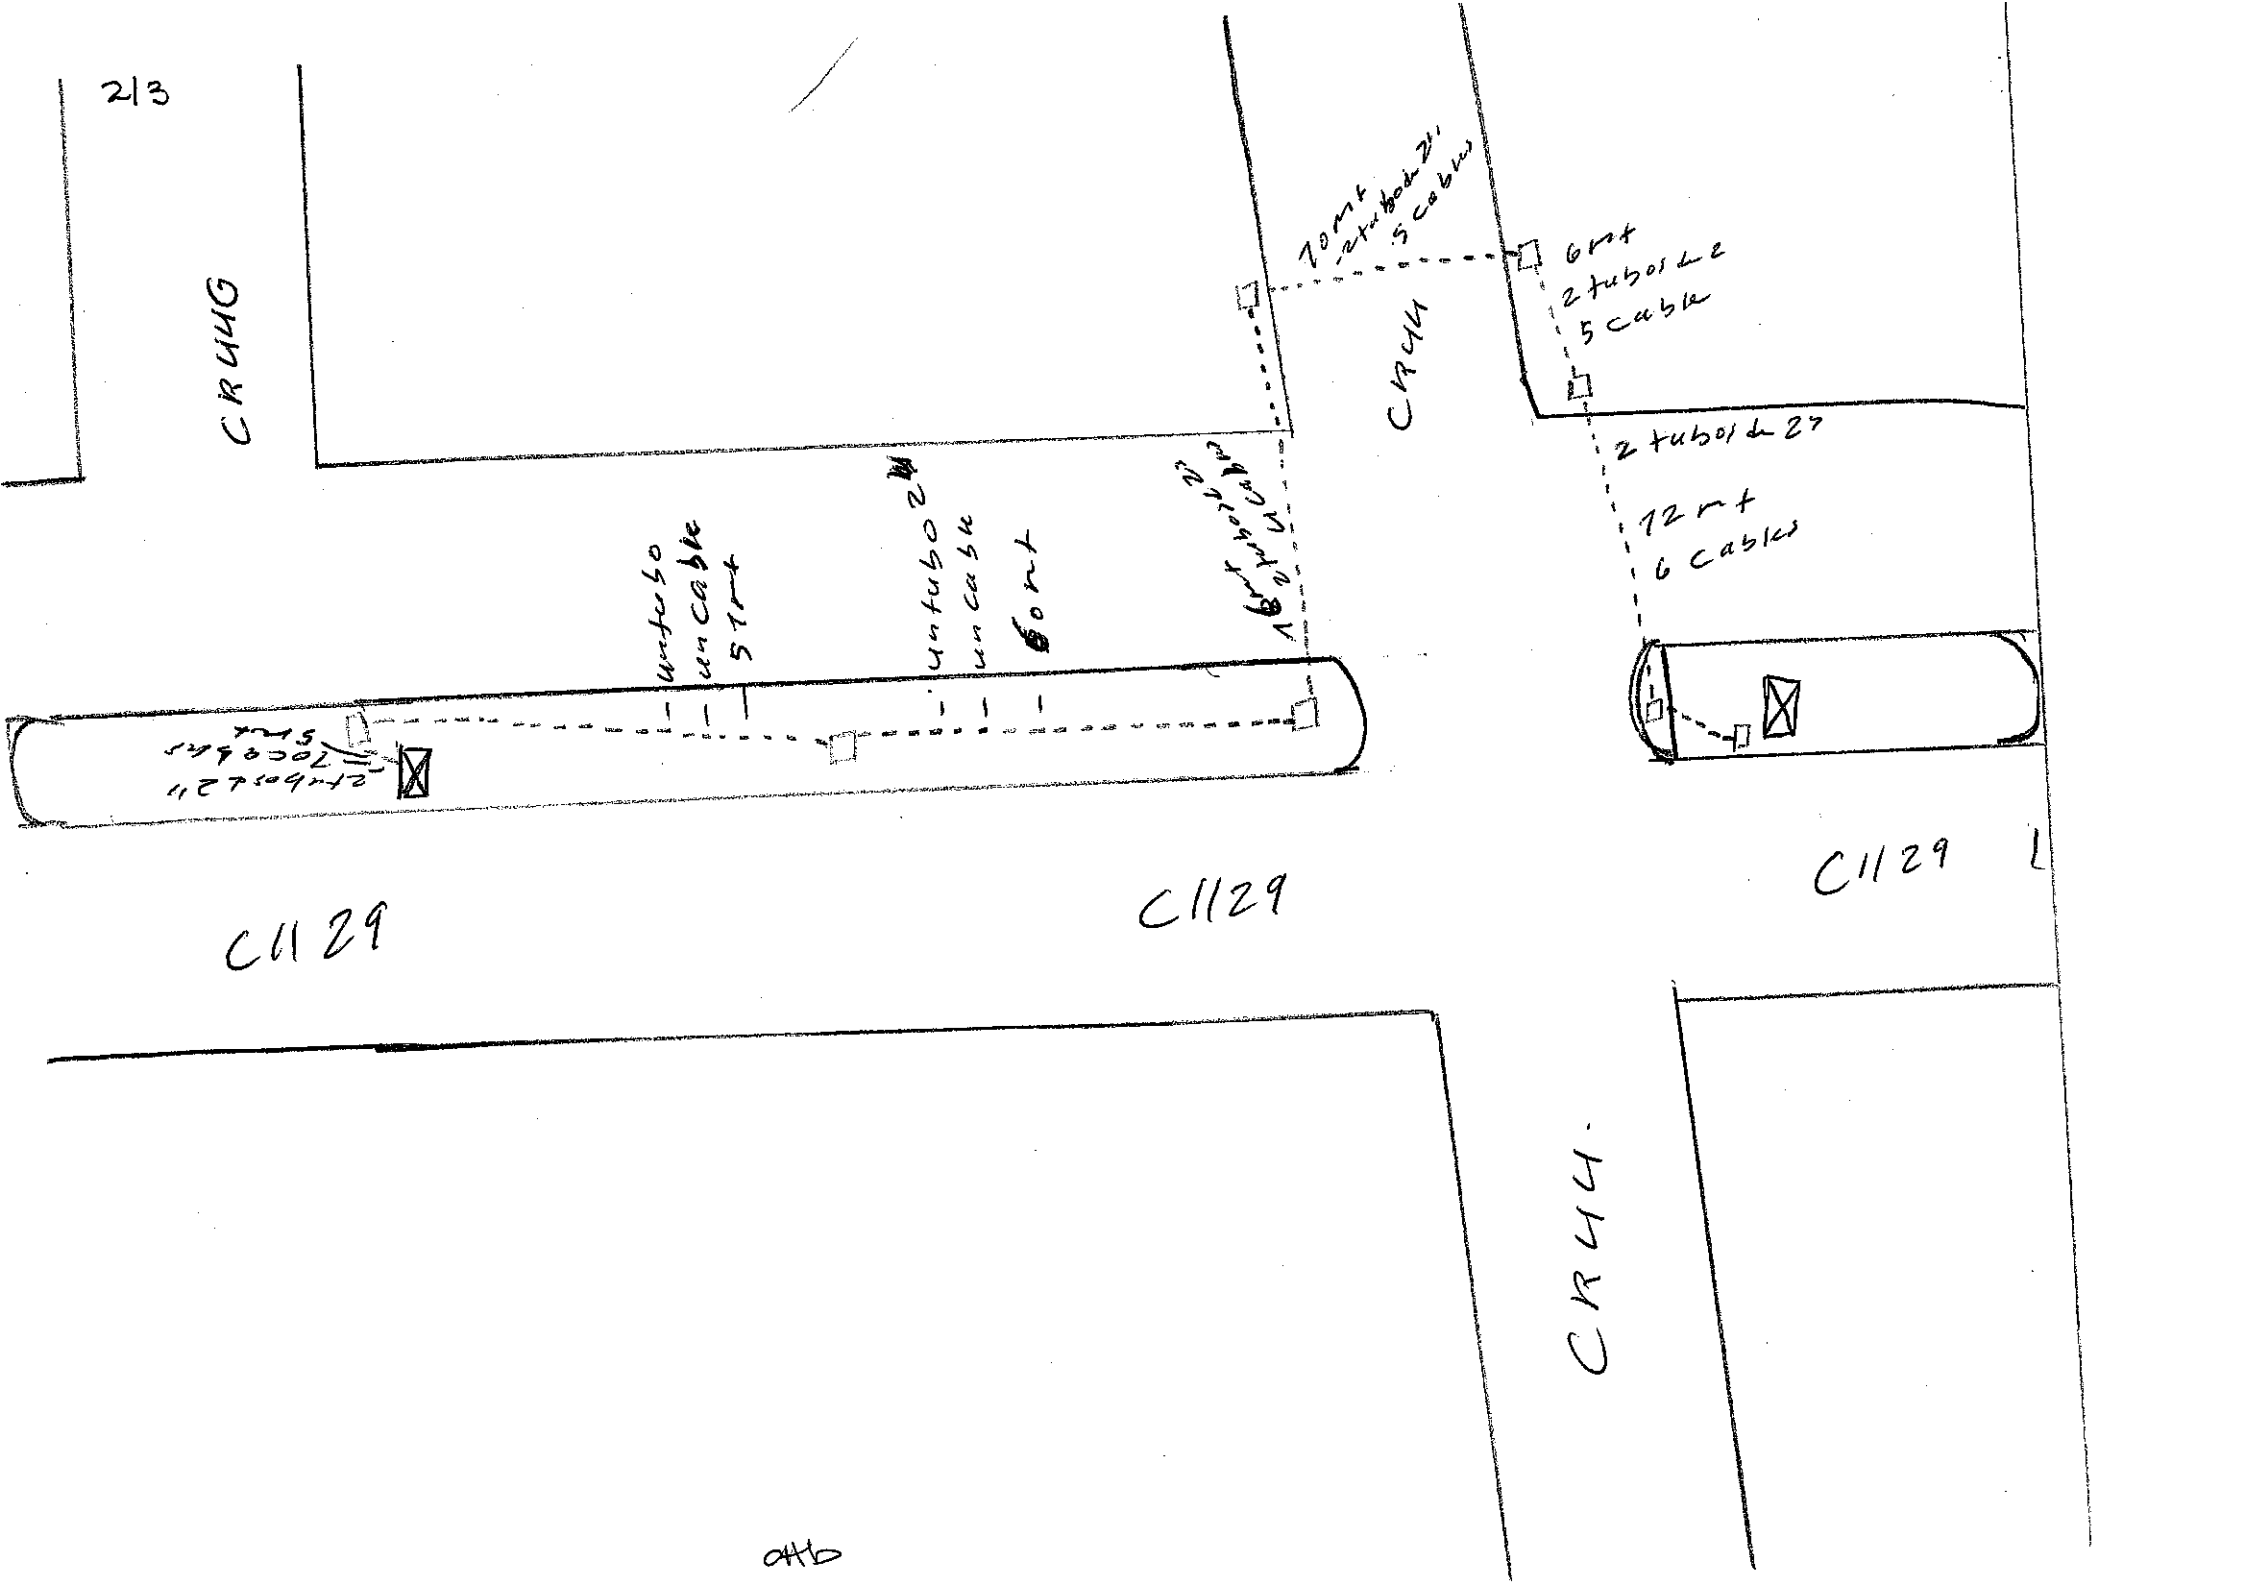
213
CR446
70 mt
2 tubos 2"
5 cables
CR446
6 mt
2 tubos 2
5 cables
2 tubos 2"
72 mt
6 cables
4 tubos 2"
un cable
50 mt
4 tubos 2"
un cable
60 mt
C1129
C1129
C1129
CR446

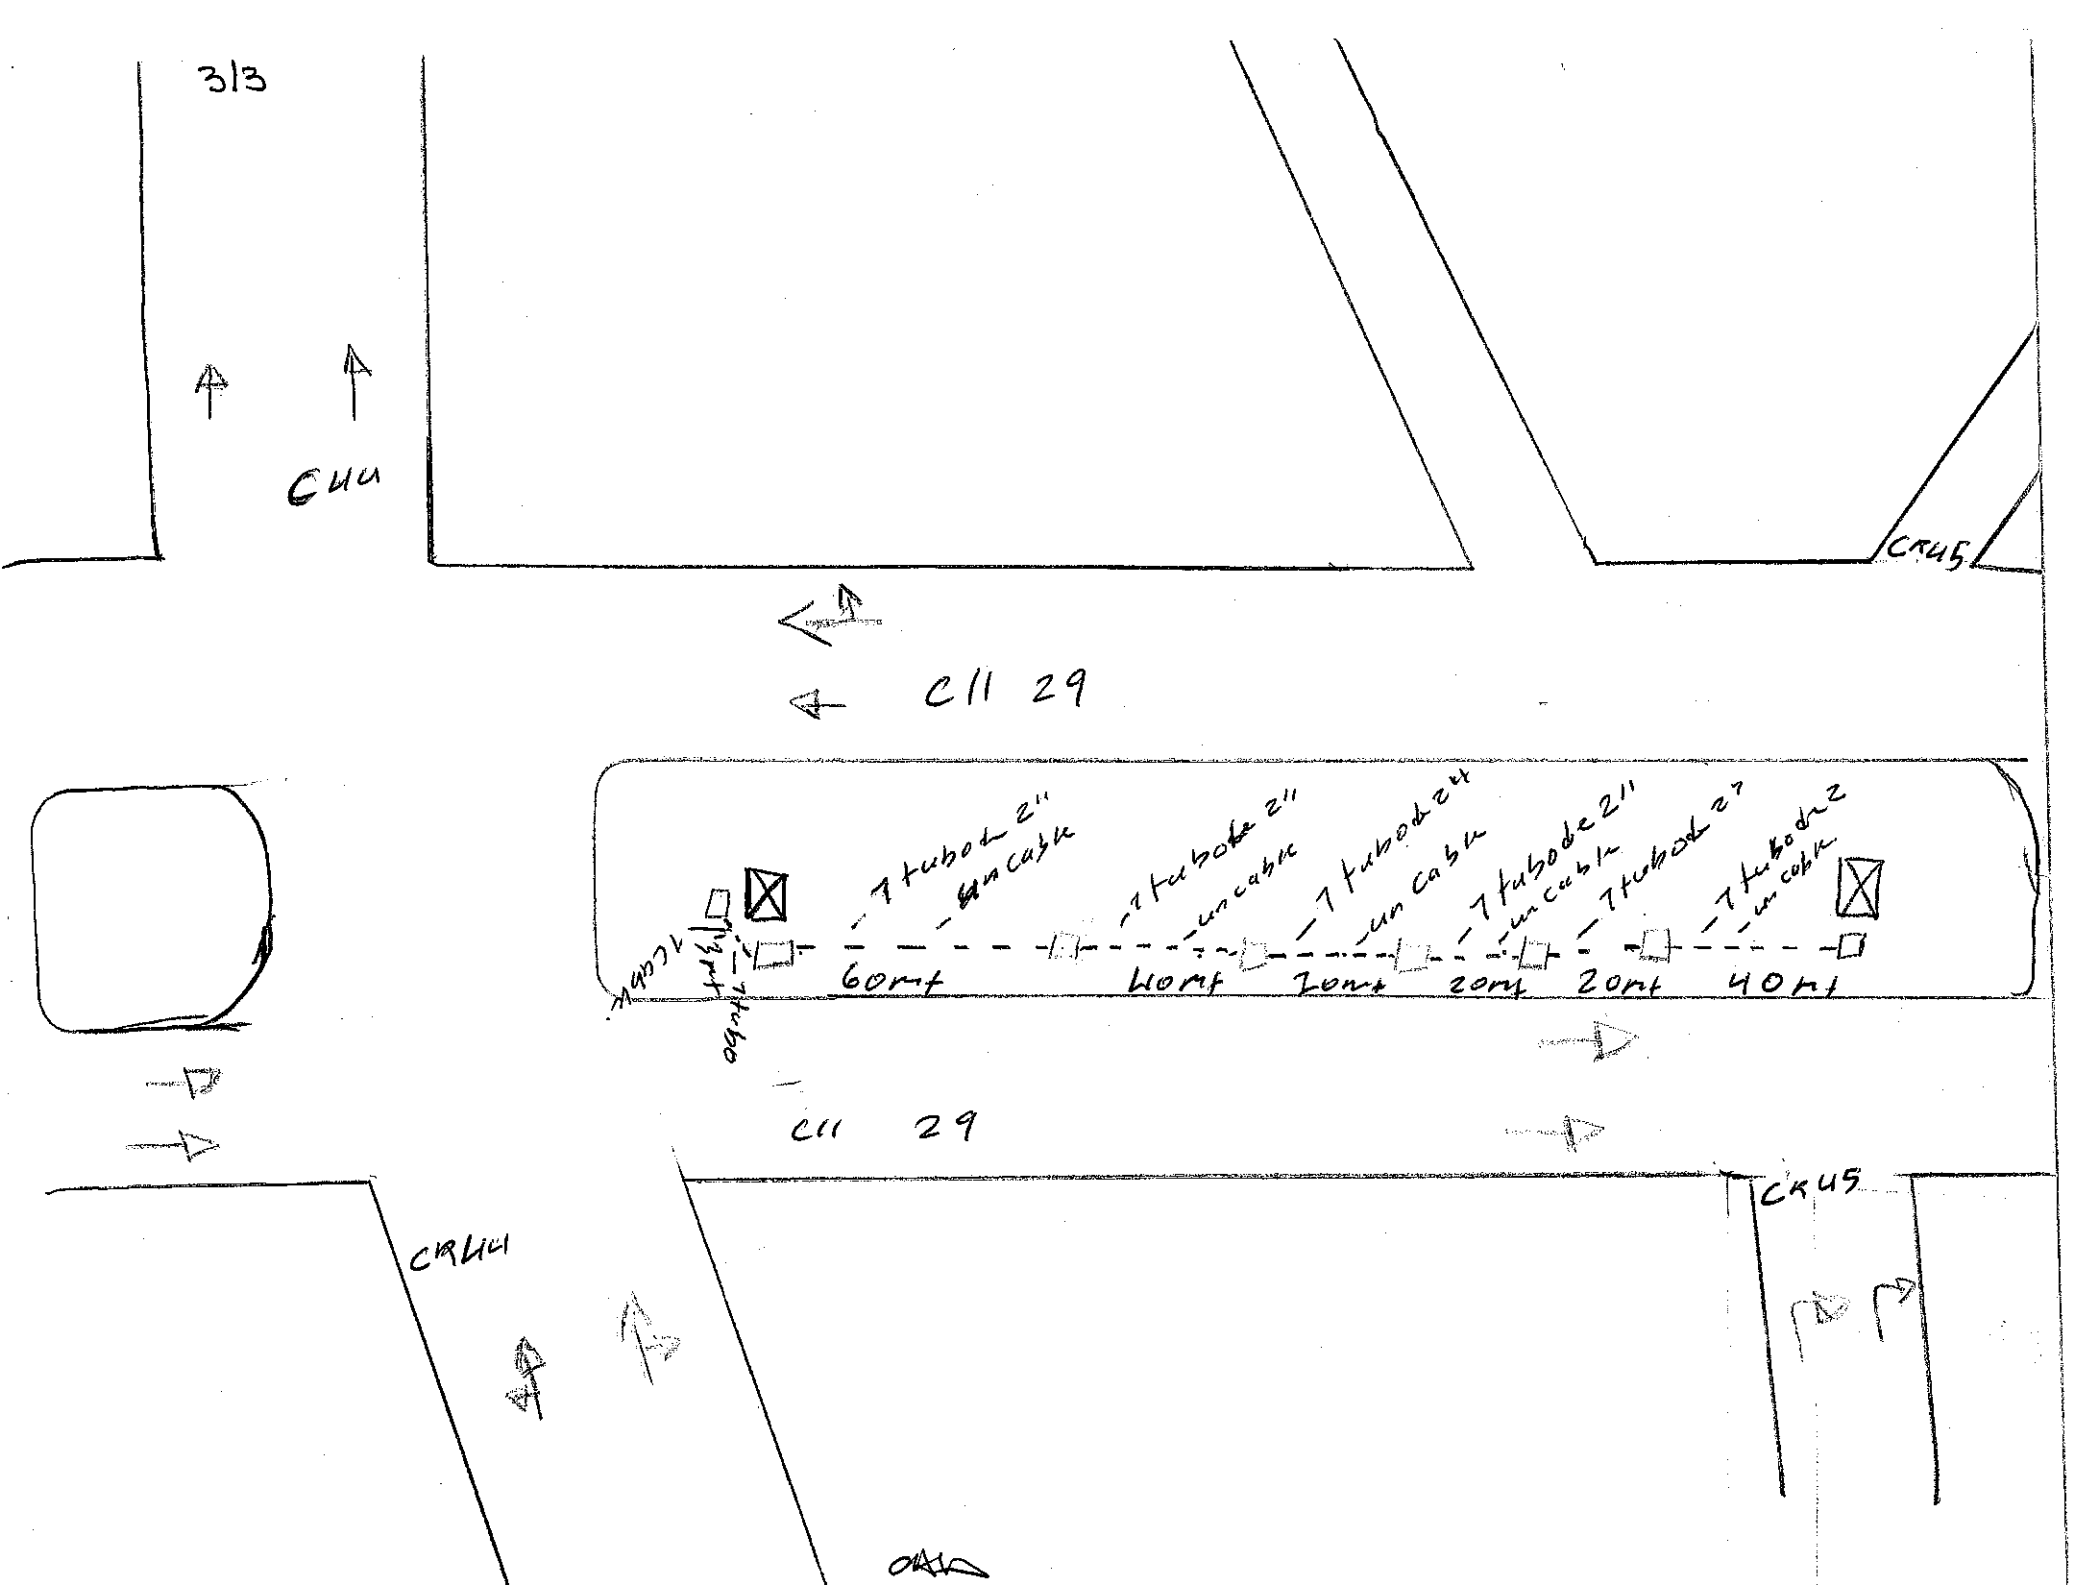
313
CR45
CR45
CR44
1 tubo 2" un cable
60mt
40mt
20mt
20mt
20mt
40mt

Alcaldía de Medellín · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN · CONSORCIO INT.FAROL MED 2025 · RAV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	16 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Sabado		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa	1672a206			Jose Cortes	1098727131
Roa Juan					
Carlos Gonzalez					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 49 Cll 78			Reportan Semaforo Apagados falla grupo 1 y 6	07am		
			Se instala 26 metros de Cable 4X8 en grupo 6			215.
			Se corriyen 2 empalmes en Cajas de paso 50PSD			94.
			Se Sellan 3 cajas de paso de 50PSD.			262

EQUIPO EN OBRA:

Equipo Soldador, Planta electrica, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	16 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Sabado		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Clavijo	71480675			Jose Cortes	1098727191
Alberto Oquendo	15.495.477				
Leo Mar Rojo	PPT 4350.715				
Arteta					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Av 80 x 55	OR	S-N	lavado de 1 brazo de mezcla lavado de 1 poste de mezcla lavado de 1 semaforo de mezcla lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 disco direccional			229-230-235-234-231-236
Av 80 x 65	OR	S-N	lavado de 1 brazo de mezcla lavado de 1 poste de mezcla lavado de 1 semaforo de mezcla lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado 1 disco direccional			229-230-235-234-236
Av 80 x 6 Sur	OR	S-N	lavado de 1 brazo de mezcla lavado de 1 poste de mezcla lavado de 1 semaforo de mezcla lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 disco direccional lavado de 1 disco PEC lavado de 1 pulsador			229-230-235-234-231-236-232

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 · DEV · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	16 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Sabado		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71480675			Jose Cortes	1098727131
Alberto Oquendo	15.495.477				
Leo mar Riera	PPT 4350715				
Anyelo					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ AV 80 x 19 Sur	OC	S-N	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula lavado de 1 semaforo vehicular de menzula lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 disco direccional			229-230-235-234-231-236
✓ AV 80 x 19 Sur	OC	S-N	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 disco direccional			229-230-235-234-231-236
✓ AV 80 x calle FF 8 Sur	OC	S-N	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula lavado de 1 semaforo de menzula lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 disco direccional			229-230-235-234-236
✓ AV 80 x calle FF 8 Sur	OC	OC-OC	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzola lavado de 1 semaforo de menzula lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 disco direccional lavado de 1 Aviso de motos			229-230-235-234-236-233

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 - BMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	16 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Sabado		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71480 675			Jose Cortes	1098777131
Alberto Oquendo	15.485.477				
Leo mar Rieta	PPT 4350715				
Arleto					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
AV 80 x Cra FF 8 Sur	OC	OC-OR	lavado de 1 brazo de menzula, lavado de 1 poste de menzula			229-230
			lavado de 1 semaforo vehicular de menzula lavado de 1			235
			semaforo vehicular de poste lavado de 1 disco direccional			234-236
AV 80 x 12 Sur	OC	N-S	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula			229-230
			lavado de 1 semaforo vehicular de menzula lavado de			235
			1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 semaforo			234-231
			peatonal lavado de 1 disco direccional			236
AV 80 x 12 Sur	OC	OC-OR	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste			229-230
			de menzula lavado de 1 semaforo vehicular de menzula			235
			lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1			234
			semaforo peatonal lavado de 1 disco direccional			231-236
AV 80 x 12 Sur	OC	OC-OC	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de			229-230
			menzula lavado de 1 semaforo vehicular de menzula			235
			lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de			234-236
			1 disco direccional			

EQUIPO EN OBRA:

plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL SIT 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 16 Mayo 2026 DIA: Sabado VEHÍCULOS: WLY 897	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE SI ✓ NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI ✓ NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71.480.675			Jose Cortes	1098727191
Alberto Oquendo	15.495.477				
Leo Mar Rieta Arvelo	PPT 43507715				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Av 80 X 2 Sur	Or	S-N	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula lavado de 1 semaforo de menzula lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 disco PEC lavado de 1 direccional lavado de 1 Pulsador lavado de 1 Aviso motos			229-230 ✓ 235 234 231-236 236-232-233
Av 80 X Cra 76	Or	S-N	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula lavado de 1 semaforo de menzula lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 disco direccional lavado de 1 Aviso de motos			229-230 235 234 236-233

EQUIPO EN OBRA: Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INT FAROLAS 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	17 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	domingo		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WLY 997		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71 480 675			Jose Cortes	1098727131
Alberto oquendo	15.405477				
leo mar Reia	PPT 4350715				
Mayeto					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 52X 67	S	oc.oi	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula lavado de 1 semaforo de menzula lavado de 1 semaforo de menzula lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de semaforo peatonal lavado de 1 disco direccional			229-230 235 234 231-236
cra 52X 64	oc	N.S	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula lavado de 1 semaforo de menzula lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 semaforo ciclista lavado de 1 disco direccional			229-230 235 234-231 231-236
cra 52X 62	oc	N.S	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula lavado de 1 semaforo de menzula lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 semaforo ciclista lavado de 1 disco direccional			229-230 235 234-231 231-236
cra 52X 61	oc	N.S	lavado de 1 brazode menzula lavado de 1 poste de menzula lavado de 1 semaforo de menzula lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 semaforo ciclista lavado de 1 disco direccional			229-230 235 234-231 231-236

EQUIPO EN OBRA: plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Quemy Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	17 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	domingo		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71480 675			Jose Cortes	70987271
Alberto Oquendo	15.405.477				
Leo Mar Rios	PPT 4350715				
Mayelo					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ cra 52X73	OC	N-S	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula			229-230
			lavado de 1 semaforo de menzula lavado de 1 semaforo			235
			vehicular de poste lavado de 1 semaforo peatonal			234-231
			lavado de 1 disco direccional lavado de 2 semaforos ciclistas			236-231
✓ cra 52X70	OC	N-S	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de			229-230
			menzula lavado de 1 semaforo de menzula lavado de			235-234
			1 semaforo peatonal lavado de 1 disco direccional			231-236
✓ cra 52X67	OC	N-S	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de			229-230
			menzula lavado de 1 semaforo de menzula lavado			235
			de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 semaforo			234
			peatonal lavado de 1 disco direccional			231-236
✓ cra 52X67	N	OR-OC	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de			229-230
			menzula lavado de 1 semaforo de menzula lavado de 1			235
			semaforo vehicular de poste lavado de 1 semaforo peatonal			234-231
			lavado de 1 disco direccional			236

EQUIPO EN OBRA:
Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 - RAY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	17 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	domingo		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71680675			Jose cortes	1098727431
Alberto oquendo	15.485.477				
Leo mar Rieta	PPT 4350715				
Angelo					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
V cra 52 x 59	oc	N-S	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula			229-230
			lavado de 1 semaforo de menzula lavado de 1 semaforo			235
			vehicular de poste lavado de 1 semaforo peatonal			234-231
			lavado de 1 disco direccional			236
V cra 55 x 59	S	oc.oc	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste			229-230
			de menzula lavado de 1 semaforo de menzula lavado			235
			de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 semaforo			234
			peatonal lavado de 1 disco direccional			231-236
cra 55 x 59	S.oc	S.N	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula			229-230
			lavado de 1 semaforo de menzula lavado de 1 semaforo			235
			vehicular de poste lavado de 1 semaforo peatonal			234-231
			lavado de 1 disco direccional			236
cra 55 x 59	S.oc	S.N	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste			229-230
			de menzula lavado de 1 semaforo de menzula lavado			235
			de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 disco			234-236

EQUIPO EN OBRA: direccional plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	17. 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WLY 997		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71080795			Jose Cortes	1098727151
Alberto oquendo	15. 495.477				
Leo mal Rea	PPT 4360				
Anyelo					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 55x59	oc	N-S	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula lavado de 1 semaforo de menzula lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 disco direccional			229-230-235-234-231-236
cra 57x58	N	oc-oc	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula lavado de 1 semaforo de menzula lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 disco direccional			229-230-235-234-231-236
cra 57x58	S	oc-oc	lavado de 1 brazo de menzula lavado de 1 poste de menzula lavado de 1 semaforo de menzula lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 disco direccional			229-230-235-234-231-236

EQUIPO EN OBRA: Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INT FAROL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	18 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	LUNES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71.680.675			Jose Cotta	1098721131
Alberto Oquendo	15.485.477				
Angelo					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 55 x 58	oc	N-S	lavado de 2 semaforos vehiculares de manzola lavado de 1 brazo de manzola lavado de 1 poste de manzola lavado de 1 disco direccional			235 ✓ 229-230 ✓ 236 ✓
cra 55 x 58	or	S-N	lavado de 1 brazo de manzola lavado de 1 poste de manzola lavado de 1 semaforo de manzola lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado 1 disco direccional			229-230 ✓ 235 ✓ 234-236 ✓
cra 55 x 58	or	oc-or	lavado de 1 brazo de manzola lavado de 1 poste de manzola lavado de 1 semaforo de manzola lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 disco direccional			229-230 ✓ 235 ✓ 234-236 ✓
cra 55 x 61	or	S-N	lavado de 1 brazo de manzola lavado de 1 poste de manzola lavado de 1 semaforo de manzola lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 disco direccional			229-230 ✓ 235 ✓ 234 ✓ 231-236 ✓

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 | BMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	18 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	lunes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WCY 897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71480675			Jose Soltes	1098722131
Alberto ogando	15.405.477				
Angelo					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 55 x 62	OR	S-N	lavado de 1 brazo de mezcla lavado de 1 poste de mezcla lavado de 1 semaforo de mezcla lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 disco direccional			229-230 235 234 231-236
cra 55 x 62	OR	OROC	lavado de 1 brazo de mezcla lavado de 1 poste de mezcla lavado de 1 semaforo de mezcla lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 disco direccional			229-230 235 234-231 236
cra 55 x 65	OR	S-N	lavado de 1 brazo de mezcla lavado de 1 poste de mezcla lavado de 1 semaforo de mezcla lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 disco direccional			229-230 235 234 231-236
cra 55 x 65	OR	OROC	lavado de 1 brazo de mezcla lavado de 1 poste de mezcla lavado de 1 semaforo de mezcla lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 disco direccional			229-230 235 234 231-236

EQUIPO EN OBRA: Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	18 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	lunes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	WLY 997		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime cifuentes	71480675			Jose Cortes	1098727171
Alberto ocampo	15.495.477				
Mayela					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 55 x 67	OS	S-N	lavado de 1 brazo de mezcla lavado de 1 poste de mezcla lavado de 1 semaforo de mezcla lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 disco direccional			229-230 235 234 231-236
cra 55 x 67	OC	S-N	lavado de 1 brazo de mezcla lavado de 1 poste de mezcla lavado de 1 semaforo de mezcla lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 2 semaforos peatonales lavado de 1 disco direccional			229-230 235 234 231-236
cra 55 x 67	N	OC.OC	lavado de 1 brazo de mezcla lavada de 1 poste de mezcla lavado de 1 semaforo de mezcla lavado de 1 semaforo vehicular de poste lavado de 1 disco direccional			229-230 235 234-236

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INT FAROL MED 2025

PLAN DE CALIDAD

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO

Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025

SIT-SGC-F-001 | VERSIÓN 1 | ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 19-05-2026 DIA: MARTES VEHÍCULOS: TSG 405	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	SI	UNIFORMES	CUMPLE SI ✓ NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI ✓ NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1023810427			Jose Cortes	1098727131
Juan Roa					
Yerson Galeano					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ CRR 53 X CLL 49	S-E	S-N	retiro de 1 poste de mensula de platina corte de 5 pernos con pulidora resane de anden 50 x 30 por 15cm de Fondo de concreto	8:30 Am	11:30 Am	172
✓ CRR 42 X CLL 48	S-W	E-W	Retiro de 1 semaforo peatonal a poste reinstalacion de 1 semaforo peatonal a poste construccion de 1 empalme electrico a poste	1:23 pm	2:00 pm	208 94
✓ CRR 43 X CLL 48	N-E	N-S	retiro de 1 placa de contraste en semaforo vehicular a poste orientacion de 1 semaforo vehicular a poste	2:04 pm	2:20 pm	199 258
✓ AV 80 X CLL 32	S-E	E-W	se encuentra lampara amarilla vehicular suelta a poste Ajuste de lampara amarilla vehicular en semaforo vehicular a poste	3:00 pm	3:20 pm	218

EQUIPO EN OBRA: Pulidora, escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / RAV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	19-05-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:			LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
				Jose Cortes	1093727131

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Rios			Suministro de tapa y marco de seguridad en hierro ductil de 60x60 = 14 Und.			17

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	19 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:	859 669.		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Calderas	71 480 675			Jose Cortes	1098727131
Alberto Oquendo	16.485 477				
Jose Peres	PPT 6 240.599				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ Cra 57 X 58	OC	N-S	retiro de 2 semaforo peatonales retiro de 8	10 AM	4 PM	172
			metros de cable de control 4x16			173
			de moliccion en concreto .80 mts x .50 mts anden			1
			el poste estaba enterrado			
			retiro de 1 poste de platina			169
			instalacion de 1 poste de platina			205
			reinstalacion de 8 mts de cable de control 4x16			215
			reinstalacion de 2 semaforo peatonales			208
			se hicieron 2 empalmes electricos en semaforos			94
			se hizo resanado en anden .80 mts x .50 mts			263

EQUIPO EN OBRA:

Planta electrica, Martillo demoledor, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

1/2

6

CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 — UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN — RDY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	19/05/2026.	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juan Restrepo	71249497			Jose Cortes	1098727931
Leonar Rios	RPT 4350715.				
Eberto Cardozo.	13461111				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 25 x Cll 3	W.	S-N.	Revisión de luces en intersección, semaforo peatonal	0930		261
			S-N. W golpeado necesita cambio.		0945	
CR 25 x Cll 10.	S.	W-E.	retiro de luces Led china 3. verde Ambar Rojo.	1000.		196
			Instalacion Lamparas Led de 2da Ledtek Verde Ambar Rojo.		1030.	279
			Empalme eléctrico. En ménsula.			94
CR 43 x Cll 31	W.	N-S.	retiro semaforo de mensula x 01 und.	1100.		190
			retiro Brazo de mensula. x 01 und			166
			retiro semaforo peatonal x 01 und			172
			retiro poste de mensula. x 01 und.			
			retiro cable 4x18 x 13 metros.			173
			Instalacion poste de platina del distrito. x 01 und.			205
			Instalación semaforo peatonal x 01 und			208
			Instalación cable 4x18 x 4 metros.		1300.	215
			Empalme eléctrico = 1 un			94

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arco, cel. 089

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

2/2

CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 / UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	19/05/2026.	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897.		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juan Restrepo.	71295492.			Jose Ortes	1098727731
Jhonnar Riera.	PPT 4350715.				
Eberto Cadrazco.	13461111.				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 45 x CL 67	E.	S-N.	retiro deleces Led china 3 verde Ambar Rojo.	1400.		196
			Instalacion Lamparas Led de 2da Ledtek Verde Ambar Rojo.		1500.	219
			Construcción de empalme			94
CR 44 x CL 73.	S.	W-E	retiro semaforo vehicular 2 mensula. modo x01 und.	1520.		170
			Instalación semaforo vehicular 2mensula de 2da x01 und		1800.	207
			Construcción de empalme			94

EQUIPO EN OBRA:

Escalera ayoes, estroga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria

CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 19/05/2026 DIA: Martes. VEHÍCULOS: WC2049	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE SI ✓ NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Luis Fernando Cosme B	7.070.904.034			Jose Cortes	1098427137
Evanis Torres	1.028.030.487				
Jorge Luis Rodrigues	PPT 1.137.342				
Miguel Angel Villegas	1.018.229.962				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR54CL130A	Sur	OR COR	Construcción de una canalización en Paramento de 2.4 x 2 tubos de 3"	8 70	1. Pm	19
CR52 CL130A	Sur	OR	Desoldada de una tapa doble y soldada de la misma	2 Pm	3 20	183 262
			Desoldada de dos Cajas de 50x50 y soldada de las mismas.			183 262

EQUIPO EN OBRA:

Equipo soldador, planta electrica.

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INT. FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 09 Mayo DIA: Martes VEHÍCULOS:	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE SI NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Alcides Rios co				Jonathan Rondon 6	1036962270
Stiven palacio					
Brayan Aulicio					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 45 Cll 67			Construccion Canalizacion zona verde 21 metros 2 tubos de 2"	6 am	5 pm	25

EQUIPO EN OBRA: Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

Se verifica señalización y EPP.

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 / RAY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	20-05-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIERCOLES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	TSG405		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038810427			Junathan Rendón	1036962270
Yerson Galvano					
Juan Ruiz					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ cra 54 x cll 52	N-W	W-E	orientación de 1 semaforo peatonal a poste	8:29 Am	8:34 Am	258
✓ cra 50 x cll 48	S-E	S-N	orientación de 1 semaforo peatonal a poste	9:00 Am	9:15 Am	258
✓ cra 70 x cll 9	N-W	N-S	demolición de tapa concretada de 50x50 en zona verde	10:30 Am		1
			retiro de 4 cordones de 15cm en tapa de 50x50			183
			retiro de 4 cordones de 15cm en tapa de 50x50			183
			concretada de tapa de 50x50 en zona verde		1:26 pm	263
✓ cra 52 x cll 62 y 64	N-E	N-S	suministro istalacion de 4 mts de cinta vandi en el	2:46 pm		104
			cuarinete		3:00 pm	
✓ cra 39 x cll 49	N-E	S-N	retiro de 1 semaforo peatonal a poste del tranvia que	4:00 pm		192
			se encontraba colgando en el poste		4:15 pm	

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTEGRAL MED 2026 · UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN · REY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 20-14/5/2026 DIA: Martes - Miercoles VEHÍCULOS:	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE SI ✓ NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI ✓ NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI ✓ NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Balbosa		Jose Arcidde		Jonathan Rendon	1036962270
Christian Balbosa					
Simeon Uvas					
Christian Mena					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
C. 55 x C1 52a		N S > W E	Se procede a abrir 20 cajas de paso 4 con llave			183
			3 cajas de tapa de concreto 16 cajas soldadas			215
			Se instalan 300m de cable 4X18			173
			Se retiran 228m de cable 4X18			195-48
			Se cambian 2 modulos (1 rojo y 1 verde) peatonal del flujo 9			94
			Se realizan 8 empalmes (6 flujo 9 y 10) (2 flujo 4)			262-263
			Se soldo 16 tapas se concretan 3 tapas			1
C. 53 x C1 54			Se demuelen 4 tapas de concreto 60X80			263
			Se concretan 5 tapas			
			Se realiza correccion de acometida electrica mal empalmada			94
			Se realiza 2 empalmes de flujo 4 (se deja precableado f-1-4-5-6)			262
C. 70 x C1 9		N S	Se soldan 2 tapas			262
C. 69b x C1 70		S N	Se soldan 2 tapas			

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor, soldadora, pulidora, soldadora portatil

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 / EPM	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	20 de Mayo	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Estiven Palacio				Jonathan Rendon	1036902270
Alcidel Rasgo					
Brayan Palacio					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 34 Cll 10			Instalación de Gabinete	8 AM		216
			Instalación de 10 Pernos de seguridad			
Cra 52 Cll 29B			Instalación de Gabinete			216
			Instalación de 10 Pernos de seguridad			
Cra 70 Cll 47D			Demolición de base controladora de semaforo		4 PM	2

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	20-05-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE		ESCOMBROS	CUMPLE	
DIA:	Miércoles		LLUVIOSO			SI	✓		SI	✓		SI	
VEHÍCULOS:	IKN 741		DURACIÓN			NO			NO			NO	

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santos	1035[illegible]6300			Jonathan Rendon	1036962270
Yeison Cañas	1035861703				
Leomar Riera	PPT4350715				
Luis Usuga	71708197				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
						237
CRA 43A Cl 4Sur - 6 Sur			Sondeo y levantamiento Instalación de 225mts de cableado de segnda			
						237
Cra 43A calle 6Sur - 7Sur			Sondeo y levantamiento Instalación de			


EQUIPO EN OBRA:


Mobiliario menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

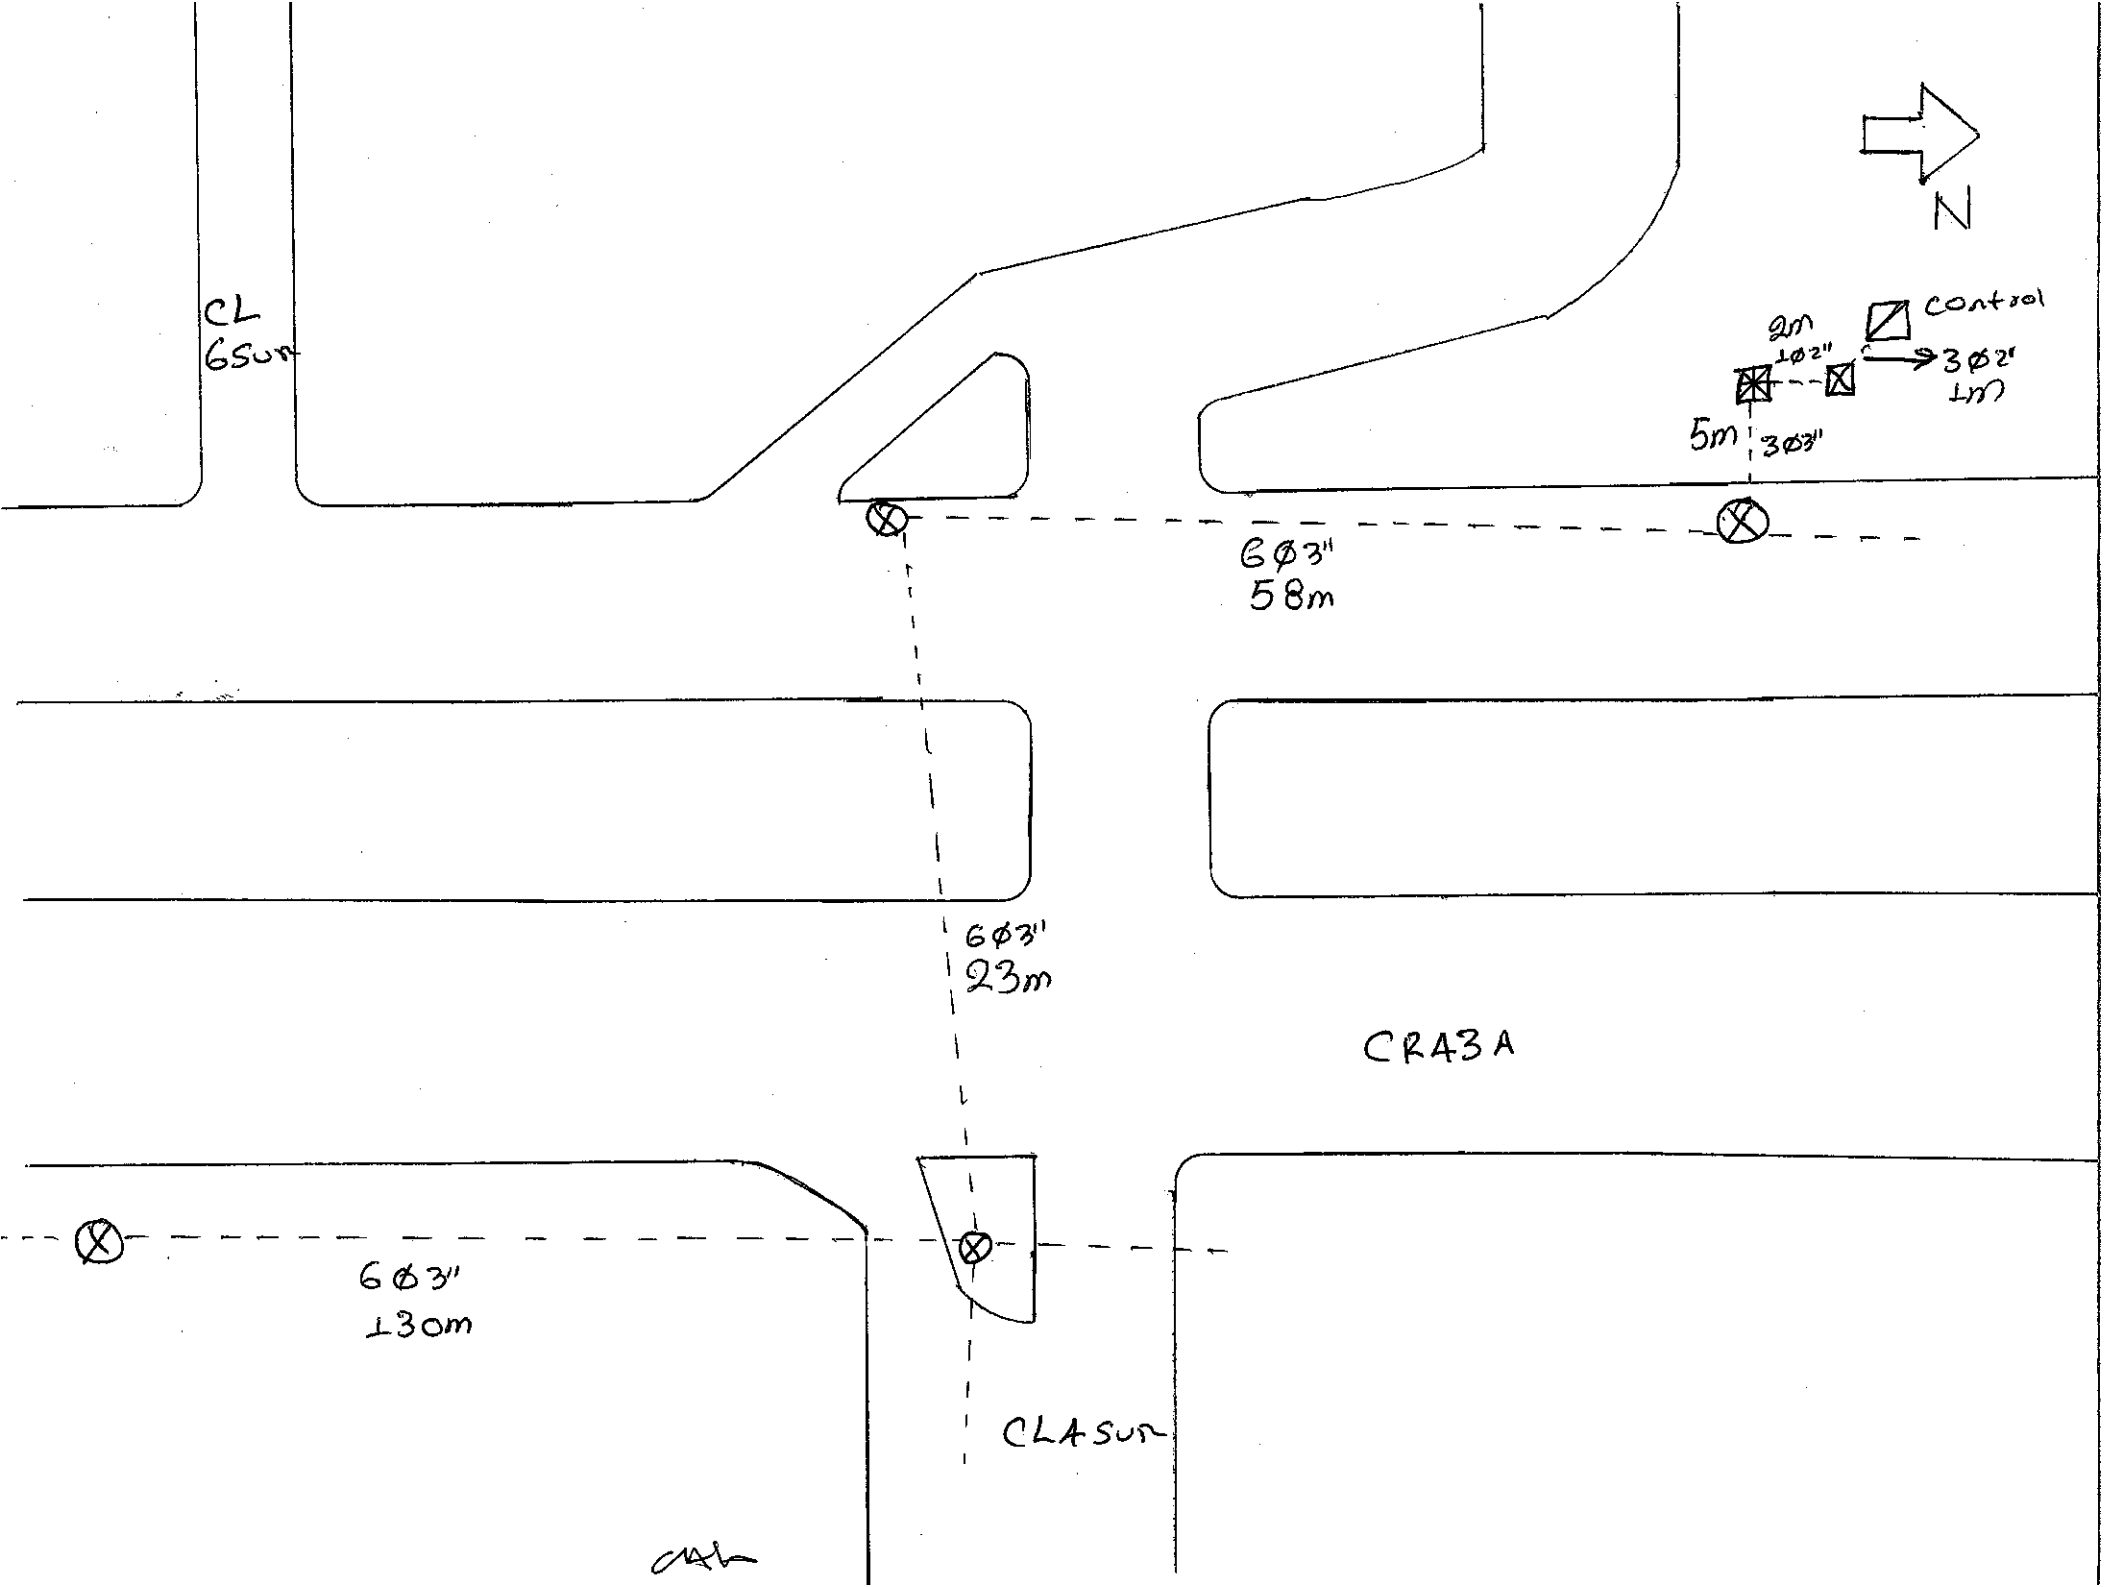
N
CL
6SUR
2m
1Ø2"
control
3Ø2"
1m
5m
3Ø3"
6Ø3"
58m
6Ø3"
23m
CR43A
6Ø3"
130m
CL4SUR

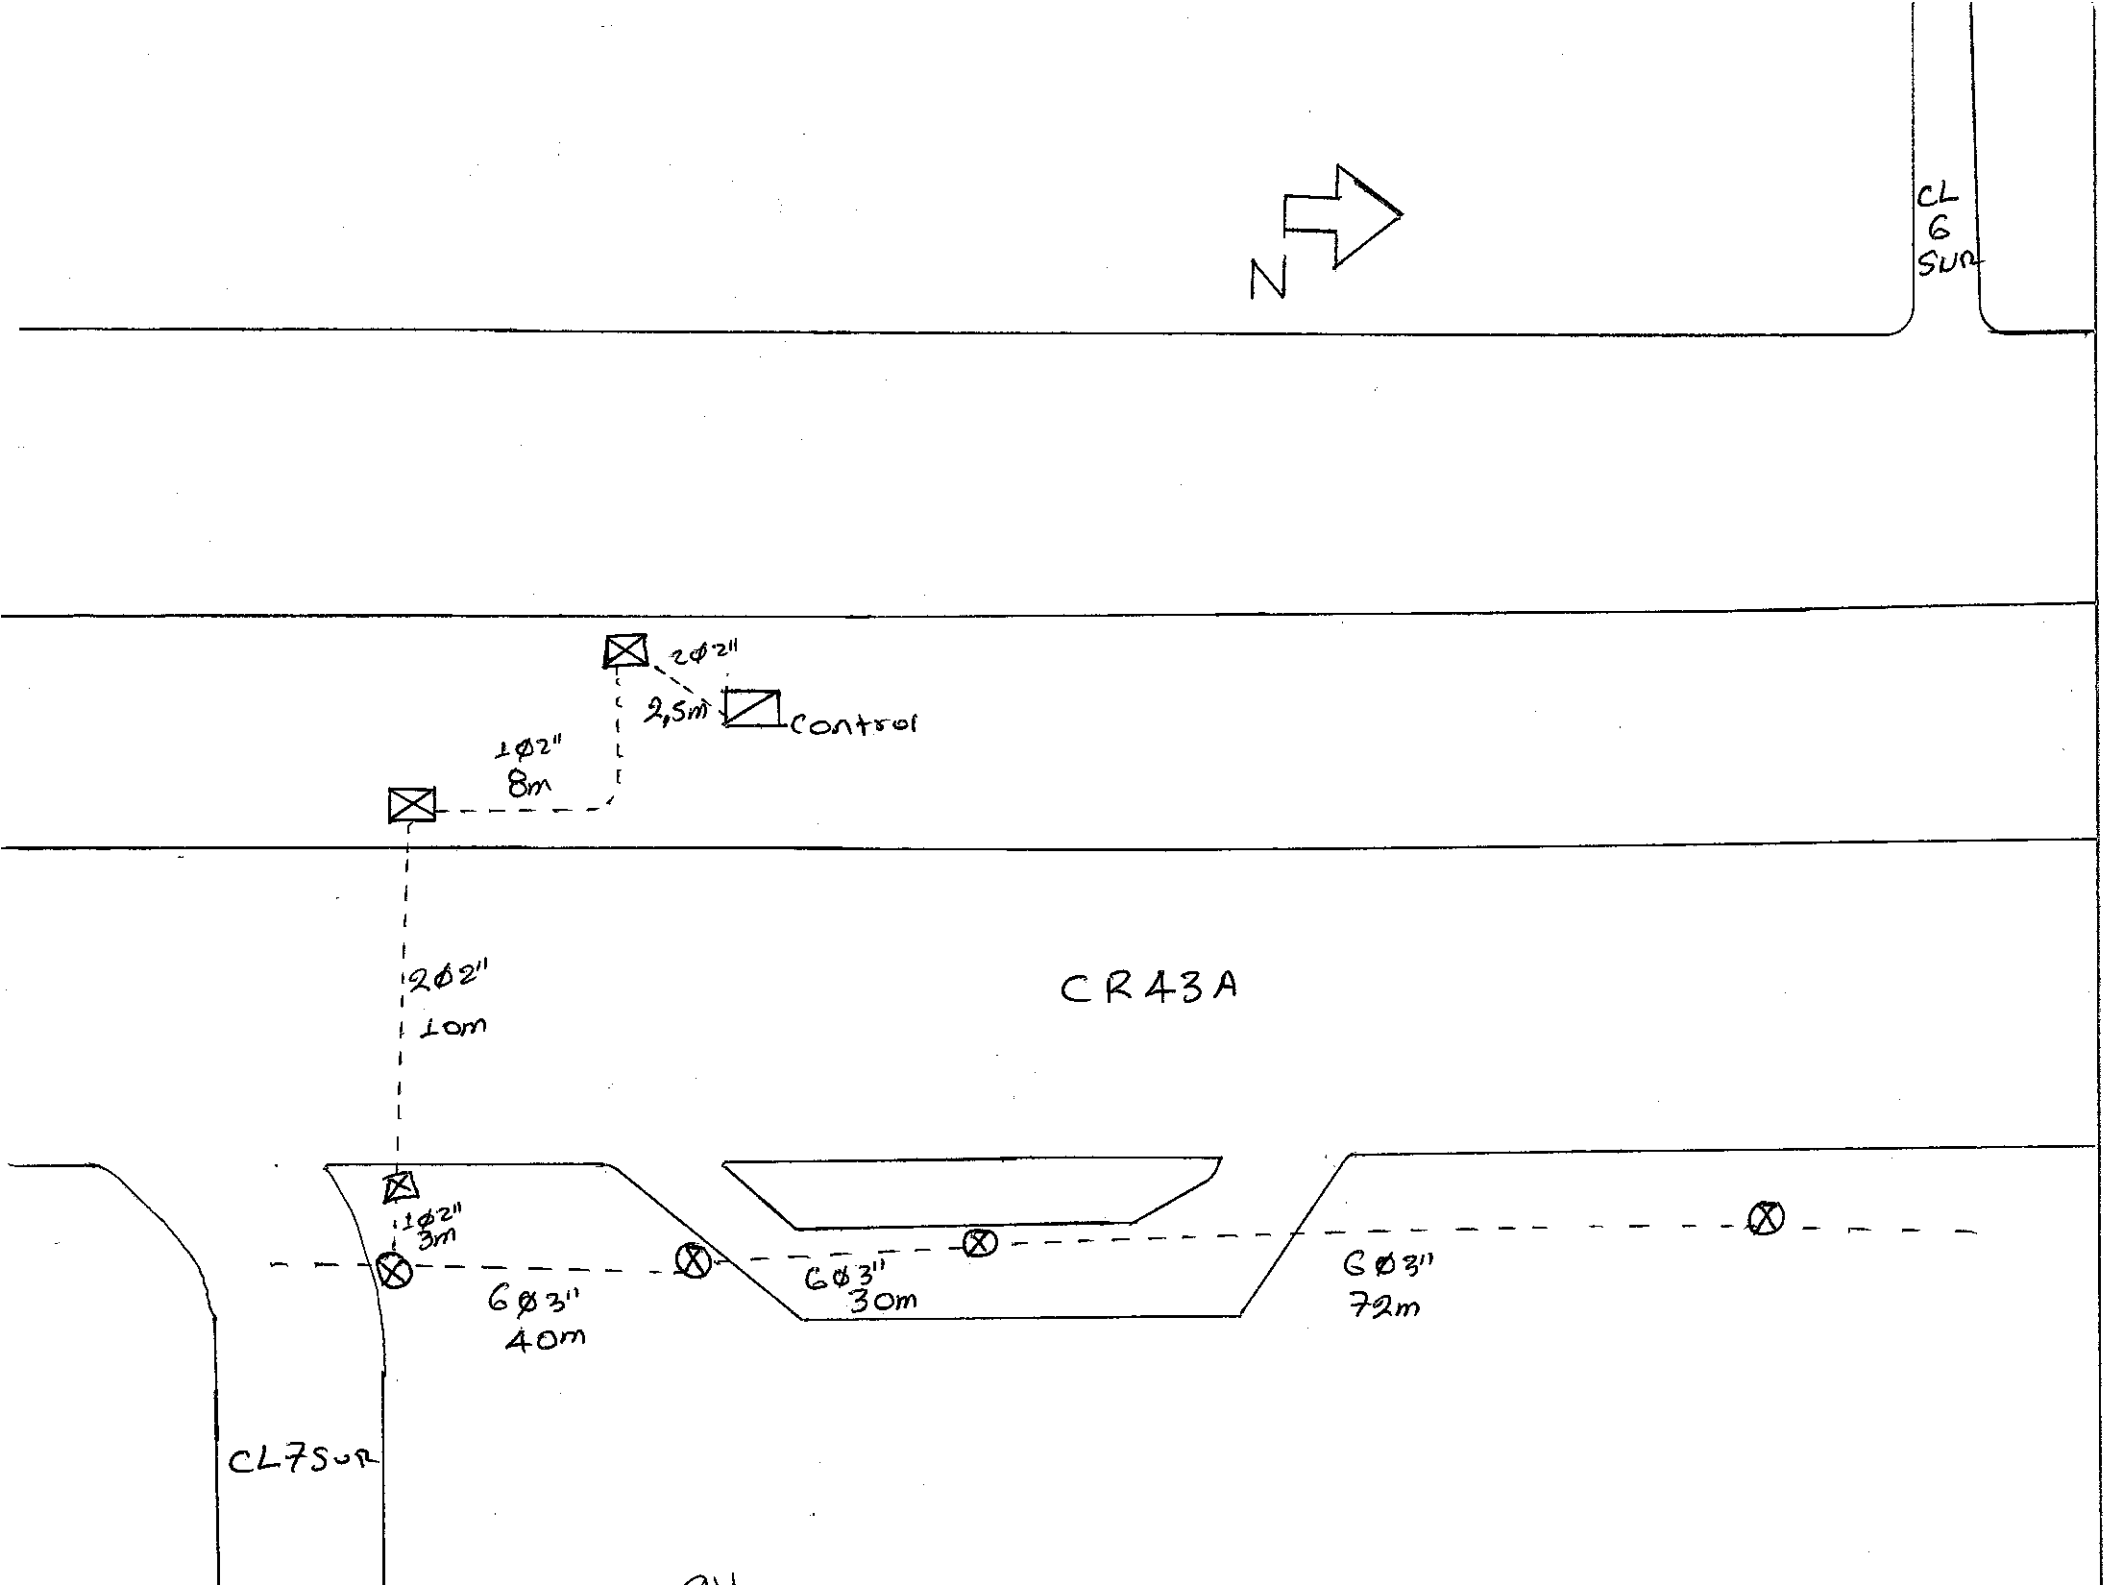
N
CL 6 SUR
2Ø2"
2,5m
Control
1Ø2"
8m
2Ø2"
10m
CR43A
1Ø2"
3m
6Ø3"
40m
6Ø3"
30m
6Ø3"
72m
CL7SUR

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · Unión Temporal SIT Medellín · Consorcio Interventor MED 2025 · RMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	20/03/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	WCY 897.		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juan Camilo Restrepo	71295447.			Jonathan Rendon	1036960270
Van Carlos Usuga	1346111				
Eberto Cadrazco.	1214729941				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR48 #CII 7	e.	S-N.	Revisión intersección con problemas	1600	1630.	261
			Se reporta semáforo sin vicera pero no se encuentra novedad			

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INT FAROL MED 2025 · UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN · Alcaldía de Medellín	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	21-05-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	TSG405		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038810427			Jonathan Fandiño	1036962270
Yerson Galeano					
Juan Roa					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ cra 70 x cll 43	N-E	N-S	retiro de 1 lampara roja peatonal en mal estado a poste	9:00Am		195
			estalacion de 1 lampara roja peatonal de segunda a poste			218
			construccion de 1 empalme electrico a poste			94
			suministro estalacion de 2 fuentes nuevas en la caja de 50x50			
			construccion de 4 empalmes electricos en la caja de 50x50			94
	S-E	N-S	suministro estalacion de 1 fuente nueva en la caja de 50x50			—
			suministro estalacion de 7 mts de cable 4x18 nuevos			215
			retiro de 7 mts de cable 4x18 en corto en la tuberia			173
			retiro de 1 semaforo de piso			—
			reestalacion de 1 semaforo de piso			—
			construccion de 1 empalme en el semaforo de piso			94
			construccion de 2 empalmes electricos en la caja de 50x50			94
	S-W	W-E	retiro de 1 lampara verde peatonal en mal estado a poste			195
			estalacion de 1 lampara verde peatonal de segunda a poste			218
			construccion de 1 empalme electrico a poste		2:30pm	94

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · Unión Temporal SIT Medellín · Consorcio Int Farol Med 2025 · RAV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	21-05-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	TSG405		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038810427		
Yerson Galeano			
Juan Ruiz			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ cra 70 x cll 43	S-W	W-E	suministro istalacion de 2 fuentes nuevas en la caja de 50x50 construccion de 4 empalmes electricos en la caja de 50x50	9:00AM		94
	N-W	W-E	suministro istalacion de 1 fuente nueva en la caja de 50x50 construccion de 2 empalmes electricos en la caja de 50x50			94
	N-W	N-S	suministro istalacion de 1 fuente nueva en la caja de 50x50 construccion de 2 empalme electrico en la caja de 50x50		2:30Pm	94
✓ cra 54 x cll 52	N-E	N-S	retiro de 1 semaforo vehicular en mal estado a poste istalacion de 1 semaforo vehicular de segunda en buen estado a poste. construccion de 1 empalme electrico a poste	3:06pm	4:00Pm	172 208 94

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA CAD	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN · CONSORCIO INTEPAROL MED 2025 · RMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No: 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	21/5/26	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	DXT 928		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Christian Barbosa				Jonathan Rendón	1036902790
Simeon Jiraut					
Jose Andrade					

	DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓	C. 52 x C 130a	S	W E	Se realiza repudinentacion de 1.20 por 50 cm con asfalto en frio y se utiliza para	8.00		21
✓	C. 55 x C 44	N	W E	Se realiza horizontacion de cerrapaso vehicular			25B
		S	W E	Se realiza horizontacion de cerrapaso peatonal			25B
		E	N S	Se realiza horizontacion de cerrapaso peatonal			25B
	C. 54 x C 46	W	N S	Se realiza horizontacion de cerrapaso peatonal			25B
		S	W E	Se realiza horizontacion de cerrapaso peatonal		5:00	25B

EQUIPO EN OBRA: Herramienta menor, cono, planta electrica

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	22/05/2026.	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	WLV 897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jean Refuerzo	7329549[illegible].			Jonathan Londoño	1036962270
Eberto Cadavco.	1346 1111.				
Leonar Rivera	PPT 4350715.				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 32 x CL 110.	W.	N-S.	Retiro de semáforo de mensula 01 und	0730.		170
Tramo intervenir.			Retiro de semaforo vehicular 01 und.			172
			Retiro de semaforo peatonal 01 und.			172
			Retiro de camara sensor. 01 und.			
			Retiro de disco pep. 01 und			179
			Retiro pulsador. 01 und.			177
			Retiro cable 4x16. 19m.			173
			Instalación de mensula. 01 und de segunda			203
			Retiro de mensula 01 und.			166
			Instalacion semaforo de mensula. 01 und			207
			Instalacion semaforo Vehicular. 01 und			208
			Instalacion semaforo peatonal. 01 und.			208
			Instalacion camara sensor. 01 und.			
			Instalacion cable 4x16 19m			215
			Retiro de disco direccional			179
			Instalación de disco direccional			220
			Construccion 04 empalmes electricos		1600.	94 - 230
			lavado semaforo vehicular 2 y lavado semaforo peatonal y ménsula			234-231

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma, Herramientamenor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	21/05/2026.	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897.		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juan Restrepo	71791497			Jonathan Londoño	1036960770
Eberto Cadrezco.	1346111.				
Leonar Rivera.	PPT 4350715.				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
45x cll 66.	S.	W-E	retiro de luces Tipo china 3. Roja verde Ambar en mensula	1630.		195.
			Instalacion de luces Ledtek de 200 Roja verde Ambar en mensula.			218
			Construccion empalme electrico x 01 und.		1730.	94
Carrera 41 x Calle 57	W	N-S	Enderezada de semaforo vehicular a mensula	7:15	7:20	257
CR32 x cll 10 Transv. Inf	W	N-S	Suministro de 4 tornillos con tuerca y arandela de 3/8 x 2"			—

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

1/2

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	21-05-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI ✓		SI		SI
VEHÍCULOS:	IKN 741		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santur	1038806300			Jonathan Rendón	1036962790
Luis Usuga	71708192				
Yeison Conde					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR51C36			Sondeo y levantamiento			237
			instalación de 10 mts de canaleta de seguridad			
	S-E.		Retiro de 3 cordones a 3 tapas 50x50			183
			- 12 cordones			
			Soldadura de 12 cordones a 3 tapas 50x50			262
			Separador Central Sur - Retiro de 4 cordones a 1 tapa 50x50			183
			Separador Central Norte. Retiro de 4 cordones de soldadura en 1 tapa 50x50			183
			Soldadura de 4 cordones 50x20 1 tapa			262


EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

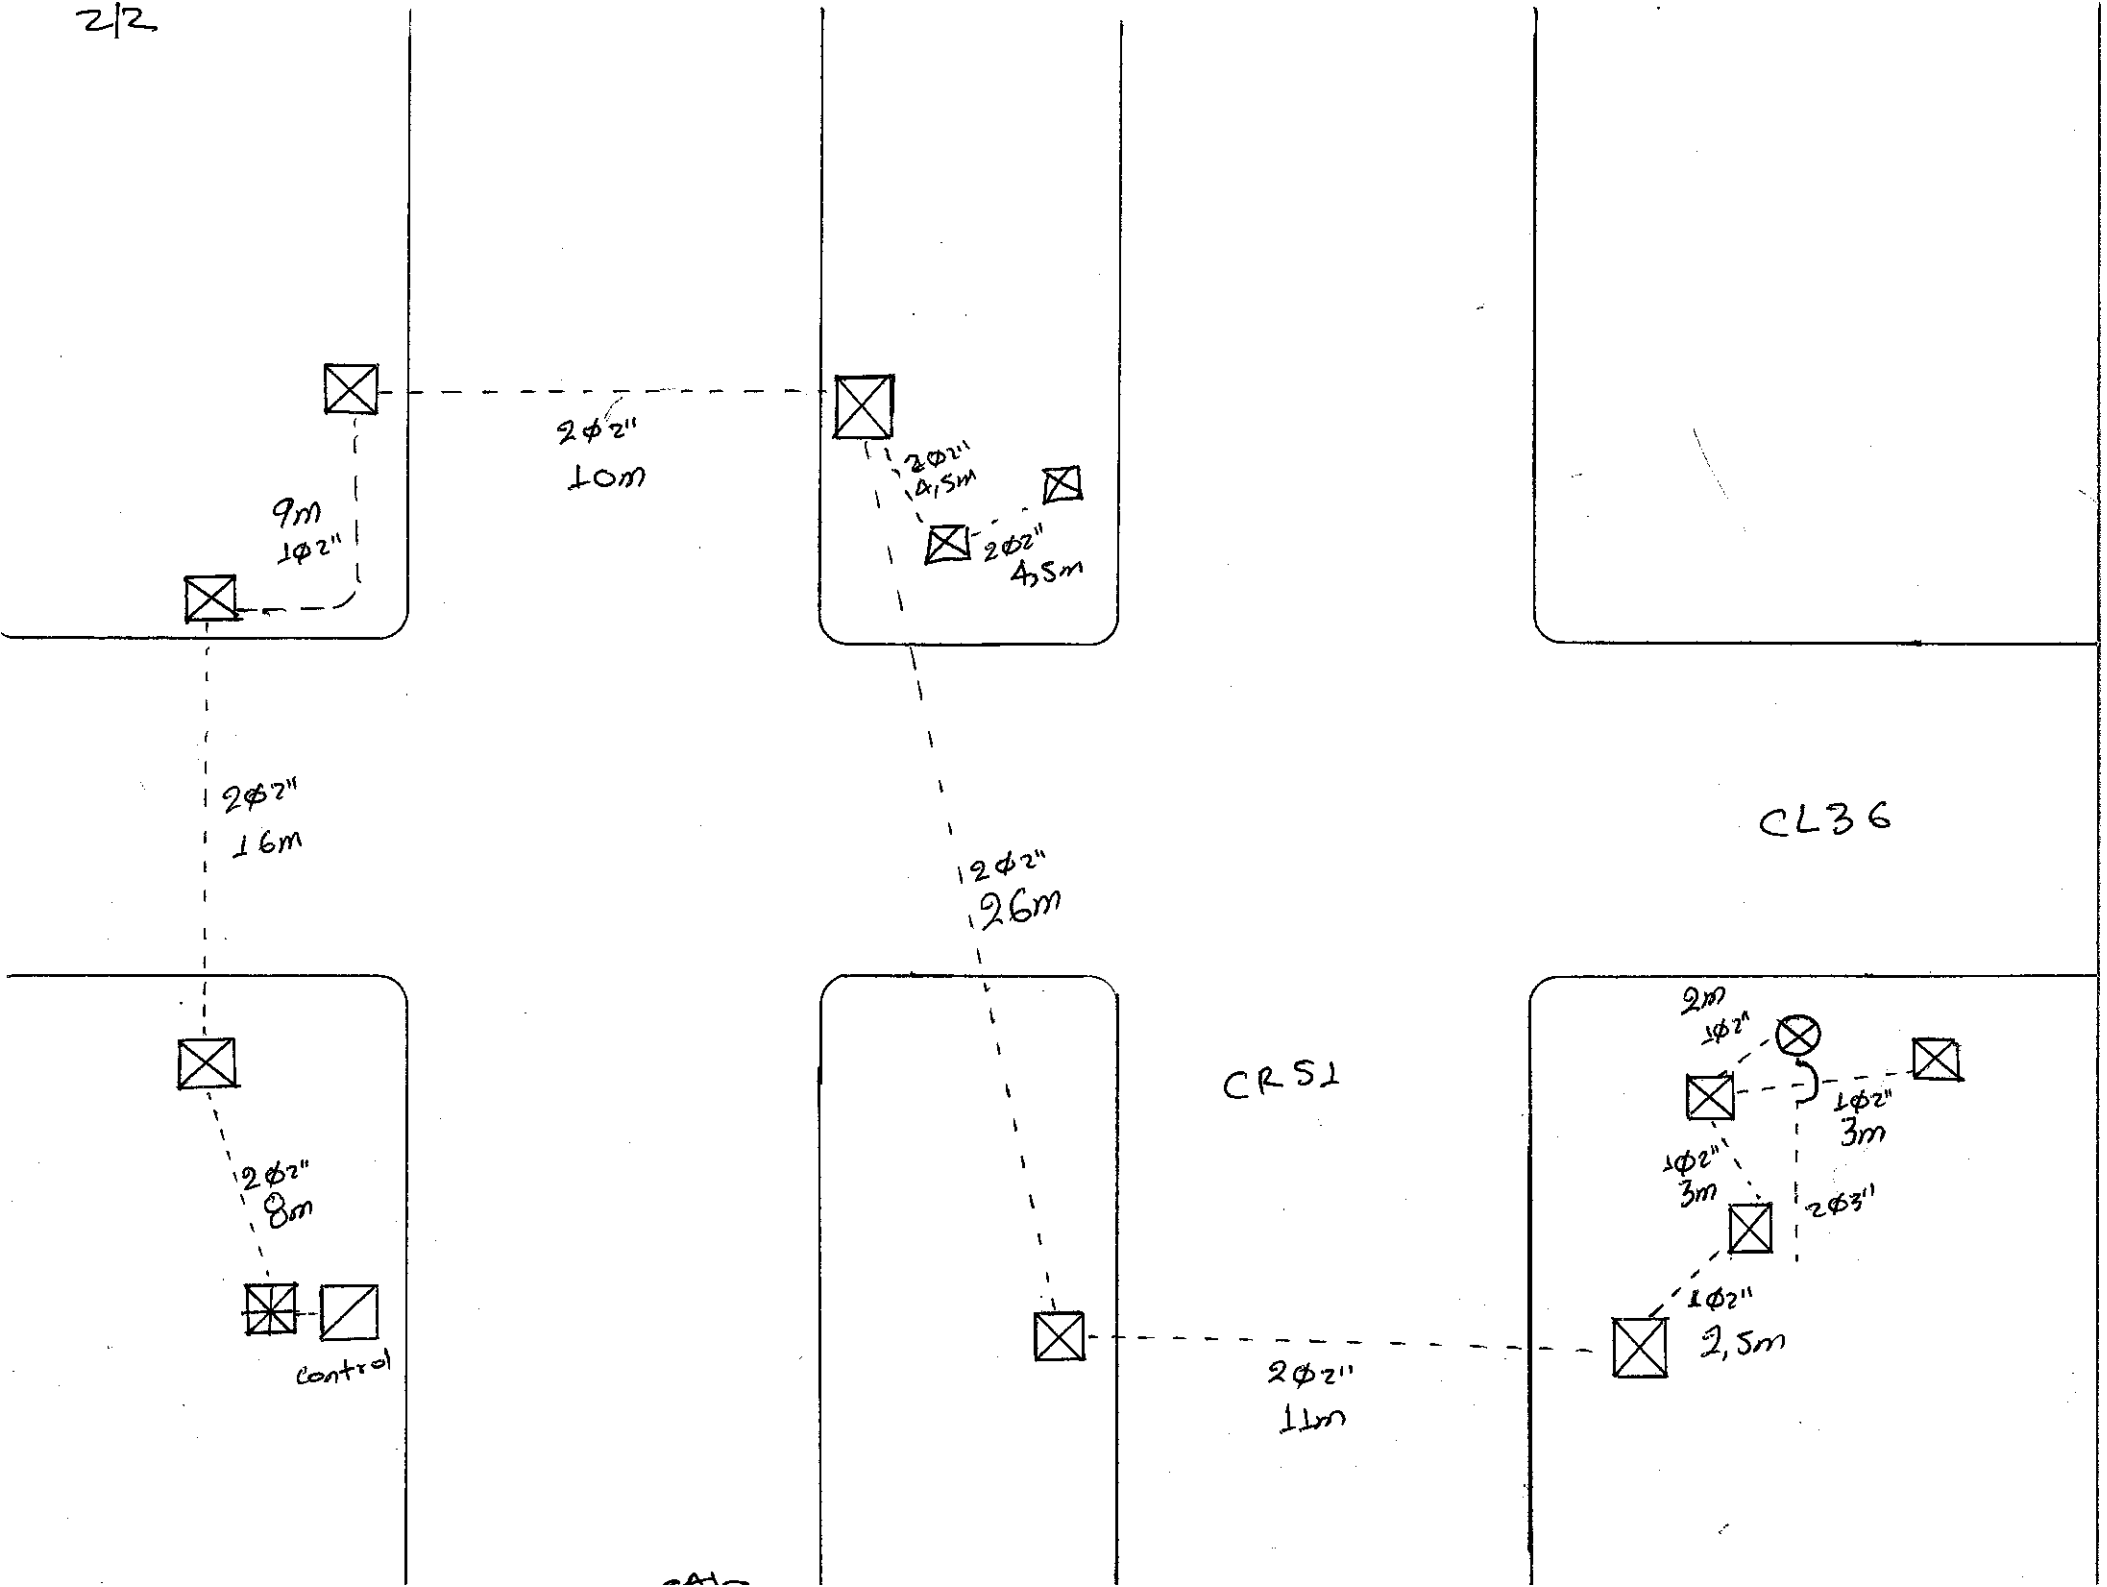
2Φ2"
10m
9m
1Φ2"
2Φ2"
1,5m
2Φ2"
4,5m
2Φ2"
16m
2Φ2"
26m
CL36
CRS1
2Φ2"
8m
control
2m
1Φ2"
1Φ2"
3m
1Φ2"
3m
2Φ3"
1Φ2"
2,5m
2Φ2"
11m

1 | 2

CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	21-05-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	IKN 741		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santos	1038806300			Jonathan Rondón	1036662790
Luis Vega					
Teisum Cortes					


DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CRS2CL38			Sondeo y levantamiento			237
CRS1CL37			instalación de 15 mts de cable de seguridad			
			Nota1 = En la CRS1CL38 costado N-W.			
			Programar señalización en cabeza de anclaje			
			mediamente 3.5m.			
			Nota2: Programar instalación de herrajes			
			soporte en la CRS1CL37. se encuentra			
			cable conductores, y posteriormente			
			Programar sondeo entre costado N-W y			
			costado S-W. Para más detalles			
			se entrega Plano o levantamiento			
CRS1CL37.	S-W	W-E	Retiro de 4 cordones de soldadura a 4			183
			tapa de 60x80			
			soldadura de 4 cordones a 4 tapa 60x80			262

EQUIPO EN OBRA:
Herramienta menor, planta electrica, pulidora

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

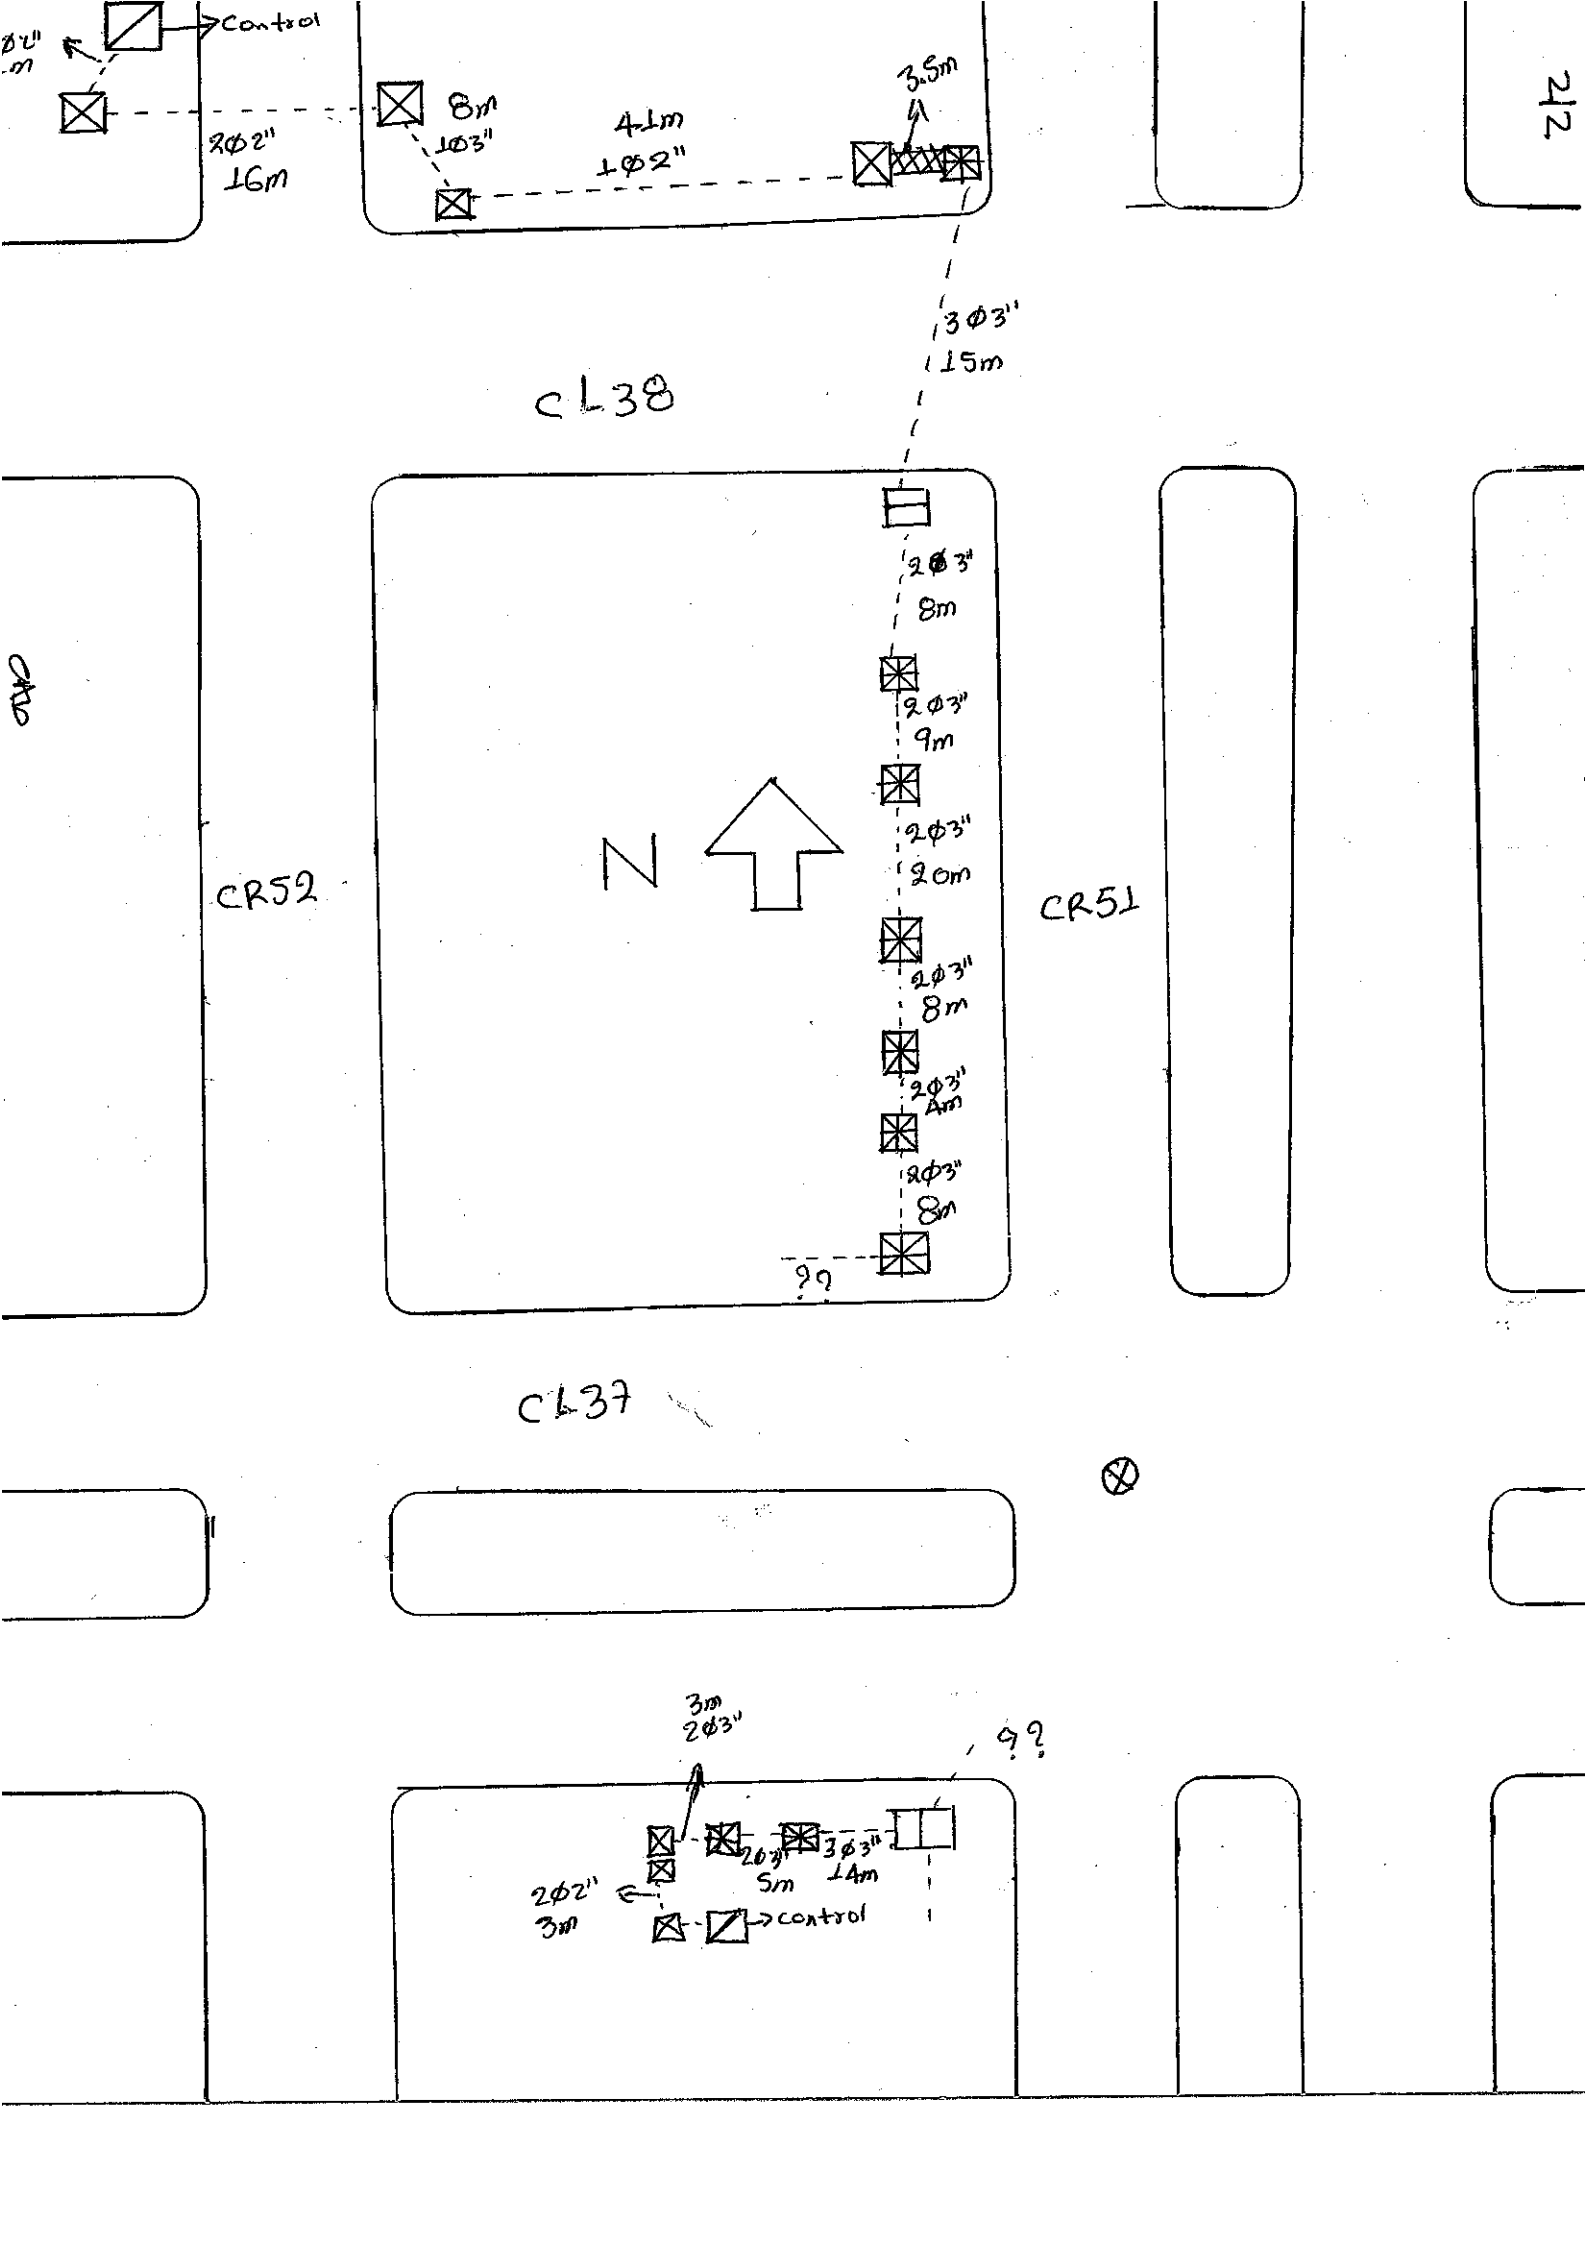
Control
2Φ2"
16m
8m
1Φ3"
4.1m
1Φ2"
3.5m
3Φ3"
15m
CL38
2Φ3"
8m
2Φ3"
9m
2Φ3"
20m
2Φ3"
8m
2Φ3"
4m
2Φ3"
8m
??
N
CR52
CR51
CL37
3m
2Φ3"
??
2Φ3"
5m
3Φ3"
14m
2Φ2"
3m
control

1/2

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · Unión Temporal SIT Medellín · Consorcio Inteparol Mcd 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	21 Mayo 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Wevel		LLUVIOSO			SI ✓			SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	ESD 669		DURACIÓN			NO			NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA

NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Yan Carlos Usuga	1.214.729.941		
Leon oquendo	15.495.477		
Jose Perez	PPT 5.240.599		

INTERVENTORÍA

NOMBRE	CÉDULA
Jonathan Rendón	1036962290

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 43AX Calle 1 Sur	Separador central	N-S	Nivelacion y aplome de poste de enterramiento directo	9:10		197
	Separador central	N-S	Nivelacion y aplome de poste de pulsador			197
	N-E	S-N	Nivelacion y aplome de poste de enterramiento directo.		11:50	197
Carrera 82 X calle 50	Separador central	N-E	Retiro de lampara peatonal roja estatica mala	13:25		195
			instalacion de lampara peatonal roja estatica de segunda			218
			Construccion de empalme electrico		13:50	94
Carrera 90 X Calle 50 Occi- AV. 90 X Colombia	N-W	E-W	Endelezada de semaforo peatonal.	13:54	13:56	258

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor, planta electrica, taladro demoledor.

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

2/2

Alcaldía de Medellín / UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN / CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 / RAV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	21 Mayo 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves.		LLUVIOSO			SI ✓			SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	ESD 669		DURACIÓN			NO			NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Yan Carlos Usuga	1.214.729.941			Jonathan Renteria	1036962740
Leon oyuendo	15.495.477				
Jose Perez	PPT 5.240.599				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 45x			Revision de cruce semaforico con problemas, se encuentra Cables de semaforos peatonales en corto.	14:20		261
calle 46					14:35	
			Nota: El cableado va por cámaras de inspección de TIGO			

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	VERSIÓN 1
	REINTEGRO DE ELEMENTOS	1/09/2025
NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACION Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
NÚMERO DEL CONTRATO	4600[illegible] de 2025	(UNION TEMPORAL SIT)

Entregado por: ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA **Recibido por:** FRANK GARCIA

FECHA	ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
21/5/2026	GABINETES DE CONTROL - MAESTRO	1	SINIESTROS
21/5/2026	POSTE DE ENTERRAMIENTO	2	SINIESTROS
21/5/2026	POSTE DE MENSULA	4	SINIESTROS
21/5/2026	POSTE RECTO DE PLATINA	1	SINIESTROS
21/5/2026	HERRAJES 50X50 CON TAPA CONCRETO	10	SINIESTROS
21/5/2026	HERRAJES 50X50 CON TAPA POLIPROPILENO	5	SINIESTROS
21/5/2026	MARCOS 50X50 SIN TAPA	14	SINIESTROS
21/5/2026	CABLE ENCAUCHETADO 4X16-4X18	717	SINIESTROS
21/5/2026	CARCAZA DE SEMAFORO VEHICULAR	12	SINIESTROS
21/5/2026	CARCAZA DE SEMAFORO PEATONAL	4	SINIESTROS
21/5/2026	PLACAS DE CONTRASTE	18	SINIESTROS
21/5/2026	FLAUTAS METALICAS	10	SINIESTROS
21/5/2026	ARAÑAS METALICAS	4	SINIESTROS

VERIFICACIÓN

	FIRMA PERSONA QUE ENTREGA		FIRMA PERSONA QUE RECIBE
nombre	ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA	nombre	FRANK GARCIA
cargo	ALMACENISTA	cargo	CIOS

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 / ROW	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	22-05-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:	TSG 405		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038810427			Jose cortes	1098427131
cristian mena				Alvaro londoño	71775731
Jose					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ cxv45 x c1173	separador central	N-S	suministro istalacion de 1 anclaje nuevo para mensula	9:11 Am	3:00pm	97

EQUIPO EN OBRA: Pulidora, Planta electrica, Martillo demoledor, Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / Unión Temporal SIT Medellín / Consorcio Int Farol Med 2025 / Pavy	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	22 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Viernes		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa	1679406			Jonathan Rueda	1036962270
Juan Roa					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 55 Cll 50			Sunchada de Equipo Contratador 3 m	07am		104
Cr 53 Cll 54			Desoldada de 3 Tapas de 60 x 80 para la busqueda de nuevo punto de acometida			183
			Soldadura en 3 Tapas de 60 x 80			262
			Coreccion del Grupo #9 y 10 en peatonales			
			construccion de dos Empalmes en Semaforos peatonales.		4pm	94

EQUIPO EN OBRA:

Equipo desoldadura, pulidora, planta electrica

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNION TEMPORAL EIT MEDELLÍN · CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 · INVIAS	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	22/5/26	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Viernes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Christian Durbosa				Jonathan Rendón	1036966270
Simon Vivas					
Luis Lozano					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ Cr 46 x Cl 56		NS	Se revisa el flujo ll se encuentra cable pisado por tapa de caja F1 y el cable de NS separados se encuentra en corto por mal empalme, se realiza reparacion empalmes y el foto queda funcionando correctamente.	8:00		261
						94
✓ Cr 42 x Cl 48	N	EW	Se realiza señalizacion de semaforo peatonal			258
	W	SN	Se realiza horizontalizacion de semaforo peatonal			258
	E	SN	Se realiza horizontalizacion de semaforo peatonal		4:00	258

EQUIPO EN OBRA: Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

1 | 2

CONSORCIO INTEGRAL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	22/05/2026.	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	viernes.		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WIY 897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juan Camilo Restrepo	71295492			Jonathan Rendón	1036962270
Eberto Cadrazco.	13461111				
Itonar Rivera	RPT 4350715.				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 52 x Cll 14	E.	S-N.	Retiro 01 mensula.	0800.		166
			Retiro 01 semaforo de mensula			170
			Retiro 01 semaforo peatonal.			172
			Retiro 01 semaforo vehicular			172
			Retiro 02 semaforos ciclistas.			172
			retiro 01 disco direccional.			179
			Retiro 01 disco PEP.			179
			Retiro 01 Pulsador destruido.			177
			Retiro 24 m cable 4x16. y reinstalacion de los mismos			173-215
			Instalacion 01 mensula; suministro consorcio SIT. nueva de	S/Sm		58
			Instalacion 01 semaforo de mensula, nuevo suministro cons. SIT.			64
			Instalacion 01 semaforo vehicular; reutilizado el antiguo.			208
			Suministro 02 accesorios tipo codo de pesta.			—
			Suministro 04 arandelas pesadas (mogollas).			—
			Suministro 04 Juegos de tornillos para brida de mensula			—
			Instalacion 01 semaforo peatonal (reinstalado)			208
			Instalacion 02 semaforo de ciclistas (reinstalado)			208
			Construcción 06 ampolmes electricos			94

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

2/2

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	22/03/2026.	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Viernes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juan Restrepo	71291492			Jonathan Rendón	1036962290
Eberto Cadrazco	12141111				
Leomer Rivas	PPT 43507IS.				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 52 x CL 14	E	S-N	Instalación 01 pulsador. metálico retirado en KR52x10.			214
			Instalación 01 disco direccional. y gum instalado por STT			85
			Instalación 01 disco PEP.			220
			Retiro de 04m. cable 2x16.			173
			Instalación de 04m cable 2x12.		1600.	215

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

1/2

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · Unión Temporal SIT Medellín · CONSORCIO INT PAROL MED 2025 · DEVY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	27 Y 28/05/2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves y Viernes		LLUVIOSO			SI X		SI X		SI X
VEHÍCULOS:	UL2 049		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Luis Fernando Gil	7.080.803			Jonathan Rendón	1036962270
Evristo Ives	7028030				
Jorge Luis Rodiguez	7711373 62				
miguel Angel Villadon	7078229962				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 52 CL 53	OR.	N S	Retiro de. Un Semaforo Vehicular a Poste	8 40		172
			Retiro de un semaforo Peatonal			172
			Retiro de un Disco Direccional			179
			Retiro de 30 mt de cable 4X16 Viejo.			173
			Retiro de un Poste de enterramiento			168
			Reinstalacion de un Poste de enterramiento			206
			Reinstalacion de un Semaforo Vehicular Poste			208
			Reinstalacion de un Semaforo Peatonal			208
			Reinstalacion de un Disco Direccional			220
			Instalacion de 45 mt de cable 4X18 nucleos anti Vandalo			215
			Canalizacion en Anden de 2.5 mt con un tubo de 2"		3 50	28-1
			Suministro de 4 U en Varilla de 3/8			
			Construccion de una Caja de 60 X 60			35
			Construccion de dos Em Palmes en Poste			94
			Instalacion de herraje de seguridad tipo Apolo 60x60			13

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor, taladro, pulidora, planta electrica

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

2/2

CONSORCIO INTEGRAL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	21 y 22/05/2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves y Viernes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:	WL2 049		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Luis Fernando G B	1.040807034			Jonathan Rendón	1036902240
Ermitaños	1028036487				
Miguel Angel Villegas	1018229962				
Jorgelais Rodriguez	PPT 1177342				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR52 cl153	occ	N S	Retiro de un Semaforo Vehicular a Poste.	7 30		172
			" " " " " " Peatonal a Poste.			172
			" " " Disco direccional			179
			Retiro de 12 mt de cable 4X8			173
			Retiro de un Poste. de enterramiento.			168
			Contrapaos hueva.			
			Instalacion de un Poste nuevo de enterramiento			206
			Reinstalacion de 12 mt de cable 4X8			215
			Reinstalacion de un Semaforo Vehicular a Poste		5 pm	208
			Reinstalacion de un Semaforo Peatonal a Poste.			208
			Reinstalacion de un Disco direccional			220
			Construccion de 2 Empalmes en Poste			94
CRA52 cl 53	OR	N-S	Demolicion de anden de 2,5 mts x 0,09 mts			1
			Retiro y Reinstalacion de adoquin 2,5 mts.			53

EQUIPO EN OBRA: Herramienta menor, taladro dimoledor, pulidora, planta electrica

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / Red Vial	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	23 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:			LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa	16791906			Jonathan Rendon	1036962270
Carlos Murillo					
Carlos Alberto Diaz					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
√ Carr 51 Cll 67	Glorieta		Reporte por hurto de acometida.	08am		
			Instalacion de acometida a poste de Alumbrado			
			Suministro Instalacion de cable encauchetado			
			numero 4 en aluminio (15 metros)			
			Construccion de dos empalmes (aposte y caseta)			94
			Soldadura en caja metalica de 50x50			262
			Concreto en bajante de poste		(3)	263
			Sunchada de Equipo control de Semaforo.		4pm	104
			6m.			

EQUIPO EN OBRA:

Equipo de soldadura, herramienta menor, polvidera.

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / RAY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	21/5/2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Lunes		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	TSG 405		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038810427			Jose cortes	1098727131
Christian Barbosa				Jonathan Rendon	1036962270
Simeon Vivas					
Juan Roa					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ C. 70 x Cl 44			Se revisa Grupo 8 (Separador, WEW-N) se encuentra que la fuente del semaforo de paso del separador esta en corto, se suministran 16 metros de cable 4X18 para alimentar el semaforo de paso del separador de la fuente del EW-N)	8:00		215
			Se revisa Grupo 6 (Separador WE-S) se encuentra q el semaforo de paso del separador esta en corto y el semafor y fuente de WE-S queda funcionando			
			Se revisa Grupo 6 (Separador EW N) se revisa fuentes y semaforos de paso y se encuentran en falla todo se suministraron 16 metros de cable 4X18 para conectar el semaforo de paso del separador ya que se encontraba conectada directamente a los 110 voltios y no a los 24 de la fuente			215
			Se revisa Grupo 8 (separador WE-S) se revisa fuente del separador y semaforo de paso del separador y se encuentran en corto el lado WE-S queda funcionando correctamente			

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

212

CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	23/5/26	TIEMPO	SECO	✓	UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Lunes		LLUVIOSO			SI	✓		SI	✓		SI	
VEHÍCULOS:	XSG 405		DURACIÓN			NO			NO			NO	

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038810427			Jonathan Rendón	1036962270
Cristian Ruiboso					
Simon Vives					
Juan Roa					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 70 x Cl 44			Se revisa Grupo 8 (NS-E / NS-O) se revisa semaforos de piso y fuentes y se encuentra en Corto y cacan el equipo de funcionamiento			
			Se realizan 35 empalmes para todos los semaforos de piso y fuentes			94
			Quedan 6 semaforos de piso funcionando			
			Quedan 6 semaforos de piso sin funcionamiento			
			6 fuentes en funcionamiento			
			5 fuentes en falla		5:00	

EQUIPO EN OBRA: Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

2935 2908

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / Rey	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	25 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	lunes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa P.	16791906			Jonathan Londoño	1036902290
Luis lozano					
Jose Andrade					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ Carre 40 Cll 10		W E	Daño de Grupo 3 Exclusiva	07:00		
		M S	Pendiente dos cambios de fuentes de Semaforo			
			de pito - daño en cableado por roedores.			
			Cambio de cableado 4X18 (27 metros nuevo)			173-215
			Construcion de 3 empalmes			94
✓ Cre 69 Cll 73	Separador	E W	Enderezada de Semaforo Vehicular			258
	N	E W	Enderezada de Semaforo Vehicular.			258

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor.

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

1/2

CONSORCIO INT PAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 25/05/2026 DIA: lunes VEHÍCULOS: WLY 897.	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE SI ✓ NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI ✓ NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juan Camilo Restrepo.	71295492			Jonathan Rendón	1036962240
Eberto Cadrazco	13461111				
Yan Usuga	1711477994				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 45 x C 117 3	N.	E-W	Canalizacion en Adoquin 3,6m. 1Ø2"	0800.		28-53
			Retiro 01 poste de mensula.			166
			Retiro 02 semaforos peatonales			172
			Retiro 01 semaforo vehicular.			172
			Retiro 01 disco direccional			179
			Retiro 01 sonorizador.			176
			Instalación mensula completa de 8da. ole 4,5m			203
			Levado de mensula completa.		(2)	230
			Instalacion semaforo vehicular a mensula "Entrega SIT"			207
			Levado de semaforo vehicular. x 01 und			234
			Instalacion semaforo vehicular. x 01 und.			208
			Instalacion 02 semaforo peatonal.			208
			Instalacion 01 sonorizador			213
			Construccion empalme electrico x 05 und.			94
			retiro cable 4x16 x 30m.			193
			Instalacion cable 4x16 x 30m.			215
			Suministro cable 4x18 e instalación x 9m. "Entrega SIT"		1600.	215

EQUIPO EN OBRA: Planta electrica, herramiento menor, pulidora.

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	23/03/2026.	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Lunes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897.		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juan Camilo Restrepo	71241492			Jonathon Bedoya	1036962290
Eberto Cadrazco.	13461111				
Yan Usuga	1214729941.				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 44 x C1173	S	W-E.	retiro semaforo de mensula.	16 15.		170
			retiro brazo de mensula 4,5m. en mal estado			—
			retiro 06m. cable 4x16.		1730.	173

EQUIPO EN OBRA:

Platoforma, Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	25 Mayo 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Lunes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WL2 049		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Luis Fdo. Guerrero	1070.807 034			Jonathan Rendón	1036902210
Ermis Torres G.	1023 030 497				
Miguel Villegas	1018 229 962				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 80 X	Separador central	N-S	Demolicion de tapa de caja de inspeccion de 60x60	10:00		1 ✓
DG 75D Cost. Sur			Limpieza de caja de inspeccion			54 ✓
			instalacion de herraje de seguridad de 60x60			
			tipo Apolo nuevo.			13 ✓
			Suministro e instalacion de 40 en varilla de 3/8		11:30	
Carrera 55X	S	W-E	Demolicion de tapa de caja de inspeccion de 60x60	13:10		1 ✓
Calle 30A			Limpieza de caja de inspeccion			54 ✓
			instalacion de herraje de seguridad de 60x60			
			tipo Apolo nuevo			13 ✓
			Suministro e instalacion de 40 en varilla de 3/8		14:30	

EQUIPO EN OBRA:
Motomiscelador menor, planta electrica, pulidora, taladro demoledor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

PLAN DE CALIDAD

CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 26-05-2026 DIA: MARTES VEHÍCULOS: TSG405	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	Si	UNIFORMES	CUMPLE SI ✓ NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI ✓ NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038810427			Jonathan Rendón	1036602270
Juan Rom					
Simeon Vivas					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ Cra 52 x Cll 29A			Cambio de pulsadores touchless y de boton a poste	9:30Am	-P	177
	S-E	S-N	Retiro de 1 pulsador de boton a poste			88
			suministro istalacion de 1 pulsador digital nuevo a poste	+P		
			perforacion en poste con taladro y machuelos			94
			construccion de 1 empalme en el pulsador			
	separador	S-N	retiro de 1 pulsador touchless a poste		-P	177
			perforacion en poste con taladro y machuelos			
			suministro istalacion de 1 pulsador digital nuevo	+P		88
			construccion de 1 empalme en el pulsador			94
	separador central	S-N	retiro de 1 pulsador touchless a poste		-P	177
			perforacion en poste con taladro y machuelos			
			suministro istalacion de 1 pulsador digital nuevo	+P		88
			construccion de 1 empalme en el pulsador			94

EQUIPO EN OBRA: Mantenimiento

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTEAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	26 -05 -2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	TSG 405		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038910427			Jonathan Runder	1036902270
Juan Roa					
Simcon Vivas					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ cra 52 x cll 29A	separador central	N-S	retiro de 1 pulsador de boton a poste perforacion en poste con taladro y machuelos suministro istalacion de 1 pulsador digital nuevo a poste construccion de 1 empalme en el pulsador	9:30Am	-P	177 88 94
	separador	N-S	retiro de 1 pulsador touchless a poste perforacion en poste con taladro y machuelos a suministro istalacion de 1 pulsador digital nuevo a poste construccion de 1 empalme en el pulsador	+P	-P	177 88 94
	N-W	N-S	retiro de 1 pulsador touchless a poste perforacion en poste con taladro y machuelos suministro istalacion de 1 pulsador digital nuevo a poste construccion de 1 empalme en el pulsador	+P	-P 11:16Am	177 88 94

EQUIPO EN OBRA:

Mantenimiento menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

3|3

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLÍN / CONSORCIO INTERVENTOR MED 2025 / RAV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	26 - 05 - 2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	TSG405		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
edwin santos	1035810427			Jonathan Londoño	1036602270
juan roa					
simon vivas					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ cra 54 x cll 53	S-W	E-W	cambio de cable de acometida de punto	7:40Am		
			retiro de 4 cordones de 15cm en tapa de 60x80			183
			retiro de 4 cordones de 15cm en tapa de 60x60			183
			suministro istalacion de 20mts de cable encauchetado			80
			2x10 nuevo de la caja al controlador			
			construccion de 1 empalme electrico en cable encauche			94
			todo 2x10 en la caja de 60x60		5:00Pm	
			soldadura en tapa de 60x80			262
			soladura en tapa de 60x60			262
			soladura en tapa de 60x60			262

EQUIPO EN OBRA: Herramienta menor, pulidora, equipo soldadura, planta electrica

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN / CONSORCIO INT EAROL MED 2025 / ROY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 26/05/26 DIA: MARTES VEHÍCULOS:	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	X	UNIFORMES	CUMPLE SI ✓ NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI ✓ NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
William Chavarria	98687775			Jose Cortes	1098727131
Carlos Gonzalez.	1049894058			Alvaro Hurtado	98775 77
				Oleg Bard	43 06 858

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ Cr 50	S-W	S-N	Rasqueteada de Poste recto	10:00		
Cll 52			Pintada de Poste recto			224
	S-E	S-N	Rasqueteada de poste recto			
			Pintada de poste recto			224
	N-E	S-N	Rasqueteada de poste recto			
			Pintada de poste recto			224
	N-W	E-W	Rasqueteada de poste recto			
			Pintada de poste recto			224
	S-W	E-W	Rasqueteada de poste recto		13:00	
			Pintada de poste recto			224
✓ Cr 57	S-E	W-E	Rasqueteada de poste de mensula	14:00		
Cll 53			Pintada de poste de mensula			224
	N-E	E-W	Rasqueteada de poste de mensula			
			Pintada de poste de mensula.		16:00	224

EQUIPO EN OBRA:
Escalera Arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INTEAROL MEO 2025 / RDV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 26/5/26 DIA: Martes VEHÍCULOS:	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	X	UNIFORMES	CUMPLE SI ✓ NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI ✓ NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Christian Balbosa	1.151.966.785			Jonathan Rendón	1036962270
Jose Andrade					
Cristian Mena					
Luis Lozano					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 44 x Cl 73	S	W E	Suministro e instalacion de anclaje para mensula	8:00		97
			Canalizacion de anclaje a mensula con tubo de 2" en zona dura a caja 3 metros		4:30	28

EQUIPO EN OBRA: Herramientas menores, polisdora, soldadora, planta electrica

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

1/3

Alcaldía de Medellín / UNIDAD TEMPORAL SIT MEDELLÍN / CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 / RAY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	26/05/2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:	UH2 049		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Luis Fernando G M	1.010801034			Jonathan Londoño	1036962270
Evmistocles	1029 030 187				
Jorge Luis Rodriguez	PPT 7737342.				
Miguel Angel Villa	1078 229962				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR78 C1133	S.P.	OROC	Retiro de un Poste de Platina Con 2 Cmt			169
glorieta Lbule			Concretiado. 40x40x25			1
vías			Retiro de un Semaforo Vehicular a Poste.			172
			Retiro de un Semaforo Peatonal			172
			Retiro de un Pulsador.			177
			Retiro de un Disco direccional			179
			Retiro de un Disco Pare Grande.			179
			Retiro de 32 Mt de Cable UX78			173
			Retiro de 8 mt de Cable 2x4			173
			Instalacion de un Poste de Platina 9m.			205
			retiramos en la AV80 con C1127.			
			Instalacion de un Semaforo Vehicular de Segunda	X		208
			a Poste.			
			Instalacion de un Semaforo Peatonal de	X		208
			Segunda.			
			Instalacion de 32 mt de cable UX78 de	X		215
			Segunda.			

EQUIPO EN OBRA:
Herramientamenor, tutodio, pulidora, planta electrica

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNION TEMPORAL SIT MEDELLÍN · CONSORCIO INFRAROJ MED 2025 · RMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	26/05/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:	WL2 049		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Luis Fernando Gil	1.070807031			Jonathan Jurado	1036962270
Evris Tovar	1023030487				
Jorge Luis Rodriguez	PPT 7737412				
Miguel Angel Villega	1078224962				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 73 C 1133			Instalación de un Disco direccional			220
Bulevia S			de Segunda			
			Instalación de pulsador			214
			instalacion de un Disco Pet Grande			220
			instalacion de. 8 mt de Cable 2x4.			215
			Concretada de un poste de Platina 25 cnt			263
			Construccion de. 2 Empalmes en Semaforo			
			a Poste. y un Empalme. a Pulsador.			94
AV 80C 1125.			Retiro de. un Poste de Platina.			169
			Retiro de. un semaforo Vehicular. a poste.			172
			Retiro de. 26 mt de. Cable 4x16			173
			Retiro de. un Disco direccional.			179
			instalacion de. 70 mt de. Cable 4x18 Negro			215
			instalacion de un semaforo Vehicular a			208
			Poste. de mensula instalacion de. un Disco direccional			220
			Construccion de. un Empalme en semaforo a poste			94

EQUIPO EN OBRA: Herramienta menor, pulidora, taladro demoledor, planta electrica

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

3/3

CONSORCIO INT FAROL MED 2025	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	26/05/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	martes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WLZ 049		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Luis Fernando G.M	7.070.802.021			Jonathan Londoño	1039.021.790
Evmi Storres	1028.034.187				
Jorge Luis Rodriguez	PPT 71 7742				
Miguel Villada	1078229967				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
[illegible]			Desoldada de una Caja de 50X50.			183
AV 80 Cll 25			Soldadade una caja de 50X50.			262

EQUIPO EN OBRA:
Herramienta menor, equipo de soldadura, planta electrica

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INT FAROL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	26/03/2026.	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897.		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juan Camilo Restrepo	71295497			Jonathan Cendales	1036902270
Eberto Cadrazco	13461111				
Yan Usuga.	1214729941.				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 70 x Cll 32.	w.	n-s.	Instalacion semaforo de mensula nuevo y suministro SIT	10 00.		64
			Instalacion Brazo de mensula nuevo y suministro SIT.	de 5,5m		203
			Instalacion Cable 4x18x 9metros y suministro SIT.			215
			Construccion ampolla electrica x 02 und			94
			Suministro 04 Tornillos de Bridas y Arandelas			-
			serial Luz verde leotek nueva 0874.			
			serial luz Amarilla leotek nueva 0873.			
			serial luz roja leotek nueva 0872.		1200.	
CR 48A x Cll 1 sur	n-e.	s-n.	Enderezado de luces verde y roja Torcidas.	1300	1330.	2603
CR 30 x Cll 47.	e-w	n-s.	reparacion Semaforo housing reventado, se cierra aspecto.	1345		241
			rojo Abierto, semaforo. n-s. w. para cambio "vehicular"		1430.	
CR 66B x Cll 34 unicentro.	no	e-w.	Enderezado de brazo de mensula. "Tornillos flojos"	1630.		249
CR 66B x Cll 34 unicentro.	nw. sw.	e-w. w-e.	Enderezado de Brazo de mensula x Tornillos Flojos			249
			reparacion semaforo vehicular housing reventado.		1600.	241

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	27 - 05 - 2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIERCOLES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	TSG405		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin santos	1038810427			Jonathan Mendez	1036952270
Juan Ron					
simeon vivas					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 46 x cll 41	separador central	W-E	orientacion de 2 semaforos peatonales a poste	8:16 AM		258
	N-W	N-S	orientacion de 1 semaforo vehicular a poste		8:40 AM	258
cra 48 x cll 41	N-E	N-S	orientacion de 1 semaforo vehicular a poste	8:38 AM	8:46 AM	258
cra 48 x cll 25 paso Bancolombia	S-W	N-S	se hace la visita a la interseccion para revisar los pulsadores toten con el personal tecnico y al revisar se observa que estan desprogramados quedan pendiente para programar	10:48 AM	11:22 AM	261
	separador central	E-W	retiro de 1 pulsador de boton en mal estado a poste Istalacion de 1 pulsador de boton de grounda a poste construccion de 1 empalme en el pulsador	1:13 PM	2:00 PM	177 214 94

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor.

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN · CONSORCIO INT FAROL MED 2025 · REV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	27 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	miercoles		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa	16791906			Jonathan Londoño	1036962770
luis lozada					
Jose Andrade					
cristian mena					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 55 Cll 50			Sunchada de Equipo Controlador.	07am		104
Cr 87 Cll 47DD			Cambio de cableado de Grupo #9 en cobre.			
			Desoldada de 15 Tapas de paso de cableado			183
			Retiro de cableado 4X16 en mal estado			173
			(127 metros)			
			Suministro Instalacion de cableado nuevo 4X18			215
			(152 metros)			
			Construccion de dos Empalmes en Semaforos			94
			Vehiculares. del Grupo #9			
			Soldadura de 15 Tapas de paso de Cableado			262
			de Semaforos.		5:45pm	

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor, tolados pesados, patrullero, planta electrica

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN · CONSORCIO INTEFAROL MED 2025 · RAV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	27/05/26	TIEMPO	SECO	✓	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIERCOLES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Laura padilla	1017221580			Jose Cortes	1098727131
Wilman Chavarro	98681775				
Yeison guerrero	1039597832				
Carlos Mario G	7049097598				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
					8:00	
Cr 51 Cl 53	N-E	S-N	Rasqueteada De poste Recto			224
			Pintada De poste Recto			
	S	S-N	Rasqueteada De poste Recto			224
			pintada De poste Recto			
	N-W	N-S	Rasqueteada De poste De mensula			224
			Pintada De poste De mensula			
	S	N-S	Rasqueteada De poste Recto			224
			Pintada De poste Recto			2:00
	S	E-W	Rasqueteado De poste Recto			224
			Pintada De poste Recto			224
	N-W	N-S	Pintura de dos postes con rasqueteo			

EQUIPO EN OBRA:

Kit antiderrame, escalera, arco, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	27/05/2026	TIEMPO	SECO	✓	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Luis Reynaldo Gil	1.078807074			Jonathan Rendón	1036922270
Evris Tovar	1028030497				
Jorge Luis Rodriguez	1018224962				
Miguel Angel Villa	PPT 773742				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR45 C1166			Retiro de un Semaforo Vehicular a Poste.			172
CR45C1166	N	occon	Retiro de un Disco Direccional			179
			Retiro de un Poste de Enterramiento.			168
			Retiro de 65 mt de cable UX 78			173
			Retiro de una Estencion de 2" Con			192
			una Percha.			191
			Instalacion de un Poste de Enterramiento			206
			Reinstalacion de un Semaforo Vehicular a Poste			208
			Reinstalacion de un DISCO direccional.			220
			Instalacion de 700 mt de cable UX 78 nuevo			215
			Construccion de un Ere Portico en Semaforo Vehicular			94
			a Poste			
CR52C1153			Instalacion de 30 mt de cable UX 78 nuevo.			215

EQUIPO EN OBRA:

Planta electrica, pulidora, taladro percutor, Apisonador manual

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	27/05/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIERCOLES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	ESD 669		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71480 675			Jonathan Rendón	1036962270
Alberto Ocampo	15.495.477				
Luis Osuga	71.708.197				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Csa 52 #82	N	N-S	SE RECIBIO CRUCE con Problemas en Acometida de	8. AM	11. AM	
			Alimentacion empalme Flojo y sin conectores. SE Hizo 1			94
			Empalme electrico con conectores Tipo Pirrsin			240
			Suministro instalacion de 2 conectores			
Csa 43A #150r	OC	OC-OR	SE endereZo 1 semaforo vehicular a poste Cirado SE Hizo	12:30 AM	12:30 PM	258
			1 empalme electrico			94
Csa 51 #77	OR	S-N	SE cerro 1 aspecto abierto en semaforo peatonal	1 PM	2 PM	260
			SE Hizo 1 empalme electrico			94
csa 51 #77	N-OR	OR-OC	SE endereZo 1 visera en 1 semaforo peatonal		3 PM	260
			SE Hizo 1 empalme electrico	2:30 AM		94
csa 51 #77	OC	OC-OR	SE RETIRO de 1 lampara peatonal Roja mala			195
			instalacion de 1 lampara peatonal roja de 2da	3:30 AM	4 PM	218
			SE Hizo 1 empalme electrico			94
Csa 44 #69			SE RETIRO 1 lampara peatonal verde mala. SE instalo 1	4:30 PM	5 PM	195
			lampara peatonal EQUIPO EN OBRA: verde de 2da			218
			SE Hizo 1 empalme electrico			94

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

Recomendo menor.

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 · UNION TEMPORAL EIT MEDELLÍN · RAV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	28-05-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	TSG 405		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin santos	1038810427			Jose cortes	1098727137
Juan Ron					
simeon vivas					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✓ cra 65 x cll 78	S-W	E-W	cambio de cable en corta del grupo 16 del poste al controlador	8:21 am		
			retiro de 4 cordones de 15cm en tapa de 50x50			183
			retiro de 4 cordones de 15cm en tapa de 50x50			183
	N-W		retiro de 4 cordones de 15cm en tapa de 50x50			183
	N-W		retiro de 4 cordones de 15cm en tapa de 50x50			183
			retiro de 101 mts de cable 4x16 del poste al controlador			173
			suministro instalacion de 128 mts de cable 4x18 + 65 mts del repetidor TOTAL 193 mts			215
			construccion de 1 empalme electrico a poste			94
			construccion de 1 empalme electrico en la cara de 50x50		7:20pm	94
✓ cra 48 x cll 41	separador central	E-W	retiro de 1 semaforo vehicular a poste	1:52 pm		172
			instalacion de 1 semaforo vehicular de segunda a poste			208
			ensamble de 1 carcasa vehicular de segunda			241
			construccion de 1 empalme electrico a poste		3:00pm	94

EQUIPO EN OBRA:

Planta electrica, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

NOTA. queda pendiente cambiar herrajes de 50x50

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL EIT MEDELLIN / CONSORCIO INT EAROL MED 2025 / RAV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	28 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI —		SI —		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa	16791906			Jose Cortes	1098727131
Cristian mena					
Jose Andrade					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
√ Cr 87 47DD		SN	Cambio de Cableado del Grupo 2 en mal estado	07am		183
			Desoldado de 8 cajas			215
			Suministro Instalación de cable nuevo 4X18 (65 metros)			173
			Retiro de Cableado en mal estado 4X16 (54 metros)			94
			Construcion de Empalme en Semaforo Vehicular del Grupo 2			262
			Soldadura en 8 cajas		5pm	262
√ Cr 65 TV 78			Soldadura en 3 cajas de paso 50x50			

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor, Planta electrica equipo Soldadora, Pulidora.

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT CAROL MED 2025 / RAV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	28/5/26	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Christian Barbosa				Jonathan Renteria	1036902270
Luis Lozano					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 44 x Cl 69	W	S N	Se realiza hincentacion de semaforo peatonal	8:06		258
			Se realiza cambio de tanpura Rosa (Retiro e Instalacion)			195-218
	S	WE	Construcción de empalme			94
			Se realiza hincentacion de semaforo peatonal			258
	N	EW	Se realiza hincentacion de semaforo peatonal			258
Tv sup x Cl Sur			Se sube cableado a equipo controlador de radar		9:00	—

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	28/05/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	JMC ESB 669		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71.680.673			Jonathan Rendón	1030602240
Luis Fdo. Usuga	71.703.197				
Leon Oquendo	15.496.477				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 52 x 82			Se hiso visita para revisar Acometida. cruce	8.1m	10 1m	261
			perdido voltaje estable 119 voltios			
cra 51 x 57	oc	oc-or	peatonales Apagados y semaforo peatonal Girado	11 Am	1 Pm	
			se rodeizo 1 semaforo peatonal girado, empalmes			258
			flojo se hicieron 2 empalmes electrico y se poso			94
			en funcionamiento los peatonales			
cra 41 x 57	or	N-S	retiro de 1 lampara peatonal roja de 2da mala	1 Pm	2. Pm	195
			instalacion de 1 lampara peatonal roja de 2da buena			218
			se hiso 1 empalme electrico			94
cra 48 x 58	oc	N-S	se pego con concreto 1 herraje soporte metalico	2.30 Pm	3.30 Pm	263
			le avian quitado la mescla (vandalizado)			
cra 70 x 55	sur	oc or	retiro de 1 lampara peatonal roja mala	4. Pm	5. Pm	195
			instalacion de 1 lampara peatonal roja de 2da			218
			se hiso 1 empalme electrico			94

EQUIPO EN OBRA:

Normalmente menor,

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Gweny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	28/05/2026	TIEMPO	SECO	✓	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WLC049		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Luis Fernando Gom	7.070807074			Jonathan Londoño	1036902240
Emiston Ceres	1028030487				
Jorge Luis Rodrigu	PPT 1137742				
Miguel Angel Villa	1078229962				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 55 cll 50	OR.	N S	Canalizacion en Anden de 80 cm con tres tubos de 3"	7030		
			Construccion de una base de controlador		3.00	33

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor, retroexcavadora, camioneta

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Gueny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

1/2

CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD**	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	29 - 05 - 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO	SI		SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	TSG 405		DURACIÓN	2. horas		NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin santos	1038 810427			Jonathan Londoño	1036[illegible]2270
simon vivas					
juan ROA					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 48 x cll 25			cambio de 2 pulsadores toten a poste	8:50Am		
Bancolombia	S - W	N-S	retiro de 1 pulsador toten			177
			retiro de 3mts de cable 4x18 del semaforo peatonal al pulsador			173
			perforacion en poste con taladro y machuelos			
			suministro estalacion de 1 pulsador digital nuevo a poste			88
			construccion de 1 empalme en el pulsador			94
	S - E	S-N	retiro de 1 pulsador toten			177
			retiro de 13 mts de cable 4x18 del semaforo peatonal a pulsador			173
			perforacion en poste con taladro y machuelos			
			suministro estalacion de 1 pulsador digital nuevo a poste			88
			construccion de 1 empalme en el pulsador		10:30Am	94
cra 48 x paso	S - W	N-S	retiro de 1 pulsador touchless a poste	7:45pm		177
seguro politecnico			perforacion en poste con taladro y machuelos			
			suministro estalacion de 1 pulsador digital nuevo en poste			88
			construccion de 1 empalme en el pulsador		3:00pm	94

EQUIPO EN OBRA:

herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INT FAROL MED 2025 · ROY · UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	29 - 05 - 2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	TSG 405		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038810427			Jonathan Rendón	1036900740
Simeon Vivas					
Juan Roa					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 48 x calle segura politecnico	S-E	S-N	cambio de 3 pulsadores Touchless y 1 de boton a poste	7:45 pm		177
			retiro de 1 pulsador de boton en mal estado a poste			
			perforacion en poste con taladro y machuelos			88
			suministro estalacion de 1 pulsador digital nuevo a poste			94
			construccion de 1 empalme en el pulsador			
	separador central	S-N	retiro de 1 pulsador touchless a poste			177
			perforacion en poste con taladro y machuelos			88
			suministro estalacion de 1 pulsador digital nuevo a poste			94
			construccion de 1 empalme en el pulsador			
	separador central	N-S	retiro de 1 pulsador touchless a poste			177
			perforacion en poste con taladro y machuelos			88
			suministro istalacion de 1 pulsador digital nuevo a poste			94
			construccion de 1 empalme en el pulsador		3:00 pm	

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLÍN / CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 / RAV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	29 05 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	viernes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa	1674190 6.			Jonathan Benedux	1036962240
Cristian mena					
Jose Andrade.					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 46 Cll 53	W	N S	Retiro de Poste recto en mal estado.	07 am		168
			Retiro de 4 metros de cableado 4X18			173
			Retiro de Semaforo Peatonal.			172
			Instalacion de Poste recto de Segunda			206
			Instalacion de 4 METROS de cableado 4X18			215
			Instalacion de Semaforo Peatonal.			208
	E	S N.	Retiro de Semaforo Peatonal			172
			Retiro de Semaforo Vehicular			172
			Retiro de Disco Direccional.			179
			Retiro de cableado 4X18 4 metros			173
			Retiro de Poste recto en mal estado.			168
			Instalacion de Poste recto de Segunda.			206
			Instalacion de cableado 4X18 4 metros.			215
			Instalacion de Disco Direccional.			220
			Instalacion de Semaforo Peatonal.			208
			Instalacion de Semaforo Vehicular.		05pm	208
			Construcción de empalmes = 3 un			94

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor, planta electrica, pulidora

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEPAROL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	29/5/26	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Viernes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Christian Barbosa				Jonathan Limaler	1036962270

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 46 x Cl 54	W	N1	Peatonal fuera de servicio a color Rojo	8:00		
			Se abren 4 camaras de poco para revision de cableado		(2)	261
			Se encuentra un corto en cableado que lleve la señal de color rojo			
			No se puede cambiar el cableado por seguridad de epm y otra necesario donde se necesita acompañamiento de personal de espacios confinados			
			Se procede a enviar la señal del rojo por el color amarillo			
			Se realiza cambio de modulo rojo por fallo en leds		3:00	

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

1/3

CONSORCIO INTEFAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	29-05-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	viernes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71.480.675			Jonathan Rendón	1036624470
Alberto Oquendo	15 485 477				
Luis Fdo Uruga	71.708.197				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cl 74 x Cl 53	NW	E-W	Lavado de poste recto -	10:30am		230
			Lavado de semáforo peatonal			231
			Lavado de Pulsador			232
			Lavado de disco para peatonal			236
	SW	E-W	Lavado de poste recto			230
			Lavado de semáforo peatonal			231
	NE	W-E	Lavado de poste recto			230
			Lavado de semáforo vehicular			234
			Lavado de pulsador			232
			Lavado de disco direccional			236
	SW	N-S	Lavado poste recto			230
			Lavado semáforo peatonal			231
			Lavado de pulsador			232
			Lavado de disco para peatón			234

EQUIPO EN OBRA:

Mantenimiento menor.

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín · Unión Temporal SIT Medellín · Consorcio Int Farol Med 2025 · Rey	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	29-05-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	viernes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cfuentes	71.480.675			Jonathan Rueda	1036902290
Alberto Oquendo	15.485.477				
Luis Fdo Uruga	71-708.197				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 94 x Cl 53	SE	N-S	Lavado de poste recto			230
			Lavado de semaforo peatonal			231
			Lavado de pulsador			232
			Lavado de disco PEP			236
	SW	S-N	Lavado de poste recto			230
			Lavado de semaforo peatonal			231
			Lavado de semaforo vehicular			234
			Lavado de disco direccional			236
	SE	E-W	Lavado de poste recto			230
			Lavado de semaforo peatonal			231
			Lavado de semaforo ciclista			231
			Lavado de pulsador			232
			Lavado de disco PEP			236
	NE	S-N	Lavado de poste recto			230
			Lavado de semaforo peatonal			231

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

3/3

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FASOL MED 2025 / RAY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	29-05-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Viernes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71.480.675			Jonathan Cuela	1036962730
Alberto Oquendo	15.485.477				
Luis Fdo Uruga	71.708.197				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 74 x Cl 53	N-E	S-N	Lavado de pulsador			232
			Lavado de disco pep			236
CR 74 x Cl 53	NW	S-N	Lavado de poste recto			230
			Lavado de semáforo peatonal			231
			Lavado de pulsador			232
			Lavado de disco pep.			236
	NW	N-S	Lavado de poste recto			230
			Lavado de semáforo vehicular			234
			Lavado de semáforo peatonal			231
			Lavado de disco direccional.		5:00 pm	236

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL EIT MEDELLIN / CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 / ROV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	29-05-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Viernes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Luis Fdo Guerrero	1'070.807.034			Jonathan Londoño	1036906275
Ermis Torres	1 028 030.487				
Jorge Luis Rodriguez	PPT: 1137342				
Miguel Angel Villeda	1.08 229 962				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 57 x CL 48			Construcción de base para controlador			33
			Construcción de canalización en adoquín 20cm con 3 tubos del 3".			

EQUIPO EN OBRA: Herramienta menor, pulidora, taladro demoledor, planta electrica

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL RIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / RMY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	27/02/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro Londoño	71775731
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CARRERA 41 X CL 46	pagado		Retiro de cable telefónico de 10, 20 ó 50 pares. Incluye transporte a su disposición final. 380 MTS			173
			Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares. 380 MTS			215
	mar 20		Suministro, transporte e instalación de tuerca de ojo para instalación de fibra óptica. 2 UNIDADES			123
			Suministro, transporte e instalación de helicoidal para instalación de fibra óptica. 2 UNIDADES			125
			Suministro, transporte e instalación de placa identificadora de fibra óptica. 13 UNIDADES			126
			Empalme por fusión de fibra óptica de 24 hilos , incluye instalación de mufla con derivación. 1 UNIDAD			114
			Suministro e instalación de fibra óptica armada de 24 hilos. 420 METROS			113
CR 48Bx CL 5			Soldada de cajas de inspección. Mínimo 15 cm de cordón en cada lado de la caja. 5 UNIDAD			262
Paso Inem			Retiro de Soldadura en tapa- marco en caja de inspección. 5UNIDAD			183
			Suministro, transporte e instalación de placa identificadora de fibra óptica. 12 UNIDADES			126

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / UNION TEMPORAL	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	2/03/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro Londoño	71775731
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CARRERA 91 X CL 64	pagado		Suministro, transporte e instalación de fibra óptica ADSS, 87 MTS. CR 91 x CL 64 A CR 89 x CL 65			122
			Suministro, transporte e instalación de placa identificadora de fibra óptica. 4 UNIDADES			126
	mano		Empalme por fusión de fibra óptica de 24 hilos , incluye instalación de mufla con derivación. 2 UNIDADES			114
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
CARRERA 48 X CL 2			Suministro e instalación de fibra óptica armada de 24 hilos. 235 METROS			113
			Suministro, transporte e instalación de placa identificadora de fibra óptica. 11 UNIDADES			126
CARRERA 48 X CL 4			Suministro e instalación de fibra óptica armada de 24 hilos. 160 METROS			113
			Suministro, transporte e instalación de placa identificadora de fibra óptica. 9 UNIDADES			126
			Soldada de cajas de inspección. Mínimo 15 cm de cordón en cada lado de la caja. 2 UNIDAD			262
			Retiro de Soldadura en tapa- marco en caja de inspección. 1 UNIDAD			183

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / UNION TEMPORAL RIT MEDELLIN	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	3/03/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro Londoño	71775731
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CARRERA 75 X CL 80	pagado		Desmonte de caja ob, instalacion de caja ob suministro e instalacion de Pigtails SC/UPC. 1 UNIDADES			
		marzo	Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 UNIDADES. CR 75 X CL 80 A CR 72A X CL 78B			117
CARRERA 75 X CL 80	pagado		Desmonte de caja ob, instalacion de caja ob suministro e instalacion de Pigtails SC/UPC. 1 UNIDADES			
		marzo	Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 UNIDADES. CR 75 X CL 80 A CR 80 X CL 80			117
CARRERA 75 X CL 80	pagado		Desmonte de caja ob, instalacion de caja ob suministro e instalacion de Pigtails SC/UPC. 1 UNIDADES			
		marzo	Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 UNIDADES. CR 75 X CL 80 A CR 80 X CL 77BB			117
CARRERA 48 X CL 10			Soldada de cajas de inspección. Mínimo 15 cm de cordón en cada lado de la caja. 1 UNIDAD			262

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / RAV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	4/03/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIERCOLES		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro Londoño	71775731
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CARRERA 32 X CL 9 SUR	Pagado marzo		Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades CR 32 X CL 9 SUR A CR 32 X CL 5 SUR			117
CARRERA 32 X CL 5 SUR	Pagado marzo		Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades CR 32 X CL 5 SUR A CR 32 X CL 9 SUR			117
CARRERA 48 X CL 10			Suministro e instalación de fibra óptica armada de 24 hilos. 530 METROS CR 48 X CL 10 A CR 48 X CL 14			113
			Soldada de cajas de inspección. Mínimo 15 cm de cordón en cada lado de la caja. 1 UNIDAD			262
			Retiro de Soldadura en tapa- marco en caja de inspección. 1UNIDAD			183
			Suministro, transporte e instalación de placa identificadora de fibra óptica. 27 UNIDADES			126

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / RMY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	5/03/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro Londoño	71775731
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 52 X CL 53			Desmonte de caja ob, instalación de caja ob suministro e instalación de Pigtails SC/UPC. 1 UNIDADES			
	Pagado		Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 UNIDADES. CR 52 X CL 53 A CR 53 X CL 52			117
CR 53 X CL 53			Desmonte de caja ob, instalación de caja ob suministro e instalación de Pigtails SC/UPC. 1 UNIDADES			
	Pagado		Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 UNIDADES. CR 53 X CL 53 A CR 53 X CL 50			117
CR 54 X CL 53	Pagado		Desmonte de caja ob, instalación de caja ob suministro e instalación de Pigtails SC/UPC. 1 UNIDADES			
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 UNIDADES. CR 54 X CL 53			117
CR 53 X CL 53-2	Pagado		Desmonte de caja ob, instalación de caja ob suministro e instalación de Pigtails SC/UPC. 1 UNIDADES			
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 UNIDADES. CR 53 X CL 53			117
CIOS			Fusión de 8 Pig tails			
			Fusión de 8 empalmes			
CR 48 x CL 2			Suministro e instalación de fibra óptica armada de 24 hilos. 200 METROS			113
			Soldada de cajas de inspección. Mínimo 15 cm de cordón en cada lado de la caja. 3 UNIDAD			262
			Retiro de Soldadura en tapa- marco en caja de inspección. 3 UNIDAD			183
			Suministro, transporte e instalación de placa identificadora de fibra óptica. 12 UNIDADES			1260

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNION TEMPORAL · INT FAROL MED 2025 · RAMY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	6/03/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro Londoño	71775731
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CARRERA 25 X CL 21 SUR			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades CR 25 X CL 20 SUR A CR 27 X CL 20 SUR			117
	Pagado					
CARRERA 25 X CL 21 SUR			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades CR 25 X CL 20 SUR A CR 27 X CL 12 SUR			117
	marzo					
CARRERA 27 X CL 20 SUR			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades CR 27X CL 20 SUR A CR 34 X CL 16 SUR			117
CARRERA 27 X CL 20 SUR			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades CR 27 X CL 20 SUR A CR 25 X CL 21 SUR			117
CR 48 X CL 7 SUR			Soldada de cajas de inspección. Mínimo 15 cm de cordón en cada lado de la caja. 9 UNIDAD			262
			Retiro de Soldadura en tapa- marco en caja de inspección. 9 UNIDAD			183

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / RAY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	9/03/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	LUNES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro Londoño	71775731
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 48 X CL 2			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 48 X CL 2 A CR 48 X CL 1)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 48 X CL 2			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 48 X CL 2 A CR 48 - CL 7D)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 48 X CL 1 SUR			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 48 X CL 1 SUR A CR 48 X CL 2)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 48 X CL 7D			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND (CR 48 X CL 7D A CR 48 X CL 2)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 48 X CL 7D			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND (CR 48 X CL 7D A CR 48 X CL 9)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 52 X CL 50	pagado abril		Soldaduras de camaras 4 Tapas (CR 52 X CL 50 A CR 52 X CL 46)			262

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD**	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025**	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	10/03/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro Londoño	71775731
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 39 X CL 48			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 39 X CL 48 A CR 39 X CL 50)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 48 X CL 10			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 48 X CL 10 A CR 48 X CL 9)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 48 X CL 10			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 48 X CL 10 A CR 48 X CL 14)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 48 X CL 7D			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND (CR 48 X CL 9 A CR 48 X CL 7D)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 48 X CL 9			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND (CR 48 X CL 9 A CR 48 X CL 14)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 48 X CL 10			Instalación tendido de fibra optica armada 300 metros (CR 48 X CL 10 A CR 48 X CL 14)			113
			Suministro e Instalación de placas identificadoras 14 Und			126
			Soldadas de recamaras 3Und			262
			Desoldadas de camaras 1 Und			183
CR 51 X CL 92			Soldada de camara 1 Und			—
pagado			Desoldada de camara 1 Und			—

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / RAY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	18/03/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIERCOLES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro Londoño	71775731
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 51 X CL 10			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 51 X CL 10 A CR 52 X CL 10)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 52 X CL 10			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 52 X CL 10 A CR 51 X CL 10)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 48 X CL 18			Suministro e instalación de 400 mts de fibra optica armada (CR 48 X CL 18 A CR 48 X CL19)			113
			Suministro e instalacón de 15 placas identificadoras			126

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL BIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD**	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	19/03/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro Londoño	71775731
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
EAFIT			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (EAFIT A CR 48 X CL 08)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 48 X CL 18			Suministro e intalación de 100mts de fibra optica ADSS (CR 48 X CL 18 A CR 48 X CL 19)			122
			Suministro e instalación de tuerca de ojo para instalación de fibra óptica			123
			Suministro e instalación de 4 helicoidales			125
			Suminitro e instalación de 9 placas identificadoras de fibra optica			126
			Construcción de canalización en zona verde : 11 m.			27
			Suministro e instalación de 2 tubos bajantes galvanizados de 1 1/2 pulgadas de 1 m c/u.			47

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	20/03/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro Londoño	71775731
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 48 X CL 19			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 48 X CL 19 A CR 48 X CL 18)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 48 X CL 19			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 48 X CL 19 A CR 48 X CL 24)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 48 X CL 19			Suministro e instalación de 1 placa identificadora (CR 48 X CL 19 A CR 48 X CL 18 A CR 48 X CL 24)			126
			Empalme por fusión de fibra óptica de 24 hilos , incluye instalación de mufla con derivación.			114
CR 48 X CL 19			Suministro e instalación de 596 mts de fibra optica armada (CR 48 X CL 19 A CR 48 X CL 24)			113
			Suministro e instalación de 24 placas identificadoras de fibra optica			126

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL IBT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / ROW	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	24/03/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro Londoño	71775731
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 48 X CL 24			Desoldada de camara 1 Und (CR 48 X CL 24 A CR 48 X CL 25)			183
			Soldada de camara 1 Und			262

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD**	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: **REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN**

FECHA:	28/03/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	SABADO		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				**INTERVENTORÍA**	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749				
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 48 X CL 16A			Suministro e instalación de 520 mts de fibra optica armada (CR 48 X CL 14 A CR 48 X CL 16)			
			suministro e instalación de 30 placas identificadoras de fibra optica			
			Desoldada de camara 1 Und			
			Soldada de camaras 3 Und			

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		**RESPONSABLE INTERVENTORÍA**
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL EIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / RAV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	30/03/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	LUNES		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro Londoño	71775731
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 48 X CL 14			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pigtail LC y organización de hilos. 1 UND (CR 48 X CL 14 A CR 48 X CL 16)			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
CR 48 X CL 14			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pigtail LC y organización de hilos. 1 UND (CR 48 X CL 14 A CR 48 X CL 10)			116
CR 48 X CLL 16			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pigtail LC y organización de hilos. 1 UND (CR 48 X CL 16 A CR 48 X CL 14)			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
CR 48 X CL 16			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pigtail LC y organización de hilos. 1 UND (CR 48 X CL 16 A CR 48 X CL 18)			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
CR 48 X CL 24			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pigtail LC y organización de hilos. 1 UND (CR 48 X CL 24 A CR 48 X CL 19)			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
CR 48 X CL 04			Suministro e instalación de 407mts de fibra armada (CR 48 X CL 04 A CR 48 X CL 01)			113
			Suministro e instalación de 21 placas identificadoras de fibra óptica			126
CR 48 X CL 14			Soldadura de 12 camaras (CR 48 X CL 14 A CR 48 X CL 16)			262

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT. PARQ. MED 2025 / ROV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	31/03/2026	TIEMPO	SECO	✓	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Luis Fernando G. M	1.070807034			Alvaro Londoño	71775737
Santiago Perea Cano	1.000533792				
Leonar Rivas	PPt 4350775				
Jose. Alex. Caña.	1.036651089				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR52C11 70x5.	S P.	S N	Instalacion de 862 mt de fibra. Optica para la comunicacion cerca fonica.	9.30		113
			instalacion de 20 Placas informativa Amarillas.		4.30.	126

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTEAROL MED 2025 / RAY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	07/04/2026	TIEMPO	SECO	✓	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	miercoles		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:	LKN 741		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Luis Fernando G. A	1.070807034			Alvaro Londoño	71775731
Santiago mena. G.	1.000533792.				
Leomar Rivera.	PPT.U350775				
Jose. Alex Cano.	1.036651089				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 52 C 115 Y 2	S P	S N	Instalacion de 770 mt de Cable de fibra	8 40		113
			Para la Comunicacion Semaforica.			
			Instalacion de 18. Pla Puntas Amarillas		11 50	126
			Informatica.			
			Retiro de soldadura de 2 tapas de 50x50			183
			Soldadura de 2 tapas de 50x50cm			262

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INT FAROL MED 2025 RMV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN**

FECHA:	1/04/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIERCOLES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro Londoño	71775731
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 70 X CL 14			Desmonte e instalación de una caja OB (CR 70 X CL 14 A CR 70 X CL 19)			
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
CR 70 X CL 09			Desmonte e instalación de una caja OB (CR 70 X CL 09 A CR 70 X CL 14)			
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
CR 70 X CL 14			Desmonte e instalación de una caja OB (CR 70 X CL 14 A CR 70 X CL 09)			
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
CR 48 X CL 24			6 metros canalización en zona verde (CR 48 X CL 24 A CR 48 X CL 25)			27
			Suministro, transporte e instalación de bajante metalico de 1 1/2" (4,5mts)			47
			Soldada de 9 tapas de camaras			262

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	6/04/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	LUNES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA

NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749		
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927		

INTERVENTORÍA

NOMBRE	CÉDULA
Alvaro Londoño	71775731

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 51 X CL 41			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pigtail LC y organización de hilos. 1 UND (CR 51 X CL 41 A CR 51 X CL 44)			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
CR 52 X CL 10			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pigtail LC y organización de hilos. 1 UND (CR 52 X CL 10 A CR 52 X CL 05)			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN**

FECHA:	7/04/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro Londoño	71775731
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 51 X CL 44			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 51 X CL 44 A CR 41 X CL 41)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

3/2

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN · CONSORCIO INTEAROL MED 2025 · PAV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 09-04-2026 DIA: Jueves VEHÍCULOS:	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	X	UNIFORMES	CUMPLE SI X NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI X NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santos	1038866300			Alvaro Londoño	71775731
Jaime Cifuentes	71180678				
Santos Mena	1000533797				
Alex Cossi	1036651089				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR32-34 calle 1Sur.			Suministro e instalación de 29mts de cable fibra optica armada de 24 hilos consecutivos (3294 - 3003).	11-20		113
			Suministro e instalación de 17 placas de identificación de cable fibra optica			126
CR32C 1Sur	N-W.		Retiro de 12 cordones de Soldadura a 3 tapas de Cofre			183
CR34C 1Sur	N.		Retiro de 16 cordones a 4 tapas de cofre de Bronce central.			183
			Retiro de 2 Cordones a 1 tapa de Cofre		16-50	183

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INT EAFOL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	10-04-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Viernes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santos	1038806300			Alvaro Londoño	71775731
Jaime Cifuentes	71480675				
Santiago Mena	1000533792				
Alex Caños	1036651089				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR34-378 calle 1Sur.			Suministro e instalacion de 490mts de cable fibra optica armado de 24 hilos concentrador (3003-2513).	9-20	16-00	113
			Suministro e instalación de 24 pbocs de idem ubicación de cable fibra optica			126

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / L RAV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN**

FECHA:	13/04/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	LUNES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA		**INTERVENTORÍA**	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749	Alvaro Londoño	71775731
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 48 X CL 30			Suministro e instalación de 297mts de fibra armada			113
			Suministro e instalación de 14 placas identificadoras de fibra óptica			126

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		**RESPONSABLE INTERVENTORÍA**
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL EIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / RAV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN**

FECHA:	14/04/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro Londoño	71775737
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 80 X CL 44			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 80 X CL 44 A CR 79 AA)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 80 X CL 44			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 80 X CL 44 A IGLESIA)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 48 X CL 30			Suministro e instalación de 356mts de fibra óptica armada			113
			Suministro e instalación de 19 placas identificadoras de fibra óptica			126

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNIÓN TEMPORAL IST MEDELLÍN · CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	14 Abril 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes.		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71.480.675			Alvaro Londoño	71775731
Yelson Conas	1.035.961.703				
Santiago Hena	1.000.533.792				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* Carrera 80 entre calle 9 y calle 6	E	S-N	Revision de cable de comunicaciones por cargal de inspeccion, se revisa el cable de comunicacion entre calle 9 y calle 6 por problemas de Coneccion durante 5 horas, no se encuentra ningun daño en el cable de fibra optica Nota: El cable de comunicaciones se encontraba flojo en la borrera del controlador, se deja en funcionamiento.			261

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Oleny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	15-04-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO	X		SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	LKN 741		DURACIÓN	2.5 horas		NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santes	1038806300			Alvaro Londoño	71775731
Leamar Rivera	PPT435071S				
Yeison Cañas	1.035.861.703				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR52CL30			Revisión de cruce con Problemas			261
CR52CL29			Revisión de cruce con Problemas.			261
* CR43D - A8 Calle 1 Sur.			Suministro e instalación de 362 mts de cable fibra optica armada de 24 hilos consecutivos (2008 - 1646).			113
			Suministro e instalación de 12 Placas identificación de cable.			126
			Nota: Programar la terminación de instalación del Cable de fibra optica ya que fuertes lluvias no fue posible terminar.			

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / RAY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	15/04/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIERCOLES		LLUVIOSO			SI	✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO			NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro Londoño	71775731
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 70 X CL 16			Desmonte e instalación de una caja OB (CR 70 X CL 16 A CR 70 X CL 23)			
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 70 X CL 16			Desmonte e instalación de una caja OB (CR 70 X CL 16 A CR 70 X CL 14)			
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 48 X CL 04 SUR			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 48 x CL 04 SUR A EAFIT)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CL 48 X CL 04 SUR			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 48 x CL 04 SUR A CR 48 X CL 01 SUR)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD**	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	16/04/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro Londoño	71775731
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 48 X CL 24			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 48 X CL 24 A CR 48 X CL 25)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 48 X CL 30			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 48 X CL 30 A EMPALME EXISTENTE)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 48 X CL 30			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 48 X CL 30 A CR 48 X CL 31)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 48 X CL 31			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND (CR 48 X CL 31 A CR 48 X CL 30)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 43 X CL 50			Suministro e instalación de 630mts de fibrada armada			113
			Suministro e instalación de 13 placas identificadoras de fibra optica			126

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

112

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLÍN / CONSORCIO INT. PAROL. MED 2025 R&Y	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	16-04-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	IKN 741		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santos	1038806300			Alvaro Londoño	71775731
Leonar Viera	RPT: 4350715				
Jean carlos usuga	1214729941				
Alex cañar	1036651089.				


	DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
X	CR48CL15sur	N-E.		Suministro e instalación de 3 placas de identificación de cable Rota el cable de fibra optica se debe instalar en controlador local.			126
X	CR43D CL15sur			Separador control. Suministro e instalación de 3 placas de identificación de cable fibra optica Rota el cable fibra optica se debe instalar en controlador local Soldar de 8 cordones a 2 tapar de 50x50			126 262
X	CR51CL36-37			Sondeo y levantamiento.			237

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

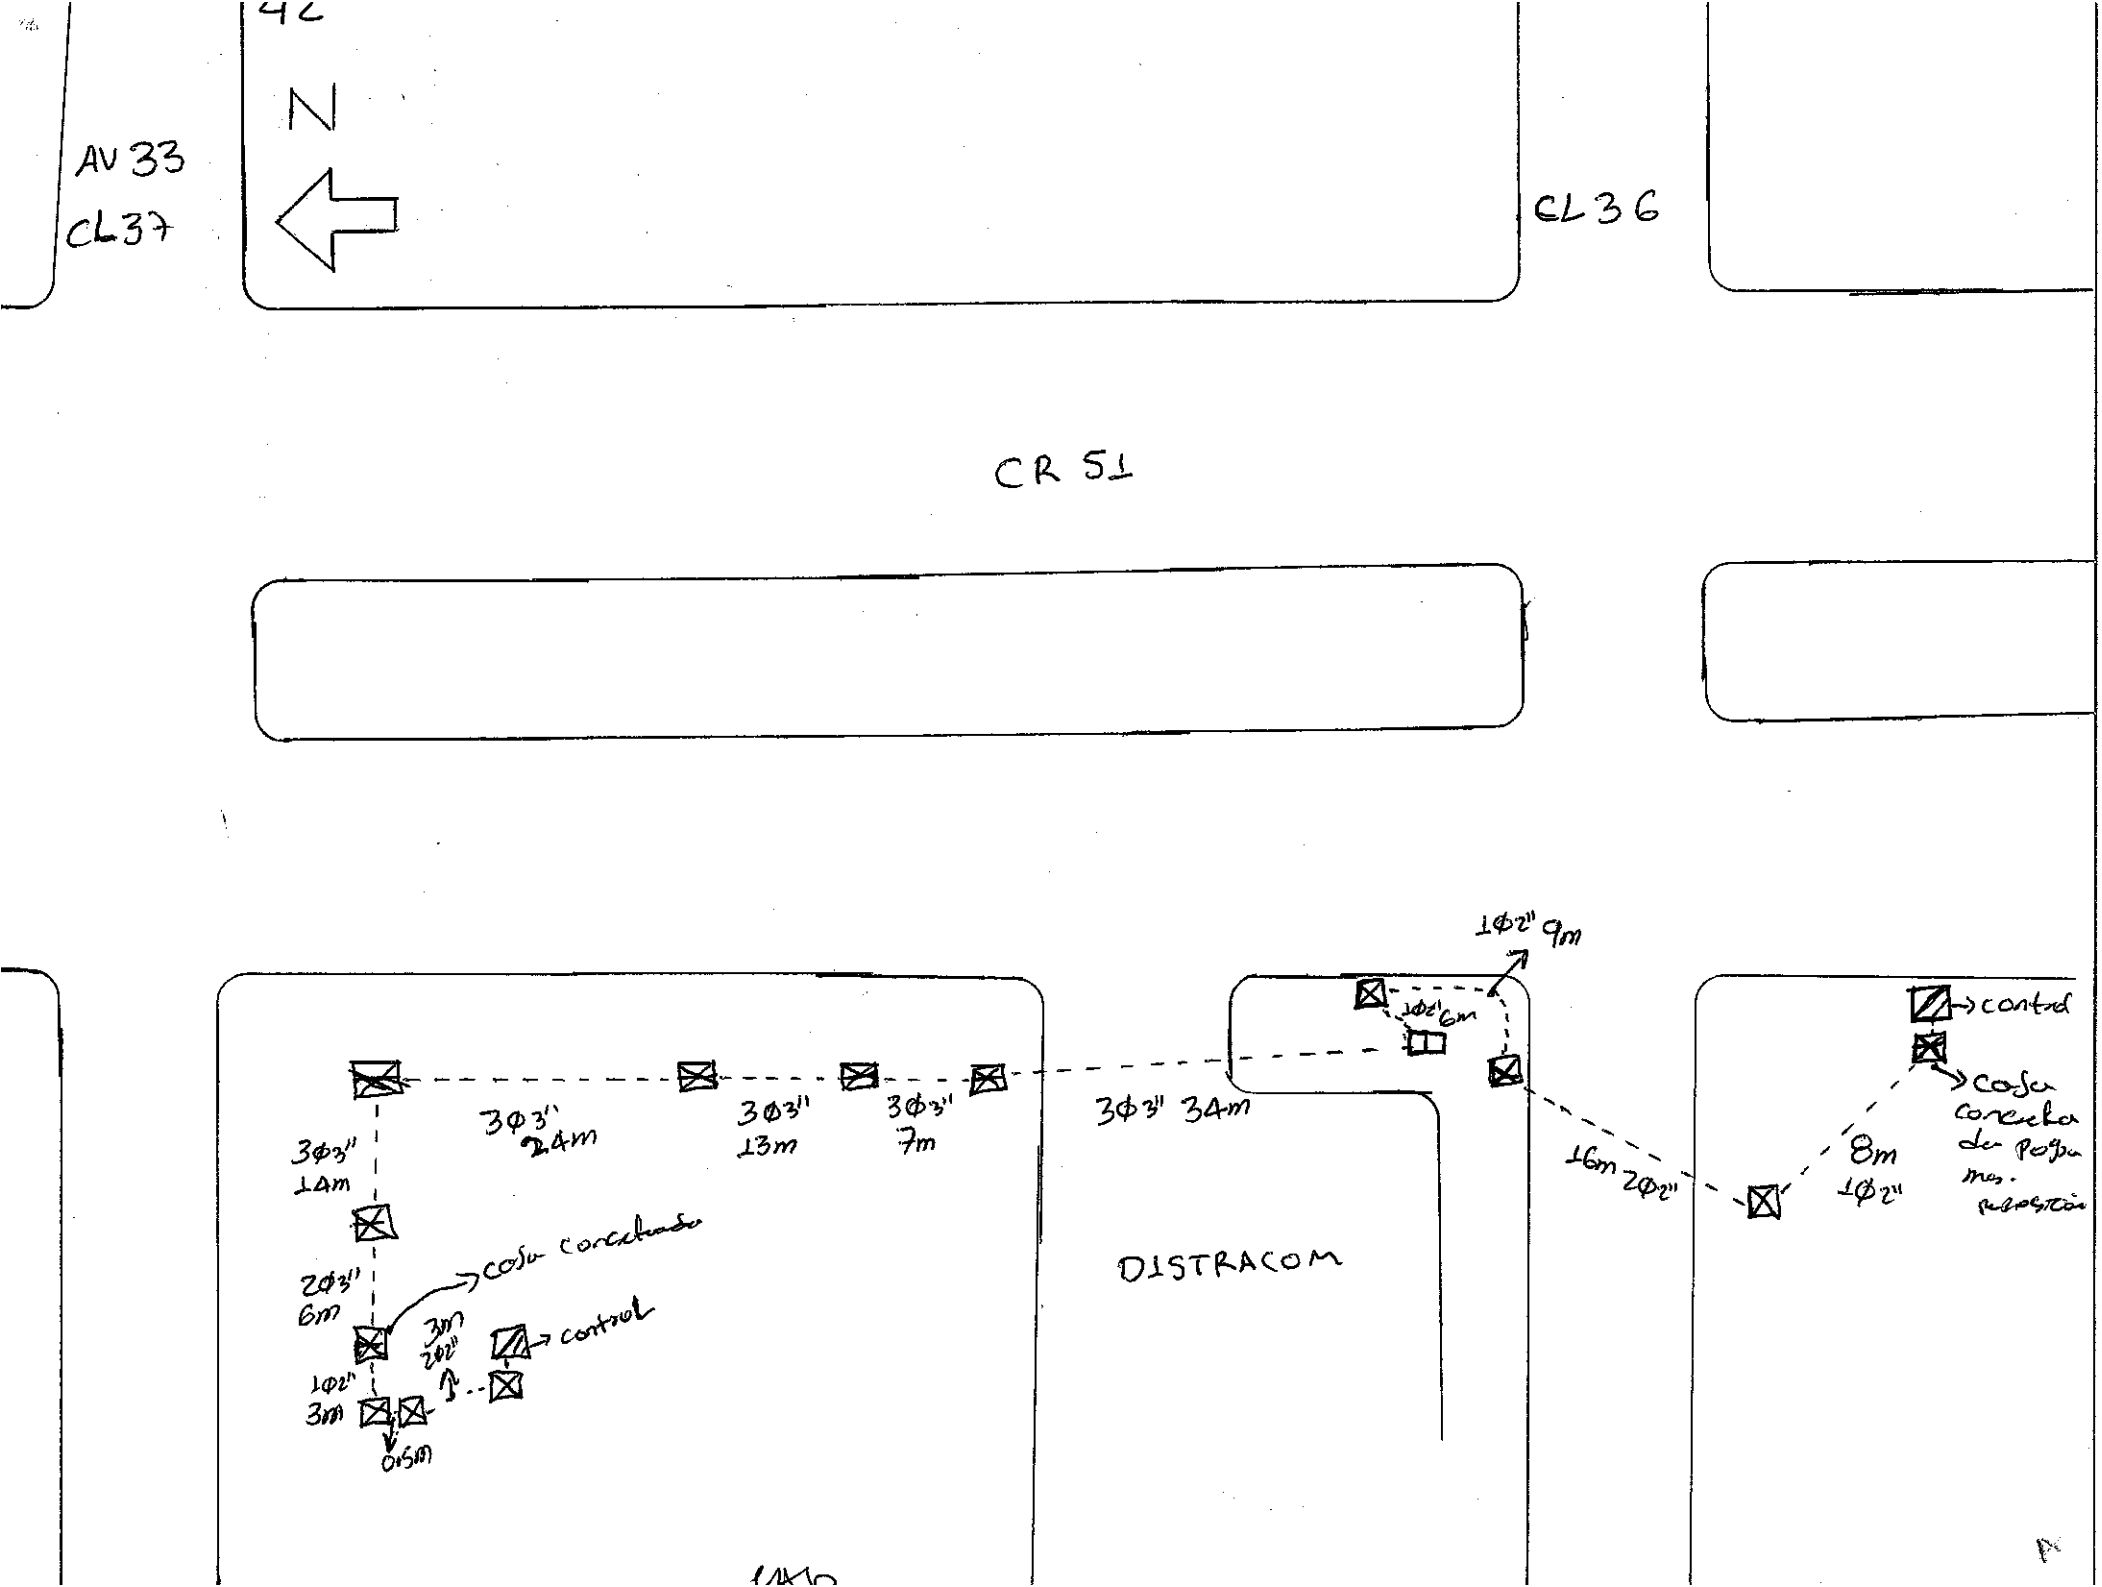
42
N
AV 33
CL 37
CL 36
CR 51
3Φ3" 24m
3Φ3" 13m
3Φ3" 7m
3Φ3" 34m
3Φ3" 14m
2Φ3" 6m
cosa concreta
3m 2Φ2"
control
1Φ2" 3m
0.5m
DISTRACOM
1Φ2" 9m
1Φ2" 6m
16m 2Φ2"
8m 1Φ2"
control
cosa concreta de Pozo mas reposteria

CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD**	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	17/04/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749	Alvaro londoño	71775731
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 48 X CL 30			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 48 X CL 30 A CR 45 X CL 29)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 48 X CL 30			Suministro e instalación de 280mts de fibra óptica armada (CR 48 X CL 30 A CR 45 X CL 29)			113
			Suministro e instalación de 11 placas identificadoras de fibra óptica			126
			Soldadas de 2 camaras			262
CR 48 X CL 29			Suministro e instalación de 320mts de fibra óptica ADSS (CR 48 X CL 29 A CR 48 X CL 30)			122
			Suministro e instalación de 13 placas identificadoras de fibra óptica			126
			Suministro einstalación de 10 trompla platinas			123
			Suministro einstalación de 10 helicoidales			125
			Empalme por fusión de fibra óptica de 24 hilos.			114

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / RAY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	18/04/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	SABADO		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro londoño	71775731
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 48 X CL 29			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 48 X CL 29 A EMPALME EXISTENTE)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 48 X CL 29			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 48 X CL 29 A CR 48 X CL 25)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 45 X CL 29			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 45 X CL 29 A CR 48 X CL 30)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD**	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN**

FECHA:	21/04/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Mucio londoño	71225731
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 48 x CL 10			Suministro e instalación de 530 mts de fibra armada (CR 48 x CL 10 A CR 51 x CL 10)			113
			Suministro e instalación de 20 placas identificadoras de fibra óptica			126
			Desoldada de una (1) camara			183
			Soldada de una (1) camara			262

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	22/04/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIERCOLES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO ✓

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro londoño	71775731
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 84 x 75C - 77			Suministro e intalación de 110mts de fibra ADSS			122
			Suministro e instalación de 2 placas identificadoras de fibra óptica			126
			Suministro e instalación de 2 trompo platinas			123
			Suministro e instalación de 2 helicoidales			125
CR 64E x CL 50			Desmonte e instalación de una caja OB, empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye pigtail LC y organización de hilos. 1 UND			
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
CR 65 x CL 50			Desmonte e instalación de una caja OB, empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye pigtail LC y organización del hilos. 1 UND (CR 65 x CL 50 A CR 65 x CL 49B)			
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
CR 65 x CL 50			Desmonte e instalación de una caja OB, empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye pigtail LC y organización de hilos. 1UND (CR 65 x CL 50 A CR 65 x CL 51)			
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
CR 65 x CL 50			Desmonte e instalación de una caja OB, empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye pigtail LC y organización de hilos. 1UND (CR 65 x CL 50 A CR 66 x CL 50)			
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
CR 65 x CL 50			Desmonte e instalación de una caja OB, empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye pigtail LC y organización de hilos. 1UND (CR 65 x CL 50 A CR 64B x CL 50)			
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	25/04/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	SABADO		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro Londoño	71275731
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 48 x CL 10			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 48 x CL 10 A CR 51 x CL 10)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 51 x CL 10			Emplame de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 Und (CR 51 x CL 10 A CR 48 x CL 10)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 48 x CL 18			Emplame de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 Und (CR 48 x CL 18 A CR 48 x CL 19)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 48 x CL 18			Emplame de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 Und (CR 48 x 18 A CR 48 x CL 16)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 17B x CL 49			Emplame de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 Und (CR 17B x CL 49 A CR 20B x CL 49)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 53 x CL 30A			Suministro e instalación de 240mts de fibra armada			113
			Suministro e instalación de 11 placas identificadoras de fibra óptica			126
			1 metro de canalización en zona verde			25

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

1/3

COMSORCIO INTERVIAL MED 2025 / RBY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	(27-28-30)04-26	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Cons, Mart, y Juev		LLUVIOSO	X		SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	IGN 741		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santer	1038806300			Alvaro londoño	71775271
Santiago Mena	1000533792				
Leonar Rivera	PPTA350715				
Alex cañas	1036651089				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR52 CL38-39.			Para Poder instalar el cableado de forma OBtima. Tras Varias intentos se logro Perforar y Pasar la Resca.			
CR52CL38	N-W		Retiro de 8 cordones de soldadura en 2 Tramos de 50x50.			183
			Soldadura de 8 cordones en 2 tramos de 50x50.			262
CR5LCL5L	S-E		Retiro de (3Lx4m) = 12m de cable telefonico de 20 pares Para Posterior en cada de cambio			200
CR52-52 calle 2el			Sondeo y levantamiento (30-04-2026) Instalación de 191mts de cableado de Señal			225

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105556 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	(27-28-30) 04-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Lunes, Martes y Jueves.		LLUVIOSO	X		SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	TKN 721		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santes	1038806300			Jonathan Pinedo	1036906790
Santiago Mena	1000533792				
Leomar Rivera	PPT 1350715				
Alex cañor	1036651089				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR52CL38			Suministro e instalación de 551 mts de canal (551)			113
o			fibra optica enterrado en bolsillos (4004 - 3453).			
CR51CL41			Suministro e instalación de 19 placas de identi			126
			ficación de canal fibra opticas.			
			El 28-04-2026 en CR52CL40. Donde se			
			2 camaras telefonicas cortado N-E			
			El 30-04-2026 en la CR52CL39. Donde se			
			de 1 camara telefonica.			
			Nota: Cuando se realizaron las actividades			
			de los sondeos entre la CR52calle38-39.			
			en el plano o boceto se evidencia que			
			solo en tubo de 3" se encuentra empaca			
			tado pero la cantidad de ductos instalados la			
			Cabuya para Posteriormente instalar la fibra			
			optica, pero personal de Tigo une o Claro			
			utilizó la cabuya y dejando el tubo sin mas			
			espacio por el metros fueron la demora →			

EQUIPO EN OBRA:


Tripode y bomba sumergible Lanamiento manual planta electrica

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

Se verifica señalización y condiciones para ingreso a espacios confinados

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria

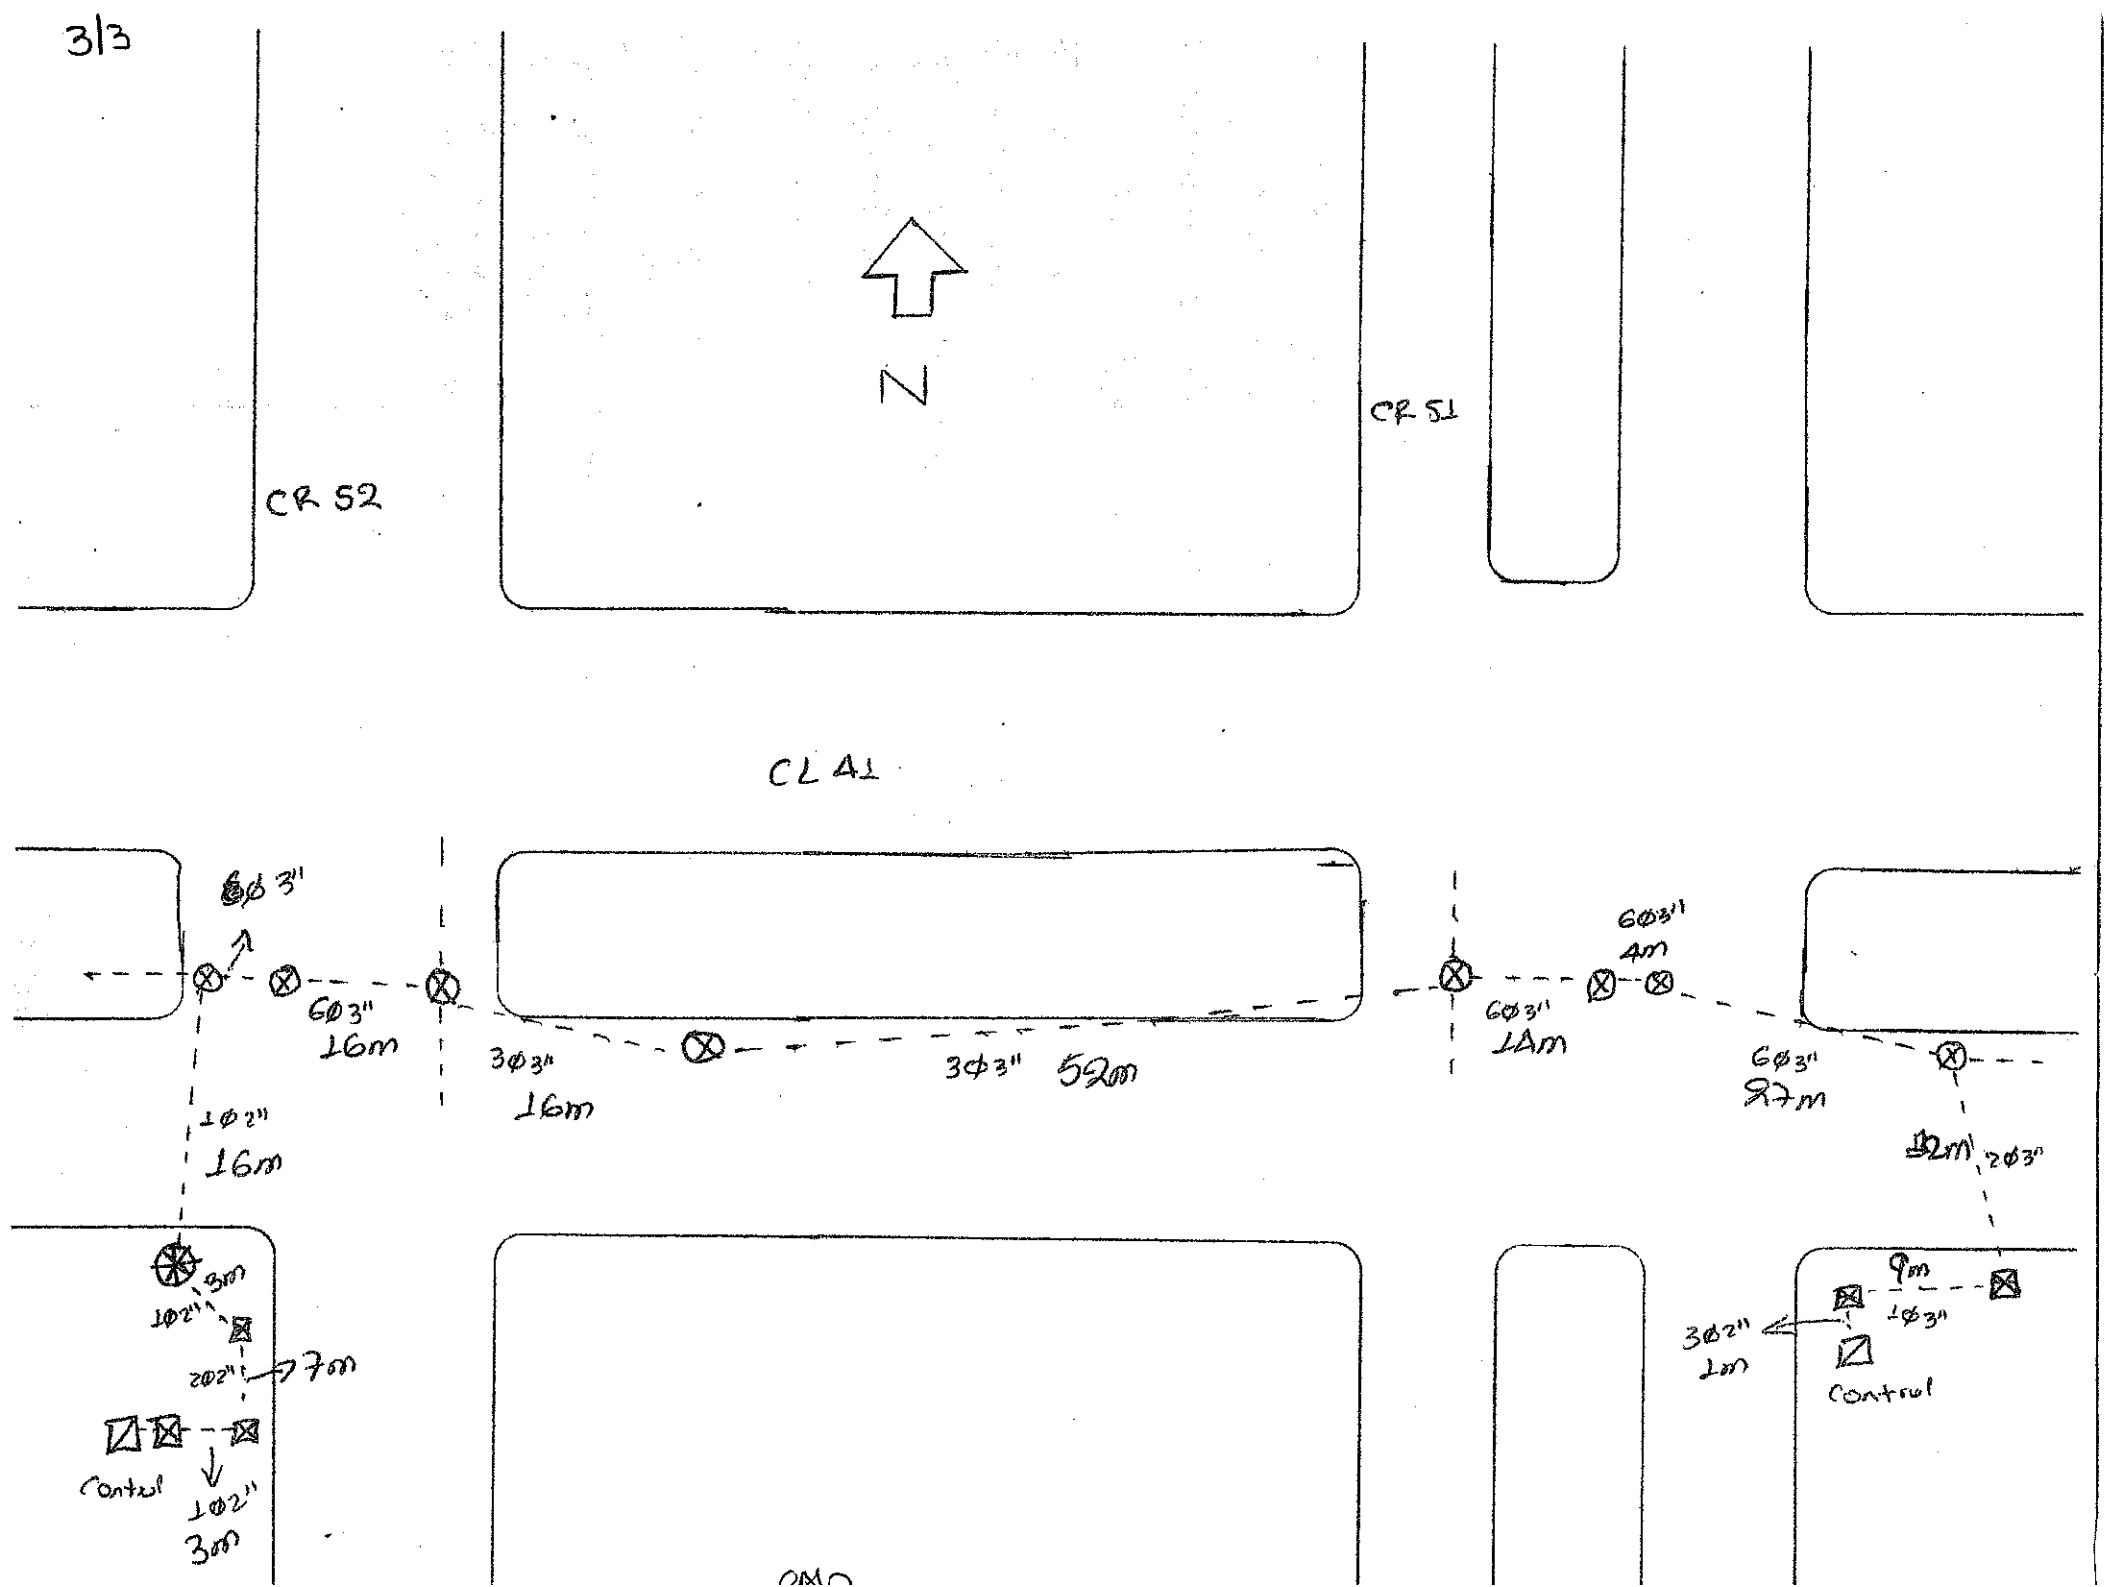
N
CR 52
CR 51
CL 41
6Ø3"
6Ø3"
16m
3Ø3"
16m
3Ø3"
52m
6Ø3"
4m
6Ø3"
14m
6Ø3"
27m
12m
2Ø3"
1Ø2"
16m
3m
1Ø2"
2Ø2"
7m
Control
1Ø2"
3m
9m
1Ø3"
3Ø2"
1m
Control

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN**

FECHA:	2/05/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	SABADO		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO ✓

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro londoño	71735231
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 80 x CL 47D			Desmonte e instalación de una caja OB, empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye pigtail LC y organización del hilos. 1 UND (CR 80 x CL 47D A CR 78 x CL 47D)			
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 81 x CL 50			Desmonte e instalación de una caja OB, empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye pigtail LC y organización del hilos. 1 UND (CR 81 x CL 50 A CR 80 x CL 48)			
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 65 x CL 30A			Sondeo a canalizaciones. (1 Und) (CR 65 x CL 30A A CR 65 X CL 30)			237

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA (MVD)	FIRMA CAD	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	24-05-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Lunes		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	IKN701		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santer	1036806300			Alvaro Londoño	71775721
Santiago Mena	1000533797				
Leonar Rivera	PPT 4350715				
Alex cossio	1036651089				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR37BCL15SUR			Suministro e instalación de 505mts de	9-30	17-00	113
CRA3ACCL5SUR			Cable fibras OPtica armada de 24 hilos			
			Suministro e instalacion 24 placas de			126
			identificación de cable			
			Consecutivos (2513-2008).			
CR37BCL15SUR	S-W.		Retiro de 4 cordones a 1 tapa de 60x80			183
			Retiro de 4 cordones a 1 tapa de 50x50			183
			Soldadura a 4 cordones a 1 tapa de 50x50			262
			En la aplicacion puntos de soldadura a tapa			
			de 60x80			

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	05/05/2026	TIEMPO	SECO	V	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	martes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WIZ 049		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Luis Fernando Gil	70.190.036			Alvaro Londoño	71775731
Eurin Torres	1028030487				
Miguel Angel Villada	1018229962				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 52 c 115.	OR.	NS	busqueda de una caja Perdida.			
			Demolicion de un anden de 1mt x 1mt			1
			Desoldada de una caja de 50x50			183
			instalacion de 180 mt de fibra Por dos			113
			Puntas total 360 armada.			
			Soldada de una caja de 50x50			262
			Construccion de un Anden de 4x7.			36
			Se hacen 4 Sanchadas en cajas de			104
			sobre poner a vereda.			

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 / RFY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 5-6 Mayo DIA: Lunes – Martes VEHÍCULOS:	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE SI ✓ NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI ✓ NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santos	1038806800			Alexis Londoño	1077572
Camilo Restrepo	71295492				
Santiago Henao	1.000.533792				
Leomar Riera	PPT 4350715				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carreras 43A 43D x calle 1 Sur			Suministro e instalacion de 582 metros de cable de fibra optica, consecutivos (2383-1801)			113
			Suministro e instalacion de 29 placuetas de identificacion de cable de fibra optico			126
			Retiro de soldadura de tapa de caja de inspeccion 02 unidades. (43A)			183
			Soldada de tapa de caja de inspeccion 02 unidades. (43A)			262
			Retiro de soldadura de tapa de caja de inspeccion 03 unidades. (43D)			183
			Soldada de tapa de caja de inspeccion 03 unidades (43D)			262
			Tibu óptica Armado..			

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	6/05/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIERCOLES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Mauricio Londoño	71775371
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 48 x CL 1 SUR			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 48 x CL 1 SUR A CR 48 x CL 04)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 48 x CL 1 SUR			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 48 x CL 1 SUR A CR 43D x CL 1 SUR)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 43D x CL 1 SUR			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 43D x CL 1 SUR A CR 48 x CL 1)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 43D x CL 1 SUR			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 43D x CL 1 SUR A CR 43a x CL 1 SUR)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 43a x CL 1 SUR			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 43a x CL 1 SUR A CR 43D x CL 1 SUR)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 43a x CL 1 SUR			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 43a x CL 1 SUR A CR 37B x CL 1 SUR)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 – RMV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	6/05/2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles - Jueves		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WC2 049		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Luis Fernando G A	7.070.807.074			Alvaro Londoño	7727731
Elvis Fonvez	1028031487				
Santiago Mena G.	1000573792				
Miguel Angel Villegas	1078229962				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 52 cll 9 y 25	ORin	SR	Instalacion de 870 mt de Cable de. Fibra Optica Por canaras de tierra y Cajas de semaforos armada	8 30		113
			Desoldada de una Caja de dos te.			183
			Desoldada de 2 cajas de 50x50.			183
			Soldada de una caja dos te.			262
			Soldada de dos cajas de 50x50.			262
			Instalacion de 76 Plaquetas informativas Amarillas		4 10	126

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Gueny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / RAV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	7/05/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Jhonfredy Londoño	71785749
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 52 x CL 22			Suministro e instalación de 431mts fibra óptica armada (CR 52 x CL 22 A CR 52 x CL 25)			113
			Suministro e instalación de 10 placas identificadoras de fibra óptica			126
CR 52 x CL 25			2 metros de canalizacion en zona verde con 1 tubo de 2 pulgadas.			28

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / DMV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:		TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:			LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
				Alvaro Londoño	71775731

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
6584 ANFITEATRO			Adecuación de CL. de 6 a 8 grupos			250
BORNERAS			16			
TOMAS CORRIENTE			2			
TERMOSTATO			—			
EXTRACTOR			—			
BREAKER MONO DOLAR 3A			—			
BREAKER			—			
FRENOS BORNERAS			3			
CANALETA			—			
TERMINALES	CABLE		10			
CABLES			1,5			
TORNILLERIA			1			
OTROS			1			
TRANSPORTE			1			
HERRAMIENTA			1			
INSTALACIONES CL			1			
BORNERA ACOMETIDA			3			

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín · UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN · CONSORCIO INT. FAROL MED 2025 · RMV	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoria No: 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:		TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:			LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO ✓

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
				Alvaro London.	71225731

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR52 cl38			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK SN: HKCOA R457OW. INSTALACION SFP → 1.			133
CR48 cl25			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK. SN: HKCOA VY76AW. INSTALACION SFP → DG2601 2603 201 DG2601 2603 202			133 132
CR48 cl24			PROGAMACION E INSTALACION MIKROTIK. SN: HKCOA NXHN5D. INSTALACION SFP → DG2601 2603 203 DG2601 2603 204			133 132
CR48 cl19			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK SN: HKCOA RNW8W1. INSTALACION SFP → DG2601 2603 205 DG2601 2603 206			133 132

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTEGRAL JED 2025 | UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoria No: 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1
	ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:		TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:			LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
				Sloane London	71275224

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR48 CL18			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK SN: HKCOA GE2YE8 INSTALACION SFP → DG 2601 2603 207 DG 2601 2603 208			133 132
CR48 CL16A 17			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK. SN: HKCOA SGCNBZ INSTALACION SFP → DG 2601 2603 209. DG 2601 2603 210			133 132
CR48 CL14			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK. SN: HKCOA GPGEBG. INSTALACION SFP → DG 2601 2603 471 DG 2601 2603 472			133 132
CR48 CL10			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK SN: HKBOA K4EV54. INSTALACION SFP → DG 2601 2603 473 DG 2601 2603 474 DG 2601 2603 475			133 132

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoria No: 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:		TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:			LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
				Alvaro Londoño	71725731

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
? POLITECNICO 2			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK			133
			SN: HKCOA XM65A4.			
			INSTALACION SFP ⇒ DG 2601 2603 476.			132
			DG 2601 2603 477			
? POLITECNICO1			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK.			133
			SN: HKCOA PKOKWE			
			INSTALACION SFP → DG 2601 2603 478.			132
			DG 2601 2603 479			
INEM.			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK.			133
			SN: HKCOA RRB5PW			
			INSTALACION SFP → DG 2601 2603 480			132
			DG 2601 2603 481			
48015			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK			133
			SN: HKCOA S7FDS1			
			INSTALACION SFP → DG 2601 2603 482			132
			DG 2601 2603 483			
			DG 2601 2603 484			

EQUIPO EN OBRA

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoria No: 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:		TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:			LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
				Mauro londoño	71775714

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR43D CL01S			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK ✓			133
			SN: HKCOA RA4 P26			
			INSTALACION SFP → DG 2601 2603 485			132
			DG 2601 2603 486			
CR48 CL04S			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK. ✓			133
			SN: HKCOA HJ8 PU2			
			INSTALACION SFP → DG 2601 2603 487			132
			DG 2601 2603 488			
GAFFT			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK. ✓			133
			SN: HKCOA 9ZJ K7Q			
			INSTALACION SFP → DG 2601 2603489			132
			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK			
			SN:			
			INSTALACION SFP →			

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN · CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 · DAV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 7-3/05/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA: Viernes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS: WL2 049		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Luis Ernesto G. M	7.070.801.034	Santiago Arenas G.	1000533792	Alexander Molina	71775779
Edwis Torres Cuervo	70780304187				
Jorge Rodriguez	PPT 7137942				
Miguel Villegas	70182299663				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 52 Cll 49 Sur y			Instalación de 7.100 mt de cable de	8 30		113
CR 50 FF Cll 49 Sur			fibra para la comunicación semafórica.			
			Instalación de 20 Plaquetas informativa		5 30	126
			semafóricas amarillas.			

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INT PARQ. MED 2025 RMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	09/05/2026	TIEMPO	SECO	✓	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Sabado.		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WL2 049		DURACIÓN			NO		NO		NO ✓

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Luis Fernando G. M	7.070807078	Edwin San to. Hurtado		Mauricio Lotero	7.717.575.721
Evris torres	70290704 BF				
Jorge Luis Rodriguez	PPT 7727342				
Miguel Angel Villada	7018 22996 2				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR52 Cll 95			Instalacion de 896 mt de Cable de Fibra Para la Comunicacion de los Semaforos			113
			Instalacion de 22 Plaqueta informativa Amarillas			1260

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	9/05/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro londoño	71 275 731
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 37B x CL 1 SUR			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 37B x CL 1 SUR A CR 34 x CL 1 SUR)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 37B x CL 1 SUR			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 37B x CL 1 SUR A CR 43A x CL 1 SUR)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 34A x CL 1 SUR			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 34A x CL 1 SUR A CR 32 x CL 1 SUR)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 34A x CL 1 SUR			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 34A x CL 1 SUR A CR 37B x CL 1 SUR)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CR 32 x CL 1 SUR			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1UND (CR 32 x CL 1 SUR A CR 34 x CL 1 SUR)			116
			Certificación de enlace optico 1 hilo, 4 Unidades			117
CL 30A x CR 66			Sondeo a canalizaciones (4 Und) (CR 30A x CL 66 A CR 30A x CL 65)			237

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	11-05-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Lunes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	IKN 721 -		DURACIÓN			NO		NO		NO ✓

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santos	1038806300	Luis Guerrero	1070807034	Alexis Londoño	71757731
Camilo Restrepo	71295492	Ermit Tomes	1028030487		
Leonar Riera	PPT4350715	Miguel Villegas	1018229962		
Jean carlos Ruga	1214729941	Jorge Rodriguez.	PPT1137342		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR34CLIGASur			Suministro e instalación de 1140 mts de cable			113
CR43ACLIGASur			fibra optica armada de 24 hilos			
			consecutivos (2036-3896).			
			Suministro e instalación de 20 placas			126
			de identificación de cable fibra optica			
CR43ACLIGAM5-E			Retiro de Soldadura a tapa de 60x60			183
			Soldada la tapa de 60x60 = 1			262

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN · CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 · DMY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	12/05/2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WL2 049		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Luis Armando G. M	7.070801034			Alexis Londoño	3177571
Emis Tapiero	1028 070487				
Angel Angel V	1018 224962				
Jorge Luis Rodriguez	PPT 11 87 342				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR52 C112 Sur			Instalacion de 506 mt de cable de Fibra	8 30		113
A CR50FF C114Sur			Para la Comunicacion de los Semaforizacion			
			Instalacion de 72 Plagueras in Formati			126
			Vea Semaforicas Amarillas			
			Construccion de una Canalizacion. de 3m en		4 30	25
			Zona Verde Con dos tubos de 2"			

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Dueny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / Roy	**PLAN DE CALIDAD**	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN**

FECHA:	12/05/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				**INTERVENTORÍA**	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro Londoño	71275371
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 65 x CL 30A			Suministro e instalación de 719 mts de fibra armada (CR 30A CL 65 A CR 30A CL 66B)			113 ✓
			Suministro e instalación de 19 placas identificadoras de fibra óptica			126 ✓

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		**RESPONSABLE INTERVENTORÍA**
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Qnery Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / RAV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	13/05/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIERCOLES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro Londoño	71725738
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 34 CL 16a sur			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND (CR 34 CL 16a sur A CR 43A CL 16 sur)			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
CR 43A CL 16a sur			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND (CR43a CL 16A sur A CR34A CR 16sur)			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
CR 52 CL2 sur			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND (CR 52 CL 2sur A CR 52 CL 9sur)			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
CR 52 CL 2 sur			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND (CR 52 CL 2sur A Noel)			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
CR 52 CL 9 sur			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND (CR 52 CL 9suR A CR 50FF CL 85F)			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
CR 52 CL 9sur			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND (CR 52 CL 9sur A CR 52 CL 2sur)			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
CR 52 CL 9sur			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND (CR 52 CL 9sur A Cemento)			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
CR 65 x CL 30A			Desoldada de camara. 2Und (CR 65 CL 30 A hasta CR 66B CL 30A); Soldada de camara 1 Und			183-262
CR 66B x CL 30A			Sondeo de canalizaciones 1 Und (CR 66B CL 30A hasta CR 66B CL 30)			237

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL BIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	14/05/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro Londoño	71785[illegible]
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 51 CL 2sur			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND (CR 51 CL 2sur A CR 52 CL 2sur)			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
NOEL			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND (NOEL A CR 52 CL 10)			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
NOEL			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND (NOEL A CR 52 CL 2sur)			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
CR 50FF CL 8sur			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND (CR 50FF CL 8sur A CR 52 CL 9sur)			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
CR 66B x CL 30A			Sondeo de canalizaciones 3Und (CR 66B x CL 30A hasta CR 70 x CL 30A)			237

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	15/05/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749	Alvaro londoño	71775730
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 65 CL 30A			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND (CR 65 CL 30A A CR 65 CL 30)			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
CR 65 CL 30A			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND (CR 65 CL 30A A CR 66b CL 30a)			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
CR 65 CL 30			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND (CR 65 CL 30 A CR 65 CL 30A)			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / RAY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	20/05/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIERCOLES		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alexis Londoño	71775731
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 66B CL 30A			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND (CR 66B CL 30A A CR 65 CL 30A)			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
CR 55 CL 30			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND (CR 55 CL 30 A CR 55 CL 30a)			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN · CONSORCIO INTEGRAL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105589 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	20/03/2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Mier Colu		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	WL2 049		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Luis Fernando Gn	1.070801026			Alvaro Londoño	71275349
Eurnis Flores	70280704197				
Jorge Luis Rodriguez	PPT 1137342				
Miguel Angel Mosquera	70182299628				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 34 Y 35 CLL 70		N S	Suministro instalacion de 200 mt de.	9 30		110
	occ		Cable UTP. Categoria 6. nuevo			
			Suministro instalacion de 11 Placuetas			98
			informativa Rojas de semaforo.			
			Revicion de Cruce con Problema. Peato		4 Pm	261
			nales apagado			
			Se recomienda Visita de(Personal del			
			EOS			

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD**	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	21/05/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA		CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro Lobo	71275797
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 52 CL 25			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND (CR 52 CL 25 A CRUZ ROJA)			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117
CR 52 x CL 29A			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND (CRUZ ROJA A CR 52 CL 25)			116
			Certificacion de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			117

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: **REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN**

FECHA:	22/05/2026		SECO			CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
DIA:	VIERNES	TIEMPO	LLUVIOSO		UNIFORMES	SI ✓	SEÑALIZACIÓN	SI ✓	ESCOMBROS	SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				**INTERVENTORÍA**	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro Londoño	71275731
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 72A x CL 78B			Certificación de enlace optico 1 hilo, 8 Unidades			117
			Desmonte e instalación de dos(2) cajas OB, empalme de fibra de hilos en el controlador, incluye pigtail LC y organización del hilos. 2 UND			

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		**RESPONSABLE INTERVENTORÍA**
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Dueny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 / RAMY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	23/05/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	SABADO		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JHONFREDY LONDOÑO	71785749			Alvaro Londoño	71775371
JULIAN MONTOYA LONDOÑO	1021805927				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 72A CL 78B			Desmonte de 120mts de fibra optica ADSS (CR72A CL 78B A CR 65 CL 68)			200
			Instalación de 120mts de fibra optica ADSS			215
			Empalme por fusión de fibra óptica de 24 hilos, incluye instalación de mufla			114

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERVENTOR FAROLIED 2025	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoria No: 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:		TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:			LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
				Alvaro Londoño	71725731

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
43A 01S			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK			
			SN: HKC0A H30NRV			133
			INSTALACION SFP → DG 260 12603 211			132
			DG 260 12603 212			132
37B01S			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK.			
			SN: HKC0A T94B02			133
			INSTALACION SFP → DG 260 12603 213			132
			DG 260 12603 214			132
34 01S			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK.			
			SN: HKC0A YWTDBY			133
			INSTALACION SFP → DG 260 12603 215			132
			DG 260 12603 216			132
32 01S			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK			
			SN:			
			INSTALACION SFP → DG 2601 2603 490 (ADICIONAL)			132

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTEAROL MED 2025	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No: 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:		TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:			LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
				Mario Londoño	71725731

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
43A16AS			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK SN: HKCOA XZ06NN. INSTALACION SFP → DG2601 26032 17			133
			DG2601 26032 18 → PASA A 3216AS			132 132
NOEZ			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK. SN: HKCOA GKTG4E INSTALACION SFP → DG2601 2603 219			133
			DG2601 2603 220			132 132
52025			PROGAMACION E INSTALACION MIKROTIK. SN: HKCOA JWSG21 INSTALACION SFP → DG2502707O3 / DG2502707O1			133
			DG2502707O2			132 132
57025			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK SN: HKCOA SS5EE1 INSTALACION SFP → DG2502707O4 → PASA A 5210			133 132

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA:

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTEAROL MED 2025	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoria No: 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:		TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:			LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
				Oscar Londoño	71775751

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
52095			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK			
			SN: HKCOA Y54 2DF			
			INSTALACION SFP → DG2510270705 / DG2510270707.			133 / 132
			DG2510270706.			132
50FF085			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK.			
			SN: HKCOA QHCNQC.			
			INSTALACION SFP → DG2510270708			133 / 132
AV80065			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK.			
			SN: HKCOA HHE1QW			
			INSTALACION SFP → DG2510270709.			133 / 132
			DG2510270710			132
5228			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK			
			SN: HKCOA QNZ9AT			
			INSTALACION SFP → DG2510270711			133 / 132

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No: 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1
		ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:		TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:			LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
				Steven Londoño	7177731

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
5225			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK			
			SN: HECOA R[illegible]QASF			133
			INSTALACION SFP → DG2510 270713			132
			DG2510 270712			132
7344.			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK.			
			SN: HECOA SPYKKN			133
			INSTALACION SFP → DG2510 270714			132
—			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK.			
			SN:			
			INSTALACION SFP →			
—			PROGRAMACION E INSTALACION MIKROTIK			
			SN:			
			INSTALACION SFP →			

EQUIPO EN OBRA

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** **Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025**	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	31/05/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:			LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
				Alvaro Londoño	71771771

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 48 x CL 7 SUR EAFIT			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ= **420 Metros**			
CR 48 B x CL 5 PASO SEGURO			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ = **235 Metros**			
CR 48 x CL 1 SUR			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ=**160 Metros**			
CR 48 x CL 7 D PASO SEGURO			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ=**530 Metros**			
CR 48 x CL 07			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ=**200 Metros**			
CR 48 x CL 10 COST. NORTE			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ =**300 Metros**			
CR 48 x CL 18 A (Peat. Ciudad del Rio)			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ = **500 Metros**			
CR 48 x CL 19 A (CLOFAN)			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ =**596 Metros**			
CR 48 x CL 14			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ = **550 Metros**			
CR 48 x CL 16 A			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ = **520 Metros**			
CR 48 x CL 4 SUR PUENTE cos			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ = **407 Metros**			
CR 52 x CL 5 PASO SEGURO N			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ = **862 Metros**			
CR 52 x CL 2 SUR			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ = **710 Metros**			
CR 32 x CL 1 SUR			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ = **291 Metros**			
CR 34 x CL 1 SUR			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ = **490 Metros**			
CR 48 x CL 27 Peat. Bancolombia			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ = **297 Metros**			

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	31/05/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:			LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 48 x CL 24			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ= **440 Metros**			
CR 43 D x CL 1 SUR			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ = **362 Metros**			
CR 45 x CL 29			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ=**280 Metros**			
CR 48 x CL 30			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ = **320 Metros**			
CR 48 x CL 10 COST. NORTE			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ = **530 Metros**			
CR 52 x CL 38			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ = **551 Metros**			
CR 37 B x CL 1 SUR (Loma de los Parras)			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ = **505 Metros**			
CR 43 A x CL 1 SUR			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ = **582 Metros**			
CR 52 x CL 9 SUR			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ = **870 Metros**			
CR 52 x CL 21 A PASO SEGUR			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ = **431 Metros**			
CR 50 FF x CL 8 SUR			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ = **1.100 Metros**			
CR 52 x CL 4 SUR (PEAT Rode			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ = **896 Metros**			
CR 43 A x CL 16 A SUR			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ = **1.140 Metros**			
CR 52 x CL 2 SUR			Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ = **506 Metros**			

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

ANEXO 13.

PERSONAL LIQUIDADO

PAZ Y SALVO LABORAL

Codigo A029

Yo, Francisco Javier Nieves Valencia identificado (a) con cedula de ciudadania No 91446091 declaro que la firma UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN , con NIT No 901.979.396-1 cumplió con todos los pagos de salarios legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del Contrato No UT SIT MEDELLIN cuyo objeto es Realizar Mantenimiento y Obras de Ampliacion y Reposicion de la Red de Semaforos en el Distrito Especial de Medellin

Por consiguiente declaro a la Empresa a **Paz y Salvo** por todo concepto.

Lo anterior se expide en Barrancabermeja el 30 de Abril de 2026.

Atentamente

91446091

Francisco Javier Nieves Valencia
CARGO : Auxiliar de Mantenimiento
C.C. 1096232225

HUELLA INDICE DERECHO

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260401 - 20260430**
Comprobante Número:**210**
Fecha y hora de generación: **04/05/2026 - 07:49 AM**
Fecha y hora de expedición: **04/05/2026 - 07:50 AM**

Empleado: **Francisco Javier Nieves Valencia**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **91446091**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.750.904
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Provisión de Cesantías*				0	$ 166.600
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 19.992
Provisión de Prima*				0	$ 166.600
Provisión de Vacaciones*				0	$ 73.013
			Total Ingresos		**$ 2.426.205**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	*Porcentaje*	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 70.036
Fondo de pensión	4.00	$ 70.036
	Total Deducciones	**$ 140.072**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) **$ 2.286.133**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.286.133

91.446.094

Soporte de pago: DNE210
CUNE:
2ab250f8c890e8670eb16ce0d9fdab138ced5ca2f2a54f9978306b68aa916df6de64bb794b332908b8fe4494fe58afb0

PAZ Y SALVO LABORAL

Codigo A020

Yo, Johan Ramirez Lopera identificado (a) con cedula de ciudadania No 1015186405 declaro que la firma UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN , con NIT No 901.979.396-1 cumplió con todos los pagos de salarios legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del Contrato No UT SIT MEDELLIN cuyo objeto es Realizar Mantenimiento y Obras de Ampliacion y Reposicion de la Red de Semaforos en el Distrito Especial de Medellin

Por consiguiente declaro a la Empresa a **Paz y Salvo** por todo concepto.

Lo anterior se expide en Barrancabermeja el 30 de Abril de 2026.

Atentamente



HUELLA INDICE DERECHO

Johan Ramirez

Johan Ramirez Lopera
CARGO : Auxiliar de Mantenimiento
C.C. 1096232225

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260401 - 20260430**
Comprobante Número:**185**
Fecha y hora de generación: **04/05/2026 - 07:49 AM**
Fecha y hora de expedición: **04/05/2026 - 07:50 AM**

Empleado: **Johan Ramirez Lopera**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1015186405**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				28	$ 1.634.178
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				28	$ 232.489
Licencia remunerada	20/04/2026	20/04/2026		1	$ 58.364
Provisión de Cesantías*				0	$ 160.355
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 19.243
Provisión de Prima*				0	$ 160.355
Provisión de Vacaciones*				0	$ 70.579
			Total Ingresos		**$ 2.335.563**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 67.702
Fondo de pensión	4.00	$ 67.702
	Total Deducciones	**$ 135.404**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
Licencia no remunerada	22/04/2026	22/04/2026	1

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.200.159**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.200.159

Johan Ramirez

Soporte de pago: DNE185
CUNE:
9fc30f3ed3b7e048e24a0fbfb977d726312455d84e320c86c2a3c1900a04082fea3e5f8b4bac7a494ff05ac58357f085

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260401 - 20260430**
Comprobante Número:**184**
Fecha y hora de generación: **04/05/2026 - 07:49 AM**
Fecha y hora de expedición: **04/05/2026 - 07:50 AM**

Empleado: **Moises David Reyes Amaya**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1002500113**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.750.904
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Horas extras diurnas 125%			25.0	3	$ 29.845
Provisión de Cesantías*				0	$ 169.086
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 20.290
Provisión de Prima*				0	$ 169.086
Provisión de Vacaciones*				0	$ 73.013
				Total Ingresos	**$ 2.461.320**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 71.230
Fondo de pensión	4.00	$ 71.230
	Total Deducciones	**$ 142.460**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.318.860**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.318.860

Soporte de pago: DNE184
CUNE:
0c4937d814e97e61ee4060dc4e58fe526dc0a1b6203afd38a7f5b567cb316b9dfe97efe870fb72c91bdedae17af14a53

PAZ Y SALVO LABORAL

Codigo A006

Yo, Moises David Reyes Amaya identificado (a) con cedula de ciudadania No 1002500113 declaro que la firma UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN , con NIT No 901.979.396-1 cumplió con todos los pagos de salarios legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del Contrato No UT SIT MEDELLIN cuyo objeto es Realizar Mantenimiento y Obras de Ampliacion y Reposicion de la Red de Semaforos en el Distrito Especial de Medellin

Por consiguiente declaro a la Empresa a **Paz y Salvo** por todo concepto.

Lo anterior se expide en Barrancabermeja el 30 de Abril de 2026.

Atentamente

Moises David Reyes Amaya
CARGO : Auxiliar de Mantenimiento
C.C. 1096232225

HUELLA INDICE DERECHO

ANEXO 14. CERTIFICADO DE EMPRESA DE MUJERES

ASESORÍA TRIBUTARIA
& REVISORÍA FISCAL

Sergio Andrés Díaz Montañez
Contador Público Especialista en Tributaria
& Revisoría Fiscal.
310 205 1725
sergio.andresdiaz@hotmail.com
Trans. 49 # 10A - 01 Edificio Terzetto - oficina 406

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

REVISADO EL LIBRO DE ACCIONISTAS Y ACCIONES DE LA SOCIEDAD SERVICIVIL SAS IDENTIFICADO CON NIT 800147909-3 DESDE EL DÍA 15 JUNIO DEL AÑO 2021 HASTA LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, SE ENCONTRÓ LA SIGUIENTE COMPOSICION ACCIONARIA, ADEMAS SE CERTIFICA QUE LOS ACCIONISTAS SON COLOMBIANOS.

CAPITAL AUTORIZADO	**$ 580.000.000.**
No DE ACCIONES	**1000**
VALOR NOMINAL	**$ 580.000**
CAPITAL SUSCRITO	**$ 580.000.000**
Y PAGADO	
No DE ACCIONES	**1000**
VALOR NOMINAL	**$580.000**

ACCIONISTA	**JORGE TRUJILLO NIÑO**
C.C.	**13893413**
No DE ACCIONES	**490**
PARTICIPACIÓN	**49%**
VALOR TOTAL ACCIONES	**$ 284.200.000**

ACCIONISTA	**NELSY VANEGAS CALDERON**
C.C.	**63459480**
PARTICIPACIÓN	**51%**
No DE ACCIONES	**510**
VALOR TOTAL ACCIONES	**$ 295.800.000**

DADO EN BARRANCABERMEJA, A LOS 09 DIAS DE FEBRERO DE 2026

SERGIO ANDRES DIAZ MONTAÑEZ
T.P 187097-T
CONTADOR PÚBLICO

ANEXO 15.

CAMARA DE COMERCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/09/2025 - 15:21:03
Recibo No. S000690987, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1hJ33VHjmQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : SERVICIVIL S.A.S
Nit : 800147909-3
Domicilio: Barrancabermeja, Santander

MATRÍCULA

Matrícula No: 21568
Fecha de matrícula: 22 de noviembre de 1991
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 30 de abril de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : DIAGONAL 62 NO. 43-151
Barrio : LAS GRANJAS
Municipio : Barrancabermeja, Santander
Correo electrónico : servicivil_ltda@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 6102194
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : 3125486349

Dirección para notificación judicial : DIAGONAL 62 NO. 43-151
Barrio : LAS GRANJAS
Municipio : Barrancabermeja, Santander
Correo electrónico de notificación : servicivil_ltda@hotmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 2370 del 28 de octubre de 1991 de la Notaria 1a. De Barrancabermeja de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de noviembre de 1991, con el No. 912486 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada SERVICIVIL LIMITADA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 12 del 06 de octubre de 2018 de la Junta de Socios de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de octubre de 2018, con el No. 25347 del Libro IX, se inscribió Transformación de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada

Por Acta No. 12 del 06 de octubre de 2018 de la Junta de Socios de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de octubre de 2018, con el No. 25347 del Libro IX, se decretó Cambio de nombre de SERVICIVIL LIMITADA por SERVICIVIL S.A.S

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: Por Acta No. 019 del 05 de noviembre de 2024 de la Asamblea General de Accionistas, inscrita el 06 de noviembre de 2024 se reformo así: Articulo 2. La sociedad tendrá por objeto principal el desarrollo de actividades tendientes a la realización de obras arquitectónicas, de urbanismo e ingeniería, bien sea civiles, eléctricas, electrónicas, mecánicas, ambientales, petroleras, energéticas, hidráulicas, de servicios públicos, saneamiento básico, mineras, de telecomunicaciones, agrícolas, rurales, de sistemas de información, vías y transportes, en todo lo relacionado con asesorías, ejecución, planeación, preparación, diseño, montaje y construcción de todo tipo de obras, estructuras, instalación de plantas de toda clase, mantenimiento y operación de las mismas, excavación de pozos profundos, suministros de materiales de construcción y de cantera, industria minera, economía minera, comercialización, exploración, explotación, trituración, beneficio y distribución de minerales comunes, exploración minera, geología minera, exploración y evaluación de reservas mineras,, minería a cielo abierto, minería subterránea, procesamiento de minerales, manejo y transporte de minerales, metalurgia metales ferrosos y no ferrosos, exploración y explotación de minerales usuales (comodietis), cobre, zinc, plomo, níquel, mineral de hierro, bauxita, alúmina, aluminio, oro, plata, platino, fosfatos, magnesio, cromo, lignito, antracita, metales raros. La prestación de toda clase de servicios de consultoría, interventorías técnicas y administrativas en las diferentes áreas anteriormente mencionadas, el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social según la legislación vigente, la promoción, compra, venta, arriendo y administración de inmuebles tanto urbanos como rurales, urbanización de terrenos y la construcción de edificaciones, el desarrollo de actividades tendientes a la adquisición, venta, comercializa con, distribución, suministro, alquiler, arrendamientos, reparación, transformación de todo tipo de maquinaria pesada y equipos destinados a la construcción, a la explotación agrícola, a la explotación minera, a la explotación acuífera, en el área de servicios públicos, petrolífera y sus derivados, industria petroquímica, de biocombustibles, el desarrollo de actividades tendientes a la adquisición, venta, comercialización, distribución, suministro, alquiler, arrendamientos, reparación transformación de vehiculos de carga, vehiculos de transporte de pasajeros, bien sea terrestres o fluviales, fabricación y comercialización de equipos y o dispositivos de control de transito con y sin registro gráficos de infracciones, (semáforos, equipos de control, botoneras peatonales, dispositivos sonoros, cámaras de seguridad, cámara de foto – detección, materiales eléctricos y electrónicos), suministros, instalación y programación de software para controladores de semáforos ,equipos de foto detección y en general para entidades de tránsito y transporte , en el desarrollo de todo lo anterior que comprende el objeto social de la empresa, se podrán constituir en territorio nacional o extranjero, sucursales o agencias, podrá promover y fundar establecimientos, almacenes de depósitos, fabricas; podrá además adquirir a cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles, arrendarlos, enajenarlos o gravarlos y darlos en garantía de sus propias obligaciones, adquirir toda clase de derecho mineros, permisos o licencias, ejecutar o conformar asociaciones, aportes y/o concesiones, uniones temporales, para explorar y explotar minas o yacimientos, , explotar o registrar marcas, nombres comerciales, patentes, invenciones o cualquier otro bien incorporal u objeto contractual que pueda desarrollarse, dentro de los parámetros del objeto social, girar, aceptar, endosar, cobrar, pagar, negociar, toda clase de títulos valores, bursátiles, de inversión, celebrar contratos de mutuo, seguro y transporte, agencia comercial, cuentas en participación y demas contratos comerciales, concurrir a licitaciones públicas, privadas y contrataciones directas, celebrar cualquier tipo de contratos con entidades bancarias o financieras y concurrir a la formación de aportes a entidades de crédito como bancos, corporaciones financieras, dedicadas a la financiación de actividades comprendida dentro de los objetivos sociales, efectuar cualquier tipo de tramites tendiente a importar o exportar mercancías de productos en cumplimiento del objeto social. Parágrafos: en desarrollo o cumplimiento de tal objeto, la sociedad podrá: hacer en su propio nombre o por cuenta de terceros, todas las actividades o en participación con ellos toda clase de operaciones comerciales, civiles e industriales o financieras sobre bienes muebles e inmuebles y constituir cualquier clase de gravamen sobre estos, celebrar contratos civiles o administrativos, con personas naturales o jurídicas, sean estas en derechos privado o público y abrir cuentas corrientes y de ahorros en bancos y corporaciones que sean convenientes para el logro de los

fines sociales. participación con ellos toda clase de operaciones comerciales, civiles e industriales o financieras sobre bienes muebles e inmuebles y constituir cualquier clase de gravamen sobre' estos, celebrar contratos civiles o administrativos, con personas naturales o jurídicas, sean estas en derechos privado o público y abrir cuentas corrientes y de ahorros en bancos y corporaciones que sean convenientes para el logro de los fines sociales.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 580.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 580.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 580.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 580.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 580.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 580.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

representante legal: Articulo 27. Se hace transformacion según acta no. 12 Del 6 de octubre de 2018, inscrita el 17 de octubre de 2018, antes mencionada: La representacion legal de la sociedad por acciones simplificada estara a cargo de una persona natural o juridica, accionista o no, quien tendra un suplente para sus faltas temporales o absolutas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal: Articulo 28. Se hace transformacion segun acta no. 12 Del 6 de octubre de 2018, inscrita el 17 de octubre de 2018, antes mencionada: La sociedad sera gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal (o su suplente en las faltas temporales o absolutas), quien no tendra restricciones de contratacion por razon de la naturaleza ni de la cuantia de los actos que celebre. Por lo tanto, se entendera que el representante legal podra celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entendera investido de los mas amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepcion de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le esta prohibido al represnetante legal y a los demas administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad juridica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantia de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 12 del 06 de octubre de 2018 de la Junta de Socios, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 17 de octubre de 2018 con el No. 25347 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL	JORGE TRUJILLO NIÑO	C.C. No. 13.893.413
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSY VANEGAS CALDERON	C.C. No. 63.459.480

REVISORIA FISCAL TEXTUAL

** Revisor fiscal: ** Que por acta no. 0000003 De asamblea de accionistas del 2 de diciembre de 2016 , inscrita el 5 de diciembre de 2016 bajo el numero 00022750 del libro ix , fue(ron) nombrado(s): Nombre identificacion revisor fiscal murillo villarreal pablo emilio c.C.13891253 Tarjeta profesional: 14953 T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) E.P. No. 1122 del 10 de mayo de 1993 de la Notaria 1a. De Barrancabermeja	3365 del 06 de abril de 1994 del libro IX
*) E.P. No. 2009 del 25 de julio de 1995 de la Notaria 1a. De Barrancabermeja	3968 del 01 de agosto de 1995 del libro IX
*) E.P. No. 2076 del 12 de julio de 1996 de la Notaria 1a. De Barrancabermeja	4587 del 02 de septiembre de 1996 del libro IX
*) E.P. No. 2499 del 21 de noviembre de 2007 de la Notaria Primera Barrancabermeja	11284 del 30 de noviembre de 2007 del libro IX
*) E.P. No. 1827 del 26 de julio de 2011 de la Notaria Primera Barrancabermeja	14715 del 28 de julio de 2011 del libro IX
*) E.P. No. 1073 del 25 de junio de 2012 de la Notaria Primera Barrancabermeja	16185 del 04 de julio de 2012 del libro IX
*) E.P. No. 1073 del 25 de junio de 2012 de la Notaria Primera Barrancabermeja	16188 del 04 de julio de 2012 del libro IX
*) E.P. No. 1073 del 25 de junio de 2012 de la Notaria Primera Barrancabermeja	16189 del 04 de julio de 2012 del libro IX
*) E.P. No. 746 del 21 de abril de 2014 de la Notaria Primera Barrancabermeja	18588 del 05 de mayo de 2014 del libro IX
*) E.P. No. 1828 del 09 de octubre de 2015 de la Notaria Primera Barrancabermeja	21205 del 20 de octubre de 2015 del libro IX
*) E.P. No. 1828 del 09 de octubre de 2015 de la Notaria Primera Barrancabermeja	21206 del 20 de octubre de 2015 del libro IX
*) Acta No. 12 del 06 de octubre de 2018 de la Junta De Socios	25347 del 17 de octubre de 2018 del libro IX
*) Acta No. 18 del 15 de julio de 2024 de la Asamblea General De Accionistas	35939 del 23 de julio de 2024 del libro IX
*) Acta No. 19 del 05 de noviembre de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas	36444 del 06 de noviembre de 2024 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4390
Actividad secundaria Código CIIU: E3900
Otras actividades Código CIIU: H4923 F4220

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: SERVICIVIL BCA
Matrícula No.: 62658
Fecha de Matrícula: 27 de noviembre de 2006
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : 62 NO 43 151
Barrio : LAS GRANJAS
Municipio: Barrancabermeja, Santander

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $3.214.000.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4390.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio

Fecha expedición: 25/09/2025 - 15:21:03
Recibo No. S000690987, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1hJ33VHjmQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



PILAR ADRIANA CONTRERAS GÓMEZ
PRESIDENTA EJECUTIVA

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

ANEXO 16.

CEDULAS

PERSONAL 100% COLOMBIANO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.151.966.785**

BARBOSA YEPES

APELLIDOS

CHRISTIAN

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-JUN-1998**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA


A+ G.S. RH

M SEXO

17-JUN-2016 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-3100150-00838444-M-1151966785-20160702 **0050**30467A 1 45220169

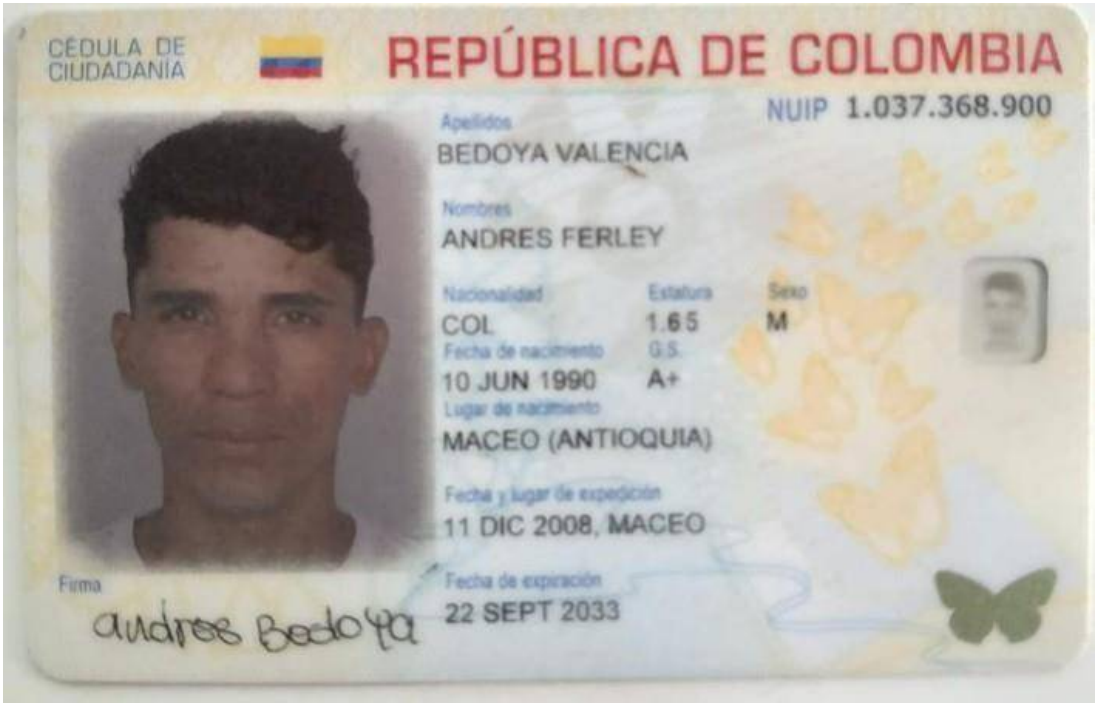

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.037.368.900

Apellidos
BEDOYA VALENCIA

Nombres
ANDRES FERLEY

Nacionalidad
COL

Estatura
1.65

Sexo
M

Fecha de nacimiento
10 JUN 1990

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
MACEO (ANTIOQUIA)

Fecha y lugar de expedición
11 DIC 2008, MACEO

Firma
andres Bedoya

Fecha de expiración
22 SEPT 2033



.CO

032536593

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL032536593601175<<<<<<<<<<<
9006108M3309221COL1037368900<3
BEDOYA<VALENCIA<<ANDRES<FERLEY

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.049.894.058

GONZALEZ MORA

APELLIDOS

CARLOS MARIO

NOMBRES

Carlos Mario -

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-ABR-2001**

HATILLO DE LOBA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-ABR-2019 HATILLO DE LOBA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-0300150-01300080-M-1049894058-20220602 **00795**38656A 1 8504797463

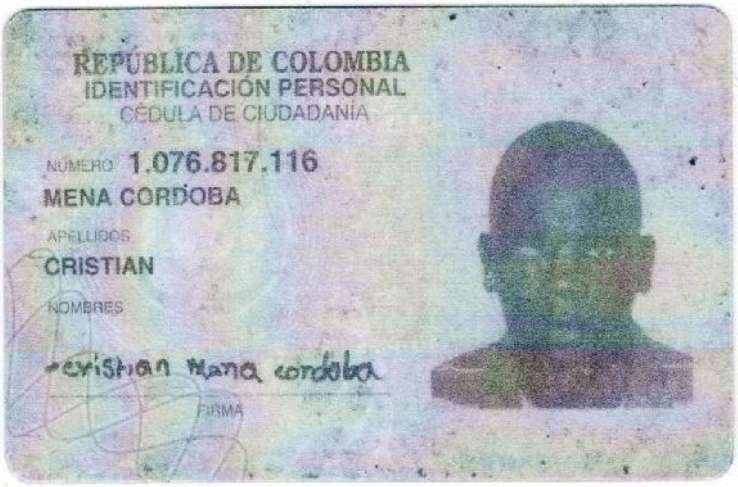

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.076.817.116
MENA CORDOBA
APELLIDOS
CRISTIAN
NOMBRES
cristian Mena cordoba
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-JUN-1991
CONDOTO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
26-AGO-2009 CONDOTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO

A-1701300-00844744-M-1076817116-20160824 0050726215A 1 45839510

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.038.810.427**

SANTOS HERNANDEZ

APELLIDOS

EDWIN DAVID

NOMBRES

edwin david santos hernandez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-AGO-1992**

MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-AGO-2010 CHIGORODO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0110600-00266236-M-1038810427-20101118 0024863480A 1 34994022



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.038.810.427**

SANTOS HERNANDEZ

APELLIDOS

EDWIN DAVID

NOMBRES

edwin david santos hernandez

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **04-AGO-1992**

MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

09-AGO-2010 CHIGORODO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-0110500-00266236-M-1038810427-20101118 0024863480A 1 34894022



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.096.218.904
PALACIO ACEVEDO
APELLIDOS
JAIME ESTIVEN
NOMBRES

Stiven
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-MAY-1992
MACEO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 ESTATURA
AB+ G.S. RH
M SEXO
15-DIC-2010 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-3100150-00570561-M-1096218904-20140508 0038389502A 1 2862858412

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.052.982.270**

ALTAMIRANDA DIAZ

APELLIDOS

JENIFER DEL CARMEN

NOMBRES

Jenifer Altamiranda Diaz

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-OCT-1992**

MAGANGUE
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-OCT-2010 MAGANGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0502800-00279702-F-1052982270-20110201 **0025674797A 1** 35708396

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.123.409.521**

GONZALEZ BURGOS

APELLIDOS

MARTIN JOSE

NOMBRES

Martin Gonzalez

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-DIC-2001**

DIBULLA
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

24-DIC-2019 TOLUVIEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-2832000-01124651-M-1123409521-20200109 **0069**589379A 1 53711091



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.123.409.521
GONZALEZ BURGOS
APELLIDOS
MARTIN JOSE
NOMBRES

Martin gonzalez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-DIC-2001
DIBULLA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
24-DIC-2019 TOLUVIEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-2832000-01124651-M-1123409521-20200109 0069589379A 1 53711091

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 98.681.775



Apellidos
CHAVARRIA BUILES

Nombres
WILLIAN ALBEIRO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.83

Sexo
M

Fecha de nacimiento
03 SEPT 1977

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
SABANALARGA (ANTIOQUIA)

Fecha y lugar de expedición
15 JUN 1996, SABANALARGA


Fecha de expiración
22 JUL 2034

Firma

.CO

0509139 23

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

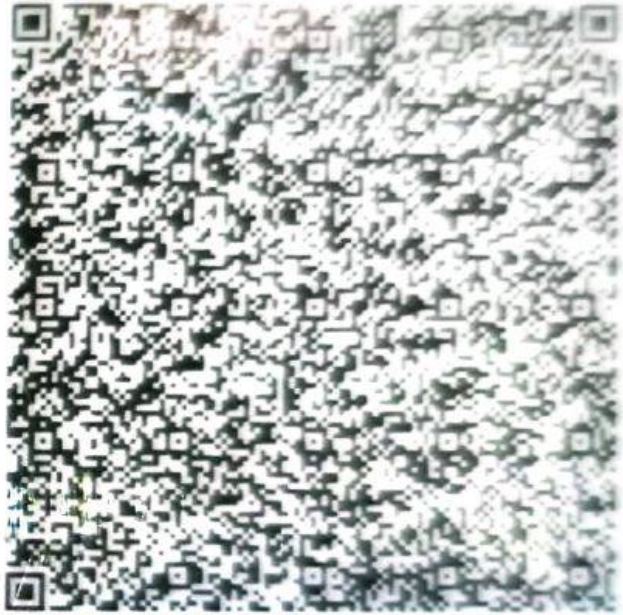

ICCOL0509139236012 17<<<<<<<<<<<
7709036M3407220COL98681775<<<8
CHAVARRIA<BUILES<<WILLIAN<ALBE


CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 98.681.775

Apellidos
CHAVARRIA BUILES

Nombres
WILLIAN ALBEIRO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.83

Sexo
M

Fecha de nacimiento
03 SEPT 1977

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
SABANALARGA (ANTIOQUIA)

Fecha y lugar de expedición
15 JUN 1996, SABANALARGA

Firma

Fecha de expiración
22 JUL 2034


CO

0509139231

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL0509139236012l7<<<<<<<<<<
7709036M3407220COL98681775<<<8
CHAVARRIA<BUILES<<WILLIAN<ALBE

CÉDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 4.852.397



Apellidos
RIASCO REYES

Nombres
AGUEDO ALCIDES

Nacionalidad
COL

Estatura
1.75

Sexo
M

Fecha de nacimiento
05 FEB 1964

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
BAJO BAUDO (PIZARRO) (CHOCO)

Fecha y lugar de expedición
19 NOV 1983, BAHIA SOLANO

Fecha de expiración
18 MAR 2033

Firma
Alcides Riascos

.CO

020198477

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL020198477417008<<<<<<<<<<<
6402053M3303182COL4852397<<<<0
RIASCO<REYES<<AGUEDO<ALCIDES<<

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.002.500.113**

REYES AMAYA

APELLIDOS

MOISES DAVID

NOMBRES

Moises Reyes A

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-AGO-1999**

MAGANGUE
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

05-ENE-2018 MAGANGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-0502800-00972751-M-1002500113-20180125 0059290273A 1 49259471

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.152.187.124

GOMEZ MEJIA

APELLIDOS

ANYELO DANIEL

NOMBRES



Anyelo Daniel Gómez M.

FIRMA

Scanned with CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **22-MAY-1990**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.81 ESTATURA **A-** G.S. RH **M** SEXO

23-MAY-2008 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS MARIO GARCIA TORRES

INDICE DERECHO

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.096.247.535**

PALACIO ACEVEDO

APELLIDOS

BRAYAN ESMID

NOMBRES

Brayan Palacio

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **29-ABR-1998**

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

05-MAY-2016 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

ÍNDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-2701900-01294488-M-1096247535-20220505 **00790**78024A 1 9918929745


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.096.247.524
ZUÑIGA BENAVIDES
APELLIDOS
CARLOS ANDRES
NOMBRES
Carlos Zuñiga
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1998
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.77
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
04-MAY-2016 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
P-2701900-00841290-M-1096247524-20160728
0050528695A 1
45109384



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.017.144.470
DIAZ PEÑA
APELLIDOS
CARLOS ALBERTO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 10-ENE-1987
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
10-FEB-2005 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDON LOPEZ
INDICE DERECHO
R-0130100-14138685-M-1017144470-20060103
0019906003H 01 197206634

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.000.537.976**

ROA SILVA

APELLIDOS

JUAN JOSE

NOMBRES

FIRMA



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-ABR-2000**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-MAY-2018 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-0100150-01015231-M-1000537976-20180618 **00615**69756A 1 50040024

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **91.446.091**


NIEVES VALENCIA

APELLIDOS

FRANCISCO JAVIER

NOMBRES

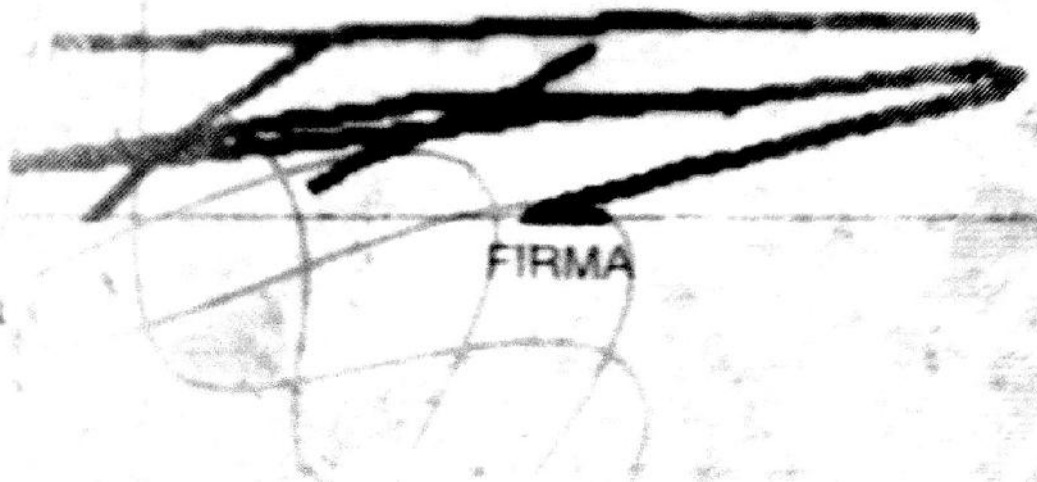

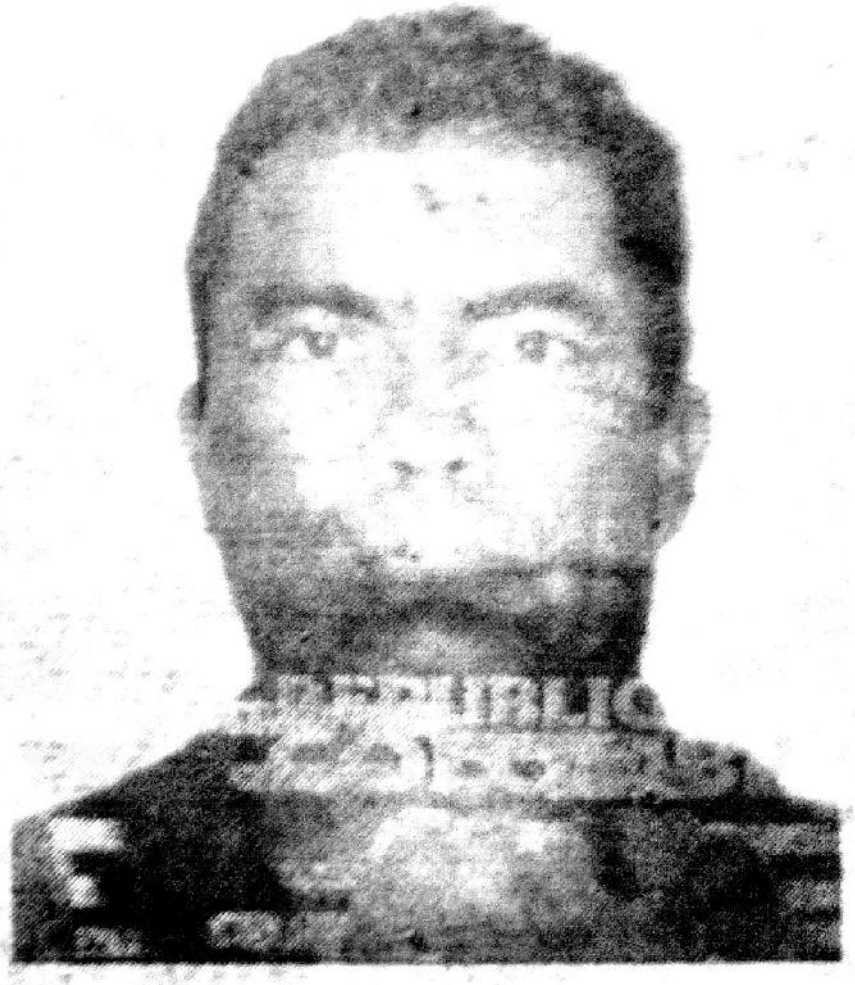

Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **20-AGO-1975**

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-OCT-1994 BARRANCABERMEJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0100150-00713668-M-0091446091-20150610 **00444**57306A 1 7013424191

Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **20-AGO-1975**


BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-OCT-1994 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0100150-00713668-M-0091446091-20150610 0044457306A 1 7013424191

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.037.605.230**

MORENO VALENCIA

APELLIDOS

JAIR ALONSO

NOMBRES

Jair Moreno

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **11-JUN-1990**

MACEO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-JUL-2008 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0104900-00488737-M-1037605230-20131007 0035334768A 1 2172573142

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.007.571.457**

BELEÑO GALVIS
APELLIDOS

JHON DEIVIS
NOMBRES

Jhon Deivis B.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-ENE-2002**
AGUACHICA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

29-ENE-2020 AGUACHICA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-1207500-01131954-M-1007571457-20200213 **0070**082283A 1 52959355

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 11.222.857



Apellidos
ANDRADE GARCIA

Nombres
JOSE ALCIBIADES

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.65	M

Fecha de nacimiento
24 JUN 1977

G.S.
B+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
19 MAR 1997, GIRARDOT

Fecha de expiración
17 MAR 2033

Firma



.CO

020217615



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL020217615015109<<<<<<<<<<
7706242M3303171COL11222857<<<8
ANDRADE<GARCIA<<JOSE<ALCIBIADE


REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NÚMERO 32220126
GIRALDO BOTERO
APELLIDOS
LINA MARIA
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 12-OCT-1982
SANTUARIO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
23-ENE-2001 SANTUARIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
P-0125600-14092643-F-0032220126-20010814
00905 01194P 01 100861994

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 42.683.289

DURANGO ARENAS
APELLIDOS

MARIA VICTORIA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-FEB-1967
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

14-DIC-1987 COPACABANA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-0110300-00903448-F-0042683289-20170509 0055312616A 2 9999877919

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.065.913.019**

VIVAS MANDON

APELLIDOS

SIMEON FERNANDO

NOMBRES

Simeon F. VIVAS

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-FEB-1998**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.77	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-FEB-2016 AGUACHICA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1207500-00801034-M-1065913019-20160314 0048941810A 1 45800978



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-DIC-1996**

CONCORDIA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | **O-** G.S. RH | **M** SEXO

29-ENE-2016 HISPANIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-0115000-00812631-M-1039597832-20160411 0049254415G 1 45539531

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.039.597.832**

GALEANO PARRA
APELLIDOS

YEISON ALEJANDRO
NOMBRES

Yeison Alejandro Galeano P
FIRMA



Scanned with CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-MAR-2000**

APARTADO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-ABR-2018 APARTADO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-0103500-01001737-M-1001025750-20180430 **0060**97701A 1 50027940

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.001.025.750**

ACOSTA SIMANCA

APELLIDOS

HERNAN DARIO

NOMBRES

H. Acosta

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16.791.906**

BARBOSA PALOMINO

APELLIDOS

FRANKLIN

NOMBRES

Franklyn Barbosa P.

FIRMA



Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1971**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO


31-OCT-1989 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100150-00032442-M-0016791906-20080728 **0001**536733A 1 2020021788

Powered by CamScanner

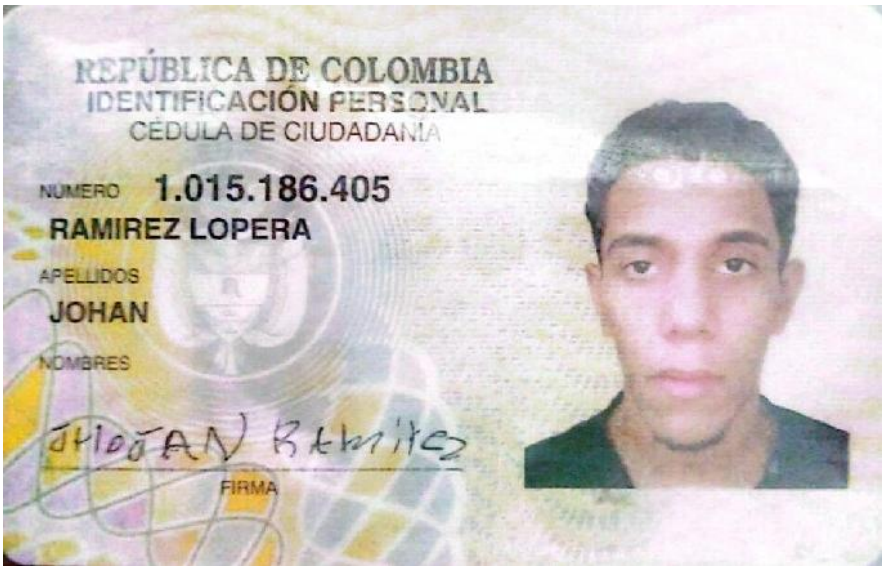

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.015.186.405
RAMIREZ LOPERA
APELLIDOS
JOHAN
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 07-ABR-2002
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
03-AGO-2020 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
INDICE DERECHO
A-0100150-61318059-M-1015186405-20220908 0084735526A 3 8505122346

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.017.221.580



Apellidos
PADILLA GIRALDO

Nombres
LAURA MARCELA

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.66	F
Fecha de nacimiento	G.S.	
29 JUL 1994	O+	

Lugar de nacimiento
PALMIRA (VALLE)

Fecha y lugar de expedición
10 AGO 2012, MEDELLIN

Firma
Laura MPG

Fecha de expiración
18 ENE 2034

.CO

037809496

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL037809496201001<<<<<<<<<<<
9407299F3401181COL1017221580<1
PADILLA<GIRALDO<<LAURA<MARCELA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91452201**

LOZANO ROJAS
APELLIDOS

LUIS DANOVER
NOMBRES

Luis Danover Lozano
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-NOV-1977**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

19-JUN-1996 ARATOCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-0500100-30104581-M-0091452201-20030127 **02482** 03024A 01 129453752

ANEXO 17.

CERTIFICADO PERSONAL 100% COLOMBIANO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Calle 44 # 52 165
Medellín, Antioquia

127 - 2026

El suscrito JORGE TRUJILLO NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.893.413 de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN, identificada con NIT 901.979.396-1, bajo la gravedad de juramento, certifico que durante el **período comprendido entre el 01 de Mayo de 2026 y el 31 de Mayo de 2026**, para la ejecución del Contrato de Obra No. 4600105555 de 2025, cuyo objeto es realizar el mantenimiento y las obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín, **se destinó el cien por ciento (100 %) de empleados y/o contratistas por prestación de servicios de nacionalidad colombiana para la ejecución del objeto contractual.**

Lo anterior se certifica en cumplimiento de lo dispuesto en el Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional y Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, correspondientes al Proceso de Contratación No. 0070007743.

En constancia, se firma en Medellín, Antioquia, a los **Cinco (05)** días del mes de **junio** de **2026**.

Cordialmente,

JORGE TRUJILLO NIÑO
C.C 13.893.413 de Barrancabermeja
R/L. UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

Calle 54 # 77D - 74 Medellín, Antioquia
CEL: 3188087109 – 3102628824 – 3182152340
Correo: uniontemporalsitmedellin@gmail.com

ANEXO 18.

ACTA MES DE MAYO

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONTRATO 4600105555 DE 2025	**FECHA DE INICIO**	**5/09/2025**	**ACTA NO. 9 MAYO DE 2026**		
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.	**AMPLIACIONES**	**N/A**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**$ 46.173,00**	
	DURACIÓN	**865 DÍAS**			
	VALOR INICIAL	**$ 14.162.162.240**	**PERIODO**	**1-31/5/2026**	
	ADICIONES	**$ 0**	**VALOR DE LA PRESENTE ACTA**	**$ 913.873.535,00**	
CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN	**VALOR CON ADICIONES**	**$ 14.162.162.240**			
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED	**% EJECUTADO EN EL PERIODO**	**6,45%**	**% EJECUTADO ACUMULADO**	**47,25%**	

CONDICIONES CONTRACTUALES						**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Vr. Parcial Total**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
	OBRA CIVIL								
1	Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	m2	1,0	$ 48.280,00	$ 48.280,00	12,00	$ 579.360,00	224,08	$ 10.818.582,40
2	Demolición base controlador local. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante	Un	1,0	$ 159.885,00	$ 159.885,00	1,00	$ 159.885,00	30,00	$ 4.796.550,00
3	Suministro e instalación de bordillo en concreto de 0.45m (espesor 0.15)	m	1,0	$ 148.053,00	$ 148.053,00	0,00	$ 0,00	67,71	$ 10.024.668,63
4	Retiro o demolición bordillo (cordón), incluye cargue, transporte y botada de material sobrante	m	1,0	$ 14.768,00	$ 14.768,00	0,00	$ 0,00	21,70	$ 320.465,60
5	Demolición de cajas de empalme hasta de 0.80 x 0.80 m libres. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante	Un	1,0	$ 147.881,00	$ 147.881,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6	Demolición de resaltos viales en mezcla asfáltica hasta nivel de via. Incluye cargue y botada de material sobrante.	m3	1,0	$ 260.770,00	$ 260.770,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7	Demolición de carpeta asfáltica hasta nivel de base granular, Incluye llenos temporales en base granular, cargue y botada de material sobrante.	m3	1,0	$ 656.913,00	$ 656.913,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8	Retiro de tapas en concreto reforzado de cajas hasta 0,80 x 0,80 m. Incluye transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 14.384,00	$ 14.384,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 14.384,00
9	Suministro de marco de 50x50 cm, en ángulo de 2"x2"x1/4" y acabado en pintura anticorrosiva. Incluye tapa de seguridad en lámina de alfajor calibre 1/8" de 50x50 cm medida exterior y anclajes en varillas de 1/4" para fijación del marco	Un	1,0	$ 534.013,00	$ 534.013,00	0,00	$ 0,00	614,00	$ 327.883.982,00
10	Suministro e instalación de marco y tapa para cajas en concreto de 0,60 x0,80 m interna. Incluye concreto de 21 MPA, para el empotramiento del elemento.	Un	1,0	$ 626.290,00	$ 626.290,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11	Suministro de marco de 60x60 cm, en ángulo de 2"x2"x1/4" y acabado en pintura anticorrosiva. Incluye tapa de seguridad en lámina de alfajor calibre 1/8" de 60x60 cm medida exterior anclajes en varillas de 1/4" para fijación del marco	Un	1,0	$ 723.504,00	$ 723.504,00	0,00	$ 0,00	70,00	$ 50.645.280,00
12	Instalación de tapa metálica de hasta de 60x60 cm. Incluye demolición de concreto, limpieza de caja, recolección de escombros	Un	1,0	$ 56.495,00	$ 56.495,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 56.495,00
13	Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPa para empotramiento de elemento	Un	1,0	$ 153.601,00	$ 153.601,00	24,00	$ 3.686.424,00	857,00	$ 131.636.057,00
14	Reparación de marco de tapa de caja de registro con ángulo o platina de 2" calibre 1/8", hasta 60 cm	Un	1,0	$ 103.386,00	$ 103.386,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15	Suministro de Tornillos de 5/8 " para cajas de hasta 60 x 60 cm, según especificaciones de la Secretaría de Movilidad de Medellín	Un	1,0	$ 29.167,00	$ 29.167,00	0,00	$ 0,00	1368,00	$ 39.900.456,00
16	Suministro de tapa y marco de seguridad en hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12, de 50x50 cm medida exterior, incluye tornillones de seguridad en acero galvanizado según especificaciones SMM.	Un	1,0	$ 625.739,00	$ 625.739,00	20,00	$ 12.514.780,00	70,00	$ 43.801.730,00
17	Suministro de tapa y marco de seguridad en hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12, de 60x60 cm medida exterior, incluye tornillones de seguridad en acero galvanizado según especificaciones SMM.	Un	1,0	$ 776.380,00	$ 776.380,00	14,00	$ 10.869.320,00	14,00	$ 10.869.320,00
18	Suministro e instalación de Concreto de 21 Mpa hecho en obra.	m3	1,0	$ 743.427,00	$ 743.427,00	0,00	$ 0,00	2,89	$ 2.148.504,03
19	Construcción de canalización en Pavimento de 0.50m, con profundidad de 70 cm. Incluye corte con cortadora de concreto, demolición de pavimento de espesor variable hasta 0,15m, excavación, botada de escombros al botadero oficial, instalación de 2 tubos electricos DB de 3", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento mecánicamente.	m	1,0	$ 256.892,00	$ 256.892,00	2,40	$ 616.541,00	40,90	$ 10.506.882,80

CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Vr. Parcial Total**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
20	Construcción de canalización en Pavimento de 0.50m, con profundidad de 30 cm, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de pavimento de espesor variable hasta 0,15m, excavación, botada de escombros al botadero oficial, instalación de 2 tubos eléctricos IMC de 3", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento mecánicamente	m	1,0	$ 308.637,00	$ 308.637,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
21	Suministro e instalación provisional de pavimento flexible en frío de 50 cm de ancho y e=2.5 cm, según requerimientos de la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín.	m	1	$ 125.098,00	$ 125.098,00	1,20	$ 150.118,00	37,40	$ 4.678.665,20
22	Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalación de dos tubos eléctricos DB de 2", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.	m	1	$ 292.727,00	$ 292.727,00	1,80	$ 526.909,00	35,95	$ 10.523.535,65
23	Construcción Canalización en adoquín de 0.20m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de dos tubos eléctricos DB de 2", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados (10%), arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.	m	1,0	$ 156.993,00	$ 156.993,00	1,20	$ 188.392,00	120,74	$ 18.955.334,82
24	Construcción de canalización en adoquín de 0,1 m incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de un tubo eléctrico PVC DB de 2", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reinstalación de adoquines y reposición de adoquines deteriorados , arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.	m	1,0	$ 47.379,00	$ 47.379,00	0,00	$ 0,00	2,50	$ 118.447,50
25	Construcción Canalización en zona verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalación de 2 tubos eléctricos DB de 2", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.	m	1,0	$ 113.988,00	$ 113.988,00	61,40	$ 6.998.863,00	205,70	$ 23.447.331,60
26	Construcción Canalización en zona dura o zona verde de hasta 30 cm de profundidad. Incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalación de un (1) tubo eléctrico DB de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente (Si aplica). NO incluye demoliciones.	m	1,0	$ 20.398,00	$ 20.398,00	0,00	$ 0,00	5,10	$ 104.029,80
27	Construcción Canalización en zona verde de hasta 30 cm de profundidad. Incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalación de un (1) tubo eléctrico DB de 1 1/2", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente (Si aplica). NO incluye demoliciones.	m	1,0	$ 27.759,00	$ 27.759,00	13,00	$ 360.867,00	48,20	$ 1.337.983,80
28	Construcción Canalización en zona dura o zona verde de hasta 30 cm de profundidad. Incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalación de un (1) tubo eléctrico DB de 2", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente (Si aplica). NO incluye demoliciones.	m	1,0	$ 31.737,00	$ 31.737,00	17,10	$ 542.703,00	87,50	$ 2.776.987,50
29	Suministro e instalación de cubierta metálica para viga de puente en lámina galvanizada calibre 16 de hasta 0,25 m2 y pintura electrostática negra. Incluye todos los elementos para su correcta fijación.	Un	1,0	$ 321.237,00	$ 321.237,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
30	Construcción de canalización aérea tubería IMC de 2", incluye accesorios de fijación.	m	1,0	$ 107.747,00	$ 107.747,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
31	Suministro e instalación de conduleta metálica de 2"	Un	1,0	$ 189.634,00	$ 189.634,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 758.536,00
32	Construcción de canalización aérea tubería IMC de 3", incluye accesorios de fijación.	m	1,0	$ 161.859,00	$ 161.859,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
33	Construcción Base para Controlador Local en concreto de 21 Mpa, acabado a la vista, medidas de hasta 0.6 X 0.41 X 1.50 m, acero de refuerzo principal, 4 de 3/8", 3 estribos de 3/8", 3 tubos eléctricos de 3" de 1.50 m, c/u, 3 curvas eléctricas de 3", excavación de 0.40 X 0.6 x 0.3 m. Incluye formaleta metálica y curado. Botada de material sobrante.	Un	1,0	$ 827.666,00	$ 827.666,00	3,00	$ 2.482.998,00	76,00	$ 62.902.616,00
34	Construcción de Cajas de 50 X 50 cm internas en concreto de 21 Mpa, paredes de 0.10 m y profundidad de 0.8 m, no incluye herraje (marco y tapa) metálico y/o sintético, antifraude, fondo en triturado lavado de tamaño 3/4", espesor 0,10 m. Incluye excavación y botada de material sobrante.	Un	1,0	$ 322.250,00	$ 322.250,00	2,00	$ 644.500,00	8,00	$ 2.578.000,00
35	Construcción de Cajas de 60 X 60 cm internas en concreto de 21 Mpa, paredes de 0.15 m y profundidad hasta 1 m, no incluye herraje metálico (marco y tapa) , fondo en triturado lavado de tamaño 3/4", espesor 0,10 m. Incluye excavación y botada de material sobrante.	Un	1,0	$ 405.108,00	$ 405.108,00	2,00	$ 810.216,00	32,00	$ 12.963.456,00
36	Construcción andenes en concreto de 21 Mpa, de espesor 8 cm, incluye acero de refuerzo #2 (2 Kg*m2), y base granular de espesor 15 cm, juntas de dilatación y acabado	m2	1,0	$ 119.037,00	$ 119.037,00	1,72	$ 204.744,00	108,73	$ 12.942.893,01
37	Construcción rampa para personas con movilidad reducida, incluye concreto de 21 Mpa, loseta táctil alerta, llaves de confinamiento en concreto, sellado de adoquines con arena de revoque y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Ver Figuras en en manual de espacio público	m2	1,0	$ 155.931,00	$ 155.931,00	0,00	$ 0,00	18,96	$ 2.956.451,76

	CONDICIONES CONTRACTUALES					PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Vr. Parcial Total**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
38	Excavación manual en material heterogéneo con cualquier tipo de humedad, H: entre 0,0 y 1,2m, incluye cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.	m3	1,0	$ 52.461,00	$ 52.461,00	0,00	$ 0,00	13,72	$ 719.764,92
39	Construccion de llaves de confinamiento en concreto de 21 Mpa, de varias medidas. Incluye formaleta de cualquier material para concreto a la vista, y biseles triangulares de 1/2"	m	1,0	$ 85.447,00	$ 85.447,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
40	Construccion de vigas en concreto de 21 Mpa, medida de 0,20 x 0,20 m, incluye acero de refuerzo: 4 varillas longitudinales de 1/2" y 7 estribos de 3/8" espaciados cada 0,15 m de 0,12 X 0,12 m. La excavación se pagará en su respectivo item.	m	1,0	$ 91.307,00	$ 91.307,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
41	Construcción de malla detectora en pavimento asfáltico, incluye corte de pavimento con disco, cable de 2x18 con su respectivo empalme eléctrico, y resane con epóxico para carpeta asfáltica	m	1,0	$ 73.690,00	$ 73.690,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
42	Suministro e instalación de acometida eléctrica, para controlador local, incluye demolición, excavación, hasta 6 m de tubería IMC de 3/4", zuncho metálico de 5/8", y hasta 25 mts de cable encauchetado 2x12, empalmes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	1,0	$ 387.566,00	$ 387.566,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 2.325.396,00
43	Construccion de puesta a tierra RA4-020 tipo EPM - incluye varilla coperweld 5/8", alambre No. 10 de cobre, soldadura exotérmica, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y cumpliendo con la norma y especificación de E. P. M. Incluye medición e informe.	Un	1,0	$ 371.481,00	$ 371.481,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 4.086.291,00
44	Construcción de descarga a tierra de pantalla de cable telefónico.	Un	1,0	$ 32.607,00	$ 32.607,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
45	Construcción contrapeso de puesta a tierra para cumplimiento con la norma y especificación de E. P. M. Incluye medición e informe.	Un	1,0	$ 443.993,00	$ 443.993,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
46	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 2", incluye accesorios de fijación.(Cinta bandit de 5/8" y hebillas tambien en acero).	m	1,0	$ 76.588,00	$ 76.588,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
47	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 1 1/2", incluye elementos de fijación.(Cinta bandit de 5/8" y hebillas en acero).	m	1,0	$ 72.987,00	$ 72.987,00	6,50	$ 474.416,00	20,00	$ 1.459.740,00
48	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 1 ", incluye accesorios de fijación.(Cinta bandit de 5/8" y hebilla en acero).	m	1,0	$ 54.610,00	$ 54.610,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
49	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 3/4"", incluye accesorios de fijación.(Cinta bandit de 5/8" y hebillas en acero).	m	1,0	$ 47.767,00	$ 47.767,00	0,00	$ 0,00	4,50	$ 214.951,50
50	Suministro e instalación de tubo eléctrico DB de 1 1/2"	m	1,0	$ 10.610,00	$ 10.610,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
51	Suministro e instalación de tubo eléctrico DB de 2"	m	1,0	$ 12.132,00	$ 12.132,00	0,00	$ 0,00	1,05	$ 12.738,60
52	Suministro e instalación de tubo eléctrico DB de 3"	m	1,0	$ 23.642,00	$ 23.642,00	0,00	$ 0,00	22,95	$ 542.583,90
53	Retiro e instalación de Adoquines (liso, alerta o güía). Incluye subbase y arena	m2	1,0	$ 56.161,00	$ 56.161,00	5,52	$ 310.009,00	21,02	$ 1.180.504,22
54	Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.	Un	1,0	$ 20.032,00	$ 20.032,00	23,00	$ 460.736,00	623,00	$ 12.479.936,00
55	Encamisado de tubería pvc en canalizacion existente hasta 50 cm.	Un	1,0	$ 19.377,00	$ 19.377,00	0,00	$ 0,00	21,00	$ 406.917,00
56	Suministro, transporte e instalación de mezcla asfáltica densa en caliente MDC 19, espesor 4", ancho hasta 50 cm. Compactada por medio mecánico, Incluye riego de emulsión asfáltica de rompimiento rapido	m	1,0	$ 106.272,00	$ 106.272,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
57	Suministro, transporte e instalación de mezcla asfáltica densa en caliente MDC 19, espesor 6", ancho hasta 50 cm. Compactada por medio mecánico, Incluye riego de emulsión asfáltica de rompimiento rapido.	m	1,0	$ 136.627,00	$ 136.627,00	36,40	$ 4.973.223,00	36,40	$ 4.973.222,80
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS								
58	Suministro, transporte e instalación de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 5.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación.	Un	1,0	$ 3.931.291,00	$ 3.931.291,00	1,00	$ 3.931.291,00	1,00	$ 3.931.291,00
59	Suministro, transporte e instalación de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 4.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación.	Un	1,0	$ 3.862.147,00	$ 3.862.147,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
60	Suministro, transporte e instalación de poste recto de enterramiento directo, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores de tubería y pintura y lo mismo que adherencia. Incluye demolición de concreto, excavación y concreto de 21 Mpa para empotramiento del poste	Un	1,0	$ 1.557.489,00	$ 1.557.489,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 4.672.467,00
61	Suministro, transporte e instalación de poste recto con platina , con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores para tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación.	Un	1,0	$ 2.144.221,00	$ 2.144.221,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
62	Suministro, transporte e instalación de poste recto con platina para instalación de brazo de ménsula, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores para tubería, pintura y adherencia. Incluye brida o flanche y elementos de fijación.	Un	1,0	$ 2.221.574,00	$ 2.221.574,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Vr. Parcial Total**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
63	Suministro, transporte e instalación de poste para ubicación de sonorizador, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores para tubería, pintura y adherencia. Incluye demolición, excavación, concreto de 21 Mpa para empotramiento del poste.	Un	1,0	$ 787.506,00	$ 787.506,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
64	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular en ménsula, incluye elementos de fijación, colocación horizontal sin placa de contraste. Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	1,0	$ 1.481.576,00	$ 1.481.576,00	2,00	$ 2.963.152,00	9,00	$ 13.334.184,00
65	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular a poste recto, incluye elementos de fijación. (flejes de acero Bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	1,0	$ 1.382.865,00	$ 1.382.865,00	0,00	$ 0,00	40,00	$ 55.314.600,00
66	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular de 4 aspectos a poste recto, incluye elementos de fijación. (flejes de acero Bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos accesorios de pasta.	Un	1,0	$ 1.788.944,00	$ 1.788.944,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
67	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular de conteo regresivo a ménsula, tres aspectos. Conteo regresivo de rojo y conteo regresivo de verde y amarillo completo durante el tiempo de amarillo. Incluye elementos de fijación (flejes de acero Bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	1,0	$ 2.165.692,00	$ 2.165.692,00	2,00	$ 4.331.384,00	8,00	$ 17.325.536,00
68	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal de conteo regresivo. Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	1,0	$ 1.658.257,00	$ 1.658.257,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 13.266.056,00
69	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal de conteo regresivo para paso peatonal actuado (pulsado). Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye módulo de conteo, cableado interno y dos soportes en policarbonato.	Un	1,0	$ 1.781.158,00	$ 1.781.158,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
70	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal estático. Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	1,0	$ 1.220.337,00	$ 1.220.337,00	0,00	$ 0,00	27,00	$ 32.949.099,00
71	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal proyector en piso. Incluye ajuste y elementos de fijación.	Un	1,0	$ 4.004.506,00	$ 4.004.506,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
72	Suministro, transporte e instalación de módulo sonoro para semáforo peatonal.	Un	1,0	$ 2.243.667,00	$ 2.243.667,00	0,00	$ 0,00	50,00	$ 112.183.350,00
73	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal tipo totem de 160x37x24 cm. Incluye sonorizador, dos lámparas peatonal estaticas de 200 mm, pulsador inductivo touchless y panel de mensajería de 19.5x97.5 cm.	Un	1,0	$ 9.476.115,00	$ 9.476.115,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
74	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	Un	1,0	$ 3.511.437,00	$ 3.511.437,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
75	Suministro, transporte e instalación de semáforo estático para ciclistas, de tres aspectos de 100 mm. IP65. Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	un	1,0	$ 1.229.318,00	$ 1.229.318,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
76	Suministro, transporte de instalación de contraste para semáforo de cuatro aspectos, inluye pintura anticorrosivo y acabado en poliuretano.	Un	1,0	$ 463.039,00	$ 463.039,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
77	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG (Termoflex) 4x18, 600 v, 105°C, para semaforización.	m	1,0	$ 7.556,00	$ 7.556,00	0,00	$ 0,00	3660,00	$ 27.654.960,00
78	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG (Termoflex) 2x18, 600 v, 105°, para semaforización.	m	1,0	$ 4.101,00	$ 4.101,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
79	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG 2x12 de Potencia-Tipo Fuerza, para semaforización. Debe cumplir con las normas y especificaciones de E. P M.	m	1,0	$ 8.546,00	$ 8.546,00	0,00	$ 0,00	306,00	$ 2.615.076,00
80	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG 2x10 de Potencia-Tipo Fuerza, para semaforización. Debe cumplir con las normas y especificaciones de E. P M.	m	1,0	$ 12.789,00	$ 12.789,00	20,00	$ 255.780,00	213,00	$ 2.724.057,00
81	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG 2x8 de Potencia-Tipo Fuerza, para semaforización. Debe cumplir con las normas y especificaciones de E. P M.	m	1,0	$ 20.225,00	$ 20.225,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
82	Suministro, transporte e instalación de cable mensajero, desnudo y de espesor E=1/8"	m	1,0	$ 2.583,00	$ 2.583,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
83	Suministro, transporte e instalación de discos direccionales, para postes de semáforos, en lámina galvanizada y/o fibra de vidrio, con material reflectivo tipo IX, incluye elementos de fijación (cinta band it de 3/4" y hebillas) y recubrimiento del borde con esmalte epóxico. Se debe cumplir con las normas y especificaciones del manual de Señalizacion vial vigente en cuanto a color y papel.	Un	1,0	$ 201.244,00	$ 201.244,00	3,00	$ 603.732,00	242,00	$ 48.701.048,00
84	Suministro, transporte e instalación de señal de seguridad vial SI-27A, para poste peatonal con pulsador.	Un	1,0	$ 266.799,00	$ 266.799,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Vr. Parcial Total**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
85	Reparación de disco direccional. Incluye retiro de material reflectivo existente, suministro e instalación de material reflectivo tipo IX (mínimo) y recubrimiento del borde con esmalte epóxico. Se debe cumplir con las normas y especificaciones del manual de Señalizacion vial vigente en cuanto a color y papel.	Un	1,0	$ 104.200,00	$ 104.200,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
86	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de semáforo a 50, 100 o 200 m, incluye excavación y concreto de 21 MPA para empotramiento. Se debe cumplir con las normas y especificaciones del manual de señalizacion vial vigente.	Un	1,0	$ 287.345,00	$ 287.345,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
87	Suministro, transporte e instalación de pulsadores para peatones. Incluye elementos de fijación.	Un	1,0	$ 940.860,00	$ 940.860,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 6.586.020,00
88	Suministro, transporte e instalación de pulsadores touchless (Sin contacto) para peatones.Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm.	Un	1,0	$ 1.026.702,00	$ 1.026.702,00	12,00	$ 12.320.424,00	48,00	$ 49.281.696,00
89	Suministro, transporte e instalación de percha con aislador	Un	1,0	$ 75.588,00	$ 75.588,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 907.056,00
90	Suministro de Protector de sobrecargas eléctricas para controlador local.	Un	1,0	$ 3.668.548,00	$ 3.668.548,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
91	Suministro, transporte e instalación de radar para detección de vehículos en intersección semafórica	Un	1,0	$ 5.276.791,00	$ 5.276.791,00	1,00	$ 5.276.791,00	8,00	$ 42.214.328,00
92	Suministro, transporte e instalación de lengüetas para chapas de controlador local	Un	1,0	$ 63.406,00	$ 63.406,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
93	Suministro, transporte e instalación de chapa principal para gabinetes de controlador local. Incluye tornillos de fijación	Un	1,0	$ 361.923,00	$ 361.923,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
94	Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	Un	1,0	$ 53.619,00	$ 53.619,00	239,00	$ 12.814.941,00	2429,00	$ 130.240.551,00
95	Suministro, transporte e instalación de empalme Cable telefónico de 10 pares. Incluye elementos necesarios para el buen desempeño	Un	1,0	$ 356.628,00	$ 356.628,00	0,00	$ 0,00	28,00	$ 9.985.584,00
96	Suministro, transporte e instalación de cortacircuitos breaker monopolar de 6 amperios.	Un	1,0	$ 17.522,00	$ 17.522,00	0,00	$ 0,00	21,00	$ 367.962,00
97	Suministro, transporte e instalación de anclajes para ménsula, incluye demolición, excavación, acero de refuerzo, concreto de 21 Mpa, cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.	Un	1,0	$ 614.727,00	$ 614.727,00	4,00	$ 2.458.908,00	11,00	$ 6.761.997,00
98	Suministro, transporte e instalación de plaqueta identificadora de cable de semáforos	Un	1,0	$ 8.781,00	$ 8.781,00	0,00	$ 0,00	126,00	$ 1.106.406,00
99	Suministro, transporte e instalación de empalme UY	Un	1,0	$ 2.077,00	$ 2.077,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
100	Suministro, transporte e instalación de empalme con Conector en "C" de cable AWG 8 ó 10	Un	1,0	$ 15.558,00	$ 15.558,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
101	Suministro, transporte e instalación de fusibles cerámica de L = 3/4" y diámetro 3/16" de 3.15 A	Un	1,0	$ 9.408,00	$ 9.408,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 9.408,00
102	Suministro e instalación de cable # 8 entre varillas de 5/8" para puesta a tierra	m	1,0	$ 9.107,00	$ 9.107,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
103	Suministro e Instalación de alambre # 10 para tierra desde la varilla de 5/8" a la bornera	m	1,0	$ 7.498,00	$ 7.498,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
104	Suministro e instalación de 50 cm de cinta bandit para semáforo vehicular o peatonal a poste recto	Un	1,0	$ 10.062,00	$ 10.062,00	20,00	$ 201.240,00	187,00	$ 1.881.594,00
105	Suministro de flauta para soporte de semáforo en ménsula. Incluye Pintura lijada, aplicación de anticorrosivo y pintura poliuretano.	Un	1,0	$ 92.570,00	$ 92.570,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
106	Suministro e Instalación de accesorio para soporte de semáforo de hasta 50 cm	Un	1,0	$ 122.434,00	$ 122.434,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
107	Suministro e Instalación de tornillos para flanche.	Un	1,0	$ 7.763,00	$ 7.763,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
108	Suministro e instalación de cable encauchetado 2 x 10	m	1,0	$ 12.967,00	$ 12.967,00	0,00	$ 0,00	282,00	$ 3.656.694,00
109	Suministro e Instalación de Cable encauchetado 2 x 14	m	1,0	$ 9.214,00	$ 9.214,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
110	Suministro e Instalación de Cable UTP cat6+ para intemperie	m	1,0	$ 5.901,00	$ 5.901,00	223,00	$ 1.315.923,00	7229,00	$ 42.658.329,00
111	Suministro e Instalación de Cable STP cat6+ para intemperie	m	1,0	$ 6.374,00	$ 6.374,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
112	Suministro e instalación de tapa bornera	Un	1,0	$ 113.050,00	$ 113.050,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	RED DE COMUNICACIONES								
113	Suministro e instalación de fibra óptica armada de 24 hilos.	m	1,0	$ 10.793,00	$ 10.793,00	15161,00	$ 163.632.673,00	30494,00	$ 329.121.742,00
114	Empalme por fusión de fibra óptica de 24 hilos , incluye instalación de mufla con derivación.	Un	1,0	$ 431.593,00	$ 431.593,00	3,00	$ 1.294.779,00	12,00	$ 5.179.116,00
115	Empalme por fusión de fibra óptica de hasta 48 hilos, tipo sangría, organización de hilos en bandeja y adosamiento en cámara o poste	Un	1,0	$ 379.842,00	$ 379.842,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
116	Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos.	Un	1,0	$ 289.775,00	$ 289.775,00	60,00	$ 17.386.500,00	128,00	$ 37.091.200,00
117	Certificación de enlace Óptico de 1 hilo, incluye reflectometría con bobina de lanzamiento, prueba VFL, potencia óptica y verificación microscópica de conectores. Incluye entregables (Gráficas de OTDR + Potencias) punto a punto	Un	1,0	$ 14.471,00	$ 14.471,00	304,00	$ 4.399.184,00	844,00	$ 12.213.524,00
118	Suministro e instalación de conector rápido de fibra óptica	Un	1,0	$ 13.093,00	$ 13.093,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
119	Suministro e instalación de conversor de medio de fibra óptica	Un	1,0	$ 256.359,00	$ 256.359,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Vr. Parcial Total**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
120	Suministro e instalación de pathcore de fibra óptica de 5 m monomodo SC	Un	1,0	$ 44.404,00	$ 44.404,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
121	Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ	m	1,0	$ 1.114,00	$ 1.114,00	15581,00	$ 17.357.234,00	71957,00	$ 80.160.098,00
122	Suministro, transporte e instalación de fibra óptica ADSS, monomodo, span 100, de 24 hilos. No incluye plano record.	m	1,0	$ 11.099,00	$ 11.099,00	530,00	$ 5.882.470,00	3447,00	$ 38.258.253,00
123	Suministro, transporte e instalación de tuerca de ojo para instalación de fibra óptica	Un	1,0	$ 24.288,00	$ 24.288,00	13,00	$ 315.744,00	153,00	$ 3.716.064,00
124	Suministro, transporte e instalación de herraje de suspensión para instalación de fibra óptica	Un	1,0	$ 25.261,00	$ 25.261,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
125	Suministro, transporte e instalación de helicoidal para instalación de fibra óptica	Un	1,0	$ 18.086,00	$ 18.086,00	16,00	$ 289.376,00	163,00	$ 2.948.018,00
126	Suministro, transporte e instalación de placa identificadora de fibra óptica	Un	1,0	$ 9.200,00	$ 9.200,00	557,00	$ 5.124.400,00	1222,00	$ 11.242.400,00
127	Suministro, configuración y puesta en marcha de equipo de comunicación inalámbrica. Consta de transmisor y antena tipo látigo con soporte para instalación en ménsula.	Un	1,0	$ 1.229.450,00	$ 1.229.450,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
128	Instalación de equipo de comunicación inalámbrica en ménsula. Incluye cinta bandit	Un	1,0	$ 182.536,00	$ 182.536,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 365.072,00
129	Retiro de equipo de comunicación inalámbrica en ménsula	Un	1,0	$ 158.942,00	$ 158.942,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 317.884,00
130	Suministro de switch capa 3 de fibra óptica	Un	1,0	$ 1.039.940,00	$ 1.039.940,00	70,00	$ 72.795.800,00	141,00	$ 146.631.540,00
131	Suministro e instalación de switch capa 2 de cinco puertos ethernet de 1 gbps	Un	1,0	$ 106.517,00	$ 106.517,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
132	Suministro e instalación de módulo SFP de 1,25 Gbps Dúplex LC/APC 1310 nm	Un	1,0	$ 183.379,00	$ 183.379,00	49,00	$ 8.985.571,00	119,00	$ 21.822.101,00
133	Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de switch capa 3 de fibra óptica	Un	1,0	$ 243.495,00	$ 243.495,00	26,00	$ 6.330.870,00	74,00	$ 18.018.630,00
134	Suministro, configuración e instalación de Router 6200 G.SHDSL.bis VPN 11.362 Mbps.	Un	1,0	$ 2.497.278,00	$ 2.497.278,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
135	Suministro e instalación dentro de gabinete de controlador de multitoma AC de 6 puestos con polo a tierra.	Un	1,0	$ 30.679,00	$ 30.679,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
136	Sumnistro e instalación de tubería embebida al interior de cárama de inspección en tubería metálica flexible de 1". Incluye elementos de fijación.	m	1,0	$ 35.197,00	$ 35.197,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS SEMAFÓRICOS								
137	Suministro de Carcaza de un aspecto para semáforo de 200 mm en policarbonato. Incluye visera	Un	1,0	$ 294.625,00	$ 294.625,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 2.357.000,00
138	Suministro de Carcaza de dos aspectos para semáforo de 200 mm en policarbonato. Incluye visera	Un	1,0	$ 533.590,00	$ 533.590,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 3.201.540,00
139	Suministro de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 5.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación y tapones.	Un	1,0	$ 3.486.539,00	$ 3.486.539,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 52.298.085,00
140	Suministro de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 4.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación y tapones.	Un	1,0	$ 3.417.396,00	$ 3.417.396,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
141	Suministro de poste recto de enterramiento directo, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores de tubería y pintura y lo mismo que adherencia.	Un	1,0	$ 1.442.326,00	$ 1.442.326,00	0,00	$ 0,00	159,00	$ 229.329.834,00
142	Suministro de poste recto de platina, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores de tubería y pintura y lo mismo que adherencia.	Un	1,0	$ 2.077.371,00	$ 2.077.371,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
143	Suministro de semáforo vehicular, incluye dos soportes en poliuretano	Un	1,0	$ 1.354.428,00	$ 1.354.428,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 13.544.280,00
144	Suministro de semáforo peatonal de conteo regresivo, incluye dos soportes en poliuretano	Un	1,0	$ 1.622.178,00	$ 1.622.178,00	0,00	$ 0,00	92,00	$ 149.240.376,00
145	Suministro de semáforo peatonal estático, incluye dos soportes en poliuretano	Un	1,0	$ 1.184.259,00	$ 1.184.259,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
146	Suministro de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	Un	1,0	$ 3.317.524,00	$ 3.317.524,00	0,00	$ 0,00	200,00	$ 663.504.800,00
147	Suministro de gabinete para controlador local, en lámina calibre 16. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte gris mate. El gabinete debe incluir dos chapas adicionales para seguridad en la puerta con llave maestra.	Un	1,0	$ 4.610.908,00	$ 4.610.908,00	25,00	$ 115.272.700,00	60,00	$ 276.654.480,00
148	Suministro de cable encauchetado AWG (Termoflex) 4x18, 600 v, 105°C, para semaforización.	m	1,0	$ 6.353,00	$ 6.353,00	0,00	$ 0,00	36275,00	$ 230.455.075,00
149	Suministro de pulsadores touchless para peatones. Incluye acople de 4" y elementos de fijación.	Un	1,0	$ 967.895,00	$ 967.895,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
150	Suministro de soporte tipo L para cámara a poste Recto	Un	1,0	$ 106.507,00	$ 106.507,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
151	Suministro de Soporte para Semáforo vehicular de 200mm a Ménsula (son un par)	Un	1,0	$ 107.728,00	$ 107.728,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
152	Suministro de Par de argollas para accesorio soporte a ménsula	Un	1,0	$ 62.692,00	$ 62.692,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
153	Suministro de soporte para ménsula, flauta galvanizada y platina galvanizada. Incluye perno de sujeción	Un	1,0	$ 181.246,00	$ 181.246,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
154	Suministro de lámparas a Led D= 200 mm, vehicular, verde, roja o amarilla.	Un	1,0	$ 335.933,00	$ 335.933,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total
155	Suministro de Lámparas a Led D=200 mm, peatonal. Verde o roja.	Un	1,0	$ 336.446,00	$ 336.446,00	0,00	$ 0,00	40,00	$ 13.457.840,00
156	Suministro de Lámparas a Led D= 200 mm, ciclistas. Verde o roja.	Un	1,0	$ 363.199,00	$ 363.199,00	0,00	$ 0,00	65,00	$ 23.607.935,00
157	Suministro de lámpara vehicular a LED D=200 mm de conteo regresivo amarilla, con conteo regresivo en rojo y en verde	Un	1,0	$ 373.428,00	$ 373.428,00	0,00	$ 0,00	200,00	$ 74.685.600,00
158	Suministro de Fuente de alimentación para lámpara a led	Un	1,0	$ 44.362,00	$ 44.362,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
159	Suministro de Bombillo C7 E12 7W 110V	Un	1,0	$ 1.223,00	$ 1.223,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
160	Suministro de Fusible de cerámica L = 3/4" y diámetro 3/16" de 3.15 A	Un	1,0	$ 7.653,00	$ 7.653,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
161	Suministro de borneras para gabinete de controlador local.	Un	1,0	$ 8.430,00	$ 8.430,00	0,00	$ 0,00	493,00	$ 4.155.990,00
162	Suministro de Transformador (220-110)	Un	1,0	$ 176.626,00	$ 176.626,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
163	Suministro de Canastilla para sonorizador	Un	1,0	$ 411.114,00	$ 411.114,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
164	Suministro de insecticida matacucarachas en aerosol x 400 ml	Un	1,0	$ 23.376,00	$ 23.376,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	RETIROS DE ELEMENTOS DE AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO								
165	Retiro de Controlador local. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 115.227,00	$ 115.227,00	1,00	$ 115.227,00	25,00	$ 2.880.675,00
166	Retiro de ménsula metálica, incluye brazo y poste. Incluye equipo de plataforma de altura, cargue y transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 224.375,00	$ 224.375,00	6,00	$ 1.346.250,00	24,00	$ 5.385.000,00
167	Retiro de brazo de ménsula metálica. Incluye equipo de plataforma de altura, cargue y transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 96.137,00	$ 96.137,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
168	Retiro de Poste Recto de enterramiento directo. Incluye equipo de corte de concreto, demolición, excavacion, cargue y transporte a su disposición final y el material sobrante al botadero oficial.	Un	1,0	$ 189.513,00	$ 189.513,00	8,00	$ 1.516.104,00	203,00	$ 38.471.139,00
169	Retiro de Poste Recto con platina. Incluye cargue transporte a su disposición final y botada de material sobrante	Un	1,0	$ 83.338,00	$ 83.338,00	3,00	$ 250.014,00	4,00	$ 333.352,00
170	Retiro de Semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de equipo de altura y transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 76.942,00	$ 76.942,00	7,00	$ 538.594,00	41,00	$ 3.154.622,00
171	Retiro e instalación de Semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de equipo de altura, retiro de placa de constraste, girada de viseras y ubicación del semáforo de manera horizontal.	Un	1,0	$ 258.474,00	$ 258.474,00	0,00	$ 0,00	200,00	$ 51.694.800,00
172	Retiro de Semáforo vehicular, peatonal o de ciclista, a poste recto. Incluye transporte a disposición final.	Un	1,0	$ 28.668,00	$ 28.668,00	52,00	$ 1.490.736,00	486,00	$ 13.932.648,00
173	Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final	m	1,0	$ 527,00	$ 527,00	1046,00	$ 551.242,00	18631,90	$ 9.819.011,30
174	Retiro de Cable mensajero de E=1/8". Incluye transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 871,00	$ 871,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
175	Retiro de acometida eléctrica de controlador local. Incluye retiro de la tubería y transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 106.330,00	$ 106.330,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
176	Retiro de Sonorizador. Incluye transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 39.167,00	$ 39.167,00	1,00	$ 39.167,00	27,00	$ 1.057.509,00
177	Retiro de Pulsador peatonal. Incluye transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 39.167,00	$ 39.167,00	23,00	$ 900.841,00	111,00	$ 4.347.537,00
178	Retiro de placa de contraste a semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de plataforma para altura y transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 36.389,00	$ 36.389,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
179	Retiro de Disco direccional o disco pulse espere y pase. Incluye transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 8.169,00	$ 8.169,00	16,00	$ 130.704,00	329,00	$ 2.687.601,00
180	Retiro de señal informativa de motos. Incluye transporte a la obra de la Obra.	Un	1,0	$ 36.389,00	$ 36.389,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 181.945,00
181	Retiro de señalización vertical de tránsito de cualquier tipo. Incluye cargue y transporte al sitio donde lo indique la interventoria.	Un	1,0	$ 19.311,00	$ 19.311,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
182	Retiro de perno en platina de poste. Incluye corte con pulidora. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 6.955,00	$ 6.955,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 27.820,00
183	Retiro de Soldadura en tapa- marco en caja de inspección	Un	1,0	$ 8.304,00	$ 8.304,00	117,00	$ 971.568,00	476,00	$ 3.952.704,00
184	Retiro de Extensión de tubería IMC a poste vehicular para cableado aéreo. Incluye transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 42.558,00	$ 42.558,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 127.674,00
185	Retiro de Cámara y gabinete para aforo vehicular. Incluye equipo de plataforma para altura y transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 207.248,00	$ 207.248,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
186	Retiro de Cámaras de video analítica para aforos , elementos de anclaje y soporte, cables de potencia y Datos, retiro de Gabinete de Control de Cámaras. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 305.670,00	$ 305.670,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
187	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero	Un	1,0	$ 80.804,00	$ 80.804,00	7,00	$ 565.628,00	732,00	$ 59.148.528,00
188	Retiro de marco métalico o sintético, de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero	Un	1,0	$ 80.804,00	$ 80.804,00	0,00	$ 0,00	17,00	$ 1.373.668,00

		CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total
189	Retiro de tapa en concreto reforzado, de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 21.502,00	$ 21.502,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 43.004,00
190	Retiro de dispositivo de análisis en campo.	Un	1,0	$ 69.655,00	$ 69.655,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
191	Retiro de percha de electroporcelana	Un	1,0	$ 41.445,00	$ 41.445,00	1,00	$ 41.445,00	1,00	$ 41.445,00
192	Retiro de bajante IMC de hasta 3". Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 22.320,00	$ 22.320,00	1,00	$ 22.320,00	6,00	$ 133.920,00
193	Retiro e instalación de tapa Bornera, incluye pintura y cinta bandit con dos hebillas	Un	1,0	$ 35.852,00	$ 35.852,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
194	Retiro de soporte tipo L para cámara a poste Recto. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 27.623,00	$ 27.623,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
195	Retiro de lámpara vehicular o peatonal a poste recto. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 15.116,00	$ 15.116,00	19,00	$ 287.204,00	496,00	$ 7.497.536,00
196	Retiro de lámpara vehicular a ménsula. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 27.184,00	$ 27.184,00	7,00	$ 190.288,00	154,00	$ 4.186.336,00
197	Retiro e instalación (aplome o nivelación) de poste recto de enterramiento directo. Incluye concreto de 21 Mpa	Un	1,0	$ 102.470,00	$ 102.470,00	4,00	$ 409.880,00	18,00	$ 1.844.460,00
198	Retiro de visera a poste recto. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 10.426,00	$ 10.426,00	1,00	$ 10.426,00	5,00	$ 52.130,00
199	Retiro de Contraste a poste. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 17.938,00	$ 17.938,00	10,00	$ 179.380,00	712,00	$ 12.771.856,00
200	Retiro de cable telefónico de 10, 20 ó 50 pares. Incluye transporte a su disposición final	m	1,0	$ 723,00	$ 723,00	12,00	$ 8.676,00	515,00	$ 372.345,00
201	Retiro de pasacalles por obstrucción de visual de semáforo.	Un	1,0	$ 68.017,00	$ 68.017,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
202	Retiro de elemento obstructivo en ménsula. Incluye uso de vehículo carro canasta o grúa	Un	1,0	$ 107.195,00	$ 107.195,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO								
203	Instalación de ménsula metálica con brazo de 4,5 o 5,50 m	Un	1,0	$ 435.317,00	$ 435.317,00	6,00	$ 2.611.902,00	28,00	$ 12.188.876,00
204	Instalación de brazo de ménsula metálica. Incluye equipo de plataforma de altura, cargue y transporte a su punto de instalación.	Un	1,0	$ 159.063,00	$ 159.063,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
205	Instalación de poste recto con platina	Un	1,0	$ 76.855,00	$ 76.855,00	5,00	$ 384.275,00	6,00	$ 461.130,00
206	Instalación de poste recto de enterramiento directo. incluye demolición, excavación y concreto de 21 MPA para empotramiento del poste y cargue y botada de material sobrante	Un	1,0	$ 129.735,00	$ 129.735,00	4,00	$ 518.940,00	197,00	$ 25.557.795,00
207	Instalación de semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de plataforma, elementos de fijación (Cinta bandit de 5/8"y hebilla)	Un	1,0	$ 112.610,00	$ 112.610,00	5,00	$ 563.050,00	27,00	$ 3.040.470,00
208	Instalación de Semáforo vehicular o peatonal a poste recto. Incluye elementos de fijación (Cinta bandit en acero de 5/8" y hebilla)	Un	1,0	$ 33.170,00	$ 33.170,00	52,00	$ 1.724.840,00	430,00	$ 14.263.100,00
209	Instalación de placa de contraste para semáforo vehicular a poste recto. Incluye elementos de fijación (Cinta bandit de 5/8" y hebilla)	Un	1,0	$ 63.098,00	$ 63.098,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
210	Instalación de viseras de semáforo en brazo de ménsula. Incluye utilización de plataforma.	Un	1,0	$ 15.826,00	$ 15.826,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
211	Instalación de viseras de semáforo en poste recto	Un	1,0	$ 4.084,00	$ 4.084,00	6,00	$ 24.504,00	11,00	$ 44.924,00
212	Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	Un	1,0	$ 208.865,00	$ 208.865,00	6,00	$ 1.253.190,00	179,00	$ 37.386.835,00
213	Instalación de Sonorizador. Incluye elementos de fijación	Un	1,0	$ 74.317,00	$ 74.317,00	1,00	$ 74.317,00	13,00	$ 966.121,00
214	Instalación de Pulsador. Incluye elementos de fijación.	Un	1,0	$ 84.079,00	$ 84.079,00	11,00	$ 924.869,00	68,00	$ 5.717.372,00
215	Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	Un	1,0	$ 1.410,00	$ 1.410,00	2141,00	$ 3.018.810,00	24336,80	$ 34.314.888,00
216	Instalación de Controlador local. Incluye prueba de acometida, cableado de grupos, detectores y pulsadores.	Un	1	$ 357.787,00	$ 357.787,00	20,00	$ 7.155.740,00	77,00	$ 27.549.599,00
217	Instalación de placa identificadora de cables de semáforo	Un	1,0	$ 4.291,00	$ 4.291,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
218	Instalación de lámpara vehicular o peatonal a poste recto	Un	1,0	$ 17.984,00	$ 17.984,00	24,00	$ 431.616,00	505,00	$ 9.081.920,00
219	Instalación de lámpara vehicular a ménsula	Un	1,0	$ 32.074,00	$ 32.074,00	7,00	$ 224.518,00	154,00	$ 4.939.396,00
220	Instalación de disco direccional. Incluye transporte y elementos de fijación (Cinta bandit en acero de 5/8" y hebilla).	Un	1,0	$ 18.598,00	$ 18.598,00	12,00	$ 223.176,00	117,00	$ 2.175.966,00
221	Instalación de señal vertical. Incluye concreto de 21 Mpa, botada de material sobrante.	Un	1,0	$ 41.159,00	$ 41.159,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
222	Calibración y mantenimiento de los planeamientos de tráfico en los controladores locales de la red semafórica de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Medellín	Hr	1,0	$ 50.539,00	$ 50.539,00	236,00	$ 11.927.204,00	2672,00	$ 135.040.208,00
	PINTURA DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS								
223	Pintura de brazo de ménsula (en bodega). Incluye retiro total de pintura hasta superficie original de la tubería (rasqueteada), dos manos de pintura anticorrosiva o base, dos manos de pintura poliuretano blanca y franjas negras. Debe cumplir con los espesores y adherencia de la pintura.	Un	1,0	$ 178.847,00	$ 178.847,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
224	Pintura de poste recto en sitio, colores blanco y negro en poliuretano, CON retiro total de pintura (rasqueteada) . Incluye limpieza y lijada del poste, y dos manos en poliuretano blanca y franjas negras.	Un	1,0	$ 143.944,00	$ 143.944,00	14,00	$ 2.015.216,00	14,00	$ 2.015.216,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Vr. Parcial Total**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
225	Pintura de poste recto en sitio, colores blanco y negro en poliuretano, SIN retiro total de pintura (rasqueteada) . Incluye limpieza y lijada del poste, y dos manos en poliuretano blanca y franjas negras.	Un	1,0	$ 85.515,00	$ 85.515,00	11,00	$ 940.665,00	66,00	$ 5.643.990,00
226	Pintura de gabinete de controlador local según diseño y color de la SMM.	Un	1,0	$ 144.020,00	$ 144.020,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
227	Pintura de placas de contraste. Lijada y limpieza de la superficie con disolvente, wash primer, pintura en poliuretano blanco para el marco y negro para el fondo completo.	Un	1,0	$ 60.705,00	$ 60.705,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	LAVADA DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS								
228	Lavada de gabinete de controlador local	Un	1,0	$ 32.665,00	$ 32.665,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 97.995,00
229	Lavada de brazo de ménsula	Un	1,0	$ 60.829,00	$ 60.829,00	45,00	$ 2.737.305,00	161,00	$ 9.793.469,00
230	Lavada de Poste recto	Un	1,0	$ 23.214,00	$ 23.214,00	59,00	$ 1.369.626,00	592,00	$ 13.742.688,00
231	Lavada de semáforo peatonal o ciclista	Un	1,0	$ 23.214,00	$ 23.214,00	48,00	$ 1.114.272,00	634,00	$ 14.717.676,00
232	Lavada de Sonorizadores o pulsador	Un	1,0	$ 13.891,00	$ 13.891,00	11,00	$ 152.801,00	135,00	$ 1.875.285,00
233	Lavada de avisos de motos	Un	1,0	$ 23.090,00	$ 23.090,00	3,00	$ 69.270,00	8,00	$ 184.720,00
234	Lavado de semáforo vehicular a poste	Un	1,0	$ 25.936,00	$ 25.936,00	52,00	$ 1.348.672,00	471,00	$ 12.215.856,00
235	Lavado de semáforo vehicular a ménsula de 3 o 4 aspectos	Un	1,0	$ 60.829,00	$ 60.829,00	46,00	$ 2.798.134,00	165,00	$ 10.036.785,00
236	Lavada de disco direccional	Un	1,0	$ 12.886,00	$ 12.886,00	56,00	$ 721.616,00	543,00	$ 6.997.098,00
	VARIOS								
237	Sondeo de canalizaciones, buscada de cajas, halado de cables y levantamiento actual georreferenciado de la intersección completa en software SIG, incluye el diámetro de las tuberías, número de cables, longitudes, distancia entre cajas, tipo de cajas, registro fotográfico, y toda la información necesaria para su correcto entendimiento.	Un	1,0	$ 243.212,00	$ 243.212,00	15,00	$ 3.648.180,00	136,00	$ 33.076.832,00
238	Adecuación en taller de perforaciones de base ménsula para ensamble en cimentación existente, incluye transporte, tratamiento de la superficie afectada con spray de zinc y pintura de acabado negra.	Un	1,0	$ 85.481,00	$ 85.481,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
239	Suministro, transporte e instalación de platina especial para realce de anclaje de ménsula. Incluye soldadura en anclaje de ménsula existente.	Un	1,0	$ 507.820,00	$ 507.820,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.523.460,00
240	Suministro, transporte e instalación de conector tipo piercing para acometida de controlador. Incluye dos conductores (F-F o F-N)	Un	1,0	$ 134.829,00	$ 134.829,00	1,00	$ 134.829,00	10,00	$ 1.348.290,00
241	Reparación de semáforo vehicular, peatonal o ciclista.	Un	1,0	$ 39.537,00	$ 39.537,00	14,00	$ 553.518,00	20,00	$ 790.740,00
242	Reparación estructural, en taller, de hasta 1m de longitud de poste recto de 4" con platina.	Un	1,0	$ 491.690,00	$ 491.690,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
243	Reparación estructural, en taller, de hasta 1m de longitud de poste recto de 4" de enterramiento.	Un	1,0	$ 347.436,00	$ 347.436,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
244	Mantenimiento de brazo de ménsula galvanizado. Incluye retiro de pintuta existente y pintura electrostática	Un	1,0	$ 188.195,00	$ 188.195,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
245	Suministro y aplicación de líquido rico en zinc para flanches de ménsula x 150 ml.	Un	1,0	$ 53.095,00	$ 53.095,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
246	Pintura de símbolo en lámparas de semáforo peatonal o vehicular	Un	1,0	$ 28.207,00	$ 28.207,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 310.277,00
247	Perforación de 1-1/8" de poste o ménsula. Incluye tapón de caucho de 1-1/8" con agujero de 3/4" y spray de zinc.	Un	1,0	$ 69.849,00	$ 69.849,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 69.849,00
248	Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.	Un	1,0	$ 94.727,00	$ 94.727,00	0,00	$ 0,00	286,00	$ 27.091.922,00
249	Alineación de brazo de ménsula, incluye tornillos.	Un	1,0	$ 100.202,00	$ 100.202,00	2,00	$ 200.404,00	2,00	$ 200.404,00
250	Adecuación de controlador local existente. Incluye instalación de ventilador, termostato, breakers, borneras, tomas de alimentación, cableado de los grupos, acometida, puesta a tierra, prueba en laboratorio y limpieza de racks (son hasta tres) y de cables. No incluye programación de tarjetas	Un	1,0	$ 917.023,00	$ 917.023,00	1,00	$ 917.023,00	25,00	$ 22.925.575,00
251	Suministro e instalación de chapa de seguridad para gabinete de controlador local existente. Incluye lengüeta en acero galvanizado de 2” y llave.	Un	1,0	$ 140.003,00	$ 140.003,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
252	Suministro de llave para apertura de cámara de inspección según diseño.	Un	1,0	$ 29.403,00	$ 29.403,00	0,00	$ 0,00	58,00	$ 1.705.374,00
253	Suministro e instalación de final de carrera para detección de apertura de gabinete. Incluye cableado hasta tarjeta de entrada del controlador.	Un	1,0	$ 88.518,00	$ 88.518,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
254	Adecuación de flanches (Brida), en taller, para ménsulas de 4.5 o 5.5 m, incluye dos bridas, extensión de 20cm del brazo y tratamiento con zinc.	Un	1,0	$ 352.728,00	$ 352.728,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
255	Lleno de caja de registro de hasta 60x80 cm con triturado. Incluye costales.	Un	1,0	$ 50.285,00	$ 50.285,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 150.855,00
256	Lleno de caja de registro de hasta 60x80 cm con triturado existente. Incluye costales	Un	1,0	$ 17.436,00	$ 17.436,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 156.924,00
257	Enderezada cara semáforo vehicular a ménsula	Un	1,0	$ 66.533,00	$ 66.533,00	1,00	$ 66.533,00	6,00	$ 399.198,00
258	Enderezada cara semáforo vehicular o peatonal o ciclistas a poste	Un	1,0	$ 22.423,00	$ 22.423,00	33,00	$ 739.959,00	254,00	$ 5.695.442,00
259	Enderezada o ajustada de visera a ménsula	Un	1,0	$ 42.581,00	$ 42.581,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 468.391,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Vr. Parcial Total**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
260	Enderezada o ajustada de visera a poste	Un	1,0	$ 12.253,00	$ 12.253,00	11,00	$ 134.783,00	58,00	$ 710.674,00
261	Diagnóstico, verificación y reparación de cruce con problemas de corto o fracturas en cableado que impiden el servicio. Incluye transporte de peronal y equipos.	Un	1,0	$ 93.381,00	$ 93.381,00	20,00	$ 1.867.620,00	128,00	$ 11.952.768,00
262	Soldada de cajas de inspección. Mínimo 15 cm de cordón en cada lado de la caja	Un	1,0	$ 66.601,00	$ 66.601,00	156,00	$ 10.389.756,00	716,50	$ 47.719.616,50
263	Suministro e instalación de concreto (e=15 cm) de 21 Mpa, para sellado de caja de inspección	Un	1,0	$ 51.086,00	$ 51.086,00	36,00	$ 1.839.096,00	115,00	$ 5.874.890,00
264	Mantenimiento a caja de inspección de 50x50 cm, 60x60 cm o 50x80 cm existente. Incluye limpieza, tratamiento anticorrosivo y lubricación de tornillos de seguridad.	Un	1,0	$ 47.238,00	$ 47.238,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 661.332,00
			COSTOS DIRECTOS			**COSTO DIRECTO ACTA**	**$ 587.481.794,00**	**COSTO DIRECTO ACUM**	**$ 4.681.178.955,00**
			Administración	32,90%		32,90%	$ 193.281.510,00	32,90%	$ 1.540.107.876,00
			Imprevistos	0,50%		0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
			Utilidad	5,00%		5,00%	$ 29.374.090,00	5,00%	$ 234.058.948,00
			Valor Total AIU	38,40%		37,90%	$ 222.655.600,00	37,90%	$ 1.774.166.824,00
			Pago Reajuste				**$ 93.200.694,00**		$ 113.690.555,00
			Guía Socioambiental				$ 10.535.447,00		$ 51.935.565,00
			Pólizas						$ 50.147.456,00
			PRESUPUESTO TOTAL			**VALOR TOTAL ACTA**	**$ 913.873.535,00**	**VALOR TOTAL ACUM.**	**$ 6.671.119.355,00**

Miguel Ángel Osorio Gómez
Director de Obra - UT SIT MEDELLIN

Marta Lucía Suárez Gómez
Director de Interventoría - CONSORCIO INT FAROL MED

ANEXO 19.

INDICES DE CAMACOL

CAMACOL ANTIOQUIA

CAMACOLInforma
El poder de construir estrategia

ÍNDICES DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN

SAO TECHNOLOGY & CIA. S.A.S.

Una eficaz gestión de obras

Que impulsa tu innovación

Mejora la calidad , entrega tus proyectos a tiempo y agiliza tus tareas de construcción.



322 6534335

www.saotechnology.com

CAMACOL ANTIOQUIA

CAMACOLInforma
El poder de construir estrategia

Este documento que contiene los índices de Costos de la Construcción, son para uso exclusivo de la empresa: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - ALCALDÍA DE MEDELLÍN, identificada con Nit: 8909052111. Para cualquier usuario diferente deberá ser verificada su validez.

CAMACOL ANTIOQUIA

ÍNDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE VIVIENDA EN MEDELLÍN

BASE 100 = DICIEMBRE DE 1989

FEBRERO DE 2026

ÍNDICE COSTO TOTAL	ENERO	FEBRERO	VARIACION % MENS.	VARIACION % ACUM/26	VARIACION % ANUAL
EDIFICACIÓN	3.757,33	3.887,27	3,46	8,04	8,83

CONCEPTO	COD	UNIFAMILIAR MÍNIMO	UNIFAMILIAR MEDIO	UNIFAMILIAR COMPLETO	MULTIFAMILIAR HASTA 5 PISOS	MULTIFAMILIAR MAS DE 5 PISOS	PROMEDIO UNI-FAMILIAR	PROMEDIO MULTI-FAMILIAR	INDICE TOTAL POR ITEM	VARIACION POR ITEM % ene-26 / feb-26	VARIACION POR ITEM % dic-25 / feb-26	VARIACION POR ITEM % feb-25 / feb-26
TOTAL MANO DE OBRA	TMO	4.696,44	4.645,62	4.641,31	4.566,62	4.577,12	4.652,58	4.569,01	4.594,77	8,71	14,64	16,71
CEMENTO	CE	3.918,26	3.911,17	3.906,41	3.904,90	3.902,29	3.907,32	3.902,28	3.902,80	1,56	6,24	9,57
CONCRETO PREMEZCLADO	CO	3.670,11	3.695,47	3.697,08	3.707,79	3.713,49	3.694,36	3.707,92	3.700,69	0,00	3,53	3,53
PREFABRICADOS	PR	2.974,50	3.899,06	3.270,70	3.325,09	3.106,65	3.568,49	3.192,70	3.289,47	0,00	8,49	8,49
AGREGADOS MINERALES	AM	3.234,67	2.948,93	3.010,75	2.801,21	2.861,58	3.026,25	2.770,70	2.828,67	0,00	4,33	4,80
HIERRO	HI	3.844,22	3.917,54	3.570,52	2.922,44	3.335,89	3.770,92	3.117,19	3.309,62	2,18	3,73	3,54
MADERAS PARA CONSTRUCCIÓN	MA	7.198,60	7.459,44	7.877,17	6.794,12	6.973,91	7.579,04	6.884,82	7.100,86	9,39	9,65	14,88
MATERIALES PARA MAMPOSTERÍA	MM	4.758,59	5.021,06	4.703,32	4.251,90	4.892,60	4.880,15	4.525,88	4.629,19	3,58	9,74	12,66
MAT.INST. HIDRÁULICA SANITARIA	IHS	5.319,57	5.692,62	6.273,32	5.837,00	4.822,83	5.847,87	5.411,24	5.530,11	-0,25	1,58	5,69
INST. ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA	IET	9.684,16	11.445,39	10.902,87	11.990,53	9.882,26	10.952,27	11.017,84	10.976,41	0,37	9,00	3,73
MATERIALES PARA CUBIERTA	MC	3.742,98	3.599,47	2.779,71	3.614,77	3.478,88	3.250,88	3.521,09	3.433,82	0,00	11,42	9,25
TOTAL MATERIALES OBRA NEGRA	TMON	4.664,45	4.817,16	4.512,79	4.760,62	4.493,02	4.669,95	4.632,19	4.615,98	1,62	6,26	6,32
PISOS	PIS	3.053,15	2.462,08	2.360,15	2.445,02	2.486,77	2.505,22	2.476,98	2.489,99	3,92	8,94	12,99
CARPINTERÍA DE MADERA	CMA	3.171,33	3.224,17	3.133,37	3.133,43	3.119,54	3.111,29	3.122,98	3.131,83	-0,58	1,61	-0,48
CARPINTERÍA METÁLICA	CM	2.840,53	3.088,70	3.191,23	3.450,22	3.478,61	3.118,61	3.460,53	3.360,16	0,45	4,99	7,56
APARATOS SANITARIOS	AS	1.795,59	1.869,55	2.079,03	1.963,84	2.130,56	1.940,26	2.026,78	2.004,97	0,00	2,47	2,11
PINTURAS	PI	2.203,80	2.053,29	2.018,29	2.910,99	2.651,93	2.041,51	2.810,58	2.583,39	3,82	10,46	14,74
INSTALACIONES ESPECIALES	IE	3.525,66	3.018,24	2.988,56	2.711,30	2.467,55	2.987,53	2.551,69	2.643,01	-0,87	-1,78	-2,32
ENCHAPES	EN	1.515,34	1.448,15	1.561,03	1.676,07	1.608,97	1.512,99	1.640,50	1.607,16	0,00	1,50	-1,08
TOTAL MATERIALES ACABADOS	TMA	2.584,23	2.645,32	2.592,11	2.718,84	2.652,52	2.620,47	2.677,74	2.660,41	0,93	3,85	4,68
HERRAMIENTAS	HE	3.184,74	2.973,96	3.231,95	2.249,22	2.011,09	3.109,30	2.242,96	2.543,03	0,83	4,20	12,17
EQUIPOS	EQ	1.431,31	1.392,87	1.550,29	1.448,46	1.543,09	1.461,64	1.478,72	1.473,14	1,17	2,48	3,28
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO	THE	1.906,68	1.770,99	1.923,64	1.493,77	1.575,72	1.860,36	1.521,59	1.636,83	1,06	2,85	5,02
TOTAL MATERIALES	TM	4.063,49	3.897,06	3.575,89	3.769,57	3.492,93	3.785,64	3.631,21	3.664,22	1,41	5,51	5,87
COSTO TOTAL DE EDIFICACIÓN	CTE	4.233,97	4.099,03	3.870,84	3.972,79	3.732,26	4.023,64	3.846,58	3.887,27	3,46	8,04	8,83

DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE INNOVACCIÓN

NOTA: PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL

Este documento que contiene los Índices de Costos de la Construcción, son para uso exclusivo de la empresa: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - ALCALDÍA DE MEDELLÍN, identificada con Nit: 8909052111. Para cualquier usuario diferente deberá ser verificada su validez.

CONCEPTO	BASE 100	CODIGO	ENERO	FEBRERO	VARIACION %		
					ene-26 feb-26	dic-25 feb-26	feb-25 feb-26
ACCESORIOS DE BRONCE	dic-89	ACC.BR.	5.577,75	5.583,76	0,11	3,55	25,53
ACCESORIOS DE HIERRO FUNDIDO	dic-89	ACC.HF.	2.006,42	2.159,43	7,63	7,63	13,63
AFIRMADOS - BASE GRANULAR (*)	dic-89	AF	4.640,36	4.743,00	2,21	6,47	6,70
AISLADORES	dic-89	AIS.	1.484,22	1.484,22	0,00	-3,27	4,00
ALAMBRE (COBRE Y ALUMINIO)	dic-89	ALM	11.000,36	10.974,13	-0,24	1,85	0,16
ALAMBRE DE COBRE	dic-89	ACU	30.150,19	30.314,35	0,54	0,95	1,84
ALAMBRES DE ALUMINIO	dic-89	AL.AL.	11.957,48	11.920,53	-0,31	2,56	-6,12
ALCANTARILLADOS (*)	dic-89	AL	2.660,22	2.718,84	2,20	4,08	8,14
ALUMBRADO PUBLICO	dic-97	ALP	321,33	329,83	2,65	4,42	3,73
ANDENES, CUNETAS Y CORDONES (*)	dic-89	ACC	1.811,52	1.828,55	0,94	5,14	6,59
BLOQUE DE CONCRETO PARA MAMPOSTERIA	dic-89	BLC	2.538,49	2.639,12	3,96	6,66	9,65
CABLE DE ALUMINIO FORRADO	dic-97	CAF	2.328,78	2.296,24	-1,40	-0,75	-4,38
CONCRETO DE 2.000 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C20	3.507,64	3.507,64	0,00	4,90	4,90
CONCRETO DE 2.500 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C25	3.822,60	3.822,60	0,00	5,05	5,05
CONCRETO DE 3.000 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C30	3.694,01	3.694,01	0,00	5,05	5,05
CONCRETO DE 3.500 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C35	3.734,31	3.734,31	0,00	5,10	5,10
CONCRETO DE 4.000 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C40	4.139,04	4.139,04	0,00	5,10	5,10
CONCRETO DE 4.500 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C45	4.353,58	4.353,58	0,00	4,59	4,59
CONCRETO DE 5.000 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C50	4.442,11	4.442,11	0,00	4,59	4,59
CONDUCTORES DE COBRE	dic-97	CC	5.562,10	5.544,28	-0,32	-0,06	-5,04
DRYWALL	dic-23	DWL	104,01	104,01	0,00	-0,19	-1,59
ELEMENTOS METALICOS	dic-89	E.M.	2.345,11	2.345,11	0,00	0,00	11,97
EQUIPO BASICO	dic-98	EB	540,31	540,31	0,00	0,00	-7,73
EQUIPO DE ELEVACION	dic-23	ELE	109,49	110,48	0,90	0,90	-4,35
EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS	dic-89	EQO	2.591,08	2.591,08	0,00	0,00	-4,66
EQUIPO PARA EDIFICACION	dic-89	EQE	1.569,89	1.596,53	1,70	2,63	19,63
EQUIPO PARA EXCAVACION EN ROCA	dic-98	EER	441,32	441,32	0,00	0,00	-6,09
EQUIPO PARA IMPRIMACION Y PAVIMENTO ASFA	dic-98	EIPA	299,60	303,34	1,25	1,25	6,45
EQUIPO PARA MOVIMIENTO DE TIERRA	dic-98	EMT	551,47	551,47	0,00	0,00	-7,44
EQUIPO PARA PAVIMENTOS NO CONVENCIONAL	dic-98	EPNC	355,93	360,38	1,25	1,25	1,92
EQUIPO PARA SUBBASE Y BASE	dic-98	ESB	623,91	623,91	0,00	0,00	1,05
GABINETE ELECTRICO - SUBESTACION	dic-97	GES	402,25	427,35	6,24	4,54	1,43
GAS - CENTROS DE MEDICION	dic-95	GCM	300,01	300,01	0,00	-2,14	-1,98
GAS - RED EXTERNA POLIETILENO	dic-97	REX	644,68	644,68	0,00	0,00	0,10
LLANTAS PARA EL TRANSPORTE DE CARGA	dic-89	LL	5.950,40	5.950,40	0,00	0,00	-1,36
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	dic-89	LC	6.101,64	5.995,70	-1,74	-3,35	0,43
MANO DE OBRA ELECTRICA	dic-97	MOBE	522,80	598,46	14,47	17,55	28,41
MANO DE OBRA PARA OBRAS PUBLICAS	dic-89	MOOP	3.703,80	3.773,59	1,88	4,75	11,45
MANO DE OBRA SUBCONTRATADA EDIF.	dic-89	MOSE	6.217,61	6.994,06	12,49	18,82	20,38
MATERIALES GALVANIZADOS	dic-89	M.G.	1.547,18	1.547,18	0,00	-0,08	11,07
MEZCLA ASFALTICA	dic-89	MAS	10.404,98	11.192,96	7,57	9,79	11,41
MOVIMIENTO DE ROCA (*)	dic-89	MR	2.321,56	2.321,56	0,00	0,00	-1,84
MOVIMIENTO DE TIERRA (*)	dic-89	MT	3.348,20	3.350,84	0,08	0,34	-3,03
PAVIMENTO ASFALTICO (CORRIDO) (*)	dic-89	PA	7.763,20	8.300,60	6,92	9,01	11,11
PAVIMENTO ASFALTICO (PARCHEO)(*)	dic-98	PAP	1.068,72	1.123,90	5,16	7,38	11,03
PAVIMENTOS DE CONCRETO (*)	dic-89	PC	2.758,78	2.763,48	0,17	4,80	5,12
POSTERIA DE CONCRETO	dic-89	PT.C.	2.580,25	2.580,25	0,00	0,00	0,00
SALIDA ELECTRICA	dic-97	SA	1.733,81	1.721,07	-0,74	-0,51	-0,97
SUB-BASE (*)	dic-89	SB	4.273,14	4.273,14	0,00	6,32	6,58
TRANSFORMADOR	dic-89	TR	3.456,35	3.456,35	0,00	0,00	-4,48
TRANSPORTE (*)	dic-89	TRA	2.004,76	2.002,56	-0,11	-0,13	0,88
TUBERIA DE ACERO	dic-89	T.ACE.	1.657,16	1.657,16	0,00	0,46	1,90
TUBERIA DE COBRE	dic-89	T.CU.	1.182,66	1.182,66	0,00	0,00	0,00
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA	dic-89	TCR	2.101,31	2.199,69	4,68	4,68	7,15


(*) INCLUYE MANO DE OBRA

Este documento que contiene los Índices de Costos de la Construcción, son para uso exclusivo de la empresa: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - ALCALDÍA DE MEDELLÍN, identificada con Nit: 8909052111. Para cualquier usuario diferente deberá ser verificada su validez.

CONCEPTO	BASE 100	CODIGO	ENERO	FEBRERO	VARIACION %		
					ene-26 feb-26	dic-25 feb-26	feb-25 feb-26
TUBERIA DE PRESION Y ACCESORIOS PVC	dic-89	PVCP	7.266,31	7.266,31	0,00	1,01	6,05
TUBERIA PVC (DUCTO TELEFONICO)	dic-89	PVCT	7.694,31	7.694,31	0,00	0,00	5,00
TUBERIA PVC CORRUGADA	dic-89	PVCC	12.206,90	12.206,90	0,00	0,00	10,12
TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS PVC	dic-89	PVCS	5.212,82	5.212,82	0,00	2,39	7,06
TUBERIA Y ACCESORIOS GALVANIZADOS	dic-89	T.G.	2.967,33	2.967,05	-0,01	1,58	1,54
VIDRIO	dic-89	VI	1.275,26	1.292,18	1,33	1,33	-2,26
INDICES DE ADITIVOS							
CEMENTICIOS	dic-99	CEM	361,79	361,79	0,00	1,92	-0,10
CEMENTOS MODIFICADOS	dic-99	CEMO	956,51	956,51	0,00	2,00	15,23
EPÓXICOS (ADHERENTES)	dic-99	EPX	583,49	583,49	0,00	1,00	6,86

CAMACOL ANTIOQUIA

VARIACIÓN ANUAL FEBRERO
DEL ICCV EN EL VALLE DE ABURRA
(Índices de Costos de Construcción de Viviendas)
2017 A 2026

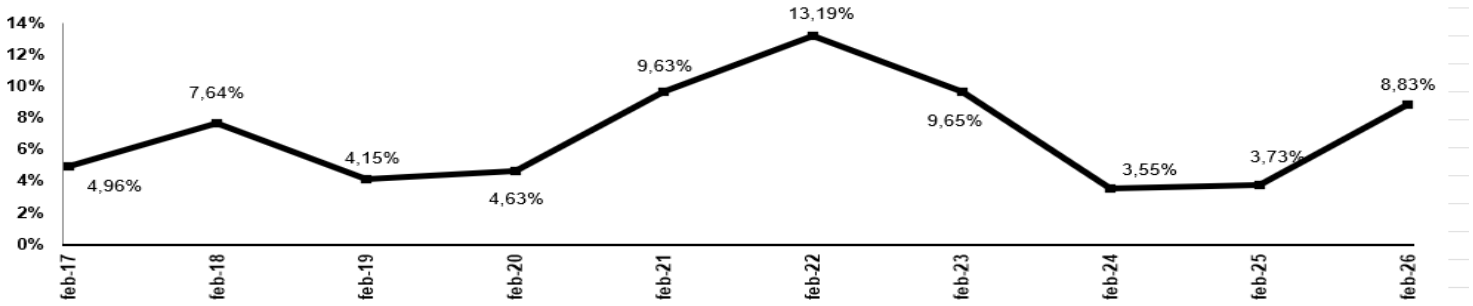

Fuente: Camacol Antioquia

ÍNDICES DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN

DEFINICIÓN

EL ÍNDICE DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN es un elemento estadístico que permite estimar el cambio promedio de los precios de los principales recursos requeridos para la edificación de viviendas, insumos básicos o actividades de construcción

El número índice es una cifra abstracta, expresada como porcentaje y se calcula con base en una participación en el costo y por la mano de obra según categorías, es decir, por aquellos elementos que conforman los costos directos. No incluye el valor del terreno. Los costos indirectos, constituidos por los gastos generales, impuestos y las utilidades, no se tomaron en cuenta por la dificultad para captar la información necesaria para elaborar el índice.

El índice en un periodo de tiempo determinado permite conocer el cambio porcentual en el costo medio de los materiales, equipo y la mano de obra en dicho periodo con relación al costo promedio de los materiales, equipo y la mano de obra en el periodo base.
La base tiene valor de 100.

USOS:
- Los índices se utilizan principalmente como instrumento para el reajuste de los contratos de obra, ya sea que estos se pacten entre particulares o entre firmas contratistas y el estado.

En los factores determinantes de los costos. Para tal efecto, la revisión debe hacerse mediante fórmulas polinómicas incorporadas en el respectivo contrato.

- Con los índices de costos se pueden hacer estimativos sobre la posible evolución de los precios de los insumos.

- Los índices permiten detectar variaciones estacionales en los precios y en consecuencia preveer periodos de escasez o alzas relativas al grupo de insumos estudiados.

- En la elaboración de cuentas nacionales, los índices de costos se emplean para deflactar o ajustar el valor bruto de la producción del sector a precios constantes.

INFORMACIÓN ADICIONAL
- Los precios incluyen el impuesto a las ventas, excepto los que expresamente estipule la ley con excepción. Los precios son de lista y no se considera ningún descuento.

La Vivienda Unifamiliar se divide en tres tipos según su costo: mínimo, medio y completo. La Vivienda Multifamiliar según su estructura hasta cinco pisos y más de cinco pisos.

- Los precios de los materiales como el cemento, los agregados minerales, bloques de concreto, los ladrillos, etc. No incluyen valor del transporte.

CAMACOL ANTIOQUIA

CAMACOLInforma
El poder de construir estrategia

ÍNDICES DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN

SAO TECHNOLOGY & CIA. S.A.S.

Una eficaz gestión de obras

Que impulsa tu innovación

Mejora la calidad , entrega tus proyectos a tiempo y agiliza tus tareas de construcción.



322 6534335

www.saotechnology.com

CAMACOL ANTIOQUIA

CAMACOLInforma
El poder de construir estrategia

Este documento que contiene los índices de Costos de la Construcción, son para uso exclusivo de la empresa: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - ALCALDÍA DE MEDELLÍN, identificada con Nit: 8909052111. Para cualquier usuario diferente deberá ser verificada su validez.

CAMACOL ANTIOQUIA

ÍNDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE VIVIENDA EN MEDELLÍN

BASE 100 = DICIEMBRE DE 1989

MARZO DE 2026

ÍNDICE COSTO TOTAL	FEBRERO	MARZO	VARIACION %		
			MENS.	ACUM/26	ANUAL
EDIFICACIÓN	3.887,27	3.894,75	0,19	8,24	8,21

CONCEPTO	COD	UNIFAMILIAR			MULTIFAMILIAR		PROMEDIO		INDICE TOTAL POR ITEM	VARIACION POR ITEM %		
		MÍNIMO	MEDIO	COMPLETO	HASTA 5 PISOS	MAS DE 5 PISOS	UNI-FAMILIAR	MULTI-FAMILIAR		feb-26 / mar-26	dic-25 / mar-26	mar-25 / mar-26
TOTAL MANO DE OBRA	TMO	4.696,44	4.645,62	4.641,31	4.566,62	4.577,12	4.652,58	4.569,01	4.594,77	0,00	14,64	14,64
CEMENTO	CE	3.918,26	3.911,17	3.906,41	3.904,90	3.902,29	3.907,32	3.902,28	3.902,80	0,00	6,24	9,57
CONCRETO PREMEZCLADO	CO	3.670,11	3.695,47	3.697,08	3.707,79	3.713,49	3.694,36	3.707,92	3.700,69	0,00	3,53	3,53
PREFABRICADOS	PR	2.974,50	3.899,06	3.270,70	3.325,09	3.106,65	3.568,49	3.192,70	3.289,47	0,00	8,49	8,49
AGREGADOS MINERALES	AM	3.234,67	2.948,93	3.010,75	2.801,21	2.861,58	3.026,25	2.770,70	2.828,67	0,00	4,33	4,80
HIERRO	HI	3.843,66	3.917,07	3.569,85	2.922,14	3.335,52	3.770,36	3.116,85	3.309,22	-0,01	3,71	7,42
MADERAS PARA CONSTRUCCIÓN	MA	7.198,18	7.458,54	7.876,00	6.794,12	6.973,83	7.578,13	6.884,78	7.100,55	0,00	9,64	14,88
MATERIALES PARA MAMPOSTERÍA	MM	4.838,95	5.126,79	4.925,75	4.383,32	5.041,22	5.027,25	4.664,68	4.770,34	3,05	13,08	13,55
MAT.INST. HIDRÁULICA SANITARIA	IHS	5.306,22	5.679,14	6.263,43	5.821,75	4.811,54	5.835,80	5.397,65	5.517,05	-0,24	1,34	2,21
INST. ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA	IET	9.684,16	11.445,39	10.902,87	11.990,53	9.882,26	10.952,27	11.017,84	10.976,41	0,00	9,00	2,09
MATERIALES PARA CUBIERTA	MC	3.636,29	3.516,12	2.739,24	3.545,28	3.420,31	3.180,67	3.456,83	3.367,67	-1,93	9,27	7,15
TOTAL MATERIALES OBRA NEGRA	TMON	4.671,02	4.831,13	4.543,58	4.772,31	4.504,83	4.688,96	4.643,89	4.629,93	0,30	6,58	6,34
PISOS	PIS	3.053,15	2.447,33	2.346,74	2.426,64	2.469,40	2.494,24	2.458,92	2.474,17	-0,64	8,24	9,18
CARPINTERÍA DE MADERA	CMA	3.171,33	3.224,17	3.133,37	3.133,43	3.119,54	3.111,29	3.122,98	3.131,83	0,00	1,61	-0,63
CARPINTERÍA METÁLICA	CM	2.840,90	3.091,07	3.191,42	3.450,63	3.478,42	3.119,73	3.460,69	3.360,63	0,01	5,00	7,30
APARATOS SANITARIOS	AS	1.854,26	1.901,27	2.106,36	1.981,89	2.148,43	1.975,95	2.044,70	2.028,64	1,18	3,68	3,31
PINTURAS	PI	2.230,49	2.089,15	2.054,03	2.971,34	2.689,53	2.074,94	2.861,59	2.629,11	1,77	12,41	17,02
INSTALACIONES ESPECIALES	IE	3.616,96	3.029,85	2.995,36	2.719,10	2.475,31	3.012,79	2.559,30	2.656,03	0,49	-1,29	-1,84
ENCHAPES	EN	1.515,34	1.448,15	1.561,03	1.676,07	1.608,97	1.512,99	1.640,50	1.607,16	0,00	1,50	-1,08
TOTAL MATERIALES ACABADOS	TMA	2.595,62	2.652,60	2.597,79	2.725,19	2.655,97	2.628,01	2.682,86	2.666,30	0,22	4,08	4,36
HERRAMIENTAS	HE	3.226,89	3.017,07	3.276,21	2.269,12	2.057,75	3.152,53	2.275,34	2.579,21	1,42	5,68	13,77
EQUIPOS	EQ	1.431,31	1.392,87	1.550,29	1.448,46	1.543,09	1.461,64	1.478,72	1.473,14	0,00	2,48	2,41
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO	THE	1.918,14	1.781,34	1.933,51	1.494,93	1.579,11	1.870,76	1.523,67	1.641,60	0,29	3,15	4,61
TOTAL MATERIALES	TM	4.071,35	3.908,60	3.595,26	3.778,52	3.500,57	3.799,39	3.639,56	3.674,25	0,27	5,80	5,76
COSTO TOTAL DE EDIFICACIÓN	CTE	4.239,72	4.107,45	3.884,88	3.979,46	3.738,21	4.033,66	3.852,91	3.894,75	0,19	8,24	8,21

DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE INNOVACCIÓN

NOTA: PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL

Este documento que contiene los Índices de Costos de la Construcción, son para uso exclusivo de la empresa: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - ALCALDÍA DE MEDELLÍN, identificada con Nit: 8909052111. Para cualquier usuario diferente deberá ser verificada su validez.


CONCEPTO	BASE 100	CODIGO	FEBRERO	MARZO	VARIACION %		
					feb-26 mar-26	dic-25 mar-26	mar-25 mar-26
ACCESORIOS DE BRONCE	dic-89	ACC.BR.	5.583,76	5.583,76	0,00	3,55	25,53
ACCESORIOS DE HIERRO FUNDIDO	dic-89	ACC.HF.	2.159,43	2.181,75	1,03	8,74	11,37
AFIRMADOS - BASE GRANULAR (*)	dic-89	AF	4.743,00	4.743,00	0,00	6,47	7,14
AISLADORES	dic-89	AIS.	1.484,22	1.484,22	0,00	-3,27	-0,10
ALAMBRE (COBRE Y ALUMINIO)	dic-89	ALM	10.974,13	10.999,90	0,23	2,09	1,16
ALAMBRE DE COBRE	dic-89	ACU	30.314,35	30.314,35	0,00	0,95	1,84
ALAMBRES DE ALUMINIO	dic-89	AL.AL.	11.920,53	11.932,42	0,10	2,66	-6,19
ALCANTARILLADOS (*)	dic-89	AL	2.718,84	2.718,84	0,00	4,08	8,11
ALUMBRADO PUBLICO	dic-97	ALP	329,83	330,40	0,17	4,60	4,30
ANDENES, CUNETAS Y CORDONES (*)	dic-89	ACC	1.828,55	1.828,55	0,00	5,14	6,58
BLOQUE DE CONCRETO PARA MAMPOSTERIA	dic-89	BLC	2.639,12	2.690,53	1,95	8,74	9,21
CABLE DE ALUMINIO FORRADO	dic-97	CAF	2.296,24	2.304,26	0,35	-0,40	-1,79
CONCRETO DE 2.000 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C20	3.507,64	3.507,64	0,00	4,90	4,90
CONCRETO DE 2.500 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C25	3.822,60	3.822,60	0,00	5,05	5,05
CONCRETO DE 3.000 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C30	3.694,01	3.694,01	0,00	5,05	5,05
CONCRETO DE 3.500 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C35	3.734,31	3.734,31	0,00	5,10	5,10
CONCRETO DE 4.000 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C40	4.139,04	4.139,04	0,00	5,10	5,10
CONCRETO DE 4.500 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C45	4.353,58	4.353,58	0,00	4,59	4,59
CONCRETO DE 5.000 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C50	4.442,11	4.442,11	0,00	4,59	4,59
CONDUCTORES DE COBRE	dic-97	CC	5.544,28	5.610,07	1,19	1,13	0,64
DRYWALL	dic-23	DWL	104,01	104,63	0,60	0,40	-0,65
ELEMENTOS METALICOS	dic-89	E.M.	2.345,11	2.412,40	2,87	2,87	15,18
EQUIPO BASICO	dic-98	EB	540,31	540,31	0,00	0,00	-3,97
EQUIPO DE ELEVACION	dic-23	ELE	110,48	111,41	0,84	1,75	-3,18
EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS	dic-89	EQO	2.591,08	2.591,08	0,00	0,00	-2,31
EQUIPO PARA EDIFICACION	dic-89	EQE	1.596,53	1.596,53	0,00	2,63	2,63
EQUIPO PARA EXCAVACION EN ROCA	dic-98	EER	441,32	441,32	0,00	0,00	-4,33
EQUIPO PARA IMPRIMACION Y PAVIMENTO ASFA	dic-98	EIPA	303,34	303,34	0,00	1,25	0,40
EQUIPO PARA MOVIMIENTO DE TIERRA	dic-98	EMT	551,47	551,47	0,00	0,00	-3,17
EQUIPO PARA PAVIMENTOS NO CONVENCIONAL	dic-98	EPNC	360,38	360,38	0,00	1,25	2,78
EQUIPO PARA SUBBASE Y BASE	dic-98	ESB	623,91	623,91	0,00	0,00	3,43
GABINETE ELECTRICO - SUBESTACION	dic-97	GES	427,35	427,35	0,00	4,54	1,19
GAS - CENTROS DE MEDICION	dic-95	GCM	300,01	300,01	0,00	-2,14	0,24
GAS - RED EXTERNA POLIETILENO	dic-97	REX	644,68	644,68	0,00	0,00	0,10
LLANTAS PARA EL TRANSPORTE DE CARGA	dic-89	LL	5.950,40	5.950,40	0,00	0,00	-1,36
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	dic-89	LC	5.995,70	6.001,68	0,10	-3,25	1,45
MANO DE OBRA ELECTRICA	dic-97	MOBE	598,46	617,08	3,11	21,20	32,41
MANO DE OBRA PARA OBRAS PUBLICAS	dic-89	MOOP	3.773,59	3.773,59	0,00	4,75	11,39
MANO DE OBRA SUBCONTRATADA EDIF.	dic-89	MOSE	6.994,06	6.994,06	0,00	18,82	20,38
MATERIALES GALVANIZADOS	dic-89	M.G.	1.547,18	1.544,92	-0,15	-0,23	-0,93
MEZCLA ASFALTICA	dic-89	MAS	11.192,96	11.192,96	0,00	9,79	11,41
MOVIMIENTO DE ROCA (*)	dic-89	MR	2.321,56	2.321,56	0,00	0,00	-1,30
MOVIMIENTO DE TIERRA (*)	dic-89	MT	3.350,84	3.351,34	0,02	0,35	0,07
PAVIMENTO ASFALTICO (CORRIDO) (*)	dic-89	PA	8.300,60	8.300,60	0,00	9,01	10,67
PAVIMENTO ASFALTICO (PARCHEO)(*)	dic-98	PAP	1.123,90	1.123,90	0,00	7,38	10,38
PAVIMENTOS DE CONCRETO (*)	dic-89	PC	2.763,48	2.763,51	0,00	4,80	5,29
POSTERIA DE CONCRETO	dic-89	PT.C.	2.580,25	2.725,17	5,62	5,62	5,62
SALIDA ELECTRICA	dic-97	SA	1.721,07	1.743,43	1,30	0,79	-0,61
SUB-BASE (*)	dic-89	SB	4.273,14	4.273,14	0,00	6,32	7,10
TRANSFORMADOR	dic-89	TR	3.456,35	3.456,35	0,00	0,00	-4,48
TRANSPORTE (*)	dic-89	TRA	2.002,56	2.002,86	0,02	-0,12	1,03
TUBERIA DE ACERO	dic-89	T.ACE.	1.657,16	1.657,16	0,00	0,46	1,90
TUBERIA DE COBRE	dic-89	T.CU.	1.182,66	1.182,66	0,00	0,00	0,00
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA	dic-89	TCR	2.199,69	2.199,69	0,00	4,68	7,15

(*) INCLUYE MANO DE OBRA

Este documento que contiene los Índices de Costos de la Construcción, son para uso exclusivo de la empresa: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - ALCALDÍA DE MEDELLÍN, identificada con Nit: 8909052111. Para cualquier usuario diferente deberá ser verificada su validez.

CONCEPTO	BASE 100	CODIGO	FEBRERO	MARZO	VARIACION %		
					feb-26 / mar-26	dic-25 / mar-26	mar-25 / mar-26
TUBERIA DE PRESION Y ACCESORIOS PVC	dic-89	PVCP	7.266,31	7.266,31	0,00	1,01	2,91
TUBERIA PVC (DUCTO TELEFONICO)	dic-89	PVCT	7.694,31	7.694,31	0,00	0,00	0,00
TUBERIA PVC CORRUGADA	dic-89	PVCC	12.206,90	12.206,90	0,00	0,00	0,00
TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS PVC	dic-89	PVCS	5.212,82	5.205,29	-0,14	2,24	5,39
TUBERIA Y ACCESORIOS GALVANIZADOS	dic-89	T.G.	2.967,05	2.934,44	-1,10	0,46	0,42
VIDRIO	dic-89	VI	1.292,18	1.292,18	0,00	1,33	-2,26
INDICES DE ADITIVOS							
CEMENTICIOS	dic-99	CEM	361,79	385,18	6,47	8,51	6,35
CEMENTOS MODIFICADOS	dic-99	CEMO	956,51	1.018,34	6,46	8,59	22,68
EPÓXICOS (ADHERENTES)	dic-99	EPX	583,49	613,44	5,13	6,18	12,34

VARIACIÓN ANUAL MARZO
DEL ICCV EN EL VALLE DE ABURRA
(Índices de Costos de Construcción de Viviendas)
2017 A 2026

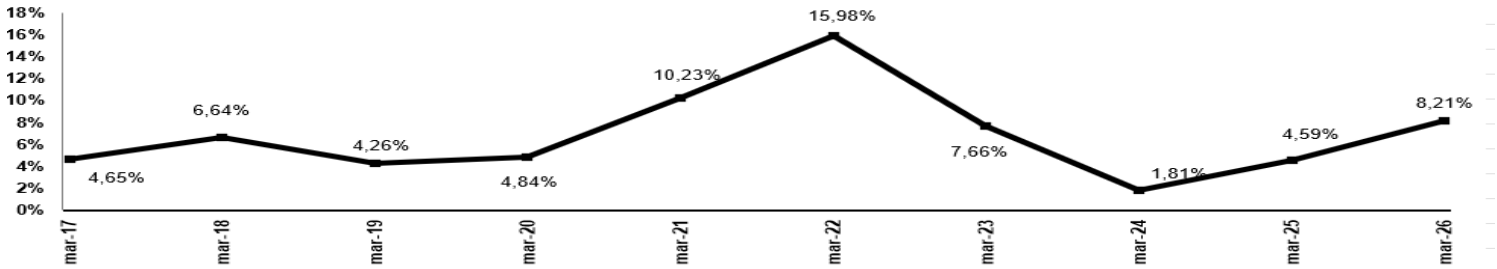

Fuente: Camacol Antioquia

ÍNDICES DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN

DEFINICIÓN

EL ÍNDICE DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN es un elemento estadístico que permite estimar el cambio promedio de los precios de los principales recursos requeridos para la edificación de viviendas, insumos básicos o actividades de construcción

El número índice es una cifra abstracta, expresada como porcentaje y se calcula con base en una participación en el costo y por la mano de obra según categorías, es decir, por aquellos elementos que conforman los costos directos. No incluye el valor del terreno. Los costos indirectos, constituidos por los gastos generales, impuestos y las utilidades, no se tomaron en cuenta por la dificultad para captar la información necesaria para elaborar el índice.

El índice en un periodo de tiempo determinado permite conocer el cambio porcentual en el costo medio de los materiales, equipo y la mano de obra en dicho periodo con relación al costo promedio de los materiales, equipo y la mano de obra en el periodo base.
La base tiene valor de 100.

USOS:
- Los índices se utilizan principalmente como instrumento para el reajuste de los contratos de obra, ya sea que estos se pacten entre particulares o entre firmas contratistas y el estado.

En los factores determinantes de los costos. Para tal efecto, la revisión debe hacerse mediante fórmulas polinómicas incorporadas en el respectivo contrato.

- Con los índices de costos se pueden hacer estimativos sobre la posible evolución de los precios de los insumos.

- Los índices permiten detectar variaciones estacionales en los precios y en consecuencia preveer periodos de escasez o alzas relativas al grupo de insumos estudiados.

- En la elaboración de cuentas nacionales, los índices de costos se emplean para deflactar o ajustar el valor bruto de la producción del sector a precios constantes.

INFORMACIÓN ADICIONAL
- Los precios incluyen el impuesto a las ventas, excepto los que expresamente estipule la ley con excepción. Los precios son de lista y no se considera ningún descuento.

La Vivienda Unifamiliar se divide en tres tipos según su costo: mínimo, medio y completo. La Vivienda Multifamiliar según su estructura hasta cinco pisos y más de cinco pisos.

- Los precios de los materiales como el cemento, los agregados minerales, bloques de concreto, los ladrillos, etc. No incluyen valor del transporte.

ANEXO 20. CERTIFICADO DE NO SUB-CONTRATACION

Medellín, Antioquia, 05 de junio de 2026

Señores

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Calle 44 # 52 165
Medellín, Antioquia

CÉSAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
R/L CONSORCIO INT FAROL MED 2025
Interventor - Contrato de Interventoría N° 4600105599 de 2025
Correo: consorciofarolmed@kalpaingenieria.com.co

MARIO ALFONSO PÉREZ LINARES
Profesional Especializado - Unidad de Circulación
Supervisor Contrato de Obra N° 4600105555 de 2025
Secretaría de Movilidad del Distrito de Medellín
Correo: marioa.perez@medellin.gov.co

128 - 2026

Asunto. Certificación de inexistencia de subcontratos en la ejecución del Contrato de Obra N° 4600105555 de 2025, para el periodo comprendido entre el **período comprendido entre el 01 de Mayo de 2026 y el 31 de Mayo de 2026.**

En mi calidad de representante legal de la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN, identificado como JORGE TRUJILLO NIÑO, mayor de edad, portador de la cédula de ciudadanía No. 13.893.413 de Barrancabermeja, me permito certificar bajo la gravedad de juramento que la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN **NO** ha suscrito, celebrado ni ejecutado ningún tipo de subcontrato con terceros para el desarrollo del **Contrato de Obra N° 4600105555 de 2025**, cuyo objeto es: "Realizar el mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín para el periodo comprendido entre el **01 de Mayo de 2026 y el 31 de Mayo de 2026"**

Esta certificación se expide en cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula 19 – Independencia del Contratista y la Cláusula 20 – Inexistencia de relación laboral entre la Entidad y el Contratista del mencionado contrato, dejando constancia de que todas las actividades, obligaciones y compromisos contractuales han sido ejecutados directamente por la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN, sin que haya existido delegación, cesión o subcontratación alguna.

La presente se expide a solicitud de los interesados, para los fines pertinentes.

Dada en Medellín, Antioquia, se expide el presente documento a los **Cinco (05)** días del mes de **junio** de **2026**.

Cordialmente,

JORGE TRUJILLO NIÑO
C.C 13.893.413 de Barrancabermeja
R/L. UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

ANEXO 21. CERTIFICADO DE REUTILIZACION DE AGUAS LLUVIAS

Medellín, Antioquia, 05 de Junio de 2026

Ingenieros

MARTA LUCÍA SUÁREZ GÓMEZ
Directora de interventoría

CÉSAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
R/L CONSORCIO INT FAROL MED 2025
Interventor - Contrato de Interventoría N° 4600105599 de 2025
Correo: consorciofarolmed@kalpaingenieria.com.co

MARIO ALFONSO PÉREZ LINARES
Profesional Especializado - Unidad de Circulación
Supervisor Contrato de Obra N° 4600105555 de 2025
Secretaría de Movilidad del Distrito de Medellín
Correo: marioa.perez@medellin.gov.co

129 - 2026

Asunto. Certificación de implementación de sistema de recolección de aguas lluvias – Plan de Sostenibilidad Ambiental para la ejecución del Contrato de Obra N° 4600105555 de 2025.

Por medio de la presente, la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN, en el marco de la ejecución del Contrato de Obra N° 4600105555 de 2025, se permite certificar que, para la vigencia comprendida entre el **01 de Mayo de 2026 y el 31 de Mayo de 2026**, se evidenció avance en la implementación y optimización del sistema de recolección y aprovechamiento de aguas lluvias, en cumplimiento de las medidas establecidas dentro del Plan de Sostenibilidad Ambiental del proyecto.

Durante el periodo correspondiente al mes de **Mayo de 2026**, y en continuidad con las acciones implementadas durante el mes de Abril del mismo año, se evidencian avances significativos en el mejoramiento de la calidad del agua recolectada en el proyecto.

En efecto, partiendo del diagnóstico previo en el cual se identificaron condiciones lodosas asociadas principalmente a la presencia de sedimentos provenientes del contacto con canaletas, bajantes y superficies de captación, durante el mes de marzo se consolidaron y fortalecieron las medidas correctivas y de optimización previamente adoptadas, destacándose:

- La continuidad y fortalecimiento de las rutinas periódicas de limpieza en los puntos de captación y conducción.
- La mejora en la eficiencia de los procesos de filtrado primario y en el manejo de sedimentos dentro de los sistemas de almacenamiento.
- La implementación de ajustes operativos adicionales orientados a disminuir la carga de sólidos suspendidos previo al almacenamiento final.

Como resultado de lo anterior, durante el mes de **Mayo de 2026** se ha evidenciado una mejora progresiva y sostenida en la calidad del agua recuperada, reduciendo de manera significativa la presencia de material particulado y optimizando sus condiciones para el aprovechamiento en actividades propias de obra y usos domésticos asociados al proyecto.

Este avance contribuye de manera efectiva a la reducción del consumo de agua potable, al uso eficiente del recurso hídrico y al cumplimiento de los lineamientos ambientales aplicables al contrato.

En consecuencia, se deja constancia del avance positivo en la gestión y tratamiento del agua recolectada, ratificando el compromiso del contratista con la sostenibilidad ambiental y la mejora continua dentro del desarrollo contractual.

Dada en Medellín, Antioquia, se expide el presente documento a los **Cinco (05)** día del mes de **Junio** de **2026.**

Cordialmente,

JORGE TRUJILLO NIÑO
C.C 13.893.413 de Barrancabermeja
R/L. UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

ANEXO 22. CERTIFICADO DE MADRE CABEZA DE FAMILIA

PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA POR PARTE DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O MUJERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Señores

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Calle 44 # 52 165
Medellín, Antioquia

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N° 4600105555 DE 2025

Objeto: **REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN**

Estimados señores:
Nosotros, JORGE TRUJILLO NIÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 13.893.413 de Barrancabermeja, y SERGIO ANDRES DIAZ MONTAÑEZ, identificado con C.C. No. 1.098.609.537 de Bucaramanga en nuestra condición de REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO de la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN, identificada con NIT 901.979.396-1, certificamos bajo la gravedad de juramento que se **VINCULÓ PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 4600105555 DE 2025** en el periodo comprendido entre **01 de Mayo de 2026 al 31 de Mayo de 2026** empleadas y/o contratistas por prestación de servicios por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar.

En el siguiente cuadro señalo las mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la ejecución del contrato referenciado:

Nombre de las mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la ejecución del Contrato de Obra	Identificación de las mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la ejecución del Contrato de Obra	Cargo en la UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
JENIFER DEL CARMEN ALTAMIRANDA DÍAZ	C.C. 1.052.982.270 **FECHA INGRESO:** 1/09/2025	Auxiliar SST y Ambiental
LAURA PADILLA GIRALDO	C.C. 1.017.221.580 **FECHA INGRESO:** 21/01/2026	Auxiliar de mantenimiento

En constancia, se firma en **Medellín, Antioquia**, a los **Cinco (05)** días del mes de **Junio** de **2026**.

Cordialmente,

SERGIO ANDRES DIAZ MONTAÑEZ
C.C. 1.098.609.537 de Bucaramanga
Contador Público - T.P 187097-T
UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

JORGE TRUJILLO NIÑO
C.C 13.893.413 de Barrancabermeja
R/L. UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

ANEXO 23. PRESUPUESTO SOCIO-AMBIENTAL

PRESUPUESTO GUÍA SOCIO AMBIENTAL					mar-26				abr-26			
ITEM	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**								
GESTION AMBIENTAL												
Manejo de residuos sólidos					**N° Factura**	**Cant**	**Valor Unitario**	**Valor total**	**N° Factura**	**Cant**	**Valor Unitario**	**Valor total**
Kit de derrames	Un	1	$ 250.000	$ 250.000	CCFD62101	2	138400,57	$ 276.801				
Dispositivos para canalizar el tránsito												
Conos (0,90 m x de altura y 2 franjas reflectivas Tipo IV Diamante)	Un	100	$ 95.000	$ 9.500.000	CCFD62074	50	80685,57	$ 4.034.279				
GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO												
Guantes de poliuretano	un	200	$ 5.000	$ 1.000.000	CCFD59776	66	5000	$ 330.000	CCFD63719	26	$ 5.000	$ 130.000
Guante de caucho	Un	200	$ 3.800	$ 760.000					CCFD63719	15	$ 3.800	$ 57.000
Certificación trabajo en altura	un	20	$ 200.000	$ 4.000.000	FE 14820	1	200000	$ 200.000				
Protección respiratoria con filtros (pintura)	Un	10	$ 126.900	$ 1.269.000	CCFD62099	$ 5	$ 126.900	$ 634.500				
Fitros vapores orgánicos (pintura)	Un	10	$ 60.000	$ 600.000					CCFD63470	10	33971,525	
Filtros humos metálicos	Un	10	$ 45.000	$ 450.000	CCFD62099	2	26340,65	$ 52.681				
Delantal lavador	Un	10	$ 15.000	$ 150.000	CCFD62099	10	$ 15.000	$ 150.000	CCFD63719	4	$ 15.000	60000
									CCFD63719	3	$ 15.000	$ 45.000
Botas con puntera dieléctrica	Un	20	$ 90.000	$ 1.800.000	FE 12618	15	86275	$ 1.294.125	CCFD63719	$ 2	90000	$ 180.000
Escalera en fibra de vidrio	Un	2	$ 800.000	$ 1.600.000					CCFD63719	2	$ 800.000	$ 1.600.000
										1	796351,57	$ 796.352
Bloqueador Solar	Un	45	$ 15.000	$ 675.000						11	$ 15.000	165000
Guantes largos para lavado	Un	20	$ 35.000	$ 700.000	CCFD59776	10	24757,95	$ 247.580				
					CCFD62099	12	23627,45	$ 283.529				
TOTAL APLICACIÓN GUÍA SOCIO AMBIENTAL								**$ 7.502.096**				**$ 3.033.352**
TOTAL					**$**							**10.535.447**
