ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

BOGOTÁ

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. ZONA SUR ORIENTE

CTO SDM 2024-3653

INFORME MENSUAL No. 15

24 DE MARZO A 23 DE ABRIL DE 2026


UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACIÓN 2024

ABRIL 2026

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACIÓN 2024

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
DISEÑÓ Y APROBÓ	Luis Fernando Rubiano Barrero	Director De Proyecto MSc. Planeación de Transporte e Ingeniería	
REALIZÓ	Alba Avendaño Cipagauta	Coordinadora	

INTERVENTORÍA JOYCO S.A.S

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ	Ing. Sergio Valderrama Camargo	Director de interventoría	
APROBÓ	Ing. Julián Álvarez	Residente de interventoría	

MODIFICACIONES		

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 6
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7
2.1 LOCALIZACIÓN 7
3. PERIODO DE REPORTE 9
4. ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO (VIGENTE/EN ACTUALIZACIÓN) 10
5. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO 11
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 18
6.1 HORIZONTAL 18
6.2 VERTICAL 32
7. PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO 38
8. ASPECTOS TÉCNICOS 41
8.1 MODIFICACIONES REALIZADAS 41
8.2 ACTIVIDADES REALIZADAS 41
8.3 INSPECCIONES 41
8.4 ESTADO DEL TIEMPO 41
9. ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A CRUCE DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES 44
10. PLAN DE CALIDAD 45
11. PROTOCOLO DE MANEJOS DE RESIDUOS 46
12. ACTIVIDADES REALIZADAS EN CORREDORES 47
13. REPORTE ESTADISTICO 48
13.1 EJECUCIÓN POR COMPONENTE 48
13.2 ZONAS ESCOLARES 49
14. CERTFICADOS DE CALIBRACIÓN, FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ESTADO DE LOS EQUIPOS 59

15. SEÑALIZACIÓN ENTREGADA A ALMACÉN 60
16. REPORTE DE SEÑALIZACIÓN RETIRADA EN VÍA Y ENTREGADA A ALMACÉN 68
17. ASPECTOS VARIOS 69
17.1 GEOREFERENCIACIÓN 69
18. RECURSOS UTILIZADOS PARA EL CONTRATO DE OBRA 74
18.1 PERSONAL 74
18.2 EQUIPO 74
18.3 INSTRUMENTOS USADOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD 74
19. VINCULACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE. 76
20. VINCULACIÓN DE PORCENTAJE DE MUJERES. 77
21. FACTOR SOCIAL 78
22. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 79
23. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS 80
23.1 ASPECTO ADMINISTRATIVO 80
23.2 ASPECTO JURIDICO 80
24. PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO 81
25. CERTIFICACIÓN SALARIOS Y HONORARIOS 82
26. LISTADO DE PROVEEDORES 83
27. CERTIFICACIÓN PAGOS PROVEEDORES 84
28. ESTADO PRESUPUESTAL 85
28.1 RESUMEN CUENTA 15 85
28.2 AVANCE PARCIAL CTO INICIAL 85
28.3 AVANCE ADICIÓN 1 87
28.4 BALANCE PRESUPUESTAL 88
29. PUNTAJE 91

30. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 92

31. ANEXOS 93

Gráfica 1 Gráfica Curva S Vigencia 2026 86
Gráfica 2 Curva S Adición 1 87

Ilustración 1 Localización Zona 7 8
Ilustración 2 Precipitación mes de febrero 42

Tabla de contenido (Tablas)

Tabla 1 Datos generales del Contrato 7
Tabla 2 UPZ localidades asignadas 8
Tabla 3 Vigencia Pólizas CTO 2024-3563 10
Tabla 4 Diseños Asignados para Implementación 11
Tabla 5 PMTs solicitados cuenta 10 38
Tabla 6 Inspecciones realizadas 41
Tabla 7 Actividades por componente 48
Tabla 8 Zonas Escolares Intervenidas 49
Tabla 9 Elementos de Señalización Vertical y Dispositivos de Control Implementados 60
Tabla 10 Estado Georeferenciación 69
Tabla 11 Personal mínimo 74
Tabla 12 Equipos empleados para la ejecución de las actividades 74
Tabla 13 Cantidades ejecutadas por ID 85
Tabla 14 Balance presupuestal 88

1. INTRODUCCIÓN

Con el propósito de atender las necesidades de señalización de la ciudad de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM, como autoridad de tránsito y en cumplimiento de sus funciones establecidas por el Decreto 672 del 22 de ENERO de 2018[1], se encarga de ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la señalización vertical y horizontal de la ciudad, así como los demás elementos y dispositivos que propendan por garantizar la seguridad vial, el buen uso del espacio público y la gestión del tránsito en la ciudad.

Es así que la SDM generó un programa para implementar las medidas necesarias y realizar el mantenimiento rutinario y correctivo de la señalización de la ciudad, que incluye la señalización de ciclorrutas, medidas de gestión, carriles preferenciales, carriles de alta ocupación vehicular, proyectos de urbanismo táctico, plazas, corredores verdes, distritos verdes, barrios vitales y mantener en condiciones óptimas de señalización para todos los usuarios de la vía; integrando por grupos las veinte (20) localidades y dividiendo el perímetro urbano y rural en siete (7) zonas y en catorce (14) corredores principales.

En marco de este programa la SDM celebro el contrato SDM-2024-3653 con la firma Unión Temporal Ecoseñalizacion 2024, el cual tiene por objeto "*Realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C. Zona Sur Oriente*", para la atención integral de las actividades de implementación de señalización, donde se incluye el suministro e instalación de la señalización vertical de pedestal, la aplicación de señalización horizontal y la implementación de otros dispositivos de señalización horizontal en la malla vial de las localidad de Usme, San Cristóbal y Ciudad Bolívar y y en los corredores de la Av Boyacá (entre Rio Tunjuelito y KR 9 Bis) y La Via al Llano (CL 86 SUR CON KR 11 hasta Concesión Autopista al Llano), o en las zonas diferentes a la asignada en la ciudad, de acuerdo a la definición de puntos o actividades a desarrollarse que establezca el comité técnico.

En el siguiente informe mensual No 15, se presenta un resumen sobre las principales actividades de señalización vertical, horizontal e implementación y/o suministro de dispositivos viales, realizadas por la Unión Temporal Ecoseñalizacion 2024, durante el periodo 24 de marzo al 23 de abril de 2026, en cumplimiento de los compromisos contractuales del contrato de obra SDM-2024-3653.

[1] "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital, de Movilidad y se dictan otras disposiciones"

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 Datos generales del Contrato

Número de Contrato de Obra	SDM 2024-3653
Objeto del Contrato	REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. – ZONA SUR ORIENTE"
Contratante:	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Contratista	UT ECOSEÑALIZACION 2024
Plazo de ejecución:	34 meses
Fecha de acta de Inicio:	24 de enero 2025
Fecha de Terminación:	23 de noviembre del 2027
Valor Inicial:	$18.771.473.428
Adición 1	$ 1.482.594.137
Valor Total	$ 20.254.067.385
Lugar de Ejecución	Bogotá D.C., Localidades: San Cristobal, Usme y Sumapaz, Corredores de Av Boyacá (entre Rio Tunjuelito y KR 9 Bis) y La Via al Llano (CL 86 SUR CON KR 11 hasta Concesión Autopista al Llano)
Interventoría:	JOYCO S.A.S BIC
Número de Contrato de Interventoría	SDM 2024-3668

Fuente: Elaboración propia

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se desarrollará en la ciudad de Bogotá D.C., y se concentra en la Zona 7 Sur Oriente , conformada por las localidades : San Cristobal, Usme y Sumapaz , también se ejecutarán actividades en los corredores asignados Av Boyacá (entre Rio Tunjuelito y KR 9 Bis) y La Vía al Llano (CL 86 SUR CON KR 11 hasta Concesión Autopista al Llano) como se muestra en la siguiente figura:

Ilustración 1 Localización Zona 7



Fuente: Elaboración propia a partir de imagen en internet

Estas localidades se encuentran conformadas por las siguientes Unidades de Planificación Zonal UPZ:

Tabla 2 UPZ localidades asignadas

4. San Cristóbal	5. Usme	20. Sumapaz
32 San Blas 33 Sosiego 34. 20 de Julio 50. La Gloria 51 Los Libertadores	52 La Flora 56 Danubio 57 Gran Yomasa 58 Comuneros 59 Alfonso Lopez 60 Parque Entre Nubes	Rio Blanco Río Sumapaz

Fuente: Elaboración propia

3. PERIODO DE REPORTE

Este informe presenta el detalle de las actividades de señalización horizontal, señalización vertical e Instalación de dispositivos de tránsito y/o elementos canalizadores del tráfico, realizadas por la Unión Temporal Ecoseñalizacion 2024 en cumplimiento del Contrato SDM-2024-3653, para el periodo del 24 de marzo al 23 de abril de 2026.

4. ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO (VIGENTE/EN ACTUALIZACIÓN)

Una vez firmada el Acta de Inicio No. SDM 2024-3653 (del 24 de enero de 2025), entre la Unión Temporal Ecoseñalización 2024 y la SDM, se remitieron las pólizas emitidas por parte de la compañía de seguros Mundial de Seguros a la Entidad, conforme las exigencias establecidas en el contrato, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la SDM.

En el mes de mayo se presentaron observaciones a algunos amparos que cubren estas pólizas, las mismas fueron atendidas y ya cuentan con aprobación por parte de la SDM.

El 26 de diciembre de 2025 se aprueba la adición 1 y se entregan las pólizas actualizadas con esta Adición)

La ejecución de este contrato está amparada por las siguientes pólizas (las cuales se presentan en el Anexo 1. Pólizas) que cubren los respectivos riesgos.:

Tabla 3 Vigencia Pólizas CTO 2024-3563

Amparos Firma del Contrato	Porcentaje	Valor	Vigencia	
			Inicio	Vencimiento
Cumplimiento	(30% sobre el valor del contrato)	$6.076.220.269.5	27-12-2024	27-05-2030
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	(__% sobre el valor del anticipo)			
Calidad del Servicio Ofrecido	(30% sobre el valor del contrato)	$6.076.220.269.5	27-12-2024	27-05-2030
Estabilidad y Calidad de la Obra	(30% sobre el valor del contrato)	$6.076.220.269.5	27-12-2024	27-05-2030
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	(20% sobre el valor del contrato)	$4.050.813.513	27-12-2024	27-11-2030
Responsabilidad Civil Extracontractual	(30% sobre el valor del contrato)	$6.076.220.269.5	27-12-2024	24-11-2030

Fuente: Elaboración propia

5. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta los Identificadores de Diseño (ID) asignados, en la siguiente tabla se expone el estado de los diseños entregados para implementación:

Tabla 4 Diseños Asignados para Implementación

No	ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
1	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3	29/01/2025	USME	EJECUTADO
2	MV_05_122_1867_12	29/01/2025	USME	EJECUTADO
3	EX_05_119_1867_12	29/01/2025	USME	EJECUTADO
4	EX_05_93_1244_11	29/01/2025	USME	EJECUTADO
5	EX_05_110_1867_12	29/01/2025	USME	EJECUTADO
6	EX_05_053_1744_10	29/01/2025	USME	EJECUTADO
7	EX_05_108_1867_12	29/01/2025	USME	EJECUTADO
8	EX_05_003_1073_24	29/01/2025	USME	EJECUTADO
9	EX_05_113_1867_12	29/01/2025	USME	EJECUTADO
10	EX_05_005_1073_24	29/01/2025	USME	EJECUTADO
11	EX_05_004_1073_24	29/01/2025	USME	NO SE EJECUTA
12	EX_04_261_1561_10	29/01/2025	SAN CRISTOBAL	NO SE EJECUTA
13	EX_05_352_1561_10	29/01/2025	USME	EJECUTADO
14	EX_05_101_1244_11	29/01/2025	USME	EJECUTADO
15	EX_05_002_1073_24	29/01/2025	USME	NO SE EJECUTA
16	EX_05_006_1744_10	29/01/2025	USME	EJECUTADO
17	EX_05_001_1073_24	29/01/2025	USME	EJECUTADO
18	EX_05_280_1561_10	29/01/2025	USME	EJECUTADO
19	EX_05_007_1073_24	29/01/2025	USME	NO SE EJECUTA
20	EX_05_007_1445_14	29/01/2025	USME	NO SE EJECUTA
21	EX_05_310_1561_10	29/01/2025	USME	EJECUTADO
22	EX_05_307_1561_10	29/01/2025	USME	EJECUTADO
23	EX_05_008_1073_24	29/01/2025	USME	EJECUTADO
24	MV_20_526_943_10	29/01/2025	SUMAPAZ	NO SE EJECUTA

No	ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
25	MV_20_025_670_11	29/01/2025	SUMAPAZ	NO SE EJECUTA
26	MV_20_021_670_11	29/01/2025	SUMAPAZ	NO SE EJECUTA
27	SH_SV_PUNTO4_TMSA_V1	10/02/2025	USME	EJECUTADO
28	SDM-202461204315912 Y SDM-202461204636702	14/02/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
29	SDM-202461204158462	14/02/2025	USME	EJECUTADO
30	SDM- 202461203879272	14/02/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
31	SDM- 202461204426482	14/02/2025	SUMAPAZ	EJECUTADO
32	SDM-202561200270682	14/02/2025	USME	EJECUTADO
33	SUMINISTRO 1	18/02/2025	NA	EJECUTADO
34	SDM-202461204137592	20/02/2025	USME	EJECUTADO
35	ASIGNACIÓN CP Reposición de Hitos Ciclorrutas	21/03/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
37	CP 202561200744162 RETIRO DE SEÑAL	8/04/2025	USME	EJECUTADO
38	CP-202561200703942	8/04/2025	USME	EJECUTADO
39	CP COLEGIO FLORENTINO Y FRANCISCO JOSE	14/04/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
40	IMPLEMENTACION PMT de EMERGENCIA AV LOS CERROS	14/04/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
41	CP Carrera 6 entre Calle 24 Sur y Av. Primero de Mayo.	15/04/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
42	CP Carrera 4 entre Av. Primero de Mayo y Calle 19A Sur Calle 19A Sur entre Carrera 6 y Carrera 5A.	15/04/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
43	CP Av. Primero de Mayo entre Carrera 9A y Carrera 1B	15/04/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
44	SIRE 5453567	6/05/2025	USME	EJECUTADO
45	CP AV BOYACA - TV 3 F (TRAMO SUR-NORTE; NORTE-SUR)	8/05/2025	USME	EJECUTADO
46	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561201777022	6/06/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO

No	ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
47	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561201795562	13/06/2025	USME	EJECUTADO
48	CP BIKE BOX CARACAS	14/06/2025	USME	EJECUTADO
49	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202098412	3/07/2025	USME	EJECUTADO
50	SUMINISTRO IDIPRON SI-35	7/07/2025	N/A	EJECUTADO
51	SDM-202561202230222	15/07/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
52	SUMINISTRO IDIPRON SI-35 Y DUPLEX	17/07/2025	N/A	EJECUTADO
53	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202378942	24/07/2025	USME	EJECUTADO
54	PMT DE EMERGENCIA Evento SIRE-5456812	24/07/2025	USME	EJECUTADO
55	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202286462	24/07/2025	USME	EJECUTADO
56	SUMINISTRO IDIPRON SR-28/ PLAQUETA	29/07/2025	N/A	EJECUTADO
57	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202284382	4/08/2025	USME	EJECUTADO
58	CP PASACALLES AV BOYACÁ	5/08/2025	FONTIBON	EJECUTADO
59	SUMINISTRO IDIPRON SR-17	13/08/2025	N/A	EJECUTADO
61	CP COLEGIO NUEVA ROMA	15/08/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
61	SUMINISTRO IDIPRON SI-35, SR-30	20/08/2025	N/A	EJECUTADO
62	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202379632	20/08/2025	USME	EJECUTADO
63	CP BARRIO LA MARIA	20/08/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
64	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202439322	29/08/2025	USME	EJECUTADO
65	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202657962	29/08/2025	USME	EJECUTADO
66	EX_04_030_1561_10	2/09/2025	SAN CRISTOBAL	EN EJECUCIÓN
67	EX_04_051_414_11_V2	2/09/2025	SAN CRISTOBAL	EN EJECUCIÓN

No	ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
68	EX_04_241_1561_10_V9	2/09/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
69	EX_04_488_826_10_V7	2/09/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
70	MV_05_99_1244_11_V3	2/09/2025	USME	NO SE EJECUTA
71	EX_05_213_1561_10_V5	2/09/2025	USME	EJECUTADO
72	EX_05_286_1561_10_V3	2/09/2025	USME	EJECUTADO
73	SUMINISTRO MALETINES	3/09/2025	N/A	EJECUTADO
74	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202584052 y SDM-202561202664192	4/09/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
75	CP_05_1524	9/09/2025	USME	EJECUTADO
76	SUMINISTRO IDIPRON SI-35, SR-30	9/09/2025	N/A	EJECUTADO
77	CP-05-1631	15/09/2025	USME	EJECUTADO
78	CP_04_1627	22/09/2025	USME	EJECUTADO
79	CP_04_1625	22/09/2025	USME	EJECUTADO
80	SUMINISTRO IDIPRON SR-06	25/09/2025	N/A	EJECUTADO
81	SUMINISTRO IDIPRON SI-35, SR-30	25/09/2025	N/A	EJECUTADO
82	PÉNDONES AK 7	25/09/2025	VARIAS	EJECUTADO
83	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561203372182	29/09/2025	USME	EJECUTADO
84	CP_04_1630	30/09/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
85	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561203329962 –DI -22669 - CL 111 Sur Quebrada Mediania (VIA AL LLANO)	1/10/2025	USME	EJECUTADO
86	CP_05_1669	7/10/2025	USME	EJECUTADO
87	CP_05_1670	7/10/2025	USME	EJECUTADO
88	CP_05_1671	7/10/2025	USME	EJECUTADO
89	CP_05_1672	7/10/2025	USME	EJECUTADO
90	CP_05_1673	7/10/2025	USME	EJECUTADO
91	CP_05_1674	7/10/2025	USME	EJECUTADO

No	ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
92	CP_05_1646	7/10/2025	USME	EJECUTADO
93	CP_05_1647	7/10/2025	USME	EJECUTADO
94	CP_05_1648	7/10/2025	USME	EJECUTADO
95	CP_04_1594	9/10/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
96	CP_05_1690	9/10/2025	USME	EJECUTADO
97	CP_ AK 10X CL 13 SUR	9/10/2025	USME	NO SE EJECUTA
98	CP_ AUTOPISTA AL LLANO X 91 SUR	9/10/2025	USME	EJECUTADO
99	Suministro Idipron Sp-48, Sr-plaqueta (9)	9/10/2025	NA	EJECUTADO
100	CP_05_1693	16/10/2025	USME	EJECUTADO
101	Suministro Idipron (10). SI-35	17/10/2025	NA	EJECUTADO
102	Ciclorruta AC75 entre AV boyacá y Kr 76	22/10/2025	ENGATIVÁ	NO SE EJECUTA
103	Suministro SDM (3), EJE AMBIENTAL	27/10/2025	NA	EJECUTADO
104	Suministro Idipron Coltanques (11)	30/10/2025	NA	EJECUTADO
105	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561203642132	30/10/2025	USME	EJECUTADO
106	Diseño Proyecto Zona Rosa	5/11/2025	CHAPINERO	EJECUTADO
107	CP Av Boyacá con KR 14I	11/11/2025	USME	EJECUTADO
108	Diseño Proyecto Zona Rosa Fase II	12/11/2025	CHAPINERO	EN EJECUCIÓN
109	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561203802572	19/11/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
110	Suministro SDM tableros (4)	19/11/2025	NA	EJECUTADO
111	CP_05_1678	25/11/2025	USME	SUSPENDIDO
112	Suminitros Idipron SITP Vereda el Hato - PERSONERIA (Memorando STP-202522100235523) (12)	1/12/2025	NA	EJECUTADO
113	CP_04_1771	17/12/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
114	CP - SDQS 6495012025 CP-05-1835	2/01/2026	USME	EJECUTADO

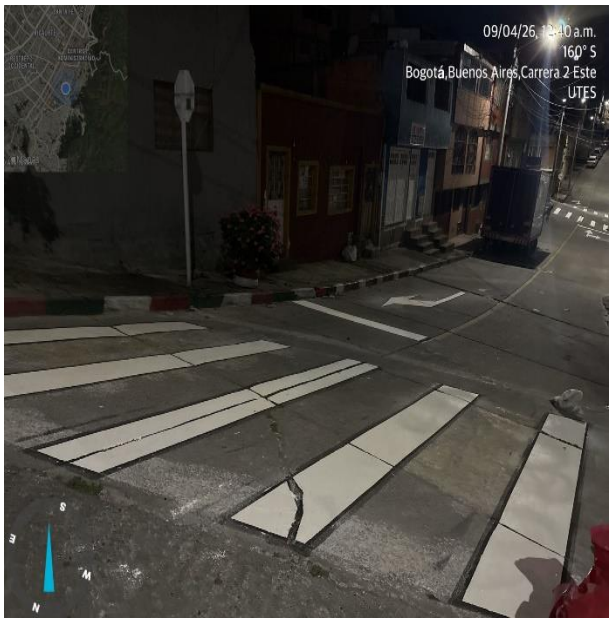
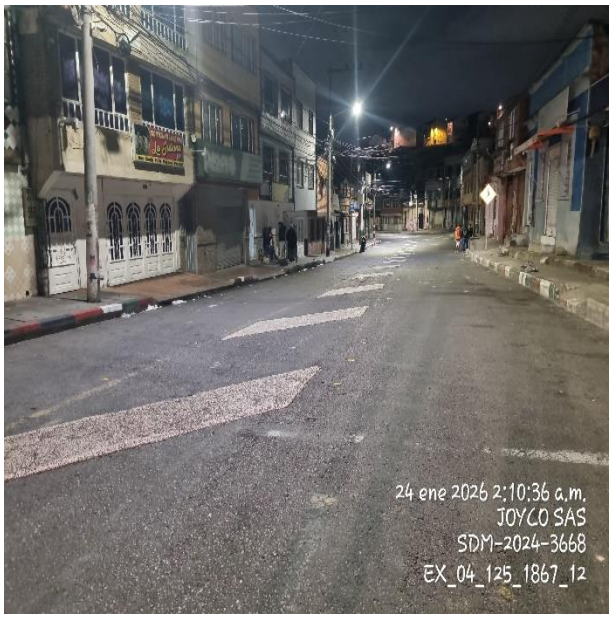
No	ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
115	EX_04_044_1561_10	7/01/2026	SAN CRISTOBAL	EN EJECUCIÓN
116	EX_04_263_1561_10	7/01/2026	SAN CRISTOBAL	EN EJECUCIÓN
117	EX_04_125_1867_12	7/01/2026	SAN CRISTOBAL	EN EJECUCIÓN
118	EX_05_004_1073_24	7/01/2026	USME	EJECUTADO
119	CP- Rad. 202561204421652 CP_05_1837	19/01/2026	USME	EJECUTADO
120	CP-04-1703 SDQS-5109132025	19/01/2026	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
121	CP_04_1868-SDQS-6847412025	19/01/2026	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
122	SDM-202561204690292	20/01/2026	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
123	EX_04_001_1073_24	26/01/2026	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
124	EX_04_003_1073_24	26/01/2026	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
125	EX_04_516_676_09	26/01/2026	SAN CRISTOBAL	ASIGNADO
126	EX_04_400_1561_10	26/01/2026	SAN CRISTOBAL	EN EJECUCIÓN
127	EX_04_127_1867_12	26/01/2026	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
128	CP_05_1768	29/01/2026	USME	ASIGNADO
129	CP_04_1742	6/02/2026	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
130	CP_05_1732	6/02/2026	USME	INSPECCIONADO
131	CP_04_1715	6/02/2026	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
132	CP_04_1621	6/02/2026	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
133	CP-05-1928	6/02/2026	USME	INSPECCIONADO
134	CP - SDQS 4960562025 CP-05-1790	26/02/2026	USME	INSPECCIONADO
135	CP-04_1971	26/02/2026	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
136	Solicitud suministro señal SP-59 - Convenio IDIPRON-SDM	6/03/2026	N/A	EJECUTADO
137	ASIGNACIÓN CP mantenimiento señalización cámaras (URG) DEI042CAM1-CAM 2	2/03/2026	USME	EJECUTADO
138	CP-04_1937-202661200207772	5/03/2026	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
139	CP-04_1937-SDQS-609792026	5/03/2026	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO

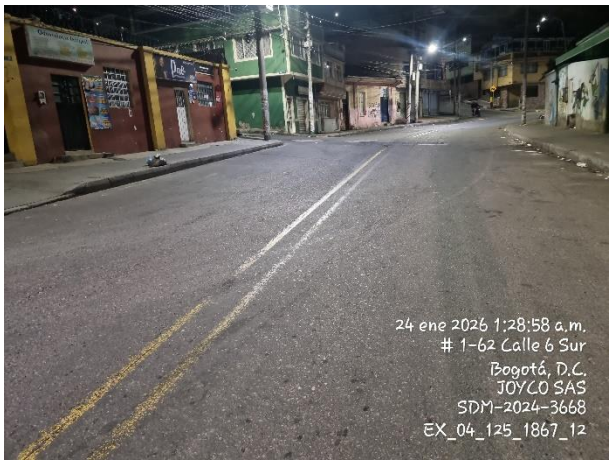
No	ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
140	CP-04_1651-202561203350212	5/03/2026	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
141	CP_05_1023	10/03/2026	USME	INSPECCIONADO
142	CP_05_1210	10/03/2026	USME	INSPECCIONADO
143	CP_05_1236	10/03/2026	USME	INSPECCIONADO
144	CP_04_1056	10/03/2026	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
145	CP_04_988	10/03/2026	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
146	CP_04_389	10/03/2026	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
147	CP_05_955	10/03/2026	USME	INSPECCIONADO
148	CP_05_1063	10/03/2026	USME	INSPECCIONADO
149	Zona amarilla - Zona T	17/03/2026	CHAPINERO	EN EJECUCIÓN
150	SIRE-5466644	26/03/2026	SAN CRISTOBAL	EN EJECUCIÓN
151	CP Señalización Intersección semaforizada Av. Boyacá con KR 14i	6/04/2026	USME	EJECUTADO

Fuente: Elaboración propia

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

6.1 HORIZONTAL

<table>
<tr><th colspan="2">EX_04_125_1867_12</th></tr>
<tr><th>ANTES</th><th>DESPUÉS</th></tr>
<tr><td colspan="2">KR 8 ESTE CL 9B</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">KR 2 ESTE CL 6</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
</table>

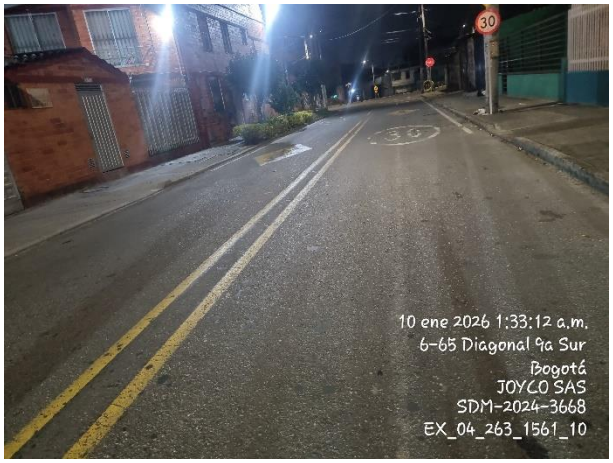
EX_04_125_1867_12	
ANTES	**DESPUÉS**
KR 3 CL 58	
	
KR 2A CL 6 SUR	
	

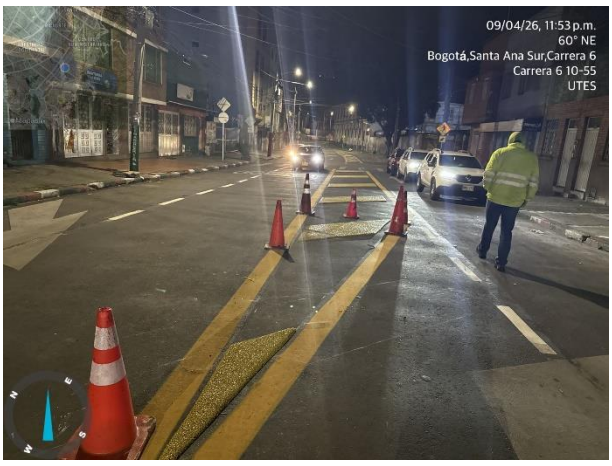
EX_05_004_1073_24	
ANTES	**DESPUÉS**
CL 89 SUR KR 5B	
	
KR 6A CL 88	
	

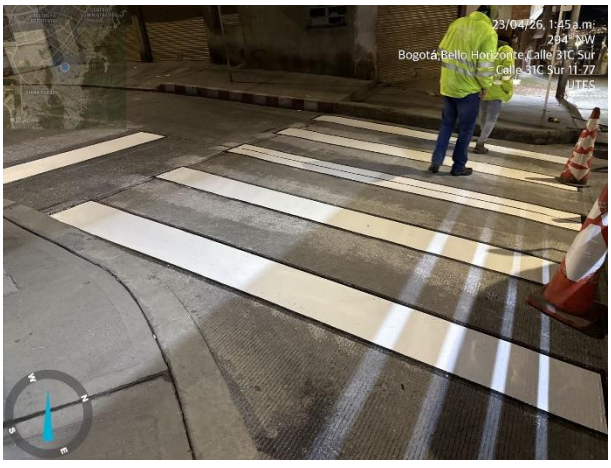
EX_05_004_1073_24	
ANTES	**DESPUÉS**
CL 91 SUR KR 5A	
	
DG 88 SUR KR 4B	
	

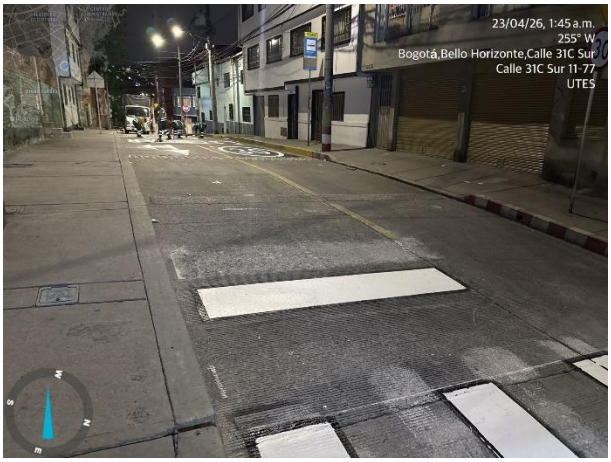
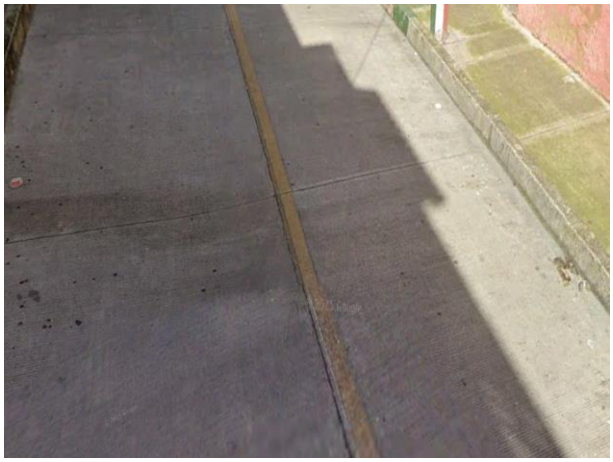
EX_04_001_1073_24	
ANTES	**DESPUÉS**
CL 11A SUR KR 3A	
	
KR 5 CL 12	
	

EX_04_001_1073_24	
ANTES	**DESPUÉS**
CL 12 SUR KR 5	
	
CL 11 A SUR KR 3A	
	

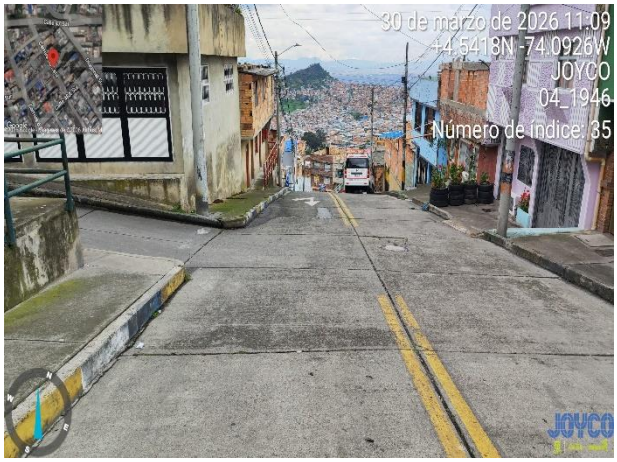
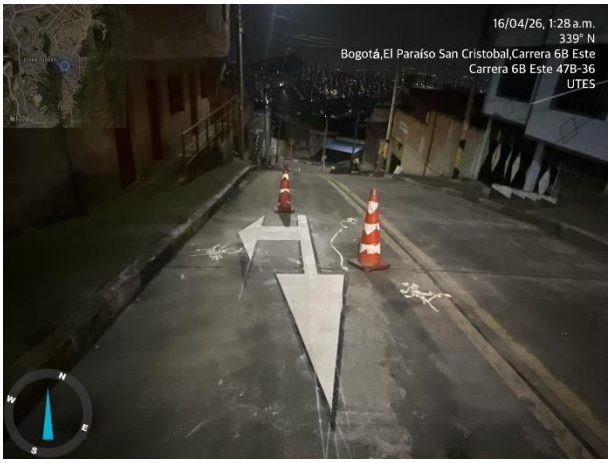
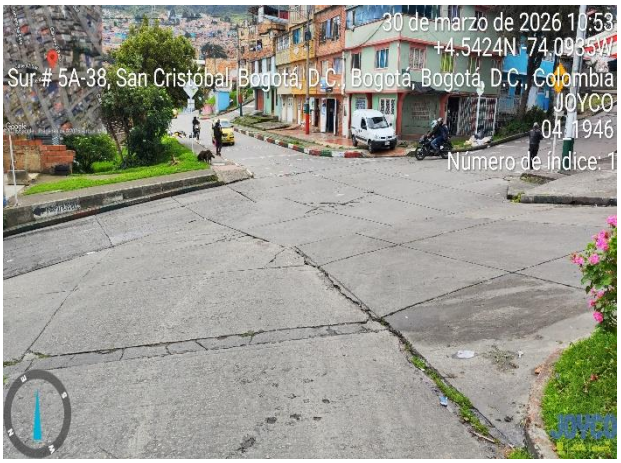
EX_04_263_1561_10	
ANTES	**DESPUÉS**
KR 6 CL 103	
	
CL 8A KR 5A	
	

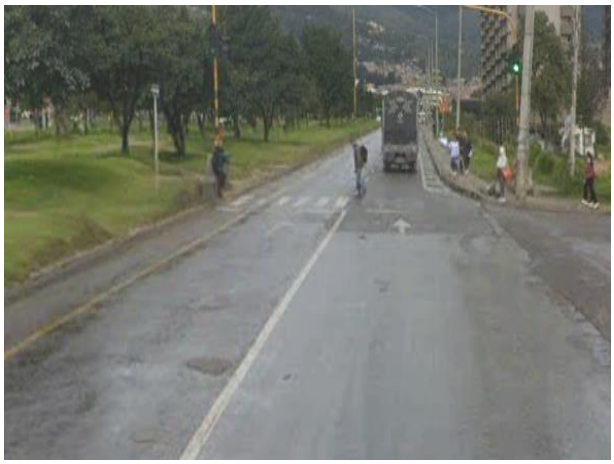
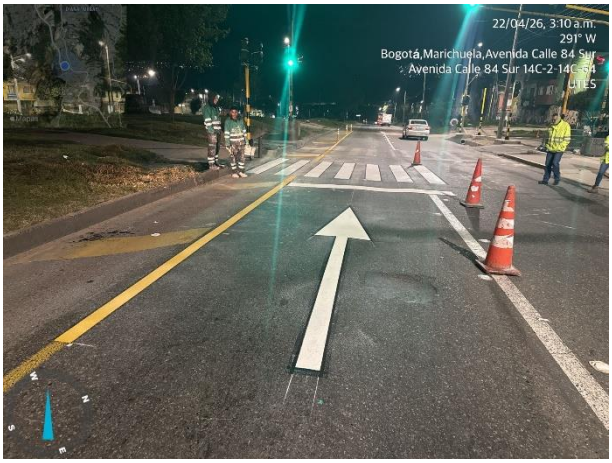
EX_04_263_1561_10	
ANTES	**DESPUÉS**
KR 6 CL 10	
	
KR 6 CL 10	
	

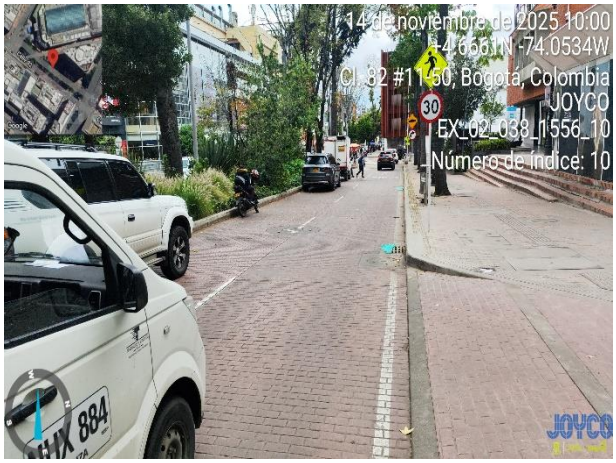
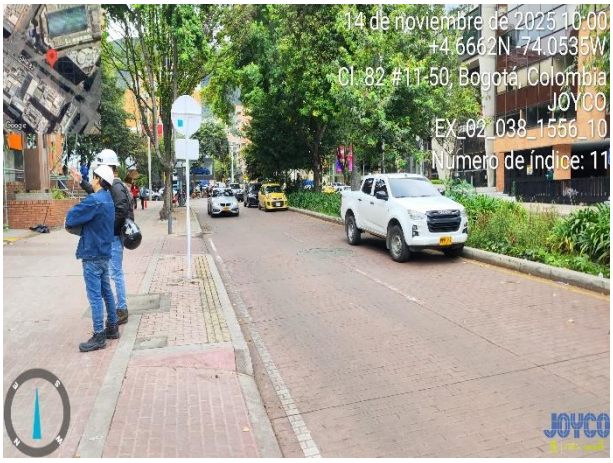
EX_04_400_1561_10	
ANTES	**DESPUÉS**
KR 1 CL 31C SUR	
	
CL 31C SUR KR 11	
	

EX_04_400_1561_10	
ANTES	**DESPUÉS**
CL 31C SUR KR 11	
	
CL 31C SUR KR 11	
	

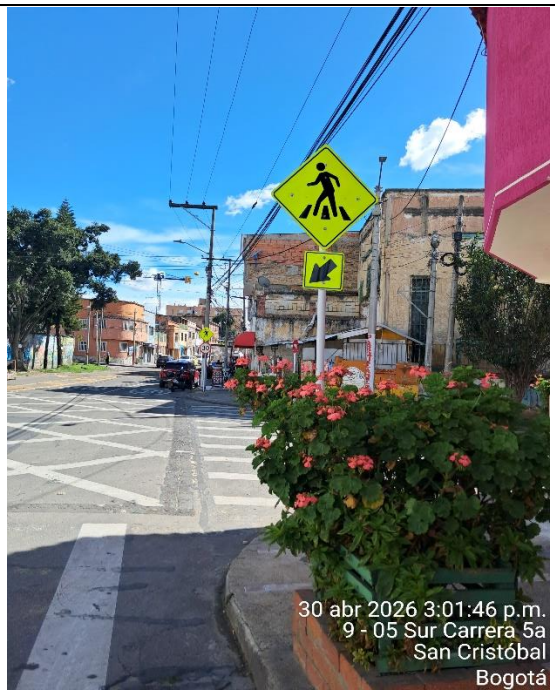
CP 04 1946 LA SIERRA	
ANTES	**DESPUÉS**
KR 6 ESTE CL 48	
	
KR 6B ESTE CL 48	
	

CP 04 1946 LA SIERRA	
ANTES	**DESPUÉS**
KR 6B ESTE CL 47B	
	
KR 6 CL 47	
	

CP AV BOYACÁ KR 14 I	
ANTES	**DESPUÉS**
AV BOYACÁ KR 14 I	
	
AV BOYACÁ KR 14 I	
	

CP_ZONA ROSA	
ANTES	**DESPUÉS**
CL 82 KR 11	
	
CL 82 KR 11	
	

6.2 VERTICAL

EX_04_263_1561_10	
USME	
	
	


PARE
30 abr 2026 2:53:32 p.m.
5A-1 Calle 9 Sur
San Cristóbal
Bogotá, D.C.


PARE
30 abr 2026 2:49:09 p.m.
561 Calle 9a Sur
San Cristóbal
Bogotá


30 abr 2026 2:47:07 p.m.
5-30 Calle 9 Sur
San Cristóbal
Bogotá, D.C.


30
30 abr 2026 2:46:20 p.m.
5-51 Calle 9 Sur
San Cristóbal
Bogotá


PARE
30 abr 2026 2:45:23 p.m.
5-30 Calle 9 Sur
San Cristóbal
Bogotá, D.C.

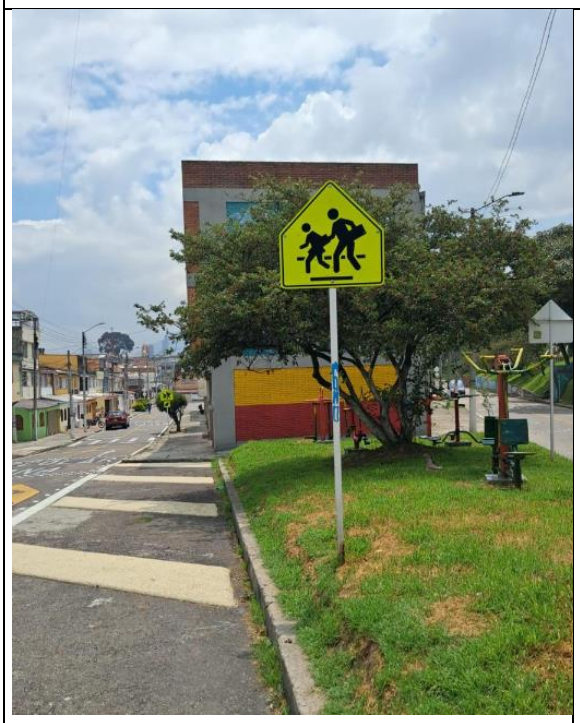

30 abr 2026 2:43:20 p.m.
8A-6 Carrera 5a
San Cristóbal
Bogotá


PARE
30 abr 2026 11:54:21 a.m.

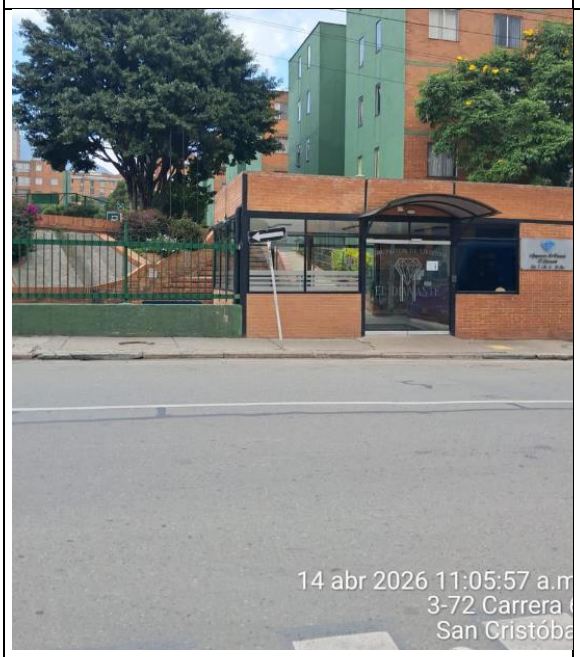

29 abr 2026 1:27:10 p. m.
4.58131575N 74.0844971W
252° W
7-17 Carrera 6
San Cristóbal
Bogotá, D.C.

EX_04_030_1561_10

USME










14 abr 2026 8:28:24 a.m
14 abr 2026 9:24:02 a
PARE
14 abr 2026 8:26:53 a.m.
9A-94 Carrera 7c
San Cristóbal
PARE
14 abr 2026 9:37:09 a.m.
77 Calle 10 Sur
San Cristóbal


13 abr 2026 11:04:58 a.m.
915 Carrera 7b
San Cristóbal
13 abr 2026 2:46:56 p.m
9-25 Carrera 7
San Cristóba
PARE
13 abr 2026 3:42:00 p.
77 Calle 10 S
San Cristób
PARE
13 abr 2026 4:25:01 p.
7B-30 Avenida Calle 11 S
San Cristó

7. PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

Respecto al Plan de Manejo (PMT) General, se radico en la interventoría el 17 de enero de 2025, a su vez la Interventoría remitió a la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito SPMT de la Secretaría Distrital de Movilidad con radicado SDM 202561200352442. Posteriormente la SPMT con oficio SPTM 202531200443941 del 04 de febrero de 2025, informo que "…una vez revisado el documento técnico y los esquemas típicos propuestos para el manejo de tráfico durante las actividades de demarcación e instalación de señalización vertical de la zona 7 localidades de Usme, San Cristóbal y Sumapaz,, mediante el contrato del asunto, se emite autorización a la propuesta…" e indica que la vigencia de la autorización es desde la fecha del comunicado hasta el 03 de febrero de 2026.

En el periodo de este informe del 24 de marzo al 23 de abril de 2026, se solicitaron y tramitaron los siguientes PMTs:

Tabla 5 PMTs solicitados cuenta 10

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
14	4/01/2026	10444	2000687	2000704	CL 84A KR 13	CL 84A KR 12	ANDÉNES Y CALZADA	CHAPINERO	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10723	4004613	4008068	CL 41B SUR KR 13B ESTE	CL 41B SUR KR 17A ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10724	4004676	4004967	KR 14 ESTE CL 41B SUR	KR 14 ESTE CL 43 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10725	4004615	4004531	KR 14A ESTE CL 41B SUR	KR 14A ESTE CL 41BIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10726	4004677	4004763	CL 42 SUR KR 13B ESTE	CL 42 SUR KR 17A ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10727	4004752	4004856	CL 42A SUR KR 13B ESTE	CL 42A SUR KR 17A ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10728	4004900	4004979	CL 42C SUR KR 13B ESTE	CL 42C SUR KR 17A ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10729	4004690	4004776	KR 15 ESTE CL 41B SUR	KR 15 ESTE CL 42A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10730	4004540	4004747	KR 17 ESTE CL 41BIS SUR	KR 17 ESTE CL 42 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10731	4004607	4004533	KR 16A ESTE CL 41B SUR	KR 16A ESTE CL 41BIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10732	4004705	4005010	KR 16A ESTE CL 41B SUR	KR 16A ESTE TV 15A ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
14	4/01/2026	10733	4005082	4005132	KR 16A ESTE TV 15A ESTE	KR 16A ESTE CL 43A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10734	4005145	N/A	CL 43A SUR KR 16A ESTE	CL 43A SUR KR 16 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10735	4004486	50005568	KR 17A ESTE CL 41 SUR	KR 17A ESTE TV 16C ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10736	30000491	N/A	KR 17A ESTE TV 16C ESTE	KR 17A ESTE CL 42CBISB SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10737	50005567	4005516	TV 16C ESTE KR 17A ESTE	TV 16C ESTE CL 46ABISA SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10738	4005091	N/A	TV 14BIS ESTE CL 43B SUR	TV 14BIS ESTE CL 43A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10739	50007952	N/A	CL 43A SUR TV 14BIS ESTE	CL 43A SUR KR 14 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10740	50007952	N/A	KR 14 ESTE CL 43A SUR	KR 14 ESTE CL 43 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10741	4004990	4005098	CL 43 SUR KR 14 ESTE	CL 43 SUR KR 16 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10742	4005146	4005498	KR 16 ESTE CL 43 SUR	KR 16 ESTE CL 46ABISA SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10743	4005517	N/A	CL 46ABISA SUR KR 16 ESTE	CL 46ABISA SUR TV 16C ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10744	4004958	4005157	KR 16B ESTE CL 42A SUR	KR 16B ESTE TV 16C ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10745	4005333	4005295	CL 45B SUR KR 13B ESTE	CL 45B SUR KR 16 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10746	4005225	4005245	CL 44A SUR KR 14 ESTE	CL 44A SUR KR 16 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10747	4005435	4005390	CL 46 SUR KR 13B ESTE	CL 46 SUR KR 16 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10748	4005316	4005550	KR 14 ESTECL 44A SUR	KR 14 ESTE CL 46ABISA SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10749	4005296	4005391	KR 15 ESTE CL 44A SUR	KR 15 ESTE CL 46 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
14	4/01/2026	10750	4005195	N/A	CL 47 SUR KR 5ABIS ESTE	CL 47 SUR KR 6 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10751	4005195	N/A	CL 47 SUR KR 5ABIS ESTE	CL 47 SUR KR 6 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10752	4005193	N/A	CL 47 SUR KR 6 ESTE	CL 47 SUR KR 6B ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10753	4005223	4005320	KR 6B ESTE CL 47 SUR	KR 6B ESTE CL 48A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
14	4/01/2026	10754	4005252	4005424	KR 6 ESTE CL 47 SUR	KR 6 ESTE CL 48B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	2/04/2026	2/07/2026
EMERGENCIAS	17/04/2026	639	5002753	5002775	AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 14G	AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 14DBIS	ANDÉNES Y CALZADA	CORREDOR	SI	17/04/2026	1/05/2026
EMERGENCIAS	17/04/2026	640	5002753	5002775	AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 14G	AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 14DBIS	ANDÉNES Y CALZADA	CORREDOR	SI	17/04/2026	1/05/2026
EMERGENCIAS	17/04/2026	834	5002752	N/A	KR 14F AUTO AL LLANO (CL 84 SUR)	KR 14F 30m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	17/04/2026	1/05/2026
EMERGENCIAS	17/04/2026	835	5002752	N/A	KR 14F AUTO AL LLANO (CL 84 SUR)	KR 14F 30m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	17/04/2026	1/05/2026
EMERGENCIAS	17/04/2026	836	5002819	N/A	KR 14I AUTO AL LLANO (CL 84 SUR)	KR 14I 30m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	17/04/2026	1/05/2026
EMERGENCIAS	17/04/2026	837	5002819	N/A	KR 14I AUTO AL LLANO (CL 84 SUR)	KR 14I 30m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	17/04/2026	1/05/2026

Fuente: elaboración propia

Igualmente, en el Anexo 2. se adjuntan los COI mencionados en la tabla anterior, donde se encuentra la información detallada de cada autorización.

8. ASPECTOS TÉCNICOS

8.1 MODIFICACIONES REALIZADAS

- En el periodo al que pertenece el presente informe se realizaron modificaciones al diseño EX_04_001_1073_24 por parte de la SDM debido a solicitudes realizadas por otras entidades..

8.2 ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se describen las actividades ejecutadas a la fecha:

- Revisión en plataforma SIGIDU
- Se realiza la solicitud de los planes de manejo de tránsito PMT para los puntos a intervenir.
- Socialización de actividades de implementación en colegios y zonas de alto flujo peatonal.
- Implementación de señalización horizontal y vertical de acuerdo a los planos inspeccionados e instalación de dispositivos según diseños.

8.3 INSPECCIONES

- A continuación, se relacionan los diseños inspeccionados en el periodo al que hace referencia este informe (24 de marzo al 23 de abril de 2026)

Tabla 6 Inspecciones realizadas

ID Diseño	Fecha de Asignación	ESTADO
CP Señalización Intersección semaforizada Av. Boyacá con KR 14I	06/04/2026	INSPECCIONADO

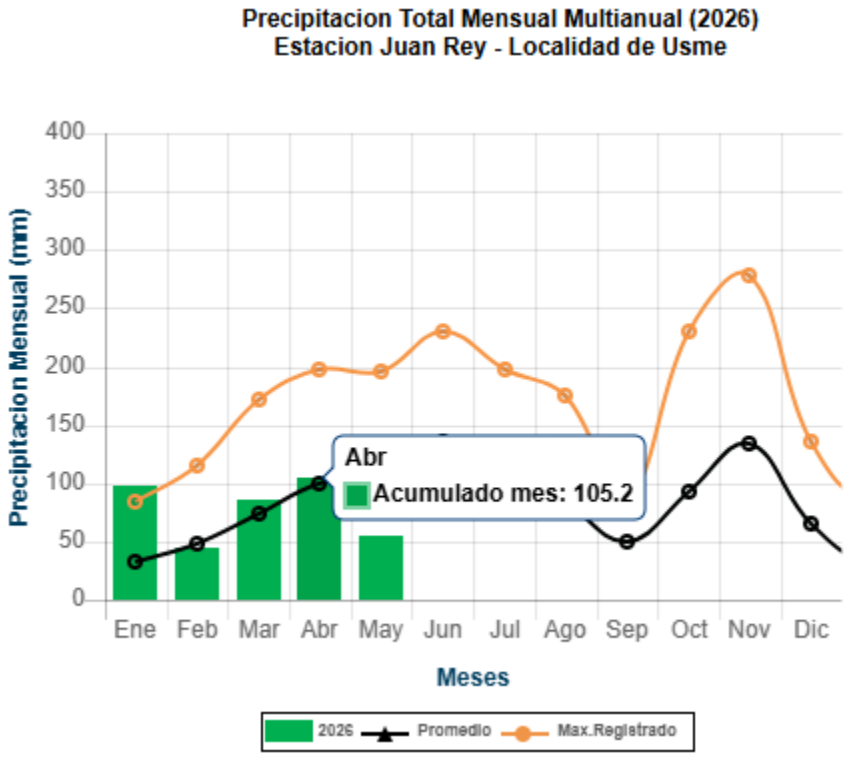
Fuente: Elaboración propia

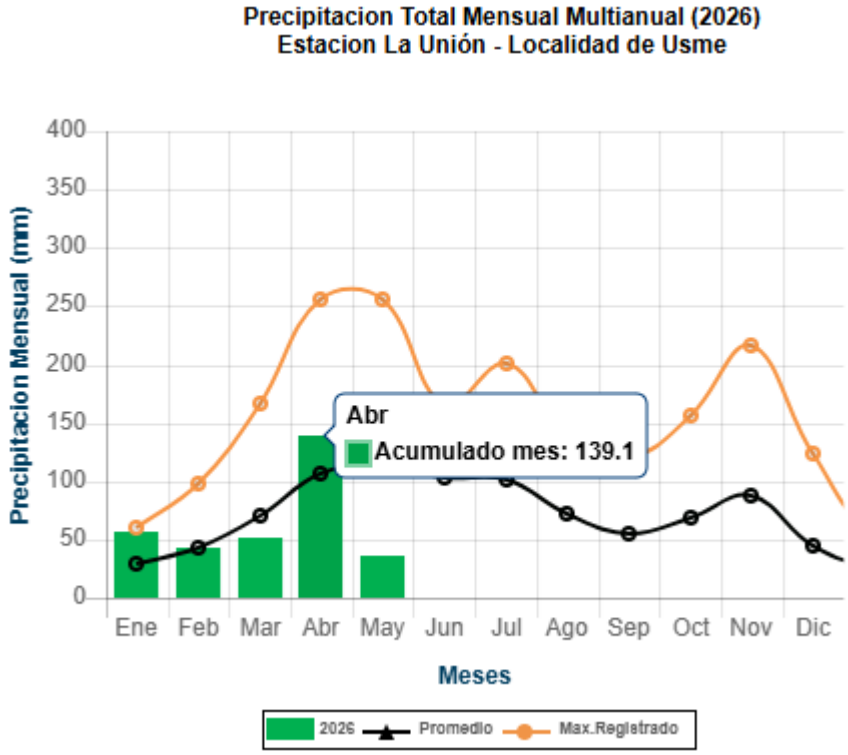
En el Anexo 3 (3.1 Inspecciones) se encuentran los formatos de inspecciones.

8.4 ESTADO DEL TIEMPO

En el periodo al que hace referencia este informe (24 de marzo a 23 de abril de 2026) se presentaron 22 días de lluvias.

Ilustración 2 Precipitación mes de febrero





9. ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A CRUCE DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

A continuación, se relacionas las actividades de consulta por diseño, en los visores y entidades correspondientes.

DISEÑO	Geoportales		ENTIDADES CONSULTADAS
	https://movilidadbogota.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=219e91e4397f4f8d99c4c1aaa66ba2c4	https://webidu.idu.gov.co/sigidu/	
EX_04_516_676_09	Validación de Reserva Sub dirección de planes de manejo de Tránsito	Validación de reserva SIGIDU	-Alcaldía local -UAERM (Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial) -EAB (Empresa de Acueducto de Bogotá) -ENEL-CODENSA -IDU
EX_04_400_1561_10	Validación de Reserva Sub dirección de planes de manejo de Tránsito	Validación de reserva SIGIDU	-Alcaldía local -UAERM (Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial) -EAB (Empresa de Acueducto de Bogotá) -ENEL-CODENSA -IDU

En el Anexo 4, se encuentran las cartas radicadas a las diferentes entidades..

10. PLAN DE CALIDAD

La información referente al Plan de Calidad se encuentra en el Anexo 5.

11. PROTOCOLO DE MANEJOS DE RESIDUOS

La información respecto al protocolo de manejos de residuos se encuentra en el Anexo 10.

12. ACTIVIDADES REALIZADAS EN CORREDORES

En el periodo al que se hace referencia en este se realizaron las siguientes actividades en el corredor de la Av Boyaca:

- Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen
- Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.
- Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.
- Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).
- Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.
- Borrado mecánico de marcas viales.

13. REPORTE ESTADISTICO

13.1 EJECUCIÓN POR COMPONENTE

De acuerdo con la ejecución de las obras durante el periodo se tienen subdividido por componente (señalización vertical y horizontal) de la siguiente forma:

Tabla 7 Actividades por componente

Corredor / Diseños	Localidad	Señalización Vertical	% Ejecutado en el ID en Señalización vertical del periodo	Señalización Horizontal	% Ejecutado en el ID en Señalización Horizontal del periodo	Total, ejecutado en el periodo de informe
EX_05_093_1244_11	USME	$ 1.985.130,00	100%		0%	$ 1.985.130,00
EX_05_004_1073_24	USME	$ 104.391.697,34	50%	$ 104.099.821,12	50%	$ 208.491.518,46
EX_04_125_1867_12	SAN CRISTOBAL		0%	$ 66.780.251,00	100%	$ 66.780.251,00
EX_04_263_1560_11	SAN CRISTOBAL	$ 40.096.463,00	29%	$ 96.393.746,15	71%	$ 136.490.209,15
EX_04_001_1073_24	SAN CRISTOBAL		0%	$ 67.440.819,23	100%	$ 67.440.819,23
CP_04_1496 LA SIERRA	SAN CRISTOBAL		0%	$ 46.430.070,29	100%	$ 46.430.070,29
EX_04_400_1561_10	SAN CRISTOBAL		0%	$ 58.685.280,68	100%	$ 58.685.280,68
DISEÑO ZONA ROSA	CHAPINERO		0%	$ 25.799.206,26	100%	$ 25.799.206,26
CP_SEMAFORIZACIÓN_AVBOY_KR 14I	USME		0%	$ 35.757.318,43	100%	$ 35.757.318,43
EX_04_030_1561_10	SAN CRISTOBAL		0%	$ 90.488.068,29	100%	$ 90.488.068,29
EX_04_044_1561_10	SAN CRISTOBAL		0%	$ 30.198.638,64	100%	$ 30.198.638,64
TOTAL		**$ 146.473.290,34**		**$ 622.073.220,09**		**$ 768.546.510**

Fuente: Elaboración propia

El valor total ejecutado en el periodo al que hace referencia este informe es de **$768.5146.510**, en la localidad de San Cristóbal se se ejecutó un valor de $496.513.337. lo que corresponde al 64.60% de la ejecución total, en Usme un valor de $246.233.967 lo que corresponde a un 32.40% de la ejecución en la localidad de Chapinero $25.799.206 lo que corresponde al 3.36% de la ejecución total.. La demarcación horizontal representa un 80.94 %, la vertical 19.06%.

13.2 ZONAS ESCOLARES

Tabla 8 Zonas Escolares Intervenidas

NÙMERO DE CUENTA	CIV	ID DISEÑO	INSTITUCION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
1	50005014	EX_05_119_1867_12	COLEGIO SAN GREGORIO HERNANDEZ	170
2	5002304			
1	50005014 5002168 5002154 5002131 5002117 5002087 5002065 5002064	EX_05_119_1867_12	IED COLEGIO SANTA LIBRADA	850
4	5002045			
2	5002174 5002169 5002324 5002132			
1	50005013 5002211 5002210 5002130 5002117	EX_05_119_1867_12	COLEGIO JUAN RULFO	175
1	5002162 5002094 5002084	EX_05_119_1867_12	JARDÍN SOCIAL CENTRO CRECER TEJAR	50
1	5008374	EX_05_119_1867_12	HOGAR INFANTIL BARQUITO DE PAPEL	150
1	5002574 5002492 5002403	EX_05_119_1867_12	COLEGIO ALMIRANTE PADILLA	320
2	5002660 5002566 5002565			
4	5002567			
1	5002171	EX_05_119_1867_12	JARDIN LOS PAYASITOS ICBF	125
2	5002391 5002349			
2	5002530 5002463 5002458 5002434 5002415	EX_05_119_1867_12	JARDIN INFANTIL BETANIA	120
2	5002502	EX_05_119_1867_12	JARDIN INFANTIL BALOO	45
	5002499			

NÙMERO DE CUENTA	CIV	ID DISEÑO	INSTITUCION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
2	5002502 5002499	EX_05_119_1867_12	COLEGIO SUMAPAZ	450
2	5002502 5002499	EX_05_119_1867_12	COLEGIO SAN JUAN DE LOS PASTOS	180
2	5002118	EX_05_119_1867_12	COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES	600
3	5007874 5001805 5001282	EX_05_93_1244_11		
2	5003204 5003333	EX_05_53_1744_11	JARDIN INFANTIL GRAN YOMASA	150
2	5003163	EX_05_53_1744_11	LICEO MAX	210
2	5003176	EX_05_53_1744_11	LICEO MARIA NELL	340
2	5003057	EX_05_53_1744_11	IED GRAN YOMASA	1630
3	5002420 5002726 5002709	EX_05_93_1244_11	COLEGIO MIRAVALLE	1500
3	5007842 5001893 5001856	EX_05_110_1867_12	COLEGIO DISTRITAL PAULO FREIRE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA ACTICULADO EDUCACIÓN SUPERIOR	3000
4	50009090 50009093			
3	5002441	EX_05_93_1244_11	COLEGIO CIUDAD BOLIVAR	210
3	5001360 5001353	EX_05_93_1244_11	JARDÍN INFANTIL ICBF	30
3	5001804 5001788	EX_05_93_1244_11	JARDIN INFANTIL MI TRIGAL	13
3	50009087	EX_04_262_1561_10	CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL FLORENTINO GONZALEZ	2000
5	4001107 4001166 4001254			
3	4001167 4001407 4001464 4001465	EX_04_262_1561_10	I.E.D FRANCISCO JAVIER MATIZ SEDE B	750
3	4001497 4001543 4001570	EX_04_241_1561_10	I.E.D FRANCISCO JAVIER MATIZ SEDE A	2500
4	4001604			
4	5000132 5000160 5000162 5000189	EX_05_108_1867_12	LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	300
4	5000132	EX_05_108_1867_12	JARDIN INFANTIL VOZ DE ALERTA	50
	5000160			
	5000162			
	5000189			

NÙMERO DE CUENTA	CIV	ID DISEÑO	INSTITUCION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
4	5000531	EX_05_110_1867_12	JARDÍN SOCIAL NEBRUSKA	215
4	5000531	EX_05_110_1867_12	I.E.D LA SALLE JUAN LUIS LONDOÑO	1410
4	5004655 5004970 5004946 5005104	EX_05_003_1073_24	COLEGIO DISTRITAL DIEGO MONTAÑA CUELLAR I.E.D	7500
4	5004418 5004488	EX_05_003_1073_24	COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA	2800
4	5004418 5004488	EX_05_003_1073_24	JARDÍN ICBF EL CISNE CANTAR	13
5	5001319 5001273 5001378	EX_05_93_1244_11	COLEGIO CENTRO CULTURAL	700
5	5001090 5001091 5008288 5000826 5000875	EX_05_113_1867_12	COLEGIO I.E.D LA AURORA	1500
5	5001192 5001226 5001234	EX_05_113_1867_12	JARDIN INFANTIL SEMILLITAS DEL FUTURO - MI ENSUEÑO	13
5	5001031 5001127 5001142	EX_05_113_1867_13	HOGAR INFANTIL ICBF MI BELLO HOGAR	13
5	5000921	EX_05_113_1867_13	COLEGIO EDUCATIVO DISTRITAL NUEVO SAN ANDRES DE LOS SANTOS	2000
6	5000727 5000825 5000906 5000674	EX_05_113_1867_13		
5	5001021	EX_05_113_1867_13	JARDIN INFANTIL LA AURORA	100
6	5000940 50005061			
6	5001836 5001833	EX_05_101_1244_11	IED PROVINCIA DE QUEBEC	2500
6	5002109 5002098	EX_05_101_1244_12	COLEGIO NUEVA ESPERANZA (IED) SEDE A y SEDE B	3200
6	5002109 5002098	EX_05_101_1244_12	JARDÍN INFANTIL SOCIAL LA ESPERANZA	110
6	5003313 5003194 5003132	EX_05_005_1073_24	I.E.D COLEGIO ATABANZHA	1800
7	5005351 5005175	EX_05_307_1561_10	COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ	1385

NÙMERO DE CUENTA	CIV	ID DISEÑO	INSTITUCION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
7	5000347 5008328	EX_05_280_1561_10	JARDIN INFANTIL LA FISCALA	59
7	5000376 50007670	EX_05_280_1561_10	I.E.D FABIO LOZANO LIMONELLI	1900
7	5001827 5001826 5001917 5002110	EX_05_101_1244_11	I.E.D PROVINCIA DE QUEBEC	1080
			ICBF HOGAR COMUNITRARIO PIOLIN	12
			HCB EL NUEVO AMANECER	39
			CENTRO MARIA ADELAIDA	80
7	5002126 5009132 5002267 5002387	EX_05_101_1244_11	SOCIAL JARDÍN INFANTIL LA ESPERANZA	95
			COLEGIO NUEVA ESPERANZA	1080
8	5006413 5006843	EX_05_001_1073_24	CENTRO EDUCATIVO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE	132
8	5006673 5006721 5006736 5006763 5006709 5006765	EX_05_001_1073_24	COLEGIO DISTRITAL EDUARDO UMAÑAN MENDOZA	1740
8	5006075 5006219	EX_05_006_1744_10	JARDIN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA	90
8	5006166 5006221	EX_05_006_1744_10	COLEGIO USMINIA SEDE A	330
8	4000421 4000433 4000461 4000494 4000464	CP_BARRIO_LA_MARIA_ EX_04_124_1867_12	CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL CRECER BALCONES	60
8	4000421 4000433 4000461 4000494 4000464	CP_BARRIO_LA_MARIA_ EX_04_124_1867_12	CENTRO EDUCATIVO MI TALLER	50
8	4000421 4000433	CP_BARRIO_LA_MARIA_ EX_04_124_1867_12	CASA DE JUVENTUD DAMAWHA	30
8	4005329 4005164 4005064	CP_NUEVA_ROMA EX_04_006_1561_10 CP_NUEVA_ROMA EX_04_044_1561_10	COLEGIO IED NUEVA ROMA	1154
8	4005561 50007877	CP_NUEVA_ROMA EX_04_006_1561_10	JARDIN SOCIAL NUEVA ROMA	187

NÙMERO DE CUENTA	CIV	ID DISEÑO	INSTITUCION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
8	5003826 5003773 5003704 5008234	EX_05_213_1561_10	COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA	2900
8	5003704 5008234	EX_05_213_1561_10	JARDIN SOCIAL BOLONIA	160
9	5004618 5004402 5003865	EX_05_286_1561_10	JARDIN INFANTIL CASA LOMA	75
9	5001008	EX_05_352_1561_10	LICEO SANTA ANA DEL SUR	280
9	4002101 4002022 4001982 4002278	EX_04_488_826_10	IED TOMAS RUEDA VARGAS	766
9	4002220 4001982 4002250	EX_04_488_826_10	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES	250
9	4002001 4002022 4001982 4002160 4002250	EX_04_488_826_10	JARDIN INFANTIL CANADA SANTA INES	220
9	4000767 4000793 4000897	EX_04_241_1561_10	CENTRO DIA LA MONTAÑA DEL SABER	784
9	4001327 4001285 4001326	EX_04_241_1561_10	JARDIN INFANTIL MANITAS CREATIVAS POR LA NIÑEZ	10
10	4001648 4002160 4002250	EX_04_488_826_10	IED TOMAS RUEDA VARGAS	1100
10	4001564 4001639	EX_04_241_1561_10		
10	4001694 4001776 4001891 4001202 4001362 4001305 4001184 4001765 4001238	EX_04_241_1561_10	COLEGIO DISTRITAL MONTEBELLO	2000
10	4001386 4001798 4001363	EX_04_241_1561_10	LICEO INTEGRAL SAN AGUSTIN	126

NÙMERO DE CUENTA	CIV	ID DISEÑO	INSTITUCION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
10	4001386 4001798	EX_04_241_1561_10	HOGAR COMUNITARIO AGRUPANDO MIS AMIGOS LOS DUENDECITOS	14
10	4001655 4001764 4001656	EX_04_241_1561_10	LICEO SENDERO DEL SABER	130
10	4001363 4001362 4001305 4001442	EX_04_241_1561_10	INSTITUTO CARMENZA DE SANCHEZ	150
10	4001571	EX_04_241_1561_10	JARDÍN ARTISTICO GRANDES PASOS	20
10	4001765 4001672	EX_04_241_1561_10	CASA JUVENIL DON BOSCO	500
10	4001672 4001765	EX_04_241_1561_10	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN DAMIAN	99
10	4002456 4002491 4002553 4002526 4002403 4002402 4002492 30000503	EX_04_051_414_11	COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	350
12	4002331 4001974 4001975 40001526			
10	4002403 4002492 4002491 4002402 4002610	EX_04_051_414_11	CDI SAN DAMIAN	120
10	4000113 4000103 4000102 4000124 4000165 4000114	EX_04_030_1561_10	JARDIN INFANTIL PEQUEÑAS MARAVILLAS	130
12	4000164			

NÙMERO DE CUENTA	CIV	ID DISEÑO	INSTITUCION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
10	4000106 4000127 4000066 4000057 4000079 4000084 4000093 4000094 4000049 4000085	EX_04_030_1561_10	COLEGIO CARLOS CASTRO SAAVEDRA	240
10	No se presento instalación de zonas escolares durante este periodo			0
12	4000164 4000149 4000137	EX_04_030_1561_10	COLEGIO NUEVA ALIANZA INTEGRAL	214
12	4000164 4000149	EX_04_030_1561_10	LICEO PSICOPEDAGOGICO FRANK FRUT	214
12	4000080 4000089 4000108 4000042 4000041	EX_04_030_1561_10	GIMNASIO EDEN PRESCOLAR	50
13	4000167 4000109			
12	4000080 4000089 4000108 4000042 4000041	EX_04_030_1561_10	JARDIN INFANTIL ANGELES	80
12	4000164 40001526 50007938 4001975 4001974	EX_04_051_414_11	HOGAR COMUNITARIO MANITAS TRAVIESAS	70
13	4000265 4000264 4000333 4000351 4000266 4000267 4000256 4000239 4000274 4000257 4000294 4000231 4000238 4000195	EX_04_263_1561_10	INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA JOVENES EL PENSAMIENTO DE PITAGORAS	150

NÙMERO DE CUENTA	CIV	ID DISEÑO	INSTITUCION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
15	1903466			
13	4000265 4000264 4000333 4000351 4000266 4000267 4000256 4000239 4000274 4000257 4000294 4000231 4000238 4000195	EX_04_263_1561_10	COLEGIO LOS URAPANES	190
15	1903328 710077			
13	4000265 4000264 4000333 4000351 4000266 4000267 4000256 4000239 4000274 4000257 4000294 4000231 4000238 4000195	EX_04_263_1561_10	COLEGIO SANTA ANA	60
13	5003874	EX_05_004_1073_24	COLEGIO PSICOPEDAGOGICO VILLAVERDE	150
13	5004039 5004101 5004460 5004560 5004324 5004312	EX_05_004_1073_24	LICEO ANDINO DEL SUR	120
13	5004039 5004101 5004460 5004560 5004324 5004312	EX_05_004_1073_24	HOGAR COMUNITARIO MI SEGUNDA CASITA	13
14	30000741	EX_05_004_1073_24		

NÙMERO DE CUENTA	CIV	ID DISEÑO	INSTITUCION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
14	30000479	EX_04_125_1867_12	HOGAR COMUNITARIO BURBUJITAS DE SABIDURIA	20
14	3002134 3002158	EX_04_125_1867_12	HOGAR COMUNITARIO MI MUNDO IDEAL	26
14	4004937 4004938 4004998 4004889 4004923 4004908	EX_04_044_1561_10	COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL SEDE C	288
14	4004864 4004784	EX_04_044_1561_10	HOGAR MI PEQUEÑA LULU	45
14	4004864 4004784	EX_04_044_1561_10	HOGAR COMUNITARIO CARIÑOSITO	13
14	4004784	EX_04_044_1561_10	LICEO SANTILLANA	190
14	5003738 5003862 5003604	EX_05_004_1073_24	JARDIN INFANTIL MUNDO FANTASIA	50
14	5003738 5003862 5003778	EX_05_004_1073_24	JARDIN INFANTIL CHUNIZA	250
14	5003738 5003862 5003778	EX_05_004_1073_24	COLEGIO DISTRITAL CHUNIZA	350
14	5004148 5004342 5007876 5004287 5004152 30000740	EX_05_004_1073_24	COLEGIO DISTRITAL EL VIRREY JOSESOLIS	1400
15	5004364			
14	5004148 5004342 5007876 5004287 5004152 30000740	EX_05_004_1073_24	HOGAR COMUNITARIO HOGAR PIOLIN	80
15	339565 364779 849573	EX_04_125_1867_12	COLEGIO SAN JUAN VIANET	150
15	709786	EX_04_263_1561_10	JARDIN INFANTIL JAVERIANO BILINGÜE	20

NÙMERO DE CUENTA	CIV	ID DISEÑO	INSTITUCION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
15	1654933 680918 1654915 680965 124718 1654898 1654889	EX_04_001_1073_24	COLEGIO SAN JUAN BOSCO	371
15	1654933 680918 1654915 680965 124718 1654898 1654889	EX_04_001_1073_24	COLEGIO AVE MARIA	1500
15	1654933 680918 1654915 680965 124718 1654898 1654889	EX_04_001_1073_24	LICEO SANTA ANA SUR	210
15	5003938 5004024 5003822 5004012 5004060	EX_05_004_1073_24	INSTITUTO EL IGENIOSO HIDALGO	320
15	5003756	EX_05_004_1073_24	COLEGIO ARIEL DAVID	107
15	1413600 1419071 1413467	EX_04_400_1561_10	HOGAR COMUNITARIO MIS ESTRELLITAS	
15	1413600 1419071 1413467	EX_04_400_1561_10	CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL	
TOTAL DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS EN EL PROYECTO				**66420**

Fuente: Elaboración propia

14. CERTFICADOS DE CALIBRACIÓN, FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ESTADO DE LOS EQUIPOS

En el Anexo 6 se encuentra la información respecto a los certificados de calibración.

15. SEÑALIZACIÓN ENTREGADA A ALMACÉN

Para el periodo del presente informe, a continuación, se presenta el detalle de la señalización vertical implementada, dispositivos de control al tránsito implementados y entregada al almacén de la SDM.

En el Anexo 9. Acta de entrega de señalización, se presenta el comprobante de ingreso de elementos emitido por la subdirección Administrativa de la Secretaría Distrital de Movilidad, donde se relaciona la señalización vertical y los dispositivos viales instalados en el periodo del 24 de febrero al 23 de marzo de 2026:

Tabla 9 Elementos de Señalización Vertical y Dispositivos de Control Implementados

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	5,33	$ 376.635,61	$ 120.523,39	18 TABLEROS	$ 497.159,00	$ 2.649.857,47
2	UND	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	18	$ 119.800,76	$ 38.336,24	18,00	$ 158.137,00	$ 2.846.466,00
3	UND	Fabricación y suministro de pedestal doble en ángulo para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	50	$ 150.388,64	$ 48.124,36	50,00	$ 198.513,00	$ 9.925.650,00
5	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en ángulo SR - SP	130	$ 292.988,64	$ 93.756,36	130,00	$ 386.745,00	$ 50.276.850,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		cumpliendo con normatividad vigente.						
6	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	124	$ 463.812,12	$ 148.419,88	124,00	$ 612.232,00	$ 75.916.768,00
7		Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	37	$ 568.224,24	$ 181.831,76	37,00	$ 750.056,00	$ 27.752.072,00
8	M2	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	7,2	$ 359.616,67	$ 115.077,33	40 TABLEROS	$ 474.694,00	$ 3.417.796,80

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	31	$ 467.840,15	$ 149.708,85	31,00	$ 617.549,00	$ 19.144.019,00
10	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	60	$ 367.910,61	$ 117.731,39	60,00	$ 485.642,00	$ 29.138.520,00
15	UND	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical doble plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	3	$ 278.868,18	$ 89.237,82	3,00	$ 368.106,00	$ 1.104.318,00
16	UND	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical sencillo plano (figura	2	$ 220.315,91	$ 70.501,09	2,00	$ 290.817,00	$ 581.634,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X30 cm,material reflectivoTipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.						
17	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 ó SP-46A, material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	24	$ 273.428,79	$ 87.497,21	24,00	$ 360.926,00	$ 8.662.224,00
18	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.	18	$ 363.000,76	$ 116.160,24	18,00	$ 479.161,00	$ 8.624.898,00
19	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2"	11	$ 208.515,91	$ 66.725,09	11,00	$ 275.241,00	$ 3.027.651,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.						
20	UND	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente.	5	$ 221.669,70	$ 70.934,30	5,00	$ 292.604,00	$ 1.463.020,00
22	UND	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	40	$ 145.928,79	$ 46.697,21	40,00	$ 192.626,00	$ 7.705.040,00
26	UND	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	58	$ 40.962,88	$ 13.108,12	N/A	$ 54.071,00	$ 3.136.118,00
28	UND	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	417	$ 21.966,67	$ 7.029,33	N/A	$ 28.996,00	$ 12.091.332,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
70	UND	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	179	$ 12.454,55	$ 3.985,45	179,00	$ 16.440,00	$ 2.942.760,00
73	UND	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	676	$ 12.572,73	$ 4.023,27	676,00	$ 16.596,00	$ 11.218.896,00
75	UND	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	248	$ 78.714,39	$ 25.188,61	248,00	$ 103.903,00	$ 25.767.944,00
77	UND	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura máxima de 15 cm, ancho de 20 cm y	26	$ 179.642,42	$ 57.485,58	26,00	$ 237.128,00	$ 6.165.328,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.						
79	UND	Suministro e instalación de Boya plástica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: de 7 cm de altura y 24 cm de base según figura 5-3 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024)	27	$ 28.100,00	$ 8.992,00	27,00	$ 37.092,00	$ 1.001.484,00
80	UND	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	82	$ 49.536,36	$ 15.851,64	82,00	$ 65.388,00	$ 5.361.816,00
TOTAL								**$ 319.922.462**

N°	ID DE DISEÑO IMPLEMENTADO	TIPO DE IMPLEMENTACIÓN	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
1	EX_05_004_1073_24	VERTICAL	USME	AV BOYACA HASTA DG 99 SUR ENTRE AK 14 Y KR 4
2	EX_04_125_1867_12	HORIZONTAL	SAN CRISTOBAL	KR 3 HASTA AC 11 SUR ENTRE TV 1B ESTE Y KR 11B ESTE
3	EX_04_263_1560_11	HORIZONTAL VERTICAL	SAN CRISTOBAL	CL 11 SUR HASTA CL 1 ENTRE KR 7 Y KR 1C E

N°	ID DE DISEÑO IMPLEMENTADO	TIPO DE IMPLEMENTACIÓN	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
4	EX_04_001_1073_24	HORIZONTAL	SAN CRISTOBAL	ENTRE CL 20 SUR Y CL 11 SUR Y ENTRE KR 6 Y TV5 ESTE
5	CP_04_1496 LA SIERRA	HORIZONTAL	SAN CRISTOBAL	KR 6 ESTE ENTRE CL 47 SUR Y CL 48B SUR
6	DISEÑO ZONA ROSA	VERTICAL	CHAPINERO	CL 82 ENTRE KR 12 Y KR 13 KR 13 ENTRE CL 86A Y CL 85
7	CP_SEMAFORIZACIÓN	HORIZONTAL VERTICAL	USME	AV BOYACÁ KR 14I
8	EX_04_030_1561_10	VERTICAL	SAN CRISTOBAL	AV KR 10 HASTA KR 7 ENTRE CL 11 SUR Y CL 1
9	EX_04_044_1561_10	HORIZONTAL	SAN CRISTOBAL	KR 4A E DESDE: DG 50 S HASTA: CL 51A S

16. REPORTE DE SEÑALIZACIÓN RETIRADA EN VÍA Y ENTREGADA A ALMACÉN

En el periodo al que hace referencia este informe se realizó entrega de señales retiradas en vía, , la información se encontrará en el Anexo 8.

17. ASPECTOS VARIOS

17.1 GEOREFERENCIACIÓN

Durante el periodo de presentación del informe se realizó la entrega de Georreferenciación perteneciente a la implementación del Obra, lo siguiente es el listado de ID's entregados a fecha de corte 23 de abril de 2026.

Tabla 10 Estado Georeferenciación

CUENTA	ID	FECHA ESTADO	ESTADO
1	EX_05_93_1244_11	6-mar-25	APROBADO SDM
1	EX_05_119_1867_12	6-mar-25	APROBADO SDM
1	MV_05_122_1867_12	20-mar-25	APROBADO SDM
1	MV_AV_BOYACA_941_09	21-mar-25	APROBADO SDM
1	MV_04_230_1561_10	17-mar-25	APROBADO SDM
1	EX_04_044_1561_10	6-mar-25	APROBADO SDM
1	EX_04_211_1561_10	17-mar-25	APROBADO SDM
1	EX_05_320_1561_10	11-mar-25	APROBADO SDM
1	EX_05_341_1561_10	11-mar-25	APROBADO SDM
2	MV_05_052_1744_10 SDM-202561200270682	9-abr-25	APROBADO SDM
2	MV_AV_BOYACA_941_09	2-may-25	APROBADO SDM
2	EX_05_119_1867_12	29-abr-25	APROBADO SDM
2	MV_05_122_1867_12	5-may-25	APROBADO SDM
2	EX_05_053_1744_10	2-may-25	APROBADO SDM
2	EX_04_211_1561_10 (pasacalle SDM-202461204137592)	21-abr-25	APROBADO SDM
3	EX_04_001_1073_24	27-may-25	APROBADO SDM
3	EX_04_262_1561_10_	29-may-25	APROBADO SDM
3	EX_05_119_1867_12	29-may-25	APROBADO SDM
3	EX_05_108_1867_12	19-may-25	APROBADO SDM
3	EX_04_241_1561_10	28-may-25	APROBADO SDM
3	MV_04_511_676_09	20-may-25	APROBADO SDM
3	EX_05_053_1744_10	7-may-25	APROBADO SDM
3	EX_05_110_1867_12	21-may-25	APROBADO SDM
3	EX_05_93_1244_11_V5	5-jun-25	APROBADO SDM
3	MV_05_122_1867_12	27-may-25	APROBADO SDM
3	MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3 (CP 202561200744162)	29-may-25	APROBADO SDM
4	EX_04_211_1561_10 PMT de EMERGENCIA AV LOS CERROS	25-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_04_261_1561_10 (CP_04_1049)	1-jul-25	APROBADO SDM
4	EX_04_001_1073_24	13-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_05_003_1073_24	13-jun-25	APROBADO SDM

CUENTA	ID	FECHA ESTADO	ESTADO
4	EX_05_110_1867_12	1-jul-25	APROBADO SDM
4	EX_05_119_1867_12	18-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_05_113_1867_12	20-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_05_053_1744_10	20-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_05_108_1867_12	19-jun-25	APROBADO SDM
4	MV_05_052_1744_10 PMT CAUCE SIRE 5453567	25-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_04_241_1561_10	17-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_04_262_1561_10	25-jun-25	APROBADO SDM
4	MV_05_122_1867_12	27-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_05_307_1561_10 CP-202561200703942	25-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_05_93_1244_11	20-jun-25	APROBADO SDM
5	EX_05_93_1244_11	8-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_05_307_1561_10 CP-202561200703942	16-jul-25	APROBADO SDM
5	MV_04_511_676_09_V11	10-jul-25	APROBADO SDM
5	MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3	16-jul-25	APROBADO SDM
5	MV_05_122_1867_12_V7	24-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_04_001_1073_24_V2	11-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_04_241_1561_10	16-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_05_003_1073_24	29-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_05_108_1867_12_V6	16-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_05_113_1867_12	29-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_04_262_1561_10	24-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_05_005_1073_24	24-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_05_119_1867_12	14-jul-25	APROBADO SDM
5	PMT SIRE 5453778	24-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_04_264_1561_10 PMT SDM-202561201385182	18-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_04_211_1561_10 SIRE 2561201777022	18-jul-25	APROBADO SDM
5	PMT EMBALSE LA REGADERA	24-jul-25	APROBADO SDM
6	EX_05_005_1073_24	14-ago-25	APROBADO SDM
6	EX_05_113_1867_12	13-ago-25	APROBADO SDM
6	MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3	13-ago-25	APROBADO SDM
6	EX_05_119_1867_12	13-ago-25	APROBADO SDM
6	EX_05_001_1073_24	15-may-25	APROBADO SDM
6	EX_05_101_1244_11	15-may-25	APROBADO SDM
6	EX_05_008_1073_24	15-ago-25	APROBADO SDM
6	EX_05_003_1073_24	13-ago-25	APROBADO SDM
6	MV_AV_CARACAS_585_24 CP_BYKE_BOX	19-ago-25	APROBADO SDM
7	MV_05_122_1867_12	19-sep-25	APROBADO SDM

CUENTA	ID	FECHA ESTADO	ESTADO
7	EX_05_213_1561_10 SDM-202561202098412	15-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_04_126_1867_12 SDM-202561202230222	15-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_101_1244_11	2-sep-25	APROBADO SDM
7	MV_AV_CARACAS_585_24 CP_BYKE_BOX	2-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_006_1561_10	10-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_001_1073_24	8-sep-25	APROBADO SDM
7	MV_AV_BOYACA_941_09	15-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_008_1073_24	8-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_307_1561_10	18-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_310_1561_10	2-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_280_1561_10	11-sep-25	APROBADO SDM
8	EX_05_001_1073_24	28-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_006_1744_10	15-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_04_124_1867_12 CP_ BARRIO_LA_MARIA	23-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_04_006_1561_10 (CP_NUEVA_ROMA)	27-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_04_044_1561_10 (CP NUEVA ROMA)	28-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_280_1561_10	15-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_008_1561_10	10-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_213_1561_10	4-nov-25	APROBADO SDM
8	EX_05_310_1561_10	10-oct-25	APROBADO SDM
8	PMT_CL_37D_S_KR_3B (SDM-202561202584052 y SDM- 202561202664192)	27-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_93_1244_11 (CP_05_124)	15-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_04_316_1561_10 (PMT SDM-202561202439322)	15-oct-25	APROBADO SDM
8	MV_05_99_1244_11 (PMT SDM-202561202657962)	15-oct-25	APROBADO SDM
8	PMT BARRIO LA FISCALA (PMT SDM- 202561202378942)	10-oct-25	APROBADO SDM
8	MV_05_052_1744_10 (PMT SDM-202561202284382 VDA LAS MARGARITAS)	28-oct-25	APROBADO SDM
8	PMT VEREDA OLARTE SDM-202561202284382	27-oct-25	APROBADO SDM
8	PMT_JUAN_REY_LA_FLORA SDM- SIRE 5456812	27-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_04_040_1561_10 SDM- 202561202286462	27-oct-25	APROBADO SDM
8	PMT_USME_SECTOR RURAL CL 137D_ KR 1 SDM-202561202379632	28-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_307_1561_10	7-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_119_1867_12	10-oct-25	APROBADO SDM
9	EX_05_352_1561_10	2-dic-25	APROBADO SDM
9	EX_05_286_1561_10	2-dic-25	APROBADO SDM
9	CPS_676_MV_01_04 (pendones kr 7)	25-nov-25	APROBADO SDM
9	EX_04_241_1561_10	25-nov-25	APROBADO SDM
9	EX_04_488_826_10	1-dic-25	APROBADO SDM
9	MV_05_122_1867_12 CP DE VIA AL LLANO	11-nov-25	APROBADO SDM

CUENTA	ID	FECHA ESTADO	ESTADO
9	EX_04_124_1867_12 CP_ BARRIO_LA_MARIA	26-nov-25	APROBADO SDM
9	EX_04_006_1561_10 (CP_NUEVA_ROMA)	25-nov-25	APROBADO SDM
9	EX_04_044_1561_10 (CP NUEVA ROMA)	3-dic-25	APROBADO SDM
10	EX_05_341_1561_10 CP_05_1669	12-dic-25	APROBADO SDM
10	MV_05_052_1744_10 CP_05_1670 5. CP_05_1671 CP_05_1673	12-dic-25	APROBADO SDM
10	EX_05_002_1073_24 CP_05_1648	12-dic-25	APROBADO SDM
10	EX_04_134_1867_12 CP_04_1594	12-dic-25	APROBADO SDM
10	MV_15_78_1244_11 CP_04_1630	15-dic-25	APROBADO SDM
10	EX_05_320_1561_10 SDM-20256120339962-DI-22669	16-dic-25	APROBADO SDM
10	EX_04_488_826_10	16-dic-25	APROBADO SDM
10	EX_04_241_1561_10	4-feb-26	APROBADO SDM
10	MV_05_122_1867_12 CP DE VIA AL LLANO	17-dic-25	APROBADO SDM
10	EX_04_051_414_11	14-ene-26	APROBADO SDM
10	EX_04_030_1561_10	19-ene-26	APROBADO SDM
11	EX_04_030_1561_10	4-feb-26	APROBADO SDM
12	EX_04_030_1561_10	6-mar-26	APROBADO SDM
12	CP_05_1690 (MV_05_052_1744_10)	20-feb-26	APROBADO SDM
12	EX_04_051_414_11	20-feb-26	APROBADO SDM
12	CP_04_1630 (MV_15_78_1244_11)	20-feb-26	APROBADO SDM
12	CP_04_1627 (EX_04_002_1073_24)	24-feb-26	APROBADO SDM
12	MV_AV_BOYACA_941_09_T3	20-feb-26	APROBADO SDM
12	EX_05_213_1561_10	24-feb-26	APROBADO SDM
13	PMT_CL_89C_SUR_KR_10B_ESTE_C13 PMT SDM-202561203642132	20-mar-26	APROBADO SDM
13	EX_04_051_ 414_11 PMT SDM 202561203802572	18-mar-26	APROBADO SDM
13	EX_05_286_1561_10	18-mar-26	APROBADO SDM
13	EX_04_241_1561_10	6-mar-26	APROBADO SDM
13	CP_05_1674 MV_05_052_1744_10	18-mar-26	APROBADO SDM
13	CP_04_1703 EX_04_262_1561_10	18-mar-26	APROBADO SDM
13	EX_05_004_1073_24	15-abr-26	APROBADO SDM
13	EX_04_263_1561_10	15-abr-26	APROBADO SDM
13	EX_04_030_1561_10	6-mar-26	APROBADO SDM
13	EMERGENCIA CL 84 EX_02_038_1556_10	10-abr-26	APROBADO SDM
13	EX_04_044_1561_10	14-abr-26	APROBADO SDM
13	EX_05_93_1244_11 CP_05_1524	10-abr-26	APROBADO SDM
14	EX_04_044_1561_10	13-may-26	APROBADO SDM
14	EX_05_004_1073_24	6-may-26	APROBADO SDM
14	EX_04_488_826_10	11-may-26	APROBADO SDM
14	EX_05_108_1867_12 (CP_05_1631)	13-may-26	APROBADO SDM

CUENTA	ID	FECHA ESTADO	ESTADO
14	MV_AV_BOYACA_941_09_V43_T3 (CP_DE_AV_BOYACA_TV3F)	8-may-26	APROBADO SDM
14	EX_02_033_1556_10 (DISEÑO ZONA ROSA)	13-may-26	EN REVISION SDM
14	EX_02_038_1556_10 (DISEÑO ZONA ROSA)	13-may-26	EN REVISION SDM
14	EX_04_261_1561_10 (CP_04_1771)	29-abr-26	APROBADO SDM
14	MV_04_511_676_09 (CP_04_1771)	29-abr-26	APROBADO SDM
14	EX_05_003_1073_24 (CP_05_1835)	29-abr-26	APROBADO SDM
14	EX_05_341_1561_10 (CP_05_1837)	8-may-26	APROBADO SDM
14	EX_04_316_1561_10 (PMT SIRE- Radicado-202561204690292)	29-abr-26	APROBADO SDM
14	EX_04_125_1867_12 (DISEÑO Y CP_04_1868)	8-may-26	APROBADO SDM
15	EX_05_004_1073_24		EN DESARROLLO
15	EX_04_125_1867_12		EN DESARROLLO
15	EX_04_263_1561_10		EN DESARROLLO
15	EX_04_001_1073_24		EN DESARROLLO
15	CP_04_1496 LA SIERRA		EN DESARROLLO
15	EX_04_400_1561_10		EN DESARROLLO
15	EX_02_033_1556_10 (DISEÑO ZONA ROSA)		EN DESARROLLO
15	EX_02_038_1556_10 (DISEÑO ZONA ROSA)		EN DESARROLLO
15	CP_SEMAFORIZACIÓN_AVBOY_KR 14I		EN DESARROLLO
15	EX_04_030_1561_10		EN DESARROLLO
15	EX_04_044_1561_10		EN DESARROLLO

Elaboración: Fuente propia

18. RECURSOS UTILIZADOS PARA EL CONTRATO DE OBRA

18.1PERSONAL

Tabla 11 Personal mínimo

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DEL PROYECTO	LUIS FERNANDO RUBIANO BARRERO
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO	DIANA PAOLA PARADA SIERRA
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA DIURNO	VICTOR ANDRES MORENO CRISTANCHO
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO	DIEGO GUALTEROS CHAVEZ
TRABAJADOR SOCIAL	ELIANA JULIETH FAJARDO BORBÓN
PROFESIONAL STT	YULID LILIANA GELVES HERRERA
TECNÓLOGO EN GEORREFERENCIACIÓN	GIOVANNY ALEXANDER BRITO NÚÑEZ
CONDUCTOR DIURNO	WILMER SIERRA
CONDUCTOR NOCTURNO	HUGO ALEJANDRO MORENO CRISTANCHO
SECRETARIA	YOLIMA PATIÑO LOBATON
ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS	ALBA ZULEIDY AVENDAÑO CIPAGAUTA

Fuente: Elaboración propia

18.2EQUIPO

Tabla 12 Equipos empleados para la ejecución de las actividades

Maquina	Serie	Tipo de Vehículo	Placa	Marca
Aplicación de pintura liquida	-	Camión	VFB357	Chevrolet
Maquina autopropulsable TITAN 1000	TAPT002	Camión	WEP027	Jac
Aplicación de plástico en frio	IAPT001	Camión	WNN061	Jac
Powrliner 8950, 2GUN Powrliner 8950, 2GUN Powrliner 8950, 2GUN	1. 1439800069 2. 1439800007 3. 1439800083	N/A	N/A	Titan
Featherlite	2001-454	N/A	N/A	ThermoMark II
Hydra M 4000, W FILTE/ (433- 801)	120700042	N/A	N/A	Titan

Fuente: Elaboración propia

18.3INSTRUMENTOS USADOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

A continuación, se listan los instrumentos usados en los frentes de obra, para el control de calidad de la señalización implementada:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Velocímetro	1
Galgas para la verificación de espesores húmedos	1
Medidor de espesores secos para tomar lecturas de la demarcación sobre testigos	1
Retrorreflectómetro horizontal	1

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Lupa con aumento de 80X	1
Cinta métrica / Odómetro	1
Equipo para medir temperatura ambiente y de la superficie por demarcar.	1
Equipo para medir humedad relativa (Termohigrómetro)	1
Equipo para medir velocidad del viento	1
Equipo para medir punto de rocío	1

Fuente: Elaboración propia

19. VINCULACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE.

Esta información se encuentra en el Anexo 9. Gestión social.

20. VINCULACIÓN DE PORCENTAJE DE MUJERES.

Esta información se encuentra en el Anexo 9. Gestión social.

21. FACTOR SOCIAL

Esta información se encuentra en el Anexo 9. Gestión social.

22. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La información referente a la gestión de seguridad y salud en el trabajo se encuentra en el Anexo 10.

23. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS

23.1 ASPECTO ADMINISTRATIVO

En el treceavo mes de ejecución del contrato comprendido entre el periodo del 24 de marzo al 23 de abril del 2026 se realizaron actividades administrativas como:

- Revisión de documentación contractual.
- Revisión de Anexo técnico.
- Requerimientos mediante oficios.
- Respuestas a requerimientos de Secretaría Distrital de Movilidad e Interventoría,
- Asistencia a comités técnicos y mesas de trabajo y revisión de acta de comité.
- Asistencia comités de representantes legales.
- Entrega y firma de planillas de implementación señalización horizontal y vertical.
- Atención a las solicitudes de Interventoría y la Secretaría Distrital de Movilidad, en desarrollo del objeto del contrato vigilado.
- Entrega financiera del contrato de obra

23.2 ASPECTO JURIDICO

En el treceavo mes de ejecución del contrato comprendido entre el periodo del del 24 de marzo al 23 de abril del 2026 se realizaron actividades jurídicas como
:

- Ejecución del Contrato de Obra dentro del plazo, montos, calidades y demás términos establecidos para el mismo.
- Solicitudes de reclamaciones por parte de la interventoría.
- No se generaron reclamaciones por parte del contratista .
- No se generaron requerimientos de suspensión o prórroga del contrato de obra.

24. PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO

Estas planillas se encuentran en el Anexo 10, Gestión SST, anexos, Anexo Seguridad Social.

25. CERTIFICACIÓN SALARIOS Y HONORARIOS

Esta certificación se encuentra en el Anexo 11 Certificación salarios y honorarios.

26. LISTADO DE PROVEEDORES

La Unión Temporal cuenta con los siguientes proveedores:

- Pintuflex :Pintura en plástico en frio metilmetacrilato (spray) :
- Ecotraffic: Pintura de plástico en frio metilmetacrilato (llana)
- Ecotraffic: Imprimante acrílico negro

27. CERTIFICACIÓN PAGOS PROVEEDORES

Esta certificación se encuentra en el Anexo 12 Certificación pago proveedores.

28. ESTADO PRESUPUESTAL

28.1 RESUMEN CUENTA 15

Tabla 13 Cantidades ejecutadas por ID

No	Corredor / Diseños	Localidad	Valor Presupuestado	Valor Ejecutado	% Ejecutado
1	EX_05_093_1244_11	USME	$ 699.289.833,00	$ 1.985.130,00	0,28%
2	EX_05_004_1073_24	USME	$ 644.886.017,00	$ 208.491.518,00	32,33%
3	EX_04_125_1867_12	SAN CRISTOBAL	$ 418.871.023,95	$ 66.780.251,00	15,94%
4	EX_04_263_1560_11	SAN CRISTOBAL	$ 630.675.363,00	$ 136.490.209,00	21,64%
5	EX_04_001_1073_24	SAN CRISTOBAL	$ 531.087.135,00	$ 67.440.819,00	12,70%
6	CP_04_1496 LA SIERRA	SAN CRISTOBAL	$ 92.655.876,00	$ 46.430.070,00	50,11%
7	EX_04_400_1561_10	SAN CRISTOBAL	$ 977.114.371,00	$ 58.685.280,00	6,01%
8	DISEÑO ZONA ROSA	CHAPINERO	$ 143.294.996,15	$ 25.799.206,00	18,00%
9	CP_SEMAFORIZACIÓN_AVBOY_KR 14I	USME	$ 35.757.318,00	$ 35.757.318,00	100,00%
10	EX_04_030_1561_10	SAN CRISTOBAL	$ 888.788.852,71	$ 90.488.068,00	10,18%
11	EX_04_044_1561_10	SAN CRISTOBAL	$ 482.960.279,00	$ 30.198.638,00	6,25%
TOTAL			**$ 5.545.381.065**	**$ 768.546.511**	

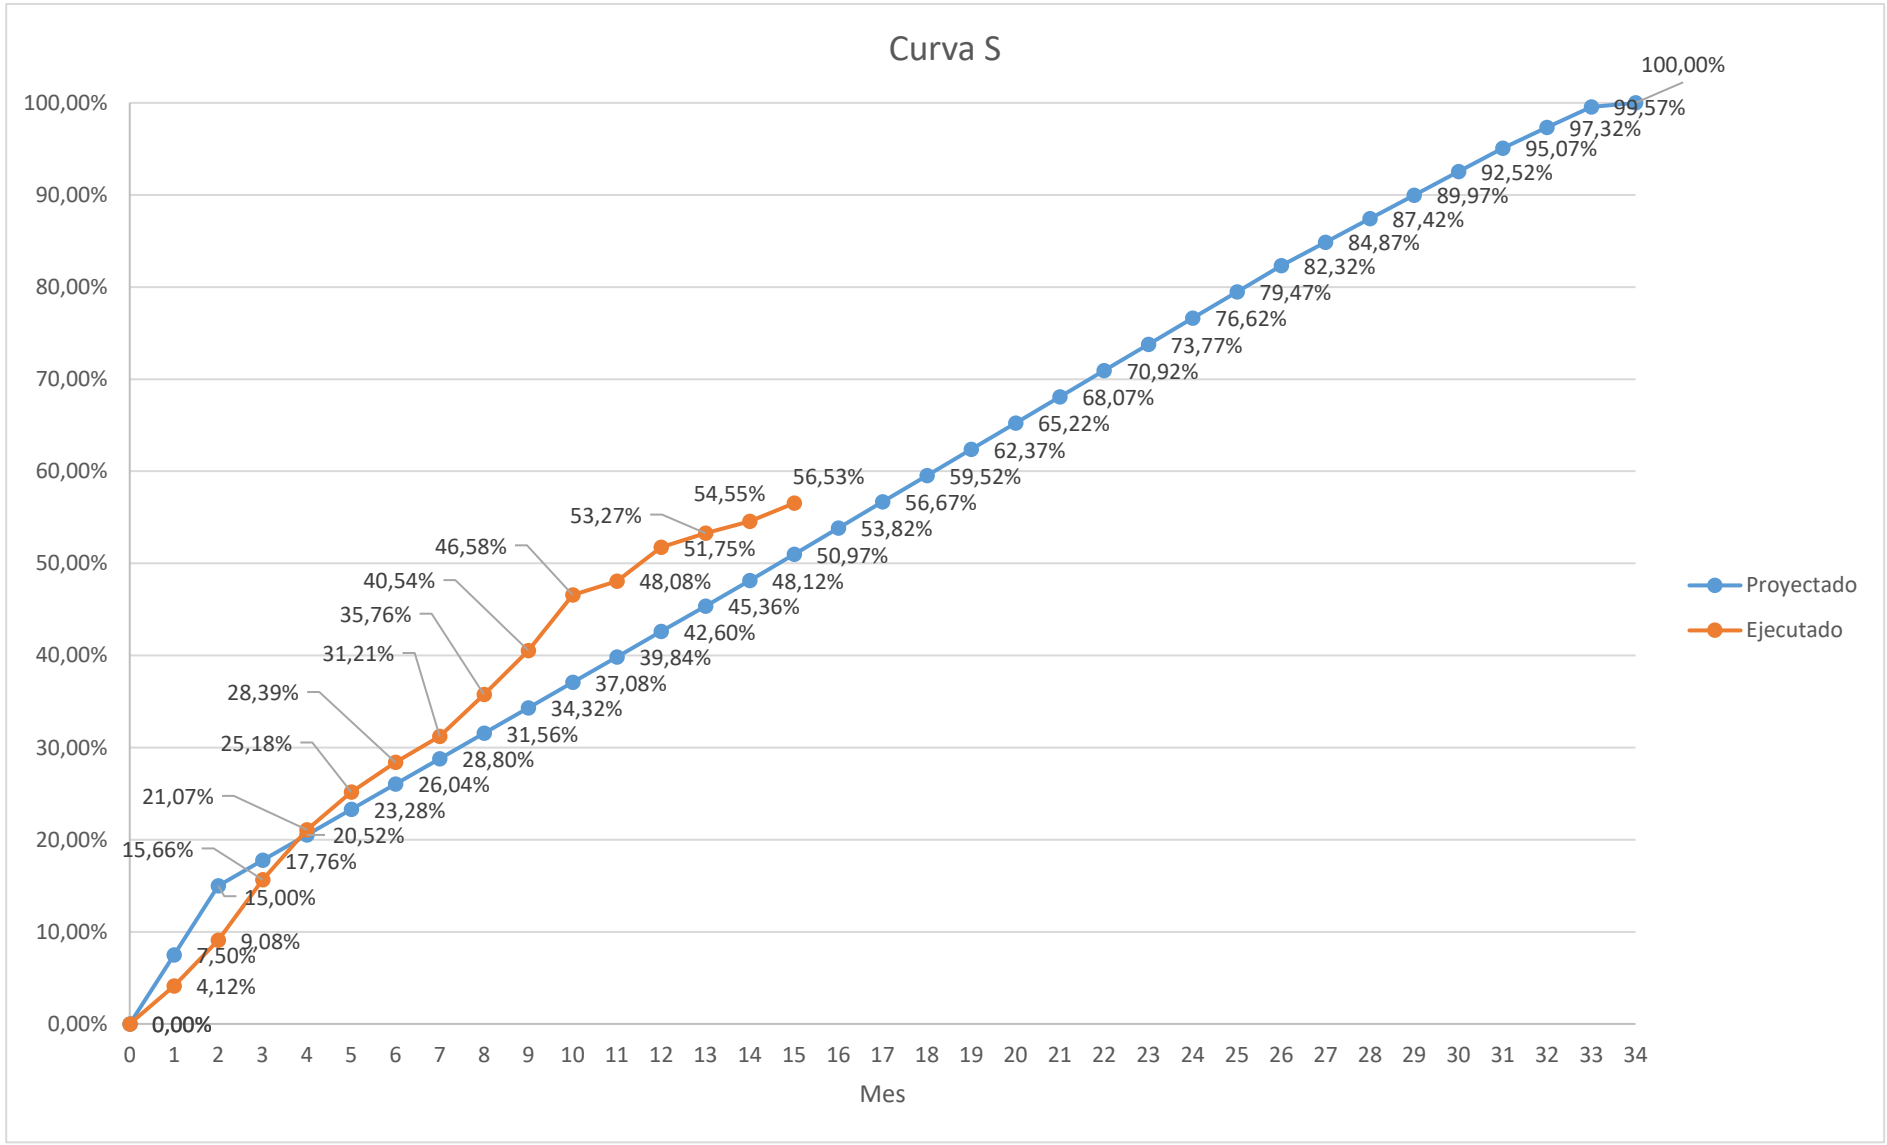
GEO APROPADA C14	$	119.606.426
GEO SIN APROBAR C15	$	114.984.207
VALOR X COBRAR	**$**	**773.168.730**

En el Anexo 13 se encuentran las planillas de obra, acta parcial de obra y suministro.

28.2 AVANCE PARCIAL CTO INICIAL

A continuación , se presenta el avance parcial y acumulado respecto al mes de ejecución, en proporción con los porcentajes mínimos establecidos para ejecutar de acuerdo con lo estipulado por la interventoría, el cual representa un valor de **2.85%** del valor total del contrato, lo ejecutado en este periodo equivale al **1,98 %** lo que indica que se está por encima de la curva de ejecución en un **5.56%**

Gráfica 1 Gráfica Curva S Vigencia 2026



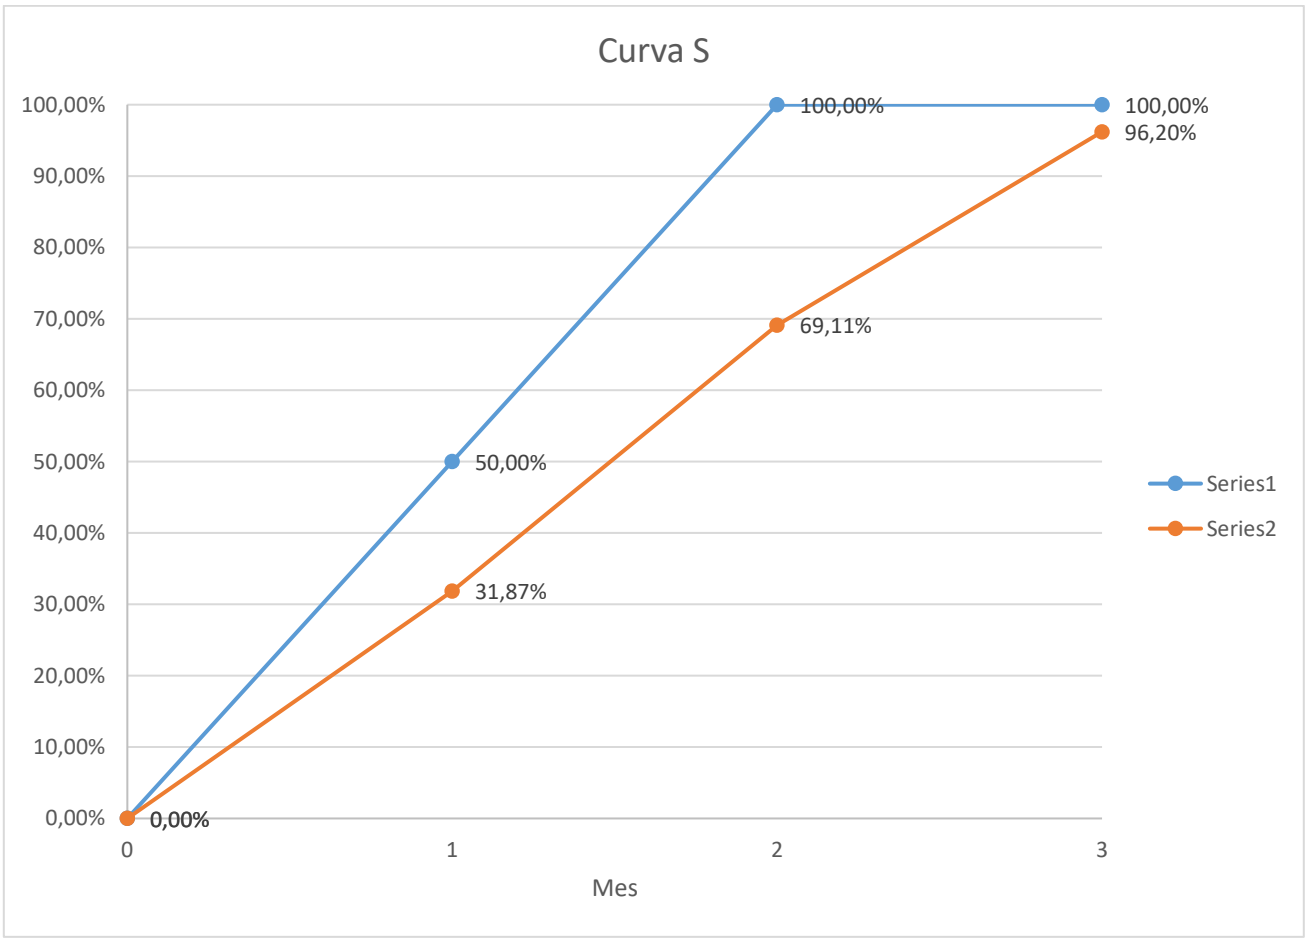
28.3AVANCE ADICIÓN 1

En el periodo al que hace referencia este informe se inicia la implementación de los siguientes diseños asignados a la Adición 1:

ID	LOCALIDAD
EX_04_044_1561_10	SAN CRISTOBAL
EX_04_263_1561_10	SAN CRISTOBAL
EX_05_004_1073_24	USME

A continuación , se presenta el avance parcial y acumulado respecto al mes de ejecución, en proporción con los porcentajes mínimos establecidos para ejecutar de acuerdo con lo estipulado por la interventoría, el cual representa un valor de **100%** del valor total de la adición 1, lo ejecutado en este periodo equivale al **27.09 %,** lo que nos da un porcentaje del 96.20% facturado, sin embargo, la ejecución de obra es del 100% de la ejecución de la adición,y el 3.80% faltante corresponde a la retegarantía y a la Geo de esta última cuenta.

Gráfica 2 Curva S Adición 1



28.4 BALANCE PRESUPUESTAL

Tabla 14 Balance presupuestal

VALOR VIGENCIA 2024	$	2.815.721.000,00
VALOR VIGENCIA 2025	$	6.209.487.857,00
VALOR VIGENCIA 2026	$	6.423.895.143,00
VALOR VIGENCIA 2027	$	3.322.369.428,00
ADICIÓN 1	$	1.482.594.137,00
VALOR TOTAL	**$**	**20.254.067.565,00**

Pagos Efectuados	Periodo	Costos Directos	AIU	Suministro	Valor Total Acta	Retegarantía 5%	Total, a Girar	Estado
Cuenta 1	24 de febrero 23 de marzo de 2025	$ 518.247.080,00	$ 165.839.066,00	$ 88.935.514,00	$ 773.021.660,00	$ 38.651.083,00	$ 734.370.577,00	PAGO
Cuenta 1	24 de febrero 23 de marzo de 2025	$ 669.831.615,05	$ 214.346.116,81	$ 47.682.975,00	$ 931.860.707	$ 46.593.035,00	$ 885.267.671,86	PAGO
Cuenta 3	24 de marzo 23 de abril de 2025	$ 935.014.969,90	$ 299.204.790,37		$ 1.234.219.760	$ 61.710.988,00	$ 1.172.508.772,26	PAGO
Cuenta 4	24 de abril 23 de mayo de 2025	$ 770.290.040,60	$ 246.492.812,99		$ 1.016.782.854	$ 50.839.143,00	$ 965.943.710,59	PAGO
Cuenta 5	24 de mayo a 23 de junio de 2025	$ 583.227.126,05	$ 186.632.680,34		$ 769.859.806	$ 38.492.990,00	$ 731.366.816,38	PAGO

Pagos Efectuados	Periodo	Costos Directos	AIU	Suministro	Valor Total Acta	Retegarantía 5%	Total, a Girar	Estado
Cuenta 6	24 de junio a 23 de julio de 2025	$ 456.710.661,60	$ 146.147.411,71		$ 602.858.073	$ 30.142.904,00	$ 572.715.169,31	PAGO
Cuenta 7	24 de julio a 23 de agosto de 2025	$ 401.305.466,12	$ 128.417.749,16		$ 529.723.215	$ 26.486.161,00	$ 503.237.054,27	PAGO
Cuenta 8	24 de agosto a 23 de septiembre de 2025	$ 579.980.185,61	$ 185.593.659,39	$ 87.952.800,00	$ 853.526.645	$ 42.676.332,00	$ 810.850.313,00	PAGO
Cuenta 9	24 de septiembre 23 de octubre de 2025	$ 680.043.365,15	$ 217.613.876,85		$ 897.657.242	$ 44.882.862,00	$ 852.774.380,00	PAGO
Cuenta 10	24 de octubre 23 de noviembre de 2025	$ 859.061.386,12	$ 274.899.643,56		$ 1.133.961.030	$ 56.698.051,00	$ 1.077.262.978,68	PAGO
Cuenta 11	24 de noviembre 23 de diciembre de 2025	$ 213.437.773,48	$ 68.300.087,52		$ 281.737.861	$ 14.086.893,00	$ 267.650.968,00	PAGO
Cuenta 12	24 de diciembre 2025 a 23 de enero de 2026	$ 521.666.470,27	$ 166.933.270,49		$ 688.599.741	$ 34.429.987,00	$ 654.169.753,76	PAGO

Pagos Efectuados	Periodo	Costos Directos	AIU	Suministro	Valor Total Acta	Retegarantía 5%	Total, a Girar	Estado
Cuenta 13	24 de enero de 2026 a 23 de febrero de 2026	$ 574.995.207,87	$ 183.998.466,52		$ 758.993.674	$ 37.949.684,00	$ 721.043.990,39	PAGO
Cuenta 14	24 de febrero de 2026 a 23 de marzo de 2026	$ 599.348.217,04	$ 191.791.429,45		$ 791.139.646	$ 39.556.982,00	$ 751.582.664,49	PAGO
Cuenta 15	24 de marzo de 2026 a 23 de abril de 2026	$ 585.733.886,36	$ 187.434.843,64		$ 773.168.730	$ 38.658.437,00	$ 734.510.293,00	
TOTAL		**$ 7.763.811.347,81**	**$ 2.484.419.631,70**		**$ 12.037.110.645,00**	**$ 601.855.532,00**	**$ 9.949.162.155,51**	

TOTAL, FACTURADO ACTA No 15	$	773.168.730
TOTAL FACTURADO , ACUMULADO	$	12.037.110.645
SALDO POR FACTURAR	**$**	**8.216.956.920**

29. PUNTAJE

Esta información se encuentra en el Anexo 14. Puntaje.

30. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se presenta un avance del 56.53% en la ejecución respecto a lo solicitado en el anexo técnico para la vigencia 2026, esto se traduce en un 5.56 % por encima de lo solicitado

- Por otro lado, se logra la ejecución del total del valor de la adición 1

- Se han presentado condiciones climáticas adversas que se han presentado en los diseños de la adición, por tal motivo hemos realizado jornadas diurnas de trabajo donde el PMT lo ha permitido para disminuir este retraso.

- Respecto al estado de Gerreferenciación:

    - Para la cuenta 1 se tienen 9 ID's, los 9 están APROBADOS por SDM.
    - Para la cuenta 2 se tienen 6 ID's, 6 están APROBADOS por SDM.
    - Para la cuenta 3 se tienen 11 ID's, 11 están APROBADOS por SDM.
    - Para la cuenta 4 se tienen 15 ID's, 15 están APROBADOS por SDM.
    - Para la cuenta 5 se tienen 17 ID's, 17 están APROBADOS por SDM.
    - Para la cuenta 6 se tienen 9 ID's, 9 están APROBADOS por SDM.
    - Para la cuenta 7 se tienen 12 ID's, 12 están APROBADOS por SDM.
    - Para la cuenta 8 se tienen 21 ID's, 21 están APROBADOS por SDM.
    - Para la cuenta 9 se tienen 9 ID's, 9 están APROBADOS por SDM.
    - Para la cuenta 10 se tienen 11 ID's, 11 están APROBADOS por SDM.
    - Para la cuenta 11 se tiene 1 ID, 1 están APROBADOS por SDM.
    - Para la cuenta 12 se tiene 7 ID, 7 están APROBADOS por SDM.
    - Para la cuenta 13 se tiene 7 ID's, 7 están APROBADOS por SDM.
    - Para la cuenta 14 se tiene 13 ID's, 11 están APROBADOS por SDM y 2 estan en REVISION SDM.
    - Para la cuenta 15 se tiene 11 ID's en desarrollo de georreferenciación.

31. ANEXOS

ANEXO 1. Pólizas

ANEXO 2. Plan de Manejo de Tránsito

ANEXO 3. Aspectos Técnicos

ANEXO 4. Consultas Reservas

ANEXO 5. Plan de Calidad

ANEXO 6. Acta de entrega a almacén

ANEXO 7. Certificados de calibración

ANEXO 8. Señales retiradas en vía

ANEXO 9. Gestión social

ANEXO 10. Gestión seguridad y salud en el trabajo

ANEXO 11. Certificación honorarios y parafiscales

ANEXO 12. Certificación pago de proveedores

ANEXO 13. Balance presupuestal

ANEXO 14. Puntaje
