INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**4**	FECHA:	4	de	JUNIO	de	2026
PERIODO: DEL	1 de MAYO de 2026	AL	31	de	MAYO	de	2026
CONTRATO No:	**IPVO 030-2025**	DE		RECURSOS:	REGALÍAS		

OBJETO:

MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACA

LOCALIZACIÓN:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA GUATEQUE, BOYACÁ

Registro BPIN proyecto:	**202500415008**

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
PSI INGENIEROS SAS	**LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ**
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
CONSORCIO INTERVALLE 2026	**TIERRASUA S.A.S**

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0.00	

VALOR INICIAL:	$ 2,411,687,093.33	VALOR ADICIONALES:	$ 0.00	VALOR TOTAL:	$ 2,411,687,093.33

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	24	de	SEPTIEMBRE	de	**2026**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	24	de	SEPTIEMBRE	de	**2026**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**42.4%**	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**23.00%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**28.7%**



INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	TIERRASUA ¡Conectamos región!

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA												
No PÓLIZA	175391	ANEXO No.	4	ASEGURADORA	CESCE COLOMBIA S.A			FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
									2	3	2026

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Cumplimiento del contrato	24	2	2026	24	3	2027	$ 241.168.709,33
Buen manejo y correcta inversión el anticipo	24	2	2026	24	3	2027	$ 723.506.127,99
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones labores	24	2	2026	24	9	2029	$241.168.709,33
Estabilidad y calidad de la obra	24	2	2026	24	9	2031	$ 482.337.418,66

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA												
No PÓLIZA	18141	ANEXO No.	4	ASEGURADORA	CESCE COLOMBIA S.A			FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
									2	3	2026

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Básico-Predios, labores y operaciones (PLO)	24	2	2026	24	6	2026	$ 525,271,500.00
Vehículos propios y no propios	24	2	2026	24	6	2026	$ 525,271,501.00
Patronal	24	2	2026	24	6	2026	$ 525,271,502.00
Contratista y Subcontratista	24	2	2026	24	6	2026	$ 525,271,503.00

ESTADO DEL TIEMPO							
BUENO		REGULAR		MALO	x	PÉSIMO	
Descripción: Durante el periodo de mayo se presento estado de tiempo malo, se presentaron lluvias fuertes en el sector y en las horas de la noche							

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)			
DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	24	2	2026

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Actividades administrativas correspondientes al contrato de obra.	I.E.T.V.T
Continuación del acopio de materiales (agregados, cemento y acero) para la elaboración de concreto destinado a las zapatas de la cubierta del escenario recreativo	I.E.T.V.T
Seguimiento del replanteo de ejes para la ubicación del acero de refuerzo en las zapatas de los ejes A y B.	I.E.T.V.T
Instalación de acero de refuerzo para las zarpas de las zapatas de los ejes A y B (cimentación de la cubierta del escenario deportivo)	I.E.T.V.T
Fundición de las zarpas de las zapatas del eje	I.E.T.V.T

Se continuó con el apuntalamiento en madera e instalación de parales, de acuerdo con el plan de acción radicado ante la interventoría.	I.E.T.V.T
Excavación para la viga de amarre en 3 secciones para el eje A	I.E.T.V.T
Ejecución de medidas de contingencia debido a la pérdida de soporte del material de cimentación en los bloques de la institución educativa, biblioteca y zona de baños. Se continuó con el apuntalamiento en madera e instalación de parales.	I.E.T.V.T
Encofrado, armado de testeros y fundida de concreto simple para la viga de enlace de la cimentación en el eje A.	I.E.T.V.T
ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Actividades administrativas correspondientes al contrato de obra.	I.E.T.V.T
Monitoreo y evaluación del avance de las metas físicas establecidas en el Plan de Acción y Contingencia.	I.E.T.V.T
Verificando la efectividad de las medidas adoptadas por el contratista ante el retraso registrado	I.E.T.V.T
Control y supervisión durante las etapas de encofrado, colocación de testeros y posterior vaciado del concreto para la viga de enlace del eje A.	I.E.T.V.T
Se realizó el seguimiento a la consistencia de la mezcla (asentamiento), procesos de vibrado	I.E.T.V.T
Ante la persistencia de la ola invernal, se solicita al contratista mantener sistemas de bombeo activos en las excavaciones de las zapatas adyacentes y proteger con polietileno los sectores excavados para evitar la saturación de los suelos de fundación y el desprendimiento de taludes	I.E.T.V.T
. Supervisión técnica de la instalación del apuntalamiento en madera y parales metálicos, asegurando que las medidas ejecutadas por el contratista coincidan con el plan de contingencia radicado	I.E.T.V.T
instalado para la viga de enlace de la cimentación en el eje A. Se verificaron diámetros, espaciamientos, traslapos y amarres de acuerdo con los planos estructurales vigentes.Control y supervisión durante las etapas de encofrado, colocación de testeros y posterior vaciado del concreto para la viga de enlace del eje A	I.E.T.V.T

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
Cargador	Cargue de material de excavación	50%	Preoperacionales de la maquina
Volquetas sencillas	Cargue de material de excavación	50%	Documentación legal y del vehiculo, recomendaciones de seguridad
Vibrador de concreto	Vibración en zapatas y viga de amarre	30%	Se recomienda el uso de EPPS, inspeccion y mantenimiento

Mezcladora de concreto	Mezcla de concreto de ciclopeo y zapatas	70%	Se recomienda el uso de EPPS, inspeccion y mantenimiento
Nivel	Nivelación de terreno	80%	Certificado de calibración del equipo

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
Afirmado	AGREGADOS VALLE DE TENZA	Se anexa ensayos de afirmado
Cemento Estructural	CEMENTOS ARGOS SOGAMOSO	Se anexa certificado del suministro actualizado
Acero de Refuerzo	DISTRIBUIDORA FERREACEROS SAS	Se anexa certificado del suministro actualizado
Arena		No se anexa soporte de suministro
Gravilla		No se anexa soporte de suministro
Acero de Refuerzo de 420	DISTRIBUIDORA FERREACEROS SAS	Se anexa certificado del suministro actualizado

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO	13	3	2026	$ 723,506,128
ACTA PARCIAL No.				
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 723,506,128.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO				N/A
ACTA PARCIAL No.				N/A
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				

CORRESPONDENCIA PRESENTADA			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
05/05/2026	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	22.1 CO-IPVO-030-2025-OF-022	Respuesta a oficio INT-053-OF-025 – Requerimiento preventivo y correctivo por acumulación de aguas en excavaciones
05/05/2026	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2027	CO-IPVO-030-2025-OF-023	Bitácora contrato de obra
07/05/2026	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2028	CO-IPVO-030-2025-OF-021	Respuesta oficio int-053-of-017
08/05/2026	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2029	CO-IPVO-030-2025-OF-024	Informe seguimiento, acorde a compromisos pactados en comité de obra no. 007 ipvo030-2025
08/05/2026	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2030	CO-IPVO-030-2025-OF-025	Remisión documentos soporte orden de giro anticipo No.3

13/05/2026	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2031	CO-IPVO-030-2025-OF-026	Remisión documentos soporte orden de giro anticipo No.4
25/05/2026	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2032	CO-IPVO-030-2025-OF-028	Solicitud Aprobación de acta de mayores y menores cantidades de obra
28/05/2026	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2033	CO-IPVO-030-2025-OF-029	Remisión documentos soporte orden de giro anticipo No.5
28/05/2026	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2034	CO-IPVO-030-2025-OF-030	Aclaración estado de pago Factura Electrónica FEME139 – Orden de Giro No. 5 al proveedor M&E COMPANY COLOMBIA SAS
02/05/2026	TIERRASUA/PSI INGENIEROS SAS	SEMANAL 9	Avance Semanal No 9 del 27 abril al 01 de mayo de 2026
02/05/2026	PSI INGENIEROS SAS	INT-053-OF-022	INT-053-OF-022 Oficio de aprobación de documentos anticipo 1
02/05/2026	PSI INGENIEROS SAS	INT-053-OF-023	INT-053-OF-023 Oficio de aprobación de documentos anticipo 2
02/05/2026	PSI INGENIEROS SAS	INT-053-OF-024	Observaciones al informe mensual No. 2 de obra
04/05/2026	PSI INGENIEROS SAS	INT-053-OF-025	INT-053-OF-025-Requerimiento preventivo y correctivo - Control de aguas en excavaciones - Obra IE Técnica Valle de Tenza
04/05/2027	TIERRASUA	INFORME MENSUAL ABRIL	Informe mensual de abril
07/05/2026	TIERRASUA	SEMANAL 10	Avance Semanal No 10 del 05 de mayo al 08 de mayo de 2026
07/05/2027	PSI INGENIEROS SAS	Informe corregidos febrero y marzo	Remisión Informes Corregidos Mensuales de Actividades y Seguimiento – Febrero y Marzo 2026

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	

11/05/2026	PSI INGENIEROS SAS	INT-053-OF-026	Respuesta a remisión de documentos soporte y aprobación de orden de giro de anticipo No. 3, contrato de obra IPVO 030-2025
11/05/2026	PSI INGENIEROS SAS	INT-053-OF-027	Reiteración Formal Requerimientos Técnicos y Administrativos - Contrato 030-2025 - Oficio INT-053-OF-027
15/05/2026	PSI INGENIEROS SAS	Semanal 11	Semanal No.11 del 11 de mayo al 15 de mayo de 2026
26/05/2025	PSI INGENIEROS SAS	Modificatorio No.1 al contrato de obra	Observaciones y aprobación técnica del Balance de Mayores y Menores Cantidades, contrato de obra IPVO 030-2025.
27/05/2026	TIERRASUA/PSI INGENIEROS SAS	INT-053-OF-031	Reiteración #2 formal de requerimientos técnicos y administrativos – Contrato de Obra No. 030-2025 Referencia: Oficio No. INT-053-OF-024 y reiteración oficio INT-053-OF-027
28/05/2026	TIERRASUA SAS PSI INGENIEROS SAS	Semanal 12 y 13	Avance Semanal No.13 del 25 de mayo al 29 de mayo de 2026.

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO DESDE dd	DESDE mm	DESDE aaaa	HASTA dd	HASTA mm	HASTA aaaa
EMETERIO VARGAS ESPINOZA	72.324.884	x	x	x	9	3	2026			
PABLO EDILSON SALAMANCA M	72.326.961	x	x	x	9	3	2026			
JOSE ARMANDO MORALES	1,052,790,067	x	x	x	20	4	2026			
CARLOS GREGORIO PEREZ	6,424,123	x	x	x	20	4	2026			
EDWARD MAURICIO GOMEZ LEGUIZAMO	1,023,036,108	x	x	x	24	4	2026			
MARIO BARRERA CASTILLO	4.130.793	x	x	x	22	5	2026			
LUIS ABELARDO PINTO RAMOS	1,049,797,274	x	x	x	20	4	2026			
LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ	1.049.603.584	x	x	x	1	2	2026			
EDWIN CAMILO SICHACA CUERVO	1.049.602.110	x	x	x	1	2	2026			
CAMILO ANDRES LANCHEROS COY	1.053.330.598	x	x	x	1	2	2026			
OSCAR FABIAN PACHECO MERCHA	1.049.606.085	x	x	x	1	2	2026			
IVAN DARIO SICHACA GAMEZ	1.049.644.688	x	x	x	1	2	2026			
EMILIO BLADIMIR PANQUEVA ALVAREZ	7.318.490	x	x	x	1	2	2026			
Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?								SI	X	NO

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ	1.049.603.584
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ	1.049.603.584
RESIDENTE DE OBRA	EDWIN CAMILO SICHACA CUERVO	1.049.602.110
INGENIERO ELECTRICO	CAMILO ANDRES LANCHEROS COY	1.053.330.598
INGENIERO EN HIDRAULICA	OSCAR FABIAN PACHECO MERCHA	1.049.606.085
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	IVAN DARIO SICHACA GAMEZ	1.049.644.688
PROFESIONAL HSEQ	EMILIO BLADIMIR PANQUEVA ALVAREZ	7.318.490
Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?		SI X NO

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	DIEGO FERNANDO SANDOVAL CUEVAS	1.057.546.791
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	LUIS CARLOS ARCHILA ADARME	7.184.837
RESIDENTE DE OBRA	DANNA TATIANA JIMENEZ RIVERA	1.049.654.004
INGENIERO ELECTRICO	JOAN GERARDO ORTEGA GARZON	1.101.687.793
INGENIERO EN HIDRAULICA	ELKIN GIOBANI SANDOVAL AVILA	1.057592064
PROFESIONAL DE ASEGURAMIENTO O GESTIÓN DE CALIDAD	FABIO MERCK RAMIREZ POVEDA	79.691.429

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
CONTRATO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CHARLAS AMBIENTALES Y SST
MANEJO Y DISPOSICION DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN
MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVECIONALES Y ESPECIALES
EXAMENES DE OCUPACIONALES DEL NUEVO PERSONAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
DESCRIPCIÓN
SOLICITUD AL SEGUIMIENTO DEL PMA Y AL PLAN SST
VERIFICACION DE CAPACITACIONES
VERIFICACION DE AFILICIÓN DEL PERSONAL
SEGUIMIENTO AL USO Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE EPP
ACOMPAÑAMIENTO DE CHARLAS DE SEGURIDAD
VERIFICACIÓN DE INSPECCIONES PERIODICAS DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS				
POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Resistencia a la compresión de concreto de 3000 psi de para zapatas	28	5	2026	
Resistencia a la compresión de concreto de 3000 psi de para zapatas	1	6	2026	
Resistencia a la compresión de concreto de 3000 psi de para zapatas	29	5	2026	
Resistencia a la compresión de concreto de 3000 psi de para zapatas	1	6	2026	
Resistencia a la compresión de concreto de 3000 psi de para zapatas	1	6	2026	
Afirmado	11	3	2026	
Cemento Estructural				Certificado expedido por el distribuidor
Acero de Refuerzo				Certificado expedido por el distribuidor

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Prueba de cilindros de ciclopeo de 2500 psi de zapatas	9	5	2026	Cumple con la resistencia
Prueba de cilindros de concreto de 3000 psi de para zapatas	9	5	2026	Cumple con la resistencia

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
Afirmado	Agregados Valle de Tenza	17.7	

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Comité 008 del 06 de mayo	6	5	2026	Se realiza recorrido para verificación del plan de accion y contingencia y se realiza seguimiento a compromisos del comité 006
Comité 009 del 19 de mayo	19	5	2027	Se realiza socialización del avance de obra y retraso, se proyecta hacer el balance de mayores y menores despues de la socialización a las autoridades municipales y educativas
Comité 010 del 21 de mayo	21	5	2026	Socializar con las autoridades de la institución educativa, autoridad del municipio las condiciones actuales de la obra, los hallazgos técnicos derivados de las actividades de demolición y excavación, y someter a aprobación las consideraciones técnicas complementarias necesarias para garantizar la estabilidad estructural de las edificaciones colindantes y la seguridad de los usuarios.

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
INFORME SEMANAL 10	4	5	2026	8	5	2026	
INFORME SEMANAL 11	11	5	2026	15	5	2026	
INFORME SEMANAL 12	18	5	2026	22	5	2026	
INFORME SEMANAL 13	25	5	2026	29	5	2026	

OBSERVACIONES: De acuerdo al pago de seguridad del personal de obra se anexan del mes anterior, ya que se efectua el pago de planilla al mes vencido

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	TIERRASUA ¡Conectamos región!

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*	VERIFICACIÓN	FOLIOS No.
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	78
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	YA SE RADICO	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	YA SE RADICO	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	SI	117
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	SI	143
Amortización del anticipo	N.A.	
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra	SI	161
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.	N.A.	
Memorias y planos de diseño aprobados	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	163
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	YA SE RADICO	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	181
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	196
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	198
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	SI	269
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)	SI	279
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	SI	282
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes	SI	311
Generales		
Registro fotográfico	SI	314
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	323

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere nec
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO)
Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

NOMBRE: **YILMAR MEDINA ANDRADE**
R/L Consorcio Intervalle 2026

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

INFORME DE OBRA

INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO MENSUAL NÚMERO 3

INFORME DE OBRA CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DEL 2026

PSI INGENIEROS S.A.S
MUNICIPIO DE GUATEQUE
2026.

INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO MENSUAL NÚMERO 3

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DEL 2026

PRESENTADO POR: LUIS EDUARDO SICHACÁ GAMEZ
R/L PSI INGENIEROS S.A.S

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO

PSI INGENIEROS S.A.S
MUNICIPIO DE GUATEQUE
2026.

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS**
V 1.0	31/05/2026	Emisión inicial PSI INGENIEROS para Revisión y comentarios de la interventoría CONSORCIO INTERVALLE 2026 Y LA SUPERVISIÓN TIERRASUA S.A.S.

ELABORACIÓN PSI INGENIEROS S.A.S	**REVISIÓN** CONSORCIO INTERVALLE 2026 S.A.S	**APROBACIÓN** TIERRASUA S.A.S
ARQ. EDWIN CAMILO SICHACA CUERVO PSI INGENIEROS S.A.S **RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA**	ING. YILMAR MEDINA ANDRADE CONSORCIO INTERVALLE 2026 **R/L INTERVENTORÍA**	ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO **SUPERVISOR TIERRASUA S.A.S**

TABLA CONTENIDO

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 6
2. COMPONENTE TÉCNICO - ADMINISTRATIVO 7
2.1 OBJETIVO GENERAL: 7
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 7
2.3 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 7
CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA 8
2.4 ETAPAS DE INTERVENCION 8
3. RESUMEN GENERAL CONTRATOS 9
RESUMEN CONTRATO DE OBRA 10
4. POLIZAS DE CUMPLIMIENTO 10
4.1 RELACIÓN DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA 11
5. PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATO DE OBRA 13
6. MAQUINARIA Y EQUIPO 13
7. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 14
7.1 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS TOTALES SEGÚN PROPUESTA 14
8. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS 19
9. ANALISIS CANTIDADES EJECUTADAS VS PROYECTADAS EN EL PROYECTO 26
9.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 27
10. ENSAYOS DE LABORATORIO Y CALIDAD DE MATERIALES Y PRODUCTOS. 32
11. CONTROL ADMINISTRATIVO 33
11.1 REVISIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR CONTRATISTA, ENTIDAD 33
11.2 RECIBO Y ENVIÓ DE OFICIOS REFERENTES AL PROYECTO 34
12. ESTADO DEL TIEMPO: 36
13. COMPONENTE SOCIAL Y AMBIENTAL 38
14. CONCLUSION GENERAL 38
15. LISTA DE ANEXOS 39

Ilustración 1: Localización del municipio de Guateque en el departamento de Boyacá 8
Ilustración 2: Cerramiento perimetral proyectado para la obra 9
Ilustración 4: instalación de cerramiento perimetral 25
Ilustración 5: demolición de obras en concreto 26
Ilustración 6: demolición de muro en mampostería 27
Ilustración 7: Desmonte malla eslabonada 27

Ilustración 8. Cargue y transporte de materiales sueltos: 28
Ilustración 9: Excavación manual zonas de urbanismo 29

Tabla 1: Resumen general contrato de obra 10
Tabla 2: Relación de pólizas contrato de obra 11
Tabla 3: Profesionales: 13
Tabla 4: Equipos utilizados: 13
Tabla 5: Actividades contratadas: 14
Tabla 6: Actividades ejecutadas en el periodo mensual: 19
Tabla 7: programado vs ejecutado en el periodo mensual 24
Tabla 8: Comités de obra en el periodo 30
Tabla 9: Relación de correspondencia enviada 31
Tabla 10: Relación de correspondencia recibida. 32

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el informe de ejecución de obra acorde al periodo de ejecución, correspondiente al periodo del **01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DEL 2026**, elaborado por **PSI INGENIEROS S.A.S** en cumplimiento de lo establecido por la entidad interventora y los documentos que son parte integral del contrato de obra N° IPVO-030-2025 que tiene por **EL MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,** firmado el día 15 del mes de diciembre del año 2025 entre **TIERRASUA SA.S (SUPERVISOR) Y PSI INGENIEROS S.A.S (CONTRATISTA)** en Tunja y con fecha de inicio del día 23 febrero de 2026.

De esta manera, dentro del presente informe se realiza una descripción de las actividades ejecutadas por parte del contratista, así como de cada uno de los procesos constructivos empleados y demás información concerniente a la ejecución de labores técnicas y administrativas que permitan dar cabal cumplimiento al objeto contractual.

2. COMPONENTE TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

2.1 OBJETIVO GENERAL:

Describir las actividades ejecutadas dentro del periodo reportado con el fin de dar a conocer a la entidad los procesos constructivos empleados en la consecución del objeto del contrato que existen dentro del lugar de ejecución del presente proyecto, y dar a conocer el avance y gestión por parte del contratista.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Realizar el reporte de avance de obra conforme lo ejecutado en obra, ante la supervisión y la interventoría.
- Describir los procedimientos y procesos constructivos en el avance de obra
- Fijar el avance de obra con el fin de determinar porcentajes de adelanto o atraso en la ejecución de las actividades concernientes al proyecto en cuestión.


2.3 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto denominado **EL MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**, se encuentra localizado en la institución educativa valle de Tenza, en el casco urbano del municipio de Guateque es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Boyacá, específicamente en la Provincia del Oriente. Se encuentra a 125 kilómetros al sur de Tunja, la capital departamental, y a 112 kilómetros al este de Bogotá. Guateque fue fundado el 28 de enero de 1636 y tiene una superficie de 36.04 km².

El municipio se caracteriza por su relieve ondulado, quebrado y escarpado, y su principal cuenca hidrográfica es el río Súnuba, formado por la unión de los ríos Aguacias y Machetá. La población de Guateque es de aproximadamente 10,921 personas, de las cuales 6,985 viven en el casco urbano y 2,937 en la zona rural.

Guateque es conocido por su hospitalidad y buen trato hacia los turistas, y cuenta con varios lugares turísticos como el Parque recreacional Colina, el sendero del alto de la burra, y la casa de la cultura. Entre las festividades más importantes se encuentran el Festival de Luces y Cultura, el Cumpleaños de Guateque, y la Semana de la Cultura "Cacique Guatoc".

Ilustración 1: Localización del municipio de Guateque en el departamento de Boyacá

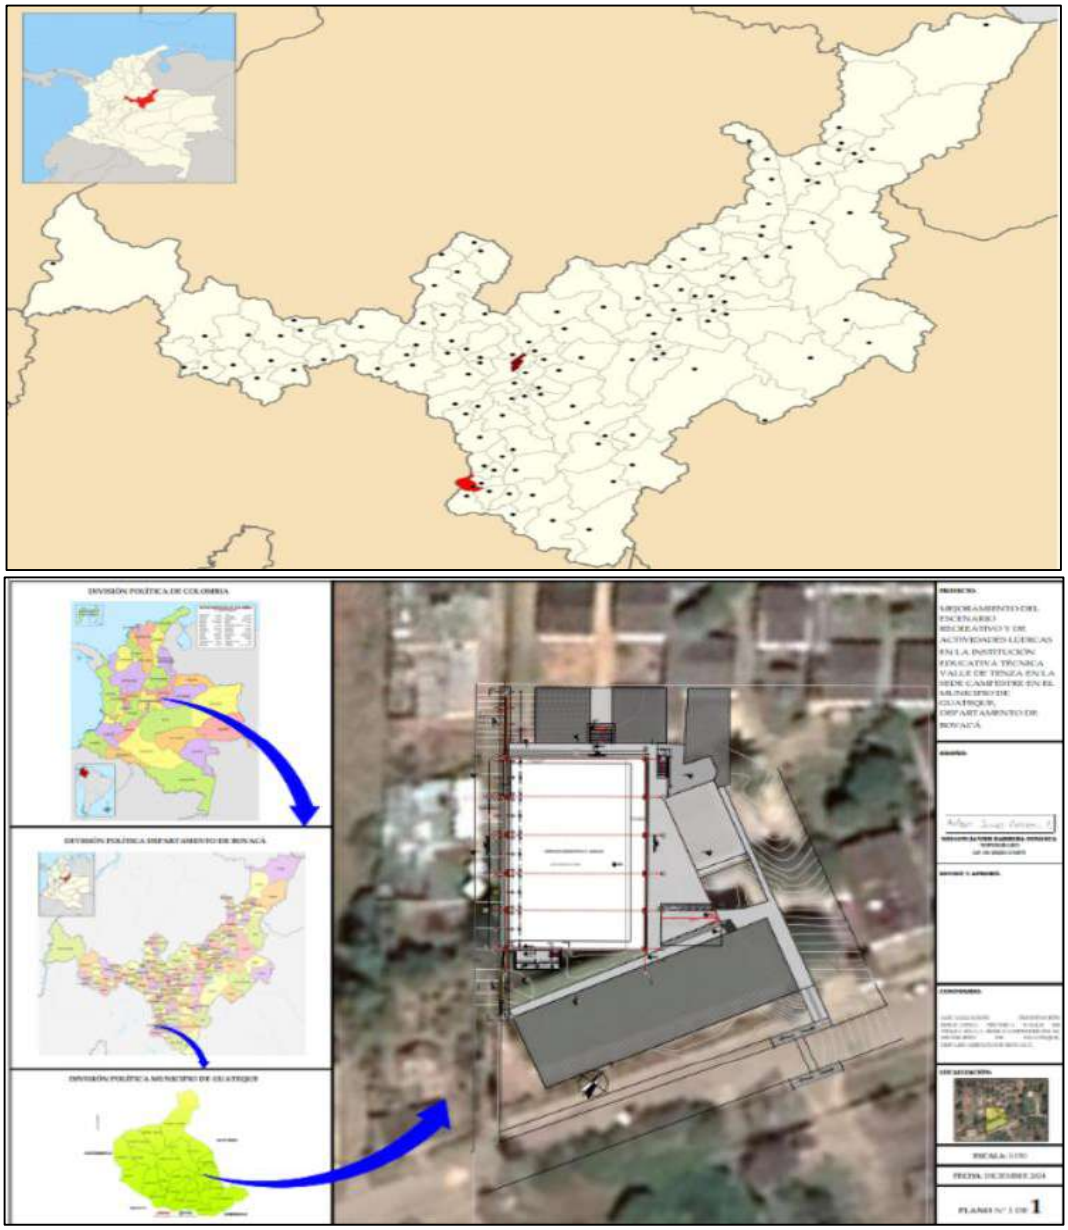


Fuente: Elaboración propia

CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA

2.4 ETAPAS DE INTERVENCION

La primera etapa de intervención consiste en realizar un cerramiento perimetral alrededor del escenario deportivo existente, el cual se contempla en la siguiente imagen:

Ilustración 2: Cerramiento perimetral proyectado para la obra

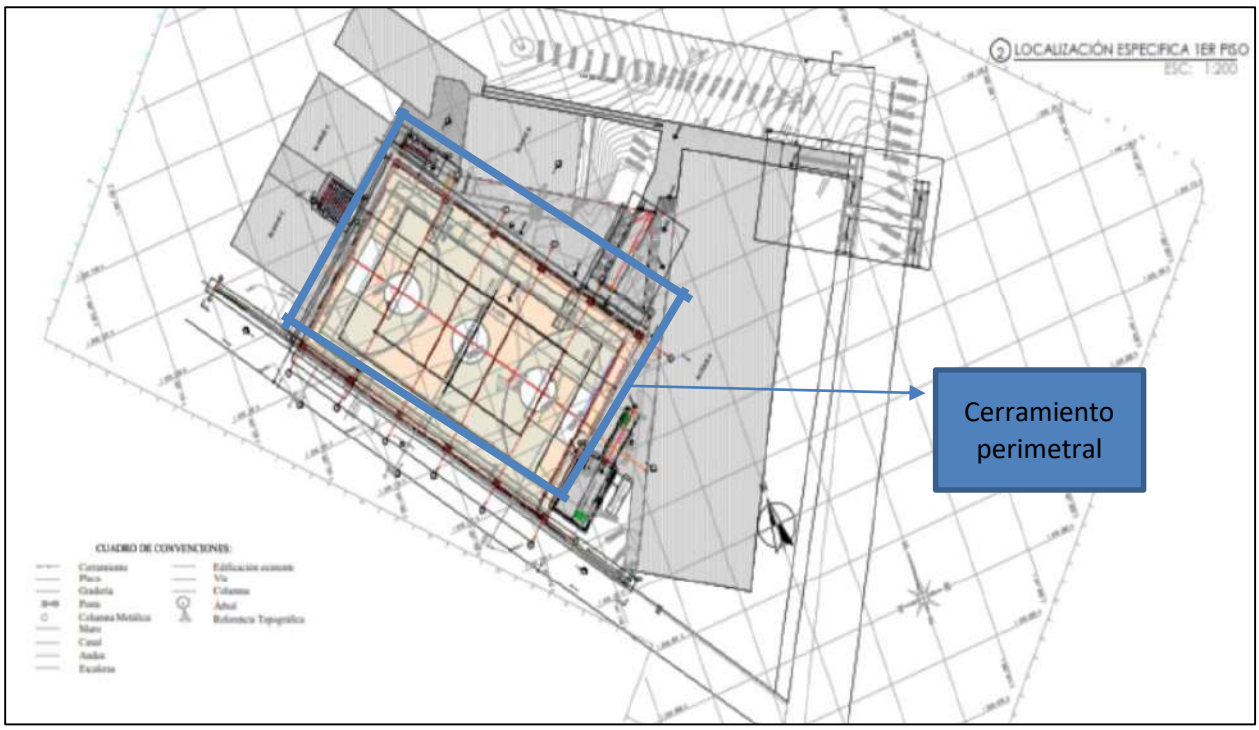

Fuente: Elaboracion propia

La segunda etapa consiste en la demolición del muro de cerramiento del colegio existente incluye estructuras de circulación y conexión entre edificaciones, para lo cual se van a usar internamente retroexcavadoras, martillos demoledores, herramienta manual, las volquetas van a sacar material por la carrera, para lo cual se contará con Controladores de tránsito a la entrada y salida de volquetas, el material producto de las demoliciones, será acopiado en sitio de disposición final autorizado por la alcaldía.

Después viene una etapa de excavaciones para la construcción de la cimentación de la cubierta y finalmente realizar la instalación de la estructura contemplada en el proyecto.

3. RESUMEN GENERAL CONTRATOS

En el presente capítulo se presentan los procesos administrativos generados durante la ejecución del contrato desde su inicio hasta su estado actual, dichos procesos comprenden actas de suspensión, Prorrogas, adiciones presupuestales, actas de cobro, actas de modificación de cantidades. Actas de ítems no previstos entre otros.

RESUMEN CONTRATO DE OBRA

Tabla 1: Resumen general contrato de obra

INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA IPVO-030-2025	
PROCESO DE CONTRATACION:	LICITACIÓN PÚBLICA
NUMERO DE CONTRATO:	No.IPVO-030-2025
CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S
CONTRATISTA:	PSI INGENIERIOS S.A.S NIT. 900.928.849-4 R/L LUIS EDUARDO SICHACÁ GAMEZ C.C. 1.049.603.584 DE TUNJA
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
VALOR INICIAL:	DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MONEDA LEGAL (2.411.687.093,33).
PLAZO INICIAL:	A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA DE INICIO:	24 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fuente: Elaboración propia

Nota: Para este periodo no se realizaron actualizaciones administrativas correspondientes al contrato de obra

4. POLIZAS DE CUMPLIMIENTO

Durante la ejecución del contrato se deben expedir conforme a la ley pólizas de cumplimiento que amparen la ejecución de los contratos tanto de obra, en el presente capítulo se realiza la relación de pólizas. en el siguiente cuadro se presenta la relación de pólizas que hasta la fecha están vigentes:

4.1 RELACIÓN DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA

Tabla 2: Relación de pólizas contrato de obra

POLIZA No.	ANEXO	OBJETO DEL SEGURO	ASEGURADORA
175391	0	GARANTIZAR ELCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONESA CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO,CONTENIDASE N ELCONTRATO Nº IPVO 030-2025, CUYO OBJETOES MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE,DEPARTAMENTO DE BOYACA; EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL A QUE HAYA LUGAR, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS AMPAROS OTORGADOS.	CESCE
18141	0	SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUALQUE SE GENERA POR RECLAMACIONES DE TERCEROS, COMO CONSECUENCIA DE ACTOS, HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA, DERIVADOSDE LA EJECUCIÓN DELCONTRATO Nº IPVO 030-2025 CUYO OBJETOES MEJORAMIENTODELESCENARIORECR EATIVO Y DE ACTIVIDAD ESLUDICAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVATECNICAVALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACA	CESCE
175391	1	MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA UN TRASLADO DE VIGENCIA SEGÚN ACTA DE INICIO DEL 24/02/2026. GARANTIZAR ELCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONESA CARGO DEL	CESCE

		TOMADOR/AFIANZADO,CONTENIDASE N ELCONTRATO Nº IPVO 030-2025, CUYO OBJETOES MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE,DEPARTAMENTO DE BOYACA; EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL A QUE HAYA LUGAR, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS AMPAROS OTORGADOS.	
18141	2	MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA EL AJUSTE AL VALOR ASEGURADO SEGÚN SMMLV DEL AÑO 2026. MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA UN TRASLADO DE VIGENCIA SEGÚN ACTA DE INCIO DEL 24/02/2026 SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SE GENERA POR RECLAMACIONES DE TERCEROS, COMO CONSECUENCIA DE ACTOS, HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº IPVO 030-2025 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDAD ES LUDICAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACA	CESCE

Fuente: Elaboración Propia

Nota: para el presente periodo no se presentaron actualizaciones de pólizas correspondientes al contrato de obra

5. PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 3: Profesionales:

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
1	LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ	1.049.603.584	DIRECTOR DE OBRA Y ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
2	EDWIN CAMILO SICHACA CUERVO	1.049.602.110	ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA
3	NAREM STIP PIÑA RODRIGUEZ	1.049.648.394	INGENIERO AUXILIAR RESIDENTE DE OBRA
4	CAMILO ANDRES LANCHEROS COY	1,053.330.598	INGENIERO ELECTRICO
5	OSCAR FABIAN PACHECO MERCHAN	1.049.606.085	INGENIERO HIDRAULICO
6	EMILIO BALDIMIR PANQUEVA ALVAREZ	7.318.490	PROFESIONAL HSEQ
7	IVAN DARIO SICHACA GAMEZ	1.049.644.688	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

Fuente: Elaboración Propia

6. MAQUINARIA Y EQUIPO

La siguiente tabla relaciona el equipo mínimo según anexo técnico:

Tabla 4: Equipos:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	USO
1	MINICARGADOR	1	DEMOLICION DE CONCRETO, CARGUE DE MATERIALES PRODUCTO DE EXACAVACIONES
2	VOLQUETA	1	CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES PARA LA OBRA Y DE EXCAVACIÓN
3	VIBROCOMPACTADOR RANA	1	COMPACTACION DE RELLENOS EN MATERIAL GRANULAR
4	MONOCILINDRO	1	COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR
5	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	(% M.O)	EXCAVACIONES, MANUALES, DEMOLICIONES DE

			CONCRETO, ENTRE OTROS

Fuente: Elaboración Propia

7. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

7.1 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS TOTALES SEGÚN PROPUESTA

A continuación, se describen las actividades planteadas para el cumplimiento del objeto del contrato.

Tabla 5: Actividades contratadas:

Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIONES**		**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD CONTRACTUAL A**	**DIST (%) B**	**VR UNITARIO COSTO DIRECTO SIN AIU C**	**VALOR UNITARIO (INCLUYE FACTOR DE INCREMENTO Y AIU)**	**VR TOTAL (INLCUYE INCREMENTO POR DISTANCIA) D=A*(C+C*B)**
		GENERAL	**PARTICULAR**							
1				**CAP. 1: REALIZAR PRELIMINARES**						
1,01		2.01.63		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA. (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA).	Metro Cuadrado	934,45	17,00%	$ 3.036,00	$ 4.618,00	$ 3.319.279,00
1,02		3.13.08		CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H = 1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	Metro Lineal	151,26	17,00%	$ 46.814,00	$ 71.204,00	$ 8.284.870,00
1,03		3.13.15		DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	Metro Cúbico	103,63	0,00%	$ 244.449,00	$ 317.784,00	$ 25.332.250,00
1,04		2.01.31		DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	128,75	0,00%	$ 16.461,00	$ 21.399,00	$ 2.119.354,00
1,05		2.01.58		DESMONTE DE MALLA ESLABONADA DE H = 2.0 M.	Metro Lineal	51,50	0,00%	$ 6.046,00	$ 7.860,00	$ 311.369,00
1,06		REFERENCIA 3.12.01		CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES DE DEMOLICION (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	Metro Cúbico	518,44	0,00%	$ 15.101,00	$ 19.631,00	$ 7.828.962,00
Subtotal										**$ 47.196.084,0**
2				**CAP. 2: REALIZAR CIMENTACIÓN Y DESAGUES**						
2,01		3.03.10		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Metro Cúbico	334,26	0,00%	$ 70.516,00	$ 91.671,00	$ 23.570.678,00
2,02		2.05.06		BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	173,14	0,00%	$ 92.874,00	$ 120.736,00	$ 16.080.204,00
2,03		3.12.03		TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	Metro Cúbico-Kilometro	5311,88	0,00%	$ 2.765,00	$ 3.595,00	$ 14.687.348,00
2,04		2.02.25		SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	Metro Cuadrado	15,20	17,00%	$ 33.429,00	$ 50.846,00	$ 594.501,00
2,05		3.03.19		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	Metro Cúbico	29,04	17,00%	$ 599.197,00	$ 911.379,00	$ 20.358.797,00

2,06		3.10.12		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	7030,32	17,00%	$ 7.674,00	$ 11.672,00	$ 63.122.291,00
2,07		2.02.10		CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	Metro Cúbico	29,04	17,00%	$ 918.406,00	$ 1.396.896,00	$ 31.204.497,00
2,08		2.02.13		CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Metro Cúbico	10,60	17,00%	$ 887.295,00	$ 1.349.576,00	$ 11.004.233,00
2,09		2.03.35		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	1341,65	17,00%	$ 7.423,00	$ 11.290,00	$ 11.652.110,00
2,10		2.02.18		LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM.	Metro Cuadrado	617,07	17,00%	$ 107.037,00	$ 162.803,00	$ 77.277.706,00
2,11		3.08.23		CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro Cuadrado	27,96	17,00%	$ 131.537,00	$ 200.068,00	$ 4.302.996,00
2,12		3.05.02		CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO.	Metro Lineal	486,80	17,00%	$ 8.541,00	$ 12.991,00	$ 4.864.578,00
2,13		3.10.06		SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	Metro Lineal	486,80	17,00%	$ 17.061,00	$ 25.950,00	$ 9.717.195,00
2,14		2.02.27		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	Metro Lineal	88,41	17,00%	$ 33.484,00	$ 50.929,00	$ 3.463.575,00
2,15		3.03.02		CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**)	Metro Cúbico	99,02	0,00%	$ 284.811,00	$ 370.254,00	$ 28.201.985,00
2,16		3.13.41		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	Metro Cuadrado	406,69	17,00%	$ 7.326,00	$ 11.143,00	$ 3.485.911,00
Subtotal										**$ 323.588.605,00**
3				**CAP. 3: REALIZAR ESTRUCTURAS**						
3,01		2.03.33		COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < = A 3.0 M. (FORMALETA METALICA).	Metro Cúbico	9,41	17,00%	$ 1.308.131,00	$ 1.989.667,00	$ 14.402.130,00
3,02		3.13.22		SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE CON GRUA DE ESTRUCTURA METALICA	Kilogramo	22.017,30	0,00%	$ 24.344,00	$ 31.647,00	$ 535.989.151,00
3,03		3.13.28		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	Kilogramo	22.017,30	17,00%	$ 4.177,00	$ 6.353,00	$ 107.600.527,00
Subtotal										**$ 657.991.808,00**
4				**CAP. 4: REALIZAR CUBIERTA**						
4,01		2.08.10		SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE SIN TRASLAPO EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA CALIBRE 22	Metro Cuadrado	659,44	17,00%	$ 261.843,00	$ 398.263,00	$ 202.023.605,00
4,02		NUEVO		SUMINISTRO E INSTALACION DE TIMPANO ACERO ESTRUCTURAL GRADO 40 CAL 22	Metro Cuadrado	132,96	0,00%	$ 280.023,00	$ 364.030,00	$ 37.231.858,00
4,03		NUEVO		SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL MICROPERFORADO GALVANIZADO CAL 16, COLOR SEGÚN DISEÑO	Metro Cuadrado	165,86	0,00%	$ 392.345,00	$ 510.049,00	$ 65.074.342,00
Subtotal										**$ 304.329.805,00**
5				**CAP. 5: REALIZAR CERRAMIENTO MAMPOSTERIA REFORZADA**						
5,01		3.03.10		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Metro Cúbico	9,53	0,00%	$ 70.516,00	$ 91.671,00	$ 672.017,00
5,02		2.02.25		SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	Metro Cuadrado	18,80	17,00%	$ 33.429,00	$ 50.846,00	$ 735.304,00

5,03		3.10.12		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	2808,31	17,00%	$ 7.674,00	$ 11.672,00	$ 25.214.636,00
5,04		2.02.13		CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Metro Cúbico	6,37	17,00%	$ 887.295,00	$ 1.349.576,00	$ 6.612.921,00
5,05		2.03.33		COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < = A 3.0 M. (FORMALETA METALICA).	Metro Cúbico	4,87	17,00%	$ 1.308.131,00	$ 1.989.667,00	$ 7.453.600,00
5,06		2.04.20		MURO EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO ESTRUCTURAL E = 0.15 M.	Metro Cuadrado	135,66	17,00%	$ 166.227,00	$ 252.831,00	$ 26.383.915,00
5,07		1.02.09		MORTERO TIPO GROUTING DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,23	17,00%	$ 569.328,00	$ 865.948,00	$ 153.206,00
5,08		2.03.31		VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	5,19	17,00%	$ 1.087.554,00	$ 1.654.170,00	$ 6.603.954,00
5,09		2.07.14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	Metro Cuadrado	46,53	17,00%	$ 11.308,00	$ 17.199,00	$ 615.609,00
5,10		REFERENCIA 3.13.25		PILOTE D = 30 CM. CONCRETO 21MPa - (3000 PSI). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO (INCUYE. EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 5 KM	Metro Lineal	28,50	0,00%	$ 210.721,00	$ 273.937,00	$ 6.005.549,00
Subtotal										**$ 80.450.711,00**
6				**CAP. 6: REALIZAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RED PLUVIAL**						
6,01		3.03.10		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Metro Cúbico	82,04	0,00%	$ 70.516,00	$ 91.671,00	$ 5.785.133,00
6,02		NUEVO		CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. INCLUYE TAPA CON MARCO METALICO	Unidad	6,00	17,00%	$ 823.074,00	$ 1.251.896,00	$ 5.777.979,00
6,03		2.12.113		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 4" PVC	Metro Lineal	43,80	17,00%	$ 55.470,00	$ 84.370,00	$ 2.842.616,00
6,04		5.01.24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	Metro Lineal	68,00	17,00%	$ 41.023,00	$ 62.396,00	$ 3.263.790,00
6,05		5.01.25		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	Metro Lineal	43,00	17,00%	$ 73.153,00	$ 111.266,00	$ 3.680.327,00
6,06		4.01.04		RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	Metro Cúbico	16,21	0,00%	$ 124.266,00	$ 161.546,00	$ 2.014.352,00
6,07		2.05.06		BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	16,21	0,00%	$ 92.874,00	$ 120.736,00	$ 1.505.488,00
6,08		2.12.122		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	15,00	17,00%	$ 20.978,00	$ 31.908,00	$ 368.164,00
6,09		2.06.08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 5" X 3"	Unidad	22,00	17,00%	$ 38.625,00	$ 58.749,00	$ 994.208,00
6,10		NUEVO		SUMIDERO LONGITUDINAL TIPO CARCAMO DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO (INCLUYE CONCRETO FUNDIDO EN SITIO 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, PINTURA Y REJILLA DE TAPA)	Metro Lineal	22,00	17,00%	$ 693.726,00	$ 1.055.157,00	$ 17.856.507,00
6,11		2.08.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	Metro Lineal	6,00	17,00%	$ 75.029,00	$ 114.119,00	$ 526.704,00
Subtotal										**$ 44.615.268,00**
7				**CAP. 7: REALIZAR OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS DEPORTIVOS**						
7,01		3.03.10		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Metro Cúbico	58,02	0,00%	$ 70.516,00	$ 91.671,00	$ 4.091.338,00
7,02		2.05.06		BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	92,86	0,00%	$ 92.874,00	$ 120.736,00	$ 8.624.280,00
7,03		REFERENCIA 2.02.18 Y 3.08.25		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO COLORES SEGÚN DISEÑO CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM.	Metro Cuadrado	233,33	17,00%	$ 170.840,00	$ 259.848,00	$ 46.638.654,00
7,04		3.08.18		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	Metro Cuadrado	4,87	17,00%	$ 117.262,00	$ 178.356,00	$ 668.147,00

7,05		3.08.19		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	Metro Cuadrado	12,90	17,00%	$ 123.513,00	$ 187.863,00	$ 1.864.182,00
7,06		3.10.07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	Kilogramo	242,16	0,00%	$ 22.214,00	$ 28.878,00	$ 5.379.342,00
7,07		8.01.02		CONSTRUCCION DE JARDINES	Metro Cuadrado	15,46	17,00%	$ 395.203,00	$ 601.104,00	$ 7.148.511,00
7,08		2.05.30		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 (30 X 30 X 1.7 CM.)	Metro Cuadrado	617,07	17,00%	$ 132.414,00	$ 201.402,00	$ 95.599.187,00
7,09		2.05.28		PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSÍN DE GRANITO	Metro Cuadrado	617,07	17,00%	$ 62.001,00	$ 94.304,00	$ 44.762.980,00
7,10		2.18.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2" INCL.TABLERO ACRILICO 10 MM PARA ANCLAR AL PISO	Juego	1,00	17,00%	$ 9.737.125,00	$ 14.810.167,00	$ 11.392.436,00
7,11		2.18.08		DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	Metro Lineal	281,44	17,00%	$ 9.162,00	$ 13.935,00	$ 3.016.907,00
7,12		2.18.07		DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	Metro Cuadrado	31,75	17,00%	$ 23.611,00	$ 35.912,00	$ 877.090,00
7,13		2.02.25		SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	Metro Cuadrado	5,70	17,00%	$ 33.429,00	$ 50.846,00	$ 222.938,00
7,14		3.10.12		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	253,21	17,00%	$ 7.674,00	$ 11.672,00	$ 2.273.466,00
7,15		2.02.13		CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Metro Cúbico	2,74	17,00%	$ 887.295,00	$ 1.349.576,00	$ 2.844.490,00
7,16		2.04.20		MURO EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO ESTRUCTURAL E = 0.15 M.	Metro Cuadrado	9,12	17,00%	$ 166.227,00	$ 252.831,00	$ 1.773.709,00
7,17		1.02.09		MORTERO TIPO GROUTING DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,11	17,00%	$ 569.328,00	$ 865.948,00	$ 73.273,00
7,18		2.03.35		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	84,14	17,00%	$ 7.423,00	$ 11.290,00	$ 730.748,00
7,19		2.02.18		LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM.	Metro Cuadrado	48,05	17,00%	$ 107.037,00	$ 162.803,00	$ 6.017.460,00
7,20		3.08.23		CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro Cuadrado	8,55	17,00%	$ 131.537,00	$ 200.068,00	$ 1.315.830,00
7,21		3.08.15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80	Metro Lineal	43,14	17,00%	$ 77.303,00	$ 117.578,00	$ 3.901.776,00
Subtotal										**$ 249.216.744,00**
8				**CAP. 8: REALIZAR INSTALACIÓN RED DE BAJA TENSION, ILUMINACIÓN Y SISTEMA PUESTA A TIERRA**						
8,01		3.03.10		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Metro Cúbico	12,49	0,00%	$ 70.516,00	$ 91.671,00	$ 880.745,00
8,02		2.01.105		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	2,00	17,00%	$ 118.116,00	$ 179.654,00	$ 276.391,00
8,03		2.10.55		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL BIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.8 AWG (2F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1")	Metro Lineal	46,84	17,00%	$ 40.726,00	$ 61.944,00	$ 2.231.899,00
8,04		2.10.109		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG (2F, T) Y DUCTO PVC DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	Unidad	1,00	17,00%	$ 122.640,00	$ 186.535,00	$ 143.489,00
8,05		2.10.67		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL BIFÁSICO EXPUESTO EN CABLE DE COBRE No.12 AWG (2F, N, T). INCLUYE TUBO EMT DE 3/4").	Metro Lineal	91,03	17,00%	$ 32.952,00	$ 50.120,00	$ 3.509.556,00
8,06		2.10.244		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA TIPO FRANKLYN DE 0.6 M PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	Unidad	8,00	17,00%	$ 126.156,00	$ 191.883,00	$ 1.180.820,00

8,07		2.10.248		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN DE 8 MM PARA ANILLO SUPERIOR DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	Metro Lineal	157,69	17,00%	$ 19.745,00	$ 30.032,00	$ 3.642.899,00
8,08		2.10.250		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE APANTALLAMIENTO EN ALAMBRÓN DE 8 MM EXPUESTA EN TUBO IMC DE 3/4"	Metro Lineal	28,00	17,00%	$ 54.124,00	$ 82.323,00	$ 1.773.102,00
8,09		2.10.252		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 1/0 PARA ANILLO INFERIOR DE APANTALLAMIENTO	Metro Lineal	104,23	17,00%	$ 42.463,00	$ 64.586,00	$ 5.178.325,00
8,10		2.10.256		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 PARA S.P.T. Y/O SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	Unidad	8,00	17,00%	$ 87.260,00	$ 132.722,00	$ 816.754,00
8,11		2.10.243		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).	Unidad	5,00	17,00%	$ 596.507,00	$ 907.287,00	$ 3.489.566,00
8,12		2.10.81		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFASICO DE 12 CIRCUITOS.	Unidad	1,00	17,00%	$ 279.702,00	$ 425.427,00	$ 327.251,00
8,13		NUEVO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION DE 4 CIRCUITOS	Unidad	1,00	0,00%	$ 2.671.481,00	$ 3.472.925,00	$ 2.671.481,00
8,14		2.10.196		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO HIGH BAY DE 100 W	Unidad	8,00	17,00%	$ 491.430,00	$ 747.465,00	$ 4.599.785,00
8,15		2.10.208		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PARA RIEL DE 1 X 20 AMP.	Unidad	3,00	17,00%	$ 27.351,00	$ 41.601,00	$ 96.002,00
8,16		2.10.218		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PARA RIEL DE 2 X 20 AMP.	Unidad	1,00	17,00%	$ 54.310,00	$ 82.606,00	$ 63.543,00
8,17		2.10.219		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PARA RIEL DE 2 X 30 AMP.	Unidad	2,00	17,00%	$ 56.020,00	$ 85.206,00	$ 131.087,00
8,18		2.10.220		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PARA RIEL DE 2 X 40 AMP.	Unidad	1,00	17,00%	$ 56.020,00	$ 85.206,00	$ 65.543,00
8,19		2.10.54		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL BIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.10 AWG (2F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 3/4")	Metro Lineal	1,30	17,00%	$ 25.859,00	$ 39.332,00	$ 39.332,00
Subtotal										**$ 31.117.570,00**
9				**CAP. 9: REALIZAR CERRAMIENTO MALLA CONTRAIMPACTO**						
9,01		3.03.10		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Metro Cúbico	2,79	0,00%	$ 70.516,00	$ 91.671,00	$ 196.740,00
9,02		2.02.25		SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	Metro Cuadrado	6,11	17,00%	$ 33.429,00	$ 50.846,00	$ 238.974,00
9,03		2.02.35		SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	493,93	17,00%	$ 7.674,00	$ 11.672,00	$ 4.434.790,00
9,04		REFERENCIA 3.13.25		PILOTE D = 30 CM. CONCRETO 21MPa - (3000 PSI). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO (INCUYE. EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 5 KM	Metro Lineal	13,50	0,00%	$ 210.721,00	$ 273.937,00	$ 2.844.734,00
9,05		2.02.13		CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Metro Cúbico	1,83	17,00%	$ 887.295,00	$ 1.349.576,00	$ 1.899.787,00
9,06		2.19.09		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRAIMPACTO H = 5,0 M.	Metro Lineal	20,00	17,00%	$ 2.360.571,00	$ 3.590.428,00	$ 55.237.361,00
9,07		NUEVO		SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TEJIDA 12X12 EN NYLON DE ALTA TENACIDAD Y RESISTENCIA CALIBRE 5 MM PARA ZONA POSTERIOR DEL ESCENARIO DEPORTIVO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	Metro Cuadrado	120,09	0,00%	$ 101.388,00	$ 131.804,00	$ 12.175.685,00
Subtotal										**$ 77.028.071,00**

				$ 1.815.534.666,0						
				COSTOS INDIRECTOS (AIU)						$ 544.660.400,00
				SUBTOTAL INCLUYE AIU						$ -
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)				NO MODIFICAR		$ 34.492.027,33
				CERTIFICACION RETIE				NO MODIFICAR		$ 8.000.000,00
				CERTIFICACION RETILAP				NO MODIFICAR		$ 9.000.000,00
				VALOR TOTAL						
				VALOR TOTAL						$ 2.411.687.093,33

Fuente: Contrato de Obra

8. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

A continuación, se describen las actividades ejecutadas a la fecha para el cumplimiento del objeto del contrato:

Tabla 6: Actividades ejecutadas en el periodo mensual:

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRACTUAL	DIST (%)	VR UNITARIO COSTO DIRECTO SIN AIU	VALOR UNITARIO (INCLUYE FACTOR DE INCREMENTO Y AIU)	VR TOTAL (INLCUYE INCREMENTO POR DISTANCIA)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR			A	B	C		D=A*(C+C*B)		
1				CAP. 1: REALIZAR PRELIMINARES								
1,01		2.01.63		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA. (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA).	Metro Cuadrado	934,45	17,00 %	$ 3.036,00	$ 4.618,00	$ 3.319.279,00	0,00	$ -

1,02		3.13.08		CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H = 1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	Metro Lineal	151,26	17,00 %	$ 46.814,00	$ 71.204,00	$ 8.284.870,00	0,00	$ -
1,03		3.13.15		DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	Metro Cúbico	103,63	0,00 %	$ 244.449,00	$ 317.784,00	$ 25.332.250,00	7,83	$ 1.914.036,00
1,04		2.01.31		DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	128,75	0,00 %	$ 16.461,00	$ 21.399,00	$ 2.119.354,00	40,80	$ 671.609,00
1,05		2.01.58		DESMONTE DE MALLA ESLABONADA DE H = 2.0 M.	Metro Lineal	51,5	0,00 %	$ 6.046,00	$ 7.860,00	$ 311.369,00	0,00	$ -
1,06		REFERENCIA 3.12.01		CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES DE DEMOLICION (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	Metro Cúbico	518,44	0,00 %	$ 15.101,00	$ 19.631,00	$ 7.828.962,00	162,78	$ 2.458.141,00
Subtotal										**$ 47.196.084,00**		**$ 5.043.786,00**
2				**CAP. 2: REALIZAR CIMENTACIÓN Y DESAGUES**								
2,01		3.03.10		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Metro Cúbico	334,26	0,00 %	$ 70.516,00	$ 91.671,00	$ 23.570.678,00	42,17	$ 2.973.871,00
2,02		2.05.06		BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	173,14	0,00 %	$ 92.874,00	$ 120.736,00	$ 16.080.204,00	0,00	$ -
2,03		3.12.03		TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	Metro Cúbico-Kilometro	5311,88	0,00 %	$ 2.765,00	$ 3.595,00	$ 14.687.348,00	0,00	$ -
2,04		2.02.25		SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	Metro Cuadrado	15,2	17,00 %	$ 33.429,00	$ 50.846,00	$ 594.501,00	7,60	$ 297.251,00
2,05		3.03.19		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	Metro Cúbico	29,04	17,00 %	$ 599.197,00	$ 911.379,00	$ 20.358.797,00	6,99	$ 4.900.413,00
2,06		3.10.12		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	7030,32	17,00 %	$ 7.674,00	$ 11.672,00	$ 63.122.291,00	2643,86	$ 23.738.109,00
2,07		2.02.10		CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	Metro Cúbico	29,04	17,00 %	$ 918.406,00	$ 1.396.896,00	$ 31.204.497,00	26,62	$ 28.604.122,00
2,08		2.02.13		CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Metro Cúbico	10,6	17,00 %	$ 887.295,00	$ 1.349.576,00	$ 11.004.233,00	5,30	$ 5.502.116,00
2,09		2.03.35		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	1341,65	17,00 %	$ 7.423,00	$ 11.290,00	$ 11.652.110,00	0,00	$ -
2,1		2.02.18		LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM.	Metro Cuadrado	617,07	17,00 %	$ 107.037,00	$ 162.803,00	$ 77.277.706,00	0,00	$ -
2,11		3.08.23		CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro Cuadrado	27,96	17,00 %	$ 131.537,00	$ 200.068,00	$ 4.302.996,00	0,00	$ -
2,12		3.05.02		CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO.	Metro Lineal	486,8	17,00 %	$ 8.541,00	$ 12.991,00	$ 4.864.578,00	0,00	$ -
2,13		3.10.06		SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E	Metro Lineal	486,8	17,00 %	$ 17.061,00	$ 25.950,00	$ 9.717.195,00	0,00	$ -

				INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)								
2,14		2.02.27		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	Metro Lineal	88,41	17,00 %	$ 33.484,00	$ 50.929,00	$ 3.463.575,00	0,00	$ -
2,15		3.03.02		CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**)	Metro Cúbico	99,02	0,00 %	$ 284.811,00	$ 370.254,00	$ 28.201.985,00	0,00	$ -
2,16		3.13.41		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	Metro Cuadrado	406,69	17,00 %	$ 7.326,00	$ 11.143,00	$ 3.485.911,00	0,00	$ -
Subtotal										**$ 323.588.605,00**		**$ 66.015.882,00**
3				**CAP. 3: REALIZAR ESTRUCTURAS**								
3,01		2.03.33		COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < = A 3.0 M. (FORMALETA METALICA).	Metro Cúbico	9,41	17,00 %	$ 1.308.131,00	$ 1.989.667,00	$ 14.402.130,00	0,00	$ -
3,02		3.13.22		SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE CON GRUA DE ESTRUCTURA METALICA	Kilogramo	22.017,30	0,00 %	$ 24.344,00	$ 31.647,00	$ 535.989.151,00	4403,46	$ 107.197.830,00
3,03		3.13.28		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	Kilogramo	22.017,30	17,00 %	$ 4.177,00	$ 6.353,00	$ 107.600.527,00	0,00	$ -
3,04		2.02.23		MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) PSI DE 2,01 M. < H < 3,50M.	Metro Cúbico	0,00	17,00 %	$ 1.139.220,00	$ 1.732.753,00	$ 0,00	0,00	$ -
Subtotal										**$ 657.991.808,00**		**$ 107.197.830,00**
4				**CAP. 4: REALIZAR CUBIERTA**								
4,01		2.08.10		SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE SIN TRASLAPO EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA CALIBRE 22	Metro Cuadrado	659,44	17,00 %	$ 261.843,00	$ 398.263,00	$ 202.023.605,00	0,00	$ -
4,02		NUEVO		SUMINISTRO E INSTALACION DE TIMPANO ACERO ESTRUCTURAL GRADO 40 CAL 22	Metro Cuadrado	132,96	0,00 %	$ 280.023,00	$ 364.030,00	$ 37.231.858,00	0,00	$ -
4,03		NUEVO		SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL MICROPERFORADO GALVANIZADO CAL 16, COLOR SEGÚN DISEÑO	Metro Cuadrado	165,86	0,00 %	$ 392.345,00	$ 510.049,00	$ 65.074.342,00	0,00	$ -
Subtotal										**$ 304.329.805,00**		**$ -**
5				**CAP. 5: REALIZAR CERRAMIENTO MAMPOSTERIA REFORZADA**								
5,01		3.03.10		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Metro Cúbico	9,53	0,00 %	$ 70.516,00	$ 91.671,00	$ 672.017,00	0,00	$ -
5,02		2.02.25		SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	Metro Cuadrado	18,8	17,00 %	$ 33.429,00	$ 50.846,00	$ 735.304,00	0,00	$ -

5,03		3.10.12		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	2808,31	17,00 %	$ 7.674,00	$ 11.672,00	$ 25.214.636,00	0,00	$ -
5,04		2.02.13		CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Metro Cúbico	6,37	17,00 %	$ 887.295,00	$ 1.349.576,00	$ 6.612.921,00	0,00	$ -
5,05		2.03.33		COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < = A 3.0 M. (FORMALETA METALICA).	Metro Cúbico	4,87	17,00 %	$ 1.308.131,00	$ 1.989.667,00	$ 7.453.600,00	0,00	$ -
5,06		2.04.20		MURO EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO ESTRUCTURAL E = 0.15 M.	Metro Cuadrado	135,66	17,00 %	$ 166.227,00	$ 252.831,00	$ 26.383.915,00	0,00	$ -
5,07		1.02.09		MORTERO TIPO GROUTING DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,23	17,00 %	$ 569.328,00	$ 865.948,00	$ 153.206,00	0,00	$ -
5,08		2.03.31		VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	5,19	17,00 %	$ 1.087.554,00	$ 1.654.170,00	$ 6.603.954,00	0,00	$ -
5,09		2.07.14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	Metro Cuadrado	46,53	17,00 %	$ 11.308,00	$ 17.199,00	$ 615.609,00	0,00	$ -
5,1		REFERENCIA 3.13.25		PILOTE D = 30 CM. CONCRETO 21MPa - (3000 PSI). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO (INCUYE. EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 5 KM	Metro Lineal	28,5	0,00 %	$ 210.721,00	$ 273.937,00	$ 6.005.549,00	0,00	$ -
Subtotal										**$ 80.450.711,00**		**$ -**
6				**CAP. 6: REALIZAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RED PLUVIAL**								
6,01		3.03.10		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Metro Cúbico	82,04	0,00 %	$ 70.516,00	$ 91.671,00	$ 5.785.133,00		$ -
6,02		NUEVO		CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. INCLUYE TAPA CON MARCO METALICO	Unidad	6	17,00 %	$ 823.074,00	$ 1.251.896,00	$ 5.777.979,00	0,00	$ -
6,03		2.12.113		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 4" PVC	Metro Lineal	43,8	17,00 %	$ 55.470,00	$ 84.370,00	$ 2.842.616,00	0,00	$ -
6,04		5.01.24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	Metro Lineal	68	17,00 %	$ 41.023,00	$ 62.396,00	$ 3.263.790,00	0,00	$ -
6,05		5.01.25		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	Metro Lineal	43	17,00 %	$ 73.153,00	$ 111.266,00	$ 3.680.327,00	0,00	$ -
6,06		4.01.04		RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	Metro Cúbico	16,21	0,00 %	$ 124.266,00	$ 161.546,00	$ 2.014.352,00	0,00	$ -
6,07		2.05.06		BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	16,21	0,00 %	$ 92.874,00	$ 120.736,00	$ 1.505.488,00	0,00	$ -
6,08		2.12.122		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	15	17,00 %	$ 20.978,00	$ 31.908,00	$ 368.164,00	0,00	$ -
6,09		2.06.08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 5" X 3"	Unidad	22	17,00 %	$ 38.625,00	$ 58.749,00	$ 994.208,00	0,00	$ -
6,1		NUEVO		SUMIDERO LONGITUDINAL TIPO CARCAMO DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO (INCLUYE CONCRETO FUNDIDO EN SITIO 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, PINTURA Y REJILLA DE TAPA)	Metro Lineal	22	17,00 %	$ 693.726,00	$ 1.055.157,00	$ 17.856.507,00	0,00	$ -
6,11		2.08.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	Metro Lineal	6	17,00 %	$ 75.029,00	$ 114.119,00	$ 526.704,00	0,00	$ -
Subtotal										**$ 44.615.268,00**		**$ -**

7				**CAP. 7: REALIZAR OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS DEPORTIVOS**							
7,01		3.03.10		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Metro Cúbico	58,02	0,00 %	$ 70.516,00	$ 91.671,00	$ 4.091.338,00	2,49	$ 175.585,00
7,02		2.05.06		BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	92,86	0,00 %	$ 92.874,00	$ 120.736,00	$ 8.624.280,00	0,00	$ -
7,03		REFERENCIA 2.02.18 Y 3.08.25		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO COLORES SEGÚN DISEÑO CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM.	Metro Cuadrado	233,33	17,00 %	$ 170.840,00	$ 259.848,00	$ 46.638.654,00	0,00	$ -
7,04		3.08.18		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	Metro Cuadrado	4,87	17,00 %	$ 117.262,00	$ 178.356,00	$ 668.147,00	0,00	$ -
7,05		3.08.19		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	Metro Cuadrado	12,9	17,00 %	$ 123.513,00	$ 187.863,00	$ 1.864.182,00	0,00	$ -
7,06		3.10.07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	Kilogramo	242,16	0,00 %	$ 22.214,00	$ 28.878,00	$ 5.379.342,00	0,00	$ -
7,07		8.01.02		CONSTRUCCION DE JARDINES	Metro Cuadrado	15,46	17,00 %	$ 395.203,00	$ 601.104,00	$ 7.148.511,00	0,00	$ -
7,08		2.05.30		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 (30 X 30 X 1.7 CM.)	Metro Cuadrado	617,07	17,00 %	$ 132.414,00	$ 201.402,00	$ 95.599.187,00	0,00	$ -
7,09		2.05.28		PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSÍN DE GRANITO	Metro Cuadrado	617,07	17,00 %	$ 62.001,00	$ 94.304,00	$ 44.762.980,00	0,00	$ -
7,1		2.18.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2" INCL.TABLERO ACRILICO 10 MM PARA ANCLAR AL PISO	Juego	1	17,00 %	$ 9.737.125,00	$ 14.810.167,00	$ 11.392.436,00	0,00	$ -
7,11		2.18.08		DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	Metro Lineal	281,44	17,00 %	$ 9.162,00	$ 13.935,00	$ 3.016.907,00	0,00	$ -
7,12		2.18.07		DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	Metro Cuadrado	31,75	17,00 %	$ 23.611,00	$ 35.912,00	$ 877.090,00	0,00	$ -
7,13		2.02.25		SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	Metro Cuadrado	5,7	17,00 %	$ 33.429,00	$ 50.846,00	$ 222.938,00	0,00	$ -
7,14		3.10.12		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	253,21	17,00 %	$ 7.674,00	$ 11.672,00	$ 2.273.466,00	0,00	$ -
7,15		2.02.13		CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Metro Cúbico	2,74	17,00 %	$ 887.295,00	$ 1.349.576,00	$ 2.844.490,00	0,00	$ -
7,16		2.04.20		MURO EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO ESTRUCTURAL E = 0.15 M.	Metro Cuadrado	9,12	17,00 %	$ 166.227,00	$ 252.831,00	$ 1.773.709,00	0,00	$ -
7,17		1.02.09		MORTERO TIPO GROUTING DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,11	17,00 %	$ 569.328,00	$ 865.948,00	$ 73.273,00	0,00	$ -
7,18		2.03.35		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	84,14	17,00 %	$ 7.423,00	$ 11.290,00	$ 730.748,00	0,00	$ -
7,19		2.02.18		LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM.	Metro Cuadrado	48,05	17,00 %	$ 107.037,00	$ 162.803,00	$ 6.017.460,00	0,00	$ -
7,2		3.08.23		CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro Cuadrado	8,55	17,00 %	$ 131.537,00	$ 200.068,00	$ 1.315.830,00	0,00	$ -
7,21		3.08.15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80	Metro Lineal	43,14	17,00 %	$ 77.303,00	$ 117.578,00	$ 3.901.776,00	0,00	$ -

Subtotal										**$ 249.216.744,00**		**$ 175.585,00**
8				**CAP. 8: REALIZAR INSTALACIÓN RED DE BAJA TENSION, ILUMINACIÓN Y SISTEMA PUESTA A TIERRA**								
8,01		3.03.10		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Metro Cúbico	12,49	0,00 %	$ 70.516,00	$ 91.671,00	$ 880.745,00	0,00	$ -
8,02		2.01.105		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	2	17,00 %	$ 118.116,00	$ 179.654,00	$ 276.391,00	0,00	$ -
8,03		2.10.55		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL BIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.8 AWG (2F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1")	Metro Lineal	46,84	17,00 %	$ 40.726,00	$ 61.944,00	$ 2.231.899,00	0,00	$ -
8,04		2.10.109		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG (2F, T) Y DUCTO PVC DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	Unidad	1	17,00 %	$ 122.640,00	$ 186.535,00	$ 143.489,00	0,00	$ -
8,05		2.10.67		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL BIFÁSICO EXPUESTO EN CABLE DE COBRE No.12 AWG (2F, N, T). INCLUYE TUBO EMT DE 3/4").	Metro Lineal	91,03	17,00 %	$ 32.952,00	$ 50.120,00	$ 3.509.556,00	0,00	$ -
8,06		2.10.244		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA TIPO FRANKLYN DE 0.6 M PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	Unidad	8	17,00 %	$ 126.156,00	$ 191.883,00	$ 1.180.820,00	0,00	$ -
8,07		2.10.248		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN DE 8 MM PARA ANILLO SUPERIOR DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	Metro Lineal	157,69	17,00 %	$ 19.745,00	$ 30.032,00	$ 3.642.899,00	0,00	$ -
8,08		2.10.250		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE APANTALLAMIENTO EN ALAMBRÓN DE 8 MM EXPUESTA EN TUBO IMC DE 3/4"	Metro Lineal	28	17,00 %	$ 54.124,00	$ 82.323,00	$ 1.773.102,00	0,00	$ -
8,09		2.10.252		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 1/0 PARA ANILLO INFERIOR DE APANTALLAMIENTO	Metro Lineal	104,23	17,00 %	$ 42.463,00	$ 64.586,00	$ 5.178.325,00	0,00	$ -
8,1		2.10.256		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 PARA S.P.T. Y/O SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	Unidad	8	17,00 %	$ 87.260,00	$ 132.722,00	$ 816.754,00	0,00	$ -
8,11		2.10.243		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).	Unidad	5	17,00 %	$ 596.507,00	$ 907.287,00	$ 3.489.566,00	0,00	$ -
8,12		2.10.81		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFASICO DE 12 CIRCUITOS.	Unidad	1	17,00 %	$ 279.702,00	$ 425.427,00	$ 327.251,00	0,00	$ -
8,13		NUEVO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION DE 4 CIRCUITOS	Unidad	1	0,00 %	$ 2.671.481,00	$ 3.472.925,00	$ 2.671.481,00	0,00	$ -
8,14		2.10.196		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO HIGH BAY DE 100 W	Unidad	8	17,00 %	$ 491.430,00	$ 747.465,00	$ 4.599.785,00	0,00	$ -

8,15		2.10.208		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PARA RIEL DE 1 X 20 AMP.	Unidad	3	17,00 %	$ 27.351,00	$ 41.601,00	$ 96.002,00	0,00	$ -
8,16		2.10.218		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PARA RIEL DE 2 X 20 AMP.	Unidad	1	17,00 %	$ 54.310,00	$ 82.606,00	$ 63.543,00	0,00	$ -
8,17		2.10.219		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PARA RIEL DE 2 X 30 AMP.	Unidad	2	17,00 %	$ 56.020,00	$ 85.206,00	$ 131.087,00	0,00	$ -
8,18		2.10.220		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PARA RIEL DE 2 X 40 AMP.	Unidad	1	17,00 %	$ 56.020,00	$ 85.206,00	$ 65.543,00	0,00	$ -
8,19		2.10.54		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL BIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.10 AWG (2F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 3/4")	Metro Lineal	1,3	17,00 %	$ 25.859,00	$ 39.332,00	$ 39.332,00	0,00	$ -
Subtotal										**$ 31.117.570,00**		**$ -**
9				**CAP. 9: REALIZAR CERRAMIENTO MALLA CONTRAIMPACTO**								
9,01		3.03.10		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Metro Cúbico	2,79	0,00 %	$ 70.516,00	$ 91.671,00	$ 196.740,00	0,00	$ -
9,02		2.02.25		SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	Metro Cuadrado	6,11	17,00 %	$ 33.429,00	$ 50.846,00	$ 238.974,00	0,00	$ -
9,03		2.02.35		SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	493,93	17,00 %	$ 7.674,00	$ 11.672,00	$ 4.434.790,00	0,00	$ -
9,04		REFERENCIA 3.13.25		PILOTE D = 30 CM. CONCRETO 21MPa - (3000 PSI). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO (INCUYE. EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 5 KM	Metro Lineal	13,5	0,00 %	$ 210.721,00	$ 273.937,00	$ 2.844.734,00	0,00	$ -
9,05		2.02.13		CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Metro Cúbico	1,83	17,00 %	$ 887.295,00	$ 1.349.576,00	$ 1.899.787,00	0,00	$ -
9,06		2.19.09		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRAIMPACTO H = 5,0 M.	Metro Lineal	20	17,00 %	$ 2.360.571,00	$ 3.590.428,00	$ 55.237.361,00	0,00	$ -
9,07		NUEVO		SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TEJIDA 12X12 EN NYLON DE ALTA TENACIDAD Y RESISTENCIA CALIBRE 5 MM PARA ZONA POSTERIOR DEL ESCENARIO DEPORTIVO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	Metro Cuadrado	120,09	0,00 %	$ 101.388,00	$ 131.804,00	$ 12.175.685,00	0,00	$ -
Subtotal										**$ 77.028.071,00**		**$ -**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO										**$ 1.815.534.666,00**		**$ 178.433.083,00**
COSTOS INDIRECTOS (AIU)									30%	$ 544.660.400,00		$ 53.529.925,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)										$ 34.492.027,33		$ 4.864.664,57
CERTIFICACION RETIE										$ 8.000.000,00		
CERTIFICACION RETILAP										$ 9.000.000,00		

TOTAL		**$ 2.411.687.093,33**		**$ 236.827.672,57**

Fuente: Elaboración propia


Nota: La memoria de cantidades ejecutadas se presentan en el ANEXO No.1 del presente informe

9. ANALISIS CANTIDADES EJECUTADAS VS PROYECTADAS EN EL PROYECTO

Durante el periodo de ejecución se evidencia que la firma contratista presenta un avance porcentual equivalente a **9.82%** con un valor de ejecución equivalente a **DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOSIENTOS VEINTI SIETE CON SEISIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($236.827.672.57)** incluye la implementación del plan de manejo ambiental con respecto a la programación de obra aprobada por la interventoría y supervisión del proyecto.

A continuación, se presenta una representación gráfica de la curva "S" generada en el periodo mensual con respecto a la programación de obra aprobada por la interventoría y la supervisión del proyecto, lo que indica un porcentaje de retraso del -5.68% de las actividades programadas y ejecutadas por la firma contratista de obra.

Tabla 7: programado vs ejecutado acumulado:

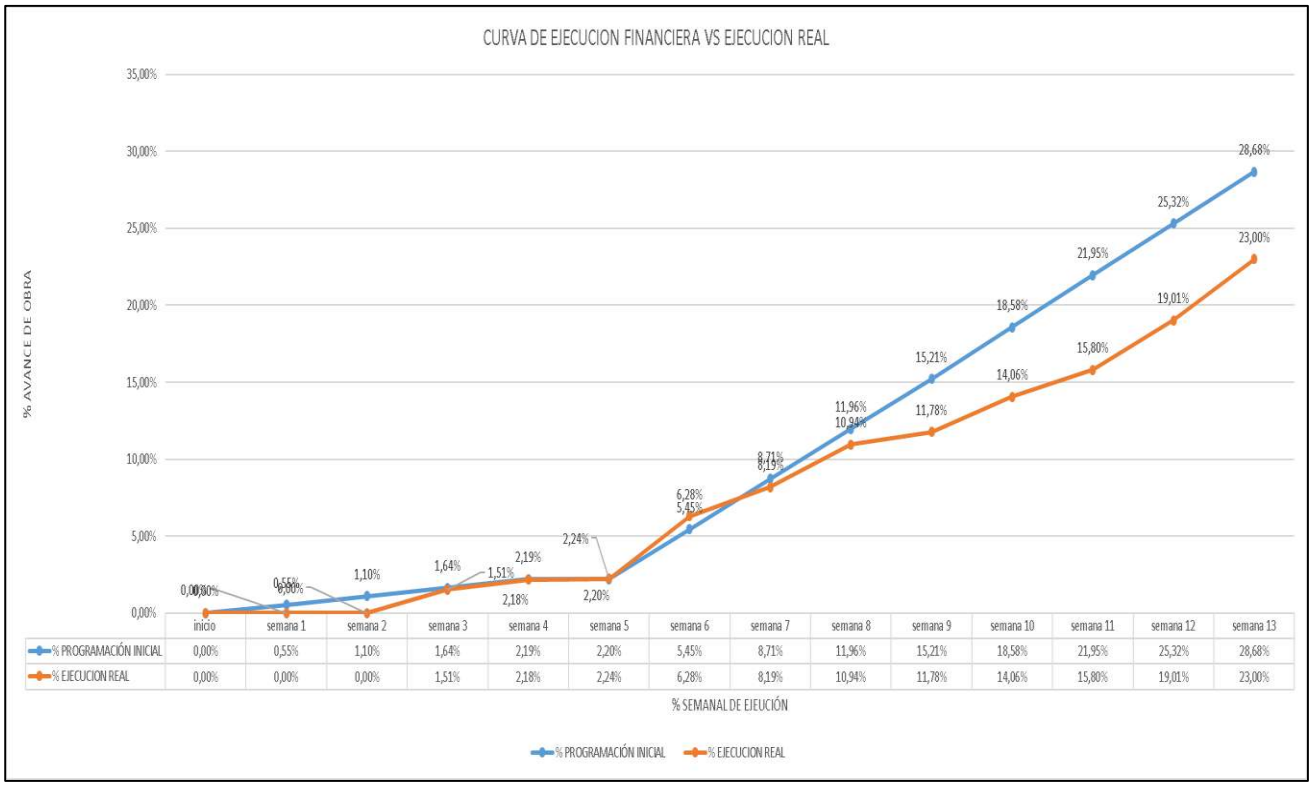

	inicio	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	semana 6	semana 7	semana 8	semana 9	semana 10	semana 11	semana 12	semana 13
% PROGRAMACIÓN INICIAL	0,00%	0,55%	1,10%	1,64%	2,19%	2,20%	5,45%	8,71%	11,96%	15,21%	18,58%	21,95%	25,32%	28,68%
% EJECUCION REAL	0,00%	0,00%	0,00%	1,51%	2,18%	2,24%	6,28%	8,19%	10,94%	11,78%	14,06%	15,80%	19,01%	23,00%

Fuente: Elaboracion propia

FECHA DE CORTE	VALOR PROGRAMADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
31/05/2026	$ 691.687.324	$ 554.699.691
	28.68%	23.00%
% DIFERENCIA DE EJEUCIÓN	-5.68%	

Fuente: Elaboracion propia

Como se aprecia en la anterior tabla se presenta un atraso del -5.68% en la ejecución de obra respecto a la programación establecida desde la fecha de inicio del contrato de obra a fecha del presente informe, situación que no es imputable a la firma contratista, toda vez que las condiciones climáticas adversas registradas en el sector, caracterizadas por precipitaciones constantes y de alta intensidad, han generado afectaciones directas en el desarrollo normal de las actividades constructivas. En particular, dichas lluvias han ocasionado desprendimientos y desestabilización de material en las excavaciones, así como acumulación de agua estancada en las áreas de cimentación, comprometiendo las condiciones técnicas y de seguridad requeridas para la continuidad de los trabajos. En atención a esta contingencia, la firma contratista ha dispuesto de manera permanente equipos de bombeo para el control y evacuación de aguas, así como recubrimientos en polietileno para la protección de las excavaciones y cimentaciones ejecutadas, con el fin de mitigar riesgos de deterioro y garantizar la calidad de la obra. Estas actividades complementarias y no previstas inicialmente han demandado mayores tiempos de ejecución y mano de obra, al requerirse la realización simultánea de labores de mitigación y recuperación de condiciones adecuadas de trabajo antes de continuar con las actividades programadas tal como se evidencia en la bitácora de obra y los informes semanales anexos en el presente informe.

9.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo del 2026 al 31 de mayo del 2026, se realizaron las actividades contratadas acorde al cumplimiento del objeto del contrato y el anexo técnico. A continuación, se describen las actividades realizadas por la firma contratista:

CAPÍTULO 2: REALIZAR CIMENTACIÓN Y DESAGÜES

- **EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN**

Para este periodo la firma contratista de continuo con excavaciones manuales para zapatas y vigas de enlace de los ejes A Y B de la cimentación de la cubierta multifuncional



Fuente: Elaboración propia

- **SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E= 0.05 M. 14 MPA (2000 PSI)**

Para este periodo la firma contratista de obra realizo elaboración de solados para viga de cimentación enlace del eje A de la cimentación de la cubierta multifuncional








Fuente: Elaboración propia

- **SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA**

Para este periodo se continuo con el suministro e instalación de acero de refuerzo para viga de cimentación de la cubierta acorde a los planos y detalles estructurales en los ejes A e instalación de acero de refuerzo longitudinal y transversal para pedestales zapatas ejes A y B.

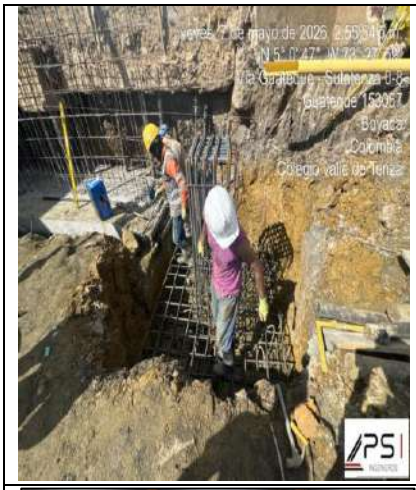














Fuente: Elaboración propia

- **CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPA (3000 PSI) + FORMALETA MADERA**

Para este periodo se realizó el encofrado y fundida de zapatas de la cimentación del escenario deportivo, de los ejes A y B, se realizaron procedimientos constructivos acorde a especificaciones técnicas, se realizó vibrado de concreto en cada elemento, así como toma de especímenes de concreto para control de resistencia a compresión. los resultados de laboratorio obtenidos son anexos al presente informe.



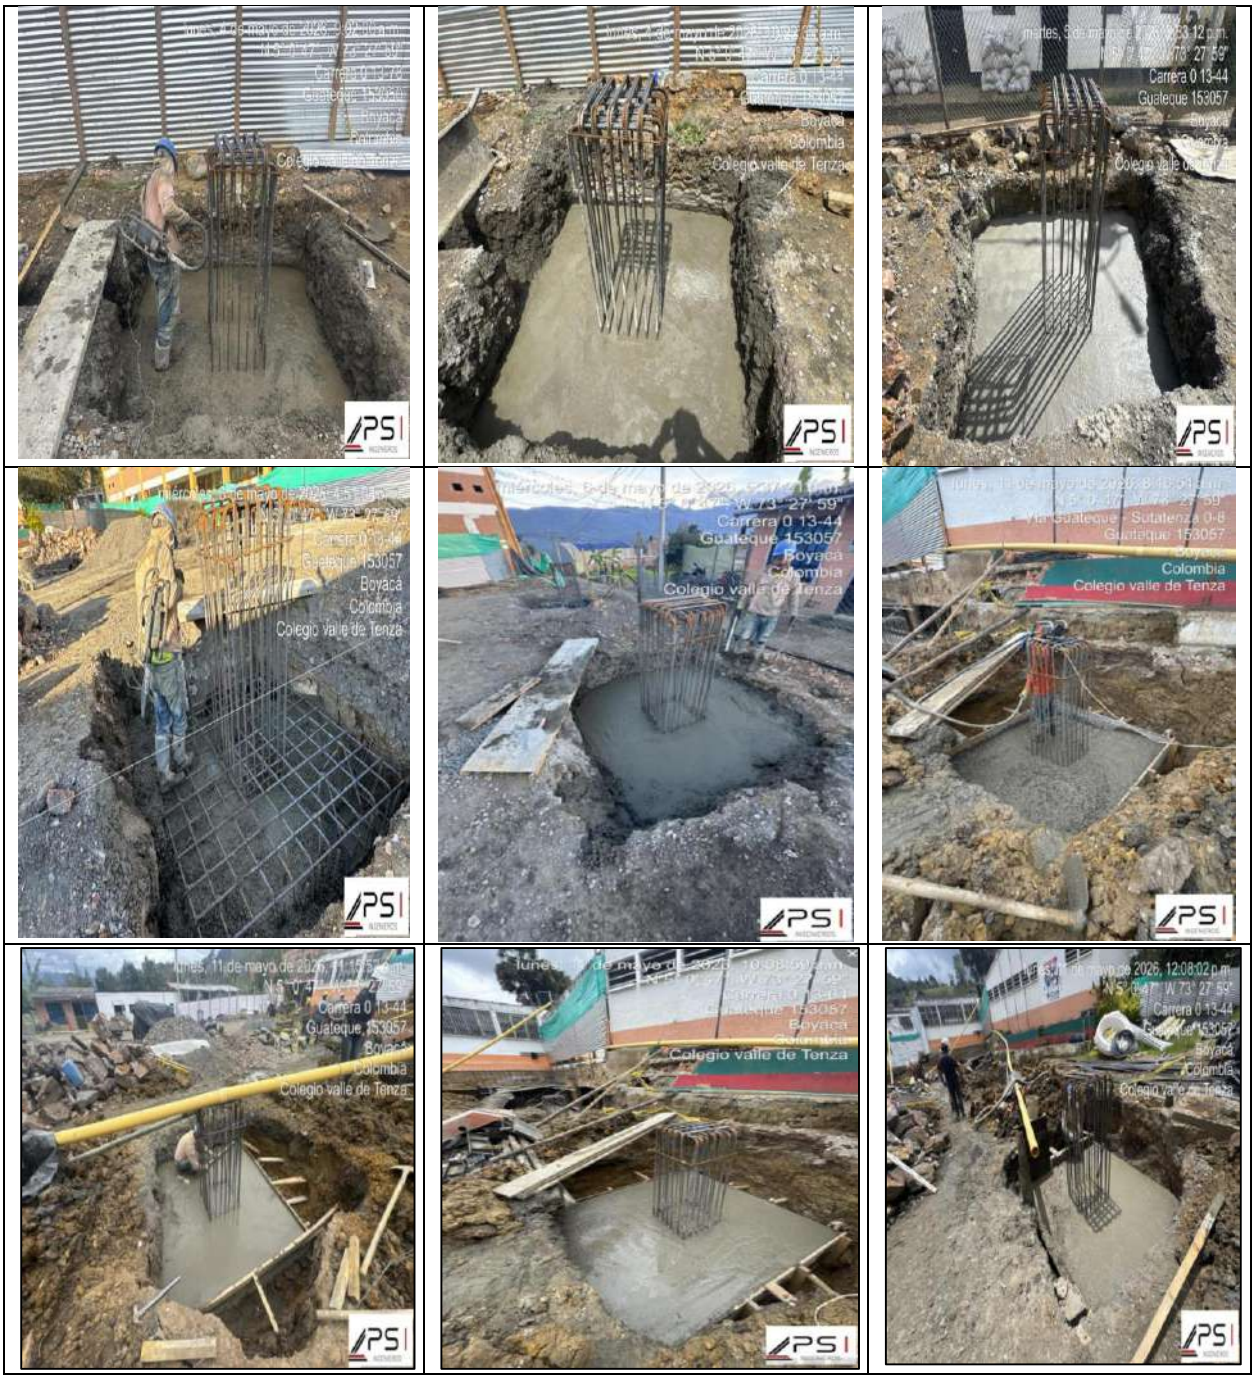

Fuente: Elaboración propia

- **CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE DE 21 MPA (3000 PSI) SECCIÓN RECTANGULAR.**

Para este periodo se realizó el encofrado y fundida de viga de enlace de la cimentación del escenario deportivo, del eje A, se realizaron procedimientos constructivos acorde a especificaciones técnicas, se realizó vibrado de concreto en el elemento, así como toma de especímenes de concreto para control de

resistencia a compresión.



Fuente: Elaboración propia

10. ENSAYOS DE LABORATORIO Y CALIDAD DE MATERIALES Y PRODUCTOS.

Los ensayos de laboratorio garantizan la calidad de cada uno de los insumos usados para las obras objeto del contrato. Para el presente periodo la firma contratista de obra realizo toma de especímenes de concreto para verificación de resistencias a concreto de las zapatas y viga de enlace de los ejes A Y B de la cimentación de la cubierta.







Nota: los resultados de laboratorio acorde a los ensayos de compresión de concreto son entregados en el capítulo de anexos del presente informe.

11. CONTROL ADMINISTRATIVO

11.1 REVISIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR CONTRATISTA, ENTIDAD

Se realizaron comités de obra para coordinar los avances del proyecto, resolver problemas y garantizar el cumplimiento de los requisitos del contrato. Los comités estuvieron integrados por representantes de la empresa constructora, la supervisión del contrato y la interventoría.

Tabla 9: Comités de obra en el periodo

FECHA	COMITÉ N°	ASUNTO	LUGAR
06/05/2026	7	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y CONTINGENCIA, SEGUIMIENTO A COMITÉ DE OBRA No.6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLE DE TENZA
19/05/2026	8	SEGUIMIENTO AL CONTRATO OBRA	INSTALACIONES DE TIERRASUA
21/05/2026	9	SOCIALIZACION DEL AVANCE DE OBRA Y SOLICITUD Y APROBACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES AL CONTRATO DE OBRA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLE DE TENZA

Fuente: Elaboración propia

Nota: los comités de obra reportados en la anterior tabla, se anexan en el cuerpo de anexos del presente informe.

11.2 RECIBO Y ENVIÓ DE OFICIOS REFERENTES AL PROYECTO

Durante el periodo del presente informe se realizó la respectiva comunicación con la supervisión y la interventoría donde se radicaron solicitudes y demás vía correo electrónico, de la misma manera se dio oportuna respuesta a las inquietudes expresadas por la firma interventora de obra y la supervisión por medio de oficios y/o comités. A continuación, se presenta una tabla de relación de correspondencia generada en el proyecto.

Tabla 10: Relación de correspondencia enviada

CORRESPONDENCIA ENVIADA					
RADICADO INTERNO	**FECHA**	**CONSECUTIVO**	**ORIGEN**	**DESTINO**	**ASUNTO**
17	28/04/2026	CO-IPVO-030-2025-OF 015	PSI INGENIEROS SAS	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	RADICACION INFORME MENSUAL No.2 de obra
18	28/04/2026	CO-IPVO-030-2025-OF 017	PSI INGENIEROS SAS	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	RESPUESTA OFICIO INT-053-OFI-20 PLAN DE CONTINGENCIA Y PLAN DE ACCION
19	29/04/2026	CO-IPVO-030-2025-OF 018	PSI INGENIEROS SAS	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	REMISION DOCUMENTOS SOPORTE ORDEN DE GIRO ANTICIPO NO.2
20	29/04/2026	CO-IPVO-030-2025-OF 019	PSI INGENIEROS SAS	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	Respuesta a oficio INT-053-OF-021 – Solicitud de información complementaria al oficio CO-IPVC-030-2025-OF-017 – Plan de Contingencia y Plan de acción
21	30/04/2026	CO-IPVO-030-2025-OF 020	PSI INGENIEROS SAS	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	JUSTIFICACIÓN TECNCIA A MAYORES Y MENORES
22	7/05/2026	CO-IPVO-030-2025-OF 021	PSI INGENIEROS SAS	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	RESPUESTA OFICIO INT-053-OF-017

23	5/05/2026	CO-IPVO-030-2025-OF 022	PSI INGENIEROS SAS	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	Respuesta a oficio INT-053-OF-025 – Requerimiento preventivo y correctivo por acumulación de aguas en excavaciones
24	5/05/2026	CO-IPVO-030-2025-OF 023	PSI INGENIEROS SAS	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026// SUPERVISION TIERRASUA S.A.S	BITACORA CONTRATO DE OBRA
25	8/05/2026	CO-IPVO-030-2025-OF 024	PSI INGENIEROS SAS	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	INFORME SEGUIMIENTO, ACORDE A COMPROMISOS PACTADOS EN COMITÉ DE OBRA NO. 007 IPVO030-2025
26	8/05/2026	CO-IPVO-030-2025-OF 025	PSI INGENIEROS SAS	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	REMISION DOCUMENTOS SOPORTE ORDEN DE GIRO ANTICIPO No.3
27	12/05/2026	CO-IPVO-030-2025-OF 026	PSI INGENIEROS SAS	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	REMISION DOCUMENTOS SOPORTE ORDEN DE GIRO ANTICIPO No.4
28	25/05/2026	CO-IPVO-030-2025-OF 027	PSI INGENIEROS SAS	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	JUSTIFICACION TECNICA A MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA
29	25/05/2026	CO-IPVO-030-2025-OF 028	PSI INGENIEROS SAS	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	SOLICITUD APROBACIÓN DE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11: Relación de correspondencia recibida.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA					
RADICADO INTERNO	**FECHA**	**CONSECUTIVO**	**ORIGEN**	**DESTINO**	**ASUNTO**

20	2/05/2026	INT-039-OF-022	INTERVENTORIA	PSI INGENIEROS	Respuesta a remisión de documentos soporte y aprobación de orden de giro de anticipo No. 1, contrato de obra IPVO 030-2025
21	2/05/2026	INT-039-OF-023	INTERVENTORIA	PSI INGENIEROS	Observaciones al informe mensual No. 2 de obra
22	4/05/2026	INT-039-OF-025	INTERVENTORIA	PSI INGENIEROS	Requerimiento preventivo y correctivo por acumulación de aguas en excavaciones.
23	11/05/2026	INT-039-OF-026	INTERVENTORIA	PSI INGENIEROS	Respuesta a remisión de documentos soporte y aprobación de orden de giro de anticipo No. 3, contrato de obra IPVO 030-2025
24	11/05/2026	INT-039-OF-027	INTERVENTORIA	PSI INGENIEROS	Reiteración formal de requerimientos técnicos y administrativos – Contrato de Obra No. 030-2025 Referencia: Oficio No. INT-053-OF-024
25	19/05/2026	INT-039-OF-029	INTERVENTORIA	PSI INGENIEROS	Observaciones y aprobación técnica del Balance de Mayores y Menores Cantidades, contrato de obra IPVO 030-2025.

Fuente: Elaboración propia

Nota: los oficios serán anexados en el ANEXO 5 del presente informe

12. ESTADO DEL TIEMPO:

En el sector los días con precipitaciones fueron bajos, se registran en el formato GPDI-FR-0525-06 CONTROL DEL TIEMPO y se presenta en el capítulo de anexos del presente informe.


tabla 1: control del tiempo

	CONTROL DEL TIEMPO	**CÓDIGO: GPDI-FR-0525-06**
		VERSIÓN: V-00
		Página: 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."
NUMERO DE CONTRATO:	IPVO-030-2025
CONTRATISTA:	PSI INGENIEROS S.A.S
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVALLE 2026
SUPERVISIÓN:	TIERRASUA S.A.S

No.	FECHA	HORAS SOL	HORAS LLUVIA	LLUVIA EN LA NOCHE	TOTAL HORAS PERDIDAS POR LLUVIA	OBSERVACIONES
1	1/05/2026					
2	2/05/2026					
3	3/05/2026					
4	4/05/2026	4	9		5	MAÑANA PARCIALMENTE SOLEADA, TARDE PRECIPITACIONES
5	5/05/2026	2	6	5	6	TODO EL DIA NUBLADO SIN SOL
6	6/05/2026	7		3		DIA SOLEADO
7	7/05/2026	6		4		DIA SOLEADO
8	8/05/2026	7		4		DIA SOLEADO
9	9/05/2026	8		5		
10	10/05/2026					
11	11/05/2026	7		4		DIA SOLEADO
12	12/05/2026	8		4		DIA SOLEADO
13	13/05/2026	4	4		4	
14	14/05/2026	3	5		5	
15	15/05/2026	7	1		1	DIA SOLEADO
16	16/05/2026	6				
17	17/05/2026					
18	18/05/2026			10		
19	19/05/2026		7		1	
20	20/05/2026	6		8		FUERTES PRECIPITACIONES EN LAS HORAS NOCTURNAS
21	21/05/2026	6	2	4	2	FUERTES PRECIPITACIONES EN LAS HORAS NOCTURNAS
22	22/05/2026	8				
23	23/05/2026	4				
24	24/05/2026					
25	25/05/2026	2	6	5	6	FUERTES PRECIPITACIONES EN LAS HORAS NOCTURNAS
26	26/05/2026	4	4	6	4	FUERTES PRECIPITACIONES EN LAS HORAS NOCTURNAS
27	27/05/2026	5	3		3	
28	28/05/2026	5	5	5	5	FUERTES PRECIPITACIONES EN LAS HORAS NOCTURNAS

29	29/05/2026	3	5	3	5	
30	30/05/2026	4	4	5	4	
31	31/05/2026	4	4			
TOTAL %		64,86 %	35,14 %	**TOTAL**	51	
SOL	120					
LLUVIA	65					
OBSERVACIONES / ANOTACIONES						
como se puede observar ser presentaron fuertes precipitaciones en las jornadas laborales y en las horas nocturnas, el municipio presenta ola invernal.						

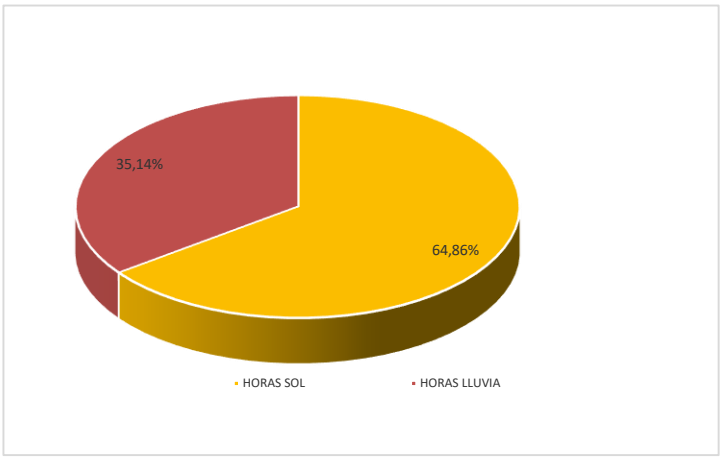

Fuente: Elaboración propia

Nota: El estado del clima se presenta en el capítulo de anexos del presente informe

13. COMPONENTE SOCIAL Y AMBIENTAL

El componente social y ambiental es entregado en el capítulo de anexos del presente informe.

14. CONCLUSION GENERAL

En el periodo evaluado, la ejecución de la obra presentó una desviación frente a la programación inicial, registrando una reducción aproximada del -5.68% en el cumplimiento de las actividades previstas. Esta variación se atribuye principalmente a las condiciones climáticas adversas, caracterizadas por precipitaciones intensas y recurrentes en la zona del proyecto, las cuales generaron restricciones operativas, especialmente en actividades relacionadas con excavaciones manuales, cimentaciones y procesos constructivos a la intemperie.

El impacto, se refleja directamente en el cumplimiento del cronograma mensual, evidenciando una afectación puntual en el rendimiento de la obra. No obstante, la firma contratista mantiene su compromiso con la correcta ejecución del proyecto, implementando las acciones necesarias para dar continuidad a los trabajos dentro de las posibilidades operativas y de seguridad permitidas. Asimismo, se espera que las condiciones climáticas mejoren en las próximas semanas, con el fin de impulsar y recuperar las actividades que actualmente presentan atraso, garantizando así el cumplimiento de los objetivos y la calidad establecida para la obra.

15. LISTA DE ANEXOS

- ANEXO NO.1 MEMORIA DE CANTIDADES
- ANEXO NO.2 CORRESPONDENCIA GENERADA
- ANEXO NO.3 ESTADO DEL TIEMPO
- ANEXO NO.4 COMPONENTE SOCIAL Y AMBIENTAL
- ANEXO NO.5 BITACORA DE OBRA
- ANEXO NO.6 PLAN DE CALIDAD.
- ANEXO NO.7 ENSAYOS LABORATORIO
- ANEXO NO.8 COMITES DE OBRA
- ANEXO No.9 INFORMES SEMANALES

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

INFORME DE INTERVENTORIA

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

CONSORCIO INTERVALLE 2026
NIT 902.027.238-5

INFORME MENSUAL MAYO
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 053-2026

OBJETO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACA"

PRESENTADO A:

TIERRASUA S.A.S
NIT 901.285.377-2

ING. JULIAN GUERRERO

SUPERVISOR

MAYO 2026

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 4
3. GENERALIDADES DEL CONTRATO 5
   3.1. CONTRATO DE OBRA 5
   3.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA 6
4. CORRESPONDENCIA 8
5. RESUMEN DE GESTIÓN 11

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

1. INTRODUCCIÓN

El municipio de Guateque ubicado estratégicamente en el sur del departamento de Boyacá, considerado como la capital de la Provincia de Oriente y un punto de encuentro vital en el frondoso Valle de Tenza. Conocido cariñosamente como la "Ciudad Luz de Colombia", este municipio no solo brilla por su famosa tradición pirotécnica, sino por el resplandor de su historia y la calidez de su gente.

A una altitud promedio de 1,815 metros sobre el nivel del mar, Guateque goza de un clima templado envidiable que invita a recorrer sus calles empedradas y su arquitectura colonial. Es la cuna del ilustre expresidente Enrique Olaya Herrera, un legado que se respira en su plaza principal y en el orgullo de sus habitantes.

Por lo anterior la gobernación de Boyacá a traves de Tierrasua inicio el proceso de contratación de obra N° IPVO 030-2025 y cualquier modificación para el "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" y el proceso de contratación de interventoria ° IPVO 039-2025 que corresponde "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

De acuerdo a lo mencionado el presente documento contiene la información de las actividades llevadas a cabo durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo y el 31 de mayo de 2026, donde se destacan principalmente los aspectos generales, aspectos financieros, aspectos técnicos y aspectos administrativos del contrato de referencia.

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en el municipio de Guateque, departamento de Boyacá, provincia de oriente, en los que contemplan el mejoramiento del escenario recreativo y de actividades lúdicas en la institución educativa técnica Valle de Tenza en la sede campestre en el municipio de Guateque.

La ejecución de esta obra comprende un conjunto de actividades técnicas y de gestión orientadas al mejoramiento y dotación de los espacios lúdicos de la institución. Las labores principales incluyen la intervención civil mediante el uso de topografía de precisión y un riguroso control de calidad que abarca ensayos de resistencia de mezclas y pruebas de líquidos penetrantes en estructuras metálicas para garantizar su seguridad. Asimismo, el proyecto integra la adecuación de redes eléctricas e hidráulicas necesario para el funcionamiento del escenario. Todo este proceso es supervisado mediante actividades de interventoría integral, que aseguran el cumplimiento del cronograma, el manejo responsable de los recursos del Sistema General de Regalías y la implementación de protocolos de seguridad y salud en el trabajo para el beneficio de la comunidad educativa de Guateque.

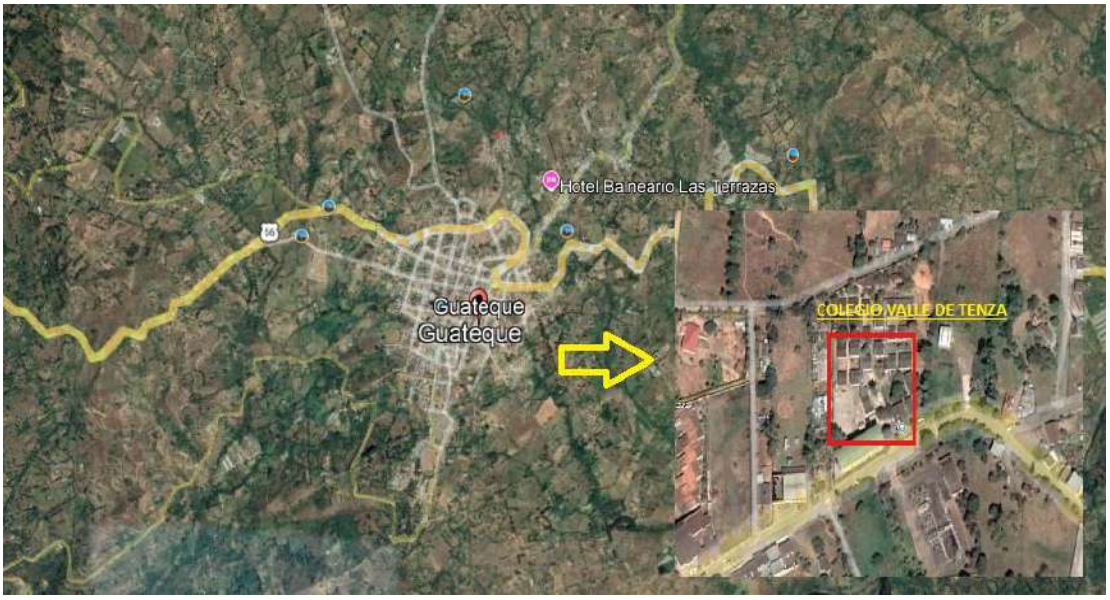


Ilustración 1. Localización del proyecto colegio Valle de Tenza.
Fuente: Google Earth 2026.

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

3.1. CONTRATO DE OBRA

Número de contrato:	N° IPVO 030-2025
Contratista:	PSI INGENIEROS S.A.S
NIT:	900.928.849-4
Fecha de suscripción del contrato	15 de diciembre de 2025
Rep. Legal	LUIS EDUARDO SICHACA GÁMEZ
Valor Inicial	DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRECIENTOS SEIOS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (2.580.811.306,36)
Valor contrato de obra	DOS MIL CUATROCIENOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (2.411.687.093.33)
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Plazo de ejecución	Siete (7) meses
Lugar de ejecución	Guateque, Boyacá
Fecha de inicio	24 de febrero de 2026
Fecha de suspeción	N/A
Fecha de acta de reinicio	N/A

Con base al contrato de obra IPVO 030-2025, la compañía aseguradora que es CESCE COLOMBIA S.A con N° de póliza 175391 certificado 4120012545

POLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA											
N° POLIZA	175391	ANEXO No.	4	ASEGURADORA	CESCE COLOMBIA S.A	FECHA EXP			DÍA	MES	AÑO
									26	02	2026
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS			VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO			
Cumplimiento del contrato			24	02	2026	24	08	2027	$ 241.168.709,33		
Buen manejo y correcta inversión el anticipo			24	02	2026	24	08	2027	$ 723.506.127,99		
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones labores			24	02	2026	24	09	2029	$241.168.709,33		
Estabilidad y calidad de la obra			24	09	2026	24	09	2031	$ 482.337.418,66		

Con base al contrato de obra IPVO 030-2025, la compañía aseguradora que es CESCE COLOMBIA S.A con N° 18141de póliza certificado 4120012546

POLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA									
N° POLIZA	18141	ANEXO No.	5	ASEGURADORA	CESCE COLOMBIA S.A	FECHA EXP	DÍA	MES	AÑO
							02	03	2026

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
Básico-Predios, labores y operaciones (PLO)	24	02	2026	24	09	2026	$ 525,271,500.00
Vehículos propios y no propios	24	02	2026	24	09	2026	$ 525,271,500.00
Patronal	24	02	2026	24	09	2026	$ 525,271,500.00
Contratista y Subcontratista	24	02	2026	24	09	2026	$ 525,271,500.00

3.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

Número de contrato:	N° 053-2026
Contratista:	CONSORCIO INTERVALLE 2026
NIT:	9 0 2. 0 2 7. 2 3 8 -5
Fecha de suscripción del contrato	26 de enero de 2026
Rep. Legal	JORGE ARMANDO CALDERÓN SÁNCHEZ
Valor Inicial	CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($168.838.122,85)
Valor Actualizado	CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($168.838.122,85)
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Plazo de ejecución	Siete (7) meses
Lugar de ejecución	Guateque, Boyacá

Fecha de inicio	24 de febrero de 2026
Fecha de suspeción	N/A
Fecha de acta de reinicio	N/A

Con base al contrato de interventoría 053-2026, aseguradora que es Seguros del estado S.A con N° de póliza 39-44-101180472.

POLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORIA									
N° POLIZA	39-44-101180472	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	FECHA EXP	DÍA	MES	AÑO
							02	03	2026

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
Cumplimiento del contrato	24	02	2026	03	04	2027	$ 16.883.812,29
Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	24	02	2026	04	10	2029	$ 16.883.812,29
Calidad del servicio	24	02	2026	24	09	2031	$33.767.624,57

Con base al contrato de interventoría 053-2026, aseguradora que es Seguros del estado S.A con N° de póliza 39-44-101047380

POLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORIA									
N° POLIZA	39-44-101047380	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	FECHA EXP	DÍA	MES	AÑO
							02	03	2026

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
Predios labores y operaciones	24	02	2026	04	10	2026	$ 305.181.000,00

4. CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA					
N°	**Fecha**	**Consecutivo**	**Origen**	**Destino**	**Asunto**
1	05/05/2026	22.1 CO-IPVO-030-2025-OF-022	PSI INGENIEROS SAS	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	Respuesta a oficio INT-053-OF-025 – Requerimiento preventivo y correctivo por acumulación de aguas en excavaciones
2	05/05/2026	23.1. CO-IPVO-030-2025-OF 023	PSI INGENIEROS SAS	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	Bitácora contrato de obra
3	07/05/2026	CO-IPVO-030-2025-OF 021	PSI INGENIEROS SAS	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	Respuesta oficio int-053-of-017
4	08/05/2026	CO-IPVO-030-2025-OF 024	PSI INGENIEROS SAS	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	Informe seguimiento, acorde a compromisos pactados en comité de obra no. 007 ipvo030-2025
5	08/05/2026	CO-IPVO-030-2025-OF 025	PSI INGENIEROS SAS	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	Remisión documentos soporte orden de giro anticipo No.3
6	13/05/2026	CO-IPVO-030-2025-OF 026	PSI INGENIEROS SAS	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	Remisión documentos soporte orden de giro anticipo No.4
7	25/05/2026	CO-IPVO-030-2025-OF 028	PSI INGENIEROS SAS	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	Solicitud Aprobación de acta de mayores y menores cantidades de obra
8	28/05/2026	CO-IPVO-030-2025-OF 029	PSI INGENIEROS SAS	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	Remisión documentos soporte orden de giro anticipo No.5
9	28/05/2026	CO-IPVO-030-2025-OF 030	PSI INGENIEROS SAS	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	Aclaración estado de pago Factura Electrónica FEME139 – Orden de Giro No. 5 al proveedor M&E COMPANY COLOMBIA SAS

Elaboración: Propia

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

CORRESPONDENCIA ENVIADA					
N°	**Fecha**	**Consecutivo**	**Origen**	**Destino**	**Asunto**
1	02/05/2026	Semanal 9	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	TIERRASUA/PSI INGENIEROS SAS	Avance Semanal No 9 del 27 abril al 01 de mayo de 2026
2	02/05/2026	INT-053-OF-022	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	PSI INGENIEROS SAS	INT-053-OF-022 Oficio de aprobación de documentos anticipo 1
3	02/05/2026	INT-053-OF-023	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	PSI INGENIEROS SAS	INT-053-OF-023 Oficio de aprobación de documentos anticipo 2
4	02/05/2026	INT-053-OF-024	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	PSI INGENIEROS SAS	Observaciones al informe mensual No. 2 de obra
5	04/05/2026	INT-053-OF-025	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	PSI INGENIEROS SAS	INT-053-OF-025- Requerimiento preventivo y correctivo - Control de aguas en excavaciones - Obra IE Técnica Valle de Tenza
6	04/05/2026	Informe mensual abril	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	TIERRASUA	Informe mensual de abril
7	07/05/2026	Semanal 10	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	TIERRASUA	Avance Semanal No 10 del 05 de mayo al 08 de mayo de 2026
8	07/05/2026	Informe corregidos febrero y marzo	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	PSI INGENIEROS SAS	Remisión Informes Corregidos Mensuales de Actividades y Seguimiento – Febrero y Marzo 2026
9	11/05/2026	INT-053-OF-026	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	PSI INGENIEROS SAS	Respuesta a remisión de documentos soporte y aprobación de orden de giro de anticipo No. 3, contrato de obra IPVO 030-2025
10	11/05/2026	INT-053-OF-027	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	PSI INGENIEROS SAS	Reiteración Formal Requerimientos Técnicos y Administrativos - Contrato 030-2025 - Oficio INT-053-OF-027
11	15/05/2026	Semanal 11	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	TIERRASUA/PSI INGENIEROS SAS	Semanal No.11 del 11 de mayo al 15 de mayo de 2026.
12	27/05/2026	INT-053-OF-031	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	TIERRASUA SAS PSI INGENIEROS SAS	Reiteración #2 formal de requerimientos técnicos y administrativos – Contrato de Obra No. 030-2025 Referencia: Oficio No. INT-053-OF-024 y

					reiteración oficio INT-053-OF-027
13	28/05/2026	Semanal 12 y 13	INTERVENTORIA Consorcio Intervalle 2026	TIERRASUA/PSI INGENIEROS SAS	Avance Semanal No.13 del 25 de mayo al 29 de mayo de 2026,

Elaboración: Propia

5. CLIMA

	MAYO/ DÍA →	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
	JORNADA M/T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
1	SECO (SE)																									X		X								X			X		X		X	X								X	X			X				X			
2	SOLEADO (SL)									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X							X	X																															
3	LLOVIZNA (LL)							X																						X				X			X		X												X							X					
4	LLUVIA FUERTE (LLF)								X																	X		X		X								X		X		X			X		X		X			X	X		X	X					
5	NUBLADO (NB)																																																															
6	GRANIZO (GZ)																																																														
7	OTRO																																																														

6. RESUMEN DE GESTIÓN

- En el marco de las actividades administrativas correspondientes al contrato de obra, se realizó el monitoreo y evaluación del avance de las metas físicas establecidas en el Plan de Acción y Contingencia. Esta labor permitió contrastar de manera rigurosa el avance real frente al programado, verificando la efectividad de las medidas adoptadas por el contratista ante el retraso registrado. A partir de este análisis, se conminó al constructor a optimizar los rendimientos de mano de obra y el suministro de materiales, garantizando la ruta crítica del proyecto y el cumplimiento de los acuerdos contractuales establecidos para mitigar las desviaciones identificadas.
- Se ejecutó el estricto control y supervisión durante las etapas de encofrado, colocación de testeros y posterior vaciado del concreto para la viga de enlace del eje A. En la fase previa, se revisó el acero de refuerzo instalado para la viga de enlace de la cimentación en el eje A, donde se verificaron diámetros, espaciamientos, traslapos y amarres de acuerdo con los planos estructurales vigentes, asegurando el cumplimiento de la norma sismorresistente. Asimismo, se realizó la supervisión técnica de la instalación del apuntalamiento en madera y parales metálicos, asegurando que las medidas ejecutadas por el contratista coincidan con el plan de contingencia radicado para garantizar la estabilidad geométrica del elemento. Durante la etapa de colocación del material, se realizó el seguimiento a la consistencia de la mezcla (asentamiento) y a los procesos de vibrado, garantizando una masa homogénea, libre de hormigueros y conforme a la resistencia especificadasupervisó la demolición de elementos estructurales y no estructurales (muros de ladrillo). La Interventoría constató que los procedimientos se realizaran siguiendo las normas de seguridad técnica, minimizando en los más posible la generación de material particulado y vibraciones excesivas.
- Ante la persistencia de la ola invernal en la zona del proyecto, la interventoría/supervisión adoptó una postura preventiva orientada a la protección de la infraestructura colindante. En consecuencia, se solicita al contratista mantener sistemas de bombeo activos en las excavaciones de las zapatas adyacentes y proteger con polietileno los sectores excavados. Esta instrucción técnica tiene como objetivo primordial evitar la saturación de los suelos de fundación y el desprendimiento de taludes, salvaguardando la capacidad portante del terreno de soporte, garantizando la seguridad del personal en obra y previniendo retrocesos en el cronograma de excavaciones y cimentaciones.

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

Se llevó a cabo el seguimiento técnico y administrativo de la fase de cimentanciones del proyecto, centrándose en la gestión, verificación y supervision de la construcción de la cimentación garantizando el cumplimiento normativo y contractual. Se verificó que el personal encargado contara con los Elementos de Protección Personal (EPP) adecuados, especialmente para protección respiratoria y auditiva asegurando los estándares de seguridad. Durante el periodo del 1 de mayo al 31 de mayo de 2026, el avance del mes de mayo es del 9.82% con un porcentaje de retraso acumulado del 5.68%.

							CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
1	**CAP. 1: PRELIMINARES**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**DIST %**	**VALOR TOTAL INCLUYE INCREMENTO POR DISTANCIA**	**VALOR TOTAL+AUI**	**M4-01/05/26-31/05/26**	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA. (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA).	$ 3,036.00	934.45	17.00%	$ 3,319,279.00	$ 4,315,063.00	0	$ -
1.2	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H = 1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	$ 46,814.00	151.26	17.00%	$ 8,284,870.00	$ 10,770,331.00	0.00	$ -
1.3	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	$ 244,449.00	103.63	0.00%	$ 25,332,250.00	$ 32,931,925.00	7.83	$ 2,488,246.38
1.4	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	$ 16,461.00	128.75	0.00%	$ 2,119,354.00	$ 2,755,160.00	40.80	$ 873,091.48
1.5	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA DE H = 2.0 M.	$ 6,046.00	51.50	0.00%	$ 311,369.00	$ 404,780.00		$ -
1.6	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES DE DEMOLICION (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	$ 15,101.00	518.44	0.00%	$ 7,828,962.00	$ 10,177,651.00	162.78	$ 3,195,582.96
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 47,196,084.00**	**$ 61,354,910.00**		**$ 6,556,920.82**
2	**CAP. 2: REALIZAR CIMENTACIÓN Y DESAGUES**							

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	$ 70,516.00	334.26	0.00%	$ 23,570,678.00	$ 30,641,881.00	42.17	$ 3,865,757.56
2.2	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	$ 92,874.00	173.14	0.00%	$ 16,080,204.00	$ 20,904,265.00	0.00	$ -
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	$ 2,765.00	5311.88	0.00%	$ 14,687,348.00	$ 19,093,552.00	0.00	$ -
2.4	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	$ 33,429.00	15.2	17.00%	$ 594,501.00	$ 772,851.00	7.60	$ 386,425.50
2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	$ 599,197.00	29.04	17.00%	$ 20,358,797.00	$ 26,466,436.00	6.99	$ 6,370,536.76
2.6	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	$ 7,674.00	7030.32	17.00%	$ 63,122,291.00	$ 82,058,978.00	2,643.86	$ 30,859,541.18
2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	$ 918,406.00	29.04	17.00%	$ 31,204,497.00	$ 40,565,846.00	26.62	$ 37,185,358.83
2.8	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	$ 887,295.00	10.6	17.00%	$ 11,004,233.00	$ 14,305,503.00	5.30	$ 7,152,751.50
2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	$ 7,423.00	1341.65	17.00%	$ 11,652,110.00	$ 15,147,743.00	0.00	$ -
2.10	LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM.	$ 107,037.00	617.07	17.00%	$ 77,277,706.00	$ 100,461,018.00	0.00	$ -
2.11	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	$ 131,537.00	27.96	17.00%	$ 4,302,996.00	$ 5,593,895.00	0.00	$ -
2.12	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO.	$ 8,541.00	486.8	17.00%	$ 4,864,578.00	$ 6,323,951.00	0.00	$ -

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

2.13	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	$ 17,061.00	486.8	17.00%	$ 9,717,195.00	$ 12,632,354.00	0.00	$ -
2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	$ 33,484.00	88.41	17.00%	$ 3,463,575.00	$ 4,502,648.00	0.00	$ -
2.15	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**)	$ 284,811.00	99.02	0.00%	$ 28,201,985.00	$ 36,662,581.00	0.00	$ -
2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	$ 7,326.00	406.69	17.00%	$ 3,485,911.00	$ 4,531,684.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 323,588,605.00**	**$ 420,665,186.00**		**$ 85,820,371.34**
3	**CAP. 3: REALIZAR ESTRUCTURAS**							
3.1	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < = A 3.0 M. (FORMALETA METALICA).	$ 1,308,131.00	9.41	17.00%	$ 14,402,130.00	$ 18,722,769.00	0.00	$ -
3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE CON GRUA DE ESTRUCTURA METALICA	$ 24,344.00	22,017.30	0.00%	$ 535,989,151.00	$ 696,785,896.00	4,403.46	$ 139,357,179.20
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	$ 4,177.00	22,017.30	17.00%	$ 107,600,527.00	$ 139,880,685.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 657,991,808.00**	**$ 855,389,350.00**		**$ 139,357,179.20**
4	**CAP. 4: REALIZAR CUBIERTA**							

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

4.1	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE SIN TRASLAPO EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA CALIBRE 22	$ 261,843.00	659.44	17.00%	$ 202,023,605.00	$ 262,630,687.00		$ -
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIMPANO ACERO ESTRUCTURAL GRADO 40 CAL 22	$ 280,023.00	132.96	0.00%	$ 37,231,858.00	$ 48,401,415.00	0.00	$ -
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL MICROPERFORADO GALVANIZADO CAL 16, COLOR SEGÚN DISEÑO	$ 392,345.00	165.86	0.00%	$ 65,074,342.00	$ 84,596,645.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 304,329,805.00**	**$ 395,628,747.00**		**$ -**
5	**CAP. 5: REALIZAR CERRAMIENTO MAMPOSTERIA REFORZADA**							
5.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	$ 70,516.00	9.53	0.00%	$ 672,017.00	$ 873,622.00	0.00	$ -
5.2	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	$ 33,429.00	18.8	17.00%	$ 735,304.00	$ 955,895.00	0.00	$ -
5.3	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	$ 7,674.00	2808.31	17.00%	$ 25,214,636.00	$ 32,779,027.00	0.00	$ -
5.4	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	$ 887,295.00	6.37	17.00%	$ 6,612,921.00	$ 8,596,797.00	0.00	$ -
5.5	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < = A 3.0 M. (FORMALETA METALICA).	$ 1,308,131.00	4.87	17.00%	$ 7,453,600.00	$ 9,689,680.00	0.00	$ -
5.6	MURO EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO ESTRUCTURAL E = 0.15 M.	$ 166,227.00	135.66	17.00%	$ 26,383,915.00	$ 34,299,090.00	0.00	$ -
5.7	MORTERO TIPO GROUTING DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	$ 569,328.00	0.23	17.00%	$ 153,206.00	$ 199,168.00	0.00	$ -
5.8	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	$ 1,087,554.00	5.19	17.00%	$ 6,603,954.00	$ 8,585,140.00	0.00	$ -

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	$ 11,308.00	46.53	17.00%	$ 615,609.00	$ 800,292.00	0.00	$ -
5.1	PILOTE D = 30 CM. CONCRETO 21MPa - (3000 PSI). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO (INCUYE. EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 5 KM	$ 210,721.00	28.5	0.00%	$ 6,005,549.00	$ 7,807,214.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 80,450,711.00**	**$ 104,585,925.00**		**$ -**
6	**CAP. 6: REALIZAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RED PLUVIAL**							
6.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	$ 70,516.00	82.04	0.00%	$ 5,785,133.00	$ 7,520,673.00	0.00	$ -
6.2	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. INCLUYE TAPA CON MARCO METALICO	$ 823,074.00	6	17.00%	$ 5,777,979.00	$ 7,511,373.00	0.00	$ -
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 4" PVC	$ 55,470.00	43.8	17.00%	$ 2,842,616.00	$ 3,695,401.00	0.00	$ -
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	$ 41,023.00	68	17.00%	$ 3,263,790.00	$ 4,242,927.00	0.00	$ -
6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	$ 73,153.00	43	17.00%	$ 3,680,327.00	$ 4,784,425.00	0.00	$ -
6.6	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	$ 124,266.00	16.21	0.00%	$ 2,014,352.00	$ 2,618,658.00	0.00	$ -
6.7	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	$ 92,874.00	16.21	0.00%	$ 1,505,488.00	$ 1,957,134.00	0.00	$ -

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	$ 20,978.00	15	17.00%	$ 368,164.00	$ 478,613.00	0.00	$ -
6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 5" X 3"	$ 38,625.00	22	17.00%	$ 994,208.00	$ 1,292,470.00	0.00	$ -
6.10	SUMIDERO LONGITUDINAL TIPO CARCAMO DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO (INCLUYE CONCRETO FUNDIDO EN SITIO 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, PINTURA Y REJILLA DE TAPA)	$ 693,726.00	22	17.00%	$ 17,856,507.00	$ 23,213,459.00	0.00	$ -
6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	$ 75,029.00	6	17.00%	$ 526,704.00	$ 684,715.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 44,615,268.00**	**$ 57,999,848.00**		**$** -
7	**CAP. 7: REALIZAR OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS DEPORTIVOS**							
7.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	$ 70,516.00	58.02	0.00%	$ 4,091,338.00	$ 5,318,739.00	0.00	$ -
7.2	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	$ 92,874.00	92.86	0.00%	$ 8,624,280.00	$ 11,211,564.00	0.00	$ -
7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO COLORES SEGÚN DISEÑO CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM.	$ 170,840.00	233.33	17.00%	$ 46,638,654.00	$ 60,630,250.00	0.00	$ -
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	$ 117,262.00	4.87	17.00%	$ 668,147.00	$ 868,591.00	0.00	$ -
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	$ 123,513.00	12.9	17.00%	$ 1,864,182.00	$ 2,423,437.00	0.00	$ -
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	$ 22,214.00	242.16	0.00%	$ 5,379,342.00	$ 6,993,145.00	0.00	$ -
7.7	CONSTRUCCION DE JARDINES	$ 395,203.00	15.46	17.00%	$ 7,148,511.00	$ 9,293,064.00	0.00	$ -

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 (30 X 30 X 1.7 CM.)	$ 132,414.00	617.07	17.00%	$ 95,599,187.00	$ 124,278,943.00	0.00	$ -
7.9	PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSÍN DE GRANITO	$ 62,001.00	617.07	17.00%	$ 44,762,980.00	$ 58,191,874.00	0.00	$ -
7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2" INCL.TABLERO ACRILICO 10 MM PARA ANCLAR AL PISO	$ 9,737,125.00	1	17.00%	$ 11,392,436.00	$ 14,810,167.00	0.00	$ -
7.11	DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	$ 9,162.00	281.44	17.00%	$ 3,016,907.00	$ 3,921,979.00	0.00	$ -
7.12	DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	$ 23,611.00	31.75	17.00%	$ 877,090.00	$ 1,140,217.00	0.00	$ -
7.13	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	$ 33,429.00	5.7	17.00%	$ 222,938.00	$ 289,819.00	0.00	$ -
7.14	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	$ 7,674.00	253.21	17.00%	$ 2,273,466.00	$ 2,955,506.00	0.00	$ -
7.15	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	$ 887,295.00	2.74	17.00%	$ 2,844,490.00	$ 3,697,837.00	0.00	$ -
7.16	MURO EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO ESTRUCTURAL E = 0.15 M.	$ 166,227.00	9.12	17.00%	$ 1,773,709.00	$ 2,305,822.00	0.00	$ -
7.17	MORTERO TIPO GROUTING DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	$ 569,328.00	0.11	17.00%	$ 73,273.00	$ 95,255.00	0.00	$ -
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	$ 7,423.00	84.14	17.00%	$ 730,748.00	$ 949,972.00	0.00	$ -

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

7.19	LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM.	$ 107,037.00	48.05	17.00%	$ 6,017,460.00	$ 7,822,698.00	0.00	$ -
7.20	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	$ 131,537.00	8.55	17.00%	$ 1,315,830.00	$ 1,710,579.00	0.00	$ -
7.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80	$ 77,303.00	43.14	17.00%	$ 3,901,776.00	$ 5,072,309.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 249,216,744.00**	**$ 323,981,767.00**		**$ -**
8	**CAP. 8: REALIZAR INSTALACIÓN RED DE BAJA TENSION, ILUMINACIÓN Y SISTEMA PUESTA A TIERRA**							
8.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	$ 70,516.00	12.49	0.00%	$ 880,745.00	$ 1,144,969.00	0.00	$ -
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	$ 118,116.00	2	17.00%	$ 276,391.00	$ 359,308.00	0.00	$ -
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL BIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.8 AWG (2F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1")	$ 40,726.00	46.84	17.00%	$ 2,231,899.00	$ 2,901,469.00	0.00	$ -
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG (2F, T) Y DUCTO PVC DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	$ 122,640.00	1	17.00%	$ 143,489.00	$ 186,536.00	0.00	$ -
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL BIFÁSICO EXPUESTO EN CABLE DE COBRE No.12 AWG (2F, N, T). INCLUYE TUBO EMT DE 3/4").	$ 32,952.00	91.03	17.00%	$ 3,509,556.00	$ 4,562,423.00	0.00	$ -
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA TIPO FRANKLYN DE 0.6 M PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	$ 126,156.00	8	17.00%	$ 1,180,820.00	$ 1,535,066.00	0.00	$ -

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN DE 8 MM PARA ANILLO SUPERIOR DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	$ 19,745.00	157.69	17.00%	$ 3,642,899.00	$ 4,735,769.00	0.00	$ -
8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE APANTALLAMIENTO EN ALAMBRÓN DE 8 MM EXPUESTA EN TUBO IMC DE 3/4"	$ 54,124.00	28	17.00%	$ 1,773,102.00	$ 2,305,033.00	0.00	$ -
8.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 1/0 PARA ANILLO INFERIOR DE APANTALLAMIENTO	$ 42,463.00	104.23	17.00%	$ 5,178,325.00	$ 6,731,823.00	0.00	$ -
8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 PARA S.P.T. Y/O SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	$ 87,260.00	8	17.00%	$ 816,754.00	$ 1,061,780.00	0.00	$ -
8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).	$ 596,507.00	5	17.00%	$ 3,489,566.00	$ 4,536,436.00	0.00	$ -
8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFASICO DE 12 CIRCUITOS.	$ 279,702.00	1	17.00%	$ 327,251.00	$ 425,426.00	0.00	$ -
8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION DE 4 CIRCUITOS	$ 2,671,481.00	1	0.00%	$ 2,671,481.00	$ 3,472,925.00	0.00	$ -
8.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO HIGH BAY DE 100 W	$ 491,430.00	8	17.00%	$ 4,599,785.00	$ 5,979,721.00	0.00	$ -
8.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PARA RIEL DE 1 X 20 AMP.	$ 27,351.00	3	17.00%	$ 96,002.00	$ 124,803.00	0.00	$ -
8.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PARA RIEL DE 2 X 20 AMP.	$ 54,310.00	1	17.00%	$ 63,543.00	$ 82,606.00	0.00	$ -

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

8.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PARA RIEL DE 2 X 30 AMP.	$ 56,020.00	2	17.00%	$ 131,087.00	$ 170,413.00	0.00	$ -
8.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PARA RIEL DE 2 X 40 AMP.	$ 56,020.00	1	17.00%	$ 65,543.00	$ 85,206.00	0.00	$ -
8.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL BIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.10 AWG (2F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 3/4")	$ 25,859.00	1.3	17.00%	$ 39,332.00	$ 51,132.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 31,117,570.00**	**$ 40,452,844.00**		**$ -**
9	**CAP. 9:REALIZAR CERRAMIENTO MALLA CONTRAIMPACTO**							
9.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	$ 70,516.00	2.79	0.00%	$ 196,740.00	$ 255,762.00	0.00	$ -
9.2	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	$ 33,429.00	6.11	17.00%	$ 238,974.00	$ 310,666.00	0.00	$ -
9.3	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	$ 7,674.00	493.93	17.00%	$ 4,434,790.00	$ 5,765,227.00	0.00	$ -
9.4	PILOTE D = 30 CM. CONCRETO 21MPa - (3000 PSI). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO (INCUYE. EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 5 KM	$ 210,721.00	13.5	0.00%	$ 2,844,734.00	$ 3,698,154.00	0.00	$ -
9.5	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	$ 887,295.00	1.83	17.00%	$ 1,899,787.00	$ 2,469,723.00	0.00	$ -
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRAIMPACTO H = 5,0 M.	$ 2,360,571.00	20	17.00%	$ 55,237,361.00	$ 71,808,569.00	0.00	$ -

9.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TEJIDA 12X12 EN NYLON DE ALTA TENACIDAD Y RESISTENCIA CALIBRE 5 MM PARA ZONA POSTERIOR DEL ESCENARIO DEPORTIVO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	$ 101,388.00	120.09	0.00%	$ 12,175,685.00	$ 15,828,391.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 77,028,071.00**	**$ 100,136,492.00**		**$ -**
	TOTAL OBRA				**$ 1,815,534,666.00**	**$ 2,360,195,066.00**		**$ 231,734,471.36**
	OTRO							
	COSTOS INDIRECTOS (AIU)			**30%**	**$ 544,660,400**			
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)				**$ 34,492,027.33**	**$ 34,492,027.33**	0.15	$ 5,173,804.10
	CERTIFICACION RETIE				**$ 8,000,000.00**	**$ 8,000,000.00**		
	CERTIFICACION RETILAP				**$ 9,000,000.00**	**$ 9,000,000.00**		
	TOTAL OBRA				**$ 2,411,687,093.33**	**$ 2,411,687,093.33**	**9.82%**	**$ 236,908,275.46**
	INTERVENTORIA							
	INTERVENTORIA					$ 168,838,122.85	1.81%	**$ 3,055,970.02**
	TOTAL EJECUTADO PERIODO M4-01/05/26-31/05/26							**$ 239,964,245.49**

Ejecución de actividades y cantidades de acuerdo al mes de marzo.

De acuerdo a las actividades ejecutadas en obra se tiene un avance desde la suscripción de acta de inicio del 23% y del 9.82% para el mes de mayo.

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

Elaboró:

DANNA TATIANA JIMENEZ RIVERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

CONTROL Y VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902027238	5	CONSORCIO INTERVALLE 2026	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERVALLE R2	AV UNIVERSITARIA 58 B 291 TO 2 AP 207	TUNJA-BOYACA	3132509283	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	04388750	9504388750	E	2026/05/12	2026/05/11	BANCO AV VILLAS	0	$898,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INTERVALLE R2 (5 Afiliados)						$1,342,362	$215,100			$1,342,362	$54,100			$1,342,362	$54,100			$1,342,362	$14,300		$0	$0
Centro de Trabajo: INTERVALLE (5 Afiliados)						$1,342,362	$215,100			$1,342,362	$54,100			$1,342,362	$54,100			$1,342,362	$14,300		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (5 Afiliados)						$1,342,362	$215,100			$1,342,362	$54,100			$1,342,362	$54,100			$1,342,362	$14,300		$0	$0
1	CC	7184837	ARCHILA ADARME LUIS CARLOS	230301	6	$350,181	$56,100	MIN002	6	$350,181	$14,100	CCF10	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	$3,700	6	$0	$0
2	CC	1101687793	ORTEGA GARZON JOAN GERARDO	25-14	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF10	2	$116,727	$4,700	14-11	2	$116,727	$1,300	2	$0	$0
3	CC	79691429	RAMIREZ POVEDA FABIO MERCK	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$7,100	CCF10	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	$1,900	3	$0	$0
4	CC	1057546791	SANDOVAL CUEVAS DIEGO FERNANDO	230301	9	$525,272	$84,100	EPS017	9	$525,272	$21,100	CCF10	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	$5,500	9	$0	$0
5	CC	1057592064	SANDOVAL AVILA ELKIN GIOBANI	230301	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$7,100	CCF10	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	$1,900	3	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INTERVALLE R5 (2 Afiliados)						$1,809,269	$289,600			$1,809,269	$72,500			$1,809,269	$72,500			$1,809,269	$126,000		$0	$0
Centro de Trabajo: INTERVALLE R5 (2 Afiliados)						$1,809,269	$289,600			$1,809,269	$72,500			$1,809,269	$72,500			$1,809,269	$126,000		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)						$1,809,269	$289,600			$1,809,269	$72,500			$1,809,269	$72,500			$1,809,269	$126,000		$0	$0
6	CC	1049654004	JIMENEZ RIVERA DANNA TATIANA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
7	CC	1049644677	LOZADA MORENO NATHALY	230301	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
Total	**Afiliados(7)**					$3,151,631	$504,700			$3,151,631	$126,600			$3,151,631	$126,600			$3,151,631	$140,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$504,700	$0	$0	$504,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$46,800	$0	$0	$46,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$177,700	$0	$0	$177,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$140,300	$0	$0	$140,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$140,300	$0	$0	$140,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$126,600	$0	$0	$126,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	$126,600	$0	$0	$126,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$126,600	$0	$0	$126,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$91,200	$0	$0	$91,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$14,100	$0	$0	$14,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$4,700	$0	$0	$4,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$2,400	$0	$0	$2,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$14,200	$0	$0	$14,200
TOTAL				**7**	**$898,200**	**$0**	**$0**	**$898,200**

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

CONTROL Y VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL PERSONAL DE OBRA

ANEXO No. 4.1.1.
PLANILLAS SS
Y AFILIACIONES

PSI INGENIEROS

PLANILLAS SS
ABRIL 2026

CERTIFICACIÓN DE APORTES Y RELACIÓN DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Tunja, 27 de mayo de 2026

El suscrito, LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.603.584 de Tunja, en calidad de Representante Legal de PSI INGENIEROS S.A.S.,

CERTIFICA

Que la empresa PSI INGENIEROS S.A.S., en calidad de contratista de obra del contrato IPVO 030-2025, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", cuenta a la fecha, con los aportes vigentes al Sistema de Seguridad Social Integral de su personal vinculado al proyecto. Los aportes mencionados incluyen los subsistemas de salud, pensión y riesgos laborales, conforme a la normatividad vigente y aplicable.

A continuación, se detalla la relación de planillas correspondientes a los periodos de aportes:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEDICACIÓN	N° PLANILLA ABRIL 2026
Luis Eduardo Sichacá Gámez	1.049.603.584	Director de obra	50%	9505559227
		Especialista en estructuras	30%	
Edwin Camilo Sichacá Cuervo	1.049.602.110	Residente de obra	100%	9503669183
Narem Stip Piña Rodríguez	1.049.648.394	Auxiliar residente de obra	100%	9503669183
Camilo Andrés Lancheros Coy	1,053.330.598	Ingeniero eléctrico	10%	9505448727
Oscar Fabian Pacheco Merchán	1.049.606.085	Ingeniero hidráulico	10%	9505448727
Emilio Bladimir Panqueva Álvarez	7.318.490	Profesional HSEQ	50%	9505559227
Iván Darío Sichacá Gámez	1.049.644.688	Especialista en geotecnia	10%	9505559227
Rodrigo Albeiro Mendivelso Cely	7.181.346	Profesional ambiental	50%	86737090 9505550041
Planilla colaboradores	-	Personal operativo	-	1750928292

La presente certificación se expide para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. M.Sc. LUIS EDUARDO SICHACÁ GAMEZ
C.C. 1.049.603.584 de Tunja
PSI INGENIEROS S.A.S.
Dirección: Calle 20 No. 13-14 Oficina 216B
Cel: 313 830 72 69
e-mail: psi.ingenieros1@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CL 20 13 14	TUNJA-BOYACA	3132931188	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	342544640	9505559227	E	2026/05/13	2026/05/28	BANCO DE BOGOTA	15	$2,012,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Centro de Trabajo: ADMON PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
1	CC	33366983	MEDINA YENNY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ANDENES PAIPA (2 Afiliados)						$3,326,720	$532,400			$3,326,720	$133,200			$3,032,055	$121,400			$3,326,720		$231,600		$0	$0		$1,018,600
Centro de Trabajo: CENTRO (2 Afiliados)						$3,326,720	$532,400			$3,326,720	$133,200			$3,032,055	$121,400			$3,326,720		$231,600		$0	$0		$1,018,600
Ciudad: PAIPA Depto: BOYACA (2 Afiliados)						$3,326,720	$532,400			$3,326,720	$133,200			$3,032,055	$121,400			$3,326,720		$231,600		$0	$0		$1,018,600
2	CC	7318490	PANQUEVA EMILIO X	230201	27	$1,575,815	$252,200	EPS005	27	$1,575,815	$63,100	CCF10	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,575,815	6.960%	$109,700	27	$0	$0	Si	$476,300
3	CC	1049644688	SICHACA IVAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INGENIEROS ESPECIALISTAS (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Centro de Trabajo: ESPECIALISTA OBRA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
4	CC	1049603584	SICHACA LUIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total		**Afiliados(4)**				$6,828,530	$1,092,800			$6,828,530	$273,400			$6,533,865	$261,600			$6,828,530		$362,700		$0	$0		$1,990,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,092,800	$11,900	$0	$1,104,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$9,100	$0	$849,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$252,200	$2,800	$0	$255,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$362,700	$3,900	$0	$366,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$362,700	$3,900	$0	$366,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$261,600	$2,900	$0	$264,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$261,600	$2,900	$0	$264,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$273,400	$3,000	$0	$276,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$800	$0	$70,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$203,300	$2,200	$0	$205,500
TOTAL				**4**	**$1,990,500**	**$21,700**	**$0**	**$2,012,200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901062819
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INTERVENTORIA,CONSULTIRA Y CONSTRUCCION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	RAMIRIQUI	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 4 NO 4-67	TELÉFONO:	7327628
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - COR RAM
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1750928292**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996645033		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100	$ 0	$ 84.100
230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.120.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.120.900	$ 0	$ 1.120.900
SUBTOTALES:										**$ 1.205.000**	**$ 0**	**$ 1.205.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 166.000
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 65.600
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 301.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 301.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 510.700	$ 510.700	$ 0	$ 0	$ 510.700
SUBTOTALES:									**$ 510.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 510.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	8	$ 301.700	$ 0	$ 301.700
SUBTOTALES:			**$ 301.700**	**$ 0**	**$ 301.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901062819
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INTERVENTORIA,CONSULTIRA Y CONSTRUCCION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	RAMIRIQUI	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 4 NO 4-67	TELÉFONO:	7327628
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - COR RAM
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1750928292**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996645033

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN										SALUD							ARP																
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 72326961	SALAMANCA MENDOZA PABLO EDILSON	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	1	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	PT 6424123	PEREZ CARLOS GREGORIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	21																230301-PORVENIR	10	$ 583.635	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 93.400	NUEVA EPS CM	10	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 23.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	10	$ 583.635	1	$ 40.700	10	$ 583.635	CCF10-COMFABOY	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.319.100

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GUATEQUE	MUNICIPIO DE GUATEQUE	GUATEQUE-BOYACA	3138307269	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	338322569	9503669183	E	2026/05/13	2026/05/26	BANCOLOMBIA	13	$1,095,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049648394	PIÑA RODRIGUEZ NAREM STIP																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
2	CC	1049602110	SICHACA CUERVO EDWIN CAMILO																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total	**Afiliados(2)**																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$243,800		$0	$0		$1,084,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GUATEQUE	MUNICIPIO DE GUATEQUE	GUATEQUE-BOYACA	3138307269	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	338322569	9503669183	E	2026/05/13	2026/05/26	BANCOLOMBIA	13	$1,095,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$560,400	$5,400	$0	$565,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$2,700	$0	$282,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$2,700	$0	$282,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$243,800	$2,300	$0	$246,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$243,800	$2,300	$0	$246,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$1,400	$0	$141,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$140,200	$1,400	$0	$141,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$140,200	$1,400	$0	$141,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$700	$0	$70,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$700	$0	$70,800
TOTAL				**2**	**$1,084,600**	**$10,500**	**$0**	**$1,095,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GUATEQUE	MUNICIPIO DE GUATEQUE	GUATEQUE-BOYACA	3138307269	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	339201237	9505448727	E	2026/05/13	2026/05/27	BANCOLOMBIA	14	$110,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1053330598	LANCHEROS COY CAMILO ANDRES	X	X																230301	3	$175,091	$28,100	EPS017	3	$175,091	$7,100	CCF10	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	$12,200	3	$0	$0	Si	$54,500
2	CC	1049606085	PACHECO MERCHAN OSCAR FABIAN	X	X																230301	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$7,100	CCF10	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	$12,200	3	$0	$0	Si	$54,500
Total	**Afiliados(2)**																						$350,182	$56,200			$350,182	$14,200			$350,182	$14,200			$350,182	$24,400		$0	$0		$109,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GUATEQUE	MUNICIPIO DE GUATEQUE	GUATEQUE-BOYACA	3138307269	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	339201237	9505448727	E	2026/05/13	2026/05/27	BANCOLOMBIA	14	$110,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$56,200	$600	$0	$56,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$56,200	$600	$0	$56,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$24,400	$300	$0	$24,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$24,400	$300	$0	$24,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$14,200	$200	$0	$14,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$14,200	$200	$0	$14,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$14,200	$200	$0	$14,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$7,100	$100	$0	$7,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$7,100	$100	$0	$7,200
TOTAL				**2**	**$109,000**	**$1,300**	**$0**	**$110,300**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7181346	RODRIGO ALBEIRO MENDIVELSO CELY	CALLE 43 N 8A 06	3104714630	afiliacionesappcontrol@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	TIPACOQUE		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		86737090	28/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$302.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	131.400	0		0		0	15	1.500	0	132.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	168.100	0	0	0	0	15	1.900	0	170.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	15	0	0	0
ICBF				
0	15	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	131.400	132.900
Pensión	1	168.100	170.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	299.500	302.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7181346	RODRIGO ALBEIRO MENDIVELSO CELY	CALLE 43 N 8A 06	3104714630	afiliacionesappcontrol@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	TIPACOQUE		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		86737090	28/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$302.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excluyendo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 7181346	MENDIVELSO CELY RODRIGO ALBEIRO	3	0			N	X	X															23030 1	1.050.543	18	168.100	0	0	0	0	EPS037	1.050.543	18	131.400		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO PAIPA	PARQUE PRINCIPAL PAIPA	PAIPA-BOYACA	3138307269	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	342513950	9505550041	Y	2026/05/13	2026/05/28	BANCO DE BOGOTA	15	$148,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	4179386	CAMACHO JUAN	X	T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	9	$525,272	$36,600	0	$0	$0	No	$36,600
2	CC	7181346	MENDIVELSO RODRIGO	X	T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	18	$1,050,543	$73,200	0	$0	$0	No	$73,200
3	CC	79969466	VARGAS IVAN	X	T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	9	$525,272	$36,600	0	$0	$0	No	$36,600
Total	**Afiliados(3)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,101,087	$146,400		$0	$0		$146,400

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO PAIPA	PARQUE PRINCIPAL PAIPA	PAIPA-BOYACA	3138307269	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	342513950	9505550041	Y	2026/05/13	2026/05/28	BANCO DE BOGOTA	15	$148,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$146,400	$1,600	$0	$148,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$146,400	$1,600	$0	$148,000
TOTAL				3	$146,400	$1,600	$0	$148,000

AFILIACIONES

30263252

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT. 900.156.264-2

No.Radicación: 389097

FECHA DE RADICACIÓN: 25 05 2026

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. TIPO DE TRÁMITE: A. AFILIACIÓN [ ] B. REPORTE DE NOVEDADES [X]
2. TIPO DE AFILIACIÓN: A. Individual: a) Cotizante o cabeza de familia [X] b) Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]
3. RÉGIMEN: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA: SI [ ] NO [X]
5. TIPO DE AFILIADO: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ] D. Afiliado adicional [ ]
6. TIPO DE COTIZANTE: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
7. CÓDIGO: A1345

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

8. APELLIDOS Y NOMBRES
- PRIMER APELLIDO: BARRERA
- SEGUNDO APELLIDO: CASTILLO
- PRIMER NOMBRE: MARIO
- SEGUNDO NOMBRE:

9. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.N. [ ] M.S. [ ] R.C. [ ] T.I. [ ] C.C. [CC] C.E. [ ] S.C. [ ] C.D. [ ] A.S. [ ] P.T. [ ]
10. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 4130793
11. SEXO BIOLÓGICO: F [ ] M [X]
12. SEXO IDENTIFICACIÓN: F [ ] M [X] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual?
13. NACIONALIDAD: COLOMBIA
14. LUGAR DE NACIMIENTO: PAÍS: COLOMBIA; DEPARTAMENTO: BOYACA; MUNICIPIO: GUATEQUE
15. FECHA NACIMIENTO: DÍA 21 MES 04 AÑO 1962

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

16. ETNIA: 6
17. COMUNIDAD INDÍGENA:
18. DISCAPACIDAD: SI [ ] NO [X] CATEGORÍA DE DISCAPACIDAD:
19. TIENE ENCUESTA SISBÉN? SI [ ] NO [X]
20. CLASIFICACIÓN SISBÉN:
21. GRUPO POBLACIÓN ESPECIAL:
22. ARL: POSITIVA
23. AFP: COLPENSIONES
24. IBC: $1,750,905.00
25. TARIFA CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA: $0.00
26. RESIDENCIA
- DIRECCIÓN: VEREDA SINCACHOQUE
- TELÉFONO FIJO:
- TELÉFONO CELULAR: 3223136928
- CORREO ELECTRÓNICO: mariobarreracastillo9@gmail.com
- DEPARTAMENTO: BOYACA
- MUNICIPIO/ DISTRITO: GUATEQUE
- LOCALIDAD/COMUNA:
- ZONA: CABECERA MUNICIPAL [X] CENTRO POBLADO [ ] RURAL DISPERSO [ ] RESTO RURAL [ ]
- IPS: 7225

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR - Datos de identificación del beneficiario (Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

27. APELLIDOS Y NOMBRES
- PRIMER APELLIDO:
- SEGUNDO APELLIDO:
- PRIMER NOMBRE:
- SEGUNDO NOMBRE:

28. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: T.I. [ ] C.C. [ ] C.E. [ ] S.C. [ ] C.D. [ ] P.T. [ ]
29. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
30. SEXO BIOLÓGICO: F [ ] M [ ]
31. SEXO IDENTIFICACIÓN: F [ ] M [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual?
32. NACIONALIDAD:
33. LUGAR DE NACIMIENTO: PAÍS; DEPARTAMENTO; MUNICIPIO
34. FECHA NACIMIENTO: DÍA; MES; AÑO

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	35. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	36. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	37. NÚMERO DE IDENTIDAD	38. NACIONALIDAD	39. SEXO F	39. SEXO M	40. SEXO IDENTIFICACIÓN F	40. SEXO IDENTIFICACIÓN M	40. SEXO IDENTIFICACIÓN T	40. SEXO IDENTIFICACIÓN NB	40. SEXO IDENTIFICACIÓN Otro?	41. LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS	41. LUGAR DE NACIMIENTO DEPART.	41. LUGAR DE NACIMIENTO MUNICIPIO	42. FECHA DE NACIMIENTO DÍA	42. FECHA DE NACIMIENTO MES	42. FECHA DE NACIMIENTO AÑO
B1		CN MS RC TI CC CE SC PA CD AS PT															
B2		CN MS RC TI CC CE SC PA CD AS PT															
B3		CN MS RC TI CC CE SC PA CD AS PT															
B4		CN MS RC TI CC CE SC PA CD AS PT															
B5		CN MS RC TI CC CE SC PA CD AS PT															

	Datos complementarios del Beneficiario 43. PARENTESCO	44. ETNIA	45. COMUNIDAD	46. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL	47. TIENE ENCUESTA SISBÉN? SI	47. NO	48. CLASIFICACIÓN SISBÉN NIVEL	48. GRUPO	49. DISCAPACIDAD SI	49. NO	CATEGORÍA DE DISCAPACIDAD	50. INCAPACIDAD PERMANENTE SI	50. NO	51. Datos de residencia DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/ DISTRITO	ZONA CABECERA MUNICIPAL	CENTRO POBLADO	RURAL DISPERSO	RESTO RURAL
B1							I. II.												
B2							I. II.												
B3							I. II.												
B4							I. II.												
B5							I. II.												

	TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR	52. VALOR DE LA UPC DEL AFILIADO ADICIONAL	DIRECCIÓN	LOCALIDAD/ COMUNA	CORREO ELECTRÓNICO	53. IPS	54. CÓDIGO DE LA IPS (A REGISTRAR POR LA EPS)
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

55. Nombre o razón social: INTERVENTORIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
56. Tipo documento de Identificación: NIT [X] C.C. [ ] C.E. [ ] S.C. [ ] P.A. [ ] C.D. [ ] P.T. [ ]
57. Número del documento de Identificación: 901062819
58. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS):
59. Ubicación
- DIRECCIÓN: VDA CAICEDOS
- TELÉFONO FIJO O CELULAR: 3202331409
- CORREO ELECTRÓNICO: incons.sas2017@gmail.com
- DEPARTAMENTO:
- MUNICIPIO/DISTRITO:

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. TIPO DE NOVEDAD
1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD [ ]
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS [ ]
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LA EPS Código: [ ]
6. REPORTE DE PAGO A TRAVÉS DE UN TERCERO Código: [ ]
7. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
8. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR [X]
10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO [ ]
11. INSCRIPCIÓN EPS RETORNO AL PAÍS.1. RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA. [ ]
12. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
13. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
14. MOVILIDAD A) AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO [ ] B) AL RÉGIMEN SUBSIDIADO [ ]
15. TRASLADO A) MISMO RÉGIMEN [ ] B) DIFERENTE RÉGIMEN [ ]
16. REPORTE DE FALLECIMIENTO [ ]
17. REPORTE DEL TRÁMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE [ ]
18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PREPENSIONADO [ ]
19. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO [ ]
20. INGRESO A CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA. [ ]
21. RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA. [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

61. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
- PRIMER APELLIDO:
- SEGUNDO APELLIDO:
- PRIMER NOMBRE:
- SEGUNDO NOMBRE:
- TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: T.I. [ ] C.C. [ ] C.E. [ ] S.C. [ ] C.D. [ ] P.T. [ ]
- NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
62. SEXO BIOLÓGICO: F [ ] M [ ]
63. SEXO IDENTIFICACIÓN: F [ ] M [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual?
64. FECHA NACIMIENTO: DÍA; MES; AÑO
65. EPS ANTERIOR:
66. FECHA DE NOVEDAD: DÍA 19 MES 05 AÑO 2026
67. MOTIVO DE TRASLADO Código:
68. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES:

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

69. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(los) Beneficiario(s) reportado(s) dependen económicamente de mi. [ ]
70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad [ ]
72. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
75. Autorizo para que la EPS realice el manejo de los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
76. a). Autorizo mi consentimiento explícito para que Nueva EPS establezca comunicación a través de SMS, EMAIL, Página Web, Notificaciones App, Llamadas Telefónicas, WhatsApp y otros canales, para recibir mensajes informativos. [X]
b). Autorización para que la EPS me contacte con fines netamente informativos sobre la prestación de servicios de salud dentro de los horarios regulares, incluso si estoy registrado en el "Registro de Números Excluidos" (RNE). [ ]
77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes. [ ]
78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente. [ ]

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
- PRIMER APELLIDO:
- SEGUNDO APELLIDO:
- PRIMER NOMBRE:
- SEGUNDO NOMBRE:
- TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: T.I. [ ] C.C. [ ] C.E. [ ] S.C. [ ] C.D. [ ] P.T. [ ]
- NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

IX. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia, beneficiario cuando aplique o afiliado adicional
81. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación Colectiva, Institucional o de Oficio

X. ANEXOS

82. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] MS [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] CE [ ] SC [ ] PA [ ] CD [ ] AS [ ] PT [ ]
Cantidad: Total
83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
84. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016 [ ]
90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en las que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. Total Anexos [ ]

XI. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIONES RESPONSABLES DE POBLACIONES ESPECIALES

92. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Código del Municipio: Código del departamento:
93. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

XII. DATOS DE LA INSTITUCIÓN Y DEL FUNCIONARIO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN.

94. APELLIDOS Y NOMBRES
- Primer apellido:
- Segundo apellido:
- Primer nombre:
- Segundo nombre:
- TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. [ ] C.E. [ ] S.C. [ ] C.D. [ ] P.T. [ ]
- Número del documento de identidad:
95. FIRMA DEL FUNCIONARIO
96. FECHA DE RADICACIÓN: DÍA; MES; AÑO
97. FECHA DE VALIDACIÓN: DÍA; MES; AÑO

OBSERVACIONES:

VIGILADO Supersalud

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

- ORIGINAL: E.P.S. -

ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES Y CARTA DE DESEMPEÑO

nueva eps
gente cuidando gente
NIT. 900.156.264-2

Autorización de mensajes de texto. (Circular externa 000016 mayo de 2013)

Yo, MARIO BARRERA CASTILLO identificado (a) con R.C. | T.I. | C.C. | C.E. | CC | S.C. | C.D. | P.E. | P.T.

número 4130793 de GUATEQUE, certifico que:

1	¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente?	SÍ☐ No☐
2	¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	SÍ☐ No☐
3	¿Leyó el contenido de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente?	SÍ☐ No☐
4	¿Leyó el contenido de la carta de desempeño de la EPS?	SÍ☐ No☐
5	¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información, fue asesorado adecuadamente por la EPS?	SÍ☐ No☐

Así mismo autorizo a NUEVA EPS, para que envíe información al teléfono celular No. 3223136928

y/o correo electrónico: mariobarreracastillo9@gmail.com

SÍ☐ No☐

Autorizo la entrega de la carta de Derechos y Deberes del Afiliado y carta de Desempeño, en formato electrónico. SÍ☐ No☐

Consulte la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño en el micrositio Web https://www.nuevaeps.com.co/carta-derechos-deberes

Evitando impresiones para ser amigable con el planeta SI ☐ NO ☐

Declaración juramentada de convivencia: Declarar que convivo con el(la) señor(a) _____ Identificado(a) con _____

No. _____ desde el día _____ del año _____

Cordialmente,

Firma: _____

Tipo ID: CC No. ID: 4130793

Fecha de Solicitud: 25/05/2026

Dirección: VEREDA SINCACHOQUE

Tel: 3223136928 Municipio: GUATEQUE

Departamento: BOYACA

Huella

Afiliado manifiesta que no sabe o no puede firmar, autoriza a:

Firma: _____

Tipo ID: _____ No. ID: _____

Fecha (dd/mm/aaaa): _____

Dirección: _____

Tel: _____ Municipio: _____

Departamento: _____

Huella

Manifiesto con mi firma la aceptación de todas las declaraciones y términos incorporados en este formato y el consentimiento expreso, previo e informado en relación con el tratamiento de mis datos personales que hará NUEVA EPS S.A., en sujeción a la política para el tratamiento de datos personales de la NUEVA EPS S.A. .

Autorizaciones

En virtud de la anterior certificación, autorizo expresamente y conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley 527 de 1995, a NUEVA EPS S.A. para que me remita información en forma de mensajes de datos, a través de mecanismos como sms -short message service - , correos electrónicos y redes sociales, relacionada con los servicios de NUEVA EPS S.A. y la carta de derecho de deberes.

Autorizo de manera expresa a NUEVA EPS S.A. y/o a la persona natural o jurídica a quien ésta encargue, para que recolecte, almacene, use, haga circular, actualice o suprima mis datos personales, para acceder a los servicios de la NUEVA EPS S.A. y para el cumplimiento de la carta de derechos y deberes.

Aviso de privacidad

Hago constar expresamente que NUEVA EPS S.A. me informó sobre los siguientes derechos que me asisten como titular de datos personales:

• Acceder los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.

• Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente al responsable del tratamiento y al encargado del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros datos, en relación con datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos datos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.

• Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.

• Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, con respecto del uso que le ha dado a los datos personales.

• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.

• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la constitución.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la política de tratamiento de los datos personales de NUEVA EPS S.A., a través de los siguientes mecanismos que ponemos a su disposición:

Sitio web: www.nuevaeps.co

Régimen Contributivo:
Línea Gratuita: **01 8000 954400**
Línea de atención en Bogotá: **(601) 307 7022**

Régimen Subsidiado:
Línea Gratuita: **01 8000 95 2000**
Línea de atención en Bogotá: **(601) 307 7051**

Oficinas de atención al afiliado de NUEVA EPS S.A.
Conmutador: **(601) 419 3000**
Dirección Administrativa: Carrera 85k No 46A – 66 Piso 2

Sr.(a) afiliado(a), la información por usted suministrada en este formato, así como la relacionada en el formulario de afiliación y/o demás documentos anexos, serán utilizados por NUEVA EPS S.A. como responsable del tratamiento de la información únicamente para los fines específicos relacionados con la administración y prestación de servicios en salud de Plan Obligatorio de Salud, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 "Hábeas Data"; dicho tratamiento podrá implicar la trasferencia, trasmisión y/o recepción de los datos, y el cual se realizará a través de sí misma, terceros encargados de tratamiento de información o de sus aliados comerciales, para fines comerciales y para la correcta prestación del servicio, de la forma indicada en los Términos y Condiciones de cada uno de sus portales y de la Política de Confidencialidad y Protección de Datos.

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL TRABAJADOR INDEPENDIENTE CUYO INGRESO SEA IGUAL O SUPERIOR A 1 SMMLV

ACTIVIDAD ECONÓMICA	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	POSEE VIVIENDA PROPIA		PRODUCTOR AGROPECUARIO	
	POSITIVA	COLPENSIONES	$1750905	SÍ		SÍ	
				NO		NO	

Nivel de Escolaridad									
Ninguno ☐	Secundaria ☐	Normalista ☐	Profesional ☐	Doctorado ☐
Preescolar ☐	Media académica o clásica (bachillerato básico) ☐	Técnica Profesional ☐	Especialización ☐	Último Grado
Básico Primaria ☐	Media técnica (bachillerato básico) ☐	Tecnológica ☐	Maestría ☐	Aprobado _____

Posición Ocupacional	Patrón/Empleador ☐	Contratista ☐	Trabaja por su Cuenta ☐
Inicio Contrato		Fin Contrato	

SEÑOR USUARIO: TRABAJADOR INDEPENDIENTE O CONTRATISTA, RECUERDE REPORTAR LA NOVEDAD DE RETIRO EN LA PLANILLA DE PAGO A PARTIR DEL MOMENTO QUE DECIDA NO CONTINUAR CON LOS SERVICIOS DE SALUD, EL NO HACERLO LE GENERA MORA, LA CUAL TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL MOMENTO EN EL QUE REPORTE SU RETIRO AL SISTEMA. DECRETO 806 ART. 57 DE 1998 Y ART. 59 DECRETO 1406 DE 1999.

SÓLO DILIGENCIAR SI ES COTIZANTE INDEPENDIENTE PAGO POR TERCERO	Nombre del Tercero	Tipo de Identificación	NIT	C.C.	C.E.	Identificación del Tercero que realiza el Aporte	DV
			P.A.	T.I.	C.D.		

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR LA EPS

Nombre del ASESOR o PROMOTOR	CÓDIGO ASESOR o PROMOTOR	Nombre de OFICINA	
Fabio Galvis Hernandez	A1345		CIUDAD Y FECHA

CER_AFI_2026027605162

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

Mario Barrera Castillo identificado con CC. 4130793 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	INTERVENTORIA, CONSULTORIA,	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 901062819

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/05/23	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5429001

Esta certificación se expide a los 22 días del mes de mayo del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC22052026N4130793A18309227.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

Hacienda

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de la afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, EMETERIO VARGAS ESPINOSA identificado(a) con CC 72324884 registra la siguiente información.

Datos del empleador	Datos de la Relación Laboral
INTERVENTORIA, CONSULTORIA, CONSTRUCCIÓN SAS INCONS - NI. 901062819	Fecha de inicio de cobertura: 09-03-2026 Estado Afiliación: ACTIVO Tipo Vinculación: TRABAJADOR DEPENDIENTE Clase de Riesgo: 5 Actividad Económica: 5429001

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 08 dia(s) del mes de Marzo de 2026.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

El(La) Señor(a) EMETERIO VARGAS ESPINOSA identificado(a) con CC 72324884 se encuentra afiliado a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	**01/01/2014**
Estado de la Afiliación:	**ACTIVO**
IPS:	**SUBSIDIADO-ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUI**
Categoría:	**A**

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 5 días del mes de mayo del año 2026.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS.
NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones
Nueva EPS S.A

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

EMETERIO VARGAS ESPINOSA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **72.324.884**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 5 de Mayo del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Hacienda

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de la afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, PABLO EDILSON SALAMANCA MENDOZA identificado(a) con CC 72326961 registra la siguiente información.

Datos del empleador	Datos de la Relación Laboral
INTERVENTORIA, CONSULTORIA, CONSTRUCCIÓN SAS INCONS - NI. 901062819	Fecha de inicio de cobertura: 16-09-2025 Estado Afiliación: ACTIVO Tipo Vinculación: TRABAJADOR DEPENDIENTE Clase de Riesgo: 5 Actividad Económica: 5429001

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 08 dia(s) del mes de Marzo de 2026.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

EPS Sanitas
Nuestro compromiso es contigo
NIT. 800.251.440-6

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Fecha de Radicado: 05052026

201023497

(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo antes de diligenciar este formulario)

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Contribución solidaria
A. Afiliación — B. Reporte de Novedades X	A. Individual - Cotizante o Cabeza de Familia X — B. Colectiva — D. De Oficio — Beneficiario o Afiliado adicional — C. Institucional	A. Contributivo X — B. Subsidiado	Si — No X

5. Tipo de Afiliado	6. Tipo de Cotizante	7. Código
A. Cotizante X — C. Beneficiario — B. Cabeza de Familia — D. Afiliado adicional	A. Dependiente X — B. Independiente — C. Pensionado	(a registrar por la EPS)

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
SALAMANCA	MENDOZA	PABLO	EDILSON

9. Tipo de documento de identidad	10. Número del documento de identidad	11. Sexo biológico	12. Sexo identificación	Cuál	13. Nacionalidad
CC	72326961	Femenino — Masculino X	F — M X — T — NB — Otro		COLOMBIANO

14. Lugar de nacimiento	País	Departamento	Municipio	15. Fecha de nacimiento
	COLOMBIA	BOYACA	RAMIRIQUI	15 10 1983

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos Personales

16. Etnia	17. Comunidad	18. Discapacidad	19. Tiene encuesta SISBÉN	20. Clasificación SISBÉN	21. Grupo de población especial
6		Si — No X — Categoría de discapacidad	Si — No X	Nivel — Grupo	

22. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	23. Administradora de Pensiones	24. Ingreso base de cotización - IBC	25. Tarifa Contribución Solidaria
POSITIVA	PORVENIR	$ 1.750.905	

26. Residencia Dirección	Teléfono Fijo
VDA CAICEDOS ALTO	

Teléfono Celular	Correo Electrónico
3168654716	lmyriamramos42@gmail.com

Departamento	Municipio / Distrito	Localidad / Comuna	Zona
BOYACA	TUNJA		Cabecera Municipal — Rural Disperso — Centro Poblado — Resto Rural X

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos Básicos de Identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente del cotizante

27. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

28. Tipo de documento de identidad	29. Número del documento de identidad	30. Sexo biológico	31. Sexo identificación	Cual	32. Nacionalidad
		Femenino — Masculino	F — M — T — NB — Otro		

33. Lugar de nacimiento	País	Departamento	Municipio	34. Fecha de nacimiento
				D D M M A A A A

Datos Básicos de Identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	35. Apellidos y nombres: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	36. Tipo de documento de identidad	37. Número del documento de identidad	38. Nacionalidad	39. Sexo biológico	40. Sexo Identificación	41. Lugar de nacimiento	42. Fecha de nacimiento
B1				Femenino Masculino	F M T NB Otro Cual	País Departamento Municipio	D D M M A A A A
B2				Femenino Masculino	F M T NB Otro Cual	País Departamento Municipio	D D M M A A A A
B3				Femenino Masculino	F M T NB Otro Cual	País Departamento Municipio	D D M M A A A A
B4				Femenino Masculino	F M T NB Otro Cual	País Departamento Municipio	D D M M A A A A
B5				Femenino Masculino	F M T NB Otro Cual	País Departamento Municipio	D D M M A A A A

Datos complementarios del Beneficiario

	43. Parentesco	44. Etnia	45. Comunidad	46. Grupo de población especial	47. Tiene encuesta SISBÉN	48. Clasificación SISBÉN	49. Discapacidad	50. Incapacidad permanente
B1					Si No	Nivel Grupo	Si No Categoría de discapacidad	Si No
B2					Si No	Nivel Grupo	Si No Categoría de discapacidad	Si No
B3					Si No	Nivel Grupo	Si No Categoría de discapacidad	Si No
B4					Si No	Nivel Grupo	Si No Categoría de discapacidad	Si No
B5					Si No	Nivel Grupo	Si No Categoría de discapacidad	Si No

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio/ Distrito	zona	Teléfono fijo y/o celular	52. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1			Cabecera Municipal — Centro Poblado — Rural Disperso — Resto Rural		
B2			Cabecera Municipal — Centro Poblado — Rural Disperso — Resto Rural		
B3			Cabecera Municipal — Centro Poblado — Rural Disperso — Resto Rural		
B4			Cabecera Municipal — Centro Poblado — Rural Disperso — Resto Rural		
B5			Cabecera Municipal — Centro Poblado — Rural Disperso — Resto Rural		

	Dirección	Localidad/Comuna	Correo Electrónico
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

A. AFILIACIÓN

AEU

201023497

53. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS		54. Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

55. Nombre o razón social	56. Tipo documento de Identificación	57. Número del documento de Identificación	58. Tipo de aportante o pagador de Pensiones (a registrar por la EPS)
INTERVENTORIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	NT	901062819	

59. Ubicación

Dirección: VDA CAICEDOS

Teléfono fijo o Celular: 3107589835

Correo Electrónico: incons.sas2017@gmail.com

Departamento: BOYACA

Municipio / Distrito: RAMIRIQUI

60. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identificación.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código
- [ ] 6. Reporte de pago a través de un tercero Código
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Inscripción EPS retorno al país.
- [ ] 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 14. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 15. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 16. Reporte de fallecimiento del Cotizante o Cabeza de familia.
- [ ] 17. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pre- pensionado.
- [ ] 19. Reporte de la calidad de Pensionado.
- [ ] 20. Ingreso a Contribución Solidaria.
- [ ] 21. Retiro de Contribución Solidaria.

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de identificación

Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	62. Sexo biológico	63. Sexo identificación	64. Fecha de nacimiento
		Femenino Masculino	F M T NB Otro Cual	D D M M A A A A

65. EPS anterior	66. Fecha de novedad	67. Motivo de traslado	68. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones
	01042026	Código	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 69. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 72. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [X] 73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [X] 74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [X] 75. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [X] 76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.
- [ ] 77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
- [ ] 78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Tipo de documento de identidad	No. del documento de identidad

IX. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional	81. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio
Pablo salamanca mendoza	Jorge Manuel castro

X. ANEXOS

- [X] 82. Anexo copia del documento de identidad. Cantidad de documentos de identidad anexos: CN RC TI CC CE PA CD SC PT
- [ ] 83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 84. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 88. Documentó en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016.
- [ ] 90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en a que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

Total Anexos

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial: Código del municipio | Código del departamento

93. Nombre de la Institución

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y nombres

Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	95. Firma del funcionario	96. fecha de radicación	97. Fecha de validación
			D D M M A A A A	D D M M A A A A

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

Doc. identificación y nombre del Ejecutivo Comercial	Sello de Radicación	Sticker procesamiento
SEGUROS Y VIDA LTDA NIT 900986188	EPS Sanitas RECIBIDO PARA SU ESTUDIO	

B. REPORTE DE NOVEDADES

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

PABLO EDILSON SALAMANCA MENDOZA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **72.326.961**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 5 de Mayo del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

CER_AFI_2026026662231

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

Jose Armando Morales Montenegro identificado con CC. 1052790067 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	INTERVENTORIA, CONSULTORIA,	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 901062819

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/04/22	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5429001

Esta certificación se expide a los 21 días del mes de abril del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC21042026N1052790067A17373376.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 05/05/2026, el empleador INTERVENTORIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS identificado con NIT número 901062819 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
10300159	05/05/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
PERMISO POR PROTECCIÓN	6424123	CARLOS GREGORIO PEREZ	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-21
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1023036108	EDWARDMAURICIO GOMEZ LEGUIZAMO	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-28
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1049797274	LUISABELARDO PINTO RAMOS	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-21
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1052790067	JOSEARMANDO MORALES MONTENEGRO	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-22
CÉDULA DE CIUDADANÍA	4287474	JAIME FONSECA	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-16

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 5 días del mes de Mayo del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Protección

Una empresa sura

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **MORALES MONTENEGRO JOSE ARMANDO** identificado(a) con **CC** número **1.052.790.067** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 14 de abril de 2007 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 05 de mayo de 2026.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:
Bogotá **(601) 482 33 64** – Medellín **(604) 510 90 99** – Cali **(602) 386 00 80** -
Barranquilla **(605) 319 79 99** – Cartagena **(605) 642 49 99** – WhatsApp **+57 310 220 5575**
o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a **https://customer0001.wolkvox.com/proteccion/index.php**

CER_AFI_2026026662124

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

CARLOS GREGORIO PEREZ identificado con PT. 6424123 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	INTERVENTORIA, CONSULTORIA,	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 901062819

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/04/22	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5429001

Esta certificación se expide a los 21 días del mes de abril del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **PT21042026N6424123A17373268.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 05/05/2026, el empleador INTERVENTORIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS identificado con NIT número 901062819 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
10300159	05/05/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
PERMISO POR PROTECCIÓN	6424123	CARLOS GREGORIO PEREZ	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-21
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1023036108	EDWARDMAURICIO GOMEZ LEGUIZAMO	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-28
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1049797274	LUISABELARDO PINTO RAMOS	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-21
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1052790067	JOSEARMANDO MORALES MONTENEGRO	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-22
CÉDULA DE CIUDADANÍA	4287474	JAIME FONSECA	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-16

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 5 días del mes de Mayo del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

CARLOS GREGORIO PEREZ, identificado(a) con permiso de protección temporal **P.T 6424123**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 05 de Mayo del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

CER_AFI_2026026662177

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

Luis Abelardo Pinto Ramos identificado con CC. 1049797274 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	INTERVENTORIA, CONSULTORIA,	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 901062819

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/04/22	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5429001

Esta certificación se expide a los 21 días del mes de abril del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC21042026N1049797274A17373322.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 05/05/2026, el empleador INTERVENTORIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS identificado con NIT número 901062819 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
10300159	05/05/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
PERMISO POR PROTECCIÓN	6424123	CARLOS GREGORIO PEREZ	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-21
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1023036108	EDWARDMAURICIO GOMEZ LEGUIZAMO	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-28
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1049797274	LUISABELARDO PINTO RAMOS	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-21
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1052790067	JOSEARMANDO MORALES MONTENEGRO	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-22
CÉDULA DE CIUDADANÍA	4287474	JAIME FONSECA	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-16

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 5 días del mes de Mayo del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

LUIS ABELARDO PINTO RAMOS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.049.797.274**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 5 de Mayo del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

CER_AFI_2026026789928

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

Edward Mauricio Gomez Leguizamo identificado con CC. 1023036108 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	INTERVENTORIA, CONSULTORIA,	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 901062819

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/04/28	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5429001

Esta certificación se expide a los 27 días del mes de abril del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC27042026N1023036108A17500109.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 05/05/2026, el empleador INTERVENTORIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS identificado con NIT número 901062819 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
10300159	05/05/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
PERMISO POR PROTECCIÓN	6424123	CARLOS GREGORIO PEREZ	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-21
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1023036108	EDWARDMAURICIO GOMEZ LEGUIZAMO	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-28
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1049797274	LUISABELARDO PINTO RAMOS	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-21
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1052790067	JOSEARMANDO MORALES MONTENEGRO	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-22
CÉDULA DE CIUDADANÍA	4287474	JAIME FONSECA	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-16

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 5 días del mes de Mayo del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

EDWARD MAURICIO GOMEZ LEGUIZAMO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.023.036.108**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 5 de Mayo del 2026.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

BITÁCORA DE OBRA

	BITACORA			
	PSI INGENIEROS S.A.S		Folio	1

DATOS DE LA OBRA		
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
Localización	Institución educativa tecnica Valle de Tenza	Guateque, Boyacá
N° de contrato de obra	IPVO 030-2025	
fecha de acta de inicio	24 DE FEBRERO DE 2026	
Fecha de inicio	02 DE MARZO DE 2026	
fecha estimada de conclusión	24 DE SEPTIEMBRE 2026	
DATOS DEL CONTRATISTA		
Nombre o razon social	PSI INGENIEROS S.A.S	
Domicilio		
telefono		
DATOS DE LA INTERVENTORIA		
Nombre o razon social	CONSORCIO INTERVALLE 2026	
Domicilio		
telefono		

TIEMPO
MAÑANA PARCIALMENTE SOLEADO, TARDE NUBLADO CON LLUVIAS

ACTIVIDADES

• se continua con el armado de parrila para pedestales eje A-3, A-4, A-5 cimentacion cubierta acorde a los planos estrucuturales

• Se continua con el seguimiento plan de contigencia para proteccion de viga de cimentacion bloques de biblioteca y zona de baños institucion eductavia, se realiza revision en la señalizacion del aera para evitar transito de peatones en la zona, al igual que la suspension temporal de los baños y biblioteca, se realiza revision del apuntalamiento en madera y parales como me dida de asentamiento de la viga

• Se continuo con la elaboracion de concreto de 3,000 psi para zarpas zapatas eje A-2, A-3, A-6 cimentacion cubierta escenario deportivo, se realiza toma de cilindros de concreto para verirficacion de resistencia

PERSONA Y MAQUINARIA

PERSONAL	CANTIDAD	CARGO	EMPRESA	HORARIO
ING RESIDENTE DE OBRA	1	RESIDENTE DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	RESESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLE 2026	7:00 AM A 5:00 PM
CUADRILLA DE OBRA	3	AUXILIARES DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
MAQUINARIA Y EQUIPO	**CANTIDAD**	**TIPO**	**EMPRESA**	**H/DÍA**
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	VARIOS	N/A	PSI INGENIEROS S.A.S	JR
EQUIPO TOPOGRAFICO				

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	UNIDAD	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO
CEMENTO								

FOTOS









VISITAS

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
ING LUIS EDUARDO SICHACA	DIRECTOR DE OBRA	
ING .DANNA TATIANA JIMÉNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Se realiza acompañamiento en fundida de zarpa de zapatas en el eje A, se realiza toma de cilindros de concreto y se hace recomendaciones sobre el seguimiento al plan de acción, se hace solicitud sonre el requetimiento preventivo y correctivo del control de agua acumulada en excavaciones

EDWIN CAMILO SICHACA
RESIDENTE DE OBRA

Danna Jiménez
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE LA SUPERVISIÓN

	BITACORA			
	PSI INGENIEROS S.A.S		Folio	1

DATOS DE LA OBRA		
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
Localización	Institución educativa tecnica Valle de Tenza	Guateque, Boyacá
N° de contrato de obra	IPVO 030-2025	
fecha de acta de inicio	24 DE FEBRERO DE 2026	
Fecha de inicio	02 DE MARZO DE 2026	
fecha estimada de conclusión	24 DE SEPTIEMBRE 2026	
DATOS DEL CONTRATISTA		
Nombre o razon social	PSI INGENIEROS S.A.S	
Domicilio		
telefono		
DATOS DE LA INTERVENTORIA		
Nombre o razon social	CONSORCIO INTERVALLE 2026	
Domicilio		
telefono		

TIEMPO

NUBLADO SIN LLUVIAS EN LA JORNADA LABORAL

ACTIVIDADES

• se continua con el armado de parrila para pedestales eje A cimentacion cubierta acorde a los planos estrucuturales

• Se continua con el seguimiento plan de contigencia para proteccion de viga de cimentacion bloques de biblioteca y zona de baños institucion eductavia, se realiza revision en la señalizacion del aera para evitar transito de peatones en la zona, al igual que la suspension temporal de los baños y biblioteca, se realiza revision del apuntalamiento en madera y parales como me dida de asentamiento de la viga

• Se continuo con la elaboracion de concreto de 3,000 psi para zarpas zapatas eje a cimentacion cubierta escenario deportivo, se realiza toma de cilindros de concreto para verirficacion de resistencia

• Se realiza evacuacion de agua acumulada en excavaciones de zapatas ejes a cimentacion cubierta

PERSONA Y MAQUINARIA

PERSONAL	CANTIDAD	CARGO	EMPRESA	HORARIO
ING RESIDENTE DE OBRA	1	RESIDENTE DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	RESESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLE 2026	7:00 AM A 5:00 PM
CUADRILLA DE OBRA	3	AUXILIARES DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
MAQUINARIA Y EQUIPO	CANTIDAD	TIPO	EMPRESA	H/DÍA
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	VARIOS	N/A	PSI INGENIEROS S.A.S	JR
EQUIPO TOPOGRAFICO				

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	UNIDAD	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO
CEMENTO								

FOTOS





VISITAS

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
ING LUIS EDUARDO SICHACA	DIRECTOR DE OBRA	
ING .DANNA TATIANA JIMÉNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Debido a las lluvias presentadas en la noche, hace sugerencia al manejo del plan acción y manejo de aguas

EDWIN CAMILO SICHACA
RESIDENTE DE OBRA

Danna Jiménez
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE LA SUPERVISIÓN

	BITACORA			
	PSI INGENIEROS S.A.S		Folio	1

DATOS DE LA OBRA		
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
Localización	Institución educativa tecnica Valle de Tenza	Guateque, Boyacá
N° de contrato de obra	IPVO 030-2025	
fecha de acta de inicio	24 DE FEBRERO DE 2026	
Fecha de inicio	02 DE MARZO DE 2026	
fecha estimada de conclusión	24 DE SEPTIEMBRE 2026	
DATOS DEL CONTRATISTA		
Nombre o razon social	PSI INGENIEROS S.A.S	
Domicilio		
telefono		
DATOS DE LA INTERVENTORIA		
Nombre o razon social	CONSORCIO INTERVALLE 2026	
Domicilio		
telefono		

TIEMPO
SOLEADO EN LA JORNADA LABORAL

ACTIVIDADES

• se continua con el armado de parrila para pedestales eje A cimentacion cubierta acorde a los planos estrucuturales

• Se continua con el seguimiento plan de contigencia para proteccion de viga de cimentacion bloques de biblioteca y zona de baños institucion eductavia, se realiza revision en la señalizacion del aera para evitar transito de peatones en la zona, al igual que la suspension temporal de los baños y biblioteca, se realiza revision del apuntalamiento en madera y parales como me dida de asentamiento de la viga y se inicia con la recuperacion del material socavado o material de soporte de la viga de cimentacion de la biblioteca estudiantil

• Se continuo con la elaboracion de concreto de 3,000 psi para zarpas zapatas eje A cimentacion cubierta escenario deportivo, se realiza toma de cilindros de concreto para verirficacion de resistencia

• Se realiza elaboracion de especimenes de concreto para control de resisitencia zapatas ejes A

• Se realiza evacuacion de agua acumulada en excavaciones de zapatas ejes a cimentacion cubierta

PERSONA Y MAQUINARIA

PERSONAL	CANTIDAD	CARGO	EMPRESA	HORARIO
ING RESIDENTE DE OBRA	1	RESIDENTE DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	RESESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLE 2026	7:00 AM A 5:00 PM
CUADRILLA DE OBRA	3	AUXILIARES DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
MAQUINARIA Y EQUIPO	**CANTIDAD**	**TIPO**	**EMPRESA**	**H/DÍA**
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	VARIOS	N/A	PSI INGENIEROS S.A.S	JR
EQUIPO TOPOGRAFICO				

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	UNIDAD	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO
CEMENTO								

FOTOS







VISITAS

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
ING LUIS EDUARDO SICHACA	DIRECTOR DE OBRA	
ING .DANNA TATIANA JIMÉNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Se realiza acompañamiento en fundida de zarpa de zapatas en el eje A, se realiza toma de cilindros de concreto y se hace recomendaciones sobre el seguimiento al plan de acción, se realiza recorrido con la supervisión del proyecto para verificar el plan de acción, se realiza seguimiento a los compromisos del comite pasado del # 006 y se dejan compromisos establecidos

EDWIN CAMILO SICHACA
RESIDENTE DE OBRA

Danna Jiménez
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE LA SUPERVISIÓN

	BITACORA			
	PSI INGENIEROS S.A.S		Folio	1

DATOS DE LA OBRA		
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
Localización	Institución educativa tecnica Valle de Tenza	Guateque, Boyacá
N° de contrato de obra	IPVO 030-2025	
fecha de acta de inicio	24 DE FEBRERO DE 2026	
Fecha de inicio	02 DE MARZO DE 2026	
fecha estimada de conclusión	24 DE SEPTIEMBRE 2026	
DATOS DEL CONTRATISTA		
Nombre o razon social	PSI INGENIEROS S.A.S	
Domicilio		
telefono		
DATOS DE LA INTERVENTORIA		
Nombre o razon social	CONSORCIO INTERVALLE 2026	
Domicilio		
telefono		

TIEMPO
SOLEADO EN LA JORNADA LABORAL

ACTIVIDADES

• se finaliza la instalacion de acero de refuerzo para zarpas zapatas del eje A, cimentacion cubierta

• Se continua con el seguimiento plan de contigencia para proteccion de viga de cimentacion bloques de biblioteca y zona de baños institucion eductavia, se realiza revision en la señalizacion del aera para evitar transito de peatones en la zona, al igual que la suspension temporal de los baños y biblioteca, se realiza revision del apuntalamiento en madera y parales como me dida de asentamiento de la viga y se inicia con la recuperacion del material socavado o material de soporte de la viga de cimentacion de la biblioteca estudiantil

• Se finaliza con la fundida de zarpas de zapatas del eje B cimentacion cubierta

• Se realiza evacuacion de agua acumulada en excavaciones de zapatas ejes a cimentacion cubierta

• se realiza instalacion de acero de refuerzo para pedestales eje B-2, y se realiza fundida de zarpa zapata del mismo elemento cimentacion cubierta

PERSONA Y MAQUINARIA

PERSONAL	CANTIDAD	CARGO	EMPRESA	HORARIO
ING RESIDENTE DE OBRA	1	RESIDENTE DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	RESESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLE 2026	7:00 AM A 5:00 PM
CUADRILLA DE OBRA	3	AUXILIARES DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM

MAQUINARIA Y EQUIPO	CANTIDAD	TIPO	EMPRESA	H/DÍA
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	VARIOS	N/A	PSI INGENIEROS S.A.S	JR
EQUIPO TOPOGRAFICO				

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	UNIDAD	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO
CEMENTO								

FOTOS





VISITAS

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
ING LUIS EDUARDO SICHACA	DIRECTOR DE OBRA	
ING .DANNA TATIANA JIMÉNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Se realiza acompañamiento en fundida de zarpa de zapatas en el eje B, se realiza toma de cilindros de concreto y se hace recomendaciones sobre el seguimiento al plan de acción.

EDWIN CAMILO SICHACA
RESIDENTE DE OBRA

Danna Jiménez
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE LA SUPERVISIÓN

	BITACORA			
	PSI INGENIEROS S.A.S		Folio	1

DATOS DE LA OBRA		
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
Localización	Institución educativa tecnica Valle de Tenza	Guateque, Boyacá
N° de contrato de obra	IPVO 030-2025	
fecha de acta de inicio	24 DE FEBRERO DE 2026	
Fecha de inicio	02 DE MARZO DE 2026	
fecha estimada de conclusión	24 DE SEPTIEMBRE 2026	
DATOS DEL CONTRATISTA		
Nombre o razon social	PSI INGENIEROS S.A.S	
Domicilio		
telefono		
DATOS DE LA INTERVENTORIA		
Nombre o razon social	CONSORCIO INTERVALLE 2026	
Domicilio		
telefono		

TIEMPO

SOLEADO EN LA JORNADA LABORAL

ACTIVIDADES

• Se continua con el seguimiento plan de contigencia para proteccion de viga de cimentacion bloques de biblioteca y zona de baños institucion eductavia, se realiza revision en la señalizacion del aera para evitar transito de peatones en la zona, al igual que la suspension temporal de los baños y biblioteca, se realiza revision del apuntalamiento en madera y parales como me dida de asentamiento de la viga y se inicia con la recuperacion del material socavado o material de soporte de la viga de cimentacion de la biblioteca estudiantil

• Se continuo con la evacuacion de agua acumulada y lodo en excavaciones de zapatas ejes B cimentacion cubierta

• se continuo con la instalacion de acero de refuerzo para pedestales eje B-3 y B-4

PERSONA Y MAQUINARIA

PERSONAL	CANTIDAD	CARGO	EMPRESA	HORARIO
ING RESIDENTE DE OBRA	1	RESIDENTE DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	RESESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLE 2026	7:00 AM A 5:00 PM
CUADRILLA DE OBRA	3	AUXILIARES DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
MAQUINARIA Y EQUIPO	CANTIDAD	TIPO	EMPRESA	H/DÍA
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	VARIOS	N/A	PSI INGENIEROS S.A.S	JR
EQUIPO TOPOGRAFICO				

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	UNIDAD	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO
CEMENTO								

FOTOS





VISITAS

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
ING LUIS EDUARDO SICHACA	DIRECTOR DE OBRA	la acumulacion de agua en las excavacaciones de las zapatas del eje B, de igual manera el desprendimiento del material en las excavaciones, requiere que la firma contratista de obra realice limpieza y evacuacion de lodo y agua en las exacavaciones, lo que genera una reduccion en los rendimientos de las actividades programadas
ING .DANNA TATIANA JIMÉNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Se hace recomendaciones y seguimiento a las medidas establecidas por el contratista en el plan de acción y control de agua lluvias y se envia informe de seguimiento de los compromisos pactados en el comité 007

EDWIN CAMILO SICHACA
RESIDENTE DE OBRA

Danna Jiménez
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE LA SUPERVISIÓN

	BITACORA			
	PSI INGENIEROS S.A.S		Folio	1

DATOS DE LA OBRA	
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Localización	Institución educativa tecnica Valle de Tenza — Guateque, Boyacá
N° de contrato de obra	IPVO 030-2025
fecha de acta de inicio	24 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de inicio	02 DE MARZO DE 2026
fecha estimada de conclusión	24 DE SEPTIEMBRE 2026
DATOS DEL CONTRATISTA	
Nombre o razon social	PSI INGENIEROS S.A.S
Domicilio	
telefono	
DATOS DE LA INTERVENTORIA	
Nombre o razon social	CONSORCIO INTERVALLE 2026
Domicilio	
telefono	

TIEMPO
SOLEADO EN LA JORNADA LABORAL

ACTIVIDADES

• Se continua con el seguimiento plan de contigencia para proteccion de viga de cimentacion bloques de biblioteca y zona de baños institucion eductavia, se realiza revision en la señalizacion del aera para evitar transito de peatones en la zona, al igual que la suspension temporal de los baños y biblioteca, se realiza revision del apuntalamiento en madera y parales como me dida de asentamiento de la viga y se inicia con la recuperacion del material socavado o material de soporte de la viga de cimentacion de la biblioteca estudiantil

• Se continuo con la evacuacion de agua y lodo acumulada en excavaciones de zapatas eje Bcimentacion cubierta

• se continuo con la instalacion de acero de refuerzo para zarpa zapatas y pedestales eje B-3 y B-4 y B-5

PERSONA Y MAQUINARIA

PERSONAL	CANTIDAD	CARGO	EMPRESA	HORARIO
ING RESIDENTE DE OBRA	1	RESIDENTE DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	RESESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLE 2026	7:00 AM A 5:00 PM
CUADRILLA DE OBRA	3	AUXILIARES DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
MAQUINARIA Y EQUIPO	**CANTIDAD**	**TIPO**	**EMPRESA**	**H/DÍA**
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	VARIOS	N/A	PSI INGENIEROS S.A.S	JR
EQUIPO TOPOGRAFICO				

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	UNIDAD	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO
CEMENTO								

FOTOS





VISITAS

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
ING LUIS EDUARDO SICHACA	DIRECTOR DE OBRA	
ING .DANNA TATIANA JIMÉNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Supervisión por parte de la intercventoria en espaciados y cantidad de flejes de acuerdo a los planos de cimentaciones. Se hace recomendaciones y seguimiento a las medidas establecidas por el contratista en el plan de acción y control de agua lluvias

EDWIN CAMILO SICHACA
RESIDENTE DE OBRA

Danna Jiménez
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE LA SUPERVISIÓN

	BITACORA			
	PSI INGENIEROS S.A.S		Folio	1

DATOS DE LA OBRA		
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
Localización	Institución educativa tecnica Valle de Tenza	Guateque, Boyacá
N° de contrato de obra	IPVO 030-2025	
fecha de acta de inicio	24 DE FEBRERO DE 2026	
Fecha de inicio	02 DE MARZO DE 2026	
fecha estimada de conclusión	24 DE SEPTIEMBRE 2026	
DATOS DEL CONTRATISTA		
Nombre o razon social	PSI INGENIEROS S.A.S	
Domicilio		
telefono		
DATOS DE LA INTERVENTORIA		
Nombre o razon social	CONSORCIO INTERVALLE 2026	
Domicilio		
telefono		

TIEMPO
SOLEADO EN LA JORNADA LABORAL

ACTIVIDADES

• Se continua con el seguimiento plan de contigencia para proteccion de viga de cimentacion bloques de biblioteca y zona de baños institucion eductavia, se realiza revision en la señalizacion del aera para evitar transito de peatones en la zona, al igual que la suspension temporal de los baños y biblioteca, se realiza revision del apuntalamiento en madera y parales como me dida de asentamiento de la viga y se inicia con la recuperacion del material socavado o material de soporte de la viga de cimentacion de la biblioteca estudiantil

• se dio inicio con la elaboracion de concreto para zarpas zapatas de los eje B-3 y B-4 y B-5, cimentacion escenario deportivo

PERSONA Y MAQUINARIA

PERSONAL	CANTIDAD	CARGO	EMPRESA	HORARIO
ING RESIDENTE DE OBRA	1	RESIDENTE DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	RESESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLE 2026	7:00 AM A 5:00 PM
CUADRILLA DE OBRA	3	AUXILIARES DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
MAQUINARIA Y EQUIPO	CANTIDAD	TIPO	EMPRESA	H/DÍA
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	VARIOS	N/A	PSI INGENIEROS S.A.S	JR
EQUIPO TOPOGRAFICO				

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	UNIDAD	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO
CEMENTO								

FOTOS





VISITAS

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
ING LUIS EDUARDO SICHACA	DIRECTOR DE OBRA	
ING .DANNA TATIANA JIMÉNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Supervisión por parte de la intercventoria en espaciados y cantidad de flejes de acuerdo a los planos de cimentaciones. Se hace recomendaciones y seguimiento a las medidas establecidas por el contratista en el plan de acción y control de agua lluvias, se hace reiteración formal al oficio de requerimientos técnicos y administrativos – Contrato de Obra No. 030-2025 Referencia: Oficio No. INT-053-OF-024 y reiteración oficio INT-053-OF-027

EDWIN CAMILO SICHACA
RESIDENTE DE OBRA

Danna Jiménez
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE LA SUPERVISIÓN

	BITACORA			
	PSI INGENIEROS S.A.S		Folio	1

DATOS DE LA OBRA		
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
Localización	Institución educativa tecnica Valle de Tenza	Guateque, Boyacá
N° de contrato de obra	IPVO 030-2025	
fecha de acta de inicio	24 DE FEBRERO DE 2026	
Fecha de inicio	02 DE MARZO DE 2026	
fecha estimada de conclusión	24 DE SEPTIEMBRE 2026	
DATOS DEL CONTRATISTA		
Nombre o razon social	PSI INGENIEROS S.A.S	
Domicilio		
telefono		
DATOS DE LA INTERVENTORIA		
Nombre o razon social	CONSORCIO INTERVALLE 2026	
Domicilio		
telefono		

TIEMPO
SOLEADO EN LA JORNADA LABORAL

ACTIVIDADES
• Se continua con el seguimiento plan de contigencia para proteccion de viga de cimentacion bloques de biblioteca y zona de baños institucion eductavia, se realiza revision en la señalizacion del aera para evitar transito de peatones en la zona, al igual que la suspension temporal de los baños y biblioteca, se realiza revision del apuntalamiento en madera y parales como me dida de asentamiento de la viga y se inicia con la recuperacion del material socavado o material de soporte de la viga de cimentacion de la biblioteca estudiantil
• se continuo con la elaboracion de concreto para zarpas zapatas de los eje B-3 y B-4 y B-5, cimentacion escenario deportivo

PERSONA Y MAQUINARIA

PERSONAL	CANTIDAD	CARGO	EMPRESA	HORARIO
ING RESIDENTE DE OBRA	1	RESIDENTE DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	RESESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLE 2026	7:00 AM A 5:00 PM
CUADRILLA DE OBRA	3	AUXILIARES DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM

MAQUINARIA Y EQUIPO	CANTIDAD	TIPO	EMPRESA	H/DÍA
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	VARIOS	N/A	PSI INGENIEROS S.A.S	JR
EQUIPO TOPOGRAFICO				

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	UNIDAD	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO
CEMENTO								

FOTOS





VISITAS

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
ING LUIS EDUARDO SICHACA	DIRECTOR DE OBRA	
ING .DANNA TATIANA JIMÉNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

EDWIN CAMILO SICHACA
RESIDENTE DE OBRA

Danna Jiménez
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE LA SUPERVISIÓN

	BITACORA			
	PSI INGENIEROS S.A.S		Folio	1

DATOS DE LA OBRA		
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
Localización	Institución educativa tecnica Valle de Tenza	Guateque, Boyacá
N° de contrato de obra	IPVO 030-2025	
fecha de acta de inicio	24 DE FEBRERO DE 2026	
Fecha de inicio	02 DE MARZO DE 2026	
fecha estimada de conclusión	24 DE SEPTIEMBRE 2026	
DATOS DEL CONTRATISTA		
Nombre o razon social	PSI INGENIEROS S.A.S	
Domicilio		
telefono		
DATOS DE LA INTERVENTORIA		
Nombre o razon social	CONSORCIO INTERVALLE 2026	
Domicilio		
telefono		
TIEMPO		
SOLEADO EN LA JORNADA LABORAL		
ACTIVIDADES		

• Se continua con el seguimiento plan de contigencia para proteccion de viga de cimentacion bloques de biblioteca y zona de baños institucion eductavia, se realiza revision en la señalizacion del aera para evitar transito de peatones en la zona, al igual que la suspension temporal de los baños y biblioteca, se realiza revision del apuntalamiento en madera y parales como me dida de asentamiento de la viga y se inicia con la recuperacion del material socavado o material de soporte de la viga de cimentacion de la biblioteca estudiantil

• se dio inicio con las exacavciones para la construccion de vigas de cimentacion muro de cerramiento permetral, y viga de cimentacion dee enalnce entre las zapatas del eje A

PERSONA Y MAQUINARIA

PERSONAL	CANTIDAD	CARGO	EMPRESA	HORARIO
ING RESIDENTE DE OBRA	1	RESIDENTE DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	RESESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLE 2026	7:00 AM A 5:00 PM
CUADRILLA DE OBRA	3	AUXILIARES DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
MAQUINARIA Y EQUIPO	CANTIDAD	TIPO	EMPRESA	H/DÍA
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	VARIOS	N/A	PSI INGENIEROS S.A.S	JR
EQUIPO TOPOGRAFICO				

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	UNIDAD	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO
CEMENTO								

FOTOS





VISITAS

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
ING LUIS EDUARDO SICHACA	DIRECTOR DE OBRA	
ING .DANNA TATIANA JIMÉNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Se realiza acompañamiento en la fundida de solado de 0.05 de espesor para viga de cimentación eje A

EDWIN CAMILO SICHACA
RESIDENTE DE OBRA

Danna Jiménez
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE LA SUPERVISIÓN

	BITACORA			
	PSI INGENIEROS S.A.S		Folio	1

DATOS DE LA OBRA		
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
Localización	Institución educativa tecnica Valle de Tenza	Guateque, Boyacá
N° de contrato de obra	IPVO 030-2025	
fecha de acta de inicio	24 DE FEBRERO DE 2026	
Fecha de inicio	02 DE MARZO DE 2026	
fecha estimada de conclusión	24 DE SEPTIEMBRE 2026	
DATOS DEL CONTRATISTA		
Nombre o razon social	PSI INGENIEROS S.A.S	
Domicilio		
telefono		
DATOS DE LA INTERVENTORIA		
Nombre o razon social	CONSORCIO INTERVALLE 2026	
Domicilio		
telefono		

TIEMPO
SOLEADO EN LA JORNADA LABORAL

ACTIVIDADES
• Se continua con el seguimiento plan de contigencia para proteccion de viga de cimentacion bloques de biblioteca y zona de baños institucion eductavia, se realiza revision en la señalizacion del aera para evitar transito de peatones en la zona, al igual que la suspension temporal de los baños y biblioteca, se realiza revision del apuntalamiento en madera y parales como me dida de asentamiento de la viga y se inicia con la recuperacion del material socavado o material de soporte de la viga de cimentacion de la biblioteca estudiantil
• se continuo con las exacavciones para la construccion de vigas de cimentacion muro de cerramiento permetral, y viga de cimentacion dee enalnce entre las zapatas del eje A

PERSONA Y MAQUINARIA

PERSONAL	CANTIDAD	CARGO	EMPRESA	HORARIO
ING RESIDENTE DE OBRA	1	RESIDENTE DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	RESESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLE 2026	7:00 AM A 5:00 PM
CUADRILLA DE OBRA	3	AUXILIARES DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
MAQUINARIA Y EQUIPO	**CANTIDAD**	**TIPO**	**EMPRESA**	**H/DÍA**
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	VARIOS	N/A	PSI INGENIEROS S.A.S	JR
EQUIPO TOPOGRAFICO				

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	UNIDAD	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO
CEMENTO								

FOTOS



VISITAS

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
ING LUIS EDUARDO SICHACA	DIRECTOR DE OBRA	
ING .DANNA TATIANA JIMÉNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Se realiza acompañamiento a retiro de material de derrumbe del plan acción y se realiza apuntalmiento con madera , seguimiento al plan de acción

EDWIN CAMILO SICHACA
RESIDENTE DE OBRA

Danna Jiménez
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE LA SUPERVISIÓN

	BITACORA			
	PSI INGENIEROS S.A.S		Folio	1

DATOS DE LA OBRA		
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
Localización	Institución educativa tecnica Valle de Tenza	Guateque, Boyacá
N° de contrato de obra	IPVO 030-2025	
fecha de acta de inicio	24 DE FEBRERO DE 2026	
Fecha de inicio	02 DE MARZO DE 2026	
fecha estimada de conclusión	24 DE SEPTIEMBRE 2026	
DATOS DEL CONTRATISTA		
Nombre o razon social	PSI INGENIEROS S.A.S	
Domicilio		
telefono		
DATOS DE LA INTERVENTORIA		
Nombre o razon social	CONSORCIO INTERVALLE 2026	
Domicilio		
telefono		

TIEMPO
SOLEADO EN LA JORNADA LABORAL

ACTIVIDADES

• Se continua con el seguimiento plan de contigencia para proteccion de viga de cimentacion bloques de biblioteca y zona de baños institucion eductavia, se realiza revision en la señalizacion del aera para evitar transito de peatones en la zona, al igual que la suspension temporal de los baños y biblioteca, se realiza revision del apuntalamiento en madera y parales como me dida de asentamiento de la viga y se inicia con la recuperacion del material socavado o material de soporte de la viga de cimentacion de la biblioteca estudiantil

• se realiza instalacion de acero transversal pedestales ejes A-1 A A-6, Acorde a planos estructurales cimentacion escenario deportivo

• se continuo con las exacavciones para la construccion de vigas de cimentacion muro de cerramiento permetral, y viga de cimentacion dee enalnce entre las zapatas del eje A

PERSONA Y MAQUINARIA

PERSONAL	CANTIDAD	CARGO	EMPRESA	HORARIO
ING RESIDENTE DE OBRA	1	RESIDENTE DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	RESESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLE 2026	7:00 AM A 5:00 PM
CUADRILLA DE OBRA	3	AUXILIARES DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
MAQUINARIA Y EQUIPO	**CANTIDAD**	**TIPO**	**EMPRESA**	**H/DÍA**
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	VARIOS	N/A	PSI INGENIEROS S.A.S	JR
EQUIPO TOPOGRAFICO				

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	UNIDAD	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO
CEMENTO								

FOTOS





VISITAS

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
ING LUIS EDUARDO SICHACA	DIRECTOR DE OBRA	
ING .DANNA TATIANA JIMÉNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	realiza acompañamiento para la instalacion de acero transversal pedestales ejes A-1 A A-6, Acorde a planos estructurales cimentación

EDWIN CAMILO SICHACA
RESIDENTE DE OBRA

Danna Jiménez
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE LA SUPERVISIÓN

	BITACORA			
	PSI INGENIEROS S.A.S		Folio	1

DATOS DE LA OBRA	
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Localización	Institución educativa tecnica Valle de Tenza — Guateque, Boyacá
N° de contrato de obra	IPVO 030-2025
fecha de acta de inicio	24 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de inicio	02 DE MARZO DE 2026
fecha estimada de conclusión	24 DE SEPTIEMBRE 2026
DATOS DEL CONTRATISTA	
Nombre o razon social	PSI INGENIEROS S.A.S
Domicilio	
telefono	
DATOS DE LA INTERVENTORIA	
Nombre o razon social	CONSORCIO INTERVALLE 2026
Domicilio	
telefono	

TIEMPO

SOLEADO EN LA JORNADA LABORAL

ACTIVIDADES

• Se continua con el seguimiento plan de contigencia para proteccion de viga de cimentacion bloques de biblioteca y zona de baños institucion eductavia, se realiza revision en la señalizacion del aera para evitar transito de peatones en la zona, al igual que la suspension temporal de los baños y biblioteca, se realiza revision del apuntalamiento en madera y parales como me dida de asentamiento de la viga y se inicia con la recuperacion del material socavado o material de soporte de la viga de cimentacion de la biblioteca estudiantil

• se realiza instalacion de acero transversal pedestales ejes A-1 A A-6, Acorde a planos estructurales cimentacion escenario deportivo

• se continuo con las exacavciones para la construccion de vigas de cimentacion muro de cerramiento permetral, y viga de cimentacion dee enalnce entre las zapatas del eje A

PERSONA Y MAQUINARIA

PERSONAL	CANTIDAD	CARGO	EMPRESA	HORARIO
ING RESIDENTE DE OBRA	1	RESIDENTE DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	RESESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLE 2026	7:00 AM A 5:00 PM
CUADRILLA DE OBRA	3	AUXILIARES DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
MAQUINARIA Y EQUIPO	**CANTIDAD**	**TIPO**	**EMPRESA**	**H/DÍA**
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	VARIOS	N/A	PSI INGENIEROS S.A.S	JR
EQUIPO TOPOGRAFICO				

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	UNIDAD	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO
CEMENTO								

FOTOS

VISITAS

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
ING LUIS EDUARDO SICHACA	DIRECTOR DE OBRA	
ING .DANNA TATIANA JIMÉNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	se continuo con las exacavaciones para la construccion de vigas de cimentacion muro de cerramiento permetral, y viga de cimentacion dee enalnce entre las zapatas del eje A y se hace solictud al plan de acción

EDWIN CAMILO SICHACA
RESIDENTE DE OBRA

Danna Jiménez
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE LA SUPERVISIÓN

	BITACORA			
	PSI INGENIEROS S.A.S		Folio	1

DATOS DE LA OBRA	
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Localización	Institución educativa tecnica Valle de Tenza — Guateque, Boyacá
N° de contrato de obra	IPVO 030-2025
fecha de acta de inicio	24 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de inicio	02 DE MARZO DE 2026
fecha estimada de conclusión	24 DE SEPTIEMBRE 2026
DATOS DEL CONTRATISTA	
Nombre o razon social	PSI INGENIEROS S.A.S
Domicilio	
telefono	
DATOS DE LA INTERVENTORIA	
Nombre o razon social	CONSORCIO INTERVALLE 2026
Domicilio	
telefono	

TIEMPO
DIA NUBALDO CON PRESENCIA DE LLUVIAS

ACTIVIDADES

• Se continua con el seguimiento plan de contigencia para proteccion de viga de cimentacion bloques de biblioteca y zona de baños institucion eductavia, se realiza revision en la señalizacion del aera para evitar transito de peatones en la zona, al igual que la suspension temporal de los baños y biblioteca, se realiza revision del apuntalamiento en madera y parales como me dida de asentamiento de la viga y se inicia con la recuperacion del material socavado o material de soporte de la viga de cimentacion de la biblioteca estudiantil

• se realiza instalacion de acero transversal pedestales ejes A-1 A A-6, Acorde a planos estructurales cimentacion escenario deportivo

• se continuo con las exacavciones para la construccion de vigas de cimentacion muro de cerramiento permetral, y viga de cimentacion dee enalnce entre las zapatas del eje A

• Se realiza evacuacion del agua acumulada en excavaciones de la cimentacion de la cubierta del escenario deportivo

• Se empieza con el suministro y figurado de acero longitudinal y trnaversal para viga de amarre pedestales eje A, cimentacion cubierta acorde a los planos estrucutrales

PERSONA Y MAQUINARIA

PERSONAL	CANTIDAD	CARGO	EMPRESA	HORARIO
ING RESIDENTE DE OBRA	1	RESIDENTE DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	RESESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLE 2026	7:00 AM A 5:00 PM
CUADRILLA DE OBRA	3	AUXILIARES DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
MAQUINARIA Y EQUIPO	**CANTIDAD**	**TIPO**	**EMPRESA**	**H/DÍA**
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	VARIOS	N/A	PSI INGENIEROS S.A.S	JR
EQUIPO TOPOGRAFICO				

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	UNIDAD	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO
CEMENTO								

FOTOS







VISITAS

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
ING LUIS EDUARDO SICHACA	DIRECTOR DE OBRA	se presentaron fuertes precipitacions en el sector en el transcurso del puente festivo, lo que genero acumulacion de agua en excavaciones de zapatas eje a y b, se realizaron actividades de evacuacion y secado en las areas afectadas
ING .DANNA TATIANA JIMÉNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	se realiza reunión en las instalaciones de tierrasua con compromisos establecidos para efectuar un comité con las autoridades educativas y municipales para la revisión de cantidades y modificaciones de acuerdo al plan de acción

EDWIN CAMILO SICHACA
RESIDENTE DE OBRA

Danna Jiménez
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE LA SUPERVISIÓN

	BITACORA			
	PSI INGENIEROS S.A.S		Folio	1

DATOS DE LA OBRA		
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
Localización	Institución educativa tecnica Valle de Tenza	Guateque, Boyacá
N° de contrato de obra	IPVO 030-2025	
fecha de acta de inicio	24 DE FEBRERO DE 2026	
Fecha de inicio	02 DE MARZO DE 2026	
fecha estimada de conclusión	24 DE SEPTIEMBRE 2026	
DATOS DEL CONTRATISTA		
Nombre o razon social	PSI INGENIEROS S.A.S	
Domicilio		
telefono		
DATOS DE LA INTERVENTORIA		
Nombre o razon social	CONSORCIO INTERVALLE 2026	
Domicilio		
telefono		

TIEMPO
NUBLADO CON LLUVIAS

ACTIVIDADES

• Se continua con el seguimiento plan de contigencia para proteccion de viga de cimentacion bloques de biblioteca y zona de baños institucion eductavia, se realiza revision en la señalizacion del aera para evitar transito de peatones en la zona, al igual que la suspension temporal de los baños y biblioteca, se realiza revision del apuntalamiento en madera y parales como me dida de asentamiento de la viga y se inicia con la recuperacion del material socavado o material de soporte de la viga de cimentacion de la biblioteca estudiantil

• Se realiza evacuacion del agua acumulada en excavaciones de la cimentacion de la cubierta del escenario deportivo

• Se continuo con el suministro y figurado de acero longitudinal y transversal para viga de amarre pedestales eje A, cimentacion cubierta acorde a los planos estrucutrales

PERSONA Y MAQUINARIA

PERSONAL	CANTIDAD	CARGO	EMPRESA	HORARIO
ING RESIDENTE DE OBRA	1	RESIDENTE DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	RESESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLE 2026	7:00 AM A 5:00 PM
CUADRILLA DE OBRA	3	AUXILIARES DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM

MAQUINARIA Y EQUIPO	CANTIDAD	TIPO	EMPRESA	H/DÍA
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	VARIOS	N/A	PSI INGENIEROS S.A.S	JR
EQUIPO TOPOGRAFICO				

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	UNIDAD	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO
CEMENTO								

FOTOS





VISITAS

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
ING LUIS EDUARDO SICHACA	DIRECTOR DE OBRA	
ING .DANNA TATIANA JIMÉNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Se realiza acompañamiento a la el suministro y figurado de acero longitudinal y transversal para viga de amarre pedestales eje A y se hace

EDWIN CAMILO SICHACA
RESIDENTE DE OBRA

Danna Jiménez
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE LA SUPERVISIÓN

	BITACORA			
	PSI INGENIEROS S.A.S		Folio	1

DATOS DE LA OBRA		
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
Localización	Institución educativa tecnica Valle de Tenza	Guateque, Boyacá
N° de contrato de obra	IPVO 030-2025	
fecha de acta de inicio	24 DE FEBRERO DE 2026	
Fecha de inicio	02 DE MARZO DE 2026	
fecha estimada de conclusión	24 DE SEPTIEMBRE 2026	
DATOS DEL CONTRATISTA		
Nombre o razon social	PSI INGENIEROS S.A.S	
Domicilio		
telefono		
DATOS DE LA INTERVENTORIA		
Nombre o razon social	CONSORCIO INTERVALLE 2026	
Domicilio		
telefono		

TIEMPO
NUBLADO CON LLUVIAS

ACTIVIDADES

• Se continua con el seguimiento plan de contigencia para proteccion de viga de cimentacion bloques de biblioteca y zona de baños institucion eductavia, se realiza revision en la señalizacion del aera para evitar transito de peatones en la zona, al igual que la suspension temporal de los baños y biblioteca, se realiza revision del apuntalamiento en madera y parales como me dida de asentamiento de la viga y se inicia con la recuperacion del material socavado o material de soporte de la viga de cimentacion de la biblioteca estudiantil

• Se realiza evacuacion del agua acumulada en excavaciones de la cimentacion de la cubierta del escenario deportivo

• Se continuo con el suministro y figurado de acero longitudinal y trnaversal para viga de amarre pedestales eje A, cimentacion cubierta acorde a los planos estrucutrales

PERSONA Y MAQUINARIA

PERSONAL	CANTIDAD	CARGO	EMPRESA	HORARIO
ING RESIDENTE DE OBRA	1	RESIDENTE DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	RESESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLE 2026	7:00 AM A 5:00 PM
CUADRILLA DE OBRA	3	AUXILIARES DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM

MAQUINARIA Y EQUIPO	CANTIDAD	TIPO	EMPRESA	H/DÍA
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	VARIOS	N/A	PSI INGENIEROS S.A.S	JR
EQUIPO TOPOGRAFICO				

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	UNIDAD	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO
CEMENTO								

FOTOS



VISITAS

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
ING LUIS EDUARDO SICHACA	DIRECTOR DE OBRA	
ING .DANNA TATIANA JIMÉNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Se realiza comité de obra 010 en presencia del contratista, la supervisión via meet, autoridades de la institución educativa, la alcaldia municipal y la interventoria del proyecto,Socializar con las autoridades de la institución educativa, autoridad del municipio las condiciones actuales de la obra, los hallazgos técnicos derivados de las actividades de demolición y excavación, y someter a aprobación las consideraciones técnicas complementarias necesarias para garantizar la estabilidad estructural de las edificaciones colindantes y la seguridad de los usuarios.

EDWIN CAMILO SICHACA
RESIDENTE DE OBRA

Danna Jiménez
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE LA SUPERVISIÓN

	BITACORA			
	PSI INGENIEROS S.A.S		Folio	1

DATOS DE LA OBRA		
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
Localización	Institución educativa tecnica Valle de Tenza	Guateque, Boyacá
N° de contrato de obra	IPVO 030-2025	
fecha de acta de inicio	24 DE FEBRERO DE 2026	
Fecha de inicio	02 DE MARZO DE 2026	
fecha estimada de conclusión	24 DE SEPTIEMBRE 2026	
DATOS DEL CONTRATISTA		
Nombre o razon social	PSI INGENIEROS S.A.S	
Domicilio		
telefono		
DATOS DE LA INTERVENTORIA		
Nombre o razon social	CONSORCIO INTERVALLE 2026	
Domicilio		
telefono		

TIEMPO
NUBLADO CON LLUVIAS

ACTIVIDADES

• Se continua con el seguimiento plan de contigencia para proteccion de viga de cimentacion bloques de biblioteca y zona de baños institucion eductavia, se realiza revision en la señalizacion del aera para evitar transito de peatones en la zona, al igual que la suspension temporal de los baños y biblioteca, se realiza revision del apuntalamiento en madera y parales como me dida de asentamiento de la viga y se inicia con la recuperacion del material socavado o material de soporte de la viga de cimentacion de la biblioteca estudiantil

• Se realiza

• Se dio inicio con el encofrado para viga de amarre pedestales eje A, cimentacion cubierta acorde a los planos estrucutrales

PERSONA Y MAQUINARIA

PERSONAL	CANTIDAD	CARGO	EMPRESA	HORARIO
ING RESIDENTE DE OBRA	1	RESIDENTE DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	RESESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLE 2026	7:00 AM A 5:00 PM
CUADRILLA DE OBRA	3	AUXILIARES DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
MAQUINARIA Y EQUIPO	**CANTIDAD**	**TIPO**	**EMPRESA**	**H/DÍA**
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	VARIOS	N/A	PSI INGENIEROS S.A.S	JR
EQUIPO TOPOGRAFICO				

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	UNIDAD	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO
CEMENTO								

FOTOS





VISITAS

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
ING LUIS EDUARDO SICHACA	DIRECTOR DE OBRA	
ING .DANNA TATIANA JIMÉNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Se dio inicio con el encofrado para viga de amarre pedestales eje A, cimentacion cubierta acorde a los planos estructurales

EDWIN CAMILO SICHACA
RESIDENTE DE OBRA

Danna Jiménez
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE LA SUPERVISIÓN

	BITACORA			
	PSI INGENIEROS S.A.S		Folio	1

DATOS DE LA OBRA	
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Localización	Institución educativa tecnica Valle de Tenza — Guateque, Boyacá
N° de contrato de obra	IPVO 030-2025
fecha de acta de inicio	24 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de inicio	02 DE MARZO DE 2026
fecha estimada de conclusión	24 DE SEPTIEMBRE 2026
DATOS DEL CONTRATISTA	
Nombre o razon social	PSI INGENIEROS S.A.S
Domicilio	
telefono	
DATOS DE LA INTERVENTORIA	
Nombre o razon social	CONSORCIO INTERVALLE 2026
Domicilio	
telefono	

TIEMPO
NUBLADO SIN LLUVIAS

ACTIVIDADES
• Se continua con el seguimiento plan de contigencia para proteccion de viga de cimentacion bloques de biblioteca y zona de baños institucion eductavia, se realiza revision en la señalizacion del aera para evitar transito de peatones en la zona, al igual que la suspension temporal de los baños y biblioteca, se realiza revision del apuntalamiento en madera y parales como me dida de asentamiento de la viga y se inicia con la recuperacion del material socavado o material de soporte de la viga de cimentacion de la biblioteca estudiantil
• Se continuo con El encofrado para viga de amarre pedestales eje A, cimentacion cubierta acorde a los planos estrucutrales

PERSONA Y MAQUINARIA

PERSONAL	CANTIDAD	CARGO	EMPRESA	HORARIO
ING RESIDENTE DE OBRA	1	RESIDENTE DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	RESESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLE 2026	7:00 AM A 5:00 PM
CUADRILLA DE OBRA	3	AUXILIARES DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM

MAQUINARIA Y EQUIPO	CANTIDAD	TIPO	EMPRESA	H/DÍA
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	VARIOS	N/A	PSI INGENIEROS S.A.S	JR
EQUIPO TOPOGRAFICO				

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	UNIDAD	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO
CEMENTO								

FOTOS





VISITAS

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
ING LUIS EDUARDO SICHACA	DIRECTOR DE OBRA	
ING .DANNA TATIANA JIMÉNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Se continua con el encofrado para viga de amarre pedestales eje A, cimentacion cubierta acorde a los planos estructurales

EDWIN CAMILO SICHACA
RESIDENTE DE OBRA

Danna Jiménez
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE LA SUPERVISIÓN

	BITACORA			
	PSI INGENIEROS S.A.S		**Folio**	1

DATOS DE LA OBRA	
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Localización	Institución educativa tecnica Valle de Tenza — Guateque, Boyacá
N° de contrato de obra	IPVO 030-2025
fecha de acta de inicio	24 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de inicio	02 DE MARZO DE 2026
fecha estimada de conclusión	24 DE SEPTIEMBRE 2026
DATOS DEL CONTRATISTA	
Nombre o razon social	PSI INGENIEROS S.A.S
Domicilio	
telefono	
DATOS DE LA INTERVENTORIA	
Nombre o razon social	CONSORCIO INTERVALLE 2026
Domicilio	
telefono	

TIEMPO

NUBLADO CON LLUVIAS

ACTIVIDADES

• Se continua con el seguimiento plan de contigencia para proteccion de viga de cimentacion bloques de biblioteca y zona de baños institucion eductavia, se realiza revision en la señalizacion del aera para evitar transito de peatones en la zona, al igual que la suspension temporal de los baños y biblioteca, se realiza revision del apuntalamiento en madera y parales como me dida de asentamiento de la viga y se inicia con la recuperacion del material socavado o material de soporte de la viga de cimentacion de la biblioteca estudiantil

• Se continuo con El encofrado para viga de amarre pedestales eje A, cimentacion cubierta acorde a los planos estrucutrales

PERSONA Y MAQUINARIA

PERSONAL	**CANTIDAD**	**CARGO**	**EMPRESA**	**HORARIO**
ING RESIDENTE DE OBRA	1	RESIDENTE DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	RESESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLE 2026	7:00 AM A 5:00 PM
CUADRILLA DE OBRA	3	AUXILIARES DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
MAQUINARIA Y EQUIPO	**CANTIDAD**	**TIPO**	**EMPRESA**	**H/DÍA**
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	VARIOS	N/A	PSI INGENIEROS S.A.S	JR
EQUIPO TOPOGRAFICO				

MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TIPO**	**UNIDAD**	**TIPO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TIPO**
CEMENTO								

FOTOS

VISITAS

CONTRATISTA	**INTERVENTORIA**	**OBSERVACIONES**
ING LUIS EDUARDO SICHACA	DIRECTOR DE OBRA	se presentaron fuertes precipitacions en el sector en el transcurso del día, lo que genero acumulacion de agua en excavaciones de zapatas eje ay b, se realizaron actividades de evacuacion y secado en las areas afectadas
ING .DANNA TATIANA JIMÉNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Se activa protocolo del plan acción y evacuación de aguas ya que durante la jornada las lluvias fuertes evitaron el rendimiento del cronograma de obra, se recibe el modificatorio al contrato de obra IPVO 030-2025

EDWIN CAMILO SICHACA
RESIDENTE DE OBRA

Danna Jiménez
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE LA SUPERVISIÓN

	BITACORA			
	PSI INGENIEROS S.A.S		Folio	1

DATOS DE LA OBRA	
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Localización	Institución educativa tecnica Valle de Tenza — Guateque, Boyacá
N° de contrato de obra	IPVO 030-2025
fecha de acta de inicio	24 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de inicio	02 DE MARZO DE 2026
fecha estimada de conclusión	24 DE SEPTIEMBRE 2026
DATOS DEL CONTRATISTA	
Nombre o razon social	PSI INGENIEROS S.A.S
Domicilio	
telefono	
DATOS DE LA INTERVENTORIA	
Nombre o razon social	CONSORCIO INTERVALLE 2026
Domicilio	
telefono	

TIEMPO
NUBLADO CON LLUVIAS

ACTIVIDADES

• Se continua con el seguimiento plan de contigencia para proteccion de viga de cimentacion bloques de biblioteca y zona de baños institucion eductavia, se realiza revision en la señalizacion del aera para evitar transito de peatones en la zona, al igual que la suspension temporal de los baños y biblioteca, se realiza revision del apuntalamiento en madera y parales como me dida de asentamiento de la viga y se inicia con la recuperacion del material socavado o material de soporte de la viga de cimentacion de la biblioteca estudiantil

• Se dio inicio con la fundida en concreto para viga de amarre pedestales eje A, cimentacion cubierta acorde a los planos estrucutrales

PERSONA Y MAQUINARIA

PERSONAL	CANTIDAD	CARGO	EMPRESA	HORARIO
ING RESIDENTE DE OBRA	1	RESIDENTE DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	RESESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLE 2026	7:00 AM A 5:00 PM
CUADRILLA DE OBRA	3	AUXILIARES DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
MAQUINARIA Y EQUIPO	CANTIDAD	TIPO	EMPRESA	H/DÍA
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	VARIOS	N/A	PSI INGENIEROS S.A.S	JR
EQUIPO TOPOGRAFICO				

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	UNIDAD	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO
CEMENTO								

FOTOS





VISITAS

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
ING LUIS EDUARDO SICHACA	DIRECTOR DE OBRA	se presentaron fuertes precipitacions en el sector en el transcurso del día, lo que genero acumulacion de agua en excavaciones de zapatas eje ay b, se realizaron actividades de evacuacion y secado en las areas afectadas
ING .DANNA TATIANA JIMÉNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Se hace supervision de fundida en viga de amarre y se hace acompamiento en en especificicaciones tecnicas. Se realiza Observaciones y aprobación técnica del Balance de Mayores y Menores Cantidades, contrato de obra IPVO 030-2025 y es remitido a la entidad contratante

EDWIN CAMILO SICHACA
RESIDENTE DE OBRA

Danna Jiménez
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE LA SUPERVISIÓN

	BITACORA			
	PSI INGENIEROS S.A.S		Folio	1

DATOS DE LA OBRA	
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Localización	Institución educativa tecnica Valle de Tenza — Guateque, Boyacá
N° de contrato de obra	IPVO 030-2025
fecha de acta de inicio	24 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de inicio	02 DE MARZO DE 2026
fecha estimada de conclusión	24 DE SEPTIEMBRE 2026

DATOS DEL CONTRATISTA	
Nombre o razon social	PSI INGENIEROS S.A.S
Domicilio	
telefono	

DATOS DE LA INTERVENTORIA	
Nombre o razon social	CONSORCIO INTERVALLE 2026
Domicilio	
telefono	

TIEMPO

NUBLADO CON LLUVIAS

ACTIVIDADES

• Se continua con el seguimiento plan de contigencia para proteccion de viga de cimentacion bloques de biblioteca y zona de baños institucion eductavia, se realiza revision en la señalizacion del aera para evitar transito de peatones en la zona, al igual que la suspension temporal de los baños y biblioteca, se realiza revision del apuntalamiento en madera y parales como me dida de asentamiento de la viga y se inicia con la recuperacion del material socavado o material de soporte de la viga de cimentacion de la biblioteca estudiantil

• Se desencofro viga de amarre pedestales eje A

• se inicia con el suministro corte y figureo de acero longitudinal y transversal para parrila de columnas y pilotes muro cerramiento perimetral acorde a planos estrucuturales

PERSONA Y MAQUINARIA

PERSONAL	CANTIDAD	CARGO	EMPRESA	HORARIO
ING RESIDENTE DE OBRA	1	RESIDENTE DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	RESESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLE 2026	7:00 AM A 5:00 PM
CUADRILLA DE OBRA	3	AUXILIARES DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM

MAQUINARIA Y EQUIPO	CANTIDAD	TIPO	EMPRESA	H/DÍA
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	VARIOS	N/A	PSI INGENIEROS S.A.S	JR
EQUIPO TOPOGRAFICO				

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	UNIDAD	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO
CEMENTO								

FOTOS



VISITAS

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
ING LUIS EDUARDO SICHACA	DIRECTOR DE OBRA	se presentaron fuertes precipitacions en el sector en el transcurso del día, lo que genero acumulacion de agua en excavaciones de zapatas eje ay b, se realizaron actividades de evacuacion y secado en las areas afectadas
ING .DANNA TATIANA JIMÉNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Se realiza solicitud del orden y aseo del lugar de trabajo, manejo del PMA, se acompaña en la supervisión de desencofre de la viga y se realiza encofre de los pedestales del eje A

EDWIN CAMILO SICHACA
RESIDENTE DE OBRA

Danna Jiménez
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE LA SUPERVISIÓN

	BITACORA			
	PSI INGENIEROS S.A.S		Folio	1

DATOS DE LA OBRA		
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
Localización	Institución educativa tecnica Valle de Tenza	Guateque, Boyacá
N° de contrato de obra	IPVO 030-2025	
fecha de acta de inicio	24 DE FEBRERO DE 2026	
Fecha de inicio	02 DE MARZO DE 2026	
fecha estimada de conclusión	24 DE SEPTIEMBRE 2026	
DATOS DEL CONTRATISTA		
Nombre o razon social	PSI INGENIEROS S.A.S	
Domicilio		
telefono		
DATOS DE LA INTERVENTORIA		
Nombre o razon social	CONSORCIO INTERVALLE 2026	
Domicilio		
telefono		

TIEMPO
NUBLADO CON LLUVIAS

ACTIVIDADES

• Se continua con el seguimiento plan de contigencia para proteccion de viga de cimentacion bloques de biblioteca y zona de baños institucion eductavia, se realiza revision en la señalizacion del aera para evitar transito de peatones en la zona, al igual que la suspension temporal de los baños y biblioteca, se realiza revision del apuntalamiento en madera y parales como me dida de asentamiento de la viga y se inicia con la recuperacion del material socavado o material de soporte de la viga de cimentacion de la biblioteca estudiantil

• Se realiza encofrado de pedestales cimentacion cubierta escenario deportivo eje A-1 A A-6

• se continuo con el suministro corte y figureo de acero longitudinal y transversal para parrila de columnas y pilotes muro cerramiento perimetral acorde a planos estrucuturales

PERSONA Y MAQUINARIA

PERSONAL	CANTIDAD	CARGO	EMPRESA	HORARIO
ING RESIDENTE DE OBRA	1	RESIDENTE DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	RESESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLE 2026	7:00 AM A 5:00 PM
CUADRILLA DE OBRA	3	AUXILIARES DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
MAQUINARIA Y EQUIPO	CANTIDAD	TIPO	EMPRESA	H/DÍA
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	VARIOS	N/A	PSI INGENIEROS S.A.S	JR
EQUIPO TOPOGRAFICO				

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	UNIDAD	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO
CEMENTO								

FOTOS





VISITAS

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
ING LUIS EDUARDO SICHACA	DIRECTOR DE OBRA	
ING .DANNA TATIANA JIMÉNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Se hace acompañamiento y supervision en figurado y amarre del acero para columnas de cerramiento y pilotes, se presentan lluvias fuertes en el sector

EDWIN CAMILO SICHACA
RESIDENTE DE OBRA

Danna Jiménez
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE LA SUPERVISIÓN

	BITACORA			
	PSI INGENIEROS S.A.S		Folio	1

DATOS DE LA OBRA		
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
Localización	Institución educativa tecnica Valle de Tenza	Guateque, Boyacá
N° de contrato de obra	IPVO 030-2025	
fecha de acta de inicio	24 DE FEBRERO DE 2026	
Fecha de inicio	02 DE MARZO DE 2026	
fecha estimada de conclusión	24 DE SEPTIEMBRE 2026	
DATOS DEL CONTRATISTA		
Nombre o razon social	PSI INGENIEROS S.A.S	
Domicilio		
telefono		
DATOS DE LA INTERVENTORIA		
Nombre o razon social	CONSORCIO INTERVALLE 2026	
Domicilio		
telefono		

TIEMPO
NUBLADO CON LLUVIAS EN LA JORNADA

ACTIVIDADES

• Se continua con el seguimiento plan de contigencia para proteccion de viga de cimentacion bloques de biblioteca y zona de baños institucion eductavia, se realiza revision en la señalizacion del aera para evitar transito de peatones en la zona, al igual que la suspension temporal de los baños y biblioteca, se realiza revision del apuntalamiento en madera y parales como me dida de asentamiento de la viga y se inicia con la recuperacion del material socavado o material de soporte de la viga de cimentacion de la biblioteca estudiantil

• se continuo con el suministro corte y figureo de acero longitudinal y transversal para parrila de columnas y pilotes muro cerramiento perimetral acorde a planos estrucuturales

PERSONA Y MAQUINARIA

PERSONAL	CANTIDAD	CARGO	EMPRESA	HORARIO
ING RESIDENTE DE OBRA	1	RESIDENTE DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	RESESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLE 2026	7:00 AM A 5:00 PM
CUADRILLA DE OBRA	3	AUXILIARES DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM

MAQUINARIA Y EQUIPO	CANTIDAD	TIPO	EMPRESA	H/DÍA
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	VARIOS	N/A	PSI INGENIEROS S.A.S	JR
EQUIPO TOPOGRAFICO				

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	UNIDAD	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO
CEMENTO								

FOTOS





VISITAS

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
ING LUIS EDUARDO SICHACA	DIRECTOR DE OBRA	
ING .DANNA TATIANA JIMÉNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Se activa protocolo del plan acción y evacuación de aguas ya que durante la jornada las lluvias fuertes evitaron el rendimiento del cronograma de obra

EDWIN CAMILO SICHACA
RESIDENTE DE OBRA

Danna Jiménez
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE LA SUPERVISIÓN

	BITACORA			
	PSI INGENIEROS S.A.S		Folio	1

DATOS DE LA OBRA		
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
Localización	Institución educativa tecnica Valle de Tenza	Guateque, Boyacá
N° de contrato de obra	IPVO 030-2025	
fecha de acta de inicio	24 DE FEBRERO DE 2026	
Fecha de inicio	02 DE MARZO DE 2026	
fecha estimada de conclusión	24 DE SEPTIEMBRE 2026	
DATOS DEL CONTRATISTA		
Nombre o razon social	PSI INGENIEROS S.A.S	
Domicilio		
telefono		
DATOS DE LA INTERVENTORIA		
Nombre o razon social	CONSORCIO INTERVALLE 2026	
Domicilio		
telefono		

TIEMPO
NUBLADO CON LLUVIAS

ACTIVIDADES
• Se continua con el seguimiento plan de contigencia para proteccion de viga de cimentacion bloques de biblioteca y zona de baños institucion eductavia, se realiza revision en la señalizacion del aera para evitar transito de peatones en la zona, al igual que la suspension temporal de los baños y biblioteca, se realiza revision del apuntalamiento en madera y parales como me dida de asentamiento de la viga y se inicia con la recuperacion del material socavado o material de soporte de la viga de cimentacion de la biblioteca estudiantil
• se continuo con el suministro corte y figureo de acero longitudinal y transversal para parrila de columnas y pilotes muro cerramiento perimetral acorde a planos estrucuturales

PERSONA Y MAQUINARIA

PERSONAL	CANTIDAD	CARGO	EMPRESA	HORARIO
ING RESIDENTE DE OBRA	1	RESIDENTE DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	RESESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLE 2026	7:00 AM A 5:00 PM
CUADRILLA DE OBRA	3	AUXILIARES DE OBRA	PSI INGENIEROS S.A.S	7:00 AM A 5:00 PM

MAQUINARIA Y EQUIPO	CANTIDAD	TIPO	EMPRESA	H/DÍA
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	VARIOS	N/A	PSI INGENIEROS S.A.S	JR
EQUIPO TOPOGRAFICO				

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	UNIDAD	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO
CEMENTO								

FOTOS

VISITAS

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
ING LUIS EDUARDO SICHACA	DIRECTOR DE OBRA	
ING .DANNA TATIANA JIMÉNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Se activa protocolo del plan acción y evacuación de aguas ya que durante la jornada las lluvias fuertes evitaron el rendimiento del cronograma de obra

EDWIN CAMILO SICHACA
RESIDENTE DE OBRA

Danna Jiménez
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE LA SUPERVISIÓN

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

SEGUIMIENTO FINANCIERO AL CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO INTERVALLE 2026	**FORMATO DEL SEGUIMIENTO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA N° IPVO 030-2025 "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".**	

SEGUIMIENTO DEL ANTICIPO

N°	FECHA	ITEM	VALOR TOTAL	VALOR DEL PAGO	FACTURA	NIT	EMPRESA
1	20 DE ABRIL DE 2026	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	$383,500,000.00	$340,001,189.75	FEME139	901.534.198-1.	M&E COMPANY COLOMBIA SAS
2	29 DE ABRIL DE 2026	ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPOS Y TRANSPORTE DE MATERIALES	$173,601,128.00	$88,842,630.00	FVEJ282	1.007.655.567-1	JANDIR ESTIVEN MONTAÑA GONZALEZ (M&E COMPANY COLOMBIA)
3	08 DE MAYO DE 2026	SALARIOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SUBCONTRATOS	$166,405,000.00	$80,690,909.10	FE102205	901062819-9	INCONS S.A.S
4	12 DE MAYO DE 2026	ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPOS Y TRANSPORTE DE MATERIALES	$166,405,000.00	$16,364,000.00	FE496	901698547-0	TRANSERVICIOS E IMPORTACIONES SAS

CONCEPTO	VALOR TOTAL	VALOR APROBADO	VALOR RESTANTE
COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	$383,500,000.00	$340,001,189.75	$43,498,810.25
SALARIOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SUBCONTRATOS	$166,405,000.00	$80,690,909.10	$85,714,090.90
ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPOS Y TRANSPORTE DE MATERIALES	$173,601,128.00	$105,206,630.00	$68,394,498.00
VALOR TOTAL	**$723,506,128.00**	**$525,898,728.85**	**$197,607,399.15**

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

SOPORTES DE SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

Guateque, 11 de mayo de 2026

INT-053-OF-026

Señor:
LUIS EDUARDO SICHACA GÁMEZ
R/L PSI INGENIEROS S.A.S
Contratista

REF: Respuesta a remisión de documentos soporte y aprobación de orden de giro de anticipo No. 3, contrato de obra IPVO 030-2025

Objeto del contrato: *"MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".*

Cordial saludo,

En atención al oficio remitido por su despacho con fecha del 08 de mayo de 2026, mediante el cual se presentan los documentos soporte para el trámite No. 3 de orden de giro de anticipo del proyecto *"Mejoramiento del escenario recreativo y de actividades lúdicas en la Institución Educativa Técnica Valle de Tenza en la sede campestre en el municipio de Guateque, departamento de Boyacá"*, esta Interventoría se permite informar lo siguiente:

Tras la revisión técnica y administrativa de los folios anexos, se confirma la recepción satisfactoria de los siguientes documentos:

- **Factura Electrónica de Venta: FVEJ282** La factura electrónica de venta No. FE10205 emitida por INCONS S.A.S. el 06/05/2026, por un valor total de **$80.690.909,10** (Ochenta millones seiscientos noventa mil novecientos nueve con diez centavos), cumple con los requisitos legales y corresponde a los conceptos de avance de obra y administración en el municipio de Guateque.
- **Registro Único Tributario (RUT):** Se verifica la vigencia del RUT de INCONS S.A.S. (NIT 901062819-9), con actividad principal 4290 y responsabilidades tributarias actualizadas al 06/03/2026.
- **Certificación Bancaria:** Constancia de la cuenta corriente No. 92300000119 en Bancolombia S.A., a nombre de la empresa subcontratista, con estado ACTIVA.
- **Plan de Inversión del Anticipo:** Documento debidamente firmado por el Contratista, la Interventoría, el cual detalla una inversión total de $723.506.128,00.

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

El concepto de la factura presentada corresponde al "Avance del contrato de construcción, mano de obra y equipo para construcción de obra civil". Este rubro se encuentra debidamente contemplado en el Ítem 2 del Plan de Inversión aprobado ("SALARIOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS, SUBCONTRATO"), el cual tiene asignado un presupuesto total de $166.405.000.00 (23.00% del anticipo total). El valor facturado es coherente con la disponibilidad de dicho rubro para el presente periodo.

Una vez verificada la vigencia de los documentos y su alineación con el Contrato No. IPVO 030-2025, esta Interventoría procede a dar su **APROBACIÓN** para el trámite de giro ante la fiduciaria correspondiente, conforme al Plan de Inversión y Anticipo establecido.

Atentamente,



ING. JORGE ARMANDO CALDERÓN SANCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERVALLE 2026

Tunja, 08 de mayo de 2026

INGENIERO,

JORGE ARMANDO CALDERÓN SÁNCHEZ

R/L CONSORCIO INTERVALLE 2026

INTERVENTORÍA

CO-IPVO-030-2025-OF-025

REFERENCIA: Remisión documentos soporte orden de giro anticipo No.3

OBJETO: "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito documentos soporte de la tercera orden de giro de anticipo, para su revisión y aprobación. Se anexan los siguientes documentos:

- Factura
- RUT
- certificación bancaria,
- plan de inversión del anticipo aprobado

Atentamente,

ING. M.SC. LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. 1.049.603.584 de Tunja
R/L PSI INGENIEROS S.A.S.
Contratista
Cel: 313-830-72-69
cubiertaguateque@gmail.com
psi.ingenieros1@gmail.com

INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT 901062819-9
vereda caicedos, Ramiriquí, Boyacá,
Tel: +573107589831
incons.sas2017@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE10205
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	PSI INGENIEROS S.A.S		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Calle 57 #9-43, Colombia, Tunja, Boyacá		06/05/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3138307269	**NIT** 900928849-4	14/05/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Avance contrato de construcción, mano de obra y equipo,para la construccion de obra civil (coliseo y/o cancha) municipio de Guateque Boyaca	Unidad	$72.727.272,73	1		$72.727.272,73
2	Administración (4)	Unidad	$2.909.090,91	1		$2.909.090,91
3	Imprevistos (1%)	Unidad	$727.272,73	1		$727.272,73
4	Utilidad (5%)	Unidad	$3.636.363,64	1		$3.636.363,64
5	IVA sobre la utilidad (19%)	Unidad	$690.909,09	1		$690.909,09

Moneda: COP
Generado: 2026-05-06 17:05:38-05:00
Validación DIAN: 2026-05-06 17:06:38-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 9fd6bffb5d02d3c7138361dfe157f35205c2e53e481fa8c708f906efa6e45c80468bd892f5598e6eae7130a3fbc90ad4

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$80.690.909,10
Total	$80.690.909,10

Total de lineas: 5

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764107865539 de 2026-03-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE10201 hasta FE20000 con vigencia hasta 2028-03-31

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141239569907

(415)7707212489984(8020) 000014123956990 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 6 2 8 1 9	9	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INCONS S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Ramiriquí 5 9 9

41. Dirección principal
VDA CAICEDOS

42. Correo electrónico incons.sas2017@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 7 5 8 9 8 3 5	3 2 0 3 3 1 9 1 5 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 1 7 0 3 1 7	7 1 1 2	2 0 1 7 0 3 1 7		7 4 9 0	7 7 3 0

Ocupación	
51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1 4	4 8	5 2	5 5																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

EL TRAMITE DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141239569907

(415)7707212489984(8020) 000014123956990 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 6 2 8 1 9	9	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	1 4 7 2 3 7	
73. Fecha	2 0 1 7 0 3 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 7 0 3 0 3	
77. No. Matrícula mercantil	2 7 7 3 0	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	3 8	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

EN TRAMITE
DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141239569907

(415)7707212489984(8020) 000014123956990 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 6 2 8 1 9	9	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 1 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 0 4 4 7 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTRO	LEON	JORGE	MANUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

EN TRAMITE DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Miércoles, 26 de noviembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INTERVENTORIA CONSULTORIA Y CONSTRCCION identificado(a) con NIT 901062819, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	92300000119	2020/02/04	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

Guateque, 13 de mayo de 2026

INT-053-OF-028

Señor:
LUIS EDUARDO SICHACA GÁMEZ
R/L PSI INGENIEROS S.A.S
Contratista

REF: Respuesta a remisión de documentos soporte y aprobación de orden de giro de anticipo No. 4, contrato de obra IPVO 030-2025

Objeto del contrato: *"MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".*

Cordial saludo,

En atención al oficio remitido por su despacho con fecha del 12 de mayo de 2026, mediante el cual se presentan los documentos soporte para el trámite No. 4 de orden de giro de anticipo del proyecto *"Mejoramiento del escenario recreativo y de actividades lúdicas en la Institución Educativa Técnica Valle de Tenza en la sede campestre en el municipio de Guateque, departamento de Boyacá"*, esta Interventoría se permite informar lo siguiente:

Tras la revisión técnica y administrativa de los folios anexos, se confirma la recepción satisfactoria de los siguientes documentos:

- **Factura Electrónica de Venta:** Emitida por TRANSERVICIOS E IMPORTACIONES SAS (FE496) el 11/05/2026 por un valor total de $16.364.000 (Dieciséis millones trescientos sesenta y cuatro mil).
- **Registro Único Tributario (RUT):** Se incluye el Registro Único Tributario de TRANSERVICIOS E IMPORTACIONES SAS (NIT 901698547-0), actualizado al 01-10-2025.
- **Certificación Bancaria:** Constancia de la cuenta corriente No. 49200001265 en Bancolombia S.A., a nombre de la empresa TRANSERVICIOS E IMPORTACIONES SAS, con estado ACTIVA.

- **Plan de Inversión del Anticipo:** Se adjunta el plan aprobado para el contrato No. IPVO 030-2025.

El concepto de la factura presentada corresponde al donde el rubro de "Alquiler de maquinaria y transporte" (relacionado con la factura) tiene una asignación total de $173.601.128,00. El valor facturado es coherente con la disponibilidad de dicho rubro para el presente periodo.

Una vez verificada la vigencia de los documentos y su alineación con el Contrato No. IPVO 030-2025, esta Interventoría procede a dar su **APROBACIÓN** para el trámite de giro ante la fiduciaria correspondiente, conforme al Plan de Inversión y Anticipo establecido.

Atentamente,



ING. JORGE ARMANDO CALDERÓN SANCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERVALLE 2026

Tunja, 12 de mayo de 2026

INGENIERO,

JORGE ARMANDO CALDERÓN SÁNCHEZ

R/L CONSORCIO INTERVALLE 2026

INTERVENTORÍA

CO-IPVO-030-2025-OF-026

REFERENCIA: Remisión documentos soporte orden de giro anticipo No.4

OBJETO: "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito documentos soporte de la cuarta orden de giro de anticipo, para su revisión y aprobación. Se anexan los siguientes documentos:

- Factura
- RUT
- certificación bancaria,
- plan de inversión del anticipo aprobado

Atentamente,

ING. M.SC. LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. 1.049.603.584 de Tunja
R/L PSI INGENIEROS S.A.S.
Contratista
Cel: 313-830-72-69
cubiertaguateque@gmail.com
psi.ingenieros1@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141184691714

(415)7707212489984(8020) **000014118469171 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 9 8 5 4 7	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TRANSERVICIOS E IMPORTACIONES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Guateque 3 2 2

41. Dirección principal
CR 6 5 76 - EL PROGRESO

42. Correo electrónico transerviciossas6@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 5 7 9 6 0 9 8	3 1 8 2 4 0 9 6 5 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 3 0	2 0 2 3 0 3 1 5	4 7 1 1	2 0 2 5 0 1 2 8		4 7 6 1	4 6 1 0		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	1 4	4 2	4 7	4 8	5 2	5 5																				

14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CASTRO VELAZQUEZ ANDREA CAROLINA
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 01-10-2025 02:37:42PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141184691714

(415)7707212489984(8020) **000014118469171 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 9 8 5 4 7	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		0 0 2
73. Fecha	2 0 2 3 0 2 1 7	2 0 2 3 0 9 2 9
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 3 2 4	2 0 2 3 1 0 2 5
77. No. Matrícula mercantil	2 1 0 0 8 5	2 1 0 0 8 5
78. Departamento	1 5	1 5
79. Ciudad/Municipio	3 8	3 8
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 3 2 4	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	1 0 1	2 0 2 3 0 3 2 9		-
2	8 1	2 0 2 3 0 3 2 9		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 01-10-2025 02:37:42PM

COPIA CERTIFICADO COSTO
DOCUMENTO SIN COSTO
Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141184691714

(415)7707212489984(8020) 000014118469171 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 9 8 5 4 7	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 5 2 3		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 4 9 7 9 8 6 0 7		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTRO	VELAZQUEZ	ANDREA	CAROLINA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 5 2 3		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 5 7 6 9 0 4 8 9		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HERNANDEZ	VELASQUEZ	LEIDY	PAOLA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 01-10-2025 02:37:42PM

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141184691714

(415)7707212489984(8020) **000014118469171 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 9 8 5 4 7		Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1	

162. Nombre del establecimiento
SUPER MARKET EL PROGRESO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Boyacá 1 5	Guateque 3 2 2	

165. Dirección
CR 6 5 68 BRR EL PROGRESO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 2 8 6 2 1	2 0 2 5 0 1 2 8
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3 1 8 2 4 0 9 6 5 7	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papele 4 7 6 1	

162. Nombre del establecimiento
PAPELERIA MISCELANIA Y VARIEDADES COLORS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Boyacá 1 5	Guateque 3 2 2	

165. Dirección
CR 6 5 76 BRR EL PROGRESO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 2 8 6 2 0	2 0 2 5 0 1 2 8
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3 1 0 5 7 9 6 0 9 8	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 01-10-2025 02:37:42PM

Powered by CamScanner

Certificado Bancario

miércoles, 13 de agosto de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. Se permite informar que TRANSERVICIOS E IMPORTACIONES SAS identificado (a) con NIT 901698547 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No producto	Fecha apertura	Estado
COP CUENTA DE AHORROS	49200001265	26/03/2024	ACTIVA

El manejo de este(os) productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
***Importante**: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionado anteriormente.

*Si desea verificar esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57 - 4) 510 90 00 - Bogotá - Local(57 - 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57 - 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57 - 2) 554 05 05 - Resto del País: 01800 09 12345. Sucursal telefónica en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

TRANSERVICIOS E IMPORTACIONES SAS
NIT: 901698547 - 0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 6 5 76, GUATEQUE, Boyacá, Colombia
Tel. 3105796098
Email. transerviciossas6@gmail.com
Régimen simple de tributación
Autorización factura electrónica de venta No: 18764087673043 válida desde 2025-01-24 hasta 2027-01-24 rango desde FE101 hasta FE500

Nombre/Razón Social: PSI INGENIEROS S.A.S
NIT: 900928849
Dirección:
Teléfono:
Email: PSICONTABILIDAD055@GMAIL.COM

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **FE496**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **10:52:30**
FECHA FIRMADO: **11/05/2026 10:52:31**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	05	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	Alquiler de Retroexcavadora SERVICIO ALQUILER RETROEXCAVADORA 55H	62	55,0000	$120.000,0000	IVA	19%	$1.254.000,0000	$0,00	$6.600.000,00
2	SERV01	TRASPORTE DE MATERIALES SERVICIO TRANSPORTE DE MATERIALES 11.5 DIAS	WSD	11,5000	$740.000,0000				$0,00	$8.510.000,00

Notas: SERVICIO ALQUILERRETROEXCAVADORA Y SERVICIO TRANSPORTE MATERIALES

SON: (dieciséis millones trescientos sesenta y cuatro mil pesos cero centavos)

CUFE: fe1a05086dcda3d8232bc98041a9f296cda49bbf8d147ca41ae0b4eb8bec873d4febd46124ec55da4db4f49541c2a026

Subtotal:	$15.110.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$1.254.000,00
Total:	$16.364.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$6.600.000,0000	19,0000%	$1.254.000,0000

Firma Digital: KlGbx31y+05R2vV1XAORFNQywjyOVXWciaBhh/ICfAQAU/tHspRVhWBa3qJmriwv
nzEsNNtWYIbtoBPQIRqjGdcorhWNxALOMWm8yUpjElbAv+Qf/IYKKOcsZPXrnZro
upiH1VwRyIlcmHanY7GVcoEwCKnq0S1WWjI5LNupBz8P3X+vI6IpNiOE/nQHJJc3
K/b8KgUpYPtm2348ooGeFRGDOAsf4tUo1jqtF8jYAKavn7UiomrOlxJ8mEoVRdc7
6mcG2r78hwS+CiIbWmpmaln4KCTY4pVW0lUzzFB6pxdtqRKbwWzvIpb63UUKNEEu
UU2mw/RWXtLTJJgYIrJzqQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES E INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PLAN DE INVERSION Y ANTICIPO

CONTRATO No.	No. IPVO 030-2025	**FIDUCIARIA**	ALIANZA FIDUCIARIA S.A
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA	**INTERVENTOR**	CONSORCIO INTERVALLE 2026
CONTRATISTA	PSI INGENIEROS S.A.S	**SUPERVISOR**	TIERRASUA S.A.S
VALOR DEL ANTICIPO	**$ 723,506,128.000**		
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		

ITEM	CONCEPTO	VALOR MES 1 ($)	VALOR MES 2 ($)	VALOR MES 3 ($)	VALOR MES 4 ($)	VALOR MES 5 ($)	VALOR MES 6 ($)	VALOR MES 7 ($)	VALOR TOTAL ($)	%
1	COMPRA DE MATERIALES Y INSUMOS	$ 28,000,000.00	$ 166,300,000.00	$ 189,200,000.00					$ 383,500,000.00	53.01%
2	SALARIOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS, SUBCONTRATOS	$ 12,160,000.00	$ 72,167,000.00	$ 82,078,000.00					$ 166,405,000.00	23.00%
3	ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPOS Y TRASNPORTE DE MATERIALES	$ 12,688,000.00	$ 75,275,000.00	$ 85,638,128.00					$ 173,601,128.00	23.99%
	VALOR TOTAL								**$ 723,506,128.00**	**100.00%**

LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ
R.L PSI INGENIERIOS S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

JORGE ARMANDO CALDERÓN SANCHEZ
R.L CONSORCIO INTERVALLE 2026
INTERVENTOR

JULIAN EDGARDO GUERRERO
TIERRASUA S.A.S
SUPERVISOR

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

ACTAS GENERADAS

TIERRASUA ¡Conectamos región!	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CODIGO: M-GE-CV-F-001
	ACTA DE REUNIÓN	

LUGAR DE REUNIÓN	Institución Educativa técnica Valle de Tenza/via Teams.				
FECHA	21-May-2026	Hora inicio	9:33 am	hora Final	11:12 am.

- Presentación de los presentes:
- socalización del avance de obra 15.8% presentamos un retraso 6% aproximadamente condiciones climaticas Fuertes lluvias.
- Cambio del baldozin pulido por una loza en concreto ya se comento en el comite anterior a todos los presentes
- Eliminar la malla contra impacto por una malla de nailon de acuerdo al seguimiento del plan acción. ya que se proyecta hacer un sostenimiento adecuado para los suelos encontrados. y contingencia.
- la autoridad municipal comenta sobre la contingencia presentada y sobre el piso por el cambio, se manifiesta que el baldosin pulido puede durar más y el mantenimiento es menor. y tomar una opción de toptimizar recursos de regalias e ir a un ajuste.
- Al realizar un aumento y aumentar recursos entra en una suspencion de retraso
- En los renders iniciales se presentan con pintura no con baldozin.
- El señor rector interviene pregunta sobre la duración y mantenimiento del concreto pulido. y sobre el acceso a los condiciones dignas a los estudiantes.
- El contratista menciona los condiciones de durabilidad con acabado de concreto pulido.
- Por parte de la autoridad de la institución y del municipio, plantean que no es una opción el tema de suspención, ya que no se presenta una opción. adicional, se da viabilidad a la propuesta.
- se cierra el comite con recorrido. y se cierra con reralces en las zonas afectadas. en columnas. y en la zona de los baños y bibliotera.
- Una vez reunidas todas las partes, la alcaldia municipal, el señor rector, el contratista e interventoria se socializó las actividades necesarias para ejecutar el plan de acción debido a la contingencia, se hace necesaria la construcción de un muro de contención, fue necesario, establecer compensación de recursos, donde el muto acuerdo es el acabado en concreto pulido y suprimir la malla contra impacto

COMPROMISOS

FECHA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
	Balance de cantidades menores y mayores, para su aprobación respectiva por la interventoría.	Contratista

DECISIONES / APROBACIONES

Se da viabilidad a la propuesta del piso en concreto policby y a la malla contra impacto, para cambiar los ítems y poder dar compensación a los recursos para el muro de contención.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta y se anexa lista de asistencia que en ella intervinieron.

ASISTENTES

NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Yilmar Medina	Interventor	Interventoría	
Jhon Alip Tina Rodriguez	Aux. Residente de Obra	PSI Ingenieros S.A.S	
Elkin Cabezas C.	AP. SPICI.	ALCALDIA.	
David Rey		IE Valle de Tenza	
Alvaro F. Zárate B	SECTOR	S. E. V. T.	
Brigit Cupa	Sec Planeación	Alcaldía Guateque	
David Morales C.	Alcalde	Alcaldía Guateque	
Diana Tatiana Jiménez R	Residente Interventoría	Intervalle 2026	
Luis Sichacá Gamez	Dir Obra PSI	PSI ingenieros.	

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

ACTA DE SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE CONSIDERACIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE OBRA No. IPVO-030-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

- **Objeto:** Mejoramiento del escenario recreativo y de actividades lúdicas en la Institución Educativa Técnica Valle de Tenza en la sede campestre en el municipio de Guateque, departamento de Boyacá.
- **Municipio:** Guateque, Boyacá.
- **Fecha de la Reunión:** 21 de mayo de 2026.
- **Lugar:** Instalaciones de la Institución Educativa Técnica Valle de Tenza - Sede Campestre.
- **Convocados / Participantes:** Autoridad de la institución educativa, Autoridad política, administrativa y legal del municipio, representantes de la firma contratista (PSI INGENIEROS S.A.S.), Interventoría (Consorcio Intervalle 2026) y Supervisión técnica (TIERRASUA).

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Socializar con las autoridades de la institución educativa, autoridad del municipio las condiciones actuales de la obra, los hallazgos técnicos derivados de las actividades de demolición y excavación, y someter a aprobación las consideraciones técnicas complementarias necesarias para garantizar la estabilidad estructural de las edificaciones colindantes y la seguridad de los usuarios.

3. EXPOSICIÓN DE CONSIDERACIONES TÉCNICAS

La firma contratista y la interventoría expusieron detalladamente los siguientes puntos críticos evidenciados tras la remoción del material de soporte original:

1. **Inestabilidad del Terreno Colindante:** Al realizar las excavaciones y demoliciones del muro cerramiento, se constató que el sistema de cimentación de los bloques existentes (cafetería, biblioteca y baños) es de tipo superficial. Estos bloques están cimentados sobre suelo natural saturado debido a filtraciones de agua provenientes de la parte superior del plantel.





2. **Exposición de Infraestructura Existente:** El movimiento de tierra dejó al descubierto la base estructural de la **zona de baños y la biblioteca estudiantil**. Se constató físicamente que estas edificaciones poseen una cimentación de tipo superficial, sin vigas de amarre profundas ni mejoramiento de subrasante previo, quedando en estado de descalce latente.

3. **Riesgo Estructural y Geotécnico:** Las excavaciones necesarias para ampliar la sección transversal de la nueva cancha multifuncional generaron un desprendimiento del material de soporte de los bloques colindantes. Lo anterior, sumado a condiciones climatológicas desfavorables, representa un riesgo alto para la seguridad de la comunidad estudiantil y los operarios de la obra.
4. **Modificaciones de Acabados por Seguridad (Principio de Prevención del Daño):** Con el fin de evitar accidentes futuros y caídas de los estudiantes, se socializó la sustitución técnica y anulación del acabado en baldosín de granito (Ítems 7.08 y 7.09). En su lugar, el piso terminado del escenario será ejecutado directamente en una losa de contrapiso de concreto, la cual ofrece un mayor coeficiente de adherencia, mayor durabilidad y menores costos de mantenimiento preventivo.
5. Se reforma integralmente el Capítulo 9, unificando sus actividades en un único ítem ejecutable: el Ítem 9.07 (Malla tejida en nylon). Asimismo, con el objetivo de ampliar el área de cobertura y optimizar los niveles de seguridad y protección en la obra, se ha determinado duplicar la cantidad originalmente proyectada para este concepto.
6. **ESTADO INICIAL DE LAS ESTRUCTURAS ANTES DE LA INTERVENCIÓN**

   Previo al inicio de las actividades constructivas, durante las visitas de reconocimiento y seguimiento inicial acta de vecindad de inicio, se evidenció que los bloques existentes ya presentaban algunas patologías y deterioros asociados al uso, antigüedad y comportamiento normal de la estructural.

7. FISURAS EN PLACAS:

- Existencia de fisuras longitudinales y transversales en placas de piso y elementos de concreto.
- Las fisuras observadas no representaban, a la fecha de inspección inicial, una condición de gravedad estructural.

COLUMNAS CIRCULARES

- Presencia de fisuras longitudinales superficiales en algunas columnas circulares.
- Desprendimiento localizado de recubrimiento de concreto en ciertos puntos.

ESTADO GENERAL

- Se evidenciaban signos de desgaste normal por uso y antigüedad de las edificaciones.
- No se observaron indicios de falla estructural inminente previo al inicio de las excavaciones.

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL PREVIO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA ZONA BAÑOS NIÑAS:



Fachada posterior baños mujeres el cual se encuentra ubicado paralelamente al escenario deportivo, se evidencia muro perimetral en buen estado.



4. La anterior fotografía demuestra la distribución arquitectónica que comprende el pasillo de ingreso a baño de mujeres y estructura comprendida entre columnas circulares que soportan placa de concreto de cubierta entre zona de baños y biblioteca institucional, como se puede evidenciar en los círculos de color rojo en la anterior fotografía, se evidencian grietas en sentidos longitudinal y transversal y desprendimiento de material en placa de piso entre la grada y el nivel existente del pasillo, adicionalmente las columnas circulas se logra identificar fisuras y desprendimientos de concreto en sus elemento tal cual lo muestran los círculos de color rojo en las siguientes ilustraciones:





La anterior fotografía evidencia el estado del piso del pasillo o zona de ingreso a baño de mujeres el cual está construido en baldosa, los círculos de color rojo permiten evidenciar roturas en sentido transversal en algunas baldosas existentes. De manera general se concluye que el piso se encuentra en un estado aceptable.

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL PREVIO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA, BIBLIOTECA ESTUDIANTIL:





Las anteriores fotografías evidencian la fachada perimetral, muros internos y cubierta de la estructura de la biblioteca paralela al escenario deportivo de la institución valle de Tenza, no se evidencian afectaciones se concluye que la estructura se encuentra en buen estado.

DESCRIPCIÓN DE LA EVENTUALIDAD PRESENTADA

Durante la ejecución de las excavaciones requeridas para el proyecto, particularmente en el sector colindante a los bloques existentes, se presentó un desprendimiento del material de soporte asociado a la cimentación superficial de las estructuras existentes. La condición anteriormente descrita generó un asentamiento diferencial localizado en la viga de cimentación, ocasionando:

- Afectación del piso existente en baldosa entre los bloques de baños y biblioteca.
- Incremento y aparición de nuevas fisuras en algunas columnas.
- Aparición de fisuras en muro lateral del bloque de baños.
- Alteraciones localizadas en elementos no estructurales y de acabado. Es importante señalar que parte de las fisuras existentes correspondían a patologías previas a la intervención como se indica en el anterior capitulo; sin embargo, las actividades de excavación incidieron directamente en las afectaciones recientemente evidenciadas en los sectores indicados.

A continuación, se presenta el registro fotográfico que permite evidenciar lo mencionado anteriormente:




Fisuras longitudinales en baldosas, existentes a casusa de asentamiento en la viga de cimentación del baño de las mujeres de la institución educativa.





La siguiente fotografía evidencia la biblioteca estudiantil, los muros y cubierta se encuentran en buen estado. Se evidencia un asentamiento en la puerta de ingreso, lo que dificulta la apertura de la puerta metálica

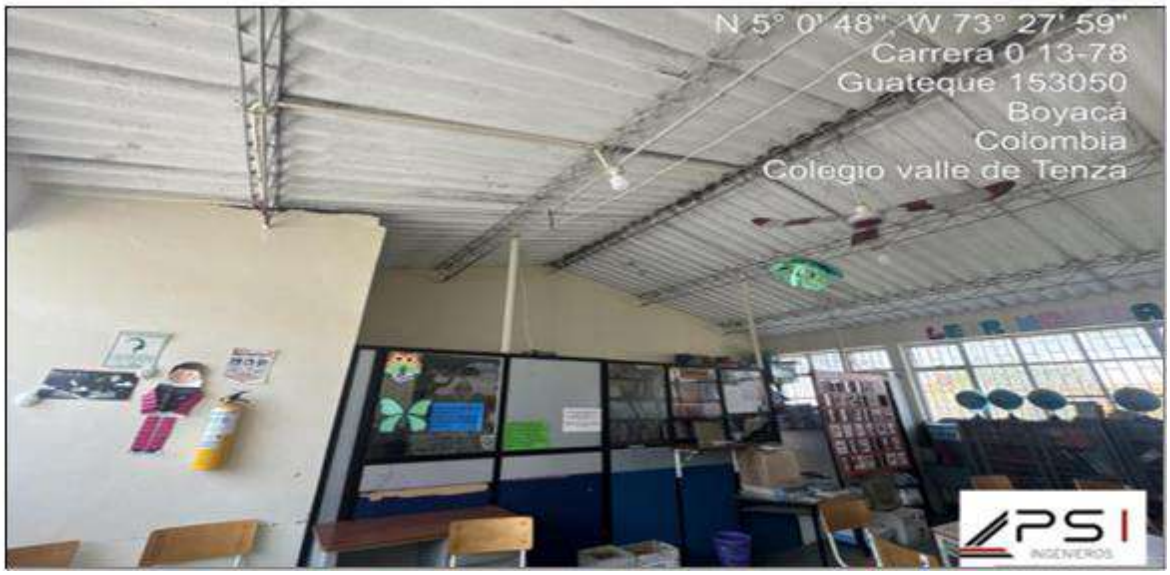

MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL CONTRATISTA

Una vez identificada la situación presentada, la firma contratista de obra ejecutó de manera inmediata las siguientes acciones:

- AISLAMIENTO PREVENTIVO: Se realizó el aislamiento de las zonas afectadas con el fin de restringir el acceso de estudiantes, docentes y personal administrativo.
- SEÑALIZACIÓN: Se implementó señalización preventiva y control de circulación peatonal.



COMUNICACIÓN A LAS PARTES INTERESADAS:

La situación fue comunicada oportunamente a la comunidad estudiantil, supervisión/interventoría del proyecto mediante oficio de obra No. CO-IPVO-030-OF-014 (REF: Solicitud de inhabilitación temporal de bloques de biblioteca y baños de niñas por excavaciones aledañas a la obra)

FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN

La firma contratista elaboró y socializó un plan de acción ante la interventoría mediante oficio de obra No. CO-IPVO-030-OFI- 017 REF: (Respuesta a oficio INT-053-OF-020 – Plan de Contingencia y Plan de Acción) orientado a Prevenir mayores afectaciones sobre las estructuras existentes. Estabilizar el sector intervenido. Mitigar riesgos asociados a asentamientos adicionales. Garantizar condiciones seguras durante la continuidad de la obra.

CONCLUSIONES

- Antes del inicio de las actividades constructivas, los bloques existentes ya presentaban algunas patologías y afectaciones menores, tales como fisuras longitudinales y transversales en placas, fisuras superficiales y desprendimiento localizado de concreto en algunas columnas circulares.
- Las excavaciones ejecutadas para la ampliación de la cancha y construcción de zapatas generaron una afectación sobre el material de soporte de la viga de

cimentación superficial de los bloques colindantes, ocasionando un asentamiento diferencial localizado.

- Se realizó inspección y auscultación visual a la cafetería estudiantil, para lo cual no se evidencian afectaciones, se concluye que se encuentra en las mismas condiciones previo al inicio a las actividades del contrato.
- Una vez finalice la ejecución del plan de acción radicado ante la interventoría y culminen las actividades principales del proyecto, se realizará una evaluación técnica integral para definir las medidas definitivas de reajuste, reparación y/o rehabilitación requeridas en las zonas afectadas.

5. SOLUCIONES PROPUESTAS Y BALANCES ADOPTADOS

Para dar solución definitiva a los riesgos identificados sin alterar el valor total del contrato ni el objeto del mismo, se detalló la incorporación y compensación de las siguientes actividades en el presupuesto del proyecto:

Plan de contingencia y acción: El contratista definió acciones urgentes de ingeniería para mitigar el riesgo de colapso mientras se construye la solución definitiva:

- **Instalación de Estabilización (Apuntalamiento):** Colocación de elementos de madera y puntales metálicos para sostener el talud expuesto de manera provisional.
- **Manejo de Aguas Superficiales:** Desvío provisional de los flujos de agua mediante canales artesanales plásticos para evitar que sigan saturando el talud de la excavación.
- **Inclusión de Muro de Contención:** Construcción de un muro de contención tipo cantiléver en concreto reforzado acelerado (Ítem 3.04) diseñado expresamente para mitigar los empujes hidráulicos y las sobrecargas de las estructuras superiores de los baños, biblioteca y cafetería.
- **Manejo Cimentación e inclusión de Filtros:** Incremento en los volúmenes de excavación manual, material de afirmado compactado y concreto ciclópeo para las bases del muro. Asimismo, para evitar socavaciones futuras por aguas subsuperficiales, se adicionan filtros perimetrales utilizando tubería de drenaje PVC de 4", material filtrante e instalación de geotextil NT 1600.

6. COMPROMISOS DE LAS PARTES Y APROBACIÓN

Una vez expuestos los soportes técnicos y jurídicos amparados bajo la normativa colombiana (Decreto 1082 de 2015 y Ley 80 de 1993), las autoridades manifiestan su total acuerdo y aprueba las consideraciones presentadas, bajo las siguientes condiciones y compromisos:

1. **Priorización de la Seguridad:** La comunidad respalda unánimemente la inclusión del muro de contención y el cambio de material del piso por considerarlo vital para proteger la integridad física de los niños y jóvenes de la institución.

2. **Celeridad en las Obras:** El contratista se compromete a dar celeridad a los trabajos de estabilización del talud en el costado noroccidental para normalizar el acceso a la zona de biblioteca y baños a la mayor brevedad.
3. **Mesa de Seguimiento:** Se mantendrá un canal de comunicación directo con la Alcaldía municipal y con el rector de la institución educativa para reportar el avance físico de los nuevos ítems de mitigación incorporados y otras solicitudes presentadas.

No siendo otro el objeto de la presente convocatoria, se da por finalizada la reunión de socialización, firmando de conformidad los representantes legales y miembros del comité comunitario delegados.

TIERRASUA ¡Conectamos región!	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CODIGO: M-GE-CV-F-001
	ACTA DE REUNIÓN	

LUGAR DE REUNIÓN	Institución educativa técnica Valle de Tenza.				
FECHA	06 - May - 2026	HORA DE INICIO	10:10 am	HORA FIN	

- Se realiza recorrido Para verificación del plan de acción y contingencia, de acuerdo al recorrido se hace la observación del seguimiento del acta de vencidad del colegio en los bloqueo de la biblioteca y los baños específicamente la zona de conexión, la supervisión solicitá al contratista de obra y la interventoria un informe detallado para determinar si se presenta afectaciones

- Se hace seguimiento a los compromisos del comite 006 que fueron los siguientes:

  * Inicio de ejecocion: Priorizar la fundición del muro contra el bloque afectado desde el día 21 de abril de 2026.
  Seguimiento: se encuentra en proceso de construcción, de acuerdo al plan de acción y contigencia ya se tomaron medidas de apuntalamiento con Fundida de ciclopeo. se encuentra en ejecución el plan de acción.

  * Paquete documental: Entrega de diseño estructural, arquitectonico, memorias de cálculo y estudio geótecnico y entre otros Para revisión y aprobación de la interventoria.
  Seguimiento: ya el contratista hizo envio del paquete documental, se encuentra en seguimiento y verificación de los especialistas de la interventoria.

  * Balance de cantidades: Presentacion del excel actualizado con el desgloce de Items aumentados y disminuidos para revisión y aprobación de la interventoria.

  Seguimiento: De acuerdo al plan de acción y contigencia, se está realizando el balance por Parte del contratista Para enviarlo ala interventoria Para su verificación y aprobación.

  * Actualización del Apu: Presentar el analisis de precios unitarios para revisión y aprobación de la interventoria.
  Seguimiento: De acuerdo al plan de acción y contigencia, se está realizando Por Parte del contratista para enviarlo a la interventoria para su verificación y aprobación.

TIERRASUA ¡Conectamos región!	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CODIGO: M-GE-CV-F-001
	ACTA DE REUNIÓN	

COMPROMISOS		
FECHA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
8 - Mayo - 2026.	Entregar la revisión de los paquetes documentales Entregar faltantes Balances y actualizacion APU Entregara el informe de seguimiento del Actividad	Interventoria. Contratista, Contratista/ interventoria.

DECISIONES / APROBACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta y se anexa lista de asistencia que en ella intervinieron.

ASISTENTES

NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Jhonatan Piña Rodriguez	Aux. Residente de obra	PSI Ingenieros S.A.S	
FREDDY S. RAMIREZ	Dir Proyecto	TierraSua SAS	
Danna Tatiana Jiménez	Residente de Interventoria	Consorcio Intervalle 2026	

TIERRASUA ¡Conectamos región!	FORMATO		VERSIÓN: 0	
	ACTA DE REUNIÓN		CODIGO: M-GE-CV-F-001	
LUGAR DE REUNIÓN	Instalaciones de Tierrasua.			
FECHA	19-May-2026	HORA DE INICIO	4:00 pm	HORA FIN	4:39 pm.

- Presentación de todos los presentes
- Se realiza la socialización de avances de obra con un retraso del 6%
- De acuerdo al comite en guateque, con la socialización del plan de acción y otros ajustes del plan para socializar con el rector
- Ajuste con la entidad u balance de mayores y menores, modificatorio para una actividad nueva, que se realizará.
- Se hace necesario el comité para hablar con el secretario de Planeación y la directiva del rector. para los nuevas modificaciones en piso de baldozin en granito y otros acabados.
- Revisar todos los items para hacer el balance de acuerdo a que a las cantidades a ejecutar.
- Comite dia Jueves 21 de mayo 9 am. en el colegio (institución Educativa técnica valle de tenza).
- Revisión Final despues de la visita del día 21 de mayo.

TIERRASUA ¡Conectamos región!	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: ATH-FO-25
	FORMATO LISTA DE ASISTENCIA	Versión: 00
	ÁREA DE TALENTO HUMANO	Fecha: 02-12-2024

TEMA: Seguimiento al plan de acción.

FECHA: 19 - May - 2026 HORA: 4:00 pm LUGAR: _____

RESPONSABLE: _____ PROCESO: _____

No	NOMBRE Y APELLIDO	N° DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Danna Tatiana Jiménez R.	1049634004	Ing. Res. Interven.	3219472043	danna8216@gmail.com	
2	Yilmar Medina Andrade	1057587774	Interventora	3142702357	yilmarmedina@hotmail.com	
3	John Ernesto Garcia V.	7160233	Gerente Técnico	3163334288	johngarcia@tierrasua.com	
4	Angie Paola Rios Moreno	1018490660	Coord de proyectos	3123622178	proyectos@tierrasua.com	
5	Luis Eduardo Sichaca G.	4049603584	PSI ingenieros	3138307264	psi.ingeniera1@gmail.com	
6	Freddy A. Ramirez G.	7171376	Tierrasua.	3124471932	freddyaryu@yahoo.es	
7	Julian E. Guerrero R.	7173877	SUPERVISOR	3118962136	tecnica@tierrasua.com	
8	Patricia Mora	40.044917	Apoyo Sup.	3132488009	tecnica@hiramsa.com	
9	Luis Carlos Molina S	7.173.470	Apoyo Sup	3162812059	lcarlosmolina77@gmail.com	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

INFORMES DE LABORATORIOS ENSAYOS DE OBRA

ANEXO No.7 ENSAYOS DE LABORATORIO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Carretera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia.
C.P - 150408 Tel/Fax: 7426350

N°: 10008131704743

CLIENTE	FACTURA	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
DISTRIBUIDORA FERREACEROS S.A.S	**9007775409/20**	**OC 2430**	**11154698/000020**	**NTC 2289**	**6.000**

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8'' 6m	1727417701	GR 60	0,29	0,93	0,012	0,030	0,24	0,27	0,08	0,11	0,02	0,002	0,001	0,47
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8'' 6m	1727419301	GR 60	0,27	0,90	0,014	0,026	0,18	0,30	0,11	0,13	0,02	0,003	0,002	0,45
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8'' 6m	1727419401	GR 60	0,27	0,94	0,016	0,029	0,20	0,29	0,12	0,16	0,02	0,002	0,001	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS — **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Separa	Ángulo
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8'' 6m	1727417701	3	474	619	1,31	16,4	0,550	OK	6,45	0,54	2,55	62
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8'' 6m	1727419301	3	469	609	1,30	17,1	0,546	OK	6,40	0,67	2,60	60
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8'' 6m	1727419401	3	476	613	1,29	16,5	0,538	OK	6,50	0,58	2,14	63
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,526 kg/m		máx 6,70 mm	mín 0,38 mm	máx 3,60 mm	mín 45,0 deg

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TUTA, 17.03.2026

PAOLA KATHERIN MATEUS

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

NTC 2289:2020 Barras corrugadas de acero de baja aleacion para refuerzo de concreto | Res. 2003:2022 Barras corrugadas de acero de baja aleacion para refuerzo de concreto | NTC 6574:2023 Acero figurado para refuerzo de concreto. | SC-2002486 | CO SC-2002486

No. 089770

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 26/03/2026

CLIENTE	**DISTRIBUIDORA FERREACEROS S.A.S.**	**DESTINO**	DUITAMA	**NORMA**	NTC 2289
		PLACA	XID 437	**GRADO**	420

PEDIDO No.	39772
REMISIÓN No.	39835
FACTURA No.	130096

						ENSAYOS FÍSICOS				ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.												RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																				
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 8	12	I25751	2	84	✔	492.2	651.8	13.5	1.32	0.28	1.03	0.0283	0.011	0.20	0.24	0.09	0.10	0.015	-	0.0020	0.47	3.844	1.600	16.660	70.3	3.750
R - No. 5	12	20260950	2	864	✔	471.3	615.8	16.2	1.31	0.27	1.10	0.0113	0.028	0.19	0.24	0.08	0.08	0.013	0.00028	0.0023	0.47	1.511	1.290	10.250	72.0	2.050
		20260137	6		✔	484.6	628.7	17.0	1.30	0.27	1.15	0.0132	0.025	0.21	0.22	0.07	0.09	0.012	0.00041	0.0017	0.48	1.506	1.190	10.300	71.8	1.610
R - No. 6	6	20260178	3	450	✔	488.1	646.5	14.8	1.32	0.27	1.12	0.0127	0.030	0.19	0.24	0.08	0.08	0.014	0.00024	0.0018	0.47	2.165	1.410	12.540	72.3	2.460
R - No. 5	6	20260195	2	432	✔	478.3	627.8	15.9	1.31	0.27	1.16	0.0149	0.030	0.21	0.25	0.08	0.12	0.013	0.00021	0.0019	0.48	1.506	1.070	10.320	72.1	1.600
R - No. 4	6	20260182	1	1008	✔	475.5	615.7	15.5	1.29	0.27	1.16	0.0151	0.033	0.17	0.20	0.09	0.09	0.012	0.00020	0.0017	0.48	0.974	0.920	8.460	68.8	1.810
		2815532031	2		✔	473.3	604.6	16.8	1.28	0.27	1.18	0.016	0.020	0.19	0.01	0.01	0.01	-	-	0.0030	0.47	0.972	0.940	8.460	68.8	1.690
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 8						(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(3.735 - 3.973)	Min: 1.27	Max: 17.8	Min: 45	Max: 9.7
R - No. 5						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(1.459 - 1.552)	Min: 0.71	Max: 11.1	Min: 45	Max: 6.1
R - No. 6						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.101 - 2.235)	Min: 0.97	Max: 13.3	Min: 45	Max: 7.3
R - No. 4						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(0.934 - 0.994)	Min: 0.51	Max: 8.9	Min: 45	Max: 4.9

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

Ing. Sandra Cabrera
DIRECTOR CONTROL CALIDAD

Enviado: ferreaceros.sas@gmail.com


Reporte de calidad

1/04/2026 — 30/04/2026 | Planta Sogamoso | Cemento Estructural Max

PARÁMETROS FÍSICOS

Blaine	Retenido 325	Fraguado inicial	Fraguado final
4534 cm2/g	1.3 %	108 min	175 min

Resistencia 1 día	Resistencia 3 días	Resistencia 7 días	Resistencia 28 días
20.8 MPa	32.5 MPa	37.9 MPa	(Blank) MPa

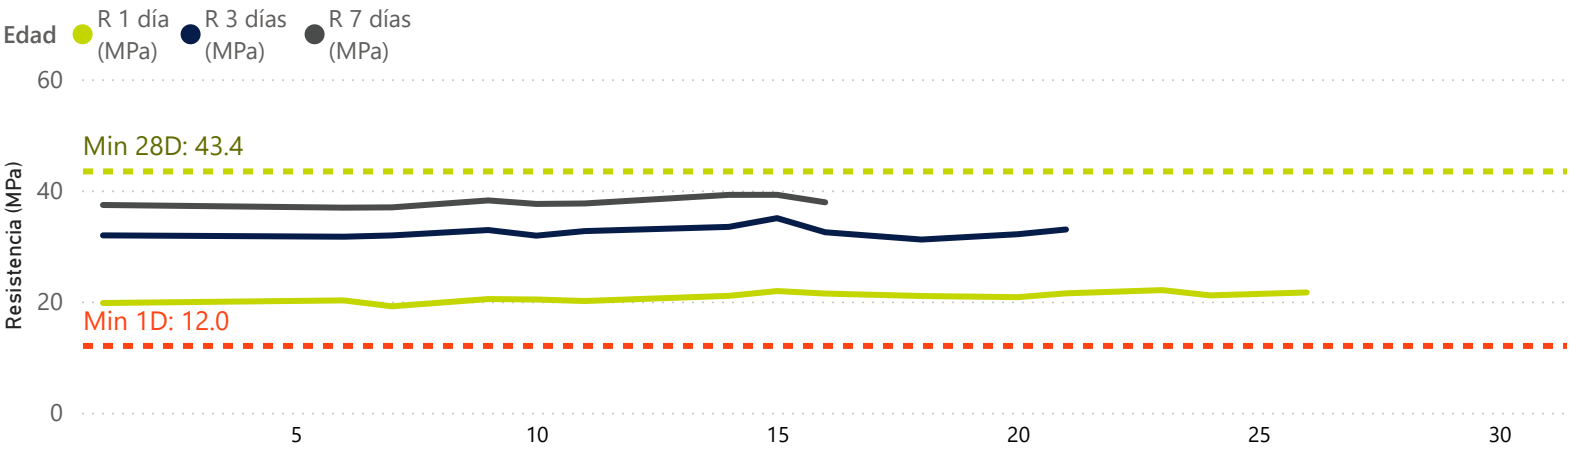

* Este cemento cumple con la especificación de la ficha técnica Argos para cemento Estructural Max.


* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.

OTROS PARÁMETROS FÍSICO

Densidad NTC 221	Contenido de Aire NTC 224	Expansión en autoclave NTC 107	Expansión barras de mortero NTC 4927
3,08 g/cm3	6,4 %	0,044 %	NO HAY INFORMACIÓN

PARÁMETROS QUÍMICOS

Fases minerológicas (Bogué)

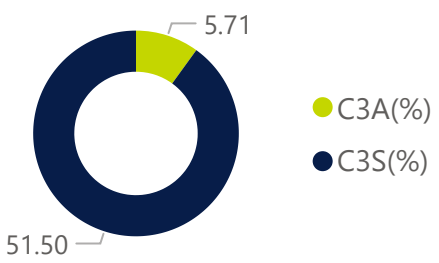

SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO
20.11 %	4.58 %	3.23 %	60.18 %

SO3	Perdidas por ignición	Equivalente alcalino
3.00 %	5.92 %	0.58 %

RESUMEN

Fecha	Blaine (cm2/g) NTC 33	Retenido 325 (%) NTC 294	FI (Min) NTC 118	FF (Min) NTC 118	R1 día (MPa) NTC 220	R3 días (MPa) NTC 220	R7 días (MPa) NTC 220	R28 días (MPa) NTC 220
1/04/2026	4458	1.4	122	190	19.7	31.9	37.4	
6/04/2026	4528	1.2	111	170	20.2	31.7	36.9	
7/04/2026	4478	1.5	111	170	19.1	31.9	36.9	
9/04/2026	4586	1.3	110	170	20.4	32.9	38.2	
10/04/2026	4362	1.1	110	170	20.4	31.8	37.6	
11/04/2026	4451	1.2	106	170	20.1	32.7	37.6	
14/04/2026	4411	1.4	101	170	21.0	33.4	39.2	
15/04/2026	4657	1.4	103	170	21.9	35.0	39.2	
16/04/2026	4448	1.3	103	170	21.4	32.5	37.8	
18/04/2026	4669	1.4	105	180	21.0	31.1		
20/04/2026	4565	1.3	105	180	20.8	32.1		
21/04/2026	4503	1.4	112	180	21.5	33.0		
23/04/2026	4648	1.4	106	180	22.0			
24/04/2026	4662	1.3	106	180	21.1			
26/04/2026	4590	1.4	104	170	21.6			

* Los resultados en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones de los materiales ensayados.


* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.

* Las especificaciones del Cemento Estructural Max cumplen con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo ART) y la Norma ASTM C1157 (Type HE).

INGEPUL PERFORACIONES

RESISTENCIA A LA COMPRESION CILINDROS DE CONCRETO NTC 673

Codigo cliente:	001 A-CT-RC 01
Fecha ingreso	25 DE MAYO DEL 2026
Cliente	PSI INGENIEROS S.A.S
NIT	900,928,8494
DIRECCIÓN	CALLE 20 NO. 13-14 OFI 216 B
OBRA	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CORREO ELECTRONICO	PSI.INGENIEROS1@GMAIL.COM




Datos de especímenes — **Resultados Módulo de rotura**

No	Cód LAB	Cód. cliente	Fecha Toma	Fecha Falla	Edad (dias)	Slump cm	Mr Diseño (PSI)	Elemento estructural	DIAMETRO cm	ALTURA Cm	Peso KG	Carga KN	Carga Kg	falla	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA psi	f'c (%)
1	6	063	23/04/2026	18/12/2025	32	NE	2500	CONCRETO CICLOPEO ZAPATAS EJE A Y B	10,7	20,3	4,172	226,5	23096	6	256,9	3669,3	146,80%
2	6	063	30/044/2026	28/05/2026	28	NE	3000	ZARPA ZAPATA EJE B-1	15,4	30	13,55	450,2	45887	5	292,2	3695,2	121,30%
3	6	063	2/05/2026	1/06/2026	30	NE	3000	ZARPA ZAPATA EJE A-5	10,6	20,2	4,208	193	19680	3	223	3185,9	106,20%
4	6	063	15/05/2026	29/05/2026	14	NE	3000	ZARPA ZAPATAS EJE B-2	15,2	30,5	12,35	406,1	41410	2	228,2	3260,1	108,70%
5	6	063	6/05/2026	1/06/2026	26	NE	3000	ZARPA ZAPATAS EJE A-1 A A-4	15,3	30,5	12,32	511,8	52188,2	5	280,2	4002,6	133,40%
6	6	063	2/05/2026	1/06/2026	30	NE	3000	ZARPA ZAPATAS EJE A-2 Y A-3	15,7	30,6	12,744	508,9	51892,5	2	260	3829,3	127,60%
7	6	063	6/05/2026	1/06/2026	26	NE	3000	ZARPA ZAPATAS EJE B-3 Y B-4	15,5	30,4	12,728	486	49557,4	5	266,1	3800,8	126,70%
8	6	063	6/05/2026	1/06/2026	26	NE	3000	ZARPA ZAPATAS EJE B-5	10,6	20,1	4,182	215,1	21934	2	247,6	3537,3	117,90%

RESISTENCIA A LA COMPRESION CILINDROS DE CONCRETO NTC 673

Codigo cliente:	001 A-CT-RC 01
Fecha ingreso	25 DE MAYO DEL 2026
Cliente	PSI INGENIEROS S.A.S
NIT	900,928,8494
DIRECCIÓN	CALLE 20 NO. 13-14 OFI 216 B
OBRA	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CORREO ELECTRONICO	PSI.INGENIEROS1@GMAIL.COM



REGISTRO FOTOGRAFICO



INGEPUL PERFORACIONES	PROYECTO	CLIENTE	
	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	PSI INGENIEROS S.A.S NIT: 900928849-4	
MUESTRA	MATERIAL GRANULAR - AFIRMADO	NORMA	
LOCALIZACION	GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	INVIAS	INV-E-123-13
CANTERA	TRITURADOS VALLE DE TENZA	AASTHO	M-145
FECHA DE ENSAYO	11/03/2026	ASTM	D-422

ANALISIS GRANULOMÉTRICO

ANTES DE LAVADO	
PESO PLATÓN (gr)	321,0
PESO PLATÓN + MUEST (gr)	5960
PESO MUESTRA (gr)	5639


DESPUÉS DE LAVADO	
PESO PLATÓN (gr)	321,0
PESO PLATÓN + MUESTRA (gr)	5123
PESO MUESTRA SECA (gr)	4802,0
PASA TAMIZ Nº 200 (%)	14,84

CORRECCIÓN	
PESO TOTAL MUESTRA (gr)	5639,00
∑ PESOS RETENIDOS (gr)	5639,00
ERROR (gr)	0,00
ERROR (%)	0,00

ANÁLISIS POR TAMIZADO

TAMIZ Nº	DIÁMETRO, mm	PESO RETENIDO, gr	PESO CORREGIDO, gr	%RETENIDO	%RETENIDO ACUMULADO	%PASA
2 1/2"	63,3	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2"	50,8	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1 1/2"	38,1	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1"	25,4	180,00	180,00	3,19	3,19	96,81
3/4"	19,0	241,00	241,00	4,27	7,47	92,53
1/2"	12,5	407,00	407,00	7,22	14,68	85,32
3/8"	9,51	418,00	418,00	7,41	22,10	77,90
4	4,76	1129,00	1129,00	20,02	42,12	57,88
5	4,00	323,00	323,00	5,73	47,85	52,15
8	2,36	535,00	535,00	9,49	57,33	42,67
10	2,00	107,00	107,00	1,90	59,23	40,77
16	1,18	310,00	310,00	5,50	64,73	35,27
30	0,60	307,00	307,00	5,44	70,17	29,83
40	0,425	229,00	229,00	4,06	74,23	25,77
50	0,300	359,00	359,00	6,37	80,60	19,40
100	0,150	209,00	209,00	3,71	84,31	15,69
200	0,074	46,00	46,00	0,82	85,12	14,88
FONDO		839,00	839,00	14,88	100,00	0,00
∑		**5639,00**	**5639,0**			

CURVA GRANULOMÉTRICA

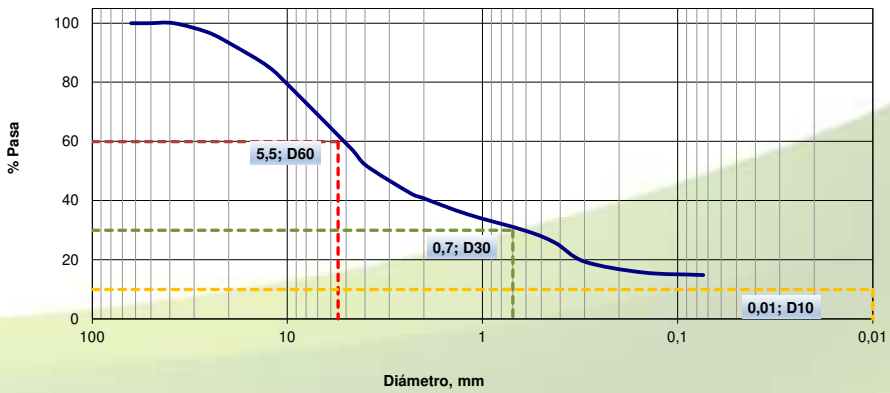

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO	
% Gravas	42,12
% Arenas	43,00
% Finos	14,84


PROPIEDADES CURVA	
D60	5,50
D30	0,70
D10	0,01
Cu	550,00
Cc	8,91

ING. JOEL DAVID PULIDO ROLON
M.P. 25202-254769

INGEPUL PERFORACIONES	PROYECTO	CLIENTE	
	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	PSI INGENIEROS S.A.S NIT: 900928849-4	
MUESTRA	MATERIAL GRANULAR - AFIRMADO	NORMA	
LOCALIZACION	GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	INVIAS	INV-E-123-13
CANTERA	TRITURADOS VALLE DE TENZA	AASTHO	M-145
FECHA DE ENSAYO	11/03/2026	ASTM	D-422

TAMIZ		PORCENTAJE QUE PASA		
		Franja Granulométrica		Resultado Ensayo
NORMAL	ALTERNO	A-1	A-2	
37.5 mm	1 1/2"	100	-	100,00
25.0 mm	1"	100	100	96,81
19.0 mm	3/4"	65 - 100	100	92,53
9.5 mm	3/8"	45 - 80	65 - 100	77,90
4.75 mm	No.4	30 - 65	50 - 85	57,88
2.0 mm	No.10	22 - 52	33 - 67	40,77
425 µm	No.40	15 - 35	20 - 45	25,77
75 µm	No.200	10 - 25	10 - 25	14,88

CURVA GRANULOMÉTRICA

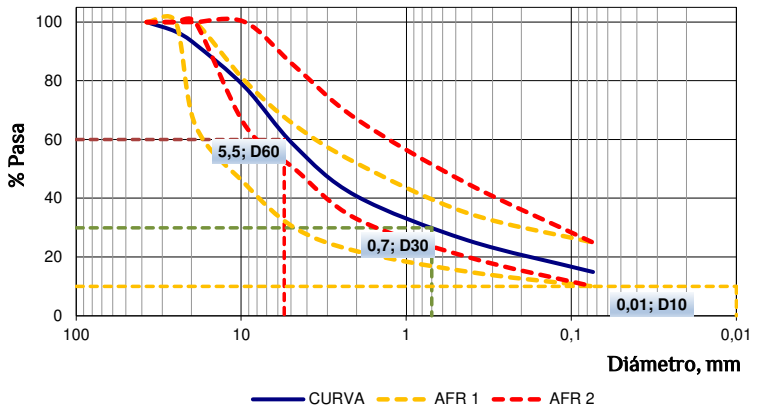

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO	
% Gravas	41,43
% Arenas	54,76
% Finos	3,81

PROPIEDADES CURVA	
D60	5,50
D30	0,70
D10	0,01
Cu	550,00
Cc	8,91

RELACION	REQUISITO	RESULTADO
$\frac{\%\text{ pasa tamiz No. 200}}{\%\text{ pasa tamiz No.10}}$	0,20 a 0,45	0,36
$\frac{\%\text{ pasa tamiz No. 200}}{\%\text{ pasa tamiz No. 40}}$	$\leq \frac{2}{3}$	0,58
{(% pasa tamiz de 1")-(% pasa tamiz No. 10)}×{% pasa tamiz No. 4}	16 a 34	32,44

ING. JOEL DAVID PULIDO ROLON
M.P. 25202-254769


INGEPUL PERFORACIONES	PROYECTO	CLIENTE
	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	PSI INGENIEROS S.A.S NIT: 900928849-4

MUESTRA	MATERIAL GRANULAR - AFIRMADO	NORMA	
LOCALIZACION	GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	INVIAS	INV-E-125-13
CANTERA	TRITURADOS VALLE DE TENZA	AASTHO	T-89
FECHA DE ENSAYO	11/03/2026	ASTM	D-438

GRANULOMETRIA

TAMIZ Nº	DIÁMETRO, mm	%PASA
2 1/2"	63,3	100,00
2"	50,8	100,00
1 1/2"	38,1	96,81
1"	25,4	85,32
3/4"	19	57,88
1/2"	12,5	42,67
3/8"	9,51	35,27
4	4,76	57,88
10	2	40,77
40	0,425	25,77
100	0,15	4,29
200	0,074	14,88
FONDO	0	0,00

CURVA GRANULOMÉTRICA

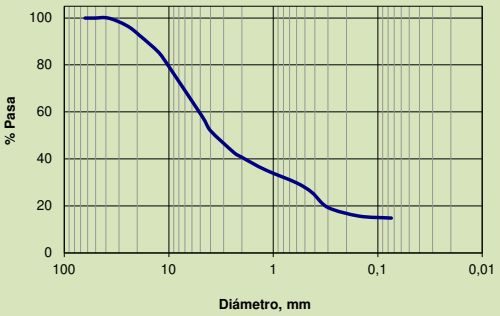

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO	
% Gravas	42,12
% Arenas	43,00
% Finos	14,84

PROPIEDADES CURVA	
D60	5,50
D30	0,70
D10	0,01
Cu	550,00
Cc	8,91

ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG

HUMEDAD

CAPSULA Nº	187
PESO CAPSULA (gr)	5,39
CAPSULA + MUESTRA HUMEDA (gr)	65,17
CAPSULA + MUESTRA SECA (gr)	61,17
HUMEDAD %	7,2

LAVADO TAMIZ 200

PLATON Nº	12
PESO PLATON (gr)	321
PLATON + MUESTRA SIN LAVAR (gr)	5639
PLATON + MUESTRA LAVADA (gr)	4802
PASA TAMIZ Nº200	14,84%

LIMITE LIQUIDO

PUNTO 1	
CAPSULA Nº	NL
PESO CAPSULA (gr)	NL
CAPSULA + MUESTRA HUMEDA (gr)	NL
CAPSULA + MUESTRA SECA (gr)	NL
HUMEDAD	-
PUNTO 2	
CAPSULA Nº	NL
PESO CAPSULA (gr)	NL
CAPSULA + MUESTRA HUMEDA (gr)	NL
CAPSULA + MUESTRA SECA (gr)	NL
HUMEDAD	-
PUNTO 3	
CAPSULA Nº	NL
PESO CAPSULA (gr)	NL
CAPSULA + MUESTRA HUMEDA (gr)	NL
CAPSULA + MUESTRA SECA (gr)	NL
HUMEDAD	-

LIMITE PLASTICO

PUNTO 1	
CAPSULA Nº	NP
PESO CAPSULA (gr)	NP
CAPSULA + MUESTRA HUMEDA (gr)	NP
CAPSULA + MUESTRA SECA (gr)	NP
HUMEDAD	-
PUNTO 2	
CAPSULA Nº	NP
PESO CAPSULA (gr)	NP
CAPSULA + MUESTRA HUMEDA (gr)	NP
CAPSULA + MUESTRA SECA (gr)	NP
HUMEDAD	-

CLASIFICACION

UNIFICADA DE SUELOS SUCS	SM
AASHTO	A-1 (0)

NUMERO DE GOLPES	
PUNTO 1	NL
PUNTO 2	NL
PUNTO 3	NL

VALORES DE PLASTICIDAD	
LIMITE LIQUIDO	NL
LIMITE PLASTICO	NP
INDICE DE PLASTICIDAD	NIP

Limpieza (F)				
Límite líquido, máximo (%)	E-125	25	25	25
Índice de plasticidad, máximo (%)	E-125 y E-126	6	6	6
Equivalente de arena, mínimo (%)	E-133	25	25	25
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables, máximo (%)	E-211	2	2	2
Resistencia del material (F)				
CBR (%): porcentaje asociado al valor mínimo especificado de la densidad seca, medido en una muestra sometida a cuatro días de inmersión, mínimo.	E-148	30	30	40

		REQUISITO	RESULTADO
INDICE DE PLASTICIDAD (%)	NIP	MAX 6%	CUMPLE
LIMITE LIQUIDO (%)	NL	MAX 25%	CUMPLE

ING. JOEL DAVID PULIDO ROLON
M.P. 25202-254769

INGEPUL PERFORACIONES

PROYECTO	CLIENTE
MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	PSI INGENIEROS S.A.S NIT: 900928849-4

MUESTRA	MATERIAL GRANULAR - AFIRMADO	NORMA	
LOCALIZACION	GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	INVIAS	INV-E-142-13
CANTERA	**TRITURADOS VALLE DE TENZA**	AASTHO	T-180
FECHA DE ENSAYO	11/03/2026	ASTM	D-1557

ENSAYO DE COMPACTACIÓN


PRUEBA		**1**	**2**	**3**	
No. GOLPES	%	55	55	55	
HUMEDAD INICIAL	%	3	3	3	
HUMEDAD DESEADA	%	6	9	12	
HUMEDAD ADICIONAL	%	3	6	9	
PESO SUELO HUMEDO	Gr	5500	5500	5500	
PESO SUELO SECO	Gr	5339,81	5339,81	5339,81	
VOL. AGUA ADICIONAL	mlt	160,19	320,39	480,58	
MOLDE No.		1	2	3	
PESO MOLDE + MUESTRA COMPACTADA	Gr	7241	7732	7202	
PESO DEL MOLDE	Gr	2456	2456	2456	
PESO MUESTRA COMPACTADA	Gr	4785	5276	4746	
VOLUMEN DEL MOLDE	Cm^3	2208	2208	2208	
DENSIDAD HUMEDA	Gr/cm^3	2,17	2,39	2,15	
HUMEDAD CON HUMEDOMETRO	%	10,88	11,99	15,36	
DENSIDAD SECA	Gr/cm^3	1,95	2,13	1,86	

CONTENIDO DE HUMEDAD

Nº DE CAPSULA		20	22	1	
PESO DE CAPSULA	Gr	7,99	7,93	7,9	
PESO DE CAPSULA + MUESTRA HUMEDA	Gr	68,23	54,46	63,03	
PESO DE CAPSULA + MUESTRA SECA	Gr	62,32	49,48	55,69	
HUMEDAD	%	10,88	11,99	15,36	

DATOS DE COMPACTACION OPTIMA	
HUMEDAD OPTIMA	**13**
DENSIDAD SECA MAXIMA (Gr/cm^3)	**2,180**
DENSIDAD SECA MAXIMA (lb/pie^3)	**136,1**

CURVA PROCTOR

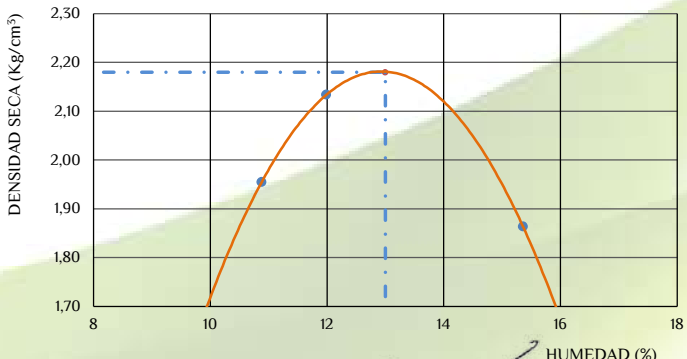

ING. JOEL DAVID PULIDO ROLON
M.P. 25202-254769

INGEPUL PERFORACIONES	PROYECTO	CLIENTE	
	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	PSI INGENIEROS S.A.S NIT: 900928849-4	
LOCALIZACION	GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
		NORMA	INV E 148 - 13
CANTERA	**TRITURADOS VALLE DE TENZA**	AASTHO	
FECHA	11/03/2026	ASTM	

DATOS PROCTOR	
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)	13,00
DENSIDAD MAXIMA SECA (Gr/cm3)	2,180
NUMERO DE CAPAS	5

CARACTERÍSTICA	NORMA DE ENSAYO INV	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	CLASE B	CLASE A
Dureza (D)				
Desgaste en la máquina de los Ángeles (Gradación A), máximo (%) - 500 revoluciones (%)	E-218	50	50	50
Degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval, máximo (%)	E-238	-	35	30
Durabilidad (D)				
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%) - Sulfato de sodio - Sulfato de magnesio	E-220	12 18	12 18	12 18
Limpieza (F)				
Límite líquido, máximo (%)	E-125	25	25	25
Índice de plasticidad, máximo (%)	E-125 y E-126	6	6	6
Equivalente de arena, mínimo (%)	E-133	25	25	25
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables, máximo (%)	E-211	2	2	2
Resistencia del material (F)				
CBR (%): porcentaje asociado al valor mínimo especificado de la densidad seca, medido en una muestra sometida a cuatro días de inmersión, mínimo.	E-148	30	30	40


MOLDE N°	1	2	3
N° DE CAPAS	5	5	5
N° DE GOLPES POR CAPA	56	26	12
CONDICION DE LA MUESTRA	N.A.	N.A.	N.A.
PESO MOLDE + SUELO HUMEDO (g)	9652,0	9586,0	9508,0
PESO DE MOLDE (g)	3528,0	3658,0	3725,0
PESO SUELO HUMEDO (g)	6124,0	5928,0	5783,0
VOLUMEN DEL SUELO (g)	2650,0	2650,0	2650,0
DENSIDAD HUMEDA (g)	2,311	2,237	2,182
CAPSULA (g)	12,0	47,0	86,0
PESO DE CAPSULA	4,12	5,83	7,18
PESO DE CAPSULA + MUESTRA HUMEDA	48,59	57,12	52,28
PESO DE CAPSULA + MUESTRA SECA	46,12	54,17	49,68
HUMEDAD	5,88	6,10	6,12
DENSIDAD SECA (g)	**2,18**	**2,11**	**2,06**

DETERMINACION DE CBR			
ENERGIA	56	26	12
CBR NATURAL	69,2%	39,8%	28,4%
CBR SUMERGIDO	59,3%	35,7%	24,3%
DENSIDAD SECA (g)	2,18	2,11	2,06

CURVA PROCTOR



CURVA CBR

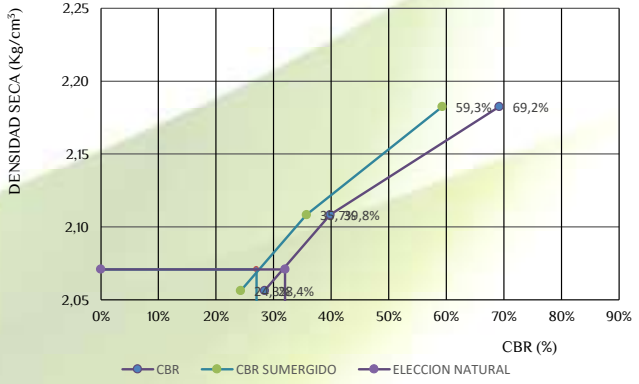

	SUMERGIDO	NATURAL
CBR	**27,0%**	**32,0%**

ING. JOEL DAVID PULIDO ROLON
M.P. 25202-254769

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

INFORMES DE LABORATORIOS ENSAYOS DE INTERVENTORIA

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA
SUELOS Y CONCRETOS
SICLAB INGENIERIA S.A.S
NIT: 901.994.116-9

Calle 10 # 9 - 18
Barrio Enrique Olaya Herrera
Guateque-Boyaca
TEL 321 214 4951

ENSAYOS DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V.E - 410 -13

ENSAYO NUMERO: 2021-004
SOLICITANTE: CONSORCIO INTERVALLE 2026
DIRECCION TUNJA - BOYACA
NIT/ C.C. 902.027.238-5
TELEFONO: 3132509283
OBRA Y/O N° DE CONTRATO: MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

FECHA DE FUNDIDO 23/04/2026
FECHA DE ROTURA 9/05/2026
EDAD (DIAS) 16
F'C (Mpa): **17.5** **F'C (psi):** **2500**
ASENTAMIENTO Sin reporte
FECHA DEL INFORME: 9 de mayo de 2026

FINALIDAD Determinar la calidad del concreto de obra
NORMA DE ENSAYO I.N.V.E - 410 -13
MAQUINA ENSAYO Maquina de ensayo a compresion IT-2001-Modelo 2020 Automatica
CERT DE CALIBRACIO F-0585

Nª CILINDROS FALLADOS 1
REMISION N° 041-26

ID LABORATORIO	ID OBRA	ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	PESO	ALTURA (H)	DIAMETRO (D)	L/D	FACTOR DE CORRECCION	AREA	EDAD DEL CILINDRO	CARGA	RESISTENCIA A LA COMPRESION		% F'c	TIPO DE FALLA DEL CILINDRO
				kgf	mm	mm			mm2		KN	MPa	psi	%	
1292	X	CICLOPEO	ZAPATAS	No reportado	200	100	2.00	1	7,854	16	235.7	**30.00**	**4350.8**	**171.5%**	T5

TIPO DE FALLA



FOTOGRAFIA PREFALLA, CILINDRO 1



FOTOGRAFIA RESULTADO, CILINDRO 1



FOTOGRAFIA POSFALLA, CILINDRO 1



NOTA: LOS CILINDROS FUERON TOMADOS POR EL SOLICITANTE Y ENTREGADOS EN EL LABORATORIO PARA SU POSTERIOR FALLA INDICANDO FECHA DE FUNDIDA

OBSERVACIONES: Los resultados mostrados en este informe corresponden únicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s)

DEFECTOS CILINDRO; No se aprecian defectos

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE
CESAR ANDRES GOMEZ C.
M.P. 15202-283196BYC

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA
SUELOS Y CONCRETOS
SICLAB INGENIERIA S.A.S
NIT: 901.994.116-9

Calle 10 # 9 - 18
Barrio Enrique Olaya Herrera
Guateque-Boyaca
TEL 321 214 4951

ENSAYOS DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V.E - 410 -13

ENSAYO NUMERO: 2021-004
SOLICITANTE: CONSORCIO INTERVALLE 2026
DIRECCION TUNJA - BOYACA
NIT/ C.C. 902.027.238-5
TELEFONO: 3132509283
OBRA Y/O N° DE CONTRATO: MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.


FECHA DE FUNDIDO 29/04/2026
FECHA DE ROTURA 9/05/2026
EDAD (DIAS) 10
F'C (Mpa): **21.0** **F'C (psi):** **3000**
ASENTAMIENTO Sin reporte
FECHA DEL INFORME: 9 de mayo de 2026

FINALIDAD Determinar la calidad del concreto de obra
NORMA DE ENSAYO I.N.V.E - 410 -13
MAQUINA ENSAYO Maquina de ensayo a compresion IT-2001-Modelo 2020 Automatica
CERT DE CALIBRACIO F-0585

Nª CILINDROS FALLADOS 1
REMISION N° 041-26

ID LABORATORIO	ID OBRA	ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	PESO	ALTURA (H)	DIAMETRO (D)	L/D	FACTOR DE CORRECCION	AREA	EDAD DEL CILINDRO	CARGA	RESISTENCIA A LA COMPRESION		% F'c	TIPO DE FALLA DEL CILINDRO
				kgf	mm	mm			mm2		KN	MPa	psi	%	
1293	X	ZAPATAS A1 -A2	ZAPATAS A1 -A2	No reportado	201	100	2.01	1	7,854	10	231.3	**29.44**	**4269.6**	**140.2%**	T4

TIPO DE FALLA



FOTOGRAFIA PREFALLA, CILINDRO 1



FOTOGRAFIA RESULTADO, CILINDRO 1



FOTOGRAFIA POSFALLA, CILINDRO 1



NOTA: LOS CILINDROS FUERON TOMADOS POR EL SOLICITANTE Y ENTREGADOS EN EL LABORATORIO PARA SU POSTERIOR FALLA INDICANDO FECHA DE FUNDIDA

OBSERVACIONES: Los resultados mostrados en este informe corresponden únicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s)

DEFECTOS CILINDRO; No se aprecian defectos

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE
CESAR ANDRES GOMEZ C.
M.P. 15202-283196BYC

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDO POR LA INTERVENTORIA

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

Guateque, 03 de junio de 2026

INT-053-OF-034

Señor:
LUIS EDUARDO SICHACA GÁMEZ
R/L PSI INGENIEROS S.A.S
Contratista

REF: Certificado de cumplimiento de afiliación del personal mínimo y de obra.

Objeto del contrato: *"MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".*

Cordial saludo,

Nos permitimos informar que de acuerdo al contrato de obra N° IPVO 030-2025, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales vigentes, me permito informar que, tras realizar la revisión documental correspondiente al periodo comprendido entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026 se ha verificado lo siguiente:

- Afiliación: El personal reportado en el listado de personal mínimo se encuentra debidamente afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales - ARL).
- Pagos: Se constató el pago de los aportes mediante las Planillas Integradas de Liquidación de Aportes (PILA) presentadas por el Contratista.
- Consistencia: El número de trabajadores activos profesionales coincide plenamente con los registros de pago aportados, cumpliendo con la normativa legal vigente y los requerimientos contractuales Se reporta un trabajador con certificado de afiliación de EPS y riesgos laborales.

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

NOMBRE	C.C	CARGO	NUMERO DE PLANILLA
EMETERIO VARGAS ESPINOZA	72.324.884	Maestro de obra	1750928292
PABLO EDILSON SALAMANCA M.	72.326.961	Ayudante	1750928292
JOSE ARMANDO MORALES	1,052,790,067	Ayudante	1750928292
CARLOS GREGORIO PEREZ	6,424,123	Ayudante	1750928292
EDWARD MAURICIO GOMEZ LEGUIZAMO	1,023,036,108	Ayudante	1750928292
MARIO BARRERA CASTILLO	4.130.793	Maestro de obra	Se presenta certificado de afiliación ya que es personal nuevo de obra
LUIS ABELARDO PINTO RAMOS	1,049,797,274	Ayudante	1750928292
LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ	1.049.603.584	Director de obra/ Especialista en estructuras	9505559227
EDWIN CAMILO SICHACA CUERVO	1.049.602.110	Residente de obra	9503669183
CAMILO ANDRES LANCHEROS COY	1.053.330.598	Ingeniero eléctrico	9505448727
OSCAR FABIAN PACHECO MERCHA	1.049.606.085	Ingeniero en hidráulica	9505448727
IVAN DARIO SICHACA GAMEZ	1.049.644.688	Especialista en geotecnia	9505559227
EMILIO BLADIMIR PANQUEVA ALVAREZ	7.318.490	Profesional HSEQ	9505559227

Por lo anterior, se emite CONCEPTO FAVORABLE y aprobación al cumplimiento de las obligaciones de seguridad social del personal profesional para el periodo mencionado. Este documento sirve como soporte para el trámite de aceptación por parte de la interventoría.



YILMAR MEDINA ANDRADE
R/L Consorcio Intervalle 2026
Consorciointervalle2026@outlook.com

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS VIGENTES SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE. (SEÑALIZACIÓN DE OBRA, VERTIMIENTOS, MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA, ETC.)

INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO MENSUAL NÚMERO 3
COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME DE OBRA CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2026

PSI INGENIEROS S.A.S
MUNICIPIO DE GUATEQUE
2026.

INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO MENSUAL NÚMERO 3
COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2026

PRESENTADO POR: LUIS EDUARDO SICHACÁ GAMEZ
R/L PSI INGENIEROS S.A.S

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO

PSI INGENIEROS S.A.S
MUNICIPIO DE GUATEQUE
2026.

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS**
V 1.0	28/05/26	Emisión inicial PSI INGENIEROS S.A.S. para revisión y comentarios de la interventoría CONSORCIO INTERVALLE 2026 y la supervisión TIERRASUA S.A.S.

ELABORACIÓN PSI INGENIEROS S.A.S	**REVISIÓN** CONSORCIO INTERVALLE 2026 S.A.S	**APROBACIÓN** TIERRASUA S.A.S
ING. EMILIO BLADIMIR PANQUEVA **PROFESIONAL HSEQ CONTRATISTA** PSI INGENIEROS S.A.S	ING. JORGE ARMANDO CALDERÓN SANCHEZ **REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA** CONSORCIO INTERVALLE 2026	ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO **SUPERVISOR CONTRATANTE** TIERRASUA S.A.S.

ÍNDICE CONTENIDO

1. Resumen general del contrato 5
2. Componente de seguridad y salud en el trabajo 6
3. Descripción del proyecto 7
4. Personal en obra 8
5. Actividades programadas 9
6. Conclusiones 14
7. Lista de anexos 15

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación específica del proyecto 7
Ilustración 2. Actividades programadas para el mes 9
Ilustración 3. Inducciones de personal 10
Ilustración 4. Señalización y demarcación en obra 12
Ilustración 5. Elementos de atención a emergencias 12
Ilustración 6. Capacitaciones de seguridad 13

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Resumen general contrato de obra 5
Tabla 2: Profesionales 8
Tabla 3. Personal subcontratado 8
Tabla 4. Planillas SS 9
Tabla 5. Capacitaciones de seguridad 13

1. RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

Este capítulo presentará de manera organizada el conjunto de actos administrativos desarrollados en el marco de la ejecución contractual, abarcando desde su inicio hasta el estado actual. Se incluirán, entre otros, los registros correspondientes a suspensiones, prórrogas y adiciones presupuestales. A continuación, se expone la información consolidada para su respectivo control.

Tabla 1: Resumen general contrato de obra

INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA IPVO-030-2025	
PROCESO DE CONTRATACION:	LICITACIÓN PÚBLICA
NUMERO DE CONTRATO:	No. IPVO-030-2025
CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S
CONTRATISTA:	PSI INGENIERIOS S.A.S NIT. 900.928.849-4 R/L LUIS EDUARDO SICHACÁ GAMEZ C.C. 1.049.603.584 DE TUNJA
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
VALOR INICIAL:	DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MONEDA LEGAL (2.411.687.093,33).
PLAZO INICIAL:	A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA DE INICIO:	24 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fuente: Elaboración propia

2. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El presente componente de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como finalidad presentar las actividades implementadas por PSI INGENIEROS S.A.S., en calidad de contratista ejecutor, durante el mes de mayo de 2026, en el marco del Contrato No. IPVO-030-2025, cuyo objeto corresponde al "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

En este sentido, el presente informe evidencia el seguimiento y cumplimiento de las actividades contempladas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, orientadas a la prevención de riesgos laborales derivados de las actividades constructivas desarrolladas durante el periodo evaluado. Lo anterior incluye acciones relacionadas con afiliaciones y pago de aportes al sistema de seguridad social, realización de exámenes médico ocupacionales, inducciones, suministro y reposición de elementos de protección personal, señalización y demarcación de áreas, inspecciones preoperacionales, capacitaciones y mantenimiento de condiciones adecuadas de orden, aseo y atención de emergencias.

De igual manera, se presentan las medidas implementadas para fortalecer las condiciones de seguridad en los diferentes frentes de trabajo, especialmente en actividades asociadas a excavaciones, fundiciones, instalación de acero de refuerzo y ejecución de medidas de contingencia derivadas de la pérdida de soporte del material de cimentación en sectores de la institución educativa. Estas acciones permitieron dar continuidad al desarrollo del proyecto bajo condiciones controladas, promoviendo la prevención de incidentes y la protección de la integridad física y salud de los trabajadores.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se llevará a cabo en la Sede Campestre de la Institución Educativa Técnica Valle de Tenza, ubicada en el municipio de Guateque, Boyacá. La zona de intervención se caracteriza por una topografía inclinada y se encuentra al noreste del casco urbano, a la salida que conecta con el municipio de Sutatenza. El acceso al plantel educativo está en mal estado, con pavimento flexible deteriorado y sin un sistema adecuado de drenaje superficial. La intervención consistirá en la construcción de una nueva cubierta en el terreno actual de la institución, con el objetivo de mejorar el escenario deportivo y garantizar condiciones óptimas para la realización de actividades escolares y recreativas. Esta obra no solo mejorará las instalaciones para los estudiantes, sino que también beneficiará a la comunidad de Guateque y a los turistas, ofreciendo un espacio saludable y adecuado para el deporte y la recreación.


Región: Andina **Suelo:** Urbano **Altitud:** 1815 M S. N. M

Zona: Urbana **Topografía:** Inclinada **Clima:** Cálido-Templado

Coordenadas: 5°00′21″N 73°28′23″O

Las siguientes ilustraciones muestran la localización aproximada del proyecto.

Ilustración 1. Ubicación específica del proyecto

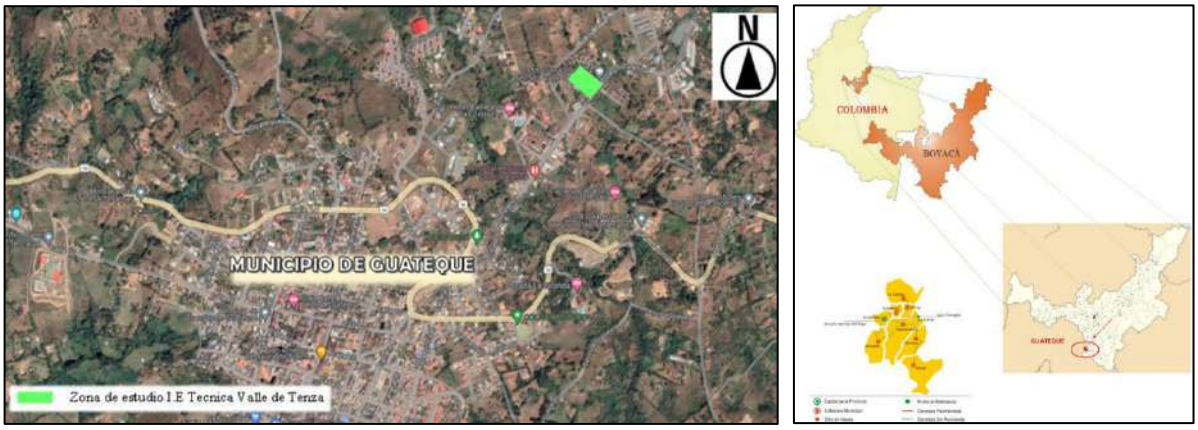

Fuente: El proyecto

4. PERSONAL EN OBRA

El presente capítulo tiene como objetivo presentar de manera estructurada el personal involucrado en la ejecución del contrato, incluyendo tanto el equipo profesional como el personal operativo (subcontratado).

a. Profesionales: El presente apartado describe al personal profesional vinculado al contrato, de acuerdo con lo estipulado en el anexo técnico.

Tabla 2: Profesionales

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEDICACIÓN
Luis Eduardo Sichacá Gámez	1.049.603.584	Director de obra	50%
		Especialista en estructuras	30%
Edwin Camilo Sichacá Cuervo	1.049.602.110	Residente de obra	100%
Narem Stip Piña Rodríguez	1.049.648.394	Auxiliar residente de obra	100%
Camilo Andrés Lancheros Coy	1,053.330.598	Ingeniero eléctrico	10%
Oscar Fabian Pacheco Merchán	1.049.606.085	Ingeniero hidráulico	10%
Emilio Bladimir Panqueva Álvarez	7.318.490	Profesional HSEQ	50%
Iván Darío Sichacá Gámez	1.049.644.688	Especialista en geotecnia	10%
Rodrigo Albeiro Mendivelso Cely	7.181.346	Profesional ambiental	50%

Fuente: Elaboración Propia

b. Personal operativo: A continuación, se presenta al personal operativo subcontratado, encargado de la ejecución directa de los procesos constructivos.

Tabla 3. Personal subcontratado


NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	INGRESO	EGRESO
Emeterio Vargas Espinosa	72.324.884	Maestro de obra	09/03/26	-
Pablo Edilson Salamanca Mendoza	72.326.961	Oficial de obra	09/03/26	-
Jaime Fonseca	4.287.474	Ayudante de obra	16/04/26	30/04/26
Luis Abelardo Pinto Ramos	1.049.797.274	Ayudante de obra	21/04/26	-
Carlos Gregorio Pérez	6.424.123	Ayudante de obra	21/04/26	-
José Armando Morales Montenegro	1.052.790.067	Ayudante de obra	22/04/26	-
Edward Mauricio Gómez Leguizamón	1.023.036.108	Ayudante de obra	28/04/26	-
Mario Barrera Castillo	4.130.793	Ayudante de obra	23/05/26	-

Fuente: Elaboración Propia

5. ACTIVIDADES PROGRAMADAS

A continuación, se presentan las acciones programadas para el presente mes, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) aprobado para la ejecución del contrato. La información refleja las medidas preventivas, seguimientos y controles previstos, orientados a garantizar condiciones seguras y saludables para el personal durante la obra.

Ilustración 2. Actividades programadas para el mes

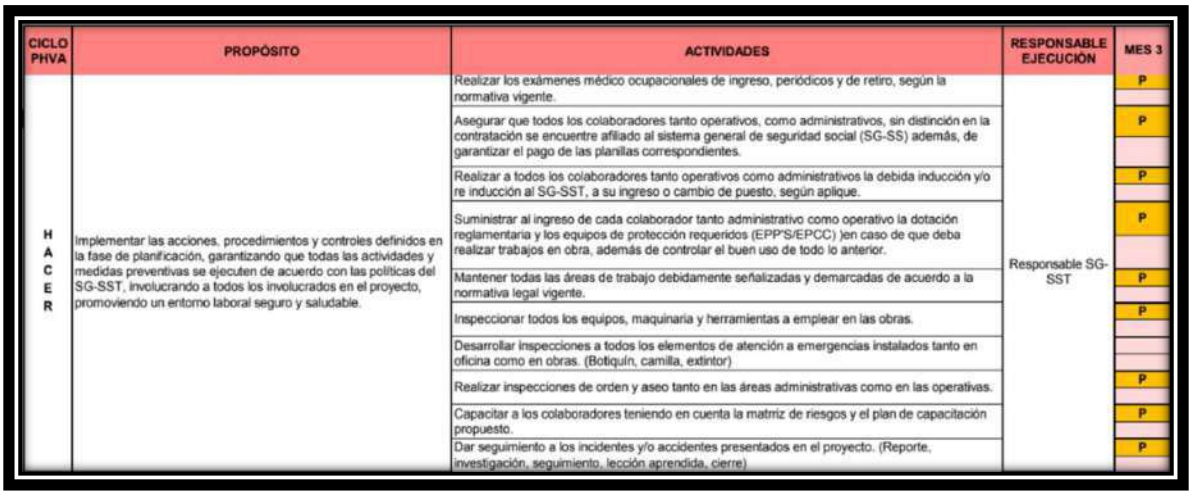

CICLO PHVA	PROPÓSITO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE EJECUCIÓN	MES 3
H A C E R	Implementar las acciones, procedimientos y controles definidos en la fase de planificación, garantizando que todas las actividades y medidas preventivas se ejecuten de acuerdo con las políticas del SG-SST, involucrando a todos los involucrados en el proyecto, promoviendo un entorno laboral seguro y saludable.	Realizar los exámenes médico ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro, según la normativa vigente.	Responsable SG-SST	P
		Asegurar que todos los colaboradores tanto operativos, como administrativos, sin distinción en la contratación se encuentre afiliado al sistema general de seguridad social (SG-SS) además, de garantizar el pago de las planillas correspondientes.		P
		Realizar a todos los colaboradores tanto operativos como administrativos la debida inducción y/o re inducción al SG-SST, a su ingreso o cambio de puesto, según aplique.		P
		Suministrar al ingreso de cada colaborador tanto administrativo como operativo la dotación reglamentaria y los equipos de protección requeridos (EPP'S/EPCC))en caso de que deba realizar trabajos en obra, además de controlar el buen uso de todo lo anterior.		P
		Mantener todas las áreas de trabajo debidamente señalizadas y demarcadas de acuerdo a la normativa legal vigente.		P
		Inspeccionar todos los equipos, maquinaria y herramientas a emplear en las obras.		P
		Desarrollar inspecciones a todos los elementos de atención a emergencias instalados tanto en oficina como en obras. (Botiquín, camilla, extintor)		
		Realizar inspecciones de orden y aseo tanto en las áreas administrativas como en las operativas.		P
		Capacitar a los colaboradores teniendo en cuenta la matriz de riesgos y el plan de capacitación propuesto.		P
		Dar seguimiento a los incidentes y/o accidentes presentados en el proyecto. (Reporte, investigación, seguimiento, lección aprendida, cierre)		P

Fuente: El proyecto

1. Pago de planillas y afiliación de personal

Durante el mes de mayo de 2026, PSI INGENIEROS S.A.S. realizó seguimiento al cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado al proyecto, garantizando que los trabajadores contaran con cobertura activa en salud, pensión y riesgos laborales conforme a la normatividad vigente. Estas verificaciones se efectuaron tanto para el personal directo como para el contratado a través de subcontrato, asegurando el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de las actividades constructivas. Teniendo en cuenta que el pago de las planillas se realiza mes vencido, para el presente informe se adjuntan los soportes de pago correspondientes al mes de abril de 2026, así como los soportes de afiliación del personal vinculado al proyecto. El registro correspondiente se adjunta mediante el ANEXO N°4.1.1.

Tabla 4. Planillas SS

PLANILLA	PERIODO	AÑO
9505559227	Abril	2026
1750928292	Abril	2026
9503669183	Abril	2026
9505448727	Abril	2026
86737090	Abril	2026
9505550041	Abril	2026

Fuente: El proyecto

2. Exámenes médico ocupacionales

En cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante el periodo evaluado se realizó un examen médico ocupacional de ingreso y un examen médico ocupacional de retiro al personal vinculado al proyecto. Estas actividades permitieron verificar las condiciones de salud y aptitud laboral de los trabajadores frente a las funciones desempeñadas en obra, especialmente en actividades asociadas a excavaciones, manipulación de materiales, instalación de acero y demás labores propias del proyecto. Lo anterior permitió dar cumplimiento a los requerimientos normativos aplicables y fortalecer el seguimiento a las condiciones de salud del personal durante su permanencia en obra. Los soportes correspondientes se adjuntan mediante el ANEXO N°4.1.2.

3. Accidentes en obra

Durante el mes de mayo de 2026 no se registraron accidentes de trabajo en el desarrollo de las actividades constructivas del proyecto. Este resultado evidencia la continuidad en la implementación de medidas preventivas, controles de seguridad y seguimiento permanente a las condiciones de trabajo en los diferentes frentes de obra. Así mismo, refleja el compromiso del personal con el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, especialmente frente a actividades asociadas a excavaciones, fundidas, manipulación de acero y ejecución de medidas de contingencia en las zonas intervenidas.

4. Inducciones

Durante el mes de mayo de 2026 se realizó la respectiva inducción al personal que ingresó al proyecto, abordando aspectos relacionados con las condiciones generales de la obra, funciones del cargo, riesgos asociados a las actividades a ejecutar y medidas preventivas establecidas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo, se socializaron lineamientos orientados al uso adecuado de elementos de protección personal, señalización, orden y aseo, y procedimientos de actuación frente a situaciones de emergencia. Estas actividades permitieron fortalecer el conocimiento del trabajador frente a los controles implementados en obra y promover el desarrollo seguro de las labores. El registro correspondiente se adjunta mediante el ANEXO N°4.1.3.

Ilustración 3. Inducciones de personal



Fuente: El proyecto

5. Suministro, reposición de EPP's

En el desarrollo de las actividades correspondientes al periodo evaluado, se realizó la entrega de elementos de protección personal al trabajador que ingresó al proyecto, de acuerdo con los riesgos

identificados para las labores a ejecutar en obra. Así mismo, se efectuó la reposición de aquellos elementos que presentaban desgaste o deterioro producto del uso continuo en actividades como excavaciones, instalación de acero, fundiciones y manejo de materiales. Estas acciones permitieron garantizar condiciones adecuadas de protección para el personal y promover el uso permanente y correcto de los EPP durante la ejecución de las labores. El registro correspondiente se adjunta mediante el ANEXO N°4.1.4.

Ilustración 4. Entrega y reposición de epp's



Fuente: El proyecto

6. Preoperacionales de herramientas, equipos y maquinaria

En el marco de las actividades ejecutadas durante el mes de mayo de 2026, se realizaron las inspecciones preoperacionales a las herramientas, equipos y maquinaria utilizadas en obra, de acuerdo con su frecuencia de uso y las labores desarrolladas en los diferentes frentes de trabajo. Estas verificaciones permitieron identificar oportunamente condiciones inseguras, fallas mecánicas o posibles riesgos asociados a la operación de los equipos antes del inicio de las actividades, contribuyendo a la prevención de incidentes y garantizando condiciones adecuadas para el desarrollo seguro de las labores constructivas. El registro correspondiente se adjunta mediante ANEXO N°4.1.5.

7. Señalización y demarcación

Durante el mes de mayo de 2026 se mantuvieron las medidas de señalización y demarcación en los diferentes frentes de trabajo, garantizando la delimitación del área de intervención mediante cerramiento perimetral y restringiendo el acceso de personal no autorizado. Así mismo, se realizó la señalización de áreas de peligro asociadas a excavaciones, cimentaciones y zonas de intervención temporal, especialmente en aquellos sectores donde se adelantaron actividades relacionadas con medidas de contingencia y apuntalamiento. De igual manera, se conservó la señalización preventiva e informativa en adecuado estado de visibilidad y mantenimiento, fortaleciendo las condiciones de seguridad tanto para el personal de obra como para la comunidad educativa presente en el área de influencia.

Ilustración 5. Señalización y demarcación en obra



Fuente: El proyecto

8. Elementos de atención a emergencias

Durante el periodo evaluado, se mantuvieron disponibles en obra los elementos destinados para la atención de emergencias, tales como botiquines de primeros auxilios y demás implementos requeridos para la atención inicial de cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante la ejecución de las actividades. Estos elementos permanecieron ubicados en zonas de fácil acceso para el personal y en condiciones adecuadas de uso, permitiendo fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles incidentes en los diferentes frentes de trabajo

Ilustración 6. Elementos de atención a emergencias



Fuente: El proyecto

9. Orden y aseo

Como parte de las estrategias de prevención de riesgos implementadas en obra, durante el mes de mayo de 2026 se realizaron jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo, promoviendo espacios organizados y condiciones adecuadas para el desarrollo seguro de las actividades constructivas. Así mismo, se dio cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones impartidas por la interventoría relacionadas con el mantenimiento del orden en obra, fortaleciendo las acciones correctivas requeridas en campo. Adicionalmente, durante el periodo se llevó a cabo una inspección enfocada en verificar las condiciones de limpieza, disposición de materiales,

manejo de residuos y organización general de los frentes de trabajo. El registro correspondiente se adjunta mediante el ANEXO N°4.1.6.

10. Capacitaciones de seguridad

En cumplimiento del cronograma establecido dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante el mes de mayo de 2026 se ejecutaron las dos capacitaciones programadas para el personal vinculado al proyecto. Estas actividades permitieron reforzar los lineamientos de prevención, autocuidado y control de riesgos asociados a las labores desarrolladas en obra, fortaleciendo la cultura de seguridad y el cumplimiento de las medidas implementadas durante la ejecución de las actividades constructivas. Los registros correspondientes se adjuntan mediante El ANEXO N°4.1.7.

Tabla 5. Capacitaciones de seguridad

FECHA	TEMA
07/05/26	Actos y condiciones inseguras
21/05/26	Uso seguro de maquinaria pesada

Fuente: El proyecto

Ilustración 7. Capacitaciones de seguridad



Fuente: El proyecto

6. CONCLUSIONES

Durante el mes de mayo de 2026, PSI INGENIEROS S.A.S. dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la implementación de medidas orientadas a la identificación, prevención y control de los riesgos asociados a las actividades ejecutadas en obra. En este sentido, se garantizó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con seguridad social, exámenes médico ocupacionales, inducciones, suministro de elementos de protección personal y ejecución de capacitaciones dirigidas al personal vinculado al proyecto.

Así mismo, se mantuvieron condiciones adecuadas de señalización, demarcación, orden y aseo, inspecciones preoperacionales y disponibilidad de elementos para la atención de emergencias, fortaleciendo las condiciones de seguridad en los diferentes frentes de trabajo. De igual manera, se realizó seguimiento permanente a las actividades de contingencia y apuntalamiento ejecutadas en la institución educativa, implementando controles preventivos que permitieron minimizar riesgos durante su desarrollo.

Como resultado de las medidas implementadas y del compromiso del personal con el cumplimiento de los lineamientos establecidos, durante el periodo evaluado no se presentaron accidentes de trabajo, evidenciando el adecuado control de las condiciones de seguridad y salud en el desarrollo de las actividades constructivas del proyecto.

7. LISTA DE ANEXOS

ANEXO NO.4.1.1 Pago de planillas y afiliaciones

ANEXO NO.4.1.2 Exámenes médico ocupacionales

ANEXO NO.4.1.3 Inducciones

ANEXO NO.4.1.4 Suministro, reposición de EPP’s

ANEXO NO.4.1.5 Preoperacionales de herramientas, equipos y maquinaria

ANEXO NO.4.1.6 Inspección orden y aseo

ANEXO NO.4.1.7 Capacitaciones de seguridad

ANEXO No. 4.1.1.
PLANILLAS SS
Y AFILIACIONES

PSI INGENIEROS

PLANILLAS SS
ABRIL 2026

CERTIFICACIÓN DE APORTES Y RELACIÓN DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Tunja, 27 de mayo de 2026

El suscrito, LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.603.584 de Tunja, en calidad de Representante Legal de PSI INGENIEROS S.A.S.,

CERTIFICA

Que la empresa PSI INGENIEROS S.A.S., en calidad de contratista de obra del contrato IPVO 030-2025, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", cuenta a la fecha, con los aportes vigentes al Sistema de Seguridad Social Integral de su personal vinculado al proyecto. Los aportes mencionados incluyen los subsistemas de salud, pensión y riesgos laborales, conforme a la normatividad vigente y aplicable.

A continuación, se detalla la relación de planillas correspondientes a los periodos de aportes:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEDICACIÓN	N° PLANILLA ABRIL 2026
Luis Eduardo Sichacá Gámez	1.049.603.584	Director de obra	50%	9505559227
		Especialista en estructuras	30%	
Edwin Camilo Sichacá Cuervo	1.049.602.110	Residente de obra	100%	9503669183
Narem Stip Piña Rodríguez	1.049.648.394	Auxiliar residente de obra	100%	9503669183
Camilo Andrés Lancheros Coy	1,053.330.598	Ingeniero eléctrico	10%	9505448727
Oscar Fabian Pacheco Merchán	1.049.606.085	Ingeniero hidráulico	10%	9505448727
Emilio Bladimir Panqueva Álvarez	7.318.490	Profesional HSEQ	50%	9505559227
Iván Darío Sichacá Gámez	1.049.644.688	Especialista en geotecnia	10%	9505559227
Rodrigo Albeiro Mendivelso Cely	7.181.346	Profesional ambiental	50%	86737090 9505550041
Planilla colaboradores	-	Personal operativo	-	1750928292

La presente certificación se expide para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. M.Sc. LUIS EDUARDO SICHACÁ GAMEZ
C.C. 1.049.603.584 de Tunja
PSI INGENIEROS S.A.S.
Dirección: Calle 20 No. 13-14 Oficina 216B
Cel: 313 830 72 69
e-mail: psi.ingenieros1@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CL 20 13 14	TUNJA-BOYACA	3132931188	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	342544640	9505559227	E	2026/05/13	2026/05/28	BANCO DE BOGOTA	15	$2,012,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Centro de Trabajo: ADMON PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
1	CC	33366983	MEDINA YENNY																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ANDENES PAIPA (2 Afiliados)																						$3,326,720	$532,400			$3,326,720	$133,200			$3,032,055	$121,400			$3,326,720		$231,600		$0	$0		$1,018,600
Centro de Trabajo: CENTRO (2 Afiliados)																						$3,326,720	$532,400			$3,326,720	$133,200			$3,032,055	$121,400			$3,326,720		$231,600		$0	$0		$1,018,600
Ciudad: PAIPA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																						$3,326,720	$532,400			$3,326,720	$133,200			$3,032,055	$121,400			$3,326,720		$231,600		$0	$0		$1,018,600
2	CC	7318490	PANQUEVA EMILIO	X																230201	27	$1,575,815	$252,200	EPS005	27	$1,575,815	$63,100	CCF10	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,575,815	6.960%	$109,700	27	$0	$0	Si	$476,300
3	CC	1049644688	SICHACA IVAN																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INGENIEROS ESPECIALISTAS (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Centro de Trabajo: ESPECIALISTA OBRA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
4	CC	1049603584	SICHACA LUIS																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total		**Afiliados(4)**																				$6,828,530	$1,092,800			$6,828,530	$273,400			$6,533,865	$261,600			$6,828,530		$362,700		$0	$0		$1,990,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,092,800	$11,900	$0	$1,104,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$9,100	$0	$849,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$252,200	$2,800	$0	$255,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$362,700	$3,900	$0	$366,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$362,700	$3,900	$0	$366,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$261,600	$2,900	$0	$264,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$261,600	$2,900	$0	$264,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$273,400	$3,000	$0	$276,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$800	$0	$70,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$203,300	$2,200	$0	$205,500
TOTAL				**4**	**$1,990,500**	**$21,700**	**$0**	**$2,012,200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901062819
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INTERVENTORIA,CONSULTIRA Y CONSTRUCCION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	RAMIRIQUI	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 4 NO 4-67	TELÉFONO:	7327628
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - COR RAM
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1750928292**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996645033		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100	$ 0	$ 84.100
230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.120.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.120.900	$ 0	$ 1.120.900
SUBTOTALES:										**$ 1.205.000**	**$ 0**	**$ 1.205.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 166.000
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 65.600
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 301.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 301.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 510.700	$ 510.700	$ 0	$ 0	$ 510.700
SUBTOTALES:									**$ 510.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 510.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	8	$ 301.700	$ 0	$ 301.700
SUBTOTALES:			**$ 301.700**	**$ 0**	**$ 301.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901062819
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INTERVENTORIA,CONSULTIRA Y CONSTRUCCION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	RAMIRIQUI	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 4 NO 4-67	TELÉFONO:	7327628
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - COR RAM
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1750928292**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996645033

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
7	CC 72326961	SALAMANCA MENDOZA PABLO EDILSON	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI
8	PT 6424123	PEREZ CARLOS GREGORIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI

NOVEDADES

Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
7																	
8	21																

SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
7	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
8	230301-PORVENIR	10	$ 583.635	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 93.400

SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
7	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
8	NUEVA EPS CM	10	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 23.400

ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
7	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	1	$ 121.900
8	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	10	$ 583.635	1	$ 40.700

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	10	$ 583.635	CCF10-COMFABOY	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.319.100

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GUATEQUE	MUNICIPIO DE GUATEQUE	GUATEQUE-BOYACA	3138307269	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	338322569	9503669183	E	2026/05/13	2026/05/26	BANCOLOMBIA	13	$1,095,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049648394	PIÑA RODRIGUEZ NAREM STIP																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
2	CC	1049602110	SICHACA CUERVO EDWIN CAMILO																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total	**Afiliados(2)**																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$243,800		$0	$0		$1,084,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GUATEQUE	MUNICIPIO DE GUATEQUE	GUATEQUE-BOYACA	3138307269	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	338322569	9503669183	E	2026/05/13	2026/05/26	BANCOLOMBIA	13	$1,095,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$560,400	$5,400	$0	$565,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$2,700	$0	$282,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$2,700	$0	$282,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$243,800	$2,300	$0	$246,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$243,800	$2,300	$0	$246,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$1,400	$0	$141,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$140,200	$1,400	$0	$141,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$140,200	$1,400	$0	$141,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$700	$0	$70,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$700	$0	$70,800
TOTAL				**2**	**$1,084,600**	**$10,500**	**$0**	**$1,095,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GUATEQUE	MUNICIPIO DE GUATEQUE	GUATEQUE-BOYACA	3138307269	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	339201237	9505448727	E	2026/05/13	2026/05/27	BANCOLOMBIA	14	$110,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1053330598	LANCHEROS COY CAMILO ANDRES	X	X																230301	3	$175,091	$28,100	EPS017	3	$175,091	$7,100	CCF10	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	$12,200	3	$0	$0	Si	$54,500
2	CC	1049606085	PACHECO MERCHAN OSCAR FABIAN	X	X																230301	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$7,100	CCF10	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	$12,200	3	$0	$0	Si	$54,500
Total	**Afiliados(2)**																						$350,182	$56,200			$350,182	$14,200			$350,182	$14,200			$350,182	$24,400		$0	$0		$109,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GUATEQUE	MUNICIPIO DE GUATEQUE	GUATEQUE-BOYACA	3138307269	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	339201237	9505448727	E	2026/05/13	2026/05/27	BANCOLOMBIA	14	$110,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$56,200	$600	$0	$56,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$56,200	$600	$0	$56,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$24,400	$300	$0	$24,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$24,400	$300	$0	$24,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$14,200	$200	$0	$14,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$14,200	$200	$0	$14,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$14,200	$200	$0	$14,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$7,100	$100	$0	$7,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$7,100	$100	$0	$7,200
TOTAL				**2**	**$109,000**	**$1,300**	**$0**	**$110,300**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7181346	RODRIGO ALBEIRO MENDIVELSO CELY	CALLE 43 N 8A 06	3104714630	afiliacionesappcontrol@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	TIPACOQUE		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		86737090	28/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$302.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	131.400	0		0		0	15	1.500	0	132.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	168.100	0	0	0	0	15	1.900	0	170.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	15	0	0	0
ICBF				
0	15	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	131.400	132.900
Pensión	1	168.100	170.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	299.500	302.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7181346	RODRIGO ALBEIRO MENDIVELSO CELY	CALLE 43 N 8A 06	3104714630	afiliacionesappcontrol@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	TIPACOQUE		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		86737090	28/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$302.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excluyendo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 7181346	MENDIVELSO CELY RODRIGO ALBEIRO	3	0			N	X	X															230301	1.050.543	18	168.100	0	0	0	0	EPS037	1.050.543	18	131.400		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO PAIPA	PARQUE PRINCIPAL PAIPA	PAIPA-BOYACA	3138307269	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	342513950	9505550041	Y	2026/05/13	2026/05/28	BANCO DE BOGOTA	15	$148,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	4179386	CAMACHO JUAN	X	T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	9	$525,272	$36,600	0	$0	$0	No	$36,600
2	CC	7181346	MENDIVELSO RODRIGO	X	T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	18	$1,050,543	$73,200	0	$0	$0	No	$73,200
3	CC	79969466	VARGAS IVAN	X	T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	9	$525,272	$36,600	0	$0	$0	No	$36,600
Total	**Afiliados(3)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,101,087	$146,400		$0	$0		$146,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO PAIPA	PARQUE PRINCIPAL PAIPA	PAIPA-BOYACA	3138307269	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	342513950	9505550041	Y	2026/05/13	2026/05/28	BANCO DE BOGOTA	15	$148,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$146,400	$1,600	$0	$148,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$146,400	$1,600	$0	$148,000
TOTAL				3	$146,400	$1,600	$0	$148,000

AFILIACIONES

30263252

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT. 900.156.264-2

No.Radicación: 389097

FECHA DE RADICACIÓN: 25 05 2026

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. TIPO DE TRÁMITE: A. AFILIACIÓN [ ] B. REPORTE DE NOVEDADES [X]
2. TIPO DE AFILIACIÓN: A. Individual: a) Cotizante o cabeza de familia [X] b) Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]
3. RÉGIMEN: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA: SI [ ] NO [X]
5. TIPO DE AFILIADO: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ] D. Afiliado adicional [ ]
6. TIPO DE COTIZANTE: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
7. CÓDIGO: A1345

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

8. APELLIDOS Y NOMBRES
PRIMER APELLIDO: BARRERA | SEGUNDO APELLIDO: CASTILLO | PRIMER NOMBRE: MARIO | SEGUNDO NOMBRE:

9. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.N. [ ] M.S. [ ] R.C. [ ] T.I. [ ] C.C. [X] C.E. [ ] S.C. [ ] C.D. [ ] A.S. [ ] P.T. [ ]
10. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 4130793
11. SEXO BIOLÓGICO: F [ ] M [X]
12. SEXO IDENTIFICACIÓN: F [ ] M [X] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual?
13. NACIONALIDAD: COLOMBIA
14. LUGAR DE NACIMIENTO: PAÍS: COLOMBIA | DEPARTAMENTO: BOYACA | MUNICIPIO: GUATEQUE
15. FECHA NACIMIENTO: DÍA: 21 | MES: 04 | AÑO: 1962

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

16. ETNIA: 6
17. COMUNIDAD INDÍGENA:
18. DISCAPACIDAD: SI [ ] NO [X] CATEGORÍA DE DISCAPACIDAD:
19. TIENE ENCUESTA SISBÉN? SI [ ] NO [X]
20. CLASIFICACIÓN SISBÉN:
NIVEL:
GRUPO:
21. GRUPO POBLACIÓN ESPECIAL:
22. ARL: POSITIVA
23. AFP: COLPENSIONES
24. IBC: $1,750,905.00
25. TARIFA CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA: $0.00
26. RESIDENCIA
DIRECCIÓN: VEREDA SINCACHOQUE
TELÉFONO FIJO:
TELÉFONO CELULAR: 3223136928
CORREO ELECTRÓNICO: mariobarreracastillo9@gmail.com
DEPARTAMENTO: BOYACA
MUNICIPIO/ DISTRITO: GUATEQUE
LOCALIDAD/COMUNA:
ZONA: CABECERA MUNICIPAL [X] CENTRO POBLADO [ ] RURAL DISPERSO [ ] RESTO RURAL [ ]
IPS: 7225

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR - Datos de identificación del beneficiario (Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

27. APELLIDOS Y NOMBRES
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE

28. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: T.I. [ ] C.C. [ ] C.E. [ ] S.C. [ ] C.D. [ ] P.T. [ ]
29. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
30. SEXO BIOLÓGICO: F [ ] M [ ]
31. SEXO IDENTIFICACIÓN: F [ ] M [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual?
32. NACIONALIDAD:
33. LUGAR DE NACIMIENTO: PAÍS | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO
34. FECHA NACIMIENTO: DÍA | MES | AÑO

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	35. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	36. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	37. NÚMERO DE IDENTIDAD	38. NACIONALIDAD	39. SEXO F	39. SEXO M	40. SEXO IDENTIFICACIÓN F	40. SEXO IDENTIFICACIÓN M	40. SEXO IDENTIFICACIÓN T	40. SEXO IDENTIFICACIÓN NB	40. SEXO IDENTIFICACIÓN Otro?	41. LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS	41. LUGAR DE NACIMIENTO DEPART.	41. LUGAR DE NACIMIENTO MUNICIPIO	42. FECHA DE NACIMIENTO DÍA	42. FECHA DE NACIMIENTO MES	42. FECHA DE NACIMIENTO AÑO
B1		CN MS RC TI CC CE SC PA CD AS PT															
B2		CN MS RC TI CC CE SC PA CD AS PT															
B3		CN MS RC TI CC CE SC PA CD AS PT															
B4		CN MS RC TI CC CE SC PA CD AS PT															
B5		CN MS RC TI CC CE SC PA CD AS PT															

	Datos complementarios del Beneficiario 43. PARENTESCO	44. ETNIA	45. COMUNIDAD	46. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL	47. TIENE ENCUESTA SISBÉN? SI	47. NO	48. CLASIFICACIÓN SISBÉN NIVEL	GRUPO	49. DISCAPACIDAD SI	NO	CATEGORÍA DE DISCAPACIDAD	50. INCAPACIDAD PERMANENTE SI	NO	51. Datos de residencia DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/ DISTRITO	ZONA CABECERA MUNICIPAL	CENTRO POBLADO	RURAL DISPERSO	RESTO RURAL
B1							I. II.												
B2							I. II.												
B3							I. II.												
B4							I. II.												
B5							I. II.												

	TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR	52. VALOR DE LA UPC DEL AFILIADO ADICIONAL	DIRECCIÓN	LOCALIDAD/ COMUNA	CORREO ELECTRÓNICO	53. IPS	54. CÓDIGO DE LA IPS (A REGISTRAR POR LA EPS)
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

55. Nombre o razón social: INTERVENTORIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
56. Tipo documento de Identificación: NIT [X] C.C. [ ] C.E. [ ] S.C. [ ] P.A. [ ] C.D. [ ] P.T. [ ]
57. Número del documento de Identificación: 901062819
58. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS):
59. Ubicación: DIRECCIÓN: VDA CAICEDOS | TELÉFONO FIJO O CELULAR: 3202331409 | CORREO ELECTRÓNICO: incons.sas2017@gmail.com | DEPARTAMENTO: | MUNICIPIO/DISTRITO:

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. TIPO DE NOVEDAD
1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD [ ]
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS [ ]
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LA EPS Código: [ ]
6. REPORTE DE PAGO A TRAVÉS DE UN TERCERO Código: [ ]
7. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
8. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR [X]
10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO [ ]
11. INSCRIPCIÓN EPS RETORNO AL PAÍS.1. RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA. [ ]
12. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
13. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
14. MOVILIDAD
A) AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO [ ]
B) AL RÉGIMEN SUBSIDIADO [ ]
15. TRASLADO
A) MISMO RÉGIMEN [ ]
B) DIFERENTE RÉGIMEN [ ]
16. REPORTE DE FALLECIMIENTO [ ]
17. REPORTE DEL TRÁMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE [ ]
18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PREPENSIONADO [ ]
19. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO [ ]
20. INGRESO A CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA. [ ]
21. RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA. [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

61. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: T.I. [ ] C.C. [ ] C.E. [ ] S.C. [ ] C.D. [ ] P.T. [ ]
NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
62. SEXO BIOLÓGICO: F [ ] M [ ]
63. SEXO IDENTIFICACIÓN: F [ ] M [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual?
64. FECHA NACIMIENTO: DÍA | MES | AÑO
65. EPS ANTERIOR:
66. FECHA DE NOVEDAD: DÍA: 19 | MES: 05 | AÑO: 2026
67. MOTIVO DE TRASLADO Código:
68. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES:

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

69. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(los) Beneficiario(s) reportado(s) dependen económicamente de mi. [ ]
70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad [ ]
72. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
75. Autorizo para que la EPS realice el manejo de los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
76. a). Autorizo mi consentimiento explícito para que Nueva EPS establezca comunicación a través de SMS, EMAIL, Página Web, Notificaciones App, Llamadas Telefónicas, WhatsApp y otros canales, para recibir mensajes informativos. [X]
b). Autorización para que la EPS me contacte con fines netamente informativos sobre la prestación de servicios de salud dentro de los horarios regulares, incluso si estoy registrado en el "Registro de Números Excluidos" (RNE). [ ]
77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes. [ ]
78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente. [ ]

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: T.I. [ ] C.C. [ ] C.E. [ ] S.C. [ ] C.D. [ ] P.T. [ ]
NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

IX. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia, beneficiario cuando aplique o afiliado adicional

81. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación Colectiva, Institucional o de Oficio

X. ANEXOS

82. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] MS [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] CE [ ] SC [ ] PA [ ] CD [ ] AS [ ] PT [ ]
Cantidad: Total
83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
84. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016 [ ]
90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en las que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]
Total Anexos

XI. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIONES RESPONSABLES DE POBLACIONES ESPECIALES

92. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL | Código del Municipio | Código del departamento | 93. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

XII. DATOS DE LA INSTITUCIÓN Y DEL FUNCIONARIO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN.

94. APELLIDOS Y NOMBRES
Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. [ ] C.E. [ ] S.C. [ ] C.D. [ ] P.T. [ ]
Número del documento de identidad
95. FIRMA DEL FUNCIONARIO
96. FECHA DE RADICACIÓN: DÍA | MES | AÑO
97. FECHA DE VALIDACIÓN: DÍA | MES | AÑO

OBSERVACIONES:

VIGILADO Supersalud

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

- ORIGINAL: E.P.S. -

ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES Y CARTA DE DESEMPEÑO

nueva eps
gente cuidando gente
NIT. 900.156.264-2

Autorización de mensajes de texto. (Circular externa 000016 mayo de 2013)

Yo, MARIO BARRERA CASTILLO identificado (a) con R.C. | T.I. | C.C. | C.E. | CC | S.C. | C.D. | P.E. | P.T.

número 4130793 de GUATEQUE, certifico que:

1	¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente?	SÍ☐ No☐
2	¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	SÍ☐ No☐
3	¿Leyó el contenido de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente?	SÍ☐ No☐
4	¿Leyó el contenido de la carta de desempeño de la EPS?	SÍ☐ No☐
5	¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información, fue asesorado adecuadamente por la EPS?	SÍ☐ No☐

Así mismo autorizo a NUEVA EPS, para que envíe información al teléfono celular No. 3223136928

y/o correo electrónico: mariobarreracastillo9@gmail.com

SÍ☐ No☐

Autorizo la entrega de la carta de Derechos y Deberes del Afiliado y carta de Desempeño, en formato electrónico. SÍ☐ No☐

Consulte la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño en el micrositio Web https://www.nuevaeps.com.co/carta-derechos-deberes

Evitando impresiones para ser amigable con el planeta SI ☐ NO ☐

Declaración juramentada de convivencia: Declarar que convivo con el(la) señor(a) _____ Identificado(a) con _____ No. _____ desde el día _____ del año _____

Cordialmente,

Firma: _____

Tipo ID: CC No. ID: 4130793

Fecha de Solicitud: 25/05/2026

Dirección: VEREDA SINCACHOQUE

Tel: 3223136928 Municipio: GUATEQUE

Departamento: BOYACA

Huella

Afiliado manifiesta que no sabe o no puede firmar, autoriza a:

Firma: _____

Tipo ID: _____ No. ID: _____

Fecha (dd/mm/aaaa): _____

Dirección: _____

Tel: _____ Municipio: _____

Departamento: _____

Huella

Manifiesto con mi firma la aceptación de todas las declaraciones y términos incorporados en este formato y el consentimiento expreso, previo e informado en relación con el tratamiento de mis datos personales que hará NUEVA EPS S.A., en sujeción a la política para el tratamiento de datos personales de la NUEVA EPS S.A. .

Autorizaciones

En virtud de la anterior certificación, autorizo expresamente y conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley 527 de 1995, a NUEVA EPS S.A. para que me remita información en forma de mensajes de datos, a través de mecanismos como sms -short message service - , correos electrónicos y redes sociales, relacionada con los servicios de NUEVA EPS S.A. y la carta de derecho de deberes.

Autorizo de manera expresa a NUEVA EPS S.A. y/o a la persona natural o jurídica a quien ésta encargue, para que recolecte, almacene, use, haga circular, actualice o suprima mis datos personales, para acceder a los servicios de la NUEVA EPS S.A. y para el cumplimiento de la carta de derechos y deberes.

Aviso de privacidad

Hago constar expresamente que NUEVA EPS S.A. me informó sobre los siguientes derechos que me asisten como titular de datos personales:

• Acceder los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.

• Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente al responsable del tratamiento y al encargado del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros datos, en relación con datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos datos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.

• Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.

• Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, con respecto del uso que le ha dado a los datos personales.

• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.

• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la constitución.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la política de tratamiento de los datos personales de NUEVA EPS S.A., a través de los siguientes mecanismos que ponemos a su disposición:

Sitio web: www.nuevaeps.co

Régimen Contributivo:
Línea Gratuita: **01 8000 954400**
Línea de atención en Bogotá: **(601) 307 7022**

Régimen Subsidiado:
Línea Gratuita: **01 8000 95 2000**
Línea de atención en Bogotá: **(601) 307 7051**

Oficinas de atención al afiliado de NUEVA EPS S.A.
Conmutador: **(601) 419 3000**
Dirección Administrativa: Carrera 85k No 46A – 66 Piso 2

Sr.(a) afiliado(a), la información por usted suministrada en este formato, así como la relacionada en el formulario de afiliación y/o demás documentos anexos, serán utilizados por NUEVA EPS S.A. como responsable del tratamiento de la información únicamente para los fines específicos relacionados con la administración y prestación de servicios en salud de Plan Obligatorio de Salud, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 "Hábeas Data"; dicho tratamiento podrá implicar la trasferencia, trasmisión y/o recepción de los datos, y el cual se realizará a través de sí misma, terceros encargados de tratamiento de información o de sus aliados comerciales, para fines comerciales y para la correcta prestación del servicio, de la forma indicada en los Términos y Condiciones de cada uno de sus portales y de la Política de Confidencialidad y Protección de Datos.

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL TRABAJADOR INDEPENDIENTE CUYO INGRESO SEA IGUAL O SUPERIOR A 1 SMMLV

ACTIVIDAD ECONÓMICA	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	POSEE VIVIENDA PROPIA		PRODUCTOR AGROPECUARIO	
	POSITIVA	COLPENSIONES	$1750905	SÍ		SÍ	
				NO		NO	

Nivel de Escolaridad									
	Ninguno ☐	Secundaria ☐	Normalista ☐	Profesional ☐	Doctorado ☐
	Preescolar ☐	Media académica o clásica (bachillerato básico) ☐	Técnica Profesional ☐	Especialización ☐	Último Grado
	Básico Primaria ☐	Media técnica (bachillerato básico) ☐	Tecnológica ☐	Maestría ☐	Aprobado _____

Posición Ocupacional	Patrón/Empleador ☐	Contratista ☐	Trabaja por su Cuenta ☐
Inicio Contrato		Fin Contrato	

SEÑOR USUARIO: TRABAJADOR INDEPENDIENTE O CONTRATISTA, RECUERDE REPORTAR LA NOVEDAD DE RETIRO EN LA PLANILLA DE PAGO A PARTIR DEL MOMENTO QUE DECIDA NO CONTINUAR CON LOS SERVICIOS DE SALUD, EL NO HACERLO LE GENERA MORA, LA CUAL TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL MOMENTO EN EL QUE REPORTE SU RETIRO AL SISTEMA. DECRETO 806 ART. 57 DE 1998 Y ART. 59 DECRETO 1406 DE 1999.

SÓLO DILIGENCIAR SI ES COTIZANTE INDEPENDIENTE PAGO POR TERCERO	Nombre del Tercero	Tipo de Identificación	NIT	C.C.	C.E.	Identificación del Tercero que realiza el Aporte	DV
			P.A.	T.I.	C.D.		

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR LA EPS

Nombre del ASESOR o PROMOTOR	CÓDIGO ASESOR o PROMOTOR	Nombre de OFICINA	
Fabio Galvis Hernandez	A1345		CIUDAD Y FECHA

CER_AFI_2026027605162

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

Mario Barrera Castillo identificado con CC. 4130793 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	INTERVENTORIA, CONSULTORIA,	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 901062819

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/05/23	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5429001

Esta certificación se expide a los 22 días del mes de mayo del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC22052026N4130793A18309227.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

Hacienda

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de la afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, EMETERIO VARGAS ESPINOSA identificado(a) con CC 72324884 registra la siguiente información.

Datos del empleador	Datos de la Relación Laboral
INTERVENTORIA, CONSULTORIA, CONSTRUCCIÓN SAS INCONS - NI. 901062819	Fecha de inicio de cobertura: 09-03-2026 Estado Afiliación: ACTIVO Tipo Vinculación: TRABAJADOR DEPENDIENTE Clase de Riesgo: 5 Actividad Económica: 5429001

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 08 dia(s) del mes de Marzo de 2026.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

El(La) Señor(a) EMETERIO VARGAS ESPINOSA identificado(a) con CC 72324884 se encuentra afiliado a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	**01/01/2014**
Estado de la Afiliación:	**ACTIVO**
IPS:	**SUBSIDIADO-ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUI**
Categoría:	**A**

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 5 días del mes de mayo del año 2026.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS.
NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones
Nueva EPS S.A

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

EMETERIO VARGAS ESPINOSA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **72.324.884**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 5 de Mayo del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Hacienda

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de la afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, PABLO EDILSON SALAMANCA MENDOZA identificado(a) con CC 72326961 registra la siguiente información.

Datos del empleador	Datos de la Relación Laboral
INTERVENTORIA, CONSULTORIA, CONSTRUCCIÓN SAS INCONS - NI. 901062819	Fecha de inicio de cobertura: 16-09-2025 Estado Afiliación: ACTIVO Tipo Vinculación: TRABAJADOR DEPENDIENTE Clase de Riesgo: 5 Actividad Económica: 5429001

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 08 dia(s) del mes de Marzo de 2026.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

EPS Sanitas
Nuestro compromiso es contigo
NIT. 800.251.440-6

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Fecha de Radicado: 05052026

201023497

(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo antes de diligenciar este formulario)

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Contribución solidaria
A. Afiliación — B. Reporte de Novedades X	A. Individual - Cotizante o Cabeza de Familia X — B. Colectiva — D. De Oficio — Beneficiario o Afiliado adicional — C. Institucional	A. Contributivo X — B. Subsidiado	Si — No X

5. Tipo de Afiliado	6. Tipo de Cotizante	7. Código
A. Cotizante X — C. Beneficiario — B. Cabeza de Familia — D. Afiliado adicional	A. Dependiente X — B. Independiente — C. Pensionado	(a registrar por la EPS)

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
SALAMANCA	MENDOZA	PABLO	EDILSON

9. Tipo de documento de identidad	10. Número del documento de identidad	11. Sexo biológico	12. Sexo identificación	Cuál	13. Nacionalidad
CC	72326961	Femenino — Masculino X	F — M X — T — NB — Otro		COLOMBIANO

14. Lugar de nacimiento				15. Fecha de nacimiento
País	Departamento	Municipio		
COLOMBIA	BOYACA	RAMIRIQUI		15 10 1983

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos Personales

16. Etnia	17. Comunidad	18. Discapacidad	19. Tiene encuesta SISBÉN	20. Clasificación SISBÉN	21. Grupo de población especial
6		Si — No X — Categoría de discapacidad	Si — No X	Nivel — Grupo	

22. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	23. Administradora de Pensiones	24. Ingreso base de cotización - IBC	25. Tarifa Contribución Solidaria
POSITIVA	PORVENIR	$ 1.750.905	

26. Residencia Dirección	Teléfono Fijo
VDA CAICEDOS ALTO	

Teléfono Celular	Correo Electrónico
3168654716	lmyriamramos42@gmail.com

Departamento	Municipio / Distrito	Localidad / Comuna	Zona
BOYACA	TUNJA		Cabecera Municipal — Rural Disperso — Centro Poblado — Resto Rural X

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos Básicos de Identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente del cotizante

27. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

28. Tipo de documento de identidad	29. Número del documento de identidad	30. Sexo biológico	31. Sexo identificación	Cual	32. Nacionalidad
		Femenino — Masculino	F — M — T — NB — Otro		

33. Lugar de nacimiento			34. Fecha de nacimiento
País	Departamento	Municipio	D D M M A A A A

Datos Básicos de Identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	35. Apellidos y nombres — Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	36. Tipo de documento de identidad	37. Número del documento de identidad	38. Nacionalidad	39. Sexo biológico	40. Sexo Identificación	41. Lugar de nacimiento	42. Fecha de nacimiento
B1				Femenino Masculino	F M T NB Otro Cual	País Departamento Municipio	D D M M A A A A
B2				Femenino Masculino	F M T NB Otro Cual	País Departamento Municipio	D D M M A A A A
B3				Femenino Masculino	F M T NB Otro Cual	País Departamento Municipio	D D M M A A A A
B4				Femenino Masculino	F M T NB Otro Cual	País Departamento Municipio	D D M M A A A A
B5				Femenino Masculino	F M T NB Otro Cual	País Departamento Municipio	D D M M A A A A

Datos complementarios del Beneficiario

	43. Parentesco	44. Etnia	45. Comunidad	46. Grupo de población especial	47. Tiene encuesta SISBÉN	48. Clasificación SISBÉN	49. Discapacidad	50. Incapacidad permanente
B1					Si No	Nivel Grupo	Si No Categoría de discapacidad	Si No
B2					Si No	Nivel Grupo	Si No Categoría de discapacidad	Si No
B3					Si No	Nivel Grupo	Si No Categoría de discapacidad	Si No
B4					Si No	Nivel Grupo	Si No Categoría de discapacidad	Si No
B5					Si No	Nivel Grupo	Si No Categoría de discapacidad	Si No

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio/ Distrito	zona	Teléfono fijo y/o celular	52. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1			Cabecera Municipal — Centro Poblado — Rural Disperso — Resto Rural		
B2			Cabecera Municipal — Centro Poblado — Rural Disperso — Resto Rural		
B3			Cabecera Municipal — Centro Poblado — Rural Disperso — Resto Rural		
B4			Cabecera Municipal — Centro Poblado — Rural Disperso — Resto Rural		
B5			Cabecera Municipal — Centro Poblado — Rural Disperso — Resto Rural		

	Dirección	Localidad/Comuna	Correo Electrónico
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

A. AFILIACIÓN

AEU

201023497

53. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS		54. Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

55. Nombre o razón social	56. Tipo documento de Identificación	57. Número del documento de Identificación	58. Tipo de aportante o pagador de Pensiones (a registrar por la EPS)
INTERVENTORIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	NT	901062819	

59. Ubicación

Dirección: VDA CAICEDOS

Teléfono fijo o Celular: 3107589835

Correo Electrónico: incons.sas2017@gmail.com

Departamento: BOYACA

Municipio / Distrito: RAMIRIQUI

60. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identificación.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código
- [ ] 6. Reporte de pago a través de un tercero Código
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Inscripción EPS retorno al país.
- [ ] 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 14. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 15. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 16. Reporte de fallecimiento del Cotizante o Cabeza de familia.
- [ ] 17. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pre- pensionado.
- [ ] 19. Reporte de la calidad de Pensionado.
- [ ] 20. Ingreso a Contribución Solidaria.
- [ ] 21. Retiro de Contribución Solidaria.

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de identificación

Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	62. Sexo biológico	63. Sexo identificación	64. Fecha de nacimiento
		Femenino Masculino	F M T NB Otro Cual	D D M M A A A A

65. EPS anterior	66. Fecha de novedad	67. Motivo de traslado	68. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones
	01042026	Código	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 69. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 72. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [X] 73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [X] 74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [X] 75. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [X] 76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.
- [ ] 77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
- [ ] 78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Tipo de documento de identidad	No. del documento de identidad

IX. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional	81. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio
Pablo salamanca mendoza	Jorge Manuel castro

X. ANEXOS

- [X] 82. Anexo copia del documento de identidad. Cantidad de documentos de identidad anexos: CN RC TI CC CE PA CD SC PT
- [ ] 83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 84. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 88. Documentó en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016.
- [ ] 90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en a que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

Total Anexos

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial: Código del municipio | Código del departamento

93. Nombre de la Institución

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y nombres

Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	95. Firma del funcionario	96. fecha de radicación	97. Fecha de validación
			D D M M A A A A	D D M M A A A A

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

Doc. identificación y nombre del Ejecutivo Comercial	Sello de Radicación	Sticker procesamiento
SEGUROS Y VIDA LTDA NIT 900986188	EPS Sanitas RECIBIDO PARA SU ESTUDIO	

B. REPORTE DE NOVEDADES

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

PABLO EDILSON SALAMANCA MENDOZA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **72.326.961**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 5 de Mayo del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

CER_AFI_2026026662231

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

Jose Armando Morales Montenegro identificado con CC. 1052790067 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	INTERVENTORIA, CONSULTORIA,	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 901062819

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/04/22	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5429001

Esta certificación se expide a los 21 días del mes de abril del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC21042026N1052790067A17373376.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 05/05/2026, el empleador INTERVENTORIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS identificado con NIT número 901062819 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
10300159	05/05/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
PERMISO POR PROTECCIÓN	6424123	CARLOS GREGORIO PEREZ	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-21
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1023036108	EDWARDMAURICIO GOMEZ LEGUIZAMO	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-28
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1049797274	LUISABELARDO PINTO RAMOS	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-21
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1052790067	JOSEARMANDO MORALES MONTENEGRO	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-22
CÉDULA DE CIUDADANÍA	4287474	JAIME FONSECA	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-16

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 5 días del mes de Mayo del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Protección

Una empresa sura

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **MORALES MONTENEGRO JOSE ARMANDO** identificado(a) con **CC** número **1.052.790.067** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 14 de abril de 2007 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 05 de mayo de 2026.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:
Bogotá **(601) 482 33 64** – Medellín **(604) 510 90 99** – Cali **(602) 386 00 80** -
Barranquilla **(605) 319 79 99** – Cartagena **(605) 642 49 99** – WhatsApp **+57 310 220 5575**
o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a **https://customer0001.wolkvox.com/proteccion/index.php**

CER_AFI_2026026662124

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

CARLOS GREGORIO PEREZ identificado con PT. 6424123 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	INTERVENTORIA, CONSULTORIA,	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 901062819

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/04/22	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5429001

Esta certificación se expide a los 21 días del mes de abril del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **PT21042026N6424123A17373268.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 05/05/2026, el empleador INTERVENTORIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS identificado con NIT número 901062819 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
10300159	05/05/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
PERMISO POR PROTECCIÓN	6424123	CARLOS GREGORIO PEREZ	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-21
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1023036108	EDWARDMAURICIO GOMEZ LEGUIZAMO	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-28
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1049797274	LUISABELARDO PINTO RAMOS	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-21
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1052790067	JOSEARMANDO MORALES MONTENEGRO	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-22
CÉDULA DE CIUDADANÍA	4287474	JAIME FONSECA	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-16

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 5 días del mes de Mayo del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

CARLOS GREGORIO PEREZ, identificado(a) con permiso de protección temporal **P.T 6424123**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 05 de Mayo del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

CER_AFI_2026026662177

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

Luis Abelardo Pinto Ramos identificado con CC. 1049797274 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	INTERVENTORIA, CONSULTORIA,	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 901062819

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/04/22	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5429001

Esta certificación se expide a los 21 días del mes de abril del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC21042026N1049797274A17373322.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 05/05/2026, el empleador INTERVENTORIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS identificado con NIT número 901062819 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
10300159	05/05/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
PERMISO POR PROTECCIÓN	6424123	CARLOS GREGORIO PEREZ	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-21
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1023036108	EDWARDMAURICIO GOMEZ LEGUIZAMO	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-28
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1049797274	LUISABELARDO PINTO RAMOS	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-21
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1052790067	JOSEARMANDO MORALES MONTENEGRO	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-22
CÉDULA DE CIUDADANÍA	4287474	JAIME FONSECA	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-16

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 5 días del mes de Mayo del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

LUIS ABELARDO PINTO RAMOS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.049.797.274**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 5 de Mayo del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

CER_AFI_2026026789928

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

Edward Mauricio Gomez Leguizamo identificado con CC. 1023036108 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	INTERVENTORIA, CONSULTORIA,	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 901062819

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/04/28	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5429001

Esta certificación se expide a los 27 días del mes de abril del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC27042026N1023036108A17500109.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 05/05/2026, el empleador INTERVENTORIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS identificado con NIT número 901062819 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
10300159	05/05/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
PERMISO POR PROTECCIÓN	6424123	CARLOS GREGORIO PEREZ	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-21
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1023036108	EDWARDMAURICIO GOMEZ LEGUIZAMO	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-28
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1049797274	LUISABELARDO PINTO RAMOS	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-21
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1052790067	JOSEARMANDO MORALES MONTENEGRO	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-22
CÉDULA DE CIUDADANÍA	4287474	JAIME FONSECA	1750905	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS	2026-04-16

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 5 días del mes de Mayo del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

EDWARD MAURICIO GOMEZ LEGUIZAMO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.023.036.108**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 5 de Mayo del 2026.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

ANEXO No. 4.1.2.
EVALUACIONES MÉDICO OCUPACIONALES

APSI	NOTIFICACIÓN EXÁMEN DE EGRESO	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-25 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

Guateque, Boyacá, 30 de abril de 2026

Señor(a):
JAIME FONSECA
C.C. 4.287.474
AYUDANTE DE OBRA

Asunto: Notificación para realización de examen médico ocupacional de egreso y exoneración de responsabilidades

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos informarle que, con ocasión de la terminación de su contrato laboral con la empresa, con fecha de finalización el día 30 de abril de 2026, usted tiene derecho a practicarse el examen médico ocupacional de egreso, conforme a lo establecido en el numeral 7 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Este examen tiene como objetivo verificar su estado de salud al momento de la desvinculación, identificar posibles afectaciones relacionadas con el cargo desempeñado y dejar constancia del estado de salud con el que culmina su relación laboral.

Así mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Resolución 1843 de 2026, el examen médico de egreso debe practicarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización del contrato. Por tanto, se le notifica formalmente que dispone de este plazo, contado a partir de la fecha de retiro, es decir, hasta el día 06 de mayo del 2026, para presentarse a realizarse dicho examen en la IPS. En caso de no presentarse dentro del plazo indicado, se entenderá que ha renunciado voluntariamente a su derecho a practicarse el examen médico de egreso. En consecuencia, la empresa quedará exonerada de cualquier tipo de responsabilidad legal, médica, laboral o de seguridad social derivada de su estado de salud posterior al retiro, o de cualquier situación relacionada con riesgos laborales no diagnosticados o documentados al momento de la desvinculación.

Agradecemos su atención y le solicitamos que, en caso de tener alguna duda con el examen de egreso, por favor se acerque previamente a la oficina, o se comunique con el residente o la profesional de SST, quienes le colaborarán con el acompañamiento necesario.

Sin otro particular, quedamos atentos a su gestión dentro del tiempo establecido.

REPRESENTANTE LEGAL

LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ
CÉDULA: 1.049.603.584 DE TUNJA

COLABORADOR

Jaime Fonseca
JAIME FONSECA
DOC. ID. 4.287.474

CRISTIAN F. HEREDIA ALBA
MEDICO ESP. SALUD OCUPACIONAL
RM. 15367/2013
LIC. S.O. 1958 /2015

26 de Mayo de 2026

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

NOMBRES		**Mario Barrera Castillo**				
TIPO DE DOCUMENTO		C.C 4.130.793 Guateque Boyacá				
FECHA DE NACIMIENTO		21 de Abril de 1962				
EDAD		64 años				
EPS		Nueva EPS SA				
EMPRESA		INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S				
CARGO A OCUPAR		Oficial de Construcción				
TALLA	1.82 mts	**PESO**	71 kg	**IMC**	21.40	
ANTEC.DE IMPORTANCIA		NO				
APOYO VISUAL		Gafas				
ENFASIS OSTEOMUSCULAR		SIN ALTERACIONES OSTEOMUSCULARES ACTUALES				
DIAGNOSTICOS		1. SIN SIGNOS DE COVID-19 (INMUNIZADO OCT/22) 2. IMC 21.40 PESO SALUDABLE 3. OSTEOMUSCULAR SANO 4. I 875				
CALIFICACIÓN		**PUEDE REALIZAR LABORES DEL CARGO SIN RESTRICCIONES**				
RECOMENDACIONES		1. ALIMENTACION BALANCEADA RICA EN FRUTAS Y VERDURAS, BAJA EN GRASAS Y CARBOHIDRATOS 2. EJERCICIO 2-3 VECES A LA SEMANA 3. HIGIENE POSTURAL 4. USO DE EPP 5. PAUSAS ACTIVAS Y VISUALES 6. MASAJES EN MSIS				
CONTRAINDICACIONES		NINGUNA				

Cristian F. Heredia Alba
MED. GENERAL RM. 15367/13
ESP. SALUD OCUPACIONAL
LIC. 1958/15

CRISTIAN FERNEY HEREDIA ALBA
MEDICO ESP SALUD OCUPACIONAL
RM. 15367/2013
LIC. S.O. 1958 /2015

Dr.CristianHeredia
mdheredia23@gmail.com
Cel.: 314-3013578
Centro cívico y Comercial Plaza Real oficina 240

ANEXO No. 4.1.3
INDUCCIONES

PSI INGENIEROS	INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN	CÓDIGO: HSEQ-FR-0124-09 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

NOMBRE DE QUIÉN INGRESA: Mario Barrero Castillo

DOCUMENTO: 4130793 **CARGO A DESEMPEÑAR:** Oficial.

INDUCCIÓN: (X) **REINDUCCIÓN:** ( ) **FECHA:** 23 05 26

OBJETIVO: Garantizar que el colaborador reciba, comprenda y registre la información esencial sobre la organización, sus políticas, procedimientos, valores, cultura organizacional, normas de seguridad y demás aspectos relevantes que le permitan integrarse de manera efectiva, segura y alineada a los objetivos institucionales, ya sea como nuevo ingreso (inducción) o como parte de un proceso de actualización o cambio interno (reinducción).

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD	SI	NO
¿Recibió información sobre la misión, visión, objetivos y valores de la empresa?	X	
¿Le explicaron claramente la estructura organizacional de la empresa?	X	
¿Conoce a quién debe acudir en caso de dudas relacionadas con su cargo o funciones?	X	
¿Le informaron sobre los horarios, políticas de puntualidad y control de asistencia?	X	
¿Se le presentó el reglamento interno de trabajo?	X	
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**NO**
¿Recibió información sobre los riesgos asociados a su puesto de trabajo?	X	
¿Le explicaron los protocolos de emergencia y evacuación?	X	
¿Conoce las rutas de evacuación y los puntos de encuentro?	X	
¿Sabe a quién acudir en caso de accidente/incidente laboral y el procedimiento para reportar?	X	
¿Le mostraron el uso correcto de los elementos de protección personal (EPP) y las consecuencias de no usarlos de manera correcta?	X	
¿Le informaron sobre las pausas activas y su importancia para la salud?	X	
¿Le explicaron cómo reportar condiciones o actos inseguros?	X	
MEDIO AMBIENTE	**SI**	**NO**
¿Le explicaron cómo separar correctamente los residuos generados en su lugar de trabajo?	X	
¿Le indicaron prácticas para ahorrar energía, agua u otros recursos en el trabajo?	X	
¿Está informado sobre la política ambiental de la empresa?	X	
¿Sabe a quién acudir para reportar un derrame y otra situación que afecte el medio ambiente?	X	
CONTROL DE INDUCCIÓN	**SI**	**NO**
¿Considera que la información fue explicada de forma clara y fácil de entender?	X	
¿Le dieron espacio para hacer preguntas si algo no fue claro?	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA COLABORADOR

Nombre: Mario Barrero
Documento: 4130793

FIRMA ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Nombre: Julio Bladimir Paipilla
Documento: 7318490

ANEXO No. 4.1.4.
SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE EPP'S

PSI INGENIEROS	ENTREGA, REPOSICIÓN Y CONTROL DE EPP'S	CÓDIGO: HSEQ-FR-0124-12
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

OBJETIVO: Registrar la entrega, reposición y verificación del uso y estado de los EPP, para asegurar la protección del trabajador y el cumplimiento del SG-SST.

OBJETO DEL CONTRATO:
"MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

ENTREGADO POR: Mario Bladimir Pinzon **MES/AÑO:** Mayo 2026.

Colaborador	Fecha	Tipo EPP	Cantidad	Estado Nuevo/Reposición	Firma	Observación
Mario Barrera	23/05/26	Botas	1	Nuevo	Mario B	
Mario Barrera	23/05/26	casco	1	Nuevo	Mario B	
Mario Barrera	23/05/26	Gafas	1	Nuevo	Mario B	
Mario Barrera	23/05/26	Tapabocas	1	Nuevo	Mario B	
Mario Barrera	23/05/26	Tapabocas	1	Nuevo	Mario B	
Mario Barrera	23/05/26	Tapabocas	1	Nuevo	Mario B	
Mario Barrera	23/05/26	overol	1	Nuevo	Mario B	

ANOTACIÓN: Al firmar el presente formato, declaro haber recibido los Elementos de Protección Personal (EPP) relacionados, en buen estado, y me comprometo a usarlos correctamente y a reportar cualquier daño o pérdida.

ANEXO No. 4.1.5.
PREOPERACIONALES

PSI INGENIEROS	Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: No. 00
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Código: FR-GS-016
		Fecha: 02-02-24

Responsable: Claudio Bladimir Pangueva

Fecha de la inspección: del 04 al 09 de mayo del 2025

#	HERRAMIENTA	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
1	TALADROS	✓			
2	LLAVES DE EXPANSIÓN	✓			
3	LLAVES MIXTAS	✓			
4	MARTILLOS	✓			
5	CARRETILLA DE MANO	✓			
6	PICAS	✓			
7	MAZOS	✓			
8	ALICATES	✓			
9	PINZAS DE PRESIÓN	✓			
10	DESTORNILLADORES	✓			
11	PALAS	✓			
12	CINCELES	✓			
13	LLANAS	✓			
14	MANGUERAS	✓			
15	PLOMADAS	✓			
16	METROS	✓			
17	NIVELES	✓			
18	RATCHES	✓			
19	PULIDORAS	✓			
20	GUADAÑA	✓			
21	SEGUETAS	✓			
22	ESCALERAS	✓			
23	BROCAS	✓			
24	LIJADORAS	✓			
25	CORTADORA	✓			
26					
27					
28					
29					
30					
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	✓			
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	✓			
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	✓			
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	✓			
	Todas las herramientas cumplen con las condiciones mínimas para la ejecución de las labores en obra.	✓			
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	✓			

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE			OBSERVACIONES

Firma Responsable:

Claudio Bladimir Pangueva
Profesional SST

	Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: No. 00
PSI INGENIEROS	FORMATO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Código: FR-GS-016
		Fecha: 02-02-24

Responsable: Aurelio Ricardo Pacheco

Fecha de la inspección: Del 11 al 16 de mayo del 2026

#	HERRAMIENTA	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
1	TALADROS	X			
2	LLAVES DE EXPANSIÓN	X			
3	LLAVES MIXTAS	X			
4	MARTILLOS	X			
5	CARRETILLA DE MANO	X			
6	PICAS	X			
7	MAZOS	X			
8	ALICATES	X			
9	PINZAS DE PRESIÓN	X			
10	DESTORNILLADORES	X			
11	PALAS	X			
12	CINCELES	X			
13	LLANAS	X			
14	MANGUERAS	X			
15	PLOMADAS	X			
16	METROS	X			
17	NIVELES	X			
18	RATCHES	X			
19	PULIDORAS	X			
20	GUADAÑA	X			
21	SEGUETAS	X			
22	ESCALERAS	X			
23	BROCAS	X			
24	LIJADORAS	X			
25	CORTADORA	X			
26					
27					
28					
29					
30					
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X			
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X			
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X			
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X			
	Todas las herramientas cumplen con las condiciones mínimas para la ejecución de las labores en obra.	X			
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X			

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE			OBSERVACIONES

Firma Responsable:

Aurelio Ricardo Pacheco
Profesional SST

PSI INGENIEROS	Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: No. 00
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Código: FR-GS-016
		Fecha: 02-02-24

Responsable: Guido Ordeñana Vásquez

Fecha de la inspección: 19 al 23 de mayo de 2025

#	HERRAMIENTA	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
1	TALADROS	X			
2	LLAVES DE EXPANSIÓN	X			
3	LLAVES MIXTAS	X			
4	MARTILLOS	X			
5	CARRETILLA DE MANO	X			
6	PICAS	X			
7	MAZOS	X			
8	ALICATES	X			
9	PINZAS DE PRESIÓN	X			
10	DESTORNILLADORES	X			
11	PALAS	X			
12	CINCELES	X			
13	LLANAS	X			
14	MANGUERAS	X			
15	PLOMADAS	X			
16	METROS	X			
17	NIVELES	X			
18	RATCHES	X			
19	PULIDORAS	X			
20	GUADAÑA	X			
21	SEGUETAS	X			
22	ESCALERAS	X			
23	BROCAS	X			
24	LIJADORAS	X			
25	CORTADORA	X			
26					
27					
28					
29					
30					
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X			
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X			
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X			
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X			
	Todas las herramientas cumplen con las condiciones mínimas para la ejecución de las labores en obra.	X			
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X			

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE			OBSERVACIONES

Firma Responsable:

Guido Ordeñana Vásquez
Profesional SST

PSI INGENIEROS	Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: No. 00
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Código: FR-GS-016
		Fecha: 02-02-24

Responsable: Saulo Bladimir Burgos

Fecha de la inspección: Del 25 al 3 de mayo de 2026

#	HERRAMIENTA	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
1	TALADROS				
2	LLAVES DE EXPANSIÓN				
3	LLAVES MIXTAS				
4	MARTILLOS				
5	CARRETILLA DE MANO				
6	PICAS				
7	MAZOS				
8	ALICATES				
9	PINZAS DE PRESIÓN				
10	DESTORNILLADORES				
11	PALAS				
12	CINCELES				
13	LLANAS				
14	MANGUERAS				
15	PLOMADAS				
16	METROS				
17	NIVELES				
18	RATCHES				
19	PULIDORAS				
20	GUADAÑA				
21	SEGUETAS				
22	ESCALERAS				
23	BROCAS				
24	LIJADORAS				
25	CORTADORA				
26					
27					
28					
29					
30					
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X			
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X			
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X			
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X			
	Todas las herramientas cumplen con las condiciones mínimas para la ejecución de las labores en obra.	X			
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X			

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE			OBSERVACIONES

Firma Responsable:

Saulo Bladimir Burgos
Supervisor SST

ANEXO No. 4.1.6.
INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO

PSI INGENIEROS	FORMATO ORDEN Y ASEO	CÓDIGO: HSEQ-FR-0124-17 VERSIÓN: V-00 Página: 1 de 1

Proyecto: (Indique con X según corresponda)	SI X	NO ( )	Lugar / Proyecto:	HVO-030-2025	
Área a inspeccionar:	Frente de obra			Fecha de inspección:	20-05-26
Responsable:	Camilo Bedoya Pequeño			Cargo:	Profesional SST

INDICADOR A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
La oficina / contenedor se encuentra aseado y ordenado.	X			
Las herramienta y equipos se encuentran almacenados en el sitio demarcado y señalizado para ello.	X			
El sitio donde se ejecutan labores / área de trabajo se encuentran aseadas y ordenadas.		X		Se observa desorden
Los baños se encuentran aseados, limpios, libres de olores desagradables y con los accesorios y utencilios necesarios para su uso.	X			
Los elementos de protección personal asignados a cada uno de los empleados se encuentran limpios.	X			
Los cajones se encuentran ordenados y aseados.	X			
Los materiales se encuentran almacenados de forma correcta (Menos de 1,60 mts de altura si está apilado), ubicado en estantes, sitio de almacenamiento limpio, ordenado, señalizado, demarcado.	X			
Se evidencia señalización y demarcación de áreas, senderos peatonales, espacios de trabajo, peligros, riesgos.	X			
Las rutas de evacuación se encuentran limpias y libres de obstáculos.	X			
Los pisos se encuentran aseados, secos y libres de objetos.			X	
No se evidencia comida en las áreas de trabajo.		X		
Las ventanas están limpias, libres de polvo o suciedad y permiten la entrada de luz natural	X			
Las paredes están limpias, su pintura en buen estado y sin desgastes de ninnguna clase.			X	
Se evidencia desprendimiento o cualquier daño o deterioro en los techos.		X		
Los cables y enchufes se encuentran organizados, en buen estado, y no representan un riesgo de caida, incendio o cualquier otro accidente.	X			
La obra se encuentra libre de cinta peligro en el piso, garantizando áreas organizadas.	X			
El personal cuenta con vestimenta limpia, adecuada, buen aseo personal y buenas prácticas de aseo.	X			
Las áreas de disposición de residuos se encuentran en puntos específicos y estratégicos, con los residuos dispuestos de manera correcta. Además son entregados al vehículo recolector de acuerdo al dia, horano y ruta establecida para el sector.	X			
Existe un archivo para organizar la documentación de la empresa y este, se encuentra totalmente ordenado.	X			

PLAN DE ACCIÓN

HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL SST

ANEXO No. 4.1.7.
CAPACITACIONES SST

PSI INGENIEROS	ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	CÓDIGO: HSEQ-FR-0124-15
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

NOMBRE RESPONSABLE:	Camilo Vladimir Pacheco				
DOCUMENTO:	7318490	**CARGO:**	Profesional SST		
SST	(x)	**AMBIENTAL:**	( )	**FECHA:**	21-05-26
TEMA:	Uso seguro de motosierra pesada			**DURACIÓN:**	15 min

OBJETIVO: Registrar y controlar la asistencia del personal a las capacitaciones en SST y gestión ambiental, como evidencia de su formación en prevención de riesgos y responsabilidad ambiental.

NOMBRE COLABORADOR	CÉDULA	FIRMA
EDWARDO MORALES	1052790067	
Pablo Salamanca Mendoza	72326961	Pablo Salamanca M.
Emtega	72324884	Emtega
Mauricio Gómez	1023036108	Mauricio G.
Luis Pinto Ramos	1049779 874	
carlos perez	6424123	carlos

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Nombre: Camilo Vladimir Pacheco

Documento: 7318490

PSI INGENIEROS	ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	CÓDIGO: HSEQ-FR-0124-15 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

NOMBRE RESPONSABLE:	Cmdo Bladimir Parqueo				
DOCUMENTO:	7318490	**CARGO:**	Profesional SST		
SST	(x)	**AMBIENTAL:**	( )	**FECHA:**	7-05-26
TEMA:	Actos y condiciones inseguras.			**DURACIÓN:**	15 min

OBJETIVO: Registrar y controlar la asistencia del personal a las capacitaciones en SST y gestión ambiental, como evidencia de su formación en prevención de riesgos y responsabilidad ambiental.

NOMBRE COLABORADOR	CÉDULA	FIRMA
ABMARO MORALES	1052790067	
Mauricio Gomez	1023036108	Mauricio G
Pbb salamanca Mendoza	723 26961 Pbb	Pbb salamanca M.
Carlos perez	6424123	carlos
Luis Dinto Ramos	1044 797 274	
Emilio	72324884	Emilio C

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Nombre: Cmdo Bladimir Parqueo

Documento: 7318490

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

COPIA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y PERMISOS AMBIENTALES

ING. JORGE ESTEBAN CUPA BERNAL

Secretario de Planeación, Infraestructura y Control Interno.

Carrera 6 No. 9—18

GUATEQUE — BOYACA

Resolución No 019 del 22 JULIO de 2025

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA

Número de Licencia:	15322-025-041
Dirección	C 13 1 S 179
Barrio:	LIBERTADOR
Vigencia de la Licencia:	22 de Julio de 2025
A:	21 de Julio de 2028
Área Total Construida:	617.07
Uso:	**MULTIPLE ESPECIAL**
Número de pisos:	1ER PISO ESCENARIO LUDICO (1)
Propietarios:	MUNICIPIO DE GUATEQUE
Diseño Arquitectónico	Arq. **DANIEL SEBASTIAN TENJO PINEDA** **A31472015-1049632766**
Diseño Estructural	Ing. **LUIS ORLANDO BARON** **091037-0556866 CND**
Responsable de la obra	MUNICIPIO DE GUATEQUE

RESOLUCIÓN N. 019
(JULIO 22 DE 2025)

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA DE CONSTRUCCION EN MODADLIDAD OBRA NUEVA EN EL PREDIO CON CÓDIGO CATASTRAL NÚMERO **15322010001070001000 MATRICULA** INMOBILIARIA NÚMERO **079-28589** UBICADO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE.

El suscrito Secretario de Planeación de Guateque – Boyacá, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere la ley 66 de 1968, la ley 388 de 1997, la ley 675 de 2001, el Acuerdo Municipal N° 001 de 2015, Decreto 1469 de 2010, el Decreto 1077 de 2015, modificado por los Decretos 2095 de 2015 y 2218 de 2015 y 1547 de 2015, Decreto No. 1783 de 2021 y el Decreto de nombramiento No. 080 de Julio 02 de 2024,

C O N S I D E R A N D O

Que el día veintidós (22) de Julio de 2025, fue abierto por el Despacho de la Oficina de Planeación el expediente No.019 correspondiente al trámite de expedición de licencia de Construcción en modalidad obra nueva en el predio con código catastral número **15322010001070001000 y** matricula inmobiliaria número **079-28589, ubicado** en C 13 1 S 179 barrio LIBERTADOR , de propiedad del MUNICIPIO DE GUATEQUE, identificado con Nit, 800.013.683-9, representado legalmente por **DAVID FRANCISCO MORALES CASTILLO,** mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía número 80.871.562 expedida en Bogotá, posesionado mediante Acta No. 16 del libro de actas que se lleva en la Notaría única del Círculo de Guateque, con funciones a partir del 01 de enero de 2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en la Constitución Política de Colombia, ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012, ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 sus Decretos Reglamentarios, actuando en nombre y representación del Municipio de Guateque, con NIT 800.013.683-9, y en atención a lo consagrado en al artículo 94 de la ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015.

Que se debe dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 015 de 2019 "***ARTICULO SEGUNDO:*** *La secretaria de planeación municipal deberá exhortar a quienes soliciten la respectiva licencia de construcción a no usar materiales que contengan asbesto en cualquiera de sus presentaciones*".

Que en cumplimiento de lo dispuesto en la normatividad vigente a este respecto fueron notificados los vecinos colindantes de los predios identificados en el primer considerando. Dentro de los términos de ley, ante este despacho no fue presentada ninguna objeción relativa al desarrollo de las obras objeto de la presente resolución.

Que los planos arquitectónicos y estructurales cumplen con los requisitos exigidos en la ley 400 de 1997 y norma sismo-resistente NSR-10.

Que los diseños, planos, estudios y demás NO controvierten las normas urbanísticas del Municipio.

Que el inmueble se encuentra en el perímetro Urbano y tiene disponibilidad inmediata de servicios públicos, tal como se demuestra con las certificaciones y/o facturas correspondientes, expedidas por la Dirección Administrativa de Públicos Domiciliarios y la Empresa de Energía Eléctrica de Boyacá.

Por lo anteriormente expuesto, la secretaria de Planeación Municipal.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Otorgar **LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE UNA EDIFICACION DE MODALIDAD DE OBRA NUEVA DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ",** en el predio con código catastral **153220100010700010000** y matricula inmobiliaria número **079-28589,** ubicado en la C 13 1 S 179 barrio LIBERTADOR ", perímetro Urbano del Municipio de Guateque de propiedad del Municipio de Guateque, con Nit número 800013683-9, representante legal Ingeniero **DAVID FRANCISCO MORALES CASTILLO**, identificado con cedula de ciudadanía numero 80871562 expedida en Bogotá. **ARTÍCULO SEGUNDO**: La licencia otorgada en el artículo anterior, estará sujeta a las siguientes condiciones especiales:

- Uso: **MULTIPLE ESPECIAL**

- Vigencia: Treinta y seis (36) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente Resolución. de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente a este respecto.
- La solicitud de prórroga deberá presentarse dentro del curso de los últimos 30 días hábiles antes del vencimiento de la respectiva licencia.

- Características básicas del proyecto:

AREA DEL LOTE	6.400.00	Mtrs²
AREA EXISTENTE 1ER PISO	685.82	Mtrs²
TOTAL, AREA CONSTRUIDA EXISTENTE	1.633.05	Mtrs²
AREA 1ER PISO ESCENARIO LUDICO	617.07	Mtrs²
TOTAL, AREA 1ER PISO	617.07	Mtrs²
TOTAL, AREA CONSTRUIDA	2.250.12	Mtrs²

- INDICE DE OCUPACION 0.35
- INDICE DE CONSTRUCCION 0.35

ARTÍCULO TERCERO: De la presente resolución hacen parte integral los siguientes planos y estudios:

Planos Arquitectónicos y Estructurales

PLANO No.	DESCRIPCION
1/19	PLANO DIVISION POLITICA GUATEQUE BOYACA LOCALIZACION GENERAL PRIMER PISO
2/19	PLANO DIVISION POLITICA GUATEQUE BOYACA LOCALIZACION ESPECIFICA PIMER PISO, LOCALIZACION ESPECIFICA CUBIERTA
3/19	PROGRAMA ARQUITECTONICO
4/19	PLANO DE DEMOLICIONES
5/19	PLANTA GENERAL 1ER PISO
6/19	PLANTA DE CUBIERTAS
7/19	PLANTA GENETAL 1ER PÍSO
8/19	PLANTA GENETAL CUBIERTAS
9/19	FACHADA NORTE, FECHADA ORIENTE
10/19	FACHADA SUR FACHADA OCCIDENTE
11/19	CORTE A CORTE B
12/19	CORTE C CORTE D
13/19	DETALLE DE MURO DE CERRAMIENTO
14/19	DETALLE DE RAMPAS Y ESCALERAS
15/19	DETALLE DE ESCALERAS, DETALLE DE SCREENPANEL XL
16/19	DETALLE DE TARIMA Y ASTA DE BANDERAS
17/19	DETALLE DE ACCESIBILIDAD
18/19	DETALLE DE MALLA CONTRA INPACTO
19/19	PLANO DE RUTA DE EVACUACION
1/3	PLANTA ELECTRICA DIAGRAMA UNIFILIAR GENERAL, PLANTA DE ILUMINACION
2/3	PLANTA ELECTRICA DIAGRAMA UNIFILIAR GENERAL, PLANTA DE ILUMINACION
3/3	APANTALLAMIENTO, DETALLES DE APANTALLAMIEMIENTO, DISTRIBUCION DE PUNTAS CAPTADORAS
1/11	PLANTA DE CIMENTACION, DETALLES ESTRUCTURALES DE CIMENTACION, PLANTA DE ANCLAJES DE ESTRUCTURA METALICA
2/11	PLANTA DE VIGAS DE CORONA PLANTA DE CUBIERTA, DETALLES ESTRUCTURALES
3/11	ALZAD PORTICOS ESTRUCTURALES EJES AYB, DETALLES DE CONEXIONES, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESTRUCTURA
4/11	ALZADO PORTICOS ESTRUCTURALES EJES 1 Y 7, DETALL4ES DE CONEXIONES ESPECOIFICACIONES TECNICAS DE LA ESTRUCTURA
5/11	DESPIECES DE ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA METALICA, ESPECIFICACIONES DE MATERIALES DE LA INFRAESTRUCTURA METALICA
6/11	VISTA ISOMETRICA DE LA ESTRUCTURA, ALZADO PORTICOS EJES 2-6, CANTIDADES DE MATERIALES METALICA, DETALLES DE CONEXIONES METALICAS
7/11	PLANTA DE VIGA CIMENTACION MURO DE CERRAMIENTO, DETALLES ESTRUCTURALKES DE CIMENTACION, CORTE EN ALZADO DEL MURO DE CERRAMIENTO, DDESPUEDE ACEROS VGA CIMENTACION – VGA SOBRE MURO- COLUMNA PILOTE
8/11	DETALLES ESTRUCTURALES DE CIMENTACION CERRAMIENTO MALLA CONTRA IMPACTO, CORTE EN ALZADO DE CERRAMIENTO MALLA CONTRA INPACTO- DESPIECE ACEROS VGA CIMENTACION PILOTE
9/11	DETALLES ESTRUCTURALES DE CIMENTACION RAMPA DE ACCESO -PLATAFORMA DE IZADO, CORTE EN ALZADO DE RAMPA DE ACCESO-PLATAFORMA DE IZADO, DESPIECE ACEROS VGA CIMENTACION, DETALLES DE ESCALERAS, DISTRIBUCION DE PLANTAS MAMPOSTERIA REFORZADA DISTRIBICION DE PLANTA MALLA ELECTROSOLDADA, VISTA FRONTAL Y POSTERIOR PLATAFORMA DE IZADO, DETALLE LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL

10/11	DETALLES ESTRUCTURALES DE CIMENTACION RAMPA DE ACCESO-PLATAFORMA DE IZADO, CORTE DE ALZADO DE RAMPA DE ACCESO, PLATAFORMA DE IZADO DESPIECE ACEROS VGA CIMENTACION DETALLES ESCALERA, DISTRIBUCION DE PLANTA MAMPOSTERIA REFORZADA DISTRIBUCION EN PLANTA MALLA ELECTROSOLDADA VISTA FRONTALK Y POSTERIOR PLATAFORMA DE IZADO DETALLE LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL
11/11	DETALLE MALLA TEJIDA EN NYLON PARA ESCENARIO DEPORTIVO, DETALLE TENSOR Y GRILLETE
1/3	PLANTA GENERAL DISEÑO HIDROSANITARIO PLUVIAL
2/3	AXONOMETRIA REDES HIDRAULICAS PLUVIALES DETALLES
3/3	PLANTA GENERAL DISEÑO HIDROSANITARIO PLUVIAL

ARTÍCULO CUARTO: Reconocer como responsable del diseño: **ARQUITECTÓNICO** al Arquitecto **DANIEL SEBASTIAN TENJO PINEDA,** identificado con cedula de ciudadanía número 1.049.632.766 y Matrícula Profesional No. **A31472015-1049632766** y **ESTRUCTURAL** al Ingeniero **LUIS ORLANDO BARON,** identificado con cedula de ciudadanía número 7.179.630 y Matrícula Profesional No. **091037-0556866 CND**

ARTICULO QUINTO: El acceso peatonal publico quedara por fuera del cerramiento del nuevo proyecto objeto de esta licencia.

ARTÍCULO SEXTO: se expide en relación a los requisitos exigidos por la Gobernación de Boyacá para financiamiento de proyectos con recursos del Sistema General de Regalías, la cual obedece a viabilidad técnica emitida por esta.

ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la licencia que se otorga deberá ejecutar las obras autorizadas garantizando la salubridad de las personas, la estabilidad de los terrenos y edificaciones y los elementos constitutivos del espacio público, lo mismo que las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas que se deriven de la misma. En consecuencia, será responsable frente al municipio y/o a terceros por los perjuicios causados con motivo de dicha ejecución.

ARTÍCULO OCTAVO: En los términos previstos en la normatividad vigente a este respecto, el titular de la presente diligencia deberá fijar en lugar visible desde la vía pública, una valla de una dimensión mínima de 0.70 m x 0.50 m en la cual se debe incluir, por lo menos, la siguiente información:

- Clase de licencia.
- Número de la licencia y autoridad que la expidió.
- Dirección del inmueble.
- Vigencia de la licencia.
- Nombre del titular.

Descripción del tipo de obra que se adelanta, haciendo referencia especialmente al uso o usos autorizados, metros de construcción, altura total de las edificaciones, número de estacionamientos y número de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos.

ARTÍCULO NOVENO : El titular de la presente licencia deberá mantener a disposición de las autoridades y en el sitio de la obra que aquí se autoriza, la presente resolución junto con los planos sellados y aprobados, que hacen parte de la misma.

ARTÍCULO DECIMO : El titular de la licencia debe cumplir con lo establecido en el Decreto Nacional 1077 de 2015, *"ARTICULO 2.2.6.1.2.3.6 Obligaciones del titular de la licencia. (...)*

1. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vpecinas y de los elementos constitutivos del espacio público.

2. Cuando se trate de licencias de urbanización, ejecutar las obras de urbanización con sujeción a los proyectos técnicos aprobados y entregar y dotar las áreas públicas objeto de cesión gratuita con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público, de acuerdo con las especificaciones que la autoridad competente expida.

3. Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente.

4. Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Médio Ambiente, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el decreto único del sector ambiente y desarrollo sostenible en materia de licenciamiento ambiental.

5. Cuando se trate de licencias de construcción, solicitar el Certificado de Permiso de Ocupación al concluir las obras de edificación en los términos que establece el artículo 2.2.6.1.4.1 del presente decreto.

6. Someterse a una supervisión técnica en los términos que señalan las normas de construcción sismo resistentes, siempre que la licencia comprenda una construcción de una estructura de más de tres mil (3.000) metros cuadrados de área.

7. Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y elementos no estructurales que señalan las normas de construcción sismo resistentes, siempre que la licencia comprenda la construcción de una estructura menor a tres mil (3.000) metros cuadrados de área.

8. Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

9. Dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida.

10. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo resistente vigente. (...)"

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición ante el jefe de la Oficina de Planeación Municipal y de apelación ante el alcalde municipal, en los términos de Ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la Secretaria de Planeación, a los Veintidós (22) días del mes de Julio del año dos mil veinticinco (2025).

ING. JORGE ESTEBAN CUPA BERNAL
Secretario de planeación, infraestructura y control interno.
Guateque – Boyacá

Reviso: Ing., Jorge Esteban Cupa B.
Elaboro: Monica Lozano

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE.

HACE CONSTAR QUE

Que la Resolución No. 019 correspondiente a la Licencia de construcción en modalidad de obra nueva en el predio con **CEDULA CATASTRAL** No. **15322010001070001000** y **MATRICULA 079-28589** del veintidós (22) de Julio de 2025 expedida por este despacho, fue notificado al titular a los Veintitrés (23) días del mes de Julio del año en curso, quien renunció expresamente a los términos de ejecutoría del acto administrativo notificado, quedando firme a partir del mismo día.

Se firma en el Municipio de Guateque a los Veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2025

ING. JORGE ESTEBAN CUPA BERNAL
Secretario de Planeación, Infraestructura y Control Interno

22.9.1 SPICI

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

En Guateque a los Veintitrés (23) días del mes de Julio del año dos mil veinticinco (2025), se hizo presente el **DAVID FRANCISCO MORALES CASTILLO,** mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía número 80.871.562 expedida en Bogotá, posesionado mediante Acta No. 16 del libro de actas que se lleva en la Notaría única del Círculo de Guateque, con funciones a partir del 01 de enero de 2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en la Constitución Política de Colombia, ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012, ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 sus Decretos Reglamentarios, actuando en nombre y representación del Municipio de Guateque, con NIT 800.013.683-9, con el fin de notificarle personalmente la Resolución No 019 de Julio Veintidós (22) de 2025 mediante la cual se le concede una licencia de construcción de edificación en un predio ubicado en la C 13 1 S 179 barrio LIBERTADOR

Para tal efecto se hace entrega de un original del texto mencionado Acto Administrativo.

El Notificado,

DAVID FRANCISCO MORALES CASTILLO
C.C. 80.871.562 expedida en Bogotá

Quien notifica,

JORGE ESTEBAN CUPA BERNAL
Secretario de Planeación, Infraestructura y Control Interno.

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

REGISTRO DE USO CORRECTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (ENTREGA DE DOTACIONES, PLANILLAS, FOTOS, ETC.)

ANEXO No. 4.1.4.
SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE EPP'S

PSI INGENIEROS	ENTREGA, REPOSICIÓN Y CONTROL DE EPP'S	CÓDIGO: HSEQ-FR-0124-12
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

OBJETIVO: Registrar la entrega, reposición y verificación del uso y estado de los EPP, para asegurar la protección del trabajador y el cumplimiento del SG-SST.

OBJETO DEL CONTRATO:
"MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

ENTREGADO POR: Mario Bladimir Pinzon **MES/AÑO:** Mayo 2026.

Colaborador	Fecha	Tipo EPP	Cantidad	Estado Nuevo/Reposición	Firma	Observación
Mario Barrera	23/05/26	Botas	1	Nuevo	Mario B	
Mario Barrera	23/05/26	casco	1	Nuevo	Mario B	
Mario Barrera	23/05/26	Gafas	1	Nuevo	Mario B	
Mario Barrera	23/05/26	Tapabocas	1	Nuevo	Mario B	
Mario Barrera	23/05/26	Tapabocas	1	Nuevo	Mario B	
Mario Barrera	23/05/26	Tapabocas	1	Nuevo	Mario B	
Mario Barrera	23/05/26	overol	1	Nuevo	Mario B	

ANOTACIÓN: Al firmar el presente formato, declaro haber recibido los Elementos de Protección Personal (EPP) relacionados, en buen estado, y me comprometo a usarlos correctamente y a reportar cualquier daño o pérdida.

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (SEGUIMIENTO DE FICHAS AMBIENTALES)

INFORME DE OBRA CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2026

PSI INGENIEROS S.A.S
MUNICIPIO DE GUATEQUE
2026.

INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO MENSUAL NÚMERO 3
COMPONENTE AMBIENTAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2026

PRESENTADO POR: LUIS EDUARDO SICHACÁ GAMEZ
R/L PSI INGENIEROS S.A.S

SUPERVISOR: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO

PSI INGENIEROS S.A.S
MUNICIPIO DE GUATEQUE
2026.

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS**
V 1.0	28/04/26	Emisión inicial PSI INGENIEROS S.A.S. para revisión y comentarios de la interventoría CONSORCIO INTERVALLE 2026 y la supervisión TIERRASUA S.A.S.

ELABORACIÓN PSI INGENIEROS S.A.S	**REVISIÓN** CONSORCIO INTERVALLE 2026 S.A.S	**APROBACIÓN** TIERRASUA S.A.S
 ING. RODRIGO ALBEIRO MENDIVELSO CELY **PROFESIONAL HSEQ CONTRATISTA** PSI INGENIEROS S.A.S	ING. JORGE ARMANDO CALDERÓN SANCHEZ **REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA** CONSORCIO INTERVALLE 2026	ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO **SUPERVISOR CONTRATANTE** TIERRASUA S.A.S.

ÍNDICE CONTENIDO

1. Resumen general del contrato 5
2. Descripción del proyecto 6
3. Componente ambiental 7
4. Actividades del pma 12
5. Conclusión 20
6. Lista de anexos 21

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación específica del proyecto 6
Ilustración 2. Ubicación del proyecto en Colombia 6
Ilustración 3. Capacitaciones ambientales 12
Ilustración 4. Manejo de materiales 13
Ilustración 5. Señalización y demarcación en obra 14
Ilustración 6. Instalación de punto ecológico 15
Ilustración 7. Campamento 17
Ilustración 8. Valla informativa del proyecto 18

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Resumen general contrato de obra 5
Tabla 2: Programas y fichas ambientales 7
Tabla 3. Capacitaciones ambientales 13

1. RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

Este capítulo presentará de manera organizada el conjunto de actos administrativos desarrollados en el marco de la ejecución contractual, abarcando desde su inicio hasta el estado actual. Se incluirán, entre otros, los registros correspondientes a suspensiones, prórrogas y adiciones presupuestales. A continuación, se expone la información consolidada para su respectivo control.

Tabla 1: Resumen general contrato de obra

INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA IPVO-030-2025	
PROCESO DE CONTRATACION:	LICITACIÓN PÚBLICA
NUMERO DE CONTRATO:	No. IPVO-030-2025
CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S
CONTRATISTA:	PSI INGENIERIOS S.A.S NIT. 900.928.849-4 R/L LUIS EDUARDO SICHACÁ GAMEZ C.C. 1.049.603.584 DE TUNJA
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
VALOR INICIAL:	DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MONEDA LEGAL (2.411.687.093,33).
PLAZO INICIAL:	A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA DE INICIO:	24 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fuente: Elaboración propia

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en el municipio de Guateque, Provincia de Oriente, departamento de Boyacá, específicamente en la Institución Educativa Técnica Valle de Tenza – Sede Campestre. El área de intervención se encuentra dentro del área urbana del municipio y sobre la vía que comunica a Guateque con el municipio de Sutatenza, lo cual facilita la accesibilidad y logística para la ejecución de las obras.

Región: Andina
Dirección: Zona Urbana
Municipio: Guateque
Altitud: 1815 M S. N. M
Coordenadas: 5°00′21″N 73°28′23″O

Suelo: Urbano
Departamento: Boyacá
Topografía: Inclinada
Clima: Cálido-Templado


Las siguientes ilustraciones muestran la localización aproximada del proyecto.

Ilustración 1. Ubicación específica del proyecto



Fuente: El proyecto

Ilustración 2. Ubicación del proyecto en Colombia

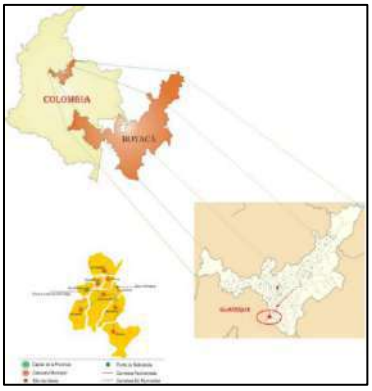

Fuente: El proyecto

3. COMPONENTE AMBIENTAL

El presente componente ambiental corresponde al seguimiento de las actividades ejecutadas durante el mes de mayo de 2026 por PSI INGENIEROS S.A.S., en calidad de contratista ejecutor del Contrato No. IPVO-030-2025, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y ambientales aplicables al proyecto, se dio continuidad a la implementación de las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental – PMA, el cual se encuentra conformado por seis (6) programas que integran dieciséis (16) fichas ambientales orientadas a la prevención, mitigación, control y seguimiento de los posibles impactos generados durante la ejecución de las actividades constructivas.

Durante el periodo evaluado se desarrollaron actividades asociadas a excavaciones, instalación de acero de refuerzo, fundiciones, acopio y manejo de materiales, así como medidas de contingencia y apuntalamiento en sectores específicos de la institución educativa, razón por la cual se mantuvo seguimiento permanente al cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos para el proyecto. En este sentido, se implementaron acciones relacionadas con manejo de residuos, señalización, control de materiales, funcionamiento de campamentos y sitios de acopio, atención a la comunidad, cultura vial y protección de las condiciones del entorno, procurando minimizar las afectaciones sobre la comunidad educativa y el área de influencia.

Así mismo, se continuó fortaleciendo las medidas de control, orden y seguimiento ambiental en obra, dando cumplimiento a las recomendaciones impartidas por la interventoría y promoviendo el adecuado desarrollo de las actividades constructivas conforme a la normatividad ambiental vigente y a los compromisos establecidos dentro del PMA.

Tabla 2: Programas y fichas ambientales

PROGRAMA 1 – DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	
FICHA N°1. CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL	Realizar seguimiento al cumplimiento de actividades contempladas en el Plan de Manejo Ambiental – PMA, dando cumplimiento a los requerimientos legales y operativos del contrato. Presentación de los informes establecidos, indicando los avances de cumplimiento de cada uno de los programas que conforman el presente PMA.
FICHA N°2. CAPACITACIÓN AMBIENTAL PARA EL PERSONAL DE OBRA.	Capacitación del personal de la obra de acuerdo al cronograma de capacitaciones.
FICHA N°3. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES.	El Profesional ambiental, antes del inicio de las obras debe verificar que el proyecto cumpla con todos los requerimientos legales, para lo cual, durante la etapa pre-constructiva, debe determinar y adelantar la gestión para obtener los permisos, concesiones, licencias y/o autorizaciones que requiera para la ejecución. Es responsabilidad del contratista, a través de su profesional ambiental, verificar y cumplir con los requerimientos establecidos en los actos administrativos mediante

	los cuales se otorgan los permisos. En los informes mensuales se deberá reportar el cumplimiento de los mismos, los cuales serán verificados por la interventoría. El contratista, puede adquirir los materiales de construcción a un tercero, al igual que disponer los escombros, en escombreras y/o predios autorizados, en ese caso, el especialista ambiental debe verificar que los proveedores cuenten con los correspondientes permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes, de conformidad con la normatividad.
PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
FICHA N°4. MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	Verificar que el transporte, almacenamiento y acopio del material se realice acorde con la normatividad vigente. Los materiales utilizados en el desarrollo de la obra serán adquiridos a terceros previa verificación que cuenten con los permisos y/o licencias ambientales o mineras vigentes. El almacenamiento de materiales como cemento, hierros, entre otros, se realizará en sitios específicos dispuestos para esta actividad, dentro del campamento de la obra. Llenar los vehículos destinados al transporte de escombros hasta su capacidad, cubrir la carga con una polisombra o plástico. Para mantener el aseo en la zona de trabajo, se realizarán jornadas de limpieza con el fin de reducir la emisión de partículas a la atmosfera. Durante el almacenamiento de los materiales serán cubiertos con polietileno o cualquier otro material impermeable. En caso de ocurrencia de lluvias, es conveniente cubrir materiales como arena con plástico y acondicionar alrededor de los montículos (acordonamiento), para evitar su dispersión y posibles afectaciones al área de influencia directa del proyecto.
FICHA N°5. EXPLOTACIÓN FUENTES DE MATERIALES	Todas las fuentes de materiales, de acuerdo con la normatividad vigente, requieren de concesión minera y de licencia ambiental para su explotación. Por lo anterior, los contratistas pueden adquirir los materiales a personas que cuenten con dichas autorizaciones u obtenerlos directamente para el proyecto. Dentro del PMA se debe anexar copia de los actos administrativos que otorgan dichos permisos, los cuales deben estar vigentes.
FICHA N°6. SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES.	DEMARCACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Se demarcarán las áreas de circulación y las excavaciones, con cinta o malla y/o colombinas, de manera, que se puede evitar la caída a un nivel inferior de los trabajadores, estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa. La señalización utilizada en el proyecto debe mantenerse limpia y en buen estado. Todo el personal tendrá que ser distinguido con overol e implementos de protección personal adecuados. INSTALACIONES TEMPORALES Se instalarán en el interior del campamento señales informativas y preventivas.
FICHA N°7. MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LODOS.	Reutilizar en obra materiales de excavaciones para la reconformación del terreno previa aprobación de la interventoría Los escombros deben ser retirados del frente de obra y transportados a los sitios autorizados para su disposición final. Las volquetas destinadas al transporte de escombros no deben ser llenadas por encima del borde superior del platón, la carga dentro de las volquetas deberá protegerse con carpas o polisombra debidamente aseguradas. Las volquetas destinas al transporte y disposición de material sobrante (especialmente escombros) deben seguir las rutas revisadas y aprobadas. La disposición final de escombros se debe realizar exclusivamente en el sitio autorizado por el municipio de Guateque para tal fin de acuerdo al uso de suelo. Las áreas que se emplearán para el almacenamiento temporal y cargue de escombros serán debidamente señalizadas, y el material será apilado y cubierto en forma tal, que evite la erosión eólica o el arrastre del mismo por la lluvia.

	La velocidad de las volquetas en vías locales no debe exceder los 20 Km. /hora y en las vías principales no deben pasar los 60km/hora. En caso de ocurrencia de lluvias, se deben cubrir los escombros con plástico y acondicionar alrededor de los montículos, para evitar axial su dispersión y posibles afectaciones al área de influencia directa del proyecto.
FICHA N°8. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES.	Para el almacenamiento de los residuos sólidos convencionales generados por las actividades que se adelantan en la obra, se deberá, disponer de un lugar específico en el campamento, el cual debe estar señalizado y protegido contra la acción, del viento y la lluvia. Para el manejo de residuos sólidos convencionales y de reciclaje y/o rehúso se empleará un código de colores así: • Blanco: residuos aprovechables limpios y secos. • Negro: residuos no aprovechables. En esta bolsa o recipiente deberán disponerse los residuos no aprovechables. • Verde: residuos orgánicos aprovechables. La recolección de los residuos al interior de la obra, se adelantarán con frecuencia dos veces por semana, sin embargo, de acuerdo a la cantidad de residuos generados en obra (siendo mínima) se realizará su traslado semanalmente para la entrega al vehículo recolector. Se realizarán campañas de orden, aseo y limpieza, teniendo en cuenta la recolección tanto de basuras como de materiales de construcción. No se realizarán vertimientos de combustibles o aceites en cuerpos de agua. No se realizará lavado, reparación y mantenimiento de vehículos en el sitio de la obra o en zonas verdes. Manejo de Residuos Peligrosos: Si durante el proyecto se genera cualquier tipo de residuo que se enmarque en la definición de residuos peligrosos, sepárelo de los demás tipos de residuos y envíelos a incineración en una empresa autorizada.
PROGRAMA 3. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	
FICHA N°10. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES.	Los derrames o fugas de insumos y materiales peligrosos, dentro o fuera de los sitios de almacenamiento, deben recolectarse, almacenarse y ser enviados a tratamiento con una empresa especializada que cuente con las autorizaciones del caso, con el fin de evitar la contaminación del suelo. Adecue un sitio especial para el almacenamiento de materiales, lo más alejado posible de cuerpos de agua. Prohibido el lavado de maquinaria y equipos en los cursos de agua. No se realizarán vertimientos en cuerpos hídricos relacionados con el proyecto. Se garantiza el servicio de baño para el personal (1 por cada 15 trabajadores), arrendamiento de baños circunvecinos, los cuales deben contar con las características de higiene y limpieza permanentemente.
PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	
FICHA N°11. MANEJO DEL DESCAPOTE Y LA COBERTURA VEGETAL.	Minimizar la afectación sobre la cobertura en las áreas a intervenir Garantizar que los trabajadores cuenten con la debida capacitación antes del inicio de las actividades de descapote, y asegurar que todo el personal emplee adecuadamente los elementos de protección personal. Recolectar y acopiar el material vegetal removido. Prohibir el tránsito de maquinaria en vegetación que no esté dentro del área de intervención
PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
FICHA N°15. INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO.	Disponer de áreas temporales utilizadas como sitios de parqueo de maquinaria y acopios de materiales sobrantes producto de excavaciones, demoliciones y derrumbes. El campamento será ubicado preferiblemente en un área que no requiere apertura de caminos, remoción de vegetación ni descapotes. El campamento de obra y frentes de trabajo se deberá proveer de extintores para control incendios, de acuerdo con el panorama de riesgos.

	Desmantelamiento de áreas temporales: Se realizará dejando en iguales condiciones a las iniciales. Medidas para proteger a la comunidad educativa: a) Delimitación y control de acceso Instalación de cerramiento provisional o aislamiento físico del área de intervención. Señalización preventiva visible (obra en ejecución, prohibido el paso, uso de EPP, riesgo de excavación). Control de ingreso únicamente a personal autorizado. Organización segura del almacenamiento de materiales y herramientas. b) Manejo de excavaciones Protección perimetral de excavaciones activas. Cubrimiento o aseguramiento al finalizar la jornada cuando aplique. Supervisión permanente durante actividades críticas. c) Control de ruido Programación de actividades de mayor emisión sonora en horarios coordinados con la rectoría. Mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos. Restricción del uso innecesario de equipos ruidosos en horario de clase. d) Coordinación institucional Socialización previa del inicio de actividades con directivas de la institución. Establecimiento de canal de comunicación directo entre residente de obra y rectoría. Ajuste de cronograma cuando se presenten actividades académicas especiales.
FICHA N°17. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS.	Todas las actividades que impliquen el uso de maquinaria y equipos dentro de la obra y por ende las emisiones atmosféricas, cumplirán con las normas de calidad del aire actualmente vigentes. Los sitios de suministro de combustibles se mantendrán limpios y ordenados, y se adelantará en sitio habilitado para esta actividad. Únicamente se permitirá que se suministre combustibles y lubricantes en el sitio de operación de la maquinaria o equipos cuando por fuerza mayor así lo exija. Se dotará a los operarios con los EPP necesarios para desarrollar las actividades de manejo de maquinaria y equipo. Programación de actividades de mayor emisión sonora en horarios coordinados con la rectoría. Restricción del uso innecesario de equipos ruidosos en horario de clase.
PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL	
FICHA N°18. A TENCIÓN A LA COMUNIDAD.	Establecer un punto de atención a la comunidad en el campamento. La oficina debe disponer de una línea telefónica o buzón para PQRS sobre el proyecto. Se realizará reunión informativa antes del inicio de las actividades de obra para dar a conocer las características del proyecto y su tiempo de ejecución. Diseño, divulgación y publicación de valla informativa del proyecto.
FICHA N°19. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.	<u>Acciones informativas:</u> Se realizarán reuniones informativas antes del inicio de las actividades de obra, durante todo el proceso constructivo, hasta la finalización de las acciones constructivas, siempre que sea necesario. Se realizarán reuniones de inicio, finalización y con la junta de acción comunal, estas últimas en caso de ser necesarias. Se acordarán las medidas a implementar para asegurar el acceso a los predios, fincas y/o actividades económicas. Con las instituciones se acordarán los mecanismos para asegurar la dinámica intrínseca de las instituciones, de manera que la obra no genere traumatismos, ni inconformidades ni conflictos sociales. <u>Acciones de divulgación:</u> Los volantes se utilizarán para informar sobre las actividades extraordinarias que surjan en la obra como la suspensión temporal de los servicios públicos cuando esta es generada por las actividades constructivas e informar sobre medidas socio ambientales específicas que requiera difundir el proyecto constructivo.

	Instalación de buzón para recepción de PQRS en obra.
FICHA N°20. MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS	El contratista deberá realizar seguimiento y control al adecuado diligenciamiento de los formatos de las actas de vecindad, desarrollando las siguientes actividades: 1. Verificar que los formatos estén adecuadamente diligenciados. 2. Validar que todas las actas de vecindad cuenten con firmas del contratista, interventoría y propietario. 3. Revisar la entrega a la interventoría, de las actas de vecindad firmadas con sus respectivos registros fotográficos. 4. Actualizar la base de datos con información del levantamiento de actas de vecindad. 5. Comprobar acercamientos previos con empresas, instituciones y organizaciones prestadores de servicios públicos mediante actas de recorridos o actas de reunión. 6. Confirmar la subsanación de las afectaciones a la infraestructura y servicios públicos en caso de presentarse.
FICHA N°22. CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	En la reunión de inicio se informará de la solicitud a reuniones de ser necesarias con la junta de acción comunal y/o demás población que tenga la intención de participar, se listarán en un formato donde se diligencien los datos de cada miembro. Se convocará a reuniones de acuerdo a la necesidad, donde se contará con la participación del profesional técnico y ambiental del contratista e interventoría. Las temáticas de las reuniones tratarán sobre el avance de las actividades de obra, las manifestaciones ciudadanas que se hayan presentado, las que se encuentran abiertas y el manejo que puede hacerse para su cierre. El contratista liderará las reuniones que se realicen, cumpliendo los compromisos adquiridos con ellos, atendiendo cada una de las inquietudes presentadas y brindando información clara, veraz y oportuna requerida por sus miembros. Se elaborará el acta, el formato de asistencia y el registro fotográfico de cada reunión realizada.

Fuente: Elaboración Propia

4. ACTIVIDADES DEL PMA

Se presenta a continuación, la descripción de las actividades ejecutadas en el marco del Plan de Manejo Ambiental (PMA) durante el periodo reportado. Estas se organizan conforme a los programas y fichas ambientales del proyecto, lo que permite evidenciar el nivel de cumplimiento de las medidas establecidas para la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales. La información consignada da cuenta de las acciones desarrolladas en obra durante la fase inicial, así como de las medidas de manejo implementadas y las proyectadas para los periodos siguientes, garantizando la trazabilidad y el seguimiento de la gestión ambiental.

PROGRAMA 1 – DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Conformación del grupo de gestión ambiental

Durante el mes de mayo de 2026 se llevó a cabo reunión del grupo de gestión ambiental del proyecto, en la cual se realizó seguimiento al estado de implementación de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental – PMA, especialmente frente a las actividades desarrolladas en obra relacionadas con excavaciones, fundiciones, acopio de materiales y ejecución de medidas de contingencia en las áreas intervenidas de la institución educativa. Así mismo, se efectuó la entrega del presente informe mensual, como soporte del avance y cumplimiento de los programas ambientales establecidos para el proyecto. El registro correspondiente se adjunta mediante el ANEXO N°4.2.1.

Capacitación ambiental para el personal de obra.

En cumplimiento del cronograma de formación ambiental establecido para el proyecto, durante el mes de mayo de 2026 se ejecutaron las dos capacitaciones programadas dirigidas al personal vinculado a la obra. Estas jornadas permitieron reforzar los lineamientos contemplados en el Plan de Manejo Ambiental – PMA, promoviendo buenas prácticas relacionadas con el manejo de ambiental en el entorno de la institución educativa. Los registros correspondientes se adjuntan mediante el ANEXO N°4.2.2.

Ilustración 3. Capacitaciones ambientales



Fuente: El proyecto

Tabla 3. Capacitaciones ambientales

FECHA	TEMA
14/05/26	Mitigación del cambio climático
26/05/26	Gestión integral de residuos

Fuente: El proyecto

Cumplimiento de requerimientos legales.

Durante el periodo evaluado se dio continuidad al cumplimiento de los requerimientos legales ambientales aplicables al proyecto, manteniéndose vigente la documentación relacionada con la cantera y la escombrera autorizadas para el suministro y disposición de materiales derivados de las actividades constructivas. Así mismo, se continuó realizando seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales asociadas a dichos permisos, garantizando que las actividades ejecutadas en obra se desarrollaran conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos dentro del Plan de Manejo Ambiental – PMA.

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Manejo integral de materiales de construcción.

Durante el mes de mayo de 2026 se dio continuidad a la implementación de medidas orientadas al manejo integral de materiales de construcción utilizados en los diferentes frentes de trabajo del proyecto. En este sentido, los materiales empleados para las actividades de fundición, instalación de acero de refuerzo, excavaciones y ejecución de medidas de contingencia se mantuvieron organizados en zonas de acopio previamente definidas, garantizando condiciones adecuadas de almacenamiento, control y orden en obra. Así mismo, se implementaron medidas para prevenir la dispersión de material particulado y minimizar afectaciones al entorno, especialmente durante el manejo de agregados, cemento y demás insumos utilizados en las actividades constructivas, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental – PMA.

Ilustración 4. Manejo de materiales



Fuente: El proyecto

Explotación fuentes de materiales.

En cumplimiento de las medidas ambientales establecidas para el proyecto, durante el mes de mayo de 2026 se continuó utilizando materiales provenientes de fuentes previamente verificadas y

autorizadas, las cuales cuentan con los respectivos permisos y/o licencias ambientales y mineras vigentes. De esta manera, se garantizó la legalidad en la explotación, transporte y suministro de los materiales requeridos para las actividades de obra, incluyendo excavaciones, fundiciones y conformación de elementos estructurales. Así mismo, se mantuvo el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de dichos permisos, asegurando la trazabilidad y adecuado manejo de los materiales empleados durante el periodo evaluado.

Señalización de frentes de obra y sitios temporales.

Durante el periodo evaluado se mantuvieron las medidas de señalización y demarcación en los diferentes frentes de trabajo y áreas temporales del proyecto, garantizando la delimitación de la zona de intervención mediante cerramiento perimetral y controlando el acceso de personal no autorizado. Así mismo, se conservó la señalización preventiva e informativa en áreas excavadas, zonas de fundición y sectores donde se ejecutaron medidas de contingencia y apuntalamiento, fortaleciendo las condiciones de seguridad para trabajadores y comunidad educativa. De igual manera, la señalización instalada permaneció en adecuado estado de visibilidad y mantenimiento, asegurando su funcionalidad durante el desarrollo de las actividades constructivas conforme a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental – PMA.

Ilustración 5. Señalización y demarcación en obra



Fuente: El proyecto

Manejo y disposición final de escombros y lodos.

Durante el mes de mayo de 2026 se mantuvo la implementación de las medidas establecidas para el manejo de residuos sólidos convencionales y especiales generados en el desarrollo de las actividades constructivas. Para ello, continuó en funcionamiento el punto ecológico ubicado en obra, debidamente señalizado y destinado a la separación de residuos en la fuente conforme al código de colores definido, promoviendo entre el personal prácticas adecuadas de clasificación y disposición temporal.

Los residuos generados fueron almacenados de manera organizada en áreas definidas previo a su entrega al vehículo recolector en los días y horarios establecidos para el sector. En atención a observaciones realizadas por la interventoría respecto a la permanencia temporal de residuos en obra, se fortalecieron las medidas de seguimiento y control relacionadas con la recolección,

almacenamiento y disposición final, reforzando las jornadas de orden, aseo y limpieza en los diferentes frentes de trabajo.

Así mismo, se mantuvieron las medidas preventivas orientadas a evitar afectaciones al entorno, incluyendo la restricción de vertimientos contaminantes y la prohibición de realizar lavado o mantenimiento de vehículos dentro del área de intervención. En cuanto a los residuos asociados a sacos de cemento, se continuó con la implementación de manejo diferenciado mediante su acopio temporal bajo cubierta y en sitio organizado, con el propósito de minimizar la dispersión de material particulado y garantizar condiciones adecuadas para su disposición final o posible aprovechamiento, el cual continúa siendo evaluado conjuntamente con la interventoría conforme a las especificaciones técnicas del material y las condiciones propias del proyecto.

Finalmente, se continuará realizando seguimiento a las condiciones de almacenamiento temporal y disposición de residuos generados en obra, fortaleciendo las medidas de control y cumplimiento ambiental conforme a las recomendaciones impartidas por la interventoría y a los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental – PMA.

Ilustración 6. Instalación de punto ecológico



Fuente: El proyecto

PROGRAMA 3. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales.

Durante el mes de mayo de 2026 se mantuvieron las medidas implementadas para el manejo adecuado de residuos líquidos domésticos e industriales, con el propósito de prevenir afectaciones sobre el suelo y posibles fuentes hídricas cercanas al área de influencia del proyecto. En este sentido, los insumos y materiales utilizados en obra continuaron almacenándose en zonas previamente definidas y bajo condiciones controladas, minimizando riesgos asociados a derrames o contaminación ambiental durante el desarrollo de actividades constructivas.

Como parte de las acciones preventivas, se reiteró al personal la prohibición de realizar vertimientos y actividades de lavado de maquinaria, equipos o herramientas en áreas no

autorizadas, promoviendo el cumplimiento de buenas prácticas ambientales durante la ejecución de excavaciones, fundiciones, manejo de materiales y demás labores desarrolladas en obra. Así mismo, se mantuvieron establecidos los lineamientos para la atención de posibles derrames o fugas, contemplando su contención, recolección y disposición conforme a la normatividad vigente.

En cuanto al manejo de residuos domésticos, se continuó garantizando el servicio sanitario para el personal mediante el uso de una unidad sanitaria ubicada en un predio aledaño al área de intervención, asegurando condiciones adecuadas de higiene, mantenimiento y uso responsable. Esta medida permitió evitar afectaciones a la comunidad educativa y prevenir impactos ambientales derivados de vertimientos inadecuados.

PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Manejo del descapote y la cobertura vegetal

Durante el periodo evaluado no se realizaron actividades de descapote ni remoción de cobertura vegetal dentro del área de intervención del proyecto. No obstante, se mantuvieron vigentes las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental – PMA orientadas a la protección de las zonas verdes y vegetación existente en el entorno de la institución educativa.

En este sentido, se continuó controlando el tránsito de maquinaria y personal únicamente dentro de las áreas autorizadas para intervención, evitando afectaciones innecesarias sobre superficies no contempladas dentro del alcance de obra. Así mismo, permanecen definidos los lineamientos para el manejo del material vegetal que eventualmente pueda generarse en etapas posteriores del proyecto, contemplando su adecuada recolección, almacenamiento temporal y disposición final conforme a las disposiciones ambientales aplicables.

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio

Durante el mes de mayo de 2026 se dio continuidad al funcionamiento del campamento de obra y de las áreas destinadas para el acopio temporal de materiales, manteniendo condiciones adecuadas de organización, almacenamiento y control dentro del área de intervención. Así mismo, continuó en operación el contenedor dispuesto para el desarrollo de actividades administrativas, permitiendo mantener separadas las labores operativas de las dinámicas propias de la institución educativa y fortaleciendo la organización interna del proyecto.

Las zonas destinadas al campamento y acopio permanecieron ubicadas en sectores previamente intervenidos, evitando afectaciones adicionales sobre la cobertura vegetal y el entorno circundante. De igual manera, se mantuvieron las medidas de delimitación mediante cerramiento, señalización visible y control de acceso restringido al personal autorizado, contribuyendo a la seguridad de los trabajadores y de la comunidad educativa presente en el área de influencia.

En cuanto al manejo operativo del campamento, se conservaron condiciones adecuadas para el almacenamiento de herramientas, materiales e insumos utilizados en obra, promoviendo medidas de orden y limpieza orientadas a minimizar impactos ambientales. Así mismo, se continuó coordinando con la institución educativa la programación de actividades que pudieran generar mayores niveles de ruido, procurando reducir interferencias con la jornada académica y manteniendo comunicación permanente con la rectoría para la articulación de las actividades constructivas con el funcionamiento normal de la institución.

Ilustración 7. Campamento



Fuente: El proyecto

Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

Durante el periodo evaluado no se requirió el uso de maquinaria pesada dentro del área de intervención del proyecto. No obstante, las herramientas y equipos menores utilizados para el desarrollo de las actividades constructivas fueron operados bajo condiciones controladas y conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental – PMA.

Como parte de las medidas de control implementadas, se realizaron inspecciones preoperacionales a las herramientas utilizadas en obra, verificando sus condiciones de funcionamiento y promoviendo prácticas seguras durante su operación. Así mismo, se mantuvieron las disposiciones orientadas a prevenir afectaciones ambientales relacionadas con ruido, manejo de insumos y posibles derrames, restringiendo actividades de mantenimiento o manipulación de sustancias en áreas no autorizadas.

Adicionalmente, se continuó coordinando con la institución educativa las actividades que pudieran generar impactos temporales asociados al uso de equipos, procurando minimizar afectaciones sobre el normal desarrollo de la jornada académica y garantizando condiciones adecuadas para la ejecución de las labores en obra.

Atención a la comunidad

Durante el mes de mayo de 2026 no se requirió la realización de nuevas jornadas de socialización con la comunidad, teniendo en cuenta que estas actividades fueron ejecutadas previo al inicio de la obra. Sin embargo, se mantuvieron activos los canales de comunicación establecidos con la institución educativa y demás actores del área de influencia, permitiendo atender de manera oportuna cualquier inquietud relacionada con el desarrollo de las actividades constructivas.

La valla informativa del proyecto permaneció instalada en un sitio visible dentro del área de intervención, garantizando el acceso a información general de la obra por parte de la comunidad educativa y visitantes. Así mismo, se continuó articulando con la rectoría aspectos relacionados con la programación de actividades y manejo de situaciones propias de la ejecución del proyecto, fortaleciendo el adecuado relacionamiento con el entorno y promoviendo condiciones de comunicación permanente durante el periodo evaluado.

Ilustración 8. Valla informativa del proyecto



Fuente: El proyecto

Información y divulgación

Durante el mes de mayo de 2026 se dio continuidad a las acciones de información y divulgación contempladas para el proyecto, sin que se presentaran peticiones, quejas, reclamos o sugerencias (PQRS) por parte de la comunidad o de la institución educativa. Así mismo, no fue necesario realizar nuevas jornadas de socialización, teniendo en cuenta que las actividades ejecutadas durante el periodo no generaron afectaciones que requirieran procesos adicionales de divulgación o atención comunitaria.

No obstante, se mantuvo comunicación permanente con la comunidad educativa y actores del área de influencia, brindando atención oportuna a las inquietudes manifestadas directamente en obra y garantizando el adecuado flujo de información durante la ejecución de las actividades constructivas. De igual manera, se conserva la disposición de implementar mecanismos informativos adicionales en caso de ser requeridos. Mediante ANEXO N°4.2.3., se adjunta la

bitácora de PQRS correspondiente al periodo evaluado.

Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos

Durante el periodo evaluado no fue necesario adelantar nuevas actividades relacionadas con actas de vecindad, considerando que este proceso fue ejecutado previamente en la etapa inicial del proyecto. En este sentido, se continúa tomando como referencia el registro inicial del estado de los predios ubicados en el área de influencia, como soporte para el seguimiento y control de posibles afectaciones derivadas de la ejecución de la obra.

Así mismo, se dio continuidad al monitoreo de las condiciones del entorno, verificando que las actividades constructivas desarrolladas durante el mes de mayo de 2026 no generaran afectaciones sobre predios vecinos ni interferencias en la prestación de servicios públicos, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental – PMA.

Cultura vial y participación comunitaria

Durante el mes de mayo de 2026 se mantuvieron las estrategias de cultura vial y participación comunitaria implementadas para el proyecto, garantizando condiciones adecuadas de movilidad y seguridad en el entorno de la institución educativa durante el desarrollo de las actividades constructivas.

En este sentido, para las maniobras de ingreso y salida de vehículos asociados a la obra se contó con personal paletero encargado de regular el tránsito y controlar el paso peatonal, contribuyendo a la prevención de incidentes y minimización de riesgos para estudiantes, personal de la institución y comunidad en general. Así mismo, se mantuvo la disposición de generar espacios de diálogo y atención comunitaria en caso de ser requeridos, promoviendo la adecuada articulación entre el proyecto y los actores del área de influencia.

5. CONCLUSIÓN

Durante el mes de mayo de 2026, PSI INGENIEROS S.A.S. dio continuidad a la implementación de las medidas ambientales establecidas en el Plan de Manejo Ambiental – PMA para el desarrollo del proyecto, garantizando el seguimiento y control de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de trabajo conforme a la normatividad ambiental vigente y a las obligaciones contractuales aplicables.

En este sentido, se mantuvieron acciones orientadas al manejo adecuado de materiales, residuos sólidos y líquidos, señalización de áreas de intervención, control de sitios de acopio y funcionamiento del campamento de obra, así como medidas de prevención y control asociadas al desarrollo de excavaciones, fundiciones y ejecución de actividades de contingencia dentro de la institución educativa. De igual manera, se fortalecieron las jornadas de orden y limpieza y el seguimiento a la disposición temporal de residuos, atendiendo las recomendaciones realizadas por la interventoría en el marco del seguimiento ambiental del proyecto.

Así mismo, se mantuvo comunicación permanente con la comunidad educativa y coordinación constante con la rectoría de la institución, permitiendo desarrollar las actividades constructivas bajo condiciones controladas y minimizando posibles afectaciones sobre el entorno. Como resultado de las medidas implementadas y del seguimiento realizado durante el periodo evaluado, las actividades desarrolladas se ejecutaron dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el PMA y promoviendo una adecuada gestión ambiental durante la ejecución del proyecto.

6. LISTA DE ANEXOS

ANEXO NO.4.2.1 Reunión GGA

ANEXO NO. 4.2.2 Capacitaciones ambientales

ANEXO NO. 4.2.3 Bitácora de PQRS

ANEXO No. 4.2.1.
REUNIÓN GGAS

RESPONSABLE: RODRIGO MENDIVELSO **CARGO:** PROFESIONAL AMB

FECHA: 28 DE MAYO **CONTRATO:** IDU-030-2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

PSI INGENIEROS S.A.S. por medio de la presente acta, da constancia del desarrollo de la SEGUNDA reunión mensual, en la cual se revisó el cumplimiento y desarrollo del PMA, durante el periodo comprendido entre el 01 de el 31 DE MAYO DE 2026, en donde se cumplieron las medidas y normas ambientales vigentes, teniendo en cuenta buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obra, que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrolla, haciendo énfasis en las fichas ambientales propuestas para el proyecto.

La presente se firma a los 28 días del mes de MAYO de 2026. por los interesados que en ella intervinieron siendo los integrantes del grupo de gestión ambiental y social, quienes tienen pleno conocimiento de los roles y responsabilidades dentro del mismo y han participado de la sesión desarrollada:

REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR DE OBRA

LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ
CÉDULA: 1.049.603.584 DE TUNJA

RESIDENTE DE OBRA

EDWIN CAMILO SICHACÁ
CÉDULA: 1.049.602.110 DE TUNJA

PROFESIONAL AMBIENTAL

RODRIGO ALBEIRO MENDIVELSO CELY
CÉDULA: 7.181.346 DE TUNJA

ANEXO No. 4.2.2.
CAPACITACIONES AMBIENTALES

PSI INGENIEROS	ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	CÓDIGO: HSEQ-FR-0124-15 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

NOMBRE RESPONSABLE:	RODRIGO MENDIOLA.				
DOCUMENTO:	7.181.346	**CARGO:**	PROFESIONAL AMBIENTAL		
SST ( )	**AMBIENTAL:** (x)			**FECHA:**	14 - MAYO - 26
TEMA:	MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO			**DURACIÓN:**	15 MIN.

OBJETIVO: Registrar y controlar la asistencia del personal a las capacitaciones en SST y gestión ambiental, como evidencia de su formación en prevención de riesgos y responsabilidad ambiental.

NOMBRE COLABORADOR	CÉDULA	FIRMA
Pablo salamanca Mendoza	72326761	Pablo salamanca
Eduardo Morales	1052790067	
Mauricio Gómez	1083036108	Mauricio G.
carlos perez	6774123	carlos
Luis Pinto Ramos	1049797274	
Emilio	72724884	Emilio G

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Nombre: RODRIGO MENDIOLA.
Documento: 7.181.346.

PSI INGENIEROS	ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	CÓDIGO: HSEQ-FR-0124-15 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

NOMBRE RESPONSABLE:	RODRIGO ALBERTO MENDIVELSO.				
DOCUMENTO:	7.181.346	**CARGO:**	PROFESIONAL AMBIENTAL		
SST ( )	**AMBIENTAL:** (X)		**FECHA:**	26 MAYO 26	
TEMA:	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS		**DURACIÓN:**	15 MIN	

OBJETIVO: Registrar y controlar la asistencia del personal a las capacitaciones en SST y gestión ambiental, como evidencia de su formación en prevención de riesgos y responsabilidad ambiental.

NOMBRE COLABORADOR	CÉDULA	FIRMA
Mauricio Gómez	1023036108	Mauricio G.
~~ARMANDO MORALES~~ Rob6 solanilla MenJoca	~~1052790067~~ 1232496144	Rob6 solanilla
Enrique	72324884	Enrique
Luis pinto Ramos	1044747274	Luis
carlos perez	6424123	carlos
Mario Barrera Castillo	4130793	

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Nombre: RODRIGO MENDIVELSO

Documento: 7181346

ANEXO No. 4.2.3.
BITÁCORA DE PQRS

Fecha: 28 DE MAYO DE 2026

A quien corresponda,

Yo, _____, identificado/a con cédula de ciudadanía No. _____, de _____, con teléfono N° _____, y correo electrónico _____, en calidad de _____, me permito presentar la siguiente novedad a PSI INGENIEROS S.A.S.:

- **Tipo de PQRS: (marque una X en la casilla según corresponda su novedad)**

PETICIÓN		QUEJA		RECLAMO		SUGERENCIA	

- **Motivo o asunto: (Descripción breve de lo que trata la PQRS)**

_____

_____

Descripción detallada:

MEDIANTE LA PRESENTE, SE DEJA CONSTANCIA DE QUE DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, NO SE PRESENTO PQRS POR NINGUNA DE LAS PARTES INTERESADAS.

Solución o respuesta esperada:

_____

_____

Sin más en particular, quedo atento/a, a una pronta respuesta y/o solución.

Atentamente,

PROFESIONAL AMB
PAOLA MENDIVELSO.

NOTA: Se informa que el plazo para proporcionar una respuesta a cualquier es de quince (15) días hábiles. En caso de ser necesario un plazo adicional, este podrá ser prorrogado por un período de quince (15) días hábiles adicionales, notificándose dicha ampliación antes del vencimiento del plazo inicial. Esta extensión será otorgada exclusivamente cuando sea necesario recabar pruebas adicionales o completar información relevante para la correcta resolución de la solicitud.

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

ANALISIS DE ACTIVIDADES IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO

Tunja, 27 de mayo de 2026

CERTIFICACIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RESIDUOS PELIGROSOS

El suscrito, LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.603.584 de Tunja, en calidad de Representante Legal de PSI INGENIEROS S.A.S., identificada con NIT 900.928.849-4.

CERTIFICA QUÉ,

Durante el mes de mayo de 2026, en el marco de la ejecución del Contrato No. IPVO-030-2025, cuyo objeto corresponde al "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", se implementaron las medidas de manejo ambiental contempladas en el Plan de Manejo Ambiental – PMA para la gestión integral de los residuos generados durante el desarrollo de las actividades constructivas.

En cumplimiento de las medidas de manejo ambiental implementadas durante el período señalado, se desarrollan las actividades necesarias para la adecuada gestión de los residuos que puedan generarse en la ejecución de la obra, de conformidad con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental – PMA y la normatividad ambiental vigente.

En este sentido, se mantienen condiciones adecuadas de orden y aseo en las áreas de trabajo, promoviendo la correcta segregación, almacenamiento y disposición de los residuos, así como la implementación de acciones de control y seguimiento orientadas a prevenir impactos ambientales asociados a su manejo.

La presente certificación se expide a solicitud, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. M.Sc LUIS EDUARDO SICHACÁ GAMEZ
C.C. 1.049.603.584 de Tunja
PSI INGENIEROS S.A.S.
Dirección: Calle 20 No. 13-14 Oficina 216B
Cel: 313 830 72 69
e-mail: psi.ingenieros1@gmail.com

Tunja, 02/06/2026

SEÑORES:

INGENIERO,
YILMAR MEDINA ANDRADE
R/L CONSORCIO INTERVALLE 2026
INTERVENTORIA

CO-IPVO-030-2025-OF-033

REFERENCIA: Radicado certificación de disposición de residuos.

OBJETO: "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. "

Cordial saludo,

En mi calidad de Representante Legal de PSI INGENIEROS S.A.S., contratista de obra del proyecto de la referencia, me permito realizar la entrega formal de la Certificación de Manejo de Residuos Sólidos y Residuos Peligrosos, documento que acredita la adecuada gestión para la recolección, aprovechamiento y/o disposición final de los residuos generados durante la ejecución del proyecto, conforme a la normatividad ambiental vigente.

La documentación se anexa para su respectiva revisión y archivo dentro de los soportes ambientales del contrato.

Sin otro en particular, quedo atento a sus comentarios

Ing. M.Sc LUIS EDUARDO SICHACÁ GAMEZ
C.C 1.049.603.584 de Tunja
PSI INGENIEROS S.A.S
Dirección: Calle 20 No. 13-14 Oficina 216 B
Cel: 313-830-72-69
e-mail: cubiertaguateque@gmail.com
psi.ingenieros1@gmail.com

Anexo 1: Certificación disposición de residuos.


CONSORCIO
INTERVALLE 2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO ZAPATAS EJE A, ACORDE A PLANOS ESTRUCUTRALES

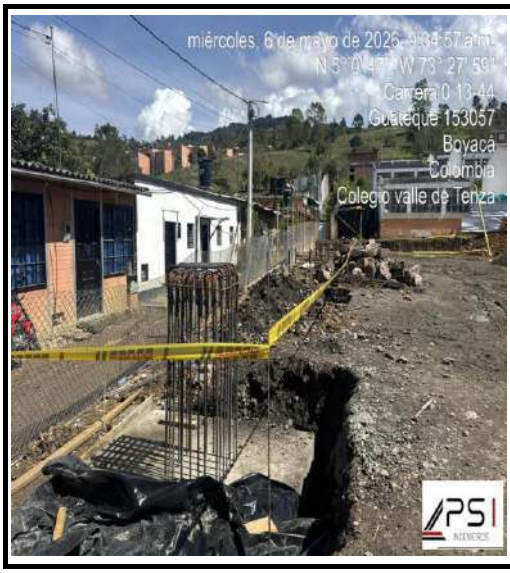

SEÑALIZACION DE EXCAVACIONES A ZAPATAS EJE A



CONCRETO 3,000 PSI PARA ZARPA ZAPATAS EJE A



ELABORACION DE ESPECIMENES DE CONCRETO PARA VERIFICACION DE RESISTENCIA CONCRETO ZAPATAS EJE A CUBIERTA



SISTEMA DE EVACUACION DE AGUA ACUMULADA EN EXCAVACIONES DE ZAPATAS



SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION Y RE INSTALACION DE SEÑALIZACION EN AREA AFECTADA



VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL VIBRADO DE LAS ZAPATAS



VERIFICACIÓN DE FIGURADO DE ACERO PARA ZAPATAS



SUPERVISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y CONTIGENCIA EN ZONA DE INESTABILIDAD



VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL VIBRADO DE LAS ZAPATAS

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



CICLOPEO DE 2000 PSI PARA VIGA DE AMARRE



INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO AMARRE EJE A, ACORDE A PLANOS ESTRUCUTRALES



APUNTALAMIENTO PARA PLAN DE CONTINGENCIA



ELABORACION DE CONCRETO PARA ZAPATAS EJE B CUBIERTA

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO VIGA DE CIMENTACION EJE A , ACORDE A PLANOS ESTRUCTURALES



INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO VIGA DE CIMENTACION EJE A , ACORDE A PLANOS ESTRUCTURALES



EXCAVACIONES MANUALES PARA VIGA DE CIMENTACION MURO DE CERRAMIENTO Y VIGA DE CIMENTACION EJE A



SISTEMA DE EVACUACION DE AGUA ACUMULADA EN EXCAVACIONES DE ZAPATAS



SUPERVISION DE LA INTERVENTORIA DE LA VIGA DE AMARRE DEL EJE A



CLIMATOLOGIA REPORTADO POR LA INTERVENTORIA



AFECTACIÓN EN OBRA DE LAS PRECIPITACIONES EN RECORRIDO POR LA INTERVENTORIA



AFECTACIÓN EN OBRA DE LAS PRECIPITACIONES EN RECORRIDO POR LA INTERVENTORIA

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



INSTALACIÓN DE ACERO, PARA PARRILLA VIGA DE CIMENTACIÓN EJE A



ENCOFRADO DE VIGA DE ENALCE CIMENTACIÓN EJE A




VACIADO DE CONCRETO SIMPLE PARA VIGA DE ENLACE EJE A



SECADO Y EVACUACIÓN DE AGUA ACUMULADA EN EXCAVACIONES DE LA CIMENTACIÓN




CONTROL Y SUPERVISIÓN EN LAS ETAPAS DE ENCONFRADO DE LA VIGA

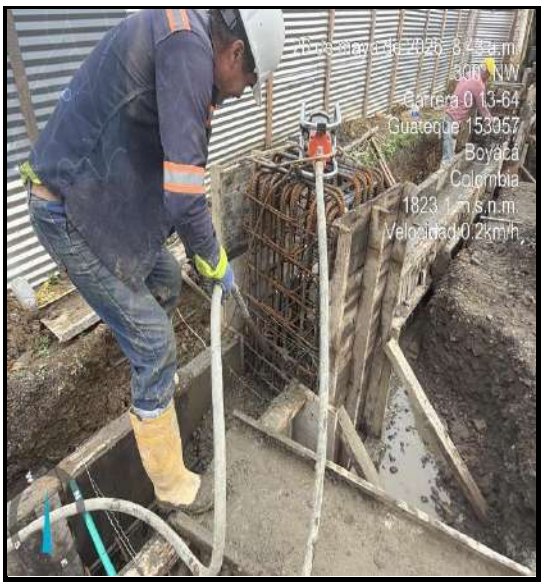

CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL VIBRADO DEL CONCRETO



VERIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL AVANCE DE LA VIGA

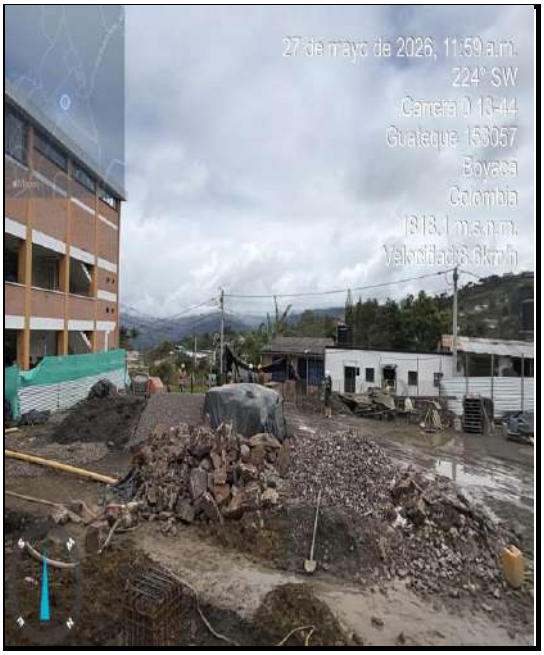

REITERACIONES DEL ORDEN Y ASEO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

CONSORCIO
INTERVALLE 2026

SOPORTES DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Outlook

Respuesta a oficio INT-053-OF-025 – Requerimiento preventivo y correctivo por acumulación de aguas en excavaciones

Desde CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>
Fecha Mar 05/05/2026 9:28
Para Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>

1 archivo adjunto (963 KB)
22.1 CO-IPVO-030-2025-OF-022.pdf;

Tunja, 05 de mayo de 2026

Ingeniera:
DANNA TATIANA JIMÉNEZ RIVERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


CO-IPVO-030-2025-OF-022

REF.: Respuesta a oficio INT-053-OF-025 – Requerimiento preventivo y correctivo por acumulación de aguas en excavaciones


Cordial saludo.


Por medio del presente damos respuesta al oficio de la referencia.

- **EVACUACIONES DE AGUAS (BOMBEO):** la firma contratista de obra dispone de equipo de bombeo para la evacuación de aguas acumuladas en las excavaciones de las zapatas de la cimentación de la cubierta del escenario deportivo, antes del vaciado de concreto simple. El siguiente registro fotográfico evidencia el uso del equipo de bombeo y proceso de secado del área.



- **CANALIZACIÓN Y MANEJO DE ESCORRENTÍAS:** se entiende la observación y solicitud de la firma contratista de interventoría, mas sin embargo nos permitimos responder de la siguiente manera: debido a que el nivel de afirmado actual de la cancha multifuncional presenta un peralte transversal dirigida hacia el costado norte, paralela a la zona de los baños de la institución educativa, razón por la cual la escorrentía de agua lluvia tiende a dirigirse hacia este sector y depositarse en la excavaciones de las zapatas del eje B, este peralte responde al cárcamo proyectado a construir en dicho sector, acorde a las actividades contratadas en el contrato de obra el cual está destinado a la evacuación tanto de las aguas provenientes de lavado de la cancha como de las aguas lluvias que descienden desde la parte alta en la zonas de urbanismo, más específicamente entre los ejes B-5 y B-6 de las zapatas. Adicionalmente, el espacio disponible dentro del proyecto es limitado, por lo que el área donde actualmente se presenta escorrentía superficial en la zona de urbanismo ha sido prevista para el acopio de acero de refuerzo de la cimentación, restringiendo de cierta manera la posibilidad de implementar soluciones de canalización en este sector. Como medida de subsanación y respuesta a la solicitud de la interventoría, se plantea culminar los vaciados de concreto de las zapatas en los ejes A y B, posteriormente, dar inicio a las actividades correspondientes a la construcción del filtro francés y el cárcamo longitudinal en este sector, lo cual permitirá encauzar manejar y evacuar adecuadamente las aguas presentes superficiales y subsuperficial del proyecto.

- 

**PROTECCIÓN DE TALUDES:** (*En zonas donde la excavación deba permanecer abierta, se requiere el recubrimiento de taludes con polietileno (plástico) para prevenir procesos de erosión y pérdida de cohesión.)* se atiende observación se presenta registro fotográfico de protección a excavaciones abiertas:

- **REVISIÓN DE SISTEMAS DE ENTIBADO:** (*Realizar una inspección técnica a los sistemas de contención y apuntalamiento existentes, verificando que la presión hidrostática no haya comprometido su integridad estructural.)* Se atiende observación, se realiza seguimiento e inspección visual a apuntalamientos existentes con frecuencias diarias los cuales son registrados en la bitácora de obra.

- **SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTO:** (*Reforzar el aislamiento de las áreas inundadas para prevenir accidentes por caídas, dado que el agua oculta la profundidad real y posibles irregularidades del terreno.)* se atiende observación se implementa señalización de áreas de excavación abiertas en obra.

Atentamente,

ING. M.SC. LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. 1.049.603.584 de Tunja
R/L PSI INGENIEROS S.A.S.
Contratista

Cel: 313-830-72-69
cubiertaguateque@gmail.com
psi.ingenieros1@gmail.com

Outlook

Bitácora contrato de obra

Desde CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>
Fecha Mar 05/05/2026 9:41
Para Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>; freddy.dproyectostierrasua <freddy.dproyectostierrasua@gmail.com>; lcarlosmolina77@gmail.com <lcarlosmolina77@gmail.com>

1 archivo adjunto (328 KB)
23.1 CO-IPVO-030-2025-OF-023.pdf;

Tunja, 05 de mayo de 2026

INGENIEROS,

JORGE ARMANDO CALDERÓN SÁNCHEZ
R/L CONSORCIO INTERVALLE 2026
INTERVENTORÍA

JULIAN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR
TIERRASUA S.A.S

CO-IPVO-030-2025-OF-023

REFERENCIA: Bitácora contrato de obra

OBJETO: "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito link para visualización en tiempo real de la bitácora de obra, para revisión y fines pertinentes.

https://drive.google.com/drive/folders/1YWq0Bg86f0qgeYujGwugfa_ZyytjSiBo?usp=sharing

Atentamente,

ING. M.SC. LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. 1.049.603.584 de Tunja
R/L PSI INGENIEROS S.A.S.
Contratista
Cel: 313-830-72-69
cubiertaguateque@gmail.com
psi.ingenieros1@gmail.com

Outlook

RE: RESPUESTA OFICIO INT-053-OF-017

Desde Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>
Fecha Mar 19/05/2026 6:43
Para CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>
CC freddy.dproyectostierrasua <freddy.dproyectostierrasua@gmail.com>; lcarlosmolina77 <lcarlosmolina77@gmail.com>

1 archivo adjunto (12 MB)
29.INT-053-2025-OF-029-MENORES Y MAYORES-1.pdf;

Cordial saludo,

En calidad de Interventoría del proyecto *"Mejoramiento del escenario recreativo y de actividades lúdicas en la Institución Educativa Técnica Valle de Tenza en la sede campestre en el municipio de Guateque, departamento de Boyacá"* , me permito remitir de manera oficial el Oficio INT-053-OF-029.

Tras la evaluación técnica y administrativa del balance de mayores y menores cantidades presentado por el contratista, esta Interventoría otorga la preaprobación a los ajustes de cantidades del numeral 1, sujeta a las siguientes consideraciones y requerimientos inmediatos:

Consideraciones Técnicas y Requerimientos:

- **Muro de Contención (Nuevo Ítem 3.04):** Se aprueba su inclusión debido a las necesidades geotécnicas del terreno. Como soporte, se anexa el APU referenciado con la base de precios oficiales de la Gobernación de Boyacá.
- **Actualización Contractual Obligatoria:** Derivado de esta nueva actividad y los cambios en el terreno, el contratista debe realizar la **actualización inmediata del cronograma de obra y de los planos** correspondientes.
- **Balance de Excavaciones:** Se identificó un volumen de ejecución mediante excavación mecánica. Es necesario que el contratista presente la discriminación y balance correspondiente, dado que su precio unitario es diferente al de la excavación manual.
- **Ítems de Demolición (1.03 y 1.04):** Se constató que el incremento responde a diferencias entre las estructuras reales del sitio y los planos récord iniciales. Se recuerda que esta actividad sigue en ejecución.

Documentos Adjuntos:

1. Oficio INT-053-OF-029
2. Análisis de Precios Unitarios (APU)
3. Balance Definitivo

4. Cartera de Volúmenes

5. Plano Arquitectónico con muros de contención

Quedamos atentos a la pronta entrega del cronograma y planos actualizados por parte del contratista para continuar con el flujo normal del proyecto.

Atentamente,

DANNA TATIANA JIMENEZ RIVERA

Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERVALLE 2026

De: CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>
Enviado: jueves, 7 de mayo de 2026 8:35
Para: Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>
Asunto: RESPUESTA OFICIO INT-053-OF-017

Tunja, 07/05/2026

INGENIERO:
JORGE ARMANDO CALDERÓN SÁNCHEZ
R/L CONSORCIO INTERVALLE 2026
INTERVENTORÍA

CO-IPVO-030-2025-OF-021

REFERENCIA: RESPUESTA OFICIO **INT-053-OF-017**

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos responder a las solicitudes presentadas en el oficio de referencia de la siguiente manera:

1. información administrativa y financiera

La siguiente tabla relaciona el estado administrativo y financiero del contrato de obra, para la presente fecha, no se han realizado suspensiones, prórrogas, reinicios, ni adicionales:

Tabla 1: Información general del contrato de obra

INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA IPVO-030-2025	
PROCESO DE CONTRATACIÓN:	LICITACIÓN PÚBLICA
NUMERO DE CONTRATO:	No.IPVO-030-2025
CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S
CONTRATISTA:	PSI INGENIERIOS S.A.S NIT. 900.928.849-4 R/L LUIS EDUARDO SICHACÁ GAMEZ C.C. 1.049.603.584 DE TUNJA
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
VALOR INICIAL:	DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MONEDA LEGAL (2.411.687.093,33).
PLAZO INICIAL:	A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA DE INICIO:	24 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fuente: Elaboración propia

el siguiente cuadro se presenta la relación de pólizas que hasta la fecha están vigentes:

Tabla 2: Relación de pólizas del contrato de obra

POLIZA No.	ANEXO	OBJETO DEL SEGURO	ASEGURADORA
175391	0	GARANTIZAR ELCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONESA CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO,CONTENIDASEN ELCONTRATO Nº IPVO 030-2025, CUYO OBJETOES MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE,DEPARTAMENTO DE BOYACA; EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL A QUE HAYA LUGAR, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS AMPAROS OTORGADOS.	CESCE
18141	0	SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUALQUE SE GENERA POR RECLAMACIONES DE TERCEROS, COMO CONSECUENCIA DE ACTOS, HECHOS U	CESCE

		OMISIONES DEL CONTRATISTA, DERIVADOSDE LA EJECUCIÓN DELCONTRATO Nº IPVO 030-2025 CUYO OBJETOES MEJORAMIENTODELESCENARIORECREATIVO Y DE ACTIVIDAD ESLUDICAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVATECNICAVALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACA	
175391	1	MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA UN TRASLADO DE VIGENCIA SEGÚN ACTA DE INICIO DEL 24/02/2026. GARANTIZAR ELCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONESA CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO,CONTENIDASEN ELCONTRATO Nº IPVO 030-2025, CUYO OBJETOES MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE,DEPARTAMENTO DE BOYACA; EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL A QUE HAYA LUGAR, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS AMPAROS OTORGADOS.	CESCE
18141	2	MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA EL AJUSTE AL VALOR ASEGURADO SEGÚN SMMLV DEL AÑO 2026. MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA UN TRASLADO DE VIGENCIA SEGÚN ACTA DE INCIO DEL 24/02/2026 SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SE GENERA POR RECLAMACIONES DE TERCEROS, COMO CONSECUENCIA DE ACTOS, HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº IPVO 030-2025 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDAD ES LUDICAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACA	CESCE

Fuente: Elaboración propia

Nota: las anteriores pólizas se encuentran debidamente publicadas en la plataforma secop II, y debidamente aprobadas por la supervisión del proyecto.

Tabla 3: Balance físico vs balance financiero del proyecto:

1	CAP. 1: PRELIMINARES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	DIST %	VALOR TOTAL	VALOR DE EJECUCION HASTA LA FECHA	
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA. (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA).	$ 3.036,00	934,45	17,00%	$ 3.319.279,00	934,45	$ 3.319.279,00
1,2	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H = 1.50 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	$ 46.814,00	151,26	17,00%	$ 8.284.870,00	134,10	$ 7.394.271,00
1,3	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	$ 244.449,00	103,63	0,00%	$ 25.332.250,00	68,00	$ 16.622.532,00
1,4	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	$ 16.461,00	128,75	0,00%	$ 2.119.354,00	49,99	$ 823.050,00
1,5	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA DE H = 2.0 M.	$ 6.046,00	51,5	0,00%	$ 311.369,00	39,69	$ 240.026,00
1,6	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES DE DEMOLICION (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	$ 15.101,00	518,44	0,00%	$ 7.828.962,00	0,00	$ 498.635,00
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 47.196.084,00**		**$ 28.897.793,00**
2	**CAP. 2: REALIZAR CIMENTACIÓN Y DESAGUES**						
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	$ 70.516,00	334,26	0,00%	$ 23.570.678,00	97,20	$ 6.854.155,00
2,2	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	$ 92.874,00	173,14	0,00%	$ 16.080.204,00	173,14	$ 16.080.204,00

2,3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	$ 2.765,00	5311,88	0,00%	$ 14.687.348,00	5.311,88	$ 14.687.348,00
2,4	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	$ 33.429,00	15,2	17,00%	$ 594.501,00	0,00	$ -
2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	$ 599.197,00	29,04	17,00%	$ 20.358.797,00	29,04	$ 20.358.797,00
2,6	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	$ 7.674,00	7030,32	17,00%	$ 63.122.291,00	355,81	$ 3.194.721,00
2,7	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	$ 918.406,00	29,04	17,00%	$ 31.204.497,00	0,00	$ -
2,8	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	$ 887.295,00	10,6	17,00%	$ 11.004.233,00	0,00	$ -
2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	$ 7.423,00	1341,65	17,00%	$ 11.652.110,00	0,00	$ -
2,10	LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM.	$ 107.037,00	617,07	17,00%	$ 77.277.706,00	0,00	$ -
2,11	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	$ 131.537,00	27,96	17,00%	$ 4.302.996,00	0,00	$ -
2,12	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO.	$ 8.541,00	486,8	17,00%	$ 4.864.578,00	0,00	$ -
2,13	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E	$ 17.061,00	486,8	17,00%	$ 9.717.195,00	0,00	$ -

	INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)						
2,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	$ 33.484,00	88,41	17,00%	$ 3.463.575,00	0,00	$ -
2,15	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**)	$ 284.811,00	99,02	0,00%	$ 28.201.985,00	0,00	$ -
2,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	$ 7.326,00	406,69	17,00%	$ 3.485.911,00	0,00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 323.588.605,00**		**$ 61.175.225,00**
3	**CAP. 3: REALIZAR ESTRUCTURAS**						
3,1	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < = A 3.0 M. (FORMALETA METALICA).	$ 1.308.131,00	9,41	17,00%	$ 14.402.130,00	0,00	$ -
3,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE CON GRUA DE ESTRUCTURA METALICA	$ 24.344,00	22.017,30	0,00%	$ 535.989.151,00	4.436,49	$ 108.001.814,00
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	$ 4.177,00	22.017,30	17,00%	$ 107.600.527,00	0,00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 657.991.808,00**		**$ 108.001.814,00**

4	**CAP. 4: REALIZAR CUBIERTA**						
4,1	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE SIN TRASLAPO EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA CALIBRE 22	$ 261.843,00	659,44	17,00%	$ 202.023.605,00	0,00	$ -
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIMPANO ACERO ESTRUCTURAL GRADO 40 CAL 22	$ 280.023,00	132,96	0,00%	$ 37.231.858,00	0,00	$ -
4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL MICROPERFORADO GALVANIZADO CAL 16, COLOR SEGÚN DISEÑO	$ 392.345,00	165,86	0,00%	$ 65.074.342,00	0,00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 304.329.805,00**		**$ -**
5	**CAP. 5: REALIZAR CERRAMIENTO MAMPOSTERIA REFORZADA**						
5,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	$ 70.516,00	9,53	0,00%	$ 672.017,00	0,00	$ -
5,2	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	$ 33.429,00	18,8	17,00%	$ 735.304,00	0,00	$ -
5,3	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	$ 7.674,00	2808,31	17,00%	$ 25.214.636,00	0,00	$ -
5,4	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	$ 887.295,00	6,37	17,00%	$ 6.612.921,00	0,00	$ -
5,5	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < = A 3.0 M. (FORMALETA METALICA).	$ 1.308.131,00	4,87	17,00%	$ 7.453.600,00	0,00	$ -

5,6	MURO EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO ESTRUCTURAL E = 0.15 M.	$ 166.227,00	135,66	17,00%	$ 26.383.915,00	0,00	$ -
5,7	MORTERO TIPO GROUTING DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	$ 569.328,00	0,23	17,00%	$ 153.206,00	0,00	$ -
5,8	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	$ 1.087.554,00	5,19	17,00%	$ 6.603.954,00	0,00	$ -
5,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	$ 11.308,00	46,53	17,00%	$ 615.609,00	0,00	$ -
5,1	PILOTE D = 30 CM. CONCRETO 21MPa - (3000 PSI). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO (INCUYE. EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 5 KM	$ 210.721,00	28,5	0,00%	$ 6.005.549,00	0,00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 80.450.711,00**		**$ -**
6	**CAP. 6: REALIZAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RED PLUVIAL**						
6,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	$ 70.516,00	82,04	0,00%	$ 5.785.133,00	0,00	$ -
6,2	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. INCLUYE TAPA CON MARCO METALICO	$ 823.074,00	6	17,00%	$ 5.777.979,00	0,00	$ -
6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 4" PVC	$ 55.470,00	43,8	17,00%	$ 2.842.616,00	0,00	$ -
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	$ 41.023,00	68	17,00%	$ 3.263.790,00	0,00	$ -

6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	$ 73.153,00	43	17,00%	$ 3.680.327,00	0,00	$ -
6,6	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	$ 124.266,00	16,21	0,00%	$ 2.014.352,00	0,00	$ -
6,7	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	$ 92.874,00	16,21	0,00%	$ 1.505.488,00	0,00	$ -
6,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	$ 20.978,00	15	17,00%	$ 368.164,00	0,00	$ -
6,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 5" X 3"	$ 38.625,00	22	17,00%	$ 994.208,00	0,00	$ -
6,10	SUMIDERO LONGITUDINAL TIPO CARCAMO DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO (INCLUYE CONCRETO FUNDIDO EN SITIO 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, PINTURA Y REJILLA DE TAPA)	$ 693.726,00	22	17,00%	$ 17.856.507,00	0,00	$ -
6,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	$ 75.029,00	6	17,00%	$ 526.704,00	0,00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 44.615.268,00**		**$ -**
7	**CAP. 7: REALIZAR OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS DEPORTIVOS**						
7,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	$ 70.516,00	58,02	0,00%	$ 4.091.338,00	0,00	$ -

7,2	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	$ 92.874,00	92,86	0,00%	$	8.624.280,00	0,00	$ -
7,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO COLORES SEGÚN DISEÑO CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM.	$ 170.840,00	233,33	17,00%	$	46.638.654,00	0,00	$ -
7,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	$ 117.262,00	4,87	17,00%	$	668.147,00	0,00	$ -
7,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	$ 123.513,00	12,9	17,00%	$	1.864.182,00	0,00	$ -
7,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	$ 22.214,00	242,16	0,00%	$	5.379.342,00	0,00	$ -
7,7	CONSTRUCCION DE JARDINES	$ 395.203,00	15,46	17,00%	$	7.148.511,00	0,00	$ -
7,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 (30 X 30 X 1.7 CM.)	$ 132.414,00	617,07	17,00%	$	95.599.187,00	0,00	$ -
7,9	PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSÍN DE GRANITO	$ 62.001,00	617,07	17,00%	$	44.762.980,00	0,00	$ -
7,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2" INCL.TABLERO ACRILICO 10 MM PARA ANCLAR AL PISO	$ 9.737.125,00	1	17,00%	$	11.392.436,00	0,00	$ -
7,11	DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE	$ 9.162,00	281,44	17,00%	$	3.016.907,00	0,00	$ -

	AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).						
7,12	DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	$ 23.611,00	31,75	17,00%	$ 877.090,00	0,00	$ -
7,13	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	$ 33.429,00	5,7	17,00%	$ 222.938,00	0,00	$ -
7,14	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	$ 7.674,00	253,21	17,00%	$ 2.273.466,00	0,00	$ -
7,15	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	$ 887.295,00	2,74	17,00%	$ 2.844.490,00	0,00	$ -
7,16	MURO EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO ESTRUCTURAL E = 0.15 M.	$ 166.227,00	9,12	17,00%	$ 1.773.709,00	0,00	$ -
7,17	MORTERO TIPO GROUTING DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	$ 569.328,00	0,11	17,00%	$ 73.273,00	0,00	$ -
7,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	$ 7.423,00	84,14	17,00%	$ 730.748,00	0,00	$ -
7,19	LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM.	$ 107.037,00	48,05	17,00%	$ 6.017.460,00	0,00	$ -
7,20	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	$ 131.537,00	8,55	17,00%	$ 1.315.830,00	0,00	$ -
7,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80	$ 77.303,00	43,14	17,00%	$ 3.901.776,00	0,00	$ -

	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 249.216.744,00**		**$ -**
8	**CAP. 8: REALIZAR INSTALACIÓN RED DE BAJA TENSION, ILUMINACIÓN Y SISTEMA PUESTA A TIERRA**						
8,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	$ 70.516,00	12,49	0,00%	$ 880.745,00	0,00	$ -
8,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	$ 118.116,00	2	17,00%	$ 276.391,00	0,00	$ -
8,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL BIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.8 AWG (2F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1")	$ 40.726,00	46,84	17,00%	$ 2.231.899,00	0,00	$ -
8,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG (2F, T) Y DUCTO PVC DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	$ 122.640,00	1	17,00%	$ 143.489,00	0,00	$ -
8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL BIFÁSICO EXPUESTO EN CABLE DE COBRE No.12 AWG (2F, N, T). INCLUYE TUBO EMT DE 3/4").	$ 32.952,00	91,03	17,00%	$ 3.509.556,00	0,00	$ -
8,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA TIPO FRANKLYN DE 0.6 M PARA SISTEMA	$ 126.156,00	8	17,00%	$ 1.180.820,00	0,00	$ -

	DE APANTALLAMIENTO							
8,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN DE 8 MM PARA ANILLO SUPERIOR DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	$ 19.745,00	157,69	17,00%	$ 3.642.899,00	0,00	$ -	
8,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE APANTALLAMIENTO EN ALAMBRÓN DE 8 MM EXPUESTA EN TUBO IMC DE 3/4"	$ 54.124,00	28	17,00%	$ 1.773.102,00	0,00	$ -	
8,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 1/0 PARA ANILLO INFERIOR DE APANTALLAMIENTO	$ 42.463,00	104,23	17,00%	$ 5.178.325,00	0,00	$ -	
8,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 PARA S.P.T. Y/O SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	$ 87.260,00	8	17,00%	$ 816.754,00	0,00	$ -	
8,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).	$ 596.507,00	5	17,00%	$ 3.489.566,00	0,00	$ -	
8,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFASICO DE 12 CIRCUITOS.	$ 279.702,00	1	17,00%	$ 327.251,00	0,00	$ -	
8,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION DE 4 CIRCUITOS	$ 2.671.481,00	1	0,00%	$ 2.671.481,00	0,00	$ -	
8,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED	$ 491.430,00	8	17,00%	$ 4.599.785,00	0,00	$ -	

	TIPO HIGH BAY DE 100 W						
8,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PARA RIEL DE 1 X 20 AMP.	$ 27.351,00	3	17,00%	$ 96.002,00	0,00	$ -
8,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PARA RIEL DE 2 X 20 AMP.	$ 54.310,00	1	17,00%	$ 63.543,00	0,00	$ -
8,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PARA RIEL DE 2 X 30 AMP.	$ 56.020,00	2	17,00%	$ 131.087,00	0,00	$ -
8,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PARA RIEL DE 2 X 40 AMP.	$ 56.020,00	1	17,00%	$ 65.543,00	0,00	$ -
8,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL BIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.10 AWG (2F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 3/4")	$ 25.859,00	1,3	17,00%	$ 39.332,00	0,00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 31.117.570,00**		**$ -**
9	**CAP. 9:REALIZAR CERRAMIENTO MALLA CONTRAIMPACTO**						
9,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	$ 70.516,00	2,79	0,00%	$ 196.740,00	0,00	$ -
9,2	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	$ 33.429,00	6,11	17,00%	$ 238.974,00	0,00	$ -
9,3	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	$ 7.674,00	493,93	17,00%	$ 4.434.790,00	0,00	$ -

9,4	PILOTE D = 30 CM. CONCRETO 21MPa - (3000 PSI). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO (INCUYE. EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 5 KM	$ 210.721,00	13,5	0,00%	$ 2.844.734,00	0,00	$ -
9,5	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	$ 887.295,00	1,83	17,00%	$ 1.899.787,00	0,00	$ -
9,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRAIMPACTO H = 5,0 M.	$ 2.360.571,00	20	17,00%	$ 55.237.361,00	0,00	$ -
9,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TEJIDA 12X12 EN NYLON DE ALTA TENACIDAD Y RESISTENCIA CALIBRE 5 MM PARA ZONA POSTERIOR DEL ESCENARIO DEPORTIVO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	$ 101.388,00	120,09	0,00%	$ 12.175.685,00	0,00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 77.028.071,00**		**$ -**
	TOTAL OBRA				**$ 1.815.534.666,00**		**$ 198.074.832,00**
	OTRO						
	COSTOS INDIRECTOS (AIU)			**30%**	**$ 544.660.400,00**	**30%**	**$ 59.422.450,00**
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)				**$ 34.492.027,33**		**$ -**
	CERTIFICACION RETIE				**$ 8.000.000,00**		**$ -**
	CERTIFICACION RETILAP				**$ 9.000.000,00**		**$ -**
	TOTAL OBRA				**$ 2.411.687.093,33**		**$ 257.497.282,00**

Fuente: Elaboracion propia

Durante el periodo de obra después de la suscripción de acta de inicio se ha seguido la ejecución de acorde al flujo de fondos aprobado entre las partes para lo cual a fecha del presente oficio se presenta un porcentaje de ejecución físico porcentual del 10.91% correspondiente a un valor de $ 257.497.282, con respecto al porcentaje de programación de obra porcentual del 11.94% con un valor equivalente a $ 281.807.290. a continuación, se presenta curva "s" de ejecución.

FECHA DE CORTE	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO
24/04/2026	$ 281.807.290	$ 257.497.282
	11,94%	10,91%
% DIFERENCIA DE EJEUCIÓN	1,03%	

Fuente: Elaboracion propia

2. justificación técnica de ajuste y balance de obra:

La justificación técnica se presenta en el oficio **CO-IPVO-030-2025-OF-020** anexo al presente documento, de igual manera son anexados Balance de obra con memorias de cantidades en formato Excel y pdf, APU de inclusión de ítem nuevo con su respectivo desglosé.

3. sustentación de excavaciones mecánicas:

De acuerdo con lo expuesto en el oficio de obra **CO-IPVO-030-2025-OF-020**, y considerando la inclinación existente en la cancha del escenario deportivo de la Institución Educativa Valle de Tenza, se hace necesaria la ejecución de actividades de nivelación del material con el fin de conformar adecuadamente la subrasante de la cancha multifuncional. Lo anterior se fundamenta en que la cancha existente tenía una pendiente o desnivel de aproximadamente 70 cm en sentido longitudinal en 30 m. razón por la cual es importante nivelar el área de la cancha en su totalidad con el objetivo de garantizar el estricto cumplimiento de los niveles y cotas establecidos en los planos de la cimentación de la cubierta y la cancha multifuncional.

Para efectos de soporte técnico, se anexan las carteras topográficas correspondientes a los m3 de material de a retirar conforme a la nivelación de la cancha, así como el respectivo registro fotográfico. De igual manera, en las memorias de balance se presentan las dimensiones y cantidades requeridas para la correcta ejecución de la actividad.

Ilustración 1: plano topográfico con curvas de nivel:

Desnivel de cancha de 0.70 m en sentido longitudinal

Fuente: Componen te topográfico estudios y diseños aprobados

Como se puede observar en las ilustraciones del plano topográfico se evidencian curvas de nivel de la cancha con desniveles de 0.70 m desde la abscisa ko+000 con una cota de 1829.40 msnm a la abscisa ko+038 con una cota de 1828.70 en sentido longitudinal.

4. componente estructural muros y arquitectónico:

Se presenta informe y concepto técnico de obras adicionales con las respectivas memorias de cálculo, planos en formato PDF Y DWG y memorial de responsabilidad de los profesionales designados de los componentes estructurales y arquitectónicos al presente documento para revisión y aprobación del mismo.

Acorde a lo anterior nos permitimos anexar los siguientes documentos, para revisión y fines pertinentes:

- sabana de mayores y menores cantidades en digital y PDF
- oficio solicitud acta de mayores y menores con justificación técnica **CO-IPVO-030-2025-OF-020**
- memoria de cantidades en digital y PDF
- cartera topográfica
- APU ítem muro de contención editable y PDF.
- concepto técnico muro estructural
- planos muro de contención y arquitectónico en DWG y pdf
- memoriales de responsabilidad
- Comités de obra

Los anteriores documentos se encuentran disponibles en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/10zVFu71ZFH8kPkqotY_Jzqy3Ma7SubrU?usp=sharing

Cordialmente,

Ing. M.sc LUIS EDUARDO SICHACÁ GAMEZ
C.C 1.049.603.584 de Tunja
PSI INGENIEROS S.A.S
Dirección: Calle 20 No. 13-14 Oficina 216 B
Cel: 313-830-72-69
e-mail: cubiertaguateque@gmail.com
psi.ingenieros1@gmail.com

Outlook

INFORME SEGUIMIENTO, ACORDE A COMPROMISOS PACTADOS EN COMITÉ DE OBRA NO. 007 IPVO030-2025

Desde CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>
Fecha Vie 08/05/2026 10:26
Para Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>

1 archivo adjunto (24 MB)
24.1 CO-IPVO-030-2025-OF-024.pdf;

Tunja, 08 de mayo de 2026

INGENIEROS,

JORGE ARMANDO CALDERÓN SÁNCHEZ
R/L CONSORCIO INTERVALLE 2026
INTERVENTORÍA

JULIAN EDGARDO GUERRERO
SUPERVISOR
TIERRASUA S.A.S

CO-IPVO-030-2025-OF-024

REFERENCIA: INFORME SEGUIMIENTO, ACORDE A COMPROMISOS PACTADOS EN COMITÉ DE OBRA NO. 007 IPVO030-2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

Cordial saludo,

En atención a la visita técnica realizada por la supervisión del proyecto de construcción del escenario deportivo en la institución educativa, y conforme a la solicitud efectuada por dicha supervisión mediante comité de obra Número 007-IPVO-030 de fecha 06 de mayo del presente año, se presenta el presente informe de seguimiento al estado de las estructuras existentes (zona baños y biblioteca estudiantil) colindantes al área de intervención de la obra. El informe tiene como propósito documentar las condiciones observadas en los bloques existentes de baños y biblioteca antes del inicio de las actividades constructivas, así como las afectaciones evidenciadas posteriormente durante la ejecución de las excavaciones requeridas para la conformación de la cancha, áreas de urbanismo y las cimentaciones proyectadas.

De igual manera, se describen las medidas preventivas y correctivas implementadas por la firma contratista con el fin de mitigar riesgos, salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil y controlar las afectaciones presentadas, así como el seguimiento técnico realizado sobre las zonas comprometidas.

El presente documento se emite como soporte técnico de seguimiento y control de las condiciones estructurales observadas durante la ejecución del proyecto.

ANTECEDENTES:

En el marco de la ejecución del proyecto de construcción del escenario deportivo, se realizaron actividades de excavación para:

- Ampliación de la sección transversal de la cancha proyectada.
- Excavaciones para conformación de zapatas de cimentación.
- Adecuación de niveles y conformación del terreno.

Las excavaciones fueron ejecutadas en un sector colindante a dos bloques existentes correspondientes a:

- Bloque de baños.
- Bloque de biblioteca.

Debido a la diferencia de altura entre el nivel proyectado de la cancha y la cota de cimentación superficial de los bloques existentes, se presentó un desprendimiento parcial del material de soporte localizado bajo la viga de cimentación superficial de dichas estructuras. Como consecuencia de lo anterior, se evidenció un asentamiento diferencial localizado, generando afectaciones visibles principalmente en:

- Piso existente en baldosa.
- Aparición y/o incremento de fisuras en elementos estructurales y no estructurales.
- Afectación puntual en muro lateral del bloque de baños.

ESTADO INICIAL DE LAS ESTRUCTURAS ANTES DE LA INTERVENCIÓN

Previo al inicio de las actividades constructivas, durante las visitas de reconocimiento y seguimiento inicial acta de vecindad de inicio, se evidenció que los bloques existentes ya presentaban algunas patologías y deterioros asociados al uso, antigüedad y comportamiento normal de la estructura.

Entre las condiciones observadas previamente se identificaron:

FISURAS EN PLACAS:

- Existencia de fisuras longitudinales y transversales en placas de piso y elementos de concreto.
- Las fisuras observadas no representaban, a la fecha de inspección inicial, una condición de gravedad estructural.

COLUMNAS CIRCULARES


- Presencia de fisuras longitudinales superficiales en algunas columnas circulares.
- Desprendimiento localizado de recubrimiento de concreto en ciertos puntos.

ESTADO GENERAL


- Se evidenciaban signos de desgaste normal por uso y antigüedad de las edificaciones.
- No se observaron indicios de falla estructural inminente previo al inicio de las excavaciones.

A continuación, se presenta el registro fotográfico que permite evidenciar lo mencionado anteriormente:


REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL PREVIO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA ZONA BAÑOS NIÑAS:




Fachada posterior baños mujeres el cual se encuentra ubicado paralelamente al escenario deportivo, se evidencia muro perimetral en buen estado





La anterior fotografía demuestra la distribución arquitectónica que comprende el pasillo de ingreso a baño de mujeres y estructura comprendida entre columnas circulares que soportan placa de concreto de cubierta entre zona de baños y biblioteca institucional, como se puede evidenciar en los círculos de color rojo en la anterior fotografía, se evidencian grietas en sentidos longitudinal y transversal y desprendimiento de material en placa de piso entre la grada y el nivel existente del pasillo, adicionalmente las columnas circulas se logra identificar fisuras y desprendimientos de concreto en sus elemento tal cual lo muestran los círculos de color rojo en las siguientes ilustraciones:












La anterior fotografía evidencia el estado del piso del pasillo o zona de ingreso a baño de mujeres el cual está construido en baldosa, los círculos de color rojo permiten evidenciar roturas en sentido transversal en algunas baldosas existentes. De manera general se concluye que el piso se encuentra en un estado aceptable.

REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL PREVIO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA, BIBLIOTECA ESTUDIANTIL:



Las anteriores fotografías evidencian la fachada perimetral, muros internos y cubierta de la estructura de la biblioteca paralela al escenario deportivo de la institución valle de Tenza, no se evidencian afectaciones se concluye que la estructura se encuentra en buen estado.

DESCRIPCIÓN DE LA EVENTUALIDAD PRESENTADA


Durante la ejecución de las excavaciones requeridas para el proyecto, particularmente en el sector colindante a los bloques existentes, se presentó un desprendimiento del material de soporte asociado a la cimentación superficial de las estructuras existentes. La condición anteriormente descrita generó un asentamiento diferencial localizado en la viga de cimentación, ocasionando:

- Afectación del piso existente en baldosa entre los bloques de baños y biblioteca.
- Incremento y aparición de nuevas fisuras en algunas columnas.
- Aparición de fisuras en muro lateral del bloque de baños.
- Alteraciones localizadas en elementos no estructurales y de acabado.


Es importante señalar que parte de las fisuras existentes correspondían a patologías previas a la intervención como se indica en el anterior capitulo; sin embargo, las actividades de excavación incidieron directamente en las afectaciones recientemente evidenciadas en los sectores indicados.


A continuación, se presenta el registro fotográfico que permite evidenciar lo mencionado anteriormente:


REGISTRO FOTOGRÁFICO POSTERIOR AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA ZONA BAÑOS NIÑAS:





Fisuras longitudinales en baldosas, existentes a casusa de asentamiento en la viga de cimentación del baño de las mujeres de la institución educativa.











La anterior fotografía evidencia la biblioteca estudiantil, los muros y cubierta se encuentran en buen estado. Se evidencia un asentamiento en la puerta de ingreso, lo que dificulta la apertura de la puerta metálica

MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL CONTRATISTA

Una vez identificada la situación presentada, la firma contratista de obra ejecutó de manera inmediata las siguientes acciones:

- **AISLAMIENTO PREVENTIVO:** Se realizó el aislamiento de las zonas afectadas con el fin de restringir el acceso de estudiantes, docentes y personal administrativo.

- **SEÑALIZACIÓN:** Se implementó señalización preventiva y control de circulación peatonal.

- **COMUNICACIÓN A LAS PARTES INTERESADAS:** La situación fue comunicada oportunamente a la comunidad estudiantil, supervisión/interventoría del proyecto mediante oficio de obra No. CO-IPVO-030-OF-014 (*REF: Solicitud de inhabilitación temporal de bloques de biblioteca y baños de niñas por excavaciones aledañas a la obra*)

FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN

La firma contratista elaboró y socializó un plan de acción ante la interventoría mediante oficio de obra No. CO-IPVO-030-OFI- 017 REF: (*Respuesta a oficio INT-053-OF-020 – Plan de Contingencia y Plan de Acción)* orientado a

- Prevenir mayores afectaciones sobre las estructuras existentes.

- Estabilizar el sector intervenido.

- Mitigar riesgos asociados a asentamientos adicionales.

- Garantizar condiciones seguras durante la continuidad de la obra.

EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Actualmente, el contratista se encuentra ejecutando las actividades contempladas dentro del plan de acción aprobado y radicado ante la interventoría, encaminadas al control y estabilización de las zonas afectadas.

CONCLUSIONES

- Antes del inicio de las actividades constructivas, los bloques existentes ya presentaban algunas patologías y afectaciones menores, tales como fisuras longitudinales y transversales en placas, fisuras superficiales y desprendimiento localizado de concreto en algunas columnas circulares.
- Las excavaciones ejecutadas para la ampliación de la cancha y construcción de zapatas generaron una afectación sobre el material de soporte de la viga de cimentación superficial de los bloques colindantes, ocasionando un asentamiento diferencial localizado.
- Se realizó inspección y auscultación visual a la cafetería estudiantil, para lo cual no se evidencian afectaciones, se concluye que se encuentra en las mismas condiciones previo al inicio a las actividades del contrato.
- Una vez finalice la ejecución del plan de acción radicado ante la interventoría y culminen las actividades principales del proyecto, se realizará una evaluación técnica integral para definir las medidas definitivas de reajuste, reparación y/o rehabilitación requeridas en las zonas afectadas.

Atentamente,

ING. M.SC. LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. 1.049.603.584 de Tunja
R/L PSI INGENIEROS S.A.S.
Contratista
Cel: 313-830-72-69
cubiertaguateque@gmail.com
psi.ingenieros1@gmail.com
Anexos: comité de obra No.007
Oficios: CO-IPVO-030-OF-014
CO-IPVO-030-OFI- 017

Outlook

RE: Remisión documentos soporte orden de giro anticipo No.3

Desde Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>
Fecha Lun 11/05/2026 9:35
Para CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>

1 archivo adjunto (3 MB)
26.INT-053-2025-OF-026.pdf;

Guateque, 11 de mayo de 2026

INT-053-OF-026

Señor:
LUIS EDUARDO SICHACA GÁMEZ
R/L PSI INGENIEROS S.A.S
Contratista

REF: Respuesta a remisión de documentos soporte y aprobación de orden de giro de anticipo No. 3, contrato de obra IPVO 030-2025

Cordial saludo

En atención al oficio remitido por su despacho con fecha del 08 de mayo de 2026, mediante el cual se presentan los documentos soporte para el trámite No. 3 de orden de giro de anticipo del proyecto *"Mejoramiento del escenario recreativo y de actividades lúdicas en la Institución Educativa Técnica Valle de Tenza en la sede campestre en el municipio de Guateque, departamento de Boyacá"*, esta Interventoría se permite informar lo siguiente:

Tras la revisión técnica y administrativa de los folios anexos, se confirma la recepción satisfactoria de los siguientes documentos:

- **Factura Electrónica de Venta: FVEJ282** La factura electrónica de venta No. FE10205 emitida por INCONS S.A.S. el 06/05/2026, por un valor total de **$80.690.909,10** (Ochenta millones seiscientos noventa mil novecientos nueve con diez centavos), cumple con los requisitos legales y corresponde a los conceptos de avance de obra y administración en el municipio de Guateque.
- **Registro Único Tributario (RUT):** Se verifica la vigencia del RUT de INCONS S.A.S. (NIT 901062819-9), con actividad principal 4290 y responsabilidades tributarias actualizadas al 06/03/2026.
- **Certificación Bancaria:** Constancia de la cuenta corriente No. 92300000119 en Bancolombia S.A., a nombre de la empresa subcontratista, con estado ACTIVA.
- **Plan de Inversión del Anticipo:** Documento debidamente firmado por el Contratista, la Interventoría, el cual detalla una inversión total de $723.506.128,00.

El concepto de la factura presentada corresponde al "Avance del contrato de construcción, mano de obra y equipo para construcción de obra civil". Este rubro se encuentra debidamente contemplado en el Ítem 2 del Plan de Inversión aprobado ("SALARIOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS, SUBCONTRATO"), el cual tiene asignado un presupuesto total de $166.405.000.00 (23.00% del anticipo total). El valor facturado es coherente con la disponibilidad de dicho rubro para el presente periodo.

Una vez verificada la vigencia de los documentos y su alineación con el Contrato No. IPVO 030-2025, esta Interventoría procede a dar su **APROBACIÓN** para el trámite de giro ante la fiduciaria correspondiente, conforme al Plan de Inversión y Anticipo establecido.

Atentamente,

ING. JORGE ARMANDO CALDERÓN SANCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERVALLE 2026

De: CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>
Enviado: viernes, 8 de mayo de 2026 10:37
Para: Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>
Asunto: Remisión documentos soporte orden de giro anticipo No.3

Tunja, 08 de mayo de 2026

INGENIERO,

JORGE ARMANDO CALDERÓN SÁNCHEZ

R/L CONSORCIO INTERVALLE 2026

INTERVENTORÍA

CO-IPVO-030-2025-OF-025

REFERENCIA: Remisión documentos soporte orden de giro anticipo No.3

OBJETO: “MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito documentos soporte de la tercera orden de giro de anticipo, para su revisión y aprobación. Se anexan los siguientes documentos:

- Factura
- RUT
- certificación bancaria,
- plan de inversión del anticipo aprobado

Atentamente,

ING. M.SC. LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. 1.049.603.584 de Tunja
R/L PSI INGENIEROS S.A.S.
Contratista
Cel: 313-830-72-69
cubiertaguateque@gmail.com
psi.ingenieros1@gmail.com

Outlook

Fwd: Remisión documentos soporte orden de giro anticipo No.4

Desde CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>
Fecha Mié 13/05/2026 11:45
Para Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>

1 archivo adjunto (2 MB)
26. CO-IPVO-030-2025-OF-026.pdf;

---------- Forwarded message ---------
De: **CUBIERTA GUATEQUE** <cubiertaguateque@gmail.com>
Date: mar, 12 may 2026 a la(s) 9:10 p.m.
Subject: Remisión documentos soporte orden de giro anticipo No.4
To: Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>

Tunja, 12 de mayo de 2026

INGENIERO,

JORGE ARMANDO CALDERÓN SÁNCHEZ

R/L CONSORCIO INTERVALLE 2026

INTERVENTORÍA

CO-IPVO-030-2025-OF-026

REFERENCIA: Remisión documentos soporte orden de giro anticipo No.4

OBJETO: “MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito documentos soporte de la cuarta orden de giro de anticipo, para su revisión y aprobación. Se anexan los siguientes documentos:

- Factura
- RUT

- certificación bancaria,
- plan de inversión del anticipo aprobado

Atentamente,

ING. M.SC. LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. 1.049.603.584 de Tunja
R/L PSI INGENIEROS S.A.S.
Contratista
Cel: 313-830-72-69
cubiertaguateque@gmail.com
psi.ingenieros1@gmail.com

Outlook

Remisión documentos soporte orden giro anticipo No.5

Desde CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>
Fecha Jue 28/05/2026 10:36
Para Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>

1 archivo adjunto (1 MB)
29. CO-IPVO-030-2025-OF-029docx.pdf;

Tunja, 28/05/2026

SEÑORES:

INGENIERO,
YILMAR MEDINA ANDRADE
R/L CONSORCIO INTERVALLE 2026
INTERVENTORIA

CO-IPVO-030-2025-OF-029

REFERENCIA: Remisión documentos soporte orden giro anticipo No.5

OBJETO: "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. "

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito documentos soporte de la orden de giro de anticipo #5, para su revisión y aprobación.

Se anexan los siguientes documentos:

- factura
- RUT
- certificación bancaria,
- plan de inversión del anticipo aprobado

Cordialmente,

Ing. M.sc LUIS EDUARDO SICHACÁ GAMEZ
C.C 1.049.603.584 de Tunja
PSI INGENIEROS S.A.S
Dirección: Calle 20 No. 13-14 Oficina 216 B
Cel: 313-830-72-69
e-mail: cubiertaguateque@gmail.com
psi.ingenieros1@gmail.com

Outlook

Aclaración estado de pago Factura Electrónica FEME139 – Orden de Giro No. 5 al proveedor M&E COMPANY COLOMBIA SAS

Desde CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>
Fecha Jue 28/05/2026 14:47
Para Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>

1 archivo adjunto (168 KB)
30. CO-IPV-030-2025-OF-030docx.pdf;

Tunja, 28/05/2026

SEÑORES:
INGENIERO,
YILMAR MEDINA ANDRADE
R/L CONSORCIO INTERVALLE 2026
INTERVENTORIA

CO-IPVO-030-2025-OF-030

REFERENCIA: Aclaración estado de pago Factura Electrónica FEME139 – Orden de Giro No. 5 al proveedor M&E COMPANY COLOMBIA SAS

OBJETO: "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos informar a la Interventoría lo relacionado con la Factura Electrónica de Venta N° FEME139, expedida por el proveedor M&E COMPANY COLOMBIA SAS (NIT 901534198-1), correspondiente a la fabricación y montaje de la estructura metálica para el escenario deportivo de la Institución Educativa Valle de Tenza – Municipio de Guateque, cuyo valor total es de $340.001.189,75 (trescientos cuarenta millones un mil ciento ochenta y nueve pesos con setenta y cinco centavos).

Dicha factura fue remitida oportunamente a la Interventoría como soporte de giro para el Anticipo No. 1, siendo tramitada y aprobada por esa corporación. El giro correspondiente se efectuó el día 23 de abril de 2026, por un valor de $194.300.000,00 (ciento noventa y cuatro millones trescientos mil pesos), como pago parcial (anticipo) sobre el valor total de la factura. En consecuencia, quedó un saldo pendiente por cancelar de $145.701.189,75 (ciento cuarenta y cinco millones setecientos un mil ciento ochenta y nueve pesos con setenta y cinco centavos).

Con el fin de cancelar en su totalidad la Factura Electrónica FEME139, con fecha 28 de mayo de 2026 se tramita ante la Interventoría la Orden de Giro No. 5, orden que sera girada desde la Fiducia (Alianza

Fiduciaria S.A.) directamente al mismo proveedor M&E COMPANY COLOMBIA SAS. El valor de la orden de giro, una vez aplicados los descuentos tributarios de ley, asciende a $138.936.224,47 (ciento treinta y ocho millones novecientos treinta y seis mil doscientos veinticuatro pesos con cuarenta y siete centavos).

Es importante precisar que los valores correspondientes a impuestos (IVA y retenciones) no son trasladados al proveedor ni son objeto de giro desde la Fiducia. Dichos valores son asumidos con cargo al capital de trabajo del contratista de obra PSI INGENIEROS S.A.S y serán cancelados directamente desde las cuentas propias de la empresa, conforme a las obligaciones tributarias aplicables.

A continuación se resume el estado de pago de la factura:

Valor total Factura Electrónica FEME139: $340.001.189,75

Anticipo No. 1 girado el 23/04/2026: $194.300.000,00

Saldo pendiente tras Anticipo No. 1: $145.701.189,75

Descuentos tributarios aplicados (Orden de Giro No. 5): $6.764.965,28

Valor Orden de Giro No. 5 (28/05/2026): $138.936.224,47

Lo anterior se informa a la Interventoría para su conocimiento, revisión y aprobación del trámite de la Orden de Giro No. 5, con el propósito de dar cierre al pago total de la Factura Electrónica FEME139 al proveedor M&E COMPANY COLOMBIA SAS.

Cordialmente,

Ing. M.sc LUIS EDUARDO SICHACÁ GAMEZ
C.C 1.049.603.584 de Tunja
PSI INGENIEROS S.A.S
Dirección: Calle 20 No. 13-14 Oficina 216 B
Cel: 313-830-72-69
e-mail: cubiertaguateque@gmail.com / psi.ingenieros1@gmail.com

Outlook

Avance Semanal No 9 del 27 abril al 01 de mayo de 2026

Desde Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>
Fecha Sáb 02/05/2026 9:55
Para lcarlosmolina77@gmail.com <lcarlosmolina77@gmail.com>; freddy.dproyectostierrasua <freddy.dproyectostierrasua@gmail.com>
CC CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>

1 archivo adjunto (2 MB)
SEMANAL 9 DESDE EL 27-04-2026 AL 01-05-2026.pdf;

Cordial Saludo

Adjunto a este mensaje el informe de Avance Semanal No.9, correspondiente al periodo del 27 abril al 01 de mayo de 2026, relacionado con el contrato de obra IPVO-030-2025 para el mejoramiento del escenario recreativo en la Institución Educativa Técnica Valle de Tenza (Guateque, Boyacá).

Quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional.

Atentamente,

Danna Tatiana Jiménez Rivera
Residente de interventoría

Outlook

RE: Remisión documentos soporte orden giro anticipo No.1

Desde Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>
Fecha Sáb 02/05/2026 16:59
Para CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>

1 archivo adjunto (663 KB)
22.INT-053-2025-OF-022.pdf;

Estimado Ing. Luis Eduardo Sichaca Gámez:

Por medio del presente, el **Consorcio Intervalle 2026**, en su calidad de Interventoría, remite formalmente el oficio **INT-053-OF-022**.

Este documento contiene la respuesta técnica y administrativa a su solicitud del 20 de abril de 2026, referente al trámite de la **primera orden de giro de anticipo** para el proyecto de mejoramiento del escenario recreativo en la Institución Educativa Técnica Valle de Tenza.

Puntos destacados de la comunicación:

- **Aprobación:** Se otorga el aval para el trámite de giro ante la fiduciaria, tras verificar que la documentación soporte (Factura FEME139, RUT y Certificación Bancaria de M&E COMPANY COLOMBIA SAS) cumple con los requisitos.
- **Conformidad:** Se confirma que la factura presentada por **$340.001.189,75** se alinea correctamente con el Plan de Inversión del Anticipo aprobado, específicamente en el rubro de materiales e insumos.

Adjunto encontrará el archivo PDF con el oficio debidamente firmado por la dirección de interventoría.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional para la continuidad de este proceso.

Atentamente,

Ing. Jorge Armando Calderón Sánchez
Representante Legal
Consorcio Intervalle 2026

De: CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>
Enviado: lunes, 20 de abril de 2026 16:05
Para: Consorciointervalle2026@outlook.com <Consorciointervalle2026@outlook.com>
Asunto: Re: Remisión documentos soporte orden giro anticipo No.1

Cordial saludo, debido a un error en el cargue de los anexos en el anterior oficio nos permitimos realizar corrección del rut y certificación bancaria de la empresa MYE COMPANY S.A.S, para revisión y fines pertinentes

El lun, 20 abr 2026 a la(s) 2:07 p.m., CUBIERTA GUATEQUE (cubiertaguateque@gmail.com) escribió:

> Tunja, 20/04/2026
>
> **SEÑORES:**
>
> INGENIERO,
> JORGE ARMANDO CALDERÓN SÁNCHEZ
> R/L CONSORCIO INTERVALLE 2026
> INTERVENTORÍA
>
> CO-IPVO-030-2025-OF-012
>
> **REFERENCIA:** Remisión documentos soporte orden giro anticipo No.1
>
> **OBJETO:** "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. "
>
> Cordial saludo,
>
> Cordial saludo,
>
> Por medio de la presente, remito documentos soporte de la primera orden de giro de anticipo, para su revisión y aprobación.
>
> Se anexan los siguientes documentos:
> - factura
> - RUT
> - certificación bancaria,
> - plan de inversión del anticipo aprobado
>
> Cordialmente,
>
> Ing. M.sc LUIS EDUARDO SICHACÁ GAMEZ
> C.C 1.049.603.584 de Tunja
> **PSI INGENIEROS S.A.S**
> Dirección: Calle 20 No. 13-14 Oficina 216 B
> Cel: 313-830-72-69
> e-mail: cubiertaguateque@gmail.com
> psi.ingenieros1@gmail.com

Outlook

RE: Remisión documentos soporte orden de giro anticipo No.2

Desde Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>
Fecha Sáb 02/05/2026 17:02
Para CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>

1 archivo adjunto (655 KB)
23.INT-053-2025-OF-023.pdf;

Estimado Ing. Luis Eduardo Sichaca Gámez:

Por medio de la presente, el **Consorcio Intervalle 2026**, en ejercicio de sus funciones de Interventoría, remite el oficio **INT-053-OF-023**.

Este documento da respuesta a la comunicación enviada por su despacho el 29 de abril de 2026, mediante la cual se radicaron los soportes para el trámite de la **segunda orden de giro de anticipo** del proyecto de mejoramiento del escenario recreativo en la Institución Educativa Técnica Valle de Tenza.

Aspectos clave de la revisión:

- **Documentación Recibida:** Se confirma la recepción y validación de la Factura FVEJ282, el RUT y la Certificación Bancaria del proveedor Jandir Estiven Montaña Gonzalez.
- **Validación de Rubro:** Se verificó que el concepto por "Servicio de transporte de material y perfilería" por valor de **$88.842.630,00** es coherente con el ítem de transporte contemplado en el Plan de Inversión del Anticipo aprobado.
- **Aval de Giro:** Cumplidos los requisitos técnicos y administrativos, esta Interventoría otorga su **APROBACIÓN** para proceder con el trámite de giro ante la fiduciaria.

Se adjunta el archivo PDF con el oficio formal para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Jorge Armando Calderón Sánchez
Representante Legal
Consorcio Intervalle 2026

De: CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>
Enviado: miércoles, 29 de abril de 2026 18:32
Para: Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>
Asunto: Remisión documentos soporte orden de giro anticipo No.2

Tunja, 29 de abril de 2026

INGENIERO,

JORGE ARMANDO CALDERÓN SÁNCHEZ

R/L CONSORCIO INTERVALLE 2026

INTERVENTORÍA

CO-IPVO-030-2025-OF-018

REFERENCIA: Remisión documentos soporte orden de giro anticipo No.2

OBJETO: "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito documentos soporte de la segunda orden de giro de anticipo, para su revisión y aprobación. Se anexan los siguientes documentos:

- Factura
- RUT
- certificación bancaria,
- plan de inversión del anticipo aprobado

Atentamente,

ING. M.SC. LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. 1.049.603.584 de Tunja
R/L PSI INGENIEROS S.A.S.
Contratista
Cel: 313-830-72-69
cubiertaguateque@gmail.com
psi.ingenieros1@gmail.com

Outlook

Requerimiento preventivo y correctivo - Control de aguas en excavaciones - Obra IE Técnica Valle de Tenza

Desde Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>
Fecha Lun 04/05/2026 14:49
Para CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>

1 archivo adjunto (867 KB)
25.INT-053-2025-OF-025.pdf;

Estimado Ing. Luis Eduardo Sichaca Gámez:

Cordial saludo.

Por medio del presente, hago entrega formal del requerimiento **INT-053-OF-025**, relacionado con la inspección de campo realizada recientemente en el proyecto de "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA".

Se ha constatado la acumulación crítica de aguas (escorrentía y/o freática) en diversas áreas de excavación, lo cual representa un riesgo inminente para la estabilidad de los taludes, la capacidad portante del suelo, la seguridad del personal y la integridad técnica del concreto.

Para mitigar los riesgos identificados, se solicita la implementación inmediata de las siguientes medidas:

- **Evacuación de Aguas (Bombeo):** Disponer de equipos de bombeo de capacidad suficiente para mantener las excavaciones secas.
- **Canalización:** Construir barreras, diques de tierra o canales de desviación para evitar el ingreso de aguas lluvias.
- **Protección de Taludes:** Recubrir los taludes con polietileno para prevenir erosión y pérdida de cohesión.
- **Inspección de Entibados:** Revisar la integridad de los sistemas de contención ante posibles presiones hidrostáticas.
- **Seguridad:** Reforzar el aislamiento y señalización de áreas para prevenir accidentes por caídas.

Dada la urgencia técnica y los posibles retrasos en el cronograma por la necesidad de reemplazar material inadecuado, **se requiere la presentación de un plan de acción en un plazo no mayor a 24 horas**, detallando las maniobras a realizar.

Quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente,

Danna Tatiana Jiménez Rivera
Residente de Interventoría
CONSORCIO INTERVALLE 2026

Outlook

INFORME MENSUAL 3 DE ABRIL

Desde Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>
Fecha Lun 04/05/2026 17:23
Para freddy.dproyectostierrasua <freddy.dproyectostierrasua@gmail.com>; lcarlosmolina77@gmail.com <lcarlosmolina77@gmail.com>

1 archivo adjunto (826 KB)
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA E INFORME ABRIL GUATEQUE (2).pdf;

Reciban un cordial saludo.

Por medio del presente, hago entrega formal del Informe Mensual de Actividades correspondiente al mes de ABRIL, en cumplimiento de las obligaciones establecidas.

Se adjuntan los siguientes documentos para su revisión y fines pertinentes:

1. Certificación de avance periodo abril.
2. Informe de interventoría de acuerdo a la obra abril con sus anexos.

Quedo atento a sus comentarios o a cualquier requerimiento de información adicional que consideren necesario para la aprobación del mismo.

Atentamente

Danna Tatiana Jiménez Rivera

INFORME DE INTERVENTORIA DE OBRA ABRIL GUATEQUE (2).pdf

Outlook

Avance Semanal No 10 del 05 de mayo al 08 de mayo de 2026

Desde Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>
Fecha Jue 07/05/2026 14:54
Para lcarlosmolina77 <lcarlosmolina77@gmail.com>; freddy.dproyectostierrasua <freddy.dproyectostierrasua@gmail.com>
CC CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>

1 archivo adjunto (2 MB)
SEMANAL 10 DESDE EL 04-05-2026 AL 08-05-2026.pdf;

Cordial Saludo

Adjunto a este mensaje el informe de Avance Semanal No.10, correspondiente al periodo del 04 de mayo al 08 de mayo de 2026, relacionado con el contrato de obra IPVO-030-2025 para el mejoramiento del escenario recreativo en la Institución Educativa Técnica Valle de Tenza (Guateque, Boyacá).

Quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional.

Atentamente,

Danna Tatiana Jiménez Rivera
Residente de interventoría

Outlook

Remisión Informes Corregidos Mensuales de Actividades y Seguimiento – Febrero y Marzo 2026

Desde Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>
Fecha Jue 07/05/2026 15:23
Para lcarlosmolina77 <lcarlosmolina77@gmail.com>; freddy.dproyectostierrasua <freddy.dproyectostierrasua@gmail.com>

INFORME DE INTERVENTORIA DE OBRA MARZO GUATEQUE.pdf

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito hacer entrega formal de los informes mensuales de actividades correspondientes a los meses de **febrero** y **marzo** del presente año.

Correcciones y ajustes solicitados previamente, cumpliendo así con los estándares técnicos y la rigurosidad requerida para el seguimiento del proyecto.

A continuación, se relacionan los archivos adjuntos:

1. **INFORME DE INTERVENTORIA DE OBRA FEBRERO GUATEQUE**
   INFORME DE INTERVENTORIA DE OBRA FEBRERO GUATEQUE.pdf

2. **INFORME DE INTERVENTORIA DE OBRA MARZO GUATEQUE**

Quedo atenta a cualquier observación adicional o al proceso de radicación.

Cordialmente,

Danna Tatiana Jiménez Rivera
Residente de Interventoría
CONSORCIO INTERVALLE 2026

Outlook

RE: Remisión documentos soporte orden de giro anticipo No.3

Desde Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>
Fecha Lun 11/05/2026 9:35
Para CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>

1 archivo adjunto (3 MB)
26.INT-053-2025-OF-026.pdf;

Guateque, 11 de mayo de 2026

INT-053-OF-026

Señor:
LUIS EDUARDO SICHACA GÁMEZ
R/L PSI INGENIEROS S.A.S
Contratista

REF: Respuesta a remisión de documentos soporte y aprobación de orden de giro de anticipo No. 3, contrato de obra IPVO 030-2025

Cordial saludo

En atención al oficio remitido por su despacho con fecha del 08 de mayo de 2026, mediante el cual se presentan los documentos soporte para el trámite No. 3 de orden de giro de anticipo del proyecto *"Mejoramiento del escenario recreativo y de actividades lúdicas en la Institución Educativa Técnica Valle de Tenza en la sede campestre en el municipio de Guateque, departamento de Boyacá"*, esta Interventoría se permite informar lo siguiente:

Tras la revisión técnica y administrativa de los folios anexos, se confirma la recepción satisfactoria de los siguientes documentos:

- **Factura Electrónica de Venta: FVEJ282** La factura electrónica de venta No. FE10205 emitida por INCONS S.A.S. el 06/05/2026, por un valor total de **$80.690.909,10** (Ochenta millones seiscientos noventa mil novecientos nueve con diez centavos), cumple con los requisitos legales y corresponde a los conceptos de avance de obra y administración en el municipio de Guateque.
- **Registro Único Tributario (RUT):** Se verifica la vigencia del RUT de INCONS S.A.S. (NIT 901062819-9), con actividad principal 4290 y responsabilidades tributarias actualizadas al 06/03/2026.
- **Certificación Bancaria:** Constancia de la cuenta corriente No. 92300000119 en Bancolombia S.A., a nombre de la empresa subcontratista, con estado ACTIVA.
- **Plan de Inversión del Anticipo:** Documento debidamente firmado por el Contratista, la Interventoría, el cual detalla una inversión total de $723.506.128,00.

El concepto de la factura presentada corresponde al "Avance del contrato de construcción, mano de obra y equipo para construcción de obra civil". Este rubro se encuentra debidamente contemplado en el Ítem 2 del Plan de Inversión aprobado ("SALARIOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS, SUBCONTRATO"), el cual tiene asignado un presupuesto total de $166.405.000.00 (23.00% del anticipo total). El valor facturado es coherente con la disponibilidad de dicho rubro para el presente periodo.

Una vez verificada la vigencia de los documentos y su alineación con el Contrato No. IPVO 030-2025, esta Interventoría procede a dar su **APROBACIÓN** para el trámite de giro ante la fiduciaria correspondiente, conforme al Plan de Inversión y Anticipo establecido.

Atentamente,

ING. JORGE ARMANDO CALDERÓN SANCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERVALLE 2026

De: CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>
Enviado: viernes, 8 de mayo de 2026 10:37
Para: Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>
Asunto: Remisión documentos soporte orden de giro anticipo No.3

Tunja, 08 de mayo de 2026

INGENIERO,

JORGE ARMANDO CALDERÓN SÁNCHEZ

R/L CONSORCIO INTERVALLE 2026

INTERVENTORÍA

CO-IPVO-030-2025-OF-025

REFERENCIA: Remisión documentos soporte orden de giro anticipo No.3

OBJETO: “MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito documentos soporte de la tercera orden de giro de anticipo, para su revisión y aprobación. Se anexan los siguientes documentos:

- Factura
- RUT
- certificación bancaria,
- plan de inversión del anticipo aprobado

Atentamente,

ING. M.SC. LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. 1.049.603.584 de Tunja
R/L PSI INGENIEROS S.A.S.
Contratista
Cel: 313-830-72-69
cubiertaguateque@gmail.com
psi.ingenieros1@gmail.com

Outlook

Semanal No.11 del 11 de mayo al 15 de mayo de 2026

Desde Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>
Fecha Vie 15/05/2026 9:01
Para freddy.dproyectostierrasua <freddy.dproyectostierrasua@gmail.com>; lcarlosmolina77 <lcarlosmolina77@gmail.com>
CC CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>

1 archivo adjunto (2 MB)
SEMANAL 11 DESDE EL 11-05-2026 AL 15-05-2026.pdf;

Cordial Saludo

Adjunto a este mensaje el informe de Avance Semanal No.11, correspondiente al periodo del 11 de mayo al 15 de mayo de 2026, relacionado con el contrato de obra IPVO-030-2025 para el mejoramiento del escenario recreativo en la Institución Educativa Técnica Valle de Tenza (Guateque, Boyacá).

Quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional.

Atentamente,

Danna Tatiana Jiménez Rivera
Residente de interventoría

Outlook

Re: Modificatorio No.1 al contrato de obra

Desde freddy.dproyectostierrasua <freddy.dproyectostierrasua@gmail.com>
Fecha Mar 02/06/2026 15:48
Para Consorcio Intervalle <consorciointervalle2026@outlook.com>

Acuso recibo, gracias.

> Sobre 2 jun 2026 en 3:34 p.m., Consorcio Intervalle <consorciointervalle2026@outlook.com> escribió:
>
> Cordial saludo Arquitecto Freddy,
>
> A continuación, se anexa la aprobación del modificatorio firmada por el representante legal de la interventoría.
>
> Atentamente,
>
> **DANNA TATIANA JIMENEZ RIVERA**
> Residente de Interventoría
> Consorcio Intervalle 2026
>
> 30.INT-053-2025-OF-030-MENORES Y MAYORES-1.pdf
>
> ---
>
> **De:** freddy.dproyectostierrasua <freddy.dproyectostierrasua@gmail.com>
> **Enviado:** martes, 2 de junio de 2026 15:12
> **Para:** patymozo_18 <patymozo_18@yahoo.com>; Tierrasua Técnica <tecnica@tierrasua.com>; Consorcio Intervalle <consorciointervalle2026@outlook.com>
> **Asunto:** Re: Modificatorio No.1 al contrato de obra
>
> Cordial saludo,
>
> Una vez revisado los documentos enviados por la interventoría y el oficio donde este avala y autoriza el modificarorio, solicito que el oficio lleve la firma del interventor y/o representante legal del consorcio.
>
> Agradezco su agilidad en el envío de lo requerido para darle tramite al modificatorio.
>
> Atentamente
>
> Freddy Ramírez

Sobre 27 may 2026 en 11:16 a.m., freddy.dproyectostierrasua <freddy.dproyectostierrasua@gmail.com> escribió:

Comienza a reenviar mensajes:

De: freddy.dproyectostierrasua <freddy.dproyectostierrasua@gmail.com>
Fecha: 26 may 2026 en 17:25
To: patymozo_18 <patymozo_18@yahoo.com>
Asunto: Fwd: Modificatorio No.1 al contrato de obra

Comienza a reenviar mensajes:

De: TIERRASUA <freddy.dproyectostierrasua@gmail.com>
Fecha: 26 may 2026 en 14:19
To: lcarlosmolina77 <lcarlosmolina77@gmail.com>
Asunto: Fwd: Modificatorio No.1 al contrato de obra

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Consorcio Intervalle** <Consorciointervalle2026@outlook.com>
Fecha: El mar, 26 may. 2026 a la(s) 2:07 p.m.
Asunto: RE: Modificatorio No.1 al contrato de obra
Para: CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>
Cc: freddy.dproyectostierrasua <freddy.dproyectostierrasua@gmail.com>, lcarlosmolina77 <lcarlosmolina77@gmail.com>

Cordial saludo

Ingeniero:

LUIS EDUARDO SICHACA GÁMEZ

Representante Legal - PSI INGENIEROS S.A.S

C.C. TIERRASUA S.A.S

Para: ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO Supervisor del Proyecto

Oficio N°: INT-053-OF-030

REF: Observaciones y aprobación técnica del Balance de Mayores y Menores Cantidades, contrato de obra IPVO 030-2025.

Objeto del contrato: *"MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"*.

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de interventoría del proyecto de la referencia, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales de seguimiento técnico, administrativo y financiero, nos permitimos remitir el informe de evaluación y viabilidad técnica relacionado con el balance de mayores y menores cantidades de obra, así como con la inclusión de ítems no previstos, presentado y radicado por el contratista de obra.

1. VARIACIONES DE LAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES
(Se da por reproducido y validado el cuadro analítico de los Capítulos 1 a 9 contenido en el cuerpo del informe, con un valor total de obra ejecutado AIU de $2.411.687.093,33).

2. OBSERVACIONES TÉCNICAS DEL BALANCE

- **Ítems 1.03 y 1.04 (Demoliciones):** El incremento registrado en estos ítems responde a que las estructuras halladas en el sitio (muros de mampostería, vigas de cimentación y espesores de la placa de la cancha) diferían de las especificaciones de los planos récord iniciales. Se constata que esta actividad se encuentra actualmente en fase de ejecución.

- **Excavaciones y Balance de Volúmenes:** Se integró la nueva actividad equivalente a "excavación mecánica" con el propósito de optimizar los rendimientos operativos del proyecto y responder de manera eficiente a las condiciones reales de la topografía del terreno.

- **Ítems Suprimidos:** Con el objetivo de ajustar el proyecto a la solución técnica concertada y garantizar la viabilidad financiera, se retiraron del presupuesto contractual las siguientes actividades:

    - **Ítem 7.08:** Suministro e instalación de baldosín de granito N° 5 (30 * 30 * 1.7 cm).
    - **Ítem 7.09:** Pulida y destronado de piso en baldosín de granito.
    - **Ítem 9.01:** Excavación manual en material común.
    - **Ítem 9.02:** Solado en concreto de espesor e = 0.05 m, 14 MPa (2000 PSI).
    - **Ítem 9.03:** Suministro, figurado y amarre de acero 60000 PSI / 420 MPa.
    - **Ítem 9.04:** Pilote D = 30 cm en concreto de 21 MPa (3000 PSI), sin incluir acero de refuerzo (incluye excavación, cargue y retiro de sobrantes hasta 5 km).
    - **Ítem 9.05:** Concreto para viga de amarre de 21 MPa (3000 PSI), de sección rectangular.
    - **Ítem 9.06:** Suministro e instalación de malla contra impacto H = 5.0 m.

    Nota de Ajuste en Cerramientos: Se reformó integralmente el Capítulo 9, unificando sus actividades en el **Ítem 9.07 (Malla tejida en nylon)**. Con el fin de ampliar el área de cobertura y optimizar la seguridad del escenario deportivo, se determinó duplicar la cantidad originalmente proyectada para este concepto.

- **Ítems No Previstos (Nuevas Actividades):** Para garantizar la estabilidad estructural y la funcionalidad del proyecto, se evaluaron y avalaron los siguientes Análisis de Precios Unitarios (APU):

- **Ítem 2.17 - Excavaciones mecánicas varias en material común seco (incluye acarreo libre hasta 5 km):** Actividad indispensable para la nivelación general del terreno, requerida tras identificar una diferencia de aproximadamente 70 cm entre los niveles topográficos del diseño y la rasante de la placa existente. Soporte técnico: Se adoptó el código 3.02.07 de la base de precios oficiales de la Gobernación de Boyacá.

- **Ítem 2.18 - Pulida o allanado para pisos en concreto:** Modificación concertada y aprobada en el comité técnico del 21 de mayo de 2026, con la participación de las autoridades institucionales, la administración municipal, la entidad contratante, el contratista y la interventoría. En dicha sesión se acordó por mutuo acuerdo suprimir los ítems de baldosín (7.08 y 7.09) y sustituirlos por este acabado. Soporte técnico: Se adoptó el código 2.18.14 de la Gobernación de Boyacá.

- **Ítem 3.04 - Muro de contención en concreto de 21 MPa (3000 PSI), de H = 2.01 m a 3.50 m:** Responde a las necesidades técnicas y geotécnicas críticas del terreno. Soporte técnico: Se adoptó como referencia el código 2.02.23 de la base de precios oficiales de la Gobernación de Boyacá.

3. CONCLUSIONES Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORÍA

- **Actualización Contractual:** Debido a la inclusión de estas nuevas actividades y a las modificaciones del terreno, el contratista deberá realizar la actualización inmediata del cronograma de obra y de los planos correspondientes. Asimismo, deberá compilar y radicar la documentación técnica y administrativa necesaria para la formalización del respectivo modificatorio contractual.

- **Principio de Compensación Presupuestal:** Se precisa que las modificaciones técnicas aquí detalladas se estructuraron bajo un estricto principio de compensación presupuestal. Por lo tanto, el valor total del contrato se mantiene inalterado, garantizando que el balance económico final no genere adiciones de recursos ni costos extraordinarios.

- **Instancia de Validación:** Se aclara que la presente revisión constituye una pre-aprobación técnica por parte de la interventoría. El balance definitivo de mayores y menores cantidades que consolide la totalidad de los ítems completamente ejecutados se formalizará exclusivamente en las memorias de cálculo de la liquidación final del contrato.

Tras evaluar las memorias de cálculo y la proyección del proyecto, se otorga **aprobación técnica** a los ajustes de cantidades presentados en los capítulos que integran el numeral 1 (*Variaciones Mayores y Menores*).

Atentamente,

DANNA TATIANA JIMENEZ RIVERA

Residente de Interventoría

Consorcio Intervalle 2026

ANEXOS DEL OFICIO

1. Solicitud de aprobación de acta de mayores y menores cantidades de obra (Oficio CO-IPVO-030-2025-OF-028).

2. Análisis de Precios Unitarios (APUs) no previstos.

3. Balance definitivo de cantidades.

4. Acta de Comité Técnico N° 010 del 21 de mayo de 2026.

5. Memorias de cálculo y diseño estructural.

6. Cartera de volúmenes de excavación y demolición.

7. Justificación técnica de mayores y menores cantidades (Oficio CO-IPVO-030-2025-OF-027).

8. Plano arquitectónico modificado (con inclusión de muros de contención).

Atentamente,

DANNA TATIANA JIMENEZ RIVERA
Residente de Interventoría
Consorcio Intervalle 2026
30.INT-053-2025-OF-030-MENORES Y MAYORES-1.pdf

De: CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>
Enviado: lunes, 25 de mayo de 2026 7:54
Para: Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>
Asunto: Modificatorio No.1 al contrato de obra

Tunja, 25/05/2026

INGENIERO:
YILMAR MEDINA ANDRADE
R/L CONSORCIO INTERVALLE 2026
INTERVENTORÍA

CO-IPVO-030-2025-OF-028

REFERENCIA: Solicitud Aprobación de acta de mayores y menores cantidades de obra

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Cordial saludo,

Por medio de la presente y conforme a lo manifestado en el último comité técnico de obra realizado entre las partes el pasado 21 de mayo del presente año, anexo en el presente documento nos permitimos solicitar amablemente a la firma contratista de interventoría **CONSORCIO INTERVALLE 2026** la

aprobación del Modificatorio No. 1 y/o acta de mayores y menores cantidades al contrato de obra No. IPVO-030-2025.
La presente solicitud se fundamenta en las condiciones actualmente evidenciadas en el proyecto, así como en las necesidades técnicas y operativas identificadas durante la ejecución contractual, las cuales fueron expuestas y analizadas conjuntamente en los respectivos comités técnicos de obra. En consecuencia, y con el objetivo de optimizar los recursos del proyecto y garantizar la adecuada ejecución de las actividades contractuales, se hace necesario efectuar ajustes a las cantidades inicialmente previstas.

Acorde a lo anterior nos permitimos hacer entrega de la información pertinente solicitada por la firma interventora mediante oficio **No. INT-053-OF-017**

1. información administrativa y financiera

La siguiente tabla relaciona el estado administrativo y financiero del contrato de obra, para la presente fecha, no se han realizado suspensiones, prorrogas, reinicios, ni adicionales:
Tabla 1: Información general del contrato de obra

INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA IPVO-030-2025	
PROCESO DE CONTRATACION:	LICITACIÓN PÚBLICA
NUMERO DE CONTRATO:	No.IPVO-030-2025
CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S
CONTRATISTA:	PSI INGENIERIOS S.A.S NIT. 900.928.849-4 R/L LUIS EDUARDO SICHACÁ GAMEZ C.C. 1.049.603.584 DE TUNJA
OBJETO:	“MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”
VALOR INICIAL:	DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MONEDA LEGAL (2.411.687.093,33).
PLAZO INICIAL:	A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA DE INICIO:	24 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fuente: Elaboración propia

el siguiente cuadro se presenta la relación de pólizas que hasta la fecha están vigentes:

Tabla 2: Relación de pólizas del contrato de obra

POLIZA No.	ANEXO	OBJETO DEL SEGURO	ASEGURADORA
175391	0	GARANTIZAR ELCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONESA CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO,CONTENIDASEN	CESCE

		ELCONTRATO Nº IPVO 030-2025, CUYO OBJETOES MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE,DEPARTAMENTO DE BOYACA; EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL A QUE HAYA LUGAR, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS AMPAROS OTORGADOS.	
18141	0	SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUALQUE SE GENERA POR RECLAMACIONES DE TERCEROS, COMO CONSECUENCIA DE ACTOS, HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA, DERIVADOSDE LA EJECUCIÓN DELCONTRATO Nº IPVO 030-2025 CUYO OBJETOES MEJORAMIENTODELESCENARIORECREATIVO Y DE ACTIVIDAD ESLUDICAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVATECNICAVALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACA	CESCE
175391	1	MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA UN TRASLADO DE VIGENCIA SEGÚN ACTA DE INICIO DEL 24/02/2026. GARANTIZAR ELCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONESA CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO,CONTENIDASEN ELCONTRATO Nº IPVO 030-2025, CUYO OBJETOES MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE,DEPARTAMENTO DE BOYACA; EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL A QUE HAYA LUGAR, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS AMPAROS OTORGADOS.	CESCE
18141	2	MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA EL AJUSTE AL VALOR ASEGURADO SEGÚN SMMLV DEL AÑO 2026. MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA UN TRASLADO DE VIGENCIA SEGÚN ACTA DE INCIO DEL 24/02/2026 SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SE GENERA POR RECLAMACIONES DE TERCEROS, COMO CONSECUENCIA DE ACTOS, HECHOS U	CESCE

		OMISIONES DEL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº IPVO 030-2025 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDAD ES LUDICAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACA	

Fuente: Elaboración propia

Nota: las anteriores pólizas se encuentran debidamente publicadas en la plataforma secop II, y debidamente aprobadas por la supervisión del proyecto.

Tabla 3: Balance físico vs balance financiero del proyecto:

1	CAP. 1: PRELIMINARES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	DIST %	VALOR TOTAL	VALOR DE EJECUCION HASTA LA FECHA	
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA. (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA).	$ 3.036,00	934,45	17,00%	$ 3.319.279,00	934,45	$ 3.319.279,00
1,2	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H = 1.50 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	$ 46.814,00	151,26	17,00%	$ 8.284.870,00	134,10	$ 7.394.271,00
1,3	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	$ 244.449,00	103,63	0,00%	$ 25.332.250,00	68,00	$ 16.622.532,00
1,4	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	$ 16.461,00	128,75	0,00%	$ 2.119.354,00	49,99	$ 823.050,00
1,5	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA DE H = 2.0 M.	$ 6.046,00	51,5	0,00%	$ 311.369,00	39,69	$ 240.026,00
1,6	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS,	$ 15.101,00	518,44	0,00%	$ 7.828.962,00	0,00	$ 498.635,00

	PRODUCTO DE SOBRANTES DE DEMOLICION (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).						
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 47.196.084,00**		**$ 28.897.793,00**
2	**CAP. 2: REALIZAR CIMENTACIÓN Y DESAGUES**						
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	$ 70.516,00	334,26	0,00%	$ 23.570.678,00	97,20	$ 6.854.155,00
2,2	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	$ 92.874,00	173,14	0,00%	$ 16.080.204,00	173,14	$ 16.080.204,00
2,3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	$ 2.765,00	5311,88	0,00%	$ 14.687.348,00	5.311,88	$ 14.687.348,00
2,4	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	$ 33.429,00	15,2	17,00%	$ 594.501,00	0,00	$ -
2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	$ 599.197,00	29,04	17,00%			

Outlook

RE: Radicación informe mensual No.2 de obra

Desde Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>
Fecha Mié 27/05/2026 11:27
Para CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>
CC freddy.dproyectostierrasua <freddy.dproyectostierrasua@gmail.com>; lcarlosmolina77 <lcarlosmolina77@gmail.com>

1 archivo adjunto (607 KB)
31.INT-053-2025-OF-031.pdf;

Guateque, 27 de mayo de 2026

INT-053-OF-031

Señor:
LUIS EDUARDO SICHACA GÁMEZ
R/L PSI INGENIEROS S.A.S
Contratista

C.C TIERRASUA S.A.S
ING JULIAN EDGARDO GUERRERO
Supervisor

REF: Reiteración #2 formal de requerimientos técnicos y administrativos – Contrato de Obra No. 030-2025 Referencia: Oficio No. INT-053-OF-024 y reiteración oficio INT-053-OF-027

Objeto del contrato: *"MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".*

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera para el proyecto de *"Mejoramiento del escenario recreativo en la I.E.T. Valle de Tenza"*, y ante la persistencia de las inconsistencias y vacíos documentales detectados en el Informe Mensual No. 2, nos vemos en la obligación de emitir esta Segunda Reiteración con carácter URGENTE.

A la fecha, el contratista de obra no ha subsanado de manera satisfactoria los requerimientos previos, por lo cual se solicita la entrega perentoria de la siguiente información y soporte técnico:

1. DOCUMENTACIÓN DE PERSONAL Y SEGUIMIENTO

- Seguridad Social y Planilla de Aportes: Se solicita al contratista adjuntar, relacionar y verificar los soportes de pago de seguridad social (salud, pensión y ARL) del mes de abril correspondientes al personal nuevo y mínimo reportado en obra, garantizando la cobertura total antes del inicio de sus actividades en el frente de trabajo.

2. CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS DE LABORATORIO

- Ensayos de Material de Afirmado: Es obligatorio presentar los resultados de los ensayos de laboratorio realizados al material de afirmado utilizado en el mejoramiento del escenario. El informe debe incluir, como mínimo: Granulometría, Límites de Atterberg, Proctor Modificado y su respectivo ensayo de CBR, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. Adicionalmente, se deben anexar los certificados de calibración vigentes de los equipos de laboratorio y la tarjeta profesional/certificación del laboratorista a cargo.
- Diseño de Mezcla para Concreto Ciclópeo (2500 PSI): Se reitera la obligación de radicar el diseño de mezcla técnico para el concreto de 2500 PSI destinado al concreto ciclópeo, especificando detalladamente la dosificación y la relación porcentual piedra media / concreta empleada en la estructura.
- Diseño de Mezcla para Concreto Estructural 3000 PSI Se solicita nuevamente el diseño de mezcla para el concreto de 3000 PSI. Se recuerda que dicho diseño debe estar avalado por un laboratorio debidamente certificado, garantizando la resistencia exigida en las notas y planos estructurales del proyecto.
- Certificación de Calidad del Cemento: Revisado el anexo técnico denominado “Cemento”, se observa que la certificación emitida por Cementos Argos S.A. (Planta Sogamoso) corresponde al año 2023. Se solicita al contratista presentar una certificación con fecha actualizada que corresponda al lote de producción del material que se está acopiando y utilizando actualmente en la obra.
- Relación de Fuentes y Canteras de Materiales: Es fundamental para la trazabilidad del proyecto conocer la procedencia legal y técnica de los agregados. Por lo tanto, se exige la relación detallada y las certificaciones de las fuentes o canteras de donde se adquiere el material fino y granular.

3. ORDEN, ASEO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) Y NO APROVECHABLES

- Plan de Manejo y Gestión Ambiental en Obra: Se solicita al contratista implementar de manera inmediata las medidas de control ambiental exigidas para el proyecto, enfocándose en la correcta segregación de los siguientes residuos generados en las actividades de mejoramiento:
    - Residuos Peligrosos (RESPEL): Se exige garantizar el almacenamiento seguro, rotulado y techado de residuos tales como envases vacíos de aditivos para concreto, disolventes, pegamentos, bultos de cemento vacíos, elementos de protección personal contaminados y cualquier material impregnado de hidrocarburos. Asimismo, se solicita presentar el certificado de disposición final emitido por un gestor ambiental autorizado por la autoridad ambiental competente para este tipo de sustancias.

- Residuos No Aprovechables: Se debe reportar la logística implementada para la recolección, evacuación continua y disposición final de los residuos ordinarios e inertes no aprovechables, evitando la acumulación de focos de contaminación dentro de las instalaciones de la Institución Educativa.

- Orden y Aseo de la Obra: Se reitera que el contratista debe mantener las áreas de trabajo, acopio y tránsito peatonal en óptimas condiciones de limpieza, garantizando el aislamiento total de la obra frente a la comunidad para prevenir incidentes o riesgos a la salud pública.

La omisión o retraso en la entrega de estos soportes técnicos y administrativos impide el trámite de aprobación del informe y, por ende, las gestiones administrativas subsiguientes.

Atentamente,

Danna Tatiana Jiménez Rivera
Residente de Interventoría
CONSORCIO INTERVALLE 2026

De: Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>
Enviado: lunes, 11 de mayo de 2026 10:31
Para: CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>
Asunto: RE: Radicación informe mensual No.2 de obra

Asunto: Reiteración Formal Requerimientos Técnicos y Administrativos - Contrato 030-2025 - Oficio INT-053-OF-027

Cordial saludo, Ing. Luis Eduardo Sichaca,

Adjunto al presente remito formalmente el **Oficio No. INT-053-OF-027**, mediante el cual el **Consorcio Intervalle 2026** realiza una reiteración de carácter urgente sobre los requerimientos técnicos y administrativos pendientes del proyecto de mejoramiento del escenario recreativo en la I.E.T. Valle de Tenza.

Debido a las inconsistencias persistentes en el Informe Mensual No. 2 , se requiere con prontitud la entrega de los siguientes soportes para proceder con el trámite de aprobación:

- **Documentación de Personal:** Relación y soportes de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) del personal nuevo reportado en obra.

- **Control de Calidad (Suelos):** Resultados de ensayos de laboratorio para material de afirmado (Granulometría, Límites de Atterberg, Proctor Modificado y CBR), junto con la certificación de

equipos y documentos del laboratorista.

- **Diseños de Mezcla:** Radicación de los diseños técnicos para concreto de 2500 PSI (ciclópeo) y 3000 PSI (estructural), avalados por laboratorio certificado.
- **Materiales:** Certificación de calidad del cemento con fecha actualizada (el soporte actual data de 2023) y la relación detallada de las fuentes o canteras de materiales finos y granulares.

Agradezco su gestión inmediata para subsanar estas observaciones, toda vez que la ausencia de estos documentos impide la continuidad de los trámites administrativos del contrato.

Atentamente,

Danna Tatiana Jiménez Rivera

Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERVALLE 2026

De: Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>
Enviado: sábado, 2 de mayo de 2026 17:02
Para: CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>
Asunto: RE: Radicación informe mensual No.2 de obra

Estimado Ing. Luis Eduardo Sichaca Gámez:

Reciba un cordial saludo.

En calidad de Interventoría del proyecto "Mejoramiento del escenario recreativo y de actividades lúdicas en la Institución Educativa Técnica Valle de Tenza", me permito adjuntar el Oficio No. INT-053-OF-023 con fecha del 02 de mayo de 2026.

A través de este documento, se notifican formalmente las observaciones encontradas tras la revisión del **Informe Mensual No. 2**, las cuales incluyen inconsistencias de forma y fondo que deben ser subsanadas para su aprobación. Entre los puntos clave a atender se encuentran:

- **Soportes y Anexos:** Carga completa de documentos técnicos y financieros en el Drive.
- **Gestión de Obra:** Implementación de la bitácora en línea y actualización de planillas de seguridad social del personal nuevo.
- **Control de Calidad:** Entrega de ensayos de laboratorio (afirmado, CBR), diseños de mezcla (2500 y 3000 PSI), certificaciones de cemento actualizadas y relación de fuentes de materiales.

Se solicita que toda la documentación requerida sea organizada en las carpetas correspondientes del enlace de Drive ya establecido, garantizando la trazabilidad necesaria para el proceso de auditoría.

Quedo atenta a la pronta radicación de los ajustes solicitados para proceder con el trámite administrativo correspondiente.

Cordialmente,

Danna Tatiana Jiménez Rivera

Residente de Interventoría

De: CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>
Enviado: martes, 28 de abril de 2026 20:02
Para: Consorciointervalle2026@outlook.com <Consorciointervalle2026@outlook.com>
Asunto: Radicación informe mensual No.2 de obra

Tunja, 28/04/2026

SEÑORES:

INGENIERO,
JORGE ARMANDO CALDERÓN SÁNCHEZ
R/L CONSORCIO INTERVALLE 2026
INTERVENTORÍA

CO-IPVO-030-2025-OF-015

REFERENCIA: Radicación informe mensual No.2 de obra

OBJETO: "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA EN LA SEDE CAMPESTRE EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. "

Cordial saludo, en mi calidad de Representante Legal de PSI INGENIEROS S.A.S, contratista del contrato de obra No. IPVO-030-2025, me permito realizar la radicación formal del informe de obra No.2 correspondiente al periodo comprendido entre 01 de abril del 2026 al 30 de abril del 2026, para su revisión y fines pertinentes.

Dicha información se encuentra disponible en el siguiente link

https://drive.google.com/drive/folders/1dWes1F9lSD8tW2Zv4btVDgjGrzPyD8No?usp=sharing

Cordialmente,

Ing. M.sc LUIS EDUARDO SICHACÁ GAMEZ
C.C 1.049.603.584 de Tunja
PSI INGENIEROS S.A.S
Dirección: Calle 20 No. 13-14 Oficina 216 B
Cel: 313-830-72-69
e-mail: cubiertaguateque@gmail.com
psi.ingenieros1@gmail.com

Outlook

Semanal 12 y 13 de mayo 2026

Desde Consorcio Intervalle <Consorciointervalle2026@outlook.com>
Fecha Jue 28/05/2026 15:06
Para freddy.dproyectostierrasua <freddy.dproyectostierrasua@gmail.com>; lcarlosmolina77 <lcarlosmolina77@gmail.com>
CC CUBIERTA GUATEQUE <cubiertaguateque@gmail.com>

2 archivos adjuntos (4 MB)
SEMANAL 12 DESDE EL 18-05-2026 AL 22-05-2026.pdf; SEMANAL 13 DESDE EL 25-05-2026 AL 29-05-2026-1.pdf;

Cordial Saludo

Adjunto a este mensaje el informe de Avance Semanal No.13, correspondiente al periodo del 25 de mayo al 29 de mayo de 2026, relacionado con el contrato de obra IPVO-030-2025 para el mejoramiento del escenario recreativo en la Institución Educativa Técnica Valle de Tenza (Guateque, Boyacá). Se anexa semanal 12 debido a una corrección realizada.

Quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional.

Atentamente,

Danna Tatiana Jiménez Rivera
Residente de interventoría
