INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE ABRIL2026
-MAYO DE 2026

UNION TEMPORAL SAN DIEGO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

CONTRATO DE OBRA No. 1381 DE 2025


Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el Sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE ABRIL2026
-MAYO DE 2026

Imagen 1.UBICACION FRENTES DE OBRA Lote 2

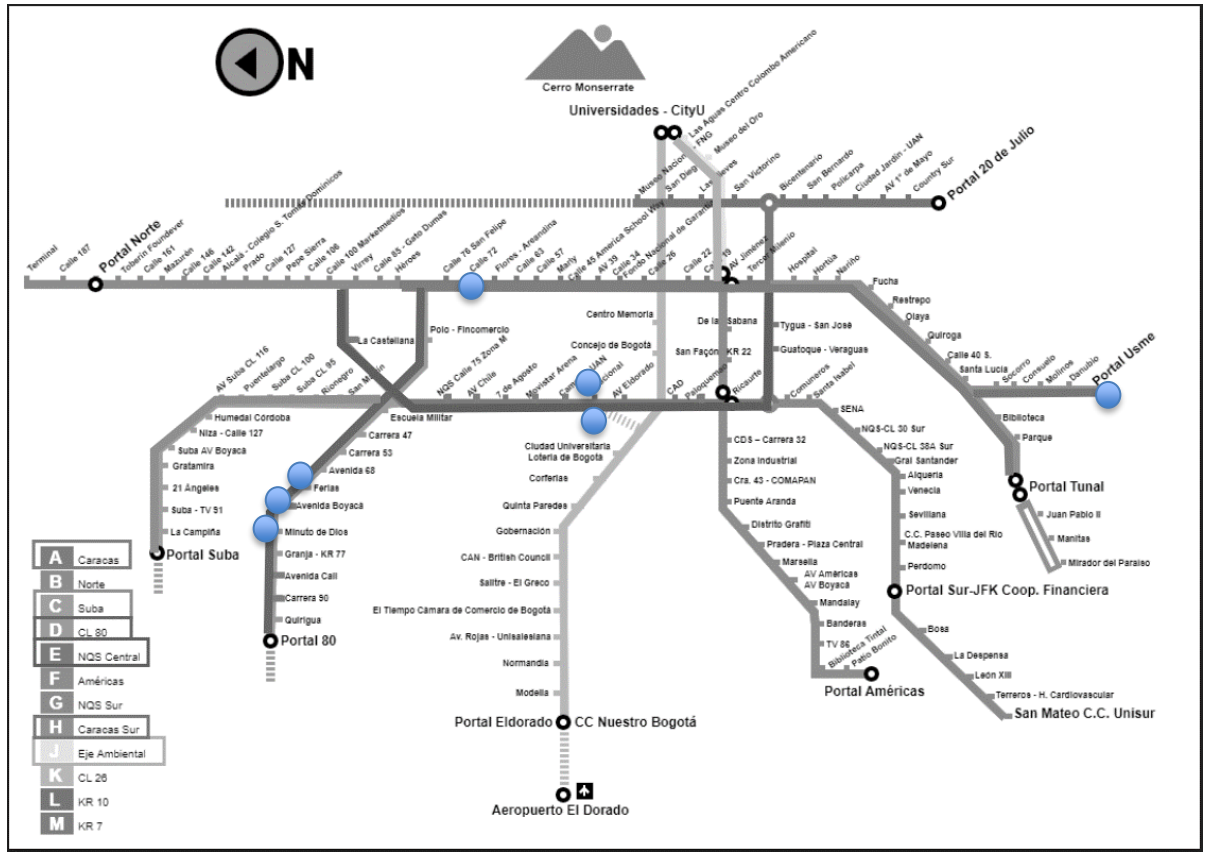

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE ABRIL2026 -MAYO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Abril de 2026 al 20 de Mayo del 2026.

MET-02	**1381-L2-052**	**NQS CENTRAL -E**	**ESTACION CALLE 72**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES	**100%**

CANTIDAD		
Cantidad teórica	**Cantidad ejecutada**	**% avance**
208,16	208,16	100%


ANTES



DURANTE



DESPUES

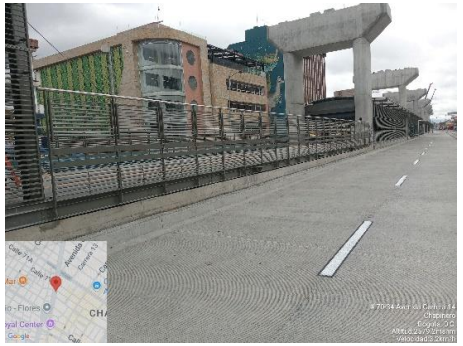

Se realiza la instalación de las celosías de realce de las transiciones a y B de los vagones de la Estacion.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE ABRIL2026 -MAYO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Abril de 2026 al 20 de Mayo del 2026.

MET-11	1381-L2-053	NQS CENTRAL -E	ESTACION CALLE 72	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADADE VAGONES ETAPA 2	100%

CANTIDAD		
Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
890,21	890,21	100%

ANTES



DURANTE



DESPUES



En la Estación se realizo el suministro e instalación de las celosías de fachadas de los vagones A y B de la Estacion

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Abril de 2026 al 20 de Mayo del 2026.

MES DE ABRIL2026 -MAYO DE 2026

MET-03	1381-L2-054	NQS CENTRAL -E	ESTACION UNIVERSIDAD NACIONAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA	100%

CANTIDAD		
Cantidad teórica	**Cantidad ejecutada**	**% avance**
253,35	253,35	100%

COSTADO ORIENTAL

ANTES



DURANTE



DESPUES



Se implementa PMT , se efectua la instalación del cerramiento tipo onda en el costado oriental de la Estación Universidad Nacional.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1


MES DE ABRIL2026 -MAYO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Abril de 2026 al 20 de Mayo del 2026.

SEÑ 04	1381-L2-55	NQS SUR - H	PORTAL USME	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA VALLAS DE SEÑALETICA E INFORMACION AL USUARIO	EN EJECUCION

CANTIDAD		
Cantidad teórica	**Cantidad ejecutada**	**% avance**
EN EJECUCION	EN EJECUCION	90 %

ANTES

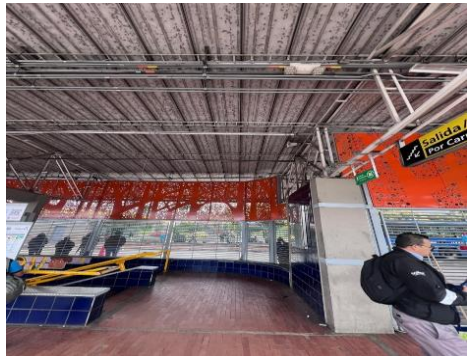

EN EJECUCION



Se REALIZA LA INSTALACION DE SEÑALIZACION

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE ABRIL2026 -MAYO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Abril de 2026 al 20 de Mayo del 2026.

SEÑ 05	1381-L2-56	NQS SUR - H	PORTAL USME	SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PARA VALLAS DESCOLGADAS EN PORTAL	EN EJECUCION

CANTIDAD		
Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
EN EJECUCION	EN EJECUCION	90 %

ANTES



EN EJECUCION



Se REALIZA LA INSTALACION DE SEÑALIZACION EN PORTAL.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE ABRIL2026 -MAYO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Abril de 2026 al 20 de Mayo del 2026.

OBC - 02	1381-L2-57	CALLE 80 - D	ESTACION MINUTO DE DIOS	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES	EN EJECUCION

CANTIDAD		
Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
EN EJECUCION	EN EJECUCION	20 %

ANTES



EN EJECUCION





Se realiza el desmonte de la cubierta existente y se instala una nueva cubierta en alucincc a dos aguas eliminando el lucernario

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE ABRIL2026 -MAYO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Abril de 2026 al 20 de Mayo del 2026.

OBC - 02	1381-L2-58	CALLE 80 - D	ESTACION BOYACA	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES	EN EJECUCION

CANTIDAD		
Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
EN EJECUCION	EN EJECUCION	10 %

ANTES



EN EJECUCION



Se realiza el desmonte de la cubierta existente y se instala una nueva cubierta en alucinc e dos aguas eliminando el lucernario

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE ABRIL2026 -MAYO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Abril de 2026 al 20 de Mayo del 2026.


OBC - 02	1381-L2-59	CALLE 80 - D	ESTACION FERIAS	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES	100%

CANTIDAD		
Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
248,30	248,30	100 %

ANTES



DURANTE

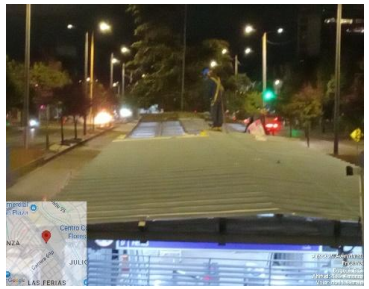

DESPUES



Se realiza el desmonte de la cubierta existente y se instala una nueva cubierta en alucinc ea dos aguas eliminando el lucernario

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE ABRIL2026 -MAYO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Abril de 2026 al 20 de Mayo del 2026.

MET-03	1381-L2-060	NQS CENTRAL -E	ESTACION UNIVERSIDAD NACIONAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA	100%

CANTIDAD		
Cantidad teórica	**Cantidad ejecutada**	**% avance**
256,90	256,90	100%

COSTADO OCCIDENTAL

ANTES



DURANTE



DESPUES



Se implementa PMT , se inicia la instalación del cerramiento tipo onda en el costado occidental de la Estación Universidad Nacional.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1


MES DE ABRIL2026 -MAYO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Abril de 2026 al 20 de Mayo del 2026.


SEÑ 01	1381-L2-61	NQS SUR - H	PORTAL USME	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS PARA SEÑALETICA E INFORMACION AL USUARIO	EN EJECUCION

CANTIDAD		
Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
EN EJECUCION	EN EJECUCION	90 %

ANTES

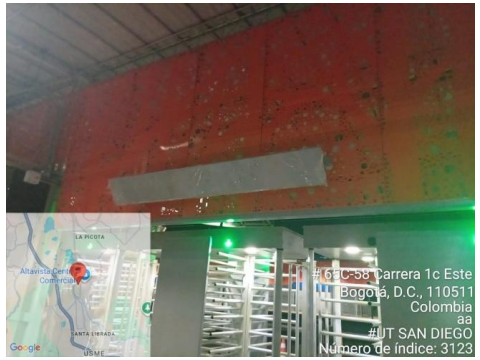

EN EJECUCION

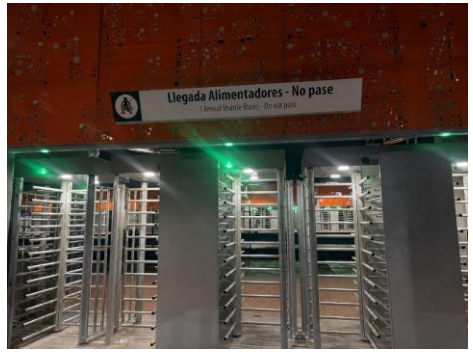

Se REALIZA LA INSTALACION DE SEÑALIZACION

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1


MES DE ABRIL2026 -MAYO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Abril de 2026 al 20 de Mayo del 2026.


SEÑ 03	1381-L2-62	NQS SUR - H	PORTAL USME	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS PARA SEÑALETICA E INFORMACION AL USUARIO EN VINILO FOTOLUMINISCENTE	EN EJECUCION

CANTIDAD		
Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
EN EJECUCION	EN EJECUCION	90%

ANTES

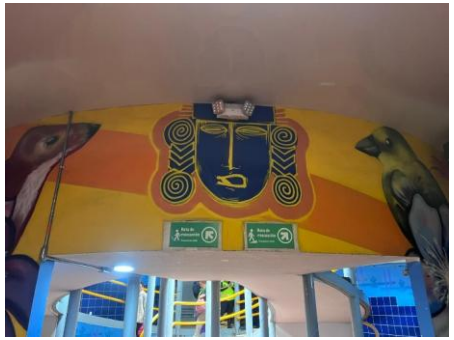

EN EJECUCION

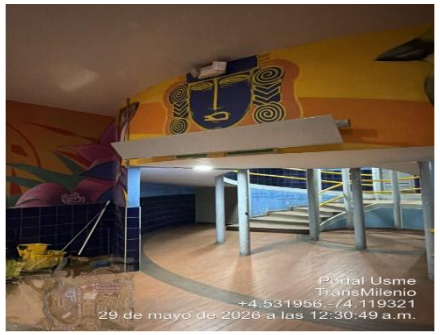

Se REALIZA LA INSTALACION DE SEÑALIZACION FOTOLUMINICENSCE EN PORTAL.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE ABRIL2026 -MAYO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Abril de 2026 al 20 de Mayo del 2026.


SEÑ 02	1381-L2-63	NQS SUR - H	PORTAL USME	SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLAS DE INFORMACION AL USUARIO. (SEÑ-02)	EN EJECUCION

CANTIDAD		
Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
EN EJECUCION	EN EJECUCION	90%

ANTES



EN EJECUCION

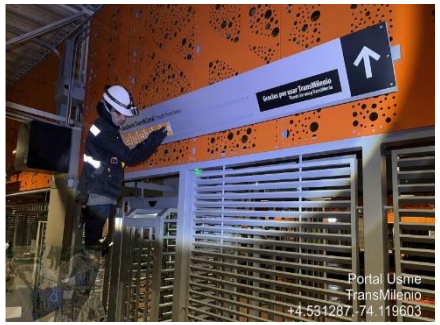

Se REALIZA LA INSTALACION DE SEÑALIZACION DE RUTEROS.

INFORME EJECUTIVO

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Abril de 2026 al 20 de Mayo del 2026.

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE ABRIL2026
-MAYO DE 2026

COMPONENTE DE CALIDAD





FICHA TECNICA CUBIERTA







TRABAJOS CONSTRUCCION EN TALLER

Se realiza revisión de los materiales suministrados aprobadas para la instalación de la cubierta cumpliendo con las especificaciones técnicas y construcción de celosías de realce y fachada.

INFORME EJECUTIVO

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Abril de 2026 al 20 de Mayo del 2026.

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE ABRIL2026
-MAYO DE 2026

COMPONENTE DE CALIDAD




MEDICION DE ESPESORES




VERIFICACION DE PULGADAS DE CONCRETO





VERIFICACION DE PERFORACIONES Y APLICACIÓN DE EPOXICO




CONTROL DE NIVELES

Se realizan verificaciones en obra del concreto suministrado, se realizan nivelaciones y plomos en la instalación de estructura metálica y se verifican perforaciones en las instalaciones de anclajes

INFORME EJECUTIVO


Actividades Ejecutadas entre el 21 de Abril de 2026 al 20 de Mayo del 2026.

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE ABRIL2026
-MAYO DE 2026

COMPONENTE SST



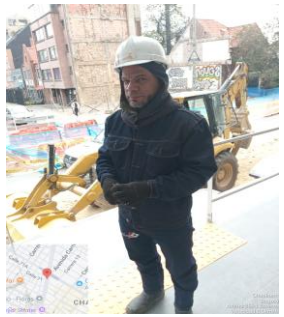

VERIFICACION DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y PLANILLAS





ELEMENTOS DE SEGURIDAD





DEMARCACION Y PROTECCION ESPACIOS DE TRABAJO EN OBRA







SEÑALIZACION ESPACIOS DE TRABAJO EN OBRA

Se realizaron los respectivos cerramientos y la señalización de obra. Cada punto de trabajo contó con su respectivo extintor y camilla, el personal dispuso de la dotación completa, en cumplimiento de las normas de seguridad establecidas.


INFORME EJECUTIVO

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Abril de 2026 al 20 de Mayo del 2026.

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE ABRIL2026
-MAYO DE 2026

COMPONENTE AMBIENTAL

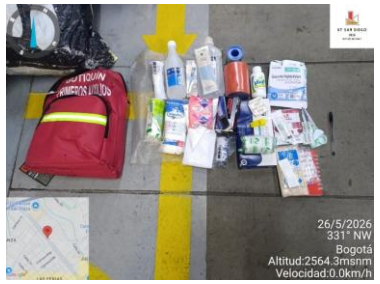




KIT DE DERAMES Y CAMILLA



PROTECCION DE ARBOLES Y PROTECCIONES EN VIA



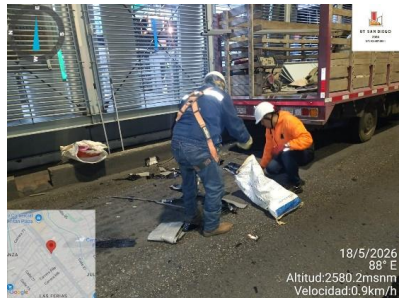

ASEO DE OBRA



PUNTOS DE ACOPIO Y RESPEL

Las actividades se ejecutaron cumpliendo normativas ambientales y de gestión. Se garantizó la correcta identificación y manejo de residuos peligrosos y de construcción, con disposición en sitios autorizados. El manejo de sustancias químicas cumplió con el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) .

INFORME EJECUTIVO

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Abril de 2026 al 20 de Mayo del 2026.

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE ABRIL2026
-MAYO DE 2026

CONCLUSION

- Las actividades realizadas corresponden al proceso de construcción de las ordenes de trabajos autorizadas y correspondientes a los lineamientos dados por interventoría y Transmilenio. En el periodo de Abril de 2026 – Mayo de 2026.

- La cubierta cumple con las especificaciones técnicas y las protecciones a condiciones climáticas
- Las pendientes garantizan la evacuación del agua minimizando filtraciones
- Los materiales se encuentran en buenas condiciones de calidad y resistencia
- Los elementos metálicos presentan correcta alineación, nivelación, y fijación.
- La estructura cumple con criterios de seguridad y durabilidad.
- La aplicación de barrera ayuda a prolongar la vida útil de la estructura
- Las uniones soldadas fueron verificadas a satisfacción.
