INFORME MENSUAL DE OBRA No. 10
PERIODO DEL 21 DE ABRIL DE 2026 AL 20 DE MAYO DE 2026

UNIÓN TEMPORAL SAN DIEGO 2026

NIT: 901.957.338-1

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

CONTRATO DE OBRA No. 1381 DE 2026

Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el Sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A.

BOGOTÁ D.C. 2026

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 5
2 GENERALIDADES 5
2.1 OBJETIVO GENERAL 5
2.2 ALCANCE 5
3 INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO 7
3.1 Datos Generales, Fecha de suscripción y Legalización 7
3.2 Valor del contrato 7
3.3 Garantías 8
4 ASPECTOS TECNICOS 8
4.1 Actividades Realizadas Durante el Periodo 8
4.1.1 ORDEN No 1381-L2-052: 10
4.1.2 ORDEN No 1381-L2-053: 11
4.1.3 ORDEN No 1381-L2-054: 12
4.1.4 ORDEN No 1381-L2-055: 13
4.1.5 ORDEN No 1381-L2-056: 14
4.1.6 ORDEN No 1381-L2-057: 15
4.1.7 ORDEN No 1381-L2-058: 16
4.1.8 ORDEN No 1381-L2-059: 17
4.1.9 ORDEN No 1381-L2-060: 18
4.1.10 ORDEN No 1381-L2-061: 19
4.1.11 ORDEN No 1381-L2-062: 20
4.1.12 ORDEN No 1381-L2-063: 21
5 ANALISIS DE TIEMPO, PERSONAL Y ACTIVIDADES 22
6 PLAN DE MANEJO TRANSITO (PMT) 29
7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 30
8 CONCLUSIÓN 33
9 ANEXOS 33
9.1 FORMATO ORDEN DE TRABAJO CALLE 72 1 A 5 (MET-02) 33
9.2 FORMATO ORDEN DE TRABAJO CALLE 72 1 A 5 (MET-11) 33
9.3 FORMATO ORDEN DE TRABAJO UNIVERSIDAD NACIONAL 1 A 5 (MET-03) 33
9.4 FORMATO ORDEN DE TRABAJO FERIAS 1 A 5 (OBC-02) 33
9.5 FORMATO ORDEN DE TRABAJO UNIVERSIDAD NACIONAL 1 A 5 (MET-03) 33

9.6 ACTA DE COSTOS No 10 PERIODO 33

CONTENIDO TABLAS

Tabla 1. TRONCALES ASIGNADAS A LOTE 2 6

Tabla 2. DATOS GENERALES 7

Tabla 3. VALOR DEL CONTRATO 7

Tabla 4.GARANTIAS DEL CONTRATO 8

Tabla 5. ACTIVIDADES DEL CONTRATO EN EL PERIODO 9

Tabla 6. ANÁLISIS DE TIEMPO Y PERSONAL MÍNIMO. 22

Tabla 7. ANÁLISIS PMT ESTACIÓN U. NACIONAL 29

CONTENIDO ILUSTRACIONES

Ilustración 1. MAPA TRONCALES LOTE 2 6

Ilustración 2. COI ESTACIÓN U. NACIONAL 29




LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DESTINATARIO	NO. COPIAS
Interventoría	1
Transmilenio	1

INDICE DE MODIFICACIONES

REVISIÓN	FECHA	ACTUALIZACIÓN
1	20/05/2026	versión entregada a interventoría

TABLA DE CONTROL

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORO	Cesar Patarroyo	Residente de obra	
Vo.Bo	Michael Humberto López	Residente interventoría	
APROBO	Eduardo Andrés Acero	Director de Interventoría	

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN

En las actividades del sistema de trasporte masivo TM, se tiene como alcance llevar a cabo las adecuaciones y/o construcción de obras complementarias ordenadas sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C. y sus áreas de influencia que se encuentre a cargo de TRANSMILENIO S.A en los tiempos de ejecución definidos por el interventor y la entidad, cumpliendo con los requisitos establecidos en el anexo técnico.

2 GENERALIDADES

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el Sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A. Lote 2

2.2 ALCANCE

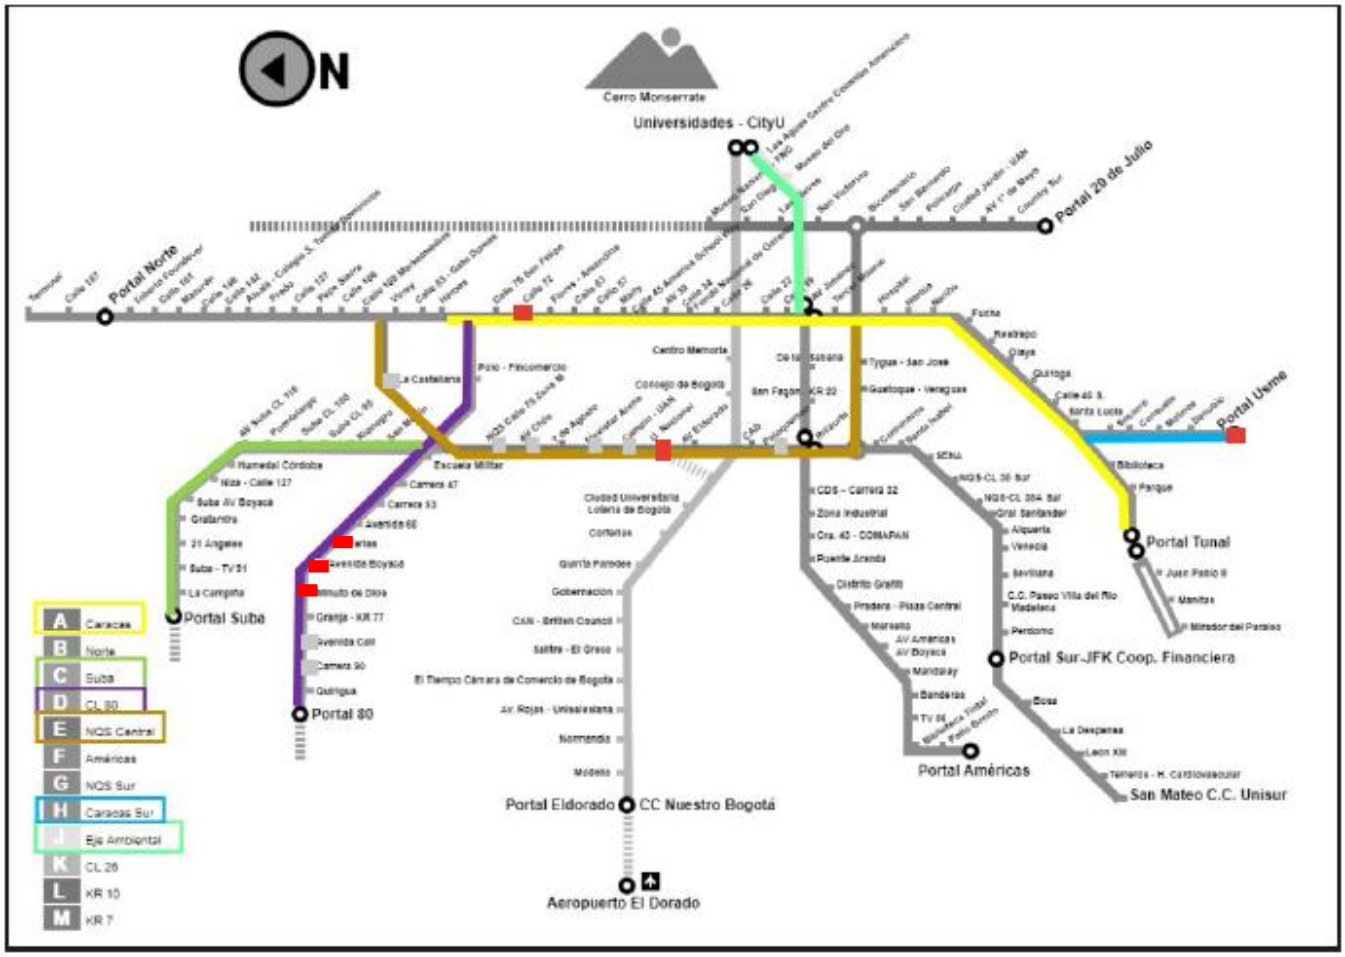
La Unión Temporal San Diego deberá cumplir con todas y cada una de las características, actividades, condiciones y obligaciones técnicas del anexo técnico, así mismo tener en cuenta la descripción técnica del proceso constructivo y de ejecución de cada actividad y su detalle; donde la calidad se deberá cumplir con todas las normas técnicas vigentes gestión que aplicara a las obras de los diferentes frentes a realizar en las estaciones del sistema Transmilenio, en la ciudad de Bogotá D.C, teniendo en cuenta la identificación de áreas a intervenir y que se encuentren autorizadas por los supervisores. Donde el equipo profesional del contratista realizará inspecciones dejando evidencia fotográfica a los diferentes frentes donde se podrá evidenciar el antes, durante y después de la ejecución de actividades.

Tabla 1. TRONCALES ASIGNADAS A LOTE 2

LOTE	TRONCAL
2	CALLE 80
	SUBA
	CARACAS
	CARACAS SUR
	NQS CENTRAL (INCLUYE ESTACIONES CALLE SEXTA)
	EJE AMBIENTAL

Ilustración 1. MAPA TRONCALES LOTE 2

Fuente: https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/mapa-interactivo-de-transmilenio-rutas-y-estaciones-del-sistema



- Los puntos rojos señalados en el mapa corresponden a las estaciones de Transmilenio que fueron intervenidas de acuerdo con lo establecido en las ordenes de trabajo.

3 INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO

3.1 Datos Generales, Fecha de suscripción y Legalización

Tabla 2. DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
No. CONTRATO	1381-2025		1369-2025	
OBJETO	Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el Sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. Lote 2		Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes de la respectiva licitación (lote 1 y lote 2), cuyo objeto es: realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C, que se encuentran a cargo de la empresa de transporte del tercer milenio - Transmilenio s.a.	
PARTICIPACION CONTRACTUAL	UNION TEMPORAL SAN DIEGO 2026	% PARTICIPACIÓN	CONSORCIO ALIANZA XXI	% PARTICIPACIÓN
	G 63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAS	80%	DAIMCO S.A.S	99,90%
	ICFAN S.A.S	20%	DIBENEM S.A.S	0,10%
FECHA DE INICIO	21 DE JULIO 2025		21 DE JULIO 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE OCTUBRE 2026		20 DE OCTUBRE 2026	
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		15 MESES	

3.2 Valor del contrato

Tabla 3. VALOR DEL CONTRATO

UNION TEMPORAL SANDIEGO 2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 13.750.000.000
ADICIÓN 50%	$ 6.875.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 20.625.000.000

3.3 Garantías

Tabla 4.GARANTIAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No DE POLIZA	DESCRIPCIÓN	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
SEGUROS MUNDIAL	NB-100391857	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	11/11/2025	20/04/2027	$ 6.126.856.033.50
			PRESTACIONES SOCIALES	11/11/2025	20/10/2029	$ 2.042.285.344.50
			ESTABILIDAD DE OBRA	20/10/2026	20/10/2031	$ 6.126.856.033.50
	NB-100102243	RESPONSABILIDAD CIVIL	AMPARO	21/07/2025	20/10/2026	$ 1.021.142.672.25
			PATRONAL	21/07/2025	20/10/2026	$ 1.021.142.672.25
			CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	21/07/2025	20/10/2026	$ 1.021.142.672.25
			VEHICULOS PROPIOS U NO PROPIOS	21/07/2025	20/10/2026	$ 1.021.142.672.25

4 ASPECTOS TECNICOS

4.1 Actividades Realizadas Durante el Periodo

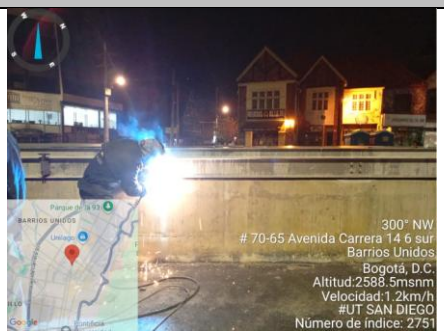
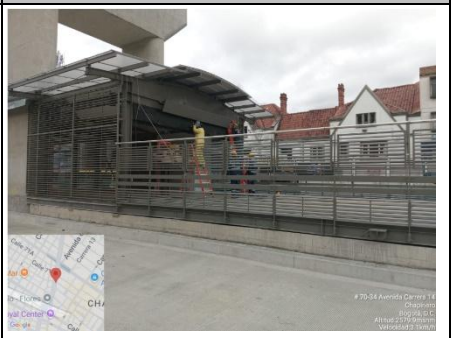
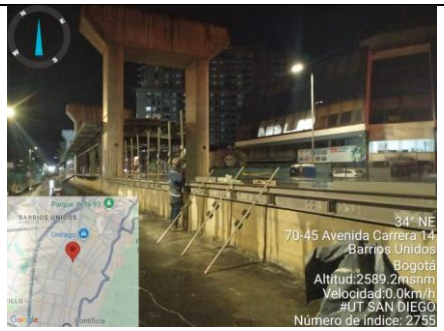
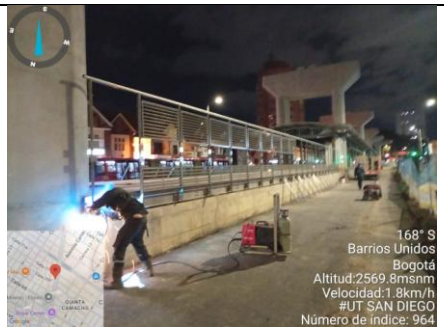
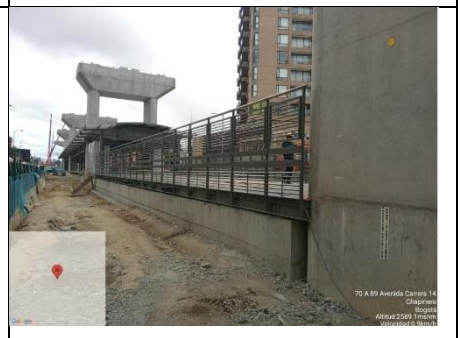
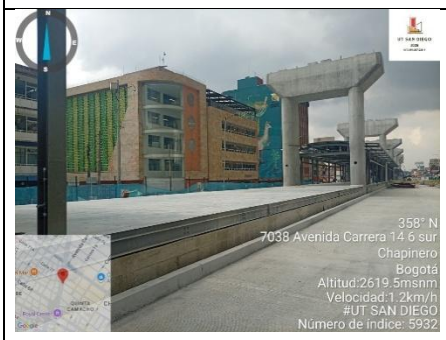
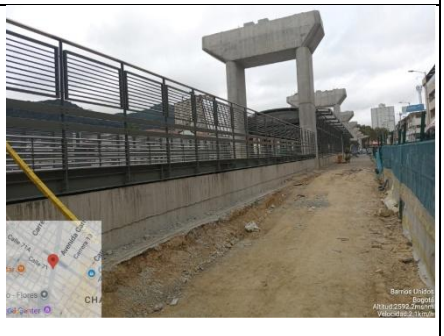
A continuación, se relacionan las actividades por ítem dé ejecución con su registro fotográfico durante el periodo comprendido entre el periodo 21 de abril de 2026 al 20 de mayo de 2026.

Tabla 5. ACTIVIDADES DEL CONTRATO EN EL PERIODO

DESCRIPCIÓN GENERAL			
NÚMERO DE CONTRATO		**CTO. 1381-2025**	
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el Sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S. A	
ÍTEMS	**Estación**	**Descripción**	**Observación**
MET – 02	CALLE 72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES	EJECUTADA
MET – 11	CALLE 72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2	EJECUTADA
MET – 03	U. NACIONAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA	EJECUTADA
SEÑ – 04	PORTAL USME	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO	ORDEN DE TRABAJO EN EJECUCIÓN
SEÑ – 05	PORTAL USME	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DESCOLGADA PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO	ORDEN DE TRABAJO EN EJECUCIÓN
OBC-02	MINUTO DE DIOS	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES (OBC-02)	ORDEN DE TRABAJO EN EJECUCIÓN
OBC-02	AV. BOYACA	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES (OBC-02)	ORDEN DE TRABAJO EN EJECUCIÓN
OBC-02	FERIAS	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES (OBC-02)	EJECUTADA
SEÑ-01	PORTAL USME	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS PARA SEÑALETICA E INFORMACIÓN AL USUARIO (SEÑ-01)	ORDEN DE TRABAJO EN EJECUCIÓN
SEÑ-03	PORTAL USME	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS PARA SEÑALETICA E INFORMACIÓN AL USUARIO EN VINILO FOTOLUMINISCENTE (SEÑ-03)	ORDEN DE TRABAJO EN EJECUCIÓN
SEÑ-02	PORTAL USME	SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLAS DE INFORMACION AL USUARIO. (SEÑ-02)	ORDEN DE TRABAJO EN EJECUCIÓN

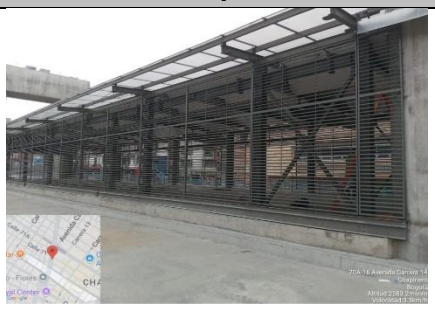
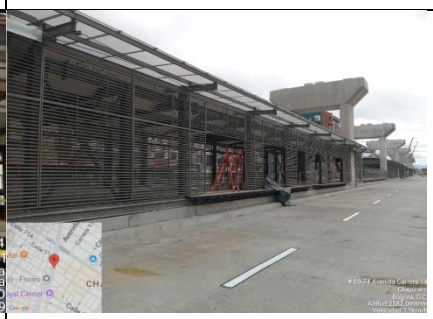
4.1.1 ORDEN No 1381-L2-052:

Troncal	Estación	Descripción
CARACAS – A	CALLE 72 MET-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES

Antes	Durante	Después
		
		
		
		

4.1.2 ORDEN No 1381-L2-053:

Troncal	Estación	Descripción
CARACAS – A	CALLE 72 MET-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2

Antes	Durante	Después
		
		
		
		

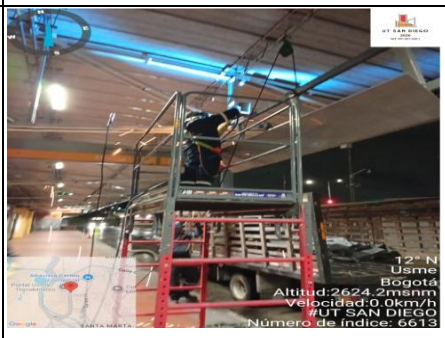
4.1.3 ORDEN No 1381-L2-054:

Troncal	Estación	Descripción
NQS CENTRAL -E	U. NACIONAL MET-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA.

Antes	Durante	Después
		
		
		
		

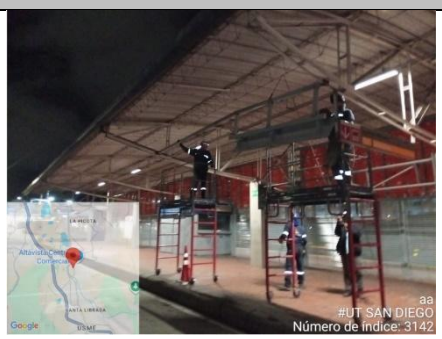
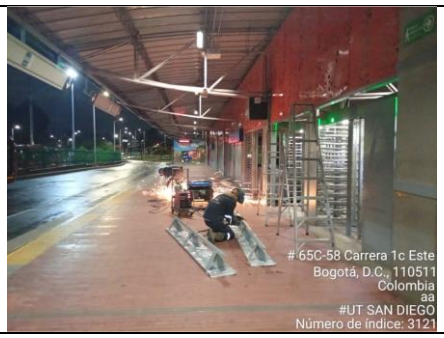
4.1.4 ORDEN No 1381-L2-055:

Troncal	Estación	Descripción
CARACAS SUR	PORTAL USME SEÑ-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO

Antes	Durante	Después
		**EN EJECUCIÓN**
		**EN EJECUCIÓN**
		**EN EJECUCIÓN**
		**EN EJECUCIÓN**

4.1.5 ORDEN No 1381-L2-056:

Troncal	Estación	Descripción
CARACAS SUR	PORTAL USME SEÑ-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DESCOLGADA PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO

Antes	Durante	Después
		**EN EJECUCIÓN**
		**EN EJECUCIÓN**
		**EN EJECUCIÓN**
		**EN EJECUCIÓN**

4.1.6 ORDEN No 1381-L2-057:

Troncal	Estación	Descripción
CALLE 80 - D	MINUTO DE DIOS (OBC-02)	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES (OBC-02)

Antes	Durante	Después
	**EN EJECUCIÓN**	**EN EJECUCIÓN**
	**EN EJECUCIÓN**	**EN EJECUCIÓN**
	**EN EJECUCIÓN**	**EN EJECUCIÓN**
	**EN EJECUCIÓN**	**EN EJECUCIÓN**

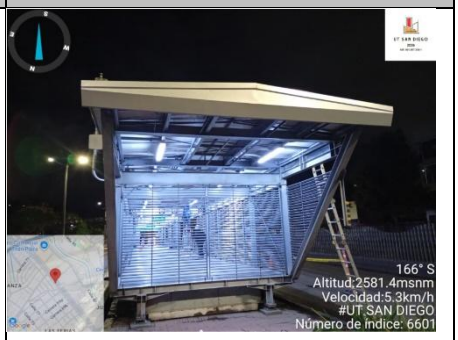
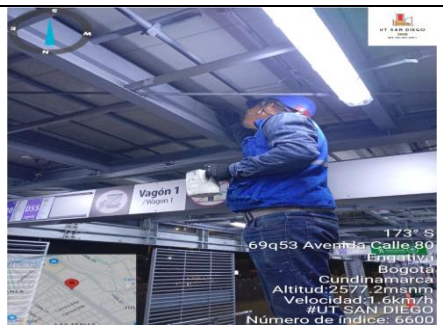
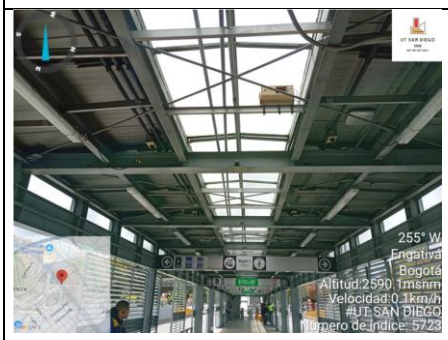
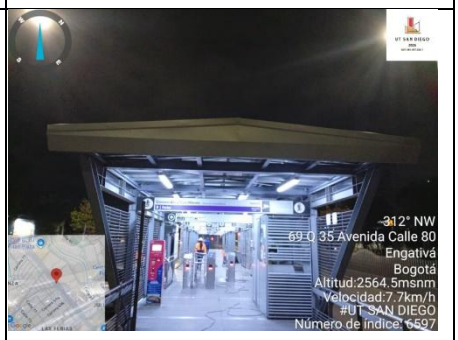
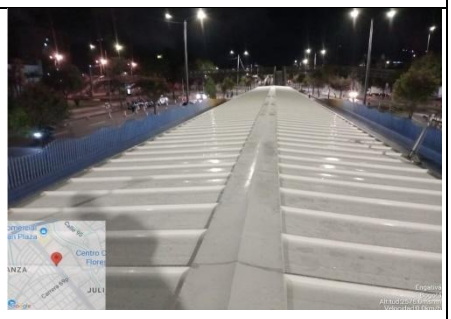
4.1.7 ORDEN No 1381-L2-058:

Troncal	Estación	Descripción
CALLE 80 - D	BOYACA (OBC-02)	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES (OBC-02)

Antes	Durante	Después
	**EN EJECUCIÓN**	**EN EJECUCIÓN**
	**EN EJECUCIÓN**	**EN EJECUCIÓN**
	**EN EJECUCIÓN**	**EN EJECUCIÓN**
	**EN EJECUCIÓN**	**EN EJECUCIÓN**

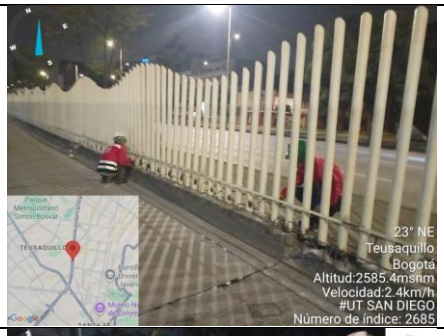
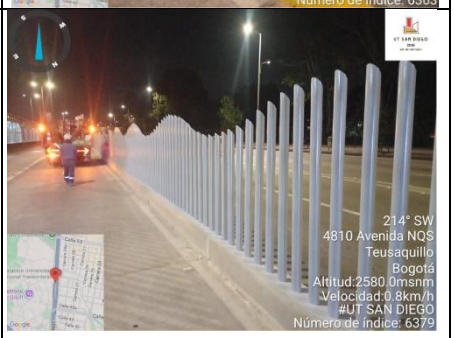
4.1.8 ORDEN No 1381-L2-059:

Troncal	Estación	Descripción
CALLE 80 - D	FERIAS (OBC-02)	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES (OBC-02)

Antes	Durante	Después
		
		
		
		

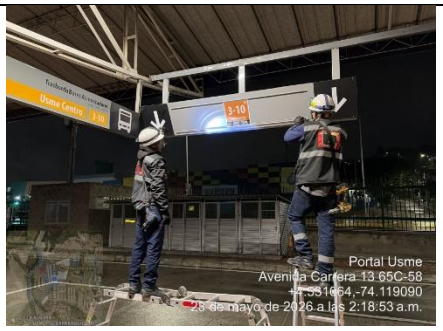
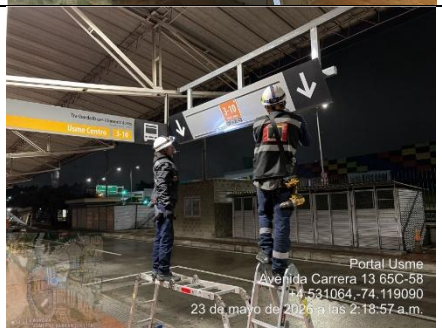
4.1.9 ORDEN No 1381-L2-060:

Troncal	Estación	Descripción
NQS CENTRAL -E	U. NACIONAL MET-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA.

Antes	Durante	Después
		
		
		
		

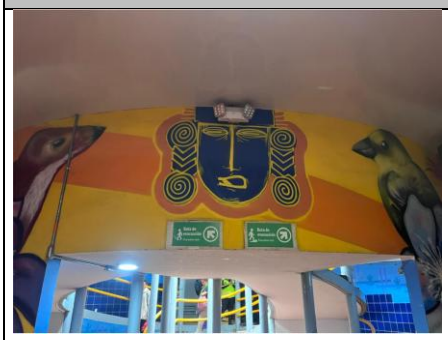
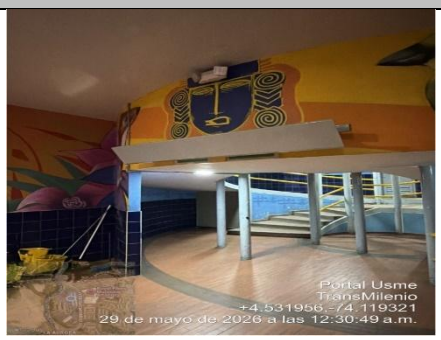
4.1.10 ORDEN No 1381-L2-061:

Troncal	Estación	Descripción
CARACAS SUR	PORTAL USME SEÑ-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS PARA SEÑALETICA E INFORMACIÓN AL USUARIO (SEÑ-01)

Antes	Durante	Después
		**EN EJECUCIÓN**
		**EN EJECUCIÓN**
		**EN EJECUCIÓN**
		**EN EJECUCIÓN**

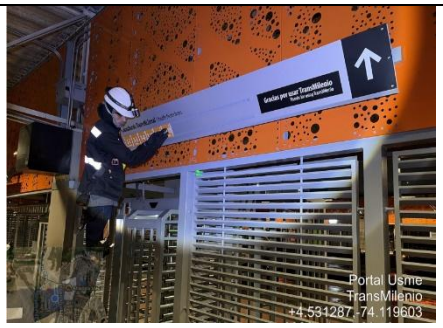
4.1.11 ORDEN No 1381-L2-062:

Troncal	Estación	Descripción
CARACAS SUR	PORTAL USME SEÑ-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS PARA SEÑALETICA E INFORMACIÓN AL USUARIO EN VINILO FOTOLUMINISCENTE (SEÑ-03)

Antes	Durante	Después
		**EN EJECUCIÓN**

4.1.12 ORDEN No 1381-L2-063:

Troncal	Estación	Descripción
CARACAS SUR	PORTAL USME SEÑ-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLAS DE INFORMACION AL USUARIO. (SEÑ-02)

Antes	Durante	Después
		**EN EJECUCIÓN**
		**EN EJECUCIÓN**
		**EN EJECUCIÓN**
		**EN EJECUCIÓN**

5 ANALISIS DE TIEMPO, PERSONAL Y ACTIVIDADES

Tabla 6. ANÁLISIS DE TIEMPO Y PERSONAL MÍNIMO.

FECHA	REPORTE DEL CLIMA	PERSONAL MINIMO EN OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
21/04/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
22/04/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
23/04/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
24/04/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
25/04/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
26/04/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
27/04/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
28/04/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	FABRICACIÓN CELOSIA PLATINAS Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
29/04/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DESCOLGADA PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO Y TRABAJO ADMINISTRATIVO

FECHA	REPORTE DEL CLIMA	PERSONAL MINIMO EN OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
30/04/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DESCOLGADA PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO Y TRABAJO ADMINISTRATIVO.
01/05/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DESCOLGADA PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
02/05/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE E ESTRUCTURA DESCOLGADA PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
03/05/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DESCOLGADA PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO Y TRABAJO ADMINISTRATIVO

FECHA	REPORTE DEL CLIMA	PERSONAL MINIMO EN OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
04/05/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DESCOLGADA PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
05/05/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2, - -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO, -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DESCOLGADA PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
06/05/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2, - -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO, -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DESCOLGADA PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
07/08/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2, - -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO,

FECHA	REPORTE DEL CLIMA	PERSONAL MINIMO EN OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
			-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DESCOLGADA PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
08/09/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2, - -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO, -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DESCOLGADA PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
09/05/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2, - -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO, -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DESCOLGADA PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
10/05/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2, - -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO, -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DESCOLGADA PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
11/05/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2, - -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA.

FECHA	REPORTE DEL CLIMA	PERSONAL MINIMO EN OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
			-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO, -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DESCOLGADA PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
12/05/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2, - -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO, -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DESCOLGADA PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
13/05/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2, - -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO, -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DESCOLGADA PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
14/05/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2, - -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO, -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DESCOLGADA PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
15/05/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2, -

FECHA	REPORTE DEL CLIMA	PERSONAL MINIMO EN OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
			-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO, -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DESCOLGADA PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO. -PINTURA, DESMONTE Y MOSNTE DE CUBIERTA PARA VAGON EN ESTACION Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
16/05/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2, - -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO, -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DESCOLGADA PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO. -PINTURA, DESMONTE Y MOSNTE DE CUBIERTA PARA VAGON EN ESTACION Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
17/05/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2, - -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO, -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DESCOLGADA PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO. -PINTURA, DESMONTE Y MOSNTE DE CUBIERTA PARA VAGON EN ESTACION Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
18/05/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2, - -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO,

FECHA	REPORTE DEL CLIMA	PERSONAL MINIMO EN OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
			-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DESCOLGADA PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO. -PINTURA, DESMONTE Y MOSNTE DE CUBIERTA PARA VAGON EN ESTACION Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
19/05/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2, - -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO, -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DESCOLGADA PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO. -PINTURA, DESMONTE Y MOSNTE DE CUBIERTA PARA VAGON EN ESTACION Y TRABAJO ADMINISTRATIVO
20/05/2026	SIN REPORTE NO SE AFECTAN LAS ACTIVIDADES	1 DIRECTOR DE OBRA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST,1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2INSPECTOR DE OBRA,1 INSPECTOR SST,1 INSPECTOR AMBIENTAL	-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2, - -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO, -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DESCOLGADA PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO. -PINTURA, DESMONTE Y MOSNTE DE CUBIERTA PARA VAGON EN ESTACION Y TRABAJO ADMINISTRATIVO

6 PLAN DE MANEJO TRANSITO (PMT)

Tabla 7. ANÁLISIS PMT ESTACIÓN U. NACIONAL

FECHA DE APROBACION DEL COI	NUMERO DE APROBACION	FECHA DE INICIO DEL COI	FECHA DE FINALIZACION DEL COI	ESTACIÓN
13/03/2026	202661200768562	13/03/2026	14/05/2026	U. NACIONAL

Ilustración 2. COI ESTACIÓN U. NACIONAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI) y otros

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 | VERSIÓN: 3.0

COI No. 11
MARZO 12 DE 2026
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
8491	2000650	N/A	KR 13 CL 85	KR 13 CL 86A	U.T. ECOSEÑALIZACION 2024	13-mar-26	7-may-26	22:00-05:00	22:00-05:00	SDM-3653-2024	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. NO SE AUTORIZA CIERRE DE MAS DE UN CARRIL EN NINGUN MOMENTO DE LA INTERVENCION. 3. REALIZAR SOCIALIZACION DEL CIERRE CON LA COMUNIDAD EN EL TRAMO ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS Y CIERRE TEMPORAL DE SECCION DE ANDENES ADYACENTES DEL TRAMO PARA IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION VERTICAL, HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS VIALES - APLICAN PLANOS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE UN CARRIL, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL DE MINIMO 3m GARANTIZANDO TODOS LOS MOVIMIENTOS PERMITIDOS. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA PRESENTADO CON BASE A LAS CONDICIONES DE TRAFICO EXISTENTES Y GEOMETRIA REAL QUE SE PRESENTA EN EL TRAMO, UNICAMENTE EN EL HORARIO AUTORIZADO. GARANTIZAR SIEMPRE 1.2m DE ANCHO EFECTIVO MINIMO PARA TRANSITO PEATONAL EN LOS ANDENES AFECTADOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CERRAMIENTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO, SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD VIAL.	SI	CHAPINERO	CAROLINA GUEVARA O.	SDM-20266120020304 2-SPMT-20263120042 4471
8492	5001013	5001104	AUTO AL LLANO (KR 14V) DG 68A SUR	AUTO AL LLANO (KR 14V) DG 69A SUR	U.T. ECOSEÑALIZACION 2024	-	-	-	-	SDM-3653-2024	LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS Y CIERRE TEMPORAL DE SECCION DE ANDENES ADYACENTES DEL TRAMO PARA IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION VERTICAL, HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS VIALES, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE PROPONE ESQUEMAS TIPICOS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES EN ANDEN.	NO	CORREDOR	MILTON C. SANCHEZ M.	SDM-20266120020304 2-SPMT-20263120042 4471
8493	13001251	N/A	AV NQS (AK 30) 15m AL NORTE DE LA CL 48	AV NQS (AK 30) 30m AL SUR DE LA CL 45	U.T. SAN DIEGO 2026	13-mar-26	14-may-26	00:30-03:30	00:30-03:30	TM-1369-2025	NOTA: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 2. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 5-MAR-26 Y 12-MAR-26, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE). 3. SE DEBE GARANTIZAR QUE LA SEÑALIZACION ENCONTRADA EN CAMPO, QUEDE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES Y CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, GARANTIZANDO SU DURABILIDAD CON EL FIN DE CUMPLIR LOS ESTANDARES DE CALIDAD DE LA DEMARCACION ENCONTRADA, SEGUN EL ACTA DE COORDINACION PRESENTADA CON LA SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION DE LA SDM, TENIENDO EN CUENTA QUE EL TRAMO SE ENCUENTRA EN GARANTIAS DE SEÑALIZACION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO, PARA ACTIVIDADES ADECUACION Y/O CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE INFRAESTRUCTURA BRT, CONFORME A LOS ESQUEMAS PRESENTADOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADA Y CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL AUXILIAR DE TRANSITO PROPUESTO. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EXCLUSIVA. NO SE AUTORIZA EL PARQUEO DE EQUIPOS NI MAQUINARIA FUERA DEL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN LA CALZADA MIXTA. POR NINGUN MOTIVO SE AUTORIZA INTERVENCION FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (03:30 HORAS) LA CALZADA EXCLUSIVA DE TM DEBE HABILITARSE AL TRANSITO LIBRE DE OBSTACULOS EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL.	SI	CORREDOR	ANGELA M. CIFUENTES R.	202661200768562

Registro fotográfico:







7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Tabla 7. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR ESTACIÓN

ÍTEMS	Estación	Descripción	PORCENTAJE DE AVANCE
MET – 02	CALLE 72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES	EJECUTADA
MET – 11	CALLE 72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2	EJECUTADA
MET – 03	U. NACIONAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA	EJECUTADA
SEÑ – 04	PORTAL USME	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO.	ORDEN DE TRABAJO EN EJECUCIÓN
SEÑ – 05	PORTAL USME	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DESCOLGADA PARA VALLAS DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO	ORDEN DE TRABAJO EN EJECUCIÓN
OBC-02	MINUTO DE DIOS	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES (OBC-02)	ORDEN DE TRABAJO EN EJECUCIÓN
OBC-02	AV. BOYACA	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES (OBC-02)	ORDEN DE TRABAJO EN EJECUCIÓN
OBC-02	FERIAS	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES (OBC-02)	EJECUTADA
SEÑ-01	PORTAL USME	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS PARA SEÑALETICA E INFORMACIÓN AL USUARIO (SEÑ-01)	ORDEN DE TRABAJO EN EJECUCIÓN
SEÑ-03	PORTAL USME	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS PARA SEÑALETICA E INFORMACIÓN AL USUARIO EN VINILO FOTOLUMINISCENTE (SEÑ-03)	ORDEN DE TRABAJO EN EJECUCIÓN
SEÑ-02	PORTAL USME	SUMINISTRO E INSTALACION DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLAS DE INFORMACION AL USUARIO. (SEÑ-02)	ORDEN DE TRABAJO EN EJECUCIÓN

Tabla 8. EJECUTADO VS PROYECTADO

ITEM	% EJECUTADO	% PROYECTADO	DIFERENCIA
MET – 02	100%	100%	0%
MET – 11	100%	100%	0%
MET – 03	100%	100%	0%
SEÑ – 04	50%	50%	50%
SEÑ – 05	50%	50%	50%
OBC-02	50%	50%	50%
SEÑ-01	50%	50%	50%
SEÑ-03	50%	50%	50%
SEÑ-02	50%	50%	50%

Haciendo un análisis de la tabla 7. Porcentaje de ejecución por estación y la tabla 8. Ejecutado vs proyectado se puede evidenciar que el MET-02 se encuentra ejecutado al 100%, el MET-11 se ejecutado al 100%, el MET-03 se encuentra ejecutado al 100%, el SEÑ-04 se encuentra en ejecución, el SEÑ-05 se encuentra en ejecución, el OBC-02 se encuentra en ejecución, la SEÑ-01 se encuentra en ejecución , la SEÑ-03 se encuentra en ejecución y la SEÑ-02 está en ejecución.

Tabla 9. VALORES CONTRACTUALES INICIALES ANTES DE LA ADICIÓN

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJES
VALOR CONTRACTUAL CON AIU	$ 13.750.000.000	100%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°1 CON AU	$ 1.740.809.942	12.66%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°2 CON AU	$ 1.303.682.495	9.48%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°3 CON AU	$ 1.383.555.556	10.06%
VALOR FACTURADO	$ 4.428.047.993	32.20%
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR CON AIU	$ 9.321.952.007	67.80%

Tabla 10. CUADRO RESUMEN CON ADICION Nº1

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO CON AIU	$ 13.750.000.000	66%
VALOR ADICION Nº1 CON AIU DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.672.853.445	48.53%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON AIU	$ 20.422.853.445	100%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°1 CON AU	$ 1.740.809.942	8.52%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°2 CON AU	$ 1.303.682.495	6.38%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°3 CON AU	$ 1.383.555.556	6.77%
VALOR DE ACTA DE COSTOS Nº4 CON AU	$ 2.520.377.188	12.34%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°5 CON AU	$ 159.339.749	0.78%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°6 CON AU	$ 1.294.706.093	6.34%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°7 CON AU	$ 1.603.759.734	7.85%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°8 CON AU	$ 861.860.274	4.22%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°9 CON AU	$ 664.722.397	3.25%
VALOR DE ACTA DE COSTOS N°10 CON AU	$ 1.943.801.608	9.52%
VALOR FACTURADO	$ 13.476.615.037	65.99%
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR CON AIU	$ 6.946.238.408	34.01%

Según el valor del contrato con AIU y la ejecución de las ordenes de trabajo número Nueve que surgen de la necesidad de la entidad, se tiene ejecutado y facturado un 65.99% que corresponde a un valor de $ 13.476.615.037 AU incluido, discriminado de la siguiente manera, para el acta número uno un valor de $1.740.809.942 AU incluido que corresponde al 8.52% del valor total del contrato, para el acta numero dos un valor de $1.303.682.495 AU incluido que corresponde a un 6.38% del valor total del contrato, para el acta número tres por un valor de $1.383.555.556 AU incluido que corresponde a un 6.77% del valor total del contrato, para el acta número cuatro un valor de $2.520.377.188 AU incluido que corresponde a un 12.34% del valor total del contrato, para el acta número cinco un valor de $159.339.749 AU incluido que corresponde a un 0.78% del valor total del contrato, para el acta número seis un valor de $1.294.706.093 AU incluido que corresponde a un 6.34% del valor total del contrato, para el acta número siete un valor de $1.603.759.734 AU incluido que corresponde a un 7.85% del valor total del contrato, para el acta número ocho un valor de $861.860.274 AU incluido que corresponde a un 4.22 % del valor total del contrato, para el acta número nueve un valor de $664.722.397 AU incluido que corresponde a un 3.25 % ,para el acta número diez un valor de $1.943.801.608 AU incluido que corresponde a un 9.52% del valor total del contrato contando con un valor pendiente por ejecutar de $6.946.238.408 AIU incluido que corresponde a un 34.01% del valor total del contrato. Se genero un adicional para el contrato del 50% que corresponde a un valor de $ 6.672.853.445 AIU incluido, para un total del contrato de $ 20.422.853.445 con AIU incluido.

8 CONCLUSIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 21 de abril de 2026 y el 20 de mayo de 2026, la Unión Temporal San Diego 2026 ejecutó las actividades programadas en el marco del Contrato de Obra No. 1381 de 2026, dando cumplimiento a las órdenes de trabajo asignadas y atendiendo los lineamientos establecidos por la interventoría.
Las actividades correspondientes al ítem:
MET-02: suministro e instalación de celosía metálica en vanos de zona de transición en estaciones, en la estación calle 72.
MET-11: suministro e instalación de celosía para fachada de vagones etapa 2, estación calle 72
MET-03: suministro e instalación de cerramiento tipo onda en la estación nacional
SEÑ-04: suministro e instalación de estructuras para vallas de señalética e información al usuario en el portal Usme.
SEÑ-05: suministro e instalación de estructura descolgada para vallas de señalética e información al usuario en el portal Usme
OBC-02: desmonte, suministro e instalación de cubierta en estaciones (obc-02) estación ferias minuto de dios y avenida Boyacá
SEÑ-01: suministro e instalación de vallas para señalética e información al usuario (señ-01) en portal Usme.
SEÑ-03: suministro e instalación de vallas para señalética e información al usuario en vinilo fotoluminiscente (señ-03) en portal Usme.
SEÑ-02: suministro e instalación de ruteros informativos en vallas de información al usuario. (señ-02) en el portal de Usme.

De igual manera, se garantizó la disponibilidad oportuna de los recursos humanos y técnicos necesarios para la ejecución contractual, asegurando la continuidad operativa de las actividades y el cumplimiento, seguridad y manejo ambiental exigidos. En cuanto al componente financiero, el contrato registra un avance acumulado del 65.89 % de su valor total, incluido el AIU, evidenciando consistencia entre el avance de ejecución y los valores facturados durante el período objeto de seguimiento.

Finalmente, El 19 de noviembre 2025 Se genero una adición para el contrato del 50% que corresponde a un valor de $ 6.672.853.445 AIU incluido, para un total del contrato de $ 20.422.853.445 con AIU incluido. obedece a las necesidades operativas identificadas durante la ejecución, permitiendo fortalecer el alcance del proyecto y garantizar la continuidad y cumplimiento del objeto contractual, en concordancia con los requerimientos de la entidad y la supervisión de la interventoría.

9 ANEXOS

9.1 FORMATO ORDEN DE TRABAJO CALLE 72 1 A 5 (MET-02)
9.2 FORMATO ORDEN DE TRABAJO CALLE 72 1 A 11 (MET-11)
9.3 FORMATO ORDEN DE TRABAJO UNIVERSIDAD NACIONAL 1 A 5 (MET-03)
9.4 FORMATO ORDEN DE TRABAJO FERIAS 1 A 5 (OBC-02)
9.5 FORMATO ORDEN DE TRABAJO UNIVERSIDAD NACIONAL 1 A 5 (MET-03)
9.6 ACTA DE COSTOS No 10 PERIODO
